CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME
NIT. 901.935.374 - 0

CSM 015

RAD JORGE A MOLINA MEJIA

Tame, 01 de julio de 2025

Señores:
MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
Jorge Molina Mojica
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública N° 058 del 2024, cuyo objeto es "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud formal de suspensión

Respetado Ingeniero

Cordial saludo,

El CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 058 de 2024, cuyo objeto es la "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se permite solicitar formalmente la suspensión temporal de las actividades contractuales, con fundamento en los siguientes hechos y en el marco normativo aplicable.

Durante los meses de mayo, junio y lo que va corrido del mes de julio de 2025, se han presentado precipitaciones intensas y persistentes que han impedido el desarrollo normal de las actividades de obra, especialmente aquellas relacionadas con excavaciones y manejo de materiales granulares, los cuales provienen de canteras ubicadas en zonas adyacentes a los afluentes del río Cravo, actualmente desbordado.

El día 01 de julio de 2025, la Alcaldía Municipal de Tame expidió el Decreto No. 053, por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Municipio de Tame, debido a los impactos de la temporada invernal atípica.

2391
6 F 6

El Municipio de Tame, debido a la variabilidad climática está siendo afectado por eventos de origen natural, como lo es la temporada invernal que originó crecientes súbitas, desbordamiento, erosión, boquetes y/o desvío de cauce en los ríos y caños, ocasionando inundaciones, las cuales se procederán a describir a continuación:

- Como consecuencia de la temporada invernal que arreciaron a mediados del mes de mayo y durante el mes de junio del presente año, las crecientes súbitas de los ríos Casanare, Río Tame (San Ignacio), Caño el Plato, el río Tocoragua, río Purare, Río San Lope, río Cravo Norte y (brazo Culebrero), río Cabalalia - Tamacay, río Ele, río Cusay (Tigre), quebrada la Macaguana, caño Grane, caño Chicanoa, Caño Guarapo, por ahora los que han reportado las comunidades.

A pesar de contar con personal técnico y operativo en campo, las condiciones climáticas y los altos niveles freáticos en el área de intervención han hecho imposible continuar con las excavaciones y otras labores constructivas, generando riesgos operacionales y económicos.

El Contrato de Obra 058-RAPLL-2024, en su **CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA,** numeral 45, establece expresamente la obligación de:

"Informar oportunamente a la REGIÓN LLANOS. sobre cualquier eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato"

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales pueden suspenderse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista.

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia ha ilustrado sobre la ocurrencia de suspensiones del contrato estatal cuando sobreviene una causa ajena a las partes contratantes, como podrían ser hechos de la naturaleza, v.g. -cambios de las condiciones climatológicas, terremotos, incendios, inundaciones-1; o acciones del hombre que afectan el desarrollo del contrato, por ejemplo, alteraciones de orden público, protestas, paros y bloqueos2, o decisiones derivadas de autoridades con facultad para suspender los contratos.

[1] Al respecto ver las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la que se describen situaciones en las que las partes decidieron suspender la ejecución de los contratos por fuertes inviernos e inundaciones, radicaciones: 10.735 del 31 de agosto de 1999 y 12.431 del 31 de marzo de 2003, entre otras.

[2] Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en la que se analizó la suspensión de un contrato por la acción de los trabajadores de un sindicato, radicado: 11.101 del 20 de febrero de 1998.

~~1996~~
051

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME
NIT. 901.935.374 - 0

En consecuencia, y conforme a los anexos que se adjuntan (Informe Técnico Diario de Condiciones Hidrometeorológicas, Alertas y Pronósticos (ITD). donde se puede constatar que el departamento a fecha del día de hoy se encuentra en alerta roja.

En virtud de lo anterior, y con el fin de proteger tanto la continuidad técnica del contrato como los recursos públicos comprometidos, solicitamos respetuosamente:

- Se estudie por parte de la interventoría la autorización y aprobación formal para la suspensión temporal de las actividades contractuales a partir del 02 de julio de 2025, por el termino de un (01) mes.
- La formalización mediante acta de suspensión, en la que se deje constancia de la situación de fuerza mayor, conforme a lo requerido contractualmente y a efectos de trazabilidad administrativa.

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución del contrato y nuestra total disposición para reanudar actividades tan pronto se restablezcan las condiciones climáticas, en coordinación con la interventoría y el contratante

Atentamente,

GRIGELIO MULATO ARRECHEA
R/L. CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

ANEXOS:

Informes Técnicos de Condiciones Hidrometeorológicas (ITD),

Decreto Municipal No. 053 de 2025

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

NIT 901.415.324-0

Rdo: Jorge Molina
04-08-2025
9:00 am.

CSM 018

Tame, 04 de agosto de 2025

Señores:
MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
Jorge Molina Mojica
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública N° 058 del 2024, cuyo objeto es "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Solicitud Acta de Mayores y Menores Cantidades y Adicional en Valor N°1

Cordial saludo,

El CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 058 de 2024, cuyo objeto es la "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se permite de manera atenta y formal solicitar a esa Interventoría la elaboración y revisión conjunta del Acta de Mayores y Menores Cantidades y Adicional en Valor No. 1, en atención a las variaciones detectadas en las cantidades de obra originalmente contratadas con un valor inicial del contrato de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (1.194.468.094,85)

Durante el desarrollo de las actividades contractuales y con base en la revisión técnica de los documentos contractuales (planos, cantidades de obra y presupuestos) en comparación con el levantamiento topográfico y replanteo ejecutado en sitio, se identificaron diferencias sustanciales en las longitudes, áreas y volúmenes de algunas actividades. Estas diferencias corresponden a ajustes necesarios por condiciones reales del terreno, empalmes con estructuras existentes, y adecuaciones requeridas para garantizar la funcionalidad y calidad del proyecto, después de realizado el estudio de las cantidades reales necesarias según los datos reales se concluye que el contrato necesita de un adicional de SESENTA Y SIETE

1398
653

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

NIT 901.935.374 - 8

MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESCIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($67.782.773,64).

Los cambios en las cantidades de obra, tanto en aumento como en disminución, generan impactos directos en los costos de ejecución del contrato. La formalización de estos ajustes mediante el acta correspondiente permitirá mantener el equilibrio económico del contrato, asegurando la disponibilidad de recursos adecuados para la culminación satisfactoria de las actividades contratadas y ajustadas, concluyendo con un valor total del contrato de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.262.250.868,49).

La solicitud se fundamenta en lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, los cuales permiten la modificación de los contratos estatales mediante otrosí, siempre que existan justificaciones técnicas, financieras y jurídicas debidamente soportadas. Igualmente, esta solicitud encuentra sustento en las cláusulas contractuales relacionadas con ajustes y modificaciones al contrato y en el cumplimiento del principio de equilibrio contractual. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018, las cantidades de obra pueden ser ajustadas mediante acta de mayores y menores cantidades, siempre que exista una justificación técnica válida y cuente con aprobación por parte de la supervisión e interventoría.

Con base en lo anterior, solicitamos de manera respetuosa que se programe una reunión de revisión técnica conjunta para la elaboración y suscripción del acta correspondiente, la cual formalice las nuevas cantidades y actividades adicionales que resultan necesarias para la correcta ejecución del contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta para proceder con las actividades pertinentes.

Atentamente,

GRICELIO MULATO ARRECHEA
R/L. CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

Carrera 15 N° 13 – 61 Barrio Sucre
consorciosanmigueltame@gmail.com
Tame Arauca

1399
654

ANEXOS:

01- INFORME EJECUTIVO DE JUSTIFICACIÓN TECNICA ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ADICIONAL EN VALOR N°1
02- ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y ADICIONAL EN VALOR N°1
03- BALANCE GENERAL DE AVANCE
04- PLANOS
05- CARTERAS TOPOGRAFICAS

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

NIT. 901 935 378 - 0

CSM 019

Tame, 13 de agosto de 2025

Recibo
Jorge Molina
13/08/2025
a: 17 OMM

Señores:
MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
Jorge Molina Mojica
Representante Legal
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública N° 058 del 2024, cuyo objeto es "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

Asunto: Afectación de sardineles por parte de la comunidad – Reposición y advertencia

Cordial saludo,

Me permito informar que, en el marco del desarrollo del proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido que se adelanta en la CARRERA 21 ENTRE CALLE 12 Y 13, se evidenció que varios de los sardineles previamente instalados han sido dañados por acciones indebidas de algunos miembros de la comunidad, quienes no tomaron las precauciones necesarias para su adecuada conservación.

Como consecuencia de esta situación, será necesario realizar el reemplazo y reinstalación de los sardineles afectados, acción que asumirá el contratista únicamente por esta vez, como un gesto de responsabilidad y compromiso con la calidad del proyecto.


Es importante dejar constancia de que estos daños no son atribuibles al contratista, ya que ocurrieron posterior a la correcta ejecución de la instalación y como resultado del uso inadecuado o manipulación externa. En este sentido, se advierte que, si estos hechos llegan a repetirse, el contratista no se hará responsable por nuevas reposiciones ni por los costos derivados de las mismas.

Carrera 15 N° 13 – 61 Barrio Sucre
consorciosanmigueltame@gmail.com
Tame Arauca


~~404~~
676

Para soporte de lo anterior, se anexan evidencias fotográficas que muestran el estado de los sardineles afectados.

1.

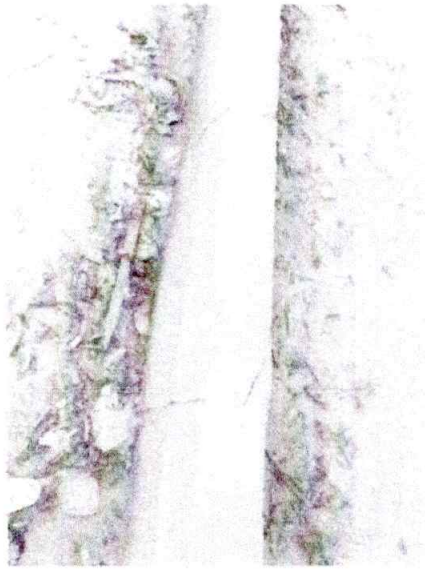


2.

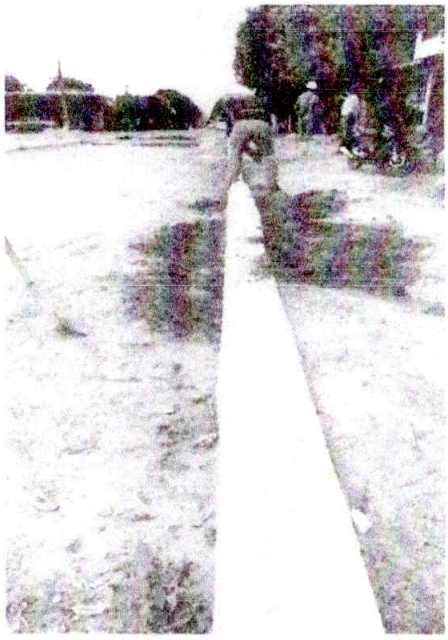


651 ~~7402~~

3.



4.

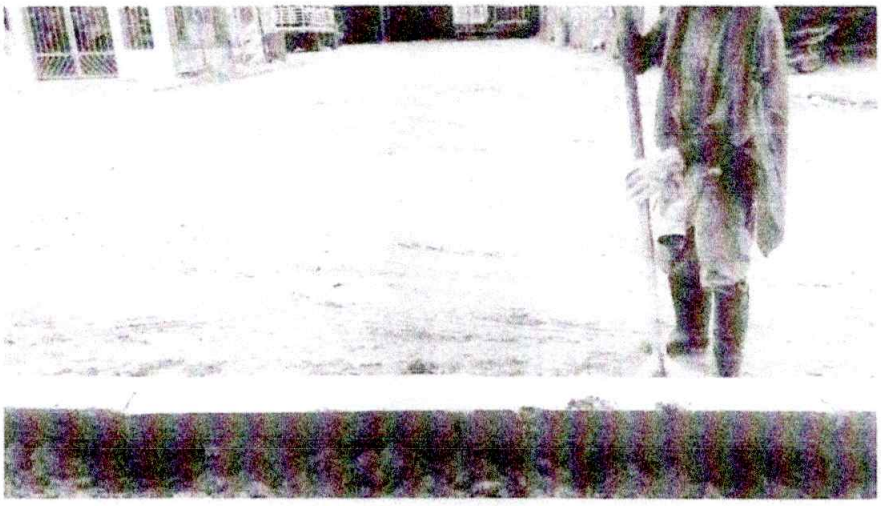


Carrera 15 N° 13 – 61 Barrio Sucre
consorciosanmigueltame@gmail.com
Tame Arauca

658

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME
NIT 901 495 274-0

5.

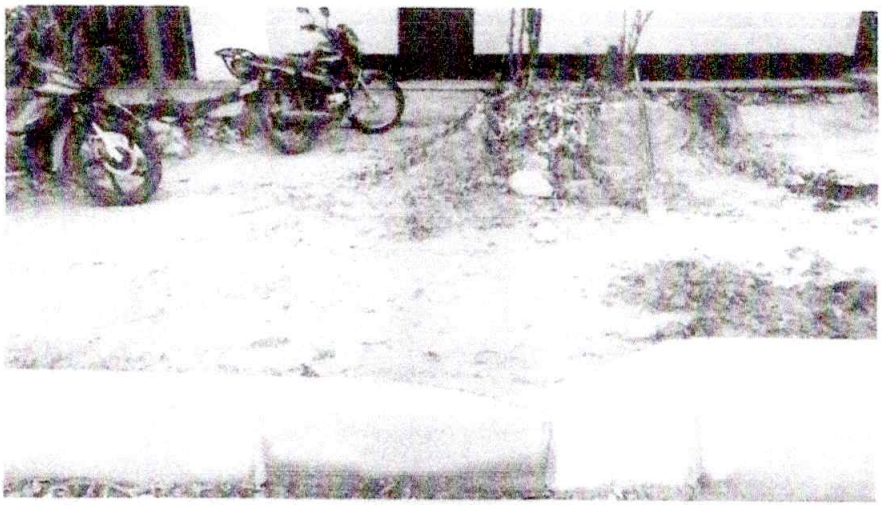

Así mismo, se informa que una copia del presente oficio ha sido remitida a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del municipio de Tame, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para socializar esta situación con la comunidad y evitar futuros inconvenientes.

Atentamente,

GRIGELIO MULATO ARRECHEA

R/L. CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

Carrera 15 N° 13 – 61 Barrio Sucre
consorciosanmigueltame@gmail.com
Tame Arauca

659

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME
NIT. 901 985 374 - 0

RDU
JORGE A MOLINA FG
AGOSTO 29

Tame, 29 de agosto de 2025

Señor
JORGE MOLINA MOJICA
R/L. MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA EXTERNA
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública N° 058 del 2024, cuyo objeto es **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Asunto: Entrega de informes mensuales de mayo y junio

Respetados señores:

De manera atenta, nos permitimos remitir a la interventoría los informes mensuales correspondientes al mes de mayo y junio en cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas vigentes del Contrato de Obra No. 058 DE 2024, cuyo objeto es **PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Atentamente,

GRIGELIO MULATO ARRECHEA
R/L CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

1401
660

Gmail

MOLINA MOJICA INGENIERIA <molinamojicaing@gmail.com>

Solicitud Informe Ejecutivo.

2 mensajes

gerencia RAP LLANOS <gerencia@rapllanos.gov.co> 10 de septiembre de 2025, 10:35
Para: molinamojicaing@gmail.com
Cc: mauriciorincon731@gmail.com

Yopal (Casanare), 10 de septiembre de 2025.

Señor,
JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA
R/L MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
NIT: 9015819502
Email. molinamojicaing@gmail.com
Tame – Arauca

Asunto: Solicitud Informe Ejecutivo.

En atención a las funciones que le asisten a la interventoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable al régimen de contratación estatal, me permito solicitar muy respetuosamente la entrega de un informe ejecutivo que dé cuenta del estado actual de la obra, incluyendo los aspectos físicos, administrativos, financieros y demás que se encuentren bajo su ámbito de competencia, en el marco de las labores de control, supervisión y seguimiento contractual.
El informe deberá ser remitido a esta dependencia a más tardar el 12 de septiembre de 2025, con el fin de adelantar una revisión detallada del avance en la ejecución del proyecto y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y de la interventoría.
Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atenta a la respuesta a la presente solicitud.

Cordialmente,

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

NERY OROS ORTIZ
Gerente

Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS
Tel. 608 6343587
gerencia@rapllanos.gov.co
Carrera 21 N. 6 - 78 Barrio San Martín

Yopal Casanare

GE-100-10-210 OFICIO INTERVENTORIA TAME .pdf
376K

MOLINA MOJICA INGENIERIA <molinamojicaing@gmail.com> 12 de septiembre de 2025, 17:48
Para: gerencia RAP LLANOS <gerencia@rapllanos.gov.co>, mauriciorincon731@gmail.com

Tame, 12 de septiembre de 2025

Doctora:
NERY OROS ORTIZ
R/IL REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS
NIT 9015819502

E-mail: rapllanos22@gmail.com
Ciudad

Cordial saludo,

En atención a la solicitud realizada el pasado 10 de septiembre de 2025, nos permitimos remitir el **inf**orme de ejecución de actividades con corte al 31 de agosto de 2025, en el cual se evidencian las labores desarrolladas por el contratista de obra, así como las gestiones contractuales adelantadas por la interventoría, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud, recomendación o solicitud que considere pertinente.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
--

Molina Mojica Ingeniería S.A.S
Tel : (7) 888 4506
Cel. 316 4827829
Tame- Arauca



INFORME ACORTE MES DE AGOSTO DE 2025 VF.pdf
9705K

7487 662

CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME
NIT. 901 935 174 -0

Tame, 29 de septiembre de 2025

PDO
JORGE A. MOLINA
SEP/29.

Señor
JORGE MOLINA MOJICA
R/L. MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA EXTERNA
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública N° 058 del 2024, cuyo objeto es **"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Asunto: Entrega de correcciones de informes mes de mayo y junio, y informes de meses de agosto y septiembre

Respetados señores:

De manera atenta, nos permitimos remitir a la interventoría las subsanaciones correspondientes a los informes mensuales de los meses de mayo y junio. También se hace la entrega de los informes correspondientes a los meses de agosto y septiembre en cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas vigentes del Contrato de Obra No. 058 DE 2024, cuyo objeto es **PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

Atentamente,

GRIGELIO MULATO ARRECHEA
R/L CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

1408
663

Gmail

MOLINA MOJICA INGENIERIA <molinamojicaing@gmail.com>

CONVOCATORIA REUNION

1 mensaje

gerencia RAP LLANOS <gerencia@rapllanos.gov.co> 3 de octubre de 2025, 15:30
Para: molinamojicaing@gmail.com, CONSORCIO SAN MIGUEL TAME <consorciosanmigueltame@gmail.com>, edwin.cubides.casanare@gmail.com

Señores

CONSORCIO SAN MIGUEL
(Contratista de Obra) Contrato No 058-RAPLL-2024
MOLINA MOJICA INGENIERIA
(Contratista de interventoría) Contrato No 057-RAPLL-2024
Ing MAURICIO RINCON
(Apoyo a la supervisión) Contrato No 033-RAPLL-2024

Se adjunta el link para la reunion que se llevará acabo el día lunes 6 obtubre a las 2:00 pm.

(Sin título)
Lunes, 6 de octubre · 2:00 – 3:00pm
Zona horaria: America/Bogota
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada: https://meet.google.com/oui-bawa-pxs
O marca el: (CO) +57 601 8956564 PIN: 773 696 238#
Más números de teléfono: https://tel.meet/oui-bawa-pxs?pin=7427997627517

Atentamente,

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

NERY OROS ORTIZ
Gerente

Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS
Tel. 608 6343587
gerencia@rapllanos.gov.co
Carrera 21 N. 6 - 78 Barrio San Martín

Yopal Casanare

1469
669

COPIA BITÁCORA DE OBRA

Carrera 12 # 14-42 B. Santander Tame-Arauca Tel: (7) 8884506 Cel.: 316-4827829
molinamojicaing@gmail.com

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Entidad Pública Descentralizada
NIT 901581990-2

Fecha:	8-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV		Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING. AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se da inicio al contrato de obra No 058

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			
Descripcion breve de los hechos			
Hubo Lesión?			
Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

~~200~~
666

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Territorios para prosperar
NIT. 901581950-2

Fecha:	9-may-25	Localización:	Vías urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV		Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:
x	x	x	x	x

Señalización

Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 252021267S3 CND	

~~207~~
667

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Regiones para el progreso
NIT. 901581950-2

Fecha:	10-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	Contratista de Obra:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV		Soleado	7:00 -12:00	3:00 - 5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		1:30 - 3:00
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x		x		

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3	x	1
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI: | NO: x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que desempeña:

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si | No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
TP 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

~~262~~
668

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Trabajando para prosperar
NIT. 901581956-2

Fecha:	11-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	0	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
				ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA				
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x		x		

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra			
Descripción		**Cant**	**Estado**
Retroexcavadora Orugada:			
Motoniveladora:			
Vibrocompactador:			
Carrotanque:			
Volquetas 14 m3			
Volquetas 7 m3		x	1
Mezcladora de cemento (trompo)			
Vibrocompactador cemento:			
Cortadora cemento (para dilataciones)			
Kit instalacion Mezcla para placas			
Grua (Instalacion de postes)			
Herramienta menor electricos			
Herramienta menor obras			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	

Accidentes en obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			
Descripcion breve de los hechos			
Hubo Lesión?			
Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~205~~
669

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT. 901581950-2

Fecha:	12-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoría:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV		Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

SE ENTREGA A INTERVENTORIA LA DOCUENTACIONN REQUERIDA PARA EL PROYECTO, EN LA QUE SE ENCURNTRA LAS HOJAS DE VIDA PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA PARA SU DEBIDA APROBACIÓN

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY TARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

261
670

CONSORCIO SAN MIGUEL S.A.S. TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGION LLANOS RAP Región para la prosperidad NIT. 901581950-2

Fecha:	13-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad	ING. RESID INTERV			a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV		Soleado	7:00 -12:00	1:00-2:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluvia Pasajera		2:00 - 3: 30
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	Cant	Estado	Ocurrio Algun Accidente?			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~285~~
69/

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGION LLANOS
RAP Territorios para prosperar
NIT 901581950 2

Fecha:	14-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

266
6-72

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT. 901581350-2

Fecha:	15-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de interventoria		Estado del Tiempo /Duración	a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

~~967~~
673

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT. 901581960-2

Fecha:	16-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoría:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración	a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**					
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?			
Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~268~~
674

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS RAP

Fecha:	17-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No	

Observaciones en Obra:	Responsabilidad de Bitacora:	
	MAYDA DURLEY TARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
	Residente de Obra	Residente de Interventoria
	T.P 252021267 53 CND	

~~262~~
625

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Región para prosperar
NIT. 901581950-2

Fecha:	18-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración	a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. DIREC INTERV		Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	0	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING. AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA				
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1 BUENO: 2		DEFICIENTE:3	Si		No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

676
210

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS RAP Territorios para prosperar NIT. 901581950-2

Fecha:	19-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DARLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

221
677

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

REGIÓN LLANOS
RAP-E Región Administrativa y de Planeación
NIT. 901581950-2

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	20-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
							a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~272~~ 678

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

NIT. 901581980-2

Fecha:	21-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:	**Responsabilidad de Bitacora:**	
	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
	Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
	T.P 25202126753 CND	

673

679

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Región para la prosperidad
NIT. 901561950-2

Fecha:	22-may-25	Localización:		Vías urbanas:	Hoja Numero: 1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
							a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Se busca el lugar el cual será utilizado como bodega de la ejecucion de la obra

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

~~2024~~
6/10

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Región Administrativa y de Planeación Especial
NIT. 901581950-2

Fecha:	23-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	0	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					**Señalización**			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra			**Accidentes en obra**			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

205
081

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Ordenando para prosperar
NIT. 901581950-2

Fecha:	24-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	Contratista de Obra:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar
NIT 901581950-2

Fecha:	25-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoría:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	0	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING. AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	**Señalización**			
						Cintas reflectivas:		Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x					

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?			
Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

2.23

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Territorios para la prosperidad
NIT. 901581950-2

Fecha:	26-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		1:00-5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE EJEUCION DE LA OBRA

SE REALIZA EL CERRAMIENTO D ELA CALLE 24 Y SE IMPLEMENTA SU DEBIDA SEÑALIZACION CUMPLIENDO CON EL PMT PROPUESTO ANTERIORMENTE.

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE 3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

624
228

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGION LLANOS

RAP Territorios para prosperar

NIT. 901581950-2

Fecha:	27-may-25	Localización:	Vías urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra						**Estado del Tiempo /Duración**		
Perosnal del Contratista de obra				**Personal de Interventoria**			**a.m**	**p.m**
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						**Señalización**		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra			**Accidentes en obra**		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si	No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA OURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

GST
229

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
NIT. 901581956-2

Fecha:	28-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
							a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**					
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

626
780

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT 901581050-2

Fecha:	29-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoría:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoría:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 BUENO: 2 DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

6d7
~~787~~

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

NIT: 901581950-2

Fecha:	30-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1		**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Nublado	7:00 -12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. AUX. RESIDENTE		Lluviosa		
						Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			Si:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si	No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

~~MAYDA~~ DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

681

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT: 901581950-2

Fecha:	31-may-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	Contratista de Obra:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL		Nublado	7:00 -12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	6	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

619
~~963~~

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Territorios para prosperar
NIT. 901581956-2

Fecha:	1-jun-25	Localización:		Vías urbanas:	Hoja Numero: 1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	Contratista de Obra:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	0	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x		x		

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	Cant	Estado	Ocurrio Algun Accidente?			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3	x	1	Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~284~~ 690

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
NIT. 901581950-2

Fecha:	2-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	Contratista de Obra:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra

Cargo	Cant	Cargo	Cantidad
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO	1
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL	
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	2
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1
		PALETEROS	2

Personal de Interventoria

ING. RESID INTERV	1	
ING. DIREC INTERV	1	
ING. AMBIENTAL	1	
ING. ESP HIDRAULICO		
ING. ESP GEOTECNIA		
ING. AUX. RESIDENTE		
COMISION TOPOGRAFIA	1	
INSPECTOR SISO		

Estado del Tiempo /Duración

	a.m	p.m
Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluviosa		
Lluvia Fuerte		

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos
x	x	x	x	x	

Señalización

Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

~~165~~
691

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

RAP Territorios para la esperanza

NIT. 901581950-2

Fecha:	3-jun-25	Localización:		Vias urbanas:	Hoja Numero: 1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración	a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**					
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00 -12:00	3:00 - 5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO	1	ING. AMBIENTAL	1	Nublado		1:30 - 3:00
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	2	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x		x		

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

SE REALIZA A LA VEZ EXCAVACIONES PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE 3" DE ACUEDUCTO

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3	x	1	Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

~~28 6~~

692

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	4-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO	1	ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	2	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MANUAL PARA EL REEMPLAZO DE LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO

SE REALIZA TAMBIEN A SU VEZ LAS ACTIVIDADES DE CAMA DE ARENA, TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO 8" Y RELLENO CON COMPACTACION DEL MISMO MATERIAL

SE REALIZA A LA VEZ EXCAVACIONES PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE 3" DE ACUEDUCTO

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126758 CND	

287

093

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGION LLANOS
RAP Territorios para prosperar
NIT. 901381950-2

Fecha:	5-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00 -12:00	1:00 -5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO	1	ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	2	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	**Señalización**		
						Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se adelantan actividades de prealistamiento

SE ENTREGA A INTERVENTORIA LA DOCUENTACIONN REQUERIDA PARA EL PROYECTO, EN LA QUE SE ENCURNTRA LAS HOJAS DE VIDA PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA PARA SU DEBIDA APROBACIÓN

SE REALIZA A LA VEZ EXCAVACIONES PARA REEMPLAZO DE TUBERIA DE 3" DE ACUEDUCTO

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 BUENO: 2 DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

188
684

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

NIT 901561950-2

Fecha:	6-jun-25	Localización:	Vías urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00 -12:00	1:00-2:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		2:00 - 3: 30
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

~~489~~
694

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	7-Jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		1:00 5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Nublado	7:00-12:00	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. AUX. RESIDENTE		Lluviosa		
						Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

290

6%

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP Territorios para prosperar
NIT. 901581956-2

Fecha:	8-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	0	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x		x		

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3	x	1	Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit Instalacion Mezcla para placas						
Grua (Instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

194

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	9-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00-12:00	1:00-5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
Si:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si | No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

202
698

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	10-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1		a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Soleado		1:00-5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL	1	Seco	10:00-12:00	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. AUX. RESIDENTE		Lluviosa	7:00-10:00	
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1	Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra			
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**			
Retroexcavadora Orugada:			SI:		NO:	x
Motoniveladora:			Hora:			
Vibrocompactador:			Nombre:			
Carrotanque:			Cargo:			
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:			
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos			
Mezcladora de cemento (trompo)						
Vibrocompactador cemento:						
Cortadora cemento (para dilataciones)						
Kit instalacion Mezcla para placas						
Grua (instalacion de postes)						
Herramienta menor electricos						
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?			
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	Si		No	

Observaciones en Obra:	Responsabilidad de Bitacora:	
	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ Residente de Obra T.P 25202126753 CND	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA Residente de Interventoria

293

699

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	11-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV			a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Soleado	7:00-10:00	1:00-5:00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. AUX. RESIDENTE		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1	Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?			
Si		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

294

700

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME NIT: 901.935.374-0

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGION LLANOS
RAP Entidad Administrativa Especial
NIT. 901831966-2

Fecha:	12-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	*REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS*	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra

Cargo	Cant	Cargo	Cantidad
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA	
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO	
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL	
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1
		PALETEROS	2

Personal de Interventoria

ING. RESID INTERV	1
ING. DIREC INTERV	1
ING. AMBIENTAL	1
ING. ESP HIDRAULICO	
ING. ESP GEOTECNIA	
ING. AUX. RESIDENTE	
COMISION TOPOGRAFIA	1
INSPECTOR SISO	1

Estado del Tiempo /Duración

	a.m	p.m
Soleado	7:00-10:00	1:00-5:00
Seco		
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluviosa		
Lluvia Fuerte		

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos
x	x	x	x	x	

Señalización

Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

205
201

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	13-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°:	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
058 DE 2024		
Contrato de Obra N°:	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
057 DE 2024		
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado	7:00-12:00	1:00-5::00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

246
702

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

NIT 900581960-2

Fecha:	14-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco	7:00-12:00	1:00-5::00
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		2:00 - 3: 30
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad					Señalización			
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Se busca el lugar el cual será utilizado como bodega de la ejecucion de la obra

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra			
Ocurrio Algun Accidente?			
SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			
Descripcion breve de los hechos			
Hubo Lesión?			
SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

T.P 25202126753 CND

903

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	15-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	0	INSPECTOR SISO	0	ING. RESID INTERV		Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	0	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV		Seco		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	0	MAESTRO		ING. AMBIENTAL		Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	0	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE	0	ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	0	TOPOGRAFO	0	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	0	COMISION TOPOGRAFIA				
				INSPECTOR SISO				

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

NO SE LABORÓ

Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en obra		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
T.P 25202126753 CND	

704

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	16-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"			
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ				

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	ING. RESID INTERV	1	Soleado	a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco	7:00-12:00	1:00-5::00
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

Si:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

Si | No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Interventoria

705

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	17-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
							a.m	p.m
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**	**ING. RESID INTERV**	1	Soleado		
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. DIREC INTERV	1	Seco		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera	7:00-12:00	1:00-5::00
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	COMISION TOPOGRAFIA	1			
		PALETEROS	2	INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						Señalización		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI: | NO: x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que desempeña:

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI | No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
Residente de Obra
T.P 25202126753 CND

Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA

706
~~705~~

CONSORCIO SAN MIGUEL TAME

CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS
RAP
NIT. 901581950-2

Fecha:	18-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		
Contrato de Obra N°: 058 DE 2024		Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024		Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
Supervisor:		REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ			

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco	7:00-12:00	1:00-5::00
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		2:00 - 3: 30
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	**Señalización** Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (Instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 | BUENO: 2 | DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente? SI: | NO: x

Hora:

Nombre:

Cargo:

Actividad que desempeña:

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión? SI | No

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

707

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha:	19-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	Cant	Cargo	Cantidad				a.m	p.m
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco	7:00-12:00	1:00-5::00
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad

Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Señalización		
						Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant	Estado
Retroexcavadora Orugada:		
Motoniveladora:		
Vibrocompactador:		
Carrotanque:		
Volquetas 14 m3		
Volquetas 7 m3		
Mezcladora de cemento (trompo)		
Vibrocompactador cemento:		
Cortadora cemento (para dilataciones)		
Kit Instalacion Mezcla para placas		
Grua (instalacion de postes)		
Herramienta menor electricos		
Herramienta menor obras		

EXCELENTE: 1 BUENO: 2 DEFICIENTE:3

Accidentes en obra

Ocurrio Algun Accidente?

SI:		NO:	x
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que desempeña:			

Descripcion breve de los hechos

Hubo Lesión?

SI		No	

Observaciones en Obra:

Responsabilidad de Bitacora:

MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA
Residente de Obra	Residente de Interventoria
T.P 25202126753 CND	

302

302

CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

REGIÓN LLANOS

NIT: 901581950-2

Fecha:	20-jun-25	Localización:	Vias urbanas:	Hoja Numero:	1
Entidad Contratante	***REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS***	**Contratista de Obra:**	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME - NIT: 901.935.374-0 R/L GRIGELIO MULATO ARRECHEA		
		Contratista Interventoria:	MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S - NIT: 900.516.082 - 4 R/L JORGE MOLINA MOJICA		

Contrato de Obra N°: 058 DE 2024	Objeto de Obra:	"PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Contrato de Obra N°: 057 DE 2024	Objeto de Interventoria:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VIAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
Supervisor:	REGION ADMINISTRATIVA Y PLANEACION RAP LLANOS - NERY OROS ORTIZ	

Personal para ejecucion de obra

Perosnal del Contratista de obra				Personal de Interventoria		Estado del Tiempo /Duración		
Cargo	**Cant**	**Cargo**	**Cantidad**				**a.m**	**p.m**
ING. DIRECTOR DE OBRA	1	INSPECTOR SISO	1	ING. RESID INTERV	1	Soleado		
ING. ESP. GEOTECNIA	1	ALMACENISTA		ING. DIREC INTERV	1	Seco	7:00-12:00	1:00-5::00
ING . ESP GERENCIA DE PROYECTOS	1	MAESTRO		ING. AMBIENTAL	1	Nublado		
ING. RESIDENTE OBRA	1	OFICIAL		ING. ESP HIDRAULICO		Lluvia Pasajera		
ING . AUX DE RESIDENTE		AYUDANTE		ING. ESP GEOTECNIA		Lluviosa		
ING AMBIENTAL	1	TOPOGRAFO	1	ING. AUX. RESIDENTE		Lluvia Fuerte		
		PALETEROS	2	COMISION TOPOGRAFIA	1			
				INSPECTOR SISO	1			

Elementos de seguridad						**Señalización**		
Cascos	Botas:	Guantes:	Gafas:	Carnet:	Conos	Cintas reflectivas:	Señales preventivas	PMT:
x	x	x	x	x				

Actividades Desarrolladas

ACTIVIDADES DE OBRA:

Se empiezan a realizar trabajos de oficina debio a la necesidad de una solicitud de un modificatorio de cantidades del proyecto, se traba sobre un levantamiento y verificación

Maquinaria y Equipos en Obra			**Accidentes en obra**		
Descripción	**Cant**	**Estado**	**Ocurrio Algun Accidente?**		
Retroexcavadora Orugada:			SI:	NO:	x
Motoniveladora:			Hora:		
Vibrocompactador:			Nombre:		
Carrotanque:			Cargo:		
Volquetas 14 m3			Actividad que desempeña:		
Volquetas 7 m3			Descripcion breve de los hechos		
Mezcladora de cemento (trompo)					
Vibrocompactador cemento:					
Cortadora cemento (para dilataciones)					
Kit Instalacion Mezcla para placas					
Grua (Instalacion de postes)					
Herramienta menor electricos					
Herramienta menor obras			Hubo Lesión?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE:3	SI		No

Observaciones en Obra:	**Responsabilidad de Bitacora:**	
	MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ	**Ing. RODOLFO MOLINA MOJICA**
	Residente de Obra	**Residente de Interventoria**
	T.P 25202126753 CND	

709

303
