	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/2/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO	X		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	3h		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Yepes		Jose Jenifer Altamiranda	1082952220	Jonathan Rendon	1036962790
Jhon Davies				Jose carlos	1090727131
Mateo Gonzales					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 76 x Cl 34	W	NS	Se retira herraje metalico con tapa de concreto de 50X50	8:00		187
			Se instala herraje metalico con tapa de seguridad de 10X50			13
	E	SN	Se retira herraje metalico con tapa de concreto de 50X50			187
			Se realiza realce de 50 cm			
			Se instala herraje metalico con tapa de seguridad de 50X50		4:00	13
			Se realiza traslado de cajetos ya que se encontraba encima de la caja			

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, pulidora, falda de demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se autoriza realce de caja sentido suroriente costado oriental, se verifica señalizacion y epp, deja buen aseo de

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/02/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894058	Jenifer Altamiranda	1052982275		
Moises reyes	1002500775				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Lavado de Postes			
Cr 55	Central	W-E	lavado de Poste recto	08:00		230
Cll 67	Central		lavado de semaforo vehicular			234
			lavado de disco direccional			236
			Retiro de contraste.			199
	S	W-E	lavado de Poste recto			230
			lavado de semaforo Peatonal			231
			lavado de semaforo vial usuario			231
	S	W-E	Retiro de contraste de poste de mensula.			199
	W	S-N	lavado de Poste recto			230
			lavado de semaforo Peatonal			231
	E	SN	lavado de Poste recto			230
			lavado de semaforo Peatonal.		10:00	231

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23/02/26	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Carlos Gonzalez	1049894038				
Moises Reyes	1002500773				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 55	S	E-W	lavado de Poste recto			230
Cll 67			lavado de Semaforo Peatonal			231
	Carril	E-W	Lavado de semaforo vehicular			234
	Central		lavado de Poste recto			230
			Retiro de contraste			199
	N	E-W	Retiro de contraste de poste de mensula.			199

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/3

Alcaldía de Medellín / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INTEROL MED 2025 / RAY	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes		LLUVIOSO	X		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	IKN 741		DURACIÓN	1/2 hora		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Cesar Sanchez	1038806300				
Santiago Mena	1000533792				
Leonar Rios	PPT=4350715				
Alex Cañas	1036651088				


DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CR 51A CL 92			sondeo y levantamiento	8-00		237
AV 92A			instalación de 70mts de cabeza de segmento			
CR 55 CL 92-93			sondeo y levantamiento			237
			instalación de 320mts de cabeza de segmento		15-30	


EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

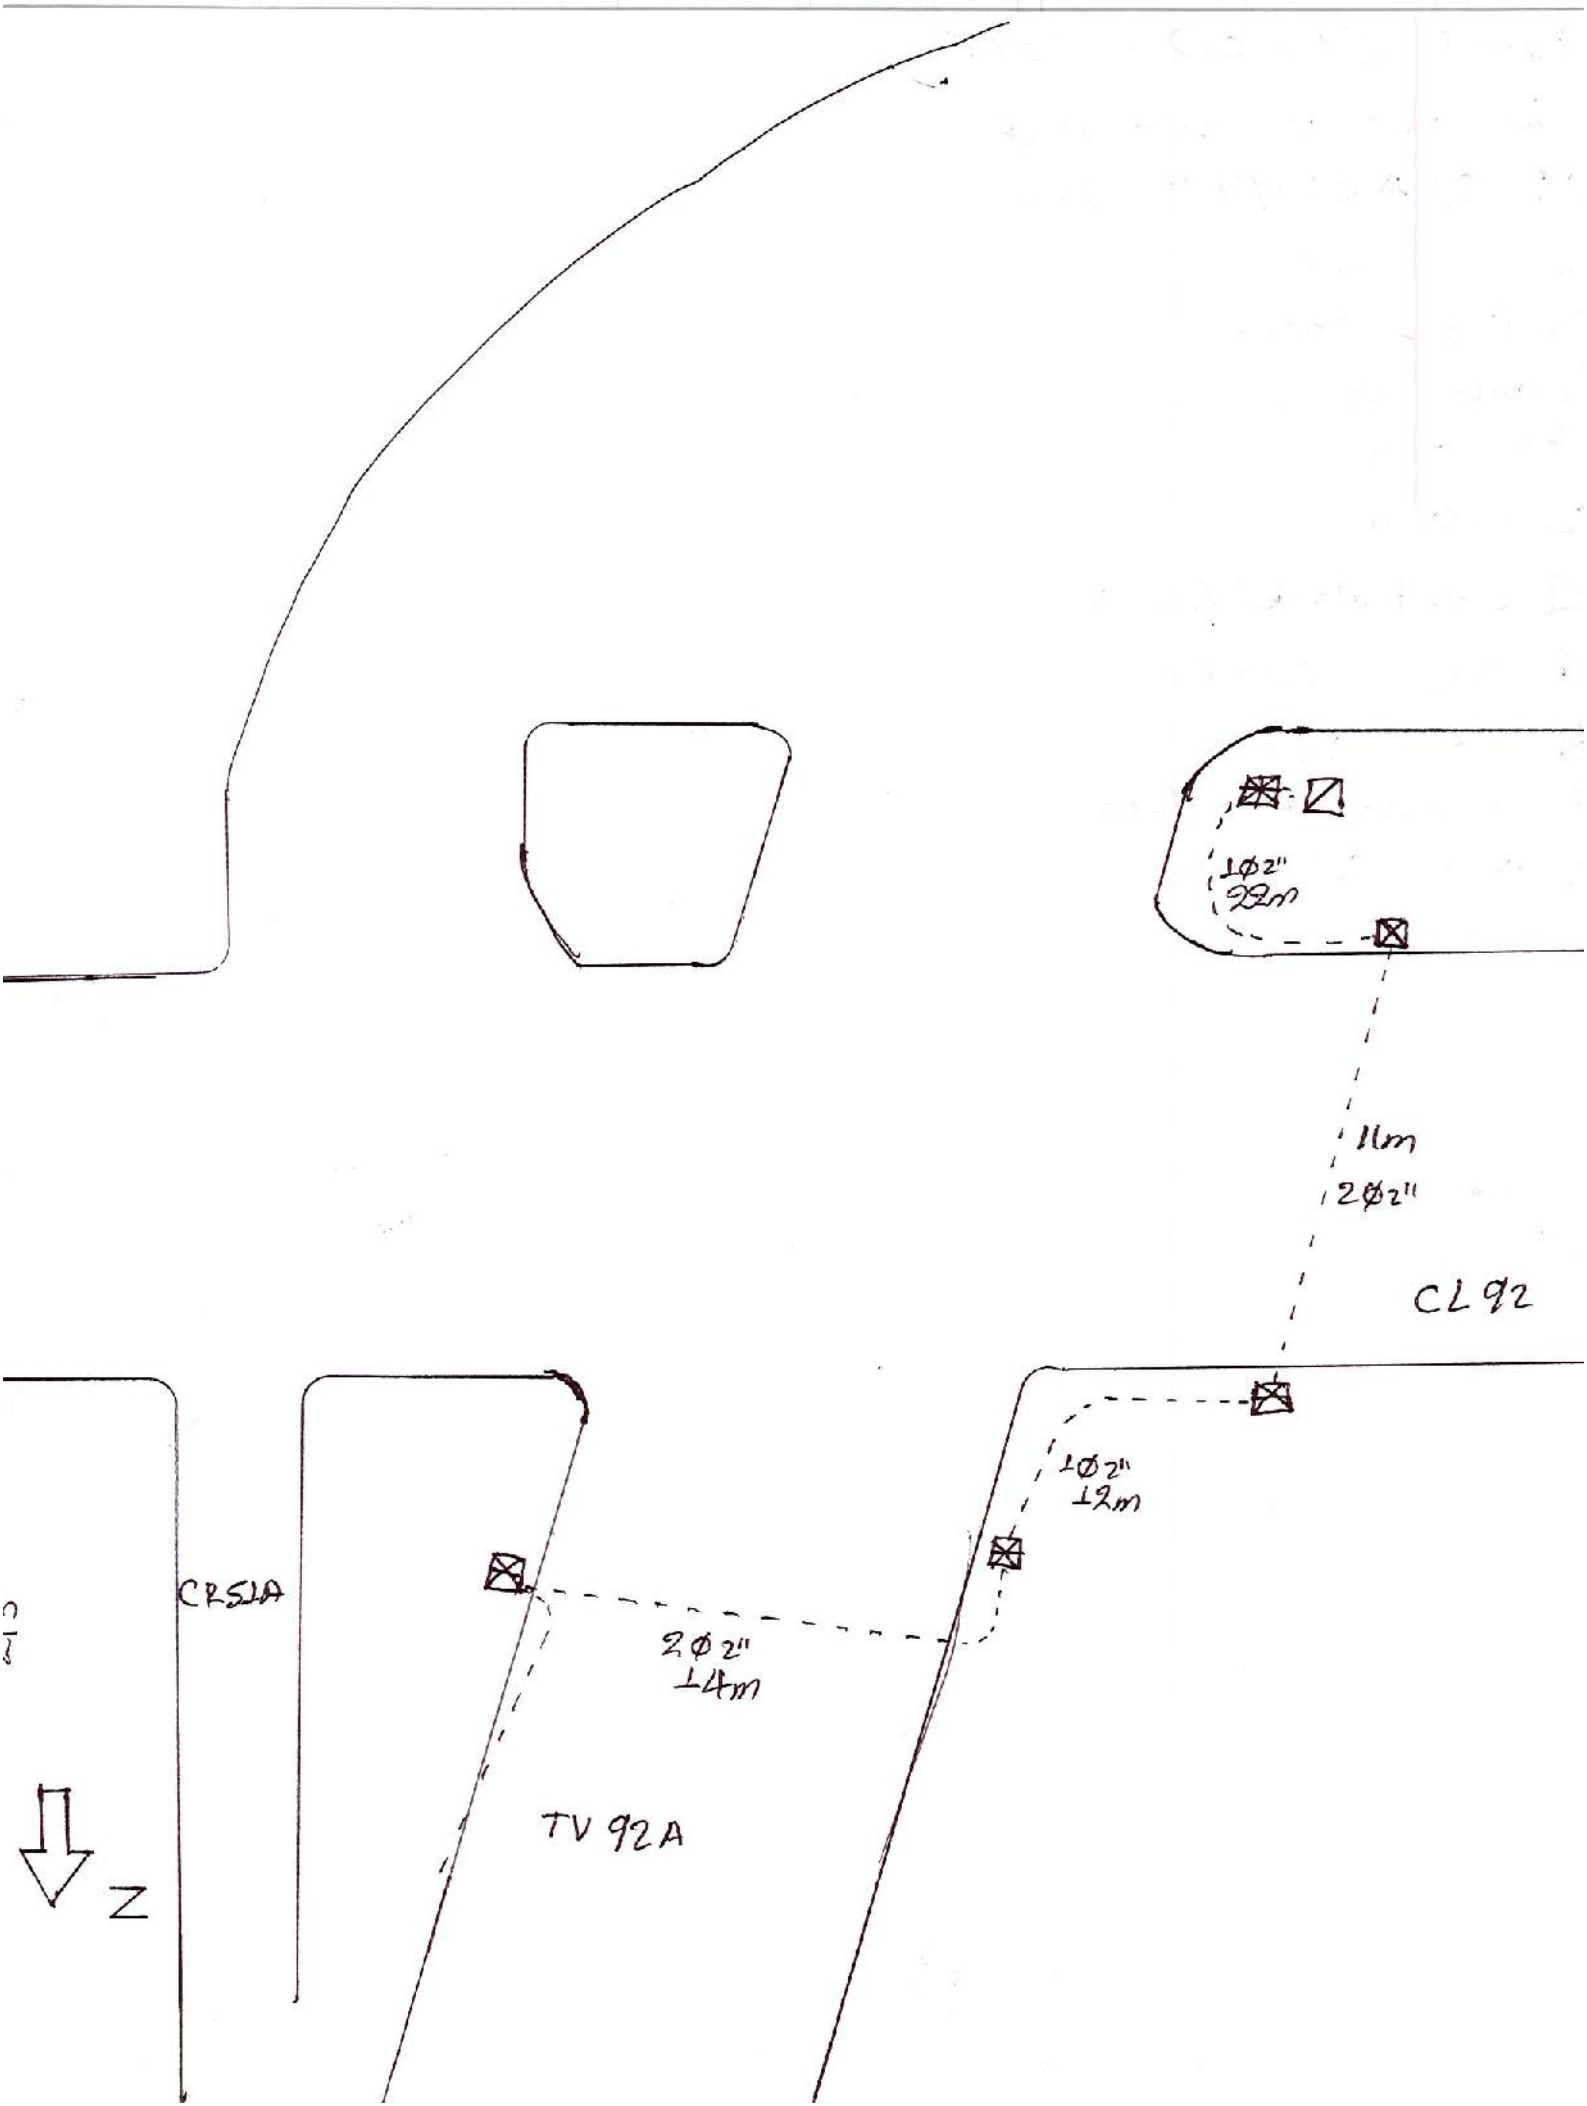
1Ø2"
22m
11m
2Ø2"
CL92
1Ø2"
12m
CR51A
2Ø2"
14m
TV 92A
Z

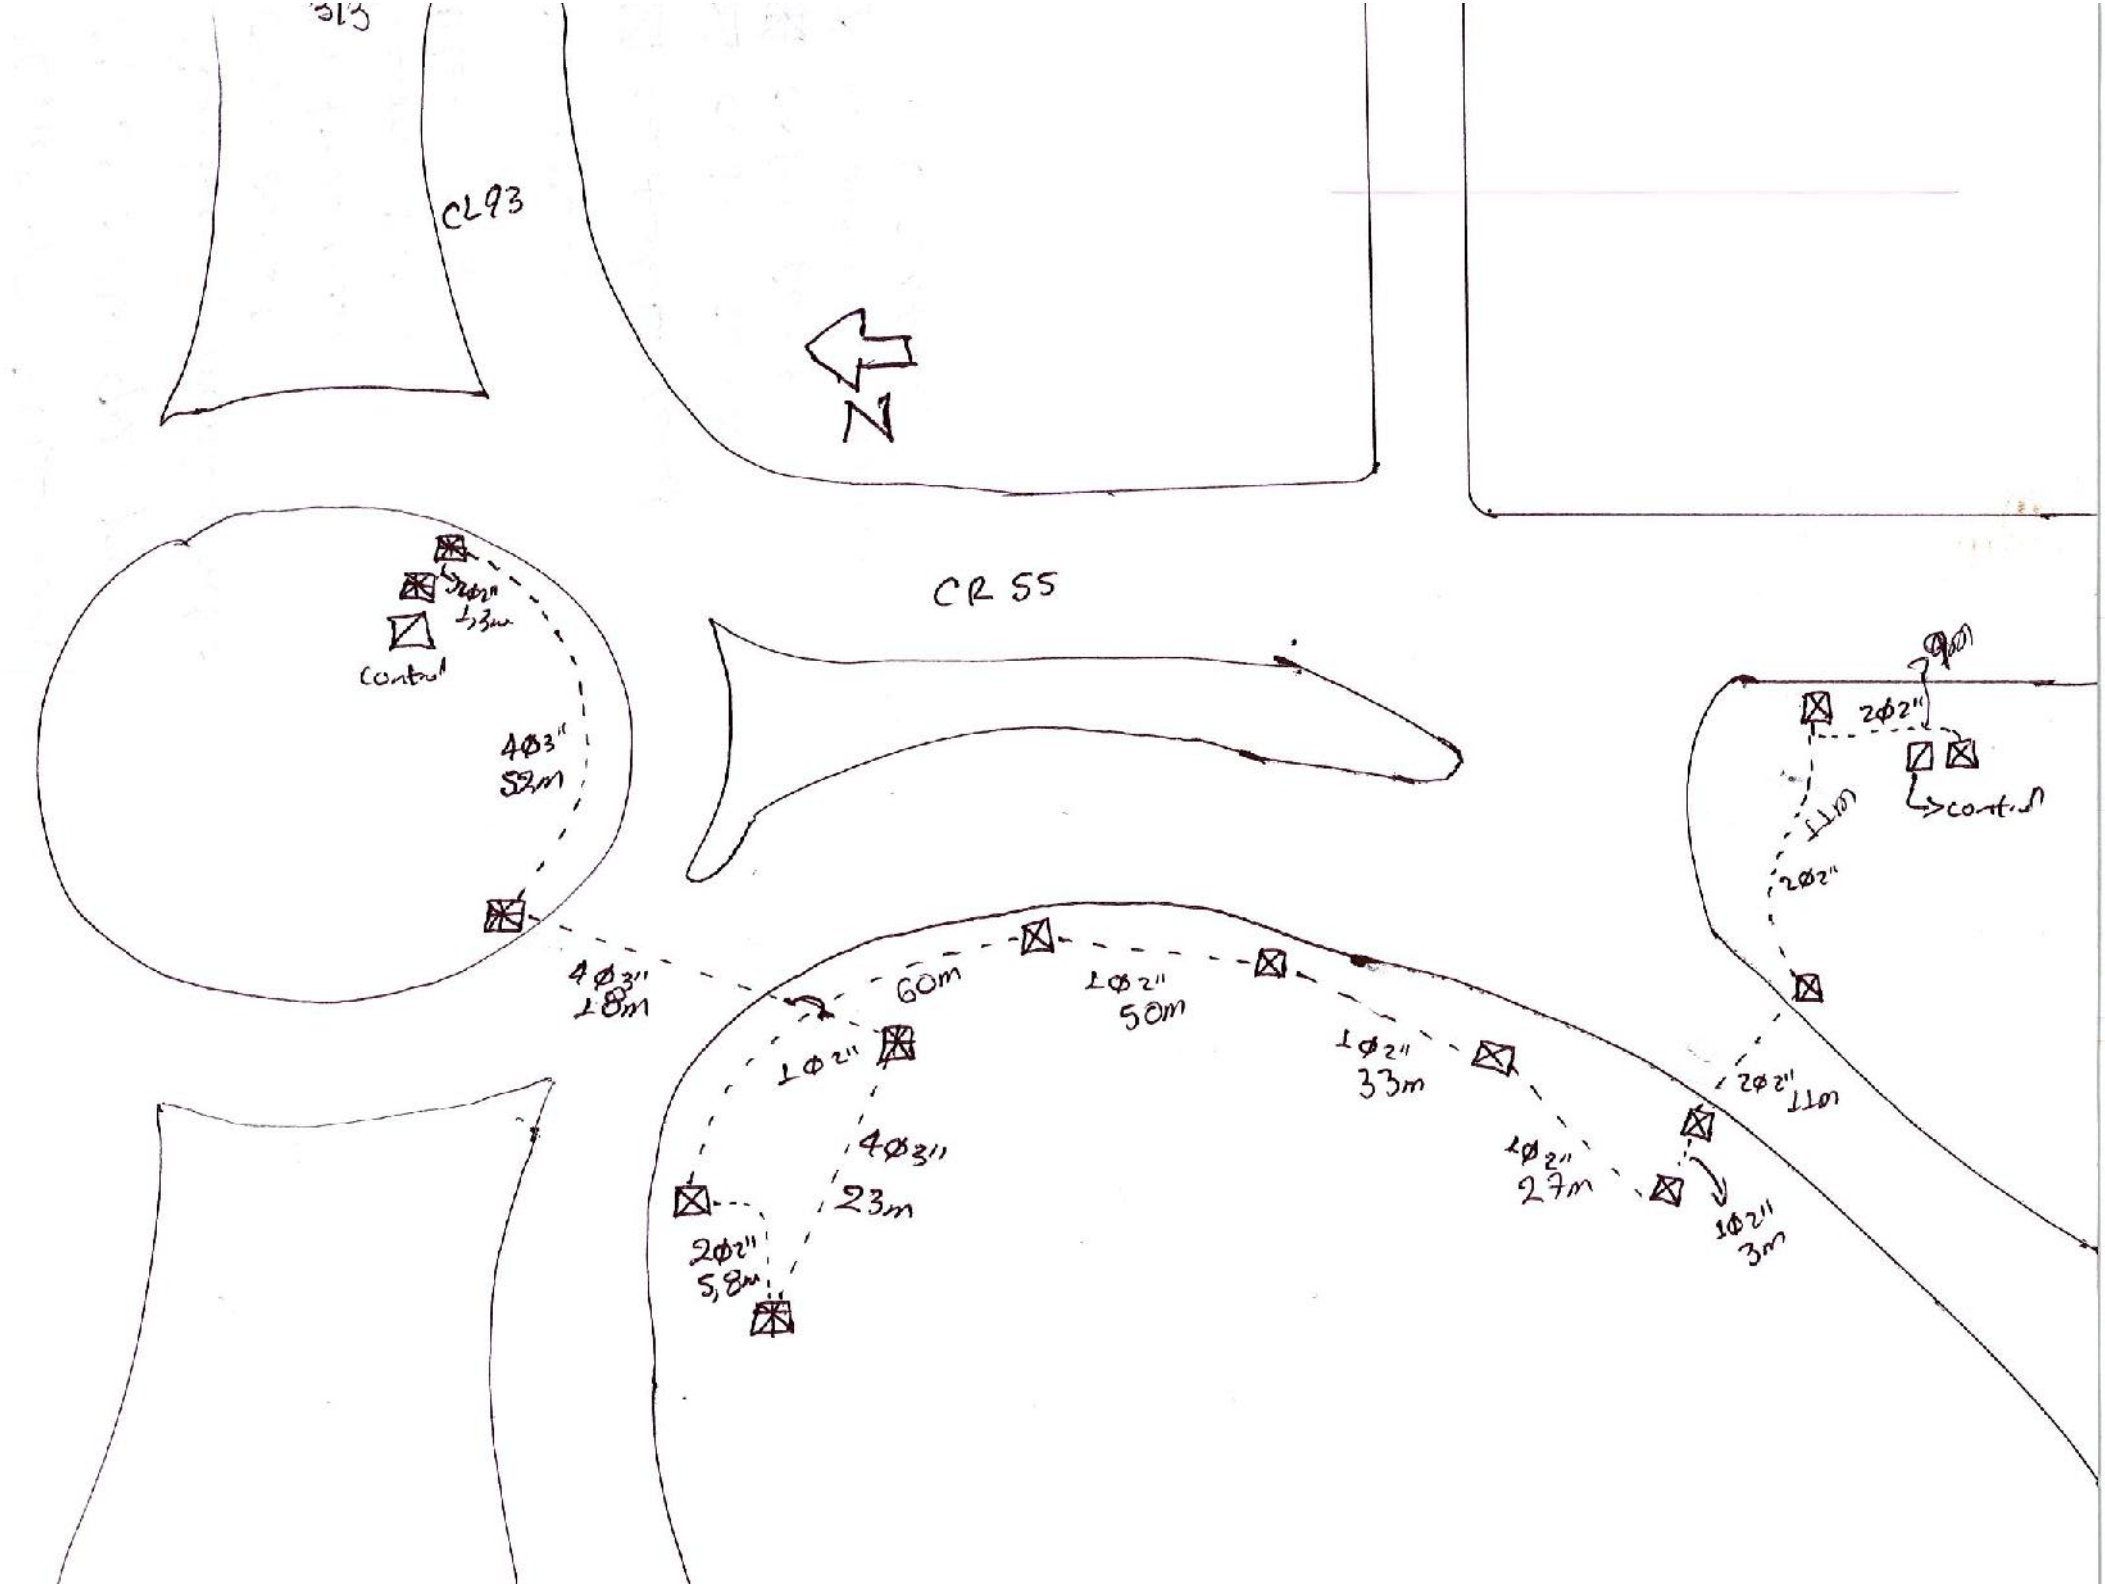
CL93
N
CR 55
4Φ3"
52m
Control
4Φ3"
18m
60m
1Φ2"
50m
1Φ2"
33m
1Φ2"
27m
1Φ2"
3m
2Φ2"
11m
4Φ3"
23m
2Φ2"
5,8m
2Φ2"
Control
2Φ2"
11m

1 | 2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT EAJOL MED 2025 · ROY · UNION TEMPORAL IMT MEDELLIN · Alcaldía de Medellín	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23 febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Roberto Cadavid	13.461.111				
Jose Perez	PPT 5.240.591				
Leon oquendo	15.495.477				
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 55 x	S-E	W-E	Construccion de Canalizacion en zona dura con 2	8:00		22
Calle 93 Glorieta			tubos de pvc de 2" de 3 metros.			
Madre Laura Cost			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto			187
Suroriental			de 50x50			
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje nuevo de seguridad nuevo			13
			de 50x50			
	N-E	W-E	Retiro de 1 herraje y tapa plastico de 50x50			187
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje nuevo de seguridad de			13
			50 x50			
	S-E	S-N	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto			187
			de 50x50			
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje nuevo de seguridad de			13
			50 x 50.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERSOL MED 2025 · RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23 Febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Lunes.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadrazco	13.461.111				
Jose Perez	PPT 5.240.509				
Leon oquendo	15.485.477				
Jorge Rodriguez.	PPT 1.137.342				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 55 x	S-W	S-N	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto			187
calle 93 Glorieta			de 50 x 50 02 unidades			
Madre Laura Cost			Limpieza de caja de inspeccion 02 unds			54
Suroriental.			instalacion de herraje nuevo de seguridad de			13
			50 x 50 02 unidades.		17:00	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · Unión Temporal SIT Medellín · Consorcio Interaseo Sit Medellín 2025 · RAY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	23 febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	lunes.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1.214.729.941				
Elmis Torres	1.028.030.487				
Higel villegas	1.018.229.962				
Yelson Cuevas.	1.035.961.703				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 80 x Calle 9 Cost. Sur	S-E	S-N	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50	9:00		187
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
	Separador Central	S-N	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50			187
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
Carrera 80 x Calle 9 Cost. Norte Rincon (CR76)	Separador Central	N-S	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50			187
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50			13
	Separador Norte	S-W	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50			187
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de 50x50		16:00	13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / PAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 - 02 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038910427				
semeon vivas					
Luis Lozano					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V 80 x cll 14			Estalación de pulsadores y cambio de lamparas peatonales	9:15am		
	S-E	S-N	perforación en poste con taladro y machuelos			
			Istalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de 4 empalmes en los pulsadores			94
			construccion de un empalme electrico en la caja de 50x50			94
			soldadia de 4 cordones en tapa de 50x50 de 10cm			262
			soldada de 4 cordones de 10cm en tapa de 50x50			262
			suministro istalacion de 25mts de cable 4x18 nuevos			215
	S-E	S-N	retiro de una lampara verde peatonal en mal estado a poste			195
			Istalacion de una lampara verde peatonal nueva			218
			estatica a poste. stiker 0091 SIN 20250003			
			construccion de un empalme electrico a poste			94
			se realizaron pruebas funcionales desde el controlador			
			quedando todo en buen funcionamiento.		12:00pm	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

42

Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN · CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 · RAY	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24-02-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MARTES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427				
Luis Lozano					
simcon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V.80 x paso peatonal			revicion de 4 pulsadores x se encontraron en mal estado.	7:00pm		
campos de paz	S-W	W-E	retiro de un pulsador de boton a poste			177
			estalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador			94
	separador central	W-E	retiro de un pulsador digital a poste			177
			estalacion de un pulsador de segunda de boton a poste			214
			perforacion con taladro y machuelos para rectificar las roscas, para los tornillos.			
			construccion de un empalme en el pulsador			94
	separador central	E-W	retiro de un pulsador de boton a poste			177
			Estalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador			94
	N-E	E-W	retiro de un pulsador de boton a poste			177
			estalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador		3:34pm	94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTEGRAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 02 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 507		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa P.	16791906				
Jose Andrade	11222857				
Carlos Gonzalez	1049894058				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 51			Hurto de calleado y corte de Cableado de	07am		
Calle 35			Comunicacion.			
			Construccion de Empalme en caja de			94
			paso de Semaforo YX18 dos lineas.			
			Contruccion de Empalme de comunicacion		11am	94
AV 80			Sondeo de Cajas de paso (8 cajas)	11 35		
Calle 25					5pm	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24/2/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Yepes		Jenifer Altamiranda	1052982270	Queny Barreneche	43060550
Shan Davies				Jose Cortes	1090427131
Martin Gonzales				Jonathan Rendon	1036902270

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cr 51 x Cl 35	E	N S	Se retira herraje metalico con tapa de concreto de 50X50	8:00		187
			Se instala herraje metalico con tapa de seguridad de 50X50			13
Cr 76 X Cl 33	E	S N	Se retira herraje metalico con tapa de concreto de 50X50			187
			Se instala herraje metalico con tapa de seguridad de 50X50		4:00	13

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, soldadora demoledor, pulidora, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Verificación de señalización y EPP

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24/02/2026	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Jorge José Ruiz Silva	1000537496			Jose cortes	1098727131
Yeison Galeano				Jonathan Rendon	1036962270
Thomas Ramirez				Queny Patricia	43068550
Hernan Acosta					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 36 - CALLE 10	Norte	W - E	• Retiro de 4 adoquines de 20x20	8:50		
			• Retiro de 8 adoquines de 40 x 40			
			• Construcción de canalización de 2 metros			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con serial 20250113 - Siucer 0318			212
			• Suministro e instalación de 6 metros de cruceta			
			• Suministro e instalación de 11 metros de cable 4x18			215
			• Suministro e instalación de fuente con serial 20250013 - Siucer 0237			—
			• Construcción de 3 empotres			94
			• Re - instalación de 4 adoquines de 20x20			53
			• Re - instalación de 5 adoquines de 40 x 40		4:20	53

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Pulidora, taladro demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	17/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO	✓		SI ✓		SI ✓		SI ✓
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura Padilla	1013221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
52 x 64	W-N	W-E	Lavado poste recto (de bomera, para cambio)	9:42am		230
			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro de contraste			199
Carrera 52	S-W	S-N	Lavado poste recto			230
Calle 64			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado semaforo ciclista			231
Carrera 52	S-E	S-N	Lavado poste recto (de bomera, para cambio)			230
Calle 64			Lavado semaforo peatonal			231
Carrera 52	E-S	E-W	Lavado poste recto (de bomera, para cambio)			230
Calle 64			Lavado semaforo peatonal			231
Carrera 52	E-N	E-W	Lavado poste recto (de bomera, para cambio)			230
Calle 64			Lavado semaforo peatonal			231

EQUIPO EN OBRA:

Escalera, Arnes, Herramienta Menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes		LLUVIOSO	/		SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN	—		NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura Padilla	1013221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	N-E	N-S	Lavado poste recto (de bombera, para cambio)			230
Calle 64			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro contraste			199
Carrera 52	N-W	N-S	Retiro contraste			199
Calle 64						
Carrera 52	W-S	W-E	Retiro contraste		3:58 pm	199
Calle 64						

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INT FAROL MED 2025 · RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	24 febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Martes.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadiazco	13.461.111				
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342				
José Perez	PPT 5.240.599				
Leon oquendo	15.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 51AX Calle 92	S-E	N-S	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50	9:30		187
			Limpieza de Caja de inspeccion.			54
			Instalacion del herraje de Seguridad nuevo de 50x50			13
	N-E	N-S	Construccion de Caja de inspeccion de 50x50			34
			Construccion en canalizacion en zona verde			25
			con 2 tubos PVC 2" 4,20 metros.			
			Instalacion de herraje de Seguridad nuevo de 50x50			13
	S-E	N-S	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto de 50x50			187
			Limpieza de Caja de inspeccion			54
			Instalacion de herraje de Seguridad nuevo de 50x50		16:30	13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

115

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 / RMV	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-02-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESR 528		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427				
simeon vivas	1065943019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cxv. 48 x cll 7 paso el INEN	Separador central	N-S	se visita la interseccion y se procede a revisar los pulsadores desde el controlador con pruebas de cheque guardando uno por uno en buen estado y funcionamiento	9:20 Am	9:50 Am	261
Cxv 48 x cll 7D paso politecnico	S-E	S-N	revicion de 4 pulsadores 3 en buen estado y funcionando y uno en mal estado retiro de un pulsador tousled a poste rectificacion de roscas con machuelos en poste istalacion de un pulsador de boton de segunda a poste construccion de un empalme en el pulsador se realizaron pruebas desde el controlador quedando en buen funcionamiento	10:05 Am	11:20 Am	175 214 94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO SEMAFOROS MEDELLÍN 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25-02-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESR 528		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1038810427				
Gimson Vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
AV 80 X CLL 77B			revicion de 4 pulsadores y se encontraron malos y uno vandalizado y cable en mal estado	7:56 AM		
	N-E	S-N	retiro de un pulsador tousled a poste			177
			perforacion con taladro y machuelos en el poste			
			instalación de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador			94
	separador central	S-N	retiro de un pulsador tousled a poste			177
			rectificacion de roscas con machuelos en el poste			
			instalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			retiro de 18mts de cable 4x18 del poste al controlador			173
			suministro instalación de 26mts de cable 4x18 nuevos asta el controlador:			215
			construccion de un empalme en el pulsador		4:00pm	94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3|3

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 - 02 -2026	TIEMPO	SECO	51	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIERCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	ESR 528		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
edwin santos	1038810427				
simeon vivas	1065913019				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V 80 X cll 77B	separador central	N-S	retiro de un pulsador tousled a poste	7:56 pm		177
			rectificación de rosca con machuplos en el poste			
			istalación de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador			94
	N-W	N-S	retiro de una base plastica de pulsador en poste			177
			perforacion con taladro, broca cierra y machuplos en el poste			
			istalación de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			construccion de un empalme en el pulsador		4:00 pm	94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RMV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 02 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa	16791906			Jonathan Rendon	1036960270
Jose Andrade	11222057			Jose cortes	1098727131
Carlos Gonzalez	1049894058				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 65	Separador	S N	Cambio de cableado del Grupo 4 en corto.	07 am		
Calle 93			Retiro de cableado en mal estado (13 metros)			173
			Instalacion y suministro de cableado 4X18 nuevo (16 metros)			215
			Construcion de Empalme en Semaforo Vehicular Sun chadas dos.			94 104
			Retiro de lampara de conteo mal estado.			
			Instalacion y suministro de lampara de conteo (Stver 0531 - 2025 10 24)		11 30 am	—
AV 80	Glorieta	NS	Horto de cableado	1 30 pm		
Calle 44			Suministro Instalacion de cableado 4X18 nuevo 27 metros			215
			Retiro de 6 metros usados.			173
			Construcion de dos Empalmes en semaforo			94
			Soldadura de Caja de 60 x 60		5pm	262

EQUIPO EN OBRA:

Escalera tipo tijera. herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalizacion y EPPS

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25/02/26	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Ruiz Silva	1000537976			Jose Cortes	1020729131
Yeison Yolcano				Jonathan Rendón	1036962270
Yeison Acosta				Alvaro Londoño	71775731

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 35 - CALLE 10	NORTE	W - E	• Retiro de 3 adoquines de 40 x 40	8:30		
			• Construcción de canalización de 2 metros			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con serial 20250111 - sticker 0619			212
			• Suministro e instalación de 2 metros de coraza			—
			• Suministro e instalación de 4 metros de cable 4x18			215
			• Suministro e instalación de fuente con serial 20250113 - sticker 0527			—
			• Construcción de 3 empalmes		12:10	94
CARRERA 35 - CALLE 10	SUR	W - E	• Retiro de 3 adoquines de 40 x 40	1:10		
			• Retiro de 8 adoquines de 20 x 20			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con serial 20250140 - sticker 0526			212
			• Construcción de canalización de 2 1/2 metros			
			• Suministro e instalación de 3 metros de coraza			
			• Suministro e instalación de 5 metros de cable 4x18			215

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, taladro demoledor, soldadura, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalización y EPP

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25/01/26	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Juan José Rios Silva	1000537976				
Yeison Galeano					
Marvin Acosta					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 35 - CALLE 10	SUR	W - E	• Suministro e instalación de fuente con señal			—
			2025OP40 - Steiger 0233			
			• Construcción de 3 empalmes			94 —
			• Re-instalación de 8 adoquines 20 x 20		4:40	53 —

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEARO MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 25/2/26 DIA: Miercoles VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN	X	UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christica Barbosa Yepes					
Ihan Davies					
Martin Gonzales					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Tv 73 x Cr 69	Separados	S N	Se retira semaforo vehicular partido	8:30		172
Rinconcito Ecuatoriano			Se retira disco direccional malo			179
			Se retira 4 metros de cable 4X18			173
			Se retira poste recto de enterramiento golpeado por vehiculo			168
			Se retira herraje metalico con tapa de concreto de 50X50			187
			Se instala poste de enterramiento (nuevo)			206
			Se instala semaforo vehicular nuevo (20250285) (nuevo)			65
			Caja A2511007427-0528) (amarillo A2511007844-0529) (verde A2511008390-0530) (semaforo 20250285)			
			Se instala cable de 4X18 - 4 metros			215
			Se reconstruye una pared de la caja			
			Se instala herraje metalico con tapa de seguridad de 50X50		3:40	13
			Se realiza empalme a semaforo vehicular			94
	E	N S	Se instala disco direccional (F) nuevo	3:40	4:00	83

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 febrero 2025	TIEMPO	SECO	—	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI ✓		SI ✓		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO ✓

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500713			Jose celtos	1078827131
Laura padilla	1017221580			Jonathan Rendon	1036960270

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	W-N	W-E	Lavado poste recto	8 am		230
Calle 62			Lavado semaforo peatonal			231
	W-S	W-E	Lavado poste recto			230
			Lavado semaforo peatonal			231
	S-W	S-N	Lavado poste recto			230
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado semaforo ciclista			231
	S-E	S-N	Lavado poste recto (de bornera, para cambio)			230
			Lavado semaforo peatonal			231
	E-S	E-W	Lavado poste recto (de bornera para cambio)			230
			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro de contraste			199

EQUIPO EN OBRA:

Escalera tipo tijera.

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

S. verificar señalización y EPP; cambiar lamparas ojo peatonal oriente occidente - costado norte y proyectar. cambio de 11 postes en sentido ori.-occ.- sur y norte; norte sur costado - oriente norte y sur

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 febrero 2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura Padilla	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	E-N	E-W	Lavado poste recto (de bornera, para cambio)			230
calle 62			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal (Lampara roja no prende)			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro de contraste			199
	N-E	N-S	Lavado poste recto (de bornera, para cambio)			230
			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro de contraste			199
Carrera 52	W-S	W-E	Lavado poste recto (de bornera, para cambio)			230
calle 64			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional		3:40 pm	236

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Query Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/2

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 Febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadavco	13.461.111				
Jose Perez	PPT 5.240.599				
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342				
Leon oquendo	15.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 39x	S-E	S-N	Encamisada de 1 tubo de 3/4 de acometida	8:00		55
calle 58			electrica. 1,60 metros.			
			Construccion de Canalizacion en zona verde			27
			con 1 tubo pvc de 1 1/2 2,70 metros, tubería de			
			fibra optica.			
			Construccion de Canalizacion en zona verde			25
			con 2 tubos pvc de 2" 1,90 metros.			
	Separador central	E-W	Demolicion de tapa de caja de inspeccion			1
			concretada de 50x50			
			Limpieza de caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo			13
			de 50x50			
	N-E	S-N	Demolicion de tapa de caja de inspeccion concretada			1
			de 50x50 02 unidades.			
			Limpieza de caja de inspeccion 02 unidades.			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de			13
			50x50 02 unidades.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INT PARQUEMED 2025 RMY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 febrero 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Eberto Cadavco	13.461.111				
Jose Perez	PPT 5.240.599				
Jorge Rodriguez	PPT 1.137.342				
Leon oquendo	15.495.477				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 39 x	S-W	S-N	Demolicion de tapa de Caja de inspeccion concreticada			1
Calle 55			de 50x50			
			Limpieza de Caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje de seguridad nuevo de			13
			50x50		17:00	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL ITF MEDELLÍN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-02-2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin Santos	1035810427				
simson vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V 80 x cll 79			se visita la intersección y nos encontro pulsador en el poste.	9:05Am		
	separador central	N-S	perforación con taladro y machuelos para el pulsador			
			istalacion de un pulsador de boton de segunda a poste			214
			reistalacion de 9mts de cable 4X16 al poste que se encontro en la caja de 60x60			215
			construcción de un empalme en el pulsador			94
	separador central	S-N	se encontró pulsador de boton desarustado a poste			260
			Ajuste de un pulsador de boton a poste		10:21Am	
A.V 80 x cll 77B			istalacion de pulsador y cambio de lamparas peatonales	10:28Am		
	S-W	W-E	perforación con taladro y machuelos en poste para pulsador			
			istalacion de un pulsador de boton a poste de segunda			214
			construccion de un empalme en el pulsador		12:00Pm	94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 - 02 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038810427				
simeon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
A.V 80 x cll 77B	N-W	N-S	retiro de una lampara verde peatonal en mal estado a poste	10:30Am		195
			instalacion de una lampara verde peatonal nueva estatica a poste			218
			stiker: 0089 - S/N 20250009			
			construccion de un empalme electrico a poste			94
	N-E	S-N	retiro de una lampara roja peatonal en mal estado a poste			195
			retiro de una lampara verde peatonal en mal estado a poste			195
			instalacion de una lampara roja peatonal nueva a poste			218
			stiker: 0078 - S/N 20250014			
			instalacion de una lampara verde peatonal nueva estatica a poste			218
			stiker: 0090 - S/N 20250002			
			construccion de un empalme electrico a poste		12:00pm	94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · RMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 - 02 - 2026	TIEMPO	SECO	SI	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	JUEVES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Edwin santos	1038410427				
Simeon vivas					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
cvr 76 x cll 55 y	N-E	E-W	se visita la intrerseccion y se encuentran pulsadores 2	2:50pm		
60	S-W	W-E	en buen estado y 2 apagados sin servicio			
			perforacion en poste con taladro y machuelos para			214
			Ajustar la base del pulsador que se encontraron desa			
			justada			
			retiro de pulsador digital a poste			177
			Instalacion de pulsador digital a poste			214
			queda pendiente revisar el cable desde el poste asta			
			el controlador pasando por debajo del puente		4:00pm	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de Interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 02 2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	MTN 502		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Bobosa	16791906				
Carlos Gonzalez					
Jose Andrade	1122853				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	NE	NS	Reporte de Semaforos Peatonales en corto Grupo 7	07am		
Calle 82			Retiro de Cableado en mal Estado (50 METROS)			173
			Suministro Instalacion de Cableado nuevo 4x18			215
			(68 metros)			
			Construccion de Empalme en Semaforos			94
			Peatonales x2			
			limpieza de caja de Paso de cables		12:20	54
AV 80			Sondeo de Cajas de Paso de Cableado			
Calle 21			de Semaforo 7 Cajas.		5pm	

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVIAL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/2/26	TIEMPO	SECO	X	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Christian Barbosa Lopez				Jose Cortes	1070727131
Jhon Davies				Jonathan Tenda	1036962270
Martin Gonzalez					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
C. 76 x CI 30	S	W E	Retiro de semaforo peatonal a mensula			172
			Retiro de 17 metros de cable 4X18			173
			Instalacion de poste recto de enterramiento			206
			Reinstalacion de 12 metros de cable 4X18			215
			Reinstalacion de semaforo peatonal en poste recto de enterramiento			208
			Construccion de 30cm de canalizacion para llevar el poste			28
			Retiro de herrage metalico con tapa de [illegible] concreto de 50x50			187
			Instalacion de herrage metalico con tapa de seguridad 50x50			13

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, pulidora, taladro demoledor, herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Se verifica señalizacion y EPP.

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEAROL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · RNV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/02/26	TIEMPO	SECO	x	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:	0		DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Ivan José Roa Silva	1000337976			Jose cortes	1090729730
Yeison Galeano	1039597832			jonathan Rendón	1036962270
Hernán Acosta	1001029750				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 35 - CALLE 10	NORTE	W - E	• Retiro de 3 adoquines 40 x 40	8:30		
			• Retiro de 6 adoquines 20 x 20			
			• Construcción de canalización de 2 metros			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con serial 20250106 - sticker 0532			212
			• Suministro e instalación de 2½ metros de cobre			
			• Suministro e instalación de 9 metros de cable 4x18			215
			• Suministro e instalación de fuente con serial 20250051 - sticker 0286			
			• Construcción de 3 empalmes			94
			• Re-instalación de 6 adoquines 20 x 20		12:30	53
CARRERA 35 - CALLE 10	SUR	W - E	• Retiro de 3 adoquines 40x40	1:30		
			• Retiro de 13 adoquines 20 x 20			
			• Construcción de canalización de 3 metros			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con serial 20250109 - sticker 0633			212
			• Suministro e instalación de 3½ metros de cobre			

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, pulidora, taladro de mesa, herramientas menores

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

Verificacion señalizacion y EPP.

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26/02/26	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Ivan José Roa Silva	1000537976				
Yeiber Goleano	1039597832				
Hernan Acosta	1007023780				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
CARRERA 35 - CALLE 10	SUR	W - E	• Suministro e instalación de 5 metros de cable 4x18			215
			• Suministro e instalación de fuente con señal			—
			20250065 - SF1221 0288			
			• Construcción de 3 empalmes			94
			• Re-instalación de 13 adoquines 20x20		4:30	53

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL EIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEGRAL MED 2025 / RAY	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 febrero 2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura padilla	1013221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	W-N	W-E	Lavado poste recto	8:40 am		230
Calle 61			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retro contraste			199
Carrera 52	W-S	W-E	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retro contraste			199
Carrera 52	S-W	S-N	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado semaforo ciclista			231
Carrera 52	S-E	S-N	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo peatonal			231

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/2

Alcaldía de Medellín / UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN / CONSORCIO INTEGRAL SEMAFORIZACION 2025 / RAV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26 febrero 2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura padilla	1013221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	N-E	N-S	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo vehicular			234
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado disco direccional			236
			Retiro contraste			199
Carrera 52	E-N	E-W	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo peatonal			231
Carrera 52	E-S	E-W	Lavado poste recto			230
Calle 61			Lavado semaforo peatonal			231
Carrera 52	N-W	N-S	Retiro contraste		4:12pm	199
Calle 61						

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · RNV	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 y 26 febrero	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles y Jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Vargas	1.214.729.941				
Ermis Torres	1.028.030.497				
Santiago Hena	1.000.533.792				
Miguel villegas	1.018.229.962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 54 x	N-E	N-S	Retiro de poste de enterramiento directo	8:00		168
calle 54			Retiro de semaforo vehicular a poste			172
			Retiro de semaforo peatonal.			172
	N-W	W-E	Retiro de poste de enterramiento directo			168
			Retiro de semaforo vehicular a poste			172
			Retiro de semaforo peatonal.			172
			Retiro de disco direccional.			179
	N-E	W-E	Retiro de poste de enterramiento directo			168
			Retiro de semaforo peatonal.			172
	S-E	W-E	Retiro de poste de enterramiento directo			168
			Retiro de semaforo peatonal.			172
	N-W	N-S	Retiro de semaforo vehicular a poste			172
			Retiro de semaforo peatonal			172
			Retiro de disco direccional.			179
	S-W	W-E	Retiro de semaforo peatonal.			172

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
Alcaldía de Medellín · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTERVIAL MED 2025 · ROY	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	25 y 26 febrero	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Miercoles y Jueves.		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Yan Carlos Usuga	1.214.729.941				
Elmis Torres.	1.028.030.497				
Santiago Mena	1.000.533.792				
Miguel Villegas	1.018.229.962				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 54x	S-W	W-E	Retiro de disco direccional.		11:30	179
Calle 54						
Carrera 80 x	N-W	N-S	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto	14:00		187
calle 9 Cost.			de 60x50			
Norte Rincon			Limpieza de Caja de inspeccion			54
(CR76)			Realce de caja de inspeccion de 28 cm.			
			Instalacion de herraje metalico de seguridad			13
			nuevo de 50x50			
Carrera 80 x	Separador Central	W-N	Retiro de herraje metalico con tapa de Concreto			187
calle 9			de 50x50			
Cost. Sur			Limpieza de Caja de inspeccion			54
			instalacion de herraje metalico de seguridad			13
			nuevo de 50x50.		16:30	
			El retiro de este amoblamiento se realiza por solicitud de la Entidad.			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT. FAROL MED. 2025 / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	26-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	jueves		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Javier Nieves		Andrés Bedoya			
Stiven Palacio		Cristian Hena			
Carlos Zúñiga		Brayan Palacio			
Alcides Riasco		Harlon Salderriaga			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Cl. 70 x Cl 16			Construcción de base para controlador local = 1 un			33
			Retiro de herraje de 50x50 con tapa de concreto = 1 un			187
			Limpieza de caja = 1 un			54
			Instalación de herraje de 50x50 = 1 un			13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO LUMINOTECNICO MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:			LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa				Jose cortes	1098727131
Yeison Galeano					
Juan Jose Roa					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			• Retiro de 46 adoquines 20x20			
cra 35 x cl 10			• Construcción de canalización de 8" metros			
			• Suministro e instalación de semaforo de piso con			212
			serial 20250101 - Stiker 0534			
			• Suministro e instalación de 7 metros de coraza			
			• Suministro e instalación de 11 metros de cable 9x18			215
			• Suministro e instalación de fuente con serial			
			20258092 - stiker 0291			
			• Construcción de 3 empalmes			94
			• Re-instalación de 32 adoquines 20x20			53

EQUIPO EN OBRA:

Planta electrica, Pulidora, taladro demoledor herramienta menor

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 febrero 2026	TIEMPO	SECO	-	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura Padilla	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	N-E	~~N-S~~	Lavado poste recto			230 -
Calle 59			Lavado semaforo vehicular			234 -
			Lavado semaforo peatonal			231 -
			Lavado disco direccional			236 -
	E-N	E-W	Lavado poste recto			230 -
			Lavado semaforo vehicular			234 -
			Lavado semaforo peatonal			231 -
			Lavado disco direccional			236 -
	E-S	E-W	Lavado poste recto			230 -
			Lavado semaforo vehicular			234 -
			Lavado semaforo peatonal			231 -
			Lavado disco direccional			236 -
	S-E	S-N	Lavado poste recto			230 -
			Lavado semaforo peatonal			231 -

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoria

CONSORCIO INTERVENTOR FAROL MED 2025 · UNION TEMPORAL SIT MEDELLÍN · PMV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27 febrero 2026	TIEMPO	SECO	✓	UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Moises Reyes	1002500113				
Laura padilla	1017221580				

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
Carrera 52	S-W	S-N	Lavado poste recto			230
Clle 59			Lavado semaforo peatonal			231
	W-S	W-E	Lavado poste recto			230
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado semaforo ciclista			231
			1			
	W-N	W-E	Lavado poste recto			230
			Lavado semaforo peatonal			231
			Lavado semaforo ciclista			231

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTEFAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Javier Nieves		Alcides Riascos			
Stiven Palacio		Cristian Mena			
Carlos Zuñiga		Harlon Saldarriaga			
Andres Bedoya		Brayan Palacio			

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Retiro de 10 herrajes en zona verde (50 x 50 cm)			187
KR 70 x						
Cl 14			Limpieza de 10 cajas			54
			Instalacion de 10 herrajes de 50 x 50 cm nuevos			13
			Retiro de 4 herrajes de 50x50 en andén			187
			Limpieza de 4 cajas			54
			Instalación de 4 herrajes nuevos de 50 x 50 cm.			13

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERVENTOR MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	27-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	viernes		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Suministro de semáforo vehicular incluye dos soportes = 10 un			143
Ríos			Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo = 12 un			144
			Suministro de poste recto de enterramiento directo = 4 un			141

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN	PLAN DE CALIDAD	
		VERSIÓN 1
	REINTEGRO DE ELEMENTOS	1/09/2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	OBJETO: MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ". SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NÚMERO DEL CONTRATO	4600105555 de 2025 (UNION TEMPORAL SIT)

Entregado por: ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA | **Recibido por: FRANK GARCIA**

FECHA	ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION
27/2/2026	LAMPARAS PEATONALES VERDES	25	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARAS PEATONALES ROJAS	21	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARAS CICLISTAS VERDES	3	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARA CICLISTAS ROJAS	3	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARAS CHINAS VERDES	1	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARAS CHINAS ROJAS	2	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARAS CHINAS AMARILLAS	15	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARA LEOTEK AMARILLA	1	SINIESTROS
27/2/2026	LAMPARA LEOTEK AMARILLA	83	REINTEGRO BUENAS
27/2/2026	LAMPARA DE CONTEO REGRESIVO AMARILLO	1	SINIESTROS
27/2/2026	CABLE 4X16-4X18	375	SINIESTROS
27/2/2026	CABLE UTP	26	SINIESTROS
27/2/2026	CABLE TELEFONICO 10-20 O MAS PARES	33	SINIESTROS
27/2/2026	CABLE ENCAUCHETADO 2X12-3X12	48	SINIESTROS
27/2/2026	HERRAJES DE 50X50 CON TAPA	13	SINIESTROS
27/2/2026	TAPAS DE 50X50 CONCRETO	12	SINIESTROS
27/2/2026	TAPA DE 60X60 CONCRETO	4	SINIESTROS
27/2/2026	MARCO DE 50X50 SIN TAPA	4	SINIESTROS
27/2/2026	MARCO DE 60X60 SIN TAPA	4	SINIESTROS
27/2/2026	PULSADORES TOUCHLESS	19	SINIESTROS
27/2/2026	PULSADORES VIEJOS	2	SINIESTROS
27/2/2026	DISCOS DIRECCIONALES	4	SINIESTROS
27/2/2026	SONORIZADORES	15	REGULARES HAY 5, MALOS HAY 2
27/2/2026	CANASTILLAS DE SONORIZADOR	26	SINIESTROS
27/2/2026			
27/2/2026			
27/2/2026			

VERIFICACIÓN

FIRMA PERSONA QUE ENTREGA:		***FIRMA PERSONA QUE RECIBE***	
nombre	ANYELO DANIEL GOMEZ MEJIA	**nombre**	FRANK GARCIA
cargo	ALMACENISTA	**cargo**	CIOS

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 FD: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	sábado		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa					
Juan José Roa					
Yeison Galeano					
Hernán Acosta					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Suministro e Instalacion de módulo sonoro = 8 un			72
CR 36 x CL 10			Construcción de empalme eléctrico = 16 un			94
			Instalación de cable 4x18 nuevo = 8m			215
			Suministro e Instalación de módulo sonoro = 8 un			72
CR 35 x CL 10			Instalación de cable 4x18 = 8m			215
			Construcción de empalme = 16 un			94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Díaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA: 28-02-2026 DIA: sábado VEHÍCULOS:	TIEMPO	SECO LLUVIOSO DURACIÓN		UNIFORMES	CUMPLE SI NO	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE SI NO	ESCOMBROS	CUMPLE SI NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Franklin Barbosa					
Juan José Roa					
Yeison Galeano					
Hernán Acosta					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Suministro e Instalacion de módulo sonoro = 8 un			72
CR 41 x CL 10			Construcción de empalme eléctrico = 16 un			94
			Instalación de cable 4x18 nuevo = 8m			215
			Suministro e Instalación de módulo sonoro = 8 un			72
CR 40 x CL 10			Instalación de cable 4x18 = 8m			215
			Construcción de empalme = 16 un			94

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-02-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sábado		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Suministro de poste de enterramiento directo = 15 un			141
Ríos						
			Suministro de gabinete para Controlador local = 15 un			147
			Suministro de marco de 60x60 cm incluya tapa de seguridad = 20 un			11
			Suministro de tornillos de 5/8" para cajas de hasta 60x60cm = 40 un			15
			Suministro de switch capa3 de fibra óptica = 10 un			130

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

1/4

CONSORCIO INTERFAROL MED 2025 – RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Andrade	11.222.857	Luis Danover Lozano	91.452.201		
Hernán Acosta	1.001.025.750	Carlos Mario González	1.049.894.058		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
	NE		**Demolición de andén:**(((3,42 m*3,38 m) +(4,56 m*3,38 m))-(((0,6 m*0,6 m)*2 cajas)+(0,4 m* 0,4 m)válvula+(0,9 m*0,9 m)anclaje+ (0,5m*0,5m)hidrante))			1
			Construcción de andén: (((3,42 m*3,38 m) +(4,56 m*3,38 m))-(((0,6 m*0,6 m)*2 cajas)+(0,4 m* 0,4 m)válvula+(0,9 m*0,9 m) anclaje+ (0,5 m*0,5 m) hidrante+ (1,4m*1,2m) rampa+(1,95m*0,20m)+(3,65m*0,2m)guía+(1,8m*1,2m)rampa))			36
			Construcción de rampa: (1,4m*1,2m)+ ((1,8m*1,2m)+(0,38m*1m))			37
			Suministro e instalación de bordillo: 11,0 m+4,9 m+0,7 m			3
			Suministro e instalación de concreto :(11,0m+4,9m+0,7 m)*0,1*0,07			18
			Suministro e instalación de adoquin de 0,1m: 5,05 m + 1,40 m			
CR 43 x CL 31			**Suministro e instalación de guia táctil de 0,2 m:** 1,95 m + 3,65 m			
			Construcción de Caja de 60 X 60 cm: 1 un			35
			Instalación de herraje de 60x60 cm : 1 un			13
			Suministro e instalación de anclaje para ménsula: 1 un			97
			Construcción de andén:(((π* 0,55m)2)/2)			36

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

2/4

Alcaldía de Medellín / UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN / CONSORCIO INT FAROL MED 2025 - RAY	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	4/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Andrade	11.222.857	Luis Danover Lozano	91.452.201		
Hernán Acosta	1.001.025.750	Carlos Mario González	1.049.894.058		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
	NW (Carrera 43)		**Demolición de andén:**((9,15 m*1,55 m)-((0,6 m*0,6 m) caja)+(0,5 m* 0,35 m)contador+(0,5 m*0,5 m)caja))			1
			Construcción de andén:((9,15 m*1,30 m)-((0,6 m*0,6 m) caja)+(0,5 m* 0,35 m)contador+(0,5 m*0,5 m)caja+(1,2 m*1,35 m)rampa+(0,2m*36*0,2m))loseta			36
			Suministro e instalación de bordillo: 0,88m+2,05 m+1,08m+2,9m+1,2m			3
			Construcción de rampa: (1,35m*1,2m)			37
			Suministro e instalación de adoquin de 0,1m: 0,88m+2,05 m+1,08m+2,9m			
CR 43 x CL 31			**Suministro e instalación de guia táctil de 0,2 m**: 1,95 m + 3,65 m			
			Construcción de Caja de 60 X 60 cm: 1 un			35
			Instalación de herraje de 60x60 cm : 1 un			13
			Suministro e instalación de concreto :(0,88m+2,05 m+1,08m+2,9m+1,2m)*0,1*0,07			18
			Instalación de poste de enterramiento : 1 un			206

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

3/4

CONSORCIO INTERVENTORIA FAROL MED 2025	**PLAN DE CALIDAD**	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN**

FECHA:	4/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Andrade	11.222.857	Luis Danover Lozano	91.452.201		
Hernán Acosta	1.001.025.750	Carlos Mario González	1.049.894.058		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Demolición de andén:(((3,07 m*3,75 m)/2)-((0,6 m*0,6 m) caja)+(0,6 m* 0,8 m)caja+(0,5 m*0,5 m)caja)))			1
			Construcción de andén:(((3,07 m*3,75 m)/2)-((0,6 m*0,6 m) caja)+(0,6 m* 0,8 m)caja+(0,5 m*0,5 m)caja+(13*0,2m*0,2m)))			36
			Suministro e instalación de bordillo: 22,10 m			3
	NW		**Construcción de rampa:** (2,80 m*1,2m)			37
	(Calle 31)		**Suministro e instalación de adoquin de 0,1m:** (22,10 m - 1,20 m)			
CR 43 x CL 31			**Suministro e instalación de guia táctil de 0,2 m:** 2,6 m + (16,84 m- (1,2 m rampa-0,35m contador))			
			Construcción de Caja de 60 X 60 cm: 2 un			35
			Instalación de herraje de 60x60 cm : 2 un			13
			Demolición de andén: ((16,84 m * 3,82 m)-(0,5 m *0,5 m)caja+(0,5 m *0,35 m)contador+(0,6 m*0,6 m) caja+(1,2m*0,8m)caja+(1,6m*0,7m)+(1,6m*1,35m)palma			1
			Construcción de andén:(((16,84 m * 3,82 m)-((0,5 m *0,5 m)caja+(0,5 m *0,35 m)contador+(0,6 m*0,6 m)) caja+(1,2m*0,8m)caja+(1,6m*0,7m)+(1,6m*1,35m)palma+(1,2m* 2,8m)rampa+(16,84m*0,2m)guía)))			36
			Instalación de poste de enterramiento : 1 un			206
			Demolición de rampas existentes: (1,20 m * 0,8 m)+(3,80 m * 0,4 m)			1

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	**REVISÓ/ACTUALIZÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

CONSORCIO INT FAROL MED 2025	PLAN DE CALIDAD	SIT-SGC-F-001
	REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoría No. 4600105599 de 2025	VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	4/02/2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	MIÉRCOLES		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
José Andrade	11.222.857	Luis Danover Lozano	91.452.201		
Hernán Acosta	1.001.025.750	Carlos Mario González	1.049.894.058		

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
	SW		Construcción de Canalización en zona verde: 1,60 m			25
CR 43 x CL 31						
			Instalación de poste de enterramiento : 1 un			206

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

Alcaldía de Medellín · UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN · CONSORCIO INTEROL MED 2025 · RyV	**PLAN DE CALIDAD** **REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DIARIO** Contrato de obra No. 4600105555 de 2025 - Contrato de interventoria No. 4600105599 de 2025	SIT-SGC-F-001 VERSIÓN 1 ED: SEP 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN

FECHA:	28-2-2026	TIEMPO	SECO		UNIFORMES	CUMPLE	SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	ESCOMBROS	CUMPLE
DIA:	Sábado		LLUVIOSO			SI		SI		SI
VEHÍCULOS:			DURACIÓN			NO		NO		NO

PERSONAL EN OBRA

CONTRATISTA				INTERVENTORÍA	
NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA	NOMBRE	CÉDULA
Brayan Palacio					
Cristian Mena					
Carlos Zuñiga					

DIRECCIÓN	COSTADO	SENTIDO	TRABAJOS REALIZADOS	HORA INICIO	HORA FINAL	ITEM
			Construcción de canalización en pavimento 7,5m + 7,8m + 9,5m = 24,80m			19
CR 43K CL 33						
Cruce Nuevo			Suministro e Instalación provisional de pavimento en frio 7,5m + 7,8m + 9,5m = 24,80m			

EQUIPO EN OBRA:

OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

VERIFICACIÓN

RESPONSABLE CONTRATISTA		RESPONSABLE INTERVENTORÍA
ELABORÓ	REVISÓ/ACTUALIZÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Durango	NOMBRE: Carlos Alberto Diaz	NOMBRE: Queny Patricia Barreneche
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CARGO: Auxiliar de Residencia	CARGO: Residente de Obra	CARGO: Residente de Interventoría

ANEXO 13.

PERSONAL LIQUIDADO

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.049.894.058 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

CARLOS MARIO GONZÁLEZ MORA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.049.894.058

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, EDWIN DAVID SANTOS HERNANDEZ identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.038.810.427 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

Edwin santos

EDWIN DAVID SANTOS HERNANDEZ
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.038.810.427

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA identificado (a) con cedula de ciudadania No 77.182.422 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

GEINER ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 77.182.422

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, HERNAN DARIO ACOSTA SIMANCA identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.001.025.750 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

HERNAN DARIO ACOSTA SIMANCA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.001.025.750

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, MARTIN JOSÉ GONZÁLEZ BURGOS identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.123.409.521 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

MARTIN JOSE GONZALES BURGOS
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.123.409.521

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, MOISES DAVID REYES AMAYA identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.002.500.113 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

MOISES DAVID REYES AMAYA
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.002.500.113

PAZ Y SALVO LABORAL

Yo, SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON identificado (a) con cedula de ciudadania No 1.065.913.019 declaro que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLIN , con NIT No 901.979.396-1 cumplió con todos los pagos de salarios legales, extralegales, prestaciones sociales, compensaciones e indemnizaciones causadas en el desarrollo del Contrato No 4600105555 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.

Por consiguiente declaro a la Empresa a **Paz y Salvo** por todo concepto.

Lo anterior se expide en Medellin el 31 de Diciembre de 2025.

Atentamente



HUELLA INDICE DERECHO

Fernando Vivas

SIMEON FERNANDO VIVAS MANDON
CARGO: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
C.C. 1.065.913.019

ANEXO 14. CERTIFICADO DE EMPRESA DE MUJERES

ASESORÍA TRIBUTARIA
& REVISORÍA FISCAL

Sergio Andrés Díaz Montañez
Contador Público Especialista en Tributaria
& Revisoría Fiscal.
310 205 1725
sergio.andresdiaz@hotmail.com
Trans. 49 # 10A - 01 Edificio Terzetto - oficina 406

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

REVISADO EL LIBRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD SERVICIVIL SAS IDENTIFICADO CON NIT 800147909-3 DESDE EL DÍA 15 JUNIO DEL AÑO 2021 HASTA LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, SE ENCONTRÓ LA SIGUIENTE COMPOSICION ACCIONARIA, ADEMAS SE CERTIFICA QUE LOS ACCIONISTAS SON COLOMBIANOS.

CAPITAL AUTORIZADO	**$ 580.000.000.**
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$ 580.000**
CAPITAL SUSCRITO	**$ 580.000.000**
Y PAGADO	
No DE ACCIONES	**1000**
VALOR NOMINAL	**$580.000**

ACCIONISTA	**JORGE TRUJILLO NIÑO**
C.C.	**13893413**
No DE ACCIONES	**490**
PARTICIPACIÓN	**49%**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 284.200.000**

ACCIONISTA	**NELSY VANEGAS CALDERON**
C.C.	**63459480**
PARTICIPACIÓN	**51%**
No DE ACCIONES	**510**
VALOR TOTAL ACCIONES	**$ 295.800.000**

DADO EN BARRANCABERMEJA, A LOS 09 DIAS DE FEBRERO DE 2026

SERGIO ANDRES DIAZ MONTAÑEZ
T.P 187097-T
CONTADOR PÚBLICO

ANEXO 15.

CAMARA DE COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SERVICIVIL S.A.S
Nit : 800147909-3
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 21568
Fecha de matrícula: 22 de noviembre de 1991
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 30 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : servicivil_ltda@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6102194
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3125486349

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL 62 NO. 43-151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : servicivil_ltda@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 2370 del 28 de octubre de 1991 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de noviembre de 1991, con el No. 912486 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SERVICIVIL LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se inscribió Transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018, con el No. 25347 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de SERVICIVIL LIMITADA por SERVICIVIL S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Por Acta No. 019 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita el 06 de noviembre de 2024 se reformo así: Articulo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de actividades tendientes a la realización de obras arquitectónicas, de urbanismo e ingeniería, bien sea civiles, eléctricas, electrónicas, mecánicas, ambientales, petroleras, energéticas, hidráulicas, de servicios públicos, saneamiento básico, mineras, de telecomunicaciones, agrícolas, rurales, de sistemas de información, vías y transportes, en todo lo relacionado con asesorías, ejecución, planeación, preparación, diseño, montaje y construcción de todo tipo de obras, estructuras, instalación de plantas de toda clase, mantenimiento y operación de las mismas, excavación de pozos profundos, suministros de materiales de construcción y de cantera, industria minera, economía minera, comercialización, exploración, explotación, trituración, beneficio y distribución de minerales comunes, exploración minera, geología minera, exploración y evaluación de reservas mineras,, minería a cielo abierto, minería subterránea, procesamiento de minerales, manejo y transporte de minerales, metalurgia metales ferrosos y no ferrosos, exploración y explotación de minerales usuales (comodietis), cobre, zinc, plomo, níquel, mineral de hierro, bauxita, alúmina, aluminio, oro, plata, platino, fosfatos, magnesio, cromo, lignito, antracita, metales raros. La prestación de toda clase de servicios de consultoría, interventorías técnicas y administrativas en las diferentes áreas anteriormente mencionadas, el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social según la legislación vigente, la promoción, compra, venta, arriendo y administración de inmuebles tanto urbanos como rurales, urbanización de terrenos y la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercializa con, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación, transformación de todo tipo de maquinaria pesada y equipos destinados a la construcción, a la explotación agrícola, a la explotación minera, a la explotación acuífera, en el área de servicios públicos, petrolífera y sus derivados, industria petroquímica, de biocombustibles, el desarrollo de actividades tendientes a la adquisición, venta, comercialización, distribución, suministro, alquiler, arrendamientos, reparación transformación de vehiculos de carga, vehiculos de transporte de pasajeros, bien sea terrestres o fluviales, fabricación y comercialización de equipos y o dispositivos de control de transito con y sin registro gráficos de infracciones, (semáforos, equipos de control, botoneras peatonales, dispositivos sonoros, cámaras de seguridad, cámara de foto – detección, materiales eléctricos y electrónicos), suministros, instalación y programación de software para controladores de semáforos ,equipos de foto detección y en general para entidades de tránsito y transporte , en el desarrollo de todo lo anterior que comprende el objeto social de la empresa, se podrán constituir en territorio nacional o extranjero, sucursales o agencias, podrá promover y fundar establecimientos, almacenes de depósitos, fabricas; podrá además adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, arrendarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones, adquirir toda clase de derecho mineros, permisos o licencias, ejecutar o conformar asociaciones, aportes y/o concesiones, uniones temporales, para explorar y explotar minas o yacimientos, , explotar o registrar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal u objeto contractual que pueda desarrollarse, dentro de los parámetros del objeto social, girar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, negociar, toda clase de títulos valores, bursátiles, de inversión, celebrar contratos de mutuo, seguro y transporte, agencia comercial, cuentas en participación y demas contratos comerciales, concurrir a licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas, celebrar cualquier tipo de contratos con entidades bancarias o financieras y concurrir a la formación de aportes a entidades de crédito como bancos, corporaciones financieras, dedicadas a la financiación de actividades comprendida dentro de los objetivos sociales, efectuar cualquier tipo de tramites tendiente a importar o exportar mercancías de productos en cumplimiento del objeto social. Parágrafos: en desarrollo o cumplimiento de tal objeto, la sociedad podrá: hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros, todas las actividades o en participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los

fines sociales. participación con ellos toda clase de operaciones comerciales, civiles e industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles y constituir cualquier clase de gravamen sobre' estos, celebrar contratos civiles o administrativos, con personas naturales o jurídicas, sean estas en derechos privado o público y abrir cuentas corrientes y de ahorros en bancos y corporaciones que sean convenientes para el logro de los fines sociales.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 580.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 580.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representante legal: Articulo 27. Se hace transformacion según acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La representacion legal de la sociedad por acciones simplificada estara a cargo de una persona natural o juridica, accionista o no, quien tendra un suplente para sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Articulo 28. Se hace transformacion segun acta no. 12 Del 6 de octubre de 2018, inscrita el 17 de octubre de 2018, antes mencionada: La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal (o su suplente en las faltas temporales o absolutas), quien no tendra restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantia de los actos que celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al represnetante legal y a los demas administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica prestamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2018 con el No. 25347 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO	C.C. No. 13.893.413
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSY VANEGAS CALDERON	C.C. No. 63.459.480

REVISORIA FISCAL TEXTUAL

** Revisor fiscal: ** Que por acta no. 0000003 De asamblea de accionistas del 2 de diciembre de 2016 , inscrita el 5 de diciembre de 2016 bajo el numero 00022750 del libro ix , fue(ron) nombrado(s): Nombre identificacion revisor fiscal murillo villarreal pablo emilio c.C.13891253 Tarjeta profesional: 14953 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1122 del 10 de mayo de 1993 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3365 del 06 de abril de 1994 del libro IX
*) E.P. No. 2009 del 25 de julio de 1995 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	3968 del 01 de agosto de 1995 del libro IX
*) E.P. No. 2076 del 12 de julio de 1996 de la Notaria 1a. De Barrancabermeja	4587 del 02 de septiembre de 1996 del libro IX
*) E.P. No. 2499 del 21 de noviembre de 2007 de la Notaria Primera Barrancabermeja	11284 del 30 de noviembre de 2007 del libro IX
*) E.P. No. 1827 del 26 de julio de 2011 de la Notaria Primera Barrancabermeja	14715 del 28 de julio de 2011 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16185 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16188 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 1073 del 25 de junio de 2012 de la Notaria Primera Barrancabermeja	16189 del 04 de julio de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 746 del 21 de abril de 2014 de la Notaria Primera Barrancabermeja	18588 del 05 de mayo de 2014 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21205 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) E.P. No. 1828 del 09 de octubre de 2015 de la Notaria Primera Barrancabermeja	21206 del 20 de octubre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 12 del 06 de octubre de 2018 de la Junta De Socios	25347 del 17 de octubre de 2018 del libro IX
*) Acta No. 18 del 15 de julio de 2024 de la Asamblea General De Accionistas	35939 del 23 de julio de 2024 del libro IX
*) Acta No. 19 del 05 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	36444 del 06 de noviembre de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4390
Actividad secundaria Código CIIU: E3900
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SERVICIVIL BCA
Matrícula No.: 62658
Fecha de Matrícula: 27 de noviembre de 2006
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : 62 NO 43 151
Barrio : LAS GRANJAS
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3.214.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4390.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio

Fecha expedición: 25/09/2025 - 15:21:03
Recibo No. S000690987, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 1hJ33VHjmQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ANEXO 16.

CEDULAS

PERSONAL 100% COLOMBIANO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.151.966.785**

BARBOSA YEPES

APELLIDOS

CHRISTIAN

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1998**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA


A+ G.S. RH

M SEXO

17-JUN-2016 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-3100150-00838444-M-1151966785-20160702 **0050**30467A 1 45220169

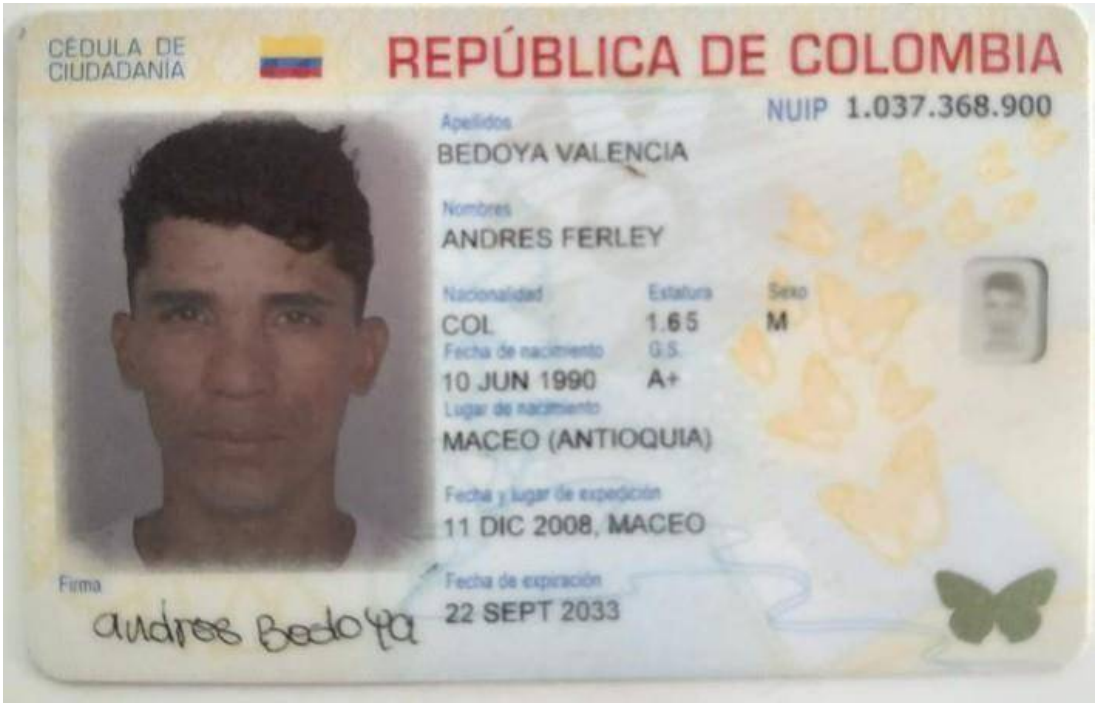

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.037.368.900

Apellidos
BEDOYA VALENCIA

Nombres
ANDRES FERLEY

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
M

Fecha de nacimiento
10 JUN 1990

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MACEO (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
11 DIC 2008, MACEO

Firma
andres Bedoya

Fecha de expiración
22 SEPT 2033



.CO

032536593

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL032536593601175<<<<<<<<<<<
9006108M3309221COL1037368900<3
BEDOYA<VALENCIA<<ANDRES<FERLEY

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.049.894.058

GONZALEZ MORA

APELLIDOS

CARLOS MARIO

NOMBRES

Carlos Mario -

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-2001**

HATILLO DE LOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2019 HATILLO DE LOBA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0300150-01300080-M-1049894058-20220602 **00795**38656A 1 8504797463

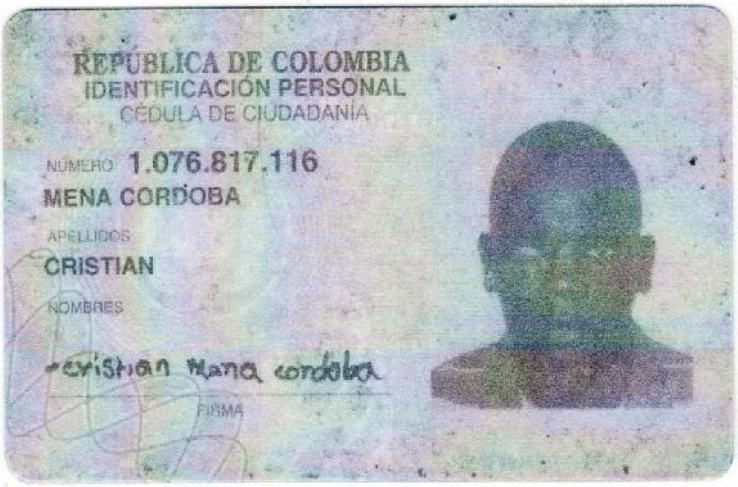

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.076.817.116
MENA CORDOBA
APELLIDOS
CRISTIAN
NOMBRES
cristian Mena cordoba
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1991
CONDOTO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-AGO-2009 CONDOTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO

A-1701300-00844744-M-1076817116-20160824 0050726215A 1 45839510

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0110600-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34994022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.810.427**

SANTOS HERNANDEZ

APELLIDOS

EDWIN DAVID

NOMBRES

edwin david santos hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1992**

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

09-AGO-2010 CHIGORODO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0110500-00266236-M-1038810427-20101118 0024863480A 1 34894022



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.218.904
PALACIO ACEVEDO
APELLIDOS
JAIME ESTIVEN
NOMBRES

Stiven
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1992
MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 ESTATURA
AB+ G.S. RH
M SEXO
15-DIC-2010 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-3100150-00570561-M-1096218904-20140508 0038389502A 1 2862858412

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.052.982.270**

ALTAMIRANDA DIAZ

APELLIDOS

JENIFER DEL CARMEN

NOMBRES

Jenifer Altamiranda Diaz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-OCT-1992**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-OCT-2010 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0502800-00279702-F-1052982270-20110201 **0025674797A 1** 35708396

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.123.409.521**

GONZALEZ BURGOS

APELLIDOS

MARTIN JOSE

NOMBRES

Martin Gonzalez

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-DIC-2001**

DIBULLA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-DIC-2019 TOLUVIEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 **0069**589379A 1 53711091



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.123.409.521
GONZALEZ BURGOS
APELLIDOS
MARTIN JOSE
NOMBRES

Martin gonzalez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-2001
DIBULLA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
24-DIC-2019 TOLUVIEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2832000-01124651-M-1123409521-20200109 0069589379A 1 53711091

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775



Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA


Fecha de expiración
22 JUL 2034

Firma

.CO

0509139 23

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

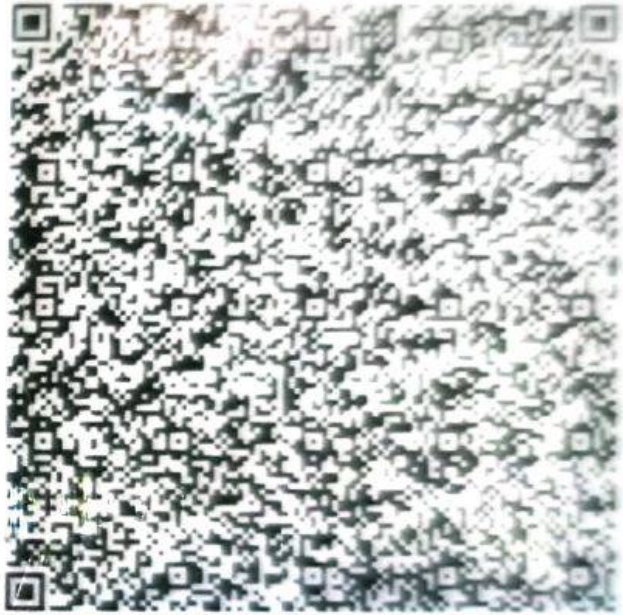

ICCOL0509139236012 17<<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 98.681.775

Apellidos
CHAVARRIA BUILES

Nombres
WILLIAN ALBEIRO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.83

Sexo
M

Fecha de nacimiento
03 SEPT 1977

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
SABANALARGA (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
15 JUN 1996, SABANALARGA

Firma

Fecha de expiración
22 JUL 2034


CO

0509139231

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0509139236012l7<<<<<<<<<<
7709036M3407220COL98681775<<<8
CHAVARRIA<BUILES<<WILLIAN<ALBE

CÉDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 4.852.397



Apellidos
RIASCO REYES

Nombres
AGUEDO ALCIDES

Nacionalidad
COL

Estatura
1.75

Sexo
M

Fecha de nacimiento
05 FEB 1964

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BAJO BAUDO (PIZARRO) (CHOCO)

Fecha y lugar de expedición
19 NOV 1983, BAHIA SOLANO

Fecha de expiración
18 MAR 2033

Firma
Alcides Riascos

.CO

020198477

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020198477417008<<<<<<<<<<<
6402053M3303182COL4852397<<<<0
RIASCO<REYES<<AGUEDO<ALCIDES<<

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.002.500.113**

REYES AMAYA

APELLIDOS

MOISES DAVID

NOMBRES

Moises Reyes A

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-AGO-1999**

MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

05-ENE-2018 MAGANGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0502800-00972751-M-1002500113-20180125 0059290273A 1 49259471

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.152.187.124

GOMEZ MEJIA

APELLIDOS

ANYELO DANIEL

NOMBRES



Anyelo Daniel Gómez M.

FIRMA

Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1990**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81 ESTATURA **A-** G.S. RH **M** SEXO

23-MAY-2008 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO GARCIA TORRES

INDICE DERECHO

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.096.247.535**

PALACIO ACEVEDO

APELLIDOS

BRAYAN ESMID

NOMBRES

Brayan Palacio

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1998**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

05-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-2701900-01294488-M-1096247535-20220505 **00790**78024A 1 9918929745


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.096.247.524
ZUÑIGA BENAVIDES
APELLIDOS
CARLOS ANDRES
NOMBRES
Carlos Zuñiga
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 30-ABR-1998
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
04-MAY-2016 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2701900-00841290-M-1096247524-20160728
0050528695A 1
45109384



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.017.144.470
DIAZ PEÑA
APELLIDOS
CARLOS ALBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1987
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
10-FEB-2005 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ
INDICE DERECHO
R-0130100-14138685-M-1017144470-20060103
0019906003H 01 197206634

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.537.976**

ROA SILVA

APELLIDOS

JUAN JOSE

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-2000**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-MAY-2018 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0100150-01015231-M-1000537976-20180618 **00615**69756A 1 50040024

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **91.446.091**


NIEVES VALENCIA

APELLIDOS

FRANCISCO JAVIER

NOMBRES

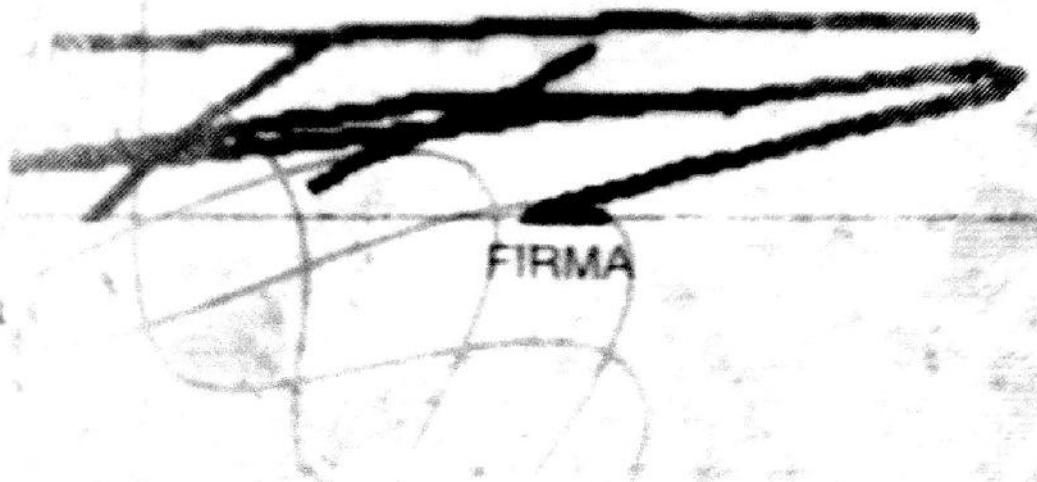

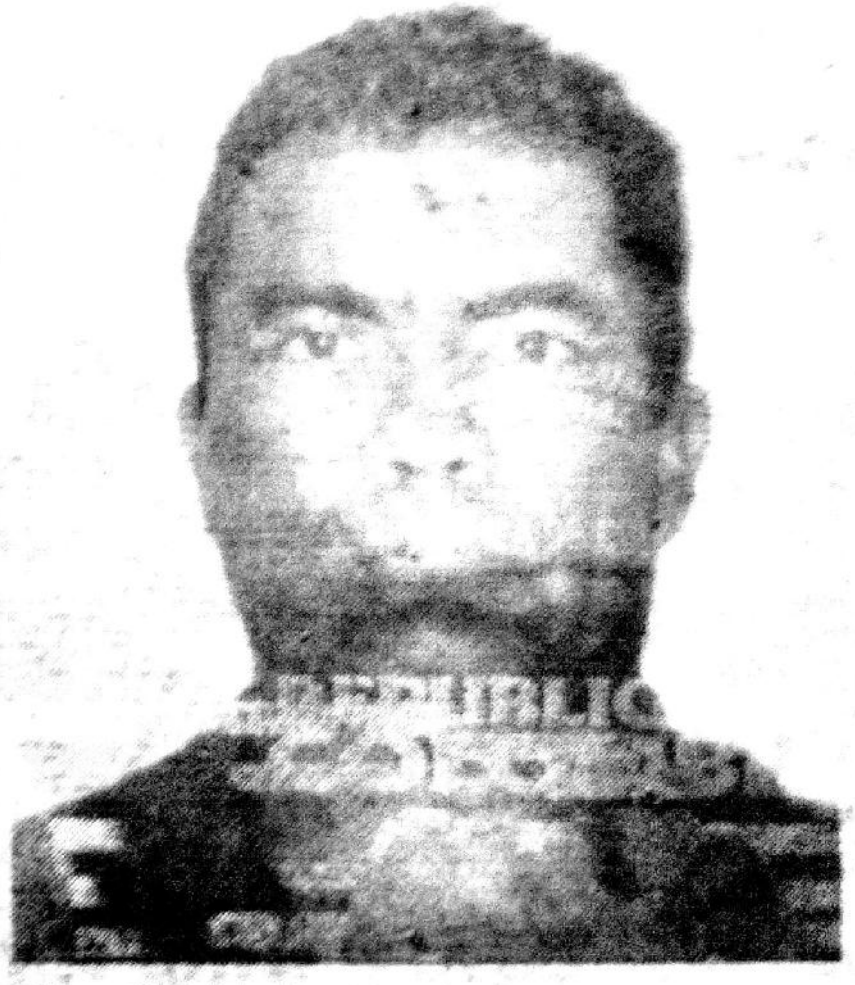

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 **00444**57306A 1 7013424191

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1975**


BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-00713668-M-0091446091-20150610 0044457306A 1 7013424191

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.605.230**

MORENO VALENCIA

APELLIDOS

JAIR ALONSO

NOMBRES

Jair Moreno

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **11-JUN-1990**

MACEO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-JUL-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0104900-00488737-M-1037605230-20131007 0035334768A 1 2172573142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.571.457**

BELEÑO GALVIS
APELLIDOS

JHON DEIVIS
NOMBRES

Jhon Deivis B.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-2002**
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

29-ENE-2020 AGUACHICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1207500-01131954-M-1007571457-20200213 **0070**082283A 1 52959355

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 11.222.857



Apellidos
ANDRADE GARCIA

Nombres
JOSE ALCIBIADES

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.65	M

Fecha de nacimiento
24 JUN 1977

G.S.
B+

Lugar de nacimiento
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
19 MAR 1997, GIRARDOT

Fecha de expiración
17 MAR 2033

Firma



.CO

020217615



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL020217615015109<<<<<<<<<<
7706242M3303171COL11222857<<<8
ANDRADE<GARCIA<<JOSE<ALCIBIADE


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO 32220126
GIRALDO BOTERO
APELLIDOS
LINA MARIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 12-OCT-1982
SANTUARIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-ENE-2001 SANTUARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
P-0125600-14092643-F-0032220126-20010814
00905 01194P 01 100861994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 42.683.289

DURANGO ARENAS
APELLIDOS

MARIA VICTORIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-FEB-1967
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

14-DIC-1987 COPACABANA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0110300-00903448-F-0042683289-20170509 0055312616A 2 9999877919

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.913.019**

VIVAS MANDON

APELLIDOS

SIMEON FERNANDO

NOMBRES

Simeon F. VIVAS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1998**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-FEB-2016 AGUACHICA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1207500-00801034-M-1065913019-20160314 0048941810A 1 45800978



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-DIC-1996**

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O-** G.S. RH | **M** SEXO

29-ENE-2016 HISPANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0115000-00812631-M-1039597832-20160411 0049254415G 1 45539531

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.039.597.832**

GALEANO PARRA
APELLIDOS

YEISON ALEJANDRO
NOMBRES

Yeison Alejandro Galeano P
FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-2000**

APARTADO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-ABR-2018 APARTADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0103500-01001737-M-1001025750-20180430 **0060**97701A 1 50027940

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.001.025.750**

ACOSTA SIMANCA

APELLIDOS

HERNAN DARIO

NOMBRES

H. Acosta

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.791.906**

BARBOSA PALOMINO

APELLIDOS

FRANKLIN

NOMBRES

Franklyn Barbosa P.

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1971**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO


31-OCT-1989 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00032442-M-0016791906-20080728 **0001**536733A 1 2020021788

Powered by CamScanner

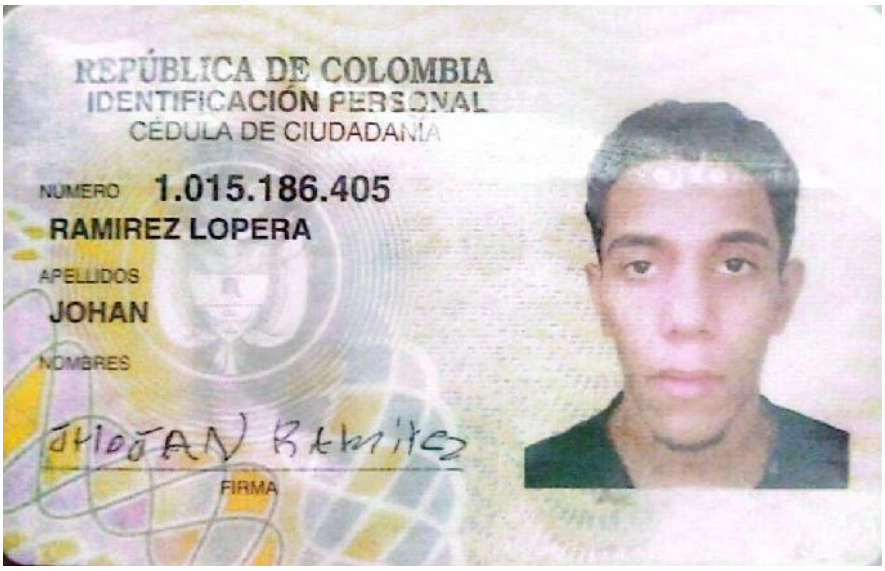

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.015.186.405
RAMIREZ LOPERA
APELLIDOS
JOHAN
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-2002
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
03-AGO-2020 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO
A-0100150-61318059-M-1015186405-20220908 0084735526A 3 8505122346

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	F
Fecha de nacimiento	G.S.	
29 JUL 1994	O+	

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma
Laura MPG

Fecha de expiración
18 ENE 2034

.CO

037809496

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91452201**

LOZANO ROJAS
APELLIDOS

LUIS DANOVER
NOMBRES

Luis Danover Lozano
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1977**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

19-JUN-1996 ARATOCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30104581-M-0091452201-20030127 **02482** 03024A 01 129453752

ANEXO 17.

CERTIFICADO PERSONAL 100% COLOMBIANO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

105 - 2026

El suscrito JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificada con NIT 901.979.396-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que durante el **período comprendido entre el 01 de Febrero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026**, para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105555 de 2025, cuyo objeto es realizar el mantenimiento y las obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín, **se destinó el cien por ciento (100 %) de empleados y/o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad colombiana para la ejecución del objeto contractual.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional y Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, correspondientes al Proceso de Contratación No. 0070007743.

En constancia, se firma en Medellín, Antioquia, a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 18.

ACTA MES DE FEBRERO

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
	OBRA CIVIL							
1	Demolición de andén hasta 20cm, incluye corte con disco de concreto, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales	m2	1,0	$ 48.280,35	126,80	$ 6.121.825	196,72	$ 9.497.666
2	Demolición base controlador local. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 159.885,12	1,00	$ 159.885	14,00	$ 2.238.391
3	Suministro e instalación de bordillo en concreto de 0.45m (espesor 0.15)	m	1,0	$ 148.052,75	46,81	$ 6.930.349	67,71	$ 10.024.651
4	Retiro o demolición bordillo (cordón), incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	m	1,0	$ 14.768,06	0,00	$ -	20,90	$ 308.653
5	Demolición de cajas de empalme hasta de 0.80 x 0.80 m libres. Incluye cargue, transporte y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 147.880,78	0,00	$ -	0,00	$ -
6	Demolición de resaltos viales en mezcla asfáltica hasta nivel de via. Incluye cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 260.770,23	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Demolición de carpeta asfáltica hasta nivel de base granular, Incluye llenos temporales en base granular, cargue y botada de material sobrante.	m3	1,0	$ 656.913,29	0,00	$ -	0,00	$ -
8	Retiro de tapas en concreto reforzado de cajas hasta 0,80 x 0,80 m. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 14.384,39	0,00	$ -	0,00	$ -
9	Suministro de marco de 50x50 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 50x50 cm medida exterior y anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 534.013,01	0,00	$ -	480,00	$ 256.326.243
10	Suministro e instalación de marco y tapa para cajas en concreto de 0,60 x0,80 m interna. Incluye concreto de 21 MPA, para el empotramiento del elemento.	Un	1,0	$ 626.289,74	0,00	$ -	0,00	$ -
11	Suministro de marco de 60x60 cm, en ángulo de 2"x2"x1/4" y acabado en pintura anticorrosiva. Incluye tapa de seguridad en lámina de alfajor calibre 1/8" de 60x60 cm medida exterior anclajes en varillas de 1/4" para fijación del marco	Un	1,0	$ 723.503,61	20,00	$ 14.470.072	50,00	$ 36.175.180
12	Instalación de tapa metálica de hasta de 60x60 cm. Incluye demolición de concreto, limpieza de caja, recolección de escombros	Un	1,0	$ 56.494,94	0,00	$ -	1,00	$ 56.495
13	Instalación de marco y tapa metálicos para cajas de hasta 60x60 cm interna. Incluye concreto de 21 MPa para empotramiento de elemento	Un	1,0	$ 153.601,16	129,00	$ 19.814.549	517,00	$ 79.411.797
14	Reparación de marco de tapa de caja de registro con ángulo o platina de 2" calibre 1/8", hasta 60 cm	Un	1,0	$ 103.385,12	0,00	$ -	0,00	$ -
15	Suministro de Tornillos de 5/8 " para cajas de hasta 60 x 60 cm, según especificaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín	Un	1,0	$ 29.166,91	40,00	$ 1.166.676	1.060,00	$ 30.916.922

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
16	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 50x50 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 625.739,16	0,00	$ -	50,00	$ 31.286.958
17	Suministro de tapa y marco de seguridad en hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12, de 60x60 cm medida exterior, incluye tornillones de seguridad en acero galvanizado según especificaciones SMM.	Un	1,0	$ 776.380,06	0,00	$ -	0,00	$ -
18	Suministro e instalación de Concreto de 21 Mpa hecho en obra.	m3	1,0	$ 743.426,30	0,70	$ 521.268	2,89	$ 2.146.175
19	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 70 cm. Incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos electricos DB de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente.	m	1,0	$ 256.891,62	25,90	$ 6.653.493	29,60	$ 7.603.992
20	Construcción de canalización en Pavimento de 0.50m, con profundidad de 30 cm, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de pavimento de espesor variable hasta 0,15m, excavación, botada de escombros al botadero oficial, instalación de 2 tubos eléctricos IMC de 3", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento mecánicamente	m	1,0	$ 308.636,56	0,00	$ -	0,00	$ -
21	Suministro e instalación provisional de pavimento flexible en frío de 50 cm de ancho y e=2.5 cm, según requerimientos de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.	m	1	$ 125.098,27	24,80	$ 3.102.437	24,80	$ 3.102.437
22	Construcción Canalización en Zona Dura de 0.40m, incluye corte con cortadora de concreto, demolición de concreto de espesor variable hasta 0.15m, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura del pavimento rigido y la cimentación de la tuberia, concreto de 21 Mpa de espesor 0.1 m.	m	1	$ 292.726,88	10,30	$ 3.015.087	19,25	$ 5.634.992
23	Construcción Canalización en adoquín de 0.20m, incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de dos tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reintalación adoquines y reposición de adoquines deteriorados (10%), arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 156.992,77	14,84	$ 2.329.773	99,94	$ 15.689.858

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
24	Construcción de canalización en adoquín de 0,1 m incluye retiro de adoquines, excavación, botada de escombros, instalación de un tubo eléctrico PVC DB de 2", lleno compactado de los materiales que componen la estructura y de la cimentación, reinstalación de adoquines y reposición de adoquines deteriorados , arena de pega y sellado de adoquines con arena de revoque.	m	1,0	$ 47.378,61	0,70	$ 33.165	2,50	$ 118.447

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
25	Construcción Canalización en zona verde, incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de 2 tubos eléctricos DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente.	m	1,0	$ 113.987,72	15,10	$ 1.721.215	37,80	$ 4.308.736
26	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 3/4", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 20.398,12	0,00	$ -	5,10	$ 104.030
27	Construcción Canalización en zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 1 1/2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 27.759,39	2,70	$ 74.950	2,70	$ 74.950
28	Construcción Canalización en zona dura o zona verde de hasta 30 cm de profundidad. Incluye descapote, excavación, botada de escombros, instalación de un (1) tubo eléctrico DB de 2", lleno compactado y reinstalación de la vegetación existente (Si aplica). NO incluye demoliciones.	m	1,0	$ 31.737,72	0,80	$ 25.390	61,70	$ 1.958.217
29	Suministro e instalación de cubierta metálica para viga de puente en lámina galvanizada calibre 16 de hasta 0,25 m2 y pintura electrostática negra. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	Un	1,0	$ 321.236,99	0,00	$ -	0,00	$ -
30	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 2", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 107.746,39	0,00	$ -	0,00	$ -
31	Suministro e instalación de conduleta metálica de 2"	Un	1,0	$ 189.633,67	0,00	$ -	0,00	$ -
32	Construcción de canalización aérea tubería IMC de 3", incluye accesorios de fijación.	m	1,0	$ 161.859,10	0,00	$ -	0,00	$ -
33	Construcción Base para Controlador Local en concreto de 21 Mpa, acabado a la vista, medidas de hasta 0.6 X 0.41 X 1.50 m, acero de refuerzo principal, 4 de 3/8", 3 estribos de 3/8", 3 tubos eléctricos de 3" de 1.50 m, c/u, 3 curvas eléctricas de 3", excavación de 0.40 X 0.6 x 0.3 m. Incluye formaleta metálica y curado. Botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 827.665,46	25,00	$ 20.691.637	60,00	$ 49.659.928
34	Construcción de Cajas de 50 X 50 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.10 m y profundidad de 0.8 m, no incluye herraje (marco y tapa) metálico y/o sintético, antifraude, fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 322.250,00	2,00	$ 644.500	2,00	$ 644.500

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
35	Construcción de Cajas de 60 X 60 cm internas en concreto de 21 Mpa, paredes de 0.15 m y profundidad hasta 1 m, no incluye herraje metálico (marco y tapa) , fondo en triturado lavado de tamaño 3/4", espesor 0,10 m. Incluye excavación y botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 405.107,66	6,00	$ 2.430.646	22,00	$ 8.912.368
36	Construcción andenes en concreto de 21 Mpa, de espesor 8 cm, incluye acero de refuerzo #2 (2 Kg*m2), y base granular de espesor 15 cm, juntas de dilatación y acabado	m2	1,0	$ 119.036,85	85,57	$ 10.185.918	101,20	$ 12.046.012
37	Construcción rampa para personas con movilidad reducida, incluye concreto de 21 Mpa, loseta táctil alerta, llaves de confinamiento en concreto, sellado de adoquines con arena de revoque y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ver Figuras en en manual de espacio público	m2	1,0	$ 155.931,36	9,20	$ 1.434.568	18,96	$ 2.955.834
38	Excavación manual en material heterogéneo con cualquier tipo de humedad, H: entre 0,0 y 1,2m, incluye cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m3	1,0	$ 52.460,26	0,42	$ 21.823	1,31	$ 68.460
39	Construccion de llaves de confinamiento en concreto de 21 Mpa, de varias medidas. Incluye formaleta de cualquier material para concreto a la vista, y biseles triangulares de 1/2"	m	1,0	$ 85.447,98	0,00	$ -	0,00	$ -
40	Construccion de vigas en concreto de 21 Mpa, medida de 0,20 x 0,20 m, incluye acero de refuerzo: 4 varillas longitudinales de 1/2" y 7 estribos de 3/8" espaciados cada 0,15 m de 0,12 X 0,12 m. La excavación se pagará en su respectivo item.	m	1,0	$ 91.307,80	0,00	$ -	0,00	$ -
41	Construcción de malla detectora en pavimento asfáltico, incluye corte de pavimento con disco, cable de 2x18 con su respectivo empalme eléctrico, y resane con epóxico para carpeta asfáltica	m	1,0	$ 73.690,03	0,00	$ -	0,00	$ -
42	Suministro e instalación de acometida eléctrica, para controlador local, incluye demolición, excavación, hasta 6 m de tubería IMC de 3/4", zuncho metálico de 5/8", y hasta 25 mts de cable encauchetado 2x12, empalmes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,0	$ 387.565,75	0,00	$ -	5,00	$ 1.937.830
43	Construccion de puesta a tierra RA4-020 tipo EPM - incluye varilla coperweld 5/8", alambre No. 10 de cobre, soldadura exotérmica, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y cumpliendo con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 371.480,49	0,00	$ -	8,00	$ 2.971.844
44	Construcción de descarga a tierra de pantalla de cable telefónico.	Un	1,0	$ 32.606,94	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
45	Construcción contrapeso de puesta a tierra para cumplimiento con la norma y especificación de E. P. M. Incluye medición e informe.	Un	1,0	$ 443.993,50	0,00	$ -	0,00	$ -
46	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 2", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas tambien en acero).	m	1,0	$ 76.588,87	0,00	$ -	0,00	$ -
47	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 1/2", incluye elementos de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 72.986,99	0,00	$ -	0,00	$ -
48	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 1 ", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebilla en acero).	m	1,0	$ 54.609,83	0,00	$ -	0,00	$ -
49	Suministro, transporte e instalación de bajantes metálicos de 3/4"", incluye accesorios de fijación.(Cinta bandit de 5/8" y hebillas en acero).	m	1,0	$ 47.766,62	0,00	$ -	4,50	$ 214.950
50	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 1 1/2"	m	1,0	$ 10.610,55	0,00	$ -	0,00	$ -
51	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 2"	m	1,0	$ 12.132,23	0,00	$ -	0,00	$ -
52	Suministro e instalación de tubo eléctrico DB de 3"	m	1,0	$ 23.641,62	0,00	$ -	22,20	$ 524.844
53	Retiro e instalación de Adoquines (liso, alerta o güía). Incluye subbase y arena	m2	1,0	$ 56.160,40	9,24	$ 518.922	9,24	$ 518.922
54	Limpieza de caja de inspección de hasta 60x80 cm hasta 1 m de profundidad. Debe incluir minimo el 50% del volumen de la caja.	Un	1,0	$ 20.032,51	110,00	$ 2.203.577	340,00	$ 6.811.055
55	Encamisado de tubería pvc en canalizacion existente hasta 50 cm.	Un	1,0	$ 19.376,45	4,00	$ 77.506	7,00	$ 135.635
56	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 4", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido	m	1,0	$ 106.271,68	0,00	$ -	0,00	$ -
57	Suministro, transporte e instalación de mezcla asfáltica densa en caliente MDC 19, espesor 6", ancho hasta 50 cm. Compactada por medio mecánico, Incluye riego de emulsión asfáltica de rompimiento rapido.	m	1,0	$ 136.627,17	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS							
58	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.931.291,18	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
59	Suministro, transporte e instalación de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 3.862.146,68	0,00	$ -	0,00	$ -
60	Suministro, transporte e instalación de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia. Incluye demolición de concreto, excavación y concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste	Un	1,0	$ 1.557.489,16	0,00	$ -	3,00	$ 4.672.467
61	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina , con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.144.221,10	0,00	$ -	0,00	$ -
62	Suministro, transporte e instalación de poste recto con platina para instalación de brazo de ménsula, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye brida o flanche y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 2.221.573,70	0,00	$ -	0,00	$ -
63	Suministro, transporte e instalación de poste para ubicación de sonorizador, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores para tubería, pintura y adherencia. Incluye demolición, excavación, concreto de 21 Mpa para empotramiento del poste.	Un	1,0	$ 787.505,06	0,00	$ -	0,00	$ -
64	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular en ménsula, incluye elementos de fijación, colocación horizontal sin placa de contraste. Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.481.575,14	2,00	$ 2.963.150	3,00	$ 4.444.725
65	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.382.864,88	17,00	$ 23.508.703	31,00	$ 42.868.811
66	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de 4 aspectos a poste recto, incluye elementos de fijación. (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos accesorios de pasta.	Un	1,0	$ 1.788.942,92	0,00	$ -	0,00	$ -
67	Suministro, transporte e instalación de semáforo vehicular de conteo regresivo a ménsula, tres aspectos. Conteo regresivo de rojo y conteo regresivo de verde y amarillo completo durante el tiempo de amarillo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero Bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 2.165.691,47	5,00	$ 10.828.457	5,00	$ 10.828.457

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
68	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.658.256,50	0,00	$ -	8,00	$ 13.266.052
69	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de conteo regresivo para paso peatonal actuado (pulsado). Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye módulo de conteo, cableado interno y dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.781.158,24	0,00	$ -	0,00	$ -
70	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal estático. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	Un	1,0	$ 1.220.336,71	11,00	$ 13.423.704	22,00	$ 26.847.408
71	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal proyector en piso. Incluye ajuste y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 4.004.506,50	0,00	$ -	0,00	$ -
72	Suministro, transporte e instalación de módulo sonoro para semáforo peatonal.	Un	1,0	$ 2.243.666,18	37,00	$ 83.015.649	37,00	$ 83.015.649
73	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal tipo totem de 160x37x24 cm. Incluye sonorizador, dos lámparas peatonal estaticas de 200 mm, pulsador inductivo touchless y panel de mensajería de 19.5x97.5 cm.	Un	1,0	$ 9.476.114,88	0,00	$ -	0,00	$ -
74	Suministro, transporte e instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.511.437,14	0,00	$ -	0,00	$ -
75	Suministro, transporte e instalación de semáforo estático para ciclistas, de tres aspectos de 100 mm. IP65. Incluye elementos de fijación (flejes de acero bandit con sus correspondientes hebillas). Incluye dos soportes en policarbonato.	un	1,0	$ 1.229.317,20	0,00	$ -	0,00	$ -
76	Suministro, transporte de instalación de contraste para semáforo de cuatro aspectos, inluye pintura anticorrosivo y acabado en poliuretano.	Un	1,0	$ 463.039,02	0,00	$ -	0,00	$ -
77	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 7.555,64	0,00	$ -	3.660,00	$ 27.653.627
78	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG (Termoflex) 2x18, 600 v, 105°, para semaforización.	m	1,0	$ 4.101,16	0,00	$ -	0,00	$ -
79	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x12 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 8.546,24	0,00	$ -	165,00	$ 1.410.130
80	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x10 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 12.788,29	0,00	$ -	155,00	$ 1.982.186

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
81	Suministro, transporte e instalación de cable encauchetado AWG 2x8 de Potencia-Tipo Fuerza, para semaforización. Debe cumplir con las normas y especificaciones de E. P M.	m	1,0	$ 20.224,71	0,00	$ -	0,00	$ -
82	Suministro, transporte e instalación de cable mensajero, desnudo y de espesor E=1/8"	m	1,0	$ 2.583,82	0,00	$ -	0,00	$ -
83	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales, para postes de semáforos, en lámina galvanizada y/o fibra de vidrio, con material reflectivo tipo IX, incluye elementos de fijación (cinta band it de 3/4" y hebillas) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 201.243,50	5,00	$ 1.006.217	227,00	$ 45.682.273
84	Suministro, transporte e instalación de señal de seguridad vial SI-27A, para poste peatonal con pulsador.	Un	1,0	$ 266.798,41	0,00	$ -	0,00	$ -
85	Reparación de disco direccional. Incluye retiro de material reflectivo existente, suministro e instalación de material reflectivo tipo IX (mínimo) y recubrimiento del borde con esmalte epóxico. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de Señalizacion vial vigente en cuanto a color y papel.	Un	1,0	$ 104.200,14	0,00	$ -	0,00	$ -
86	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de semáforo a 50, 100 o 200 m, incluye excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento. Se debe cumplir con las normas y especificaciones del manual de señalizacion vial vigente.	Un	1,0	$ 287.344,65	0,00	$ -	0,00	$ -
87	Suministro, transporte e instalación de pulsadores para peatones. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 940.859,83	0,00	$ -	7,00	$ 6.586.019
88	Suministro, transporte e instalación de pulsadores touchless (Sin contacto) para peatones.Lámina autoadhesiva de identificación de 9x5 cm.	Un	1,0	$ 1.026.702,31	0,00	$ -	6,00	$ 6.160.214
89	Suministro, transporte e instalación de percha con aislador	Un	1,0	$ 75.588,15	0,00	$ -	12,00	$ 907.058
90	Suministro de Protector de sobrecargas eléctricas para controlador local.	Un	1,0	$ 3.668.547,69	0,00	$ -	0,00	$ -
91	Suministro, transporte e instalación de radar para detección de vehículos en intersección semafórica	Un	1,0	$ 5.276.791,18	0,00	$ -	0,00	$ -
92	Suministro, transporte e instalación de lengüetas para chapas de controlador local	Un	1,0	$ 63.406,07	0,00	$ -	0,00	$ -
93	Suministro, transporte e instalación de chapa principal para gabinetes de controlador local. Incluye tornillos de fijación	Un	1,0	$ 361.922,69	0,00	$ -	0,00	$ -
94	Suministro, transporte e instalación de empalme para cables Eléctricos AWG 4x18, 2x16, 3x18 y 4x12	Un	1,0	$ 53.618,50	339,00	$ 18.176.671	1.433,00	$ 76.835.307

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
95	Suministro, transporte e instalación de empalme Cable telefónico de 10 pares. Incluye elementos necesarios para el buen desempeño	Un	1,0	$ 356.627,89	1,00	$ 356.628	23,00	$ 8.202.443
96	Suministro, transporte e instalación de cortacircuitos breaker monopolar de 6 amperios.	Un	1,0	$ 17.521,68	0,00	$ -	0,00	$ -
97	Suministro, transporte e instalación de anclajes para ménsula, incluye demolición, excavación, acero de refuerzo, concreto de 21 Mpa, cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	Un	1,0	$ 614.726,88	2,00	$ 1.229.454	5,00	$ 3.073.635
98	Suministro, transporte e instalación de plaqueta identificadora de cable de semáforos	Un	1,0	$ 8.781,07	0,00	$ -	72,00	$ 632.237
99	Suministro, transporte e instalación de empalme UY	Un	1,0	$ 2.077,31	0,00	$ -	0,00	$ -
100	Suministro, transporte e instalación de empalme con Conector en "C" de cable AWG 8 ó 10	Un	1,0	$ 15.557,80	0,00	$ -	0,00	$ -
101	Suministro, transporte e instalación de fusibles cerámica de L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 9.407,51	1,00	$ 9.408	1,00	$ 9.408
102	Suministro e instalación de cable # 8 entre varillas de 5/8" para puesta a tierra	m	1,0	$ 9.106,94	0,00	$ -	0,00	$ -
103	Suministro e Instalación de alambre # 10 para tierra desde la varilla de 5/8" a la bornera	m	1,0	$ 7.498,55	0,00	$ -	0,00	$ -
104	Suministro e instalación de 50 cm de cinta bandit para semáforo vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 10.061,42	8,00	$ 80.491	128,00	$ 1.287.860
105	Suministro de flauta para soporte de semáforo en ménsula. Incluye Pintura lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura poliuretano.	Un	1,0	$ 92.570,09	0,00	$ -	0,00	$ -
106	Suministro e Instalación de accesorio para soporte de semáforo de hasta 50 cm	Un	1,0	$ 122.433,53	0,00	$ -	0,00	$ -
107	Suministro e Instalación de tornillos para flanche.	Un	1,0	$ 7.762,28	0,00	$ -	0,00	$ -
108	Suministro e instalación de cable encauchetado 2 x 10	m	1,0	$ 12.966,76	0,00	$ -	282,00	$ 3.656.627
109	Suministro e Instalación de Cable encauchetado 2 x 14	m	1,0	$ 9.213,87	0,00	$ -	0,00	$ -
110	Suministro e Instalación de Cable UTP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 5.901,01	0,00	$ -	5.789,00	$ 34.160.956
111	Suministro e Instalación de Cable STP cat6+ para intemperie	m	1,0	$ 6.374,28	0,00	$ -	0,00	$ -
112	Suministro e instalación de tapa bornera	Un	1,0	$ 113.049,86	0,00	$ -	0,00	$ -
	RED DE COMUNICACIONES							
113	Suministro e instalación de fibra óptica armada de 24 hilos.	m	1,0	$ 10.792,63	0,00	$ -	1.182,00	$ 12.756.889
114	Empalme por fusión de fibra óptica de 24 hilos , incluye instalación de mufla con derivación.	Un	1,0	$ 431.593,21	0,00	$ -	5,00	$ 2.157.966
115	Empalme por fusión de fibra óptica de hasta 48 hilos, tipo sangría, organización de hilos en bandeja y adosamiento en cámara o poste	Un	1,0	$ 379.841,76	0,00	$ -	0,00	$ -
116	Empalme de fibra de 4 hilos en el controlador, incluye caja OB, pig tail LC y organización de hilos.	Un	1,0	$ 289.775,29	0,00	$ -	10,00	$ 2.897.752

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
117	Certificación de enlace Óptico de 1 hilo, incluye reflectometría con bobina de lanzamiento, prueba VFL, potencia óptica y verificación microscópica de conectores. Incluye entregables (Gráficas de OTDR + Potencias) punto a punto	Un	1,0	$ 14.471,10	0,00	$ -	256,00	$ 3.704.603
118	Suministro e instalación de conector rápido de fibra óptica	Un	1,0	$ 13.092,49	0,00	$ -	0,00	$ -
119	Suministro e instalación de conversor de medio de fibra óptica	Un	1,0	$ 256.359,10	0,00	$ -	0,00	$ -
120	Suministro e instalación de pathcore de fibra óptica de 5 m monomodo SC	Un	1,0	$ 44.403,90	0,00	$ -	0,00	$ -
121	Localización y replanteo del trazado definitivo de la red. Incluye Plano KMZ	m	1,0	$ 1.113,44	0,00	$ -	41.666,00	$ 46.392.562
122	Suministro, transporte e instalación de fibra óptica ADSS, monomodo, span 100, de 24 hilos. No incluye plano record.	m	1,0	$ 11.098,99	0,00	$ -	480,00	$ 5.327.514
123	Suministro, transporte e instalación de tuerca de ojo para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 24.288,29	0,00	$ -	12,00	$ 291.460
124	Suministro, transporte e instalación de herraje de suspensión para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 25.260,84	0,00	$ -	0,00	$ -
125	Suministro, transporte e instalación de helicoidal para instalación de fibra óptica	Un	1,0	$ 18.085,98	0,00	$ -	13,00	$ 235.118
126	Suministro, transporte e instalación de placa identificadora de fibra óptica	Un	1,0	$ 9.200,14	5,00	$ 46.001	62,00	$ 570.409
127	Suministro, configuración y puesta en marcha de equipo de comunicación inalámbrica. Consta de transmisor y antena tipo látigo con soporte para instalación en ménsula.	Un	1,0	$ 1.229.450,14	0,00	$ -	0,00	$ -
128	Instalación de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula. Incluye cinta bandit	Un	1,0	$ 182.536,13	0,00	$ -	2,00	$ 365.072
129	Retiro de equipo de comunicación inalámbrica en ménsula	Un	1,0	$ 158.941,47	0,00	$ -	2,00	$ 317.883
130	Suministro de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 1.039.940,03	10,00	$ 10.399.400	24,00	$ 24.958.560
131	Suministro e instalación de switch capa 2 de cinco puertos ethernet de 1 gbps	Un	1,0	$ 106.516,62	0,00	$ -	0,00	$ -
132	Suministro e instalación de módulo SFP de 1,25 Gbps Dúplex LC/APC 1310 nm	Un	1,0	$ 183.378,61	0,00	$ -	0,00	$ -
133	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de switch capa 3 de fibra óptica	Un	1,0	$ 243.494,94	0,00	$ -	0,00	$ -
134	Suministro, configuración e instalación de Router 6200 G.SHDSL.bis VPN 11.362 Mbps.	Un	1,0	$ 2.497.278,18	0,00	$ -	0,00	$ -
135	Suministro e instalación dentro de gabinete de controlador de multitoma AC de 6 puestos con polo a tierra.	Un	1,0	$ 30.678,47	0,00	$ -	0,00	$ -
136	Sumnistro e instalación de tubería embebida al interior de cárama de inspección en tubería metálica flexible de 1". Incluye elementos de fijación.	m	1,0	$ 35.196,53	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS SEMAFÓRICOS							

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
137	Suministro de Carcaza de un aspecto para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 294.625,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.178.500
138	Suministro de Carcaza de dos aspectos para semáforo de 200 mm en policarbonato. Incluye visera	Un	1,0	$ 533.589,60	1,00	$ 533.590	6,00	$ 3.201.538
139	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 5.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.486.539,74	0,00	$ -	15,00	$ 52.298.096
140	Suministro de ménsula galvanizada (poste recto con platina y brazo de L= 4.5 m), con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla normas para espesores de tubería, pintura y adherencia. Incluye elementos de fijación y tapones.	Un	1,0	$ 3.417.395,23	0,00	$ -	0,00	$ -
141	Suministro de poste recto de enterramiento directo, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 1.442.325,87	19,00	$ 27.404.191	159,00	$ 229.329.812
142	Suministro de poste recto de platina, con pintura electrostática y/o poliuretano, que cumpla norma para espesores de tubería y pintura y lo mismo que adherencia.	Un	1,0	$ 2.077.371,39	0,00	$ -	0,00	$ -
143	Suministro de semáforo vehicular, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.354.428,47	10,00	$ 13.544.285	10,00	$ 13.544.285
144	Suministro de semáforo peatonal de conteo regresivo, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.622.177,75	12,00	$ 19.466.133	92,00	$ 149.240.353
145	Suministro de semáforo peatonal estático, incluye dos soportes en poliuretano	Un	1,0	$ 1.184.258,67	0,00	$ -	0,00	$ -
146	Suministro de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 3.317.523,84	0,00	$ -	200,00	$ 663.504.769
147	Suministro de gabinete para controlador local, en lámina calibre 16. Incluye pintura anticorrosiva y esmalte gris mate. El gabinete debe incluir dos chapas adicionales para seguridad en la puerta con llave maestra.	Un	1,0	$ 4.610.908,24	15,00	$ 69.163.624	35,00	$ 161.381.788
148	Suministro de cable encauchetado AWG (Termoflex) 4x18, 600 v, 105°C, para semaforización.	m	1,0	$ 6.352,60	0,00	$ -	36.275,00	$ 230.440.607
149	Suministro de pulsadores touchless para peatones. Incluye acople de 4" y elementos de fijación.	Un	1,0	$ 967.895,23	0,00	$ -	0,00	$ -
150	Suministro de soporte tipo L para cámara a poste Recto	Un	1,0	$ 106.507,23	0,00	$ -	0,00	$ -
151	Suministro de Soporte para Semáforo vehicular de 200mm a Ménsula (son un par)	Un	1,0	$ 107.728,32	0,00	$ -	0,00	$ -
152	Suministro de Par de argollas para accesorio soporte a ménsula	Un	1,0	$ 62.691,47	0,00	$ -	0,00	$ -
153	Suministro de soporte para ménsula, flauta galvanizada y platina galvanizada. Incluye perno de sujeción	Un	1,0	$ 181.246,39	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 6 FEBRERO		ACUMULAD0	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
154	Suministro de lámparas a Led D= 200 mm, vehicular, verde, roja o amarilla.	Un	1,0	$ 335.932,80	0,00	$ -	0,00	$ -
155	Suministro de Lámparas a Led D=200 mm, peatonal. Verde o roja.	Un	1,0	$ 336.446,53	0,00	$ -	40,00	$ 13.457.861
156	Suministro de Lámparas a Led D= 200 mm, ciclistas. Verde o roja.	Un	1,0	$ 363.197,98	0,00	$ -	65,00	$ 23.607.868
157	Suministro de lámpara vehicular a LED D=200 mm de conteo regresivo amarilla, con conteo regresivo en rojo y en verde	Un	1,0	$ 373.427,75	0,00	$ -	200,00	$ 74.685.550
158	Suministro de Fuente de alimentación para lámpara a led	Un	1,0	$ 44.361,99	0,00	$ -	0,00	$ -
159	Suministro de Bombillo C7 E12 7W 110V	Un	1,0	$ 1.223,99	0,00	$ -	0,00	$ -
160	Suministro de Fusible de cerámica L = 3/4" y diámetro 3/16" de 3.15 A	Un	1,0	$ 7.652,46	0,00	$ -	0,00	$ -
161	Suministro de borneras para gabinete de controlador local.	Un	1,0	$ 8.429,91	0,00	$ -	0,00	$ -
162	Suministro de Transformador (220-110)	Un	1,0	$ 176.626,45	0,00	$ -	0,00	$ -
163	Suministro de Canastilla para sonorizador	Un	1,0	$ 411.113,44	0,00	$ -	0,00	$ -
164	Suministro de insecticida matacucarachas en aerosol x 400 ml	Un	1,0	$ 23.376,45	0,00	$ -	0,00	$ -
	RETIROS DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO							
165	Retiro de Controlador local. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 115.227,60	0,00	$ -	12,00	$ 1.382.731
166	Retiro de ménsula metálica, incluye brazo y poste. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 224.375,00	3,00	$ 673.125	9,00	$ 2.019.375
167	Retiro de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 96.137,28	0,00	$ -	0,00	$ -
168	Retiro de Poste Recto de enterramiento directo. Incluye equipo de corte de concreto, demolición, excavacion, cargue y transporte a su disposición final y el material sobrante al botadero oficial.	Un	1,0	$ 189.513,01	18,00	$ 3.411.234	174,00	$ 32.975.262
169	Retiro de Poste Recto con platina. Incluye cargue transporte a su disposición final y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 83.338,15	0,00	$ -	1,00	$ 83.338
170	Retiro de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 76.942,20	2,00	$ 153.884	5,00	$ 384.710
171	Retiro e instalación de Semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de equipo de altura, retiro de placa de constraste, girada de viseras y ubicación del semáforo de manera horizontal.	Un	1,0	$ 258.473,99	2,00	$ 516.948	33,00	$ 8.529.642
172	Retiro de Semáforo vehicular, peatonal o de ciclista, a poste recto. Incluye transporte a disposición final.	Un	1,0	$ 28.668,35	68,00	$ 1.949.448	360,00	$ 10.320.608
173	Retiro de Cable AWG 4 x 16, 4x18 y Cable de Comunicación . Incluye transporte a disposición final	m	1,0	$ 526,73	850,00	$ 447.724	12.113,90	$ 6.380.804

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 6 FEBRERO		ACUMULAD0	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
174	Retiro de Cable mensajero de E=1/8". Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 871,39	0,00	$ -	0,00	$ -
175	Retiro de acometida eléctrica de controlador local. Incluye retiro de la tubería y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 106.330,20	0,00	$ -	0,00	$ -
176	Retiro de Sonorizador. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.166,91	0,00	$ -	26,00	$ 1.018.339
177	Retiro de Pulsador peatonal. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 39.166,91	13,00	$ 509.170	34,00	$ 1.331.675
178	Retiro de placa de contraste a semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 36.389,45	0,00	$ -	0,00	$ -
179	Retiro de Disco direccional o disco pulse espere y pase. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 8.169,08	16,00	$ 130.705	283,00	$ 2.311.849
180	Retiro de señal informativa de motos. Incluye transporte a la obra de la Obra.	Un	1,0	$ 36.389,45	1,00	$ 36.389	3,00	$ 109.167
181	Retiro de señalización vertical de tránsito de cualquier tipo. Incluye cargue y transporte al sitio donde lo indique la interventoria.	Un	1,0	$ 19.311,42	0,00	$ -	0,00	$ -
182	Retiro de perno en platina de poste. Incluye corte con pulidora. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 6.954,48	0,00	$ -	0,00	$ -
183	Retiro de Soldadura en tapa- marco en caja de inspección	Un	1,0	$ 8.303,47	33,00	$ 274.014	200,00	$ 1.660.693
184	Retiro de Extensión de tubería IMC a poste vehicular para cableado aéreo. Incluye transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 42.557,80	3,00	$ 127.673	3,00	$ 127.673
185	Retiro de Cámara y gabinete para aforo vehicular. Incluye equipo de plataforma para altura y transporte a su disposición final.	Un	1,0	$ 207.248,55	0,00	$ -	0,00	$ -
186	Retiro de Cámaras de video analítica para aforos , elementos de anclaje y soporte, cables de potencia y Datos, retiro de Gabinete de Control de Cámaras. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 305.669,80	0,00	$ -	0,00	$ -
187	Retiro de herraje metálico (marco y tapa), de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,19	96,00	$ 7.757.202	426,00	$ 34.422.585
188	Retiro de marco métalico o sintético, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final y botada de material sobrante en botadero	Un	1,0	$ 80.804,19	4,00	$ 323.217	15,00	$ 1.212.063
189	Retiro de tapa en concreto reforzado, de cajas de inspección en concreto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 21.502,17	1,00	$ 21.502	2,00	$ 43.004
190	Retiro de dispositivo de análisis en campo.	Un	1,0	$ 69.656,07	0,00	$ -	0,00	$ -
191	Retiro de percha de electroporcelana	Un	1,0	$ 41.445,09	0,00	$ -	0,00	$ -
192	Retiro de bajante IMC de hasta 3". Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 22.320,09	0,00	$ -	1,00	$ 22.320

Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación	**CONTRATO 4600105555 DE 2025**	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
		DURACIÓN	865 DÍAS		
		VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
		ADICIONES	$ -		
	CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
	INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
				PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 6 FEBRERO		ACUMULAD0	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
193	Retiro e instalación de tapa Bornera, incluye pintura y cinta bandit con dos hebillas	Un	1,0	$ 35.851,88	0,00	$ -	0,00	$ -
194	Retiro de soporte tipo L para cámara a poste Recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.622,83	0,00	$ -	0,00	$ -
195	Retiro de lámpara vehicular o peatonal a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 15.116,33	34,00	$ 513.955	342,00	$ 5.169.785
196	Retiro de lámpara vehicular a ménsula. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 27.184,25	5,00	$ 135.921	51,00	$ 1.386.396
197	Retiro e instalación (aplome o nivelación) de poste recto de enterramiento directo. Incluye concreto de 21 Mpa	Un	1,0	$ 102.470,38	1,00	$ 102.470	9,00	$ 922.233
198	Retiro de visera a poste recto. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 10.426,30	0,00	$ -	4,00	$ 41.705
199	Retiro de Contraste a poste. Incluye transporte a su disposición final	Un	1,0	$ 17.938,58	36,00	$ 645.789	615,00	$ 11.032.228
200	Retiro de cable telefónico de 10, 20 ó 50 pares. Incluye transporte a su disposición final	m	1,0	$ 723,27	0,00	$ -	463,00	$ 334.872
201	Retiro de pasacalles por obstrucción de visual de semáforo.	Un	1,0	$ 68.017,34	0,00	$ -	0,00	$ -
202	Retiro de elemento obstructivo en ménsula. Incluye uso de vehículo carro canasta o grúa	Un	1,0	$ 107.195,09	0,00	$ -	0,00	$ -
	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE AMOBLAMIENTO SEMAFÓRICO							
203	Instalación de ménsula metálica con brazo de 4,5 o 5,50 m	Un	1,0	$ 435.317,20	4,00	$ 1.741.269	12,00	$ 5.223.806
204	Instalación de brazo de ménsula metálica. Incluye equipo de plataforma de altura, cargue y transporte a su punto de instalación.	Un	1,0	$ 159.062,86	0,00	$ -	0,00	$ -
205	Instalación de poste recto con platina	Un	1,0	$ 76.854,77	0,00	$ -	1,00	$ 76.855
206	Instalación de poste recto de enterramiento directo. incluye demolición, excavación y concreto de 21 MPA para empotramiento del poste y cargue y botada de material sobrante	Un	1,0	$ 129.735,55	19,00	$ 2.464.975	172,00	$ 22.314.514
207	Instalación de semáforo vehicular a ménsula. Incluye utilización de plataforma, elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8"y hebilla)	Un	1,0	$ 112.610,55	-1,00	-$ 112.611	3,00	$ 337.832
208	Instalación de Semáforo vehicular o peatonal a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 33.169,80	41,00	$ 1.359.962	315,00	$ 10.448.487
209	Instalación de placa de contraste para semáforo vehicular a poste recto. Incluye elementos de fijación (Cinta bandit de 5/8" y hebilla)	Un	1,0	$ 63.098,27	0,00	$ -	0,00	$ -
210	Instalación de viseras de semáforo en brazo de ménsula. Incluye utilización de plataforma.	Un	1,0	$ 15.825,87	0,00	$ -	0,00	$ -
211	Instalación de viseras de semáforo en poste recto	Un	1,0	$ 4.084,54	0,00	$ -	4,00	$ 16.338

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.** 6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA** 28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS	
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA** $ 682.045.474
	ADICIONES	$ -	
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO** 4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%	**PERÍODO** 1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTA NO. 6 FEBRERO		ACUMULAD0	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
212	Instalación de semáforo peatonal de piso de 1 metro de longitud que cumpla con la norma IP67	Un	1,0	$ 208.864,88	29,00	$ 6.057.082	29,00	$ 6.057.082
213	Instalación de Sonorizador. Incluye elementos de fijación	Un	1,0	$ 74.317,20	0,00	$ -	12,00	$ 891.806
214	Instalación de Pulsador. Incluye elementos de fijación.	Un	1,0	$ 84.078,76	18,00	$ 1.513.418	30,00	$ 2.522.363
215	Instalación de Cable AWG 4x16, cable 2x16, cable 4x18 o neopreno, o telefónico de 10 pares.	Un	1,0	$ 1.410,40	2.110,00	$ 2.975.954	13.124,00	$ 18.510.150
216	Instalación de Controlador local. Incluye prueba de acometida, cableado de grupos, detectores y pulsadores.	Un	1	$ 357.786,85	19,00	$ 6.797.950	35,00	$ 12.522.540
217	Instalación de placa identificadora de cables de semáforo	Un	1,0	$ 4.291,18	0,00	$ -	0,00	$ -
218	Instalación de lámpara vehicular o peatonal a poste recto	Un	1,0	$ 17.984,10	34,00	$ 611.460	346,00	$ 6.222.501
219	Instalación de lámpara vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 32.073,70	5,00	$ 160.368	51,00	$ 1.635.758
220	Instalación de disco direccional. Incluye transporte y elementos de fijación (Cinta bandit en acero de 5/8" y hebilla).	Un	1,0	$ 18.598,27	7,00	$ 130.188	83,00	$ 1.543.656
221	Instalación de señal vertical. Incluye concreto de 21 Mpa, botada de material sobrante.	Un	1,0	$ 41.158,96	0,00	$ -	0,00	$ -
222	Calibración y mantenimiento de los planeamientos de tráfico en los controladores locales de la red semafórica de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín	Hr	1,0	$ 50.539,02	330,00	$ 16.677.876	1.890,00	$ 95.518.744
	PINTURA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS							
223	Pintura de brazo de ménsula (en bodega). Incluye retiro total de pintura hasta superficie original de la tubería (rasqueteada), dos manos de pintura anticorrosiva o base, dos manos de pintura poliuretano blanca y franjas negras. Debe cumplir con los espesores y adherencia de la pintura.	Un	1,0	$ 178.847,54	0,00	$ -	0,00	$ -
224	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, CON retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 143.944,36	0,00	$ -	0,00	$ -
225	Pintura de poste recto en sitio, colores blanco y negro en poliuretano, SIN retiro total de pintura (rasqueteada) . Incluye limpieza y lijada del poste, y dos manos en poliuretano blanca y franjas negras.	Un	1,0	$ 85.515,17	5,00	$ 427.576	42,00	$ 3.591.637
226	Pintura de gabinete de controlador local según diseño y color de la SMM.	Un	1,0	$ 144.020,23	0,00	$ -	0,00	$ -
227	Pintura de placas de contraste. Lijada y limpieza de la superficie con disolvente, wash primer, pintura en poliuretano blanco para el marco y negro para el fondo completo.	Un	1,0	$ 60.705,20	0,00	$ -	0,00	$ -
	LAVADA DE ELEMENTOS SEMAFÓRICOS							
228	Lavada de gabinete de controlador local	Un	1,0	$ 32.665,46	3,00	$ 97.996	3,00	$ 97.996
229	Lavada de brazo de ménsula	Un	1,0	$ 60.828,76	16,00	$ 973.260	58,00	$ 3.528.068
230	Lavada de Poste recto	Un	1,0	$ 23.213,87	138,00	$ 3.203.514	293,00	$ 6.801.665

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%	**PERÍODO**	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
231	Lavada de semáforo peatonal o ciclista	Un	1,0	$ 23.213,87	175,00	$ 4.062.428	354,00	$ 8.217.712
232	Lavada de Sonorizadores o pulsador	Un	1,0	$ 13.890,90	21,00	$ 291.709	63,00	$ 875.126
233	Lavada de avisos de motos	Un	1,0	$ 23.090,32	0,00	$ -	2,00	$ 46.181
234	Lavado de semáforo vehicular a poste	Un	1,0	$ 25.936,42	96,00	$ 2.489.896	220,00	$ 5.706.012
235	Lavado de semáforo vehicular a ménsula de 3 o 4 aspectos	Un	1,0	$ 60.828,76	17,00	$ 1.034.089	59,00	$ 3.588.897
236	Lavada de disco direccional	Un	1,0	$ 12.885,84	97,00	$ 1.249.926	251,00	$ 3.234.345
	VARIOS							
237	Sondeo de canalizaciones, buscada de cajas, halado de cables y levantamiento actual georreferenciado de la intersección completa en software SIG, incluye el diámetro de las tuberías, número de cables, longitudes, distancia entre cajas, tipo de cajas, registro fotográfico, y toda la información necesaria para su correcto entendimiento.	Un	1,0	$ 243.212,43	16,00	$ 3.891.399	92,00	$ 22.375.544
238	Adecuación en taller de perforaciones de base ménsula para ensamble en cimentación existente, incluye transporte, tratamiento de la superficie afectada con spray de zinc y pintura de acabado negra.	Un	1,0	$ 85.481,21	0,00	$ -	0,00	$ -
239	Suministro, transporte e instalación de platina especial para realce de anclaje de ménsula. Incluye soldadura en anclaje de ménsula existente.	Un	1,0	$ 507.820,09	0,00	$ -	0,00	$ -
240	Suministro, transporte e instalación de conector tipo piercing para acometida de controlador. Incluye dos conductores (F-F o F-N)	Un	1,0	$ 134.829,48	1,00	$ 134.829	9,00	$ 1.213.465
241	Reparación de semáforo vehicular, peatonal o ciclista.	Un	1,0	$ 39.537,57	0,00	$ -	6,00	$ 237.225
242	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" con platina.	Un	1,0	$ 491.690,03	0,00	$ -	0,00	$ -
243	Reparación estructural, en taller, de hasta 1m de longitud de poste recto de 4" de enterramiento.	Un	1,0	$ 347.436,42	0,00	$ -	0,00	$ -
244	Mantenimiento de brazo de ménsula galvanizado. Incluye retiro de pintuta existente y pintura electrostática	Un	1,0	$ 188.195,09	0,00	$ -	0,00	$ -
245	Suministro y aplicación de líquido rico en zinc para flanches de ménsula x 150 ml.	Un	1,0	$ 53.094,65	0,00	$ -	0,00	$ -
246	Pintura de símbolo en lámparas de semáforo peatonal o vehicular	Un	1,0	$ 28.206,65	0,00	$ -	11,00	$ 310.273
247	Perforación de 1-1/8" de poste o ménsula. Incluye tapón de caucho de 1-1/8" con agujero de 3/4" y spray de zinc.	Un	1,0	$ 69.848,99	0,00	$ -	1,00	$ 69.849
248	Medición resistencia de puesta a tierra equipo de control local, incluye informe.	Un	1,0	$ 94.727,60	0,00	$ -	286,00	$ 27.092.094
249	Alineación de brazo de ménsula, incluye tornillos.	Un	1,0	$ 100.202,31	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.**	6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA**	28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS		
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 682.045.474
	ADICIONES	$ -		
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO**	4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%		
			PERÍODO	1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
250	Adecuación de controlador local existente. Incluye instalación de ventilador, termostato, breakers, borneras, tomas de alimentación, cableado de los grupos, acometida, puesta a tierra, prueba en laboratorio y limpieza de racks (son hasta tres) y de cables. No incluye programación de tarjetas	Un	1,0	$ 917.023,12	0,00	$ -	3,00	$ 2.751.069
251	Suministro e instalación de chapa de seguridad para gabinete de controlador local existente. Incluye lengüeta en acero galvanizado de 2" y llave.	Un	1,0	$ 140.002,89	0,00	$ -	0,00	$ -
252	Suministro de llave para apertura de cámara de inspección según diseño.	Un	1,0	$ 29.403,18	0,00	$ -	58,00	$ 1.705.384
253	Suministro e instalación de final de carrera para detección de apertura de gabinete. Incluye cableado hasta tarjeta de entrada del controlador.	Un	1,0	$ 88.518,06	0,00	$ -	0,00	$ -
254	Adecuación de flanches (Brida), en taller, para ménsulas de 4.5 o 5.5 m, incluye dos bridas, extensión de 20cm del brazo y tratamiento con zinc.	Un	1,0	$ 352.728,32	0,00	$ -	0,00	$ -
255	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado. Incluye costales.	Un	1,0	$ 50.285,40	0,00	$ -	3,00	$ 150.855
256	Lleno de caja de registro de hasta 60x80 cm con triturado existente. Incluye costales	Un	1,0	$ 17.435,69	0,00	$ -	8,00	$ 139.486
257	Enderezada cara semáforo vehicular a ménsula	Un	1,0	$ 66.533,24	0,00	$ -	3,00	$ 199.599
258	Enderezada cara semáforo vehicular o peatonal o ciclistas a poste	Un	1,0	$ 22.423,41	31,00	$ 695.126	175,00	$ 3.924.098
259	Enderezada o ajustada de visera a ménsula	Un	1,0	$ 42.580,92	1,00	$ 42.581	9,00	$ 383.229
260	Enderezada o ajustada de visera a poste	Un	1,0	$ 12.252,89	7,00	$ 85.770	39,00	$ 477.862
261	Diagnóstico, verificación y reparación de cruce con problemas de corto o fracturas en cableado que impiden el servicio. Incluye transporte de peronal y equipos.	Un	1,0	$ 93.380,78	9,00	$ 840.427	84,00	$ 7.843.984
262	Soldada de cajas de inspección. Mínimo 15 cm de cordón en cada lado de la caja	Un	1,0	$ 66.601,16	36,00	$ 2.397.642	317,50	$ 21.145.869
263	Suministro e instalación de concreto (e=15 cm) de 21 Mpa, para sellado de caja de inspección	Un	1,0	$ 51.085,98	4,00	$ 204.344	37,00	$ 1.890.182
264	Mantenimiento a caja de inspección de 50x50 cm, 60x60 cm o 50x80 cm existente. Incluye limpieza, tratamiento anticorrosivo y lubricación de tornillos de seguridad.	Un	1,0	$ 47.237,72	0,00	$ -	14,00	$ 661.328
	COSTOS DIRECTOS				**COSTO DIRECTO ACTA**	**$ 479.735.760**		$ 3.139.741.859
	Administración			32,90%	32,90%	$ 157.833.065		$ 1.032.975.072
	Imprevistos			0,50%	0,00%	$ -		$ -
	Utilidad			5,00%	5,00%	$ 23.986.788		$ 156.987.092
	Valor Total AIU			38,40%	37,90%	$ 181.819.853		$ 1.189.962.164
	Pago Reajuste					$ 20.489.861		$ 20.489.861
	Guía Socioambiental							$ 41.400.118

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTRATO 4600105555 DE 2025	**FECHA DE INICIO**	5/09/2025	**ACTA NO.** 6/01/1900
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN.	**AMPLIACIONES**	N/A	**FECHA** 28/02/2026
	DURACIÓN	865 DÍAS	
	VALOR INICIAL	$ 14.162.162.240	**VALOR PRESENTE ACTA** $ 682.045.474
	ADICIONES	$ -	
CONTRATISTA: UT SIT MEDELLIN	**VALOR CON ADICIONES**	$ 14.162.162.240	**PORCENTAJE ACUMULADO** 4,82%
INTERVENTOR: CONSORCIO INT FAROL MED	**% EJECUTADO ACUMULADO**	31,36%	**PERÍODO** 1-28/02/2026

CONDICIONES CONTRACTUALES					**ACTA NO. 6 FEBRERO**		**ACUMULAD0**	
Item	**Actividad**	**Unidad**	**Cant. Total**	**Valor Unitario**	**Cant**	**Vr. Parcial**	**Cant**	**Vr. Total**
	Pólizas							$ 50.147.456
	PRESUPUESTO TOTAL				**VALOR TOTAL ACTA**	**$ 682.045.474**	**VALOR TOTAL ACUMULADO**	$ 4.441.741.458

Miguel Ángel Osorio Gómez
Director de Obra - UT SIT MEDELLIN

Marta Lucía Suárez Gómez
Director de Interventoría - CONSORCIO INT FAROL MED

ANEXO 19.

INDICES DE CAMACOL

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

SAO TECHNOLOGY & CIA. S.A.S.

Una eficaz gestión de obras

Que impulsa tu innovación

Mejora la calidad , entrega tus proyectos a tiempo y agiliza tus tareas de construcción.



322 6534335

www.saotechnology.com

CAMACOL ANTIOQUIA

CAMACOLInforma
El poder de construir estrategia

Este documento que contiene los índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CAMACOL ANTIOQUIA

ÍNDICES DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA EN MEDELLÍN

BASE 100 = DICIEMBRE DE 1989

ENERO DE 2026

ÍNDICE COSTO TOTAL	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION % MENS.	VARIACION % ACUM/26	VARIACION % ANUAL
EDIFICACIÓN	3.598,10	3.757,33	4,43	4,43	6,54

CONCEPTO	COD	UNIFAMILIAR			MULTIFAMILIAR		PROMEDIO		INDICE TOTAL POR ITEM	VARIACION POR ITEM %		
		MÍNIMO	MEDIO	COMPLETO	HASTA 5 PISOS	MAS DE 5 PISOS	UNI-FAMILIAR	MULTI-FAMILIAR		dic-25 ene-26	dic-25 ene-26	ene-25 ene-26
TOTAL MANO DE OBRA	TMO	4.294,75	4.262,65	4.255,88	4.210,56	4.213,30	4.264,92	4.209,87	4.226,58	5,45	5,45	9,97
CEMENTO	CE	3.864,27	3.853,77	3.846,60	3.844,78	3.840,40	3.849,74	3.841,44	3.843,02	4,62	4,62	9,04
CONCRETO PREMEZCLADO	CO	3.670,11	3.695,47	3.697,08	3.707,79	3.713,49	3.694,36	3.707,92	3.700,69	3,53	3,53	6,64
PREFABRICADOS	PR	2.974,50	3.899,06	3.270,70	3.325,09	3.106,65	3.568,49	3.192,70	3.289,47	8,49	8,49	8,49
AGREGADOS MINERALES	AM	3.234,67	2.948,93	3.010,75	2.801,21	2.861,58	3.026,25	2.770,70	2.828,67	4,33	4,33	11,56
HIERRO	HI	3.751,88	3.825,88	3.495,14	2.866,76	3.260,59	3.685,38	3.052,86	3.238,87	1,51	1,51	-1,25
MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN	MA	6.586,87	6.853,32	7.250,31	6.192,83	6.361,59	6.962,78	6.277,54	6.491,23	0,23	0,23	3,66
MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA	MM	4.603,06	4.805,01	4.500,41	4.150,46	4.694,20	4.680,28	4.383,83	4.468,98	5,94	5,94	12,73
MAT.INST. HIDRÁULICA SANITARIA	IHS	5.336,33	5.709,15	6.294,06	5.849,66	4.833,40	5.866,11	5.423,03	5.543,91	1,84	1,84	6,65
INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA	IET	9.641,94	11.380,32	10.823,14	11.950,73	9.870,58	10.885,72	10.989,99	10.936,25	8,60	8,60	2,35
MATERIALES PARA CUBIERTA	MC	3.742,98	3.599,47	2.779,71	3.614,77	3.478,88	3.250,88	3.521,09	3.433,82	11,42	11,42	10,30
TOTAL MATERIALES OBRA NEGRA	TMON	4.590,19	4.733,39	4.445,75	4.693,37	4.409,78	4.594,63	4.558,55	4.542,25	4,56	4,56	5,20
PISOS	PIS	2.943,12	2.373,44	2.275,40	2.352,03	2.389,11	2.415,09	2.381,49	2.396,06	4,83	4,83	8,73
CARPINTERÍA DE MADERA	CMA	3.192,36	3.245,63	3.141,09	3.151,98	3.140,70	3.126,98	3.142,59	3.150,25	2,21	2,21	0,44
CARPINTERÍA METÁLICA	CM	2.808,81	3.069,43	3.172,78	3.437,97	3.467,58	3.096,78	3.448,79	3.345,16	4,52	4,52	7,26
APARATOS SANITARIOS	AS	1.795,59	1.869,55	2.079,03	1.963,84	2.130,56	1.940,26	2.026,78	2.004,97	2,47	2,47	2,11
PINTURAS	PI	2.100,11	1.970,90	1.939,44	2.816,40	2.547,10	1.957,28	2.711,46	2.488,34	6,39	6,39	10,93
INSTALACIONES ESPECIALES	IE	3.688,76	3.038,98	3.000,72	2.725,24	2.481,40	3.032,65	2.565,29	2.666,27	-0,91	-0,91	4,91
ENCHAPES	EN	1.515,34	1.448,15	1.561,03	1.676,07	1.608,97	1.512,99	1.640,50	1.607,16	1,50	1,50	-1,08
TOTAL MATERIALES ACABADOS	TMA	2.550,35	2.620,97	2.566,96	2.692,13	2.633,06	2.593,74	2.654,17	2.635,82	2,89	2,89	5,30
HERRAMIENTAS	HE	3.168,95	2.954,57	3.217,23	2.221,92	1.997,38	3.092,53	2.220,38	2.522,12	3,34	3,34	13,16
EQUIPOS	EQ	1.414,32	1.376,66	1.528,89	1.432,81	1.525,32	1.443,25	1.462,29	1.456,08	1,30	1,30	2,21
TOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO	THE	1.890,02	1.754,03	1.903,76	1.477,45	1.558,26	1.842,31	1.504,87	1.619,61	1,77	1,77	4,56
TOTAL MATERIALES	TM	4.001,18	3.837,32	3.528,68	3.720,97	3.441,58	3.730,56	3.581,78	3.613,21	4,04	4,04	5,28
COSTO TOTAL DE EDIFICACIÓN	CTE	4.080,58	3.951,99	3.730,40	3.845,68	3.611,76	3.878,37	3.723,06	3.757,33	4,43	4,43	6,54

DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE INNOVACCIÓN

NOTA: PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION %		
					dic-25 ene-26	dic-25 ene-26	ene-25 ene-26
ACCESORIOS DE BRONCE	dic-89	ACC.BR.	5.392,46	5.577,75	3,44	3,44	26,66
ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO	dic-89	ACC.HF.	2.006,42	2.006,42	0,00	0,00	5,57
AFIRMADOS - BASE GRANULAR (*)	dic-89	AF	4.454,58	4.640,36	4,17	4,17	13,80
AISLADORES	dic-89	AIS.	1.534,32	1.484,22	-3,27	-3,27	-0,25
ALAMBRE (COBRE Y ALUMINIO)	dic-89	ALM	10.774,91	11.000,36	2,09	2,09	-0,90
ALAMBRE DE COBRE	dic-89	ACU	30.027,71	30.150,19	0,41	0,41	1,29
ALAMBRES DE ALUMINIO	dic-89	AL.AL.	11.622,78	11.957,48	2,88	2,88	-7,33
ALCANTARILLADOS (*)	dic-89	AL	2.612,20	2.660,22	1,84	1,84	8,67
ALUMBRADO PUBLICO	dic-97	ALP	315,87	321,33	1,73	1,73	1,73
ANDENES, CUNETAS Y CORDONES (*)	dic-89	ACC	1.739,19	1.811,52	4,16	4,16	7,11
BLOQUE DE CONCRETO PARA MAMPOSTERIA	dic-89	BLC	2.474,31	2.538,49	2,59	2,59	8,11
CABLE DE ALUMINIO FORRADO	dic-97	CAF	2.313,51	2.328,78	0,66	0,66	-4,34
CONCRETO DE 2.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C20	3.343,70	3.507,64	4,90	4,90	4,90
CONCRETO DE 2.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C25	3.638,73	3.822,60	5,05	5,05	7,83
CONCRETO DE 3.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C30	3.516,57	3.694,01	5,05	5,05	7,28
CONCRETO DE 3.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C35	3.553,11	3.734,31	5,10	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C40	3.938,20	4.139,04	5,10	5,10	5,10
CONCRETO DE 4.500 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C45	4.162,52	4.353,58	4,59	4,59	4,59
CONCRETO DE 5.000 P.S.I PREMEZCLADO	dic-89	C50	4.247,16	4.442,11	4,59	4,59	4,59
CONDUCTORES DE COBRE	dic-97	CC	5.547,65	5.562,10	0,26	0,26	-4,71
DRYWALL	dic-23	DWL	104,21	104,01	-0,19	-0,19	-0,07
ELEMENTOS METALICOS	dic-89	E.M.	2.345,11	2.345,11	0,00	0,00	11,97
EQUIPO BASICO	dic-98	EB	540,31	540,31	0,00	0,00	-7,86
EQUIPO DE ELEVACION	dic-23	ELE	109,49	109,49	0,00	0,00	-4,00
EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	dic-89	EQO	2.591,08	2.591,08	0,00	0,00	-4,70
EQUIPO PARA EDIFICACION	dic-89	EQE	1.555,57	1.569,89	0,92	0,92	17,63
EQUIPO PARA EXCAVACION EN ROCA	dic-98	EER	441,32	441,32	0,00	0,00	-6,31
EQUIPO PARA IMPRIMACION Y PAVIMENTO ASFA	dic-98	EIPA	299,60	299,60	0,00	0,00	5,14
EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA	dic-98	EMT	551,47	551,47	0,00	0,00	-7,88
EQUIPO PARA PAVIMENTOS NO CONVENCIONAL	dic-98	EPNC	355,93	355,93	0,00	0,00	0,66
EQUIPO PARA SUBBASE Y BASE	dic-98	ESB	623,91	623,91	0,00	0,00	1,05
GABINETE ELECTRICO - SUBESTACION	dic-97	GES	408,78	402,25	-1,60	-1,60	-6,31
GAS - CENTROS DE MEDICION	dic-95	GCM	306,57	300,01	-2,14	-2,14	-3,33
GAS - RED EXTERNA POLIETILENO	dic-97	REX	644,68	644,68	0,00	0,00	-1,98
LLANTAS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA	dic-89	LL	5.950,40	5.950,40	0,00	0,00	-2,39
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	dic-89	LC	6.203,46	6.101,64	-1,64	-1,64	2,21
MANO DE OBRA ELECTRICA	dic-97	MOBE	509,13	522,80	2,68	2,68	16,50
MANO DE OBRA PARA OBRAS PUBLICAS	dic-89	MOOP	3.602,49	3.703,80	2,81	2,81	9,39
MANO DE OBRA SUBCONTRATADA EDIF.	dic-89	MOSE	5.886,36	6.217,61	5,63	5,63	8,85
MATERIALES GALVANIZADOS	dic-89	M.G.	1.548,46	1.547,18	-0,08	-0,08	11,08
MEZCLA ASFALTICA	dic-89	MAS	10.194,80	10.404,98	2,06	2,06	8,93
MOVIMIENTO DE ROCA (*)	dic-89	MR	2.321,56	2.321,56	0,00	0,00	-1,91
MOVIMIENTO DE TIERRA (*)	dic-89	MT	3.339,52	3.348,20	0,26	0,26	-3,41
PAVIMENTO ASFALTICO (CORRIDO) (*)	dic-89	PA	7.614,23	7.763,20	1,96	1,96	8,72
PAVIMENTO ASFALTICO (PARCHEO)(*)	dic-98	PAP	1.046,69	1.068,72	2,10	2,10	8,79
PAVIMENTOS DE CONCRETO (*)	dic-89	PC	2.636,92	2.758,78	4,62	4,62	5,18
POSTERIA DE CONCRETO	dic-89	PT.C.	2.580,25	2.580,25	0,00	0,00	0,31
SALIDA ELECTRICA	dic-97	SA	1.729,83	1.733,81	0,23	0,23	0,56
SUB-BASE (*)	dic-89	SB	4.019,16	4.273,14	6,32	6,32	13,40
TRANSFORMADOR	dic-89	TR	3.456,35	3.456,35	0,00	0,00	-4,48
TRANSPORTE (*)	dic-89	TRA	2.005,18	2.004,76	-0,02	-0,02	0,92
TUBERIA DE ACERO	dic-89	T.ACE.	1.649,53	1.657,16	0,46	0,46	1,90
TUBERIA DE COBRE	dic-89	T.CU.	1.182,66	1.182,66	0,00	0,00	3,10
TUBERIA DE CONCRETO REFORZADA	dic-89	TCR	2.101,31	2.101,31	0,00	0,00	9,17


(*) INCLUYE MANO DE OBRA

Este documento que contiene los Índices de Costos de la Construcción, son para uso exclusivo de la empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - ALCALDÍA DE MEDELLÍN, identificada con Nit: 8909052111. Para cualquier usuario diferente deberá ser verificada su validez.

CONCEPTO	BASE 100	CODIGO	DICIEMBRE	ENERO	VARIACION %		
					dic-25 ene-26	dic-25 ene-26	ene-25 ene-26
TUBERIA DE PRESION Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCP	7.193,60	7.266,31	1,01	1,01	7,10
TUBERIA PVC (DUCTO TELEFONICO)	dic-89	PVCT	7.694,31	7.694,31	0,00	0,00	5,00
TUBERIA PVC CORRUGADA	dic-89	PVCC	12.206,90	12.206,90	0,00	0,00	10,12
TUBERIA SANITARIA Y ACCESORIOS PVC	dic-89	PVCS	5.091,24	5.212,82	2,39	2,39	9,40
TUBERIA Y ACCESORIOS GALVANIZADOS	dic-89	T.G.	2.920,93	2.967,33	1,59	1,59	1,53
VIDRIO	dic-89	VI	1.275,26	1.275,26	0,00	0,00	-3,54
INDICES DE ADITIVOS							
CEMENTICIOS	dic-99	CEM	354,96	361,79	1,92	1,92	7,52
CEMENTOS MODIFICADOS	dic-99	CEMO	937,76	956,51	2,00	2,00	25,11
EPÓXICOS (ADHERENTES)	dic-99	EPX	577,71	583,49	1,00	1,00	13,64

CAMACOL ANTIOQUIA

VARIACIÓN ANUAL ENERO
DEL ICCV EN EL VALLE DE ABURRA
(Índices de Costos de Construcción de Viviendas)
2017 A 2026

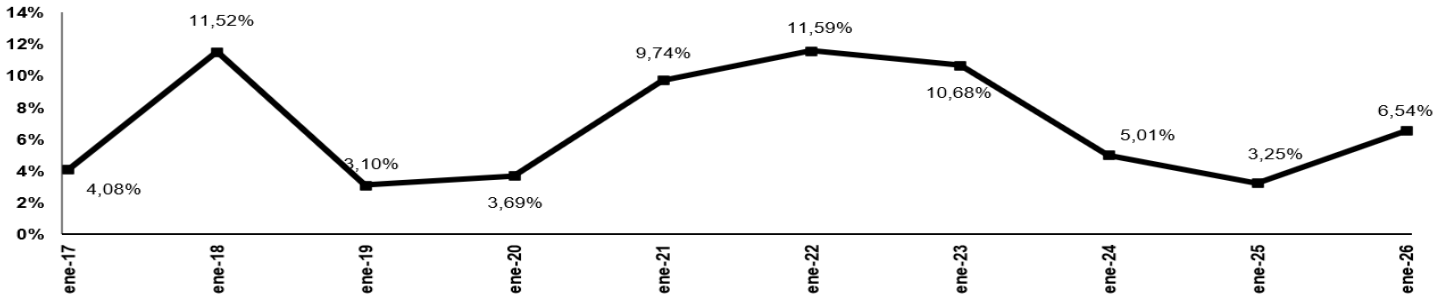

Fuente: Camacol Antioquia

ÍNDICES DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN

DEFINICIÓN

EL ÍNDICE DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN es un elemento estadístico que permite estimar el cambio promedio de los precios de los principales recursos requeridos para la edificación de viviendas, insumos básicos o actividades de construcción

El número índice es una cifra abstracta, expresada como porcentaje y se calcula con base en una participación en el costo y por la mano de obra según categorías, es decir, por aquellos elementos que conforman los costos directos. No incluye el valor del terreno. Los costos indirectos, constituidos por los gastos generales, impuestos y las utilidades, no se tomaron en cuenta por la dificultad para captar la información necesaria para elaborar el índice.

El índice en un periodo de tiempo determinado permite conocer el cambio porcentual en el costo medio de los materiales, equipo y la mano de obra en dicho periodo con relación al costo promedio de los materiales, equipo y la mano de obra en el periodo base.
La base tiene valor de 100.

USOS:

- Los índices se utilizan principalmente como instrumento para el reajuste de los contratos de obra, ya sea que estos se pacten entre particulares o entre firmas contratistas y el estado.

En los factores determinantes de los costos. Para tal efecto, la revisión debe hacerse mediante fórmulas polinómicas incorporadas en el respectivo contrato.

- Con los índices de costos se pueden hacer estimativos sobre la posible evolución de los precios de los insumos.

- Los índices permiten detectar variaciones estacionales en los precios y en consecuencia preveer periodos de escasez o alzas relativas al grupo de insumos estudiados.

- En la elaboración de cuentas nacionales, los índices de costos se emplean para deflactar o ajustar el valor bruto de la producción del sector a precios constantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los precios incluyen el impuesto a las ventas, excepto los que expresamente estipule la ley con excepción. Los precios son de lista y no se considera ningún descuento.

La Vivienda Unifamiliar se divide en tres tipos según su costo: mínimo, medio y completo. La Vivienda Multifamiliar según su estructura hasta cinco pisos y más de cinco pisos.

- Los precios de los materiales como el cemento, los agregados minerales, bloques de concreto, los ladrillos, etc. No incluyen valor del transporte.

ANEXO 20. CERTIFICADO DE NO SUB-CONTRATACION

Medellín, Antioquia, 28 de Febrero de 2026

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Calle 44 # 52 165
Medellín, Antioquia

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

106 - 2026

Asunto. Certificación de inexistencia de subcontratos en la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, para el periodo comprendido entre el **01 de Febrero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026.**


En mi calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, identificado como JORGE TRUJILLO NIÑO, mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía No. 13.893.413 de Barrancabermeja, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN **NO** ha suscrito, celebrado ni ejecutado ningún tipo de subcontrato con terceros para el desarrollo del **Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025**, cuyo objeto es: "Realizar el mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín para el periodo comprendido entre el **01 de Febrero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026**."

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 19 – Independencia del Contratista y la Cláusula 20 – Inexistencia de relación laboral entre la Entidad y el Contratista del mencionado contrato, dejando constancia de que todas las actividades, obligaciones y compromisos contractuales han sido ejecutados directamente por la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, sin que haya existido delegación, cesión o subcontratación alguna.

La presente se expide a solicitud de los interesados, para los fines pertinentes.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Veintiocho (28)** día del mes de **Febrero** de **2026**.

Cordialmente,



JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN

ANEXO 21.

CERTIFICADO DE REUTILIZACION DE AGUAS LLUVIAS

Medellín, Antioquia, 28 de Febrero de 2026

Ingenieros

MARTA LUCÍA SUÁREZ GÓMEZ
Directora de interventoría

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
R/L CONSORCIO INT FAROL MED 2025
Interventor - Contrato de Interventoría N° 4600105599 de 2025
Correo: consorciofarolmed@kalpaingenieria.com.co

MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Profesional Especializado - Unidad de Circulación
Supervisor Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025
Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín
Correo: marioa.perez@medellin.gov.co

107 - 2026

Asunto. Certificación de implementación de sistema de recolección de aguas lluvias – Plan de Sostenibilidad Ambiental para la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025.

Por medio de la presente, la UNIÓN TEMPORAL SIT MEDELLÍN, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N° 4600105555 de 2025, se permite certificar que, para la vigencia comprendida entre el **01 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026**, se evidenció avance en la implementación y optimización del sistema de recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, en cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Plan de Sostenibilidad Ambiental del proyecto.

Durante el periodo anteriormente ejecutado (01 de enero al 31 de enero de 2026), se identificó que las aguas recolectadas presentaban condiciones lodosas asociadas principalmente a sedimentos provenientes del contacto con canaletas, bajantes y superficies de captación. En atención a dicho diagnóstico técnico, durante el mes de febrero se adelantaron acciones correctivas y de mejora, consistentes en:

- Implementación de rutinas periódicas de limpieza en puntos de captación y conducción.
- Optimización de los procesos de filtrado primario y manejo de sedimentos en los sistemas de almacenamiento.
- Ajustes operativos orientados a reducir la carga sólida suspendida antes del almacenamiento final.

Como resultado de las acciones ejecutadas en febrero de 2026, se ha evidenciado una mejora progresiva en la calidad del agua recuperada, lo cual permite fortalecer su aprovechamiento en actividades propias de obra y usos domésticos asociados al proyecto, contribuyendo de manera efectiva a la reducción del consumo de agua potable y al cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables.

Estas acciones ratifican el compromiso del contratista con la gestión eficiente del recurso hídrico y con la implementación continua de medidas de sostenibilidad ambiental dentro del desarrollo contractual.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes dentro del seguimiento ambiental del contrato.

Dada en Medellín, Antioquia, se expide el presente documento a los **Veintiocho (28)** día del mes de **Febrero** de **2026**

Cordialmente,

JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C 13.893.413 de Barrancabermeja
R/L. UNION TEMPORAL SIT MEDELLIN
Proyectaron. Ing. Miguel Angel Osorio Gomez – Director de Obra UT SIT MEDELLIN
Ing. Carlos Alberto Diaz Peña – Residente de Obra UT SIT MEDELLIN

ANEXO 22.

CERTIFICADO DE MADRE CABEZA DE FAMILIA

Notaría Décima de Medellín

DECLARACIÓN JURADA CON FINES EXTRAPROCESALES

N.º DEX 2025 – 1.707

EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, REPÚBLICA DE COLOMBIA, A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), AL DESPACHO DE LA NOTARIA DÉCIMA (10ª) DE MEDELLÍN, CUYO NOTARIO TITULAR ES EL DOCTOR **ELIFONSO CARDONA SANTANA,** CON EL FIN DE RENDIR DECLARACIÓN CON FINES EXTRAPROCESALES DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1557 DE 1989. PREVIA IMPOSICIÓN DEL CONTENIDO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES* CONFORME AL ART. 7º DEL DECRETO 0019 DEL 2012 (SUPRESIÓN DE TRAMITES), ART. 188 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, ART. 442 DEL CÓD1GO PENAL Y ART. 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, COMPARECEN LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE IDENTIFICAN Y MANIFIESTAN: ----------

*** MIS NOMBRES Y APELLIDOS SON: **LAURA MARCELA PADILLA GIRALDO**, ME IDENTIFICO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **1.017.221.580**, MI ESTADO CIVIL **SOLTERA,** MI ACTIVIDAD ECONÓMICA **EMPLEADA,** MI LUGAR DE RESIDENCIA **CRA 9 NRO 56-56 BARRIO CAICEDO MEDELLÍN,** MI TELÉFONO DE CONTACTO **3245181814,** Y LOS NOMBRES DE MIS PADRES SON: **PAUL PADILA Y EDITH GIRALDO** ----------

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: * * *

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.221.580



Apellidos
PADILLA GIRALDO

Nombres
LAURA MARCELA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.66	F
Fecha de nacimiento	G.S.	
29 JUL 1994	O+	

Lugar de nacimiento
PALMIRA (VALLE)

Fecha y lugar de expedición
10 AGO 2012, MEDELLIN

Firma
Laura MPG

Fecha de expiración
18 ENE 2034

.CO

037809496

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL037809496201001<<<<<<<<<<<
9407299F3401181COL1017221580<1
PADILLA<GIRALDO<<LAURA<MARCELA
