ARAMCO
INGENIEROS

INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA NO. 10

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.597.963-8

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025






PERIODO COMPRENDIDO
DESDE 1 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró: Componentes Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico	Ing. BRYAN FELIPE AVILÉS RAMÍREZ Supervisor de Obra	
Revisó: Componentes Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico	Ing. KAREN DAYANA ROJAS ROJAS Profesional de Gestión Técnica y de Proyectos	
Elaboró: Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ing. CRISTINA MARCELA RUBIO MUÑOZ Profesional SST	
Revisó: Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ing. BRAYAN FERNANDO SANABRIA VEGA Profesional de Gestión Integrada HSEQ	
Revisó y Aprobó: Informe Consolidado y Anexos	Ing. ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA Representante Legal	

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 4
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
   2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 5
   2.2. SITUACIÓN ACTUAL POR INTERVENIR 6
3. INFORME TÉCNICO 8
   3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2026 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026 8
   3.5. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS 26
   3.6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 28
   3.7. COMPARACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO 28
4. INFORME ADMINISTRATIVO 29
   4.1. RELACIÓN DE ACTAS 29
   4.2. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA Y MUNICIPIO 29
5. INFORME FINANCIERO 32
   5.1. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO MENSUAL 32
   5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS 49
6. INFORME JURÍDICO 50
   6.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 50
7. CONCLUSIONES 52

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

1. INTRODUCCIÓN

Los acueductos y las obras de infraestructura que garantizan el acceso al agua potable son fundamentales para el desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente aquellas cuyos sistemas han quedado obsoletos con el paso del tiempo. La falta de acceso a agua limpia y segura no solo limita la calidad de vida, sino que también desencadena problemas graves de salud pública, como enfermedades gastrointestinales, infecciones y desnutrición, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Es responsabilidad del Estado priorizar estas inversiones, no solo para cumplir con el derecho esencial al agua potable, sino también para promover la equidad social, reducir las desigualdades y asegurar un entorno más saludable y digno para toda la población. La modernización de estas estructuras es más que una necesidad técnica: es un compromiso con la justicia social y el progreso humano.

Acorde con lo anterior, la CORPORACIÓN NASA KIWE, en la actualidad ejecuta el proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE" identificado con BPIN 202400000000040. De este propósito resultó la celebración del Contrato de Obra Pública No. 052 de 2025 suscrito el 22 de abril de 2025 con la Sociedad ARAMCO INGENIEROS S.A.S. identificada con NIT. 901.597.963-8 el cual tiene por objeto llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025 con un periodo máximo de ejecución estimado desde la firma del Acta de Inicio y hasta el 30 de marzo de 2026, dentro del cual se tiene contemplada la obligación del Contratista de presentar Informes de ejecución Mensual en los componentes técnico, administrativo y financiero desarrollados en el periodo de ejecución.

De conformidad con lo estipulado en el Contrato y sus Anexos, en el presente Informe se relaciona lo pertinente en cuanto al cumplimiento del Objeto Contractual en el periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2026 y 28 de Febrero de 2026, se detallan las actividades realizadas, recursos empleados, hitos alcanzados y las dificultades encontradas, todo lo anterior teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Construcción vigentes en el País y los parámetros dados por la Entidad Estatal para la ejecución de las Obras de Construcción, proporcionando así una visión integral del estado actual del proyecto y sirviendo como herramienta de seguimiento y evaluación para los diferentes actores involucrados.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.597.963-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA C.C. 1.081.415.530 DE LA PLATA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 SUR NO. 9 – 13, APTO 201, EL PORTAL II ETAPA LA PLATA, HUILA
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE $ 462.896.150,00
PLAZO INICIAL:	DESDE FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA NO. 1:	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026
PRORROGA NO. 2:	HASTA EL 30 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR:	ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ ASESOR ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DE 2026

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Páez, ubicado en el Departamento del Cauca, a 130 kilómetros de Popayán, ciudad capital del Departamento. La cabecera municipal se localiza a 2°38’49” Latitud Norte, 75°58’18” Longitud Oeste y 1380 msnm.

Ilustración 1. Localización Geográfica de Páez en el Departamento del Cauca y Colombia



La localidad de Aránzazu se encuentra ubicada en el territorio del Resguardo Indígena de Ricaurte, reconocido por su riqueza cultural y su diversidad étnica. Se distancia en aproximadamente 29,3 Km

de la Cabecera Municipal de Páez (Belalcázar) a la cual se llega tomando la Ruta 37 desde el Municipio de La Plata, en el Departamento del Huila. Esta zona se encuentra bajo administración indígena y cuenta con una estructura organizativa propia, lo que requiere una coordinación constante con las autoridades tradicionales del resguardo para la ejecución de las actividades del proyecto. El territorio presenta características geográficas propias de la región andina, con terrenos de topografía irregular y acceso mediante vías terciarias.

Ilustración 2. Imagen Satelital Localización PTAP Localidad Aránzazu



2.2. SITUACIÓN ACTUAL POR INTERVENIR

La localidad de Aránzazu enfrenta una problemática crítica en relación con la obsolescencia y el deterioro de su infraestructura hidráulica. Las actuales redes de conducción y distribución presentan un desgaste significativo, limitando su capacidad operativa para asegurar un suministro confiable y continuo de agua potable a las 60 familias de la comunidad. De igual manera, las estructuras destinadas al tratamiento del agua, incluyendo las unidades de captación, aducción y desarenación, han superado su ciclo de vida útil, resultando en deficiencias en la calidad del recurso hídrico proveniente de la microcuenca abastecedora. La intervención proyectada incluye la renovación integral de las redes deterioradas, la implementación de unidades de tratamiento avanzadas (filtros gruesos dinámicos, filtros de flujo ascendente y filtros lentos en arena), así como la construcción de nuevas estructuras de almacenamiento para optimizar la operación del sistema.

	
Ilustración 3. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP	*Ilustración 4. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP*
	
Ilustración 5. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP	*Ilustración 6. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP*

El área tiene una topografía irregular con predominancia de terrenos montañosos y acceso limitado a través de vías terciarias, lo que genera desafíos logísticos para el transporte de materiales y equipos. Además, debido a que es un territorio ancestral bajo administración indígena, cualquier intervención requiere concertación previa con las autoridades tradicionales del resguardo, quienes participan en el proceso de planificación y ejecución del proyecto.

Se ha realizado un reconocimiento preliminar del terreno, en el cual se identificaron los puntos críticos a intervenir, incluyendo el trazado para la conducción, las zonas para instalación de estructuras de tratamiento y las áreas previstas para las acometidas domiciliarias. La intervención proyectada tiene como objetivo garantizar el acceso sostenible y de calidad al agua potable, respetando el contexto cultural, social y ambiental del territorio.

3. INFORME TÉCNICO

El sitio donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicado a un costado de la Cordillera Central, para acceder a él se debe transitar el Tramo 3701 de la Ruta Nacional 37 que comunica el Municipio de La Plata con Guadualejo en la Transversal Huila - Cauca. Previo a llegar a este Centro Poblado, a un costado, entre el PR 68 Y PR 69 se toma un desvío hacia la localidad de Aránzazu. Previo al inicio de las obras se realizaron visitas en compañía de Supervisión en el sector a Intervenir con el objetivo principal de conocer las características del lugar, ubicación exacta, vecindades, accesos, áreas de trabajo y almacenamiento para conocer en la totalidad el alcance del Contrato. Habiendo transcurrido a la fecha 309 días a corte de 28 de febrero, en el sitio del proyecto se han venido realizando las actividades que se relacionan a continuación.

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2026 Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026

Durante el periodo reportado del proyecto de construcción del acueducto, se avanzó en el frente correspondiente al desarenador con la fundición del cuerpo central y cajas de entrada y salida, así como la reubicación, fijación de acero y solado de limpieza de la bocatoma. Paralelamente, en otro frente de obra ubicado en la zona de planta, se continuó con el avance en la construcción de la caseta de almacenamiento de arena, desarrollando actividades de construcción de andenes, repello e instalaciones hidrosanitarias; también se culminan actividades relacionadas con el pozo séptico. Este progreso contribuye al acondicionamiento de las áreas operativas necesarias para el sistema de tratamiento.

3.2. BOCATOMA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 14MPA PARA SOLADOS DE LIMPIEZA

Se realizó el suministro, transporte y colocación de concreto con resistencia a la compresión f'c = 14 MPa, destinado a la ejecución de solados de limpieza en la estructura de la bocatoma, con el fin de proporcionar una superficie regular, limpia y estable para el posterior desarrollo de los elementos estructurales. La actividad incluyó la preparación y verificación del área intervenida, el extendido y nivelación del concreto conforme a las cotas de diseño, así como el control del espesor especificado, garantizando condiciones adecuadas de apoyo, protección del terreno natural y cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

	
Ilustración 7. Solado de Limpieza Fundido	*Ilustración 8. Solado de Limpieza para Bocatoma*

	
Ilustración 9. Fundición de Solado de limpieza en Bocatoma	*Ilustración 10. Solado de Limpieza y Manejo de Aguas*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28MPA PARA ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCIÓN Y LOSAS DE PISOS

Se llevó a cabo el suministro, transporte y colocación de concreto con resistencia a la compresión f'c = 28 MPa, destinado a la ejecución de zapatas para muros de contención y losas de piso, conforme a los diseños estructurales del proyecto. La actividad comprendió la verificación de la formaleta y del acero de refuerzo previamente instalado, el vaciado controlado del concreto, su adecuada distribución, compactación y nivelación, asegurando el cumplimiento de las dimensiones, cotas y pendientes establecidas. Con ello se garantizó la correcta capacidad portante, estabilidad estructural y durabilidad de los elementos construidos.

	
Ilustración 11. Proceso de Fundición de Losa de Piso en Bocatoma	*Ilustración 12. Acabo Superior de Losa de Piso Fundida*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

	
Ilustración 13. Proceso de Fundición de Losa de Piso en Bocatoma	*Ilustración 14. Losa de Piso en Bocatoma Fundida*

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

Se realizó el suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo, conforme a los planos estructurales y a las especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó el despiece, doblado y armado del acero según diámetros, longitudes y geometrías definidas, así como su correcta instalación y amarre, garantizando recubrimientos, alineación y separación adecuados. Con ello se aseguró el adecuado comportamiento estructural de los elementos intervenidos, optimizando la capacidad resistente y la durabilidad de las estructuras ejecutadas.

	
Ilustración 15. Corte, figurado e instalación de acero para bocatoma	*Ilustración 16. Corte, figurado e instalación de acero para bocatoma*
	
Ilustración 17. Instalación de acero aleta de bocatoma	*Ilustración 18. Instalación de acero pantalla de bocatoma*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

3.3. ADUCCION Y VIADUCTOS

CONCRETO CICLÓPEO 60% PIEDRA Y 40% CONCRETO DE 21 MPA

Se ejecutó la colocación de concreto ciclópeo, compuesto por 60 % de piedra y 40 % de concreto con resistencia a la compresión f'c = 21 MPa, destinado a la construcción de soporte perimetral de andenes y cámaras del desarenador, conforme a los diseños y especificaciones técnicas del proyecto. La actividad incluyó la preparación de la superficie de apoyo, la disposición controlada de la piedra, el vaciado del concreto para garantizar su adecuada envoltura y compactación, así como la conformación y nivelación del elemento estructural, asegurando estabilidad, continuidad y adecuada transferencia de cargas.

	
Ilustración 19. Fundición de Ciclópeo en Caseta de Almacenamiento	*Ilustración 20. Fundición de Ciclópeo en Caseta de Almacenamiento*
	
Ilustración 21. Fundición de Ciclópeo en Cámara de Desarenador	*Ilustración 22. Fundición de Ciclópeo en Cámara de Desarenador*

3.4. DESARENADOR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 28 MPA PARA MUROS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas, se ejecutó el suministro y colocación de concreto estructural con una resistencia característica de 28 MPa para la conformación de muros. Esta actividad se realizó conforme a los diseños estructurales aprobados, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos para el vaciado, vibrado, curado y control de calidad del concreto. El proceso incluyó la verificación de las condiciones del encofrado, la correcta disposición del acero de refuerzo previamente instalado, y el cumplimiento de los parámetros de temperatura, trabajabilidad y tiempo de fraguado del concreto. La ejecución fue supervisada para garantizar la continuidad de los elementos, la adecuada compactación del material y la obtención de superficies

uniformes, resistentes y durables, en concordancia con los requisitos técnicos y normativos aplicables al proyecto.

	
Ilustración 23. Proceso de Fundición Cuerpo de Desarenador	*Ilustración 24. Cuerpo Central Fundido Desarenador*
	
Ilustración 25. Cámara de Ingreso de Desarenador Fundida	*Ilustración 26. Retiro de Formaleta Desarenador*

SUM. E INST. VÁLVULA TIPO WAFER PVC 4”

Durante el periodo se realizó el suministro e instalación de una válvula tipo wafer de 4" en PVC, ubicada en la cámara de excesos del desarenador. Esta válvula cumple una función clave en el control del flujo dentro del sistema, permitiendo regular, interrumpir o redirigir el paso del agua según las necesidades operativas del proceso de tratamiento. El suministro incluyó la adquisición de la válvula y sus accesorios de montaje, asegurando que cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, especialmente en cuanto a resistencia a la presión, compatibilidad con el tipo de fluido y durabilidad en condiciones de operación continua. La instalación se llevó a cabo sobre la línea correspondiente, cuidando la correcta alineación entre bridas y el ajuste adecuado de los elementos de fijación.

	
Ilustración 27. Válvula Wafer 4" Instalada en Cámara de Excesos Desarenador	*Ilustración 28. Válvula Wafer 4" Instalada en Desarenador*

ACARREO DE MATERIALES (CEMENTO, ARENA, TRITURADO Y ACERO) AL SITIO DE LA ADUCCIÓN.

Se realizó el acarreo y suministro de materiales de construcción, incluyendo cemento, arena, material triturado y acero de refuerzo, hasta el sitio de la bocatoma, garantizando la disponibilidad oportuna de insumos para la ejecución de las actividades programadas. El traslado se efectuó conforme a las condiciones de acceso y logística del proyecto, asegurando el adecuado manejo, almacenamiento y protección de los materiales, con el fin de preservar sus propiedades físicas y mecánicas y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas.

	
Ilustración 29. Acarreo de Material por Medio de Bestias (Caballos)	*Ilustración 30. Transporte Interno y Acarreo de Material Interno hasta Sitio de Aducción*
	
Ilustración 31. Transporte Interno y Acarreo de Material Interno hasta Sitio de Interés	*Ilustración 32. Acarreo de Material por Medio de Bestias (Caballos)*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

3.4.1. CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA

EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

Durante el desarrollo del proyecto se ejecutaron las excavaciones en seco necesarias para el sistema de tratamiento individual. El material predominante en el terreno fue identificado como conglomerado, lo cual implicó un mayor esfuerzo técnico y operativo debido a su dureza y compactación natural. Las excavaciones se realizaron de forma manual, garantizando el cumplimiento de las dimensiones establecidas en el diseño, tanto en profundidad como en ancho de zanja. Este proceso fue ejecutado en seco, es decir, sin presencia significativa de agua subterránea o escorrentía superficial. La actividad se desarrolló cumpliendo con las medidas de seguridad y protección ambiental establecidas para este tipo de trabajos.

	
Ilustración 33. Excavación para Pozo Séptico	*Ilustración 34. Excavación para Pozo Séptico*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21MPA PARA PLACA DE PISO E=0.07M

Durante el periodo mencionado se ejecutó el suministro y colocación de concreto estructural de 21 MPa, destinado a la conformación de la placa de piso con espesor de 0,07 m para la caseta de almacenamiento. Previamente, se realizó la preparación del área, incluyendo limpieza, nivelación y verificación de la base, así como la instalación de formaleta perimetral según los planos del proyecto. La mezcla fue extendida y distribuida uniformemente sobre el área proyectada, después se efectuó el regleado para asegurar el espesor de diseño y se aplicó el acabado superficial correspondiente, obteniendo una superficie lisa y uniforme. Finalmente, se inició el proceso de curado con el fin de preservar la humedad del concreto y favorecer el desarrollo óptimo de su resistencia.

		
Ilustración 35. Aplicación de Concreto para Piso	*Ilustración 36. Nivelación de Piso*	*Ilustración 37. Piso en Caseta Terminado*

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO

Se ejecuta el suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo en la estructura correspondiente al sistema de tratamiento individual, de acuerdo con las dimensiones, diámetros y especificaciones establecidas en los planos estructurales. El proceso de figuración se desarrolla siguiendo las longitudes de anclaje, traslapos y dobleces indicados en el diseño, garantizando la correcta configuración estructural. Posteriormente, se procede con la instalación y amarre del acero en su posición definitiva, empleando alambre recocido para asegurar su fijación, verificando su alineación, recubrimiento nominal y separación entre barras, conforme a lo estipulado en la normativa técnica vigente.

		
Ilustración 38. Figurado de Acero para Pozo	*Ilustración 39. Instalación de Acero para Pozo*	*Ilustración 40. Instalación de Acero para Pozo*

SUM. E INST. PISO EN CERÁMICA

Durante el periodo reportado se ejecutó la instalación de piso en cerámica para la caseta de almacenamiento, conforme a las especificaciones del proyecto. Previamente, se realizó la preparación de la superficie mediante la aplicación de un mortero de nivelación 1:3 (una parte de cemento por tres de arena), garantizando una base uniforme, limpia y con la pendiente adecuada para el correcto funcionamiento del área. Posteriormente, se procedió con la colocación de la cerámica, utilizando material de pega adecuado para zonas húmedas y asegurando su correcta alineación y nivelación. Una vez instalada la cerámica, se aplicó fragua en todas las juntas, obteniendo un acabado impermeable, uniforme y resistente.

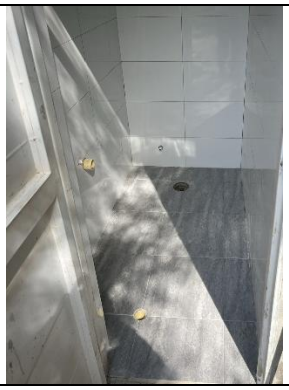
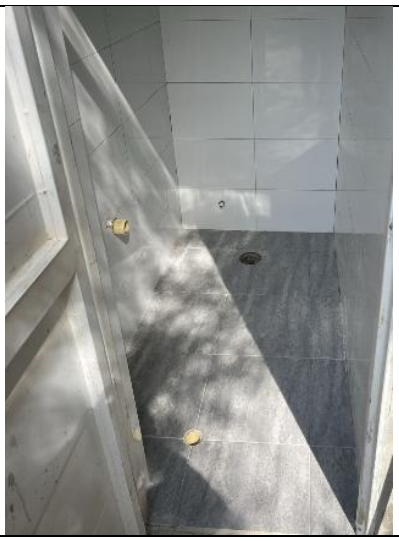
	
Ilustración 41. Piso Instalado en Caseta de Almacenamiento	*Ilustración 42. Instalación de Piso en Cerámica*

	
Ilustración 43. Instalación de Piso en Cerámica	*Ilustración 44. Instalación de Piso en Cerámica*

SUM. E INST. ENCHAPE PARED EN PORCELANA

Durante el periodo reportado se ejecutó el enchape de muros, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto para áreas interiores del baño de la caseta de almacenamiento de arena. Previamente, se prepararon las superficies mediante la aplicación de un mortero de aplome 1:3 (una parte de cemento por tres de arena), con el fin de garantizar la correcta nivelación, adherencia y verticalidad del soporte antes de colocar las piezas cerámicas.

Posteriormente, se procedió con la instalación del enchape utilizando material de pega adecuado para este tipo de revestimientos, cuidando la alineación, modulación y separación uniforme entre piezas. Finalmente, se aplicó fragua en todas las juntas, obteniendo un acabado limpio, resistente y apto para las condiciones de uso previstas. La actividad se realizó conforme a los estándares de calidad establecidos para acabados cerámicos en muros.

	
Ilustración 45. Enchape de Pared Instalado	*Ilustración 46. Enchape de Pared Instalado*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

	
Ilustración 47. Instalación de Enchape y Piso en Baño de Caseta	*Ilustración 48. Instalación de Enchape de Pared*

SUM. Y CONSTR. DE ANDENES EN CONCRETO SIMPLE DE 21MPA DE E=0.07, B=1.0M

Se realizó la construcción de andén en concreto con resistencia de 21 MPa y espesor de 7 cm. El concreto fue vaciado y nivelado, aplicando acolillado en las juntas para controlar fisuras y acabado escobillado superficial para garantizar adherencia y evitar deslizamientos. Esta actividad se ejecutó como parte del proyecto, asegurando la correcta conformación del andén y cumpliendo con las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

	
Ilustración 49. Andén Perimetral Construido	*Ilustración 50. Andén Perimetral Construido*
	
Ilustración 51. Construcción de Andenes	*Ilustración 52. Andenes de Caseta*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

SUM. E INST. TUBERÍA SANITARIA PVC D=4” TIPO PESADA

Durante el desarrollo del proyecto se llevó a cabo el suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4" tipo pesada, destinada a establecer la conexión entre la caseta de almacenamiento y el sistema de tratamiento individual. Esta tubería fue seleccionada por su resistencia mecánica, durabilidad y capacidad para soportar las condiciones propias de un sistema sanitario.

El suministro incluyó la adquisición, transporte y almacenamiento en sitio de la tubería y sus accesorios, garantizando que cumplieran con las especificaciones técnicas del diseño. La instalación se realizó conforme a los planos del proyecto, cuidando la correcta alineación, pendiente y profundidad de colocación, con el fin de asegurar un flujo eficiente y sin obstrucciones.

	
Ilustración 53. Tubería de Conexión Instalada	*Ilustración 54. Tubería de Conexión con Sistema de Tratamiento Individual*

SUM. Y CONSTR. DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 50X50

Se realizó el suministro y construcción de cajas de inspección en concreto simple de dimensiones 50 × 50 cm en la caseta de almacenamiento, destinada a las conexión hidráulica, incluyendo excavación, conformación de fondo, vaciado del concreto, levantamiento de muros y acabados, garantizando la correcta alineación, accesibilidad y funcionamiento del sistema, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

	
Ilustración 55. Caja de Inspección Fundida	*Ilustración 56. Tapa para Caja de Inspección*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

SUM. Y CONSTR. DE PUNTO SANITARIO PVC 2”

Se realizó la instalación de puntos sanitario en tubería PVC-S de 2" tipo pesado, incluyendo el suministro y colocación de accesorios necesarios para la conexión, aplicación de limpiador y soldadura para garantizar la hermeticidad y resistencia de las uniones. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones del proyecto, asegurando la correcta alineación, pendiente y fijación del sistema sanitario, cumpliendo con las normas técnicas aplicables para instalaciones hidráulicas y sanitarias.

	
Ilustración 57. Punto Sanitario Lavaplatos	*Ilustración 58. Puntos Sanitarios Caseta*

SUM. Y CONSTR. DE PUNTO SANITARIO PVC 4”

Se llevó a cabo la instalación de puntos sanitario utilizando tubería PVC-S de 4" tipo pesado, contemplando el suministro y montaje de los accesorios correspondientes, así como la aplicación de limpiador y adhesivo para asegurar uniones firmes y estancas. Esta actividad se ejecutó en cumplimiento de las especificaciones del proyecto, garantizando la correcta disposición, pendiente y fijación del sistema, conforme a las normas técnicas aplicables para redes sanitarias.

	
Ilustración 59. Punto Sanitario Inodoro	*Ilustración 60. Puntos Sanitarios Caseta*

SUM. Y CONSTR. DE RED HIDRÁULICA PVC ½”

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC-P de ½” con relación de dimensiones estándar (RDE) 13.5, destinada a la conducción de agua según el diseño del proyecto. La actividad incluyó la provisión de accesorios como uniones, así como la aplicación de limpiador y soldadura química para garantizar la hermeticidad de las conexiones. El proceso contempló el corte, alineación y ensamble

de la tubería, asegurando pendientes y trazados conforme a planos hidráulicos. Todo se ejecutó bajo las especificaciones técnicas y normativas aplicables, garantizando la funcionalidad y durabilidad del sistema.

	
Ilustración 61. Conexión de Tubería de ½" con Tubería de 2"	*Ilustración 62. Tubería de Red de ½" de Caseta de Almacenamiento*

SUM. Y CONSTR. DE PUNTO HIDRÁULICO PVC 1/2"

Durante la jornada se ejecutó el suministro e instalación del punto hidráulico en tubería PVC de 1/2", conforme a las especificaciones del proyecto y normativa técnica aplicable. La actividad inició con la verificación del trazado y la ubicación de los puntos, seguida de la preparación del área y la identificación de las líneas existentes para evitar interferencias. Posteriormente, se realizaron los cortes, ranurados y adecuaciones necesarias para la instalación de la tubería, accesorios y uniones requeridos.

	
Ilustración 63. Red Hidráulica en Caseta	*Ilustración 64. Punto Hidráulico en Lavaplatos*

3.4.2. CONEXIONES HIDRÁULICAS

SUM. Y CONSTR. DE CONCRETO DE 14 MPA PARA SOLADOS DE LIMPIEZA

Se ejecutó el solado de limpieza en las áreas de fundación del sistema de tratamiento individual, permitiendo una base uniforme para el armado de acero de refuerzo. Esta capa de concreto contribuye a evitar la contaminación del concreto estructural con el terreno natural y facilita el trazado de ejes y niveles.

	
Ilustración 65. Solado de Limpieza en Pozo de Inspección	*Ilustración 66. Solado e Instalación de Acero en Pozo de Inspección*

3.4.3. OTROS

SUM. E INST. VÁLVULA DE PURGA ¾", INCLUYE ACCESORIOS

Se ejecutó el suministro e instalación de la válvula de purga de ¾", incluyendo todos los accesorios requeridos para su correcta conexión y operación, iniciando con la verificación del punto de instalación y las condiciones de la línea existente. Se realizó el corte y adecuación de la tubería, seguido del ensamble de la válvula y accesorios mediante uniones selladas para garantizar estanqueidad. Finalmente, se efectuó la prueba de funcionamiento para comprobar el correcto cierre y apertura de la válvula, dejando la instalación operativa y conforme a las especificaciones del proyecto.

	
Ilustración 67. Suministro e Instalación de Válvula de Purga ¾"	*Ilustración 68. Suministro de Válvulas para Red de Tuberías*

SUM. E INST. DE CAJILLA REGISTRO PARA VÁLVULAS

Se realizó el suministro e instalación de la cajilla de registro para válvulas, iniciando con la ubicación y replanteo del punto de instalación según planos del proyecto. Se efectuó la excavación y adecuación del terreno para garantizar la correcta nivelación y estabilidad de la cajilla, procediendo a su posicionamiento y alineación. Posteriormente, se instalaron las conexiones y soportes necesarios para alojar adecuadamente las válvulas y facilitar su operación y mantenimiento. Finalmente, se ejecutó el relleno perimetral, compactación y limpieza del área intervenida, dejando la cajilla de registro completamente funcional y conforme a las especificaciones técnicas.

	
Ilustración 69. Instalación de Cajilla Registro sobre Red de Conexión	*Ilustración 70. Instalación de Cajilla Registro sobre Red de Conexión*

SUM. E INST. VÁLVULA DE CORTE 2”, INCLUYE ACCESORIOS

Se llevó a cabo el suministro e instalación de la válvula de corte de 2”, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta conexión y operación, iniciando con la verificación del trazado y de las condiciones de la línea existente. Se realizó el corte y adecuación de la tubería, seguido del montaje de la válvula y sus accesorios mediante uniones selladas para garantizar la estanqueidad del sistema. Posteriormente, se efectuaron pruebas de funcionamiento para confirmar el adecuado cierre y apertura de la válvula, asegurando su operatividad y cumplimiento con las especificaciones técnicas del proyecto.

	
Ilustración 71. Instalación de Válvula de Corte sobre Red de Conexión	*Ilustración 72. Instalación de Válvula de Corte sobre Red de Conexión*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.15*0.15

Se ejecutó el suministro y colocación de concreto estructural de 21 MPa para las vigas de cimentación con sección de 0,15 × 0,15 m correspondientes al pozo de inspección, iniciando con la verificación del encofrado, nivelación, alineación y habilitado del acero de refuerzo según planos y especificaciones del proyecto. El concreto fue suministrado manualmente realizando la conformación geométrica de los elementos, asegurando el cumplimiento de las dimensiones de diseño. Finalmente, se aplicaron los procedimientos de curado inicial para favorecer el desarrollo de la resistencia requerida y se dejó el elemento listo para la continuidad de las actividades del pozo de inspección.

		
Ilustración 73. Construcción de Viga de Cimentación	*Ilustración 74. Viga de Cimentación en Pozo*	*Ilustración 75. Construcción de Viga de Cimentación*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA DE PISO E=0.15M

Se realizó el suministro y colocación de concreto estructural de 21 MPa para la placa de piso con espesor de 0,15 m, iniciando con la verificación de la base, nivelación y limpieza del área a intervenir, así como la revisión del acero de refuerzo y las formaletas de borde conforme a los planos del proyecto. El concreto fue suministrado manualmente y después, se efectuó el regleado para garantizar el espesor de diseño y se aplicó el acabado superficial correspondiente. Finalmente, se inició el curado inicial con el fin de preservar la humedad del elemento y asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia especificada.

		
Ilustración 76. Construcción de Placa para Pozo	*Ilustración 77. Placa en Pozo de Inspección*	*Ilustración 78. Construcción de Placa para Pozo*

SUM. E INST. TAPA EN CONCRETO DE 1.27X0.35 E=0.07

Durante el periodo reportado se ejecutaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de las tapas en concreto para el sistema de tratamiento individual. Estas tapas fueron fabricadas con concreto de alta resistencia y un espesor uniforme de 7 cm, garantizando su capacidad estructural y durabilidad frente a las condiciones de operación. El proceso incluyó la elaboración, manejo y ubicación precisa de cada elemento, asegurando su correcta alineación con las estructuras existentes y cumpliendo con las especificaciones de los planos.

La instalación se llevó a cabo mediante procedimientos controlados que aseguraron un asentamiento adecuado y un cierre hermético del sistema, proporcionando seguridad estructural y facilidad de acceso para futuras labores de mantenimiento. Con la finalización de esta actividad se dejó completamente cerrado y protegido el sistema de tratamiento individual, optimizando su funcionamiento y asegurando la integridad de sus componentes internos.

		
Ilustración 79. Tapas de Pozo Fundidas	*Ilustración 80. Tapas de Pozo Fundidas*	*Ilustración 81. Colocación de Acero para Tapas de Pozo*

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGAS AÉREA DE 0.12X0.12

Se realizó el suministro y colocación de concreto estructural de 21 MPa para vigas de amarre del sistema de tratamiento individual, iniciando con la verificación de la base, nivelación y limpieza del área a intervenir, así como la revisión del acero de refuerzo y las formaletas de borde conforme a los planos del proyecto. El concreto fue suministrado manualmente y después se aplicó el acabado superficial correspondiente. Finalmente, se inició el curado inicial con el fin de preservar la humedad del elemento y asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia especificada.

	
Ilustración 82. Viga Aérea de Pozo Fundida	*Ilustración 83. Viga Aérea de Pozo Fundida*

REPELLO DE MUROS, COLUMNETAS Y CINTAS DE CONFINAMIENTO CON MORTERO 1:3. INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES DONDE SE REQUIERA

Se ejecutó el repello de muros, columnetas y cintas de confinamiento con mortero en proporción 1:3, correspondiente a los elementos estructurales y de cerramiento de la caseta de almacenamiento. La actividad incluyó la preparación de superficies mediante limpieza, humectación y verificación de la

adherencia base, seguido de la aplicación del mortero con llana para garantizar un acabado uniforme y de la planeidad exigida en planos. Se conformaron filos, carteras y se dejaron las juntas o dilataciones necesarias según las condiciones constructivas del área. El trabajo se realizó asegurando el correcto espesor de la capa, la continuidad de las superficies y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 84. Repello Terminado en Vista Posterior de Caseta</td><td>Ilustración 85. Repello Terminado en Vista Lateral</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Ilustración 86. Repello de Muros Internos</td><td>Ilustración 87. Repello de Muro Frontal de Caseta</td></tr>
</table>

MESÓN EN CONCRETO DE 21PA E=0.08M, ANCHO=0.50 – 0.60M. INCLUYE FORMALETA Y ACERO DE REFUERZO, 1#3 A 0.15M EN AMBOS SENTIDOS

Se ejecutó la construcción del mesón en concreto de 21 MPa, con espesor de 0,08 m y ancho de 0,60 m conforme a los planos estructurales. La actividad inició con la preparación y nivelación del área de apoyo, seguida del armado de la formaleta y la colocación del refuerzo, asegurando el recubrimiento y amarre adecuado de las barras. Posteriormente, se procedió al vaciado del concreto, garantizando su correcta compactación y logrando la conformación dimensional del elemento. Finalmente, se realizó el acabado superficial requerido y se implementaron las actividades de curado inicial para asegurar el desarrollo óptimo de la resistencia del mesón.

	
Ilustración 88. Mesón de Caseta Fundido	*Ilustración 89. Mesón de Caseta Fundido*

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATAS EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DETALLE DE PLANOS. INCLUYE GRIFERÍA, ACOPLE MANGUERA Y ACCESORIOS

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación del lavaplatos de la caseta, siguiendo las especificaciones arquitectónicas y sanitarias del proyecto. Previamente, se verificaron las dimensiones, puntos de anclaje y conexiones hidráulicas disponibles para asegurar una correcta compatibilidad y montaje del equipo.

	
Ilustración 90. Instalación de Lavaplatos en Mesón	*Ilustración 91. Lavaplatos Instalados*

3.5. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS

Durante el periodo de ejecución reportado, uno de los factores que ha generado mayor impacto negativo en el avance físico del proyecto es la logística asociada al transporte y acarreo de materiales hacia las distintas áreas de intervención. La complejidad es aún mayor debido a que, además de abastecer la zona de la planta de potabilización, actualmente se está interviniendo el sector de la bocatoma y el desarenador, ubicado a una distancia considerablemente mayor y con condiciones de acceso más restrictivas.

La topografía abrupta del terreno, caracterizada por pendientes pronunciadas, zonas inestables y ausencia total de vías aptas para tránsito vehicular, ha obligado a adoptar un esquema de transporte mixto. En este, los motocarros pueden operar únicamente hasta ciertos puntos intermedios que resultan accesibles, mientras que el tramo final, tanto hacia la planta como hacia la bocatoma y desarenador, debe realizarse exclusivamente mediante acarreo con animales de carga (bestias). Esta

situación incrementa significativamente el esfuerzo logístico, pues los puntos más alejados requieren tiempos de traslado prolongados, mayor número de viajes y una coordinación constante para evitar interrupciones en la cadena de suministro.

Estas condiciones, además de limitar severamente la capacidad de carga por desplazamiento, exponen los materiales a riesgos adicionales. El transporte sobre caminos angostos y resbaladizos, junto con la posibilidad de lluvias repentinas, incrementa la probabilidad de deterioro o pérdida parcial de insumos sensibles como el cemento, la tubería y el acero de refuerzo. En el caso particular de los tramos hacia la bocatoma, la distancia y la exigencia física del recorrido aumentan la vulnerabilidad del material y la frecuencia de recambio logístico.



Ilustración 92. Agotamiento Severo de Bestias



Ilustración 93. Retraso Generado por Reubicación de Bocatoma por Evento Invernal



Ilustración 94. Estado del Camino de Acceso



Ilustración 95. Arreglos en Camino de Acceso



Ilustración 96. Camino de Acceso en Mal Estado

No obstante, el contratista ha mantenido una postura proactiva ante estas dificultades, implementando acciones orientadas a mitigar el impacto de las limitaciones logísticas. Entre ellas se destacan la optimización de rutas de acarreo, la programación anticipada y articulada de las mingas comunitarias, la adecuación manual de ciertos tramos críticos del sendero y la evaluación de alternativas técnicas que permitan reducir la demanda de materiales en los sectores más distantes.

Se continuará trabajando de manera coordinada con la comunidad, la supervisión y los demás actores del proyecto, con el propósito de asegurar la continuidad operativa, mejorar la eficiencia en el transporte de materiales y mantener los estándares de calidad y seguridad durante la ejecución de

las obras. A pesar de las dificultades, las acciones implementadas buscan garantizar un avance progresivo y consistente hacia el cumplimiento del cronograma contractual establecido.

3.6. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Bocatoma	78,50%
2	Aducción y Viaductos	62,92%
3	Desarenador	96,73%
4	Redes de Distribución	78,40%
5	Estructura de Llegada a PTAP	100,00%
6	Filtro Grueso Dinámico FGDi	97,86%
7	Filtro Grueso Ascendente	88,48%
8	Filtro Lento en Arena	82,64%
9	Cámara de Lavado de Gravas	88,65%
10	Cámara de Lavado de Arenas	93,07%
11	Caseta de Almacenamiento de Arena	89,45%
12	Conexiones Hidráulicas	90,23%
13	Otros	100,00%
14	NO PREVISTOS	57,04%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DEL PROYECTO FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO 2026		84,70%

AVANCES POR MES O PERIODO	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUM.	VALOR MENSUAL O PERIODO
1 de Febrero de 2026 a 28 de Febrero de 2026	$ 462.896.150,00	84,70%	$ 392.087.115,00

3.7. COMPARACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	**Acum. Anterior**	**Periodo Acta**	**Acum. Periodo**	**En Días**
Programado (%)	75,11%	16,31%	91,42%	
Ejecutado (%)	74,29%	10,41%	84,70%	
Diferencia	-0,82%	-5,90%	-6,72%	-23,00
AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)				
Avance	**Acum. Anterior**	**Periodo Acta**	**Acum. Periodo**	**En %**
Programado ($)	$ 347.681,23	$ 75.498,43	$ 423.179,66	
Ejecutado ($)	$ 343.869,95	$ 48.217,17	$ 392.087,12	
Diferencia	-$ 3.811,28	-$ 27.281,26	-$ 31.092,54	-6,72%

ARAMCO
INGENIEROS

4. INFORME ADMINISTRATIVO

La carpeta contractual contiene los documentos referentes a estudios previos, CDP, RP, Acta de Inicio, Informes de Supervisión, Soportes Documentales, Aprobación de Pólizas y la fase Precontractual soportada en todos los documentos publicados en el Portal de Contratación (SECOP II). El proyecto fue adjudicado a la Sociedad ARAMCO INGENIEROS S.A.S. representada legalmente por Andrés Mauricio Ramírez Cuenca.

4.1. RELACIÓN DE ACTAS

Relación de las diferentes Actas: Acta de Inicio, Acta de Suspensión, Acta de Reinicio, Acta de Modificación, Acta Parcial de Obra Ejecutada, Acta de Recibo Final, Acta de Reunión, etc.

TIPO DE ACTA	NO.	FECHA
Acta de Inicio		25 de Abril de 2025
Acta de Reunión – Socialización del Proyecto con la Comunidad Beneficiaria		25 de Abril de 2025
Acta de Visita y Entrega de Sitio		25 de Abril de 2025
Acta de Visita de Obra	02	15 de Mayo de 2025
Acta de Visita de Obra	03	4 de Junio de 2025
Acta de Visita de Obra	04	19 de Junio de 2025
Acta de Visita de Obra	05	17 de Julio de 2025
Acta de Reunión – Comité Técnico Aclaración Planos y Diseños		28 de Julio de 2025
Acta de Visita de Obra	06	29 de Julio de 2025
Acta de Visita de Obra	07	08 de Agosto de 2025
Acta de Visita de Obra	08	14 de Agosto de 2025
Acta de Visita de Obra	09	4 de Septiembre de 2025
Acta de Visita de Obra	10	24 de Septiembre de 2025
Acta de Visita de Obra	11	3 de Octubre de 2025
Acta de Visita de Obra	12	23 de Octubre de 2025
Acta de Visita de Obra	13	06 de Noviembre de 2025
Acta de Visita de Obra	14	13 de Noviembre de 2025
Acta de Visita de Obra	15	03 de Diciembre de 2025
Acta de Visita de Obra	16	17 de Diciembre de 2025
Acta de Visita de Obra	17	4 de Febrero de 2025

4.2. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA Y MUNICIPIO

Relación de la diferente Correspondencia: Oficios, Solicitudes, Comunicados, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, etc.

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
21/04/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra
21/04/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Modelo de Valla Informativa y Especificaciones
02/05/2025	Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Cronograma de Obra para Ejecución del Proyecto

ARAMCO
INGENIEROS

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
16/05/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra Ajustados
19/05/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra Editables
17/06/2025	CO-052-20250617001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Mayo
24/06/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Observaciones Informe Mes de Mayo
24/06/2025	Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Respuesta Observaciones y Correcciones Informe Mes de Mayo
07/07/2025	CO-052-20250707001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Junio
10/07/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Observaciones Informe Mes de Junio
23/07/2025	CO-052-20250723001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Aclaración Observaciones Planos Hidráulicos y Estructurales
23/07/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Invitación Mesa Técnica para Aclaración Requerimientos
31/07/2025	CO-052-20250731001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Ajuste y Corrección Planos Hidráulicos y Estructurales Acorde Observaciones Técnicas Comité del 28 de Julio de 2025
15/08/2025	CO-052-20250815001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Julio
15/08/2025	CO-052-20250815002 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Aval Cambio Profesional en Seguridad y Salud Ocupacional
15/08/2025	1.12-442 Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Seguimiento y Cumplimiento Contrato de Obra 052 de 2025
25/08/2025	CO-052-20250825001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Trámite Pago Acta Parcial de Obra No. 1 – Incluye Anexos
09/09/2025	CO-052-20250909001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Agosto
23/09/2025	CO-052-20250923001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Trámite Pago Acta Parcial de Obra No. 2 – Incluye Anexos
30/09/2025	CO-052-20250930001	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Aval Cambio Supervisor de Obra
11/10/2025	CO-052-20251011001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Septiembre
29/10/2025	CO-052-20251029001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud de Prorroga al Plazo de Ejecución Contractual
06/11/2025	CO-052-20251106001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud de Prorroga al Plazo de Ejecución Contractual
15/11/2025	CO-052-20251115001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Octubre
05/12/2025	CO-052-20251205001	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Noviembre
15/12/2025	CO-052-20251215001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud Aprobación Creación Ítems No Previstos

ARAMCO
INGENIEROS

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
05/01/2026	CO-052-20260105001	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Diciembre
15/01/2026	CO-052-20260115001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Solicitud de Prorroga al Plazo de Ejecución Contractual
10/02/2026	CO-052-20260210001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Enero

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

5. INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE $ 462.896.150,00
VALOR DEL ANTICIPO:	CERO PESOS M/CTE $ 0,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	CERO PESOS M/CTE $ 0,00
SALDO DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE $ 462.896.150,00

5.1. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO MENSUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
	CAPTACION - CONDUCCIÓN - ALMACENAMIENTO Y REDES							
01	**BOCATOMA**							
1.01	Localización y replanteo obras	m2	11.67	$ 3,904.00	$ 45,560.00	11.67	$ 45,560.00	100.00%
1.02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0.30m.	m2	11.67	$ 8,257.00	$ 96,359.00	11.67	$ 96,359.00	100.00%
1.03	Manejo de quebrada que incluye desvio y encauce para trabajos en area libre	Un	1.00	$ 1,953,399.00	$ 1,953,399.00	1.00	$ 1,953,399.00	100.00%
1.04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0.00	$ 29,736.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	0.00	$ 56,497.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3.88	$ 201,777.00	$ 782,894.00	3.88	$ 782,894.00	100.00%
1.07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	0.00	$ 18,227.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10.97	$ 42,423.00	$ 465,380.00	16.35	$ 693,616.00	149.04%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
1.09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	4.15	$ 958,110.00	$ 3,976,157.00	5.21	$ 4,991,753.00	125.54%
1.10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4.87	$ 996,736.00	$ 4,854,104.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	723.21	$ 7,555.00	$ 5,463,852.00	1094.31	$ 8,267,512.00	151.31%
1.12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0.00	$ 330,845.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1.00	$ 218,275.00	$ 218,275.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6.50	$ 33,724.00	$ 219,206.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4.50	$ 46,889.00	$ 211,001.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	5.10	$ 94,384.00	$ 481,358.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	6.00	$ 90,716.00	$ 544,296.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	0.00	$ 27,042.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	23556.35	$ 100.00	$ 2,355,635.00	2411.58	$ 241,158.00	10.24%
				SUBTOTAL:	**$ 21,748,470.00**		**$ 17,072,251.00**	**78.50%**
02	**ADUCCION Y VIADUCTOS**							
2.01	Localización y replanteo tuberías	ml	40.00	$ 2,134.00	$ 85,360.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3.75	$ 29,736.00	$ 111,510.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.03	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14.00	$ 18,227.00	$ 255,178.00	0.00	$ 0.00	0.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
2.05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	2.00	$ 42,423.00	$ 84,846.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	11.57	$ 690,272.00	$ 7,986,447.00	12.87	$ 8,883,801.00	111.24%
2.07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	17.18	$ 7,555.00	$ 129,795.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	Ml	101.20	$ 26,575.00	$ 2,689,390.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	67.00	$ 20,330.00	$ 1,362,110.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.10	Sum. e inst. Tubería HD PE 10 D = 63 mm	Ml	40.00	$ 23,538.00	$ 941,520.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.11	Punto de union entre tuberia PE 63mm y tuberia PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adapatador hembra PVC	Un	2.00	$ 245,575.00	$ 491,150.00	0.00	$ 0.00	0.00%
2.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	7849.11	$ 100.00	$ 784,911.00	5051.22	$ 505,122.00	64.35%
				SUBTOTAL:	**$ 14,922,217.00**		**$ 9,388,923.00**	**62.92%**
03	**DESARENADOR**							
3.01	Localización y replanteo obras	m2	30.73	$ 3,904.00	$ 119,970.00	30.73	$ 119,970.00	100.00%
3.02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m.	m2	30.73	$ 8,257.00	$ 253,738.00	30.73	$ 253,738.00	100.00%
3.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0.00	$ 29,736.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.04	Excavación en roca en seco	m3	12.70	$ 176,555.00	$ 2,242,249.00	12.70	$ 2,242,249.00	100.00%
3.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18.63	$ 18,227.00	$ 339,569.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	0.00	$ 42,423.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	1.98	$ 958,110.00	$ 1,897,058.00	1.98	$ 1,897,058.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
3.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6.53	$ 996,736.00	$ 6,508,686.00	6.53	$ 6,508,686.00	100.00%
3.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1230.83	$ 7,555.00	$ 9,298,921.00	1230.83	$ 9,298,921.00	100.00%
3.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	13.70	$ 70,173.00	$ 961,370.00	13.70	$ 961,370.00	100.00%
3.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0.00	$ 330,845.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	8.00	$ 37,061.00	$ 296,488.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.13	Sum. e inst. Tubería PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	250.00	$ 47,510.00	$ 11,877,500.00	250.00	$ 11,877,500.00	100.00%
3.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2 1/2"	Un	5.00	$ 66,358.00	$ 331,790.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3.00	$ 69,633.00	$ 208,899.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1.00	$ 38,836.00	$ 38,836.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	0.00	$ 860,433.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1.00	$ 685,637.00	$ 685,637.00	1.00	$ 685,637.00	100.00%
3.19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	21637.80	$ 100.00	$ 2,163,780.00	21637.80	$ 2,163,780.00	100.00%
				SUBTOTAL:	**$ 37,224,491.00**		**$ 36,008,909.00**	**96.73%**
04	**REDES DE DISTRIBUCION**							
4.01	Localización y replanteo tuberías	ml	1702.00	$ 2,134.00	$ 3,632,068.00	1410.00	$ 3,008,940.00	82.84%
4.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	244.05	$ 29,736.00	$ 7,257,071.00	200.25	$ 5,954,634.00	82.05%
4.03	Excavación en roca en seco	m3	11.25	$ 176,555.00	$ 1,986,244.00	11.25	$ 1,986,244.00	100.00%
4.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	255.30	$ 18,227.00	$ 4,653,353.00	211.50	$ 3,855,011.00	82.84%
4.05	Retiro de tubería PVC existente	ml	1702.00	$ 2,568.00	$ 4,370,736.00	1564.00	$ 4,016,352.00	91.89%
4.06	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1 1/2"" RDE 21	ml	564.00	$ 20,152.00	$ 11,365,728.00	410.00	$ 8,262,320.00	72.70%
4.07	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1" RDE 21	ml	138.00	$ 9,264.00	$ 1,278,432.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.08	Conexión de acometidas existentes a nueva tuberia con Sum. e inst. de collarin de derivacion de 1"X1/2" y accesorios	Un	0.00	$ 31,277.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
4.09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	0.00	$ 48,177.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	0.00	$ 100.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	**$ 34,543,632.00**		**$ 27,083,501.00**	**78.40%**
	PLANTA DE TRATAMIENTO							
05	**ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP**							
5.01	Localización y replanteo obras	m2	7.36	$ 3,904.00	$ 28,733.00	7.36	$ 28,733.00	100.00%
5.02	Limpieza y descapote	m2	13.49	$ 8,257.00	$ 111,387.00	13.49	$ 111,387.00	100.00%
5.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	17.30	$ 29,736.00	$ 514,433.00	17.30	$ 514,433.00	100.00%
5.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	11.63	$ 18,227.00	$ 211,980.00	11.63	$ 211,980.00	100.00%
5.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.77	$ 42,423.00	$ 202,358.00	4.77	$ 202,358.00	100.00%
5.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0.45	$ 958,110.00	$ 431,149.00	0.45	$ 431,150.00	100.00%
5.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2.16	$ 996,736.00	$ 2,152,950.00	2.16	$ 2,152,950.00	100.00%
5.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	220.36	$ 7,555.00	$ 1,664,820.00	220.36	$ 1,664,820.00	100.00%
5.10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7.35	$ 65,369.00	$ 480,462.00	7.35	$ 480,462.00	100.00%
5.11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	4.00	$ 90,716.00	$ 362,864.00	4.00	$ 362,864.00	100.00%
5.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	7011.87	$ 100.00	$ 701,187.00	7011.87	$ 701,187.00	100.00%
				SUBTOTAL:	**$ 6,862,323.00**		**$ 6,862,323.00**	**100.00%**
06	**FILTRO GRUESO DINAMICO FGDi**							
6.01	Localización y replanteo obras	m2	11.27	$ 3,904.00	$ 43,998.00	11.27	$ 43,998.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
6.02	Limpieza y descapote	m2	31.03	$ 8,257.00	$ 256,215.00	31.03	$ 256,215.00	100.00%
6.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16.73	$ 29,736.00	$ 497,483.00	16.73	$ 497,483.00	100.00%
6.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	7.92	$ 18,227.00	$ 144,357.00	7.92	$ 144,358.00	100.00%
6.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7.92	$ 42,423.00	$ 335,990.00	7.92	$ 335,990.00	100.00%
6.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1.54	$ 958,110.00	$ 1,475,489.00	1.54	$ 1,475,489.00	100.00%
6.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	4.15	$ 996,736.00	$ 4,136,454.00	4.15	$ 4,136,454.00	100.00%
6.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	533.52	$ 7,555.00	$ 4,030,744.00	533.52	$ 4,030,744.00	100.00%
6.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	9.60	$ 70,173.00	$ 673,661.00	9.60	$ 673,661.00	100.00%
6.11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	788.88	$ 30,155.00	$ 23,788,676.00	788.88	$ 23,788,676.00	100.00%
6.12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	12.00	$ 21,664.00	$ 259,968.00	12.00	$ 259,968.00	100.00%
6.13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	2.00	$ 36,457.00	$ 72,914.00	2.00	$ 72,914.00	100.00%
6.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	4.40	$ 33,724.00	$ 148,386.00	4.40	$ 148,386.00	100.00%
6.15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1.20	$ 31,741.00	$ 38,089.00	1.20	$ 38,089.00	100.00%
6.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	5.50	$ 46,889.00	$ 257,890.00	5.50	$ 257,890.00	100.00%
6.17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6.00	$ 28,129.00	$ 168,774.00	6.00	$ 168,774.00	100.00%
6.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	$ 40,497.00	$ 80,994.00	2.00	$ 80,994.00	100.00%
6.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	4.00	$ 18,150.00	$ 72,600.00	4.00	$ 72,600.00	100.00%
6.20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	8.00	$ 16,937.00	$ 135,496.00	6.00	$ 101,622.00	75.00%
6.21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	0.00	$ 860,433.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2.00	$ 614,366.00	$ 1,228,732.00	2.00	$ 1,228,732.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
6.23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0.39	$ 212,406.00	$ 82,838.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6.26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	10.20	$ 65,369.00	$ 666,764.00	10.20	$ 666,764.00	100.00%
6.27	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	17001.66	$ 100.00	$ 1,700,166.00	11160.95	$ 1,116,095.00	65.65%
				SUBTOTAL:	**$ 40,462,354.00**		**$ 39,595,895.00**	**97.86%**
07	**FILTRO GRUESO ASCENDENTE**							
7.01	Localización y replanteo obras	m2	14.80	$ 3,904.00	$ 57,780.00	14.80	$ 57,779.00	100.00%
7.02	Limpieza y descapote	m2	37.49	$ 8,257.00	$ 309,555.00	37.49	$ 309,555.00	100.00%
7.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	23.92	$ 29,736.00	$ 711,285.00	23.92	$ 711,285.00	100.00%
7.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8.83	$ 18,227.00	$ 160,944.00	8.83	$ 160,944.00	100.00%
7.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	13.10	$ 42,423.00	$ 555,742.00	13.10	$ 555,741.00	100.00%
7.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2.65	$ 958,110.00	$ 2,538,991.00	2.65	$ 2,538,992.00	100.00%
7.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	10.50	$ 996,736.00	$ 10,465,728.00	10.50	$ 10,465,728.00	100.00%
7.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1346.20	$ 7,555.00	$ 10,170,541.00	1346.20	$ 10,170,541.00	100.00%
7.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	7.26	$ 70,173.00	$ 509,456.00	7.26	$ 509,456.00	100.00%
7.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0.00	$ 330,845.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	4.00	$ 37,061.00	$ 148,244.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.13	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	24.88	$ 30,155.00	$ 750,256.00	24.88	$ 750,256.00	100.00%
7.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	11.00	$ 21,664.00	$ 238,304.00	11.00	$ 238,304.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
7.15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2.00	$ 13,092.00	$ 26,184.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	4.22	$ 33,724.00	$ 142,315.00	4.22	$ 142,315.00	100.00%
7.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	8.78	$ 46,889.00	$ 411,685.00	8.78	$ 411,685.00	100.00%
7.18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	5.70	$ 37,184.00	$ 211,949.00	5.70	$ 211,949.00	100.00%
7.19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	6.00	$ 94,384.00	$ 566,304.00	6.00	$ 566,304.00	100.00%
7.20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	8.00	$ 28,129.00	$ 225,032.00	8.00	$ 225,032.00	100.00%
7.21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	8.00	$ 40,497.00	$ 323,976.00	8.00	$ 323,976.00	100.00%
7.22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	0.00	$ 90,716.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6.00	$ 33,799.00	$ 202,794.00	6.00	$ 202,794.00	100.00%
7.24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	10.00	$ 27,042.00	$ 270,420.00	10.00	$ 270,420.00	100.00%
7.25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2.00	$ 685,637.00	$ 1,371,274.00	2.00	$ 1,371,274.00	100.00%
7.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	2.07	$ 212,406.00	$ 439,681.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1.73	$ 212,406.00	$ 367,462.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1.38	$ 212,406.00	$ 293,120.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1.38	$ 212,406.00	$ 293,120.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1.38	$ 212,406.00	$ 293,120.00	0.00	$ 0.00	0.00%
7.31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	7.20	$ 65,369.00	$ 470,657.00	7.20	$ 470,657.00	100.00%
7.32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	47508.49	$ 100.00	$ 4,750,849.00	23192.24	$ 2,319,224.00	48.82%
				SUBTOTAL:	**$ 37,276,768.00**		**$ 32,984,213.00**	**88.48%**
08	**FILTRO LENTO EN ARENA**							
8.01	Localización y replanteo obras	m2	28.90	$ 3,904.00	$ 112,825.00	28.90	$ 112,825.00	100.00%
8.02	Limpieza y descapote	m2	54.87	$ 8,257.00	$ 453,062.00	54.87	$ 453,062.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
8.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	58.85	$ 29,736.00	$ 1,749,964.00	58.85	$ 1,749,964.00	100.00%
8.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	16.66	$ 18,227.00	$ 303,662.00	16.66	$ 303,662.00	100.00%
8.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	27.94	$ 42,423.00	$ 1,185,299.00	27.94	$ 1,185,299.00	100.00%
8.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	7.00	$ 958,110.00	$ 6,706,770.00	7.00	$ 6,706,770.00	100.00%
8.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	11.88	$ 996,736.00	$ 11,841,223.00	11.88	$ 11,841,224.00	100.00%
8.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2651.14	$ 7,555.00	$ 20,029,363.00	2651.14	$ 20,029,363.00	100.00%
8.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23.90	$ 70,173.00	$ 1,677,135.00	23.90	$ 1,677,135.00	100.00%
8.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	0.00	$ 330,845.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	5.28	$ 30,155.00	$ 159,218.00	5.28	$ 159,218.00	100.00%
8.13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	3.00	$ 21,664.00	$ 64,992.00	3.00	$ 64,992.00	100.00%
8.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1.00	$ 13,092.00	$ 13,092.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0.00	$ 46,889.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	30.10	$ 37,184.00	$ 1,119,238.00	30.10	$ 1,119,238.00	100.00%
8.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	9.60	$ 94,384.00	$ 906,086.00	9.60	$ 906,086.00	100.00%
8.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2.00	$ 90,716.00	$ 181,432.00	2.00	$ 181,432.00	100.00%
8.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	0.00	$ 33,799.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	14.00	$ 235,246.00	$ 3,293,444.00	12.00	$ 2,822,952.00	85.71%
8.21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	11.00	$ 27,042.00	$ 297,462.00	7.00	$ 189,294.00	63.64%
8.22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	6.00	$ 184,096.00	$ 1,104,576.00	6.00	$ 1,104,576.00	100.00%
8.23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	0.00	$ 11,242.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2.00	$ 989,693.00	$ 1,979,386.00	2.00	$ 1,979,386.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
8.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3.60	$ 212,406.00	$ 764,662.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1.14	$ 212,406.00	$ 242,142.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	19.37	$ 181,767.00	$ 3,520,827.00	0.00	$ 0.00	0.00%
8.28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	111231.67	$ 100.00	$ 11,123,167.00	42906.45	$ 4,290,645.00	38.57%
				SUBTOTAL:	**$ 68,829,027.00**		**$ 56,877,123.00**	**82.64%**
09	**CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS**							
9.01	Localización y replanteo obras	m2	1.76	$ 3,904.00	$ 6,871.00	1.76	$ 6,871.00	100.00%
9.02	Limpieza y descapote	m2	10.27	$ 8,257.00	$ 84,799.00	10.27	$ 84,799.00	100.00%
9.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	1.03	$ 29,736.00	$ 30,628.00	1.03	$ 30,628.00	100.00%
9.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1.37	$ 18,227.00	$ 24,971.00	1.37	$ 24,971.00	100.00%
9.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1.70	$ 42,423.00	$ 72,119.00	1.70	$ 72,119.00	100.00%
9.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.17	$ 958,110.00	$ 162,879.00	0.17	$ 162,879.00	100.00%
9.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.23	$ 996,736.00	$ 229,250.00	0.23	$ 229,249.00	100.00%
9.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	59.51	$ 7,555.00	$ 449,598.00	59.51	$ 449,598.00	100.00%
9.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0.00	$ 30,155.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	0.00	$ 21,664.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0.00	$ 26,792.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
9.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	10.64	$ 46,889.00	$ 498,899.00	5.04	$ 236,321.00	47.37%
9.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	14.00	$ 40,497.00	$ 566,958.00	14.00	$ 566,958.00	100.00%
9.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1.00	$ 120,782.00	$ 120,782.00	1.00	$ 120,782.00	100.00%
9.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	666.13	$ 100.00	$ 66,613.00	666.13	$ 66,613.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
				SUBTOTAL:	**$ 2,314,367.00**		**$ 2,051,789.00**	**88.65%**
10	**CAMARA DE LAVADO DE ARENAS**							
10.01	Localización y replanteo obras	m2	4.55	$ 3,904.00	$ 17,763.00	4.55	$ 17,763.00	100.00%
10.02	Limpieza y descapote	m2	24.80	$ 8,257.00	$ 204,773.00	24.80	$ 204,774.00	100.00%
10.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	2.05	$ 29,736.00	$ 60,959.00	2.05	$ 60,959.00	100.00%
10.04	Excavación en roca en seco	m3	0.00	$ 176,555.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	1.15	$ 18,227.00	$ 20,961.00	1.15	$ 20,961.00	100.00%
10.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5.46	$ 42,423.00	$ 231,630.00	5.46	$ 231,630.00	100.00%
10.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.45	$ 958,110.00	$ 431,150.00	0.45	$ 431,150.00	100.00%
10.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.71	$ 996,736.00	$ 707,682.00	0.71	$ 707,683.00	100.00%
10.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	113.10	$ 7,555.00	$ 854,470.00	113.10	$ 854,471.00	100.00%
10.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	0.00	$ 30,155.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90º x 2"	Un	0.00	$ 21,664.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	0.00	$ 26,792.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	0.00	$ 46,889.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	0.00	$ 40,497.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
10.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	5.00	$ 120,782.00	$ 603,910.00	3.00	$ 362,346.00	60.00%
10.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	3517.10	$ 100.00	$ 351,710.00	3517.10	$ 351,710.00	100.00%
	SUBTOTAL:				**$ 3,485,008.00**		**$ 3,243,447.00**	**93.07%**
11	**CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA**							
11.01	Localización y replanteo obras	m2	76.36	$ 3,904.00	$ 298,109.00	76.36	$ 298,109.00	100.00%
11.02	Limpieza y descapote	m2	76.36	$ 8,257.00	$ 630,505.00	76.36	$ 630,505.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
11.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	65.80	$ 29,736.00	$ 1,956,629.00	65.80	$ 1,956,629.00	100.00%
11.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	5.00	$ 18,227.00	$ 91,135.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5.18	$ 42,423.00	$ 219,751.00	5.18	$ 219,751.00	100.00%
11.06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1.55	$ 690,272.00	$ 1,069,921.00	1.55	$ 1,069,922.00	100.00%
11.07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16.57	$ 58,798.00	$ 974,282.00	16.57	$ 974,283.00	100.00%
11.08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	10.81	$ 63,682.00	$ 688,403.00	10.81	$ 688,402.00	100.00%
11.09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	0.00	$ 51,694.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	0.00	$ 69,026.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	0.00	$ 57,902.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	261.98	$ 7,555.00	$ 1,979,259.00	314.08	$ 2,372,874.00	119.89%
11.13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista.	m2	37.14	$ 97,766.00	$ 3,631,029.00	26.15	$ 2,556,581.00	70.41%
11.14	Sum. e inst. Correas metálicas en perlines 100x50x1.2 mm	ml	26.16	$ 36,301.00	$ 949,634.00	26.16	$ 949,634.00	100.00%
11.15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	17.79	$ 50,493.00	$ 898,270.00	17.79	$ 898,270.00	100.00%
11.16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1.60	$ 68,775.00	$ 110,041.00	1.60	$ 110,040.00	100.00%
11.17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	12.67	$ 93,975.00	$ 1,190,664.00	10.88	$ 1,022,448.00	85.87%
11.18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	39.42	$ 53,976.00	$ 2,127,734.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07, b=1.0m	ml	57.84	$ 81,139.00	$ 4,693,080.00	57.78	$ 4,688,211.00	99.90%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
11.20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	1.70	$ 46,889.00	$ 79,712.00	14.40	$ 675,202.00	847.05%
11.21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1.00	$ 314,589.00	$ 314,589.00	1.00	$ 314,589.00	100.00%
11.22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	3.00	$ 40,811.00	$ 122,433.00	3.00	$ 122,433.00	100.00%
11.23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	0.00	$ 50,939.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1.00	$ 63,528.00	$ 63,528.00	1.00	$ 63,528.00	100.00%
11.25	Sum. y Constr. de Red hidráulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	6.25	$ 5,305.00	$ 33,156.00	17.50	$ 92,838.00	280.00%
11.26	Sum. y Constr. de Punto hidráulico PVC 1/2"	Un	3.00	$ 34,933.00	$ 104,799.00	3.00	$ 104,799.00	100.00%
11.27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1.00	$ 360,594.00	$ 360,594.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1.00	$ 173,314.00	$ 173,314.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2.00	$ 27,111.00	$ 54,222.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1.00	$ 64,596.00	$ 64,596.00	0.00	$ 0.00	0.00%
11.31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	3.76	$ 353,989.00	$ 1,330,998.00	3.77	$ 1,334,539.00	100.27%
11.32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	5.39	$ 302,288.00	$ 1,629,332.00	5.39	$ 1,629,332.00	100.00%
11.33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	32245.02	$ 100.00	$ 3,224,502.00	32245.00	$ 3,224,500.00	100.00%
	SUBTOTAL:				**$ 29,064,221.00**		**$ 25,997,419.00**	**89.45%**
12	**CONEXIONES HIDRÁULICAS**							
12.01	Localización y replanteo tuberías	ml	23.90	$ 2,134.00	$ 51,003.00	23.90	$ 51,003.00	100.00%
12.02	Excavación en conglomerado	m3	22.75	$ 29,736.00	$ 676,494.00	22.75	$ 676,494.00	100.00%
12.03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	0.00	$ 42,910.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6.99	$ 18,227.00	$ 127,406.00	6.99	$ 127,407.00	100.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
12.05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberias	m3	2.69	$ 133,966.00	$ 360,369.00	2.69	$ 360,369.00	100.00%
12.06	Sum. e inst. de Tubería PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	23.90	$ 91,901.00	$ 2,196,434.00	23.90	$ 2,196,434.00	100.00%
12.07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	12.00	$ 370,765.00	$ 4,449,180.00	9.00	$ 3,336,885.00	75.00%
12.08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	11.91	$ 42,423.00	$ 505,258.00	11.91	$ 505,258.00	100.00%
12.09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	5.00	$ 532,400.00	$ 2,662,000.00	5.00	$ 2,662,000.00	100.00%
12.10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	6.80	$ 685,953.00	$ 4,664,480.00	6.80	$ 4,664,480.00	100.00%
12.11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	5.00	$ 723,688.00	$ 3,618,440.00	5.00	$ 3,618,440.00	100.00%
12.12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	10.00	$ 37,061.00	$ 370,610.00	0.00	$ 0.00	0.00%
12.13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	26086.24	$ 100.00	$ 2,608,624.00	19130.26	$ 1,913,026.00	73.33%
	SUBTOTAL:				**$ 22,290,298.00**		**$ 20,111,795.00**	**90.23%**
13	**OTROS**							
13.01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1.00	$ 2,029,412.00	$ 2,029,412.00	1.00	$ 2,029,412.00	100.00%
	SUBTOTAL:				**$ 2,029,412.00**		**$ 2,029,412.00**	**100.00%**
14	**NO PREVISTOS**							

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
NP-01	Suministro e instalación de Caballete de fibrocemento. Incluye amarras, andamios y elementos de seguridad para el personal.	ML	4.36	$ 51,995.00	$ 226,698.00	4.36	$ 226,698.00	100.00%
NP-02	Sum. e Inst. Vertedero de control triangular (Material Acrilico minimo 1,0 cm de espesor)	Un	2.00	$ 277,254.00	$ 554,508.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-03	Sum. e Inst. Tapa en Lámina de Alfajor	m2	9.29	$ 379,860.00	$ 3,528,899.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-04	Sum. e inst. Buje presión PVC 4x3"	Un	6.00	$ 39,506.00	$ 237,036.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-05	Sum. e inst. cuello de ganso	Un	2.00	$ 362,479.00	$ 724,958.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-06	Sum. e inst. Unión PVC 6"	Un	9.00	$ 46,946.00	$ 422,514.00	9.00	$ 422,514.00	100.00%
NP-07	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x45°	Un	7.00	$ 70,946.00	$ 496,622.00	7.00	$ 496,622.00	100.00%
NP-08	Sum. e inst. Yee sanitaria PVC 6"	Un	1.00	$ 123,046.00	$ 123,046.00	1.00	$ 123,046.00	100.00%
NP-09	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x45°	Un	4.00	$ 18,942.00	$ 75,768.00	4.00	$ 75,768.00	100.00%
NP-10	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x45°	Un	2.00	$ 13,042.00	$ 26,084.00	1.00	$ 13,042.00	50.00%
NP-11	Sum. e inst. Codo presión PVC D = 2"x45°	Un	8.00	$ 14,859.00	$ 118,872.00	8.00	$ 118,872.00	100.00%
NP-12	Sum. e inst. Unión presión PVC 2"	Un	11.00	$ 7,859.00	$ 86,449.00	11.00	$ 86,449.00	100.00%
NP-13	Sum. e inst. Unión presión PVC 3"	Un	4.00	$ 25,140.00	$ 100,560.00	2.00	$ 50,280.00	50.00%
NP-14	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 4"	Un	6.00	$ 12,699.00	$ 76,194.00	6.00	$ 76,194.00	100.00%
NP-15	Sum. e inst. Unión Sanitaria PVC 3"	Un	8.00	$ 8,706.00	$ 69,648.00	6.00	$ 52,236.00	75.00%
NP-16	Sum. e inst. Tee PVC Presión 3"	Un	2.00	$ 65,042.00	$ 130,084.00	2.00	$ 130,084.00	100.00%
NP-17	Sum. e inst. Tee PVC Sanitaria 6"	Un	2.00	$ 147,734.00	$ 295,468.00	2.00	$ 295,468.00	100.00%
NP-18	Sum. e inst. Válvula Compuerta 1 1/2", incluye accesorios	Un	1.00	$ 120,434.00	$ 120,434.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-19	Sum. e inst. Válvula Ventosa 3/4", incluye accesorios	Un	3.00	$ 189,372.00	$ 568,116.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-20	Sum. e inst. Válvula de Purga 3/4", incluye accesorios	Un	3.00	$ 100,395.00	$ 301,185.00	3.00	$ 301,185.00	100.00%
NP-21	Sum. e inst. de Cajilla Registro para Válvulas	Un	16.00	$ 82,341.00	$ 1,317,456.00	3.00	$ 247,023.00	18.75%
NP-22	Sum. e inst. Codo PVC Presión 3"	Un	4.00	$ 45,042.00	$ 180,168.00	2.00	$ 90,084.00	50.00%
NP-23	Sum. e inst. Tubo PVC Presión D=3"	Un	5.60	$ 39,042.00	$ 218,635.00	5.60	$ 218,635.00	100.00%
NP-24	Anclaje para Tubería @ 1m	Un	40.00	$ 43,114.00	$ 1,724,560.00	0.00	$ 0.00	0.00%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
NP-25	Sum. e inst. Válvula de Corte 1/2", incluye accesorios	Un	6.00	$ 27,247.00	$ 163,482.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-26	Sum. e inst. Caja Registro para Válvulas 40x40	Un	2.00	$ 183,541.00	$ 367,082.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-27	Sum. e inst. Válvula de Corte 2", incluye accesorios	Un	2.00	$ 171,714.00	$ 343,428.00	2.00	$ 343,428.00	100.00%
NP-28	Sum. e inst. Válvula Corte 1 1/2", incluye accesorios	Un	4.00	$ 113,434.00	$ 453,736.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-29	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 4", incluye accesorios	Un	1.00	$ 1,051,622.00	$ 1,051,622.00	1.00	$ 1,051,622.00	100.00%
NP-30	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2 1/2", incluye accesorios	Un	3.00	$ 467,790.00	$ 1,403,370.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NP-31	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 3", incluye accesorios	Un	2.00	$ 658,308.00	$ 1,316,616.00	2.00	$ 1,316,616.00	100.00%
NP-32	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.12X0.2	ml	20.45	$ 58,703.00	$ 1,200,476.00	20.45	$ 1,200,476.00	100.00%
NP-33	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cinta de coronación de 0.1x0.12	ml	13.85	$ 49,804.00	$ 689,785.00	13.85	$ 689,785.00	100.00%
NP-34	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.15X0.15	ml	8.63	$ 50,529.00	$ 436,065.00	8.63	$ 436,065.00	100.00%
NP-35	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.15m	m2	1.19	$ 158,319.00	$ 188,400.00	1.19	$ 188,400.00	100.00%
NP-36	Suministro y colocación de concreto impermeabilizado de 21 Mpa para columnas de 0.2x0.12	ml	24.80	$ 50,857.00	$ 1,261,254.00	21.80	$ 1,108,683.00	87.90%
NP-37	Sum. e inst. Tapa en concreto de 1.27x0.35 e=0.07	Un	8.00	$ 76,363.00	$ 610,904.00	8.00	$ 610,904.00	100.00%
NP-38	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas aérea de 0.12X0.12	ml	7.60	$ 51,584.00	$ 392,038.00	7.60	$ 392,038.00	100.00%
NP-39	Sum. e inst. Válvula de Compuerta 2", incluye accesorios	Un	5.00	$ 387,774.00	$ 1,938,870.00	5.00	$ 1,938,870.00	100.00%
NP-40	Repello de muros, columnetas y cintas de confinamiento con Mortero 1:3. Incluye filos, carteras y dilataciones donde se requiera.	M2	63.55	$ 36,744.00	$ 2,335,081.00	56.92	$ 2,091,468.00	89.57%
NP-41	Mesón en concreto de 21MPa e=0.08m, ancho=0.50 - 0.60 m. Incluye formaleta y acero de refuerzo, 1#3 a 0.15m en ambos sentidos.	ML	1.90	$ 266,534.00	$ 506,415.00	2.07	$ 551,725.00	108.95%

ARAMCO
INGENIEROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ACTA MODIFICACIÓN N°1				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
NP-42	Suministro e Instalación de Lavaplatos en acero inoxidable según detalle de planos. Incluye griferia, acople manguera y accesorios.	UND	1.00	$ 241,069.00	$ 241,069.00	1.00	$ 241,069.00	100.00%
	SUBTOTAL:				**$ 26,623,655.00**		**$ 15,185,349.00**	**57.04%**

	COSTO TOTAL DIRECTO				**$ 347,676,243.00**		**$ 294,492,350.00**	84.70%
	ADMINISTRACIÓN	24%			$ 83,442,298.00		$ 70,678,164.00	84.70%
	IMPREVISTOS	2%			$ 6,953,525.00		$ 5,889,847.00	84.70%
	UTILIDAD	6%			$ 20,860,575.00		$ 17,669,541.00	84.70%
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 32%				**$ 111,256,398.00**		**$ 94,237,552.00**	**84.70%**
	COSTO TOTAL SIN IVA				**$ 458,932,641.00**		**$ 388,729,902.00**	**84.70%**
	IVA (19% sobre la utilidad)				$ 3,963,509.00		$ 3,357,213.00	84.70%
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 462,896,150.00**		**$ 392,087,115.00**	**84.70%**

ARAMCO
INGENIEROS

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 462.896.150,00
Valor Adicional del Contrato	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 462.896.150,00
Valor Causado que No se Ha Pagado	$ 25.427.648,00
Valor Total Ejecutado	$ 392.087.115,00
Valor Saldo por Ejecutar	$ 70.809.035,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIÓN
Acta de Pago Parcial No. 1	25/08/2025	$ 58.956.018,00	
Acta de Pago Parcial No. 2	23/09/2025	$ 60.186.862,00	
Acta de Pago Parcial No. 3	22/10/2025	$ 40.993.079,00	
Acta de Pago Parcial No. 4	27/11/2025	$ 63.001.694,00	
Acta de Pago Parcial No. 5	22/12/2025	$ 88.155.899,00	
Acta de Pago Parcial No. 6	27/02/2026	$ 55.365.915,00	

ARAMCO
INGENIEROS

6. INFORME JURÍDICO

Para la celebración y ejecución de este contrato se aplicó la Normatividad que regula esta clase de contratos como son: Ley 80 de 1993 Artículo 42, Ley 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 4 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. Con relación a las Garantías estipuladas en el Contrato se relacionan a continuación con los amparos y su vigencia debidamente aprobadas por la Corporación Nasa Kiwe.

Los Anexos que no se relacionan a continuación comprenden cifras negativas que surgen al momento de realizar una Actualización o Modificación de las Garantías, esto no implica la Anulación o Retiro de la Póliza, sino que se presenta por situaciones de manejo en el sistema interno de cada una de las Aseguradoras.

6.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD	OBJETO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
PÓLIZAS A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 0	$ 46.289.615,00	22/04/2025	30/03/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		$ 23.144.807,50	22/04/2025	30/11/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra		$ 92.579.230,00	30/11/2025	30/11/2030
	Calidad y Correcto Funcionamiento		$ 46.289.615,00	22/04/2025	30/03/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 0	$ 284.700.000,00	22/04/2025	30/11/2025
PÓLIZAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 2	$ 46.289.615,00	25/04/2025	02/04/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		$ 23.144.807,50	25/04/2025	03/12/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra		$ 92.579.230,00	03/12/2025	03/12/2030
	Calidad y Correcto Funcionamiento		$ 46.289.615,00	25/04/2025	02/04/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 2	$ 284.700.000,00	25/04/2025	03/12/2025
PÓLIZAS A LA FIRMA DE PRÓRROGA NO. 1					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 3	$ 46.289.615,00	12/11/2025	30/05/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		$ 23.144.807,50	12/11/2025	30/01/2029

ARAMCO
INGENIEROS

ENTIDAD	OBJETO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
	Estabilidad y Calidad de la Obra		$ 92.579.230,00	30/01/2026	30/01/2031
	Calidad y Correcto Funcionamiento		$ 46.289.615,00	12/11/2025	30/05/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 3	$ 284.700.000,00	25/04/2025	30/01/2026
PÓLIZAS A LA FIRMA DE PRÓRROGA NO. 2					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 3	$ 46.289.615,00	16/01/2026	30/07/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		$ 23.144.807,50	16/01/2026	30/03/2029
	Estabilidad y Calidad de la Obra		$ 92.579.230,00	30/03/2026	30/03/2031
	Calidad y Correcto Funcionamiento		$ 46.289.615,00	16/01/2026	30/07/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 3	$ 284.700.000,00	25/04/2025	30/03/2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

7. CONCLUSIONES

A corte del 28 de febrero de 2026, el Contrato de Obra Pública No. 052 de 2025, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, presenta un avance físico ejecutado del 84,70%. Es importante resaltar que uno de los factores que más ha influido en el ritmo de ejecución corresponde a la logística de transporte de materiales, la cual se ha visto limitada por las condiciones topográficas del sector y la ausencia de vías vehiculares adecuadas para el acceso a la zona de obra. Adicionalmente, la creciente inesperada de la quebrada, un evento que no se registraba desde hace varios años, ocasionó afectaciones significativas al frente de trabajo, impactando de manera directa el cronograma de actividades.

No obstante, las labores desarrolladas y los métodos constructivos aplicados durante el periodo reportado se han ejecutado en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, con verificación y acompañamiento permanente por parte de la Entidad Contratante, garantizando así el mantenimiento de los estándares de calidad previstos para la obra.

ARAMCO
INGENIEROS

ANEXO - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.597.963-8

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025



PERIODO COMPRENDIDO
DESDE 1 DE FEBRERO DE 2026 A 28 DE FEBRERO DE 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1. RELACIÓN DE PERSONAL ESENCIAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

El contratista ha designado el siguiente personal para las actividades administrativas y técnicas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	Bryan Felipe Avilés Ramírez	1.081.417.759	Supervisor de Obra
2	Yamid Hernando Medina Salazar	12.281.348	Maestro de Obra
3	Cristina Marcela Rubio Muñoz	1.081.401.773	Profesional SST
4	Diego Armando Yasno Triana	1.081.397.892	Topógrafo

1.2. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO DEL CONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista cuenta con el siguiente personal activo para el desarrollo de las actividades propias de construcción del proyecto:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	Gildardo Gutiérrez López	12.272.753	Obrero
2	Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	1.081.411.218	Obrero
3	Cristian Hernán López Yasnó	12.283.706	Obrero
4	José Weney Oteca Perdomo	12.283.608	Obrero
5	Jesús Olmedo Pancho Pencue	1.061.222.838	Obrero

1.3. INGRESOS DE PERSONAL (FEBRERO) Y SU AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL [1]

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL	Ingreso
1	Jesús Olmedo Pancho Pencue	1.061.222.838	Obrero	Nueva EPS	Porvenir	SURA	02/02/26

1.4. RETIRO DE PERSONAL EN EL MES DE FEBRERO

Para el mes de febrero NO se retiraron colaboradores.

1.5. RELACIÓN DE PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista ha subcontratado Mano de Obra con la sociedad L.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT. 901.839.529-4 la cual cuenta con el siguiente personal activo y a disposición para el desarrollo de las actividades propias de construcción del proyecto:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	Marcos Javier Liscano Cardozo	12.274.525	Contramaestro

1.6. VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONAL ESENCIAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

[1] Sistema de seguridad social integral, cumplimiento de la Ley 100 de 1993 "CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA".

Se realiza el reporte del pago de planillas de seguridad social del personal relacionado con el Contrato de Obra No. 052 – 2025 durante el mes de febrero. Se relacionan Planillas de Seguridad Social en Anexo 1.6.1.

Nombre del Empleado	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
Bryan Felipe Avilés Ramírez	Prestación de Servicios	X		Planilla 9498652349
Yamid Hernando Medina Salazar	Prestación de Servicios	X		Planilla 6004752181
Cristina Marcela Rubio Muñoz	Prestación de Servicios	X		Planilla 9498805723
Diego Armando Yasno Triana	Prestación de Servicios	X		Planilla 36314373

PERSONAL DEL CONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre del Empleado	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
Gildardo Gutiérrez López	Obra o Labor	X		Planilla 9499641208 Ver Anexo 1.6.2
Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	Obra o Labor	X		
Cristian Hernán López Yasnó	Obra o Labor	X		
José Weney Oteca Perdomo	Obra o Labor	X		
Jesús Olmedo Pancho Pencue	Obra o Labor	X		

PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre de Empleados del Subcontratista	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
Marcos Javier Liscano Cardozo	Obra o Labor	X		Planilla 9499438482 Ver Anexo 1.6.3

1.7. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE EGRESO [2]

En el mes de enero, se realizó la toma de los exámenes de ingreso pertinentes al nuevo personal activo.

Descripción	Cumple		N/A	Número de Exámenes Realizados de Acuerdo con el Número de Empleados Contratados y Retirados												Observación / Evidencia
	SI	NO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Examen de Ingreso	X			1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.7.1
Examen Periódico			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron

[2] Exámenes médicos ocupacionales, cumplimiento de la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.2.2.18 y el Decreto 723 de 2013, Art. 18.

																exámenes periódicos.
Examen de Egreso			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron exámenes de egreso.

1.8. AFILIACIÓN A ARL, EPS, AFP Y CCF [3]

Se realiza el reporte del pago de planillas de seguridad social del personal relacionado con el Contrato de Obra No. 052 – 2025 durante el mes de febrero. Ver Anexo 1.6.2.

Descripción	Cumple		Número de Empleados por Mes											Observación / Evidencia
	SI	NO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ARL	X		4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.8.1
EPS	X		4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.8.2
AFP	X		4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.8.3
CCF	X		4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.8.4

1.9. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL [4]

El contratista para el mes de febrero actualiza la lista de entrega de los elementos de protección personal (EPP) complementario de la siguiente forma:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo	Entrega de EPP		Observación / Evidencia
				SI	NO	
1	Jesús Olmedo Pancho Pencue	1.061.222.838	Ayudante	X		Ver Anexo 1.9.1

1.10. ACCIDENTALIDAD, AUSENTISMO Y ENFERMEDADES LABORALES [5]

Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Observación / Evidencia
No. Accidentes de Trabajo	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se generaron accidentes de trabajo.
No. Accidentes de Tránsito	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se generaron accidentes de tránsito.
No. Incidentes de Trabajo	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se generaron incidentes de trabajo.
No. Ausentismo Causa Justificada	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Se generaron ausentismos con causa justificada. Ver Anexo 1.10.4

[3] Cumplimiento del Contrato de Obra No. 052 – 2025 Sección Segunda (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), numeral 4, 5, 7.
[4] Suministro de elementos de protección personal (EPP), en cumplimiento de la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.24 literal 5.
[5] Reporte de accidentes y enfermedades a la dirección, en cumplimiento con la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.1.7

No. Ausentismo Causa No Justificada	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se generaron ausentismos con causa NO justificada.
No. Casos de Enfermedad Laboral	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se presentaron casos de enfermedad laboral.
No. Casos de Enfermedad Común	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se presentaron casos de enfermedad común.

Se reporta ausencia laboral por causa justificada, evidenciando que un empleado no asistió durante 1 día por causa de asistencia a cita médica.

1.11. CAPACITACIÓN Y/O INDUCCIÓN [6]

Se impartió capacitación por parte del profesional SST al personal en obra, así mismo proporciono conocimientos para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con sus actividades, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Observación / Evidencia
No. de Empleados que reciben Inducción de SST	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.11.1.
No. de Capacitaciones y/o Charlas Realizadas en el Mes	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.11.2.

1.12. INSPECCIÓN

No.	Inspección	Número de Inspecciones	Periodo	Favorable		Observación / Evidencia
				SI	NO	
1	Inspección del Estado y Uso de los EPP	2	02/02/2026 28/02/2026	X		Ver Anexo 1.12.1
2	Inspección de Condiciones de Orden y Aseo en Obra	3		X		Ver Anexo 1.12.2
3	Inspección a Botiquines y Camillas	1		X		Ver Anexo 1.12.3

[6] Capacitación orientada a la identificación de peligros y control de riesgos, en cumplimiento con la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.11

4	Inspección de Seguridad de Mezcladora de Concreto	3		X		Ver Anexo 1.12.4

Se realizaron las inspecciones mencionadas anteriormente con el fin de identificar y corregir condiciones peligrosas y actos inseguros para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Esto implica evaluar las condiciones de trabajo, identificar riesgos, asegurar el cumplimiento de normativas y, en última instancia, promover un entorno laboral seguro y saludable.

2. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST (ANEXOS)

Anexo 1.6.1. Planilla de Seguridad Social Administrativos
Anexo 1.6.2. Planilla de Seguridad Social Empleados de Obra
Anexo 1.6.3. Planilla de Seguridad Social Subcontratista
Anexo 1.7.1. Concepto Medico Ocupacional
Anexo 1.8.1. Afiliaciones a ARL del mes de febrero 2026
Anexo 1.8.2. Afiliaciones a EPS del mes de febrero 2026
Anexo 1.8.3. Afiliaciones a AFP del mes de febrero 2026
Anexo 1.8.4. Afiliaciones a CCF del mes de febrero 2026
Anexo 1.9.1. Entrega de elementos de protección personal del mes de febrero 2026
Anexo 1.10.4. Ausentismo por causa justificada del mes de febrero 2026
Anexo 1.11.1. Inducción del mes de febrero 2026
Anexo 1.11.2. Capacitaciones y/o charlas del mes de febrero 2026
Anexo 1.12.1. Inspección del estado y uso de los EPP del mes de febrero 2026
Anexo 1.12.2. Inspección de condiciones de orden y aseo del mes de febrero 2026
Anexo 1.12.3. Inspección del botiquín y camilla del mes de febrero 2026
Anexo 1.12.4. Inspección de seguridad de mezcladora de concreto del mes de febrero 2026

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Ilustración 1. Inducción al Nuevo Personal en Obra	*Ilustración 2. Entrega de EPP al Nuevo Personal de Obra*	*Ilustración 3. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Ilustración 4. Charla de SST al Personal de Obra



Ilustración 5. Charla de SST al Personal de Obra



Ilustración 6. Charla de SST al Personal de Obra



Ilustración 7. Charla de SST al Personal de Obra



Ilustración 8. Charla de SST al Personal de Obra



Ilustración 9. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Ilustración 10. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Ilustración 11. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Ilustración 12. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra

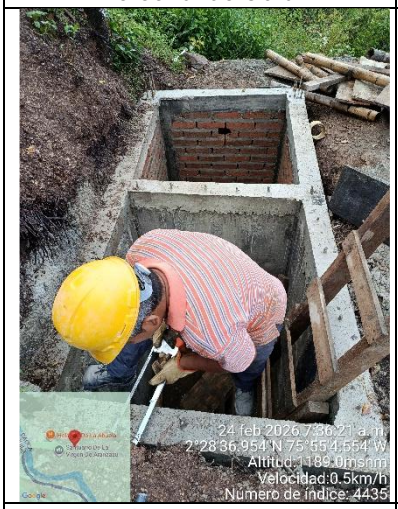


Ilustración 13. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Ilustración 14. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



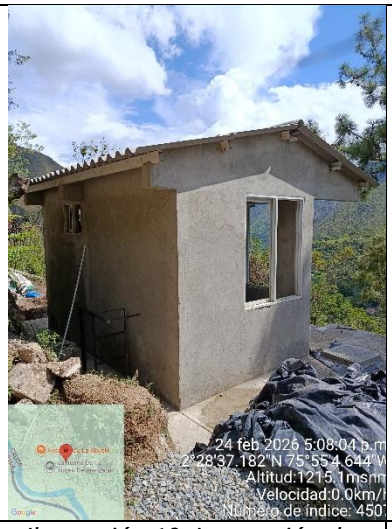
Ilustración 15. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Ilustración 16. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Ilustración 17. Inspección de Condiciones de Orden y Aseo de Obra

		
Ilustración 18. Inspección de Seguridad de la Mezcladora de Concreto en Obra	*Ilustración 19. Inspección de Condiciones de Orden y Aseo de Obra*	*Ilustración 20. Inspección de Condiciones de Orden y Aseo de Obra*
		
Ilustración 21. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra	*Ilustración 22. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra*	*Ilustración 23. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra*

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.6.1. Planilla de Seguridad Social Administrativos

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081417759		AVILES RAMIREZ BRYAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11e No 5-25	LA PLATA-HUILA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	60148766	9498652349	I	2026/02/13	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081417759	AVILES RAMIREZ BRYAN FELIPE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

ARAMCO INGENIEROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	12281348
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YAMID HERNANDO MEDINA SALAZAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA PLATA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 SUR 9 13	TELÉFONO:	3202062
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004752181	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	55526885

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1				$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 12281348	MEDINA SALAZAR YAMID HERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	12281348	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ARAMCO
INGENIEROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 12281348

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	YAMID HERNANDO MEDINA SALAZAR		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	12281348
Ciudad/Municipio	LA PLATA	Departamento	HUILA
Dirección	CALLE 2 SUR 9 13	Teléfono	3202062
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de servicios
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**6004752181**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	enero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/11
Número Autorización	55526885		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	YAMID HERNANDO	Apellidos	MEDINA SALAZAR
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	12281348
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CAUCA	Municipio	PAEZ
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
UPC Adicional	$ 0	**Total Aporte**	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Clase de Riesgo	III	Tarifa	2,436 %
Centro de Trabajo	12281348	**Total Aporte**	**$ 42.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

2026/02/11 6:51 PM USUARIO: SOI - CC12281348 PÁGINA 1 DE 1

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081401773		RUBIO MUÑOZ CRISTINA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 E N # 6-109	LA PLATA-HUILA	3153902091	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	76610107	9498805723	I	2026/02/17	2026/02/19	BANCOLOMBIA	2	$621,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1081401773	RUBIO MUÑOZ CRISTINA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$200	$0	$122,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$200	$0	$122,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				**1**	**$621,000**	**$900**	**$0**	**$621,900**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ARMANDO YASNO TRIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081397892
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-27
FECHA DE PAGO:	2026-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36314373
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36314373
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 218.900	$ 219.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 280.200	$ 281.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 42.700	$ 42.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 541.800	$ 544.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/03/2026

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.6.2. Planilla de Seguridad Social Empleados de Obra

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901597963	8	ARAMCO INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAMCO INGENIEROS SAS	CARRERA 11E NO. 5-25	LA PLATA-HUILA	3185423456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	59656525	9499641208	E	2026/02/13	2026/02/13	BANCOLOMBIA	0	$7,594,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAEZ CAUCA (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,905,600			$12,256,335	$434,300			$11,994,411	$434,300			$12,256,335	$756,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS PAEZ (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,905,600			$12,256,335	$434,300			$11,994,411	$434,300			$12,256,335	$756,100		$0	$0
Ciudad: PAEZ Depto: CAUCA (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,905,600			$12,256,335	$434,300			$11,994,411	$434,300			$12,256,335	$756,100		$0	$0
1	CC	12272753	GUTIERREZ LOPEZ GILDARDO	25-14	4	$233,454	$28,100	EPSIC3	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
2	CC	12272753	GUTIERREZ LOPEZ GILDARDO	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPSIC3	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
3	CC	1081411218	GUTIERREZ RAMOS HEYNER EFREN	230301	4	$233,454	$28,100	EPSIC3	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
4	CC	1081411218	GUTIERREZ RAMOS HEYNER EFREN	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPSIC3	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
5	CC	12283706	LOPEZ YASNO CRISTIAN HERNAN	230301	4	$233,454	$28,100	EPS037	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
6	CC	12283706	LOPEZ YASNO CRISTIAN HERNAN	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
7	CC	1062086041	OTECA RIVERA JESUS WILLIAN	25-14	4	$233,454	$28,100	EPS041	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
8	CC	1062086041	OTECA RIVERA JESUS WILLIAN	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
9	CC	12283608	OTECA PERDOMO JOSE WENEY	230301	4	$233,454	$28,100	EPS037	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
10	CC	12283608	OTECA PERDOMO JOSE WENEY	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
11	CC	1075254245	RAMIREZ VARGAS RUBEN DARIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1062083759	YAJIMBO FISUS DIEGO	230301	4	$233,454	$28,100	EPSIC3	4	$233,454	$0	CCF14	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
13	CC	1062083759	YAJIMBO FISUS DIEGO	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPSIC3	26	$1,517,451	$60,700	CCF14	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$12,256,335	$1,905,600			$12,256,335	$434,300			$11,994,411	$434,300			$12,256,335	$756,100		$0	$0

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$4,212,700	$0	$0	$4,212,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,830,700	$0	$0	$1,830,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,101,800	$0	$0	$2,101,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,390,100	$0	$0	$1,390,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$1,390,100	$0	$0	$1,390,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$986,600	$0	$0	$986,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	8	$439,000	$0	$0	$439,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$547,600	$0	$0	$547,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,004,600	$0	$0	$1,004,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$182,100	$0	$0	$182,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$509,300	$0	$0	$509,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$130,900	$0	$0	$130,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,100	$0	$0	$42,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**17**	**$7,594,000**	**$0**	**$0**	**$7,594,000**

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.6.3. Planilla de Seguridad Social Subcontratista

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839529	4	L.O. CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL L.O. CONSTRUCCIONES	CALLE 3 B SUR 4B 53	LA PLATA-HUILA	3185243456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49494644	9499438482	E	2026/02/09	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$2,711,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRAS PAEZ (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ACUEDUCTO ARANZAZU (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
Ciudad: PAEZ Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0
1	CC	12274525	LISCANO CARDOZO MARCO JAVIER	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	12279918	QUIGUAZU YASNO LUIS OVIDIO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$0	$0

ARAMCO
INGENIEROS

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$609,500	$0	$0	$609,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$609,500	$0	$0	$609,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$350,500	$0	$0	$350,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$350,500	$0	$0	$350,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**5**	**$2,711,500**	**$0**	**$0**	**$2,711,500**

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.7.1. Concepto Medico Ocupacional

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Servicios Integrales De Salud
Su salud Primero..!!

Nit. 900604369-1
Cel. 312 724 8808 - 310 273 1165
Carrera 9 N°2A- 33 - La Plata
serviciosintegralesdesaludips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 47.471

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
30 DÍA	01 MES	2026 AÑO	LA PLATA (HUILA, COLOMBIA) Ciudad	CONSULTA MEDICA OCUPACIONAL INGRESO (MEDICO)

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ARAMCO INGENIEROS S.A.S.	ARAMCO INGENIEROS S.A.S.

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
PANCHO PENCUE JESUS OLMEDO	MASCULINO	33 AÑOS 9 MESES 20 DÍAS	CC (Tipo)	1061222838 (Número)

Cargo

AYUDANTE DE CONSTRUCION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

EL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS

Observaciones: *NO APLICA*

N/A	NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL	✓	ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN SIMPLE	✓
AUDIOMETRIA SOD	✓	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	✓
MEDICION DE AGUDEZA VISUAL (VISIOMETRIA)	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS : NUTRICION , CONTROL DE PESO	SVE CARDIOVASCULAR	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO
	SVE OSTEOMUSCULAR	HACER DEPORTE
	CAPACITACIÓN : ERGONOMIA	DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 55212514 - GLORIA JIMENA HERNANDEZ

R. M.: 1384/2006 **L.S.O.:** 1376/2021

Código de Seguridad
J631P1V47471

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: PANCHO PENCUE JESUS OLMEDO

CC: 1061222838

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.8.1. Afiliaciones a ARL del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARL | sura

Medellín, 31 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARAMCO INGENIEROS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000004 ARANZAZU		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1061222838	PANCHO PENCUE JESUS OLMEDO	02/02/2026		6331tc18	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/01/2026 16:50:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 38.19.212.138, 198.143.41.49, 172.16.42.57

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.8.2. Afiliaciones a EPS del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 04/02/2026, el empleador ARAMCO INGENIEROS S.A.S identificado con NIT número 901597963 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9921103	04/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1061222838	JESUSOLMEDO PANCHO PENCUE	1750905	AYUDANTE DE OBRA	2026-02-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.8.3. Afiliaciones a AFP del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JESUS OLMEDO PANCHO PENCUE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.061.222.838**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 4 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.8.4. Afiliaciones a CCF del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CAUCA
comfacauca
al servicio del trabajador y su familia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

No. 21877

Diligencie este formulario en letra imprenta y tinta color negro

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

DEPENDIENTE		INDEPENDIENTE	Indice de Aporte 0,6%	2%	PENSIONADO	Indice de Aporte 0%	0,6%	2%
Regular	X	Regular						
Servicio Domestico		Taxista			Fidelidad 25 años			
Madre Comunitaria		Facultativos			Menos de 1.5 SMMLV			
Veteranos		Colombiano en el Exterior			Más de 1.5 SMMLV			

PARTE A — INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT): **ARAMCO INGENIEROS S.A.S.**

NIT [X] C.C [ ] T.I [ ] C.E [ ] PAS [ ] No. **901597963**

PARTE B — INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO (AÑO MES DÍA)	GÉNERO
Pancho	Pencue	Jesus	Olmedo	1992 04 10	F [ ] M [X] I [ ]

C.C [X] TJ [ ] C.E [ ] PAS [ ] CD [ ] PEP [ ] PPT [ ] VISA [ ] OTRO [ ] CUAL: No. **1061222838**

ESTADO CIVIL: [ ] SOLTERO [ ] CASADO [X] UNIÓN LIBRE [ ] VIUDO [ ] SEPARADO [ ] DIVORCIADO

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA: **ZN ARANZAZU**

SECTOR: [X] URBANO [ ] RURAL

TELÉFONO CELULAR: **3134263098**

TELÉFONO FIJO:

MUNICIPIO: **LA PLATA** | DEPARTAMENTO: **HUILA** | PAÍS: **COL**

E-MAIL: **Jesusolmedopp@gmail.com**

FACTOR DE VULNERABILIDAD

- [X] No disponible
- [ ] Cabeza de familia
- [ ] Desplazado
- [ ] Población migrante
- [ ] Ejercicio del trabajo sexual
- [ ] En condición de discapacidad
- [ ] Desmovilizado o reinsertado
- [ ] Hijos (as) de desmovilizados o reinsertados
- [ ] Damnificado desastre natural
- [ ] Hijo (as) de madres cabeza de familia
- [ ] Población zonas frontera (nacionales)
- [ ] Víctima del conflicto armado (no desplazado)

NIVEL EDUCATIVO

- [ ] Preescolar
- [ ] Básica
- [X] Secundaria
- [ ] Media
- [ ] Técnico / tecnológico
- [ ] Profesional universitario
- [ ] Posgrado / maestría
- [ ] Ninguno

PERTENENCIA ÉTNICA

- [ ] Afrocolombiano
- [ ] Comunidad negra
- [ ] Indígena
- [ ] Raizal del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina
- [ ] Palenquero
- [ ] Room/gitano
- [X] No disponible

ORIENTACIÓN SEXUAL: [X] Heterosexual [ ] Homosexual [ ] Bisexual [ ] Información no disponible

MUNICIPIO DONDE LABORA	SECTOR	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA (AÑO MES DÍA)	OCUPACIÓN / PROFESIÓN	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO MENSUAL
PAEZ	[ ] URBANO [X] RURAL	2026 02 02	Ayudante De Obra	220	[X] Básico [ ] Mesada Pensional — Comisiones [ ] SI [X] NO — VALOR $ 1.750.905 (Suma todos los conceptos salariales)

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR

¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA? [ ] SI [ ] NO

El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.

NOMBRE DEL BANCO | [ ] Cta. Ahorros [ ] Cta. Corriente | No. Cuenta

PARTE C — INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO (AÑO MES DÍA)	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
						F [ ] M [ ] I [ ]

C.C [ ] TJ [ ] C.E [ ] PAS [ ] CD [ ] PEP [ ] PPT [ ] VISA [ ] OTRO [ ] CUAL: No. — CONVIVEN [ ] SI [ ] NO — NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA — IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR No.

PARTE D — DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO (AÑO MES DÍA)	OCUPACIÓN/PROFESIÓN	GÉNERO
						F [ ] M [ ] I [ ]

C.C [ ] TJ [ ] C.E [ ] PAS [ ] CD [ ] PEP [ ] PPT [ ] VISA [ ] OTRO [ ] CUAL: No. — NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA — IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR No.

PARTE E — INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	FECHA DE NACIMIENTO (AÑO MES DÍA)	GENERO (F M I)	C.T. DISC	T. PARENTESCO HIJO	PDRE	HMNO	HJTR	IDENTIFICACIÓN (C.C-TI-C.E-PAS-REGISTRO CIVIL (NUP)) Tipo	Número	USO EXCLUSIVO C.C.F.C N/A

DISC: DISCAPACITADO HIJO: HIJODRE: PADRE HMNO: HERMANO HJTR: HIJASTRO

DECLARACIÓN:

Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

Conforme a lo establecido en la Ley 1581 del 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, ejercer las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

De igual manera, autorizo a COMFACAUCA, en caso que cobre cuotas monetarias a las cuales no tenga derecho, me sean descontadas de los próximos pagos de la cuota monetaria de subsidio familiar a que hubiere lugar.

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCA

RECIBE	DIGITA	REVISA Y DIGITALIZA
FECHA	FECHA	FECHA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE

ARAMCO
INGENIEROS

El empleo es de todos | Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD: AÑO | MES | DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

identificado(a) con:
C.C☐ TJ☐ C.E☐ PAS☐ CD☐ PEP☐ PPT☐ VISA☐ OTRO☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración
☐ 1. Convivencia y dependencia económica ☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre ☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres ☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a)_____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____
es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(la) señor(a) actualmente se desempeña como:
☐ Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado(a) ☐ Estudiante ☐ No labora

3. PADRES O HERMANO(S) HUÉRFANO(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(a) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni esta(n) afiliado(a)(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN		PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	TIPO	Número			

Firma del padre | Firma de la madre

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a)_____ identificado con_____ padre / madre biológico(a)
del menor_____ identificaco con_____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: la fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento

Observaciones

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación
2 ☐ Documento de identificación del trabajador.
3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.
4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.
5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.
6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.
7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.
8 ☐ Certificado de estudio o el boletin de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)
9 ☐ Certificado de discapacidad o perdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.
10 ☐ Para desafiliar a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.
11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. **Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora:** Diligenciar declaración juramentada establecida por Comfacauca y Ministerio de trabajo/ si el cónyuge es pensionado, anexar colilla de pago de la mesada.
12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personeria y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policia)
13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)
14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.
15 ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconoce la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábana pensional (Fondos Privados)
Copia del **último desprendible de pago**, para pensionados hasta 1.5 SMMLV y Mayores 1.5 SMMLV.
16 ☐ Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.
17 ☐ Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja
18 ☐ Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.
19 ☐ Certificación veteranos
20 ☐ Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora
21 ☐ Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales							
Dependiente	1	2						
Independiente	1	2	16	17	21			
Pensionado	1	2	15	16	17			
Veterano	1	2	19					
Madres comunitarias	1	2	21	20				
Facultativos	1	2	21					

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0,6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)								
Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3							
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11	
Conyuge/compañero(a) permanente e hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11	
Hijos no reconocidos por uno de los padres (menores en cuyo registro civil figure únicamente uno de los padres.)	6	7	8	9				
Padres.	4	5	9	10	13	18		
Hermanos huerfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14	

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.9.1. Entrega de EPP del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO INGENIEROS	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **FORMATO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**	Código: FO-HSEQ-001 Fecha: 01/06/2025 Versión: 02

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ, DPTO. DEL CAUCA. | **Lugar de Trabajo:** Aranzazú

NOMBRE DE COLABORADOR: Jesús Olmedo Pancho Peacue **CÉDULA:** 1.061.222.838 **CARGO:** Ofcpal.

TIPO			DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO		CANT	UND	FECHA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE	OBSERVACIONES
DOT	EPP	OTROS			Nuevo	Usado						
	X		Casco Amarillo	Case Eyes	X		1		02/02/26	Brayan Fernando		
	X		Guantes de Vaqueta		X		1		02/02/26	Brayan Fernando		
	X		Gafas Transparentes		X		1		02/02/26	Brayan Fernando		
	X		Tapa Oidos de Inser.		X		1		02/02/26	Brayan Fernando		
X			Chaleco Reflectivo		X		1		02/02/26	Brayan Fernando		

DOT: Dotación - **EPP**: Elementos de protección personal - **CANT:** Cantidad - **UND:** Unidad

NOTAS:

1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.
2. Los EPP y la dotación es exclusiva del personal que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.10.4. Ausentismo por causa justificada del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO
INGENIEROS

LA PROFESIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
DE ARAMCO INGENIEROS S.A.S

CERTIFICA QUE

En cumplimiento del Contrato de Obra 052 de 2025, para la construcción del sistema de acueducto de la localidad Aránzazu, Resguardo de Ricaurte Municipio de Páez, durante el mes de febrero de 2026 se registró el siguiente ausentismo laboral:

Periodo de Reporte: 01 febrero 2026 al 28 de febrero 2026					
No	Nombre	Cargo	Fecha	No. Hrs	Observación
1	Cristian Hernan López Yasnó	Ayudante de Obra	04/02/2026	8	Incapacidad General
			05/02/2026	8	

La presente certificación se expide el 3 de marzo de 2026 en La Plata Huila, para los fines que la parte interesada considere pertinentes.

MARIA ALEJANDRA CABRERA SARRIA
Profesional Gestión de Talento Humano

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.11.1. Inducción del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS S.A.S

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002
Fecha: 01/06/2025
Versión: 01

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción	X	Charla		DD	MM	AAAA	1 hora.
Reinducción		Capacitación		02	02	2026	LUGAR DEL EVENTO
Sensibilización		Reunión Informativa					Aranzazú

NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Cristina Marcela Rubio Muñoz	**CARGO:**	Profesional SST
TEMA DEL EVENTO:	Inducción. SG-SST.		

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA
Jesus Osmedo Pancho Pencue	1061222838	Oficial.	

OBJETIVOS

Informar y concientizar a los trabajadores (nuevos y antiguos) sobre los peligros, riesgos y medidas de prevención en su entorno laboral, promoviendo una cultura de autocuidado, el compilmiento normativo y la protección de su salud física y mental.

Brayan Fernando.
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: BRAYAN FERNANDO SANABRIA VEGA
C.C.: 1.081.415.537 de La Plata (H)

Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: Cristina Marcela Rubio Muñoz
C.C.: 1.081.407.773.

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	Jesus Amedo Poncho Penaux		
Número de Identificación	4064222838		
Lugar de Trabajo	Aranzazu		
Cargo	Oficial.	Fecha	02-02-26

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
Capacitación recibida para desempeño del Cargo: - Reglamento Interno de Trabajo. - Generalidades SST. - Contexto normativo de Riesgos Laborales. - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa. - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Políticas del SG-SST. - Política de alcohol y drogas. - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud. - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos. - Definición de COPASST Vigía SST e integrantes. - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes. - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso. - Equipo investigador de AT. - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro).			

OBSERVACIONES:

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.11.2. Capacitaciones y/o charlas en el mes de febrero de 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO
INGENIEROS S.A.S

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002
Fecha: 01/06/2025
Versión: 01

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción		Charla	X	DD	MM	AAAA	5 minutos
Reinducción		Capacitación		05	02	2026	LUGAR DEL EVENTO
Sensibilización		Reunión Informativa					Aranzazú

NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Cristina Marcela Rubio Muñoz	**CARGO:**	Profesional SST
TEMA DEL EVENTO:	Higiene del Sueño		

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA
Cristian Lopez Y	12283706	Ayudante	
Marcos Javier Liscano	12274525	Maestro	
Jose Wenceslao Otero	12283608	ayudante	
HEYNER Gutierrez	1081411218	Ayudante	
Gilberto Gutierrez L.	12272753	Ayudante	

OBJETIVOS

Mejorar la calidad de vida y el desempeño laboral de los trabajadores, reduciendo riesgos de accidentes y enfermedades, mediante la enseñanza de hábitos que optimicen el descanso, combatan la fatiga y fortalezcan la salud física y mental.

Brayan Fernando

Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: BRAYAN FERNANDO SANABRIA VEGA
C.C.: 1.081.415.537 de La Plata (H)

Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: Cristina Marcela Rubio Muñoz
C.C.: 1.081.410.773

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO
INGENIEROS S.A.S

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002
Fecha: 01/06/2025
Versión: 01

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción		Charla	X	DD	MM	AAAA	5 minutos.
Reinducción		Capacitación		09	02	2026	LUGAR DEL EVENTO
Sensibilización		Reunión Informativa					Aranzazú

NOMBRE DEL EXPOSITOR:	Cristian Marcela Rubio Muñoz	CARGO:	Profesional SST
TEMA DEL EVENTO:	Riesgo Psicosocial.		

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA
Jose Wilmey Ortega	12283608	ayudante	
Eduardo Gutierrez y	12277753	Ayudante	
Cristian Lopez y	12283706	Ayudante	
Hagner Gutierrez	1081411218	Ayudante	

OBJETIVOS

Identificar, evaluar, prevenir e intervenir factores laborales que afectan la salud mental, buscando promover el bienestar, reducir el estrés y el ausentismo.

Brayan Fernando.
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: BRAYAN FERNANDO SANABRIA VEGA
C.C.: 1.081.415.537 de La Plata (H)

Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: Cristian Marcela Rubio Muñoz
C.C.: 1.09.401.773

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.12.1. Inspección del estado y uso de los EPP en el mes de febrero de 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.

Código: FO-HSEQ-003
Fecha: 01/08/2025
Versión: 02

CONSORCIO: ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ

ÁREA/SECCIÓN: ARANZAZÚ - RESGUARDO DE RICAURTE - PÁEZ - CAUCA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 09 (D) / 02 (M) / 26 (A)

		PROTECCIÓN CABEZA						PROTECCIÓN RESPIRATORIA								PROTECCIÓN VISUAL								PROTECCIÓN DEL TRONCO								PROTEC. AUDITIVA		PROTECCIÓN DE LAS MANOS												EXTREMIDADES INFERIORES									
NOMBRE COMPLETO	CARGO	Casco clase E y G: contra impactos y contra conductores de alta tensión (hasta 20.000 volt)		Casco clase G: contra impactos y contra conductores de baja tensión (hasta 2.200 volt)		Cascos clase G sin ranuras laterales, para HO otros protección de Riesgo Eléctrico		Respirador media cara, con doble filtro para material particulado.		Respirador con filtro para vapores orgánicos y gases ácidos.		Respirador con filtro para humos metálicos.		Respirador con filtro para polvo de alta eficiencia.		Mascarilla para polvos.		Gafas en policarbonato con protección de impacto, filtro UV y protección lateral.		Gafas de seguridad con ventilación directa.		Careta para Soldar.		Anteojos para soldadura autógena o oxiacetilénica.		Protección facial.		Pantalón Impermeable.		Chaqueta impermeable.		Abrigo impermeable.		Peto de Carnaza.		Jardín de Seguridad.		Cinturón Portaherramientas.		Tipo Inserción.		Tipo Copa.		Guantes de Carnaza		Guantes de Nitrilo		Guantes de Caucho		Guantes de Vaqueta.		Guantes de hilo con puntos de PVC a una cara		Guantes de Neopreno		Guantes PVA - Alcohol de Polivinilo		Guantes PVA - Cobre de Poliamida		Guantes aislantes de la Electricidad.		Botas de Seguridad.		Botas de Caucho.		Botas de Caucho con puntera.		Polainas de Carnaza.		Botas Dieléctricas.		ACCIONES CORRECTIVAS
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	
Gildardo López	Ayudante.	S	B													S	B	S	B																							S	B																					
Heyner Ramos	Ayudat.	S	B													/		S	B																							S	B																					
Cristian López	Ayudant.	S	B													/		S	B																							S	B																					
José Oteca	Ayudant.	S	B													/		S	B																							S	B																					
Jesus Pancho	Oficial	S	B													S	B	S	B																							S	B																					
Marcos Liscano	Maestro	S	B													/		S	B																							S	B																					

U: Uso
E. Estado

Inspeccionado por: Brayan Fernando Sanabria Vega. **Cargo:** Pro F. HSEQ.

Supervisor SST: Cristian Mauricio Rubio Muñoz **Cargo:** Profesional SST

Identifique el nombre y apellido del colaborador al que se le van a inspeccionar los elementos de protección personal de acuerdo con la parte del cuerpo que está protegida o requiere protegerse, ubique específicamente el tipo de elemento de protección personal y marque:

Maque en **U** = (uso): S (si) o N (no)

Marque en **E** = (estado) : B (bueno) , M (malo)

ARAMCO
INGENIEROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ARAMCO INGENIEROS S.A.S

Código: FO-HSEQ-003
Fecha: 01/06/2025
Versión: 02

CONSORCIO: ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ

ÁREA/SECCIÓN: ARANZAZÚ - RESGUARDO DE RICAURTE - PÁEZ - CAUCA

FECHA DE LA INSPECCIÓN: D 13 | M 02 | A 26

| NOMBRE COMPLETO | CARGO | PROTECCIÓN CABEZA | | | | | | PROTECCIÓN RESPIRATORIA | | | | | | | | | | PROTECCIÓN VISUAL | | | | | | | | | | PROTECCIÓN DEL TRONCO | | | | | | | | | | PROTEG. AUDITIVA | | | | PROTECCIÓN DE LAS MANOS | | | | | | | | | | | | | | | | EXTREMIDADES INFERIORES | | | | | | | | | | ACCIONES CORRECTIVAS |
|---|---|---

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.12.2. Inspección de condiciones de orden y aseo del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO
INGENIEROS S.A.S

INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO EN OBRA

Código: FO-HSEQ-006
Fecha: 01/06/2025
Versión: 02

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
RESPONSABLE DE REALIZAR INSPECCIÓN:	Brayan Fernando Sanabria U.	**LUGAR DE TRABAJO:**	Aranzazú - Páez.			
CARGO:	Pto P. HSEQ.	**PERIODO COMPRENDIDO**	**DE** 02/02/26	**A**	28/02/26	

ASPECTOS A EVALUAR	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Áreas de almacenamiento según tipo, cantidad y manejo de materiales señalizados	X		X			/	X	
Sistema de almacenamiento / acopio de materiales	X		X			/	X	
Delimitación / Señalización / Encintado de Zonas	X		X			/	X	
Vias de acceso libres de obstaculos / Señalizadas	X		X		/		X	
Orden y Aseo interior carpas	X		X				X	
Servicios sanitarios ordenados / Limpios / Mantenimiento	N/A		N/A				N/A	
Facilidades de agua potable en sitio	N/A		N/A				N/A	
Suficientes recipientes para depósito de residuos sólidos	X		X			/	X	
Recipiente de residuos rotulados / Clasificados	X		X			/	X	
Áreas de trabajo limpias y ordenadas	X		X			/	X	
Áreas libres de retal, tablas con puntillas, etc.	X		X			/	X	
Almacenamiento de combustibles adecuado / Dique	N/A		N/A		/		N/A	
Puentes / Pasarelas Provisionales Adecuadas	N/A		N/A				N/A	
Delimitación / Señalización de excavaciones	X		X				X	
Zonas de parqueo de maquinaria / Vehículos señalizados	N/A		N/A				N/A	
Cables eléctricos sin entubar dispersos en piso	N/A		N/A				N/A	
Tomas de corriente, tableros de control señalizados	N/A		N/A				N/A	
Línea tierra / Herramientas / Equipos Eléctricos	N/A		N/A			/	N/A	
Almacenamiento de EPP	X		X			/	X	
Uso correctivo e indicado EPP / Limpieza	X		X			/	X	
Lavado y limpieza de partes de maquinaria	X		X		/		X	
Disposición de residuos sólidos	X		X		/		X	
Disponibilidad / Condiciones Extintores	X		X				X	
Almacenamiento / Uso Herramientas Manuales	X		X				X	

OTROS ASPECTOS A EVALUAR

FECHA	OBSERVACIONES
/	/

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	ACCIÓN MEJORA	RESPONSABLE
/	/	/

Profesional Encargado de Obra:

Marcos Cascano
Firma Responsable del Lugar de Trabajo
Nombre: Marcos Javier Cascano C.
C.C.: 12274525

Profesional Responsable de Inspección:

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sanabria Vega.
C.C.: 1081415537.

Profesional SST:

Firma Responsable SST
Nombre: Cristina Moreno Pabon M.
C.C.: 1.081.401.773

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.12.3. Inspección del botiquín y camilla del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO INGENIEROS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROTOCOLO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INSPECCIÓN A BOTIQUINES Y CAMILLAS	Codigo: FO-HSEQ-013 Fecha: 01/06/2025 Versión: 02

CONSORCIO:	Acueducto Aranzazú.	**LUGAR DE TRABAJO:**	Aranzazú - Páez.
FECHA DE INSPECCIÓN:	24/02/26.		

DATOS DE UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN

Área / Sección:		Ubicación: Aranzazú - Páez.	
TIPO DE BOTIQUÍN: (Marque con una (X) según corresponda)		**Fijo**		**De Brigadistas**	X

Marque con una (X) en la casilla de SI / NO según el botiquín tenga o no cada uno de los ítems relacionadas en el listado.

Antisépticos	**SI**	**NO**	**Antisépticos**	**SI**	**NO**
Yodo en Solución (1 frasco)	X		Agua oxigenada (1 frasco)		X
Isodine espuma (1 frasco)	X		Alcohol (1 frasco)	X	
Material de Curación			**Condiciones Encontradas**		
Gasa (1 caja)	X		Elementos vencidos		X
Toallas Higiénicas (4 uds)	X		Elementos deteriorados		X
Curas (10 uds)	X		Elementos no permitidos		X
Esparadrapo de tela (1 rollo)	X		**Estado**		
Micropore (2 cm de ancho)	X		Fácil acceso al botiquín?	X	
Aplicadores (10 uds)	X		Se puede disponer de él oportunamente?	X	
Bajalenguas (20 uds)	X		El botiquín de encuentra señalizado?	X	
Guantes desechables (5 pares)	X		Se evidencia botiquín en buen estado?	X	
Suero fisiológico o solución salina normal (1 bolsa)	X		El botiquín se encuentra aseado y ordenado?	X	
Tijeras (1 ud)	X		Se inspecciona periodicamente?	X	
Tapabocas (3 uds)	X				
Algodón (1 paquete)	X				
Otros Elementos					
Parches oculares (2 unidades)	X		Libreta y lapicero (1 ud)	X	
Inmovilizador miembros superiores (2 uds)		X	Frazada o cobija (1 ud)		X
Inmovilizador miembros inferiores (2 uds)		X	Linterna pequeña (1 unidad)	X	
Cuello ortopédico (1 ud)		X	Pilas (para la linterna)	X	
Vendas elásticas (2 uds - 10 cm ancho)	X		Lista de teléfonos de emergencia		X
Jeringas	X		Manual o folleto de primeros auxilios		X
Termómetro (1 ud)	X		Alcohol antiséptico (1 frasco)	X	
Camilla disponible (1 ud)	X		Silbato de emergencia	X	
Cinturones, agarraderas (camilla)	X		Sobres de Suero Oral Rehidratación (4 sobres)	X	
Responsable de Botiquín					
El botiquín tiene asignado responsable?	X		Está capacitado en el manejo del botiquín?	X	
Está entrenado en primeros auxilios?	X		Diligencia registros de uso del Botiquín?	X	

Responsable de la Inspección		**Responsable del Botiquín en Obra**	
Firma:	Brayan Fernando	Firma:	Marcos Cisneros
Nombre:	Brayan Fernando Sanabria Vega	Nombre:	
Cargo:	Pro F. HSEQ.	Cargo:	Maestro.
Responsable SG-SST			
Firma:			
Nombre:	Cristina Margoth Rubio Muñoz		
Cargo:	Profesional SST		

Consolidado Resumen de la Inspección

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

Anexo 1.12.4. Inspección de seguridad de mezcladora de concreto del mes de febrero 2026

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

ARAMCO
INGENIEROS

ARAMCO
INGENIEROS S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

Código: FO-HSEQ-004
Fecha: 01/02/2024
Versión: 02

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
RESPONSABLE DE REALIZAR INSPECCIÓN:	Brayan Fernando Sanchria V.	**LUGAR DE TRABAJO:**	Aranzazú- Páez.		
CARGO:	Prof. HSEQ.	**PERIODO COMPRENDIDO**	DE 02/02/26	A	28/02/26

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	Toyama	**CAPACIDAD:**	6.5 / 196 c.c.
MODELO:	X Series	**SERIE / SERIAL:**	//

Tenga en cuenta los siguientes criterios de evaluación para realizar la inspección:
B=Bueno R=Regular M=Malo

	ENTRADAS / ACTIVIDADES		SEMANA 1			SEMANA 2			SEMANA 3			SEMANA 4		
		Fecha	05/02/26			13/02/26			//			27/02/26		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
MOTOR	Limpieza general del equipo		X			X						X		
	Nivel y limpieza externa del depósito del combustibles		X			X						X		
	Filtro de combustible		X			X						X		
	Filtro de aire		X			X						X		
	Nivel del aceite		X			X						X		
	Arranque/YOYO		X			X						X		
	Tubo de escape de gases		X			X						X		
	Bujía		X			X						X		
	Poleas		X			X						X		
	Acelerador		X			X						X		
ESTRUCTURA MEZCLADORA	Estado del tambor		X			X						X		
	Mecanismos de giro para vaciado		X			X						X		
	Chumaceras y graseras (engrase)		X			X						X		
	Piñon y cremallera		X			X						X		
	Caja protectora del motor		X			X						X		
	Estado, tensión y alineación de las correas		X			X						X		
	Dique de contención		X			X						X		
	Estrás de compactación (interno)		X			X						X		
	Freno de seguridad tambor		X			X						X		
	Balineras		X			X						X		
	Llantas y barra de tiro		X			X						X		

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERARIO:	
FIRMA Y VERIFICACIÓN HSEQ / SUPERVISOR:	Brayan Fernando Sanchria Vega. Prof. HSEQ.
HORAS DE USO:	**TOTAL DE HORAS:**

FECHA	OBSERVACIONES

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia
