
INFORME MENSUAL EJECUTIVO No. 12
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

PERIODO
DEL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2026

CONTROL DE REVISIONES

Elaborado por: **CAROL NATALIA LÓPEZ CAVIEDES** Residente de Obra **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**	Firma 
Presentado por: **ALEXANDER ANDRES SEGURA PÉREZ** Director de Obra **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**	Firma 
Aprobado por: **JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ** Director de Interventoría **CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI**	Firma

CONTROL DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Descripción	Observaciones y/o modificaciones
0	17/02/2026	Versión Inicial	
1	13/03/2026	Versión 1	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
3 AVANCE DE OBRA 5
3.1 Relación de ID´s asignados 5
3.2 Relación de Obras ejecutadas 7
3.3 Relación de ID´s presentados a facturación 13
3.4 Relación de avance de obra por ítem 16
3.5 Relación de suministros por ítem 26
3.6 Estado de Georreferenciación 27
3.7 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo 27
4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA 28
5 TRÁMITE DE PMT´S 28
6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el resumen ejecutivo de lo incluido en el Informe Mensual de Obra No. 12, correspondiente al periodo del 11 de enero al 10 de febrero de 2026, para la ejecución del Contrato de Obra No. 2024-3648 cuyo objeto corresponde a "**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - ZONA 2 NORTE CENTRO**.

A continuación, se realizará el respectivo reporte de actividades ejecutadas durante el periodo reportado, teniendo en cuenta que se procedió con la suscripción del acta de inicio el pasado 11 de febrero de 2025.

Con el objetivo de dar una atención integral a la ciudad de Bogotá D.C., en temas de seguridad vial, la Secretaria Distrital de Movilidad adelantó el proceso licitatorio con el cual se están desarrollando actividades de suministro e implementación de señalización vertical, horizontal y otros elementos de seguridad vial.

Para el desarrollo del proyecto, se dividió la ciudad en siete (7) zonas con el fin de tener una cobertura y límites geográficos para cada zona y así optimizar las acciones y logística de atención integral de las medidas e intervenciones en materia de seguridad vial y señalización de la ciudad.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relaciona la información general del contrato de obra, es importante precisar, durante el periodo del presente informe no han surgido cambios contractuales.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

ZONA 2 – NORTE CENTRO	
CONTRATO No.	2024-3648
OBJETO	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	GERARDO SEGURA PÉREZ
NIT	901.899.867-5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA	ANGÉLICA MARIA CONTRERAS ORJUELA
PLAZO INICIAL	TREINTA Y CUATRO (34) MESES
FECHA DE INICIO	11/02/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2027
VALOR INICIAL	$ 18.771.473.428
VALOR ADICIÓN No. 1	$ 1.276.983.847
VALOR TOTAL	$ 20.048.457.275
INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	2024-3663
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Fuente: Elaboración propia

3 AVANCE DE OBRA

3.1 Relación de ID´s asignados

Para el periodo comprendido en el presente informe, se asignaron los siguientes ID´s para inspección e implementación.

Tabla 2. Relación de ID´s asignados

No.	ID Diseño	Localidad
1	MV_AV_CALI_941_09_T1 (ADICIÓN No. 1 Y CONTRACTUAL)	11. Suba
2	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	11. Suba
3	MV_AV_SUBA_1238_24	11. Suba
4	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	12. Barrios Unidos
5	MV_01_033_1560_10	11. Suba
6	MV_01_032_945_10	11. Suba
7	MV_AV_NQS_1073_24	12. Barrios Unidos
8	MV_11_314_1236_11_V7	11. Suba
9	MV_12_102_1560_10_V11	12. Barrios Unidos
10	EX_11_394_1842_12	11. Suba
11	EX_11_414_1842_12	11. Suba
12	EX_11_012_1238_24	11. Suba
13	EX_11_011_1238_24	11. Suba
14	EX_11_319_1236_11	11. Suba
15	EX_12_141_1881_12	12. Barrios Unidos
16	EX_11_001_1238_24	11. Suba
17	EX_11_002_1238_24	11. Suba
18	EX_12_010_1560_10_V7	12. Barrios Unidos
19	EX_11_413_1842_12	11. Suba
20	EX_11_400_1842_12	11. Suba
21	EX_11_005_1238_24	11. Suba
22	EX_11_376_1842_12	11. Suba
23	EX_11_390_1842_12	11. Suba
24	EX_11_412_1842_12	11. Suba
25	EX_11_004_1238_24	11. Suba
26	EX_11_006_1238_24	11. Suba
27	EX_11_005_1560_10	11. Suba
28	EX_11_037_1238_24	11. Suba
29	EX_11_014_1238_24	11. Suba
30	EX_11_007_1238_24	11. Suba
31	EX_11_003_1238_24	11. Suba
32	EX_11_396_1842_12	11. Suba
33	EX_11_415_1842_12	11. Suba
34	EX_11_016_1238_24	11. Suba
35	EX_11_017_1238_24	11. Suba
36	EX_11_036_1238_24	11. Suba

No.	ID Diseño	Localidad
37	EX_11_001_2484_21	11. Suba
38	EX_11_015_1238_24	11. Suba
39	EX_12_007_1249_11	12. Barrios Unidos
40	KR 58 No 66A 04	12. Barrios Unidos
41	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	12. Barrios Unidos
42	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	11. Suba
43	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	11. Suba
44	CP-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	11. Suba
45	CP-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	12. Barrios Unidos
46	CP_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	11. Suba
47	SUMINISTROS_001	No aplica
48	CP KR19 x CL 63A	12. Barrios Unidos
49	CP AC68 x CR57	12. Barrios Unidos
50	CICLORRUTA DE CL 83A con KR 116A	11. Suba
51	CP006 KR28_CL74_CL74A	12. Barrios Unidos
52	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba
53	CP008 CL71A entre KR19 y KR 20	12. Barrios Unidos
54	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	11. Suba
55	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	12. Barrios Unidos
56	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	11. Suba
57	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	12. Barrios Unidos
58	Pasacalles PyP regional	11. Suba
59	CP20243648_012 AK 24 x CL 66	12. Barrios Unidos
60	CP20243648_013 KR 17 x CL 66	12. Barrios Unidos
61	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	11. Suba
62	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	11. Suba
63	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	11. Suba
64	CP20243648_017 CAM A. NORTEx95	12. Barrios Unidos
65	CP20243648_018 CAM CALIx135A	11. Suba
66	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos
67	CP20243648_020 CL139xKR132	11. Suba
68	CP20243648_021 AV NQSxCL72	12. Barrios Unidos
69	CP20243648_022 AK 45xCL95	11. Suba
70	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	11. Suba
71	PASACALLES AV CARRERA 7	Múltiple
72	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	11. Suba
73	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	11. Suba
74	PROYECTO PEP COLOMBIA	12. Barrios Unidos
75	CICLORRUTA CL 127 D	11. Suba
76	CP20243648_024 CICLORRUTA AV. CALI CON KR 91	11. Suba
77	CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA	11. Suba
78	CP20243648_026 ALCAPARROS	11. Suba
79	CP20243648_027 MORATOS	11. Suba
80	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIDRIVE	11. Suba

No.	ID Diseño	Localidad
81	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	11. Suba
82	CP20243648_029 KR 52A con CL 174A	11. Suba
83	CP20243648_030 CL144xKR136A	11. Suba
84	CP20243648_031 AK 45xCL127C	11. Suba
85	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY (11_1687)	11. Suba
86	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	11. Suba
87	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	11. Suba
88	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	11. Suba
89	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	11. Suba
90	A90 CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	11. Suba
91	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	11. Suba
92	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	11. Suba
93	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	11. Suba
94	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	11. Suba
95	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	11. Suba
96	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	11. Suba
97	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	12. Barrios Unidos
98	SUMINISTRO 002	No aplica
99	CP20243648_044 GERARDO PAREDES (ADICIÓN No. 1)	11. Suba
100	MV_AV_NQS_1073_24_V5 (ADICIÓN No. 1)	12. Barrios Unidos
101	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	11. Suba
102	CP20243648_046 AK 1404 X CL 133A	11. Suba
103	CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA	11. Suba
104	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	11. Suba

Fuente: Elaboración propia

***Nota:** Los ID´s resaltados en NARANJA corresponden a retiro de asignaciones.*

Los ID´s resaltados en AZUL corresponden a las asignaciones con recursos de la Adición No. 1

3.2 Relación de Obras ejecutadas

Para el periodo comprendido en el presente informe, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial en los siguientes puntos, utilizando recursos contractuales:

Tabla 3. elación de obras ejecutadas en el periodo – Recursos Contractuales

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
1	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	Calle 144 por Carrera 127C Carrera 118 entre Calle 143A y Calle 144 Calle 143A entre Carrera 118 y Carrera 127C	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
2	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	Carrera 90 entre Calle 149 y Calle 159A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
3	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	ciclorruta de Av. Boyacá entre AC 127 y Av Suba	11. Suba	Vertical	TERMINADO
4	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	AK 45 x CL 134D	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
5	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	Desde la Transversal 126B hasta la Carrera 124 entre Calle 130F y Calle 135B	11. Suba	Vertical y Horizontal	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

También, se adelantaron trabajos de implementación de señalización vial utilizando los recursos destinados para la adición en los siguientes ID´s:

Tabla 4. Relación de obras ejecutadas en el periodo – Recursos Adición No. 1

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
6	CP20243648_044 GERARDO PAREDES	DG 127 Bis entre KR 91 y CL 127C CL 127B entre KR 91C y KR 92B	11. Suba	Vertical	TERMINADO
7	MV_AV_NQS_1073_24_V5	AV NQS entre AC 63 y CL 92	12. Barrios Unidos	Horizontal	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se presenta la relación de obras ejecutadas durante todo el periodo de ejecución del contrato, así:

Tabla 5. Relación de obras ejecutadas

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
1	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	AV Calle 80 entre AK 68 y Av Caracas (SIN CICLORRUTA)	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
2	MV_01_033_1560_10	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
3	MV_01_032_945_10	Autopista Norte entre AC 80 y AC 170	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
4	MV_AV_NQS_1073_24	AV NQS entre AC 63 y CL 92 (COSTADO OCCIDENTAL)	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
5	PMT de emergencia KR 58 No 66A 04	KR 58 66 A 04	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO
6	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
7	SUMINISTROS_001	Av Cra 30 # 12A-01 Sur	N/A	N/A	ENTREGADO
8	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	Calle 65 entre Carrera 22 y Carrera 24 y a la Carrera 23 entre Calle 64A y Calle 66A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
9	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	calle 144 entre carrera 141 A Bis y carrera 148, calle 143 B entre carrera 141 A Bis y Carrera 148, Carrera 141A Bis entre Calle 144 y Calle 143B y Carrera 148 entre Calle 144 y Calle 143B	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
10	CP001-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	CL 170 CON AK 72	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
11	CP002-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	Calle 80 * Carrera 24	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
12	CP003_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	Avenida Suba con Av Calle 127	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
13	CP004 KR19 x CL 63A	Carrera 19A con Calle 63A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	SUSPENDIDO
14	CP005 AC68 x CR57	AC 68 con KR 57	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
15	CP006 KR28_CL74_CL74A	Carrera 28 entre Calle 74 y Calle 74A	12. Barrios Unidos	Vertical y horizontal	TERMINADO
16	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
17	CP008 CL71A entre KR19 y KR 20	CL 71 A entre KR 19 y KR 20	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
18	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	Avenida Calle 127 entre Avenida Suba hasta la Carrera 71D	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
19	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	CL 71 A entre KR 19 y KR 17	12. Barrios Unidos	Horizontal	TERMINADO
20	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	Autopista Norte entre CL 242 y CL 245, sentido Norte - Sur	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
21	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	AC 68 x KR 15	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
22	Pasacalles PyP regional	Autopista Norte x Calle 193 Calle 80 x Carrera 119 Carrera 7 x Calle 193 Vía Suba Cota x Carrera 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO
23	CP20243648_012 AK 24 x CL 66	AK 24 con CL 66	12. Barrios Unidos	Horizontal	SUSPENDIDO
24	CP20243648_013 KR 17 x CL 66	KR 17 con CL 66	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	SUSPENDIDO
25	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	AV BOYACÁ con CL 138	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
26	CP20243648_015 CL 138 x AV BOYACÁ	CL 138 con AVENIDA BOYACÁ	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
27	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	AVENIDA BOYACÁ CON CL 131 SENTIDO (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Vertical	TERMINADO
28	CP20243648_017 CAM A. NORTEx95	AU. NORTE CON CL 95 (N-S) C. RAP / (S-N) C. LENTA	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
29	CP20243648_018 CAM CALIx135A	AV. CIUDAD DE CALI CON CL 135 A (N-S) Y (S-N)	11. Suba	Vertical	TERMINADO
30	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	INTERSECCION SEMAFORIZADA AC 72 X TV 56A	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
31	CP20243648_020 CL139xKR132	CALLE 139 - CARRERA 131 (TRAMO ORIENTE - OCCIDENTE)	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
32	CP20243648_021 AV NQSxCL72	AV NQS - AV CL 72 (NS) Y (SN)	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO
33	CP20243648_022 AK 45xCL95	AK 45 x CL 95	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
34	MV_01_033_1560_10 Ciclorruta	Autopista Norte entre AC 170 y CL 193	11. Suba	Vertical y horizontal	TERMINADO
35	REPOSICIÓN PASACALLE AV SUBA-COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
36	PASACALLES AV CARRERA 7	Avenida Carrera Séptima	Múltiple	Vertical	TERMINADO
37	MV_AV_CALI_941_09_T1	Avenida ciudad de Cali desde la Diagonal 91 hasta la Calle 166	11. Suba	Vertical y Horizontal	EN EJECUCIÓN
38	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	Avenida Boyacá entre la AC 170 y Canal Salitre (SIN CICLORRUTA)	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
39	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	AK 104 con CL 135A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
40	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	Calle 170 x Carrera 92 y Vía Suba - Cota	11. Suba	Vertical	TERMINADO
41	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	Cl 144 con Kr 141A Kr 145 con Cl 144 Kr 141 A BIS con Cl 143B	11. Suba	Vertical	TERMINADO
42	PROYECTO PEP COLOMBIA	Cl 71A entre Kr 19 y Kr 21 Dg 71 A Bis entre Kr 20 y Ac 72 Kr 20 entre Cl 71 A Bis y Ac 72	12. Barrios Unidos	Vertical y Horizontal	TERMINADO
43	CICLORRUTA CL 127 D	CALLE 127 D ENTRE AV BOYACA Y AV SUBA	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
44	CP20243648_024 CICLORRUTA AV. CALI CON KR 91	CARRERA 91 POR AV CIUDAD DE CALI	11. Suba	Vertical	TERMINADO
45	CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA	CL 137 D con AV SUBA	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
46	CP20243648_026 ALCAPARROS	CL 133A entre CR 107B y AK 104	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
47	CP20243648_027 MORATOS	AK 70 con CL 98	11. Suba	Horizontal	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
48	SH_SV_ZPP_2470_2021_ MULTIDRIVE_V0	Carrea 59 entre Calle 152 y AC 153	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
49	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	Carrera 128 entre Calle 144 y Calle 142D	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
50	CP20243648_029SEMAFORIZADA CL 174A-KR 52A	CL 174A-KR 52A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
51	CP20243648_030 CL144xKR136A	Calle 144 con Carrera 136A	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
52	CP20243648_031 AK 45xCL127C	Autopista Norte entre CL 127C y CL 127D (N-S) C. LENT	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
53	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY (11_1687)	Calle 221 por Carrera 52	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
54	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	Calle 144 por Carrera 127C Carrera 118 entre Calle 143A y Calle 144 Calle 143A entre Carrera 118 y Carrera 127C	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
55	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	Carrera 90 entre Calle 149 y Calle 159A	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
56	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	Autopista Norte x Calle 169	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
57	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	Av Suba - Cota entre Ingreso a Bogotá y Calle 169B	11. Suba	Vertical	TERMINADO
58	CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	Av Suba - Cota entre Carrera 111 y Carrera 112	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
59	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	ciclorruta de Av. Boyacá entre AC 127 y Av Suba	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
60	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	Autopista Norte por Calle 235	11. Suba	Vertical	TERMINADO
61	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	Autopista Norte por Calle 235	11. Suba	Vertical	TERMINADO
62	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	Av Suba-Cota por Calle 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO
63	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	Av Suba-Cota por Calle 116	11. Suba	Vertical	TERMINADO

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Estado
64	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	Avenida Boyacá x Calle 147	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
65	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	Carrera 23 entre Calle 65 y Calle 64	12. Barrios Unidos	Vertical	TERMINADO
66	SUMINISTRO 002	N/A	No aplica	Vertical	ENTREGADO
67	CP20243648_044 GERARDO PAREDES	DG 127 Bis entre KR 91 y CL 127C CL 127B entre KR 91C y KR 92B	11. Suba	Vertical y Horizontal	TERMINADO
68	MV_AV_NQS_1073_24_V5	AV NQS entre AC 63 y CL 92	12. Barrios Unidos	Horizontal	EN EJECUCIÓN
69	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	AK 45 x CL 134D	11. Suba	Horizontal	TERMINADO
70	CP20243648_046 AK 1404 X CL 133A	AK 104 entre CL 133A y CL 137	11. Suba	Vertical y Horizontal	DESASIGNADO
71	CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA	Desde la Calle 147 hasta la Calle 146B entre Carrera 90 y carrera 91	11. Suba	Vertical y Horizontal	INSPECCIONADO
72	CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA	Desde la Transversal 126B hasta la Carrera 124 entre Calle 130F y Calle 135B	11. Suba	Vertical y Horizontal	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

3.3 Relación de ID´s presentados a facturación

A continuación, se presenta el consolidado de avance físico ejecutado por el contratista durante el presente mes:

Tabla 6. Discriminación de valor de implementación por ID – Contractual

ID	Inicio de implementación	Implementación Vertical	Implementación Horizontal	Valor Total
CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	08/01/2026	$ 9,099,906.00	$ 66,669,221.00	$ 75,769,127.00
CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	24/01/2026	$ 21,941,111.00	$ 103,030,899.00	$ 124,972,010.00
Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	17/12/2025	$ 5,415,771.00	$ -	$ 5,415,771.00
CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	02/02/2026	$ -	$ 13,468,874.00	$ 13,468,874.00
VALOR TOTAL IMPLEMENTADO		**$ 36,456,788.00**	**$ 183,168,994.00**	**$ 219,625,782.00**

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Discriminación de valor de implementación por ID – Adición No. 1

ID	Inicio de implementación	Implementación Vertical	Implementación Horizontal	Valor Total
CP20243648_044 GERARDO PAREDES	22/01/2026	$ 9,743,076.00	$ -	$ 9,743,076.00
MV_AV_NQS_1073_24_V5	07/01/2026	$ -	$ 802,932,580.00	$ 802,932,580.00
VALOR TOTAL IMPLEMENTADO		**$ 9,743,076.00**	**$ 802,932,580.00**	**$ 812,675,656.00**

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente, se presenta el consolidado de implementación para los ID´s ejecutados en el contrato, así:

Tabla 8. Valores totales de implementación

No.	ID	Valor Total
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1	$2,657,445,033.00
2	MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1	$1,255,927,003.00
3	MV_01_033_1560_10	$305,103,255.00
4	MV_01_032_945_10	$2,342,378,207.00
5	MV_AV_NQS_1073_24	$536,881,886.00
6	PMT EMERGENCIA KR 58 No 66A 04	$6,329,522.00
7	SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0	$67,485,610.00
8	EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO)	$195,101,635.00
9	IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA	$8,874,383.00
10	CP001-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA	$21,996,726.00
11	CP002-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS	$19,469,693.00
12	CP003_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA	$19,005,925.00
13	SUMINISTROS_001	$139,939,367.00
14	CP005 AC68 x CR57	$32,099,939.00
15	CP006 KR28_CL74_CL74A	$17,635,283.00
16	CP007 AK 45 con CL 118 sentido norte-sur	$7,958,656.00
17	CP008 CL71A entre KR19 y KR 20	$6,682,290.00
18	CONTINGENCIA IDU Ac 127 x Av Suba	$7,303,204.00
19	CP20243648_009 CL 71A KR19-17	$4,384,188.00
20	CP20243648_010 INGRESO A BOGOTA	$5,701,039.00
21	CP20243648_011 AC 68 x KR 15 - Semaf	$55,232,976.00
22	Pasacalles PyP regional	$17,102,664.00
23	CP20243648_014 AV BOYACÁ x CL 138	$52,884,077.00
24	CP20243648_016 CAM AV BOYACÁx131	$11,366,096.00
25	CP20243648_017 CAM A. NORTEx95	$10,167,366.00
26	CP20243648_018 CAM CALIx135A	$7,566,631.00
27	CP20243648_019 AC 72 X TV 56A	$24,976,428.00

No.	ID	Valor Total
28	CP20243648_020 CL139xKR132	$57,540,788.00
29	CP20243648_021 AV NQSxCL72	$4,559,178.00
30	CP20243648_022 AK 45xCL95	$4,459,456.00
31	CP20243648_023 AK 104 x CL 135A	$60,834,586.00
32	PASACALLES AV CARRERA 7	$34,205,328.00
33	IMPLEMENTACIÓN SEÑAL SI-27A VÍA SUBA COTA	$1,865,238.00
34	PASACALLES PAR VIAL BILBAO	$3,347,688.00
35	CP20243648_024 CICLORRUTA AV. CALI CON KR 91	$537,348.00
36	CP20243648_026 ALCAPARROS	$4,448,220.00
37	CP20243648_027 MORATOS	$6,228,539.00
38	EX_12_141_1881_12_V9 (URB TACTICO)	$79,768,544.00
39	EX_11_380_1842_12_V5 CICLORRUTA CALLE 127D	$25,713,832.00
40	SH_SV_ZPP_2470_2021_ MULTIDRIVE_V0	$122,910,942.00
41	CP_20243648_031 AK 45 x CL 127C - MV_01_032_945_10	$1,693,353.00
42	CP20243648_035 CP-AUTOPISTA. NORTE X CL 169	$6,878,123.00
43	CP20243648_028 COLEGIO 21 ANGELES	$204,836,787.00
44	CP20243648_029SEMAFORIZADA CL 174A-KR 52A	$23,064,830.00
45	CP20243648_032 COLEGIO EL CAMINO ACADEMY	$3,274,678.00
46	CP20243648_036 AV SUBA-COTA Vertical	$15,417,423.00
47	CP20243648_037 Av Suba - Cota - Horizontal	$7,523,212.00
48	Ciclorruta Av Boyacá_127_Av_Suba	$409,900,243.00
49	CP20243648_042 Semaforizada Av. Boyacá con Calle 147	$30,351,418.00
50	CP20243648_030 CL144xKR136A	$27,139,850.00
51	CP20243648_038 PASACALLE AK45xCL235	$2,087,950.00
52	CP20243648_039 VERTICAL AK45xCL235	$1,977,087.00
53	CP20243648_040 PASACALLE AV SUBACOTAxCL116	$4,527,455.00
54	CP20243648_041 VERTICAL AV SUBACOTAxCL116	$1,575,720.00
55	CP20243648_043 Vertical - SR-42 - 7 Agosto	$472,981.00
56	SUMINISTRO 002	$46,214,529.00
57	CP20243648_044 GERARDO PAREDES (ADICIÓN No. 1)	$42,842,580.00
58	MV_AV_NQS_1073_24 (ADICIÓN No. 1)	$802,932,580.00
59	CP20243648_033 COLEGIO BILBAO	$75,769,127.00
60	CP20243648_034 21 ANGELES_CARRERA 90	$124,972,010.00
61	CP20243648_045 AK 45 con CL 134D	$13,468,874.00
	VALOR TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN	**$10,090,339,579.00**

Fuente: Elaboración propia

De la tabla anterior, se puede concluir que se han radicado para revisión y aprobación de la interventoría obras por un valor acumulado de *$ 10.090.339.579,00* equivalente al 50.33% del valor total del contrato.

3.4 Relación de avance de obra por ítem

A continuación, se presenta el consolidado de cantidades de obra ejecutadas por cada uno de los ítems presentados en la propuesta económica.

Tabla 9. Relación de obra por Item

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	0.60	$ 387,126.00	*$ 124,384.00*	2.00	$ 511,510.00	$ 306,906.00
			2.00	$ 116,138.00	*$ 37,315.00*		$ 153,453.00	$ 306,906.00
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	2.00	$ 123,138.00	*$ 39,564.00*	2.00	$ 162,702.00	$ 325,404.00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	1.00	$ 170,387.00	*$ 54,745.00*	1.00	$ 225,132.00	$ 225,132.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	36.00	$ 292,116.00	*$ 93,857.00*	36.00	$ 385,973.00	$ 13,895,028.00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	14.00	$ 462,430.00	*$ 148,579.00*	14.00	$ 611,009.00	$ 8,554,126.00
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de	7.00	$ 584,051.00	*$ 187,656.00*	7.00	$ 771,707.00	$ 5,401,949.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.						
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0.13	$ 407,437.00	*$ 130,909.00*	1.00	$ 538,346.00	$ 69,984.98
			1.00	$ 52,967.00	*$ 17,018.00*		$ 69,984.98	$ 69,984.98
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	8.00	$ 530,051.00	*$ 170,305.00*	8.00	$ 700,356.00	$ 5,602,848.00
10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina	3.00	$ 378,159.00	*$ 121,502.00*	3.00	$ 499,661.00	$ 1,498,983.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.						
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	2.00	$ 215,074.00	*$ 69,103.00*	2.00	$ 284,177.00	$ 568,354.00
16	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro	2.00	$ 249,613.00	*$ 80,200.00*	2.00	$ 329,813.00	$ 659,626.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.						
17	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	5.00	$ 309,788.00	*$ 99,535.00*	5.00	$ 409,323.00	$ 2,046,615.00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	2.00	$ 411,271.00	*$ 132,141.00*	2.00	$ 543,412.00	$ 1,086,824.00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en	12.00	$ 214,324.00	*$ 68,862.00*	12.00	$ 283,186.00	$ 3,398,232.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.						
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	2.00	$ 251,146.00	*$ 80,693.00*	2.00	$ 331,839.00	$ 663,678.00
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	1.00	$ 165,333.00	*$ 53,122.00*	1.00	$ 218,455.00	$ 218,455.00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y	3.00	$ 46,410.00	*$ 14,911.00*	N/A	$ 61,321.00	$ 183,963.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.						
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	41.00	$ 24,888.00	*$ 7,996.00*	N/A	$ 32,884.00	$ 1,348,244.00
29	UN	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	2.00	$ 55,064.00	*$ 17,692.00*	N/A	$ 72,756.00	$ 145,512.00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	185.10	$ 1,863.00	*$ 598.00*	N/A	$ 2,461.00	$ 455,531.10
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	26,554.21	$ 2,421.00	*$ 778.00*	N/A	$ 3,199.00	$ 84,946,917.79
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	7,039.85	$ 2,517.00	*$ 809.00*	N/A	$ 3,326.00	$ 23,414,541.10
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3,583.33	$ 13,096.00	*$ 4,208.00*	N/A	$ 17,304.00	$ 62,005,942.32
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con	11.00	$ 45,075.00	*$ 14,482.00*	N/A	$ 59,557.00	$ 655,127.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas						
45	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	59.98	$ 26,607.00	*$ 8,549.00*	N/A	$ 35,156.00	$ 2,108,656.88
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	185.10	$ 6,173.00	*$ 1,983.00*	N/A	$ 8,156.00	$ 1,509,675.60
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	26,554.21	$ 10,917.00	*$ 3,507.00*	N/A	$ 14,424.00	$ 383,017,925.04
57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y	7,039.85	$ 11,703.00	*$ 3,760.00*	N/A	$ 15,463.00	$ 108,857,200.55

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744						
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	50.10	$ 55,433.00	*$ 17,810.00*	N/A	$ 73,243.00	$ 3,669,474.30
59	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	20.72	$ 57,360.00	*$ 18,430.00*	N/A	$ 75,790.00	$ 1,570,368.80
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1,772.63	$ 94,112.00	*$ 30,238.00*	N/A	$ 124,350.00	$ 220,426,540.50

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	246.15	$ 97,508.00	*$ 31,329.00*	N/A	$ 128,837.00	$ 31,713,227.55
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	80.00	$ 7,817.00	*$ 2,511.00*	80.00	$ 10,328.00	$ 826,240.00
77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	48.00	$ 194,761.00	*$ 62,577.00*	48.00	$ 257,338.00	$ 12,352,224.00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	8.00	$ 53,705.00	*$ 17,256.00*	8.00	$ 70,961.00	$ 567,688.00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	96.76	$ 339,018.00	*$ 108,926.00*	N/A	$ 447,944.00	$ 43,343,061.44
94	UN	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	22.00	$ 6,592.00	*$ 2,118.00*	N/A	$ 8,710.00	$ 191,620.00
95	UN	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	25.00	$ 2,958.00	*$ 950.00*	N/A	$ 3,908.00	$ 97,700.00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	35.31	$ 15,988.00	*$ 5,137.00*	N/A	$ 21,125.00	$ 745,923.75
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	76.98	$ 35,649.00	*$ 11,454.00*	N/A	$ 47,103.00	$ 3,625,988.94
TOTAL OBRA								**$ 1,032,301,438.00**

Fuente: Elaboración propia

3.5 Relación de suministros por ítem

Para el periodo del presente informe, no se entregaron elementos por suministro.

3.6 Estado de Georreferenciación

Se presenta en la siguiente tabla el consolidado del reporte de Georreferenciación durante el plazo contractual.

Tabla 10. Estado de Georreferenciación

ID implementado	Revisión / Aprobación Interventoría Planilla	Compromiso de entrega	Estado de Georreferenciación
MV_AV_BOYACA_941_09_T1	APROBADA	19/01/2026	APROBADA 22/01/2026
MV_AV_NQS_1073_24	APROBADA ADICIÓN No. 1	05/02/2026	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
EX_11_021_1238_24	APROBADA ADICIÓN No. 1	30/01/2026	APROBADA 05/02/2026
MV_01_032_945_10	APROBADA	06/02/2026	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
EX_11_001_2484_21	APROBADA	06/02/2026	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
EX_11_394_1842_12	APROBADA	06/02/2026	ATENCIÓN DE OBSERVACIONES
EX_11_414_1842_12	APROBADA	10/02/2026	REVISIÓN INTERVENTORÍA

Fuente: Elaboración propia

3.7 Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo

Para el periodo comprendido en el presente informe, se presentaron las siguientes situaciones:

- Teniendo en cuenta la actualización del Manual de Señalización de Colombia 2024, en los cuales se generaron cambios en algunas marcas, se evidenció mayor tiempo de elaboración de los Planos Récord, ya que estas marcas deben ser actualizados previo al envío de la georreferenciación.
- A la fecha de corte del presente informe, y una vez expuesto a la SDM los PMT´s que fueron negados ya que no se logró realizar coordinación con proyectos externos (Metro Línea 1), es importante mencionar, que, aún no se inician actividades en los siguientes puntos:
  - CP20243648_004 KR 19 x CL 63ª
  - CP20243648_012 AK 24 x CL 66
  - CP20243648_013 KR 17 x CL 66
- Durante la visita de inspección realizada los días 16 y 19 de enero de 2026, al corredor de la *Av Ciudad de Cali entre DG 91 y Calle 166*, correspondiente al **ID MV_AV_CALI_941_09_T1_V37,** en la cual se constató que actualmente se adelantan actividades de implementación de demarcación en la ciclorruta, ejecutadas por un contrato externo (IDU 2407-2024).

Una vez realizado un acercamiento preliminar al responsable de la ejecución de las actividades en campo, este manifestó que el contrato contempla la rehabilitación puntual de la carpeta asfáltica de la ciclorruta en ambas calzadas, así como la implementación de la señalización en los tramos intervenidos.

Luego, una vez de remitir la comunicación **CE-UTZ2-292** "Notificación – Evidencia de actividades de señalización externas – Ciclorruta Av Ciudad de Cali entre Calle 132 y 135ª - Contrato IDU 2407-2024", y exponer la situación en los comités de seguimiento técnico, desde la supervisión del contrato se dio la instrucción de proceder con el cierre del compromiso.

4 ACCIONES REALIZADAS SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Para el periodo comprendido en el presente informe, no se evidenciaron en los puntos de obra cruces de proyectos con otras entidades.

5 TRÁMITE DE PMT´S

Para la elaboración y presentación de los PMT´s se toman en cuenta los CIV´s y se determinan los esquemas de cerramiento y/o desvíos a implementar según la necesidad y considerando el tipo de vía en la que se ejecutan las actividades.

A continuación, se relacionan los PMT´s solicitados durante el mes No. 12, entre los cuales se pasaron por modalidad normal y emergencia:

Tabla 11. Relación de PMT´s presentados

ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACION	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Horario
AC 80 X CL22 Y 23 GARANTIAS	NORMAL	08/01/2026	coi_03_(2026_01_15)	15/01/2026	16/01/2026	04/02/2026	21:00 A 5:00
KR28 ENTRE CL74 Y CL74A GARANTIAS	NORMAL	08/01/2026	coi_03_(2026_01_15)	15/01/2026	16/01/2026	22/02/2026	23:30 A 4:30
AUTNORTE X 134D	EMERGENCIA	24/01/2026	EMERGENCIA SDM (AUTO NORTE (AK 45) CL 135 - CORREDOR) 2026	26/01/2026	27/01/2026	11/02/2026	22:00 a 5:00
AV CALI ENTRE 166 Y 145 (AMBAS CALZADA VEHICULARES) VERTICAL Y HORIZONTAL (SIN CICLORRUTA)	NORMAL	29/01/2026	coi_06_(2026_02_05)	05/02/2026	06/02/2026	05/03/2026	22:00 a 5:00
21 ANGELES KR90 (PRÓRROGA)	NORMAL	29/01/2026	coi_06_(2026_02_05)	05/02/2026	06/02/2026	19/02/2026	22:00 a 5:00


ID	TIPO PMT (EMERGENCIA O NORMAL)	Fecha Solicitud a SDM	COI APROBACION	Fecha de Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Horario
EMERGENCIA COLEGIO REPUBLICA	EMERGENCIA	04/02/2026	EMERGENCIAS SDM (CL 130F TV 124ABIS - SUBA) 2026	05/02/2026	05/02/2026	19/02/2026	22:00 a 5:00
NORMAL COLEGIO REPUBLICA	NORMAL	04/02/2026	EN REVISIÓN				
GARANTIAS CALI X 135	NORMAL	04/02/2026	EN REVISIÓN				
PLAZA DE SUBA	NORMAL	04/02/2026	EN REVISIÓN				

Fuente: Elaboración propia

6 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de corte del presente informe se asignaron ciento cuatro (104) ID´s, correspondientes a cuarenta y cuatro (44) diseños normales, dos (2) suministros, ocho (8) medidas de gestión, cuarenta y ocho (48) compromisos prioritarios y dos (2) emergencias, de los cuales se han inspeccionado un total de sesenta y nueve (69), discriminados de la siguiente forma:
  - Tres (3) ID´s en ejecución
    - MV_AV_CALI_941_09_T1
    - CP20243648_048 COLEGIO LA GAITANA-DOMINICANA
    - MV_AV_NQS_1073_24_V5
  - Un (1) ID´s inspeccionado
    - CP20243648_047 PLAZA FUNDACIONAL DE SUBA
  - Tres (3) ID´s los cuales no fue posible tramitar el PMT en razón a inconsistencias en los diseños de señalización con entidades externas, de acuerdo a lo mencionado en el capítulo *"Modificaciones. Problemas y soluciones presentadas durante el periodo*" ya que la empresa Metro Línea 1, no aceptó realizar la coordinación para la señalización de estos puntos.
    - CP004 KR19 x CL 63ª
    - CP20243648_012 AK 24 x CL 66
    - CP20243648_013 KR 17 x CL 66
  - Cuatro (4) ID´s desasignados por circunstancias externas al contratista, como inconvenientes con la comunidad
    - CICLORRUTA CL 127 D (Desasignado el 14 octubre de 2025)
    - CP20243648_025 CONEXION CICLORRUTA (Desasignado el 14 octubre de 2025)
    - CP20243648_026 ALCAPARROS (Desasignado 4 de octubre de 2025)

        - CP20243648_046 AK 1404 X CL 133ª (Desasignado 28 de enero de 2026)
    - Cincuenta y seis (56) ID´s terminados
    - Dos (2) suministros entregados
- A partir de la fecha de suscripción de la **ADICIÓN No. 1** y acumuladas al presente informe, con cargo al **RP 3169** se ha presentado una afectación presupuestal de **$ 559.347.359,00** (agotando su valor), y del **RP 3170** una afectación de **$ 128.332.762,00**.
- A la fecha de corte del presente periodo MES 12, se han ejecutado actividades de obra (contractual y adición) por un valor de **$ 10.090.339.579,00**, equivalente al **50.33%** del valor total del contrato.
- A la fecha no se presenta atraso en la ejecución del contrato, el valor ejecutado contractual de **$ 9.244.564.419,00**; presenta un **+6.65%** de desviación del mismo respecto a las metas de ejecución contractual que corresponden a **$ 7.996.647.676,00**. Lo anterior, se evidencia en el siguiente gráfico:

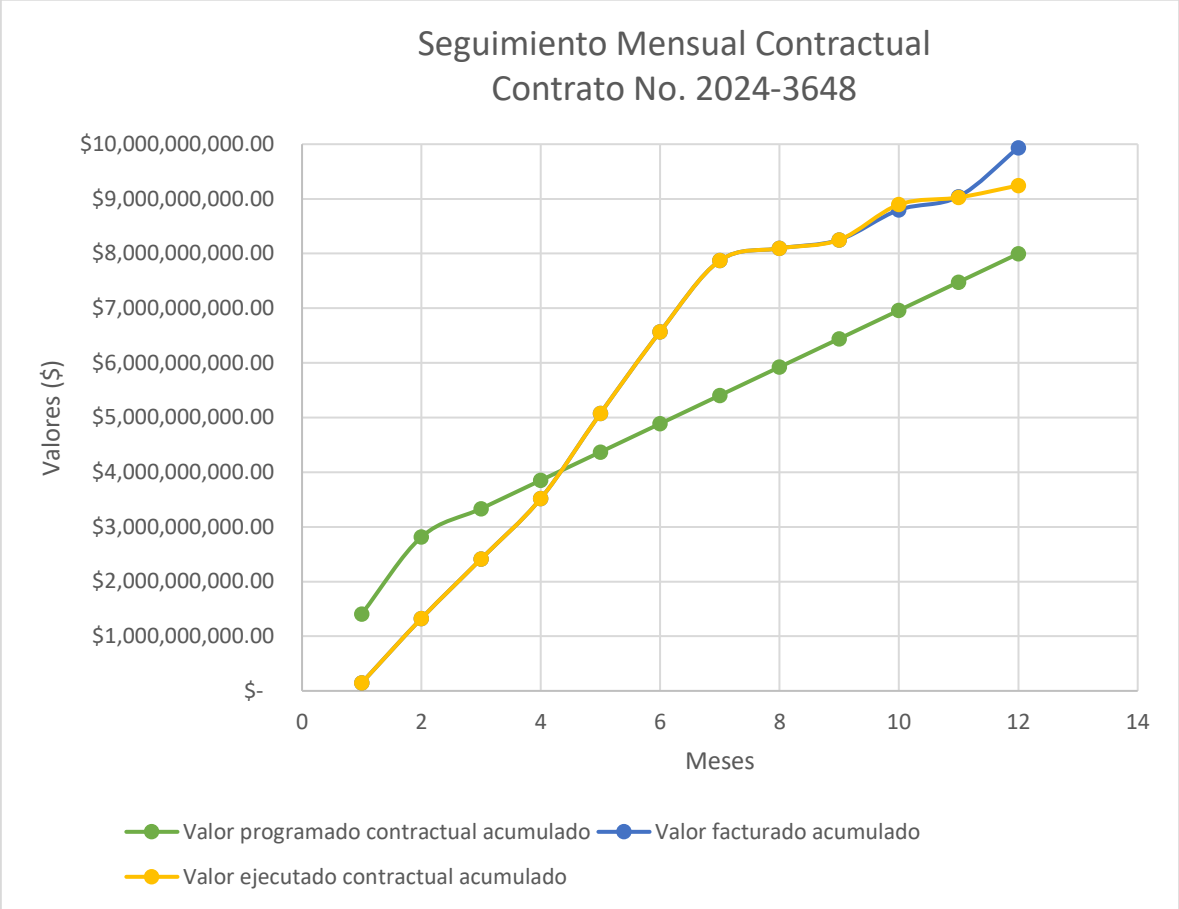

- A la fecha de corte del presente informe se han ejecutado actividades de señalización utilizando los recursos dispuestos para la Adición No. 1 por un valor de **$ 845.775.160,00**; equivalente al **66.23%** del total de la Adición No. 1.
- De acuerdo a las actividades desarrolladas desde el componente de Georreferenciación, y según lo establecido contractualmente, se procederá con la facturación por georreferenciación del Mes 11, correspondiente a $ 17.072.589,00.
