SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

RAMA JUDICIAL

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDUCIAL DE SINCELEJO

INTERVENTOR: SOLUCIONES R&S S.A.S – NIT: 901955690-9

CONTRATO Nro. MC 11 DE 2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE.

CONTRATISTA DE OBRA: SAICO INGENIERIA S.A.S – NIT: 900538927-7

CONTRATO Nro. MC 10 DE 2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE.

INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

SINCELEJO – SUCRE

DICIEMBRE 2025

1. INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito describir y documentar las actividades realizadas en el marco del proyecto de **Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre.** Estas intervenciones surgieron de la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura, así como de asegurar condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y confort para funcionarios, usuarios y demás actores que hacen uso de las Instalaciones.

Las obras ejecutadas estuvieron orientadas no solo a mejorar la habitabilidad y el aspecto físico de la edificación, sino también a fortalecer su estabilidad estructural, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de construcción y sismo-resistencia. Con ello se busca prolongar la vida útil del inmueble, prevenir riesgos asociados al deterioro físico y asegurar que la sede judicial continúe prestando un servicio eficiente a la comunidad.

Este documento expone de manera ordenada los objetivos, alcances, actividades desarrolladas y resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto, sirviendo como soporte técnico y administrativo para el seguimiento y la evaluación de las acciones

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1 GENERAL

Realizar las adecuaciones locativas y el reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre, con el fin de garantizar la seguridad, funcionalidad y condiciones adecuadas para la prestación eficiente del servicio judicial, en concordancia con la normativa vigente en materia de construcción y sismo-resistencia.

2.2 ESPECIFICOS

- Ejecutar intervenciones de reforzamiento estructural que permitan mejorar la estabilidad y resistencia del inmueble frente a riesgos asociados a cargas y eventos sísmicos.
- Desarrollar adecuaciones locativas orientadas a mejorar la habitabilidad, accesibilidad y confort de los espacios destinados a la atención de funcionarios y usuarios.
- Cumplir con los lineamientos técnicos, normativos y legales aplicables a edificaciones públicas y judiciales, asegurando la calidad y sostenibilidad de la obra.

3. OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA

3.1 GENERAL

Realizar la revisión, definición técnica, control y supervisión de las obras que busquen cumplir con el contrato que tiene como objeto adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede judicial del municipio de Toluviejo - Sucre.

3.2 ESPECIFICOS


- Ejercer control sobre la ejecución del contrato, en las etapas del periodo referenciado.
- Verificar el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados para la correcta ejecución de los contratos.
- Atender con prontitud y eficacia las solicitudes por el contratista para ejecutar exitosamente las diferentes labores de los contratos.
- Colaborar en la resolución de las dificultades que se presenten en el desarrollo del contrato con orden técnico y lógico
- Teniendo claras las funciones de la interventoría en el desarrollo del proyecto, dar a conocer mediante informes las características y el desarrollo del mismo.

4. LOCALIZACION

Colombia se encuentra en el continente americano, en la esquina noroccidental de américa del sur; sobre la línea ecuatorial, limitando con Venezuela y Brasil al oriente, Perú y ecuador al sur, al norte occidente con panamá, rodeado por el océano pacifico al occidente y al norte por el océano atlántico.

El Departamento de Sucre, ubicado en la parte noroeste de Colombia, en la región caribe, limitados por el norte y el oriente con el departamento de Bolívar; por el sur con los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba; y por el occidente con el departamento de Córdoba y el Mar Caribe.

Toluviejo es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento de Sucre, en la región Caribe, a 18 km de Sincelejo, la capital departamental. Se sitúa en la subregión de Los Montes de María y hace parte de la geografía de esta zona.

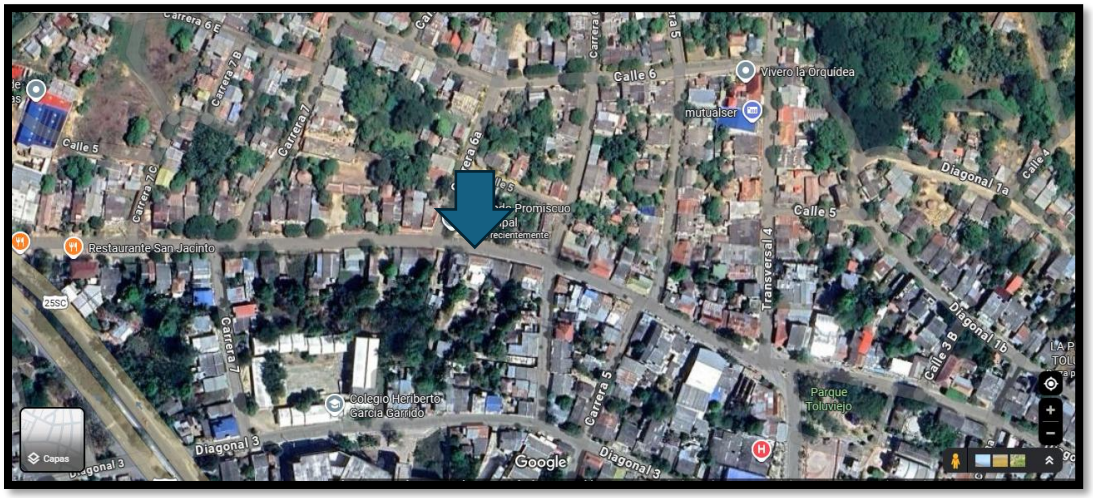

5. CONDICIONES INICIALES DEL PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el presupuesto inicial con el cual se relacionan las actividades contractuales a ejecutar por el contratista y el valor de estas:

ITEMS	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**Obras preliminares y provisionales**				**$ 9.579.710,00**
1,01	Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	m2	140	$ 12.795	$ 1.791.300
1,02	Demolición de piso en porcelanato	m2	140	$ 8.403	$ 1.176.420
1,03	Demolición de plantilla de piso	m2	140	$ 13.981	$ 1.957.340
1,04	Demolición de zocalo en porcelanato	m	142,04	$ 7.673	$ 1.089.873
1,05	Demolición de enchape de fachada	m2	18,4	$ 14.888	$ 273.940
1,06	Excavación de terreno e=30 cm	m3	39	$ 33.613	$ 1.310.907
1,07	Demolición de plantilla perimetral acceso	m2	10	$ 15.209	$ 152.090

1,08	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	m3	70	$ 26.112	$ 1.827.840
2	**Impermeabilización cubierta y muros**				**$ 6.769.356,00**
2,01	Demolición pañete	m2	2	$ 8.238	$ 16.476
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	m2	64	$ 8.975	$ 574.400
2,03	IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	m2	140	$ 44.132	$ 6.178.480
3	**Suelos, pisos, estructura y muros**				**$ 55.089.199,00**
3,01	Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	m3	62,4	$ 136.082,00	$ 8.491.517
3,02	Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye	m2	11,2	$ 69.714,77	$ 780.806

	refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm						
3,03	Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	m	84	$	26.421	$	2.219.364
3,04	Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes	Und	56	$	16.445	$	920.920
3,05	Armado de acero de machones de refuerzo	Kg	135,24	$	11.191	$	1.513.536
3,06	CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	m3	1,12	$	1.055.344	$	1.181.985
3,07	PAÑETE LINEAL 1:4	m	112	$	20.254	$	2.268.448
3,08	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	m2	568	$	15.010	$	8.525.549
3,09	ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	m2	18,4	$	69.772	$	1.283.813

3,10	Reparación de fisuras en antepecho	m	12	$ 107.504	$ 1.290.048
3,11	Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	m2	140	$ 69.142	$ 9.679.874
3,12	Instalación de zócalo	m	142,04	$ 20.429	$ 2.901.774
3,13	CIELO RASO EN PANEL PVC	m2	140	$ 63.953	$ 8.953.420
3,14	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	m2	181,96	$ 18.687	$ 3.400.229
3,15	Protector de ventanas	m2	8,4	$ 199.752	$ 1.677.916
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL					**$ 71.438.265**
ADMINISTRACIÓN				**29,50%**	**$ 21.074.288**
IMPREVISTOS				**2,00%**	**$ 1.428.765**
UTILIDAD				**3,50%**	**$ 2.500.339**
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19,00%**	**$ 475.064**
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 96.916.721**

5.1 CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PRESUPUESTO.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UND	VAL. UNITARIO	VAL. PARCIAL	CANT FINAL	VALOR FINAL
1	Obras preliminares y provisionales					
1,01	Desmonte de cielo raso en lámina en yeso cartón	m2	$ 12.795	$ 1.791.300	119,69	$ 1.531.434
1,02	Demolición de piso en porcelanato	m2	$ 8.403	$ 1.176.420	119,69	$ 1.005.755
1,03	Demolición de plantilla de piso	m2	$ 13.981	$ 1.957.340	122,93	$ 1.718.684
1,04	Demolición de zocalo en porcelanato	m	$ 7.673	$ 1.089.873	151,07	$ 1.159.160
1,05	Demolición de enchape de fachada	m2	$ 14.888	$ 273.940	17,10	$ 254.585
1,06	Excavación de terreno e=30 cm	m3	$ 33.613	$ 1.310.907	0,00	$ -
1,07	Demolición de plantilla perimetral acceso	m2	$ 15.209	$ 152.090	15,03	$ 228.591
1,08	RETIRO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DEMOLICÍÓN (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL)	m3	$ 26.112	$ 1.827.840	112,74	$ 2.943.867
2	Impermeabilización cubierta y muros					
2,01	Demolición pañete	m2	$ 8.238	$ 16.476	2,00	$ 16.476
2,02	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO	m2	$ 8.975	$ 574.400	64,00	$ 574.400
2,03	IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	m2	$ 44.132	$ 6.178.480	25,00	$ 1.103.300
3	Suelos, pisos, estructura y muros					
3,01	Mejoramiento de suelo en suelo cemento, seleccionado y compactado	m3	$ 136.082,00	$ 8.491.517	0,00	$ -
3,02	Fundida de plantilla de piso de espesor 8 cm de espesor en concreto de 3500psi, incluye	m2	$ 69.714,77	$ 780.806	128,36	$ 8.948.588

	refuerzo en malla electrosoldada de 6 mm de 15x15 cm					
3,03	Corte de muro para dilación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas para fundida de machones	m	$ 26.421	$ 2.219.364	102,00	$ 2.694.942
3,04	Anclajes de refuerzo longitudinal en 3/8" de diametro, a vigas de cimentación existentes	Und	$ 16.445	$ 920.920	196,00	$ 3.223.220
3,05	Armado de acero de machones de refuerzo	Kg	$ 11.191	$ 1.513.536	307,39	$ 3.440.149
3,06	CONCRETO 3.000 PSI MACHONES ENTRE MURO	m3	$ 1.055.344	$ 1.181.985	2,11	$ 2.226.775
3,07	PAÑETE LINEAL 1:4	m	$ 20.254	$ 2.268.448	153,44	$ 3.107.774
3,08	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	m2	$ 15.010	$ 8.525.549	0,00	$ -
3,09	ENCHAPE CERAMICA 30x40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA	m2	$ 69.772	$ 1.283.813	17,10	$ 1.193.108
3,10	Reparación de fisuras en antepecho	m	$ 107.504	$ 1.290.048	12,00	$ 1.290.048
3,11	Instalación de piso cerámica 57X57 o similar	m2	$ 69.142	$ 9.679.874	120,71	$ 8.346.125
3,12	Instalación de zócalo	m	$ 20.429	$ 2.901.774	151,07	$ 3.086.249
3,13	CIELO RASO EN PANEL PVC	m2	$ 63.953	$ 8.953.420	0,00	$ -
3,14	PINTURA KORAZA MUROS (2 MANOS)	m2	$ 18.687	$ 3.400.229	0,00	$ -
3,15	Protector de ventanas	m2	$ 199.752	$ 1.677.916	12,00	$ 2.397.022
NP	ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	Desmonte de luminarias existentes	und	$ 15.857		28,00	$ 443.996
NP2	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de vidrio de fachada y puerta. Incluye cambio de accesorios para sistema de fijacion y esmerilado	m2	$ 143.284		20,30	$ 2.908.662
NP3	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de ventanas.	m2	$ 62.515		17,90	$ 1.119.019
NP4	Desmonte, acarreo, matenimiento y reinstalacion de puertas metálicas. Incluye cambio de cerradura y bisagras	und	$ 98.265		3,00	$ 294.795
NP5	Desmonte, mantenimiento y reinstalacion de orinal para baño. Incluye cambio de accesorios y griferia	und	$ 364.398		1,00	$ 364.398

NP6	Suministro e instalación de tubo PVC de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	$ 9.668		161,00	$ 1.556.548
NP7	Suministro e instalación de tubo PVC SCH 40 de 1/2". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	$ 12.275		245,00	$ 3.007.436
NP8	Suministro e instalación de tubo PVC de 3/4". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	$ 11.762		9,00	$ 105.858
NP9	Suministro e instalación de tubo PVC de 1". Esto incluye soldadura PVC, curvas, Terminales y demás accesorios para su correcta instalación	m	$ 13.933		15,00	$ 208.995
NP10	Suministro e instalación de Registro de piso. Debe incluir el marco y el acabado.	und	$ 257.518		4,00	$ 1.030.072
NP11	Vigas de confinamiento en concreto 3.000 PSI S=0,20x0,10	ml	$ 60.198		37,30	$ 2.245.385
NP12	Nucleos de cal hidratada de D=15cm	ml	$ 80.709		180,00	$ 14.527.620
NP13	Acero de refuerzo 60.000 psi para estructuras en concreto	kg	$ 11.191		109,20	$ 1.222.057
NP14	Levante de muro en bloque 0,10	m2	$ 62.706		75,66	$ 4.744.336
NP15	Desmonte , mantenimiento y reinstalacion de puertas de madera. Incluye cambio de cerradura	und	$ 230.940		6,00	$ 1.385.640
NP16	Enchape ceramica para piso de baños	m2	$ 81.855		7,65	$ 626.191
NP17	Demolición de muro en mamposteria 0,10	m2	$ 18.755		75,66	$ 1.418.928
NP18	Suministro e instalacion de relleno con material seleccionado compactado	m3	$ 143.020		83,44	$ 11.933.589
NP19	Demolición de enchape de piso para baños	m2	$ 7.502		7,65	$ 57.390
NP20	Excavación en material comun	m3	$ 45.012		64,18	$ 2.888.870
NP21	Demolición de muro en mamposteria 0,15	m2	$ 22.506		39,45	$ 887.862
NP22	Levante de muro en bloque 0,15	m2	$ 92.854		39,45	$ 3.663.090

A	TOTAL COSTO DIRECTO		$ 71.438.265,00		$ 107.130.989,63
B	ADMINISTRACIÓN	29,50%	$ 21.074.288,18		$ 31.603.641,94
C	IMPREVISTOS	2,00%	$ 1.428.765,30		$ 2.142.619,79
D	UTILIDAD	3,50%	$ 2.500.339,28		$ 3.749.584,64
E	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 475.064,46		$ 712.421,08
	TOTAL OFERTA ECONOMICA		$ 96.916.721,00		$ 145.339.257,08

Las modificaciones planteadas en el Balance de obra N°1 a las cantidades de cada ítem del contrato están basadas en la revisión de los planos del proyecto, toma de medidas y la identificación de necesidades en obra, que permiten optimizar física y financieramente el proyecto y de igual manera garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades programadas. Todos los ajustes se realizaron con el único propósito de mejorar las condiciones planteadas, sin afectar el valor contemplado inicialmente para el contrato.

6. ASPECTOS CONTRACTUALES DE LA OBRA

6.1 CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO INTERVENTORÍA.

CONTRATO	OBRA	INTERVENTORIA

N° CONTRATO	MC 10-2025	MC 11-2025
CONTRATISTA	SAICO INGENIERIA S.A.S	SOLUCIONES R&S S.A.S
OBJETO	Adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede judicial del municipio de Toluviejo sucre	Interventoría al contrato de adecuaciones locativas y reforzamiento estructural a la sede judicial del municipio de Toluviejo sucre
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 96.916.721	$ 18.480.758
VALOR ADICIONAL	$ 48.422.536,08	$ 9.240.379
PLAZO INICIAL	Dos (2 meses)	Dos (2) meses
PLAZO ADICIONAL	Un (1) mes	Un (1) mes
VALOR TOTAL	$ 145.339.257,08	$ 27.721.137
PLAZO TOTAL	Tres (3) meses	Tres (3) meses

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS- INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.


7.1 CONTRATO DE OBRA MC 10-2025

A continuación, se presentan los balances financieros, correspondientes al contrato ejecutado por el contratista con corte al presente informe.

El Contrato de Obra No. MC 10 de 2025 tuvo como finalidad la ejecución de las "Adecuaciones locativas y el reforzamiento estructural de la sede judicial del municipio de Toluviejo, Sucre", y fue celebrado inicialmente por un monto de noventa y seis millones novecientos dieciséis mil setecientos veintiún pesos ($96.916.721).

Con posterioridad, a través del Otrosí No. 1, se realizó una adición presupuestal por valor de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintidós mil quinientos treinta y seis pesos ($48.422.536), destinada a la ejecución de actividades adicionales surgidas durante el desarrollo de la obra.

Como resultado de dicha modificación, el valor total final del contrato se estableció en ciento cuarenta y cinco millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos ($145.339.257) alcanzando un porcentaje del 100%.

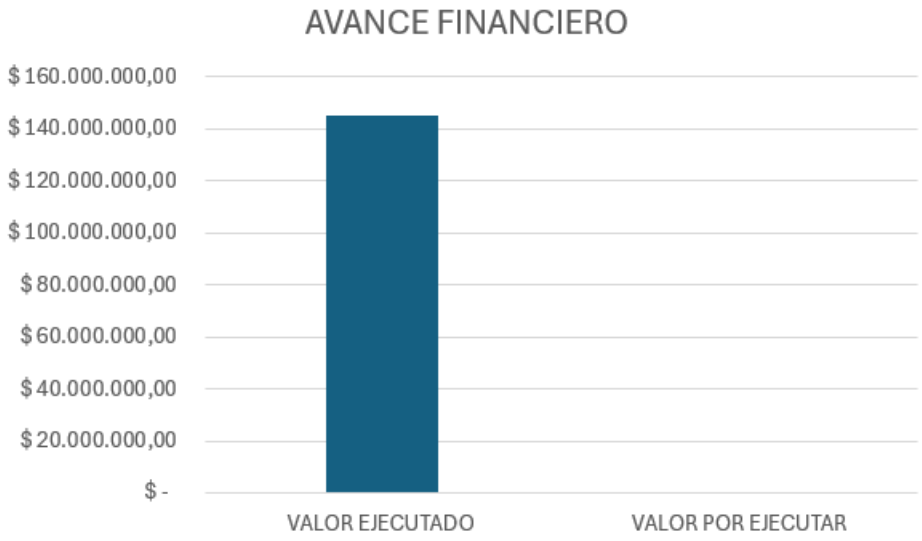


A la fecha del presente informe se presenta una ejecución física y financiera del 100% encontrándose el contrato culminado conforme a lo establecido en el alcance contractual.




7.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA MC 11- 2025

El contrato de interventoría tiene un valor de $ 18.480.758 sin que se haya efectuado desembolso alguno por concepto de anticipo. Posteriormente, se realizó una adición presupuestal por un valor de $ 9.240.379, como resultado de la cual el valor total del contrato ascendió a $ 27.721.137.

Con base en el valor vigente del contrato, la interventoría registra a la fecha un nivel de ejecución del 100%**,** correspondiente a una ejecución acumulada de $ 27.721.137, de conformidad con las actividades desarrolladas y debidamente aprobadas.

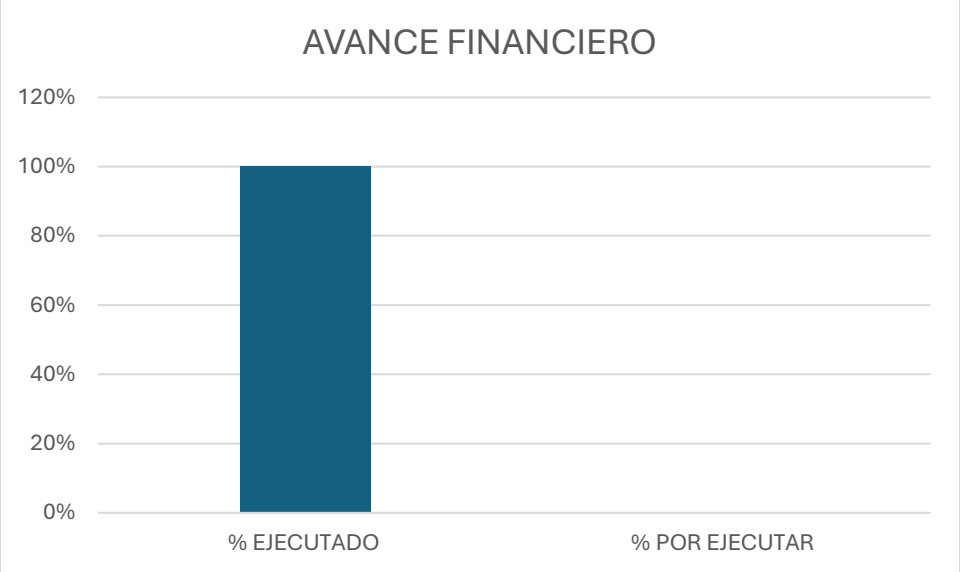

En la gráfica anterior se evidencia que la interventoría alcanzó en su totalidad el valor presupuestado, reflejando una ejecución del 100% de los recursos asignados al contrato.

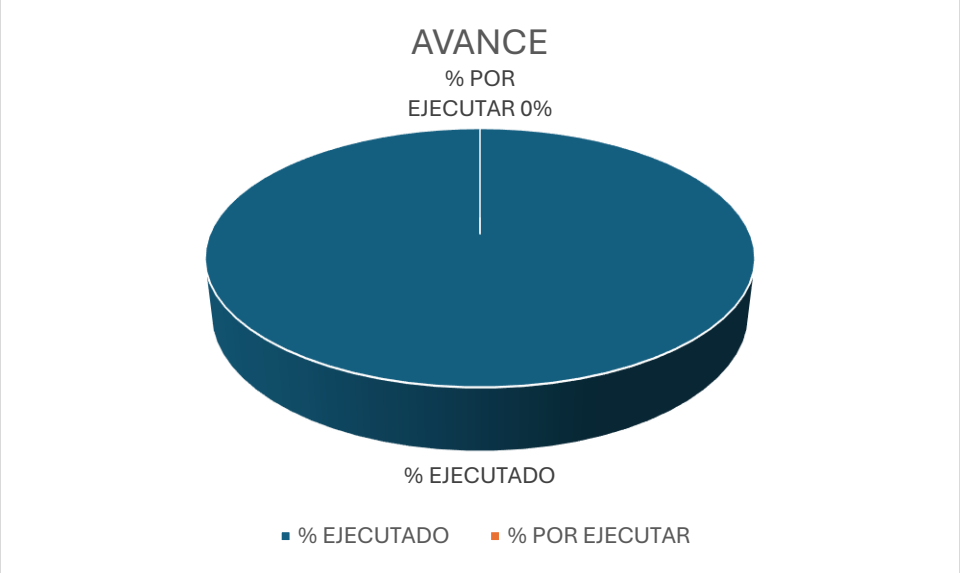

8.1 FORMAS DE PAGOS AL CONTRATISTA DE OBRA

8.1.1 ACTAS PARCIALES.

Teniendo en cuenta las funciones de naturaleza jurídica se revisó por parte del contratista la forma de pago establecida en el contrato de obra, la cual estipula que el contrato de obra se pagará mediante actas parciales o avance de ejecución.

8.1.2 ACTAS PARCIALES DEL CONTRATISTA

A la fecha el contratista no ha radicado ningún acta de cobro.

8.2 FORMA DE PAGO A LA INTERVENTORIA

8.2.1 ACTAS PARCIALES

Teniendo en cuenta las funciones de naturaleza jurídica se revisó por parte del contratista la forma de pago establecida en el contrato de obra, la cual estipula que el contrato de obra se pagará mediante actas parciales o avance de ejecución.

8.2.2 ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA.

A la fecha el contratista no ha radicado ningún acta de cobro.

9. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

9.1 GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Las pólizas por las cuales se garantiza a la entidad contratante, el cumplimiento del contrato, estabilidad y calidad de la obra y el pago de salario y prestaciones sociales; y las pólizas de responsabilidad civil extracontractuales, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales, se presentan a continuación para avalar el Contrato de obra N°. MC 10 DE 2025, de objeto: “ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO – SUCRE”, representado legalmente por OSCAR MEJIA ESCOBAR – SAICO INGENIERIA S.A.S,

constituye a favor de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO. A continuación, se describen las condiciones iniciales de las pólizas anteriormente descritas y sus modificaciones a lo largo del proyecto:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia
No. DE POLIZA	540-47-994000036158
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 1
FECHA DE EXPEDICION	04 – 08 - 2025
FECHA DE APROBACION	04 – 08 - 2025

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/08/2025	04/02/2026	$ 19.383.344,20
Pago de salaries, prestaciones sociales e ind	04/08/2025	04/10/2028	$ 14.537.508,15
Estabilidad y calidad de obra	04/08/2025	04/02/2026	$ 29.075.016,30

POLIZA DE SEGURO DE RESPONDABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia
No. DE POLIZA	540-47-994000007686
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 2
FECHA DE EXPEDICION	04 – 08 - 2025
FECHA DE APROBACION	04 – 08 - 2025

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Predios, labores y operaciones	04/08/2025	04/10/2028	$ 284.700.000
Contrato	04/08/2025	04/10/2028	$ 284.700.000
Terceros afectados	04/08/2025	04/10/2028	$ 284.700.000

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE MODIFICACION Nro 1

ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia
No. DE POLIZA	540-47-994000036158
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 2
FECHA DE EXPEDICION	07 – 10 - 2025
FECHA DE APROBACION	07 – 10 - 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/08/2025	04/03/2026	$ 29.067.851,40
Pago de salaries, prestaciones sociales e ind	04/08/2025	04/11/2028	$ 21.800.888,55
Estabilidad y calidad de obra	04/08/2025	04/03/2026	$ 43.601.777,10

POLIZA DE SEGURO DE RESPONDABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE MODIFICACION Nro. 1

ASEGURADORA	Aseguradora solidaria de Colombia
No. DE POLIZA	540-47-994000007686
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 3
FECHA DE EXPEDICION	04 – 10 - 2025
FECHA DE APROBACION	04 – 10 - 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios, labores y operaciones	04/08/2025	04/11/2028	$ 284.700.000
Contrato	04/08/2025	04/11/2028	$ 284.700.000
Terceros afectados	04/08/2025	04/11/2028	$ 284.700.000

Nota: *Las anteriores garantías se encuentran anexas en la plataforma secop 2.*

9.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA

El plazo estimado por la DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA JUDICIAL DE SINCELEJO para la ejecución de la obra es de dos (02) meses contados a partir de la fecha de acta de inicio.

Dado el acto administrativo modificatoria Nro. 1, se aprobó un adicional en tiempo de un (01) mes a partir de la culminación del tiempo inicial, quedando como nueva fecha de finalización el día 04 de noviembre de 2025.

A continuación, se relaciona el personal profesional, administrativo y técnico que SAICO INGENIERIA S.A.S dispone para la obra en mención:

NOMBRE	CARGO
Estela María Coneo Piñerez	Directora de obra
Mario Alberto Paternina Barreto	Residente de obra
Fabio Sánchez Mercado	Profesional Siso
Emeterio Hernández Sierra	Maestro de obra
Jesús Alberto Pérez Paternina	Obrero
Javier Hoyos Banqueth	Obrero
Elfre Pacheco Paternina	Obrero

9.3 ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE OBRA

Dentro de las funciones administrativas de esta interventoría se encuentra el rendir el presente informe, en el cual se hace una breve descripción de las actividades ejecutadas dentro del contrato de obra, sobre el estado general, problemáticas presentadas y la calidad de las labores.

A la fecha de presentación se han suscrito, además del contrato de obra, las siguientes actas:

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
Acta de inicio	04– 08 – 2025
Otro si No.1	04 – 10 – 2025
Prorroga No.1	04 – 10 – 2025
Acta final	04 – 11 – 2025

9.4 ACTAS DE COMITÉ

Hasta la fecha, se ha llevado a cabo la elaboración de actas del comité de obra con el propósito de realizar un seguimiento de las actividades que se están realizando y el rendimiento de estas:

ACTA DE COMITE NRO	ASUNTO
Acta de comité 001	Verificación de condiciones iniciales del palacio de justicia de Toluviejo en el marco del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 002	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 003	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 004	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 005	Entrega y socialización de los diseños ajustados del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 006	Identificación y análisis de ítems no previstos del contrato MC 10 de 2025

10. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORIA

10.1 GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Las pólizas por las cuales se garantiza a la entidad contratante, el cumplimiento del contrato, estabilidad y calidad de la obra y el pago de salario y prestaciones sociales; y las pólizas de responsabilidad civil extracontractuales, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales, se presentan a continuación para avalar el Contrato de obra N°. MC 11 DE 2025, de objeto: "ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO – SUCRE", representado legalmente por RAMON LOEPZ CAMARGO – SOLUCIONES R&S S.A.S, constituye a favor de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO. A continuación, se describen las condiciones iniciales de las pólizas anteriormente descritas y sus modificaciones a lo largo del proyecto:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO:

ASEGURADORA	Seguros mundial
No. DE POLIZA	CMT-100017501
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 2
FECHA DE EXPEDICION	04 – 08 - 2025
FECHA DE APROBACION	04 – 08 - 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/08/2025	04/04/2026	$ 3.696.151,60
Prestaciones sociales	04/08/2025	04/10/2028	$ 1.848.075,80
Calidad del servicio	04/08/2025	04/10/2028	$ 3.696.151,60

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA FIRMA DEL ACTA DE MODIFICACION Nro 1

ASEGURADORA	Seguros mundial
No. DE POLIZA	CMT-100017501
CERTIFICADO ANEXO	Anexo 3
FECHA DE EXPEDICION	06 – 10 – 2025
FECHA DE APROBACION	06 – 10 - 2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	04/08/2025	04/05/2026	$ 5.544.227.40
Pago de salaries, prestaciones sociales e ind	04/08/2025	05/11/2028	$ 2.772.113,70
Estabilidad y calidad de obra	04/08/2025	05/11/2026	$ 5.544.227.40

Nota: *Las anteriores garantías se encuentran anexas en la plataforma secop 2.*

10.2 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El plazo estimado por la DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRATIVA JUDICIAL DE SINCELEJO para la ejecución de la obra es de dos (02) meses contados a partir de la fecha de acta de inicio.

Dado el acto administrativo modificatoria Nro. 1, se aprobó un adicional en tiempo de un (01) mes a partir de la culminación del tiempo inicial, quedando como nueva fecha de finalización el día 04 de noviembre de 2025.

A continuación, se relaciona el personal profesional administrativo que SOLUCIONES R&S S.A.S dispone para la obra en mención:

NOMBRE	DEDICACION	CARGO
Alfonso Pacheco Oquendo	50%	Directora de obra
Luis Araujo Niño	100%	Residente de obra

10.3 ACTAS SUSCRITAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Dentro de las funciones administrativas de esta interventoría se encuentra el rendir el presente informe, en el cual se hace una breve descripción de las actividades ejecutadas dentro del contrato de interventoría, sobre el estado general, problemáticas presentadas y la calidad de las labores.

A la fecha de presentación se han suscrito, además del contrato de interventoría, las siguientes actas:

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
Acta de inicio	04– 08 – 2025
Otro si No.1	04 – 10 – 2025
Prorroga No.1	04 – 10 – 2025
Acta final	04 – 11 – 2025

10.4 ACTAS DE COMITÉ

Hasta la fecha, se ha llevado a cabo la elaboración de actas del comité de obra con el propósito de realizar un seguimiento de las actividades que se están realizando y el rendimiento de estas:

ACTA DE COMITE NRO	ASUNTO
Acta de comité 001	Verificación de condiciones iniciales del palacio de justicia de Toluviejo en el marco del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 002	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 003	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 004	Seguimiento a la ejecución del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 005	Entrega y socialización de los diseños ajustados del contrato MC 10 de 2025
Acta de comité 006	Identificación y análisis de ítems no previstos del contrato MC 10 de 2025

11 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas se relacionan a continuación:

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

1.01 DESMONTE EN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO CARTON

Se observa el desmonte del cielo raso existente en lámina de yeso cartón, dejando expuesta la estructura superior. Se completo un total de 119.69 m2





1.02 DEMOLICION DE PISO EN PORCELANATO

Se observa la demolición del piso existente en porcelanato, con retiro del material para su adecuada disposición. Se ejecuto un área de 119.69 m2





1.03 DEMOLICION DE PLANTILLA DE PISO

Se observa la demolición de la plantilla de piso existente, con retiro del material para su adecuada disposición. Se ejecuto un total de 122.93m2





1.04 DEMOLICION DE ZOCALO EN PORCELANATO

Se observa la demolición del zócalo existente en porcelanato, con retiro del material para su adecuada disposición. Se ejecuto un total de 151.07m2





1.05 DEMOLICION DE ENCHAPE DE FACHADA

Se observa la demolición del enchape de fachada existente, con retiro del material para su adecuada disposición**.** Se ejecuto un total de 17.10m2





1.06 DEMOLICION DE PLANTILLA PERIMETRAL ACCESO

Se observa la demolición de la plantilla perimetral del acceso existente, con retiro del material para su adecuada disposición. Se ejecuto un total de 15.03 m2.



1.07 RETIRO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION (INCLUYE CARGUE, TRASIEGO Y DISPOSICION EN BOTADERO OFICIAL).

Se observa el retiro del material producto de la demolición, incluyendo cargue, trasiego y disposición final en botadero oficial.



2. IMPERMIABILIZACION CUBIERTA Y MUROS

2.01 DEMOLICION DE PAÑETE

Se observa la impermeabilización de la cubierta y los muros, aplicada para garantizar la protección contra filtraciones de humedad.



2.02 IMPERMIABILIZACION INTEGRAL DE MORTERO

Se observa la impermeabilización integral mediante mortero, aplicada para asegurar la protección contra la humedad.



2.03 IMPERMEABILIZACIÓN MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO.

Se observa la impermeabilización con manto 500XT-FOIL de aluminio, instalada para garantizar la protección contra filtraciones. Se ejecuto un total de 25 m2






3 SUELOS, PISOS, ESTRUCTURA Y MURO

3.02 FUNDIDA DE PLANTILLA DE PISO DE ESPESOR 8 CM DE ESPESOR EN CONCRETO DE 3500PSI, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM DE 15X15 CM.

Se observa la fundida de la plantilla de piso en concreto de 3500 psi, con espesor de 8 cm, reforzada con malla electrosoldada de 6 mm a 15×15 cm. Se ejecuto un total de 128.36 m2

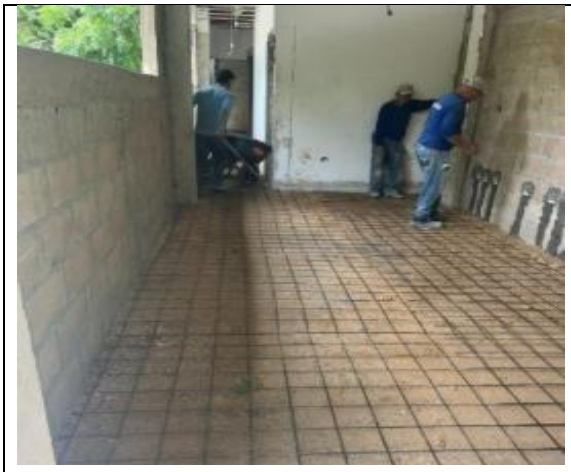



3.03 CORTE DE MURO PARA DILACIÓN ENTRE LA COLUMNA Y LOS MUROS ASOCIADOS A VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS PARA FUNDIDA DE MACHONES.

Se observa el corte del muro para generar dilatación entre la columna y los muros asociados a vanos de puertas y ventanas, previo a la fundida de machones. Se ejecuto un total de 102.00m





3.04 ANCLAJES DE REFUERZO LONGITUDINAL EN 3/8" DE DIÁMETRO, A VIGAS DE CIMENTACIÓN EXISTENTES.

Se observa la instalación de anclajes de refuerzo longitudinal de 3/8” de diámetro en vigas de cimentación existentes. Se ejecuto un total de 196 unidades





3.05 ARMADO DE ACERO DE MACHONES DE REFUERZO.

Se observa el armado del acero de los machones de refuerzo.





3.06 CONCRETO DE 3000 PSI MACHONES ENTRE MURO

Se observa la fundida de concreto de 3000 PSI en los machones ubicados entre muros.





3.07 PAÑETE LINEAL 1:4

Se observa la ejecución del pañete lineal en proporción 1:4. Se ejecuto un total de 153.44m





3.08 ENCHAPE CERÁMICA 30X40 EN FACHADA IGUAL O SIMILAR A LA RETIRADA.

Se observa la instalación de enchape cerámico de 30×40 cm en fachada, similar al material previamente retirado. Se ejecuto un total de 17.10 m2





4 ITEM NO PREVISTOS.

NP1 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES

Se observa el desmonte de las luminarias existentes. Se ejecuto un total de 28 unidades.



NP2 DESMONTE, ACARREO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VIDRIO DE FACHADA Y PUERTA. INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE FIJACIÓN Y ESMERILADO.

Se observa el desmonte, acarreo, mantenimiento y reinstalación del vidrio de fachada y puerta, incluyendo el cambio de accesorios del sistema de fijación y el esmerilado. Se ejecutó un total de 20.30 m2

NP3 DESMONTE, ACARREO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE VENTANAS.

Se observa el desmonte, acarreo, mantenimiento y reinstalación de las ventanas. S ejecuto un total de 17.90 m2

NP4 DESMONTE, ACARREO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS. INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA Y BISAGRAS.

Se observa el desmonte, acarreo, mantenimiento y reinstalación de las puertas metálicas, incluyendo el cambio de cerradura y bisagras. Se ejecuto un total de 3 unidades.



NP6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 1/2". ESTO INCLUYE SOLDADURA PVC, CURVAS,TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Se observa el suministro e instalación de tubería PVC de 1/2”, incluyendo soldadura, curvas, terminales y demás accesorios para su correcta instalación.



NP7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SCH 40 DE 1/2". ESTO INCLUYE SOLDADURA PVC, CURVAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Se observa el suministro e instalación de tubería PVC SCH 40 de 1/2”, incluyendo soldadura, curvas, terminales y demás accesorios para su correcta instalación. Se ejecuto un total de 245.00 m



NP8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 3/4". ESTO INCLUYE SOLDADURA PVC, CURVAS,TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Se observa el suministro e instalación de tubería PVC de 3/4”, incluyendo soldadura, curvas, terminales y demás accesorios para su correcta instalación. Se ejecuto 9.0 m.



NP9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 1". ESTO INCLUYE SOLDADURA PVC, CURVAS,TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Se observa el suministro e instalación de tubería PVC de 1”, incluyendo soldadura, curvas, terminales y demás accesorios para su correcta instalación. Se ejecuto un total de 15.0m.



NP11 VIGAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3.000 PSI S=0,20X0,10

Se observa la ejecución de vigas de confinamiento en concreto de 3.000 PSI, con sección de 0,20 × 0,10 m. se ejecuto un total 37.30 m.

NP12 NÚCLEOS DE CAL HIDRATADA DE D=15CM.

Se observa la ejecución de núcleos de cal hidratada con diámetro de 15 cm. Se ejecuto un total de 180.00ml.

NP13 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

Se observa la instalación de acero de refuerzo de 60.000 psi para estructuras en concreto. Se ejecuto un totak de 109.20 kg



NP14 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 0,10.

Se observa el levante de muro en bloque de 0,10 m de espesor. Se ejecuto un total de 75.66m2





NP15 DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA. INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA.

Se observa el desmonte, mantenimiento y reinstalación de las puertas de madera, incluyendo el cambio de cerradura. Se ejecuto un total de 6 und.

NP17 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA 0,10.

Se observa la demolición del muro en mampostería de 0,10 m de espesor. Se ejecuto un total de 75.66m2

NP18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.

Se observa el suministro e instalación de relleno con material seleccionado, debidamente compactado. Se ejecuto un total de 83.44m2.

NP20 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN.

Se observa la excavación en material común. Se ejecuto 64.18 m3

NP21 DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA 0,15

Se observa la demolición del muro en mampostería de 0,15 m de espesor.



NP22 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 0,15.

Se observa el levante de muro en bloque de 0,15 m de espesor.





ITEM NO PREVISTOS 2

NP2.1 PAÑETE EN MORTERO 1:4

Se observa la aplicación de pañete en mortero con dosificación 1:4. Se ejecuto un total de 230.22 m2.

NP2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA EN PISO CON TAPA, PRENSAESTOPAS DE 3/4" EN CAJA DE ALUMINIO INYECTADO DE 10 X 10 DOBLE FONDO SALIDAS PARA TUBO DE 1".

Se observa el suministro e instalación de salida en piso con tapa, prensaestopas de 3/4” en caja de aluminio inyectado de 10 × 10 cm, doble fondo y salidas para tubo de 1”.

12 CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe, el contratista de obra SAICO INGENIERÍA S.A.S. presenta un avance físico acumulado del 100% frente a la programación establecida, lo cual evidencia el cumplimiento total de las actividades previstas en el cronograma del proyecto.
- La interventoría ha realizado seguimiento permanente al desarrollo de las actividades ejecutadas, evidenciando un desempeño favorable por parte del contratista. En consecuencia, se continuará con el control y verificación del proceso constructivo, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo y la correcta culminación del contrato.
- Los profesionales asignados al proyecto han efectuado jornadas y reuniones en campo con el personal operativo, orientadas a reforzar aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal y demás lineamientos necesarios para asegurar la ejecución ordenada y segura de las actividades en obra.



ING. RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO

ANEXOS

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

BITACORA

BITACORA DE OBRA

MC 10 DE 2025

"ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE"

04 DE OCTUBRE DE 2025 AL 04 NOVIEMBRE DE 2025

SINCELEJO

Lunes, 4 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se firma acta de inicio y se hace un recorrido para el reconocimiento del área de trabajo y se inicia de inmediato con el cerramiento, desmonte de puertas, vidrios y ventanas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 5 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato. Al mismo tiempo se hace un recorrido con el maestro para determinar las actividades a intervenir posteriormente, se continua con el desmonte de puertas, vidrios y ventanas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 6 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se comienza con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves 7 de agosto de 2025

No se laboró en obra debido a ser el día festivo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes 8 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 9 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 11 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 12 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 13 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso.



Residente de obra



Residente de interventoría


Jueves, 14 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 15 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 16 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 18 de agosto de 2025

No se laboró en la obra debido a ser día feriado.



Residente de obra



Residente de interventor

Martes, 19 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros percutores, andamios.

Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo, se continua con el desmonte del cielo raso, demolición de enchape fachada, se hizo recolección de los materiales generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio.



Residente de obra



Residente de interventor

Miércoles, 20 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras.

Se continua con la recolección de los materiales (escombros)generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio, se hicieron cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 21 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras.

Se continua con la recolección de los materiales (escombros)generados de la demolición por la empresa prestadora del servicio, se hicieron cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 22 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 23 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 25 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, picas, palas.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 26 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 28 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 29 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 30 de agosto de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.


Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 1 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidoras, martillos.

Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se inicia con la figuración de acero para machones.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 2 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 6 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 8 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 9 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 11 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Sábado, 13 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes y cuadrilla eléctrica.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.

Residente de obra

Residente de interventoría

Lunes, 15 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 16 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 18 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 20 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 22 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 23 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras y ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con la demolición de plantilla existente y porcelanato con su respectivo zócalo.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, pulidora.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 26 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 27 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 29 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 30 de septiembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 2 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 3 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 4 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la figuración de acero para machones, Se continua con los cortes donde se ejecutarían los machones para reforzamiento de la estructura, se hace disposición final del material de escombro producto de la demolición por su respectiva entidad contratada.

Lunes, 6 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicia con la excavación de material común, se inicia con el trazado y replanteo por parte del ingeniero residente y el maestro de obra de los núcleos de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 7 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicia con la excavación de núcleos de cal, se continua la excavación de material común.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se inicia con el desmonte de parte eléctrica zona piso, se inicia desmonte luminarias, se finaliza excavación de material común, se inicia el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves 9 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se finaliza con el desmonte de parte eléctrica zona piso, se finaliza el desmonte de luminarias, se continua el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes 10 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se continua con la excavación de núcleos de cal de diámetro 15 cm y una profundidad de 2.50 metros, se continua el procedimiento de tratamiento a los núcleos con agua de cal.



Residente de obra



Residente de interventoría


Sábado, 11 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Se inicial el llenado de los núcleos con cal hidratada que anteriormente fueron excavados y pasaron por su tratamiento, Se inicia con la demolición de muros en bloque 0.10 y 0.15.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 13 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, vibrocompactadora.

Se finaliza el llenado de los núcleos con cal hidratada que anteriormente fueron excavados y pasaron por su tratamiento
Se continua con la demolición de muros en bloque 0.10 y 0.15. se inició las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría


Martes, 14 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.


Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, vibrocpmpactadora.

Se inicia levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se iniciaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones, se continuo las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 15 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuó levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se continuaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones, se inició las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 16 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, inicio de pañete lineal de machones en muros ya existentes.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 17 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, inicio de pañete lineal de machones en muros ya existentes, se finalizó las actividades de relleno con material seleccionado y su respectiva compactación.



Residente de obra



Residente de interventor

Sábado, 18 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, se continua el pañete lineal de machones en muros ya existentes. Se continuó levante de muros en bloque 0.10 y 0.15, se continuaron anclajes de machones a la viga de cimentación, se formaletearon y fundieron machones con vigas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 20 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, rana vibro compactadora.

Se continuaron con cortes de muros, anclajes de machones a la viga de cimentación y posterior fundida de machones, se realiza la impermeabilización de mortero y se continua el pañete lineal.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 21 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, palustre, mezcladora, carretillas.

Se continuó con el pañete lineal 1:4 de machones y muros reforzados, se ejecutaron reparaciones de fisuras en antepechos y se inició el pañete general en muros nuevos en bloque 0.10 y 0.15.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 22 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, mezcladora, formaleta metálica, vibrador de concreto.

Se continuaron trabajos de pañete en mortero 1:4 en muros nuevos y se inició la demolición de enchape de fachada y la demolición de platilla perimetral de acceso.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 23 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, mezcladora, cortadora de PVC, wincha, taladros.

Se inició el suministro e instalación de tubería PVC eléctrica de ½", PVC SCH 40 de ½", PVC de ¾" y PVC de 1", incluyendo soldaduras, curvas y terminales. Se realizó el desmonte, mantenimiento y reinstalación de orinal de baño con cambio de accesorios y grifería.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 24 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, cortadora de PVC, taladros, carretillas.

Se realizó desmonte de orinal, demolición de enchape de baño y se efectuó el desmonte de puertas metálicas y de madera.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 25 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, brochas, rodillos, espátulas, mezcladora.

Se inició impermeabilización integral en muros mediante mortero impermeabilizante y Se inició la impermeabilización mediante manto 500XT–Foil aluminio en zonas de cubierta previamente preparadas.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 27 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, carretillas, vibrocompactadora, mezcladora.

Se realiza instalación de malla electrosoldada de 6 mm de 15x15cm y se inició la fundida de plantilla de piso en concreto de 3.500 PSI con espesor de 8 cm.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 28 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, cortadora de cerámica, mezcladora. nivel, llana dentada.

Se ejecuto la instalación del enchape de cerámica de piso para baño e inició el enchape cerámica 30x40 en fachada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, palas, cortadora de cerámica, mezcladora. nivel, llana dentada.

Se ejecuto la instalación del enchape de cerámica de piso para baño y se continuó el enchape cerámica 30x40 en fachada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Jueves, 30 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, destornilladores, esmeril.

Se continuó con el enchape cerámico en fachada y se realizaron reparaciones de fisuras en antepechos.



Residente de obra



Residente de interventoría

Viernes, 31 de octubre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos**:** Herramientas menores, taladros, destornilladores.

Se efectuó el desmonte, mantenimiento y reinstalación de puertas de madera, incluyendo cambio de cerraduras, y se realizó la instalación de registros de piso con marco y acabado.



Residente de obra



Residente de interventoría

Sábado, 01 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, destornilladores.

Se realizó el suministro e instalación de salidas eléctricas en piso con tapa y prensaestopas de ¾” en caja de aluminio inyectado de 10 x 10 cm, doble fondo con salida para tubo de 1”, y se instalaron cajas eléctricas en PVC de 4x4.



Residente de obra



Residente de interventoría

Lunes, 03 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, taladros, esmeril.

Se ejecutó el suministro e instalación de protectores para ventanas en acero inoxidable y se realizaron ajustes finales a la red eléctrica instalada.



Residente de obra



Residente de interventoría

Martes, 04 de noviembre de 2025

Personal en obra: Residente de obra, SISO de obra, residente de interventoría, Maestro de obra, oficial de obras, ayudantes.

Estado de tiempo: Soleado

Herramientas y equipos: Herramientas menores, cámara fotográfica.

Se realizó inspección final de las actividades ejecutadas, verificación de acabados, funcionamiento de red eléctrica, registros de piso, puertas y enchapes, dejando la obra lista para trámite de acta final de obra.



Residente de obra



Residente de interventoría

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063135005		CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 14 a 19 - 41	SINCELEJO-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1739175428	9449130028	I	2025/09/03	2025/09/01	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1063135005	CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/09/01 03:13 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104422228		PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24a TR A 36	SAN MARCOS-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1756301204	9465412014	I	2025/09/04	2025/09/03	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1104422228	PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/09/03 10:23 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92548536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO RAUL SANCHEZ MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 29C N 4C - 29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4619358453**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993816054

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 92548536	SANCHEZ MERCADO FABIO RAUL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000	92548536	$ 97.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.237.500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS	CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	29/09/2025	90187015	$776.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	24.700	0		0		0	24	400	0	25.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	49.400	0		0		0	24	800	0	50.200	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	24.700	0		0		0	24	400	0	25.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	98.700	0	0	0	0	24	1.500	0	100.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	197.400	0	0	0	0	24	3.000	0	200.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	98.700	0	0	0	0	24	1.500	0	100.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	172.000				172.000	24	2.600	174.600			1.720	174.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	98.800	24	1.500	100.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	24	0	0	0
ICBF				
0	24	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	98.800	100.400
Pensión	3	394.800	400.800
Riesgos Laborales	1	172.000	174.600
CCF	1	98.800	100.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	764.400	776.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS		CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	29/09/2025	90187015	$776.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005990941	PEREZ PATERNINA JESUS ALBERTO	1	0			S	X	X															230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC07	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF41	616.850	24.700	0	0	0	0	0
2	CC	1102816022	HERNANDEZ SIERRA EMETERIO FERNANDO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC24	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF41	616.850	24.700	0	0	0	0	0
3	CC	1108766842	PACHECO PATERNINA ELFRE EDUARDO	1	0			S	X																25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS002	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF41	616.850	24.700	0	0	0	0	0
4	CC	80827296	HOYOS BANQUETH ALEXANDER JAVIER	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC07	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF41	616.850	24.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063135005		CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 14 a 19 - 41	SINCELEJO-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1842360147	9551021301	I	2025/10/03	2025/10/01	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1063135005	CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/10/01 04:10 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104422228		PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24a TR A 36	SAN MARCOS-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1960102367	9740259871	I	2025/11/04	2025/11/03	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1104422228	PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92548536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO RAUL SANCHEZ MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 29C N 4C - 29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4622977164**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994087425	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 92548536	SANCHEZ MERCADO FABIO RAUL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000	92548536	$ 97.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.237.500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS	CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	17/10/2025	90538888	$879.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.800	0		0		0	10	400	0	61.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	58.900	0		0		0	10	400	0	59.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	22.800	0		0		0	10	200	0	23.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	235.500	0	0	0	0	10	1.500	0	237.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	98.800	0	0	0	0	10	700	0	99.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	235.500	0	0	0	0	10	1.500	0	237.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.900				18.900	10	200	19.100			189	19.100	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	142.500	10	900	143.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	142.500	143.500
Pensión	3	569.800	573.500
Riesgos Laborales	1	18.900	19.100
CCF	1	142.500	143.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	873.700	879.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS		CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	17/10/2025	90538888	$879.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1102816022	HERNANDEZ SIERRA EMETERIO FERNANDO	1	0			S		X															230301	569.400	91.200	0	0	0	0	ESSC24	569.400	22.800	14-11	569.400	1	3.000	CCF41	569.400	22.800	0	0	0	0	0
2	CC	1108758665	MARQUEZ GASABON JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS002	47.450	1.900	14-11	47.450	1	300	CCF41	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1108766842	PACHECO PATERNINA ELFRE EDUARDO	1	0			S		X															25-14	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS002	569.400	22.800	14-11	569.400	1	3.000	CCF41	569.400	22.800	0	0	0	0	0
4	CC	1108766842	PACHECO PATERNINA ELFRE EDUARDO	1	0			S	X																25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS002	901.550	36.100	14-11	901.550	1	4.800	CCF41	901.550	36.100	0	0	0	0	0
5	CC	80827296	HOYOS BANQUETH ALEXANDER JAVIER	1	0			S		X															230201	569.400	91.200	0	0	0	0	EPS037	569.400	22.800	14-11	569.400	1	3.000	CCF41	569.400	22.800	0	0	0	0	0
6	CC	80827296	HOYOS BANQUETH ALEXANDER JAVIER	1	0			S	X																230201	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS037	901.550	36.100	14-11	901.550	1	4.800	CCF41	901.550	36.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063135005		CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kra 14 a 19 - 41	SINCELEJO-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1974860145	9784102369	I	2025/11/03	2025/11/01	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1063135005	CONEO PIÑEREZ ESTELA MARIA	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/11/01 01:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1104422228		PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 24a TR A 36	SAN MARCOS-SUCRE	2222222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1857014789	9566511049	I	2025/10/04	2025/10/03	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1104422228	PATERNINA BARRETO MARIO ALBERTO	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/10/03 11:21 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	92548536
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FABIO RAUL SANCHEZ MERCADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 29C N 4C - 29	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4740236987**			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/10/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998401300

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.500	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 97.500
SUBTOTALES:									**$ 97.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 92548536	SANCHEZ MERCADO FABIO RAUL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000	92548536	$ 97.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.237.500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS	CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91406044	$545.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	41.800	0		0		0	2	100	0	41.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	28.500	0		0		0	2	100	0	28.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	113.900	0	0	0	0	2	200	0	114.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	83.600	0	0	0	0	2	200	0	83.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	83.600	0	0	0	0	2	200	0	83.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	122.400				122.400	2	200	122.600			1.224	122.600	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	70.300	2	100	70.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	70.300	70.500
Pensión	3	281.100	281.700
Riesgos Laborales	1	122.400	122.600
CCF	1	70.300	70.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	544.100	545.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900538927-7	SAICO INGENIERIA SAS		CALLE 19 NRO 26 05 BARRIO CENTRO	3043544670	Sisoma2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SUCRE	SAN MARCOS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91406044	$545.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1108758665	MARQUEZ GASABON JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF41	521.950	20.900	0	0	0	0	0
2	CC	1108766842	PACHECO PATERNINA ELFRE EDUARDO	1	0			S	X																25-14	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS002	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF41	521.950	20.900	0	0	0	0	0
3	CC	80827296	HOYOS BANQUETH ALEXANDER JAVIER	1	0			S	X																230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	5	49.600	CCF41	711.750	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOLUCIONES R&S S.A.S
INGENIERÍA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15025404		PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 23 nro 49-01	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1740001589	9450102364	I	2025/09/03	2025/09/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15025404	PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/09/02 05:16 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795010236	9485203698	E	2025/09/19	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102860756	ARAUJO LUIS	230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF41	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,620,000**	**$259,200**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$112,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,200	$0	$0	$259,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,200	$0	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,800	$0	$0	$112,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$112,800	$0	$0	$112,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
TOTAL				**1**	**$501,600**	**$0**	**$0**	**$501,600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102865670
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNIFER PEREZ SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 B 10-31	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4616799971**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993766338

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015437615	CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8922000155	CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 28.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 28.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 434.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 434.300**

Planilla Pagada

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-09	2025-09	1841036574	9520310269	E	2025/10/19	2025/10/11	BANCOLOMBIA	0	$501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102860756	ARAUJO LUIS	230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF41	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,620,000**	**$259,200**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$112,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,200	$0	$0	$259,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,200	$0	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,800	$0	$0	$112,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$112,800	$0	$0	$112,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
TOTAL				**1**	**$501,600**	**$0**	**$0**	**$501,600**

2025/10/11 09:40 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102865670
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNIFER PEREZ SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 B 10-31	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**4620878819**			TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/09/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994092285

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES								
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1102865670	PEREZ SIERRA YENNIFER	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000				$ 0	$ 0	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 434.300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15025404		PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 23 nro 49-01	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1769012001	9492967410	I	2025/10/03	2025/10/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15025404	PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,278,222	$364,600			$2,278,222	$284,800			$0	$0			$2,278,222	$158,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				1	$808,000	$0	$808,000

2025/10/02 04:32 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15025404		PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 23 nro 49-01	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1862014587	9502103698	I	2025/11/03	2025/11/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15025404	PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/11/02 02:08 PM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1963014789	9654123698	E	2025/11/19	2025/11/11	BANCOLOMBIA	0	$501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102860756	ARAUJO LUIS	230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF41	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,200	$0	$0	$259,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,200	$0	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,800	$0	$0	$112,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$112,800	$0	$0	$112,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
TOTAL				1	$501,600	$0	$0	$501,600

2025/11/11 03:35 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102865670
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNIFER PEREZ SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 B 10-31	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4785201236**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999963014

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102865670	PEREZ SIERRA YENNIFER	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 434.300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 15025404		PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 23 nro 49-01	SINCELEJO-SUCRE	2800002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1963014785	9602145874	I	2025/12/03	2025/12/02	BANCOLOMBIA		$808,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	15025404	PACHECO OQUENDO ALFONSO RAFAEL	230301	30	$2,278,222	$364,600	ESSC07	30	$2,278,222	$284,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,278,222	$158,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,278,222**	**$364,600**			**$2,278,222**	**$284,800**			**$0**	**$0**			**$2,278,222**	**$158,600**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,600	$0	$364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,600	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,600	$0	$158,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$158,600	$0	$158,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$284,800	$0	$284,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$284,800	$0	$284,800
TOTAL				**1**	**$808,000**	**$0**	**$808,000**

2025/12/02 05:11 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955690	9	SOLUCIONES R&S SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOLUCIONES RYS SAS	CRA 40 D 29 C 04	SINCELEJO-SUCRE	2802211	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1990141656	9741025896	E	2025/12/19	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	$501,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102860756	ARAUJO LUIS	230301	27	$1,620,000	$259,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF41	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,620,000**	**$259,200**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$64,800**			**$1,620,000**	**$112,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,200	$0	$0	$259,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,200	$0	$0	$259,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,800	$0	$0	$112,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$112,800	$0	$0	$112,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
TOTAL				**1**	**$501,600**	**$0**	**$0**	**$501,600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102865670
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YENNIFER PEREZ SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 B 10-31	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4852363601**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999985016

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			**$ 28.500**	**$ 0**	**$ 28.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102865670	PEREZ SIERRA YENNIFER	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	30	$ 1.423.500	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 434.300
