Alcaldía de PEREIRA

Versión: 01

PRE-ACTA

Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017


DIRECCION	**AV 30 AGOSTO ENTRE CL 82 Y CL 83**	**FORMATO**	
PROCESO	**CONSTRUCCION COLISEO MULTIPROPOSITOS**	**CODIGO**	
FECHA EMISION		**VERSION**	


FECHA	**DD**	11	**MM**	12	2025	**CORTE N°**	8	**ELABORÓ**	CONSORCIO RC DEPORTIVO

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIPROPOSITOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA**								
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER COLISEO 2024	**Nit o c.c.**	901892584-4				**Contrato N°**	**7120-2024**	
CONTRATISTA	CONSORCIO RC DEPORTIVO	**Nit o c.c.**	901889250-9				**Contrato N°**	**6904-2024**	

CAPÍTULO	**ESTRUCTURA METALICA**	**ITEM / ACTIVIDAD**	6.1.01	Suministro e instalacion de estructura metalica compuesta de tubulares estructurales. incluye: preparación de superficies y aplicación de anticorrosivo epoxico y pintura de protección (acabado) siguiendo los requerimientos de la norma SCCP. adicionalmente, la fabricación se realizará bajo las normas AISC.	**UNID.**	KG	**UBICACIÓN**	**COLISEO DEPORTIVO PEREIRA**		

ILUSTRACION

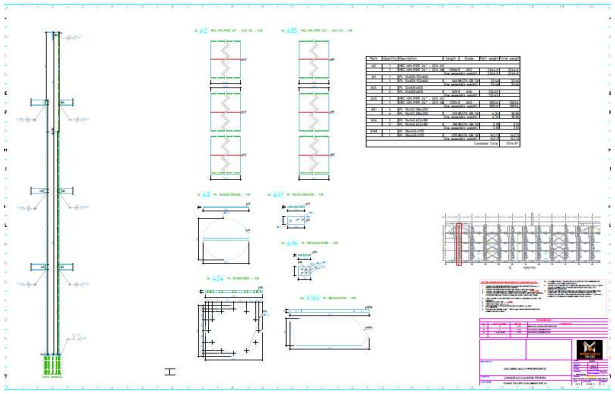

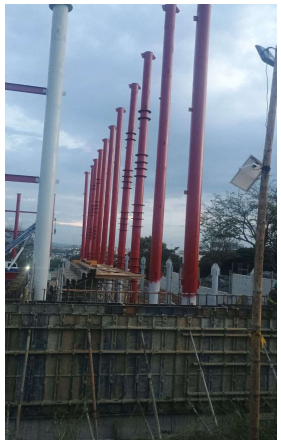



Localización	**% COMPRA**	**% SUM**	**% INSTALACION**	**CANT**	**Longitud**	**Peso x m**	**peso x unid**	**Subtotal**	**Peso Total**
		ACTA-8							
COLUMNA EJE 3 A MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 A			0.2874	1.00		4022.58	1.00	1156.09	1156.09
COLUMNA EJE 3 B MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 B			0.2874	1.00		3447.99	1.00	990.95	2147.04
COLUMNA EJE 3 C MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 C			0.2874	1.00		4860.30	1.00	1396.85	3543.89
COLUMNA EJE 3 D MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 D			0.2874	1.00		4860.30	1.00	1396.85	4940.74
COLUMNA EJE 3 E MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 E			0.2874	1.00		3314.97	1.00	952.72	5893.46
COLUMNA EJE 3 F MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 F			0.2874	1.00		3314.97	1.00	952.72	6846.19
COLUMNA EJE 3 G MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 G			0.2874	1.00		3314.97	1.00	952.72	7798.91
COLUMNA EJE 3 H MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 H			0.2874	1.00		4860.30	1.00	1396.85	9195.76
COLUMNA EJE 3 I MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 I			0.2874	1.00		4860.30	1.00	1396.85	10592.61
COLUMNA EJE 3 J MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 J			0.2874	1.00		3314.97	1.00	952.72	11545.33
COLUMNA EJE 3 K MAS CONEXIONES VER PLANO TALLER E07-PLTALLER EJE 3 K			0.2874	1.00		4022.58	1.00	1156.09	12701.42
IPE 270 EJE 3 A-B			0.2874	1.00		36.10	5.35	55.51	12756.93
W 18X35 EJE 3 A-B			0.2874	1.00		52.00	5.35	79.95	12836.88
IPE 300 EJE 3 A-B			0.2874	1.00		42.20	5.35	64.89	12901.77
IPE 270 EJE 3 B-C			0.2874	1.00		36.10	5.35	55.51	12957.28
IPE 300 EJE 3 B-C			0.2874	2.00		42.20	5.35	129.77	13087.05
IPE 400 EJE 3 C-D H-I			0.2874	6.00		66.30	5.35	611.65	13698.70
IPE 300 EJE 3 D-E-F-G-H			0.2874	8.00		42.20	5.35	519.09	14217.79
IPE 270 EJE 3 D-E-F-G-H			0.2874	4.00		36.10	5.35	222.03	14439.82
IPE 300 EJE 3 I-J-K			0.2874	4.00		42.20	5.35	259.55	14699.37
IPE 270 EJE 3 I-J-K			0.2874	2.00		36.10	5.35	111.01	14810.38
W 18X35 EJE 3 K-L			0.2874	1.00		52.00	5.35	79.95	14890.33
EJE B MEZANINE IPE 600 3-4			0.2874	1.00		5.35	5.35	8.23	14898.56
EJE B MEZANINE IPE 300 5-6-7-8-9-10-11-12			0.2874	8.00		42.20	5.35	519.09	15417.65
EJE 13 MEZANINE W 18X35 A-B-C-D-E-F G-H-I-J-K-L			0.2874	10.00		52.00	5.35	799.55	16217.20
EJE 13 MEZANINE W IPE 450 F-G			0.2874	1.00		77.60	5.35	119.32	16336.52
IPE 270 EJE 12 A-B			0.2874	2.00		36.10	5.35	111.01	16447.53
IPE 300 EJE 12 A-B			0.2874	1.00		42.20	5.35	64.89	16512.42
W 18X35 EJE 12 A-B			0.2874	1.00		52.00	5.35	79.95	16592.37
IPE 270 EJE 12 B-C			0.2874	2.00		36.10	5.35	111.01	16703.38
IPE 300 EJE 12 B-C			0.2874	2.00		42.20	5.35	129.77	16833.16
IPE 270 EJE 12 E-F F-G G-H			0.2874	6.00		36.10	5.35	333.04	17166.20
IPE 300 EJE 12 E-F F-G G-H			0.2874	5.00		42.20	5.35	324.43	17490.63
							Subtotal		17,490.63
							Vienen		395,102.98
							TOTAL		**412,593.61**

OBSERVACIONES:

ACTA 1	105552.16	ACTA5	39599.97	
ACTA 2	80966.37	ACTA6	41711.72	
ACTA 3	52314.16	ACTA7	16354.55	**ACUMULADO ITEM**
ACTA 4	58604.05	ACTA8	17490.63	**412593.61**

ING. MIGUEL FLOREZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. RUBEN GONZÁLEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA
