
CONSORCIO ADMINISTRACIÓN MUELLES

Programa de obra: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATO DE OBRA: 1651 DE 2025


Id	Nombre de tarea	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**			**254,94 días**	**jue 23/10/25**	**mar 7/07/26**	
2	SUSPENSIÓN N°1 y N°2			100 días	vie 26/12/25	lun 6/04/26	4;6
3	**1. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE VICTORIA REGIA**			**55 días**	**sáb 1/11/25**	**vie 26/12/25**	
4	Administración y operación de las instalaciones del Muelle Victoria Regia	Mes	2.00	55 días	sáb 1/11/25	vie 26/12/25	
5	**2. MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR)**			**59 días**	**mar 28/10/25**	**vie 26/12/25**	
6	Mantenimiento rutinario de las Instalaciones del Muelle Victoria Regia	Mes	2.00	59 días	mar 28/10/25	vie 26/12/25	
7	**3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PORTUARIA**			**238,94 días**	**jue 23/10/25**	**sáb 20/06/26**	
8	Implementación y divulgación del sistema de gestión en seguridad y salud en trabajo SG SST determinando su alcance a la instalación portuaria Victoria Regia.	global	1.00	64 días	jue 23/10/25	vie 26/12/25	
9	Implementación y divulgación del programa de salud ocupacional, ajustado adicionalmente a lo establecido en la nueva ley 1562/2012.	global	1.00	64 días	jue 23/10/25	vie 26/12/25	

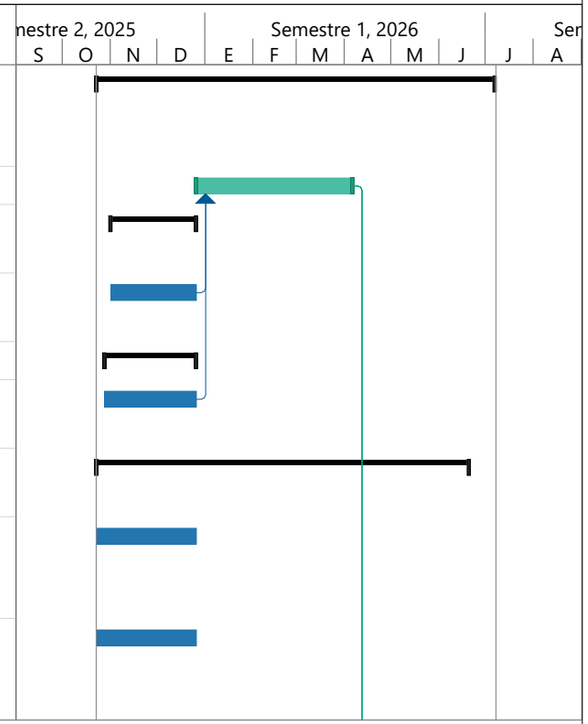

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Línea base	
Hito		Informe de resumen manual		Hito de línea base	
Resumen		Resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Atraso	
Resumen inactivo		Hito externo			


Id	Nombre de tarea	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	Predecesoras
10	Implementación y divulgación del esquema de comunicaciones con sus protocolos de coordinación para eventos críticos al momento de su ocurrencia de acuerdo a lineamientos RSI (Reglamento Sanitario Internacional - Planes de contingencia para manejo de hidro	global	1.00	64 días	jue 23/10/25	vie 26/12/25	
11	Implementación y divulgación del panorama de riesgos específico para la identificación de enfermedades propias de las áreas posibles externas.	global	1.00	64 días	jue 23/10/25	vie 26/12/25	
12	Implementación y divulgación de controles necesarios a personal de viajeros y a los operadores de medio de transporte, revisiones documentales, exámenes médicos y revisiones de mantenimiento permanente a los medios de transporte.	global	1.00	64 días	jue 23/10/25	vie 26/12/25	
13	Informe técnico con la valoración de elementos estructurales y patologías que conforman el muelle Victoria Regia. Incluye determinación de intervenciones necesarias.	global	1.00	75 días	lun 6/04/26	sáb 20/06/26	2
14	**4. MANTENIMIENTO PERIÓDICO MUELLE VICTORIA REGIA**			**91,29 días**	**lun 6/04/26**	**mar 7/07/26**	
15	Suministro e instalación de luminaria LED autónoma fotovoltaica	u	10.00	16 días	lun 6/04/26	mié 22/04/26	2
16	Mantenimiento de pedestales y mástiles de luminarias, lijado aplicación de pintura, y reinstalación.	u	10.00	30 días	mié 22/04/26	vie 22/05/26	15

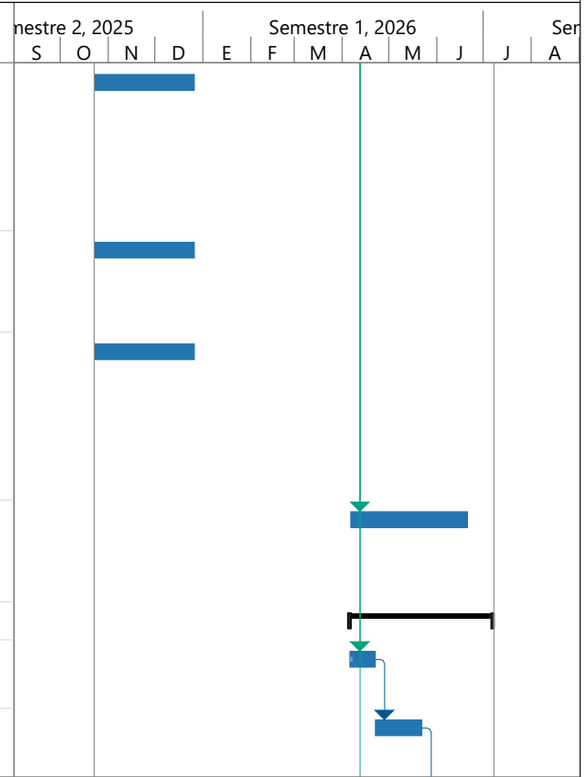

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Línea base	
Hito		Informe de resumen manual		Hito de línea base	
Resumen		Resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Atraso	
Resumen inactivo		Hito externo			

Id	Nombre de tarea	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN	Comienzo	Fin	Predecesoras
17	Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas	m2	30.00	35 días	vie 22/05/26	vie 26/06/26	16
18	Aplicación de pintura Bicapa e Imprimante Epóxico y Esmalte uretano para estructura metálica	m2	30.00	35 días	vie 22/05/26	vie 26/06/26	17CC
19	Acero de Refuerzo Estructural (Incluye corte y reposición de pieza)	kg	240.00	17 días	mié 10/06/26	sáb 27/06/26	22
20	Repaso Soldadura estructura interna	m	120.00	9 días	sáb 27/06/26	mar 7/07/26	19
21	Suministro y/o fabricación e instalación de Escotilla para Manhole de la Unidad Flotante	u	3.00	26 días	mié 10/06/26	mar 7/07/26	19CC
22	Mantenimiento Bascula digital camionera por ejes, 40 toneladas por eje 5 kg de marco totalmente mecánica, Pw con impresora térmica tiket, 2,2+3.2*0,29 m Lexus incluye acondicionamiento en caseta.	global	1.00	65 días	lun 6/04/26	mié 10/06/26	2
23	Desmonte y Demolición manual de estructuras varias	m3	5.00	25 días	mié 6/05/26	dom 31/05/26	22CC+30 días
24	Concreto clase Reforzado; f'c= 21 MPa	m3	10.00	30 días	dom 31/05/26	mar 30/06/26	23
25	Suministro de Equipo de Seguridad y Salvamento	global	1.00	26 días	mié 10/06/26	mar 7/07/26	22
26	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y si de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o	u	4.00	45 días	vie 22/05/26	lun 6/07/26	18CC

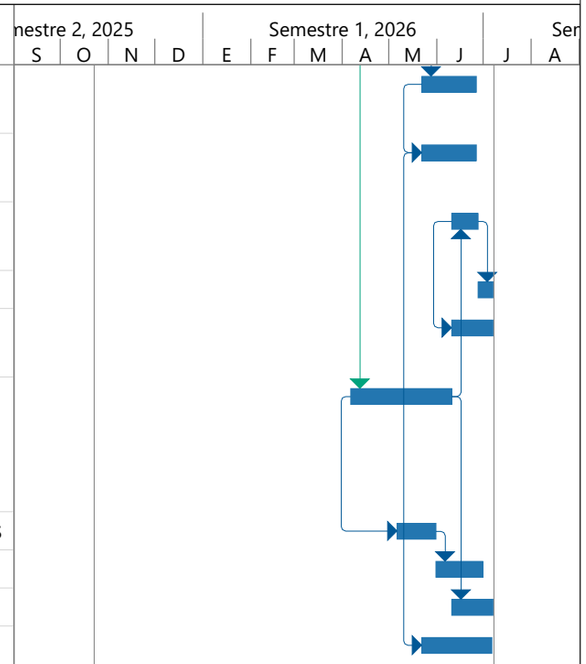

Proyecto: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Línea base	
Hito		Informe de resumen manual		Hito de línea base	
Resumen		Resumen manual		Resumen de línea base	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Progreso	
Tarea inactiva		solo fin		Progreso manual	
Hito inactivo		Tareas externas		Atraso	
Resumen inactivo		Hito externo			
