INFORME AVANCE DE OBRA

CORTE DE OBRA No. 04 MARZO 2026

CONTRATO DE OBRA N° 160-2025-LP-001



Calle 127 B No. 20 – 34 Apto 103
Teléfono móvil 321 2 34 44 77
www.lamconstrucciones.com
Bogotá D.C. Colombia

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAUSA – CUNDINAMARCA
ATTE. ING. SAUL PEREZ LUNA
SECRETARIO DE PLANEACION
Supervisor del contrato

Por medio de la Presente, nos permitimos remitir el Informe de Avance de Obra del Contrato obra 160-2025-LP-001, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA**", correspondiente al periodo del mes de marzo del 2026.

Atentamente,



Arquitecto **JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO**
Representante Legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S CONTRATISTA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
   1,1. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA 4
   1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 5
2. ESTADO FINANCIERO 6
3. CORTE DE OBRA N° 04 7
   MEMORIAS DE CANTIDADES 8
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 33
5. CONCLUSIONES 41

1. INTRODUCCION

La Alcaldía del municipio de TAUSA – CUNDINAMARCA; una vez surtidos todos los requisitos legales suscribió el Contrato de Obra N° 160-2025-LP-001, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA"

El Contrato de obra se suscribió el día 29 de septiembre de 2.025 entre el alcalde Municipal David Ortiz García y LAM CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con el Nit 900.356.860-0, como Representante Legal el Arq. Jairo Villamizar Salcedo con fecha de acta de inicio 28 de octubre del 2025.

1,1. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad: LICITACION PUBLICA

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCÍA DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA"

PLAZO: Seis (6) meses

FECHA INICIO: 28 de octubre 2025

FECHA TERMINACION: 27 de abril de 2.026

VALOR CONTRATO: Dos mil setecientos ochenta y tres millones quince mil noventa y seis pesos M/Cte. ($ 2.783.015.096.00)

REGISTRO PRESUPUESTAL: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2025000067 de 2.025

NOMBRE CONTRATISTA: LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit: 900.356.860-0
R.L. JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
C.C. N° 84.034.926 – RIOHACHA (LA GUAJIRA)

NOMBRE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTEROBRAS T
Nit; 902.000.427-3
R.L. EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ
C.C. N° 3.196.760 TAUSA- C/MARCA

1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, PÓLIZAS CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	N° POLIZA	VIGENCIA	
			INICIO	TERMINACION
CUMPLIMIENTO CONTRATO	556,603,019.20	97202	28/10/2025	27/10/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	556,603,019.00	97202	28/04/2026	27/04/1931
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	278,301,509.60	97202	28/10/2025	27/04/2029
RCE (RESPONSABILIDAD CIVILEXTRA CONTRACTUAL)	139,150,754.80	28018	31/03/2026	27/04/2026

2. ESTADO FINANCIERO

OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS T
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2,783,015,096.00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR CORTE DE OBRA N°1 (RADICADO A NOV. 20 DE 2.025)	$ 412.186.941.
PORCENTAJE DE EJECUCION	14.81%
VALOR CORTE DE OBRA N° 2 (RADICADO DIC. 19 DE 2.025)	$ 552.341.269.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	19.85%
VALOR CORTE DE OBRA No. 03	$ 607.385.495,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	22,69 %
VALOR CORTE DE OBRA No. 04 (PRESENTE ACTA)	$ 388.499.485,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	13,96 %
VALOR ACUMULADO EJECUTADO A CORTE No.04	$ 1.960.413.190,28
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	70,44 %
SALDO POR EJECUTAR A MARZO 30 DEL 2026	$ 822.601.905,72
PORCENTAJE POR EJECUTAR A MARZO 30 DE 2.026	29,56 %

3. CORTE DE OBRA N° 04

MUNCIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA

CORTE DE OBRA Nro 04 - 30 MARZO 2026

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE CORTE	30 MARZO 2026
CONTRATO No.	LP - 160-2025-01
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSORCIO INTEROBRAS T

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CORTE DE OBRA 04			ACOMULADO PRESENTE ACTA				POR EJECUTAR			
			CANT	VALOR UNITARI	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARI	VALOR PARCIAL	%	CANT	VALOR UNITARI	VALOR PARCIAL	%
	PRELIMINARES												
1,01	CAMPAMENTO 18 M2	UN	0,00	$ 2.642.958,00	0,00	1,00	$ 2.642.958,00	2.642.958,00	100,00%	0,00	$ 2.642.958,00	0,00	0%
1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	0,00	$ 12.818,00	0,00	7.529,64	$ 12.818,00	96.514.861,43	487,99%	-5.986,64	$ 12.818,00	-76.736.687,43	-388%
1,03	CONSTRUCCION DE FILTRO DE CORONACIO DE 80X60 (INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUB	ML		$ 237.134,00	0,00	100,00	$ 237.134,00	23.713.400,00	120,48%	-17,00	$ 237.134,00	-4.031.278,00	-20%
1,04	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	753,14	$ 65.238,00	49.133.164,65	2.498,48	$ 65.238,00	162.995.655,57	219,09%	-1.358,10	$ 65.238,00	-88.599.520,47	-119%
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2		$ 11.316,00	0,00	0,00	$ 11.316,00	0,00	0,00%	168,00	$ 11.316,00	1.901.088,00	100%
1,06	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	146,99	$ 84.255,00	12.384.957,14	167,61	$ 84.255,00	14.121.796,45	56,62%	128,39	$ 84.255,00	10.817.683,55	43%
1,07	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	47,34	$ 27.490,00	1.301.376,60	188,51	$ 27.490,00	5.182.216,87	608,11%	-157,51	$ 27.490,00	-4.330.026,87	-508%
1,08	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN		$ 3.487.621,00	0,00	1,00	$ 3.487.621,00	3.487.621,00	100,00%	0,00	$ 3.487.621,00	0,00	0%
1,09	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	M2		$ 8.931,00	0,00	8.702,35	$ 8.931,00	77.720.687,85	2637,08%	-8.372,35	$ 8.931,00	-74.773.457,85	-2537%
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1.557,51	$ 10.910,00	16.992.477,74	1.557,51	$ 10.910,00	16.992.477,74	558,25%	-1.278,51	$ 10.910,00	-13.948.587,74	-458%
1,11	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3		$ 146.592,00	0,00	124,71	$ 146.592,00	18.281.488,32	346,42%	-88,71	$ 146.592,00	-13.004.176,32	-246%
1,12	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	83,20	$ 41.094,00	3.419.020,80	83,20	$ 41.094,00	3.419.020,80	1386,67%	-77,20	$ 41.094,00	-3.172.456,80	-1287%
1,13	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3		$ 275.283,00	0,00	0,00	$ 275.283,00	0,00	0,00%	19,00	$ 275.283,00	5.230.377,00	100%
1,14	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	900,00	$ 6.922,00	6.229.800,00	1.760,50	$ 6.922,00	12.186.181,00	637,86%	-1.484,50	$ 6.922,00	-10.275.709,00	-538%
					89.460.796,94	0,00		**437.258.365,04**				**-270.922.751,93**	-163%
	CIMENTACION												
2,01	ESCALERA MACIZA 3500 PSI	M3		$ 1.222.132,00	0,00	53,47	$ 1.222.132,00	65.343.615,54	84,87%	9,53	$ 1.222.132,00	11.650.700,46	15%
2,02	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	267,00	$ 105.547,00	28.181.302,31	267,00	$ 105.547,00	28.181.302,31	1335,01%	-247,00	$ 105.547,00	-26.070.362,31	-1235%
2,03	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,34	$ 347.609,00	116.796,62	31,24	$ 347.609,00	10.860.799,88	91,90%	2,76	$ 347.609,00	957.906,12	8%
2,04	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,20	$ 728.780,00	874.536,00	65,00	$ 728.780,00	47.370.700,00	464,29%	-51,00	$ 728.780,00	-37.167.780,00	-364%
2,05	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,76	$ 778.882,00	588.834,79	51,01	$ 778.882,00	39.731.845,68	92,75%	3,99	$ 778.882,00	3.106.664,32	7%
2,06	PILOTE PRE EXCAVADO D=50 CM (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	ML		$ 376.431,00	0,00	0,00	$ 376.431,00	0,00	0,00%	51,00	$ 376.431,00	19.197.981,00	100%
2,07	DADOS EN CONCRETO 3500PSI	M3		$ 706.334,00	0,00	8,64	$ 706.334,00	6.102.725,76	288,00%	-5,64	$ 706.334,00	-3.983.723,76	-188%
2,08	BARANDA METÁLICA	ML		$ 569.041,00	0,00	0,00	$ 569.041,00	0,00	0,00%	107,00	$ 569.041,00	60.887.387,00	100%
2,09	DEMOLICIÓN CABEZAS DE PILOTES	M3		$ 432.808,00	0,00	0,00	$ 432.808,00	0,00	0,00%	3,00	$ 432.808,00	1.298.424,00	100%
2,10	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML		$ 38.523,00	0,00	0,00	$ 38.523,00	0,00	0,00%	48,00	$ 38.523,00	1.849.104,00	100%
2,11	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	119,67	$ 66.528,00	7.961.405,76	119,67	$ 66.528,00	7.961.405,76	2393,40%	-114,67	$ 66.528,00	-7.628.765,76	-2293%
2,12	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M	M3		$ 887.753,00	0,00	0,00	$ 887.753,00	0,00	0,00%	31,00	$ 887.753,00	27.520.343,00	100%
					37.722.875,49			**205.552.394,93**				**51.617.878,07**	20%
	ESTRUCTURAS DE CONCRETO												
3,01	COLUMNAS 3500 PSI	M3	6,21	$ 1.019.811,00	6.333.026,31	8,37	$ 1.019.811,00	8.535.818,07	38,05%	13,63	$ 1.019.811,00	13.900.023,93	62%
3,02	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	475,80	$ 7.800,00	3.711.207,55	16.880,94	$ 7.800,00	131.671.299,55	89,70%	1.939,06	$ 7.800,00	15.124.700,45	10%
3,03	CONCRETO 3500 PSI (PLACA DE CONTRAPISO)	M3		$ 435.000,00	0,00	0,00	$ 435.000,00	0,00	0,00%	6,00	$ 435.000,00	2.610.000,00	100%
3,04	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN		$ 28.448,00	0,00	0,00	$ 28.448,00	0,00	0,00%	168,00	$ 28.448,00	4.779.264,00	100%
3,05	ENTREPISO VIGUETA PLACA (PLACA TANQUES)	M2		$ 132.498,00	0,00	0,00	$ 132.498,00	0,00	0,00%	8,00	$ 132.498,00	1.059.984,00	100%
3,06	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	9,33	$ 1.089.795,00	10.165.825,72	9,33	$ 1.089.795,00	10.165.825,72	84,80%	1,67	$ 1.089.795,00	1.821.919,28	15%
3,07	VIGA CINTA 3500 PSI	M3		$ 1.057.797,00	0,00	0,00	$ 1.057.797,00	0,00	0,00%	4,00	$ 1.057.797,00	4.231.188,00	100%
					20.210.059,58			**150.372.943,34**				**43.527.079,66**	22%
	MAMPOSTERIAS												
4,01	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2		$ 55.496,00	0,00	0,00	$ 55.496,00	0,00	0,00%	364,00	$ 55.496,00	20.200.544,00	100%
4,02	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML		$ 10.223,00	0,00	0,00	$ 10.223,00	0,00	0,00%	83,00	$ 10.223,00	848.509,00	100%
4,03	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML		$ 66.170,00	0,00	0,00	$ 66.170,00	0,00	0,00%	60,00	$ 66.170,00	3.970.200,00	100%

4,04	ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML		$	42.951,00	0,00	0,00	$	42.951,00	0,00	0,00%	22,00	$	42.951,00	944.922,00	100%
4,05	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2		$	52.203,00	0,00	0,00	$	52.203,00	0,00	0,00%	178,00	$	52.203,00	9.292.134,00	100%
4,06	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2		$	77.908,00	0,00	0,00	$	77.908,00	0,00	0,00%	226,00	$	77.908,00	17.607.208,00	100%
4,07	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML		$	47.940,00	0,00	0,00	$	47.940,00	0,00	0,00%	26,00	$	47.940,00	1.246.440,00	100%
4,08	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO, INCLUYE ALISTADO	M2		$	100.530,00	0,00	0,00	$	100.530,00	0,00	0,00%	55,00	$	100.530,00	5.529.150,00	100%
4,09	PIRLANES ALUMINIO	ML		$	11.927,00	0,00	0,00	$	11.927,00	0,00	0,00%	45,00	$	11.927,00	536.715,00	100%
4,10	PEGANTE MORTERO-CONCRETO	M2		$	32.848,00	0,00	0,00	$	32.848,00	0,00	0,00%	226,00	$	32.848,00	7.423.648,00	100%
4,11	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2		$	9.388,00	0,00	0,00	$	9.388,00	0,00	0,00%	178,00	$	9.388,00	1.671.064,00	100%
4,12	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$	24.983,00	0,00	0,00	$	24.983,00	0,00	0,00%	239,00	$	24.983,00	5.970.937,00	100%
4,13	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML		$	15.657,00	0,00	0,00	$	15.657,00	0,00	0,00%	65,00	$	15.657,00	1.017.705,00	100%
4,14	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2		$	29.705,00	0,00	0,00	$	29.705,00	0,00	0,00%	37,00	$	29.705,00	1.099.085,00	100%
4,15	ESTUCO	M2		$	10.635,00	0,00	0,00	$	10.635,00	0,00	0,00%	239,00	$	10.635,00	2.541.765,00	100%
4,16	ESTUCO (LINEAL)	ML		$	6.737,00	0,00	0,00	$	6.737,00	0,00	0,00%	65,00	$	6.737,00	437.905,00	100%
4,17	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$	10.396,00	0,00	0,00	$	10.396,00	0,00	0,00%	239,00	$	10.396,00	2.484.644,00	100%
4,18	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML		$	6.658,00	0,00	0,00	$	6.658,00	0,00	0,00%	65,00	$	6.658,00	432.770,00	100%
4,19	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2		$	273.894,00	0,00	0,00	$	273.894,00	0,00	0,00%	7,00	$	273.894,00	1.917.258,00	100%
						0,00				**0,00**					**85.172.603,00**	100%
	CUBIERTAS															
5,01	CELOSIA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA.CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE	KG		$	20.556,00	0,00	22.480,43	$	20.556,00	462.107.719,08	106,62%	-1.395,43	$	20.556,00	-28.684.459,08	-7%
5,02	TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A360	M2		$	83.796,00	0,00	585,20	$	83.796,00	49.037.419,20	89,21%	70,80	$	83.796,00	5.932.756,80	11%
5,03	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML		$	45.727,00	0,00	0,00	$	45.727,00	0,00	0,00%	58,00	$	45.727,00	2.652.166,00	100%
5,04	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES DE LAMINA DELGADA(INCLUYE CONEXIONES)	KG	880,96	$	15.492,00	13.647.888,87	880,96	$	15.492,00	13.647.888,87	105,25%	-43,96	$	15.492,00	-681.084,87	-5%
5,05	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR	M2		$	574.425,00	0,00	0,00	$	574.425,00	0,00	0,00%	14,00	$	574.425,00	8.041.950,00	100%
5,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ENTRAMADO)	M2		$	80.037,00	0,00	0,00	$	80.037,00	0,00	0,00%	95,00	$	80.037,00	7.603.515,00	100%
5,07	MANTO FIBERGLASS 600X1	M2		$	41.237,00	0,00	0,00	$	41.237,00	0,00	0,00%	8,00	$	41.237,00	329.896,00	100%
5,08	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2		$	105.360,00	0,00	0,00	$	105.360,00	0,00	0,00%	8,00	$	105.360,00	842.880,00	100%
						13.647.888,87				**524.793.027,15**					**-3.962.380,15**	-1%
	ACABADOS Y ACCESORIOS															
6,01	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML		$	14.157,00	0,00	0,00	$	14.157,00	0,00	0,00%	35,00	$	14.157,00	495.495,00	100%
6,02	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML		$	13.096,00	0,00	0,00	$	13.096,00	0,00	0,00%	75,00	$	13.096,00	982.200,00	100%
6,03	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$	286.079,00	0,00	0,00	$	286.079,00	0,00	0,00%	23,00	$	286.079,00	6.579.817,00	100%
6,04	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)	M2		$	1.032.945,00	0,00	0,00	$	1.032.945,00	0,00	0,00%	19,00	$	1.032.945,00	19.625.955,00	100%
6,05	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN		$	601.420,00	0,00	0,00	$	601.420,00	0,00	0,00%	4,00	$	601.420,00	2.405.680,00	100%
6,06	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$	359.122,00	0,00	0,00	$	359.122,00	0,00	0,00%	99,00	$	359.122,00	35.553.078,00	100%
6,07	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN		$	164.212,00	0,00	0,00	$	164.212,00	0,00	0,00%	9,00	$	164.212,00	1.477.908,00	100%
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$	1.143.541,00	0,00	0,00	$	1.143.541,00	0,00	0,00%	6,00	$	1.143.541,00	6.861.246,00	100%
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$	245.060,00	0,00	0,00	$	245.060,00	0,00	0,00%	10,00	$	245.060,00	2.450.600,00	100%
6,10	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2		$	128.544,00	0,00	0,00	$	128.544,00	0,00	0,00%	9,00	$	128.544,00	1.156.896,00	100%
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$	1.312.629,00	0,00	0,00	$	1.312.629,00	0,00	0,00%	4,00	$	1.312.629,00	5.250.516,00	100%
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN		$	277.290,00	0,00	0,00	$	277.290,00	0,00	0,00%	4,00	$	277.290,00	1.109.160,00	100%
6,13	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN		$	828.685,00	0,00	0,00	$	828.685,00	0,00	0,00%	2,00	$	828.685,00	1.657.370,00	100%
6,14	BANCA EN MADERA M-50	UN		$	680.681,00	0,00	0,00	$	680.681,00	0,00	0,00%	3,00	$	680.681,00	2.042.043,00	100%
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE	UN		$	120.980,00	0,00	0,00	$	120.980,00	0,00	0,00%	4,00	$	120.980,00	483.920,00	100%
6,16	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2		$	95.797,00	0,00	0,00	$	95.797,00	0,00	0,00%	8,00	$	95.797,00	766.376,00	100%
6,17	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2		$	58.433,00	0,00	0,00	$	58.433,00	0,00	0,00%	9,00	$	58.433,00	525.897,00	100%
6,18	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN		$	207.113,00	0,00	0,00	$	207.113,00	0,00	0,00%	4,00	$	207.113,00	828.452,00	100%
6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$	397.178,00	0,00	0,00	$	397.178,00	0,00	0,00%	1,00	$	397.178,00	397.178,00	100%
6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN		$	262.733,00	0,00	0,00	$	262.733,00	0,00	0,00%	1,00	$	262.733,00	262.733,00	100%
						0,00				**0,00**					**90.912.520,00**	100%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED BALA 15W NW MV JUPITER P25265 100-277 VAC, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 15W, 1400 LM, 4000 K. IP 20 PARA INSTALACIÓN TIPO INCRUSTAR. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN		$	174.101,00	0,00	0,00	$	174.101,00	0,00	0,00%	22,00	$	174.101,00	3.830.222,00	100%

7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA LED Syl-Street LED SYL-STREET 35W NW 7P P25819, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 35W, 5300 LM, 4000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN EN BRAZO METÁLICO TIPO PEATONAL (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN		$ 757.065,00	0,00	0,00	$ 757.065,00	0,00	0,00%	9,00	$ 757.065,00	6.813.585,00	100%
7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA Proyector LED LED PROY SYLVEO 200W CW UNV N P23579, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 200W, 24000 LM, 5000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO).	UN		$ 1.496.837,00	0,00	0,00	$ 1.496.837,00	0,00	0,00%	5,00	$ 1.496.837,00	7.484.185,00	100%
7,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SYLVANIA Proyector LED LED PROY SYLVEO 300W CW UNV P23580, 60 Hz, FACTOR DE POTENCIA > 0.9, 300W, 36000 LM, 5000 K. IP 66 PARA INSTALACIÓN SOBREPUESTA EN ESTRUCTURA METÁLICA. (INCLUYE CABLE N°12 Y BRAZO METALICO)	UN		$ 2.085.417,00	0,00	0,00	$ 2.085.417,00	0,00	0,00%	29,00	$ 2.085.417,00	60.477.093,00	100%
7,05	POSTE METÁLICO 6M	UN		$ 1.665.698,00	0,00	0,00	$ 1.665.698,00	0,00	0,00%	9,00	$ 1.665.698,00	14.991.282,00	100%
7,06	SUMINISTRO DE MASTIL METÁLICO DE LAS SIGUIENTES LONGITUDES 27 M. CON CRUCETA MÉTALICA PARA PROYECTORES DE 2 FILAS POR 3 COLUMNAS Y CANASTA PARA MANTENIMIENTO. INCLUYE JUNCTION BOX O CAJA METÁLICA DE PIE DE POSTE IP65 CON FUSIBLES DE 10 A PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS	UN		$ 8.939.089,00	0,00	0,00	$ 8.939.089,00	0,00	0,00%	5,00	$ 8.939.089,00	44.695.445,00	100%
7,07	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS - HL-95512 (INCLUYE CAJA 4"X4" METALICA GALVANIZADA).	UN		$ 42.954,00	0,00	0,00	$ 42.954,00	0,00	0,00%	4,00	$ 42.954,00	171.816,00	100%
7,08	POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M - 1050 KG	UN		$ 1.874.695,00	0,00	0,00	$ 1.874.695,00	0,00	0,00%	1,00	$ 1.874.695,00	1.874.695,00	100%
7,09	SALIDA BIFÁSICA C.N.	UN		$ 60.311,00	0,00	0,00	$ 60.311,00	0,00	0,00%	6,00	$ 60.311,00	361.866,00	100%
7,10	TUBO CONDUIT 3"PVC TIPO DB	ML	474,84	$ 35.767,00	16.983.602,28	474,84	$ 35.767,00	16.983.602,28	63,06%	278,16	$ 35.767,00	9.948.948,72	37%
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE METAL CODUIT EMT Ø3", (INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 107.564,00	0,00	0,00	$ 107.564,00	0,00	0,00%	20,00	$ 107.564,00	2.151.280,00	100%
7,12	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML		$ 9.709,00	0,00	0,00	$ 9.709,00	0,00	0,00%	159,00	$ 9.709,00	1.543.731,00	100%
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIION DE TUBO EMT Ø3" FLEXIBLE PARA MASTILES (INCLUYE ACCESORIOS Y COLLARINES).	ML		$ 97.178,00	0,00	0,00	$ 97.178,00	0,00	0,00%	135,00	$ 97.178,00	13.119.030,00	100%
7,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOPLE ENTRE TUBERIA CONDUIT PVC Y METÁLICA, PARA INSTALACION SUBTERRÁNEA Ø3"	UN		$ 28.039,00	0,00	0,00	$ 28.039,00	0,00	0,00%	6,00	$ 28.039,00	168.234,00	100%
7,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 90 GRADOS, Ø3" GALVANIZADA, TIPO INTERMEDIATE METAL CONDUIT EMT	UN		$ 103.274,00	0,00	0,00	$ 103.274,00	0,00	0,00%	15,00	$ 103.274,00	1.549.110,00	100%
7,16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE HALADO Y PARA INSTALACION A LA INTEMPERIE A PRUEBA DE CORROSION CON 2 ENTRADAS DE 1"	UN		$ 208.061,00	0,00	0,00	$ 208.061,00	0,00	0,00%	41,00	$ 208.061,00	8.530.501,00	100%
7,17	CAJAS NORMA CODENSA CS-274	UN	8,00	$ 571.927,00	4.575.416,00	8,00	$ 571.927,00	4.575.416,00	44,44%	10,00	$ 571.927,00	5.719.270,00	56%
7,18	CAJAS NORMA CODENSA CS-275	UN		$ 925.306,00	0,00	0,00	$ 925.306,00	0,00	0,00%	13,00	$ 925.306,00	12.028.978,00	100%
7,19	1x(3 x 2 AWG + 1N x 2 AWG + 1G x 6 AWG)	ML		$ 25.122,00	0,00	0,00	$ 25.122,00	0,00	0,00%	16,00	$ 25.122,00	401.952,00	100%
7,20	1x(1 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1G x 12 AWG)	ML		$ 25.879,00	0,00	0,00	$ 25.879,00	0,00	0,00%	110,00	$ 25.879,00	2.846.690,00	100%
7,21	1x(2 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1 x 12 AWG)	ML		$ 33.618,00	0,00	0,00	$ 33.618,00	0,00	0,00%	32,00	$ 33.618,00	1.075.776,00	100%
7,22	1x(3 x 12 AWG + 1N x 12 AWG + 1G x 12 AWG)	ML		$ 41.356,00	0,00	0,00	$ 41.356,00	0,00	0,00%	240,00	$ 41.356,00	9.925.440,00	100%
7,23	1x(3 x 2 AWG + 1N x 2 AWG + 1G x 10 AWG)	ML		$ 20.104,00	0,00	0,00	$ 20.104,00	0,00	0,00%	195,00	$ 20.104,00	3.920.280,00	100%
7,24	1x(3 x 4 AWG + 1N x 4 AWG + 1G x 12 AWG)	ML		$ 66.796,00	0,00	0,00	$ 66.796,00	0,00	0,00%	270,00	$ 66.796,00	18.034.920,00	100%
7,25	1x(3 x 6 AWG + 1N x 6 AWG + 1G x 12 AWG)	ML		$ 47.432,00	0,00	0,00	$ 47.432,00	0,00	0,00%	238,00	$ 47.432,00	11.288.816,00	100%
7,26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CABLE DE COBRE DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 2/0 AWG AWG	ML		$ 47.880,00	0,00	0,00	$ 47.880,00	0,00	0,00%	490,00	$ 47.880,00	23.461.200,00	100%
7,27	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE Ø 16 mm X 2400 mm DE LONGITUD.	UN		$ 257.749,00	0,00	0,00	$ 257.749,00	0,00	0,00%	15,00	$ 257.749,00	3.866.235,00	100%
7,28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA CONTINUIDAD EN DUCTERIA EN INSTALACIÓN AEREA DE LOS SIGUIENTES CALIBRES: 3/8"	ML		$ 56.693,00	0,00	0,00	$ 56.693,00	0,00	0,00%	135,00	$ 56.693,00	7.653.555,00	100%
7,29	SOLDADURA EXOTERMICA DE 45 gr A 115 gr	UN		$ 12.419,00	0,00	0,00	$ 12.419,00	0,00	0,00%	30,00	$ 12.419,00	372.570,00	100%
7,30	PUNTA FRANKLIN 1 m	UN		$ 114.491,00	0,00	0,00	$ 114.491,00	0,00	0,00%	5,00	$ 114.491,00	572.455,00	100%
7,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS DE ÓXIDO DE ZINC (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO) 12 kV, 10.2 kV MCOV, 10 kA, TIPO DISTRIBUCIÓN.	UN		$ 127.158,00	0,00	0,00	$ 127.158,00	0,00	0,00%	3,00	$ 127.158,00	381.474,00	100%
7,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR MONOPOLAR TIPO CORTACIRCUITOS (INCLUYE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO).	UN		$ 256.326,00	0,00	0,00	$ 256.326,00	0,00	0,00%	3,00	$ 256.326,00	768.978,00	100%
7,33	TEMPLETE SENCILLO POSTE DIRECTO A TIERRA	UN		$ 674.569,00	0,00	0,00	$ 674.569,00	0,00	0,00%	1,00	$ 674.569,00	674.569,00	100%
7,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PARA ALUMBRADO, 208/120 V, 100A, 10 kA, 5 HILOS, SOBREPONER, ENCERRAMIENTO IP 42, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X75A Y DE 24 CIRCUITOS DEISTRIBUIDOS ASI: 10 UND de 3X15 A, 8 UND de 1X6 A Y 6 RESERVAS NO EQUIPADAS	UN		$ 2.499.022,00	0,00	0,00	$ 2.499.022,00	0,00	0,00%	1,00	$ 2.499.022,00	2.499.022,00	100%
7,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PARA ALUMBRADO, 208/120 V, 100A, 10 kA, 5 HILOS, SOBREPONER, ENCERRAMIENTO IP 42, INCLUYE TOTALIZADOR DE 3X15A Y DE 12 CIRCUITOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1 UND 3X6 A, 1 UND DE 2X6 A, 2 UND DE 1X6 A, 3 RESERVAS EQU	UN		$ 2.482.173,00	0,00	0,00	$ 2.482.173,00	0,00	0,00%	2,00	$ 2.482.173,00	4.964.346,00	100%
7,36	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN		$ 73.949,00	0,00	0,00	$ 73.949,00	0,00	0,00%	5,00	$ 73.949,00	369.745,00	100%
7,37	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA	UN		$ 168.775,00	0,00	0,00	$ 168.775,00	0,00	0,00%	7,00	$ 168.775,00	1.181.425,00	100%

7,38	PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA CIRCUITOS GFCI	UN		$	98.620,00	0,00	0,00	$	98.620,00	0,00	0,00%	7,00	$	98.620,00	690.340,00	100%
						21.559.018,28				**21.559.018,28**					**290.409.059,72**	93%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
8,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	5,00	$	581.565,00	2.907.825,00	5,00	$	581.565,00	2.907.825,00	83,33%	1,00	$	581.565,00	581.565,00	17%
8,02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	9,00	$	437.768,00	3.939.912,00	9,00	$	437.768,00	3.939.912,00	81,82%	2,00	$	437.768,00	875.536,00	18%
8,03	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML		$	47.748,00	0,00	0,00	$	47.748,00	0,00	0,00%	35,00	$	47.748,00	1.671.180,00	100%
8,04	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	45,00	$	64.985,00	2.924.325,00	45,00	$	64.985,00	2.924.325,00	38,79%	71,00	$	64.985,00	4.613.935,00	61%
8,05	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML		$	117.437,00	0,00	0,00	$	117.437,00	0,00	0,00%	57,00	$	117.437,00	6.693.909,00	100%
8,06	RED SANITARIA PVC-S 8"	ML		$	143.292,00	0,00	0,00	$	143.292,00	0,00	0,00%	45,00	$	143.292,00	6.448.140,00	100%
8,07	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML		$	19.692,00	0,00	0,00	$	19.692,00	0,00	0,00%	415,00	$	19.692,00	8.172.180,00	100%
8,08	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML		$	11.986,00	0,00	0,00	$	11.986,00	0,00	0,00%	108,00	$	11.986,00	1.294.488,00	100%
8,09	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN		$	341.819,00	0,00	0,00	$	341.819,00	0,00	0,00%	1,00	$	341.819,00	341.819,00	100%
8,10	REGISTRO 1"	UN		$	143.151,00	0,00	0,00	$	143.151,00	0,00	0,00%	6,00	$	143.151,00	858.906,00	100%
8,11	VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1"	UN		$	399.100,00	0,00	0,00	$	399.100,00	0,00	0,00%	2,00	$	399.100,00	798.200,00	100%
						9.772.062,00				**9.772.062,00**					**32.349.858,00**	77%
	CANCHA															
9,01	CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4")	ML	712,51	$	78.754,00	56.113.012,54	852,51	$	78.754,00	67.138.572,54	796,74%	-745,51	$	78.754,00	-58.711.894,54	-697%
9,02	CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 8")	ML	174,00	$	161.969,00	28.182.606,00	260,00	$	161.969,00	42.111.939,50	337,66%	-183,00	$	161.969,00	-29.640.326,50	-238%
9,03	PRADIZACIÓN EN GRAMA (PASTO KIKUYO) EXISTENTE CAMPO DEPORTIVO	M2		$	24.803,00	0,00	0,00	$	24.803,00	0,00	0,00%	6.864,00	$	24.803,00	170.247.792,00	100%
9,04	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" E=0.05	M3		$	111.166,00	0,00	0,00	$	111.166,00	0,00	0,00%	275,00	$	111.166,00	30.570.650,00	100%
9,05	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD	ML		$	996.584,00	0,00	0,00	$	996.584,00	0,00	0,00%	132,00	$	996.584,00	131.549.088,00	100%
						84.295.618,54				**109.250.512,04**	30,93%	0,00			**244.015.308,96**	69%
10,0	**URBANISMO**															
10,01	CUNETAS DE CORONACIÓN PREEMSABLADA ALVEOLAR CON GEOTEXTIL	ML		$	61.614,00	0,00	0,00	$	61.614,00	0,00	0,00%	33,00	$	61.614,00	2.033.262,00	100%
10,02	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2		$	96.103,00	0,00	0,00	$	96.103,00	0,00	0,00%	15,00	$	96.103,00	1.441.545,00	100%
10,03	ADOQUÍN CONCRETO 6CM	M2	19,22	$	89.838,00	1.726.686,36	19,22	$	89.838,00	1.726.686,36	13,26%	125,78	$	89.838,00	11.299.823,64	87%
10,04	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	187,76	$	73.020,00	13.709.870,10	187,76	$	73.020,00	13.709.870,10	605,66%	-156,76	$	73.020,00	-11.446.250,10	-506%
10,05	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML		$	87.598,00	0,00	0,00	$	87.598,00	0,00	0,00%	55,00	$	87.598,00	4.817.890,00	100%
10,06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML		$	119.713,00	0,00	0,00	$	119.713,00	0,00	0,00%	24,00	$	119.713,00	2.873.112,00	100%
10,07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M,CONCRETO DE 3000 PSI	ML		$	42.944,00	0,00	0,00	$	42.944,00	0,00	0,00%	9,00	$	42.944,00	386.496,00	100%
10,08	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3		$	80.701,00	0,00	0,00	$	80.701,00	0,00	0,00%	1,00	$	80.701,00	80.701,00	100%
10,09	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3		$	76.736,00	0,00	0,00	$	76.736,00	0,00	0,00%	4,00	$	76.736,00	306.944,00	100%
10,10	MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3		$	832.792,00	0,00	0,00	$	832.792,00	0,00	0,00%	31,00	$	832.792,00	25.816.552,00	100%
10,11	MORTERO 1:4 ARENA LAVADA DE PEÑA	M3		$	532.735,00	0,00	0,00	$	532.735,00	0,00	0,00%	1,00	$	532.735,00	532.735,00	100%
10,12	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		$	25.971,00	0,00	0,00	$	25.971,00	0,00	0,00%	7,00	$	25.971,00	181.797,00	100%
10,13	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3		$	529.031,00	0,00	0,00	$	529.031,00	0,00	0,00%	4,00	$	529.031,00	2.116.124,00	100%
10,14	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN		$	1.050.837,00	0,00	0,00	$	1.050.837,00	0,00	0,00%	4,00	$	1.050.837,00	4.203.348,00	100%
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA JUGADORES CON LISTONES DE MADERA	UN		$	776.984,00	0,00	0,00	$	776.984,00	0,00	0,00%	2,00	$	776.984,00	1.553.968,00	100%
							0,00									
						15.436.556,46				**15.436.556,46**					**46.198.047,54**	75%
		SUBTO	**SUB TOTAL**			**292.104.876,15**	**SUB TOTAL**			**1.473.994.879,00**	70,75%	**SUB TOTAL**			**609.317.223,00**	29%
		ADMINIST	25%			73.026.219,04	25%			368.498.720,00		25%			152.329.306,00	
		IMPREVIS	2%			5.842.097,52	2%			29.479.898,00		2%			12.186.344,00	
		UTILIDAD	6%			17.526.292,57	6%			88.439.693,00		6%			36.559.033,00	
			SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS AIU (33%)			**96.394.609,13**	**SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS AIU (33%)**			**486.418.311,00**	70,75%	**SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS AIU (33%)**			**201.074.683,00**	29%
															6.350.000,00	
															5.860.000,00	
		COSTOS	**COSTO TOTAL CORTE 4**			**388.499.485,28**	**TOTAL ACOMULADO**			**1.960.413.190,00**	70,44%	**TOTAL POR EJECUTAR**			**822.601.906,00**	30%

Solicita:

Rafael barriga L.

RAFAEL ALBERTO BARRIGA LOPEZ
Director de Obra LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Firma y postfirma

Autorizó:

EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ
Representante Legal INTEROBRAS T
Firma y Postfirma

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/26**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
ITEM: 1.04 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -





LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO	DIMENCIONES ANCHO	DIMENCIONES ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
FILTRO DE 8"	260,00	0,60	1,20		187,20
FILTRO DE 4"	852,51	0,60	1,20		613,81
ZAPATAS PORTERIA	1,50	1,50	1,80	4,00	16,20
PERFILACION ZONA ANDENES	50,00	3,10	0,15		23,25
PERFILADO ESCALERA CENTRAL	7,00	2,40	0,25	2,00	8,40
CAJAS HIDRAULICAS	0,80	0,80	1,00	9,00	5,76
CAJAS ELECTRICAS	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00
VOLUMEN PAGADO ACTA ANTERIOR					-108,48

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **753,14**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 2026**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
ITEM: 1.06 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -





LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
ZONA CAMERINOS	18,89	13,49	0,35		89,19
ZONA ANDEN GRADERIAS	52,30	3,10	0,10		16,21
ZONA GRADERIAS	19,70	6,54	0,10	2,00	25,77
ZONA RAMPA ACCESO GRADERIA			0,20	65,62	13,12
CAMERINOS	3,00	3,00	0,30		2,70
				TOTAL ITEM:	**146,99**

OBSERVACIONES

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 2026**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
ITEM: 1.07 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -



LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO	DIMENCIONES ANCHO	DIMENCIONES ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
CIMENTACION CAMERINOS					
ZAPATAS	1,35	1,35	1,20	16,00	34,99
PORTERIA					
ZAPATAS	1,35	1,35	1,20	4,00	8,75
AREA DE CIMENTACION	3,00	3,00	0,40		3,60

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **47,34**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA	CONTRATO No : LP - 160-2025-01
FECHA:	MARZO 30 /2026	
CAPITULO:	PRELIMINARES	
ITEM: 1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)		UNIDAD: M2

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	FILTROS CANCHA	1.112,51	1,40			1557,51

OBSERVACIONES	TOTAL ITEM:	1.557,51

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
ITEM: 1.12 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -



LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA		
ZANJA TUBO 4" COSTADO ORIENTAL GRADERIAS	80,00	0,40	0,40		12,80
ZANJA TUBOS ELECTRICOS PERIMETRAL CANCHA	220,00	0,40	0,80		70,40
				TOTAL ITEM:	**83,20**

OBSERVACIONES

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**PRELIMINARES**	
ITEM: 1.14 EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	CANCHA	100,00	60,00	0,15		900,00

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEM:**	**900,00**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	**FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**CIMENTACION**	
ITEM: 2.02 RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"		**UNIDAD: M3**



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	FILTRO DE 8"	260,00	0,60	0,40		62,40
	FILTRO DE 4"	852,51	0,60	0,40		204,60

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**CIMENTACION**	
ITEM: 2.03 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	PORTERIA	11,20	0,50	0,06		0,34

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEM:**	**0,34**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	**FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**CIMENTACION**	
ITEM: 2.04 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	PORTERIA	1,00	1,00	0,30	4,00	1,20

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEM:**	**1,20**


FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	**FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**CIMENTACION**	
ITEM: 2.05 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI		**UNIDAD: M3**

DIAGRAMA -

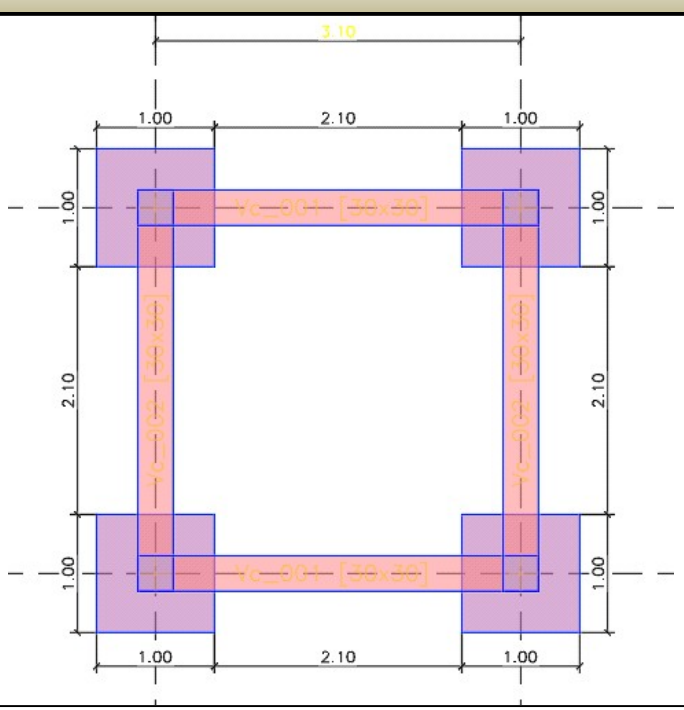

LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTURA		
PORTERIA					
VC-001	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38
VC-002	2,10	0,30	0,30	2,00	0,38

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **0,76**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA


FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30 /2026**	
CAPITULO:	**CIMENTACION**	
ITEM: 2.11 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI		**UNIDAD: M2**

DIAGRAMA -

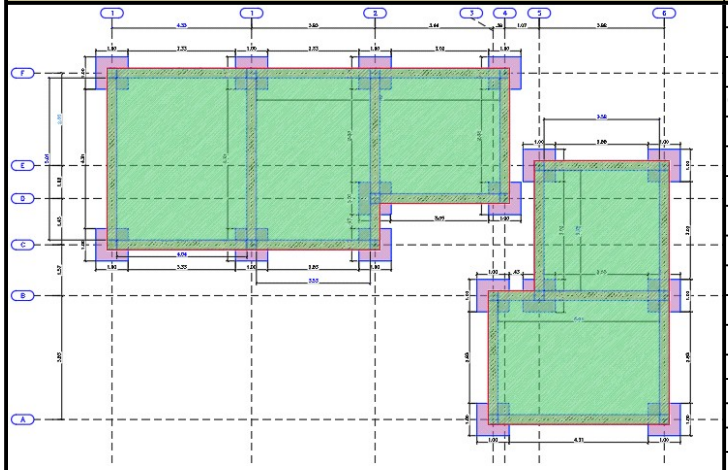

LOCALIZACION	DIMENCIONES AREA				TOTAL
CAMERINOS Y BAÑOS					
CAMERINO 1	62,24				62,24
CAMERINO 2	39,96				39,96
PORTERIA	17,47				17,47

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **119,67**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	
ITEM: 3.01 COLUMNAS 3500 PSI		**UNIDAD: M3**



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTURA		
	COLUMNAS CAMERINOS	0,30	0,30	3,15	16,00	4,54
	COLUMNAS PORTERIA	0,30	0,30	4,65	4,00	1,67

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	
ITEM: 3.02 ACERO FIGURADO 60000 PSI		**UNIDAD: KG**



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			PESO/M2	TOTAL
		LARGO	ANCHO	AREA		
	LOSA ESCALERA EJE 1	1,30	7,00	9,10	2,08	18,93
	LOSA ESCALERA EJE 8	1,30	7,00	9,10	2,08	18,93
	LOSA ESCALERA EJE 4	2,60	7,00	18,20	2,08	37,86
	LOSA ESCALERA EJE 5	2,60	7,00	18,20	2,08	37,86
	GRADAS EJE 1-4	19,70	1,32	26,00	2,08	54,09
	GRADAS EJE 5-8	19,70	1,32	26,00	2,08	54,09
	ANDEN GRADERIA 1	19,70	3,10	61,07	2,08	127,03
	ANDEN GRADERIA 2	19,70	3,10	61,07	2,08	127,03
	ANDEN RAMPA ACCESO			65,62	2,08	136,49

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEM:**	**475,80**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	**FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA	CONTRATO No : LP - 160-2025-01
FECHA:	MARZO 30/2026	
CAPITULO:	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	
ITEM: 3.06 VIGA AÉREA 3500 PSI		UNIDAD: M3



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO	DIMENCIONES ANCHO	DIMENCIONES ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
	CAMERINOS BLOQUE 1					
	V_101	8,15	0,30	0,35		0,86
	V_102	4,32	0,30	0,35		0,45
	V_103	4,13	0,30	0,35		0,43
	V_104	5,61	0,30	0,35		0,59
	V_105	5,61	0,30	0,35		0,59
	V_106	4,18	0,30	0,35		0,44
	V_107	4,32	0,25	0,35		0,38
	V_108	2,35	0,30	0,35		0,25
	V_109	4,63	0,30	0,35		0,49
	V_110	4,13	0,15	0,35		0,22
	V_111	4,18	0,15	0,35		0,22
	CAMERINOS BLOQUE 2					
	V_101	8,15	0,30	0,35		0,86
	V_102	4,32	0,30	0,35		0,45
	V_103	4,13	0,30	0,35		0,43
	V_104	5,61	0,30	0,35		0,59
	V_105	5,61	0,30	0,35		0,59
	V_106	4,18	0,30	0,35		0,44
	V_107	4,32	0,25	0,35		0,38
	V_108	2,35	0,30	0,35		0,25
	V_109	4,18	0,15	0,35		0,22
	V_110	4,13	0,15	0,35		0,22

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: 9,33

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA


FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**	
ITEM: 5.04 ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES DE LAMINA DELGADA(INCLUYE CONEXIONES)		**UNIDAD: KG**

DIAGRAMA -

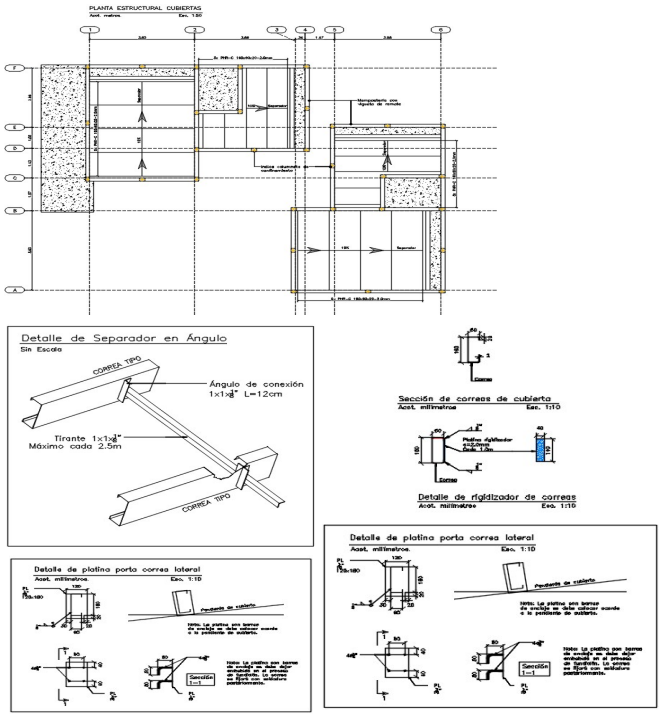

LOCALIZACION	DIMENCIONES PESO			PESO/M2	TOTAL
CAMERINOS					
CORREAS DE CUBIERTA	597,40				597,40
PLATINAS DE ANCLAJE Y RIGIDEZ	40,95				40,95
ANCLAJES LATERALES	11,73				11,73
SOPORTES DE LOSA	188,94				188,94
SOLDADURA	41,95				41,95

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
ITEM: 7.10 TUBO CONDUIT 3"PVC TIPO DB		**UNIDAD: ML**

DIAGRAMA -





LOCALIZACION	DIMENCIONES LONGITUD			CANTIDAD	TOTAL
PERIMETRO CANCHA					
COSTADO SUR	68,33			2,00	136,66
COSTADO OCCIDENTAL	52,53			2,00	105,06
COSTADO ORIENTAL	52,47			2,00	104,94
COSTADO ORIENTAL	52,79			2,00	105,58
PLAZOLETA CAMERINOS					
INSTALACION TUBERIA 3"	7,53				7,53
INSTALACION TUBERIA 3"	15,07				15,07

OBSERVACIONES	**TOTAL ITEM:**	**474,84**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
ITEM: 7.17 CAJAS NORMA CODENSA CS-274		**UNIDAD: UND**





DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES CANTIDAD			CANTIDAD	TOTAL
	PERIMETRO CANCHA					
	COSTADO SUR	1,00				1,00
	COSTADO OCCIDENTAL	1,00				1,00
	COSTADO ORIENTAL	1,00				1,00
	ANDEN GRADERIAS	3,00				3,00
	PLAZOLETA CAMERINOS	2,00				2,00

OBSERVACIONES	TOTAL ITEM:	8,00

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA	CONTRATO No : LP - 160-2025-01
FECHA:	MARZO 30/2026	
CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
ITEM: 8.01 CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100		UNIDAD: UND



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
	CAJAS DE 100x100				5,00	5,00

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: 5,00

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA	CONTRATO No : LP - 160-2025-01
FECHA:	MARZO 30/2026	
CAPITULO:	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
ITEM: 8.02 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80		UNIDAD: UND

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
	CAJAS DE 80X80				9,00	9,00

OBSERVACIONES	TOTAL ITEM:	9,00

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	
ITEM: 8.04 RED SANITARIA PVC-S 4"		**UNIDAD: ML**

DIAGRAMA -



LOCALIZACION	DIMENCIONES LONGITUD			CANTIDAD	TOTAL
ZONA GRADERIAS	45,00				45,00

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **45,00**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	MARZO 30/2026	
CAPITULO:	CANCHA	
ITEM: 9.01 CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 4")		**UNIDAD: ML**

DIAGRAMA -



LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO				TOTAL
FILTRO DE 4"	852,51				852,51
	PAGADO ACTA ANTERIOR				-140,00

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: 712,51

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**CANCHA**	
ITEM: 9.02 CONSTRUCCION DE FILTRO DE 80X60 (INCLUYE MATERIAL GRANULAR, GEOTEXTIL Y TUBERIA DE DRENAJE 8")		**UNIDAD: ML**



DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO				TOTAL
	FILTRO DE 8"	260,00				260,00
		PAGADO ACTA ANTERIOR				-86,00

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **174,00**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**URBANISMO**	
ITEM: 10.03 ADOQUÍN CONCRETO 6CM		**UNIDAD: M2**

DIAGRAMA -	LOCALIZACION	DIMENCIONES			CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO			
						
	COSTADO ORIENTAL GRADERIAS	6,20	3,10		1,00	19,22

OBSERVACIONES	TOTAL ITEM:	19,22

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA	FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

VERSIÓN 01

OBRA:	**CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA EN EL MUNUCIPIO DE TAUSA - C/MARCA**	**CONTRATO No : LP - 160-2025-01**
FECHA:	**MARZO 30/2026**	
CAPITULO:	**CANCHA**	
ITEM: 10.04 ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M		**UNIDAD: M2**





LOCALIZACION	DIMENCIONES LARGO	DIMENCIONES ANCHO	DIMENCIONES AREA	CANTIDAD	TOTAL
ANDEN PERIMETRAL GRADERIAS	19,70	3,10		2,00	122,14
ANDEN ACCESO GRADERIAS	8,75	1,30			11,38
	15,50	1,60			24,80
	9,20	3,20			29,44

OBSERVACIONES

TOTAL ITEM: **187,76**

FIRMA. RESIDENTE DE OBRA

FIRMA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

4. REGISTRO FOTOGRAFICO










16/3/2026 15:53:21
7B-36 Calle 2
Tausa
Cundinamarca


17/3/2026 11:34:58
1B-18 Carrera 8
Tausa
Cundinamarca


19/3/2026 12:21:41
7B-36 Calle 2
Tausa
Cundinamarca


28 mar 2026 2:18:02 p.m.
7-18 Calle 1a
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa









Calle 127 B No. 20 – 34 Apto 103
Teléfono móvil 321 2 34 44 77
www.lamconstrucciones.com
Bogotá D.C. Colombia


18/3/2026 11:32:17
1B-31 Carrera 7a
Tausa
Cundinamarca


25 mar 2026 8:20:26 a.m.
3-58 Carrera 4
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


27 mar 2026 10:33:26 a.m.
3-58 Carrera 4
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


1 abr 2026 10:38:13 a.m.
3-58 Carrera 4
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


28 mar 2026 11:01:37 a.m.
4-14 Calle 3
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


27 mar 2026 7:54:16 a.m.
3-2 Carrera 4
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


27 mar 2026 7:54:05 a.m.
3-2 Carrera 4
Tausa
Cundinamarca
LAM CONSTRUCCIONES
Obra Estadio Municipal de Tausa


31/3/2026 08:47:10
7-18 Calle 2
Tausa
Cundinamarca


30/3/2026 07:50:50
6-65 Calle 1a
Tausa
Cundinamarca


30/3/2026 07:51:02
6-65 Calle 1a
Tausa
Cundinamarca


31/3/2026 09:30:43
1B-18 Carrera 8
Tausa
Cundinamarca


31/3/2026 09:30:20
1B-18 Carrera 8
Tausa
Cundinamarca









Calle 127 B No. 20 – 34 Apto 103
Teléfono móvil 321 2 34 44 77
www.lamconstrucciones.com
Bogotá D.C. Colombia









Calle 127 B No. 20 – 34 Apto 103
Teléfono móvil 321 2 34 44 77
www.lamconstrucciones.com
Bogotá D.C. Colombia

5. CONCLUSIONES

1. Ya aterrizado el balance de cantidades reales de obra se evidencia que se hace necesario una adición en recursos para terminar el objeto del contrato de referencia.

2. El balance de cantidades nos muestra que se generan ítems no previstos por actividades que no se tuvieron presentes en el momento de montar el proyecto por lo cual afecta la inversión de recursos y los tiempos de desarrollo de actividades.

3. Al efectuar las excavaciones de cimentación de la portería se localiza la tubería de conducción del acueducto municipal por lo que se solicita a quien corresponda la reubicación de este tubo ya que atraviesa el predio del estadio

LAM CONSTRUCCIONES SAS
NIT 900.356.860-0
CL 97 70 C 95
Tel: (602) 2132419
Bogotá - Colombia
carboel@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FELM 137

Señores	MUNICIPIO DE TAUSA		
NIT	899.999.481-9	**Teléfono**	(601) 8583058 - Ext. 000
Dirección	CRA 3 # 3-24	**Ciudad**	Tausa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 09:22
Expedición	06/04/2026, 09:52
Vencimiento	21/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL No 4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 160-2025-LP-001 CUYO OBJETO ES, CONSTRUCCIÓNDEGRADERÍAS,ESTRUCTURA DE CUBIERTA,CAMERINOS,BATERÍAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRASEXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZGARCÍA DELMUNICIPIODE TAUSA – CUNDINAMARCA	1.00	292,104,876.15	292,104,876.15
2	ADMINISTRACION 25 %	1.00	73,026,219.04	73,026,219.04
3	IMPREVISTOS 2 %	1.00	5,842,097.52	5,842,097.52
4	UTILIDAD 6%	1.00	17,526,292.57	17,526,292.57

Total items: 4

Total Bruto	388,499,485.28
Total a Pagar	388,499,485.28

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-21 por $ 388,499,485.28

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093405476 aprobado en 20250521 prefijo FELM desde el número 107 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 96625a2f6c99d84ad5ac903fac62ca89ee6fe868d33937dbce1385c1647a62b8ecb5793d287e2d730662c5fe3e5303f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LAM CONSTRUCCIONES S.A.S identificado(a) con NITPJ 9003568600 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 239112287 desde el 12 de abril de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Bogotá D.C, abril 1 de 2026

ASUNTO: Paz y Salvo Aportes Parafiscales y pago seguridad social empresa.

AL: Señores (as)
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAUSA-CUND.

Ciudad.

Respetados señores (as):

En mi condición de Revisor Fiscal de **LAM CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificada con Nit # 900.356.860-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar y auditar que de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-FIC y CREE durante los últimos seis (6) meses.

De igual manera CERTIFICO que la empresa se encuentra al día con el pago de las nominas mensuales de sus empleados en los últimos seis (6) meses.

Lo anterior en cumplimiento del articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

_____
Contador **CARLOS BOLIVAR ELIAS**
Revisor Fiscal (TP # 115511-T)
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
CC # 72.175.354



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.175.354
NUMERO
BOLIVAR ELIAS
APELLIDOS
CARLOS
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1971
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
31-JUL-1989 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-0300100-22137259-M-0072175354-20050727 03347 05207O 02 170492350

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

115511-T



CARLOS
BOLIVAR ELIAS
C.C. 72175354
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 125430

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0103098120775716

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS BOLIVAR ELIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72175354 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 115511-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 03:38:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82876751

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 06/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAM CONTRUCCIONES S A S	**Nombre Sucursal**	TAUSA	**Código Sucursal**	006
Documento	NI900356860	**Dirección**	CL 36 SUR #35 - 46		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3336337		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	VILLAMIZAR SALCEDO JAIRO	**Identificación**	CC 84034926		
Total Afiliados	31	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003922302	MAYELINE SANTOS FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007415563	JUAN SEBASTIAN RAMOS PRADA	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 933.816	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 1007831185	YEFERSON TABA HERNANDEZ	01	00		X															0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1028884380	KEVIN SANTIAGO TASCON RISCANEVO	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
CC 1039093162	YOELY URANGO SILGADO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1055750017	GONZAGA CASTRO POLOCHE	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 992.180	$ 39.700	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF04) COMFAMA	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1066573297	ESTEBAN ANDRES PIEDRAHITA POLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1066603728	SANTIAGO URIBE TORRES	01	00		X															0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF04) COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1070306232	JEISON RODRIGO PANCHE CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1075658488	WILLIAM ALBEIRO ALARCON CAÑON	01	00	X																0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.816	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 1075669581	YONATAN SANTANA LOPEZ	01	00	X	X															0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 933.816	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 1075675281	BETY YOHANA NUÑEZ PEÑA	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.167.270	$ 186.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.167.270	$ 46.700	6,960	$ 1.167.270	$ 81.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500
CC 1076650968	LUZ HELENA PEDRAZA BARON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1077294592	URIEL SANTANA LOPEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 933.816	$ 149.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 933.816	$ 37.400	6,960	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 1077294819	JAIR ALBERTO GOMEZ RAMIREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 641.999	$ 102.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 1130646001	HECTOR FABIAN ARIAS ASTUDILLO	01	00	X																0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	6,960	$ 1.342.361	$ 93.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1143946727	OSCAR DAVID FRANCO LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 18389371	JOSE ORLANDO CRUZ MARTINEZ	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 350.181	$ 56.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 350.181	$ 14.100	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF04) COMFAMA	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 3196146	VICTOR GARCIA CAÑON	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 350.181	$ 56.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 350.181	$ 14.100	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF04) COMFAMA	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/02/2026 | **Empresa NI900356860 LAM CONTRUCCIONES S A S** | **Planilla Nro: 82876751** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71262646	OSCAR ALEJANDRO URIBE LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71352041	FERNANDO PINEDA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 71948673	LUIS FERNANDO CUADRADO ARRIETA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 78027063	WILSON RICARDO MADERA CHAVARRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 79142940	RAFAEL ALBERTO BARRIGA LOPEZ	01	01	X																0	0	16	16	16	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.066.667	$ 42.700	6,960	$ 1.066.667	$ 74.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.066.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.700
CC 79169494	FABIO ALEXANDER ALARCON SANTANA	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 79170694	RAFAEL ALBERTO QUIROGA MUÑOZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 641.999	$ 102.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 79397062	JUAN CARLOS GOMEZ TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 80467157	VICTOR MANUEL CASALLAS ROMERO	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 80541167	JOSE MANUEL LATORRE GONZALEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
CC 80545024	OMAR ALFREDO MARTINEZ FARFAN	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 641.999	$ 102.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 641.999	$ 25.700	6,960	$ 641.999	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 8166565	LUIS ALBERTO AYALA LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 34.489.212	$ 35.555.879	$ 35.555.879	$ 35.555.879	$ 5.519.800	$ 1.423.500	$ 2.475.800	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.842.600	$ 0	$ 10.842.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.
