
PROGRAMACION_MAGANGUEPJv2.mpp

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
0		**PALACIO DE JUSTICIA MAGANGUE**	**155 days**	**Tue 23/06/26 7:**	**Mon 28/12/26 5:**	
1		**INICIO**	0 days	Tue 23/06/26 7:0	Tue 23/06/26 7:00	
2		**PLAN GESTION INTEGRAL DE OBRA**	7 days	Tue 23/06/26 9:0	Wed 1/07/26 11:00	1
3		**PRELIMINARES**	**12 days**	**Wed 1/07/26 11:**	**Wed 15/07/26 5:00**	
4		Localizacion y Replanteo	1 day	Wed 1/07/26 11:(	Thu 2/07/26 11:00	2
5		Cerramiento en lamina de zinc	5 days	Sat 4/07/26 10:0(	Fri 10/07/26 1:00 p.	2;13
6		Campamento de obra y Almacenamiento de Materiales	4 days	Fri 10/07/26 3:00 p. m.	Wed 15/07/26 5:00 p. m.	5
7		**PROVISIONALES DE OBRA**	**5 days**	**Fri 10/07/26 3:00**	**Thu 16/07/26 5:00**	
8		Provisional de energia electrica	2 days	Fri 10/07/26 3:00	Mon 13/07/26 5:00	5
9		Provisional de agua potable	2 days	Fri 10/07/26 3:00	Mon 13/07/26 5:00	5
10		Servicio de baños portatiles	1 day	Wed 15/07/26 5:(	Thu 16/07/26 5:00 p.	4;6
11		Comunicaciones	1 day	Wed 15/07/26 5:(	Thu 16/07/26 5:00 p.	6
12		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**44 days**	**Thu 2/07/26 11:0**	**Tue 25/08/26 11:00**	
13		Limpieza y Descapote Esp.=0,20 mts a Maquina	2 days	Thu 2/07/26 11:0	Sat 4/07/26 10:00 a	4
14		Excavaciones a maquina	3 days	Sat 4/07/26 10:0(	Wed 8/07/26 1:00 p.	13
15		Relleno Con Material Seleccionado Certificado	3 days	Sat 4/07/26 10:0(	Wed 8/07/26 1:00 p.	14FS-3 days
16		Pilotes armados en concreto	10 days	Wed 8/07/26 3:0(	Mon 20/07/26 7:00	15
17		Descabece de pilotes de diametro 0.8 mts	10 days	Thu 2/07/26 11:0	Tue 14/07/26 5:00 p.	16FS-15 days
18		Excavacion sobre terreno para zapatas y vigas de Amarre	10 days	Sat 4/07/26 10:00 a. m.	Thu 16/07/26 5:00 p. m.	13;17FF+1 day
19		Excavaciones maquina tanque	10 days	Wed 12/08/26 5:(	Tue 25/08/26 11:00	25
20		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**65 days**	**Thu 9/07/26 3:00**	**Sat 26/09/26 10:00**	
21		Concreto De limpia o pobre 2.000 Psi, para zapatas y vigas de amarre	6 days	Thu 9/07/26 3:00 p. m.	Thu 16/07/26 5:00 p. m.	18FF
22		Concreto De 4.000 Psi, Para Zapatas, Incluye Mano De C	10 days	Wed 15/07/26 5:(	Tue 28/07/26 11:00	21SS+5 days
23		Concreto De 4.000 Psi, Para Viga De Cimentación	10 days	Wed 22/07/26 9:(	Mon 3/08/26 1:00 p.	21FS+4 days
24		Concreto De 4.000 PSI Para Pedestales	4 days	Mon 3/08/26 3:0(	Fri 7/08/26 1:00 p.	22;23
25		Concreto De 4.000 Psi Para losa contrapiso e 4.000	8 days	Mon 3/08/26 3:0(	Wed 12/08/26 5:00	23
26		Concreto De 4.000 Psi, para columas piso 1	8 days	Fri 7/08/26 3:00 p	Mon 17/08/26 7:00	24
27		Concreto De 4.000 Psi Para losa Entrepisos pisos 2	6 days	Thu 13/08/26 5:0	Thu 20/08/26 7:00	26FS-3 days
28		Concreto De 4.000 Psi, para columas piso 2	8 days	Tue 18/08/26 9:0	Thu 27/08/26 11:00	27FS-3 days
29		Concreto De 4.000 Psi Para losa Entrepisos pisos 3	6 days	Mon 24/08/26 11	Mon 31/08/26 1:00	28FS-3 days
30		Concreto De 4.000 Psi, para columas piso 3	8 days	Thu 27/08/26 11:(	Sat 5/09/26 12:00 p	29FS-3 days
31		Concreto De 4.000 Psi Para losa Entrepisos pisos 4	6 days	Wed 2/09/26 3:0(	Wed 9/09/26 5:00 p	30FS-3 days
32		Concreto De 4.000 Psi, para columas piso 4	8 days	Sat 5/09/26 2:00	Tue 15/09/26 7:00 p	31FS-3 days
33		Concreto De 4.000 Psi Para losa Entrepisos pisos 5	6 days	Fri 11/09/26 5:00	Fri 18/09/26 7:00 p	32FS-3 days
34		Concreto De 4.000 Psi, para columas piso 5	5 days	Wed 16/09/26 9:(	Tue 22/09/26 11:00	33FS-3 days
35		Concreto De 4.000 Psi Para losa sobre nivel y sobre recorrido de ascensor	7 days	Fri 18/09/26 9:00 a. m.	Sat 26/09/26 10:00 a. m.	34FS-3 days
36		Armado y Fundida losa tanque	7 days	Tue 25/08/26 11:(	Wed 2/09/26 1:00 p.	19
37		Armado y Fundida muros tanque	7 days	Wed 2/09/26 3:0(	Thu 10/09/26 5:00	36
38		Losa Tapa tanque	7 days	Thu 10/09/26 5:0	Fri 18/09/26 7:00 p.	37
39		**MAMPOSTERIA**	**38 days**	**Mon 31/08/26 3:**	**Thu 15/10/26 7:00**	
40		Mamposteria en bloque #5 y #4 Piso 1	7 days	Mon 31/08/26 3:(	Tue 8/09/26 5:00 p.	29
41		Mamposteria en bloque #5 y #4 Piso 2	7 days	Tue 8/09/26 5:00	Wed 16/09/26 7:00	40
42		Mamposteria en bloque #5 y #4 Piso 3	7 days	Thu 17/09/26 9:0	Fri 25/09/26 11:00	41
43		Mamposteria en bloque #5 y #4 Piso 4	7 days	Fri 25/09/26 11:0	Sat 3/10/26 12:00 p	42
44		Mamposteria en bloque #5 y #4 cubierta	4 days	Sat 3/10/26 2:00	Thu 8/10/26 5:00 p.	43;35
45		Pañete muros piso 1	8 days	Tue 1/09/26 3:00	Thu 10/09/26 5:00	40FS-6 days
46		Pañete muros piso 2	8 days	Wed 9/09/26 5:0(	Fri 18/09/26 7:00 p.	41FS-6 days
47		Pañete muros piso 3	8 days	Fri 18/09/26 9:00	Mon 28/09/26 1:00	42FS-6 days
48		Pañete muros piso 4	8 days	Sat 26/09/26 10:(	Tue 6/10/26 5:00 p.	43FS-6 days
49		Pañete muros cubierta	5 days	Mon 5/10/26 5:0(	Sat 10/10/26 4:00 p	44FS-3 days
50		Alfagia en concreto	4 days	Mon 12/10/26 9:(	Thu 15/10/26 7:00 p	49
51		**PISOS Y ENCHAPES**	**53 days**	**Sat 5/09/26 2:00**	**Mon 9/11/26 7:00**	
52		Plantilla de nivelacion en mortero1:4 Piso 1	5 days	Sat 5/09/26 2:00	Fri 11/09/26 5:00 p.	45FS-4 days;2
53		Plantilla de nivelacion en mortero1:4 Piso 2	5 days	Tue 15/09/26 9:0	Mon 21/09/26 11:0	46FS-4 days;2
54		Plantilla de nivelacion en mortero1:4 Piso 3	5 days	Wed 23/09/26 11	Tue 29/09/26 1:00 p	47FS-4 days;2
55		Plantilla de nivelacion en mortero1:4 Piso 4	5 days	Tue 29/09/26 3:0	Mon 5/10/26 5:00 p	43FS-4 days;3
56		Plantilla de nivelacion en mortero1:4 cubiertas	5 days	Tue 6/10/26 5:00	Mon 12/10/26 7:00	49FS-4 days;3
57		Enchapes piso tableta Piso 1	8 days	Fri 11/09/26 5:00	Tue 22/09/26 11:00	52
58		Intalacion Zocalos Piso 1	4 days	Fri 18/09/26 9:00	Wed 23/09/26 11:0	57FF+1 day
59		Enchape piso tableta Piso 2	8 days	Wed 16/09/26 9:(	Fri 25/09/26 11:00	53FS-4 days
60		Intalacion Zocalos Piso 2	4 days	Tue 22/09/26 11:(	Sat 26/09/26 10:00	59FF+1 day
61		Enchape piso tableta Piso 3	8 days	Thu 24/09/26 11:(	Sat 3/10/26 12:00 p	54FS-4 days
62		Intalacion Zocalos Piso 3	4 days	Wed 30/09/26 3:(	Mon 5/10/26 5:00 p.	61FF+1 day;6
63		Enchape piso tableta Piso 4	8 days	Wed 30/09/26 3:(	Fri 9/10/26 5:00 p.	55FS-4 days
64		Intalacion Zocalos Piso 4	4 days	Tue 6/10/26 5:00	Sat 10/10/26 4:00 p	63FF+1 day
65		Enchape piso tableta cubiertas	8 days	Wed 7/10/26 5:0(	Fri 16/10/26 7:00 p.	56FS-4 days
66		Intalacion Zocalos cubierta	4 days	Sat 17/10/26 8:0(	Thu 22/10/26 11:00	65
67		Enchape muros cocina	3 days	Thu 22/10/26 11:(	Mon 26/10/26 1:00	65;66
68		Enchape muros baños	8 days	Thu 22/10/26 11:(	Sat 31/10/26 12:00	67SS;71
69		Piso caucho Gimnasio	6 days	Mon 2/11/26 5:0(	Mon 9/11/26 7:00	83
70		**IMPERMEABILIZACIONES**	**18 days**	**Mon 28/09/26 3:**	**Tue 20/10/26 11:00**	
74		**ESTUCOS Y PINTURAS**	**60 days**	**Tue 22/09/26 11:**	**Thu 3/12/26 5:00 p**	
86		**CIELO RASO**	**23 days**	**Wed 30/09/26 3:**	**Wed 28/10/26 1:00**	
91		**CARPINTERIA METALICA**	**67 days**	**Wed 7/10/26 5:0**	**Mon 28/12/26 5:00**	
95		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**	**75 days**	**Mon 3/08/26 3:0**	**Mon 2/11/26 5:00 p**	
100		**APARATOS SANITARIOS**	**7 days**	**Sat 31/10/26 2:0**	**Mon 9/11/26 7:00 p**	
104		**RED CONTRA INCENDIOS**	**25 days**	**Fri 6/11/26 5:00 p**	**Mon 7/12/26 7:00 p**	
106		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**67 days**	**Thu 17/09/26 9:0**	**Mon 7/12/26 7:00 p**	
115		**AIRES ACONDICIONADOS**	**28 days**	**Mon 26/10/26 3:**	**Sat 28/11/26 12:00**	
116		Suministro y montaje tuberias y ductos	25 days	Mon 26/10/26 3:(	Wed 25/11/26 1:00	110FF;97FF
117		Balanceo de sistemas de AA	25 days	Mon 26/10/26 3:(	Wed 25/11/26 1:00	110FF;97FF
118		Instalacion de difusores y rejillas	7 days	Fri 20/11/26 11:0	Sat 28/11/26 12:00	117FF+3 days
119		**URBANISMO**	**25 days**	**Thu 10/09/26 5:0**	**Sat 10/10/26 4:00 p**	
122		**EQUIPOS ESPECIALES**	**12 days**	**Sat 28/11/26 2:0**	**Mon 14/12/26 11:0**	
126		**SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO ONGRID**	**40 days**	**Thu 22/10/26 11:**	**Wed 9/12/26 7:00 p**	
127		Intalacion Panel solar	40 days	Thu 22/10/26 11:(	Wed 9/12/26 7:00 p	66;107FF
128		Inversor Solar	40 days	Thu 22/10/26 11:(	Wed 9/12/26 7:00 p	66;107FF
129		Equipos de Medida del SSFV.	40 days	Thu 22/10/26 11:(	Wed 9/12/26 7:00 p	66;107FF
130		Equipos de Monitoreo	40 days	Thu 22/10/26 11:(	Wed 9/12/26 7:00 p	66;107FF
131		Soportes para paneles solares. Estructura metálica en aluminio para paneles solares Fijada losa de cubierta	40 days	Thu 22/10/26 11:00 a. m.	Wed 9/12/26 7:00 p. m.	66;107FF
132		**ASEO DE OBRA**	**120 days**	**Mon 3/08/26 3:0**	**Sat 26/12/26 12:00**	
135		**RETIE Y RETILAB**	80 days	Thu 17/09/26 9:0	Wed 23/12/26 1:00	107SS
136		**FIN**	0 days	Wed 23/12/26 1:(	Wed 23/12/26 1:00	8;10;11;15;92

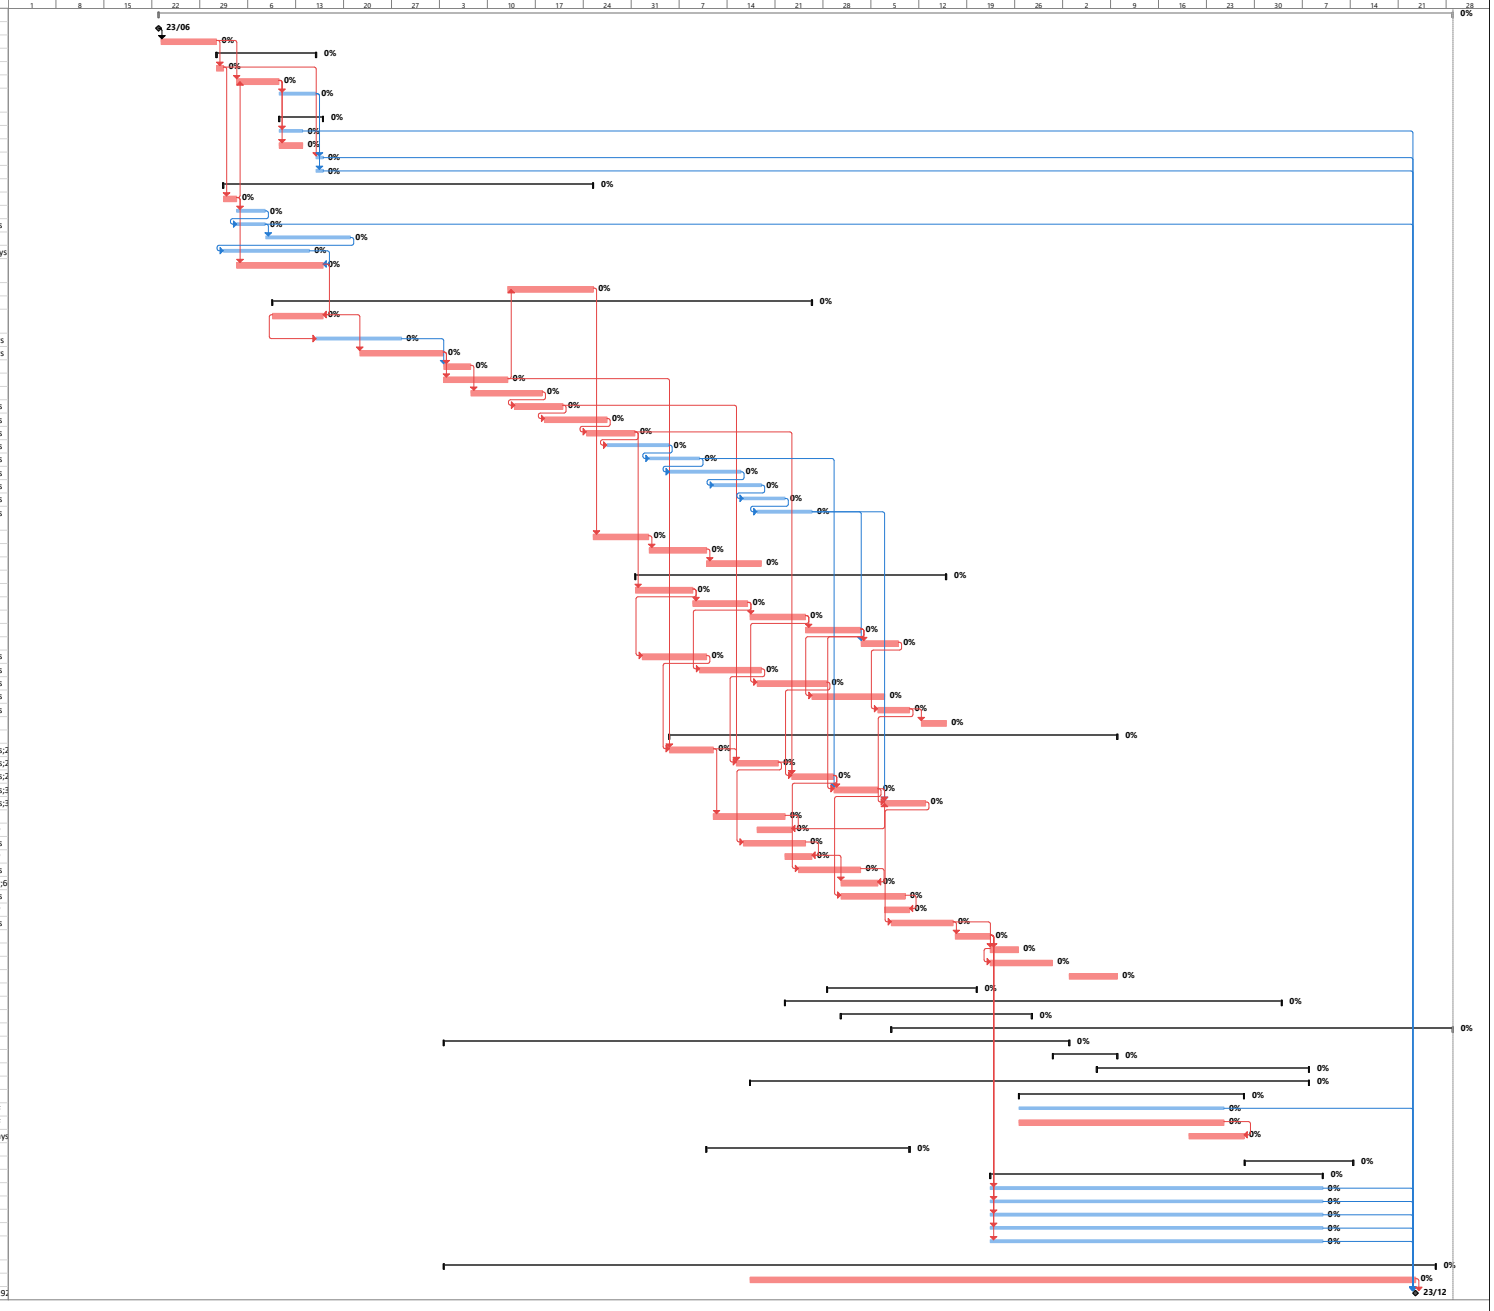

Critical Split · División crítica · Tarea · Progreso de tarea · solo el comienzo · solo duración · División de la línea base · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · solo fin · Línea base · Hito de línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Crítical


Jan '27
Feb '27
Mar '27
Apr '27
May '27
Jun '27
Jul '27
Aug '27
Sep '27
Oct '27
0%
0%
0%
2
Critical Split
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
Crítical
