# INFORMES DE INTERVENTORÍA

# INFORME DE COBRO DE INTERVENTORÍA No. 03

## PERÍODO:
## DICIEMBRE 01 DE 2025 – DICIEMBRE 31 DE 2025


Frente Brisas de primavera.


Frente Halcón de granada.

**OBJETO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 3. INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210-16227-4**

| | |
|---|---|
| **Edith Costanza Toloza Rojas**<br>Representante Legal<br>**CONSORCIO INTER PIEDECUESTA** | |

# Contenido

1 INTRODUCCIÓN ..... 6
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 7
2.1 LOCALIZACIÓN ..... 7
2.2 ESTADO INICIAL DEL TALUD ..... 8
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO ..... 8
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 16
3.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... 16
3.1.1 DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO. ..... 17
3.1.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO. ..... 18
3.1.3 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA. ..... 19
3.1.4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO (ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 01) ..... 24
3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 25
3.3 INFORME DE AVANCE ..... 26
3.3.1 Avance de obras programadas vs obras ejecutadas acumuladas 26
3.3.2 Comités de obra ..... 27
3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA ..... 28
3.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA ..... 29
3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ..... 30
3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 31
3.8 INFORMACIÓN DE RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 32
3.9 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR ..... 33
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 34
4.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... 34
4.1.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 35
4.1.2 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO ..... 36
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR. . 36
4.3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA ..... 38
4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 39
4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA ..... 40
4.6 INFORMACIÓN DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA ..... 41
4.7 SEGUIMENTO AL PAGO DE APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORÍA.FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA ..... 42
5. INFORME DE GESTIÓN SOCIO- AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA ..... 43

6. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA .. 44
7. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA ..... 45
8. BITACORA DE OBRA ..... 47
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 48
10. INFORMES SEMANALES ..... 51
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 52

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información General del contrato de obra ..... 16
Tabla 2. Control de pólizas del contrato de obra Con la suscripción del contrato de obra ..... 17
Tabla 3. Control de pólizas del contrato de obra Con la suscripción del Acta de Inicio ..... 17
Tabla 4. Relación de actas del contrato de obra ..... 18
Tabla 5. Presupuesto del contrato (condiciones iniciales) ..... 19
Tabla 6. Información General del contrato de interventoría ..... 34
Tabla 7. Control de pólizas del contrato de interventoría con la suscripción del contrato de interventoría ..... 35
Tabla 8. Control de pólizas del contrato de interventoría con la suscripción del Acta de Inicio ..... 35
Tabla 9. Relación de actas del contrato de interventoría ..... 36

# LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del proyecto. ..... 7
Ilustración 2. Estado inicial del talud Brisas de primavera. ..... 8
Ilustración 3. Estado inicial del talud Halcón de granada. ..... 8
Ilustración 4. Detalle de una pantalla anclada de concreto ..... 10
Ilustración 5. Detalle del cable del anclaje ..... 10
Ilustración 6. Detalle sistema de inyección del anclaje activo ..... 11
Ilustración 7. Detalle de zapata ..... 11
Ilustración 8 Detalle del perfil talud Brisas de primavera. ..... 12
Ilustración 9 Clavos o Nails. ..... 13
Ilustración 10 Anclajes Nails de 1 1/4" ..... 13
Ilustración 11 Proceso de instalación de barras de anclaje. ..... 14
Ilustración 12 Detalle de platina para el sistema. ..... 14
Ilustración 13 Área de cobertura de estabilización en Brisas de primavera. ..... 15
Ilustración 14. %Avance Programado vs %Avance Ejecutado ..... 26
Ilustración 15. Seguimiento a la línea base del costo ..... 26

# 1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), realizó la adjudicación del contrato cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICO DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, con el objetivo de realizar las obras tendientes a garantizar la disminución del riesgo en el talud ubicado en el Barrio Brisas de Primavera y el talud en el Barrio Halcón de Granada, del municipio de Piedecuesta.

Esta obra coadyuva a la protección de las viviendas ubicadas en los puntos de intervención de Piedecuesta, donde se ha tenido antecedentes de inestabilidad por las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona, por lo cual la obra previene la degradación del suelo, representadas por los procesos de erosión que se evidencian en el sector, así como fenómenos de remoción en masa, garantizando que en sus zonas aferentes persista la vegetación y se garantice la protección de las viviendas.

Por otro lado, desde el ámbito de gestión del riesgo y considerando que es zona de escarpe, de acuerdo a los estudios realizados por INGEOMINAS (hoy en día SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO), existe la susceptibilidad de deslizamiento producto de los procesos de erosión que se ven acelerados por la intervención del hombre, por lo cual las viviendas existentes y sus habitantes pueden sufrir pérdidas de sus enseres y hasta la de la propia vida; con la construcción de la obra, se mejorarán las condiciones de estabilidad, disminuyendo la susceptibilidad de ocurrencia del fenómeno de erosión y con ello la disminución de la amenaza existente a fenómenos de remoción en masa.

En el presente informe se describen detalladamente todas las actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato de obra e interventoría, en sus componentes técnicos, administrativos y financieros durante el periodo comprendido entre el **01 y el 31 de diciembre del 2025.**

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto está localizado en el municipio de Piedecuesta, Santander, el cual hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, junto a los municipios de Girón y Floridablanca.

La cabecera municipal de Piedecuesta está localizada a los 6° 59′ 19″ latitud norte y a los 73° 03′ 01″ longitud oeste; los taludes que se van a estabilizar se encuentran ubicados en los barrios Brisas de primavera y Halcón de granada.

En las ilustraciones No. 01 y No. 02 se puede observar la ubicación del proyecto en el municipio de Piedecuesta.

Brisas de Primavera: Carrera 1ª entre calle 15B y 16.
Halcón de Granada: Calle 1ª A Norte con carrera 19A

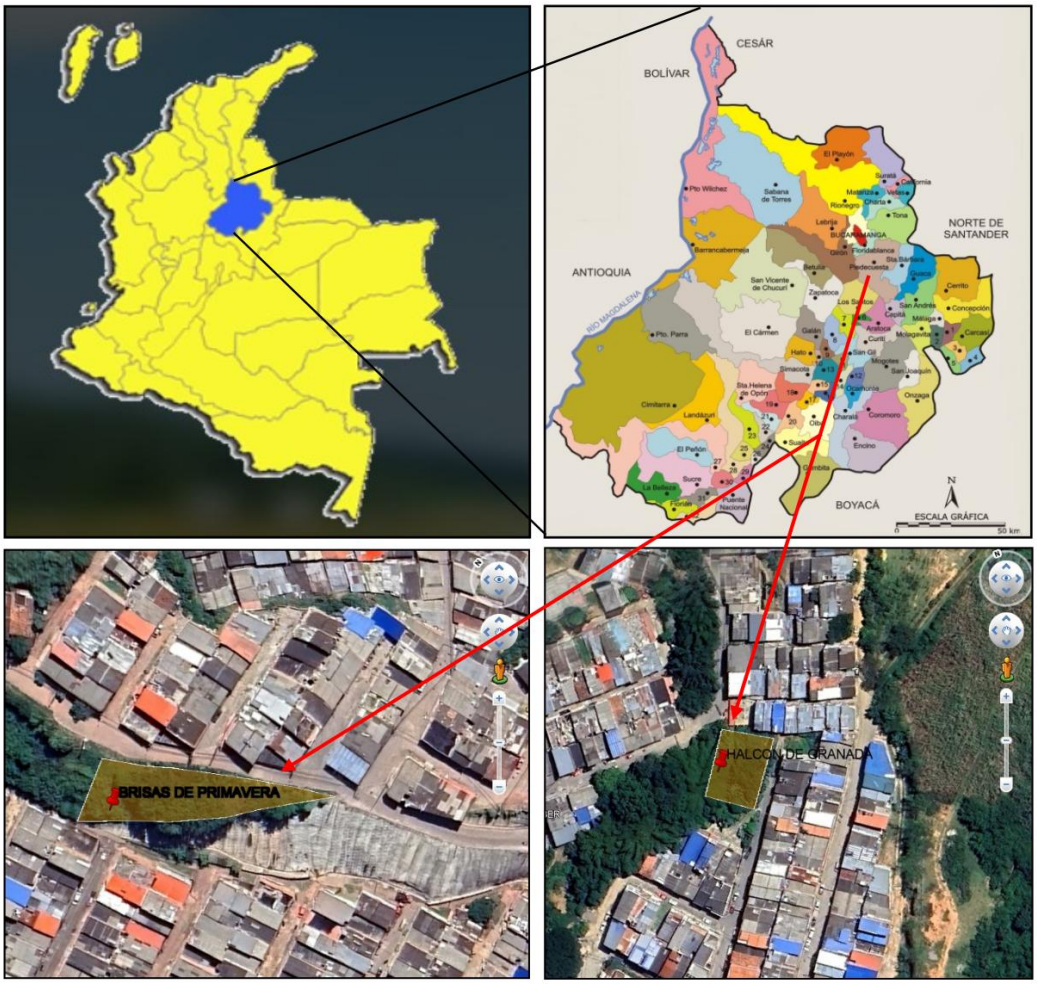



*Ilustración 1. Localización del proyecto.*
Fuente: Google Earth

## 2.2 ESTADO INICIAL DEL TALUD

En las siguientes imágenes se pueden observar el estado de los taludes antes de ser intervenidos.



*Ilustración 2. Estado inicial del talud Brisas de primavera.*



*Ilustración 3. Estado inicial del talud Halcón de granada.*

## 2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La alternativa seleccionada para estabilizar los taludes de este proyecto mejorará las condiciones de estabilidad de los mismos, toda vez que de amenaza alta pasará a tener una amenaza baja por fenómenos de remoción en masa, tanto en condiciones estáticas como dinámicas.

Las obras que se construirán en el talud del barrio Halcón de granada, será una pantalla de concreto reforzado con anclajes activos, en cada punto de intervención. Este tipo de estructura mitigará la amenaza de fenómenos de remoción en masa, toda vez que transmitirá las cargas ejercidas por el talud de una forma segura a un sitio por fuera de la dovela de falla. Dichas pantallas se conformarán por las siguientes actividades:

- Replanteo, control y medición de la obra
- Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m)
- Desmonte y limpieza
- Retiro de basuras y escombros

- Perfilado a mano descolgado de talud
- Excavación a tajo abierto en taludes
- Excavación con acarreo libre
- Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m
- Concretos
- Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas
- Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm
- Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes
- Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2
- Suministro y colocación de anclajes
- Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m
- Tensionamiento de anclajes
- Suministro y colocación
- Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m
- Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros
- Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2"
- Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje
- Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m
- Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración
- Canaleta (ancho=1m; e=10cm)
- Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m
- Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora
- Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m
- Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m

Este tipo de obra se convierte en un elemento fundamental para asegurar la estabilidad en áreas críticas con inclinaciones pronunciadas. Esto se logra mediante la utilización de anclajes que introducen tensiones, esfuerzos y deformaciones adicionales en el suelo, mejorando la estabilidad en general. Una vez instalados, estos anclajes se ajustan previamente hasta alcanzar una carga segura. En este proceso, el suelo se comprime entre el lugar donde se encuentra el anclaje y la superficie de apoyo de la estructura.

A continuación, se mostrarán detalles esquemáticos de cada uno de los componentes principales de una pantalla de concreto anclada:

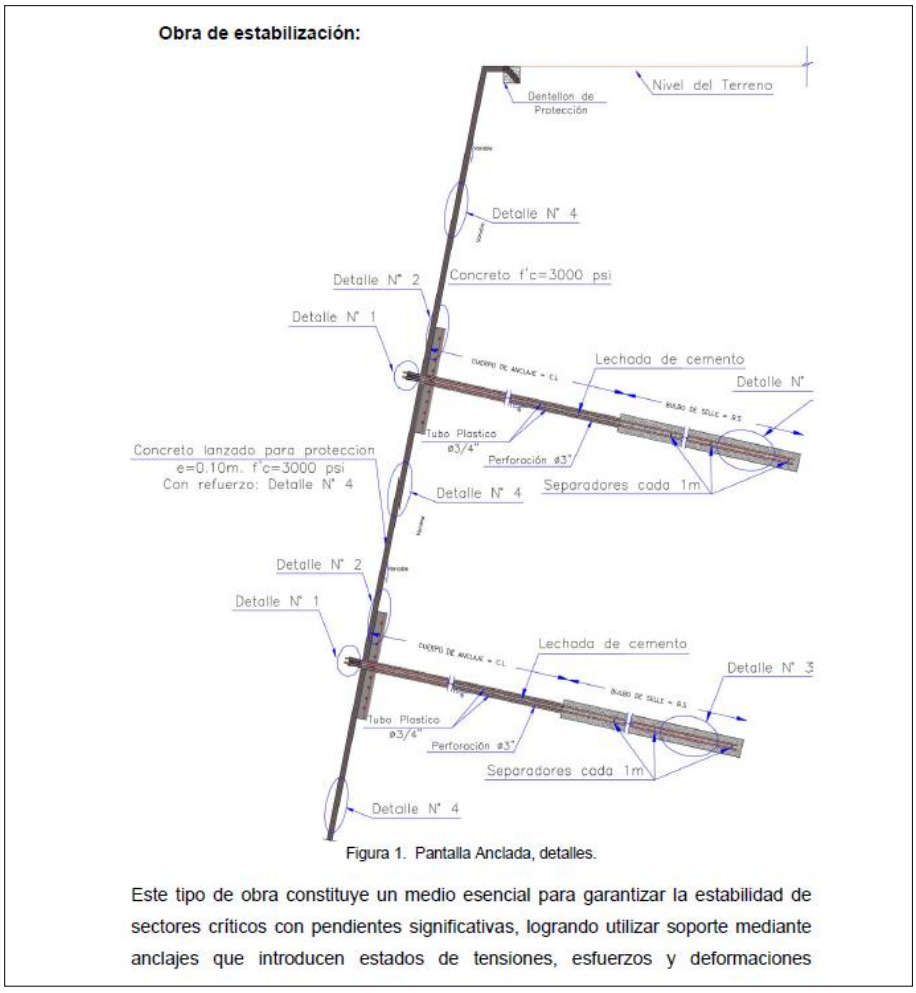



*Ilustración 4. Detalle de una pantalla anclada de concreto*

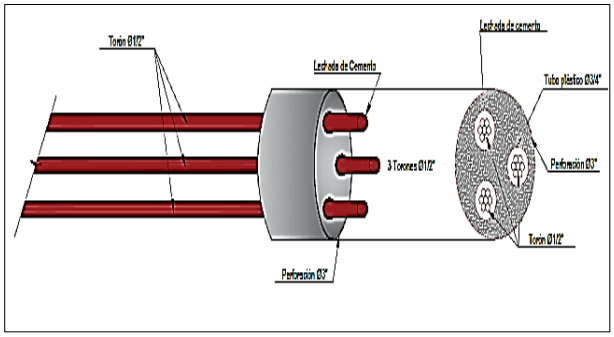



*Ilustración 5. Detalle del cable del anclaje*

El sistema del anclaje activo propuesto en esta obra de estabilización, se conforma por tres torones de Ø=1/2" trenzados entre ellos, los cuales a su vez se conforman por ocho (8) hilos de acero trenzados radialmente. Dichos torones serán tensionados hasta 10 ton cada uno, una vez el sistema del anclaje haya sido llenado e inyectado con lechada cementicia y esta

(lechada) alcance su capacidad máxima a la compresión. Una vez tensionado cada torón, el sistema del anclaje activo estará tensionado a 30 ton.

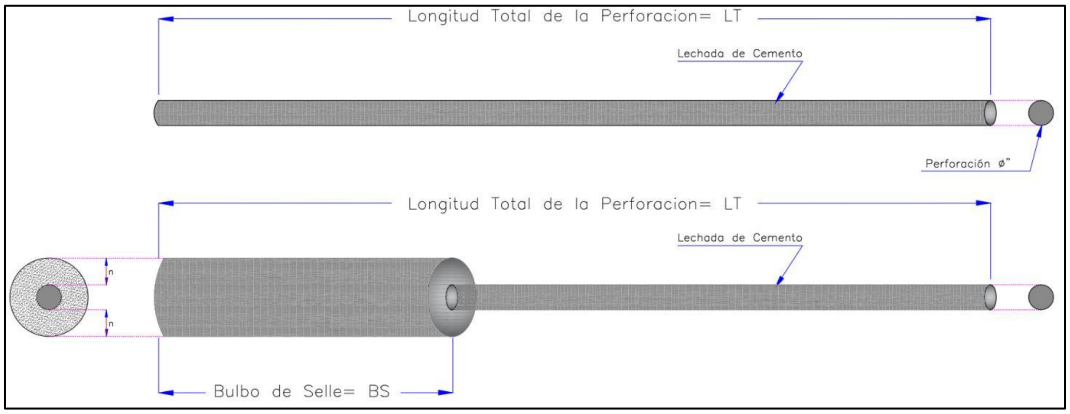



*Ilustración 6. Detalle sistema de inyección del anclaje activo*

El sistema de inyección del anclaje se realiza con lechada cementicia, con el fin de mejorar la capacidad de carga de este, toda vez que se fortalece la conexión entre el anclaje y el suelo. Adicionalmente, protege (la lechada) a los torones en la zona libre, debido a que los embebe en ella y no permite que queden expuestos en el terreno natural.

La configuración geométrica del anclaje de este proyecto, para el frente Brisas de Primavera se conforma por una longitud libre de 9,00m (distancia entre la cara del talud y el punto de inicio del bulbo) y por una longitud del bulbo de 6,00m; para el frente Halcón de granada por una longitud libre de 12,00m (distancia entre la cara del talud y el punto de inicio del bulbo) y por una longitud del bulbo de 8,00m.

El bulbo es la parte del anclaje que se adhiere al terreno natural y le transmite su carga mediante la lechada.

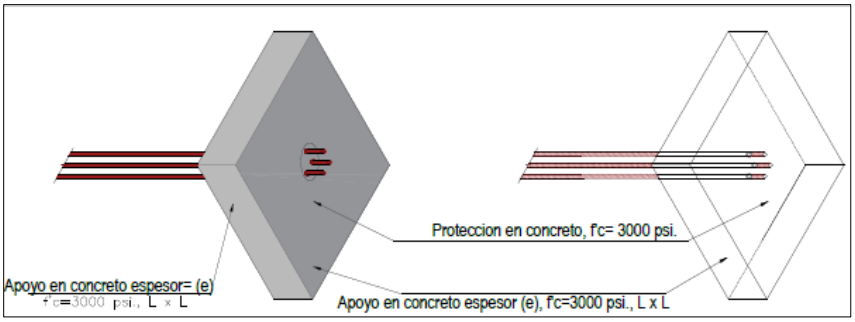



*Ilustración 7. Detalle de zapata*

La zapata tiene la función de ser un punto de apoyo para las cargas del anclaje, además mediante su estructura, generalmente ensanchada, distribuye las cargas hacia el suelo para evitar concentraciones de cargas en un punto especifico y mejorar la estabilidad de la estructura.

En el talud del barrio Brisas de Primavera, se reemplazará el sistema de pantalla de concreto reforzado con anclajes activos por un sistema tipo Nails (Anclajes pasivos ejecutados con varillas de 1 ¼) anclados al terreno con un Angulo de inclinación con la horizontal de 15° con revestimiento de la cara superficial con manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV. Este tipo de estructura mitigará la amenaza de fenómenos de remoción en masa, toda vez que transmitirá las cargas ejercidas por el talud de una forma segura a un sitio por fuera de la dovela de falla. Dicho sistema se conformará por las siguientes actividades:

- Replanteo, control y medición de la obra
- Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m)
- Desmonte y limpieza
- Retiro de basuras y escombros
- Perfilado a mano descolgado de talud (en roca)
- Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m
- Llenado de inyección con lechada cementícia para anclajes
- Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m
- Canaleta (ancho=1m; e=10cm)
- Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m
- Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m
- Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV
- Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero

A continuación, se mostrarán detalles esquemáticos de cada uno de los componentes principales del sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV soportado por anclajes pasivos:

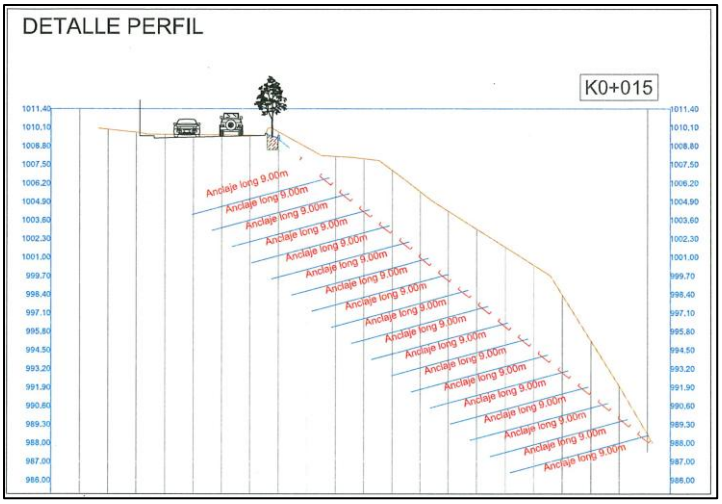



*Ilustración 8 Detalle del perfil talud Brisas de primavera.*

El sistema utiliza procedimientos similares a los de los muros anclados con la diferencia de que los refuerzos no son pretensados, sino que actúan en forma pasiva, ya que las inclusiones pasivas de refuerzo dentro del suelo generan soporte a las estructuras, en este caso al sistema de bioingeniería para control de erosión superficial.

El sistema de anclaje propuesto para este talud, se conforma por anclajes pasivos ejecutados con varillas de 1 ¼", anclados al terreno con un ángulo de inclinación con la horizontal de 15°. Cada anclaje debe contar con placa de fijación.
la cara del talud será revestida por medio de una protección de taludes con un sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV.

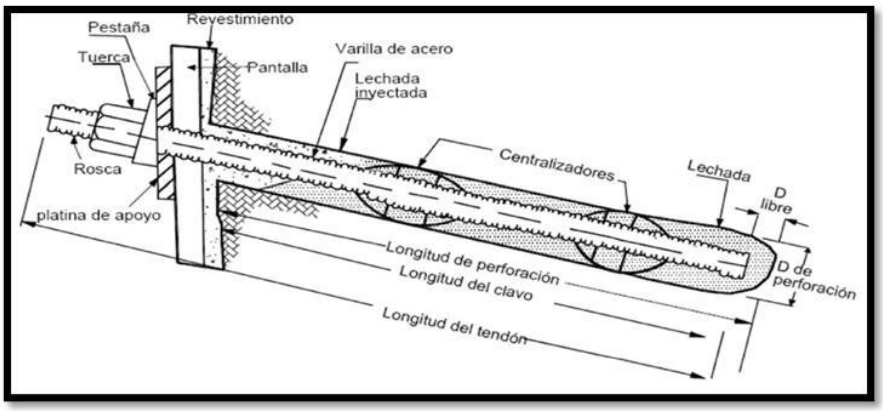



*Ilustración 9 Clavos o Nails.*

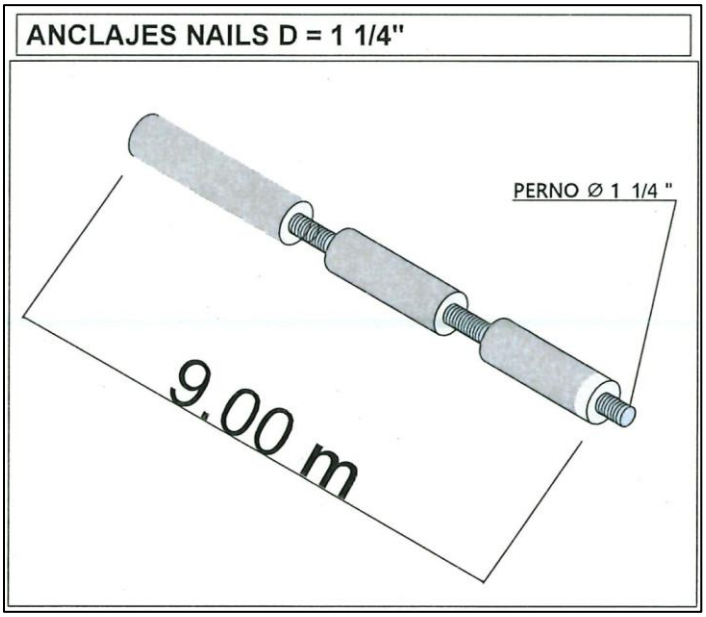



*Ilustración 10 Anclajes Nails de 1 1/4"*

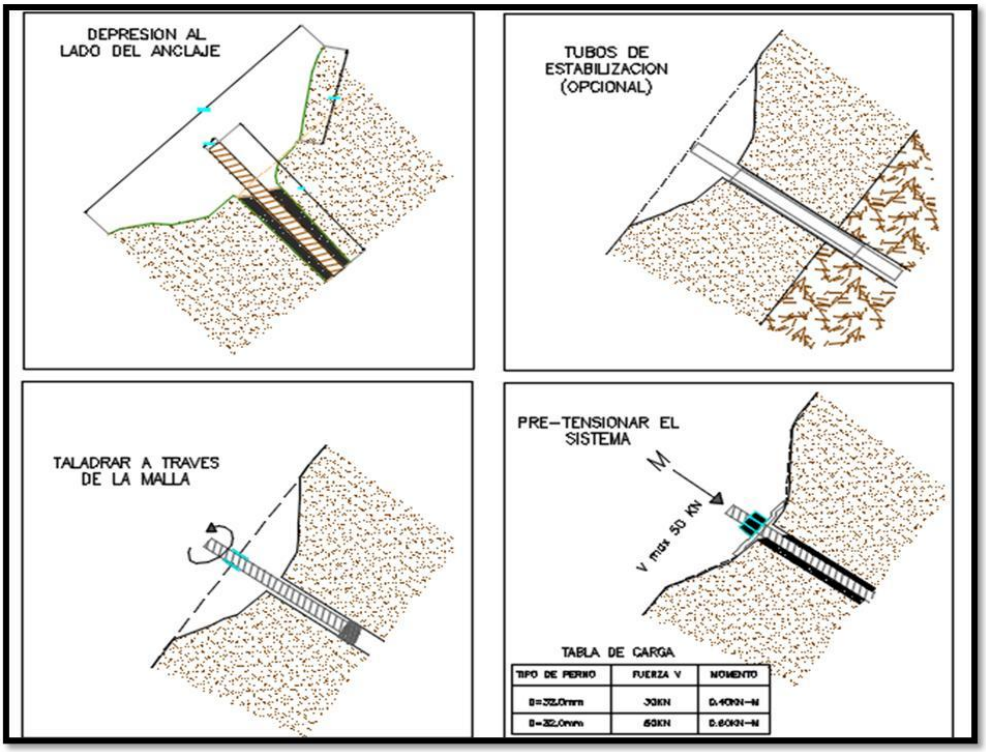



*Ilustración 11 Proceso de instalación de barras de anclaje.*

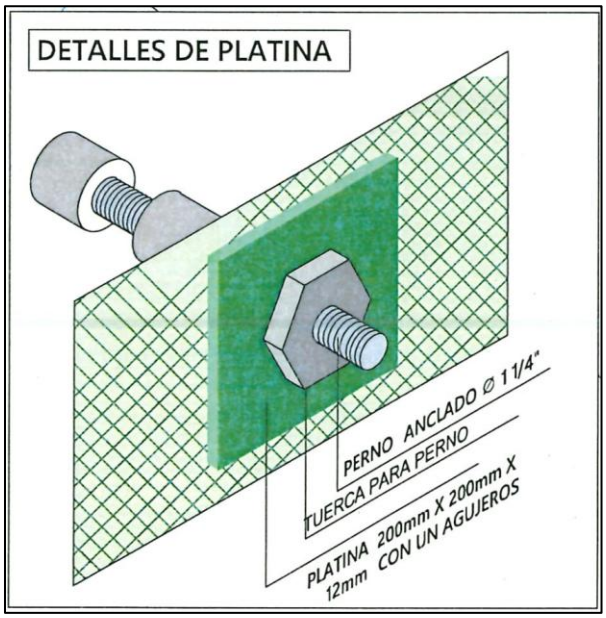



*Ilustración 12 Detalle de platina para el sistema.*

La platina quedará apoyada sobre la superficie del sistema.

Los elementos descritos controlan la erosión, el desprendimiento de material y generan el desarrollo paisajístico en las paredes de los taludes, junto a un impacto positivo ambiental.

Con el reemplazo del tipo de sistema de estabilización en Brisas de Primavera, se incrementará el área de cobertura sobre el talud en 864 m2.

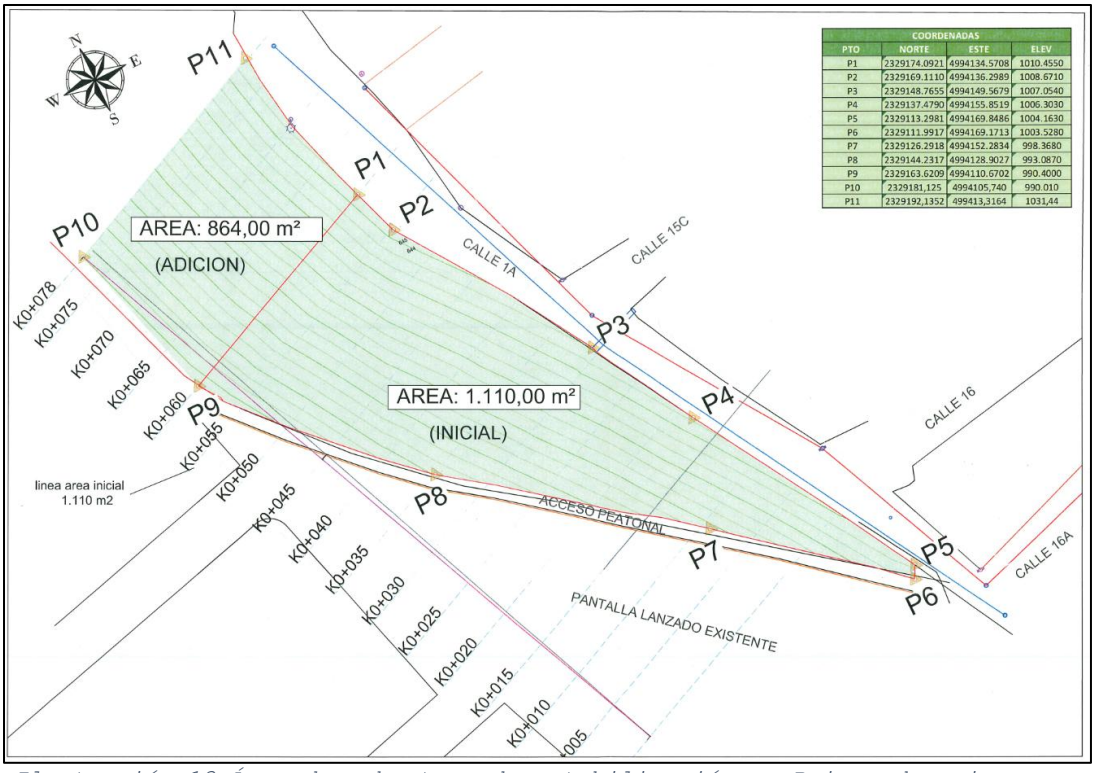



*Ilustración 13 Área de cobertura de estabilización en Brisas de primavera.*

# 3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

*Tabla 1. Información General del contrato de obra*

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **210-16223-6** |
|---|---|
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| CONTRATANTE | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB |
| NIT. | 890.201.573-0 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB |
| NIT. | 901.983.966 – 5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ |
| VALOR | NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($9.651.664.101,92) |
| VALOR ADICIONAL | N/A |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. 25000866 DEL 09 DE JUNIO DEL 2025 POR VALOR DE $2.242.976.961,36 PESOS M/CTE. |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 25001065 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $2.242.976.961,36 PESOS M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCION | 10 MESES |
| PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 15 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| DEPARTAMENTO | SANTANDER |
| MUNICIPIO | PIEDECUESTA |

### 3.1.1 DESCRIPCIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO.

*Tabla 2. Control de pólizas del contrato de obra Con la suscripción del contrato de obra*

| **CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | | | | |
| **Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS** | | | | |
| **PÓLIZA No. AB002676**(suscripción del contrato) **– ANEXO:** 0 | | | | |
| **Fecha de Expedición:** 12 de septiembre de 2025 | | **Fecha de Aprobación:** | | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | AB002676 | $1.930.332.821,00 | 05/09/2025 | 05/11/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | $482.583.205,25 | 05/09/2025 | 05/07/2029 |
| Estabilidad de la obra | | $1.930.332.821,00 | 05/07/2026 | 05/07/2031 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
| **Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS** | | | | |
| **PÓLIZA No. AB002677**(suscripción del contrato) **– ANEXO:** 0 | | | | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |
| Predios labores y operaciones | AB002677 | $711.750.000,00 | 05/09/2025 | 05/07/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | | $0,00 | 05/09/2025 | 05/07/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | | $0,00 | 05/09/2025 | 05/07/2026 |

*Tabla 3. Control de pólizas del contrato de obra Con la suscripción del Acta de Inicio*

| **CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | | | | |
| **Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS.** | | | | |
| **PÓLIZA No. AB002676**(acta de inicio) **– ANEXO:** 1 | | | | |
| **Fecha de Expedición:** 22 de octubre de 2025 | | **Fecha de Aprobación:** | | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del Contrato | AB002676 | $1.930.332.821,00 | 15/10/2025 | 15/12/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | $482.583.205,25 | 15/10/2025 | 15/08/2029 |
| Estabilidad de la obra | | $1.930.332.821,00 | 15/08/2026 | 15/08/2031 |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO** | | | | |
| **Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS.** | | | | |
| **PÓLIZA No. AB002677** (acta de inicio) **– ANEXO:** 1 | | | | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |
| Predios labores y operaciones | AB002677 | $711.750.000,00 | 15/10/2025 | 15/08/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | | $0,00 | 15/10/2025 | 15/08/2026 |
| Responsabilidad civil patronal | | $0,00 | 15/10/2025 | 15/08/2026 |

### 3.1.2 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO.

*Tabla 4. Relación de actas del contrato de obra*

| **RELACION DE ACTAS** | | |
|---|---|---|
| **FECHA y/o PERIODO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 15/10/2025 | ACTA DE INICIO | N/A |
| 23/12/2025 | ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 01 | N/A |
| Del 15/10/2025 al 14/12/2025 | ACTA PARCIAL No. 01 | $ 1.010.210.915,17 |

### 3.1.3 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

*Tabla 5. Presupuesto del contrato (condiciones iniciales)*

| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 1110 | $ 5.475,40 | $ 6.077.694,00 |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 222 | $ 86.959,00 | $ 19.304.898,00 |
| 1,07 | Perfilado a mano descolgado de talud (en roca) | m3 | 280,56 | $ 258.961,49 | $ 72.654.235,63 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:** | **$ 112.343.150,42** |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 1122,24 | $ 50.122,67 | $ 56.249.665,18 |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 748,16 | $ 91.555,59 | $ 68.498.230,21 |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 79 | $ 254.594,28 | $ 20.112.948,12 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 77.617,50 | $ 4.003,78 | $ 310.763.394,15 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:** | **$ 455.624.237,66** |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 79 | $ 1.093.853,05 | $ 86.414.390,95 |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 1110 | $ 381.784,67 | $ 423.780.983,70 |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 158 | $ 1.161.656,09 | $ 183.541.662,22 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:** | **$ 693.737.036,87** |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 15.927,00 | $ 12.147,37 | $ 193.471.161,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,02,01 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=15m | und | 395,00 | $ 663.201,86 | $ 261.964.734,70 |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 395,00 | $ 57.471,86 | $ 22.701.384,70 |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 1110 | $ 37.151,11 | $ 41.237.732,10 |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 395 | $ 82.952,24 | $ 32.766.134,80 |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 395 | $ 158.678,42 | $ 62.677.975,90 |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 395 | $ 96.930,70 | $ 38.287.626,50 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:** | **$ 653.106.750,69** |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m | m | 75 | $ 454.778,11 | $ 34.108.358,25 |
| 5,01,B | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m | m | 25 | $ 507.391,22 | $ 12.684.780,50 |
| 5,04 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 5.925,00 | $ 513.055,30 | $ 3.039.852.652,50 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:** | **$ 3.086.645.791,25** |
| **SECCIÓN SEXTA** | | | | | |
| 6 | Varios | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 83 | $ 135.159,22 | $ 11.218.215,26 |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 84 | $ 262.651,48 | $ 22.062.724,32 |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 900 | $ 75.477,93 | $ 67.930.137,00 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:** | **$ 101.211.076,58** |
| | | | | **VALOR COSTOS DIRECTOS:** | **$ 5.102.668.043,47** |
| | | | | **ADMINISTRACIÓN: 24%** | **$ 1.224.640.330,43** |
| | | | | **IMPREVISTOS: 1%** | **$ 51.026.680,43** |

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD:** | **5%** | **$ 255.133.402,17** |
| **A.I.U.** | **30%** | **$ 1.530.800.413,03** |
| **IVA de U:** | **19%** | **$ 48.475.346,41** |
| **VALOR TOTAL:** | | **$ 6.681.943.802,91** |

| **FRENTE HALCÓN DE GRANADA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** |
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 518 | $ 5.475,40 | $ 2.836.257,20 |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 271,26 | $ 86.959,00 | $ 23.588.498,34 |
| 1,06 | Perfilado a mano descolgado de talud | m3 | 308,21 | $ 191.632,12 | $ 59.062.935,71 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:** | **$ 99.794.014,04** |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 704,48 | $ 50.122,67 | $ 35.310.418,56 |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 176,12 | $ 91.555,59 | $ 16.124.770,51 |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 23 | $ 254.594,28 | $ 5.855.668,44 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 26.617,90 | $ 4.003,78 | $ 106.572.215,66 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:** | **$ 163.863.073,17** |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 23 | $ 1.093.853,05 | $ 25.158.620,15 |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 518 | $ 381.784,67 | $ 197.764.459,06 |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 56 | $ 1.161.656,09 | $ 65.052.741,04 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:** | **$ 287.975.820,25** |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 4.476,00 | $ 12.147,37 | $ 54.371.628,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,02,02 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m | und | 111,00 | $ 886.680,48 | $ 98.421.533,28 |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 111,00 | $ 57.471,86 | $ 6.379.376,46 |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 518 | $ 37.151,11 | $ 19.244.274,98 |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 111 | $ 82.952,24 | $ 9.207.698,64 |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 111 | $ 158.678,42 | $ 17.613.304,62 |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 111 | $ 96.930,70 | $ 10.759.307,70 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:** | **$ 215.997.123,80** |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | |
| 5,02 | Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 1665 | $ 439.593,16 | $ 731.922.611,40 |
| 5,03 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m | m | 555 | $ 466.857,96 | $ 259.106.167,80 |
| 5,08 | Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración | m | 2.220,00 | $ 208.702,78 | $ 463.320.171,60 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:** | **$ 1.454.348.950,80** |
| **SECCIÓN SEXTA** | | | | | |
| 6 | Varios | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 85 | $ 135.159,22 | $ 11.488.533,70 |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 38 | $ 262.651,48 | $ 9.980.756,24 |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 323 | $ 75.477,93 | $ 24.379.371,39 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:** | **$ 45.848.661,33** |
| | | | | **VALOR COSTOS DIRECTOS:** | **$ 2.267.827.643,39** |
| | | | | **ADMINISTRACIÓN: 24%** | **$ 544.278.634,41** |
| | | | | **IMPREVISTOS: 1%** | **$ 22.678.276,43** |
| | | | | **UTILIDAD: 5%** | **$ 113.391.382,17** |

| | | |
|---|---|---|
| A.I.U. | 30% | $ 680.348.293,01 |
| IVA de U: | 19% | $ 21.544.362,61 |
| | VALOR TOTAL: | $ 2.969.720.299,01 |

| PRESUPUESTO GRUPO 3 | | |
|---|---|---|
| | VALOR COSTOS DIRECTOS: | $ 7.370.495.686,86 |
| ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 1.768.918.964,84 |
| IMPREVISTOS: | 1% | $ 73.704.956,86 |
| UTILIDAD: | 5% | $ 368.524.784,34 |
| A.I.U. | 30% | $ 2.211.148.706,04 |
| IVA de U: | 19% | $ 70.019.709,02 |
| | VALOR TOTAL: | $ 9.651.664.101,92 |

### 3.1.4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO (ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 01)

Una vez socializada con la comunidad del barrio Brisas de Primavera la intervención del talud para su estabilización, se manifestó por parte de ellos la inconformidad en la tala de árboles de dicha área.
A raíz de la solicitud realizada por la comunidad, se generaron varias mesas de trabajos entre la entidad contratante, el contratista y la interventoría con el objetivo de estudiar la posibilidad de implementar otro tipo de estructura de estabilización del talud, debido a que dichos árboles, según concepto generado por los especialistas de la CDMB, ayudan a estabilizar el talud existente.
En razón de lo anterior, se definió un *sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV, anclado al talud a través de un sistema tipo nails (anclajes pasivos con varillas de Ø= 1-1/4") con una inclinación con respecto a la horizontal de 15° y una profundidad de L=9,00m* en lugar del sistema *una pantalla de concreto lanzado soportada por anclajes activo.*

Derivado del ajuste del tipo de estabilización para el frente Brisas de Primavera, surge la necesidad de incluir ÍTEMS NO PREVISTOS y realizar BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES que permitan realizar la ejecución conforme a ello. El ajuste del sistema de estabilización aumentará el área de intervención de 1.110,00 m2 a 1.964,00 m2

Se presenta ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS para el contrato No. 210.16223.6. Esta modificación no genera adición de recursos ni adición al plazo de ejecución al contrato y a partir de esta, se generó OTROSI No. 1 al contrato de obra.

**(Ver Anexo 01.)**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1,00 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 | 1,00 | $ 11.631.129,15 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | | | |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1,00 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 | 1,00 | $ 2.675.193,64 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 1110,00 | $ 5.475,40 | $ 6.077.694,00 | 1964,00 | $ 10.753.685,60 |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 222,00 | $ 86.959,00 | $ 19.304.898,00 | 392,82 | $ 34.159.234,38 |
| 1,07 | Perfilado a mano descolgado de talud (en roca) | m3 | 280,56 | $ 258.961,49 | $ 72.654.235,63 | 496,41 | $ 128.551.073,25 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:** | **$ 112.343.150,42** | | **$ 187.770.316,02** |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 1122,24 | $ 50.122,67 | $ 56.249.665,18 | 1553,94 | $ 77.887.621,82 |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 748,16 | $ 91.555,59 | $ 68.498.230,21 | 1035,93 | $ 94.845.182,35 |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 79,00 | $ 254.594,28 | $ 20.112.948,12 | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 77617,50 | $ 4.003,78 | $ 310.763.394,15 | 107965,80 | $ 432.271.310,72 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:** | **$ 455.624.237,66** | | **$ 605.004.114,89** |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 79,00 | $ 1.093.853,05 | $ 86.414.390,95 | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 1110,00 | $ 381.784,67 | $ 423.780.983,70 | 0,00 | $ 0,00 |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 158,00 | $ 1.161.656,09 | $ 183.541.662,22 | 259,60 | $ 301.565.920,96 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:** | **$ 693.737.036,87** | | **$ 301.565.920,96** |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 15927,00 | $ 12.147,37 | $ 193.471.161,99 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,02,01 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=15m | und | 395,00 | $ 663.201,86 | $ 261.964.734,70 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 395,00 | $ 57.471,86 | $ 22.701.384,70 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 1110,00 | $ 37.151,11 | $ 41.237.732,10 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 395,00 | $ 82.952,24 | $ 32.766.134,80 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 395,00 | $ 158.678,42 | $ 62.677.975,90 | 0,00 | $ 0,00 |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 395,00 | $ 96.930,70 | $ 38.287.626,50 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:** | **$ 653.106.750,69** | | **$ 0,00** |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | | | | | |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA** | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m | m | 75,00 | $ 454.778,11 | $ 34.108.358,25 | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,01,B | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m | m | 25,00 | $ 507.391,22 | $ 12.684.780,50 | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,04 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 5925,00 | $ 513.055,30 | $ 3.039.852.652,50 | 5841,00 | $ 2.996.756.007,30 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA:** | **$ 3.086.645.791,25** | | **$ 2.996.756.007,30** |
| **SECCIÓN SEXTA** | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 83,00 | $ 135.159,22 | $ 11.218.215,26 | 99,26 | $ 13.415.633,86 |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 84,00 | $ 262.651,48 | $ 22.062.724,32 | 98,70 | $ 25.923.701,08 |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 900,00 | $ 75.477,93 | $ 67.930.137,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA:** | **$ 101.211.076,58** | | **$ 39.339.334,94** |
| **SECCIÓN SÉPTIMA** | | | | | | | |
| 7 | Items no previstos | | | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m | und | | $ 786.836,00 | $ 0,00 | 649,00 | $ 510.656.564,00 |
| 7,02 | Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV | m2 | | $ 170.566,00 | $ 0,00 | 1964,00 | $ 334.991.624,00 |
| 7,03 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero | und | | $ 71.278,00 | $ 0,00 | 649,00 | $ 46.259.422,00 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SÉPTIMA:** | **$ 0,00** | | **$ 891.907.610,00** |
| | | | | **VALOR COSTOS DIRECTOS:** | **$ 5.102.668.043,47** | | **$ 5.022.343.304,11** |
| | | | **ADMINISTRACIÓN:** | **24%** | **$ 1.224.640.330,43** | | **$ 1.205.362.392,99** |
| | | | **IMPREVISTOS:** | **1%** | **$ 51.026.680,43** | | **$ 50.223.433,04** |
| | | | **UTILIDAD:** | **5%** | **$ 255.133.402,17** | | **$ 251.117.165,21** |
| | | | **A.I.U.** | **30%** | **$ 1.530.800.413,03** | | **$ 1.506.702.991,24** |
| | | | **IVA de U:** | **19%** | **$ 48.475.346,41** | | **$ 47.712.261,39** |
| | | | | **VALOR TOTAL:** | **$ 6.681.943.802,91** | | **$ 6.576.758.556,74** |
| **FRENTE HALCÓN DE GRANADA** | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** | **CANTIDAD** | **VALOR PARCIAL** |
| **SECCIÓN PRIMERA** | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1,00 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 | 1,00 | $ 11.631.129,15 |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | | | |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1,00 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 | 1,00 | $ 2.675.193,64 |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 518,00 | $ 5.475,40 | $ 2.836.257,20 | 518,00 | $ 2.836.257,20 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 271,26 | $ 86.959,00 | $ 23.588.498,34 | 271,24 | $ 23.586.759,16 |
| 1,06 | Perfilado a mano descolgado de talud | m3 | 308,21 | $ 191.632,12 | $ 59.062.935,71 | 308,21 | $ 59.062.935,71 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN PRIMERA:** | **$ 99.794.014,04** | | **$ 99.792.274,86** |
| **SECCIÓN SEGUNDA** | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 704,48 | $ 50.122,67 | $ 35.310.418,56 | 704,48 | $ 35.310.418,56 |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 176,12 | $ 91.555,59 | $ 16.124.770,51 | 176,11 | $ 16.123.854,95 |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 23,00 | $ 254.594,28 | $ 5.855.668,44 | 22,20 | $ 5.651.993,02 |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 26617,90 | $ 4.003,78 | $ 106.572.215,66 | 35409,48 | $ 141.771.767,83 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA:** | **$ 163.863.073,17** | | **$ 198.858.034,36** |
| **SECCIÓN TERCERA** | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 23,00 | $ 1.093.853,05 | $ 25.158.620,15 | 22,20 | $ 24.283.537,71 |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 518,00 | $ 381.784,67 | $ 197.764.459,06 | 518,00 | $ 197.764.459,06 |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 56,00 | $ 1.161.656,09 | $ 65.052.741,04 | 55,50 | $ 64.471.913,00 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA:** | **$ 287.975.820,25** | | **$ 286.519.909,77** |
| **SECCIÓN CUARTA** | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 4476,00 | $ 12.147,37 | $ 54.371.628,12 | 4475,52 | $ 54.365.797,38 |
| 4,02,02 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m | und | 111,00 | $ 886.680,48 | $ 98.421.533,28 | 111,00 | $ 98.421.533,28 |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 111,00 | $ 57.471,86 | $ 6.379.376,46 | 111,00 | $ 6.379.376,46 |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 518,00 | $ 37.151,11 | $ 19.244.274,98 | 518,00 | $ 19.244.274,98 |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 111,00 | $ 82.952,24 | $ 9.207.698,64 | 111,00 | $ 9.207.698,64 |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 111,00 | $ 158.678,42 | $ 17.613.304,62 | 111,00 | $ 17.613.304,62 |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 111,00 | $ 96.930,70 | $ 10.759.307,70 | 111,00 | $ 10.759.307,70 |
| | | | | **SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA:** | **$ 215.997.123,80** | | **$ 215.991.293,06** |
| **SECCIÓN QUINTA** | | | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | |
| 5,02 | Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 1665,00 | $ 439.593,16 | $ 731.922.611,40 | 1665,00 | $ 731.922.611,40 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL |
| 5,03 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m | m | 555,00 | $ 466.857,96 | $ 259.106.167,80 | 555,00 | $ 259.106.167,80 |
| 5,08 | Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración | m | 2220,00 | $ 208.702,78 | $ 463.320.171,60 | 2220,00 | $ 463.320.171,60 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA: | $ 1.454.348.950,80 | | $ 1.454.348.950,80 |
| SECCIÓN SEXTA | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 85,00 | $ 135.159,22 | $ 11.488.533,70 | 85,00 | $ 11.488.533,70 |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 38,00 | $ 262.651,48 | $ 9.980.756,24 | 38,00 | $ 9.980.756,24 |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 323,00 | $ 75.477,93 | $ 24.379.371,39 | 323,00 | $ 24.379.371,39 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEXTA: | $ 45.848.661,33 | | $ 45.848.661,33 |
| SECCIÓN SÉPTIMA | | | | | | | |
| 7 | Items no previstos | | | | | | |
| 7,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m | m | | $ 454.778,11 | $ 0,00 | 75,00 | $ 34.108.358,25 |
| 7,01,B | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m | m | | $ 507.391,22 | $ 0,00 | 25,00 | $ 12.684.780,50 |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SÉPTIMA: | $ 0,00 | | $ 46.793.138,75 |
| | | | | VALOR COSTOS DIRECTOS: | $ 2.267.827.643,39 | | $ 2.348.152.262,93 |
| | | | ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 544.278.634,41 | | $ 563.556.543,10 |
| | | | IMPREVISTOS: | 1% | $ 22.678.276,43 | | $ 23.481.522,63 |
| | | | UTILIDAD: | 5% | $ 113.391.382,17 | | $ 117.407.613,15 |
| | | | A.I.U. | 30% | $ 680.348.293,01 | | $ 704.445.678,88 |
| | | | IVA de U: | 19% | $ 21.544.362,61 | | $ 22.307.446,50 |
| | | | | VALOR TOTAL: | $ 2.969.720.299,01 | | $ 3.074.905.388,31 |

| PRESUPUESTO GRUPO 3 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR COSTOS DIRECTOS: | $ 7.370.495.686,86 | $ 7.370.495.567,04 |
| | ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 1.768.918.964,84 | $ 1.768.918.936,09 |
| | IMPREVISTOS: | 1% | $ 73.704.956,86 | $ 73.704.955,67 |
| | UTILIDAD: | 5% | $ 368.524.784,34 | $ 368.524.778,35 |
| | A.I.U. | 30% | $ 2.211.148.706,04 | $ 2.211.148.670,11 |
| | IVA de U: | 19% | $ 70.019.709,02 | $ 70.019.707,89 |
| | Ajuste decimales | | $ 0,00 | $ 156,88 |
| | | VALOR TOTAL: | $ 9.651.664.101,92 | $ 9.651.664.101,92 |

### 3.2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

El presente período de ejecución está comprendido entre el **01 y el 31 de diciembre de 2025,** el contratista de obra ejecutó las siguientes actividades:

- FRENTE DE TRABAJO BRISAS DE PRIMAVERA:

***Replanteo, control y medición de la obra.**
- Se realizó el levantamiento topográfico del talud.
- Se realizó el replanteo de la cara externa del talud en el área incluida debido a la modificación del sistema de estabilización.

***Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad.**
- Se realizaron las excavaciones superficiales sobre el talud, en material granular entre las abscisas K 0+000 y K 0+060.

***Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad.**
- Se realizaron las excavaciones superficiales sobre el talud, en material en roca entre las abscisas K 0+000 y K 0+060.

***Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m.**
- Se realizó el retiro del material excavado sobre el talud, además de las basuras y escombros extraídos.

- FRENTE DE TRABAJO HALCÓN DE GRANADA:

***Replanteo, control y medición de la obra.**
- Se realizó el replanteo de la cara externa del talud para iniciar con las excavaciones y perfilado del mismo.

***Desmonte y limpieza.**
- Se realizó el desmonte de toda la capa vegetal del talud.

***Retiro de basuras y escombros.**
- Se realizó el retiro de las basuras y escombros extraídos de la superficie del talud.

***Perfilado a mano descolgado de talud (en roca).**
- Se inició con el perfilado del talud entre las abscisas K 0+000 y K 0+026.

***Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad.**
- Se realizaron las excavaciones superficiales sobre el talud, en material granular entre las abscisas K 0+000 y K 0+026.

***Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad.**
- Se realizaron las excavaciones superficiales sobre el talud, en material en roca entre las abscisas K 0+000 y K 0+026.

***Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m.**
- Se realizó el retiro del material excavado sobre el talud, además de las basuras y escombros extraídos.

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | | | MES 03 01/12/2025 - 31/12/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | | | | EJECUTADO ANTERIOR | | EJECUTADO PERIODO | | EJECUTADO ACUMULADO | | % EJECUCION ACUMULADA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | |
| SECCIÓN PRIMERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1,00 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 | 1,00 | $ 11.631.129,15 | 0,20 | $ 2.326.225,83 | 0,15 | $ 1.744.669,37 | 0,35 | $ 4.070.895,20 | 35,00% |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1,00 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 | 1,00 | $ 2.675.193,64 | 1,00 | $ 2.675.193,64 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 2.675.193,64 | 100,00% |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 1110,00 | $ 5.475,40 | $ 6.077.694,00 | 1964,00 | $ 10.753.685,60 | 1110,00 | $ 6.077.694,00 | 854,00 | $ 4.675.991,60 | 1964,00 | $ 10.753.685,60 | 100,00% |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 222,00 | $ 86.959,00 | $ 19.304.898,00 | 392,82 | $ 34.159.234,38 | 222,00 | $ 19.304.898,00 | 0,00 | $ 0,01 | 222,00 | $ 19.304.898,01 | 56,51% |
| 1,07 | Perfilado a mano descolgado de talud (en roca) | m3 | 280,56 | $ 258.961,49 | $ 72.654.235,63 | 496,41 | $ 128.551.073,25 | 280,56 | $ 72.654.235,63 | 0,00 | $ - | 280,56 | $ 72.654.235,63 | 56,52% |
| | | | SUBTOTAL SECCION PRIMERA: | | $ 112.343.150,42 | | $ 187.770.316,02 | SUBTOTAL | $ 103.038.247,10 | SUBTOTAL | $ 6.420.660,98 | SUBTOTAL | $ 109.458.908,08 | |
| SECCIÓN SEGUNDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 1122,24 | $ 50.122,67 | $ 56.249.665,18 | 1553,94 | $ 77.887.621,82 | 1122,21 | $ 56.248.161,50 | 75,03 | $ 3.760.703,93 | 1197,24 | $ 60.008.865,43 | 77,05% |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 748,16 | $ 91.555,59 | $ 68.498.230,21 | 1035,93 | $ 94.845.182,35 | 748,14 | $ 68.496.399,10 | 70,00 | $ 6.408.891,30 | 818,14 | $ 74.905.290,40 | 78,98% |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 79,00 | $ 254.594,28 | $ 20.112.948,12 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 77617,50 | $ 4.003,78 | $ 310.763.394,15 | 107965,80 | $ 432.271.310,72 | 75048,08 | $ 300.476.001,74 | 0,97 | $ 3.883,66 | 75049,05 | $ 300.479.885,41 | 69,51% |
| | | | SUBTOTAL SECCION SEGUNDA: | | $ 455.624.237,66 | | $ 605.004.114,89 | SUBTOTAL | $ 425.220.562,34 | SUBTOTAL | $ 10.173.478,89 | SUBTOTAL | $ 435.394.041,24 | |
| SECCIÓN TERCERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 79,00 | $ 1.093.853,05 | $ 86.414.390,95 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 1110,00 | $ 381.784,67 | $ 423.780.983,70 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 158,00 | $ 1.161.656,09 | $ 183.541.662,22 | 259,60 | $ 301.565.920,96 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION TERCERA: | | $ 693.737.036,87 | | $ 301.565.920,96 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN CUARTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 15927,00 | $ 12.147,37 | $ 193.471.161,99 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,02,01 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=15m | und | 395,00 | $ 663.201,86 | $ 261.964.734,70 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 395,00 | $ 57.471,86 | $ 22.701.384,70 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | | | | | | | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 1110,00 | $ 37.151,11 | $ 41.237.732,10 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 395,00 | $ 82.952,24 | $ 32.766.134,80 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 395,00 | $ 158.678,42 | $ 62.677.975,90 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 395,00 | $ 96.930,70 | $ 38.287.626,50 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION CUARTA: | | $ 653.106.750,69 | | $ 0,00 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN QUINTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | | | | | | | | |
| 5,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m | m | 75,00 | $ 454.778,11 | $ 34.108.358,25 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 5,01,B | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tubería PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m | m | 25,00 | $ 507.391,22 | $ 12.684.780,50 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 5,04 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendiente mayores a 1:1 (en roca) con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 5925,00 | $ 513.055,30 | $ 3.039.852.652,50 | 5841,00 | $ 2.996.756.007,30 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION QUINTA: | | $ 3.086.645.791,25 | | $ 2.996.756.007,30 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN SEXTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | | | | | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 83,00 | $ 135.159,22 | $ 11.218.215,26 | 99,26 | $ 13.415.633,86 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 84,00 | $ 262.651,48 | $ 22.062.724,32 | 98,70 | $ 25.923.701,08 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para líneas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 900,00 | $ 75.477,93 | $ 67.930.137,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION SEXTA: | | $ 101.211.076,58 | | $ 39.339.334,94 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN SÉPTIMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Items no previstos | | | | | | | | | | | | | |
| 7,01 | Suministro e instalación de nails Ø=1-1/4" de L=9m | und | | $ 786.836,00 | $ 0,00 | 649,00 | $ 510.656.564,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 7,02 | Suministro e instalación del sistema para control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV | m2 | | $ 170.566,00 | $ 0,00 | 1964,00 | $ 334.991.624,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 7,03 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con un agujero | und | | $ 71.278,00 | $ 0,00 | 649,00 | $ 46.259.422,00 | 0,00 | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION SEPTIMA: | | $ 0,00 | | $ 891.907.610,00 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| | | | VALOR COSTOS DIRECTOS: | | $ 5.102.668.043,47 | | $ 5.022.343.304,11 | | $ 528.258.809,44 | | $ 16.594.139,87 | | $ 544.852.949,32 | |
| | | | ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 1.224.640.330,43 | | $ 1.205.362.392,99 | | $ 126.782.114,27 | | $ 3.982.593,57 | | $ 130.764.707,84 | |
| | | | IMPREVISTOS: | 1% | $ 51.026.680,43 | | $ 50.223.433,04 | | $ 5.282.588,09 | | $ 165.941,40 | | $ 5.448.529,49 | |
| | | | UTILIDAD: | 5% | $ 255.133.402,17 | | $ 251.117.165,21 | | $ 26.412.940,47 | | $ 829.706,99 | | $ 27.242.647,47 | |
| | | | A.I.U. | 30% | $ 1.530.800.413,03 | | $ 1.506.702.991,24 | | $ 158.477.642,83 | | $ 4.978.241,96 | | $ 163.455.884,80 | |
| | | | IVA de U: | 19% | $ 48.475.346,41 | | $ 47.712.261,39 | | $ 5.018.458,69 | | $ 157.644,33 | | $ 5.176.103,02 | |
| | | | VALOR TOTAL: | | $ 6.681.943.802,91 | | $ 6.576.758.556,74 | | $ 691.754.910,96 | | $ 21.730.026,16 | | $ 713.484.937,14 | 10,85% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| FRENTE HALCON DE GRANADA | | | | | | | | EJECUTADO ANTERIOR | | EJECUTADO PERIODO | | EJECUTADO ACUMULADO | | % EJECUCION ACUMULADA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | |
| SECCIÓN PRIMERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Replanteo, control y medición de la obra | mes | 1,00 | $ 11.631.129,15 | $ 11.631.129,15 | 1,00 | $ 11.631.129,15 | | $ - | 0,25 | $ 2.907.782,28 | 0,25 | $ 2.907.782,28 | 25,00% |
| 1,03 | Vallas y señales especiales | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| 1,03,01,A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80m) | und | 1,00 | $ 2.675.193,64 | $ 2.675.193,64 | 1,00 | $ 2.675.193,64 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 1,04 | Desmonte y limpieza | m2 | 518,00 | $ 5.475,40 | $ 2.836.257,20 | 518,00 | $ 2.836.257,20 | | $ - | 518,00 | $ 2.836.257,20 | 518,00 | $ 2.836.257,20 | 100,00% |
| 1,05 | Retiro de basuras y escombros | m3 | 271,26 | $ 86.959,00 | $ 23.588.498,34 | 271,24 | $ 23.586.759,16 | | $ - | 271,24 | $ 23.586.759,16 | 271,24 | $ 23.586.759,16 | 100,00% |
| 1,06 | Perfilado a mano descolgado de talud | m3 | 308,21 | $ 191.632,12 | $ 59.062.935,71 | 308,21 | $ 59.062.935,71 | | $ - | 308,21 | $ 59.062.935,71 | 308,21 | $ 59.062.935,71 | 100,00% |
| | | | SUBTOTAL SECCION PRIMERA: | | $ 99.794.014,04 | | $ 99.792.274,86 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 88.393.734,35 | SUBTOTAL | $ 88.393.734,35 | |
| SECCIÓN SEGUNDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Excavación a tajo abierto en taludes | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01,A | Excavación con acarreo libre | | | | | | | | | | | | | |
| 2,01,A,02 | Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad | m3 | 704,48 | $ 50.122,67 | $ 35.310.418,56 | 704,48 | $ 35.310.418,56 | | $ - | 704,48 | $ 35.310.418,56 | 704,48 | $ 35.310.418,56 | 100,00% |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 01 | | | MES 03 01/12/2025 - 31/12/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENTE BRISAS DE PRIMAVERA | | | | | | | | EJECUTADO ANTERIOR | | EJECUTADO PERIODO | | EJECUTADO ACUMULADO | | % EJECUCION ACUMULADA |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | |
| 2,01,A,03 | Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad | m3 | 176,12 | $ 91.555,59 | $ 16.124.770,51 | 176,11 | $ 16.123.854,95 | | $ - | 176,11 | $ 16.123.854,96 | 176,11 | $ 16.123.854,96 | 100,00% |
| 2,01,A,04 | Excavación a mano con acarreo libre descolgado para zapata | m3 | 23,00 | $ 254.594,28 | $ 5.855.668,44 | 22,20 | $ 5.651.993,02 | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 2,03 | Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m | m3-km | 26617,90 | $ 4.003,78 | $ 106.572.215,66 | 35409,48 | $ 141.771.767,83 | | $ - | 33344,56 | $ 133.504.282,44 | 33344,56 | $ 133.504.282,44 | 94,17% |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN SEGUNDA: | $ 163.863.073,17 | | $ 198.858.034,36 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ 184.938.555,96 | SUBTOTAL | $ 184.938.555,96 | |
| SECCIÓN TERCERA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Concretos | | | | | | | | | | | | | |
| 3,01 | Suministro y colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas | m3 | 23,00 | $ 1.093.853,05 | $ 25.158.620,15 | 22,20 | $ 24.283.537,71 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,03 | Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor 10 cm | m2 | 518,00 | $ 381.784,67 | $ 197.764.459,06 | 518,00 | $ 197.764.459,06 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 3,08 | Llenado de inyección con lechada cementicia para anclajes | m3 | 56,00 | $ 1.161.656,09 | $ 65.052.741,04 | 55,50 | $ 64.471.913,00 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN TERCERA: | $ 287.975.820,25 | | $ 286.519.909,77 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN CUARTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aceros | | | | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Suministro y colocación acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 | kg | 4476,00 | $ 12.147,37 | $ 54.371.628,12 | 4475,52 | $ 54.365.797,38 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,02,02 | Suministro e instalación de 3 cables Ø=1/2" de L=20m | und | 111,00 | $ 886.680,48 | $ 98.421.533,28 | 111,00 | $ 98.421.533,28 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,03 | Tensionamiento de anclajes | und | 111,00 | $ 57.471,86 | $ 6.379.376,46 | 111,00 | $ 6.379.376,46 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,04 | Suministro y colocación | | | | | | | | | | | | | |
| 4,04,01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m | m2 | 518,00 | $ 37.151,11 | $ 19.244.274,98 | 518,00 | $ 19.244.274,98 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,05 | Suministro e instalación de platina de 200mm x 200mm x 12mm con tres agujeros | und | 111,00 | $ 82.952,24 | $ 9.207.698,64 | 111,00 | $ 9.207.698,64 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,06 | Suministro e instalación de popora de 3 agujeros cónicos para cuña de Ø=1/2" | und | 111,00 | $ 158.678,42 | $ 17.613.304,62 | 111,00 | $ 17.613.304,62 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 4,07 | Suministro e instalación de kit de cuñas de Ø=1/2" para anclaje | und | 111,00 | $ 96.930,70 | $ 10.759.307,70 | 111,00 | $ 10.759.307,70 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN CUARTA: | $ 215.997.123,80 | | $ 215.991.293,06 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN QUINTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Perforaciones horizontales | | | | | | | | | | | | | |
| 5,02 | Ejecución perforación horizontal en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m | m | 1665,00 | $ 439.593,16 | $ 731.922.611,40 | 1665,00 | $ 731.922.611,40 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 5,03 | Ejecución perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15,00m | m | 555,00 | $ 466.857,96 | $ 259.106.167,80 | 555,00 | $ 259.106.167,80 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 5,08 | Jacket de respaldo para revestimiento de perforación horizontal en anclajes y drenes de penetración | m | 2220,00 | $ 208.702,78 | $ 463.320.171,60 | 2220,00 | $ 463.320.171,60 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | | SUBTOTAL SECCIÓN QUINTA: | $ 1.454.348.950,80 | | $ 1.454.348.950,80 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN SEXTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Varios | | | | | | | | | | | | | |
| 6,02 | Canaleta (ancho=1m; e=10cm) | m | 85,00 | $ 135.159,22 | $ 11.488.533,70 | 85,00 | $ 11.488.533,70 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 6,03 | Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m | m | 38,00 | $ 262.651,48 | $ 9.980.756,24 | 38,00 | $ 9.980.756,24 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 6,06 | Sistema de abatimiento para lineas hidráulicas de infiltración interna y protección del trasdós de la estructura estabilizadora | m | 323,00 | $ 75.477,93 | $ 24.379.371,39 | 323,00 | $ 24.379.371,39 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | | SUBTOTAL SECCION SEXTA: | $ 45.848.661,33 | | $ 45.848.661,33 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| SECCIÓN SÉPTIMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Items no previstos | | | | | | | | | | | | | |
| 7,01 | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tuberia PVC ranurada Ø=2") para drenes de 0,00m a 15,00m | m | | $ 454.778,11 | $ 0,00 | 75,00 | $ 34.108.358,25 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| 7,01,B | Sistema de abatimiento para perforación horizontal para niveles freáticos (Incluye tuberia PVC ranurada Ø=2") para drenes mayores a 15,00m | m | | $ 507.391,22 | $ 0,00 | 25,00 | $ 12.684.780,50 | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - | 0,00% |
| | | | | SUBTOTAL SECCION SEPTIMA: | $ 0,00 | | $ 46.793.138,75 | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | SUBTOTAL | $ - | |
| | | | | VALOR COSTOS DIRECTOS: | $ 2.267.827.643,39 | | $ 2.348.152.262,93 | | $ - | | $ 273.332.290,31 | | $ 273.332.290,31 | |
| | | | ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 544.278.634,41 | | $ 563.556.543,10 | | $ - | | $ 65.599.749,67 | | $ 65.599.749,67 | |
| | | | IMPREVISTOS: | 1% | $ 22.678.276,43 | | $ 23.481.522,63 | | $ - | | $ 2.733.322,90 | | $ 2.733.322,90 | |
| | | | UTILIDAD: | 5% | $ 113.391.382,17 | | $ 117.407.613,15 | | $ - | | $ 13.666.614,52 | | $ 13.666.614,52 | |
| | | | A.I.U. | 30% | $ 680.348.293,01 | | $ 704.445.678,88 | | $ - | | $ 81.999.687,09 | | $ 81.999.687,09 | |
| | | | IVA de U: | 19% | $ 21.544.362,61 | | $ 22.307.446,50 | | $ - | | $ 2.596.656,76 | | $ 2.596.656,76 | |
| | | | | VALOR TOTAL: | $ 2.969.720.299,01 | | $ 3.074.905.388,31 | | $ - | | $ 357.928.634,16 | | $ 357.928.634,16 | 11,64% |

| PRESUPUESTO GRUPO 3 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR COSTOS DIRECTOS: | $ 7.370.495.686,86 | | $ 7.370.495.567,04 | | $ 528.258.809,44 | | $ 289.926.430,18 | | $ 818.185.239,63 | |
| | | | ADMINISTRACIÓN: | 24% | $ 1.768.918.964,84 | | $ 1.768.918.936,09 | | $ 126.782.114,27 | | $ 69.582.343,24 | | $ 196.364.457,51 | |
| | | | IMPREVISTOS: | 1% | $ 73.704.956,86 | | $ 73.704.955,67 | | $ 5.282.588,09 | | $ 2.899.264,30 | | $ 8.181.852,40 | |
| | | | UTILIDAD: | 5% | $ 368.524.784,34 | | $ 368.524.778,35 | | $ 26.412.940,47 | | $ 14.496.321,51 | | $ 40.909.261,98 | |
| | | | A.I.U. | 30% | $ 2.211.148.706,04 | | $ 2.211.148.670,11 | | $ 158.477.642,83 | | $ 86.977.929,05 | | $ 245.455.571,89 | |
| | | | IVA de U: | 19% | $ 70.019.709,02 | | $ 70.019.707,89 | | $ 5.018.458,69 | | $ 2.754.301,09 | | $ 7.772.759,78 | |
| | | | Ajuste decimales | | $ 0,00 | | $ 156,88 | | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL: | $ 9.651.664.101,92 | | $ 9.651.664.101,92 | | $ 691.754.910,96 | | $ 379.658.660,32 | | $ 1.071.413.571,30 | 11,10% |

## 3.3 INFORME DE AVANCE

### 3.3.1 Avance de obras programadas vs obras ejecutadas acumuladas

Las ilustraciones No. 09 y No. 10 registran el seguimiento al PLAN DE TRABAJO planteado por el contratista de obra **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB,** en ellas se puede observar la comparación del porcentaje de avance programado vs el porcentaje de avance ejecutado, al igual que el valor programado acumulado vs el valor ejecutado acumulado del proyecto para el período **DICIMEBRE 01 – DICIEMBRE 31 DE 2025.**

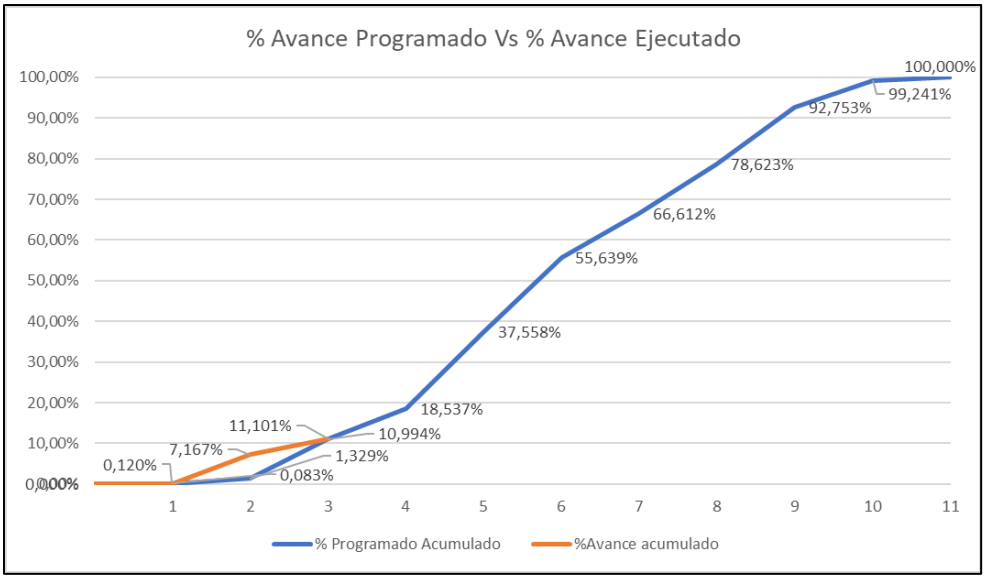



*Ilustración 14. %Avance Programado vs %Avance Ejecutado*

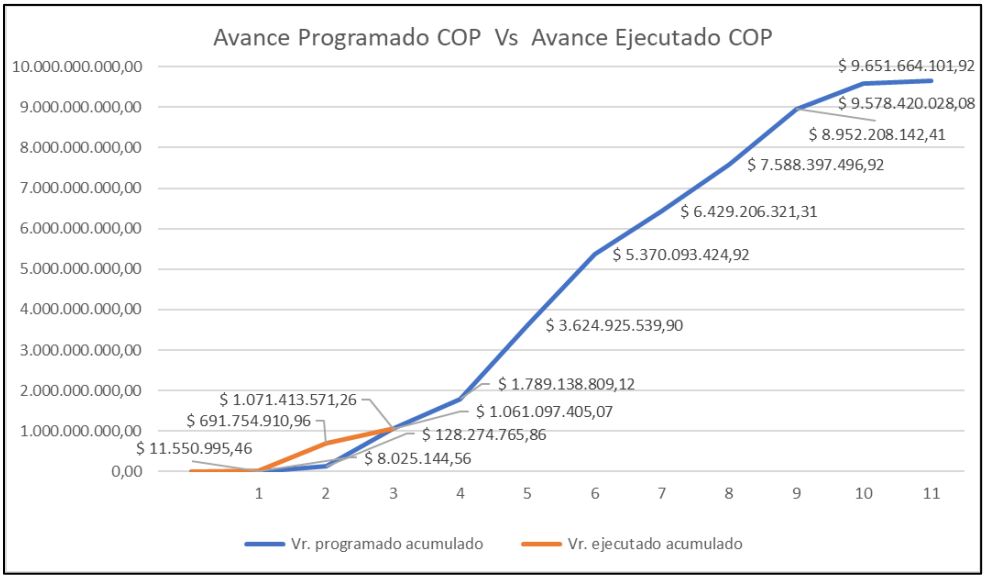



*Ilustración 15. Seguimiento a la línea base del costo*

En el presente período acumulado, en la programación de obra proyectada por el contratista, se estimaba haber ejecutado un valor acumulado de **$ 1.061.097.405,06** equivalentes al **10,994%**, sin embargo, el contratista ejecutó un monto de **$ 1.071.413.571,26** lo que representa un avance del **11,101%.**

De acuerdo a lo anterior, se deduce que el contratista de obra lleva un ADELANTO respecto al plan de trabajo de **0,107%.**

El estado actual del proyecto presentó un avance considerable, teniendo en cuenta que el contratista inició actividades de obra en el frente Halcón de granada, continuando actividades paralelamente el frente de Brisas de primavera.

### 3.3.2 Comités de obra

En el presente período se realizaron los siguientes comités de obra con el objetivo de realizar seguimiento y control al contrato (ver documentos anexos).

| Comité Técnico No. | Fecha (dd/mm/aaaa) |
|---|---|
| 04 | 20/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
| | ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5 | ACTA DE REUNIÓN | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEMA:** | DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."** | **ACTA No.** | **FECHA** | | |
| | | | **DD** | **MM** | **AA** |
| | | 04 | 20 | 12 | 25 |
| **LUGAR:** | Frente de Brisas de Primavera y Halcón de Granada - Piedecuesta, Santander | **Hora Inicio** | 9:00 AM | | |
| | | **Hora final** | 11:00 PM | | |

**AGENDA**

| No. | ORDEN DEL DIA | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | Saludo y presentación de los profesionales asistentes a la reunión. Seguimiento al avance del proyecto. | Contratista – Interventoría |
| 2 | Recorrido y revisión del avance físico de obra. | Contratista – Interventoría |
| 3 | Estado de la propuesta de reemplazo del sistema de estabilización en Brisas de Primavera. | Contratista - Intervemtoría |


| No. | DESARROLLO ORDEN DEL DÍA |
|---|---|
| 1 | Se inicia comité con profesionales del contratista e interventoría, realizando como primera medida la presentación de los profesionales asistentes de parte del Contratista de obra y de la Interventoría. |
| 2 | Se realiza recorrido y revisión del avance físico en la ejecución de obra en los dos frentes de trabajo:<br>1. Brisas de Primavera.<br>Se continúa avanzando en las actividades de excavaciones sobre el talud y el perfilado a mano descolgado del mismo. Adicionalmente se adelantan las actividades retiro de dicho material proveniente de las excavaciones al sitio de disposición autorizado. |

| | |
|---|---|
| | 2. Halcón de Granada.<br>Se continúa avanzando con las actividades de perfilado del talud y el cargue y retiro del material proveniente de las excavaciones.<br><br>Durante la semana se han ejecutado estas actividades de manera continua, conforme a la programación establecida, garantizando el adecuado desarrollo de los frentes de trabajo. |
| 3 | Durante el recorrido, la interventoría puede verificar el cumplimiento de la ejecución de obra conforme a la programación, al igual que la presencia del personal de obra y la maquinaria necesaria para el buen desarrollo de las actividades. |
| 4 | En relación a los compromisos establecidos en el comité anterior y en aras de conservar los individuos forestales existentes en el talud del frente Brisas de Primavera, el contratista de obra presentó INFORME DE AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL FRENTE DE OBRA – BRISAS DE PRIMAVERA donde se establece cambiar el sistema de pantalla de concreto lanzado soportado con anclajes activos por un sistema de control de erosión superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con estabilización UV soportado por anclajes pasivos.<br>Una vez realizada la revisión técnica de la propuesta, la interventoría emitió concepto favorable, teniendo en cuenta que con este tipo de sistema se conservará la mayoría de las especies arbóreas existentes en el talud, y además, se ampliará el área de cobertura de estabilización.<br>En base a lo anterior, se encuentra en trámite con la CDMB el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDDES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS que se generó por la nueva propuesta. |

| No. | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar revisión de los avances de obra en los dos frentes de trabajo. | Interventoría | - |
| 2 | Una vez oficializada el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDDES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS del contrato de obra, iniciar con las actividades de obra correspondientes. | Contratista | - |
| 3 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
| | ELABORÓ:<br>Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ:<br>REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ:<br>DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO:<br>A-PI-FO05 | VERSION:<br>5 | ACTA DE REUNIÓN | |

| PRÓXIMA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | | **HORA:** | | **LUGAR:** | |

| Elaboró Acta | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Jhon Alexander González Rivera | Residente de Obra |  |
| **Revisó Acta** | **Cargo** | **Firma** |
| Andrea Karina Quintero Ortiz | Residente de interventoría |  |

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
| | ELABORÓ:<br>Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ:<br>REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ:<br>DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO:<br>A-PI-FO05 | VERSION:<br>5 | ACTA DE REUNIÓN | |

| | |
|---|---|
| **TEMA:** | DESARROLLO Y AVANCE CONTRATO 210.16223.6 **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."** |
| **LUGAR:** | Frente de obra del barrio Brisas de Primavera. |

| **ACTA No.** | **FECHA** | | |
|---|---|---|---|
| | **DD** | **MM** | **AA** |
| 04 | 20 | 12 | 25 |

**LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS**

| No. | NOMBRE | GÉNERO | | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | | | |
| 1 | Jhon Alexander González Rivera | x | | Residente de Obra | Contratista | |
| 2 | Andrea Karina Quintero Ortiz | | x | Residente de interventoría | Interventoría | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

**Género**: M: Masculino / F: Femenino

## 3.4 CONTROL DIARIO DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

| FECHA | 20 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año) |
|---|---|---|---|

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS**

**MES DEL INFORME MENSUAL:** 01/12/2025 - 31/12/2025 **CONTRATO No.** 210-16223-6

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

**SECTOR:** BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA Y HALCON DE GRANADA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Estacion Total (Topografia) | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| Nivel topográfico | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| Equipo RTK - GNSS STONEX S900 | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| Excavadora DOOSAN DX225LCA | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| Minicargador CASE-2018 | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| Volqueta (modelo mayor a 2010) | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

## 3.5 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA**

FECHA: 20 (Día) / 1 (Mes) / 2026 (Año)

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**MES DEL INFORME MENSUAL:** 01/12/2025 - 31/12/2025

**CONTRATO No.** 210-16223-6

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

**SECTOR:** BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA Y HALCON DE GRANADA

| NOMBRE | CARGO | CC | Ingreso | Egreso | Empresa Aportante | Tipo de Personal | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Julián Andrés Serrano Gómez | Director de Obra | 13.870.690 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Jhon Alexander González Rivera | Residente de Obra | 1.098.760.722 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| William Eduardo Cortés Peña | Asesor en Geotecnia | 91.278.912 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Lissette Ximena Niño Carvajal | Asesor Ambiental | 63.395.720 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Víctor Julio Gamboa | Profesional SST | 91.265.828 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Andrés Leonardo Lasso Aguirre | PMP | 80.187.378 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Yeiner García Cadena | Operador de Perforación I | 1.005.187.293 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Gumercindo Parra Solano | Oficial de Obra | 91.291.101 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Alexander Prada López | Ayudante de Perforación II | 13.745.736 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Harley Prada López | Operador de Perforación II | 1.098.822.751 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Yoel Ardila Narváez | Operador de Perforación I | 1.046.427.115 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Mauricio Villamizar Solano | Operador de inyección | 1.005.541.892 | 16/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Luis Alberto Prada Rincón | Ayudante obra | 5.691.822 | 16/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Edgar Iván Palomino Holguín | Topógrafo | 1.098.636.620 | 15/10/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Yefferson Dyfred Gonzalez Ortega | Ayudante de obra | 5.823.211 | 4/11/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Andrés Francisco García Farías | Ayudante de obra | 6.656.491 | 4/11/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Luis Alfonso Fuentes Navarro | Ayudante de Perforación II | 1.098.699.422 | 4/11/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Jose Alberto Ospino Baracamonte | Ayudante de obra | 1.050.719.060 | 4/11/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Juan Andrés Díaz Quintero | Almacenista | 1.095.802.634 | 10/11/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Sergio Andres Porras Villamizar | Conductor | 1.095.808.270 | 1/12/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Miguel Angel Alvarez Escandon | Operador de maquinaria | 1.096.214.445 | 1/12/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Yeferson Acevedo Suarez | Operador de maquinaria | 1.098.714.157 | 1/12/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| Eduardo Santos Useche | Conductor | 91.274.996 | 1/12/2025 | | C.M.P.C | Operativo | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, INACTIVO= I.**

## 3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

**Fecha:** 20/01/2026

**Período del informe:** 01/12/2025 - 31/12/2025

**Contrato No.** 210-16223-6

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

**Objeto del contrato:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (FACTURACIÓN) | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **CONTRATADO** | **VALOR DEL ACTA** |
| Contrato Inicial | $ 9.651.664.101,92 | |
| Adicional | | |
| Acta Parcial 01 (Del 15/10/2025 al 14/12/2025) | | $ 1.010.210.915,17 |
| Acta Parcial 02 | | |
| Acta Final de Obra | | |
| Saldo por ejecutar | | $ 8.641.453.186,75 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 9.651.664.101,92** | **$ 9.651.664.101,92** |

## 3.7 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

FECHA | 20 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año)

**CONTRATO DE OBRA No:** 210-16223-6

**CONTRATISTA:** CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

**PERÍODO:** 01/12/2025 - 31/12/2025

**PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DIA DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Seco | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 729 |
| Lluvias moderadas | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| Lluvias intensas | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**OBSERVACIONES:**

### 3.8 INFORMACIÓN DE RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período del presente informe no se realizó ningún tipo de ensayo, toda vez que ninguna de las actividades ejecutadas lo requiere.

## 3.9 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA 20 | 1 | 2026
(Día / Mes / Año)

**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**
**(Tomado de: (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA)**

**CONTRATO DE OBRA No:** 210-16223-6 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

**PERÍODO DEL INFORME** 01/12/2025 - 31/12/2025 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 210-16227-6 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTES PIEDECUESTA

**NOMBRE ARL:** Seguros de Vida Colpatria S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Comfenalco Santander

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Dias del Mes (Diciembre de 2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | Julián Andrés Serrano Gómez | 13.870.690 | Director de Obra | $ 35.817.097 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Independiente | $ 37.011.000 | $ 2.576.000,00 | V | Sanitas EPS | 1078029261 | $ 4.448.500 | Colpensiones | 1078029261 | $ 6.405.900 | $ - | $ - | $ - | |
| 2 | Jhon Alexander González Rivera | 1.098.760.722 | Residente de Obra | $ 3.292.839 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 3.402.600 | $ 229.000 | V | Salud Total EPS | 1078285838 | $ 136.200 | Porvenir | 1078285838 | $ 544.500 | $ 136.200 | $ - | $ - | |
| 3 | William Eduardo Cortés Peña | 91.278.912 | Asesor en Geotecnia | $ 2.322.581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Independiente | $ 2.400.000 | $ 99.100 | V | EPS Sura | 7996630646 | $ 300.000 | Porvenir | 7996630646 | $ 384.000 | $ - | $ - | $ - | |
| 4 | Lissette Ximena Niño Carvajal | 63.395.720 | Asesor Ambiental | $ 2.029.849 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Independiente | $ 2.097.511 | $ 150.200 | V | EPS Sura | 1077926511 | $ 262.200 | Colpensiones | 1077926511 | $ 335.700 | $ - | $ - | $ - | |
| 5 | Victor Julio Gamboa | 91.265.828 | Profesional SST | $ 1.377.581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 1.423.500 | $ 36.400 | V | Nueva EPS | 1078285838 | $ 57.000 | Colpensiones | 1078285838 | $ 227.900 | $ 57.000 | $ - | $ - | |
| 6 | Andrés Leonardo Lasso Aguirre | 80.187.378 | PMP | $ 1.377.581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 1.423.500 | $ 85.900 | V | EPS Sura | 1078285838 | $ 57.000 | Colpensiones | 1078285838 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ - | $ - | |
| 7 | Yeiner García Cadena | 1.005.187.293 | Operador de Perforación I | $ 1.717.953 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.775.218 | $ 119.600 | V | EPS Sura | 1078227098 | $ 71.100 | Porvenir | 1078227098 | $ 284.100 | $ 71.000 | $ - | $ - | |
| 8 | Gumercindo Parra Solano | 91.291.101 | Oficial de Obra | $ 1.509.735 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.560.060 | $ 105.100 | V | Sanitas EPS | 1078227098 | $ 62.500 | Protección | 1078227098 | $ 249.700 | $ 62.500 | $ - | $ - | |
| 9 | Alexander Prada López | 13.745.736 | Ayudante de Perforación II | $ 1.424.543 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.472.028 | $ 99.200 | V | EPS Sura | 1078227098 | $ 58.900 | Porvenir | 1078227098 | $ 235.600 | $ 58.900 | $ - | $ - | |
| 10 | Harley Prada López | 1.098.822.751 | Operador de Perforación II | $ 1.563.766 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.615.892 | $ 108.900 | V | Nueva EPS | 1078227098 | $ 64.700 | Porvenir | 1078227098 | $ 258.600 | $ 64.300 | $ - | $ - | |
| 11 | Yoel Ardila Narváez | 1.046.427.115 | Operador de Perforación I | $ 1.709.775 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.766.768 | $ 118.900 | V | Salud Total EPS | 1078227098 | $ 70.800 | Colfondos | 1078227098 | $ 282.800 | $ 71.000 | $ - | $ - | |
| 12 | Mauricio Villamizar Solano | 1.005.541.892 | Operador de inyección | $ 1.737.139 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.795.044 | $ 120.900 | V | Salud Mia EPS | 1078227098 | $ 71.900 | Porvenir | 1078227098 | $ 287.300 | $ 71.800 | $ - | $ - | |
| 13 | Luis Alberto Prada Rincón | 5.691.822 | Ayudante obra | $ 1.362.970 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.408.402 | $ 98.100 | V | Nueva EPS | 1078227098 | $ 58.400 | Porvenir | 1078227098 | $ 233.200 | $ 58.300 | $ - | $ - | |
| 14 | Edgar Iván Palomino Holguín | 1.098.636.620 | Topógrafo | $ 2.644.258 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 2.732.400 | $ 1.836.900 | V | EPS Sura | 1078285838 | $ 109.400 | Colfondos | 1078285838 | $ 437.300 | $ 117.900 | $ - | $ - | |
| 15 | Yefferson Dyfred Gonzalez Ortega | 5.823.211 | Ayudante de obra | $ 1.377.581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.423.500 | $ 95.800 | V | Nueva EPS | 1078227098 | $ 57.000 | Protección | 1078227098 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ - | $ - | |
| 16 | Andrés Francisco García Farías | 6.656.491 | Ayudante de obra | $ 1.377.581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.423.500 | $ 95.200 | V | Nueva EPS | 1078227098 | $ 57.000 | Protección | 1078227098 | $ 227.800 | $ 57.000 | $ - | $ - | |
| 17 | Luis Alfonso Fuentes Navarro | 1.098.699.422 | Ayudante de Perforación II | $ 1.408.889 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.455.852 | $ 98.100 | V | Salud Total EPS | 1078227098 | $ 58.300 | Porvenir | 1078227098 | $ 233.000 | $ 58.300 | $ - | $ - | |
| 18 | Jose Alberto Ospino Baracamonte | 1.050.719.060 | Ayudante de obra | $ 1.424.543 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.472.028 | $ 99.200 | V | Salud Total EPS | 1078227098 | $ 58.900 | Porvenir | 1078227098 | $ 235.600 | $ 59.000 | $ - | $ - | |
| 19 | Juan Andrés Díaz Quintero | 1.095.802.634 | Almacenista | $ 1.480.825 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Consorcio Mitigacion Piedecuesta CDMB | $ 1.530.186 | $ 103.100 | V | Sanitas EPS | 1078227098 | $ 41.200 | Porvenir | 1078227098 | $ 244.900 | $ 61.200 | $ - | $ - | |
| 20 | Sergio Andres Forras Villamizar | 1.095.808.270 | Conductor | $ 3.728.964 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 3.853.263 | $ 260.100 | V | Famisanar EPS | 1078285838 | $ 154.200 | Colfondos | 1078285838 | $ 616.600 | $ 155.900 | $ - | $ - | |
| 21 | Miguel Angel Alvarez Escandon | 1.096.214.445 | Operador de maquinaria | $ 2.603.304 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 2.690.081 | $ 181.200 | V | Nueva EPS | 1078285838 | $ 107.800 | Porvenir | 1078285838 | $ 430.600 | $ 157.000 | $ - | $ - | |
| 22 | Yeferson Acevedo Suarez | 1.098.714.157 | Operador de maquinaria | $ 1.976.923 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 2.042.820 | $ 129.300 | V | Nueva EPS | 1078285838 | $ 81.800 | Protección | 1078285838 | $ 326.900 | $ 74.300 | $ - | $ - | |
| 23 | Eduardo Santos Useche | 91.274.996 | Conductor | $ 2.051.146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Maquinobras | $ 2.119.518 | $ 142.500 | V | Nueva EPS | 1078285838 | $ 84.900 | Colpensiones | 1078285838 | $ 339.200 | $ 110.600 | $ - | $ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-30, 09:45:00 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | enero de 2026 |
| **Empresa** | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB |
| **NIT** | NI 901983966 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1078227098 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2046393467 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 5.764.200 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 8 | $ 2.012.300 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 3 | $ 705.300 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | $ 282.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | $ 58.400 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 2 | $ 123.800 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 3 | $ 188.000 | $ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 1 | $ 71.900 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 3 | $ 178.700 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 2 | $ 130.000 | $ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 12 | $ 1.262.700 | $ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 12 | $ 750.300 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 5.764.200 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 5.764.200 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-12-30, 01:38:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078227098

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

**PAGADO 30/12/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB | | |
| **Documento** | NI901983966 | **Dirección** | KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6076159848 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | GIRON | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES | **Identificación** | CC 13870690 |
| **Total Afiliados** | 12 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005187293 | YEINER GARCIA CADENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.717.366 | $ 274.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.717.366 | $ 68.700 | 6,960 | $ 1.717.366 | $ 119.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.717.366 | $ 68.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 531.800 |
| CC 1005187293 | YEINER GARCIA CADENA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 57.852 | $ 9.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 57.852 | $ 2.400 | 0,000 | $ 57.852 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 57.202 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.000 |
| CC 1005541892 | MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.736.867 | $ 277.900 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 1.736.867 | $ 69.500 | 6,960 | $ 1.736.867 | $ 120.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.736.867 | $ 69.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 537.800 |
| CC 1005541892 | MAURICIO VILLAMIZAR SOLANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 58.177 | $ 9.400 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 58.177 | $ 2.400 | 0,000 | $ 58.177 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 57.202 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.100 |
| CC 1046427115 | YOEL ARDILA NARVAEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (231001) COLFONDOS | $ 1.707.616 | $ 273.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.707.616 | $ 68.400 | 6,960 | $ 1.707.616 | $ 118.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.707.616 | $ 68.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 529.000 |
| CC 1046427115 | YOEL ARDILA NARVAEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 59.152 | $ 9.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 59.152 | $ 2.400 | 0,000 | $ 59.152 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 57.202 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.200 |
| CC 1050719060 | JOSE ALBERTO OSPINO BARACAMONTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.424.578 | $ 228.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.424.578 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.424.578 | $ 99.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.424.578 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 441.200 |
| CC 1050719060 | JOSE ALBERTO OSPINO BARACAMONTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 1095802634 | JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.481.195 | $ 237.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.481.195 | $ 59.300 | 6,960 | $ 1.481.195 | $ 103.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.481.195 | $ 59.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 458.700 |
| CC 1095802634 | JUAN ANDRES DIAZ QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 48.991 | $ 7.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 48.991 | $ 2.000 | 0,000 | $ 48.991 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.800 |
| CC 1098699422 | LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.408.402 | $ 225.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.408.402 | $ 56.400 | 6,960 | $ 1.408.402 | $ 98.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.408.402 | $ 56.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 436.300 |
| CC 1098699422 | LUIS ALFONSO FUENTES NAVARRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 1098822751 | HARLEY PRADA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.564.089 | $ 250.300 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.564.089 | $ 62.600 | 6,960 | $ 1.564.089 | $ 108.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.564.089 | $ 62.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 484.400 |
| CC 1098822751 | HARLEY PRADA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 51.803 | $ 8.300 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 51.803 | $ 2.100 | 0,000 | $ 51.803 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 51.803 | $ 2.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.500 |
| CC 13745736 | ALEXANDER PRADA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.424.578 | $ 228.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.424.578 | $ 57.000 | 6,960 | $ 1.424.578 | $ 99.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.424.578 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 441.200 |
| CC 13745736 | ALEXANDER PRADA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 5691822 | LUIS ALBERTO PRADA RINCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.408.402 | $ 225.400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.408.402 | $ 56.400 | 6,960 | $ 1.408.402 | $ 98.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.408.402 | $ 56.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 436.300 |
| CC 5691822 | LUIS ALBERTO PRADA RINCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 48.528 | $ 7.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 48.528 | $ 2.000 | 0,000 | $ 48.528 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.700 |
| CC 91291101 | GUMERSINDO PARRA SOLANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.509.214 | $ 241.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.509.214 | $ 60.400 | 6,960 | $ 1.509.214 | $ 105.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.509.214 | $ 60.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.400 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 30/12/2025** | **Empresa NI901983966 CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB** | **Planilla Nro: 1078227098** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

**Total**

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 91291101 | GUMERSINDO PARRA SOLANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 50.846 | $ 8.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 50.846 | $ 2.100 | 0,000 | $ 50.846 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 50.846 | $ 2.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.400 |
| PT 5823211 | YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.376.050 | $ 220.200 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.376.050 | $ 55.100 | 6,960 | $ 1.376.050 | $ 95.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.376.050 | $ 55.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 426.200 |
| PT 5823211 | YEFFERSON DYFRED GONZALEZ ORTEGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| PT 6565491 | ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.376.050 | $ 220.200 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.376.050 | $ 55.100 | 6,960 | $ 1.376.050 | $ 95.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.376.050 | $ 55.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 426.200 |
| PT 6565491 | ANDRES FRANCISCO GARCIA FARIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 18.747.006 | $ 18.747.006 | $ 18.747.006 | $ 18.740.812 | $ 3.000.400 | $ 750.800 | $ 1.262.700 | $ 750.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.764.200 | $ 0 | $ 5.764.200 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-30, 09:46:31 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB |
| **NIT** | NI 901983966 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1078227094 |
| **Tipo de Planilla** | Y |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2046398536 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 99.100 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 1 | $ 99.100 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 99.100 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 99.100 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-12-30, 01:38:15 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1078227094

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

## PAGADO 30/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB | | |
| **Documento** | NI901983966 | **Dirección** | KM 7 #22 - 31 CENT IND SAN JORGE BOD 16 |
| **Tipo de Empresa** | CONTRATANTE | **Teléfono** | 6076159848 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | GIRON | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES | **Identificación** | CC 13870690 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 13870690 | JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 | $ 0 | $ 99.100 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-30, 10:11:24 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 13870690 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1078029261 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2046486100 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 13.331.300 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 6.405.900 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 4.448.500 | $ 0 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 1 | $ 2.476.900 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 13.331.300 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 13.331.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-12-30, 01:44:08 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078029261

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

## PAGADO 30/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ | | |
| **Documento** | CC13870690 | **Dirección** | CR 26 #36 - 14 OFICINA 403 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6914305 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 13870690 | JULIAN ANDRES SERRANO GOMEZ | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 35.587.500 | $ 6.405.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 35.587.500 | $ 4.448.500 | 6,960 | $ 35.587.500 | $ 2.476.900 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.331.300 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 35.587.500 | $ 35.587.500 | $ 35.587.500 | $ 0 | $ 6.405.900 | $ 4.448.500 | $ 2.476.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.331.300 | $ 0 | $ 13.331.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-11, 10:23:36 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 63395720 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1077926511 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1999221526 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 649.000 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 335.700 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 1 | $ 262.200 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 51.100 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 649.000 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 649.000 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-12-16, 08:40:09 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077926511

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

**PAGADO 11/12/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | LISSETTH XIMENA NIÑO CARVAJAL | | |
| **Documento** | CC63395720 | **Dirección** | CR 26 #36 - 14 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6914305 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 63395720 | LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.097.511 | $ 335.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.097.511 | $ 262.200 | 2,436 | $ 2.097.511 | $ 51.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 649.000 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.097.511 | $ 2.097.511 | $ 2.097.511 | $ 0 | $ 335.700 | $ 262.200 | $ 51.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 649.000 | $ 0 | $ 649.000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 91278912 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | FLORIDABLANCA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | TRAN 154#157A-89 T-B APTO 101 | TELÉFONO: | 6380581 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades profesionales, científicas y té |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 001 - INDEPENDIENTE |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7996630646** | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES diciembre AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/12/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 2008747109 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 384.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.000 | $ 0 | $ 384.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 384.000** | **$ 0** | **$ 384.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 300.000 | $ 0 | $ 0 | $ 300.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 300.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 300.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 91278912 | CORTES PEÑA WILLIAM EDUARDO | INDEPEND | | $ 2.400.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 2.400.000 | $ 384.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 384.000 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 2.400.000 | $ 300.000 | $ 0 | $ 300.000 | | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 684.000**

Planilla Pagada

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-31, 09:48:43 AM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | enero de 2026 |
| **Empresa** | MAQUINOBRAS |
| **NIT** | NI 900849507 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( MAQUINOBRAS ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1078285838 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2049520868 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 51.785.200 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 26 | $ 9.740.900 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 13 | $ 6.162.000 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 16 | $ 8.383.400 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 4 | $ 1.879.900 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | $ 953.800 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 17 | $ 1.734.200 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 7 | $ 980.500 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 4 | $ 467.000 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 11 | $ 1.017.400 | $ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 2 | $ 102.700 | $ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 4 | $ 394.700 | $ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 3 | $ 184.800 | $ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | $ 190.600 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 13 | $ 1.707.900 | $ 0 |
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 62 | $ 9.894.500 | $ 0 |
| N890201578 | CCF40 | COMFENALCO | 62 | $ 7.990.900 | $ 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **SubTotales:** | $ 51.785.200 | $ 0 |
| **Total a Pagar:** | | $ 51.785.200 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-01-02, 07:49:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1078285838

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

**PAGADO 31/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MAQUINOBRAS | **Nombre Sucursal** | MAQUINOBRAS | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI900849507 | **Dirección** | AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6914305 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER | | |
| **Representante Legal** | SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES | **Identificación** | CC 13870690 | | |
| **Total Afiliados** | 62 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1005155007 | MARIA CAMILA VARGAS ESPINOSA | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (230301) PORVENIR | $ 1.773.333 | $ 283.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.773.333 | $ 71.000 | 0,522 | $ 1.773.333 | $ 9.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.849.921 | $ 74.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.100 |
| CC 1005155007 | MARIA CAMILA VARGAS ESPINOSA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 63.333 | $ 10.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 63.333 | $ 2.600 | 0,000 | $ 63.333 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 63.333 | $ 2.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.400 |
| CC 1005209676 | LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 72.000 | $ 11.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 72.000 | $ 2.900 | 0,000 | $ 72.000 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 72.000 | $ 2.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.400 |
| CC 1005209676 | LUISA FERNANDA AREVALO PULIDO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.088.000 | $ 334.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.088.000 | $ 83.600 | 6,960 | $ 2.088.000 | $ 145.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.484.000 | $ 99.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 662.500 |
| CC 1007439672 | JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 52.906 | $ 8.500 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 52.906 | $ 2.200 | 0,000 | $ 52.906 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 52.906 | $ 2.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.900 |
| CC 1007439672 | JUAN DARIO PEDRAZA ROJAS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (230301) PORVENIR | $ 1.005.206 | $ 160.900 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.005.206 | $ 40.300 | 6,960 | $ 1.005.206 | $ 70.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.005.206 | $ 40.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 311.500 |
| CC 1037479814 | JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (230301) PORVENIR | $ 1.709.178 | $ 273.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.709.178 | $ 68.400 | 6,960 | $ 1.709.178 | $ 119.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.329.042 | $ 93.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 554.100 |
| CC 1037479814 | JESUS ALBERTO MEDRANO LANZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 96.535 | $ 15.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 96.535 | $ 3.900 | 0,000 | $ 96.535 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 67.320 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22.100 |
| CC 1063562221 | MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 2.436.855 | $ 389.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.436.855 | $ 97.500 | 6,960 | $ 2.436.855 | $ 169.700 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.818.946 | $ 152.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 809.900 |
| CC 1063562221 | MAURICIO ANDRES BECERRA ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 85.759 | $ 13.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 85.759 | $ 3.500 | 0,000 | $ 85.759 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.700 |
| CC 1063563240 | ADRIAN JOSE SOLANO FERIAS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.952.280 | $ 312.400 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.952.280 | $ 78.100 | 6,960 | $ 1.952.280 | $ 135.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.346.667 | $ 93.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 620.300 |
| CC 1063563240 | ADRIAN JOSE SOLANO FERIAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 67.320 | $ 10.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 67.320 | $ 2.700 | 0,000 | $ 67.320 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 67.320 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.200 |
| CC 1083048485 | JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.837.440 | $ 294.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.837.440 | $ 73.500 | 6,960 | $ 1.837.440 | $ 127.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.138.400 | $ 85.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 581.000 |
| CC 1083048485 | JENNIFER PAOLA CARDENAS GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 63.360 | $ 10.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 63.360 | $ 2.600 | 0,000 | $ 63.360 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 63.360 | $ 2.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.400 |
| CC 1085047138 | MILTON JOSE DIAZ RIBON | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (230201) PROTECCION | $ 2.318.730 | $ 371.000 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 2.318.730 | $ 92.800 | 6,960 | $ 2.318.730 | $ 161.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.089.594 | $ 123.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 748.800 |
| CC 1085047138 | MILTON JOSE DIAZ RIBON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | L | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 125.823 | $ 20.200 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 125.823 | $ 5.100 | 0,000 | $ 125.823 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 95.832 | $ 3.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.200 |
| CC 1085047138 | MILTON JOSE DIAZ RIBON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 251.647 | $ 40.300 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 251.647 | $ 10.100 | 0,000 | $ 251.647 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 194.709 | $ 7.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.200 |
| CC 1085047138 | MILTON JOSE DIAZ RIBON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230201) PROTECCION | $ 880.762 | $ 141.000 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 880.762 | $ 35.300 | 0,000 | $ 880.762 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 681.479 | $ 27.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 203.600 |
| CC 1095786179 | OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.721.222 | $ 435.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.721.222 | $ 108.900 | 6,960 | $ 2.721.222 | $ 189.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.753.574 | $ 150.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 883.900 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 31/12/2025** | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1095786179 | OSCAR JULIAN PALOMINO DUARTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 123.757 | $ 19.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 123.757 | $ 5.000 | 0,000 | $ 123.757 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.300 |
| CC 1095798988 | SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.740.000 | $ 278.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.740.000 | $ 69.600 | 6,960 | $ 1.740.000 | $ 121.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.750.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 539.300 |
| CC 1095798988 | SERGIO ANDRES OROSTEGUI ARDILA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 60.000 | $ 9.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 60.000 | $ 2.400 | 0,000 | $ 60.000 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 60.000 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.400 |
| CC 1095808270 | SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (231001) COLFONDOS | $ 3.736.863 | $ 597.900 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 3.736.863 | $ 149.500 | 6,960 | $ 3.736.863 | $ 260.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.817.883 | $ 152.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.160.300 |
| CC 1095808270 | SERGIO ANDRES PORRAS VILLAMIZAR | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 116.400 | $ 18.700 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 116.400 | $ 4.700 | 0,000 | $ 116.400 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 75.240 | $ 3.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.500 |
| CC 1095814603 | RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.844.154 | $ 295.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.844.154 | $ 73.800 | 6,960 | $ 1.844.154 | $ 128.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.167.579 | $ 86.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 584.100 |
| CC 1095814603 | RUBEN DARIO BAUTISTA CONTRERAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 61.776 | $ 9.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 61.776 | $ 2.500 | 0,000 | $ 61.776 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 61.776 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.900 |
| CC 1095832559 | DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 3.323.528 | $ 531.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 3.323.528 | $ 133.000 | 6,960 | $ 3.323.528 | $ 231.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 4.311.258 | $ 172.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.068.700 |
| CC 1095832559 | DEIVER FABIAN LOPEZ PADILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 113.528 | $ 18.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 113.528 | $ 4.600 | 0,000 | $ 113.528 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 95.832 | $ 3.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.700 |
| CC 1095909154 | FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 98.753 | $ 15.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 98.753 | $ 4.000 | 0,000 | $ 98.753 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.300 |
| CC 1095909154 | FREDDY ALEXANDER GALVIS MUÑOZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.961.330 | $ 473.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.961.330 | $ 118.500 | 6,960 | $ 2.961.330 | $ 206.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 4.260.696 | $ 170.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 969.100 |
| CC 1095947638 | LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 1095947638 | LIZETH YOLANDA PEREZ PRADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.376.050 | $ 220.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.376.050 | $ 55.100 | 0,522 | $ 1.376.050 | $ 7.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.376.050 | $ 55.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 337.600 |
| CC 1096214445 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.602.527 | $ 416.500 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.602.527 | $ 104.200 | 6,960 | $ 2.602.527 | $ 181.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.857.153 | $ 154.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 856.200 |
| CC 1096214445 | MIGUEL ANGEL ALVAREZ ESCANDON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 87.554 | $ 14.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 87.554 | $ 3.600 | 0,000 | $ 87.554 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 67.320 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.400 |
| CC 1098636620 | EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (231001) COLFONDOS | $ 2.641.320 | $ 422.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.641.320 | $ 105.700 | 6,960 | $ 2.641.320 | $ 183.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.853.536 | $ 114.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 826.500 |
| CC 1098636620 | EDGAR IVAN PALOMINO HOLGUIN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 91.080 | $ 14.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 91.080 | $ 3.700 | 0,000 | $ 91.080 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 91.080 | $ 3.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22.000 |
| CC 1098636979 | LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 83.160 | $ 13.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 83.160 | $ 3.400 | 0,000 | $ 83.160 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.200 |
| CC 1098636979 | LUIS ALBERTO RIVERA PEÑUELA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.411.640 | $ 385.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.411.640 | $ 96.500 | 6,960 | $ 2.411.640 | $ 167.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.528.896 | $ 101.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 751.500 |
| CC 1098664993 | YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.670.400 | $ 267.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.670.400 | $ 66.900 | 0,522 | $ 1.670.400 | $ 8.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.416.896 | $ 96.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 439.700 |
| CC 1098664993 | YURIS MILADYS ESCOBAR MEDINA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 57.600 | $ 9.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 57.600 | $ 2.400 | 0,000 | $ 57.600 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 57.600 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.100 |
| CC 1098681601 | ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230901) OLD MUTUAL SKANDIA | $ 3.152.300 | $ 504.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.152.300 | $ 126.100 | 6,960 | $ 3.152.300 | $ 219.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 4.094.729 | $ 163.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.013.800 |
| CC 1098681601 | ALEJANDRO LOAIZA GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230901) OLD MUTUAL SKANDIA | $ 108.700 | $ 17.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 108.700 | $ 4.400 | 0,000 | $ 108.700 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 108.700 | $ 4.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.200 |
| CC 1098714157 | YEFERSON ACEVEDO SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 123.552 | $ 19.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 123.552 | $ 5.000 | 0,000 | $ 123.552 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 123.552 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.800 |
| CC 1098714157 | YEFERSON ACEVEDO SUAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 61.776 | $ 9.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 61.776 | $ 2.500 | 0,000 | $ 61.776 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 61.776 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.400 |
| CC 1098714157 | YEFERSON ACEVEDO SUAREZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (230201) PROTECCION | $ 1.857.492 | $ 297.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.857.492 | $ 74.300 | 6,960 | $ 1.857.492 | $ 129.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.857.492 | $ 74.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 575.100 |
| CC 1098717464 | YESICA PAOLA MURILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 88.596 | $ 14.200 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 88.596 | $ 3.600 | 0,000 | $ 88.596 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 88.596 | $ 3.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.400 |
| CC 1098717464 | YESICA PAOLA MURILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.569.284 | $ 411.100 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 2.569.284 | $ 102.800 | 0,522 | $ 2.569.284 | $ 13.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.569.284 | $ 102.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 630.200 |
| CC 1098732608 | JHON JAIRO MARTINEZ HENAO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.503.778 | $ 400.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.503.778 | $ 100.200 | 6,960 | $ 2.503.778 | $ 174.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.168.540 | $ 126.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 802.000 |
| CC 1098732608 | JHON JAIRO MARTINEZ HENAO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 84.546 | $ 13.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 84.546 | $ 3.400 | 0,000 | $ 84.546 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.400 |
| CC 1098746750 | EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 3.282.212 | $ 525.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 3.282.212 | $ 131.300 | 6,960 | $ 3.282.212 | $ 228.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.282.212 | $ 131.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.016.300 |
| CC 1098746750 | EDER ESNEIDER GARCIA MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 113.180 | $ 18.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 113.180 | $ 4.600 | 0,000 | $ 113.180 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 113.180 | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.400 |
| CC 1098752632 | KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 73.188 | $ 11.800 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 73.188 | $ 3.000 | 0,000 | $ 73.188 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 73.188 | $ 3.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.800 |
| CC 1098752632 | KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 73.188 | $ 11.800 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 73.188 | $ 3.000 | 0,000 | $ 73.188 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 73.188 | $ 3.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.800 |
| CC 1098752632 | KAROL JOHANNA GALVIS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.049.264 | $ 327.900 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 2.049.264 | $ 82.000 | 0,522 | $ 2.049.264 | $ 10.700 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.049.264 | $ 82.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 502.600 |
| CC 1098753057 | JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 101.410 | $ 16.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 101.410 | $ 4.100 | 0,000 | $ 101.410 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 101.410 | $ 4.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.500 |
| CC 1098753057 | JHONATAN ALBERTO GIRALDO ARENAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.940.904 | $ 470.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.940.904 | $ 117.700 | 6,960 | $ 2.940.904 | $ 204.700 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.940.904 | $ 117.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 910.700 |
| CC 1098757795 | JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | (230201) PROTECCION | $ 1.552.500 | $ 248.400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.552.500 | $ 62.100 | 6,960 | $ 1.552.500 | $ 108.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.573.949 | $ 63.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 481.600 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 31/12/2025** | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1098757795 | JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 68.455 | $ 11.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 68.455 | $ 2.800 | 0,000 | $ 68.455 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 60.000 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.200 |
| CC 1098757795 | JULIAN ANDRES ALVAREZ PINZON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (230201) PROTECCION | $ 342.273 | $ 54.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 342.273 | $ 13.700 | 0,000 | $ 342.273 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 300.981 | $ 12.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.600 |
| CC 1098760722 | JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 113.420 | $ 18.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 113.420 | $ 4.600 | 0,000 | $ 113.420 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 113.420 | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.400 |
| CC 1098760722 | JHON ALEXANDER GONZALEZ RIVERA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 3.289.180 | $ 526.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.289.180 | $ 131.600 | 6,960 | $ 3.289.180 | $ 229.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.289.180 | $ 131.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.018.500 |
| CC 1098764509 | MARIA FERNANDA RIVERA SEPULVEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230901) OLD MUTUAL SKANDIA | $ 2.700.000 | $ 432.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.700.000 | $ 108.000 | 0,000 | $ 2.700.000 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.700.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 540.000 |
| CC 1098789071 | MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | (230301) PORVENIR | $ 1.225.000 | $ 196.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.225.000 | $ 49.000 | 6,960 | $ 1.225.000 | $ 85.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.225.000 | $ 49.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 379.300 |
| CC 1098789071 | MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 58.333 | $ 9.400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 58.333 | $ 2.400 | 0,000 | $ 58.333 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 58.333 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.200 |
| CC 1098789071 | MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230301) PORVENIR | $ 116.667 | $ 18.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 116.667 | $ 4.700 | 0,000 | $ 116.667 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 116.667 | $ 4.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.100 |
| CC 1098789071 | MAIRA ALEJANDRA PEREZ SANDOVAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | (230301) PORVENIR | $ 350.000 | $ 56.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 350.000 | $ 14.000 | 0,000 | $ 350.000 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 350.000 | $ 14.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 84.000 |
| CC 1098803975 | DIEGO MAURICIO NIÑO MECON | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.416.667 | $ 386.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.416.667 | $ 96.700 | 6,960 | $ 2.416.667 | $ 168.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.149.167 | $ 126.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 777.700 |
| CC 1098803975 | DIEGO MAURICIO NIÑO MECON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 83.333 | $ 13.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 83.333 | $ 3.400 | 0,000 | $ 83.333 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.333 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.200 |
| CC 1098805995 | OSCAR IVAN URIBE TORRES | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (230301) PORVENIR | $ 521.950 | $ 83.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 521.950 | $ 20.900 | 6,960 | $ 521.950 | $ 36.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 521.950 | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 161.800 |
| CC 1098805995 | OSCAR IVAN URIBE TORRES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 1098805995 | OSCAR IVAN URIBE TORRES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | (230301) PORVENIR | $ 854.100 | $ 136.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 854.100 | $ 34.200 | 0,000 | $ 854.100 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 854.100 | $ 34.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.100 |
| CC 1098822060 | SANTIAGO SERRANO TRUJILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 97.200 | $ 15.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 97.200 | $ 3.900 | 0,000 | $ 97.200 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 97.200 | $ 3.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.400 |
| CC 1098822060 | SANTIAGO SERRANO TRUJILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (230301) PORVENIR | $ 388.800 | $ 62.300 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 388.800 | $ 15.600 | 0,000 | $ 388.800 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 388.800 | $ 15.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93.500 |
| CC 1098822060 | SANTIAGO SERRANO TRUJILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 2.430.000 | $ 388.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.430.000 | $ 97.200 | 6,960 | $ 2.430.000 | $ 169.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.430.000 | $ 97.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 752.400 |
| CC 1099622802 | MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (230301) PORVENIR | $ 989.440 | $ 158.400 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 989.440 | $ 39.600 | 6,960 | $ 989.440 | $ 68.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.033.134 | $ 41.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 308.300 |
| CC 1099622802 | MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 51.224 | $ 8.200 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 51.224 | $ 2.100 | 0,000 | $ 51.224 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.200 |
| CC 1099622802 | MARLON DAVID TOLOZA BARRIOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | (230301) PORVENIR | $ 461.020 | $ 73.800 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 461.020 | $ 18.500 | 0,000 | $ 461.020 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 429.065 | $ 17.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 109.500 |
| CC 1100890118 | MAURICIO SUAREZ PEDRAZA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (230301) PORVENIR | $ 1.629.676 | $ 260.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.629.676 | $ 65.200 | 6,960 | $ 1.629.676 | $ 113.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.629.676 | $ 65.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 504.700 |
| CC 1100890118 | MAURICIO SUAREZ PEDRAZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 63.180 | $ 10.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 63.180 | $ 2.600 | 0,000 | $ 63.180 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 61.776 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.300 |
| CC 1100890118 | MAURICIO SUAREZ PEDRAZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (230301) PORVENIR | $ 252.720 | $ 40.500 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 252.720 | $ 10.200 | 0,000 | $ 252.720 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 247.104 | $ 9.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.600 |
| CC 1100952471 | EDER ANDRES GARCIA LOPEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230201) PROTECCION | $ 1.990.013 | $ 318.500 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.990.013 | $ 79.700 | 6,960 | $ 1.990.013 | $ 138.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.990.013 | $ 79.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 616.500 |
| CC 1100952471 | EDER ANDRES GARCIA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 87.552 | $ 14.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 87.552 | $ 3.600 | 0,000 | $ 87.552 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 75.240 | $ 3.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.800 |
| CC 1100952471 | EDER ANDRES GARCIA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | (230201) PROTECCION | $ 612.864 | $ 98.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 612.864 | $ 24.600 | 0,000 | $ 612.864 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 528.875 | $ 21.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 143.900 |
| CC 1102350911 | JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (231001) COLFONDOS | $ 2.125.271 | $ 340.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.125.271 | $ 85.100 | 6,960 | $ 2.125.271 | $ 148.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.963.881 | $ 118.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 691.800 |
| CC 1102350911 | JOHN ALEJANDRO PEREZ ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 70.551 | $ 11.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 70.551 | $ 2.900 | 0,000 | $ 70.551 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 61.776 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.700 |
| CC 1102383610 | URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.094.288 | $ 335.100 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 2.094.288 | $ 83.800 | 6,960 | $ 2.094.288 | $ 145.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.495.945 | $ 99.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 664.600 |
| CC 1102383610 | URIEL ALONSO RIVERA BARAJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 68.972 | $ 11.100 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 68.972 | $ 2.800 | 0,000 | $ 68.972 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 61.776 | $ 2.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.400 |
| CC 1102389388 | JONATAN RAMIRO CORDOBA CADENA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.376.000 | $ 380.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.376.000 | $ 95.100 | 6,960 | $ 2.376.000 | $ 165.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.148.200 | $ 126.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 766.700 |
| CC 13700835 | PARMENIO RODRIGUEZ AVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 57.859 | $ 9.300 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 57.859 | $ 2.400 | 0,000 | $ 57.859 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 57.859 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.100 |
| CC 13700835 | PARMENIO RODRIGUEZ AVE | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.099.313 | $ 175.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.099.313 | $ 44.000 | 6,960 | $ 1.099.313 | $ 76.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.099.313 | $ 44.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 340.500 |
| CC 13716576 | OSCAR ARTURO BARON JAIMES | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.135.880 | $ 341.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.135.880 | $ 85.500 | 6,960 | $ 2.135.880 | $ 148.700 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.765.063 | $ 110.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 686.700 |
| CC 13716576 | OSCAR ARTURO BARON JAIMES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 75.544 | $ 12.100 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 75.544 | $ 3.100 | 0,000 | $ 75.544 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 67.320 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.900 |
| CC 13742035 | JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.354.310 | $ 376.700 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.354.310 | $ 94.200 | 6,960 | $ 2.354.310 | $ 163.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.441.615 | $ 137.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 772.500 |
| CC 13742035 | JAIRO ENRIQUE CORNEJO MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 74.655 | $ 12.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 74.655 | $ 3.000 | 0,000 | $ 74.655 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 55.440 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.300 |
| CC 13745185 | JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 4.604.852 | $ 736.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 4.604.852 | $ 184.200 | 6,960 | $ 4.604.852 | $ 320.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 6.980.320 | $ 279.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.520.800 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 31/12/2025** | **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** | **Planilla Nro: 1078285838** | **Periodo Cotización: diciembre de 2025** | **Periodo Servicio: enero de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 13745185 | JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 158.788 | $ 25.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 158.788 | $ 6.400 | 0,000 | $ 158.788 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 158.788 | $ 6.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.300 |
| CC 13862051 | DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 5.064.367 | $ 810.300 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 5.064.367 | $ 202.600 | 6,960 | $ 5.064.367 | $ 352.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 6.978.348 | $ 279.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.644.600 |
| CC 13862051 | DIEGO ANTONIO LOPEZ SANTAMARIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 174.633 | $ 28.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 174.633 | $ 7.000 | 0,000 | $ 174.633 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 174.633 | $ 7.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.000 |
| CC 13871814 | JUAN DE DIOS PEREZ PABON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 13871814 | JUAN DE DIOS PEREZ PABON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (25-14) COLPENSIONES | $ 901.550 | $ 144.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 901.550 | $ 36.100 | 6,960 | $ 901.550 | $ 62.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 901.550 | $ 36.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 279.300 |
| CC 13873494 | JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4.338.375 | $ 694.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.338.375 | $ 173.600 | 6,960 | $ 4.338.375 | $ 302.000 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 6.369.837 | $ 254.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.424.600 |
| CC 13873494 | JESUS ALEXIS MANTILLA AMADO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 144.061 | $ 23.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 144.061 | $ 5.800 | 0,000 | $ 144.061 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 101.753 | $ 4.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33.000 |
| CC 26719394 | CARMEN EDITH CORTES CALDERON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 234.347 | $ 39.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 234.347 | $ 9.400 | 0,000 | $ 234.347 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 234.347 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 58.700 |
| CC 26719394 | CARMEN EDITH CORTES CALDERON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (25-14) COLPENSIONES | $ 468.694 | $ 79.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 468.694 | $ 18.800 | 0,000 | $ 468.694 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 468.694 | $ 18.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.400 |
| CC 26719394 | CARMEN EDITH CORTES CALDERON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.171.734 | $ 199.300 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.171.734 | $ 46.900 | 0,000 | $ 1.171.734 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.171.734 | $ 46.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 293.100 |
| CC 26719394 | CARMEN EDITH CORTES CALDERON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (25-14) COLPENSIONES | $ 5.155.627 | $ 876.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 5.155.627 | $ 206.300 | 6,960 | $ 5.155.627 | $ 358.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 5.155.627 | $ 206.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.648.100 |
| CC 37535732 | ALBA LORENA VELASCO GOMEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (230201) PROTECCION | $ 5.850.000 | $ 994.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 5.850.000 | $ 234.000 | 6,960 | $ 5.850.000 | $ 407.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 7.574.666 | $ 303.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.938.800 |
| CC 37535732 | ALBA LORENA VELASCO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 216.667 | $ 36.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 216.667 | $ 8.700 | 0,000 | $ 216.667 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 216.667 | $ 8.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 54.300 |
| CC 37535732 | ALBA LORENA VELASCO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 433.334 | $ 73.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 433.334 | $ 17.400 | 0,000 | $ 433.334 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 433.334 | $ 17.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 108.600 |
| CC 37750630 | LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (231001) COLFONDOS | $ 2.866.406 | $ 458.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.866.406 | $ 114.700 | 6,960 | $ 2.866.406 | $ 199.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 4.126.636 | $ 165.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 938.100 |
| CC 37750630 | LINETH MARITZA RODRIGUEZ VEGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (231001) COLFONDOS | $ 98.842 | $ 15.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 98.842 | $ 4.000 | 0,000 | $ 98.842 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 98.842 | $ 4.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23.900 |
| CC 37752831 | PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 110.771 | $ 17.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 110.771 | $ 4.500 | 0,000 | $ 110.771 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 110.771 | $ 4.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.800 |
| CC 37752831 | PERLA JOHANNA OREJUELA RAMOS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.212.350 | $ 514.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.212.350 | $ 128.500 | 6,960 | $ 3.212.350 | $ 223.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.899.128 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.022.100 |
| CC 63302660 | ALBA LUCIA SANTOS RUEDA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.869.945 | $ 299.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.869.945 | $ 74.800 | 6,960 | $ 1.869.945 | $ 130.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.869.945 | $ 74.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 579.000 |
| CC 63302660 | ALBA LUCIA SANTOS RUEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 124.663 | $ 20.000 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 124.663 | $ 5.000 | 0,000 | $ 124.663 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 124.663 | $ 5.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.000 |
| CC 63302660 | ALBA LUCIA SANTOS RUEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.745.282 | $ 279.300 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.745.282 | $ 69.900 | 0,000 | $ 1.745.282 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.745.282 | $ 69.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 419.100 |
| CC 63514916 | ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 10.633.333 | $ 1.807.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 10.633.333 | $ 425.400 | 6,960 | $ 10.633.333 | $ 740.100 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 16.115.000 | $ 644.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.617.900 |
| CC 63514916 | ADRIANA XIMENA SERRANO ARENAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 366.667 | $ 62.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 366.667 | $ 14.700 | 0,000 | $ 366.667 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 366.667 | $ 14.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.900 |
| CC 80187378 | ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (25-14) COLPENSIONES | $ 142.350 | $ 22.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 142.350 | $ 5.700 | 0,000 | $ 142.350 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 142.350 | $ 5.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.200 |
| CC 80187378 | ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 80187378 | ANDRES LEONARDO LASSO AGUIRRE | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.233.700 | $ 197.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.233.700 | $ 49.400 | 6,960 | $ 1.233.700 | $ 85.900 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.233.700 | $ 49.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 382.100 |
| CC 91110220 | WILSON MORENO NIÑO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 2.510.865 | $ 401.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.510.865 | $ 100.500 | 6,960 | $ 2.510.865 | $ 174.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.760.310 | $ 110.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 787.600 |
| CC 91110220 | WILSON MORENO NIÑO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 83.160 | $ 13.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 83.160 | $ 3.400 | 0,000 | $ 83.160 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 83.160 | $ 3.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.200 |
| CC 91217581 | LUIS ANTONIO SANABRIA REY | 01 | 01 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 664.300 | $ 26.600 | 6,960 | $ 664.300 | $ 46.300 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 664.300 | $ 26.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.500 |
| CC 91217581 | LUIS ANTONIO SANABRIA REY | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.800 |
| CC 91217581 | LUIS ANTONIO SANABRIA REY | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS046) SALUD MIA EPS046 | $ 711.750 | $ 28.500 | 0,000 | $ 711.750 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 711.750 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.000 |
| CC 91265828 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | (25-14) COLPENSIONES | $ 521.950 | $ 83.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 521.950 | $ 20.900 | 6,960 | $ 521.950 | $ 36.400 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 521.950 | $ 20.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 161.800 |
| CC 91265828 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 91265828 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | (25-14) COLPENSIONES | $ 854.100 | $ 136.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 854.100 | $ 34.200 | 0,000 | $ 854.100 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 854.100 | $ 34.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 205.100 |
| CC 91274996 | EDUARDO SANTOS USECHE | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.046.463 | $ 327.500 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.046.463 | $ 81.900 | 6,960 | $ 2.046.463 | $ 142.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.705.662 | $ 108.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 660.200 |
| CC 91274996 | EDUARDO SANTOS USECHE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 73.055 | $ 11.700 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 73.055 | $ 3.000 | 0,000 | $ 73.055 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 55.440 | $ 2.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.000 |
| CC 91357047 | ARTURO ARENAS JAIMES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 47.450 | $ 7.600 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 91357047 | ARTURO ARENAS JAIMES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (230301) PORVENIR | $ 901.550 | $ 144.300 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 901.550 | $ 36.100 | 6,960 | $ 901.550 | $ 62.800 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 901.550 | $ 36.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 279.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

**Pagado: 31/12/2025** **Empresa NI900849507 MAQUINOBRAS** **Planilla Nro: 1078285838** **Periodo Cotización: diciembre de 2025** **Periodo Servicio: enero de 2026**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 91499520 | JOSE ORLANDO ALBA JAIMES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 158.788 | $ 25.500 | (EPS042) COOSALUD | $ 158.788 | $ 6.400 | 0,000 | $ 158.788 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 158.788 | $ 6.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 38.300 |
| CC 91499520 | JOSE ORLANDO ALBA JAIMES | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 4.604.852 | $ 736.800 | (EPS042) COOSALUD | $ 4.604.852 | $ 184.200 | 6,960 | $ 4.604.852 | $ 320.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 5.994.247 | $ 239.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.481.300 |
| CC 93408591 | JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 47.450 | $ 7.600 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 47.450 | $ 1.900 | 0,000 | $ 47.450 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 47.450 | $ 1.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.400 |
| CC 93408591 | JAIRO ALBERTO YEPES CARBONELL | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.456.931 | $ 233.200 | (ESSC24) EPS-S COOSALUD | $ 1.456.931 | $ 58.300 | 6,960 | $ 1.456.931 | $ 101.500 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.456.931 | $ 58.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 451.300 |
| CE 538468 | JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ | 01 | 00 | | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 2.021.130 | $ 323.400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 2.021.130 | $ 80.900 | 6,960 | $ 2.021.130 | $ 140.700 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 2.021.130 | $ 80.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 625.900 |
| CE 538468 | JOSE LUIS BRICEÑO HERNANDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 67.320 | $ 10.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 67.320 | $ 2.700 | 0,000 | $ 67.320 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 67.320 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.200 |
| PT 5338041 | ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | L | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230201) PROTECCION | $ 50.846 | $ 8.200 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 50.846 | $ 2.100 | 0,000 | $ 50.846 | $ 0 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 50.846 | $ 2.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.400 |
| PT 5338041 | ANNEL EDGARDO HERNANDEZ ESCOBAR | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.654.647 | $ 264.800 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.654.647 | $ 66.200 | 6,960 | $ 1.654.647 | $ 115.200 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 1.654.647 | $ 66.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 512.400 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 167.923.834 | $ 169.347.334 | $ 169.347.334 | $ 202.512.033 | $ 27.120.000 | $ 6.779.800 | $ 9.894.500 | $ 7.990.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 51.785.200 | $ 0 | $ 51.785.200 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-30, 10:15:13 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | MAQUINOBRAS |
| **NIT** | NI 900849507 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | 01 ( MAQUINOBRAS ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1078029824 |
| **Tipo de Planilla** | Y |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 2046499848 |
| **Banco** | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE |
| **Valor** | $ 297.300 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N860002183 | 14-4 | AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A | 3 | $ 297.300 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 297.300 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 297.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-12-30, 12:52:57 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1078029824

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

## PAGADO 30/12/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MAQUINOBRAS | **Nombre Sucursal** | MAQUINOBRAS | **Código Sucursal** | 01 |
| **Documento** | NI900849507 | **Dirección** | AV 0 #22 - 31 CENTRO IND SAN JORGE BD 16 | | |
| **Tipo de Empresa** | CONTRATANTE | **Teléfono** | 6914305 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER | | |
| **Representante Legal** | SERRANO GOMEZ JULIAN ANDRES | **Identificación** | CC 13870690 | | |
| **Total Afiliados** | 3 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1098724789 | DANIEL RICARDO ZAMBRANO LESMES | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 |
| CC 63395720 | LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 |
| CC 91278912 | WILLIAM EDUARDO CORTES PEÑA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 4.270.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 297.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 297.300 | $ 0 | $ 297.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# 4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 4.1 INFORMACIÓN GENERAL

*Tabla 6. Información General del contrato de interventoría*

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **210-16227-4** |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.<br>GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| CONTRATANTE | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB |
| NIT. | 890.201.573-0 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA |
| NIT. | 901.982.939 – 1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| VALOR | SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($680.377.740,00) |
| ANTICIPO | N/A |
| VALOR ADICIONAL | N/A |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. 25000867 DEL 09 DE JUNIO DE 2025 POR VALOR DE $157.008.387,30 PESOS M/CTE. |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 25001230 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $157.008.387,30 PESOS M/CTE. |
| PLAZO DE EJECUCION | 10 MESES |
| PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL | N/A |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 08 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 15 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| SUPERVISOR | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA<br><br>SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL |
| DEPARTAMENTO | SANTANDER |
| MUNICIPIO | PIEDECUESTA |

### 4.1.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

*Tabla 7. Control de pólizas del contrato de interventoría con la suscripción del contrato de interventoría*

| **CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | | | | |
| **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | | |
| **PÓLIZA No. 96-44-101199736** (suscripción del contrato) **– ANEXO:** 0 | | | | |
| **Fecha de Expedición:** 25 de septiembre de 2025 | | | **Fecha de Aprobación:**07 de | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |
| Cumplimiento | 96-44-101199736 | $136.075.548,00 | 08/09/2025 | 08/01/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | $204.113.322,00 | 08/09/2025 | 08/07/2029 |
| Calidad del servicio | | $136.075.548,00 | 08/07/2026 | 08/07/2031 |

*Tabla 8. Control de pólizas del contrato de interventoría con la suscripción del Acta de Inicio*

| **CONTROL DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO ESTATAL** | | | | |
| **Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL** | | | | |
| **PÓLIZA No. 96-44-101199736** (acta de inicio) **– ANEXO:** 1 y 2 | | | | |
| **Fecha de Expedición:** 14 de agosto de 2024 | | | **Fecha de Aprobación:** 24 de septiembre de | |
| **AMPARO** | **NÚMERO** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** |
| Cumplimiento del Contrato | 96-44-101199736 | $136.075.548,00 | 15/10/2025 | 14/02/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | | $204.113.322,00 | 15/10/2025 | 14/08/2029 |
| Estabilidad de la obra | | $136.075.548,00 | 14/08/2026 | 14/08/2031 |

### 4.1.2 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

*Tabla 9. Relación de actas del contrato de interventoría*

| RELACION DE ACTAS | | |
|---|---|---|
| **FECHA y/o PERIODO** | **DESCRIPCION** | **VALOR** |
| 15/10/2025 | ACTA DE INICIO | N/A |
| Del 15/10/2025 al 14/12/2025 | ACTA PARCIAL No. 01 | $ 71.215.138,05 |

### 4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente período de ejecución del contrato, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Realizó comités y visitas técnicas con el objetivo de analizar el alcance del proyecto.
- Acompañó y participó junto al contratista de obra en la socialización del proyecto con la comunidad del barrio Halcón de granada.
- Acompañó al contratista de obra en la elaboración de las actas de vecindad de las viviendas ubicadas en el área de influencia del barrio Halcón de granada.
- Realizó acompañamiento junto con contratista y la CDMB, en la inspección de la capa vegetal del talud en Brisas de Primavera, lo que determinó no intervenir forestalmente esta área por las condiciones de las especies arbóreas existentes.
- Verificó el cumplimento en los pagos al sistema de seguridad social y de parafiscales del personal de obra.
- Verificó el cumplimiento de todas las normas en seguridad industrial y salud en el trabajo aplicables al tipo de obra ejecutada.
- Realizó comité de obra para controlar el avance del proyecto.
- Realizó el seguimiento, control y supervisión a las actividades ejecutadas por el contratista.
  - Replanteo, control y medición de la obra.
  - Desmonte y limpieza.
  - Retiro de basuras y escombros.
  - Perfilado a mano descolgado de talud (en roca).
  - Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad.
  - Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad.
  - Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m.
- Elaboró informes semanales y mensuales de seguimiento de ejecución a los contratos de obra e interventoría.
- Acompañó en la revisión y presentación del cambio de tipo de sistema de estabilización para el frente Brisas de Primavera.
- Realizó la revisión de los Ítems no previstos generados por el nuevo sistema de estabilización.
- Realizó la revisión del balance de cantidades presentadas por el contratista, que dieron lugar a la suscripción de ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS.

- Avaló el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS que se generó por el cambio de sistema de estabilización para el frente Brisas de Primavera.
- Se revisó y aprobó el ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 01 presentada por el contratista de obra, correspondiente al periodo comprendido entre el 15/10/205 y el 14/12/2025, por un valor de $ 1.010.210.915,17 PESOS M/CTE.

## 4.3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

| FECHA | 20 | 1 | 2026 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA**

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**MES DEL INFORME MENSUAL:** 01/12/2025 - 31/12/2025 **CONTRATO No.** 210-16227-4

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER PIEDECUESTA **SECTOR:** BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Estacion Total (Topografía) | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | A | A | A | |
| Vehículo (camioneta) | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | | A | A | A | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

## 4.4 CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**

FECHA: 20 (Día) | 1 (Mes) | 2026 (Año)

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**MES DEL INFORME MENSUAL:** 01/12/2025 - 31/12/2025

**CONTRATO No.** 210-16227-4

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

**SECTOR:** BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA Y HALCON DE GRANADA

| NOMBRE | CARGO | CC | Ingreso | Retiro | Tipo de Personal | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Jorge Eliecer Alvarez Carreño | Director de Interventoría | 91.275.391 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Andrea Karina Quintero Ortiz | Residente de Interventoria | 1.091.665.386 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Fredy Sebastian Toloza Pimiento | Especialista en estructuras | 1.098.739.051 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Iban Gustavo Blanco Gonzales | Especialista hidraulico | 79.431.435 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Tulia Elena Quintero Guerrero | Especialista en geotecnia | 63.398.589 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Edith Costanza Toloza Rojas | Especialista Ambiental - SST | 63.555.895 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Paula Andrea Ayala Delgado | Profesional SISO | 1.098.752.363 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| Karen Dayanna Diaz Ariza | Auxiliar residente de interventoria | 1.098.762.015 | 15/10/2025 | | Contractual | A | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | A | A | A | | A | A | | A | A | A | | | | | A | A | A | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, INACTIVO= I.**

## 4.5 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

**Fecha:** 20/01/2026

**Período del informe:** 01/12/2025 - 31/12/2025

**Contrato No.** 210-16227-4

**Contratista:** CONSORCIO INTER PIEDECUESTA

**Objeto del contrato:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **CONTRATADO** | **PAGOS REALIZADO** |
| Contrato Inicial | $ 680.377.740,00 | |
| Adicional | | |
| Acta Parcial 01 (Del 15/10/2025 al 14/12/2025) | | $ 71.215.138,05 |
| Acta Parcial 02 | | |
| Acta Final Interventoría | | |
| Saldo por ejecutar | | $ 609.162.601,95 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 680.377.740,00** | $ 680.377.740,00 |

## 4.6 INFORMACIÓN DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

Según reza en la **CLAUSULA SÉPTIMA** de la minuta del contrato, "Según el requerimiento No. 664 "Pagos parciales de acuerdo al avance y ejecución del contrato vigilado, mediante la suscripción de actas de pago debidamente revisadas y aprobadas por la Supervisión del contrato por parte de la CDMB."

Con base en lo anterior, se deduce que el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO RECIBIRÁ NINGÚN ANTICIPO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

## 4.7 SEGUIMENTO AL PAGO DE APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORÍA.FINANCIERA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

## ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO:** | **210-16227-4** | **PERIODO** | **01/12/2025 - 31/12/2025** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB** | **INTERVENTOR:** | **CONSORCIO INTER PIEDECUESTA** |
| **SUPERVISOR INTERVENTORÍA:** | **CARLOS ALBERTO DIAZ** | **PERÍODO DE SEGURIDAD SOCIAL:** | **DICIEMBRE DE 2025** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE PAGO** | | | | | | | | | | | | | | | | **19/01/2026** | |
| **No planilla** | **Nombre personal** | **Cargo y/o oficio** | **Cédula de Ciudadanía** | **No dias Trabajados** | **IBC** | **IBC MENSUAL** | **SALUD** | | **PENSIÓN** | | **ARL** | | **I.C.B.F.** | **SENA** | **Caja de compensación** | **Total a pagar** |
| | | | | | | | **EPS** | **VALOR** | **PENSION** | **VALOR** | **ARL** | **VALOR** | | | | |
| 1077647233 | Jorge Eliecer Alvarez Carreño | Director de Interventoria | 91.275.391 | 30 | $ 3.600.000,00 | $ 3.600.000,00 | SUSALUD EPS | $ 144.000,00 | COLPENSIONES | $ 576.000,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 250.600,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 161.200,00 | $ 1.131.800,00 |
| 1077001256 | Andrea Karina Quintero Ortiz | Residente de Interventoria | 1.091.665.386 | 30 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | EPS SANITAS | $ 140.000,00 | PORVENIR | $ 560.000,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 243.600,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 140.000,00 | $ 1.083.600,00 |
| 1077653017 | Fredy Sebastian Toloza Pimiento | Especialista en estructuras | 1.098.739.051 | 30 | $ 1.600.000,00 | $ 1.600.000,00 | SALUD TOTAL | $ 64.000,00 | PORVENIR | $ 256.000,00 | POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 111.400,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 70.800,00 | $ 502.200,00 |
| 35636549 | Iban Gustavo Blanco Gonzales | Especialista hidraulico | 79.431.435 | 30 | $ 1.423.500,00 | $ 1.423.500,00 | EPS SANITAS | $ 178.000,00 | COLPENSIONES | $ 227.800,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 106.600,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 0,00 | $ 512.400,00 |
| 9497461045 | Tulia Elena Quintero Guerrero | Especialista en geotecnia | 63.398.589 | 30 | $ 1.700.000,00 | $ 1.700.000,00 | SALUD TOTAL | $ 212.500,00 | PORVENIR | $ 272.500,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 127.300,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 0,00 | $ 612.300,00 |
| 1078687636 | Edith Costanza Toloza Rojas | Especialista Ambiental - SST | 63.555.895 | 30 | $ 2.055.636,00 | $ 2.055.636,00 | EPS SANITAS | $ 82.300,00 | COLPENSIONES | $ 329.000,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 71.600,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 41.200,00 | $ 524.100,00 |
| 1077653019 | Paula Andrea Ayala Delgado | Profesional SISO | 1.098.752.363 | 30 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | SALUD TOTAL | $ 140.000,00 | COLFONDOS | $ 560.000,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 243.600,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 154.800,00 | $ 1.098.400,00 |
| 1078687726 | Karen Dayanna Diaz Ariza | Auxiliar residente de interventoria | 1.098.762.015 | 17 | $ 1.303.334,00 | $ 2.300.001,18 | EPS SANITAS | $ 52.200,00 | PORVENIR | $ 208.600,00 | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A | $ 90.800,00 | EXONERADO | EXONERADO | $ 65.900,00 | $ 417.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | **Total** | **$ 3.842.300,00** |

Nota: El Especialista hidráulico y la Especialista en geotécnia están afiliados como independientes y su vinculación con el consorcio es a través de planilla Y

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-01-20, 09:09:45 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1077653020

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

**PAGADO 19/01/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA | | |
| **Documento** | NI901982939 | **Dirección** | CR 10 #20 - 05 |
| **Tipo de Empresa** | CONTRATANTE | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA | **Identificación** | CC 63555895 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 63398589 | TÚLIA ELENA QUINTERO GUERRERO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.700.000 | $ 118.400 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 118.400 |
| CC 79431435 | IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (NIN-EP) NINGUNA EPS | $ 0 | $ 0 | 6,960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.100 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 0 | $ 3.123.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 217.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 217.500 | $ 800 | $ 218.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-01-20, 09:09:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1077653019

**Periodo Cotización:** diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

## PAGADO 19/01/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA | | |
| **Documento** | NI901982939 | **Dirección** | CR 10 #20 - 05 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA | **Identificación** | CC 63555895 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1098752363 | PAULA ANDREA AYALA DELGADO | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 3.500.000 | $ 560.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.500.000 | $ 140.000 | 6,960 | $ 3.500.000 | $ 243.600 | (CCF40) COMFENALCO SANTANDER | $ 3.869.444 | $ 154.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.098.400 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.500.000 | $ 3.869.444 | $ 560.000 | $ 140.000 | $ 243.600 | $ 154.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.098.400 | $ 4.200 | $ 1.102.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 20 de enero de 2026 09:19:19 AM

**Período del informe: 202512**

**Pagada** 16/01/2026

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSTRUANLE SAS | **Sucursal** | 005 P |
| **Documento** | NI900714233 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 EDF SURA |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación del Cotizante | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Período de Cot. | Período Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 1098762015 | DIAZ ARIZA KAREN DAYANNA | 1078687726 | 16/01/2026 | 202512 | 202601 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 230301 | EPS005 | 14-4 | CCF40 | $1.303.334 | $1.303.334 | $1.303.334 | $1.645.140 | $208.600 | $52.200 | $90.800 | $65.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $417.500 |
| CC 91275391 | ALVAREZ CARREÑO JORGE ELIECER | 1078687636 | 15/01/2026 | 202512 | 202601 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 25-14 | EPS010 | 14-4 | CCF40 | $3.600.000 | $3.600.000 | $3.600.000 | $4.030.000 | $576.000 | $144.000 | $250.600 | $161.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.131.800 |
| CC 63555895 | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | 1078687636 | 15/01/2026 | 202512 | 202601 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 25-14 | EPS005 | 14-4 | CCF40 | $1.027.818 | $1.027.818 | $1.027.818 | $1.027.818 | $164.500 | $41.200 | $0 | $41.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $246.900 |
| CC 63555895 | TOLOZA ROJAS EDITH COSTANZA | 1078687636 | 15/01/2026 | 202512 | 202601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 25-14 | EPS005 | 14-4 | CCF40 | $1.027.818 | $1.027.818 | $1.027.818 | $1.027.818 | $164.500 | $41.200 | $71.600 | $41.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $318.500 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

**Fecha de Creación del Informe:** martes, 20 de enero de 2026 09:21:43 AM

**Período del informe: 202512**

**Pagada** 15/01/2026

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COEDCO SAS | **Sucursal** | 001 GENERAL |
| **Documento** | NI901109221 | **Dirección** | CR 27 #36 - 14 OFICINA 309 |
| **Tipo de Empresa** | | **Teléfono** | 6844527 |
| **Tipo Persona** | | **Forma Presentación** | |
| **Ciudad** | BUCARAMANGA | **Departamento** | SANTANDER |
| **Representante Legal** | TOLOZA ROJAS EDITH CONSTANZA | **Identificación** | CC63555895 |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | Información del Pago | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Administradoras | | | | | | | | IBC | | | | Liquidación de Aportes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación del Cotizante | Apellidos y Nombres | Referencia pago (PIN) / Número planilla | Fecha de Pago | Período de Cot. | Período Serv. | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | AFP | EPS | ARP | CCF | IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aporte Pensión | Aporte Salud | Aporte Riesgos | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte Ministerio | TOTAL |
| CC 1098739051 | TOLOZA PIMIENTO FREDY SEBASTIAN | 1077653017 | 15/01/2026 | 202512 | 202601 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS002 | 14-4 | CCF40 | $1.600.000 | $1.600.000 | $1.600.000 | $1.768.889 | $256.000 | $64.000 | $111.400 | $70.800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $502.200 |
| CC 1091665386 | QUINTERO ORTIZ ANDREA KARINA | 1077653017 | 15/01/2026 | 202512 | 202601 | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 230301 | EPS005 | 14-4 | CCF40 | $3.500.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | $3.500.000 | $560.000 | $140.000 | $243.600 | $140.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.083.600 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 63398589 | | QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3168320523 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2097537580 | 9497461045 | I | 2026/01/23 | 2026/01/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $493,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 63398589 | QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS002 | 30 | $1,700,000 | $212,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,700,000 | $8,900 | 0 | $0 | $0 | No | $493,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,700,000 | $272,000 | | | $1,700,000 | $212,500 | | | $0 | $0 | | | $1,700,000 | $8,900 | | $0 | $0 | | $493,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 63398589 | | QUINTERO GUERRERO TULIA ELENA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Bucarica 4 Etapa Bloque 15-9B apto 347 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 3168320523 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2097537580 | 9497461045 | I | 2026/01/23 | 2026/01/20 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $493,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $272,000 | $0 | $0 | $272,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $272,000 | $0 | $0 | $272,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,900 | $0 | $0 | $8,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,900 | $0 | $0 | $8,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $212,500 | $0 | $0 | $212,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $212,500 | $0 | $0 | $212,500 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$493,400** | **$0** | **$0** | **$493,400** |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 79431435 | 0 | IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-1 | CRA 27 37 33 OFIC 804 | | 6804843 | | | IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-12 | 2025-12 | 35636549 | I | 2026-01-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 416.200 | 2.900 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 35636549 | 2026-01-09 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | | | | | |
| 1 | CC 79431435 | BLANCO GONZALEZ IBAN GUSTAVO | 1.423.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 178.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.423.500 | 7.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 413.300 | N | 0 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 79431435 | 0 | IBAN GUSTAVO BLANCO GONZALEZ | I | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-1 | CRA 27 37 33 OFIC 804 | | 6804843 | | | IBG.INGENIERIA@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-12 | 2025-12 | 35636549 | I | 2026-01-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 416.200 | 2.900 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 35636549 | 2026-01-09 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.423.500 | 1.423.500 | 1.423.500 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 227.800 | 0 | 1.600 | 0 | 229.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 227.800 | 0 | 1.600 | 0 | 229.400 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 178.000 | 0 | 1.200 | 0 | 179.200 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 178.000 | 0 | 1.200 | 0 | 179.200 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 7.500 | 0 | 100 | 0 | 7.600 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 7.500 | 0 | 100 | 0 | 7.600 |
| Gran Total | | | | | 413.300 | 0 | 2.900 | 0 | 416.200 |

## 5. INFORME DE GESTIÓN SOCIO- AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA



# CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210-16227-4
# INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No. 03

**PERÍODO:**
**01 DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025**

**OBJETO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
**GRUPO 3.** INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

**Presentado por:**

| | |
|---|---|
| **Edith Costanza Toloza Rojas**<br>Representante Legal<br>**CONSORCIO INTER PIEDECUESTA** | |

# TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ..... 3
2 OBJETIVOS ..... 4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA ..... 5
4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 5
5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 6
5.1 LOCALIZACIÓN ..... 6
5.2 ESTADO INICIAL DEL TALUD ..... 7
6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL ..... 9
6.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ..... 11
6.2 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. ..... 17
6.3 PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. ..... 20
6.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA ..... 22
6.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. ..... 24
6.6 PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE. 27
6.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN. ..... 41
6.8 PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS ..... 44
6.9 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL. ..... 47
7 CONCLUSIONES ..... 62
8 RECOMENDACIONES ..... 63

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

# 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades de seguimiento, control y verificación realizadas por profesional ambiental de la interventoría, en el marco del contrato suscrito con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. El contrato de interventoría No. 210-16227-4 que tiene por objeto "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**" desde el área ambiental, la labor de interventoría tiene como finalidad asegurar que el desarrollo de las actividades técnicas del contrato de obra 210-15352-6 se lleve a cabo en estricto cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, incorporando criterios de sostenibilidad, protección del entorno y manejo responsable de los recursos naturales. Asimismo, se busca prevenir, mitigar, corregir y, de ser necesario, compensar los impactos ambientales y sociales derivados de la ejecución del proyecto, garantizando condiciones adecuadas para el bienestar de la comunidad aledaña y la conservación del entorno urbano intervenido.

En atención a estos lineamientos, el contratista de obra presentó ante esta interventoría el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), el cual constituye el instrumento de planeación y gestión ambiental del proyecto. Este plan fue formulado conforme a los principios de prevención, mitigación, corrección y compensación, y se encuentra enmarcado dentro de lo estipulado por la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de 2009, el Decreto 1076 de 2015 y demás disposiciones reglamentarias aplicables a proyectos de obra civil con inminente impacto ambiental.
El consorcio interventor presenta el primer informe de seguimiento al cumplimiento ambiental por parte del Consorcio Mitigación Piedecuesta CMBD (para los frentes de obra habilitados: **BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA Y HALCÓN DE GRANADA**), correspondiente al cumplimiento del PASA del **01 DICIEMBRE 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025**, en el cual se realizó el seguimiento detallado a los nueve programas que integran el plan. En este se describen las actividades de gestión desarrolladas por el contratista de obra en materia de manejo de residuos sólidos, control de emisiones atmosféricas, manejo adecuado de materiales de construcción, protección del suelo, cuidado de los cuerpos de agua, conservación de la flora y fauna, instalación de señalización, manejo de campamentos y gestión social.
Este reporte evidencia el avance en la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas y el compromiso del contratista con el cumplimiento de los lineamientos técnicos, normativos y contractuales en materia de sostenibilidad y protección del entorno.

# 2 OBJETIVOS

## 1.1 OBJETIVO GENERAL

- Validar la implementación de las medidas de manejo ambiental y social establecidas para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", con el fin de prevenir, mitigar, corregir o compensar los posibles impactos sobre los recursos naturales y el medio ambiente, y garantizar una gestión social adecuada con la comunidad directamente influenciada por la ejecución de las obras.

## 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales contempladas en el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), con base en la normatividad ambiental vigente y las obligaciones contractuales del proyecto.

- Supervisar la implementación de los programas de manejo ambiental, asegurando que las acciones ejecutadas por el contratista estén orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos generados por las actividades de obra.

- Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones sociales, con énfasis en el relacionamiento comunitario, la participación ciudadana y la atención oportuna a inquietudes y requerimientos de la población del área de influencia directa.

- Evaluar la gestión del contratista frente a la protección de los recursos naturales, garantizando que se respeten las condiciones del entorno urbano intervenido y se promueva un desarrollo sostenible.

- Documentar las condiciones iniciales de los predios circunvecinos mediante actas de vecindad, y establecer una línea base que permita hacer seguimiento a posibles afectaciones durante el desarrollo de la obra.

- Acompañar y validar las actividades de socialización del proyecto, promoviendo la transparencia, la apropiación comunitaria y la prevención de conflictos sociales durante la ejecución del contrato.

## 3 CUADRO INFORMATIVO DEL CONTRATO DE OBRA

| **CONTRATO DE OBRA No.** | **210-15352-6** |
|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB |
| NIT. | 901.983.966 – 5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JULIÁN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ |
| VALOR | NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($9.651.664.101,92) |
| ANTICIPO | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION | 10 MESES |
| FECHA DE INICIO | 15 DE OCTUBRE DE 2025 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | SANTANDER, PIEDECUESTA:<br>- BARRIO HALCÓN DE GRANADA<br>- BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA |

## 4 CUADRO INFORMATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **210-16227-4** |
|---|---|
| OBJETO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DOFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.<br>GRUPO 3. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA |
| NIT. | 901.982.939 – 1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS |
| VALOR | SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($680.377.740,00) |
| ANTICIPO | N/A |
| PLAZO DE EJECUCION | 10 MESES |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 08 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 15 DE OCTUBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN | 14 DE AGOSTO DE 2026 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | SANTANDER, PIEDECUESTA:<br>- HALCÓN DE GRANADA<br>- BRISAS DE PRIMAVERA |

# 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 5.1 LOCALIZACIÓN


El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander, el cual integra el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) junto con los municipios de Girón y Floridablanca. Esta área constituye un nodo urbano estratégico para la región nororiental del país, caracterizado por un crecimiento acelerado, alta dinámica de expansión urbana y la presencia de zonas con pendientes pronunciadas que requieren intervenciones de estabilización y control geotécnico.

La cabecera municipal de Piedecuesta está georreferenciada en las coordenadas 6° 59’ 19” de latitud norte y 73° 03’ 01” de longitud oeste, ubicándose en el piedemonte de la cordillera Oriental, sector que presenta condiciones topográficas irregulares y suelos susceptibles a procesos de inestabilidad, especialmente durante temporadas de alta precipitación.


Los taludes objeto de intervención se encuentran localizados específicamente en los barrios Brisas de Primavera y Halcón de Granada, sectores residenciales situados en la zona suroriental del municipio. Estas áreas presentan taludes con antecedentes de movimientos en masa de tipo superficial y erosión acelerada, generados principalmente por la combinación de factores como pendientes elevadas, escorrentía no controlada, características del subsuelo y procesos constructivos previos que han modificado la morfología natural del terreno.

La estabilización de estos taludes es prioritaria para la protección de viviendas, infraestructura de servicios públicos y vías internas de los barrios, así como para garantizar la seguridad de la comunidad y mitigar riesgos asociados a deslizamientos.

En las Ilustraciones No. 01 y No. 02 se presenta la ubicación general y específica del proyecto dentro del casco urbano de Piedecuesta, permitiendo visualizar la relación del área intervenida con la trama urbana, los accesos viales, la delimitación de los barrios y los puntos críticos donde se concentran las obras de estabilización.

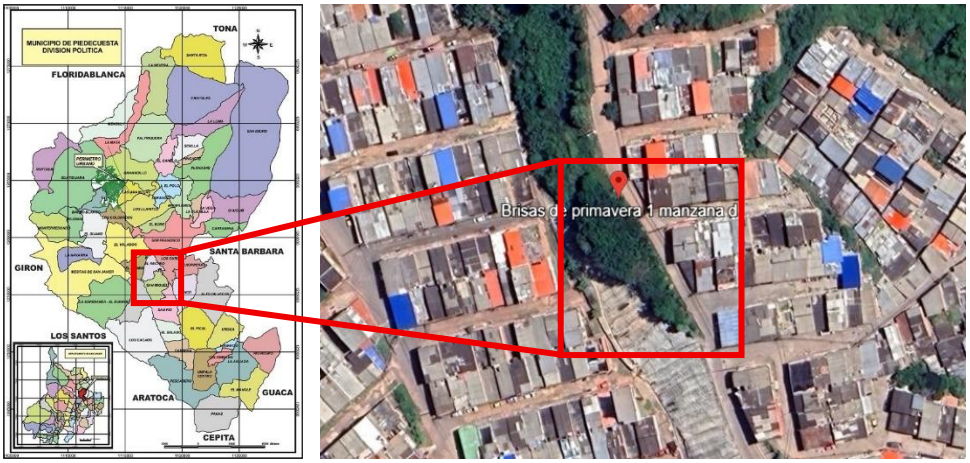


*Localización del proyecto - Brisas de primavera.*

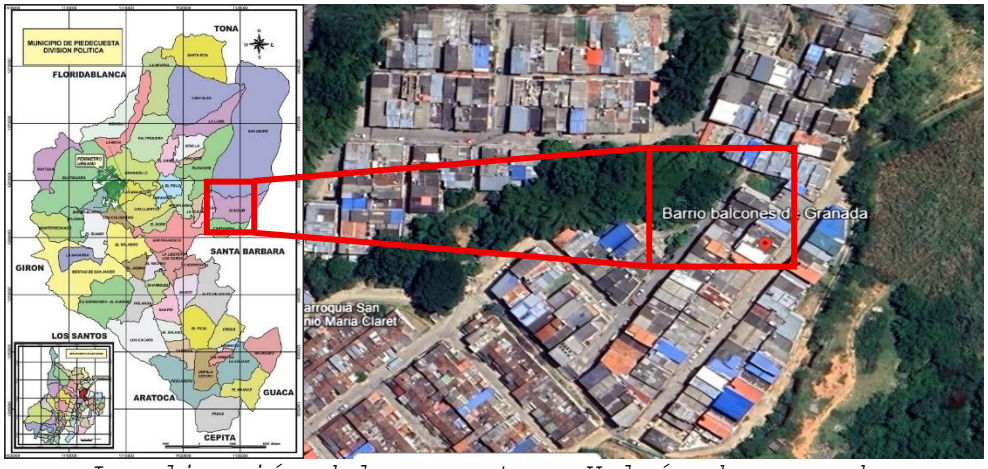


*Localización del proyecto – Halcón de granada.*

## 5.2 ESTADO INICIAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO

En las siguientes imágenes se puede observar el estado inicial de los taludes antes de ser intervenidos, los cuales presentaban características físicas y geomorfológicas que incrementaban su vulnerabilidad. Los sectores evidencian la presencia de cobertura vegetal dispersa, conformada principalmente por césped y arbustos aislados, que, si bien aportan cierta protección superficial, resultan insuficientes para garantizar la estabilidad del terreno dada la morfología existente.

Se identifica además una pendiente considerable, con laderas de inclinación pronunciada que favorecen el escurrimiento superficial no controlado y, en consecuencia, procesos de erosión y riesgo a deslizamiento. Estas condiciones generaban riesgo potencial para las viviendas y vías aledañas, especialmente durante eventos de lluvia de alta intensidad.

El registro fotográfico permite establecer el panorama preliminar de inestabilidad, evidenciando zonas con pérdida de material, exposición del suelo y ausencia de estructuras de protección o drenaje que mitigaran el avance del deterioro. Estas condiciones justificaron la priorización de las obras de estabilización implementadas por el proyecto.



Ilustración 1. Estado inicial del frente de obra en Brisas de primavera



Ilustración 2. Estado inicial del frente de obra en Halcón de granada

## 6 PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL

El contrato correspondiente a la **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** no está sujeto al régimen de Licencia Ambiental, de acuerdo con la normatividad vigente. No obstante, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y ambientales, el contratista de obra presentó el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), en el cual se definieron las acciones de manejo distribuidas en **nueve programas.** Dichos programas contemplan actividades orientadas al control, prevención y mitigación de los impactos ambientales y sociales asociados a la ejecución del proyecto.

Durante el segundo periodo de ejecución del contrato de obra, no se ha gestionado trámites o permisos ante la autoridad ambiental. Esta situación obedece al hecho de que las actividades desarrolladas han permanecido dentro del alcance técnico y territorial previamente definido, sin generar modificaciones que impliquen una mayor presión sobre los recursos naturales o que constituyan factores de riesgo ambiental adicional.

El contratista de obra, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales y como parte del compromiso con la sostenibilidad del proyecto, implementó de manera efectiva el Plan de Acción Socio Ambiental, el cual fue estructurado con base en nueve programas de manejo ambiental y social. Cada uno de estos programas contiene un conjunto de actividades específicas orientadas a la prevención, control y mitigación de impactos negativos derivados de las actividades constructivas, así como a la promoción de relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia directa.

Dichos programas abarcan aspectos clave como el manejo de residuos, el control de emisiones, la protección del recurso hídrico, la seguridad y salud en el trabajo, la gestión social y la atención a las comunidades, entre otros. Esta planificación ha permitido que las actividades de obra se desarrollen bajo un enfoque de responsabilidad ambiental y social, minimizando los posibles efectos adversos y asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas y éticas que rigen el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Los programas ambientales del PASA se relacionan a continuación:

1. Programa para el manejo de residuos.
2. Programa control de emisiones atmosféricas.
3. Programa uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
4. Programa protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía
5. Programa prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.
6. Programa para el manejo de la vegetación la fauna y el paisaje.
7. Programa de señalización.
8. Programa de adecuación de campamentos.
9. Programa de gestión social.

A continuación, se relacionan las actividades que durante el periodo reportado se realizaron en cada frente de obra:

Frente de obra Halcón de Granada:

- Replanteo, control y medición de la obra
- Desmonte y limpieza
- Perfilado a mano descolgado de talud
- Retiro de basuras y escombros
- Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad
- Excavación con acarreo libre en roca a cualquier profundidad
- Sobre acarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00m

Frente de obra Brisas de Primavera:

- Replanteo topográfico
- Desmonte y limpieza
- Retiro de basuras del talud y acopio de escombros para su posterior retiro

La implementación de metodologías técnicas adecuadas y alineadas con las buenas prácticas de ingeniería ha sido fundamental para garantizar la calidad en la ejecución del proyecto de obra pública en desarrollo. Estas metodologías permitieron establecer una sinergia efectiva entre los componentes civiles, ambientales, sociales y laborales, incluyendo aspectos clave como la seguridad industrial y la salud ocupacional, lo cual ha favorecido una intervención integral, eficiente y sostenible.

Esta articulación intersectorial se reflejó en el control riguroso de los impactos negativos potenciales y, al mismo tiempo, en la

potenciación de los beneficios sociales y ambientales que conlleva la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".** El enfoque preventivo y de mitigación adoptado permitió minimizar las afectaciones sobre el entorno físico, biótico y social, asegurando que las intervenciones cumplieran no solo con los requisitos técnicos, sino también con los principios de sostenibilidad y corresponsabilidad ambiental.

La obra contempló medidas específicas que integraron criterios de manejo ambiental proactivo, ajustadas al contexto territorial y a los lineamientos definidos en el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA). En este marco, se ejecutaron acciones concretas en materia de control de emisiones, manejo adecuado de residuos, protección del recurso hídrico, conservación del suelo, manejo de fauna y flora, gestión del riesgo, entre otros.

Por lo tanto, a continuación, se describen detalladamente los aspectos relacionados con el manejo y protección ambiental que fueron implementados durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las directrices técnicas y operativas de su respectivo programa ambiental, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de sostenibilidad y responsabilidad socioambiental:

## 6.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante el desarrollo de las actividades contractuales correspondientes a la **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADO POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** se evidenció la generación de residuos de diferentes tipos, producto de los procesos constructivos, logísticos y operativos. Esta situación permitió implementar metodologías y estrategias por parte del contratista, orientadas al manejo integral de residuos sólidos, abarcando su correcta clasificación, almacenamiento temporal, transporte interno y disposición final, conforme a la normativa ambiental vigente (Resolución 2184 de 2019 y demás aplicables).

Estas acciones estuvieron precedidas y soportadas por actividades de educación y sensibilización ambiental dirigidas al personal

operativo, administrativo y técnico de la obra, facilitadas por profesionales del equipo ambiental del contratista e interventoría. Estas jornadas incluyeron capacitaciones teóricas y prácticas; adicionalmente, se realizaron jornadas periódicas de orden, aseo y limpieza en las zonas de trabajo, almacenamiento y circulación, lo que contribuyó significativamente al control y minimización del riesgo ambiental.

Previo a la implementación de estas acciones, se desarrollaron actividades de educación y sensibilización ambiental, lideradas por los profesionales ambientales del consorcio y la interventoría, enfocadas en la promoción de buenas prácticas.

Estas incluyeron:

- Jornadas de capacitación y recomendaciones técnicas sobre el manejo adecuado de residuos.
- Campañas de orden, aseo y limpieza en el frente de obra y zonas comunes.
- Clasificación de residuos según su origen y peligrosidad, utilizando el código de colores establecido por la normatividad nacional.
- Almacenamiento temporal en puntos ecológicos debidamente señalizados, con posterior entrega a gestores autorizados para su disposición final.

El adecuado manejo de los residuos sólidos generados durante la ejecución del proyecto permitió:

- La reducción del impacto visual negativo asociado a la acumulación inadecuada de materiales.
- La prevención de la contaminación de zonas verdes, cuerpos hídricos y áreas de trabajo.
- La disminución de riesgos asociados a accidentes laborales, que pudieran derivarse del almacenamiento o disposición inadecuada de residuos.
- El cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas en materia ambiental.

El adecuado manejo de los residuos generados durante la ejecución del proyecto permitió no solo cumplir con las obligaciones ambientales contractuales, sino que también generó beneficios directos como:

- Reducción del impacto visual de la obra.

Prevención de la contaminación de zonas verdes y cuerpos de agua cercanos.
Disminución del riesgo de ocurrencia de accidentes laborales, especialmente por residuos mal ubicados.
Fortalecimiento de la cultura ambiental en el personal.
Optimización del uso de materiales reutilizables y reciclables.

La profesional ambiental del contratista de obra y de la interventoría realizaron seguimiento constante y emitieron recomendaciones periódicas, insistiendo ante el personal vinculado al proyecto sobre la importancia de aplicar los protocolos de clasificación, segregación y manejo de residuos sólidos en el área de trabajo y zonas aledañas, lo que garantizó el cumplimiento de las metas ambientales trazadas para la fase de ejecución de la obra.

Durante las visitas de seguimiento realizadas por la interventoría, se evidenció que las profesionales ambientales del consorcio insistieron de manera permanente con el personal operativo y técnico del proyecto sobre la importancia de clasificar y disponer adecuadamente los residuos sólidos, tanto en el área de trabajo como en zonas aledañas, reforzando así la cultura de responsabilidad ambiental en el proyecto.

Clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos:

Para la disposición temporal de los residuos sólidos generados en el proyecto, la interventoría realizó seguimiento y verificación periódica a las condiciones establecidas por el contratista de obra en el frente de trabajo. En cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes y como parte de la estrategia de manejo ambiental en sitio, se constató que el contratista dispuso de un punto ecológico debidamente identificado y funcional, conforme a lo estipulado en el Artículo 4° de la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, la cual establece el código de colores para la separación en la fuente.

Dicho punto ecológico permitió la clasificación inicial de los residuos sólidos de acuerdo con las siguientes categorías:

∇ Verde – Residuos Orgánicos Aprovechables: El color verde está destinado a los residuos orgánicos aprovechables, es decir,

aquellos que pueden transformarse en compost, biogás u otros productos útiles. En esta categoría se incluyen restos de alimentos como cáscaras, sobras y semillas, residuos de jardinería como hojas, ramas y césped, y desechos agrícolas. No deben depositarse en este contenedor residuos contaminados con químicos o grasas industriales, restos de animales muertos o excrementos no autorizados para compostaje. La correcta disposición de estos residuos contribuye a disminuir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y a generar productos útiles para el suelo y la agricultura

- Negro – Residuos No Aprovechables: Aquellos que no pueden ser reutilizados o reciclados por su composición o por estar contaminados. En este grupo se encuentran papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, servilletas usadas, empaques sucios, papeles metalizados y envolturas plásticas con residuos. También incluye la basura generada por el barrido o limpieza de superficies. Separar adecuadamente estos residuos evita que contaminen materiales que sí pueden ser reciclados.

- Blanco – Residuos Aprovechables (Reciclables): Los residuos aprovechables o reciclables que estén limpios y secos, permitiendo que puedan reincorporarse en cadenas de producción. En este grupo se incluyen plásticos como botellas y bolsas limpias, metales como latas de alimentos y bebidas, vidrio como botellas y frascos sin restos orgánicos, papel y cartón limpios, así como envases multicapa como cajas de leche y jugos. Para optimizar su reciclaje, se recomienda lavar y secar los envases y aplastar botellas o cajas para ahorrar espacio. Este proceso apoya la economía circular y reduce el consumo de materias primas vírgenes.

- Rojo – Residuos Peligrosos: Aquellos que, debido a sus propiedades intrínsecas —como ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos o inflamables— pueden representar riesgos significativos para la salud humana o el medio ambiente. Estos residuos pueden presentarse en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, y siempre deben manejarse por entidades que cuenten con autorización ambiental.

La disposición de este sistema de clasificación facilitó el cumplimiento del principio de separación en la fuente, el cual es fundamental para garantizar un manejo eficiente y seguro de los

residuos durante la ejecución del proyecto. Asimismo, esta organización permitió al contratista optimizar la recolección selectiva, reducir los costos de disposición final, y mejorar la trazabilidad de los residuos generados.

Disposición final de residuos generados en los frentes de obra:

Durante la ejecución de las actividades técnicas correspondientes al contrato de obra, el contratista implementó acciones diferenciadas para el manejo y disposición final de residuos, de acuerdo con su tipo, características y peligrosidad, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, especialmente lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 y el Decreto 1076 de 2015.

A continuación, se detallan los tipos de residuos generados y su correspondiente disposición final:

- Residuos no aprovechables y residuos orgánicos aprovechables: Durante el periodo evaluado, se reportó un acopio temporal de 9.0 kg los cuales fueron acopiados de manera adecuada según su clasificación; los cuales fueron almacenados temporalmente en el punto ecológico dispuesto en el campamento, y entregados a la empresa gestora Veolia. Según las rutas de recolección a su vez es la encargada del transporte hacia el Relleno Sanitario El Carrasco, sitio autorizado por la autoridad ambiental competente.

- Residuos aprovechables: Durante el periodo evaluado, se reportó un acopio temporal de 2.0 kg de residuos reciclables como plásticos PET, vidrios, cartón y chatarra.

  Una vez se cuente con una mayor cantidad y/o volumen de este tipo de residuos, se realizará entrega a gestor autorizado por la entidad ambiental para su aprovechamiento.

- Residuos peligrosos (RESPEL): Toda vez se genere residuos peligrosos, se acopian con el fin de garantizar su correcto manejo, acopio y disposición final mediante gestor autorizado.

- Residuos de construcción y demolición- RCD y material sobrante no aprovechable: Durante el periodo se realizó manejo de este tipo de residuos, se realizó traslado y disposición final de RCD hacia la escombrera El Cairo el cual es operado por la empresa Inversiones Notables INVERNOTA SAS con NIT 901.178.054-0 quién

cuenta con concepto de viabilidad ambiental aprobada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB.

∇ Material sobrante: Durante el periodo se realizó manejo de este tipo de residuos, se realizó traslado y disposición final de material sobrante hacia el Relleno Sanitario El Carrasco el cual es operado por el Consorcio Disposición Final; el cual es aprovechado en actividades operativas de cobertura diaria.

A continuación, se relaciona los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato de obra:

| **RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS** | | |
|---|---|---|
| **PERIODO** | **R.S. NO APROVECHABLES** RELLENO SANITARIO EL CARRASCO | **R.S. APROVECHABLES** ACOPIO TEMPORAL EN OBRA |
| 15 octubre 2025 a 31 octubre 2025 | 2.4 | 0.7 |
| 01 Noviembre 2025 a 30 Noviembre 2025 | 4.7 | 1.0 |
| 01 Diciembre 2025 a 31 Diciembre 2025 | 9.0 | 2.0 |
| Total | 8.0 kg | 3.7 kg |

| **RCD Y MATERIAL SOBRANTE DISPUESTOS** | | |
|---|---|---|
| **PERIODO** | **RCD ($m^3$)** EL CAIRO | **MATERIAL SOBRANTE ($m^3$)** RELLENO SANITARIO EL CARRASCO |
| 15 octubre 2025 a 31 octubre 2025 | 0 | 0 |
| 01 Noviembre 2025 a 30 Noviembre 2025 | 0 | 3.297 |
| 01 Diciembre 2025 a 31 Diciembre 2025 | 1.540 | 0 |
| TOTAL | 1.540 $m^3$ | 3.297 $m^3$ |

En el periodo relacionado se realizó capacitación a los trabajadores del frente de obra en el tema "Política Ambiental y Política de Orden y Aseo"



Punto ecológico



Retiro de material de disposición







Retiro de material de disposición

**Indicadores ambientales**

- (Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo) X 100 = %

  ( 9.0 / 9.0 ) * 100 = 100%

- (Volumen de residuos peligrosos entregados a empresa autorizada / volumen de residuos peligrosos generados en el periodo) X 100 = %

  No aplica

- (Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo) X 100= %

  No aplica

## 6.2 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Este programa consiste en la implementación de un conjunto de medidas que se requerían para controlar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material particulado, al igual que la generación de ruido durante la ejecución del contrato.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas según lo establecido en el Plan de acción socio ambiental:

Durante el desarrollo de las actividades constructivas, se realizó la instalación de polisombra verde como medida de control ambiental y mitigación de impactos atmosféricos. Esta barrera física actúa como un mecanismo de contención de partículas en suspensión, reduciendo significativamente la dispersión de material particulado (PM10 y PM2.5) hacia el entorno inmediato y las zonas residenciales aledañas.

Se controlaron las actividades generadoras de polvo mediante la dispersión de agua en las áreas de trabajo toda vez que fue necesario.

Se realizó verificación del mantenimiento y seguimiento del estado de la maquinaria acopiada y equipos utilizados garantizando las condiciones óptimas de funcionamiento.

Las actividades que generaron ruido producto de la utilización de equipos menores como taladro, pulidora y/o tronzadora para actividades de obra, se llevaron a cabo en horarios desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm con la finalidad de no afectar las actividades propias de la población aledaña.

Se prohibieron las quemas a cielo abierto de cualquier elemento que emita contaminantes tóxicos al aire. No se evidenció quemas en el frente de obra o áreas circunvecinas.

Durante la ejecución de las obras de estabilización de talud se realizó traslado de materiales, equipos y herramientas del cual se hace seguimiento a los vehículos de proveedores que circulan por las vías a una velocidad de 20 Km/h para evitar la emisión de material particulado a la atmósfera, así mismo, se restringió el uso en exceso de bocinas, cornetas, pitos y demás elementos generadores de ruido, se verificó que contaran con alarma de reversa.

Se realizó verificación de los documentos de los vehículos que fueron utilizados para actividades propias de la obra, realizando su respectiva revisión del SOAT y RTM.

A continuación, se relaciona los vehículos tipo volqueta utilizados durante la ejecución del contrato de obra:

| VEHÍCULOS TIPO VOLQUETAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **15 octubre 2025 a 31 octubre 2025** | | | | |
| **PLACA** | **SOAT** | **VIGENCIA** | **RTM** | **VIGENCIA** |
| NA | NA | NA | NA | NA |
| **01 noviembre 2025 a 30 noviembre 2025** | | | | |
| **PLACA** | **SOAT** | **VIGENCIA** | **RTM** | **VIGENCIA** |
| WFD 114 | 9310013958602 | 31/05/2026 | 183883996 | 12/09/2026 |
| TTW 843 | 4308007289163000 | 31/10/2026 | 177552748 | 30/11/2025 |
| **01 diciembre 2025 a 31 diciembre 2025** | | | | |
| **PLACA** | **SOAT** | **VIGENCIA** | **RTM** | **VIGENCIA** |
| WFD 114 | 9310013958602 | 31/05/2026 | 183883996 | 12/09/2026 |
| TTW 843 | 4308007289163000 | 31/10/2026 | 185644110 | 29/11/2025 |



Lona sintética para control de dispersión de MP



Carpado de material acopiado en obra

Brisas de primavera





Lona sintética para control de dispersión de MP

Halcón de granada

**Indicadores ambientales**

- ( Acopios autorizados / Número total de acopios) x 100= %
  ( 2 / 2 ) * 100 = 100%

- (Vehículos con certificados técnico mecánico / Vehículos en obra) x 100 = %
  ( 2 / 2 ) * 100 = 100%

### 6.3 PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Este programa determinó el avance y cumplimiento de las medidas necesarias para controlar afectaciones ambientales ocasionados por el manejo de materiales de construcción, su transporte y almacenamiento en el frente de obra.

Los materiales adquiridos por el contratista de obra provienen de fuentes legales, cuentan con sus permisos ambientales y mineros. El Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB realizó adquisición de materiales con la empresa AGREMAX S.A.S. como proveedor autorizado para distribución y comercialización de materiales.

Se contó con campamento para almacenamiento temporal de materiales, localizada en los sitios de trabajo y en zona donde no interfirieron con los componentes bióticos del área de influencia directa.

En la parte interna del almacén se almacenaron los bultos de cemento sobre estibas de madera y se cubrieron para conservar su calidad; los materiales prefabricados se almacenaron a alturas no superiores a 1.5 mts debidamente demarcados y señalizados siendo de fácil accesibilidad.

Los demás materiales se almacenaron en el sitio de obra en zonas autorizadas y no en zonas verdes, peatonales o vehiculares en el área del proyecto.

Se optimizó el uso de materiales teniendo en cuenta su almacenamiento para evitar pérdidas de cantidad y calidad. Los profesionales del área técnica y ambiental socializan recomendaciones de uso con los trabajadores siendo estos los principales actores del uso de materiales.

Se contó con plástico negro para el posterior carpado de materiales a acopiar en obra con el fin de protegerlos de la erosión causada

por agua, aire y sol; se evitar así su desperdicio, conservando su cantidad y calidad y se evitando que se humedezcan.

Los lugares de acopio de materiales se señalizaron con el fin de informar las áreas establecidas para dicha actividad; las recomendaciones de almacenamiento se siniestraron por parte del personal ambiental encargado.

Toda vez se manipuló concreto, se verificó que el personal del contratista de obra usará todos los elementos adecuados para la manipulación de concreto, guantes de caucho, carnaza, gafas y casco; evitando accidentes por estas actividades. La realización de la mezcla se realizó protegiendo el suelo mediante material impermeable (plástico), evitando contaminación y daños.

La mezcla húmeda preparada en baja cantidad se realizó en la carretilla para evitar alteraciones naturales del suelo.




Materiales de construcción y prefabricados carpados

A continuación, se relaciona materiales que durante la ejecución del proyecto se acopiaron y se utilizaron:

| CONTROL DE MATERIAL | |
|---|---|
| **15 Octubre 2025 a 31 Octubre 2025** | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** |
| Cemento (bulto) | 20 |
| Arena ($m^3$) | 5 |
| Triturado ($m^3$) | 3 |
| **01 noviembre 2025 a 30 noviembre 2025** | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** |
| Cemento (bulto) | 10 |
| Arena ($m^3$) | 2 |
| Triturado ($m^3$) | 2 |
| **01 diciembre 2025 a 31 diciembre 2025** | |
| **MATERIAL** | **CANTIDAD** |
| Cemento (bulto) | 10 |
| Arena ($m^3$) | 3 |

**Indicadores ambientales**

- (Número de acciones realizadas en obra para el manejo de los materiales de construcción / Número de acciones establecidas en el PASA) *100 = %

No aplica

- (Cantidad de material utilizado en obra / Cantidad total de material de fuentes autorizadas) *100 = %

Cemento (bulto) : ( 10 / 10 ) * 100 = 100 %

Arena ($m^3$) : ( 3 / 3 ) * 100 = 100 %

## 6.4 PROGRAMA PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA

Como parte de las estrategias de manejo ambiental durante la ejecución de las obras hidráulicas y sanitarias, el contratista implementó un conjunto de medidas orientadas a prevenir procesos erosivos, garantizar la estabilidad del terreno y evitar afectaciones al suelo y cuerpos hídricos dentro del área de influencia directa del proyecto.

∇ Manejo preventivo del concreto y protección del suelo:

La preparación de mezclas de concreto se realizó sobre superficies impermeables, evitando el contacto directo con la capa superficial del suelo y la posible infiltración de componentes contaminantes.

No se evidenciaron derrames de concreto ni lechadas, lo cual demuestra un manejo controlado y técnico de los materiales, previniendo alteraciones físico-químicas del suelo y cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en materia de protección de recursos naturales.

∇ Control del arrastre de sedimentos y disposición responsable:

Para evitar procesos erosivos y el transporte de sedimentos fuera del área de trabajo, se implementó la limpieza en las zonas aledañas al frente de obra.

∇ Prevención de contaminación química y gestión de riesgos:


Durante la ejecución del proyecto no se presentaron derrames de sustancias químicas ni combustibles en los frentes de obra. No obstante, se mantuvo una estrategia preventiva mediante:
Disponibilidad permanente de kit de atención de derrames y material absorbente en el área del campamento, con acceso inmediato en caso de emergencia.

∇ Selección estratégica del campamento de obra:

El área destinada para el campamento y el almacén fue seleccionada estratégicamente para requerir mínima intervención del suelo, evitando remociones innecesarias y conservando la cobertura vegetal en la medida de lo posible.

∇ Manejo de combustibles en sitio:

En los frentes de obra se emplearon canecas de 55 galones para el almacenamiento de combustible, las cuales fueron dispuestas en una zona confinada, impermeabilizada y con contención secundaria, diseñada para evitar infiltraciones o escurrimientos al suelo.
Hasta la fecha no se ha reportado ningún derrame, lo que evidencia la eficacia del sistema de prevención implementado, en línea con los estándares de manejo seguro de sustancias peligrosas establecidos en la Resolución 0316 de 2023 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

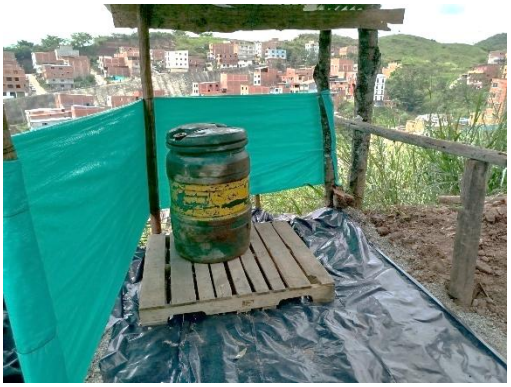



Almacenamiento de combustible



Descapote y desmonte del talud
Brisas de primavera



Descapote y desmonte del talud
Halcón de granada

**Indicador ambiental**

- ( N. de acciones realizadas / N. de acciones establecidas en el PASA) * 100 = %

( 5 / 5 ) * 100 = 100 %

## 6.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante la ejecución del proyecto, se desarrollaron acciones específicas orientadas a evitar afectaciones a los recursos hídricos superficiales, redes de alcantarillado y sistemas de drenaje urbano, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y reduciendo el riesgo de contaminación hídrica.

∇ Verificación de elementos potencialmente vulnerables:

La interventoría técnica realizó seguimiento a las medidas implementadas para evitar que los residuos, sedimentos o materiales

de construcción generaran afectaciones sobre cuerpos de agua o redes de alcantarillado presentes en la zona de influencia directa del frente de obra.

Aunque no se identificaron cuerpos de agua superficiales cercanos al sitio de intervención, se establecieron protocolos preventivos orientados al control del arrastre de materiales como cemento, limo y arcillas, los cuales, en caso de contacto con la red de alcantarillado, pueden generar taponamientos o alteraciones en su capacidad hidráulica.

∇ Prohibición de vertimientos y buenas prácticas operativas:

Durante el periodo evaluado, la interventoría evidenció que no se realizaron vertimientos de residuos líquidos, aguas contaminadas o materiales de construcción sobre las vías públicas o áreas aledañas al frente de obra.
Asimismo, se verificó que no se ejecutaron actividades de lavado de maquinaria, equipos o herramientas en el sitio de obra, lo que contribuyó a reducir el riesgo de escorrentía contaminada hacia el sistema de alcantarillado o drenaje urbano, en línea con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 sobre vertimientos puntuales.

∇ Disposición sanitaria del personal vinculado:

Para atender adecuadamente las necesidades fisiológicas del personal de obra y evitar prácticas inadecuadas que puedan comprometer la salud pública y la calidad del agua, el contratista dispuso de un baño móvil en la zona del campamento de obra a quién la realizan mantenimientos periódicos del cual la presente interventoría es garante.

La interventoría realizó seguimientos periódicos al estado de limpieza, desinfección y manejo de residuos.

∇ Protección de la red de alcantarillado

Los elementos de la red de alcantarillado perimetral fueron identificados, delimitados y protegidos adecuadamente, especialmente durante las actividades que pudieran generar aporte de sedimentos.

Para ello, se empleó geotextil como barrera física, el cual evitó el ingreso de partículas sólidas y materiales finos al sistema, preservando su funcionalidad.

∇ Limpieza de áreas con control ambiental

En las zonas donde se presentaba material suelto o residuos de obra, se ejecutaron labores de limpieza previa humectación del área, con el objetivo de evitar el levantamiento de polvo y el transporte de residuos mediante agua a presión, práctica que fue prohibida y no evidenciada durante las visitas de seguimiento.

∇ Almacenamiento estratégico de materiales

Los materiales de construcción fueron almacenados en áreas estratégicamente alejadas de las redes de alcantarillado y de las zonas de escorrentía superficial, lo que redujo el riesgo de contaminación por dispersión o arrastre durante lluvias o actividades de limpieza.

∇ Ausencia de incidentes por contaminación líquida

No se registraron derrames o fugas de combustibles, aceites, mezclas húmedas u otros residuos líquidos durante el desarrollo del proyecto. Esta ausencia de incidentes evidencia la adecuada implementación de los protocolos de manejo de sustancias peligrosas y la eficacia de las medidas preventivas establecidas.



Brisas de primavera




Halcón de granada

Unidades sanitarias móviles en cada frente de trabajo

**Indicadores ambientales**

- ( N. de unidades sanitarias utilizadas / N. de unidades sanitarias requeridas ) *100 =%
  ( 2 / 2 ) * 100 = 100 %

## 6.6 PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE.

Durante el periodo reportado, no se gestionaron trámites específicos ante la autoridad ambiental competente para el manejo del recurso flora, dado que las actividades del proyecto no contemplaron intervenciones directas sobre cobertura vegetal ni tala o traslado de individuos arbóreos, de acuerdo con el alcance del diseño técnico y la localización del proyecto dentro del área urbana intervenida.

∇ Actividades preventivas y controladas en áreas intervenidas:

El contratista limitó las actividades técnicas y constructivas únicamente a las zonas delimitadas en los planos y diseños aprobados, lo que redujo la presión sobre los ecosistemas adyacentes y evitó intervenciones innecesarias sobre áreas verdes urbanas o remanentes de vegetación.
Esta medida también permitió cumplir con el principio de mínima intervención ambiental promovido por la Ley 99 de 1993.

∇ Prohibición de prácticas contaminantes o agresivas con el entorno natural:

Durante la ejecución de la obra, se garantizó la no utilización de herbicidas ni sustancias químicas para el control de vegetación, así como la prohibición absoluta de quemas a cielo abierto para realizar desmontes u otras actividades.
Estas acciones previenen la contaminación del aire, alteración del suelo y daños a la biota local, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y la Resolución 1447 de 2018 (sobre quemas y control de contaminantes atmosféricos).

∇ Protección de árboles y áreas verdes existentes:

No se realizó disposición de residuos de obra (escombros, basuras, materiales sobrantes) en los perímetros de árboles, arbustos o zonas verdes colindantes, preservando la integridad de las raíces, la capa vegetal y los servicios ecosistémicos que estas brindan.

Asimismo, no se amarraron ni se instalaron elementos (cables, alambres, sogas) sobre árboles existentes, evitando afectaciones mecánicas o estructurales en su crecimiento.

- ∇ Control del tránsito de maquinaria y equipos:

Se garantizó que únicamente circularan y permanecieran en el frente de obra los equipos estrictamente necesarios para las actividades en curso, evitando impactos por compactación del suelo en áreas sensibles o no autorizadas.
Este control operativo permitió reducir riesgos sobre fauna urbana o vegetación espontánea presente en los bordes del área de intervención.

- ∇ Prohibición de actividades que afecten la fauna silvestre o urbana:

Como medida de bioseguridad y protección de fauna, se implementó la prohibición del porte o uso de armas de fuego, trampas o dispositivos para cacería o ahuyentamiento de animales silvestres o urbanos. Aunque no se reportaron encuentros con fauna significativa, estas medidas se establecieron como acciones preventivas obligatorias conforme al principio de precaución ambiental y la Ley 1774 de 2016 (contra el maltrato animal).

- ∇ Trámite de Permisos Ambientales – Aprovechamiento Forestal

En el marco del cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos en la legislación colombiana vigente, y conforme a las obligaciones contractuales del proyecto, el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB ha desarrollado acciones específicas orientadas al manejo adecuado del componente flora en las zonas de intervención directa del contrato de obra.

Durante la ejecución del proyecto, se identificó la necesidad de realizar actividades de aprovechamiento forestal, motivadas por la presencia de individuos arbóreos en las áreas objeto de intervención. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- **INVENTARIO FORESTAL, PLAN DE APROVECHAMIENTO, COMPENSACIÓN FORESTAL Y PLAN DE MANEJO DE FLORA EPÍFITA VASCULAR Y NO VASCULAR**

**Frentes de obra: Barrio Halcón de Granada y Brisas de primavera**

El contratista de obra, con el apoyo del ingeniero forestal, especialista en geotécnia ambiental OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA y la profesional en biología, especialista en gestión ambiental LISNEY ANDREA VILLAMIZAR PEÑA, adelantó dos inventarios forestales con el propósito de caracterizar técnicamente los individuos arbóreos presentes y soportar los trámites ambientales necesarios.

| **INVENTARIO FORESTAL** | | |
|---|---|---|
| **DESCRICIÓN** | **HALCÓN DE GRANADA** | **BRISAS DE PRIMAVERA** |
| Fecha de elaboración | 27 septiembre 2025 | 20 octubre 2025 |
| Profesional | OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA<br>Ingeniero forestal<br>Esp. geotécnia ambiental<br>T.P 68266-370067 STD<br><br>LISNEY ANDREA VILLAMIZAR PEÑA<br>Profesional en biología Esp. gestión ambiental<br>T.P. 1098661752 | OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA<br>Ingeniero forestal<br>Esp. geotécnia ambiental<br>T.P 68266-370067 STD |
| Total árboles | Del 01 al 18.<br>***18 árboles*** | Del 61 al 76 y 78 al 93, el 95 y el 97.<br>***34 árboles*** |

- **Metodología aplicada:** Se realizaron bajo criterios técnicos establecidos por la normatividad ambiental nacional y categorizados según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – (CITES, 2022), la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – (IUCN, 2022), la lista de especies amenazadas en el territorio nacional, de la resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 (MINAMBIENTE, 2017) y la resolución CDMB 000759 del 14 de septiembre del 2016 y los lineamientos técnicos de las Autoridades Ambientales Regionales. Las actividades incluyeron:

  – Identificación taxonómica de las especies presentes.
  – Medición de variables dasométricas (Diámetro a la Altura del Pecho – DAP, altura comercial, altura total, estado fitosanitario).

- Cálculo de áreas basales, volúmenes, biomasa, carbono capturado estimada a partir de ecuaciones alométricas validadas.
- Registro georreferenciado de los individuos mediante coordenadas UTM y descripción de su localización.

A continuación, se relacionan datos del inventario forestal realizados a la fecha:

Información extraída de los documentos ***"INVENTARIO FORESTAL, PLAN DE APROVECHAMIENTO, COMPENSACIÓN FORESTAL Y PLAN DE MANEJO DE FLORA EPÍFITA VASCULAR Y NO VASCULAR"*** aplica uno para cada frente de obra (Halcón de granada y Brisas de Primavera).

Ubicación de las especies inventariadas:




Ubicación de árboles – Frente de obra Halcón de granada

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

**Tabla 3.Inventario Forestal**

| Consecut | N° Ind. Pred | NOMBRE COMUN | ESPECIE | C.A.P. Tot (m) | D.A.P. (m) | ALTURA COMERCIAL (m) | ALTURA TOTAL (m) | AREA BASAL | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN FUSTE | VOLUMEN DE COPA | VOLUMEN TOTAL | BIOMASA (Kg) | CARBONO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Resbalamicos | *Bursera simaruba* | 0,39 | 0,12 | 3 | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 23,97 | 10,78 |
| 2 | 2 | Guayacan | *Tabebuia rosea* | 0,89 | 0,28 | 3 | 8 | 0,06 | 0,11 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 166,41 | 74,88 |
| 3 | 3 | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,72 | 0,23 | 3 | 8 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 108,91 | 49,01 |
| 4 | 4 | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,85 | 0,27 | 3 | 7 | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 0,02 | 0,27 | 132,81 | 59,77 |
| 5 | 4A | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,70 | 0,22 | 3 | 7 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 90,07 | 40,53 |
| 6 | 5 | Guanabano | *Tabebuia rosea* | 0,52 | 0,17 | 2,5 | 6 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 42,61 | 19,17 |
| 7 | 6 | Aguacate | *Persea americana* | 0,40 | 0,13 | 3 | 7 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 29,41 | 13,24 |
| 8 | 7 | Aguacate | *Persea americana* | 0,44 | 0,14 | 3 | 8 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 39,75 | 17,89 |
| 9 | 8 | Nauno | *pithecellobium dulce* | 0,74 | 0,24 | 3 | 9 | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 129,42 | 58,24 |
| 10 | 9 | Aguacate | *Persea americana* | 0,58 | 0,18 | 2 | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 70,67 | 31,80 |
| 11 | 10 | Nauno | *Albizia saman* | 0,56 | 0,18 | 4 | 12 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 98,82 | 44,47 |
| 12 | 11 | Nauno | *Albizia saman* | 0,37 | 0,12 | 4 | 7 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 25,17 | 11,32 |
| 13 | 12 | Caballero de la noche | *Cestrum nocturnum* | 0,35 | 0,11 | 1,7 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 16,08 | 7,24 |
| 14 | 13 | Nauno | *Albizia saman* | 0,60 | 0,19 | 4 | 12 | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 113,45 | 51,05 |
| 15 | 14 | Aguacate | *Persea americana* | 0,57 | 0,18 | 3 | 10 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,17 | 85,32 | 38,39 |
| 16 | 15 | Aguacate | *Persea americana* | 0,48 | 0,15 | 3 | 11 | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 66,55 | 29,95 |
| 17 | 16 | Aguacate | *Persea americana* | 0,56 | 0,18 | 4 | 13 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 105,16 | 47,32 |
| 18 | 17 | Aguacate | *Persea americana* | 1,08 | 0,34 | 4 | 15 | 0,09 | 0,22 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 459,45 | 206,75 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **0,57** | **1,10** | **3,28** | **0,33** | **3,61** | **1804,04** | **811,82** |

Inventario forestal – Frente de obra Halcón de granada





Ubicación de epifitas - Frente de obra Halcón de granada

| Tabla 13. Relación cobertura vegetal con área de cobertura. | |
|---|---|
| **Especie** | **Zonas verdes urbanadas TOTAL** ($cm^2$) |
| *Hyperphyscia minor* | 3.100 |
| *Cryptothecia striata* | 1.300 |
| **TOTAL cm²** | **4.400** |

**Tabla 15. Coordenadas CTM12 parcelas epífitas terrestres**

| CONSECT | NOMBRE | COOR_X | COOR_Y |
|---|---|---|---|
| 1 | Parcela 1 | 4994518,02 | 2331686,142 |
| 2 | Parcela 2 | 4994503,314 | 2331679,672 |
| 3 | Parcela 3 | 4994509,785 | 2331687,907 |

Líquenes encontrados – Frente e obra Halcón de Granada

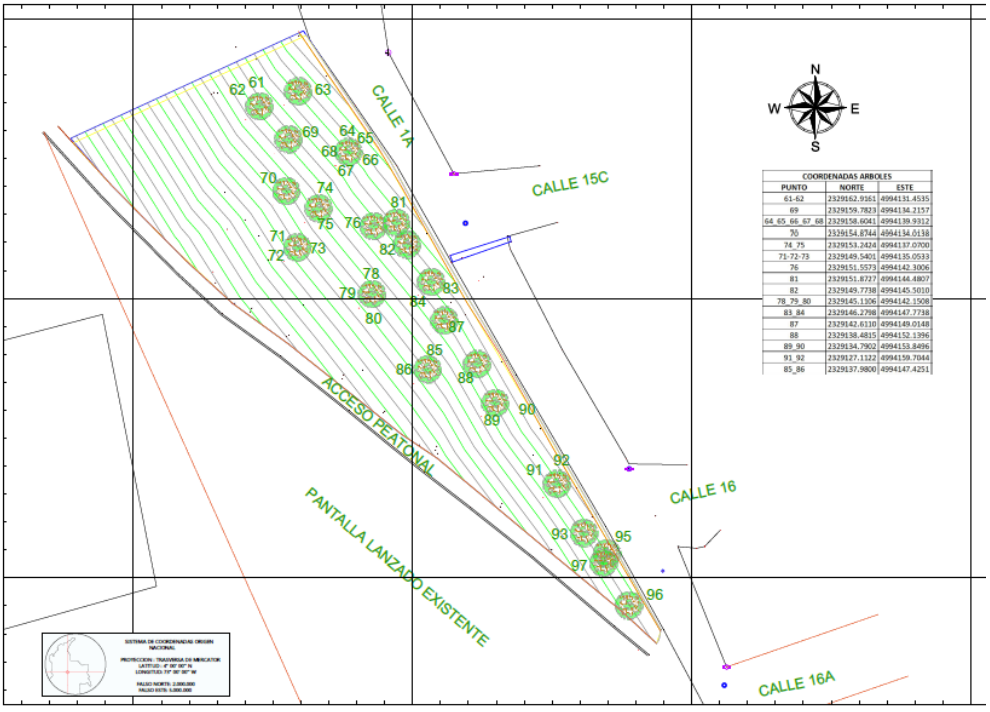


Ubicación de árboles – Frente de obra Brisas de Primavera

| Nº Indv.Pred | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | D,A,P, (cm) | ALTURA COMERCIAL (m) | ALTURA TOTAL (m) | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL ($M^3$) | BIOMASA (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Mango | *Mangifera indica* | 21,65 | 2,1 | 5,7 | 0,05 | 0,1384 | 76,1361 |
| 62 | Mango | *Mangifera indica* | 20,05 | 2,0 | 5,8 | 0,04 | 0,1209 | 66,4977 |
| 63 | Matarratón | *Gliricidia sepium* | 14,01 | 2,5 | 4,9 | 0,02 | 0,0498 | 27,4031 |
| 64 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 27,06 | 5,5 | 9,1 | 0,19 | 0,3453 | 189,9228 |
| 65 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 27,69 | 4,3 | 9,1 | 0,16 | 0,3618 | 198,9655 |
| 66 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 22,60 | 4,5 | 9,2 | 0,11 | 0,2436 | 133,9684 |
| 67 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 28,33 | 4,1 | 9,0 | 0,16 | 0,3744 | 205,9303 |
| 68 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 31,99 | 4,0 | 9,2 | 0,19 | 0,4880 | 268,4218 |
| 69 | Guamo | *Inga edulis* | 10,82 | 1,6 | 5,4 | 0,01 | 0,0328 | 18,0322 |
| 70 | Caracolí | *Anacardium excelsum* | 26,42 | 6,0 | 10,4 | 0,20 | 0,3763 | 206,9604 |
| 71 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 16,23 | 3,1 | 9,0 | 0,04 | 0,1229 | 67,6209 |
| 72 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 19,10 | 6,5 | 8,8 | 0,11 | 0,1664 | 91,5130 |
| 73 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 6,5 | 8,8 | 0,08 | 0,1155 | 63,5507 |
| 74 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 22,95 | 4,5 | 8,7 | 0,11 | 0,2375 | 130,6434 |
| 75 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 40,43 | 3,5 | 8,9 | 0,27 | 0,7539 | 414,6629 |
| 76 | Guanabano | *Annona ionophylla* | 15,15 | 4,1 | 6,6 | 0,04 | 0,0785 | 43,1972 |
| 78 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 14,96 | 3,9 | 10,5 | 0,04 | 0,1218 | 67,0012 |
| 79 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 33,42 | 5,8 | 10,5 | 0,31 | 0,6080 | 334,3995 |
| 80 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 5,0 | 9,8 | 0,06 | 0,1287 | 70,7724 |
| 81 | Guayacan amarrillo | *Handroanthus chrysanthus* | 27,69 | 4,0 | 8,9 | 0,14 | 0,3538 | 194,5926 |
| 82 | Palma manila | *Adonidia merrillii* | 12,25 | 3,1 | 3,4 | 0,02 | 0,0265 | 14,5579 |
| 83 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 17,98 | 4,5 | 8,1 | 0,07 | 0,1358 | 74,6930 |
| 84 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 26,90 | 4,8 | 8,1 | 0,16 | 0,3038 | 167,0691 |
| 85 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 16,17 | 5,1 | 7,3 | 0,06 | 0,0989 | 54,4187 |
| 86 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 14,16 | 5,0 | 7,4 | 0,05 | 0,0770 | 42,3301 |
| 87 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 31,07 | 3,5 | 9,3 | 0,16 | 0,4653 | 255,9059 |
| 88 | Matarratón | *Gliricidia sepium* | 36,92 | 1,6 | 8,4 | 0,10 | 0,5936 | 326,5074 |
| 89 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 12,73 | 3,5 | 7,9 | 0,03 | 0,0664 | 36,5128 |
| 90 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 14,04 | 3,6 | 7,9 | 0,03 | 0,0807 | 44,3815 |
| 91 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 23,75 | 4,1 | 8,2 | 0,11 | 0,2397 | 131,8224 |
| 92 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,15 | 4,0 | 8,2 | 0,04 | 0,0976 | 53,6693 |
| 93 | Oití | *Licania tomentosa* | 12,16 | 1,9 | 5,4 | 0,01 | 0,0414 | 22,7624 |
| 95 | Mango | *Mangifera indica* | 14,20 | 2,0 | 6,5 | 0,02 | 0,0679 | 37,3492 |
| 97 | Mango | *Mangifera indica* | 22,28 | 4,1 | 6,6 | 0,10 | 0,1699 | 93,4196 |
| **TOTAL** | | | | | | 3,29 | 7,68 | 4225,59 |

Inventario forestal – Frente de obra Brisas de Primavera











Halcón de granada Brisas de primavera

Inventario forestal

**TRÁMITES DE APROBACIÓN DE TALA ARBÓREA:**

**FRENTE DE OBRA HALCÓN DE GRANADA:**

- **Acta de Aprobación de Tala Arbórea**

En cumplimiento del procedimiento establecido por la autoridad ambiental competente, la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), el contratista ha gestionado y obtenido la aprobación formal para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal requeridas para la ejecución de las obras.

La siguiente acta respalda la autorización de tala de individuos arbóreos para el FRENTE DE OBRA HALCÓN DE GRANADA:

– Acta de Reunión No. 002 – Fecha: 28 de Octubre de 2025 Aprobación de tala: 18 individuos arbóreos en el frente de obra Halcón de Granada.

- **Compensación Forestal**

Como medida de mitigación y compensación ambiental, se estableció la obligación de siembra de un total de 90 árboles para la tala autorizada en el frente de obra Halcón de Granada.

A la fecha de corte del presente informe, la compensación aún no ha sido ejecutada, por lo cual los compromisos ambientales se mantienen vigentes bajo responsabilidad del contratista, quien deberá dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos por la CDMB.

– Especies recomendadas para compensación forestal:

Según recomendaciones técnicas emitidas por la CDMB, las especies a sembrar deben corresponder a individuos nativos y frutales, priorizando su función ecológica y el soporte a la fauna silvestre local:

*Especies Nativas:*
Cedrela odorata (Cedro)
Albizia guachapele (Nauno)
Tabebuia rosea (Guayacán Rosado)
Handroanthus chrysanthus (Guayacán Amarillo)
Schizolobium parahyba (Frijolito)
Jacaranda caucana (Gualanday)
Enterolobium cyclocarpum (Orejo)
Pithecellobium dulce (Gallinero)
Guazuma ulmifolia (Guácimo)

*Especies Frutales:*
Pouteria sapota (Zapote)
Mangifera indica (Mango)
Syzygium malaccense (Pomarroso Brasilero)

Altura mínima de siembra: 0.70 m

Criterios de ubicación: En áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, preferiblemente dentro del mismo predio o zonas cercanas, garantizando condiciones que favorezcan su supervivencia y evitando cualquier interferencia con las actividades constructivas

**FRENTE DE OBRA BRISAS DE PRIMAVERA:**

- **Acta de Aprobación de Tala Arbórea**

En cumplimiento del procedimiento establecido por la autoridad ambiental competente, la CDMB (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), el contratista ha gestionado y obtenido la aprobación formal para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal requeridas para la ejecución de las obras.

La siguiente acta respalda la autorización de tala de individuos arbóreos para el FRENTE DE OBRA BRISAS DE PRIMAVERA:

– Acta de Reunión No. 002 – Fecha: 17 de Diciembre de 2025
Aprobación de tala: 02 individuos arbóreos en el frente de obra Brisas de primavera, cada uno con tres bifurcaciones principales razón por las cuales fueron inventariados de manera independiente, asignándoles los códigos 71, 72 y 73 para el primer individuo y 78, 79 y 80 para el segundo.

| No Consecutivo | Nº Indv.Pred | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | D.A.P. (cm) | ALTURA COMERCIAL (m) | ALTURA TOTAL (m) | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL ($M^3$) | BIOMASA (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 16,23 | 3,1 | 9,0 | 0,04 | 0,1229 | 67,6209 |
| | 72 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 19,10 | 6,5 | 8,8 | 0,11 | 0,1664 | 91,5130 |
| | 73 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 6,5 | 8,8 | 0,08 | 0,1155 | 63,5507 |
| 2 | 78 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 14,96 | 3,9 | 10,5 | 0,04 | 0,1218 | 67,0012 |
| | 79 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 33,42 | 5,8 | 10,5 | 0,31 | 0,6080 | 334,3995 |
| | 80 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 5,0 | 9,8 | 0,06 | 0,1287 | 70,7724 |
| TOTAL | | | | | | | 0,63 | 1,15 | 694,86 |

Individuos arbóreos autorizados por la CDMB

Acta N. 002 del 17 diciembre 2025

- **Compensación Forestal**

Como medida de mitigación y compensación ambiental, se estableció la obligación de siembra de un total de 30 árboles para la tala autorizada en el frente de obra Brisas de primavera.

A la fecha de corte del presente informe, la compensación aún no ha sido ejecutada, por lo cual los compromisos ambientales se mantienen vigentes bajo responsabilidad del contratista, quien deberá dar cumplimiento dentro de los plazos establecidos por la CDMB.

– Especies recomendadas para compensación forestal:

Según recomendaciones técnicas emitidas por la CDMB, las especies a sembrar deben corresponder a individuos nativos y frutales, priorizando su función ecológica y el soporte a la fauna silvestre local:

*Especies Nativas:*
Cedrela odorata (Cedro)
Albizia guachapele (Nauno)
Tabebuia rosea (Guayacán Rosado)
Handroanthus chrysanthus (Guayacán Amarillo)
Schizolobium parahyba (Frijolito)
Jacaranda caucana (Gualanday)
Enterolobium cyclocarpum (Orejo)
Pithecellobium dulce (Gallinero)
Guazuma ulmifolia (Guácimo)

*Especies Frutales:*
Pouteria sapota (Zapote)
Mangifera indica (Mango)
Syzygium malaccense (Pomarroso Brasilero)

Altura mínima de siembra: 0.70 m
Criterios de ubicación: En áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, preferiblemente dentro del mismo predio o zonas cercanas, garantizando condiciones que favorezcan su supervivencia y evitando cualquier interferencia con las actividades constructivas

## EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN FORESTAL

A continuación, se relacionan las cantidades y actividades en torno a las actividades de intervención en cada frente de obra:

| FRENTE DE OBRA | INDIVIDUOS ARBÓREAS | | INDIVIDUOS INTERVENIDOS |
|---|---|---|---|
| | INVENTARIO | APROBACIÓN | 01 AL 31 DICIEMBRE 2025 |
| Halcón de granada | 18 | 18 | 17 |
| Brisas de primavera | 34 | 2 | 0 |

**HALCÓN DE GRANADA:**

Durante el período evaluado, se realizó la **intervención forestal de diecisiete (17) individuos arbóreos** localizados dentro del área de

influencia directa del proyecto. Estas intervenciones se ejecutaron en el frente de obra **Halcón de granada** conforme a lo establecido en el cronograma de actividades aprobado.










Intervención forestal en el Frente de obra Halcón de granada

Desde la perspectiva de la interventoría, se verificó que la totalidad de los individuos intervenidos se encontraban debidamente incluidos dentro del Permiso de Tala otorgado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, y que las actividades desarrolladas se ajustaron a la normativa ambiental vigente, así como a los términos, condiciones y obligaciones técnicas del acto administrativo correspondiente.

En el marco del control y supervisión ambiental, la interventoría constató que las actividades de tala se ejecutaron siguiendo los lineamientos técnicos establecidos en el permiso ambiental, incluyendo la delimitación del área de intervención, la identificación previa de los individuos autorizados, y la aplicación de medidas de manejo ambiental orientadas a la prevención, mitigación y control de impactos negativos sobre el entorno. Entre dichas medidas se verificó el manejo adecuado del material vegetal resultante, evitando su disposición inadecuada, así como la protección de áreas adyacentes para prevenir afectaciones innecesarias a la cobertura vegetal circundante y al suelo.

Adicionalmente, se evidenció que el contratista implementó acciones orientadas a la conservación del equilibrio ambiental, tales como la minimización de la dispersión de residuos, el control de emisiones de material particulado y ruido durante las actividades de corte, y la preservación de especies no autorizadas para intervención, garantizando así un manejo forestal responsable.

En relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los protocolos establecidos para actividades de tala, verificando que el personal involucrado contara con la capacitación requerida, el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) (casco, guantes, botas de seguridad, protección visual y auditiva, entre otros), y que se aplicaran procedimientos seguros para la operación de herramientas y equipos utilizados. Así mismo, se constató la identificación y control de riesgos asociados a la actividad, tales como caída de material vegetal, cortes, golpes y atrapamientos, garantizando condiciones de trabajo seguras para los operarios.

Como resultado de las labores de supervisión y control, la interventoría concluye que las actividades forestales se desarrollaron de manera técnica, ambientalmente responsable y bajo condiciones seguras, dando cumplimiento a las disposiciones del

permiso ambiental, a la normativa vigente y a los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin evidenciarse desviaciones significativas ni impactos ambientales negativos adicionales a los previstos.

A continuación, se relacionan los árboles talados y los árboles por compensar por parte del contratista de obra durante la ejecución del proyecto:

| MANEJO DEL RECURSO FLORA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO | TALA ARBÓREA | | COMPENSACIÓN | |
| | HALCÓN DE GRANADA | BRISAS DE PRIMAVERA | HALCÓN DE GRANADA | BRISAS DE PRIMAVERA |
| | 18 autorizados | 2 autorizados | 90 á | 30 |
| 15 al 31 Octubre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 al 30 Noviembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 al 31 Diciembre 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 0 | 0 | 0 |

**Indicador ambiental**

- ( No. de acciones de manejo implementadas / No. de acciones de manejo propuestas en el PASA ) * 100 = %
  ( 7 / 7 ) * 100 = 100%

- ( Especie forestales intervenidas / especies forestales autorizadas ) *100= %
  Halcón de granada: ( 17 / 18 ) * 100 = 95 %
  Brisas de primavera: No aplica

## 6.7 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN.

El contratista de obra implementó un programa integral de señalización y manejo de tráfico con el objetivo de prevenir impactos negativos derivados de la ausencia de señalización adecuada en las zonas de intervención, garantizar la seguridad ocupacional del personal vinculado al proyecto y proteger a las comunidades residentes y transeúntes del área de influencia directa.

∇ Señalización preventiva, informativa y de seguridad perimetral:

Durante la ejecución del proyecto se implementó:

Señalización vertical preventiva e informativa, instalada en puntos estratégicos para alertar a peatones sobre las zonas de intervención.

Estas medidas permitieron mantener la seguridad vial y minimizar riesgos de accidentalidad en zonas de alto tránsito o frente a viviendas.

- ∇ Delimitación y aislamiento de zonas de trabajo:

La zona de intervención fue delimitada de manera continua señalización preventiva y dispositivos de canalización, así mismo se restringió el ingreso no autorizado y protegió el entorno inmediato. Adicionalmente, se instalaron señales de:

Inicio y fin de obra
Acceso restringido
Frente de trabajo activo

Esta delimitación se mantuvo durante desde el inicio de las etapas constructivas, siendo objeto de mantenimiento regular para asegurar su visibilidad y funcionalidad.

- ∇ Señalización interna del frente de obra y áreas de almacenamiento:

Los materiales acopiados fueron debidamente señalizados y delimitados, previniendo obstrucciones al paso y facilitando la organización operativa. Se garantizó el uso de cinta de peligro visiblemente tensada, sin dobleces ni daños, durante toda la fase de ejecución, lo que permitió una clara demarcación de zonas riesgosas.

En el campamento y almacén del contratista se estableció señalización interna funcional y vigente, que incluyó:

Rutas de evacuación y salidas de emergencia
Puntos de encuentro
Áreas de almacenamiento de materiales y residuos
Vestier
Baño portátil ubicado en el campamento de obra
Señalización de uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP)
Carteleras informativas con material de interés en salud, seguridad y medio ambiente

Estas acciones fueron coherentes con el enfoque preventivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y se

verificó su correcta instalación, mantenimiento y actualización periódica.

∇ Preparación y respuesta ante emergencias:

El área de trabajo contó con elementos básicos para la atención inicial de emergencias, tales como:

Extintores portátiles
Señalización de kit de primeros auxilios
Acceso libre de obstáculos a rutas de escape

La disposición de estas medidas asegura que, en caso de cualquier contingencia (como derrames, incendios o evacuaciones), el personal se encuentre orientado para actuar de forma segura y eficaz.




Señalización instalada en el Frente de obra Halcón de granada




Señalización instalada en el Frente de obra Brisas de Primavera

**Indicadores ambientales**

- ( Áreas señalizadas / Áreas necesarias a señalizar) = %
  ( 2 / 2 ) * 100 = 100 %
- ( Acopios en obra / Número de puntos de acopio señalizados) = %
  ( 2 / 2 ) * 100 = 100 %

## 6.8 PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS

La implementación de los campamentos de obra e instalaciones temporales fue ejecutada bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el personal vinculado al proyecto, el almacenamiento de materiales y la gestión ordenada de actividades logísticas y administrativas, en cumplimiento de los lineamientos del SG-SST y Plan de Acción Socio Ambiental.

∇ Infraestructura dispuesta en el frente de obra:

Los dos frentes de obra cuentan con infraestructura mínima necesaria para su operación, garantizando eficiencia constructiva y bienestar del personal. Entre las instalaciones disponibles se encontraron:

Almacén técnico: El contratista de obra cuenta con dos campamentos y almacenes correspondientes a los dos frentes de obra, el cual será utilizado para el resguardo de materiales, equipos, herramientas y pertenencias de los trabajadores. Diseñado en área segura, techada y de acceso restringido.

Puntos ecológicos y área de almacenamiento temporal de residuos sólidos, debidamente señalizado, organizado por tipo de residuo (ordinario, aprovechable y peligroso), cumpliendo lo establecido en lo establecido en el programa de manejo de residuos sólidos.

Unidades sanitarias móvil, con mantenimiento regular por parte del proveedor MASSI (Mas Soluciones Integrales Colombia SAS).

Disponibilidad de agua potable, suministrada mediante red autorizada, para el consumo y lavado de manos del personal.

∇ Criterios de ubicación y prevención ambiental:

Las áreas designadas para la instalación de campamentos fueron seleccionadas con base en criterios de mínima intervención sobre el entorno natural, evitando impactos negativos sobre los recursos flora y fauna, así como sobre cuerpos de agua o zonas de recarga hídrica. Estas instalaciones se dispusieron en suelos estables y con acceso adecuado, evitando áreas de valor ecológico o suelos erosionables.

∇ Elementos de seguridad, señalización y gestión del riesgo

Los campamentos fueron dotados con elementos básicos para la atención de emergencias, entre ellos:

Botiquín completo
Extintor portátil
Camilla rígida e inmovilizador
Listado de instituciones de apoyo para atención de emergencias (MEDEVAC)

∇ Mapa de ruta de escape y punto de encuentro señalizado


Asimismo, cada campamento y frente de obra contó con señalización visible y vigente sobre riesgos ocupacionales, rutas de evacuación, uso obligatorio de EPP, ubicación de zonas restringidas y áreas

operativas. La cartelera informativa fue instalada en punto visible y actualizada periódicamente con información relacionada con:

Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Indicadores ambientales relevantes
Procedimientos de emergencia y contacto de apoyo
Instrucciones de seguridad y buenas prácticas laborales



Campamento del frente de obra Brisas de Primavera

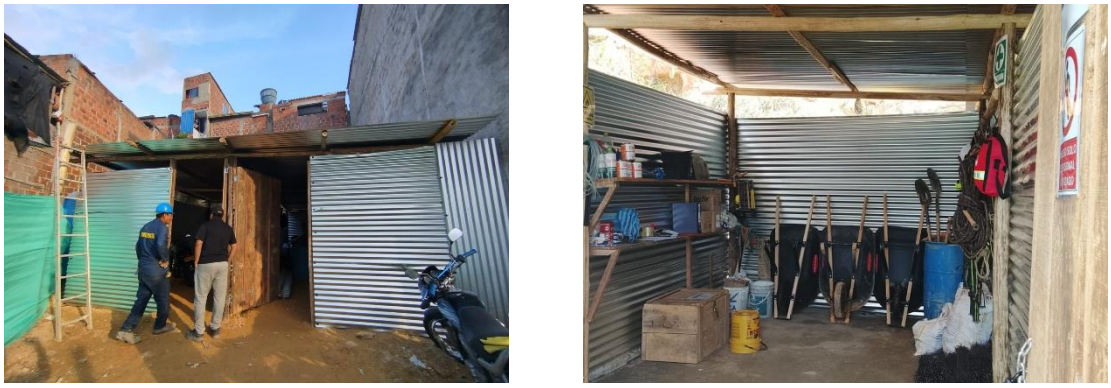

Campamento del frente de obra Halcón de granada

**Indicador ambiental**

- (Número de sitios desmantelados / Número sitios de uso temporal) *100 = %
  No aplica

- (No de medidas ambientales ejecutadas / No de medias ambientales programadas) *100 = %
  ( 4 / 4 ) * 100 = 100%

## 6.9 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL.

**Proyecto de atención a la comunidad**

*Instalación de la oficina de atención a la comunidad*

Durante el periodo de ejecución evaluado, se constata el cumplimiento de las acciones previstas en el marco del proyecto de atención a la comunidad, en particular lo relacionado con la instalación y operación de la oficina de información y atención a la comunidad.

La interventoría verifica que dicha oficina se encuentra en funcionamiento y cuenta con los canales de comunicación activos, visibles y funcionales, específicamente:

- Número telefónico de contacto directo: ***3115557728***
- Correo electrónico: ***conmitigacionptacdmb@hotmail.com***

A través de estos medios, la comunidad y las autoridades competentes pueden presentar solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS), las cuales son gestionadas por el equipo social del contratista. Se evidencia que las respuestas se brindan de manera oportuna, en concordancia con los lineamientos del programa social y los principios de atención ciudadana.

Estas acciones permiten establecer un canal efectivo de comunicación entre el proyecto y la comunidad, fortaleciendo los procesos de participación, transparencia y resolución de inquietudes en el marco del desarrollo del contrato de obra.



Volante: 01

**INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

**La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB**

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

Información de la oficina de atención a la comunidad Brisas de primavera



Volante: 02

**INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

**La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB**

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

Información de la oficina de atención a la comunidad Halcón de granada y granadillo

**Indicadores sociales**

- ( N. de peticiones recibidas / N. de peticiones atendidas ) * 100 = %

No aplica

- ( N. de peticiones atendidas / N. de peticiones cerradas ) * 100 = %

No aplica

**Proyecto de Información y Divulgación**

En cumplimiento de las actividades contempladas en el Programa de Atención a la Comunidad, la interventoría verifica que se han dispuesto mecanismos efectivos para la divulgación de información relacionada con el proyecto, dirigidos a los actores sociales ubicados en el área de influencia directa.

*Valla informativa:* a corte de fecha del presente informe se ha instalado la valla informativa del proyecto el cual fue ubicado en una zona visible y accesible, adyacente al campamento del contratista, en el barrio Brisas de primavera, Piedecuesta; siento este el primer frente de obra habilitado.




Valla informativa

*Divulgación de la información:* La interventoría confirma que la información relacionada con el proyecto ha sido socializada a los actores sociales vinculados al área de intervención, incluyendo la Administración Municipal, Instituciones Educativas, unidades residenciales, comerciantes, empresas, líderes comunitarios y otros interesados. La entrega se ha realizado a través de medios físicos, correo electrónico y plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, de acuerdo con la pertinencia y solicitud de los receptores.

*Reuniones informativas con la comunidad:*

- El día jueves 16 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m., se llevó a cabo una reunión informativa en la zona contigua al frente de obra BRISAS DE PRIMAVERA, con participación de representantes de la comunidad del sector, la entidad contratante, profesionales del contratista de obra, el equipo de interventoría y líderes comunitarios. Durante este espacio se socializó el alcance general del contrato de obra y se presentó la planificación de las actividades técnicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (SST), y sociales que serán implementadas en el marco de la ejecución del proyecto.



Volante informativo



Reunión informativa del 16 de octubre de 2025 a las 7:00 p.m
Barrio Brisas de Primavera I

- Durante el mes de noviembre 2025 no se realizaron convocatoria para reunión con la comunidad.

- El día viernes 05 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m., se llevó a cabo una reunión informativa en la zona contigua al frente de obra HALCÓN DE GRANADA, con participación de representantes de la comunidad del sector, la entidad contratante, profesionales del contratista de obra, el equipo de interventoría y líderes comunitarios. Durante este espacio se socializó el alcance general del contrato de obra y se presentó la planificación de las actividades técnicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo (SST), y sociales que serán implementadas en la ejecución del proyecto.

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

Volante: 01

**INVITACIÓN A LA REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS**

**La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB**

Informa e invita a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa del proyecto de **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** a la reunión informativa de inicio de obras, así:

**Dirección:** Calle Primera N con Cra 19 esquina (frente a tienda Liliana Granados), Barrio Halcón de Granada-Piedecuesta, Santander.

**Fecha:** Viernes 05 de diciembre de 2025

**Hora:** 5:00 p.m.

Asistiendo a esta reunión, va a tener conocimiento de la obra a desarrollar en el sector, en temas civiles, ambientales y sociales por parte del Consorcio Mitigación Piedecuesta

**MAYOR INFORMACIÓN**
**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

Volante informativo



Reunión informativa del 05 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m
Barrio Halcón de granada

*Atención de PQRS:* Desde la apertura de la oficina de atención a la comunidad, la interventoría verifica que se encuentra disponible el formato de recepción, registro y seguimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), el cual puede ser diligenciado de manera presencial por los interesados en el horario establecido, de lunes a viernes. A la fecha de elaboración del presente informe, no se han registrado PQRS por parte de los habitantes del sector, lo cual indica una recepción positiva de las actividades preliminares del proyecto o la ausencia de inconformidades hasta el momento.

**Indicadores sociales**

( N. de reuniones informativas programadas / N. de reuniones realizadas * 100 ) = %
( 1 / 1 ) * 100 = 100%

( N. de actores sociales invitados a las reuniones informativas / número de volantes, comunicaciones, mensajes entregados a los actores sociales ) * 100 = %
( 30 / 30 ) * 100 = 100%

( N. de actores sociales asistentes a las reuniones informativas / N. de actores sociales invitados) * 100 = %
( 29 / 30 ) * 100 = 90%

**Proyecto para el manejo de la infraestructura de predios y Servicios Públicos**

*Actas de vecindad:* El Contratista Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB realizó un total de **46 actas de vecindad** de inicio del proyecto, las cuales fueron diligenciadas de manera conjunta entre el residente técnico del proyecto y el equipo del área social, en cumplimiento del protocolo establecido y utilizando el formato oficial definido para tal fin.
Las actas de vecindad constituyen un insumo clave para la identificación de posibles afectaciones derivadas del desarrollo de la obra, facilitando el seguimiento, la atención oportuna a eventuales reclamaciones y el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. La interventoría hará verificación de la calidad, completitud y trazabilidad de este proceso durante las etapas de seguimiento técnico y social.

A continuación, se relacionan el número de actas de vecindad según los barrios que comprenden la zona de intervención de los dos frentes de obra:

| ACTAS DE VECINDAD | | |
|---|---|---|
| **BARRIO** | **NÚMERO DE ACTAS DE VECINDAD** | **PORCENTAJE** |
| Brisas de Primavera I | 28 | 61 % |
| Brisas de Primavera II | 5 | 10 % |
| Halcón de granada | 7 | 16 % |
| Granadillo | 6 | 13 % |
| **TOTAL** | **46** | **100 %** |

**BRISAS DE PRIMAVER II**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCA BENAVIDES PERILLA | Calle 15 C No. 0 - 58 | Brisas de Primavera II | 63.480.359 | 3116607711 |
| 2 | MARÍA LEONOR VARGAS | Calle 15 B No. 0 - 58 | Brisas de Primavera II | 63.475.291 | 3132583994 |
| 3 | MYRIAM ALMEIDA VILLAMIZAR | Calle 15 D No. 0 - 63 | Brisas de Primavera II | 63.303.495 | 3172470230 |
| 4 | VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Calle 15 C No. 0 - 57 | Brisas de Primavera II | 91265828 | 3172113522 |
| 5 | VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Calle 15 B No. 0 - 63 | Brisas de Primavera II | 91265828 | 3172113522 |

CONSORCIO INTERPIEDECUESTA

**BRISAS DE PRIMAVERA I**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLFO TORRES ROPERO | Manzana C Casa 3 | Brisas de Primavera I | 13.480.725 | 3156694907 |
| 2 | CAMILO RÍOS ARNACHE | Manzana C Casa 10 | Brisas de Primavera I | 1.065.874.471 | 3105966785 |
| 3 | CHERRYS POLANCO MEDINA | Manzana B Casa 2 | Brisas de Primavera I | 15.950.322 | 3209997334 |
| 4 | CRISANTO MARTÍNEZ | Manzana B Casa 5 | Brisas de Primavera I | 5.670.293 | 3203330392 |
| 5 | DIANA ROCÍO LAGOS | Manzana B Casa 3 | Brisas de Primavera I | 63.341.445 | 3016893592 |
| 6 | FAUSTINO JIMÉNEZ | Manzana C Casa 11 | Brisas de Primavera I | 5.422.805 | 3212597205 |
| 7 | JAIME TORRES PRIETO | Manzana B Casa 7 | Brisas de Primavera I | 19.284.692 | 3152487337 |
| 8 | JAN CARLOS GRIMALDO MENA | MANZANA A CASA 12 | Brisas de Primavera I | 1.102.384.103 | 3182844206 |
| 9 | JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Manzana D Casa 3 | Brisas de Primavera I | 78.714.853 | 3185182952 - 3144085822 |
| 10 | JEFERSON GONZÁLEZ ORTEGA | Manzana A Casa 10 piso 1 | Brisas de Primavera I | 5.823.211 | 3112802947 |
| 11 | KELLY LEÓN DÍAZ | Manzana D Casa 1 | Brisas de Primavera I | 28.259.440 | 3028421645 |
| 12 | LEIDY SERRANO RUGELES | Manzana A Casa 13 | Brisas de Primavera I | 28.078.590 | 3102096505 |
| 13 | LILIANA GARNICA ROJAS | Manzana A Casa 9 | Brisas de Primavera I | 37.725.956 | 3025981705 |
| 14 | LUIS EDUARDO GÉLEVEZ TARAZONA | Manzana A Casa 11 Taller | Brisas de Primavera I | 1.097.303.276 | 3205890997 |
| 15 | MARIA CARREÑO ROJAS | Manzana A Casa 8-201 y 301 | Brisas de Primavera I | 37.542.792 | 3204753055 |
| 16 | MARIA FERNANDA DÍAZ NIÑO | Manzana D Casa 2 | Brisas de Primavera I | 1.102.386.883 | 3112239900 |
| 17 | MARINA DIAZ FUENTE | Manzana A Casa 8 piso 101 | Brisas de Primavera I | 37.796.087 | 3178621074 |
| 18 | MARTHA BUITRAGO REYES | Manzana C Casa 9 | Brisas de Primavera I | 63.336.981 | 3167559614 |
| 19 | MERCEDES MONCADA GÉLVEZ | Manzana B Casa 6 | Brisas de Primavera I | 1.097.303.966 | 3152841112 |
| 20 | YENNY CABALLERO FLÓREZ | MANZANA B Casa 9 | Brisas de Primavera I | 1.116.792.286 | 3202180004 |
| 21 | YOLANDA PABÓN REY | MANZANA A CASA 14 | Brisas de Primavera I | 28.162.431 | 3103020181 |
| 22 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | MANZANA B Casa 4 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 23 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Manzana B Casa 8 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 24 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Manzana C Casa 1 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 25 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Manzana C Casa 2 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 26 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Manzana D Casa 2 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 27 | VICTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | MANZANA B Casa 1 | Brisas de Primavera I | 91265828 | 3172113522 |
| 28 | ANAHIL JIMÉNEZ | Vías y entorno | Brisas de Primavera I | 37.753.450 | 3115562986 |

**HALCÓN DE GRANADA**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZETH CÁRDENAS CADENA | Calle 1 NA No. 19 – 120 APTO 101 | Halcón de Granada | 1.102.359411 | 3043493916 |
| 2 | JAIME ANGARITA MAYA | Calle 1 NA No. 19 – 118 Piso 3 | Halcón de Granada | 5.670.471 | 3023964385 |
| 3 | LEIDY KATHERINE RUGELES GONZÁLEZ | Calle 1 NA No. 19 – 114 Piso 1 | Halcón de Granada | 1.095.804.944 | 315669.3515 |
| 4 | JENNIFER GARCÍA CORZO | Calle 1 NA No. 19 – 108 PISO 1 | Halcón de Granada | 1.102.714.486 | 3007599442 |
| 5 | GLADYS FERREIRA ESTÉVEZ | Calle 1 NA No. 19 – 100 Piso 2 | Halcón de Granada | 63.356.193 | 3123428238 |
| 6 | HUGO ANDRÉS PÉREZ CABALLERO | Calle 1 NA No. 19 – 96 PISO 1 | Halcón de Granada | 1.102.366.785 | 3022824765 |
| 7 | VIVIANA OVIEDO RIAÑO | Calle 1 NA No. 19 – 126 - 128 | Halcón de Granada | 37.618.699 | 3243445819 |

**GRANADILLO**

| No. | Nombre | Dirección vivienda | Barrio | No. de Cédula de Ciudadanía | No. telefónico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDINSON FABIÁN LUNA MANTILLA | Carrera 20 A No. 1N - 47 | Granadillo | 1.102.365.817 | 3194124965 |
| 2 | JOHAN SEBASTIÁN NIÑO RAMÍREZ | Carrera 20 A No. 1N - 41 | Granadillo | 1.102.348.605 | 3157435741 |
| 3 | CIRO ALFONSO MONTAÑEZ LEÓN | Carrera 20 A No. 1N - 37 | Granadillo | 5.630.410 | 3178724846 |
| 4 | DIANA YOLIMA BRICEÑO RINCÓN | Carrera 20 A No. 1N - 31 | Granadillo | 37.620.775 | 3043249688 |
| 5 | PAOLA ANDREA SILVA RÍOS | Carrera 20 A No. 1N - 25 | Granadillo | 1.102.365.934 | 3185269906 |
| 6 | VÍCTOR JULIO GAMBOA CARDOZO | Carrera 20 A No. 1N - 19 | Brisas de Primavera II | 91265828 | 3172113522 |

*Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos:* Conforme el desarrollo del proyecto lo requiera, se informará oportunamente a la comunidad sobre la programación de cortes de servicios públicos como agua, energía eléctrica u otros, que sean necesarios para la ejecución de las actividades constructivas. Esta información será comunicada con antelación a través de los canales oficiales establecidos —como la oficina de atención a la comunidad, WhatsApp, correo electrónico y avisos físicos— con el fin de minimizar molestias y garantizar que los habitantes del área de influencia estén debidamente informados y puedan tomar las precauciones necesarias en caso de presentarse estas situaciones.

**Actas de compromiso:** Durante el segundo corte de ejecución correspondiente al mes de noviembre 2025, no se realizaron actas de compromisos con actores naturales o jurídicos de la zona de influencia directa del proyecto.

**Indicadores del proyecto:**

- ( Número de informaciones sobre la elaboración de actas de vecindad en el AID de la obra / número de actas de vecindad realizadas ) * 100 = %
  ( 13 / 13 ) * 100 = 100%
  Durante el periodo se realizaron 13 actas correspondiente a Halcón de granada y Granadillo

- ( Número de volantes de elaboración de actas de vecindad entregados / número de actas de vecindad realizadas ) * 100 = %
  ( 13 / 13 ) * 100 = 100%

- (Número de actas de vecindad realizadas / número de actas de vecindad cerradas ) * 100=%
  Total de actas de vecindad de inicio abiertas: 46, no se elaboran actas de cierre en el periodo ejecutado

- (Número de quejas atendidas por daño a la infraestructura de predios / Número de quejas por daño a infraestructura de predios presentadas) *100
  No aplica

**Proyecto de recuperación del Derecho de vía (No aplica)**
Este componente no es aplicable al presente contrato, dado que la naturaleza del proyecto corresponde a la ejecución de obras de estabilización de taludes mediante pantallas ancladas, y no a la apertura, ampliación o intervención de vías públicas.

**Proyecto de cultura vial y participación comunitaria**

*Desarrollo de talleres pedagógicos de sostenibilidad:*

Este proyecto aplica dentro del componente social del contrato, en la medida en que las actividades constructivas programadas implican,

en determinados momentos, el cierre temporal de vías, el tránsito restringido o la ocupación parcial de espacios públicos o privados.

Estas situaciones pueden generar afectaciones puntuales a la movilidad peatonal y vehicular, así como alteraciones en la dinámica cotidiana de la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

En este contexto, los talleres pedagógicos de sostenibilidad se desarrollan con el objetivo de informar, sensibilizar y generar corresponsabilidad en torno al proyecto.

El objetivo principal de las actividades de sensibilización a comunidad trabajadora es promover un ambiente laboral basado en el respeto, la cooperación y la responsabilidad compartida, factores esenciales para el cumplimiento de las metas del proyecto. De igual manera, durante la ejecución del contrato se busca sensibilizar al personal frente a la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, dado el impacto que la operación de maquinaria y el transporte de materiales pueden generar en la seguridad vial del área de influencia.

| **CAPACITACIONES DEL COMPONENTE SOCIAL** | | |
|---|---|---|
| **N.** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | 13/11/2025 | Fortalecimiento de valores (trabajo en equipo) educación vial y oficina de atención a la comunidad |
| 2 | 10/12/2025 | Fortalecimiento de valores (emprendimiento) educación vial y oficina de atención a la comunidad |
| **CAPACITACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL** | | |
| **N.** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | 10/11/2025 | Clasificación de residuos y manejo adecuado del punto ecológico |
| 2 | 12/12/2025 | Política ambiental y política de orden, aseo |

**Indicadores sociales**

- ( N. de informaciones elaboradas / No. de informaciones entregadas ) * 100 = %

  ( 2 / 2 ) * 100 = 100%

**Proyecto de contratación de mano de obra**

El Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el componente social del contrato,

avanza en la vinculación progresiva de la mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto, dando prioridad a la población local del área de influencia directa. Este proceso se lleva a cabo conforme a los listados remitidos por la Oficina de Empleo de la Administración Municipal, los cuales contienen perfiles previamente registrados y validados según las necesidades del proyecto y las categorías ocupacionales requeridas.

Adicionalmente, a las personas interesadas que remiten sus hojas de vida directamente al correo electrónico del contratista, se les orienta sobre la necesidad de formalizar su postulación a través de las plataformas como la Agencia Pública de Empleo del SENA, entidad del Estado encargada de promover la transparencia y equidad en el proceso de selección de talento humano. Esta acción garantiza un proceso de selección abierto, equitativo, y conforme a la normatividad vigente en materia laboral y contractual.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento comunitario e institucional, el Consorcio también implementa espacios formativos dirigidos a los trabajadores vinculados al proyecto, los cuales se desarrollan mensualmente. En estos espacios se imparten talleres y charlas sobre el funcionamiento y objetivos de la oficina de atención a la comunidad, así como procesos orientados al fortalecimiento de valores, la convivencia, el trabajo en equipo, la corresponsabilidad y el desarrollo personal y social de los colaboradores.

Estas actividades no solo contribuyen al bienestar del equipo humano que participa en la obra, sino que también promueven una cultura organizacional basada en el respeto, la comunicación efectiva y la participación activa, enmarcada en los principios del desarrollo sostenible y la construcción de tejido social. La interventoría realizará el seguimiento a la ejecución de estas acciones, verificando la pertinencia, frecuencia y alcance de las mismas.

| MANO DE OBRA LOCAL CONTRATADA PARA LA OBRA DEL CONSORCIO MITIGACIÓN CDMB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nombre Completo** | **C.C. No.** | **Lugar de Nacimiento** | **Barrio** | **Teléfono** | **Cargo** |
| 1 | Harley Prada López | 1098822751 | Bucaramanga, sder | Vereda Granadillo – Piedecuesta | 3187720633 | Ayudante de obra |
| 2 | Alexander Prada López | 13745736 | Bucaramanga, sder | Vereda Granadillo – Piedecuesta | 3208778747 | Ayudante de obra |
| 3 | Luis Alberto Prada Rincón | 5691822 | Molagavita, sder | Brisa de Primavera I – Piedecuesta | 3008327899 | Ayudante de obra |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrés García Farías | 6565491 | Varinas, Venezuela | Villas de Andalucía, Piedecuesta | 3042807099 | Ayudante de obra |
| 5 | Jose Ospino | 105071906 | Magangué, Bolivar | Vereda El granadillo, Piedecuesta | 3209902704 | Ayudante de obra |
| 6 | Jefferson González Ortega | 5823211 | Maracay, Venezuela | Brisa de Primavera I – Piedecuesta | 311280294 | Ayudante de obra |

**Indicador social**

- **(** Número de personas contratadas como mano de obra no calificada que residen en el área de influencia / Número de personas registradas como mano de obra no calificada) * 100 = %
  ( 6 / 8 ) * 100 = 75 %

- ( Registro de afiliación de mano de obra / registro en planillas de pago de seguridad social ) * 100 = 100%
  ( 6 / 6 ) * 100 = 100%

**Proyectos productivos (No aplica)**

Conforme a la naturaleza técnica del contrato, que corresponde a la ejecución de una obra de estabilización de talud mendiante sistema de pantalla anclada y no a la construcción de una vía u otro tipo de infraestructura productiva o de conectividad rural, los proyectos productivos no aplican dentro del marco de intervención de esta obra. Cabe señalar que este tipo de proyectos, generalmente orientados al fortalecimiento económico de comunidades mediante iniciativas agropecuarias, comerciales o de servicios, están ligados a contratos que contemplan afectaciones prediales o intervenciones que generan impactos directos sobre medios de vida productivos, situación que no se presenta en este caso.

Adicionalmente, el contrato de obra no cuenta con un rubro presupuestal específico destinado a la formulación o ejecución de proyectos productivos, razón por la cual, en el contexto actual, este componente no hace parte de las acciones previstas en el Plan de Gestión Social ni en los compromisos del contratista.

La interventoría confirma, con base en la revisión del objeto contractual, alcance técnico y recursos asignados, que este componente no es aplicable para el presente proyecto de estabilidad de taludes mediante pantallas ancladas.

**Proyecto protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural (No aplica)**

De acuerdo con lo indicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y en función del alcance técnico del contrato de obra, el Proyecto de Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural no aplica para la ejecución de las actividades constructivas correspondientes a la ejecución de obras de estabilización de taludes mediante pantallas ancladas.

El trazado de la obra, el tipo de intervención y los antecedentes de uso del suelo en el área de influencia no evidencian la existencia de zonas de potencial arqueológico, y por tanto, no se han definido medidas específicas de prospección ni recuperación de hallazgos previos al inicio de actividades.

Sin embargo, se aclara que, en caso de presentarse durante la ejecución de la obra algún hallazgo fortuito de fósiles, cerámicas, restos óseos, estructuras antiguas u otros elementos que puedan tener valor patrimonial o arqueológico, el contratista deberá suspender inmediatamente las labores en el área afectada, acordonar la zona, y dar aviso inmediato al antropólogo autorizado, así como a la interventoría, con el fin de activar el protocolo de reporte y manejo definido por el ICANH.

Estas acciones permitirán garantizar la conservación del patrimonio cultural material en caso de aparición de vestigios no previstos, en cumplimiento del principio de precaución y lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008 y demás normatividad aplicable.

**Proyecto de Gestión socio predial (No aplica)**

En el marco del desarrollo de la actividad constructiva correspondiente a la ejecución de obras de estabilización de taludes mediante pantallas ancladas, no se contempla la adquisición de predios o bienes inmuebles.

## 7 CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, el contratista implementó de manera adecuada las medidas establecidas en el Plan de Acción Socio Ambiental (PASA), cumpliendo con la normatividad vigente y garantizando el manejo responsable de residuos sólidos, materiales de construcción y emisiones atmosféricas.

Se evidenció una correcta clasificación, almacenamiento temporal y disposición final de residuos sólidos, reciclables y no aprovechables, con indicadores del 100% de cumplimiento en relación con la normativa aplicable (Resolución 2184 de 2019).

Mediante el Acta N.° 002 del 28 de octubre de 2025 se aprobó el aprovechamiento forestal de dieciocho (18) árboles ubicados en el frente de obra Halcón de Granada. Durante el mes de diciembre de 2025 se habilitaron actividades operativas en este frente; por lo tanto, se ejecutaron acciones asociadas a la tala o manejo forestal de 17 árboles.

Mediante el Acta N.° 002 del 17 de diciembre de 2025 se aprobó el aprovechamiento forestal de dieciocho (2) árboles ubicados en el frente de obra Brisas de Primavera los cuales cada uno de ellos presentan tres bifurcaciones cada uno y fueron inventariados de manera individual. Durante el mes de diciembre de 2025 no se ejecutaron acciones asociadas a la tala o manejo forestal de lo árboles presentes en este frente de obra.

Las acciones de control implementadas en transporte de materiales y uso de maquinaria permitieron prevenir procesos erosivos, emisiones fugitivas y contaminación de suelos o cuerpos de agua, contribuyendo a la mitigación de impactos ambientales negativos.

La instalación y funcionamiento de la oficina de atención a la comunidad es dentro del campamento de obra.

No se registraron afectaciones a la vegetación, fauna o áreas verdes de los sectores por fuera del área autorizada de intervención, dado que las actividades se ajustaron al principio de mínima intervención ambiental. Asimismo, la señalización y adecuación de campamentos se ejecutaron bajo parámetros técnicos y de seguridad, garantizando orden y mitigación de riesgos.

Los indicadores ambientales y sociales aplicados reflejan altos niveles de cumplimiento (superiores al 90% en la mayoría de los programas), lo que evidencia una gestión integral, preventiva y articulada entre contratista, interventoría y comunidad.

La interventoría concluye que el proyecto se desarrolla en coherencia con los objetivos contractuales, técnicos, sociales y ambientales, demostrando avances significativos en sostenibilidad, cumplimiento normativo y fortalecimiento de la confianza comunitaria.

## 8 RECOMENDACIONES

El contratista de interventoría recomienda al contratista de obra cumplir estrictamente las medidas de manejo forestal establecidas en el permiso ambiental, realizando la tala únicamente de los individuos autorizados, mediante técnicas controladas que minimicen impactos al entorno, garantizando la señalización del área, el uso de elementos de protección personal, la adecuada disposición del material vegetal y la limpieza final del área intervenida, atendiendo las observaciones formuladas por la interventoría.

Anexos:

1. Manejo de residuos sólidos
2. Certificado de disposición final
3. Documentos de vehículos tipo volqueta
4. RUCOM de proveedor de materiales
5. Mantenimiento de unidad sanitaria
6. Actas de aprovechamiento forestal
7. Capacitaciones socioambientales
8. Gestión social
   - 7.1 Volante informativo de oficina de atención a la comunidad
   - 7.2 Formato de atención a la comunidad para registro de PQRS
   - 7.3 Actas de vecindad de inicio (Halcón de granada y granadillo)

# ANEXO N. 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB | **REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS** | **Código:** | SST-F-96 |
| | | **Fecha:** | 27/07/2021 |
| | | **Versión:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera** | ORDINARIO __X_____ RECICLAJE _____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | | X | 1,2 | Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal. |
| 12/12/2025 | | X | 1,1 | |
| 19/12/2025 | | X | 1,5 | |
| 26/12/2025 | | X | 1,3 | |
| **TOTAL** | | | **5,1** | |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Brisas de Primavera** | ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X_____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | | X | 1,2 | Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | **1,2** | |

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma: 

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB | **REGISTRO DE MANEJO DE RESIDUOS** | **Código:** | SST-F-96 |
| | | **Fecha:** | 27/07/2021 |
| | | **Versión:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Halcón de Granada** | ORDINARIO __X_____ RECICLAJE _____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | | X | 0,5 | Los residuos sólidos generados y acopiados en el punto ecológico son entregados a la empresa de aseo de Piedecuesta, de acuerdo con las rutas de recolección de aseo municipal. |
| 12/12/2025 | | X | 0,8 | |
| 19/12/2025 | | X | 1,1 | |
| 26/12/2025 | | X | 1,5 | |
| **TOTAL** | | | **3,9** | |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:**<br>**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER."** | TIPO DE RESIDUO : |
| **LUGAR: Frente de obra Halcón de Granada** | ORDINARIO _____ RECICLAJE ___X_____ |

| FECHA | LIQUIDO | SÓLIDO | PESO (KG) | DESCRIPCIÓN DISPOSICIÓN FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | | X | 0,8 | Los residuos reciclabes generados en el periodo son almacenados temporalmente hasta obtener un volumen considerable para ser entregados a un gestor legalmente constituido para realizar su aprovechamiento. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | **0,8** | |

Revisó: Sandra Bermudez

Cargo: Ing. Ambiental

Firma: 

# ANEXO N. 2. CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

RCD
INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

# CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD Y/O APROVECHAMIENTO

La empresa **INVERSIONES NOTABLES INVERNOTA SAS** identificada con NIT 901.178.054-0, como prestador del servicio de Disposición Final, Manejo y/o Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD en la Escombrera **EL CAIRO** con autorización vigente por la Autoridad Ambiental, Corporación Autónoma para la Defensa de la meseta de Bucaramanga CDMB, certifica que:

| | | |
|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL GENERADOR** | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB | |
| **NIT** | 901.983.966 - 5 | |
| **DIRECCION DOMICILIO** | CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BODEGA 16 | |
| **TELEFONO CONTACTO** | 315 6675536 | |
| **DIRECCION ELECTRONICA** | conmitigacionptacdmb@hotmail.com | |
| **LUGAR DE GENERACIÓN** | SECTOR HALCON DE GRANADA PIEDECUESTA | |
| **PROYECTO GENERADOR** | "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER." | |
| **FECHA RECEPCIÓN RCD** | Del 02/12/2025 al 13/12/2025 | |
| **DESCRIPCION DE RCD RECEPCIONADO** | PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACION Y ADECUACION DE TERRENOS EN MATERIAL GRANULAR Y ROCOSO, HORMIGÓN, ARENAS, LADRILLOS, BLOQUES DE HORMIGÓN, CERÁMICAS, SOBRANTES DE CEMENTOS Y CONCRETOS, EXCAVACIONES, ARCILLAS. | |
| **VOLUMEN RECEPCIONADO (m3)** | 1540 | MIL QUINIENTOS CUARENTA METROS CUBICOS |
| **DESTINO FINAL RCD** | **APROVECHAMIENTO (m3)** | **DISPOSICION FINAL (m3)** |
| | | 1540 |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en el municipio de San Juan de Girón a los **DIECISIETE** días (17) días del mes de **DICIEMBRE de 2025.**

**JAVIER HUMBERTO DIAZ GOMEZ**
Administrador General

RCD
INVERNOTA
INVERSIONES NOTABLES

**invernota.rcd@gmail.com**
CENTRO INDUSTRIAL Y LOGISTICO SAN JORGE BG 16 TEL: 607-6159848

Powered by CamScanner

# ANEXO N. 3. DOCUMENTOS DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| | 2025 | 05 | 26 |

| VIGENCIA | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2025 | 06 | 01 |
| HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2026 | 05 | 31 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9310013958602 | WFD114 | VOLQUETA | PÚBLICO | 3760 | 2017 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | FOTON | BJ3122DEPFA-G2 | 13 - PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 89806243 | LVBDHPES3HN005000 | LVBDHPES3HN005000 | 6.05 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | 3102151720 | NT | 900849507 | BUCARAMANGA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 45268 | 9310 | 45268 | 9310013958602 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $839,200.00 | $436,300.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

$1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10011843214

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PLACA: WFD114 | MARCA: FOTON | LÍNEA: BJ3122DEPFA-G2 | MODELO: 2017 | |
| CILINDRADA CC: 3.760 | COLOR: AZUL | | SERVICIO: PÚBLICO | |
| CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA | TIPO CARROCERÍA: PLATON | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD KG/PAJ: 6050 | |
| NÚMERO DE MOTOR: 89806243 | | REG: N | VIN: LVBDHPES3HN005000 | |
| NÚMERO DE SERIE: LVBDHPES3HN005000 | | REG: N | NÚMERO DE CHASIS: LVBDHPES3HN005000 | REG: N |

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

IDENTIFICACIÓN: NIT 900849507

---

REGRABACIÓN MOVILIDAD: ******

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: 141

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352016000146112

I/E: I

FECHA IMPORT.: 10/05/2016

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 28/05/2016

FECHA EXP. LIC. TTO.: 31/05/2016

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02003920796

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183883996

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SUPERCAR LA CENTRAL

**NIT:** 901171195

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-011

**Fecha de expedición:** 2025/09/12

**Fecha de vencimiento:** 2026/09/12

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** WFD114

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FOTON

**MODELO:** 2017

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 3760

**NRO. MOTOR:** 89806243

**NRO. CHASIS:** LVBDHPES3HN005000

**VIN:** LVBDHPES3HN005000

**LÍNEA:** BJ3122DEPFA-G2

**COLOR:** AZUL

**NOMBRE PROPIETARIO:** MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

| FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO \| MES \| DÍA) | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO \| MES \| DÍA) |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-11-01 | 2026-10-31 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308007289163000 | TTW843 | CARGA O MIXTO | PUBLICO | 3760 | 2018 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHICULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 2 | FOTON | BJ3122DEPFA-G2 | PLATON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 89951806 | LVBDHPES4JN005111 | LVBDHPES4JN005111 | 6.05 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS, | *******720 | NI | 9008495071 | BUCARAMANGA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AT1324 | 43 | 999913588 | 0 | BOGOTA D.C |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 320 | $ 839200 | $ 436300 | $ 2400 |

**TOTAL A PAGAR**

$ 1277900

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13 [1] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 701,68 [2] | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 8,77 | |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | HASTA 180 / 750 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

**RECUERDE QUE:**

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

**Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017158711

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| TTW843 | FOTON | BJ3122DEPFA-G2 | 2018 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 3.760 | AZUL | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| VOLQUETA | PLATON | DIESEL | 6050 |

| NUMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 89951806 | N | LVBDHPES4JN005111 |

| NUMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| LVBDHPES4JN005111 | N | LVBDHPES4JN005111 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S | NIT 900849507 |

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 141 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 352017000435854 | I | 18/10/2017 | 2 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 02/11/2018 | 02/11/2018 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA





LT03002525739

MATRICULA: MAURICIO TAPIAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

# CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185644110

## DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

**Entidad que expide el certificado:** CDA SUPERCAR LA CENTRAL

**NIT:** 901171195

**No. de Certificado de Acreditación:** 20-OIN-011

**Fecha de expedición:** 2025/11/29

**Fecha de vencimiento:** 2026/11/29

## DATOS VEHÍCULO

**PLACA:** TTW843

**CLASE:** VOLQUETA

**MARCA:** FOTON

**MODELO:** 2018

**SERVICIO:** Público

**COMBUSTIBLE:** DIESEL

**CILINDRAJE:** 3760

**NRO. MOTOR:** 89951806

**NRO. CHASIS:** LVBDHPES4JN005111

**VIN:** LVBDHPES4JN005111

**LÍNEA:** BJ3122DEPFA-G2

**COLOR:** AZUL

**NOMBRE PROPIETARIO:** MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

# ANEXO N. 4. RUCOM DE PROVEEDOR DE MATERIALES

# Certificado

# Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2023090725706**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGREMAX SAS con NIT número 900723777 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 01-08-2025 hasta el 31-08-2026. Durante el mes de junio de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: RECEBO (MIG), MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONGLOMERADOS, ARENISCAS, CANTOS, GRAVAS, MACADAN; MACADAN ALQUITRANADO; GRAVILLA, LASCA Y POLVOS DE ROCA O PIEDRA, INCLUSO LOS DE LAS PIEDRAS DE LAS CLASES 1512 Y 1513 (EXCEPTO LOS DE LA SUBCLASE 37690), Y DEMAS ROCAS TRITURADAS O NO PARA CONSTRUCCIÓN, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS ELABORADAS (TRITURADAS, MOLIDAS O PULVERIZADAS), CONGLOMERADO (ROCA O PIEDRA)

Dado en Bogotá D.C., a los 01 dias del mes de agosto del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

BRAYAN LEANDRO GARCIA LOPEZ
**01-08-2025 03:32**

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

# ANEXO N. 5. MANTENIMIENTO DE UNIDAD SANITARIA

Polo

**MASSI**
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

14975

Cliente: Consorcio mitigación
Ubicación: Brisas de Primavera Campo: PTA
Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____
Fecha: 2 de dic. 2025

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: 2/12/25 2:50pm Juan Andrés Diaz
C.C. 1095802634
Firma: _____

Nombre Operador MASSI: Andrey
C.C.
Firma: Sierra

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón
FO19 - V01

Escaneado con CamScanner
Scanned with CamScanner

**MASSI**
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15259

Cliente: Consorcio Mitigacion.

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 5 de Dic 2025

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | - |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

5/12/24 11:30AM

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz Firma: _____

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrey Firma: Sierra.

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724



Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15233

Cliente: Cons Mitigacion

Ubicación: Brisas Campo: Primavera

Hora de Inicio: 1:30 Hora Final: 1:45

Fecha: 9-Dic-25

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: 9/12/25 1:40pm Firma:

Juan Andres Diaz

C. C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

FREDDY

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Scanned with CamScanner

**MASSI**
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15186

Cliente: Consorcio mitigacion.

Ubicación: Brisas 2c Campo: Primavera PHa

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 12 de Dic 2025

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Firma:

Heidy Garcia

C. C.

Nombre Operador MASSI: Firma:

Andrey Sierra

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón



Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15378

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Brisas de Campo Primavera

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 16 de Diciembre 2025

| TIPO USP / TANQUE | CANT. |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: 16/12/25 10:50 AM Firma:

Juan Andres

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrey Sierra. Firma:

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón



Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15199

Cliente: Consorcio mitigacion

Ubicación: Brisas de Campo: Primavera P/de

Hora de Inicio: 12:05. Hora Final: 12:20 pm

Fecha: 19 de Dic 2025.

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: NO Presente en obra

Nombre de quien Revisó: Firma:

C.C.

Nombre Operador MASSI: Andres Firma: Sierra

C.C.

IMPRESO POR: CONTABILIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón

FO19 - V01

Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15506

Cliente: Cons Mitigacion
Ubicación: Brisas De Campo: Primavera
Hora de Inicio: 12:50 Hora Final: 1:05
Fecha: 23-Dic-25

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz 23/12/25 1:30pm Firma:
C. C.

Nombre Operador MASSI: FREDDY Firma:
C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón


Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15469

Cliente: Consorcio mitigación

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: P/Fa

Hora de Inicio: _____ Hora Final: _____

Fecha: 26 de Dic 2025.

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones: _____

Nombre de quien Revisó: + C/S Sergio Sanchez Firma: _____

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrey Sierra Firma: _____

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón



Scanned with CamScanner

MASSI
MÁS SOLUCIONES INTEGRALES COLOMBIA S.A.S.

NIT. 901.380.775-7

# PROCESO DE OPERACIONES SERVICIO AL CLIENTE

15523

Cliente: Consorcio Mitigacion

Ubicación: Brisas de Primavera Campo: Plta

Hora de Inicio: Hora Final:

Fecha: 30 de Dic 2025

| TIPO USP / TANQUE | CANT |
|---|---|
| USP Propiedad de MASSI | 1 |
| USP Propiedad Cliente | |
| Pozo Séptico | |
| ISOTANQUE | |

**INSUMOS UTILIZADOS**

| UNIDADES | | | VOLUMEN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PH | R | BB | GAL | LTS | MTS |
| 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Observaciones:

30/12/25 11:20PM

Nombre de quien Revisó: Juan Andres Diaz Firma:

C. C.

Nombre Operador MASSI: Andrej Sierra Firma:

C. C.

IMPRESO POR: IDENTIDAD 310 - 30 94 724

Cel: 317 681 9912 contabilidadmassi@gmail.com Cra. 6 No. 11-05 Bodg 01 Girón



Scanned with CamScanner

# ANEXO N. 6. ACTA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
| | ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5 | ACTA DE REUNIÓN | | |

| | |
|---|---|
| **TEMA:** | CONTRATO No. 210.162236.6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OBJETO DE DESARROLLAR EL CONTRATO DE OBRA NUMERO No. 210.162236.6 |
| **LUGAR:** | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB |

| **ACTA No** | **FECHA** | | |
|---|---|---|---|
| | DD | MM | AA |
| 002 | 17 | 12 | 2025 |
| **Hora Inicio** | 9:00 m | | |
| **Hora final** | 10:00 am | | |

**AGENDA**

| No. | ORDEN DEL DIA | RESPONSABLE |
|---|---|---|
| 1 | SALUDO A LOS ASISTENTES | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| 2 | CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL SECTOR DE BRISAS DE PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ<br>LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL |
| 3 | CONCLUSIONES DE LA REUNION | |
| 4 | | |

| No. | DESARROLLO ORDEN DEL DÍA |
|---|---|
| 1 | El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención de individuos arbóreos en el Sector Brisas de Primavera, Municipio de Piedecuesta Santander, en el marco de ejecución de la obra de "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER**)", se ubica en el sector de brisas de Primaveras, en el municipio de Piedecuesta. |

2

El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita a la obra de construcción ubicada en el barrio brisas de Primavera, en donde se verificó que para el sector donde se desarrolla la obra de mitigación por cuenta del Contratista **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** y donde existen 2 individuos arbóreos, que se encuentran en el área de intervención para la mitigación y así disminuir la amenaza por Erosión y fenómenos de remoción en masa, obras que coadyuvan a salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

| No Consecutivo | Nº Indv.Pred | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | D.A.P. (cm) | ALTURA COMERCIAL (m) | ALTURA TOTAL (m) | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN TOTAL ($M^3$) | BIOMASA (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 16,23 | 3,1 | 9,0 | 0,04 | 0,1229 | 67,6209 |
| | 72 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 19,10 | 6,5 | 8,8 | 0,11 | 0,1664 | 91,5130 |
| | 73 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 6,5 | 8,8 | 0,08 | 0,1155 | 63,5507 |
| 2 | 78 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 14,96 | 3,9 | 10,5 | 0,04 | 0,1218 | 67,0012 |
| | 79 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 33,42 | 5,8 | 10,5 | 0,31 | 0,6080 | 334,3995 |
| | 80 | Benjamina | *Ficus benjamina* | 15,92 | 5,0 | 9,8 | 0,06 | 0,1287 | 70,7724 |
| TOTAL | | | | | | | 0.63 | 1,15 | 694,86 |

De acuerdo con el inventario forestal del proyecto, en el área de intervención se identificaron dos (2) individuos fustales, cada uno con tres bifurcaciones principales, razón por la cual fueron inventariados de manera independiente, asignándoles los códigos 71, 72 y 73 para el primer individuo y 78, 79 y 80 para el segundo. En conjunto, estos individuos presentan un volumen total acumulado de 1,15 $m^3$, un volumen comercial de 0,63 $m^3$ y una ocupación basal total de 0,1944 $m^2$.

| | |
|---|---|
| | La Ingeniería Lissette Ximena Niño indica que el objeto del aprovechamiento de los 02 individuos presentes en el área de desarrollo de la obra, se ve justificado por la necesidad de intervenir el talud presente, aumentando los factores de seguridad a la dovela de deslizamiento mediante la construcción de pantallas ancladas, a su vez controlando los fenómenos de erosión por los fenómenos de intemperismo con la colocación del concreto lanzado y como se ha mencionado reduciendo la condición de vulnerabilidad y riesgo de los sectores, garantizando la protección de la vida y bienes los sus habitantes.<br><br>Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los arboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en las tablas 4, 5 y 6 se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 05 de Noviembre de 2025. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas. |
| 3 | La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el informe de inventario Forestal allegado, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar el aprovechamiento forestal de las especies relacionadas en el informe de inventario forestal en las tablas 4, 5, y 6, para el Sector de Brisas de Primavera, toda vez que será desarrolladla en el sector una obra de mitigación que protegerá las vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.<br><br>Por lo anterior la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT AUTORIZA las Intervenciones que se deben realizar con el fin de desarrollar las obras de mitigación, las cuales tiene por fin principal reducir la amenaza y salvaguardar la vida, bienes y Enseres de todos los habitantes localizados en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos. |

Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** hacer el seguimiento de cada individuo talado que se realice enmarcado en las recomendaciones del inventario forestal y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.

Como Medida de Compensación por la intervención de las especies relacionadas anteriormente, **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA,** deberá realizar la plantación de Ciento Setenta **(30) árboles** de la especie nativas *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 70 cm, las cuales deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, preferiblemente dentro del mismo predio, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.**

La medida de compensación deberá iniciar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir dela aprobación del Plan de compensación; se deberá realizar su respectivo mantenimiento por un término de tres (03) años, con una preciosidad de seis (06) mantenimientos en el primer año, cuatro (04) mantenimientos en el segundo año y tres mantenimientos en el tercer año, para un total de 13 mantenimientos en los tres años, los cuales se realizarán con las condiciones técnicas de control fitosanitario y fertilización, así como podas de formación y mantenimiento

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.

Los productos obtenidos del aprovechamiento como: madera rolliza (horcones, postes) tablas, cuartón, listón, vigas, bloques, varas, leña, carbón entre otros, no podrán ser transportados fuera del área del proyecto ni comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo, lejos de fuentes hídricas. Estos productos se deben utilizar dentro del predio para la reparación de cercas arreglos locativos y demás de uso doméstico si así se requiere y pueda darse su uso.

No se permite la tala de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

| No. | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento a las actividades de tala | CONSORCIO INTERPIEDECUESTA | Durante el proceso de aprovechamiento |
| 2 | Presentación de Informe de tala a la CDMB | CONSORCIO INTERPIEDECUESTA | Informe mensual una vez se inicie la tala |
| 3 | Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento. | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA | Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta |

| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
|---|---|---|---|
| | ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5 | ACTA DE REUNIÓN | | |

| PRÓXIMA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | ---------- | HORA: | ---------- | LUGAR: | ---------- |

| Elaboró Acta | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ | COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 | |
| **Revisó Acta** | **Cargo** | **Firma** |
| CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA | SUBDIRECTOR SURYT | |

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

| NO. | NOMBRE COMPLETO | GÉNERO | | CARGO U OFICIO | ENTIDAD U ORGANIZACION | TELEFONO FIJO / CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | | | | | |
| 1 | CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA | X | | SUBDIRETOR SURYT | CDMB | 3167560000 | Carlos.diaz@cdmb.gov.co | |
| 2 | JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ | X | | COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 | GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO - | 3202090759 | Jesus.sanchez@cdmb.gov.co | |
| 3 | LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL | | X | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA | 3123551214 | conmitigacionptacdmb@hotmail.com | |
| 4 | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS | | X | INTERVENTORIA AMBIENTAL | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA | 3108606047 | coedcosas@gmail.com | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CDMB | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B. | | |
| | ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas | REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC | APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL |
| CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5 | ACTA DE REUNIÓN | | |

| | |
|---|---|
| **TEMA:** | CONTRATO No. 210-162236-6: SOLICITUD DE INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL BARRIO HALCÓN DE GRANADA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OBJETO DE DESARROLLAR EL CONTRATO DE OBRA NUMERO No. 210-162236-6 |
| **LUGAR:** | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB |

| **ACTA No** | **FECHA** | | |
|---|---|---|---|
| | DD | MM | AA |
| 001 | 28 | 10 | 2025 |
| **Hora Inicio** | 3:00 pm | | |
| **Hora final** | 4:00 pm | | |

| **AGENDA** | | |
|---|---|---|
| **No.** | **ORDEN DEL DIA** | **RESPONSABLE** |
| 1 | SALUDO A LOS ASISTENTES | CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA |
| 2 | CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN EL SECTOR DE HALCON DE GRANADA, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER | JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ<br>LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL |
| 3 | CONCLUSIONES DE LA REUNION | |
| 4 | | |

| No. | DESARROLLO ORDEN DEL DÍA |
|---|---|
| 1 | El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención de individuos arbóreos en el Sector Halcón de Granada, Municipio de Piedecuesta Santander, en el marco de ejecución de la obra de "**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER)**", se ubica en el sector Halcón de Granada, en el municipio de Piedecuesta. |

2

El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita a la obra de construcción ubicada en el barrio Halcón de Granada, en donde se verificó que para el sector donde se desarrolla la obra de mitigación por cuenta del Contratista **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** y donde existen 18 individuos arbóreos, que se encuentran en el área de intervención para la mitigación y así disminuir la amenaza por Erosión y fenómenos de remoción en masa, obras que coadyuvan a salvaguardar la vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.

**Tabla 3.Inventario Forestal**

| Consecut | N° Ind. Pred | NOMBRE COMUN | ESPECIE | C.A.P. Tot (m) | D.A.P. (m) | ALTURA COMERCIAL (m) | ALTURA TOTAL (m) | AREA BASAL | VOLUMEN COMERCIAL | VOLUMEN FUSTE | VOLUMEN DE COPA | VOLUMEN TOTAL | BIOMASA (Kg) | CARBONO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Resbalamicos | *Bursera simaruba* | 0,39 | 0,12 | 3 | 6 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 23,97 | 10,78 |
| 2 | 2 | Guayacan | *Tabebuia rosea* | 0,89 | 0,28 | 3 | 8 | 0,06 | 0,11 | 0,30 | 0,03 | 0,33 | 166,41 | 74,88 |
| 3 | 3 | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,72 | 0,23 | 3 | 8 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 108,91 | 49,01 |
| 4 | 4 | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,85 | 0,27 | 3 | 7 | 0,06 | 0,10 | 0,24 | 0,02 | 0,27 | 132,81 | 59,77 |
| 5 | 4A | Ciruelo | *spondias pinnata* | 0,70 | 0,22 | 3 | 7 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 90,07 | 40,53 |
| 6 | 5 | Guanabano | *Tabebuia rosea* | 0,52 | 0,17 | 2,5 | 6 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 42,61 | 19,17 |
| 7 | 6 | Aguacate | *Persea americana* | 0,40 | 0,13 | 3 | 7 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 29,41 | 13,24 |
| 8 | 7 | Aguacate | *Persea americana* | 0,44 | 0,14 | 3 | 8 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 39,75 | 17,89 |
| 9 | 8 | Nauno | *pithecellobium dulce* | 0,74 | 0,24 | 3 | 9 | 0,04 | 0,08 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 129,42 | 58,24 |
| 10 | 9 | Aguacate | *Persea americana* | 0,58 | 0,18 | 2 | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 70,67 | 31,80 |
| 11 | 10 | Nauno | *Albizia saman* | 0,56 | 0,18 | 4 | 12 | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 98,82 | 44,47 |
| 12 | 11 | Nauno | *Albizia saman* | 0,37 | 0,12 | 4 | 7 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 25,17 | 11,32 |
| 13 | 12 | Caballero de la noche | *Cestrum nocturnum* | 0,35 | 0,11 | 1,7 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 16,08 | 7,24 |
| 14 | 13 | Nauno | *Albizia saman* | 0,60 | 0,19 | 4 | 12 | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 113,45 | 51,05 |
| 15 | 14 | Aguacate | *Persea americana* | 0,57 | 0,18 | 3 | 10 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,02 | 0,17 | 85,32 | 38,39 |
| 16 | 15 | Aguacate | *Persea americana* | 0,48 | 0,15 | 3 | 11 | 0,02 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 66,55 | 29,95 |
| 17 | 16 | Aguacate | *Persea americana* | 0,56 | 0,18 | 4 | 13 | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 105,16 | 47,32 |
| 18 | 17 | Aguacate | *Persea americana* | 1,08 | 0,34 | 4 | 15 | 0,09 | 0,22 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 459,45 | 206,75 |
| **TOTAL** | | | | | | | | **0,57** | **1,10** | **3,28** | **0,33** | **3,61** | **1804,04** | **811,82** |

De acuerdo con el inventario forestal del proyecto, los 18 individuos fustales presentes en el área de intervención del proyecto suman un volumen total acumulado de 3.61 m3 y Volumen comercial por razón de 1.10 m3, siendo la ocupación basal total de 0.57 m2. La Biomasa Aérea Total acumulada por los individuos presentes en el área de intervención del proyecto es de 1804.04 kg de los cuales 811.82 kg corresponden al carbono capturado.

Las especies que contienen la mayor proporción de biomasa es, Persea americana representada por el 47.47%, de la biomasa y carbono total acumulado. El 52.53% restante es representados por las demás especies, siendo estas las que presentaron menores diámetros ya que la determinación de la biomasa depende principalmente del diámetro a la altura del pecho.

Igualmente se corroboro que dentro de las zonas a intervenir se encontraron 07 especies de árboles que son los referenciados en las tablas anteriores para la tala, como se muestra a continuación:

| NOMBRE CIENTIFICO | CANTIDAD |
|---|---|
| Persea americana | 7 |
| Albizia saman | 3 |
| spondias pinnata | 3 |
| Tabebuia rosea | 2 |
| Bursera simaruba | 1 |
| Cestrum nocturnum | 1 |
| pithecellobium dulce | 1 |
| **TOTAL** | **18** |

La Ingeniería Lissette Ximena Niño indica que el objeto del aprovechamiento de los 18 individuos presentes en el área de desarrollo de la obra, se ve justificado por la necesidad de intervenir el talud presente, aumentando los factores de seguridad a la dovela de deslizamiento mediante la construcción de pantallas ancladas, a su vez controlando los fenómenos de erosión por los fenómenos de intemperismo con la colocación del concreto lanzado y como se ha mencionado reduciendo la condición de vulnerabilidad y riesgo de los sectores, garantizando la protección de la vida y bienes los sus habitantes.

Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los arboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en las tablas 4, 5 y 6 se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 27 de Otubre de 2025. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los

| | |
|---|---|
| | asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas. |
| 3 | La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el informe de inventario Forestal allegado, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar el aprovechamiento forestal de las especies relacionadas en el informe de inventario forestal en las tablas 3, 4, y 5, para el Sector de Halcón de Granada, toda vez que será desarrolladla en el sector una obra de mitigación que protegerá las vida de los habitantes del sector, la seguridad territorial y la infraestructura de servicios públicos.<br><br>Por lo anterior la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT AUTORIZA las Intervenciones que se deben realizar con el fin de desarrollar las obras de mitigación, las cuales tiene por fin principal reducir la amenaza y salvaguardar la vida, bienes y Enseres de todos los habitantes localizados en el margen derecho del rio de oro en el sector centro abastos.<br><br>Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA** hacer el seguimiento de cada individuo talado que se realice enmarcado en las recomendaciones del inventario forestal y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.<br><br>Como Medida de Compensación por la intervención de las especies relacionadas anteriormente, **CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA,** deberá realizar la plantación de Noventa **(90) árboles** de la especie nativas *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 70 cm, las cuales deben dirigirse a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de conservación efectiva, preferiblemente dentro del mismo predio, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.** |

La medida de compensación deberá iniciar a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir dela aprobación del Plan de compensación; se deberá realizar su respectivo mantenimiento por un término de tres (03) años, con una preciosidad de seis (06) mantenimientos en el primer año, cuatro (04) mantenimientos en el segundo año y tres mantenimientos en el tercer año, para un total de 13 mantenimientos en los tres años, los cuales se realizarán con las condiciones técnicas de control fitosanitario y fertilización, así como podas de formación y mantenimiento

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.

Los productos obtenidos del aprovechamiento como: madera rolliza (horcones, postes) tablas, cuartón, listón, vigas, bloques, varas, leña, carbón entre otros, no podrán ser transportados fuera del área del proyecto ni comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo, lejos de fuentes hídricas. Estos productos se deben utilizar dentro del predio para la reparación de cercas arreglos locativos y demás de uso doméstico si así se requiere y pueda darse su uso.

No se permite la tala de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

| No. | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento a las actividades de tala | CONSORCIO INTERPIEDECUESTA | Durante el proceso de aprovechamiento |
| 2 | Presentación de Informe de tala a la CDMB | CONSORCIO INTERPIEDECUESTA | Informe mensual una vez se inicie la tala |
| 3 | Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento. | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA | Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta |

| PRÓXIMA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | ---------- | HORA: | ---------- | LUGAR: | ---------- |

| Elaboró Acta | Cargo | Firma |
|---|---|---|
| JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ | COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 | |
| **Revisó Acta** | **Cargo** | **Firma** |
| CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA | SUBDIRECTOR SURYT | |

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

| NO. | NOMBRE COMPLETO | GÉNERO | | CARGO U OFICIO | ENTIDAD U ORGANIZACION | TELEFONO FIJO / CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | F | | | | | |
| 1 | CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA | X | | SUBDIRETOR SURYT | CDMB | 3167560000 | Carlos.diaz@cdmb.gov.co | |
| 2 | JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ | X | | COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14 | GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO - | 3202090759 | Jesus.sanchez@cdmb.gov.co | |
| 3 | LISSETTE XIMENA NIÑO CARVAJAL | | X | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA | 3123551214 | conmitigacionptacdmb@hotmail.com | |
| 4 | EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS | | X | INTERVENTORIA AMBIENTAL | CONSORCIO INTER PIEDECUESTA | 3108606047 | coedcosas@gmail.com | |

# ANEXO N. 7. CAPACITACIONES SOCIOAMBIENTALES

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☑ CHARLA ☐

OBRA Consorcio mitigación Riohacha.

TEMA DE CAPACITACIÓN Política Ambiental y Política de Orden y Aseo

LUGAR: frente de obra FECHA 12 DIC 2025

CAPACITADOR Yaggeec Pinilla DURACIÓN 30 min.

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ospino | 1050774060 | Ayudante obra | |
| 2 | Genaro Mendoza | 91291101 | oficial | |
| 3 | Harley Prada Lopez | 1098822951 | operador | Harley Prada |
| 4 | Juan Andres Diaz | 1095802634 | Almacenista | |
| 5 | Yeiner García | 1005182293 | operador Perf. | |
| 6 | Luis A. Fuentes | 1098.699.422 | Aux de Perf | |
| 7 | Alexander Prada L. | 1374573G | Ayudante P. | Alexander Prada |
| 8 | Lisalberto prada | 5.69182 | Ayudante | |
| 9 | Jefferson Gonzalez | 5823211 | Ayudante | |
| 10 | Andrés garcia | 6565491 | Ayudante | |
| 11 | Mauricio Suarez | 1100890118 | OP | |
| 12 | Mauricio villamizar | 1007541892 | Operador | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

CAPACITADOR

Yaggeec Pinilla

FIRMA

| | FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES | Código | RH-F-28 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 31/10/2022 |
| | | Versión | 2 |
| | | Página | 1 de 1 |

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: CONTRATO DE OBRA No. 210 16223.6 - CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB - "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE

TEMA DE CAPACITACIÓN: Fortalecimiento de valores (emprendimiento), educación vial y oficina de atencion a la comunidad

| LUGAR: Campamento en obra - Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB | | FECHA: | 10/12/2025 |
|---|---|---|---|
| CAPACITADOR | ALBA LUCÍA SANTOS RUEDA | DURACIÓN: | 30 MINUTOS |

| No. | PARTICIPANTE | CEDULA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres garcia | 6566492 | AYUDANTE | |
| 2 | Jose Ospino | 7090779066 | AYUDANTE | |
| 3 | [illegible] | #1209110 | [illegible] | |
| 4 | Harley Prada lopez | 1098822451 | Operador | Harley Prada |
| 5 | Juan Andres Diaz | 1095801634 | Almacenista | |
| 6 | Luis A. Tejeiro M. | 1098699422 | Aux de Pert | |
| 7 | Alejandro Prada L. | 1374523 | Ayudante B. | |
| 8 | Mauricio [illegible] | 1005911892 | Operador | |
| 9 | Mauricio Suarez | 1100890118 | OP | |
| 10 | Yeiner Garcia | 7005182293 | operador | |
| 11 | Jefferson Gonzalez | 5823211 | AYUDANTE | |
| 12 | Luis Alberto prada | 5.091.899 | Ayudante | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

OBSERVACIONES:

| CAPACITADOR |
|---|
| |
| FIRMA |

# ANEXO N. 8. GESTIÓN SOCIAL

**8.1 VOLANTE INFORMATIVO DE OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

**8.2 FORMATO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PARA REGISTRO DE PQRS**

**8.3 ACTAS DE VECINDAD DE INICIO (HALCÓN DE GRANADA Y GRANADILLO)**

# ANEXO 8.1 VOLANTE INFORMATIVO DE OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Volante: 01

# INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

## La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrio Brisas de Primavera I

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

Volante: 02

# INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

## La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB
Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728
Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

**ANEXO 3. VOLANTE INFORMATIVO A LA COMUNIDAD DEL BARRIO HALCÓN DE GRANADA PARA CONOCIMIENTO DE LOS RESIDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA OBRA DE CONTROL A LA EROSIÓN.**

Volante: 02

**INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

**La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y el Consorcio Mitigación Piedecuesta CDMB**

Informa a los actores sociales, líderes, Alcaldía, Personería, sector comercial, financiero, comunidad y residentes del área de influencia directa de la obra de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3, la oficina de atención a la comunidad, así:

Dirección: Campamento de Obra, barrios Halcón de Granada y Granadillo

Horario: De lunes a viernes

Hora: De 8 a 10:00 a.m.

En esta oficina usted puede presentar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y demás, en temas civiles, ambientales y sociales para ser atendidos por el Consorcio MITIGACIÓN Piedecuesta CDMB.

**MAYOR INFORMACIÓN**

**Contratista:** CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB

Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16 Tel: 3115557728

Correo electrónico:: conmitigacionptacdmb@hotmail.com

**ANEXO 4. ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS EN EL BARRIO HALCÓN DE GRANADA DE PIEDECUESTA**

# ANEXO 8.2 FORMATO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD PARA REGISTRO DE PQRS

| | RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS. F-113 | | |
|---|---|---|---|
| | Revisión: 00 | Fecha de revisión: Julio de 2019 | Página 1 de 1 |

**CONTRATO DE OBRA No. 210.16223.6**
**CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB**
**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA – GRUPO 3: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".**

PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - PROYECTO ATENCIÓN A LA COMUNIDAD -
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

| **Fecha:** DD / MM / AA | **Consecutivo:** |
|---|---|

| **Método de Recepción** | | | | | **Lugar Recepción** | | **Tipo de petición:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P ___ | T ___ | CP___ | CE___ | CO___ | Oficina__ | Obra___ | P ___ | Q ___ | R ___ | S ___ |
| **Nombre del solicitante:** | | | | | | | | | | |
| **Tipo de documento:** | | NIT ___ | | C.C ___ | | C.E ___ | No. | | | |
| **Dirección:** | | | | | **Teléfono:** | | | **Municipio:** | | |
| **Correo electrónico:** | | | | | | | | | | |
| **Lugar del incidente:** | | | | | | | | | | |

| **Asunto de la PQRS:** |
|---|
| |
| **Anexos:** Fotocopia de la cédula de ciudadanía, pase, tarjeta de propiedad, SOAT, RUT, Diagnósticos médicos, incapacidades (*los que se requieran para cada caso a estudiar*) |

_____
**Firma solicitante (reclamante)**

| **Residente de obra y/o encargado del proyecto** | **Encargado atención PQRS:** |
|---|---|
| Nombre: | Nombre: |
| Firma: | Firma: |
| Cédula: | Cédula: |
| Fecha revisión: DD/MM/AA | Fecha revisión: DD/MM/AA |

Este caso es enviado al Comité de Obra y PQRS, para el estudio, análisis, revisión y respuesta, junto con la documentación requerida al reclamante, se debe entregar respuesta para el cierre de la PQRS, por escrito por parte del Contratista, a conformidad o no conformidad del reclamante, en un tiempo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recibido.

**SIGLAS**
**TIPO DE SOLICITUD:** P-Petición, Q-Queja, R-Reclamo, S-Sugerencia
**METODO DE RECEPCION:** P-Personal, T-Telefónica, CP-Competencia, CE- Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física
**ESTADO:** A-Abierto, C-Cerrado

CONSORCIO MITIGACIÓN PIEDECUESTA CDMB Centro industrial logístico San Jorge Bodega 16
Tel: 3115557728
Correo electrónico: conmitigacionptacdmb@hotmail.com
