UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERRA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

26	14/03/2019	Peso especifico y absorcion del agregado fino	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	2	2,47	cumple	SI	
27	14/03/2019	Modulo de finura	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	3	3	cumple	SI	
28	14/03/2019	Equivalente de arena	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	minimo 60%	79,52%	SI	
29	14/03/2019	Valor de azul de metileno agragados finos	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	menor 5	3	SI	
30	14/03/2019	Peso especifico y absorcion del agregado grueso	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	menor 4	0,82	SI	
31	14/03/2019	Desgaste maquina de los Angeles	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	Maximo 50%	40%	SI	
32	14/03/2019	porcentaje caras fracturadas	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	Minimo 50%	81,9	SI	
33	14/03/2019	indice de forma particulas alargadas agregado grueso	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	Maximo 25%	13,1	SI	
34	14/03/2019	indice de forma particulas alargadas agregado grueso	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040	1	Maximo 25%	17,4	SI	
35	14/03/2019	Determinacion de terrones de arcilla y particulas desleznables en los agregados	Art, 630-13	Caja de encole margen izq. PR 6+040		Maximo 0.25	0	SI	
36	21/03/2019	Granullometria agregado fino para concreto	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1		cumple	SI	
37	21/03/2019	Granullometria agregado grueso para concreto	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1		cumple	SI	
38	21/03/2019	Peso especifico y absorcion del agregado fino	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	2	2,46	cumple	SI	
39	21/03/2019	Modulo de finura	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	3	3	cumple	SI	
40	21/03/2019	Equivalente de arena	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	minimo 60%	77,57%	SI	
41	21/03/2019	Valor de azul de metileno agregado sgrueso	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	menor 5	3	SI	
42	21/03/2019	Peso especifico y absorcion del agregado grueso	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	menor 4	0,84	SI	
43	21/03/2019	porcentaje caras fracturadas	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	Minimo 50%	83,2	SI	
44	21/03/2019	indice de forma particulas alargadas agregado grueso	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	Maximo 25%	12,7	SI	
45	21/03/2019	indice de forma particulas alargadas agregado grueso	Art, 630-13	Caja de descole e margen izq. PR 6+201	1	Maximo 25%	17,5	SI	
46	5/03/2019	Analisis granulometrico y limites de consistencia	Art, 230-13	Subbase granular	3		cumple	SI	
47	5/03/2019	Determinacion de contenido organico	Art 121/13	Subbase granular muestra No- 13	1	0	cumple	SI	
48	5/03/2019	Equivalente de arena	E-133	Subbase granular muestra No- 13	1	minimo 25%	30,08%	SI	
49	13/03/2019	Analisis granulometrico por tamizado	E-123-125-126	Subbase granular muestra No- 14			cumple	SI	
50	13/03/2019	Equivalente de arena	E-133	Subbase granular muestra No- 14	1	minimo 25%	32,30%	SI	
51	23/03/2019	Analisis granulometrico por tamizado	E-123-125-126	Subbase granular muestra No- 13			cumple	SI	
52	23/03/2019	Equivalente de arena	E-133	Subbase granular muestra No- 13	1	minimo 25%	33,01%	SI	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	3

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERRA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

53	23/03/2019	Desgaste maquina de los Angeles	Art, 320-13	Subbase granular muestra No- 13	1	Maximo 50%		SI	
54	23/03/2019	ensayo de modificado de compactacion	Art 220-230	Subbase granular muestra No- 13	1	densidad max=2.22 humeda optima 7.1	cumple	SI	
55	23/03/2019	CBR compactado sobre muestras inalteradas	E-148	Subbase granular muestra No- 13	1	minimo 30%			
56	23/03/2019	Perdida en Sulfatos	E-220	Subbase granular muestra No- 13	1	menor 12	5,88	SI	
57	23/03/2019	Perdida en Sulfatos	E-220	Subbase granular muestra No- 13	1	menor 12	1,58	SI	
	Ensayo a la compresion			Edad en dias					
	Fecha DE FUNDIDA	**elemento fundido**	**Art, 630-13**	**3 Dias (Mpa)**	**7 Dias (Mpa)**	**14 Dias (Mpa)**	**28 Dias (Mpa)**		
58	1/03/2019	Tuberia de 36 pulg	Art, 630-13	12,2	20,4	25,6	28	SI	concreto de 28 Mpa
59	2/03/2019	Tuberia de 36 pulg	Art, 630-13	13	19,8	25,7	28	SI	concreto de 28 Mpa
60	4/03/2019	caja de encole margen derecho pr5+660	Art, 630-13	11,5	18,4	19,4	21	SI	concreto de 21 Mpa
61	5/03/2019	Tuberia de 36 pulg	Art, 630-13	12,1	20,9	26,4		SI	concreto de 28 Mpa
62	5/03/2019	caja de encole margen izquierdo PR5+835	Art, 630-13	10,6	16,6	19,4	28,9	si	concreto de 21 Mpa
63	6/03/2019	caja de descole margen derecho PR6+040	Art, 630-13	11,6	16,9	19,7			concreto de 21 Mpa
64	7/03/2019	Tuberia de 36 pulg	Art, 630-13	13,9	21,5	25,7			concreto de 28 Mpa
65	11/03/2019	Zarpa de entrada PR6+655	Art, 630-13		21,5				concreto de 21 Mpa
66	12/03/2019	Descole Aleta margen derecho PR6+570			14,6				concreto de 21 Mpa
67	12/03/2019	Muro seccion modulo 1 PR6+555			17,8				concreto de 28 Mpa
68	13/03/2019	Muro seccion modulo 2 PR6+555			15,4				concreto de 28 Mpa
69	13/03/2019	Tuberia de 36 pulg			19,9				concreto de 28 Mpa
70	14/03/2019	caja de encole margen izquierdo PR6+040			15,1				concreto de 21 Mpa
71	16/03/2019	Zarpa de muro modulo 1 PR2+240			15,3				concreto de 28 Mpa
72	18/03/2019	Caja de encole margen izquierdo PR6+570			15				concreto de 21 Mpa
73	18/03/2019	Tuberia de 36 pulg			19,5				concreto de 28 Mpa
74	19/03/2019	Muro modulo 1 margen derecho PR 2+240			20,9				concreto de 28 Mpa
75	20/03/2019	Muro modulo 1 cabezote margen derecho			20,5				concreto de 28 Mpa
76	21/03/2019	descole margen izquierdo PR6+201			15,3				concreto de 21 Mpa
77	22/03/2019	Muro modulo 2 margen detrecho PR2+240							concreto de 28 Mpa
78	25/03/2019	Descole margen derecho PR6+935							concreto de 21 Mpa
79	25/03/2019	Tuberia de 36 pulg							concreto de 28 Mpa
80	18/12/2018	muro modulo #5 margen derecho pr2+876	Art, 630-13	12,4	20,5	26	28,6	si	concreto de 28 Mpa
81	19/12/2018	muro modulo #4 margen derecho pr2+876	Art, 630-13	12	20	25,5	28,7	si	concreto de 28 Mpa
82	19/12/2018	Cortina descole margen derecho pr2+900	Art, 630-13	9,4	14,8	19,5	21,9	si	concreto de 21 Mpa
83	22/12/2018	Caja encole margen izquierdo pr2+900	Art, 630-13	8,8	15,5	19,6	21,5	si	concreto de 21 Mpa
84	18/12/2018	muro modulo #5 margen derecho pr2+876	Art, 630-13	12,4	20,5	26	28,6	si	concreto de 28 Mpa
85	19/12/2018	muro modulo #4 margen derecho pr2+876	Art, 630-13	12	20	25,5	28,7	si	concreto de 28 Mpa
86	14/01/2019	Caja encole margen izquierdo pr 0+900	Art, 630-13	9,5	15,6				concreto de 21 Mpa
87	17/01/2019	encole margen izquierdo pr0+450	Art, 630-13	9,2	15,2				concreto de 21 Mpa
88	19/01/2019	Caja encole margen izquierdo pr+290	Art, 630-13	9,6					concreto de 21 Mpa
89	21/01/2019	Pantalla derecha box margen derecho pr3+660	Art, 630-13	11,9					concreto de 21Mpa
90	22/01/2019	Pantalla izquierda box margen izquierdo pr3+660	Art, 630-13	12,4					concreto de 21Mpa

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: JUAN CAMILO SILVA

Director de Obra

Matrícula No.: 25202-090884

Firma

Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-28306 CND,

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO**	CODIGO:	OFA CSC-14
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	15-jul.-15

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA: 27 de marzo del 2019

EMPRESA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

NORMA: ART. 630-13 E- 410 INVIAS / NTC 673

MUESTRA: AGREGADOS ARENA HERRERA Y GRAVILLA PLANTA OLAYA-HERRERA - CEMEX ESTRUCTURAL TIPO III DE 42,5KG

REMISIÓN: OFA LAB 518- 18 No. HOJAS: 1 de 3

CILINDRO No.	CODIGO CLIENTE	ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	EDAD 7	EDAD 14	EDAD 28	FECHA ROTURA	DIAMETRO ESPECIMEN pulg	ALTURA ESPECIMEN pulg	AREA ESPECIMEN pulg²	PESO CILINDRO g	DENSIDAD kg/cm³	CARGA APLICADA KN	RESISTENCIA OBTENIDA Mpa	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDA	RESISTENCIA % ESPERADO	PROMEDIO RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa	SLUMP	TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
72		CAJA ENCOLE MARGEN IZQUIERDO	PR0 + 900	14-ene.-19	X				17-ene.-19	5,98	11,92	28,08	12366	2,25	172,8	9,5	1383	96,6	45,2	40	9,5	21	4"	4	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
72				14-ene.-19		X			21-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12254	2,22	284,7	15,6	2279	159,5	74,5	70	15,6	21	4"	4	
72				14-ene.-19			X		28-ene.-19	5,94	11,88	27,71	12277	2,27	357,2	19,9	2897	202,8	94,7	90	19,9	21	4"	5	
72				14-ene.-19				X	11-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12216	2,21	398,7	22,0	3200	224,0	104,6	100	22,0	21	4"	4	
73		ENCOLE MARGEN IZQUIERDO	PR0 + 450	17-ene.-19	X				20-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12257	2,22	166,7	9,2	1334	93,4	43,6	40	9,2	21	2 1/2"	4	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
73				17-ene.-19		X			24-ene.-19	5,94	11,92	27,71	12275	2,26	273,4	15,2	2218	155,2	72,5	70	15,2	21	2 1/2"	5	
73				17-ene.-19			X		31-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12221	2,22	342,6	18,8	2743	192,0	89,7	90	18,8	21	2 1/2"	5	
73				17-ene.-19				X	14-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12192	2,21	401,2	22,0	3212	224,6	105,0	100	22,0	21	2 1/2"	4	
74		CAJA ENCOLE MARGEN IZQUIERDO	PR0 + 290	19-ene.-19	X				22-ene.-19	5,94	11,88	27,71	12291	2,27	172,8	9,6	1402	98,1	45,8	40	9,6	21	3"	4	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
74				19-ene.-19		X			26-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12271	2,22	281,5	15,5	2253	157,7	73,7	70	15,5	21	3"	3	
74				19-ene.-19			X		2-feb.-19	5,98	11,92	28,08	12215	2,22	351,8	19,3	2816	197,1	92,1	90	19,3	21	3"	5	
74				19-ene.-19				X	16-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12251	2,22	388,2	21,3	3108	217,5	101,6	100	21,3	21	3"	4	
75		PANTALLA DERECHA BOX COULVERT MARGEN IZQUIERDO	PR3 + 660	21-ene.-19	X				24-ene.-19	6,02	11,96	28,45	12278	2,20	219,7	11,9	1736	121,5	42,6	40	11,9	28	4"	4	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 7 1/2 BALDES ARENA 8 1/2 BALDES GRAVILLA
75				21-ene.-19		X			28-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12174	2,21	372,5	20,5	2962	208,7	73,1	70	20,5	28	4"	4	
75				21-ene.-19			X		4-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12301	2,23	471,2	25,9	3772	264,0	92,5	90	25,9	28	4"	5	
75				21-ene.-19				X	18-feb.-19	5,96	11,96	28,08	13266	2,40	516,2	28,4	4132	289,3	101,3	100	28,4	28	4"	5	

OBSERVACIONES

RESISTENCIA % ESPERADA (3DIAS 40% - 7DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) según norma tecnica 500/630-13 (INVIAS-13 / NTC 321)

Las muestras de concretos de nomenclatura M-# pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificación de las muestras.

INFORME No. 5 ENERO MUESTRAS TOMADAS IN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE DEL SERVICIO.





Figura 5. Esquemas de los modelos de fractura típicos

Fuente: NTC 673

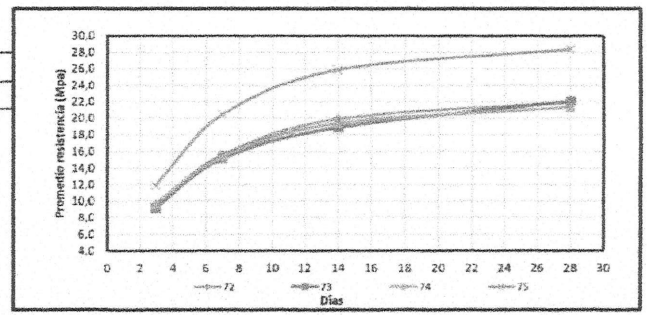

Andres Felipe Rubio Rojas
Geotecnólogo

Oficina Calle 2 No. 2-59 Valvanera Telfax 0988362780 Cel. 3158938582 - 3105510987 Pitalito - Huila / correo electronico mecanicadesuelosofa@gmail.com -oscarsuelo72@hotmail.com

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	**RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO**	CODIGO:	OFA CSC-14
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	15-jul.-15

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

EMPRESA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MUESTRA: AGREGADOS ARENA HERRERA Y GRAVILLA PLANTA OLAYA-HERRERA - CEMEX ESTRUCTURAL TIPO III DE 42,5KG

FECHA: 27 de marzo del 2019

NORMA: ART. 630-13 E- 410 INVIAS / NTC 673

REMISIÓN: OFA LAB 518- 18 No HOJAS: 2 de 3


CILINDRO No	CODIGO CLIENTE	ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	EDAD 7	EDAD 14	EDAD 28	FECHA ROTURA	DIAMETRO ESPECIMEN pulg	ALTURA ESPECIMEN pulg	AREA ESPECIMEN pulg²	PESO CILINDRO g	DENSIDAD kg/cm³	CARGA APLICADA KN	RESISTENCIA OBTENIDA Mpa	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDA	RESISTENCIA % ESPERADO	PROMEDIO RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa	SLUMP	TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
76		PANTALLA IZQUIERDA BOX COULVERT MARGEN IZQUIERDO	PR3 + 660	22-ene.-19	X				25-ene.-19	6,02	11,96	28,45	12317	2,20	227,9	12,4	1801	126,0	44,1	40	12,4	28	2" 3/4	5		1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 7 1/2 BALDES ARENA 8 1/2 BALDES GRAVILLA
76				22-ene.-19		X			29-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12224	2,22	382,3	21,0	3060	214,2	75,0	70	21,0	28	2" 3/4	5		
76				22-ene.-19			X		5-feb.-19	5,94	11,88	27,71	12143	2,25	462,4	25,7	3751	262,6	92,0	90	25,7	28	2" 3/4	4		
76				22-ene.-19				X	19-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12152	2,20	519,2	28,5	4156	290,9	101,9	100	28,5	28	2" 3/4	4		
77		LOSA SUPERIOR BOX COULVERT MARGEN IZQUIERDO	PR3 + 660	23-ene.-19	X				26-ene.-19	5,98	11,92	28,08	13289	2,42	223,1	12,3	1786	125,0	43,8	40	12,3	28	4" 1/2	3		1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 7 1/2 BALDES ARENA 8 1/2 BALDES GRAVILLA
77				23-ene.-19		X			30-ene.-19	5,98	11,92	28,08	13276	2,41	369,3	20,3	2956	206,9	72,5	70	20,3	28	4" 1/2	4		
77				23-ene.-19			X		6-feb.-19	6,02	11,96	28,45	13383	2,39	469,5	25,5	3709	259,7	90,9	90	25,5	28	4" 1/2	4		
77				23-ene.-19				X	20-feb.-19	5,98	11,92	28,08	13167	2,39	514,4	28,3	4118	288,2	101,0	100	28,3	28	4" 1/2	4		
78		CAJA ENCOLE MARGEN IZQUIERDO	PR4 + 208	23-ene.-19	X				26-ene.-19	5,94	11,88	27,71	12274	2,27	180,3	10,0	1463	102,4	47,8	40	10,0	21	3" 1/2	4		1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
78				23-ene.-19		X			30-ene.-19	5,98	11,92	28,08	12276	2,23	281,7	15,5	2255	157,9	73,7	70	15,5	21	3" 1/2	4		
78				23-ene.-19			X		6-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12296	2,23	353,7	19,4	2831	198,2	92,6	90	19,4	21	3" 1/2	5		
78				23-ene.-19				X	20-feb.-19	5,98	11,96	28,08	13246	2,40	413,3	22,7	3309	231,6	108,2	100	22,7	21	3" 1/2	4		
79		DESCOLE MARGEN DERECHO	PR4 + 070	25-ene.-19	X				28-ene.-19	5,98	11,96	28,08	12211	2,21	176,4	9,7	1412	98,8	46,2	40	9,7	21	3"	3		1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
79				25-ene.-19		X			1-feb.-19	5,94	11,92	27,71	12198	2,25	283,2	15,8	2287	160,8	75,1	70	15,8	21	3"	4		
79				25-ene.-19			X		8-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12268	2,22	354,5	19,5	2838	198,6	92,8	90	19,5	21	3"	5		
79				25-ene.-19				X	22-feb.-19	5,98	11,92	28,08	12987	2,36	395,7	21,7	3168	221,7	103,5	100	21,7	21	3"	4		

OBSERVACIONES

RESISTENCIA % ESPERADA (3DIAS 40% - 7DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) según norma tecnica 500/630-13 (INVIAS-13 / NTC 321)

Las muestras de concretos de nomenclatura M-# pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificación de las muestras.

INFORME No. 5 ENERO MUESTRAS TOMADAS IN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE DEL SERVICIO.



Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4





Figura 5. Esquemas de los modelos de fractura típicos
Fuente: NTC 673



Andres Felipe Rubio Rojas
Geotecnólogo

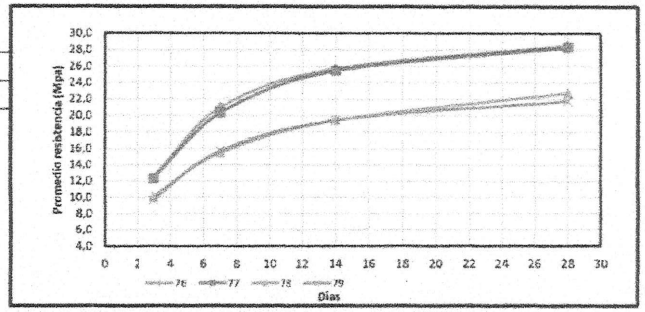

Oficina Calle 2 No. 2-59 Valvanera Telfax 0988362780 Cel 3158938582 - 3105510987 Pitalito - Huila / correo electronico mecanicadesuelosofa@gmail.com - serviclientemecanicadesuelos@gmail.com

OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA MECANICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS	RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE CILINDROS DE CONCRETO	CODIGO:	OFA CSC-14
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	15-jul.-15

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA- EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIO BLANCO- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA — FECHA: 27 de marzo del 2019

EMPRESA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA — NORMA: ART. 630-13 E- 410 INVIAS / NTC 673

MUESTRA: AGREGADOS ARENA HERRERA Y GRAVILLA PLANTA OLAYA-HERRERA - CEMEX ESTRUCTURAL TIPO III DE 42,5KG — REMISIÓN: OFA LAB 518- 18 — No. HOJAS: 3 de 3

CILINDRO No.		ELEMENTO FUNDIDO	ABSCISA ELEMENTO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	EDAD 7	EDAD 14	EDAD 28	FECHA ROTURA	DIAMETRO ESPECIMEN pulg	ALTURA ESPECIMEN pulg	AREA ESPECIMEN pulg²	PESO CILINDRO g	DENSIDAD kg/cm³	CARGA APLICADA KN	RESISTENCIA OBTENIDA Mpa	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDA	RESISTENCIA % ESPERADO	PROMEDIO RESISTENCIA Mpa	RESISTENCIA ESPECIFICADA Mpa	SLUMP	TIPO DE FALLA	OBSERVACIONES
80		DESCOLE MARGEN DERECHO	PR4 + 285	26-ene.-19	X				29-ene.-19	5,94	11,88	27,71	12215	2,26	159,1	8,9	1291	90,3	42,2	40	8,9	21	3"	3	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
80				26-ene.-19		X			2-feb.-19	5,94	11,88	27,71	12248	2,26	265,2	14,8	2151	150,6	70,3	70	14,8	21	3"	5	
80				26-ene.-19			X		9-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12198	2,21	350,4	19,3	2805	196,4	91,7	90	19,3	21	3"	4	
80				26-ene.-19				X	23-feb.-19	5,98	11,92	28,08	13189	2,40	392,9	21,6	3145	220,2	102,8	100	21,6	21	3"	4	
81		DESCOLE MARGEN DERECHO	PR4 + 381	30-ene.-19	X				2-feb.-19	5,90	11,84	27,35	12605	2,37	164,6	9,3	1353	94,7	44,2	40	9,3	21	3" 1/2	3	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
81				30-ene.-19		X			6-feb.-19	5,90	11,88	27,35	12523	2,35	272,3	15,4	2238	156,7	73,2	70	15,4	21	3" 1/2	4	
81				30-ene.-19			X		13-feb.-19	5,94	11,92	27,71	12214	2,25	352,3	19,6	2858	200,0	93,4	90	19,6	21	3" 1/2	5	
81				30-ene.-19				X	27-feb.-19	5,90	11,88	27,35	12317	2,31	412,2	23,3	3388	237,2	110,8	100	23,3	21	3" 1/2	4	
82		CAJA ENCOLE MARGEN IZQUIERDO	PR4 + 070	30-ene.-19	X				2-feb.-19	6,06	11,92	28,83	12473	2,21	172,8	9,3	1348	94,3	44,1	40	9,3	21	3"	4	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
82				30-ene.-19		X			6-feb.-19	5,94	11,88	27,71	12556	2,32	279,7	15,6	2269	158,8	74,2	70	15,6	21	3"	4	
82				30-ene.-19			X		13-feb.-19	5,94	11,92	27,71	12634	2,33	348,9	19,4	2830	198,1	92,5	90	19,4	21	3"	5	
82				30-ene.-19				X	27-feb.-19	6,02	11,96	28,45	12743	2,28	396,3	21,5	3131	219,2	102,4	100	21,5	21	3"	4	
83		DESCOLE MARGEN DERECHO	PR4 + 208	31-ene.-19	X				3-feb.-19	5,94	11,88	27,71	12361	2,29	175,5	9,8	1424	99,7	46,5	40	9,8	21	4"	3	1 BTO. CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 9 1/2 BALDES ARENA 11 1/2 BALDES GRAVILLA
83				31-ene.-19		X			7-feb.-19	5,98	11,96	28,08	12176	2,21	268,9	14,8	2153	150,7	70,4	70	14,8	21	4"	3	
83				31-ene.-19			X		14-feb.-19	5,98	11,92	28,08	12193	2,22	353,7	19,4	2831	198,2	92,6	90	19,4	21	4"	5	
83				31-ene.-19				X	28-feb.-19	5,94	11,92	27,71	13116	2,42	413,2	23,0	3352	234,6	109,6	100	23,0	21	4"	4	

OBSERVACIONES

RESISTENCIA % ESPERADA (3DIAS 40% - 7DIAS 70% - 14 DIAS 90% - 28 DIAS 100%) según norma tecnica 500/630-13 (INVIAS-13 / NTC 321)

Las muestras de concretos de nomenclatura M-# pertenecen al codigo interno del laboratorio para la identificación de las muestras.

INFORME No. 5 ENERO MUESTRAS TOMADAS IN SITU Y TRANSPORTADAS AL LABORATORIO CENTRAL POR EL CLIENTE DEL SERVICIO.





Figura 5. Esquemas de los modelos de fractura típicos

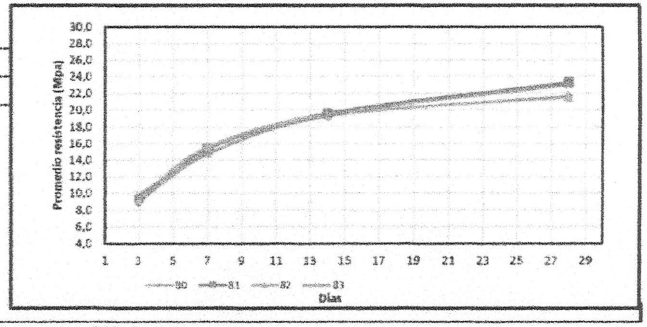

Andres Felipe Rubio Rojas
Geotecnólogo

Oficina Calle 2 No. 2-69 Valvanera Telfax 0988360506 Cel. 3158938582 - 3105510987 Pitalito - Huila / correro electronico oscarsuelos72@hotmail.com

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° de marzo al 31 de marzo de 2019, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 con la relación de personal en obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓ	1		
		PÁGINA		DE	2

FECHA 31 (Día) 3 (Mes) 19 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. día		Planilla	No. día	Planilla	No. días	
BRAYAN CAMILO OLARTE QUIRAMA	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1111341642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
LUIS FELIPE HERRERA GOME	MAESTRO DE OBRA	FEBRERO	28	91461754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
HERRERA HERMES	MAESTRO DE OBRA	FEBRERO	28	91294163	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
YEISSON PALACIO SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1111338933	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
ESPINOSA JOSE LEONARDO	OFICIAL DE OBRA	FEBRERO	28	1110175685	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
HERRERA GOMEZ JESUS ARBENIZ	OFICIAL DE OBRA	FEBRERO	28	5730935	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
EPINOSA ARBEY	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1111333763	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
HERRERA SIERRA LUIS DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1098778866	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
RAUL HERNANDO HERRERA FLOREZ	AYUDANTE DE OBRA (MAESTRO)	FEBRERO	28	10058449475	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
ALVARO JAVIER PALMA CARRERO	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1111335553	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
JOSE FABIAN VILLA CARDONA	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	1006159591	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488900208	28		8488900208	28	8488900208	28	HERMES HERRERA	
ANDRES FELIPE RUBIO	AUXILIAR DE LABORATORIO	FEBRERO	28	1061796256	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				8488955990	28		8488955990	28	8488955990	28	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA	
PEDRO ARQUIMEDES BERNAL GONZALEZ	INGENIERO RESIDENTE OBRA	FEBRERO	28	7177766	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	AUXILIAR DE INGENIERIA	FEBRERO	28	1057577164	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
KAROLAY DEL PILAR GORDILLO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	FEBRERO	28	1106485389	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
CESAR TARAZONA PEREZ	CADENERO PRIMERO	FEBRERO	28	1090459306	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
FELIX ANDRES ANGULO PICO	TOPOGRAFO	FEBRERO	28	1098641457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
ROBINSON RUBIO REINOSO	CONTROLADOR DE VIAJES	FEBRERO	28	1111336866	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
JORGE ELIECER GONZALEZ BABATIBA	INSPECTOR DE OBRA	FEBRERO	28	1083894621	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
MISAEL PARRA GARCIA	CONTROLADOR DE VIAJES	FEBRERO	28	1111336308	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
ARMANDO BUSTAMANTE MORALES	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	FEBRERO	28	14278829	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
NUMAR RUBIO VALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	FEBRERO	28	14279582	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No: 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO

CARRETERA Y/O PROYECTO: RIO BLANCO - HERRERA

SECTOR: K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. día		Planilla	No. día	Planilla	No. días	
JOSE DIMAS BLANDON	CONTROLADOR VIAL	FEBRERO	28	5829641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
YUMARA DIAZ CUENCA	CONTROLADORA VIAL	FEBRERO	28	65810524	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
OSCAR VASQUEZ NIETO	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	FEBRERO	28	17287330	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
YULY MARCELA CORREA ANGEL	SECRETARIA	FEBRERO	28	107591730	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715539593	28		7715539593	28	7715539593	28	CONSOR- VIAS DEL TOLIMA	
EDILSON ENRIQUE APARICIO VILLAMIL	OPERADOR DE PAJARITA	FEBRERO	28	1085104241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715545925	28		7715545925	28	7715545925	28	JUAN CAMILO SILVA	
FIDEL AURELIO JARAMILLO	MECANICO	FEBRERO	28	13062693	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715545925	28		7715545925	28	7715545925	28	JUAN CAMILO SILVA	
URBANO BRAVO FLAVIO ALADINO	OPERADOR RETROEXCVADR OERA	FEBRERO	28	18124457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715545925	28		7715545925	28	7715545925	28	JUAN CAMILO SILVA	
CARVAJAL PORTILLA JESUS ANTONIO	OPERADOR MOTONIVELADO RA	FEBRERO	28	18126034	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715545925	28		7715545925	28	7715545925	28	JUAN CAMILO SILVA	
WILMER SANCHEZ SANCHEZ	VOLQUETERO	FEBRERO	28	5858412	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				7715545925	28		7715545925	28	7715545925	28	JUAN CAMILO SILVA	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-090884

Firma
Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ
Director de Interventoría
Matricula No. 25202-28306 CND,

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AYV SOLUCIONES EFECTIVAS SAS identificado(a) con NI 900945994 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HORACIO MONA identificado(a) con CC 14191251

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
8489424408	418539093	E	2019-02-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-02	30
8489424408	418539093	E	2019-02-27	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-01	30
8489424408	418539093	E	2019-02-27	CCF	CCF50	COMFENALCO TOLIMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-01	30

Este certificado se expide el día 2019-02-28 a las 10:57.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clasé Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900679414	5	HH CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERMES01	cra 8 7 34	CHAPARRAL-TOLIMA	2462086	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	8468900208	8468900208	E	2019/02/05	14/02/2019	BANCOLOMBIA	9	$ 2.560.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$1.313.600	$9.000	$0	$1.322.600
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	1	$132.500	$900	$0	$133.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	10	$1.181.100	$8.100	$0	$1.189.200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$571.900	$3.900	$0	$575.800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	11	$571.900	$3.900	$0	$575.800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$328.400	$2.300	$0	$330.700
COMFATOLIMA	CCF48	800.211.025	1	11	$328.400	$2.300	$0	$330.700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$329.000	$2.400	$0	$331.400
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901.093.846	0	1	$33.200	$300	$0	$33.500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	9	$262.600	$1.800	$0	$264.400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	$33.200	$300	$0	$33.500
TOTAL				11	$2.542.900	$17.600	$0	$2.560.500

PAGADO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 900679414	5	HH CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HERMESC1	cra 8 7 34	CHAPARRAL -TOLIMA	2462006	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	8488900206	8488900206	E	2019/02/05	14/02/2019	BANCOLOMBIA	9	$ 2.560.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1110175685	ESPINOSA JOSE							X											230301	30	$874.990	$140.000	EPS037	30	$874.990	$35.000	CCF48	30	$874.990	$35.000	14-23	30	$874.990	$60.900	30	$0	$0	SI	$270.900
2	CC	1111333763	ESPINOZA ARBEY							X											231001	30	$828.116	$132.500	ESS091	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
3	CC	91294163	HERRERA HERMES							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS037	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
4	CC	5750935	HERRERA JESUS							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS037	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
5	CC	1098778866	HERRERA LUIS							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS037	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
6	CC	91481754	HERRERA LUIS							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS037	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
7	CC	1005698471	HERRERA RAUL	X																	230501	15	$414.058	$66.300	EPS037	15	$414.058	$16.600	CCF48	15	$414.058	$16.600	14-23	15	$414.058	$28.900	15	$0	$0	SI	$128.400
8	CC	1113396142	OLARTE BRAYAN							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS041	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
9	CC	1111338955	PALACIO YEISON	X																	230301	9	$248.435	$39.800	EPS037	9	$248.435	$10.000	CCF48	9	$236.373	$9.400	14-23	9	$248.435	$17.300	9	$0	$0	SI	$76.500
10	CC	1111338951	PALMA ALVARO							X											230301	30	$828.116	$132.500	EPS037	30	$828.116	$33.200	CCF48	30	$828.116	$33.200	14-23	30	$828.116	$57.700	30	$0	$0	SI	$256.600
11	CC	1006139651	VILLA JOSE							X											230301	30	$874.990	$140.000	EPS037	30	$874.990	$35.000	CCF48	30	$874.990	$35.000	14-23	30	$874.990	$60.900	30	$0	$0	SI	$270.900
Total	Afiliados(11)																						$8.209.389	$1.321.600			$8.209.389	$329.000			$8.195.223	$328.400			$8.209.389	$571.900		$0	$0		$2.542.900

PAGO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 7690239	8	OSCAR FERNANDO AREVALO PERALTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PITALITO	CLL 2 2 59	PITALITO-HUILA	8362780	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-01	2019-02	402519020	8488955990	E	2019/02/11	2019/02/14	BANCO DAVIVIENDA	3	$2,457,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PITALITO (11 Afiliados)						$9,476,856	$1,516,600			$9,476,856	$379,300			$9,476,856	$379,300			$9,476,856	$182,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$11,100		$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (2 Afiliados)						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$11,100		$0	$0
1	CC	1083910331	CLAROS MYRIAM	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	1083900908	TOVAR YUDY	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS044	30	$1,100,000	$44,000	CCF32	30	$1,100,000	$44,000	14-23	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (9 Afiliados)						$7,376,856	$1,180,600			$7,376,856	$295,300			$7,376,856	$295,300			$7,376,856	$171,200		$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (9 Afiliados)						$7,376,856	$1,180,600			$7,376,856	$295,300			$7,376,856	$295,300			$7,376,856	$171,200		$0	$0
3	CC	1007345220	ASTUDILLO ARLEY	230301	23	$598,953	$95,900	EPS044	23	$598,953	$24,000	CCF32	23	$598,953	$24,000	14-23	23	$598,953	$14,600	23	$0	$0
4	CC	83212513	CARDENAS CRISTIAN	230301	16	$586,667	$93,900	EPS044	16	$586,667	$23,500	CCF32	16	$586,667	$23,500	14-23	16	$586,667	$14,300	16	$0	$0
5	CC	1083906143	CARDENAS SANDRA	230301	23	$598,953	$95,900	EPS044	23	$598,953	$24,000	CCF32	23	$598,953	$24,000	14-23	23	$598,953	$14,600	23	$0	$0
6	CC	83041092	HERNANDEZ ARLEX	230301	16	$416,663	$66,700	EPS037	16	$416,663	$16,700	CCF32	16	$416,663	$16,700	14-23	16	$416,663	$10,200	16	$0	$0
7	CC	1081700759	HIOS DIMAR	230301	23	$598,952	$95,900	EPS044	23	$598,953	$24,000	CCF32	23	$598,953	$24,000	14-23	23	$598,953	$14,600	23	$0	$0
8	CC	1077859868	JORDAN EDILSON	230301	21	$840,000	$134,400	EPS044	21	$840,000	$33,600	CCF32	21	$840,000	$33,600	14-23	21	$840,000	$20,500	21	$0	$0
9	CC	1077859868	JORDAN EDILSON	230301	9	$360,000	$57,600	EPS044	9	$360,000	$14,400	CCF32	9	$360,000	$14,400	14-23	9	$360,000	$0	9	$0	$0
10	CC	1066302426	JURADO ERNESTO	230301	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$30,700	CCF32	23	$766,667	$30,700	14-23	23	$766,667	$18,700	23	$0	$0
11	CC	1061796256	RUBIO ANDRES	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS044	30	$1,000,000	$40,000	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
12	CC	12282143	SANCHEZ JOHN	230301	23	$1,610,000	$257,600	EPS044	23	$1,610,000	$64,400	CCF32	23	$1,610,000	$64,400	14-23	23	$1,610,000	$39,300	23	$0	$0
Total		**Afiliados(11)**				$9,476,856	$1,516,600			$9,476,856	$379,300			$9,476,856	$379,300			$9,476,856	$182,300		$0	$0

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79946569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 94 15 32 OF 507	TELÉFONO:	6215020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				7713218072	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2019		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		414409671

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 923.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923.900	$ 0	$ 923.900
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.500	$ 0	$ 110.500
230301	230301-PORVENIR	5	$ 894.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.700	$ 0	$ 894.700
231001	231001-COLFONDOS	7	$ 1.532.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.532.600	$ 0	$ 1.532.600
SUBTOTALES:										**$ 3.461.700**	**$ 0**	**$ 3.461.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 248.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.400	$ 0	$ 0	$ 248.400
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 133.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 122.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.800	$ 0	$ 0	$ 122.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.300	$ 0	$ 0	$ 181.300
MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 34.000
SUBTOTALES:													**$ 866.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 866.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.069.400	$ 1.069.400	$ 0	$ 0	$ 1.069.400
SUBTOTALES:									**$ 1.069.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.069.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	3	$ 178.800	$ 0	$ 178.800
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 527.800	$ 0	$ 527.800
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	2	$ 72.500	$ 0	$ 72.500
SUBTOTALES:			**$ 779.100**	**$ 0**	**$ 779.100**

Planilla Pagada
SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79946569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 94 15 32 OF 507	TELÉFONO:	6215020
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**77132180 72**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	febrero	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	414409671				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD									ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1065608301	HERNANDEZ NAVARRO NICODEMOS	DEPEND		$ 650.000			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 850.000	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.000	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	30	$ 850.000	$ 34.000	$ 0	$ 34.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 850.000		$ 8.900	30	$ 850.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 34.000	$ 0	$ 0																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79946569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:		CL 94 15 32 OF 507 TELÉFONO:	6215020
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7713218072	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			414409671

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN										SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
20	CC 6785048	GARCIA MORALES HERNAN ANTONIO	DEPEND		$ 828.116				SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700	30	$ 828.116	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 33.200	$ 0	$ 0		
21	CC 7731057	MEACA GONZALEZ JESUS EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI	X															230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	25	$ 690.097	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 110.500	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 690.097	$ 27.700	$ 0	$ 27.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 690.097		$ 48.100	25	$ 690.097	CCF48-CONFATOLIMA	$ 27.700	$ 0	$ 0		
22	CC 79781131	SILVA RODRIGUEZ WILLIAM	DEPEND		$ 800.000				SI																230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700	30	$ 800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 32.000	$ 0	$ 0		
23	CC 80545849	SILVA ARIAS HEPOLITO	DEPEND		$ 1.000.000				SI	X															230301-PORVENIR	26	$ 866.667	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138.700	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 34.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 866.667		$ 60.400	26	$ 866.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 34.700	$ 0	$ 0		
24	CC 86066066	JOVEN JIMENEZ ROLANDO	DEPEND		$ 828.116				SI												X				230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 0	30	$ 828.116	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0		
25	CC 91514185	SANCHEZ NUNEZ OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 2.000.000				SI																231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0		
26	CC 93081216	GUALTERO OSPINA JOSE HERNANDO	DEPEND		$ 823.116				SI														X		230301-PORVENIR	7	$ 193.228	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.000	EPS002-SALUD TOTAL	7	$ 193.228	$ 7.800	$ 0	$ 7.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 193.228		$ 0	7	$ 193.228	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 7.800	$ 0	$ 0		
27	CC 93081216	GUALTERO OSPINA JOSE HERNANDO	DEPEND		$ 828.116				SI																230301-PORVENIR	23	$ 634.889	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 101.600	EPS002-SALUD TOTAL	23	$ 634.889	$ 25.400	$ 0	$ 25.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	23	$ 634.889		$ 44.200	23	$ 634.889	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 25.400	$ 0	$ 0		

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

TOTAL	$ 6.176.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901190351
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8 A 55 TORRE C OFICINA 401	TELÉFONO:	4650906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7713385262	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			414390128

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.957.500	$ 0	$ 0	$ 17.500	$ 17.500	$ 1.500	$ 200	$ 1.992.500	$ 1.700	$ 1.994.200
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	3	$ 489.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 489.000	$ 400	$ 489.400
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 387.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 387.900	$ 300	$ 388.200
SUBTOTALES:										**$ 2.869.400**	**$ 2.400**	**$ 2.871.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 533.500	$ 0	$ 500	$ 0	$ 533.500	$ 500	$ 0	$ 534.000
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 103.700	$ 100	$ 0	$ 103.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 935.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 935.000	$ 800	$ 0	$ 935.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 125.000	$ 100	$ 0	$ 125.100
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 103.700	$ 100	$ 0	$ 103.800
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 414.700	$ 0	$ 400	$ 0	$ 414.700	$ 400	$ 0	$ 415.100
SUBTOTALES:													**$ 2.215.600**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 2.217.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.011.600	$ 1.011.600	$ 800	$ 0	$ 1.012.400
SUBTOTALES:									**$ 1.011.600**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 1.012.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	14	$ 694.800	$ 600	$ 695.400
SUBTOTALES:			**$ 694.800**	**$ 600**	**$ 695.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	$ 521.100	$ 400	$ 521.500
PASENA	PASENA - SENA	14	$ 348.000	$ 300	$ 348.300
SUBTOTALES:			**$ 869.100**	**$ 700**	**$ 869.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENSIONES TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057577164	PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 1.800.000				NO													X				230301-PORVENIR	6	$ 360.000	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 57.600	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 360.000	$ 45.000	$ 0	$ 45.000	14-11 - ARL SURA	6	$ 360.000		$ 0	6	$ 360.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0			
2	CC 1057577164	PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 1.800.000				NO								X									230301-PORVENIR	24	$ 1.590.000	$ 254.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.400	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.590.000	$ 198.800	$ 0	$ 198.800	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.590.000		$ 110.700	24	$ 1.590.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 63.600	$ 31.800	$ 47.700			
3	CC 1075291730	CORREA ANGEL YULY MARCELA	DEPEND		$ 828.116				NO												X					230301-PORVENIR	6	$ 165.624	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.500	ESSC91-ECOOPSOS EPS	6	$ 165.624	$ 20.800	$ 0	$ 20.800	14-11 - ARL SURA	6	$ 165.624		$ 0	6	$ 165.624	CCF48-CONFATOLIMA	$ 6.700	$ 3.400	$ 5.000			
4	CC 1075291730	CORREA ANGEL YULY MARCELA	DEPEND		$ 828.116				NO												X					230301-PORVENIR	24	$ 662.493	$ 106.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.000	ESSC91-ECOOPSOS EPS	24	$ 662.493	$ 82.900	$ 0	$ 82.900	14-11 - ARL SURA	24	$ 662.493		$ 46.200	24	$ 662.493	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.500	$ 13.300	$ 19.900			
5	CC 1083894621	GONZALEZ BABATIBA JORGE	DEPEND		$ 1.800.000				NO	X								X								231001-COLFONDOS	8	$ 767.625	$ 122.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 122.900	EPS044-MEDIMÁS	8	$ 767.625	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 767.625		$ 53.500	8	$ 767.625	CCF48-CONFATOLIMA	$ 30.800	$ 15.400	$ 23.100			
6	CC 1090458306	TARAZONA PEREZ CESAR	DEPEND		$ 1.200.000				NO																	230301-PORVENIR	24	$ 960.000	$ 153.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 153.600	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 960.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	24	$ 960.000		$ 66.900	24	$ 960.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 38.400	$ 19.200	$ 28.800			
7	CC 1090458306	TARAZONA PEREZ CESAR	DEPEND		$ 1.200.000				NO													X				230301-PORVENIR	6	$ 240.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.400	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 240.000	$ 30.000	$ 0	$ 30.000	14-11 - ARL SURA	6	$ 240.000		$ 0	6	$ 240.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 9.600	$ 4.800	$ 7.200			
8	CC 1098641457	ANGULO PICO FELIX ANDRES	DEPEND		$ 2.100.000				NO													X				230301-PORVENIR	6	$ 420.000	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67.200	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 420.000	$ 52.500	$ 0	$ 52.500	14-11 - ARL SURA	6	$ 420.000		$ 0	6	$ 420.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 16.800	$ 8.400	$ 12.600			
9	CC 1098641457	ANGULO PICO FELIX ANDRES	DEPEND		$ 2.100.000				NO																	230301-PORVENIR	24	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800	EPS037-NUEVA EPS	24	$ 1.680.000	$ 210.000	$ 0	$ 210.000	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.680.000		$ 117.000	24	$ 1.680.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 67.200	$ 33.600	$ 50.400			

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901190351
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8 A 55 TORRE C OFICINA 401	TELÉFONO:	4660905
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7713385262	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/02/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			414390128

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO.

Correspondiente al período comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA | ACTA No: 8 | PERIODO MES: MARZO | VALOR BÁSICO ACTA: $ 53.026.960,00

CONTRATO DE OBRA No : 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018
OBJETO:
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
SECTOR: RIO BLANCO - HERRERA
RUTA K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926
TRAMO:

PLAZO INICIAL: 15 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 22/08/2018
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 15.358.105.867
VALOR ACUMULADO: $ 19.258.327.586
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.607.431.760

PLAZO ACUMULADO: 15 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/011/2019
VALOR ADICIONALES: $ 3.900.221.719
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0912 DE 2018 | INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA, | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1250	450 DIAS	15/11/2019	19.258.327.586,00	19.258.327.586,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	563.276.197
2019	18.695.051.390
Total	19.258.327.587

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 4.607.431.760

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
912	15 MESES	15/11/2019	1.534.601.853	1.534.601.853

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	833.224.000	573.053.054	-	573.053.054	0,69	$ 63.102.082	1,00	0,110
Acumulado:	1.953.752.000	1.601.053.054	-	1.601.053.054	0,82	$ 381.323.083	1,00	0,238

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,083	7,33	0,49	7,67	17.657.274.532	-	$ 17.657.274.532	$ 17.657.274.532
Interventor:	0,248	7,33	0,49	7,67	1.153.278.770	-	$ 1.153.278.770	$ 1.153.278.770

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	6
Calzada:	7,4
Bermas:	
Sub base:	0,15
Base:	
Concreto Hidraul	0,19

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No:** 8 **PERIODO MES:** MARZO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.026.960,00

CONTRATO DE OBRA No :	1250 DEL 6 DE JULIO DE2018	PLAZO INICIAL:	15 MESES	PLAZO ACUMULADO:	15 MESES
OBJETO:		FECHA DE INICIACIÓN:	22/08/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	15/011/2019
SECTOR:	RIO BLANCO - HERRERA	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 15.358.105.867	VALOR ADICIONALES:	$ 3.900.221.719
RUTA	K0+000 AL K 3+685 Y DEL K 3+892 AL K7+926	VALOR ACUMULADO:	$ 19.258.327.586	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:		ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 4.607.431.760		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0912 DE 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO RODRIGUEZ

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
														En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANEACIÓN									0,2	0,3	1,8	1,3	0,7	0	16	147,6	104
AFIRMADO, SUBBASES Y BASES																	
PAVIMENTO RIGIDO																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJE									0,5	0,5	1,7	1,5	0,88	344,02	398	1015,72	849
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
TRANSPORTES									0,4	0,8	0,8	0,9	1,125	12,399	34	62,899	75
GPPn																	

NOTAS:
1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: JUAN CAMILO SILVA
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-096884 CND

Firma
Nombre LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28306 CND

OBSERVACION: EL CONTRATISTA TIENE UNA ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA MAYOR AL ACA CONSIGNADO EL ACUMULADO BUENO EL QUE LLEVA EL CONTRATISTA ES DE 1.900.000.000 APROXIMADAMENTE.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019, a continuación se adjunta Formato MINFRA-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 1250 DEL 6 DE JULIO DE201E **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL DEL TOLIMA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 22/08/2018

PLAZO INICIAL: 450 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 15.358.105.867,53

VALOR ACUMULADO: $ 19.258.327.586,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0912-2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	65%	$ 9.982.768.816,00	6	7	2018	29	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	11%	$ 1.626.276.140,00	6	7	2018	29	9	2022
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	50%	$ 7.687.468.340,00	29	9	2019	29	9	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 1982806

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA SEGUROS

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 767.905.294,00	6	7	2018	29	9	2019
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Jmalucelli TRAVELERS SEGUROS S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 1.925.832.759,00	19	2	2019	15	5	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	24%	$ 4.607.431.761,00	19	2	2019	16	3	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 962.916.379,00	19	2	2019	15	11	2022
Calidad de Estudios y Diseños	0%							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 3.851.665.517,00	15	11	2019	15	11	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 68368

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Jmalucelli TRAVELERS SEGUROS S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0522634-1 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: LUIS SAMUEL ORDUZ

Director de Interventoría

Matricula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ESTATAL

JMalucelli TRAVELERS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3

www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	CIUDAD DE EXPEDICION
68368	3	BOGOTA	21 / 2 / 2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 19 / 2 / 2019	00:00 Horas del 15 / 11 / 2024	MODIFICACIÓN	TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT	800.113.672 - 7
DIRECCIÓN	EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 PISO 9, IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO	2611112
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT	800.113.672 - 7
DIRECCIÓN	EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 PISO 9, IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO	2611112

OBJETO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA ADICIONAL NO. 001 DE FECHA 19/02/2019, SE EFECTUA UN AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO POR $3.900.221.719 QUEDANDO EN UN TOTAL DE $19.258.327.586.53, MODIFICANDOSE ASI EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.1250 DEL 06 DE JULIO DE 2018 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

SE ACLARAN LAS SUMAS ASEGURADAS DE LAS GARANTIAS OTORGADAS:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 1,925,832,758.65
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES $ 962,916,379.33
ESTABILIDAD DE LA OBRA $ 3,851,665,517.31

TIPO DE OBLIGACION: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRU

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/02/2019	15/05/2020	1.925.832.759,00	240.958,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/02/2019	15/11/2022	962.916.379,00	364.644,02
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/02/2019	16/03/2020	4.607.431.761,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/11/2019	15/11/2024	3.851.665.517,00	1.952.247,98

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 2.557.850,88	$ 0,00	$ 485.991,67	$ 3.043.842,55	$ 11.347.846.416,00

INTERMEDIACION

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA. ASEGURANC	2073	100,00

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO

CLASE	NOMBRE COMPAÑIA	% PARTICIPACION

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
21/02/2019	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS. ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE . ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE JUNIO DE 2008 SUPERFINANCIERA).
COMO TOMADOR DE LA POLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS. LAS EXCLUSIONES. LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELÉFONO (571) 5522350 CORREO ELECTRÓNICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co

PRESIDENTE EJECUTIVO
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

86B7E555

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 204 TELEFONO 7039052.

USUARIO SPBARRAGAN

01-07-2015-1345-P-05-CumEstGU10000022

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68368	3	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2024	MODIFICACIÓN	TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA		
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	NIT	901.190.351 - 2
		TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
DIRECCIÓN	EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 PISO 9, IBAGUE, TOLIMA	NIT	800.113.672 - 7
		TELÉFONO	2611112
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
DIRECCIÓN	EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA CARRERA 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 PISO 9, IBAGUE, TOLIMA	NIT	800.113.672 - 7
		TELÉFONO	2611112

OBJETO DE LA POLIZA:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO $4.607.431.760.26

TOMADOR CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA NIT.901.190.351-2 INTEGRADO POR:
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ C.C. 79.946.569 (PARTICIPACION 96%)
INGENIERIA DE VIAS NIT. 800186228 (PARTICIPACION 4%)

NOTA. EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, ES DE CINCO (5) AÑOS E INICIA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA, A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

********** FIN PÓLIZA **********

JMalucelli TRAVELERS

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 68368, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA
NIT : 901.190.351 - 2
Asegurado: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
NIT : 800.113.672 - 7

Se expide la presente certificación a los 21 dias del mes de Febrero de 2019.

Cordialmente,

JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO
Presidente Ejecutivo
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

JMalucelli TRAVELERS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE CONTRATOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN
NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DR 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3
www.jmtrv.com.co

No. POLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68375	4	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2019	MODIFICACIÓN	TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

OBJETO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA ADICIONAL NO. 001 DE FECHA 19/02/2019, SE EFECTUA UN AUMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO POR $3.900.221.719 QUEDANDO EN UN TOTAL DE $19.258.327.586.53, MODIFICANDOSE ASI EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES

AMPAROS	LIMITE EVENTO	LIMITE VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	962.916.379,00	962.916.379,00	962.916.379,00	215.581,00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR EN PESOS	VALOR ASEGURADO TOTAL
$ 215.581,00	$ 0,00	$ 40.960,39	$ 256.541,39	$ 962.916.379,00

INTERMEDIARIOS			DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO		
NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	CLASE	COMPAÑIA	% PARTICIPACION
SEGORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA. ASEGURANDE	2073	100,00			

FECHA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
21/02/2019	CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LO(S) AMPAROS(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A JMALUCELLI TRAVELERS S.A., PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO.
COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA DEBIÓ RECIBIR POR PARTE DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS TODA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LAS CONDICIONES DEL MISMO ENTRE OTRAS LAS COBERTURAS, LAS EXCLUSIONES. LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 Y CUALQUIER OTRA NORMA APLICABLE EN CASO CONTRARIO PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ASEGURADORA AL TELEFONO (571) 5322350 CORREO ELECTRÓNICO jmtrv@jmtrv.com.co O NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.jmalucellitravelers.com.co

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR
USUARIO SPARAGAN

PARA NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A. ES CALLE 98 No 21-50 Ofc. 901 TELEFONO 5522350

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68375	4	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2019	MODIFICACIÓN	TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

OBJETO DE LA POLIZA:

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

AMPARAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES QUE EL ASEGURADO CAUSE AL TERCERO AFECTADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, A CONSECUENCIA DE UN ACONTECIMIENTO QUE, PRODUCIÉNDOSE EXCLUSIVAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO Y CON OCASIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, OCASIONE EL DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE BIENES DE TERCEROS (DAÑOS MATERIALES) O LESIONES O MUERTE A TERCERAS PERSONAS (LESIONES PERSONALES). SE ACLARA QUE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTÁ LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.No.1250 DEL 06 DE JULIO DE 2018 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ASEGURADO ADICIONAL: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT.800.113.672-7, ÚNICAMENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA POR HECHOS GENERADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y POR LOS QUE PUEDAN RESULTAR SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. SE EXCLUYE LA RCE PROPIA DE LA ACTIVIDAD DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADO DIRECTAMENTE POR UN EVENTO OCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA GOBERNACION DEL TOLIMA, POR DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A BIENES DIFERENTES A LOS OBJETO DEL CONTRATO.

TOMADOR CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA NIT.901.190.351-2 INTEGRADO POR:
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ C.C. 79.946.569 (PARTICIPACION 96%)
INGENIERIA DE VIAS NIT. 800186228 (PARTICIPACION 4%)

COBERTURA BASICA

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES QUE INCLUYE ENTRE OTROS:
- INCENDIO Y EXPLOSIÓN
- CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL TRANSPORTE DE PERSONAS, BIENES, ANIMALES, MATERIAS PRIMAS, EQUIPOS Y/O PRODUCTOS TERMINADOS, ASÍ COMO EL CARGUE Y DESCARGUE DE LOS MISMOS. SE CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS Y NO LOS DAÑOS A BIENES TRASPORTADOS, PERSONAS TRANSPORTADAS, NI A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, CARGUE, DESCARGUE.
- POSESIÓN, USO DE DEPÓSITOS, TANQUES, TUBERÍAS.
- GASTOS Y COSTOS DE DEFENSA: LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y DEMÁS GASTOS, COSTOS Y COSTAS QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO CONSECUENCIA DE LA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE LA VÍCTIMA O SUS CAUSAHABIENTES, AÚN EN EL CASO DE QUE SEA INFUNDADA, FALSA O FRAUDULENTA. EN MATERIA PENAL, SE RECONOCERÁ LOS GASTOS DE DEFENSA DEL ASEGURADO O CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ASEGURADO, CUANDO SEAN PROCESADOS POR DELITOS CULPOSOS O ABSUELTOS POR DELITOS DOLOSOS, QUE A SU VEZ GENEREN O PUEDAN GENERAR A SU CARGO LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AMPARADOS POR ESTA PÓLIZA. SUBLÍMITE POR PERSONA/EVENTO DEL 30% DEL LÍMITE ANUAL AGREGADO EN EL BÁSICO; SUBLÍMITE AGREGADO VIGENCIA DEL 60%.

- SE ESTABLECE COMO LÍMITE ÚNICO COMBINADO (INCLUYENDO LOS SUBLÍMITES OTORGADOS) ANUAL AGREGADO LA SUMA DE $767,905,293.38

DEDUCIBLES: TODO EVENTOS: 10% SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 5 SMMLV, APLICA AUN PARA COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA.

CLAUSULAS Y CONDICIONES ADICIONALES:
1. LOS LÍMITES DADOS EN CADA CLÁUSULA ANTERIOR NO SON INDEPENDIENTES SINO QUE FORMAN PARTE DEL LÍMITE BÁSICO.
2. ESTÁ PÓLIZA NO SE CONSIDERA PRIORIDAD, NI DEDUCIBLE NI TAMPOCO PODRÁ SER UTILIZADA COMO EXCESO DE NINGUNA OTRA PÓLIZA, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SE HAYA ESTABLECIDO LO CONTRARIO.
3. LA COBERTURA DE LA PÓLIZA ESTA LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO Y SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL DESARROLLO DEL OBJETO PREVISTO EN LA PÓLIZA.
4. EL ASEGURADO DEBE TOMAR LAS MÁXIMAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ADECUADAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES COMO SEÑALES DE SEGURIDAD, ADVERTENCIAS, RECOMENDACIONES Y DEMÁS MEDIDAS QUE SEAN ADECUADAS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LA LEY ESTABLEZCA.
5. LA EMISIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA (ANEXO) SE OTORGA SOBRE LA BASE QUE EL ASEGURADO NO CONOCE NI HA

4630252

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68375	4	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2019	MODIFICACIÓN	TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

DEBIDO CONOCER EVENTO ALGUNO QUE AFECTE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA MISMA (O), SO PENA DE NO CONTAR CON COBERTURA AQUELLOS EVENTOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA (ANEXO)

6. EL ASEGURADO SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA DEBIDA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA ESTA LABOR. SIENDO EMPLEADOS DEL ASEGURADO O DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, DEBERÁN TENER AFILIACIÓN A LA ARL, SIN EXCEPCIÓN.

7. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, Y DISPONER DE UN COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA

8. AL INICIO DE LAS OBRAS DEBERÁ TENER EN SU PODER LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ASÍ COMO LOS PLANOS DE TENDIDO DE REDES, CABLES EXISTENTES Y/O TUBERÍAS.

9. AL INICIO DE LA OBRA EL ASEGURADO DEBERÁ TENER LAS ACTAS DE VECINDADES DEBIDAMENTE FIRMADAS Y DILIGENCIAS SEGÚN LO ESTABLEZCA LA LEY.

10. EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS HERRAMIENTAS DE LOS LINIEROS DE LÍNEAS ENERGIZADAS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE AISLAMIENTO PARA EQUIPOS DE TRABAJO EN LÍNEA

11. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO

EXCLUSIONES: EN ADICIÓN A LAS EXCLUSIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

- RC PROFESIONAL DE TODO TIPO, D&O (DIRECTORES Y ADMINISTRADORES), E&O (ERRORES Y OMISIONES)
- DAÑOS GENÉTICOS.
- R.C. PROFESIONAL DE TODO TIPO, ERRORES Y OMISIONES
- ENFERMEDADES PROFESIONALES.
- MULTAS Y DAÑOS PUNITIVOS Y/O EJEMPLARES.
- RECLAMACIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL O POR MORA DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. R.C. CONTRACTUAL
- RC DECENAL
- FALLAS DE LOS EQUIPOS
- FALLAS, FALTAS O VARIACIONES EN EL SUMINISTRO.
- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
- CULPA GRAVE.
- ROBO, HURTO, HURTO CALIFICADO Y/O DESAPARICIÓN MISTERIOSA
- DAÑOS A /PÉRDIDA DE: DINERO, DOCUMENTOS, VALORES, JOYAS, OBRAS DE ARTE.
- GUERRA Y GUERRA CIVIL.
- RC DERIVADA DE MOTÍN, HUELGA, ALBOROTO POPULAR, LOCK-OUT, PARO, CONMOCIÓN CIVIL, ACTOS DE TERRORISMO, CONFISCACIÓN, SABOTAJE.
- DAÑOS DERIVADOS DE ACTOS DE AUTORIDAD O ACTOS DE TERCEROS FUERA DEL CONTROL DEL ASEGURADO, INCLUYENDO ACTOS TERRORISTAS
- CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA.
- FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO / ACTOS DE NATURALEZA.
- RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN CASO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS.
- R.C. MARÍTIMA / RC FLUVIAL, DAÑOS A BARCOS, EMBARCACIONES Y SUS DAÑOS CONSECUENCIALES, P&I, RIEGOS PORTUARIOS, RIESGOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUERTOS, DIQUES, MUELLES O DESEMBARCADEROS Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (SEÑALIZACIÓN, PILOTAJE), RESPONSABILIDAD DE ASTILLEROS Y ESTIBADORES
- RIESGOS OFF SHORE
- RC AVIACIÓN, DAÑOS A AVIONES, PISTAS, LÍNEAS AÉREAS, LA RESPONSABILIDAD DE LA TORRE DE CONTROL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE AEROPUERTOS TANTO PARA LA OPERACIÓN COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS O DE CUALQUIER SITIO DE LANZAMIENTO Y SUS RESPECTIVAS INFRAESTRUCTURAS (P.EJ. SEÑALIZACIÓN, CONTROL AÉREO) – INCLUYENDO LOS RIESGOS DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO (P.EJ. COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, LIMPIEZA).
- ASÍ MISMO SE ENTIENDEN EXCLUIDOS:

A) LOS DAÑOS A LOS AVIONES Y EL DAÑO PATRIMONIAL PURO EN CONSECUENCIA DEL DAÑO MATERIAL (ESPECIALMENTE SI EL RESULTADO ES EL "GROUNDING" DE LOS AVIONES).
B) DAÑOS DEBIDO A RETRASOS DE LOS VUELOS (LLEGADA/SALIDA) CON RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO.
C) LESIONES FÍSICAS/MUERTE DE PASAJEROS QUE VIAJAN A BORDO DE LOS AVIONES

- RC CONTRACTUAL, PROFESIONAL, DAÑOS OCURRIDOS DURANTE LOS VIAJES, DAÑOS CAUSADOS POR DEMORAS, CANCELACIONES DE RESERVAS, NO DISPONIBILIDAD DE VUELOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, TRANSPORTE DE PERSONAS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, CUALQUIER TIPO DE DAÑO CASUADO EN, POR O DURANTE UN VUELO EN CUALQUIER TIPO DE AERONAVE.
- CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL, SÚBITA, IMPREVISTA, GRADUAL Y PALATINA, DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O AL ECOSISTEMA, DAÑO ECOLÓGICO PURO, DESCONTAMINACIÓN DE SUELOS, GASTOS QUE DEMANDE LA LIMPIEZA Y/O REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR CONTAMINACIÓN SÚBITA Y ACCIDENTAL, LOS GASTOS PARA EVITAR O DISMINUIR EL AGRAVAMIENTO DE LOS DAÑOS; Y, OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ESTOS EVENTOS.
- DAÑOS DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES O SUSTANCIAS: ASBESTOS, UREA DE FORMALDEHIDE, PCB´S,

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68375	4	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2019	MODIFICACIÓN

DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

PCNB'S, HIDROCARBUROS Y HIDRÓGENOS CLORINADOS, ORGANOCLORADOS, CLORO FLUO CARBONO, MTBE, METIL TER BUTIL ÉTER, PLOMO, ASKARELES, TABACO, DIOXINAS, CIANURO, DIMETIL, ISOCIANATOS, TEREFTALATOS ,MOHO, LATEX, AMIANTO, MALATION Y PALATION.

- FABRICACIÓN, MANEJO Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS TALES COMO MUNICIONES, FUSIBLES, CARTUCHOS, PÓLVORA, NITROGLICERINA, FUEGOS ARTIFICIALES, CUANDO SEA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ASEGURADO
- MINERÍA SUBTERRÁNEA
- DES (DIETILESTISBESTROL, CONTRACONCEPTIVOS, OXIQUINOLINA,VACUNAS)
- RIESGOS QUÍMICOS Y/O FARMACÉUTICOS.
- DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN Y USO DE ASBESTO O SUSTANCIAS QUE TENGAN COMO MATERIAL DICHA MATERIA
- LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE MUNICIPIOS Y AYUNTAMIENTOS
- EMPRESAS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA
- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
- CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
- ELECTRÓPOLUCIÓN
- DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO – TRANSMISIÓN DE VIRUS; RC DE LA INTERNET. Y CYBER RISK
- RC PROVENIENTE DE LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/O APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE)
- DAÑOS A LOS BIENES TRANSPORTADOS Y EL MEDIO DE TRANSPORTE.
- TRANSPORTE Y MANEJO DE COMBUSTIBLES.
- RC TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, EXPLOSIVAS, INFLAMABLES Y/O TÓXICAS, EXCEPTO LAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA SU MANEJO
- DAÑO MORAL SIN DAÑO FÍSICO, ANGUSTIA MENTAL, ACOSO SEXUAL, ABUSO DESHONESTO Y TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN
- DIFAMACIÓN, CALUMNIA / INFAMIA, DECLARACIONES CON CARÁCTER OFENSIVO
- VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN DE TERCEROS
- PIRATERÍA Y APROBACIÓN DE TÍTULOS O LEMAS AJENOS
- CUALQUIER VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PRIVACIDAD
- TRANSMISIÓN Y/O CONTAGIO DE ENFERMEDADES
- PÉRDIDAS CONSECUENCIALES QUE NO PROVENGAN DE UN DAÑO MATERIAL O LESIÓN CORPORAL. PÉRDIDA DE MERCADO. PÉRDIDAS FINANCIERAS PURAS.
- DAÑOS PREVISIBLES O A CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- DAÑOS A LAS OBRAS O A SUS INSTALACIONES Y A BIENES MUEBLES/INMUEBLES ASEGURADOS O ASEGURABLES BAJO PÓLIZAS DE DAÑOS (TRC/TRM).
- DAÑOS PRODUCIDOS DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DEL ASEGURADO.
- DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE PRUEBAS LLEVADAS A CABO POR EL ASEGURADO Y DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN.
- DAÑOS MATERIALES Y CONSECUENCIALES TANTO A LAS OBRAS CIVILES PROPIAS, COMO A LA INSTALACIÓN MECÁNICA Y A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MONTAJE.

DAÑOS A LA OBRA MISMA DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O MONTAJE ASÍ COMO A OTRAS PROPIEDADES DEL DUEÑO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EMPLEADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- DAÑOS A INMUEBLES DERIVADOS DE TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICIÓN, QUE SE PRODUZCAN EN UN CÍRCULO CUYO RADIO EQUIVALGA A LA ALTURA DE LA CONSTRUCCIÓN A DEMOLER O DERRIBAR.
- DAÑOS OCASIONADOS A LOS TERRENOS, EDIFICIOS, PARTES DE EDIFICIOS O INSTALACIONES A APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR, ASÍ COMO LOS DAÑOS POR NO APUNTALAR, SOCALZAR O RECALZAR CUANDO ESTAS ACTIVIDADES DEBIERAN HACERSE.
- GARANTÍA DE CALIDAD EN LOS TRABAJOS REALIZADOS.
- DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA DEMORA O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- DAÑOS A LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- R.C. POR EL USO DE VEHÍCULOS (COBERTURA PRIMARIA).
- RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS O TRABAJOS TERMINADOS ASÍ COMO LA EFICIENCIA O GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, RETIRADA DE PRODUCTOS, INEFICIENCIA DE PRODUCTOS, DEGRADACIÓN DEL PRODUCTO, PRODUCTOS CONTAMINADOS / PRODUCT TAMPERING
- ERRORES DE CÁLCULO O DE DISEÑO DE LA OBRA.
- DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ADMINISTRATIVOS Y/O VIOLACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTA POR LAS AUTORIDADES QUE RIGEN ESTA ACTIVIDAD
- RESPONSABILIDADES POR UBICACIONES DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO.
- RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DERIVADA DE EMPRESAS, SUCURSALES O FILIALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO
- RECLAMACIONES PROVENIENTES DEL EXTRANJERO.
- RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE VALOR ASEGURADO
- R.C POR DAÑOS O PÉRDIDA DE LOS BIENES BAJO CUSTODIA, TENENCIA Y CONTROL DEL ASEGURADO
- DAÑOS NO ATRIBUIBLES AL ASEGURADO DEBIDO A LA IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA DE TERCEROS.
- LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN DEMOLICIONES, COMO OBJETO PRINCIPAL.
- RESPONSABILIDAD CIVIL DECENAL Y SIMILARES, TALES COMO VICIOS DE CONSTRUCCIÓN, ESTABILIDAD DE OBRA, CALIDAD DEFICIENTE DE MATERIALES UTILIZADOS.
- CAMPANARIOS, CHIMENEAS DE FÁBRICA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN, PROPIEDAD, POSESIÓN U OPERACIÓN DE REPRESAS O DIQUES.

JMalucelli TRAVELERS

POLIZA No.	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICION
68375	4	BOGOTA	21 /2 /2019	BOGOTA, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /2 /2019	00:00 Horas del 15 /11 /2019	MODIFICACIÓN

DIRECCION GENERAL	Calle 98 No. 21-50 Of. 901
TELEFONO	5522350

TOMADOR	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
ASEGURADO	CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA	NIT	901.190.351 - 2
DIRECCIÓN	CL 100 NO 8A - 55 TO C OF 401, BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4660906
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0
DIRECCIÓN		TELÉFONO	0

- LA PERFORACIÓN DE TÚNELES, EN CUYO CASO DEBERÁN INFORMAR A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS CUANDO SE VAYAN A REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJOS PARA SER INCLUIDOS Y DETERMINAR LAS CONDICIONES PROPIAS DE LA ACEPTACIÓN.
- LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES CUYA ESTRUCTURA LONGITUDINAL SEA DE CARÁCTER COLGANTE O ATIRANTADO.
- OPERACIÓN DE PLATAFORMAS Y POZOS DE PERFORACIÓN
- DAÑOS AL POZO
- RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
- DAÑOS A CABLES, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS
- PROPIEDADES ADYACENTES / VIBRACIONES

********** FIN PÓLIZA **********

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019, a continuación se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	31	3	2019

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 1250 DEL 6 DE JULIO DE2018
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS HERRERA – EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

FECHA DE INICIO: 22/08/2018 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 450 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 15 DE NOVIEMBRE 2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0912 DE2018 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES: _____

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

OBSERVACIONES:

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: _____

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: _____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: _____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: _____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: _____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.
