ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-01 Versión 1	Página 1 de 1 01/02/2025

INFORME DEL CONTRATISTA

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha del presente informe	26/03/2026

PERIODO REPORTE	09/12/2026 - 26/03/2026	CONVENIO No.	31
FECHA DE INICIO	09/12/2025	FINALIZACIÓN	01/04/2026
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL	SUPERVISOR:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	REPORTE DEL CONTRATISTA		*REPORTE DEL SUPERVISION*			
			VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			
ITEM	*ACTIVIDADES PACTADAS*	*ACTIVIDADES EJECUTADAS*	*T*	*P*	*N*	*OBSERVACIONES*
1	Realizar trabajos de acuerdo con las descripciones anteriormente convenidas	Se realizan los trabajos de acuerdo a las actividades expuestas en el presupuesto y las especificaciones tecnicas, los cuales se van avanzando como se muestra en el anexo de las realizacion de los trabajos		X		
2	Garantizar el cumplimiento de las actividades o servicios establecidos en el convenio con personal de la comunidad de la vereda donde se realizan los trabajos.	se garantiza el cumplimiento de las actvidadesdeservicio establecidas en el convenio personal de la comunidad los trabajos realizados y la participacion de la misma comunidad		X		
3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y Documentos soporte de la contratación	se garantiza la calidad delos bienes materiales expuestos y necesarios en la realziacion del convenio		X		

4	Atender las instrucciones y lineamientos teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.	se atiende los lineamientos tanto expuestos por el supervisor del convenio de acuerdo a la realizacion del convenio		X		
5	Encontrarse a paz y salvo por el pago de aportes de sus empleados de las personas que JAC emplee para la ejecución del presente convenio, mediante certificación a la fecha, expedida por el presidente.	Se hace el pago de seguridad social de acuerdo a los aportes de sus empleados de las personas que integran la JAC		X		
6	Rendir un informe detallado de la ejecución de las actividades objeto del convenio.ía.	se rinde el inforem detallado de las activiidades a cobrar		X		
7	recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecución del objeto y el alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 95 de la Ley 2166 de 2021	se realiza la actividad		X		
8	Entregar, con el acta de terminación del convenio, registro fotográfico que evidencie la ejecución del objeto del convenio.	por elmomento no se entrega la totalidad del convenio pero el cual se termine a satisfaccion se realizara el acta de entrega correpondiente			X	

INSTRUCTIVO:

Actividades pactadas: El proveedor debe incluir las actividades consignadas en la minuta.

Actividades pactadas: El proveedor debe argumentar de manera explicita, el desarrollo de cada actividad pactada.

Verificacion ejecucion de actividades: El informe debe presentarse de manera periodica según las clausulas de ejecucion teniendo presente que se deben verificar si la actividad se desarrollo ***T=*** TOTALMENTE, ***P=*** PARCIALMENTE, ***N=*** No se ejecuto.

Observaciones: Se registraran todas aquellas novedades por parte del contratista para demostrar por medio de registro fotografico, y/o documental el cumplimiento debido de la misma.

Adicionalmente como proveedor entrego estos documentos: Ejemplo:FACTURA -, ACTA PARCIAL DE PAGO Y COPIA DE SEGURIDAD SOCIAL.DE **No. De planilla FEBRERO**

FIRMAS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL

CONTRATISTA

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

SUPERVISIOR

Informe de ejecución

CONVENIO SOLIDARIO No. 31 DE 2025

(26 de Marzo de 2026)

CONVENIO SOLIDARIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL

CONVENIO NO:	**31 de 2025**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MACANAL**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA DE LA VEREDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS**
CONTRATISTA:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL** **920001552-6** **BENJAMIN CORTES CAJAMARCA** **19.071.572 expedida en Bogotá DC**
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($36.000.000,00)**
PLAZO:	**VEINTITRES (23) DIAS**
PLAZO ADICIONAL	**DOS (02) MESES**
FECHA DE INICIO:	**NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**PRIMERO (01) DE ABRIL DE 2026**

VALOR INICIAL	$36.000.000	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 32.380.871,00
SALDO POR GIRAR		$ 3.619.125,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$36.000.000	$ 36.000.000

ACTIVIDADES EJECUTADAS





LOCALIZACION Y REPLANTEO: La localización se realizo a lo largo de la placa huella de acuerdo a las especificación dada en los estudios previos anexos y demás cantidades

EXCAVACION Y CUNETEO Y PERFILACION DE BANCA: Se realiza la Excavación Mecánicas y se perfila el cuneteo para dar nivel y los elementos listos para la compactación del material a recibir.





EXTENDIDA Y COMPACTA: Compactación de la vía de acuerdo a la zona a realizar en la cual se cuenta con el terreno listo para realización de la instalación de el acero y concreto respectivamente





CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 21 MPa - (3000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)




CONCRETO PARA PLACA HUELLA DE 28 MPa - (4000 PSI). (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)





SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO: Se realiza la instalación del concreto ciclópeo de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos presentados.



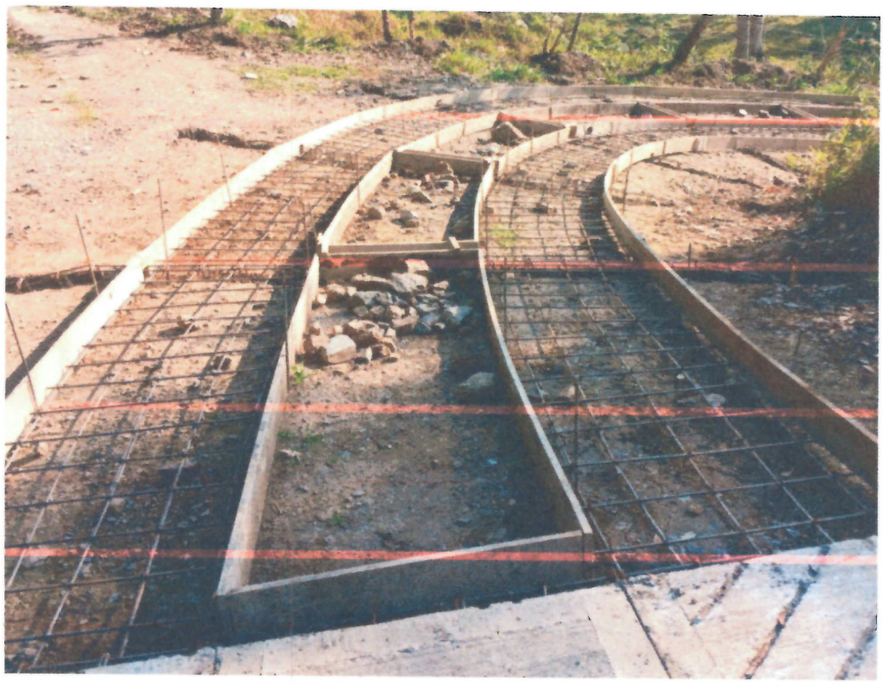

SUMINISTRO DE ACERO 3/8 : Realización de instalación de varillas de acero de 3/8 a lo largo de la placa huella según se muestra en el informe.





MATERIALES ESPECIFICOS PLACA HUELLA: Cantidades de material recebo, cemento acero y demás

BENJAMIN CORTES CAJAMARCA
R/L: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMON DEL MUNICIPIO DE MACANAL
