UT Corredores Verdes 2025

Formato del acta MPA-01-F-23
ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

ACTA PARCIAL N°: 3 ACTA FINAL

<table>
<tr><td>CONTRATO No y FECHA</td><td>LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>Obra</td></tr>
<tr><td>LUGAR Y FECHA DEL ACTA</td><td>San José de Cúcuta, 19 de marzo de de 2026</td></tr>
<tr><td>No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA</td><td>1405 del 19 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1.559.614.622,00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>FUENTE DE FINANCIACIÓN</td><td>
<table>
<tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>14</td><td>EVALUACIÓN</td><td>$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>SOBRETASA AMBIENTAL</td><td>$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>SEGUIMIENTOS</td><td>$</td></tr>
<tr><td>18</td><td>TASA POR USO DE AGUA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>23</td><td>TASA RETRIBUTIVA</td><td>$</td></tr>
<tr><td>24</td><td>SECTOR ELÉCTRICO</td><td>$</td></tr>
<tr><td>21</td><td>RENTAS CONTRACTUALES</td><td>$ 1.536.000.000,00</td></tr>
<tr><td>27</td><td>CERTIFICACIONES</td><td>$ 23.614.622,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>DURACIÓN DEL CONTRATO</td><td>nueve (9) meses.</td></tr>
<tr><td>ASISTENTES</td><td>UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
Contratista

UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
Interventor

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Supervisor</td></tr>
<tr><td>COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR</td><td>Del 01 al 28 de Febrero del 2026</td></tr>
<tr><td>VALOR A COBRAR</td><td>QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($ 502,980,046.00)</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA</td><td>Porcentaje de ejecución 52.55 %</td></tr>
<tr><td>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</td><td>OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE</td></tr>
</table>

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 5, 04/03/2025

	($ 819,553,108.00)
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Excavación y nivelación, Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación,Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico), suministro de Veraneras, agaves,Cactus, isora blanca y roja, Palma Bismarckia, Palma Manila, Cordyline, Cancion de la india,Frailejo, Amancay, Spring, Phillodendro corazon, Phillodendro Sellium, Pandanus Variagado, Veranera Tallo alto, Flor del Llano, ixora patilla, y plantas Rastreras e instalacion de Piedra bola.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$1.559.614.622,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$1.559.614.622,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 316.573.062,00
Primer pago Acta No 1	$ 71.766.772,00	$0,00
Primer pago Acta No 2	$ 244.806.290.00	$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$ 502,980,046.00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 740,061,514.00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	0306000100056599 Cuenta Corriente banco BBVA
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

UT Corredores Verdes 2025

Formato del avance de obra acumulado y ejecutado en el periodo del acta MPA-01-F-26 INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**		**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	UT Corredores Verdes 2025	**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**DESDE:** 2/1/2026
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ** **UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**		**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES** **UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	**HASTA:** 2/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
1	**DIAGNOSTICO**																	
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$0.00	1.00	$9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ - .00		$ - .00	0.30	$ 2,819,451.00
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$0.00	1.00	$2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ - .00		$ - .00	0.30	$ 655,269.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$0.00	1.00	$2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ - .00		$ - .00	0.30	$ 640,583.00
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ - .00		$ - .00		$ - .00	-	$ -
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	-$10,988,420.00	13,161.69	$17,794,605.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ - .00	6,223.73	$ 8,414,483.00
2,2	Excavacion y nivelacion	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$0.00	600.00	$36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00	154.98	$ 9,314,298.00	586.58	$ 35,253,578.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	-$2,010,600.00	47.00	$31,499,400.00		$ - .00		$ - .00		$ - .00	-	$ -
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	-$8,495,767.00	649.03	$26,106,583.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ - .00		$ - .00	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$39,939,903.00	12,104.00	$136,073,168.00			2,895.52	$ 32,551,436.00	8,127.93	$ 91,374,189.00	11,023.45	$ 123,925,625.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	554.04	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$551.00	554.04	$65,306,357.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	284.94	$ 33,586,733.00	383.70	$ 45,228,106.00
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$3,937,272.00	416.00	$14,119,872.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	258.00	$ 8,757,036.00	411.00	$ 13,950,162.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$7,858,024.00	288.00	$12,037,824.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	183.00	$ 7,649,034.00	283.00	$ 11,828,834.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	-$4,679,800.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$0.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$0.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	-$1,348,700.00	50.00	$1,348,700.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	-$1,190,660.00	26.00	$418,340.00		$ -		$ - .00	21.00	$ 337,890.00	21.00	$ 337,890.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$1,774,400.00	260.00	$2,883,400.00		$ -		$ - .00	255.00	$ 2,827,950.00	255.00	$ 2,827,950.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	-$1,146,330.00	10.00	$127,370.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	-$2,113,500.00	50.00	$704,500.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$0.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	-$200,900.00	10.00	$200,900.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	-$1,205,400.00	20.00	$401,800.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	-$17,290,000.00	- .00	$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	-$17,079,360.00	40.00	$17,079,360.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	-$27,365,940.00	10.00	$3,909,420.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$0.00	14.00	$7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ - .00	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$0.00	50.00	$20,547,100.00		$ -		$ - .00	5.00	$ 2,054,710.00	5.00	$ 2,054,710.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	-$9,690,225.00	10.00	$3,876,090.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$0.00	36.00	$19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ - .00	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$0.00	9.00	$4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ - .00	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	-$23,256,540.00	20.00	$7,752,180.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$18,172,187.00	123.00	$51,980,907.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	108.00	$ 45,641,772.00	118.00	$ 49,867,862.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$0.00	80.00	$31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ - .00	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$25,719,200.00	716.00	$44,266,700.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	445.00	$ 27,512,125.00	666.00	$ 41,175,450.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	-$3,097,100.00	100.00	$6,194,200.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**		**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	UT Corredores Verdes 2025	**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**DESDE:** 2/1/2026
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**		**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	**HASTA:** 2/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	-$3,122,100.00	150.00	$9,366,300.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	10.00	$ 624,420.00	65.00	$ 4,058,730.00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$0.00	180.00	$10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ - .00	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$0.00	100.00	$6,010,900.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	-$13,221,000.00	500.00	$13,221,000.00		$ -		$ - .00	470.00	$ 12,427,740.00	470.00	$ 12,427,740.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$0.00	400.00	$21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	125.00	$ 6,763,625.00	210.00	$ 11,362,890.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$0.00	250.00	$6,693,750.00		$ -		$ - .00	245.00	$ 6,559,875.00	245.00	$ 6,559,875.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$3,408,867.00	313.00	$16,936,117.00		$ -		$ - .00	308.00	$ 16,665,572.00	308.00	$ 16,665,572.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$18,884,041.00	849.00	$45,938,541.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	585.00	$ 31,653,765.00	844.00	$ 45,667,996.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$11,795,762.00	453.00	$24,511,377.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	416.00	$ 22,509,344.00	448.00	$ 24,240,832.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$0.00	60.00	$3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	7.00	$ 402,094.00	45.00	$ 2,584,890.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$0.00	500.00	$13,304,500.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$0.00	22.00	$614,724.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$14,359,950.00	1,550.00	$40,468,950.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	819.00	$ 21,383,271.00	869.00	$ 22,688,721.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$0.00	100.00	$2,610,900.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$0.00	20.00	$1,105,500.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	-$4,158,144.00	5.00	$649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ - .00	5.00	$ 649,710.00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	-$1,559,304.00	25.00	$3,248,550.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ - .00	19.00	$ 2,468,898.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$0.00	50.00	$2,747,100.00		$ -		$ - .00	11.00	$ 604,362.00	11.00	$ 604,362.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$14,349,450.00	1,713.00	$30,234,450.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	1,643.00	$ 28,998,950.00	1,703.00	$ 30,057,950.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	-$4,059,500.00	20.00	$353,000.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$2,964,159.00	99.00	$2,964,159.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$5,603,400.00	600.00	$5,603,400.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$4,388,600.00	200.00	$4,388,600.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$3,394,500.00	100.00	$3,394,500.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Chocoviana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$3,744,630.00	90.00	$3,744,630.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$3,324,510.00	90.00	$3,324,510.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$3,018,200.00	100.00	$3,018,200.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$1,747,050.00	50.00	$1,747,050.00						$ - .00	-	$ -
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$416,584.00	7.00	$416,584.00						$ - .00	-	$ -
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	-$30,701,079.00	13.92	$1,571,192.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	-$5,154,920.00	60.00	$7,732,380.00		$ -		$ - .00	45.75	$ 5,895,940.00	45.75	$ 5,895,940.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$0.00	2.00	$4,180,400.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$0.00	2.00	$5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ - .00	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$4,338,725.00	1.00	$4,338,725.00						$ - .00	-	$ -
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$0.00	672.00	$52,080,000.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$0.00	47,600.00	$64,355,200.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$0.00	15,400.00	$86,886,800.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$0.00	11,000.00	$32,395,000.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -

Corponor

CUADRO INFORME MENSUAL OBRA EJECUTADA

MPA-01-F-26, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**		**CONTRATO No.:**	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**	**PERIODO REPORTADO**
OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	UT Corredores Verdes 2025	**OBJETO:**	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**DESDE:** 2/1/2026
CONTRATISTA:	**EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**		**INTERVENTOR:**	**NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES 2025**	**HASTA:** 2/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO						MODIFICACION			TOTAL CONTRATADO		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°2		EJECUTADO ACTA PARCIAL N°3		ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**	**CANTIDAD**	**VALOR ($)**
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	-$4,676.00	1,075.00	$43,152,650.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$0.00		$0.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$0.00	2,500.00	$27,735,000.00		$ -		$ - .00		$ - .00	-	$ -
Ajuste compensatorio																$ (356.00)		$ (356.00)
COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL					**$ 1,189,274,532**			**$0.00**		**$1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ 383,544,339.00**		**$ 624,945,179.00**
ADMINISTRACION(22%)				22%	$ 261,640,397.00			$0.00		$261,640,397.00		$ 12,039,568.20		$ 41,068,616.60		$ 84,379,754.58		$ 137,487,939.38
IMPREVISTOS (2%)				2%	$ 23,785,491.00			$0.00		$23,785,491.00		$ 1,094,506.20		$ 3,733,510.60		$ 7,670,886.78		$ 12,498,903.58
UTILIDADES (6%)				6%	$ 71,356,472.00			$0.00		$71,356,472.00		$ 3,283,518.60		$ 11,200,531.80		$ 23,012,660.34		$ 37,496,710.74
IVA sobre utilidad 19%)				19%	$ 13,557,730.00			$0.00		$13,557,730.00		$ 623,868.53		$ 2,128,101.04		$ 4,372,405.46		$ 7,124,375.04
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$0.00**		**$1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ 502,980,046.00**		**$ 819,553,108.00**
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**32.25%**		**52.55%**

AVANCE FÍSICO : **52.55%**

OBSERVACIONES:

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 2.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$120 Pesos M/CTE.

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 3.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$236 Pesos M/CTE.

Edinson Ramiro Castro Hernandez
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Nelson David Acevedo Torres
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL INTER VERDES

Luis Carlos Carvajalino Rodriguez
SUPERVISOR - CORPONOR
JEFE DE OFICINAS DE PROYECTOS DE CORPONOR

UT Corredores Verdes 2025

Factura (Sin tachones, ni enmendaduras)

PAGE * MERGEFORMAT

UT Corredores Verdes 2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-3
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 19/03/2026 15:09:02
FEC. VENCE: 29/03/2026
VAL. DIAN: 19/03/2026 03:11:02

CUFE: 055b81ed04de8ab14173757eed8e4b6d97aa1af45a05197081f374301e540fd2ec9f2c181c767c31d887a014df721a85

Datos del Emisor

Razón social: UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT: 902018300-6
Dirección: 1 - Cúcuta
Teléfonos:
Email: CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
NIT: 890505253-4
Dirección: CALLE 13 AVENIDA EL BOSQUE No. 3E-278 CAOBOS - Cúcuta
Teléfonos:
Email: DPENA@CORPONOR.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Base	Vr. Total
1	09	1.00	UND	Pago de Acta de recibo Parcial N°3 - CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 cuyo objeto es ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, P	383,544,339.00	0	0	0.00	383,544,339.00	383,544,339.00

Total items: 1

Totales

Subtotal:		383,544,339.00
Administración	**22% :**	84,379,755.00
Imprevistos	**2%:**	7,670,887.00
Utilidad	**6%:**	23,012,660.00
Iva sobre Utilidad	**19%:**	4,372,405.00
IVA:		0.00
ICO:		0.00
BASE EXENTA:		0.00
VALOR NETO:		502,980,046.00

Total Cantidades: 1
Monto en letras: QUINIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Pago de Acta de recibo Parcial N°3-CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 cuyo objeto es ESTABLECIMIENTO,CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES,REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764103791888 con Prefijo FE desde 1 hasta 50 con vigencia desde 29/12/2025 hasta 29/12/2027

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Certificación de paz y salvo en pago de aportes, seguridad integral del periodo a cobrar expedida por el representante legal.

UT Corredores Verdes 2025

San José de Cúcuta, 04 de Marzo de 2026

Señores
CORPONOR
Cúcuta
Colombia

Referencia: Certificado de Pago Parafiscales y seguridad social

Yo , EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 1090379197, expedida en Cúcuta en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales. Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en el mes de Marzo de 2026, en San José de Cúcuta.

Atentamente;



EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ

CC.1.090.379.197

R.L. UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

LA SUSCRITA INTERVENTORIA CUYO CONTRATO LIC 731-2025

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO

CERTIFICA

Qué, UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, identificado con el NIT 902018300- 6, cuyo Representante Legal es EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.090.379.197 de Cúcuta, cumplió a satisfacción con el objetivo del contrato en mención, de acuerdo con lo consignado en el informe de acta parcial No. 02 correspondiente al periodo del 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026

Que presentó pagos de pensión, salud, riesgos profesionales y parafiscales del personal que ha laborado en la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

PERIODO	PLANILLA	VALOR PAGADO	OPERADOR
Febrero - 2026	36581907	10.857.800	Asopagos

San José de Cúcuta, 04 de Marzo 2026

Sin otro Particular

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
CC.1.090.490.104 de Cúcuta
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

UT Corredores Verdes 2025

Planillas de pago del periodo a cobrar

PAGE - MICROSOFT

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36581907	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.857.800	7.400	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	36581907	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13195283	GUTIERREZ PEÑARANDA JESUS ALBEIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
2	CC 13277198	VILLAN YANEZ RUBEN DARIO	1.750.905	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSIONES-25-14	817.089	130.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	817.089	32.700	COMFAORIENTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	8.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	204.800	S	2024001
3	CC 13497841	HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS	1.750.905	F	X															0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.108.907	177.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.108.907	44.400	COMFAORIENTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	11.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	277.900	S	2024001
4	CC 13499606	LAMUS FLOREZ JUAN CARLOS	1.750.905	F	X	X														0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.400.724	224.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.400.724	56.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.459.088	58.400	1.400.724	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	353.400	S	2024001
5	CC 13505985	ORTIZ COLMENARES MARTIN FREDY	1.750.905	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	1.108.907	177.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.108.907	44.400	COMFAORIENTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	11.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	277.900	S	2024001
6	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
7	CC 13928770	SALAZAR GOYENECHE JOSE ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
8	CC 19773673	MONTERO SAMPAYO SILFRED	1.750.905	F	X															0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.225.634	49.100	1.225.634	12.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S	2024001
9	CC 88001405	MEJIA CAICEDO ISMAEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
10	CC 88282209	MANDON AVENDAÑO GIOVANI	1.750.905	F	X	X														0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFANORTE-CCF37	1.519.883	60.800	1.459.088	15.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	368.000	S	2024001
11	CC 1005066478	FERNANDEZ JAUREGUI JUAN MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
12	CC 1090174911	BENITEZ CARVAJAL FREDDY ALONSO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
13	CC 1090175835	CAÑAS PEÑARANDA LUIS CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
14	CC 1090176560	DIAZ TOLOZA MIGUEL HUMBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
15	CC 1090177446	LOPEZ RAMIREZ ALAN KENNY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
16	CC 1090379197	CASTRO HERNANDEZ EDISON RAMIRO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
17	CC 1090461423	HERNANDEZ BOHORQUEZ ARIANA PRHISTLEY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
18	CC 1092342880	TORRES GALINDO WILMER ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
19	CC 1092386993	USECHE BETANCOURT JUNIOR ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
20	CC 1093144012	GARAVITO RAMIREZ JUAN MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
21	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
22	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
23	PT 5330612	GARRIDO RIVAS LUIS JOSE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
24	PT 6236792	MARCANO VIDAL RONALD JUNIOR	1.750.905	F	X															0			24	24	24	24	PROTECCION-230201	1.400.724	224.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.724	56.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.400.724	56.100	1.400.724	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	351.100	S	2024001
25	PT 6914058	VILLALBA MATA FREDDY JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
26	PT 7143344	MARTINEZ GONZALEZ SAMUEL JOSE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36581907	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.857.800	7.400	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
26	36581907	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
43.286.458	43.286.458	43.286.458	43.405.617	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				26	6.927.300	0	4.600	0	6.931.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.548.900	0	1.000	0	1.549.900
PORVENIR	230301	800224808	8	13	3.659.700	0	2.400	0	3.662.100
PROTECCION	230201	800229739	0	7	1.718.700	0	1.200	0	1.719.900
EPS(Administradoras: 4)				26	1.732.900	0	1.300	0	1.734.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	399.600	0	300	0	399.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	240.700	0	200	0	240.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	280.400	0	200	0	280.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	812.200	0	600	0	812.800
ARP(Administradoras: 1)				26	452.600	0	300	0	452.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	26	452.600	0	300	0	452.900
CCF(Administradoras: 2)				26	1.737.600	0	1.200	0	1.738.800
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	25	1.676.800	0	1.100	0	1.677.900
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	60.800	0	100	0	60.900
Gran Total					10.850.400	0	7.400	0	10.857.800

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025** identificado(a) con **número 902.018.300** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130306000100056599** aperturada el **19 de diciembre de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **306056599**
10 dígitos: **0306056599**
16 dígitos: **0306000100056599**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el dia **29** de **diciembre** de **2025** a las **08:28**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 141226005364

(415)7707212489984(8020) 000014122600536 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 41 LT 3 BRR CLARET

42. Correo electrónico corredoresverdes2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 2 7 2 6 3 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 2 4 0	2 0 2 5 1 2 0 1	0 1 6 1	2 0 2 5 1 2 0 1	8 1 3 0	0 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARENAS ARGUELLO ANDERSON

985. Cargo Punto de Contacto Presencial

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 1 2 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 1 2 0 1	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 2 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 3 7 9 1 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	HERNANDEZ	EDISON	RAMIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141226005364

(415)7707212489984(8020) **000014122600536 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 3 0 0	6	Impuestos de Cúcuta	7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 9 5 6 7 8 1	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SISTEMAS AMBIENTALES DEL NORTE SAS BIC

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 5 1 2 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 0 2 7 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: FORESTAL CONSULTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 5 1 2 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE OBRA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

PROYECTO:
ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

El municipio de San José de Cúcuta presenta condiciones climáticas particulares caracterizadas por altas temperaturas, las cuales se han visto intensificadas en los últimos años por fenómenos climáticos como *El Niño*, generando afectaciones en la cobertura vegetal urbana, deterioro de zonas verdes y pérdida de calidad paisajística en espacios públicos estratégicos.

Actualmente, diversas zonas verdes del municipio, especialmente aquellas asociadas a corredores viales, redomas, separadores y jardineras, evidencian deterioro producto de la falta de mantenimiento continuo, crecimiento descontrolado de malezas, deficiencias en riego y acumulación puntual de residuos sólidos, lo que incide negativamente en la percepción ciudadana y en el adecuado aprovechamiento del espacio público.

En concordancia con lo establecido en el **Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 “Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva”**, y en el marco del programa **“Cúcuta Conserva la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos”**, surge la necesidad de adelantar un proyecto orientado al mejoramiento, mantenimiento y recuperación integral de las zonas verdes urbanas, priorizando el uso de especies vegetales adecuadas a las condiciones climáticas locales y funcionales del espacio público.

La **Avenida Libertadores**, como eje vial estructurante y corredor urbano de alta importancia para la ciudad, constituye un punto estratégico de intervención, debido a su impacto paisajístico, ambiental y social. La recuperación de sus zonas verdes contribuye al fortalecimiento de la infraestructura verde urbana, mejora la calidad ambiental, aporta a la regulación microclimática y favorece el bienestar de peatones y conductores.

Este proyecto se concibe como una intervención integral que busca no sólo el embellecimiento paisajístico, sino también la conservación ambiental, el fortalecimiento del sentido de pertenencia ciudadano y la consolidación de espacios públicos más funcionales, sostenibles y acordes con las dinámicas urbanas del municipio.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance la **recuperación, establecimiento, conservación y mantenimiento integral de las zonas verdes del espacio público** del municipio de San José de Cúcuta, en el marco del programa **"Cúcuta Conserva la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos"**, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 *"Cúcuta Perseverante, Segura y Productiva"*.

La intervención se enfoca en corredores viales, redomas, separadores, jardineras y zonas verdes estratégicas de la **Avenida Libertadores**, priorizadas a partir de un diagnóstico técnico que considera el estado actual de la cobertura vegetal, el nivel de deterioro, la funcionalidad del espacio público y su impacto paisajístico y ambiental.

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de las siguientes **fases y actividades generales**:

Fase 1. Diagnóstico y alternativa de intervención

Incluye el análisis del estado actual de las zonas verdes a intervenir, la identificación de puntos críticos relacionados con cobertura vegetal, residuos sólidos, mantenimiento y arbolado existente, así como la formulación de la alternativa de intervención que define los lugares, acciones y actividades a desarrollar.

Las áreas objeto de análisis comprenden, entre otras:

- Redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas.
- Separadores de la Avenida Libertadores hasta el retorno de Circus Pop (calle 9).
- Redomas del parque CORPONOR y parque de los Ingenieros.
- Jardineras desde la Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto.
- Jardineras desde el parque Pamplonita (CENS) hasta 50 metros hacia el parque Rodizio.

- Laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías de parqueo.



Fase 2. Desmonte y limpieza manual

Comprende las actividades preliminares necesarias para preparar el terreno, tales como limpieza general, deshierbe manual, excavación y nivelación puntual, podas técnicas al arbolado existente conforme al diagnóstico y retiro del material sobrante generado durante estas labores.

Fase 3. Establecimiento del componente verde

Corresponde a la ejecución del diseño paisajístico mediante la mejora del suelo, la siembra de especies vegetales ornamentales y nativas adaptadas a las condiciones climáticas del sector, así como la instalación de elementos decorativos y señalización informativa del proyecto.

Fase 4. Mantenimiento y consolidación

Incluye labores de riego programado, limpieza continua, nutrición vegetal, control fitosanitario, podas de formación y retiro de residuos, con el fin de garantizar el adecuado establecimiento y sostenibilidad inicial de la vegetación intervenida.

Fase 5. Educación ambiental y sostenibilidad

Contempla acciones de cultura ciudadana y educación ambiental orientadas a promover la apropiación social del espacio público, el cuidado de las zonas verdes y la adopción de prácticas responsables que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

El alcance del proyecto podrá ser **ajustado o actualizado** durante su ejecución, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo, las recomendaciones técnicas y las directrices de la supervisión del proyecto.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el **área urbana del municipio de San José de Cúcuta**, específicamente en las zonas verdes asociadas a la **Avenida Libertadores**, corredor vial estratégico que articula espacios de movilidad, recreación y encuentro social, y que hace parte del sistema de infraestructura verde urbana de la ciudad.

La intervención se enfoca exclusivamente en **corredores verdes, redomas, separadores, jardineras y zonas verdes aledañas**, priorizadas a partir de un diagnóstico técnico que considera el estado actual de la cobertura vegetal, el nivel de deterioro, el impacto paisajístico y la coherencia con el entorno urbano inmediato. Esta actuación busca generar una intervención integral que contribuya a la continuidad ecológica y estética de la avenida, en articulación con otras iniciativas adelantadas por la administración municipal en el sector del Malecón.

Las áreas específicas de intervención comprenden:



- **Redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas**, incluyendo los separadores de la Avenida Libertadores hasta el retorno de Circus Pop (calle 9 con Avenida Libertadores).

- **Redomas del parque CORPONOR y del parque de los Ingenieros**.

- **Jardineras desde la Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto**.

- **Jardineras desde el parque Pamplonita (CENS) hasta 50 metros en dirección al parque Rodizio**.

- **Zonas laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías de parqueo**.

Dentro del área definida se identifican sectores correspondientes a **zonas previamente intervenidas**, en las cuales se realizarán labores de mantenimiento, así como **zonas que requieren intervención directa**, orientada al mejoramiento, recuperación y establecimiento del componente vegetal.

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficiará de manera **directa e indirecta** a la población del municipio de **San José de Cúcuta**, alrededor de 800,000 habitante especialmente a los habitantes, peatones, conductores y usuarios frecuentes de los espacios públicos asociados a la **Avenida Libertadores**, sus redomas, separadores, jardineras y zonas verdes aledañas.

De manera directa, se beneficiará la población que reside, labora o transita diariamente por los sectores intervenidos, al contar con espacios públicos más ordenados, funcionales y ambientalmente adecuados, que contribuyen a mejorar la calidad paisajística, el confort térmico y las condiciones de uso del entorno urbano.

De forma indirecta, el proyecto impacta positivamente al conjunto de la ciudadanía cucuteña, al fortalecer la infraestructura verde urbana, mejorar la calidad ambiental de un corredor vial estratégico y aportar a la mitigación de los efectos del cambio climático, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.

La cuantificación específica de la población beneficiada se encuentra consignada en la **Matriz General de Ajustes (MGA)** y en la ficha técnica del proyecto, documentos que hacen parte integral del soporte del presente informe.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 731-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DICIEMBRE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1405 del 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL- CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 . EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
OBJETO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	9 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	9 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/24/2026

2.2 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de NUEVE (9) meses que corresponde a 270 días calendario para el contrato de obra para el contrato de interventoría DIEZ (10) meses que corresponde a 300 días.

2.3 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA		2 Años a partir de acta de recibo final	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACIÓN:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra. En el informe N°1.*

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de obra a desarrollar según el modificatorio N°2:

ÍTEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			VALORES ACTUALIZADOS ACTA DE MODIFICATORIO N° 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	DIAGNÓSTICO									
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00
2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL									
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00
3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE									
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00
3,2	siembra de material vegetal						- .00	$ -		$ -
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -

3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- .00	$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00

NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00

NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00

NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum ‘Choconiana’ En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00
3,3	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									

3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construcción de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00
4	MANTENIMIENTO (6 MESES)									
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00	1,075.00	$ 43,157,326.00
5	EDUCACIÓN AMBIENTAL									
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00
COSTO DIRECTO					$ 1,189,274,532.00			$ -		$ 1,189,274,532.00
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00
COSTO INDIRECTO					$ 370,340,090.00			$ -		$ 370,340,090.00

VALOR TOTAL	$ 1,559,614,622.00		$ -		$ 1,559,614,622.00

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCIÓN	*FECHA*
CONTRATO DE OBRA No.LIC 731-2025	
CONTRATO DE OBRA	19/12/2025
ACTA DE INICIO	24/12/2025
ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	31/12/2025
ACTA DE COMITÉ N°1	06/01/2026
ACTA DE COMITÉ N°2	13/01/2026
ACTA DE COMITÉ N°3	19/01/2026
ACTA DE MODIFICACIÓN N°1	20/01/2026
ACTA DE COMITÉ N°4	01/02/2026
ACTA DE COMITÉ N°5	17/02/2026
ACTA DE MODIFICACIÓN N°2	18/02/2026
ACTA DE COMITÉ N°6	25/02/2026

Anexo. *Actas inicio. En el informe N°1*
Anexo. *Acta de comité N°1 . En el informe N°2*
Anexo. *Acta de comité N°2. En el informe N°2*
Anexo. *Acta de comité N°3. En el informe N°2*
Anexo. *Acta de de Modificación N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comité N°4.*
Anexo. *Acta de comité N°5.*
Anexo. *Acta de de Modificación N°2*
Anexo. *Acta de comité N°6.*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Con relación al plazo contractual, han transcurrido treinta y ocho (66) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 24.44%

Ver Anexo No. 1 *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

Ver Anexo No. 2 *(Control de tiempos)*

4 AVANCE FÍSICO – FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra es del 52.55% del valor total contratado.

El avance de ejecución del proyecto es de 52.55 %.

Ver anexo No. 3. *(Balance físico – financiero contrato de obra)*

5. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O ORDEN PÚBLICO

El comportamiento climático estuvo marcado por la influencia de días cálidos, que favorecen condiciones mayormente secas y cielos con nubosidad parcial que favorecen la ejecución de actividades.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

2.2 Excavación y nivelación

Esta actividad comprende los movimientos de tierra necesarios para adecuar el terreno a las cotas de diseño paisajístico, garantizando que el suelo tenga la profundidad y la pendiente adecuadas para el sostenimiento de la vegetación.

Objetivo: Proporcionar una base física óptima que facilite la aireación del suelo y el correcto desarrollo radicular, asegurando que el diseño paisajístico sea funcional, estético y duradero frente a las condiciones climáticas de la ciudad.

NP 2,5 Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.

Esta labor consiste en el aprovechamiento del material extraído durante las excavaciones de obra para el relleno y la nivelación de las áreas de intervención. El proceso incluye el extendido, la eliminación de elementos sobredimensionados y la conformación del material, ajustándose a las pendientes y niveles topográficos establecidos en el diseño paisajístico.

El propósito fundamental de esta intervención es estabilizar y uniformar la superficie del terreno mediante una estrategia de compensación de volúmenes, eliminando la necesidad de importar rellenos externos y optimizando el manejo de sobrantes en sitio.

3,1 Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)

Esta actividad comprende el suministro, preparación e incorporación de una mezcla técnica compuesta por suelo seleccionado, arena y materia orgánica en las áreas destinadas a la siembra. El proceso se ejecuta de manera focalizada mediante la integración manual de estos componentes con la tierra del sitio, asegurando una distribución homogénea que optimice la estructura física y la composición química del sustrato en la zona radicular de cada especie.

3,2,1 Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Veranera, entregados en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 8 y 15 cm. El proceso técnico integra la selección de plantas con óptimo estado fitosanitario, su

transporte protegido y la instalación definitiva en campo.

3,2,2 Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Agave, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 20 y 30 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas.

3,2,7 Suministro de material vegetal especie Cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Agave, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 30 y 50 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas

3,2,8 Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja : En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de la isora blanca y roja, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 15 y 25 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas.

NP 3,2,18 Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 y 70, con una altura Con altura de 1 y 1.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Bismarckia, entregados en bolsa de 60 kg (número 50 y 70) con una altura de 1 y 1.50 metros. El proceso técnico abarca la selección de individuos con óptimo vigor fitosanitario, su transporte especializado hasta el sitio de obra para proteger el follaje y el estípite, y la instalación definitiva.

NP 3,2,23 Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Palma Manila, entregados en presentaciones de bolsa de 30 kg (números 60 a 80) y con una altura total entre los 2.00 y 2.50 metros. El proceso operativo abarca la verificación fitosanitaria de cada individuo, su traslado protegido al área de intervención y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,25 Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie

Cordyline, entregados en bolsa de 3 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 0.70 y 1.00 metros. El proceso técnico integra la selección de plantas con follaje vigoroso y coloración característica, su transporte protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,27 Suministro de material vegetal especie CANCIÓN DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Canción de la India, entregados en bolsa de 6 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,30 Suministro de material vegetal especie FRAILEJÓN: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 y 30 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Frailejón, entregados en bolsa de 6 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,31 Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 30 y 50 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Amancay, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 30 y 50 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,32 Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Spring, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 20 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,33 Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 y 40, de largo entre 80 a 100 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Philodendro Corazón, entregados en bolsa de 6 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 80 a 100 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con óptima ramificación y coloración foliar, su traslado protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,34 Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Philodendron Selloum, entregados en bolsa de 6 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con hojas lobuladas de aspecto vigoroso, su transporte especializado para proteger la integridad de sus grandes frondas y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,35 Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Pandanus Variegado, entregados en bolsa de 10 kg (números 40 y 60) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El procedimiento incluye la selección de plantas con su característico follaje cintiforme y variegación definida, su transporte protegido para evitar lesiones en las hojas y la instalación definitiva en el terreno.

NP 3,2,36 Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Veranera Tallo Alto, entregados en bolsa de 10 kg (números 60 y 80) con una longitud establecida entre los 30 y 70 cm. El proceso técnico incluye la selección de individuos con un eje principal leñoso y definido, su transporte protegido para preservar la estructura del tallo y el follaje, y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,39 Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra de la especie Flor del Llano, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso operativo incluye la selección de individuos con tallos vigorosos y follaje sano, su transporte protegido para evitar el maltrato de sus brotes y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,34 Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Flor del Llano, entregados en bolsa de 8 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 30 Y 70 cm. El proceso operativo incluye la selección de individuos con tallos vigorosos y follaje sano, su transporte protegido para evitar el maltrato de sus brotes y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,45 Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de especies

Rastreras, entregados en bolsa de 1 kg (número 14) con una longitud establecida entre los 10 y 20 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con guías vigorosas y brotes sanos, su transporte protegido para evitar el maltrato del follaje rastrero y la instalación definitiva en campo.

3,3,2 Suministro e instalación de piedra bola

Esta actividad comprende el suministro e instalación de piedra bola para elementos decorativos en el diseño paisajístico

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2.2	Excavación y nivelación	m3	154.98	$ 60,100.00	$ 9,314,298.00
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m2	8127.93	$ 11,242.00	$ 91,374,189.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	284.94	$ 117,873.00	$ 33,586,733.00
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	258	$ 33,942.00	$ 8,757,036.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	183	$ 41,798.00	$ 7,649,034.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	21	$ 16,090.00	$ 337,890.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	255	$ 11,090.00	$ 2,827,950.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	5	$ 410,942.00	$ 2,054,710.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	108	$ 422,609.00	$ 45,641,772.00

NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	445	$ 61,825.00	$ 27,512,125.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	10	$ 62,442.00	$ 624,420.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	470	$ 26,442.00	$ 12,427,740.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	125	$ 54,109.00	$ 6,763,625.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	245	$ 26,775.00	$ 6,559,875.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	308	$ 54,109.00	$ 16,665,572.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	585	$ 54,109.00	$ 31,653,765.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	416	$ 54,109.00	$ 22,509,344.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	7	$ 57,442.00	$ 402,094.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	819	$ 26,109.00	$ 21,383,271.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	11	$ 54,942.00	$ 604,362.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1643	$ 17,650.00	$ 28,998,950.00

3.3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	45.75	$ 128,873.00	$ 5,895,940.00
Ajuste compensatorio				$ (356.00)	$ (356.00)
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 383,544,339.00
ADMINISTRACIÓN 22%					$ 84,379,755.00
IMPREVISTOS 2%					$ 7,670,887.00
UTILIDAD 6%					$ 23,012,660.00
IVA 19%					$ 4,372,405.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 119,435,707.00
COSTO TOTAL OBRA					$ 502,980,046.00
INTERVENTORÍA					$ 19,634,049.00
TOTAL PROYECTO					$ 522,614,095.00

Ver anexo No. 4. *(Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Ver Anexo No. 5. *(Registro fotográfico del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*

6.1 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS

Se informa que, de acuerdo con el presupuesto oficial del proyecto y los alcances contratados, **no se tiene contemplada la ejecución de ensayos de laboratorio** por parte de la interventoría.

En consecuencia, el control de calidad realizado durante este periodo por la obra se basó en:

- **Inspección Visual:** Verificación directa en campo de los procesos constructivos.
- **Fichas Técnicas:** Revisión de la calidad de los materiales e insumos suministrados por los proveedores.
- **Certificados de Calidad:** Validación de los documentos de origen de los materiales utilizados.

Se certifica que, mediante estos mecanismos de control, las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas y las especificaciones requeridas para la naturaleza del proyecto

6.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de corte comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, y contando con el aval técnico de la Interventoría y la aprobación de la Supervisión, se formalizó la reestructuración del equipo de trabajo del proyecto. El proceso de transición administrativa contempló el retiro de los anteriores profesionales en los cargos de Director de Obra, Residente de Obra e Inspector HSEQ el día 02 de febrero, dando paso inmediato al ingreso del nuevo personal especializado el 03 de febrero de 2026, de esta forma el equipo de trabajo quedó conformado de la siguiente manera:

CARGO	PERSONAL RETIRADO	PERSONAL INGRESADO
DIRECTOR DE OBRA	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO CC. 1.096.952.550	DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE CC. 88.032.705
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO CC. 13.719.287	DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ CC. 1.093.779.650
INSPECTOR HSEQ	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL CC. 1.096.249.395	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO CC. 1.094.276.397

7. ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

El avance financiero pagado del contrato de obra en la suscripción del acta parcial **N°1** es **4.60%** del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra **No. 1** por valor de $71,766,772.00, para un valor total a cobrar de $ **$71,766,772.00** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance financiero pagado del contrato de obra en la suscripción del acta parcial **N°2** es **15.70%** del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra **No. 2** por valor de $244,806,290, para un valor total a cobrar de **$244,806,290** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 3 es 32.25 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 3 por valor de, **$502,980,046.00** para un valor total a cobrar de **$502,980,046.00** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción acumulada de las actas parciales es 52.55 % del valor total contratado.

Saldo por pagar **$740,061,514.00**, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

Ver Anexo No. 6. *(Estado financiero de obra y relación de pagos)*

8. CONTROL SOCIAL

Se informa que, durante el presente periodo de corte de ejecución, **no se realizaron visitas presenciales** por parte de los miembros del Comité Veedor ni de representantes de la Junta de Acción Comunal a las instalaciones de la obra o a la oficina técnica.

Sin embargo, es importante precisar lo siguiente:

- **Canales Abiertos:** Se mantienen los canales de comunicación dispuestos por el Contratista y la Interventoría para atender cualquier requerimiento de la comunidad.
- **Soportes:** En el evento en que se realicen dichas visitas en periodos futuros, las constancias, actas de vecindad o registros de asistencia serán anexados debidamente en el **Informe de Ejecución del Contratista de Obra**, previa validación de esta Interventoría.

A la fecha del presente informe, no se han radicado inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad que requieran el desplazamiento del comité veedor al sitio de los trabajos

9. CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS HSEQ DE CORPONOR

Durante el periodo del informe se diligenció el formato **MPA-01-F-28 versión 2**, correspondiente al *Informe mensual de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas*, incluyendo los anexos requeridos por la Corporación. Así mismo, se realizó y presentó el control diario del equipo de trabajo del contratista de la obra, conforme a lo establecido.

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

Anexo. *Planes, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)*

9.1 LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

Para la ejecución del proyecto se contó con el siguiente personal, correspondiente a las personas que laboraron durante el periodo del informe.

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo
1	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO	13719287	Residente de obra
2	José Alexander Salazar Goyeneche	13928770	Profesional Ambiental
3	JESUS ALBEIRO GUTIERREZ PEÑARANDA	13195283	Tecnologo agropecuari
4	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO	1096952550	Director de Obra
5	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL	1096249395	Inpsector HSEQ
6	CASTRO HERNANDEZ EDINSON RAMIRO	1090379197	REPRESENTANTE LEGA
7	Ariana Prhistley Hernandez Bohorquez	1090461423	ARQUITECTA
8	Cuadros Aguirre Diego Eduardo	88032705	Director de obra
9	Darlin Yeritza Martinez Martinez	1093779650	Residente de obra
10	Danny Surelly Parra Lizcano	1094276397	Inpsector HSEQ

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	JARDINERO
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	JARDINERO
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	JARDINERO
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	JARDINERO
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	JARDINERO
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	JARDINERO
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	JARDINERO
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	JARDINERO
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	JARDINERO
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	JARDINERO
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	JARDINERO
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT	1092386993	JARDINERO
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	JARDINERO
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	JARDINERO
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	JARDINERO
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	JARDINERO
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	JARDINERO
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	JARDINERO
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	JARDINERO

Anexo. *Control diario del personal de obra (Asistencia)*

9.2 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Se presenta el listado del personal técnico y administrativo vinculado al proyecto, organizado en orden alfabético e incluyendo la respectiva fecha de ingreso. Para cada una de las personas registradas, se dio cumplimiento a lo establecido en los numerales

NOMBRE	IDENTIFICACIOI	CARGO
ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	JARDINERO
ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO	1096952550	DIRECTOR DE OBRA
ARIANA PRHISTLEY HERNANDEZ BOHORQUEZ	1090461423	ARQUITECTA
CASTRO HERNANDEZ EDINSON RAMIRO	1090379197	REPRESENTANTE LEGAL
DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	1094276397	INSPECTOR HSEQ
DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ	1093779650	RESIDENTE DE OBRA
DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE	88032705	DIRECTOR DE OBRA
FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	JARDINERO
FREDDY JESUS VILLALBA MATA PPT	6914058	JARDINERO
GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	JARDINERO
ISAIAS HERNANDES HERNANDEZ	13497841	JARDINERO
ISMAEL MEJIA CAICEDO 88001405	88001405	JARDINERO
JESUS ALBEIRO GUTIERREZ PEÑARANDA	13195283	TECNOLOGO AGROPECUARIO
JOSÉ ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE	13928770	PROFESIONAL AMBIENTAL
JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	JARDINERO
JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	JARDINERO
JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	JARDINERO
JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT	1092386993	JARDINERO
LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL	1096249395	INSPECTOR HSEQ
LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	JARDINERO
LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO	13719287	RESIDENTE DE OBRA
LUIS JOSE GARRIDO RIVAS PPT	5330612	JARDINERO
MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505965	JARDINERO
MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	JARDINERO
RONAL JUNION CARCANO VIDAL	6236792	JARDINERO
RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277196	JARDINERO
SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ PPT	7143344	JARDINERO
SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	JARDINERO
WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	JARDINERO

9.2.1 EXÁMENES DE INGRESO

Se presentan las copias de los exámenes de ingreso del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe.

Anexo *(Exámenes de ingreso del personal ingresado)*

9.3 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe.

9.3.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

9.3.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - PENSIÓN

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

9.3.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - ARL

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Anexo *de pólizas iniciales contrato de obra. En el informe N°1.*
Anexo. *Actas inicio. En el informe N°1*
Anexo. *Acta de comité N°1 . En el informe N°2*
Anexo. *Acta de comité N°2. En el informe N°2*
Anexo. *Acta de comité N°3. En el informe N°2*
Anexo. *Acta de de Modificación N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comité N°4.*
Anexo. *Acta de comité N°5.*
Anexo. *Acta de de Modificación N°2*
Anexo. *Acta de comité N°6.*

Ver Anexo No. 1 *(Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

Ver anexo No. 2. *(Balance físico – financiero contrato de obra)*

Ver anexo No. 3. *(Memorias de cálculo de cantidades de obra desarrolladas en el periodo del informe)*

Ver Anexo No. 4. *(Registro fotográfico del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*

Ver Anexo No. 5. *(Estado financiero de obra y relación de pagos)*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos MPA-01-F28 Versión 2).*

Anexo. *Planes, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)*

Anexo. *Control diario del personal de obra (Asistencia)*

Anexo *(Exámenes del personal ingresado)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado - Salud)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- Pensión)*

Anexo *(Certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social del personal contratado- ARL)*

UT Corredores Verdes
2025

Actas suscritas

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 04

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 1 de Febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

1. Compromisos de entrega de informes quincenales de avance de obra.
2. Aprobación al diseño arquitectónico (Plano 1/3 Redoma Arnulfo Briceño) y diseños arquitectónico de las otras áreas a intervenir
3. Solicitud de modificatorio (cuadro de mayores y menores).
4. Solicitud de Aprobación de cambio de personal(Director de Obra, Residente de Obra; Inspector HSEQ)

.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 9 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. Tema: Informes quincenales de avance de obra

La Interventoría, y supervisión comunica al Contratista las importancias de entrega periódica de informes de avance de obra, los cuales deberán ser presentados de manera quincenal. Se indicó que esto permitirá llevar un control detallado de la ejecución del proyecto y garantizar el seguimiento continuo por parte de la supervisión e interventoría. El Contratista tomó nota de lo expuesto y reafirmó su compromiso de cumplir con dichos informes.

2. Tema: Diseños aprobados y (Plano 1/3 Redoma Arnulfo Briceño) y demás planos arquitectónicos.

La Interventoría informó al Contratista que, una vez revisado, el plano arquitectónico correspondiente a la Redoma Arnulfo Briceño (plano 1/3) ha sido aprobado. No obstante, se aclaró que cualquier modificación durante la ejecución deberá ser comunicada a la interventoria. Por su parte, el Contratista manifestó que, dependiendo del avance de la obra y de las condiciones reales que se presenten en terreno, los diseños podrán estar sujetos a ajustes, garantizando en todo momento la calidad del proyecto y la coherencia con el diseño paisajístico general.

3. Tema: Solicitud de modificatorio contractual (cuadro de mayores y menores)

El Contratista expuso que, conforme al avance de la obra y a las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar, se evidencia la necesidad de realizar un modificatorio contractual que contemple un cuadro de mayores y menores cantidades, así como la posible inclusión de ítems no previstos que permitan ajustar el alcance del contrato a las condiciones reales del terreno y al diseño aprobado. La Interventoría respondió que, para proceder con la revisión formal del modificatorio, el Contratista deberá entregar la documentación completa que sustente técnica, financiera y administrativamente la solicitud, incluyendo memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, justificaciones técnicas y estudios de mercado, entre otros.

- Sábana o presupuesto ajustado, donde se evidencien claramente:
    - Cantidades contractuales que aumentan
    - Cantidades contractuales que disminuyen
    - Inclusión de ítems no previstos
- Memorias de cantidades de obra, debidamente enlazadas con el presupuesto.

- Informe técnico de justificación del balance presupuestal del contratista de obra.
- Justificación técnica, administrativa y financiera de la interventoría.
- APU's (Análisis de Precios Unitarios).
- Cotizaciones.
- Estudio de mercado.
- Especificaciones técnicas.

La Interventoría aclara que únicamente con la entrega completa de la documentación anteriormente relacionada se procederá a la revisión, emisión de recibido y posterior evaluación del modificatorio.

4. Tema: Solicitud de Aprobación de cambio de personal(Director de Obra, Residente de Obra; Inspector HSEQ)

Toma la palabra el contratista, manifestando la necesidad de aprobación de cambio de personal, proponiendo nuevos profesionales para los roles de Director de Obra, Residente de Obra e Inspector HSEQ. Se aclara que la fecha de retiro del personal saliente corresponde al 02/02/2026, con el ingreso inmediato del personal nuevo el 03/02/2026 para evitar vacíos en la supervisión de campo, por lo cual la conformación del personal se establece bajo el siguiente esquema:

CARGO	PERSONAL ANTERIOR	PERSONAL ACTUALIZADO
DIRECTOR DE OBRA	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO CC. 1.096.952.550	DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE CC. 88.032.705
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO CC. 13.719.287	DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ CC. 1.093.779.650
INSPECTOR HSEQ	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL CC. 1.096.249.395	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO CC. 1.094.276.397

El Contratista hace constar que la solicitud de actualización de personal fue radicada oportunamente ante la Interventoría, adjuntando los perfiles que acreditan el cumplimiento de las exigencias del Pliego de Condiciones. Al respecto, la Interventoría manifiesta su aval técnico tras verificar que los profesionales propuestos cumplen con la idoneidad y experiencia requerida. Acto seguido, la Supervisión otorga su aprobación definitiva, validando que la transición se ajusta estrictamente a los requerimientos contractuales. No obstante, ambas instancias aclaran que el Contratista queda obligado a formalizar la vinculación mediante la entrega inmediata de los certificados de afiliación a seguridad social y los exámenes médicos de ingreso del nuevo personal.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. El contratista deberá realizar la revisión integral de los manuales técnicos de señalización aplicables al proyecto y determinar la necesidad de implementar
2. El contratista deberá estructurar y presentar el paquete completo de documentos requeridos para la solicitud de modificatorio.
3. El contratista deberá hacer la entrega de las certificaciones de afiliación de seguridad social y los exámenes médicos del nuevo personal.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 05

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 17 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Intervento LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Aclaración referente al aumento de cantidad estipulado en el ítem. NP 2,5 - 3,1 - 3,2,1 - 3,2,2 - 3,2,8 - 3,2,23 - 3,2,25 - 3,2,33 - 3,2,34 - 3,2,35 - NP 3,2,39 - NP 3,2,45

Necesidad de disminución de cantidad en los ítems: 2,1 - 2,3 - 2,4 - 3,2,6 - 3,2,7 - 3,2,9 - 3,2,10 - 3,2,12 - 3,2,13 - NP 3,2,15 - NP 3,2,16 - NP 3,2,19 - NP 3,2,22 - NP 3,2,26 - NP 3,2,27 - NP 3,2,30 - NP 3,2,42 - NP 3,2,43 - NP 3,2,46 - 3,3,1 - 3,3,2 - 4,5

Aclaración de eliminación de ítems: 3,2,3 - 3,2,14

Necesidad de crear ítems no previstos: NP 3,2,47 - NP 3,2,48 - NP 3,2,49 - NP 3,2,50 - NP 3,2,51 - NP 3,2,52 - NP 3,2,53 - NP 3,2,54 - NP 3,2,55 - NP 3,3,5

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del proceso de revisión de cantidades, se realizó una corrección en el **ítem 3,1** mediante el redondeo de sus unidades a dos decimales. La medida responde a la necesidad de **corregir una distorsión en el cálculo** derivada del uso de múltiples cifras decimales, lo cual afectaba la exactitud de los valores totales. Esta precisión técnica conlleva un incremento residual de **$551.00 pesos** en el costo total del ítem; una cifra que, aunque porcentualmente despreciable, es necesaria para reflejar el valor real y exacto de la ejecución dentro del presupuesto contractual.

3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE						-	.00	$ -			
3.1	Mejora del suelo con material de enriquecido (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$	117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$	65,306,357.00

A su vez se detectó una inconsistencia de precisión en el **ítem 4.5**, procediendo a su respectiva corrección aritmética. A diferencia del ajuste anterior, en esta actividad se optó por **estandarizar la cantidad a un valor entero**, eliminando la dispersión generada por los decimales excedentes. Esta simplificación técnica derivó en una **reducción mínima en la cantidad total del ítem**, permitiendo una liquidación más exacta, acorde a las unidades reales de ejecución en campo.

4	MANTENIMIENTO (6 MESES)						-	.00	$ -			
4.1	Riego programado	m3	672.00	$	77,500.00	$ 52,080,000.00	-	.00	$ -	672.00	$	52,080,000.00
4.2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$	1,352.00	$ 64,355,200.00	-	.00	$ -	47,600.00	$	64,355,200.00
4.3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$	5,642.00	$ 86,886,800.00	-	.00	$ -	15,400.00	$	86,886,800.00
4.4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$	2,945.00	$ 32,395,000.00	-	.00	$ -	11,000.00	$	32,395,000.00
4.5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$	40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$	43,152,650.00

En relación con el ítem **2.1 (Limpieza general y deshierbe)**, se informa que, una vez realizadas las inspecciones técnicas en campo se pudo constatar que diversas áreas contempladas originalmente dentro del alcance de esta actividad no requieren intervención.
Lo anterior obedece a que dichas zonas presentan condiciones adecuadas de terreno, baja presencia de vegetación invasiva. Como resultado de esta verificación, se ha determinado una disminución justificada en el área total a intervenir, ajustando así las cantidades de obra a la realidad física del proyecto y optimizando los recursos disponibles.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL											
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,288.22	$	1,352.00	$ 28,783,025.00	(+)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,191.90	$	17,794,605.00
2.2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$	60,160.00	$ 36,096,000.00		- .00	$ -	600.00	$	36,096,000.00
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	69.00	$	970,200.00	$ 33,519,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,910,600.00)	47.00	$	31,468,400.00
2.4	Retiro de material sobrante	m3	883.24	$	40,224.00	$ 34,832,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,757.00)	849.03	$	26,106,593.00
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m3	8,551.26	$	11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,983.00	12,104.00	$	136,073,168.00

con el objetivo de lograr la nivelación del terreno y mejorar las condiciones del suelo existente, en las áreas restantes del proyecto se realizará una conformación y nivelación del terreno en las demás áreas a intervenir

Esta intervención consiste en retirar el material sobrante de los puntos más elevados para utilizarlo en las zonas que requieren relleno y nivelación. De esta manera, se optimiza el uso del material disponible y se mejora la eficiencia en la ejecución de la obra.

Bajo este criterio de aprovechamiento de recursos y eficiencia técnica, el aumento del ítem **NP 2.5 (Conformación, relleno y nivelación con material de excavación)**, lo cual permite una adecuación del terreno técnicamente viable para el proyecto.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

En cuanto al ítem **2.4 (Retiro de material sobrante)**, se informa una reducción en las cantidades ejecutadas. Esto se debe a que el material obtenido de las excavaciones será reutilizado dentro del mismo proyecto para las labores de conformación y nivelación del terreno. Al aprovechar este material en el sitio de la obra, se reduce la necesidad de retirarlo y disponerlo fuera del proyecto, lo que disminuye el volumen de material sobrante que inicialmente se tenía previsto retirar.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

Continuando con el ítem **2.3 (Poda y/o erradicación de árboles de porte alto)**, y conforme al análisis técnico y al inventario del arbolado existente, se identificó un número menor de ejemplares a intervenir, ya sea para poda o erradicación. Esta situación conlleva a una disminución justificada en la cantidad total considerada inicialmente para el presente ítem.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

Según los objetivos de impacto urbano y paisajístico del proyecto, se ha realizado un diagnóstico integral de las áreas de intervención. Considerando las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por zonas áridas, se determinó la necesidad de incorporar especies vegetales idóneas que garanticen la sostenibilidad y supervivencia en el entorno.

Como resultado de este análisis y en atención a las necesidades específicas identificadas en campo, se ajustaron las cantidades de algunas especies previamente contempladas, disminuyendo algunas y se formaliza la creación de nuevos ítems que responden a las condiciones reales de los espacios y a los requerimientos paisajísticos del proyecto
NP 3,2,47 - NP 3,2,48 - NP 3,2,49 - NP 3,2,50 - NP 3,2,51 - NP 3,2,52 - NP 3,2,53 - NP 3,2,54 - NP 3,2,55

NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	-	00	$ 29.941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2.964.159.00	99.00	$	2.964.159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 9.339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5.603.400.00	600.00	$	5.603.400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	-	00	$ 21.943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4.388.600.00	200.00	$	4.388.600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Ruscelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	-	00	$ 33.946.00	$ -	(+)	100.00	$ 3.394.600.00	100.00	$	3.394.600.00
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 41.697.00	$ -	(+)	90.00	$ 3.744.630.00	90.00	$	3.744.630.00
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 36.939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3.324.510.00	90.00	$	3.324.510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 5 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 30.182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3.018.200.00	100.00	$	3.018.200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Cristo fidee: En bolsa de 3 kg número 35 de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 34.941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1.747.050.00	50.00	$	1.747.050.00
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 59.512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416.584.00	7.00	$	416.584.00

Estas especies han sido seleccionadas por su alta resistencia y adaptabilidad climática.

En consecuencia, y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una reducción proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,6 - 3,2,7 - 3,2,9 - 3,2,10 - 3,2,12 - 3,2,13 - NP 3,2,15 - NP 3,2,16 - NP 3,2,19 - NP 3,2,22 - NP 3,2,26 - NP 3,2,27 - NP 3,2,30 - NP 3,2,42 - NP 3,2,43 - NP 3,2,46**

3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$	26.674.00	$ 2.667.400.00	(-)	(50.00)	$ (1.348.700.00)	50.00	$	1.348.700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$	16.890.00	$ 1.689.000.00	(-)	(74.00)	$ (1.190.660.00)	26.00	$	416.340.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie bore blanco y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$	11.590.00	$ 1.159.000.00	(+)	160.00	$ 1.774.400.00	260.00	$	2.933.400.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie diamela: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$	12.737.00	$ 1.273.700.00	(-)	(90.00)	$ (1.146.330.00)	10.00	$	127.370.00
3,2,12	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$	14.059.00	$ 2.810.000.00	(-)	(150.00)	$ (2.113.500.00)	50.00	$	704.500.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rabelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 00 cm	Und	-	00	$ 64.778.00	$ -		-	00 $ -	-	00 $	-
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Uraga: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$	20.090.00	$ 401.800.00	(-)	(10.00)	$ (200.900.00)	10.00	$	200.900.00
3,2,15	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 35 y 60 cm	Und	80.00	$	20.090.00	$ 1.607.200.00	(-)	(50.00)	$ (1.004.500.00)	30.00	$	601.800.00

NP 3.2.16	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80. Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	88.00	$ 426,984.00	$ 34,166,720.00	(-)	(48.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00
NP 3.2.16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60 , Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	88.00	$ 356,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(78.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00
NP 3.2.17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 45 kg número 90, con una altura Con altura de 2.00 m	Und	14.00	$ 536,942.00	$ 7,503,188.00		- 00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3.2.18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 45 kg número 90 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	58.00	$ 616,942.00	$ 20,547,180.00		- 00	$ -	58.00	$ 20,547,180.00
NP 3.2.19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,696,225.00)	10.00	$ 3,874,890.00
NP 3.2.20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.80 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- 00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3.2.21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.80 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- 00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3.2.22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60 , con una altura total de 0.80 a 1.00 m	Und	88.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(68.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00
NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg numero 60 a 80, con una altura total 2.80 a 2.50 m	Und	88.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00
NP 3.2.26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	159.00	$ 61,542.00	$ 9,291,378.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,180.00)	100.00	$ 6,194,200.00
NP 3.2.27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	203.00	$ 62,442.00	$ 12,486,469.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,369.00
NP 3.2.28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 6 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 68,109.00	$ 10,819,620.00		- 00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3.2.29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 68,109.00	$ 6,810,900.00		- 00	$ -	100.00	$ 6,810,900.00
NP 3.2.30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00
NP 3.2.31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de larga entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- 00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3.2.32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	360.00	$ 26,775.00	$ 9,639,750.00		- 00	$ -	360.00	$ 9,639,750.00
NP 3.2.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 90 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,983,641.00	849.00	$ 46,038,641.00
NP 3.2.35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 15 a	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00
NP 3.2.42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 18 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00
NP 3.2.43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OTI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00
NP 3.2.44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- 00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 15, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,550.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00
NP 3.2.46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,550.00	$ 4,413,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00

de acuerdo con las disminuciones. necesidades de la obra , y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una aumento

proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,1 - 3,2,2 - 3,2,8 - NP3,2,23 - NP3,2,25 - NP3,2,33 - NP3,2,34 - NP3,2,35 - NP 3,2,39 - NP3,2,45**

3.2.1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 5 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,796.00	$ 4,179,600.00	(+)	188.00	$ 7,858,324.00	288.00	$ 12,037,924.00
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 65,796.00	$ 6,579,600.00	(-)	(100.00)	$ (6,579,600.00)	- .00	$ -
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 20 y 95, con una altura entre 30 y 50 cm durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,026.00	$ 1,602,600.00	(-)	(74.00)	$ (1,186,052.00)	26.00	$ 416,548.00
3.2.8	Suministro de material vegetal especie ixora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,096.00	$ 1,109,600.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,600.00
NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 66 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,669.00	$ 33,800,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,972,907.00
NP 3.2.24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROLBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3.2.25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE: En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,715,200.00	716.00	$ 44,262,700.00
NP 3.3.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,888,867.00	313.00	$ 18,936,117.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00
NP 3.2.36	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 18 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,796,762.00	453.00	$ 24,511,377.00
NP 3.2.39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,800.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	568.00	$ 14,358,960.00	1,590.00	$ 48,468,960.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,600.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,150.00	1,713.00	$ 30,234,150.00

En relación con el ítem no previsto **NP 3.3.5 (Construcción de dos corazones en material vegetal)**, y de acuerdo con el avance de la obra, se hace necesaria su incorporación para lograr una integración orgánica con el diseño paisajístico. Esta intervención responde al impacto visual que se busca generar en los transeúntes, permitiendo que el elemento vegetal se funda de manera armónica con el entorno y potencie la intención estética del proyecto

3,3	INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- 00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00

En lo referente al ítem **3,3,1 (Suministro e instalación de material triturado) 3,3,2 (Suministro e instalación de piedra bola)**, tras un análisis detallado del diseño paisajístico final y los criterios estéticos del proyecto, se ha determinado una modificación en el uso decorativos. Se concluye que se priorizará el uso de material vegetal por sobre la piedra bola y triturado En consecuencia, se procede a realizar una reducción en las cantidades ejecutadas de este ítem, ajustando el volumen de suministro a los requerimientos actuales de la propuesta paisajística.

3,3	Instalación de elementos decorativos y duros				$ -		- 00	$ -		$ -
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- 00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00

De acuerdo con las necesidades identificadas durante el avance del proyecto, y conforme a los criterios técnicos y paisajísticos establecidos, se determinó que no resulta viable ni funcional la siembra de las especies inicialmente contempladas. En particular, se evaluaron las condiciones del terreno, los requerimientos de mantenimiento y la integración con el entorno, concluyendo que no se justifica la incorporación de las siguientes especies: **3.2.3** (Suministro de material vegetal especie Maguey: en bolsa de 1 kg, números 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm). - **3.2.14** (Suministro e instalación de Grama maní forrajero.)

En consecuencia, se procede a eliminar dichos ítems del alcance del proyecto, ajustando las cantidades y actividades a las condiciones reales de intervención.

3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg números 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 48,788.00	$ 4,878,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,878,800.00)	- 00	$ -
3.2.14	Suministro e instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- 00	$ -

Tras el análisis del modificatorio del proyecto, la **Interventoría** ha verificado que los ajustes propuestos, correspondientes al balance de cantidades y a la inclusión de ítems no previstos, no alteran el alcance financiero establecido inicialmente

Así mismo, se ha constatado que la solicitud de balance no requiere la adición de recursos financieros, ya que el contrato mantiene su equilibrio económico a la fecha del presente informe.

Una vez elaborado y revisado el balance detallado, la **Interventoría** evidencia que la compensación entre ítems garantiza la ejecución total de las obras proyectadas sin incrementar el valor contractual vigente, asegurando así la eficiencia administrativa y presupuestal de la intervención.

Por las anteriores consideraciones expresadas la presente interventoría considera que la modificación de mayores y menores cantidades es conveniente para el proyecto.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**1,1**	**Análisis del estado actual**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
17	2	2026	Análisis del estado Actual								1		1	**AREA TOTAL DEL PROYECTO**
												TOTAL:	**1.00**	

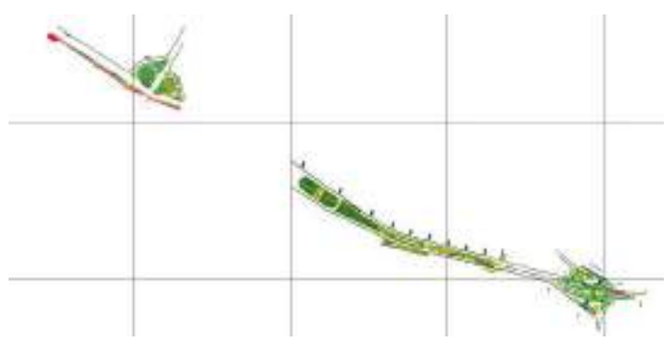

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**1,2**	**Identificación de puntos criticos**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Identificación de puntos criticos								1		1	AREA TOTAL DEL PROYECTO
													TOTAL:	**1.00**

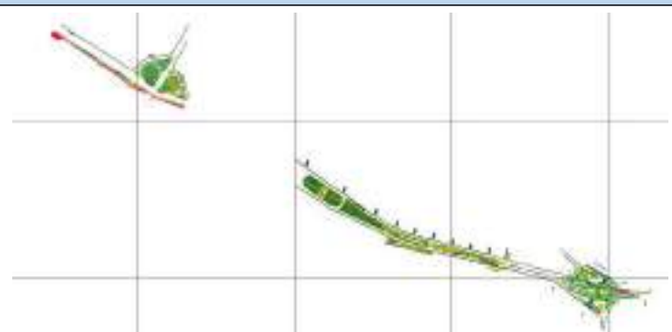

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**1,3**	**Inventario del arbolado existente**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Fichas de inventario por individuo y plano georreferenciado.								1		1	AREA TOTAL DEL PROYECTO
													TOTAL:	**1.00**

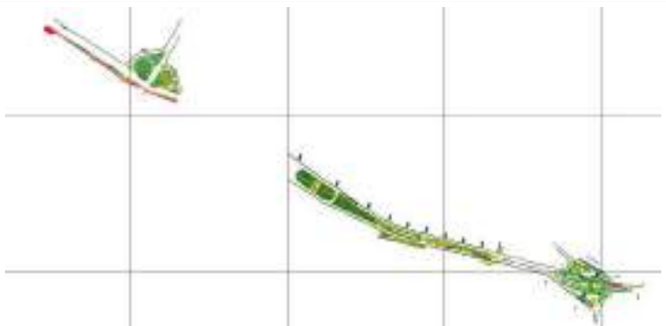

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.									DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2			HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	2,1	Limpieza general y deshierbe	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	21,289.22	CANT EJECUTADA	13,161.69	CANTIDAD ACUMULA	13,161.69

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 1				454.08						454.08	
17	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 3				28.10						28.10	
17	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño Área 2				693.78						693.78	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 1	1.30	0.61								0.79	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 2	1.47	0.62								0.91	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 3	1.40	0.63								0.88	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 4	1.40	0.62								0.87	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 5	1.40	0.57								0.80	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 6	1.40	0.61								0.85	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 7	1.40	0.65								0.91	
												TOTAL:	1,181.97	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.									DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2			HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	2,1	Limpieza general y deshierbe	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	21,289.22	CANT EJECUTADA	13,161.69	CANTIDAD ACUMULA	13,161.69

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 8	1.40	0.69								0.97	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 9	1.40	0.71								1.00	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 10	0.94	0.71								0.66	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 11	1.40	0.70								0.98	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 12	1.40	0.69								0.97	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 13	1.40	0.72								1.01	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 14	1.10	0.75								0.82	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 15	1.05	0.80								0.84	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 16	1.50	0.83								1.25	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 17	1.20	0.92								1.10	
												TOTAL:	9.60	

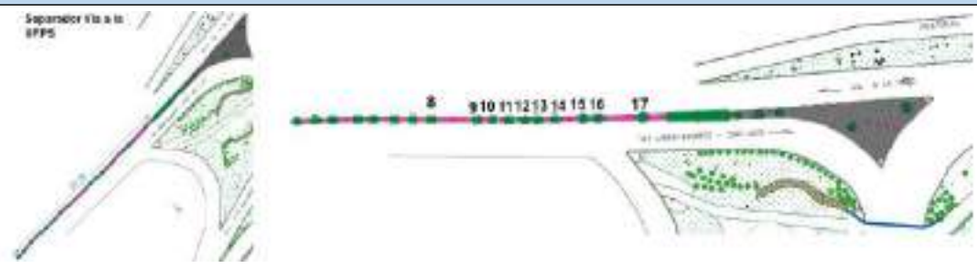

OBSERVACIONES:Hoja 2 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**13,161.69**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**13,161.69**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 18	14.05	1.17								16.37	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 19				1.04				5		5.19	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 20				1.57						1.57	
17	2	2026	Separador vía a la UFPS ÁREA 21				1.85						1.85	
17	2	2026												
17	2	2026	Peatonal UFPS Área 1				324.55						324.55	
17	2	2026	Peatonal UFPS Área 2				115.30						115.30	
17	2	2026												
17	2	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles				199.70						199.70	
17	2	2026												
												TOTAL:	**664.53**	

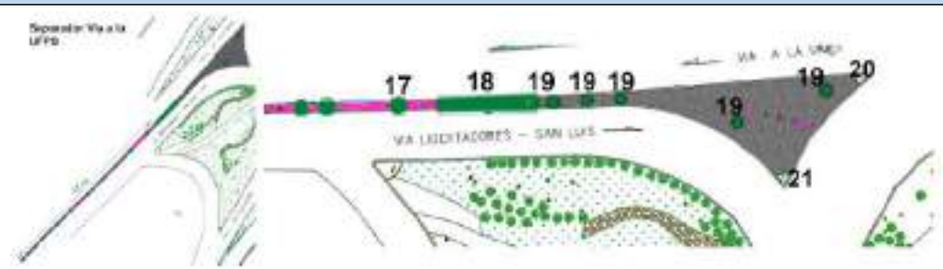



OBSERVACIONES: Hoja 3 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024


CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**13,161.69**	**CANTIDAD ACUMULA**	**13,161.69**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 1				739.07						739.07	
17	2	2026	Lateral izquierdo debajo del puente ÁREA 1				733.04						733.04	
17	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1				806.60						806.60	
17	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2				673.90						673.90	
17	2	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles				229.20						229.20	
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1				298.87						298.87	
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 2				328.84						328.84	
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 3				49.98						49.98	
17	2	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 1				374.91						374.91	
17	2	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 2				133.22						133.22	
												TOTAL:	**4,367.63**	





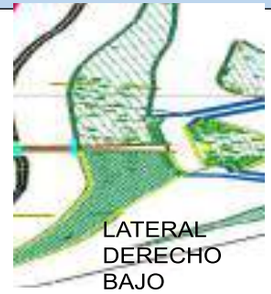





OBSERVACIONES:Hoja 4 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

	CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.								DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	2,1	Limpieza general y deshierbe	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	21,289.22	CANT EJECUTADA	13,161.69	CANTIDAD ACUMULADA	13,161.69	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 1				1.84						1.84	
17	2	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 2				2.54						2.54	
17	2	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 3				4.59						4.59	
17	2	2026	Separador Via Libertadores San Luis ÁREA 4				1.04						1.04	
17	2	2026	Separador Inferior Bajo Puente Guadua				73.35						73.35	
17	2	2026	Separador Superior Bajo Puente Guadua				109.64						109.64	
17	2	2026	Separador Via San Mateo Área 1				100.00						100.00	
17	2	2026	Separador Via San Mateo Área 2				28.29						28.29	
												TOTAL:	321.29	







OBSERVACIONES:Hoja 5 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**							**PERIODO REPORTADO**		
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**										**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**13,161.69**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**13,161.69**		

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 1				239.85						239.85	
17	2	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 2				207.22						207.22	
17	2	2026	Lateral Derecho entre calles 6 a 7A ÁREA 3				327.94						327.94	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 1				479.11						479.11	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 2				297.90						297.90	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 3				1,084.17						1,084.17	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 4				152.18						152.18	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 5				822.53						822.53	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 6				343.94						343.94	
												TOTAL:	**3,954.84**	



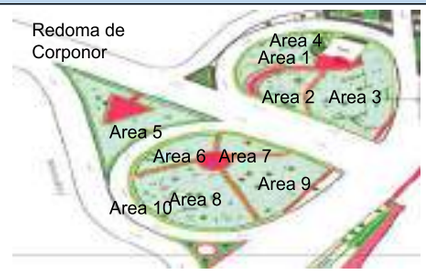

OBSERVACIONES:Hoja 7 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**13,161.69**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**13,161.69**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 7				192.70						192.70	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 8				1,155.15						1,155.15	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 9				861.26						861.26	
17	2	2026	Redoma de Corponor ÁREA 10				126.80						126.80	
17	2	2026												
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 1				2.31						2.31	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 2				26.53						26.53	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 3				11.49						11.49	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 4, 5, 6				6.41						6.41	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 7				30.46						30.46	
												TOTAL:	**2,413.11**	



OBSERVACIONES:Hoja 8 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**		
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**										**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,1**	**Limpieza general y deshierbe**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**	**21,289.22**	**CANT EJECUTADA**	**13,161.69**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**13,161.69**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 8				22.66						22.66	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 9				15.01						15.01	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 10				13.20						13.20	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 11				83.00						83.00	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 12				73.89						73.89	
17	2	2026	Separador Redoma de Corponor ÁREA 13				40.96						40.96	
													248.72	
												TOTAL ACUMULADO	**13,161.69**	





OBSERVACIONES:Hoja 9 de 20

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**600.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**600.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO		LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	En las areas de intervencion del proyecto					600					600.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
												TOTAL:	**600.00**	

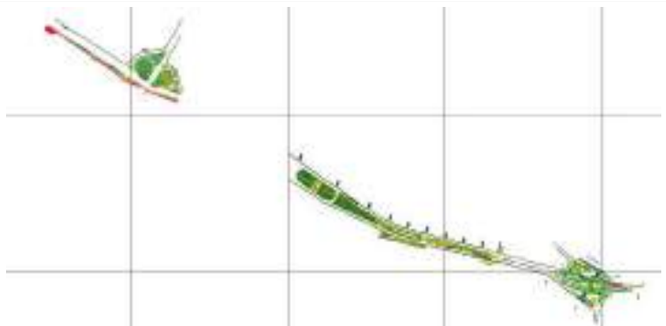

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,3**	**Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**47.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**47.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Erradicacion Arboles porte alto en las areas de intervencion del proyecto								47		47	
												TOTAL:	**47.00**	

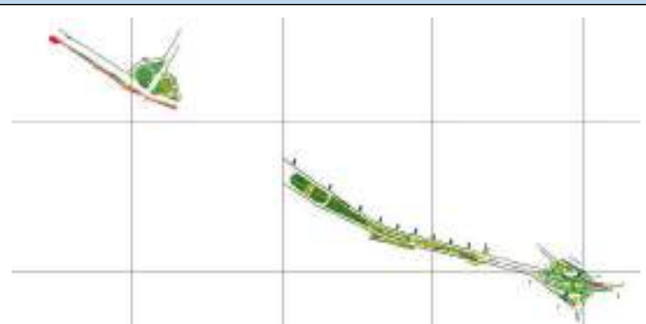

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**							**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**											**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025		**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**2,4**	**Retiro de material sobrante**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**649.03**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**649.03**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
17	2	2026	Área total de limpieza			0.05	3328.21						166.41	**REDOMA PUENTE GUADUA**
17	2	2026	ÁREA total de excavación					332.84					332.84	**REDOMA PUENTE GUADUA**
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
												SUBTOTAL:	**499.2500**	
												Factor área de expansión:	**1.3000**	
												TOTAL:	**649.03**	

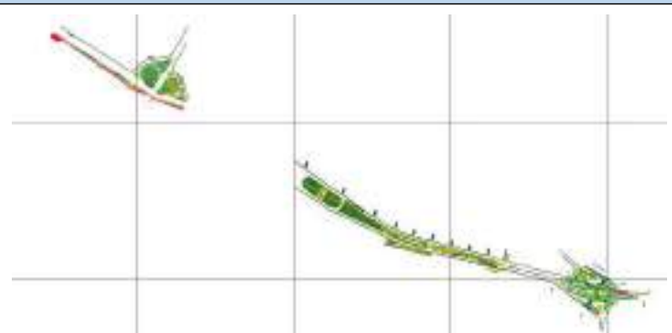

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 2,5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**12104.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**12104.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1				806.60						806.60	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2				673.90						673.90	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Lateral derecho puente de guadua; entrada túneles				229.20						229.20	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1				298.87						298.87	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 2				328.84						328.84	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 3				49.98						49.98	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 1				374.91						374.91	REDOMA PUENTE GUADUA
17	2	2026	Entrada via Libertadores - San Luis ÁREA 2				133.22						133.22	REDOMA PUENTE GUADUA
							9208.48						9208.48	
												SUBTOTAL:	**12104.00**	
												Factor área de expansión:	**1.00**	
												TOTAL:	**12104.00**	

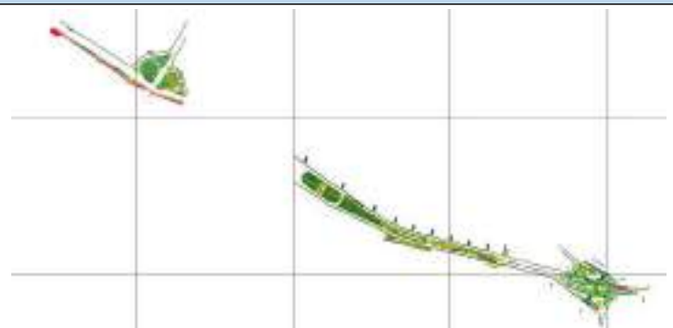

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**554.04**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**554.04**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Mejora de suelo en las areas de intervencion del proyecto					554.04					554.04	
												TOTAL:	**554.04**	

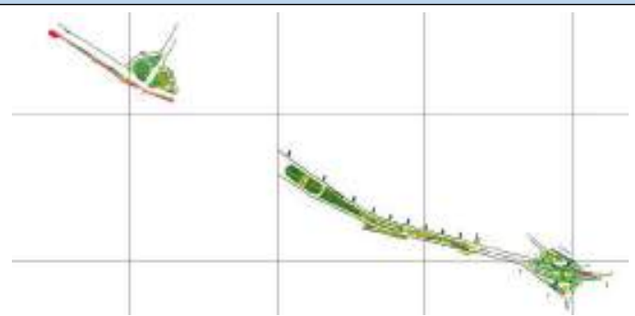

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**416.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**416.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
17	2	2026	Veranera en las areas de intervencion del proyecto								416		416	
												TOTAL:	**416.00**	

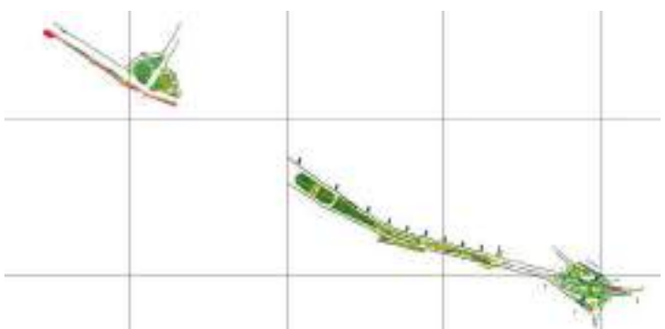



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**288.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**288.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Agave en las areas de intervencion del proyecto								288		288	
												TOTAL:	**288.00**	

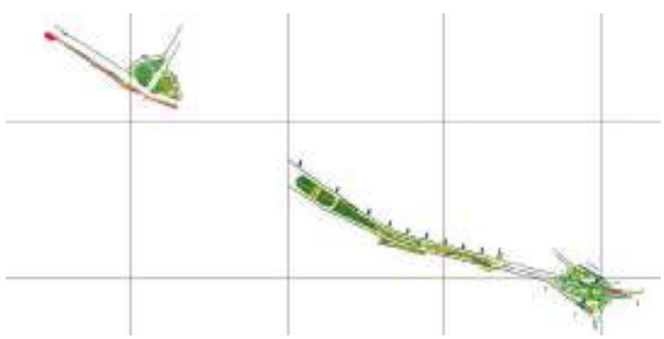



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,3**	**Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Maguey en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

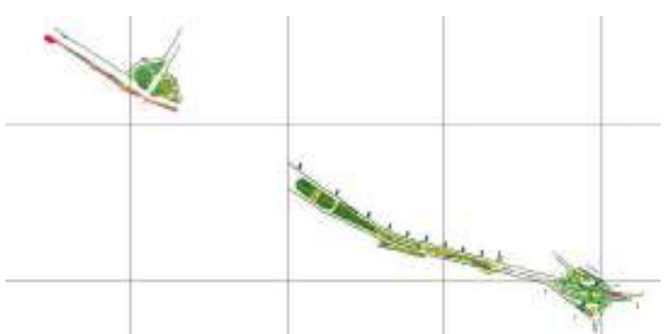



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,4**	**Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Palma CICA en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

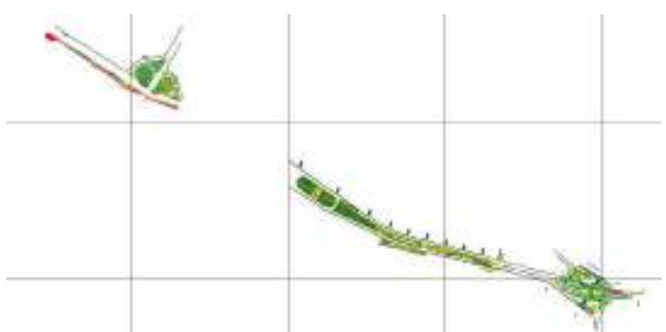



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,5**	**Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Palma Manila en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

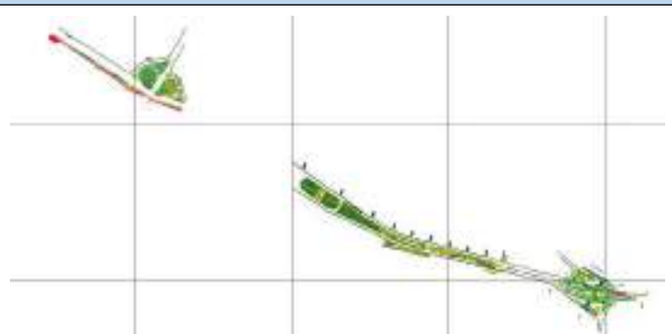



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,6**	**Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**50.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Cinta de Colores en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	**50.00**	

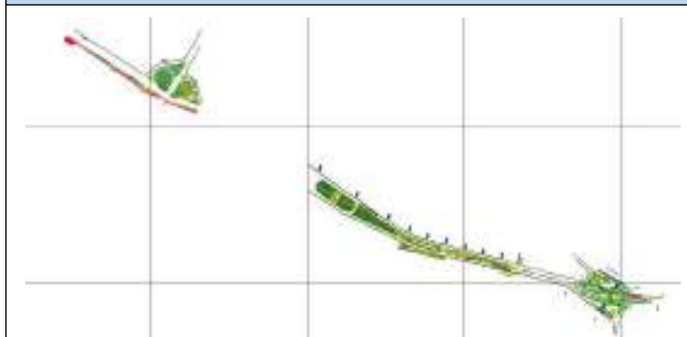



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,7**	**Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**26.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**26.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Cactus en las areas de intervencion del proyecto								26		26	
												TOTAL:	**26.00**	

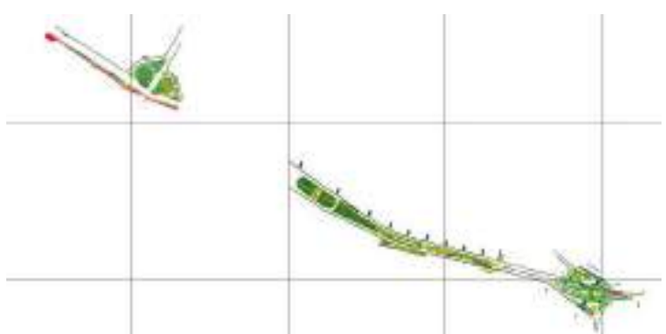



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,8**	**Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**260.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**260.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Isora blanca y roja en las areas de intervencion del proyecto								260		260	
TOTAL:													**260.00**	

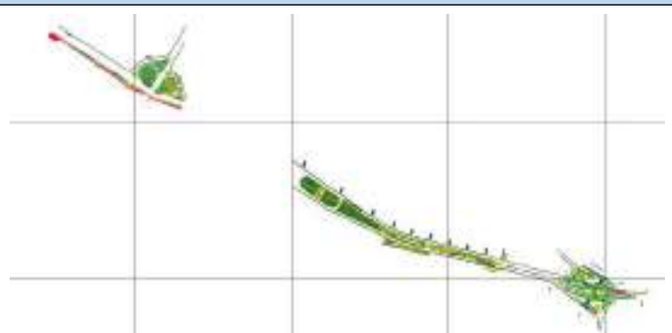

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,9**	**Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**10.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**10.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Duranta en las areas de intervencion del proyecto								10		10	
												TOTAL:	**10.00**	

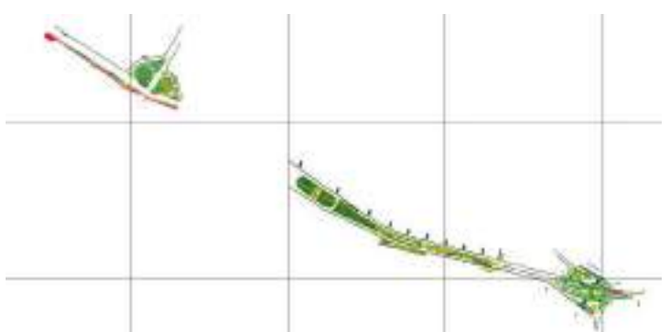



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexill Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,10**	**Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**50.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Lengua de Suegra en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	**50.00**	

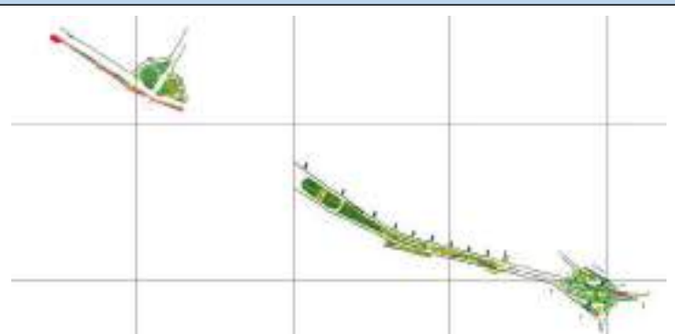



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,11**	**Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Palma rubelina en las areas de intervencion del proyecto								0		0	
												TOTAL:	0.00	

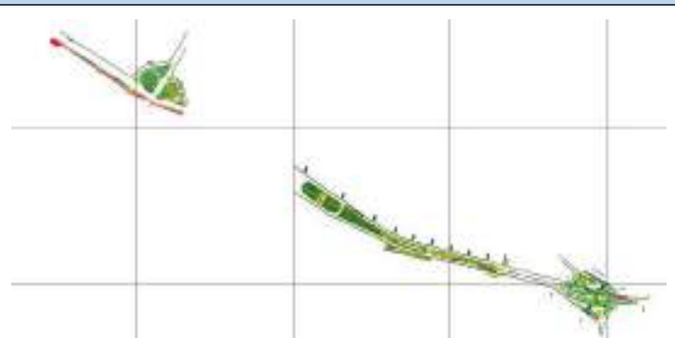



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,12**	**Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**10.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**10.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Urapo en las areas de intervencion del proyecto								10		10	
												TOTAL:	**10.00**	

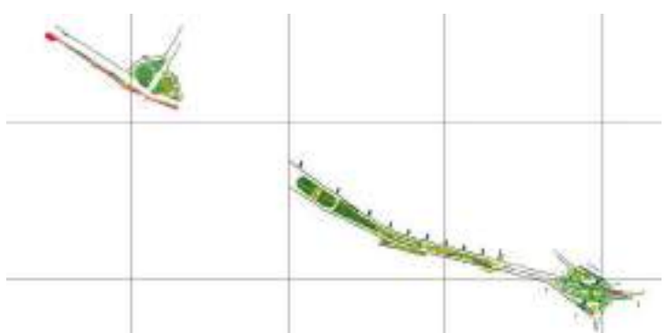



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,2,13**	**Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**20.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**20.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Guayacán en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	**20.00**	

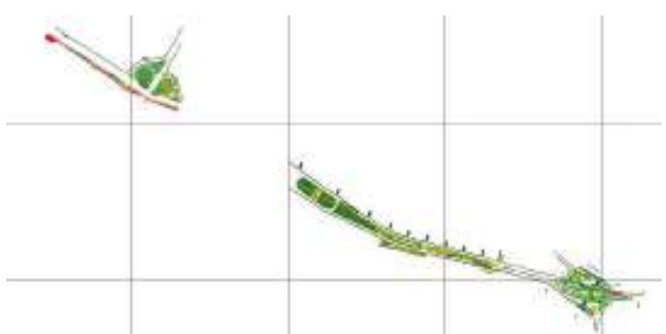



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,14**	**Suministro e Instalación de Grama maní forrajero**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**0.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**0.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Maní Forrajero en las areas de intervencion del proyecto				0						0	
													TOTAL:	**0.00**	

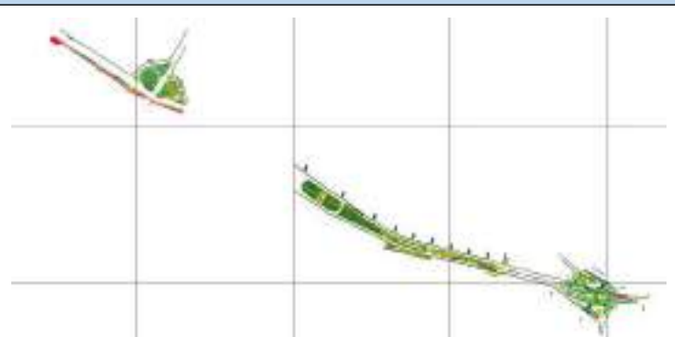



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,15**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**40.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**40.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	PALMA MARIPOSA en las areas de intervencion del proyecto								40		40	
												TOTAL:	**40.00**	

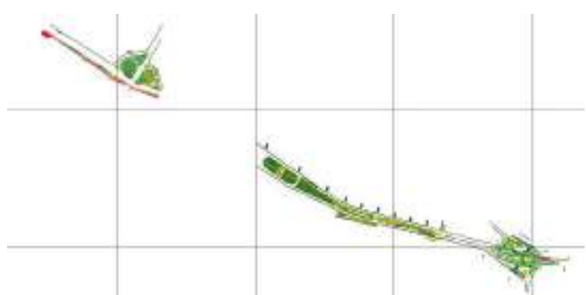



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,16**	**Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**10.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**10.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	PALMA COLA DE ZORRO en las areas de intervencion del proyecto								10		10	
												TOTAL:	**10.00**	

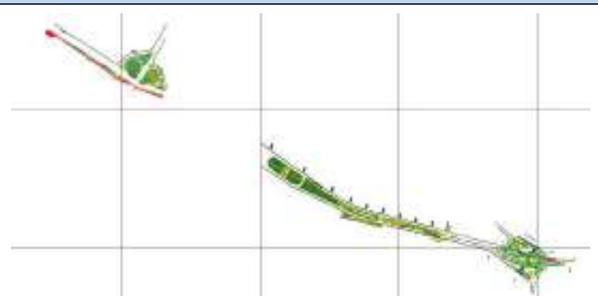



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,17**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**14.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**14.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA BISMARCKIA en las areas de intervencion del proyecto								14		14	
												TOTAL:	**14.00**	

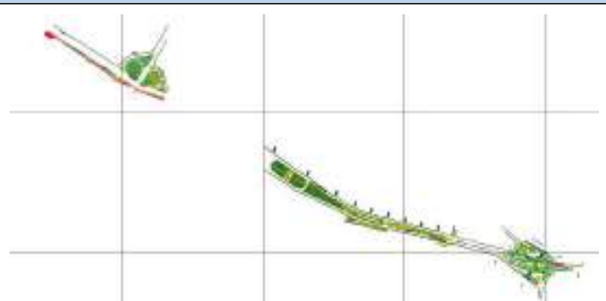



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	50.00	CANTIDAD ACUMULADA	50.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	PALMA BISMARCKIA en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	50.00	

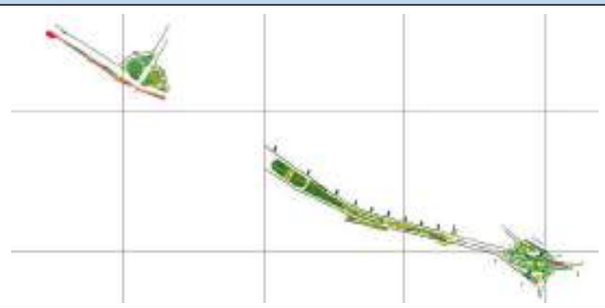



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	10.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA AREKA en las areas de intervencion del proyecto								10		10	
												TOTAL:	10.00	

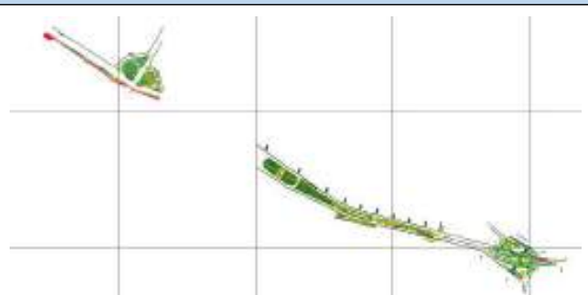



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,20**	**Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**36.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**36.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA REAL en las areas de intervencion del proyecto								36		36	
												TOTAL:	36.00	

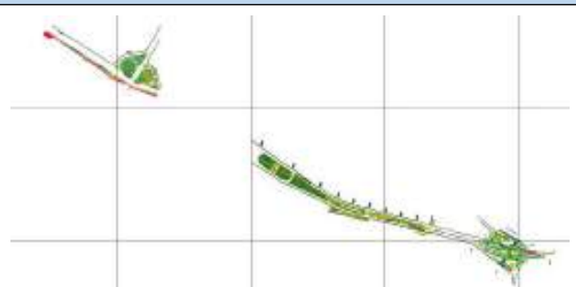



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.						DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No. 2 MODIFICATORIO	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	9.00	CANTIDAD ACUMULADA	9.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA BOTELLA en las areas de intervencion del proyecto								9		9	
												TOTAL:	9.00	

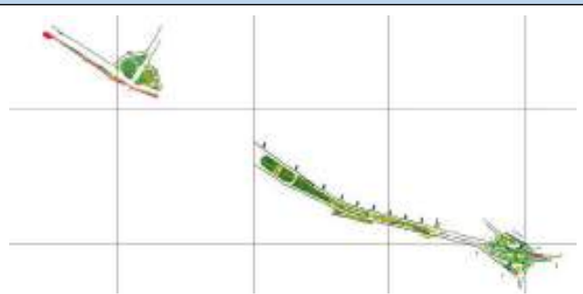



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	20.00	CANTIDAD ACUMULADA	20.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA CICA en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	20.00	

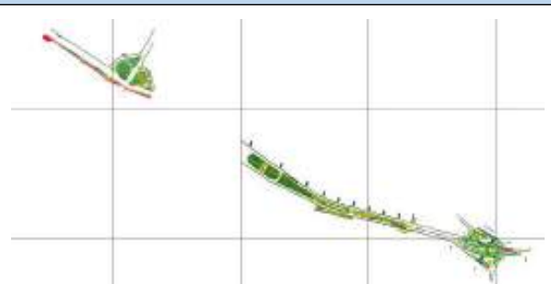



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**123.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**123.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	PALMA MANILA en las areas de intervencion del proyecto								123		123	
												TOTAL:	**123.00**	

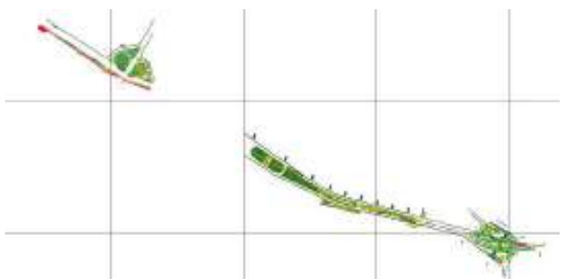



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	80.00	CANT EJECUTADA	80.00	CANTIDAD ACUMULADA	80.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PALMA ROUBELINA en las areas de intervencion del proyecto								80		80	
												TOTAL:	80.00	

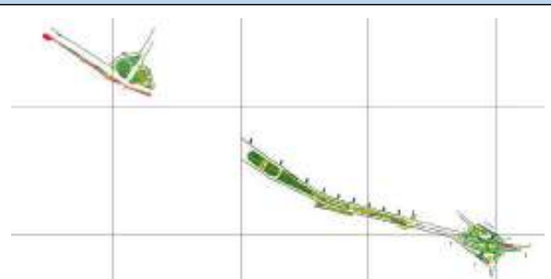



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**716.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**716.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	PALMA CORDYLINE en las areas de intervencion del proyecto								716		716	
												TOTAL:	**716.00**	

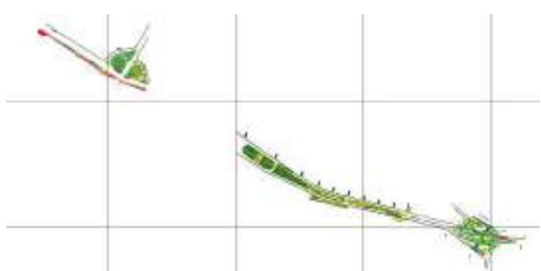



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,26**	**Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	GINGER AMARILLA en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

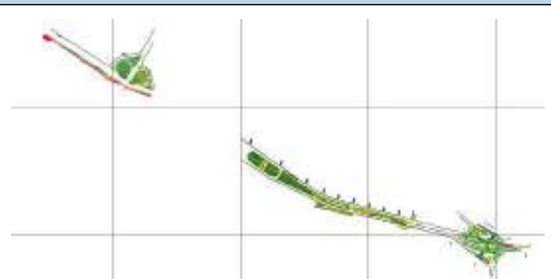



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**150.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**150.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	CANCION DE LA INDIA en las areas de intervencion del proyecto								150		150	
												TOTAL:	**150.00**	

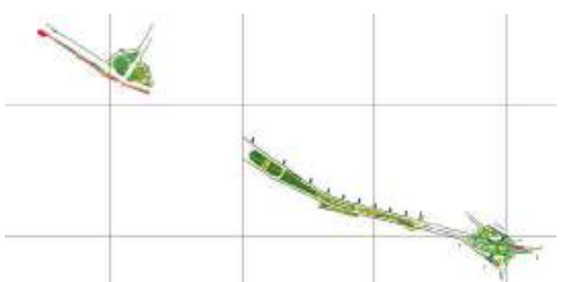



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,28**	**Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**180.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**180.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	CHEFLERA VARIAGADA en las areas de intervencion del proyecto								180		180	
													TOTAL:	**180.00**	

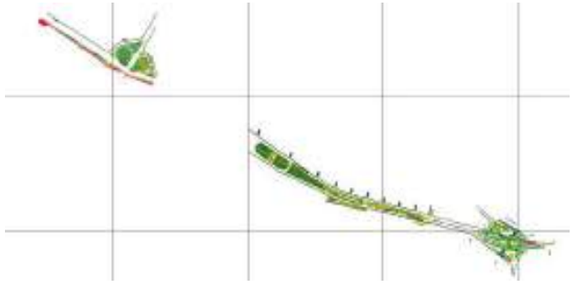



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,29**	**Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	MARGITANA en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	**100.00**	

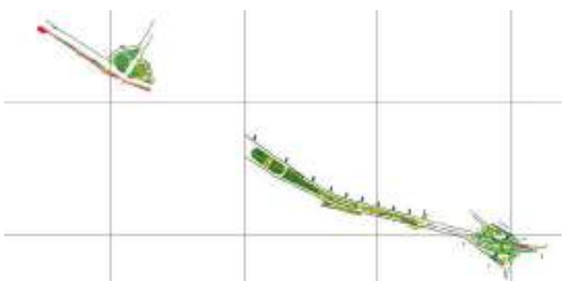



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,30**	**Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**500.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**500.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	FRAILEJON en las areas de intervencion del proyecto								500		500	
												TOTAL:	**500.00**	

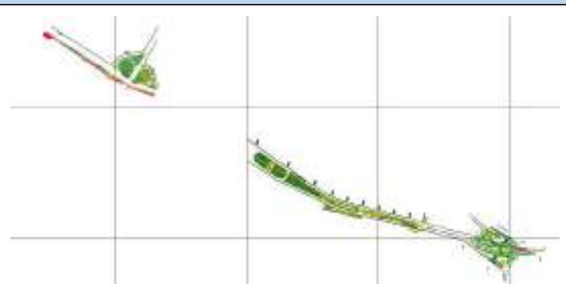



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	80.00	CANT EJECUTADA	400.00	CANTIDAD ACUMULADA	400.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Amancay en las areas de intervencion del proyecto								400		400	
												TOTAL:	400.00	

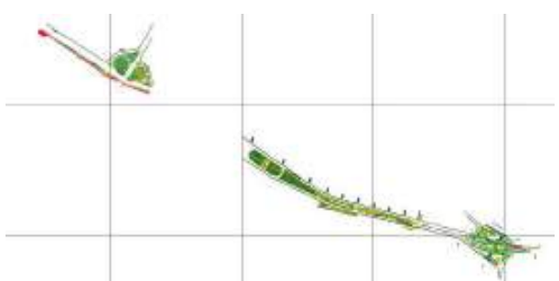



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP		UNIDAD		CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA		CANTIDAD ACUMULADA	
	3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm		Und		80.00		250.00		250.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	SPRING en las areas de intervencion del proyecto								250		250	
												TOTAL:	250.00	

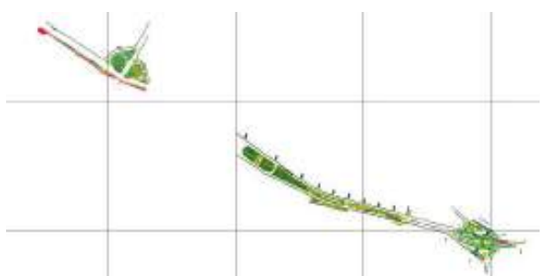



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,33**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**313.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**313.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	PHILODENDRO CORAZON en las areas de intervencion del proyecto								313		313	
												TOTAL:	**313.00**	

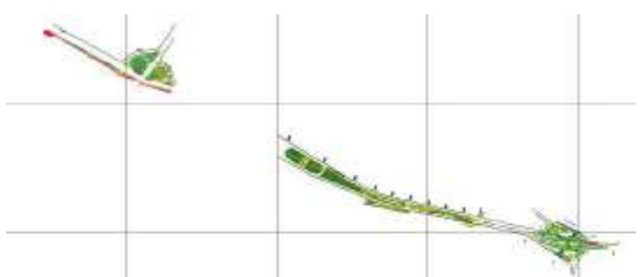



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**849.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**849.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PHILODENDRO SELLOUM en las areas de intervencion del proyecto								849		849	
													TOTAL:	**849.00**	

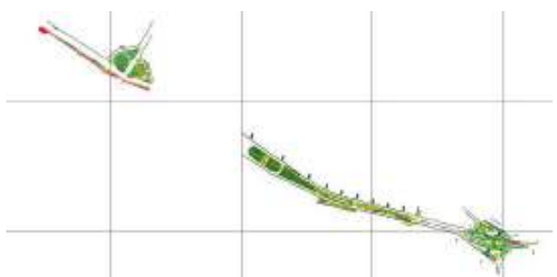



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**453.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**453.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PANDANUS VARIEGADO en las areas de intervencion del proyecto								453		453	
												TOTAL:	453.00	

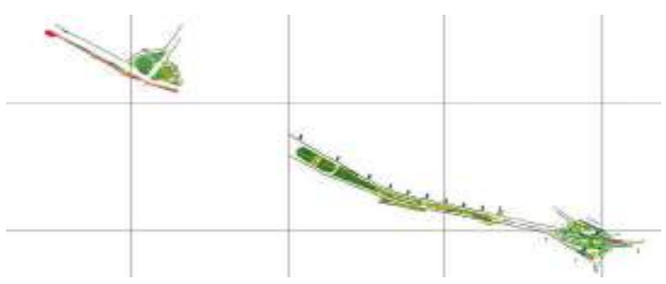



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**60.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	VERANERA TALLO ALTO en las areas de intervencion del proyecto								60		60	
												TOTAL:	**60.00**	

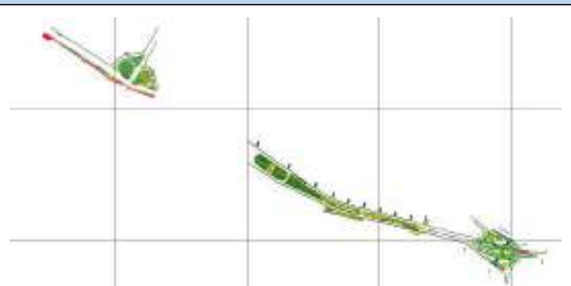



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	80.00	CANT EJECUTADA	500.00	CANTIDAD ACUMULADA	500.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	CINTA LIRIOPE en las areas de intervencion del proyecto								500		500	
												TOTAL:	500.00	

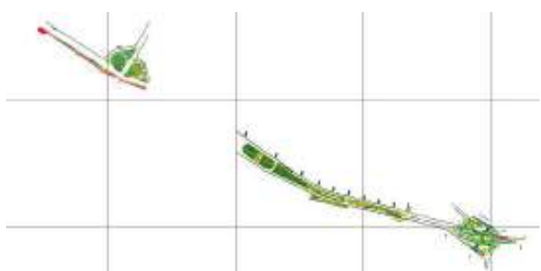



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	80.00	CANT EJECUTADA	22.00	CANTIDAD ACUMULADA	22.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	LILIACEA en las areas de intervencion del proyecto								22		22	
												TOTAL:	22.00	

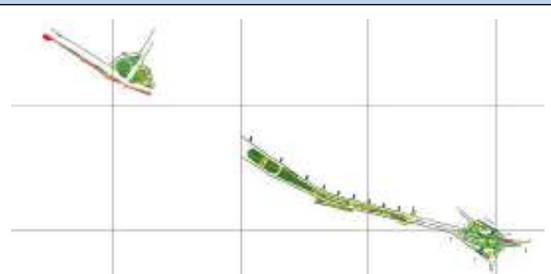



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**1550.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1550.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	FLOR DE LLANO en las areas de intervencion del proyecto								1550		1550	
													TOTAL:	**1550.00**	

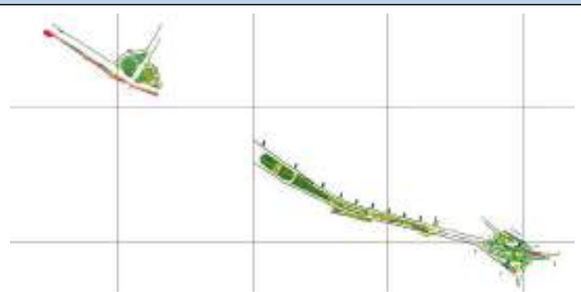



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,40**	**Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**100.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**100.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	LANTANA en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	100.00	

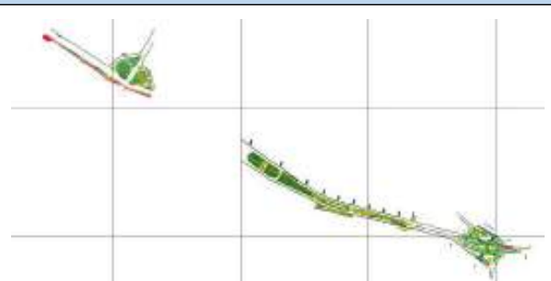



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	80.00	CANT EJECUTADA	20.00	CANTIDAD ACUMULADA	20.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PANAMEÑAS en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	20.00	

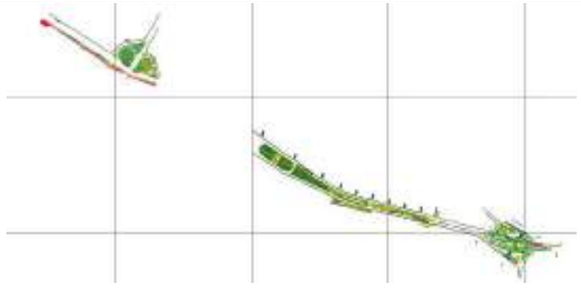



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,42**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**80.00**	**CANT EJECUTADA**	**5.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**5.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	ARBOLES CARBONERO en las areas de intervencion del proyecto								5		5	
												TOTAL:	**5.00**	

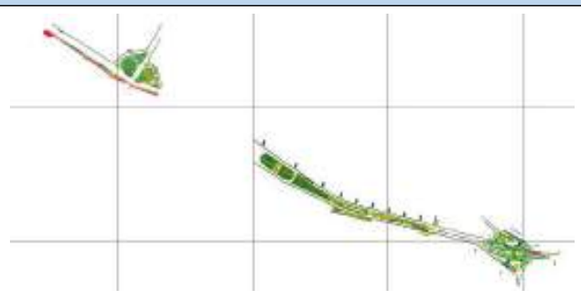



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,43**	**Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**37.00**	**CANT EJECUTADA**	**25.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**25.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	ARBOLES OITI en las areas de intervencion del proyecto								25		25	
												TOTAL:	**25.00**	

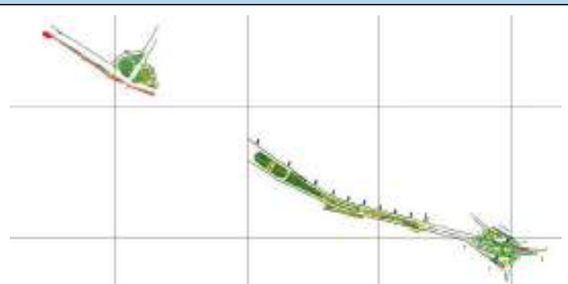



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2			**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,44**	**Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**50.00**	**CANT EJECUTADA**	**50.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**50.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	IXORA PATILLA en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	**50.00**	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**900.00**	**CANT EJECUTADA**	**1713.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1713.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	PLANTAS RASTRERAS en las areas de intervencion del proyecto								1713		1713	
												TOTAL:	**1713.00**	

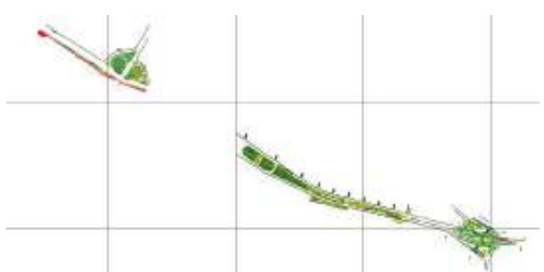



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,46**	**Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**250.00**	**CANT EJECUTADA**	**20.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**20.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	TU Y YO en las areas de intervencion del proyecto								20		20	
												TOTAL:	**20.00**	

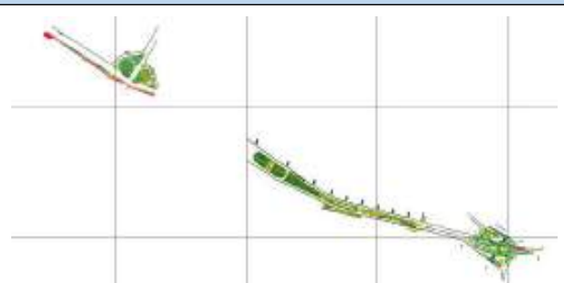



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	99.00	CANTIDAD ACUMULADA	99.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Philodendro Lemon en las areas de intervencion del proyecto								99		99	
TOTAL:													99.00	

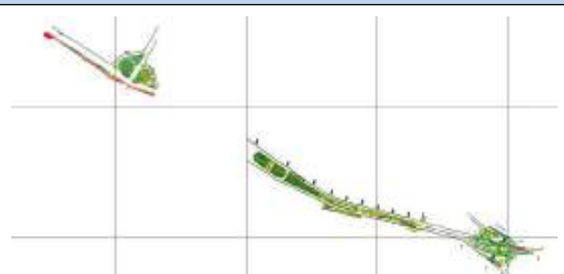



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,48**	**Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**600.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**600.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	Limon de Cerca en las areas de intervencion del proyecto								600		600	
												TOTAL:	**600.00**	

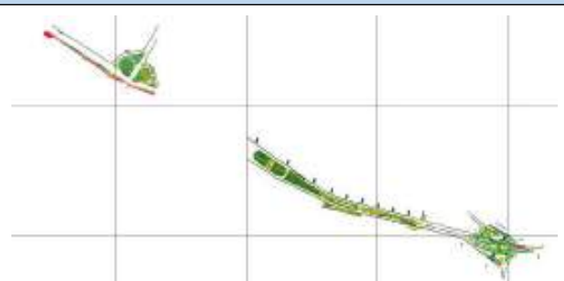



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	200.00	CANTIDAD ACUMULADA	200.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Pennisetum en las areas de intervencion del proyecto								200		200	
												TOTAL:	200.00	

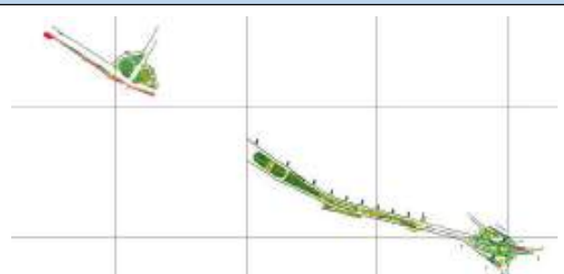



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	100.00	CANTIDAD ACUMULADA	100.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Coralillo en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
TOTAL:													100.00	

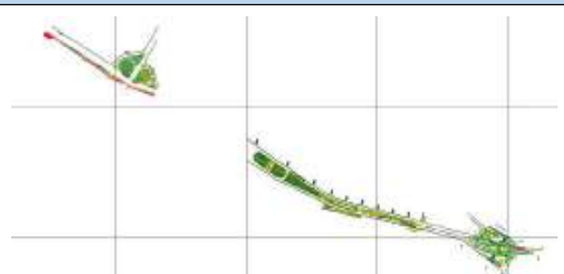



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	90.00	CANTIDAD ACUMULADA	90.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Mini Heliconias en las areas de intervencion del proyecto								90		90	
												TOTAL:	90.00	

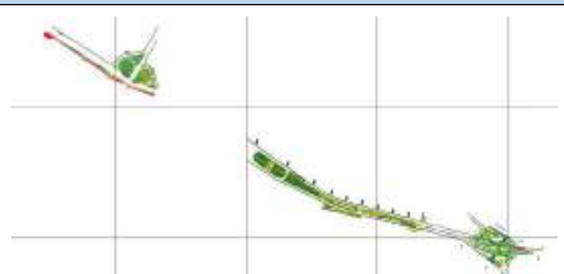



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	90.00	CANTIDAD ACUMULADA	90.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Pluma de Indio en las areas de intervencion del proyecto								90		90	
												TOTAL:	90.00	

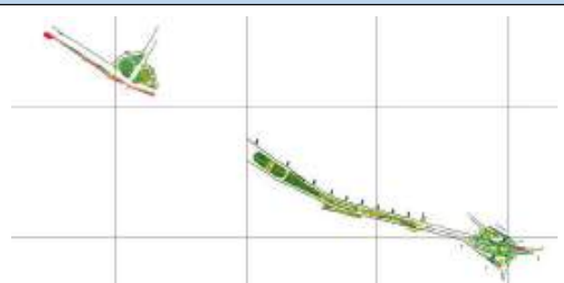



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	100.00	CANTIDAD ACUMULADA	100.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Mostera mini en las areas de intervencion del proyecto								100		100	
												TOTAL:	100.00	

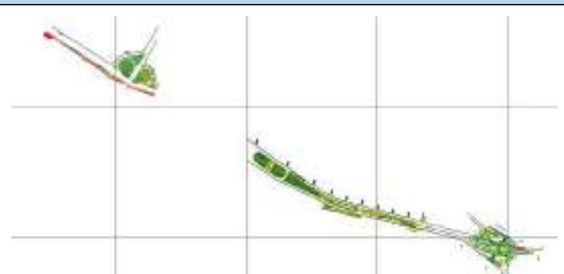



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	0.00	CANT EJECUTADA	50.00	CANTIDAD ACUMULADA	50.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Crotos en las areas de intervencion del proyecto								50		50	
												TOTAL:	50.00	

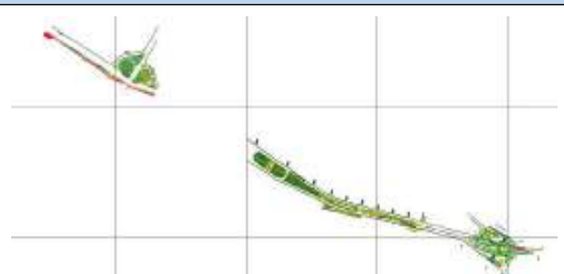



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,55**	**Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**0.00**	**CANT EJECUTADA**	**7.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**7.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**		
17	2	2026	Mostera grande en las areas de intervencion del proyecto								7		7	
												TOTAL:	**7.00**	

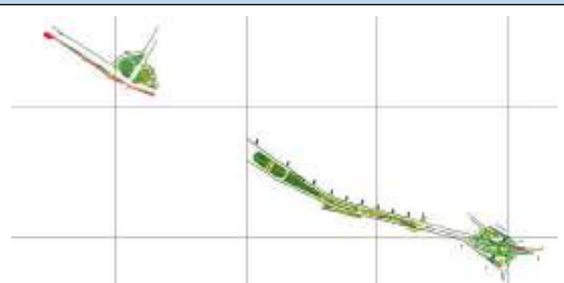



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,3,1**	**Suministro e instalación de material triturado**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**13.92**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**13.92**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Triturado en las areas de intervencion del proyecto					13.92					13.92	
												TOTAL:	**13.92**	

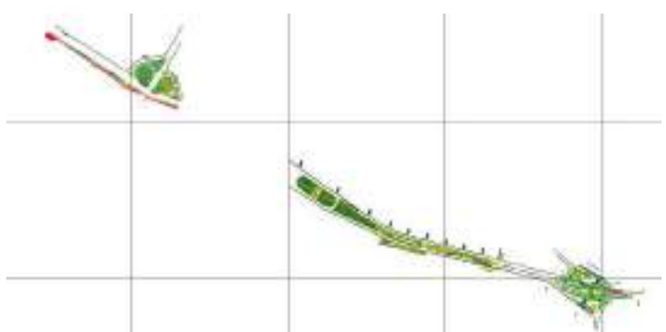

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2	**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**60.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.30	0.30							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°1**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.54	0.30	0.30							0.68	**Anillo de piedra en arbol N°2**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.84	0.30	0.30							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°3**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°4**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°5**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°6**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.04	0.30	0.30							0.72	**Anillo de piedra en arbol N°7**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.30	0.30							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°8**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.80	0.30	0.30							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°9**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.30	0.30							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°10**
												TOTAL:	**7.30**	

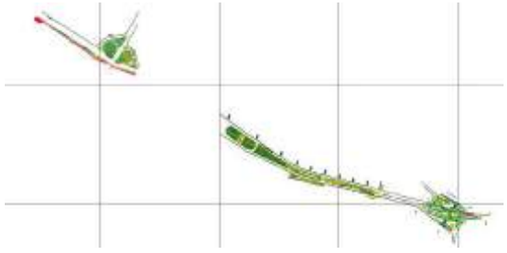

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**60.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.30	0.30							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°11**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.80	0.30	0.30							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°12**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.30	0.30	0.30							0.84	**Anillo de piedra en arbol N°13**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.30	0.30							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°14**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°15**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.30	0.30	0.30							0.84	**Anillo de piedra en arbol N°16**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.30	0.30							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°17**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	10.05	0.30	0.30							0.90	**Anillo de piedra en arbol N°18**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.30	0.30							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°19**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°20**
												TOTAL:	**7.84**	

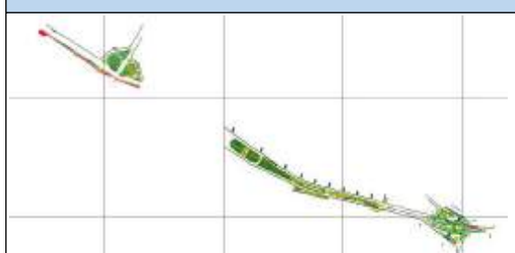

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	MODIFICATORIO 2	HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	60.00	CANTIDAD ACUMULADA	60.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.74	0.30	0.30							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°21**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	10.68	0.30	0.30							0.96	**Anillo de piedra en arbol N°22**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.67	0.30	0.30							0.78	**Anillo de piedra en arbol N°23**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	13.19	0.30	0.30							1.19	**Anillo de piedra en arbol N°24**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	12.88	0.30	0.30							1.16	**Anillo de piedra en arbol N°25**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	14.14	0.30	0.30							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°26**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	12.88	0.30	0.30							1.16	**Anillo de piedra en arbol N°27**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	14.14	0.30	0.30							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°28**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.14	0.30	0.30							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°29**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.05	0.30	0.30							0.90	**Anillo de piedra en arbol N°30**
												TOTAL:	**10.84**	

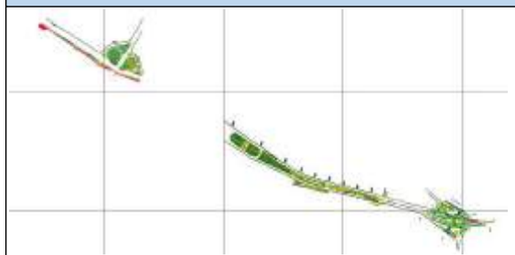

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**								**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**											**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2				**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**60.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.37	0.30	0.30							0.93	**Anillo de piedra en arbol N°31**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.17	0.30	0.30							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°32**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.80	0.30	0.30							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°33**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.74	0.30	0.30							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°34**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	7.85	0.30	0.30							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°35**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	7.54	0.30	0.30							0.68	**Anillo de piedra en arbol N°36**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.42	0.30	0.30							0.85	**Anillo de piedra en arbol N°37**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.77	0.30	0.30							1.33	**Anillo de piedra en arbol N°38**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.37	0.30	0.30							0.93	**Anillo de piedra en arbol N°39**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.68	0.30	0.30							0.96	**Anillo de piedra en arbol N°40**
												TOTAL:	**8.80**	

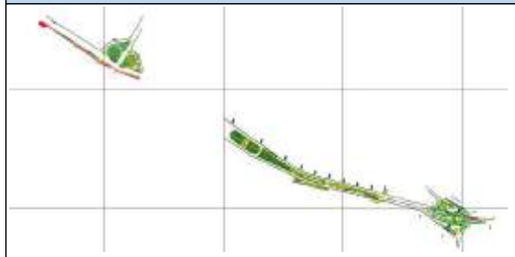

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexill Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.									DESDE:	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		INFORME No.	MODIFICATORIO 2		HASTA:	17	2	2026

ÍTEM:	3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL		CANT EJECUTADA	60.00	CANTIDAD ACUMULADA	60.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	13.85	0.30	0.30							1.25	**Anillo de piedra en arbol N°41**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.80	0.30	0.30							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°42**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	11.62	0.30	0.30							1.05	**Anillo de piedra en arbol N°43**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	15.39	0.30	0.30							1.39	**Anillo de piedra en arbol N°44**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.33	0.30	0.30							1.29	**Anillo de piedra en arbol N°45**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.05	0.30	0.30							0.90	**Anillo de piedra en arbol N°46**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.74	0.30	0.30							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°47**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.93	0.30	0.30							0.89	**Anillo de piedra en arbol N°48**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	12.57	0.30	0.30							1.13	**Anillo de piedra en arbol N°49**
17	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	15.58	0.30	0.30							1.40	**Anillo de piedra en arbol N°50**
												TOTAL:	**10.97**	

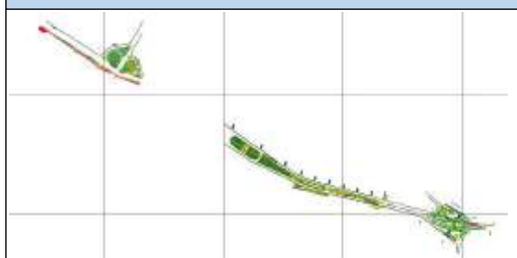

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	MODIFICATORIO 2		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**60.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Suministro e instalacion de piedra bola en las areas de intervencion					14.25					14.25	
													TOTAL:	**14.25**
													TOTAL ACUMULADO:	**60.00**

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,3**	**Instalación de nombres en material vegetal**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Nombres en material vegetal en las areas de intervencion del proyecto								2		2	
												TOTAL:	**2.00**	

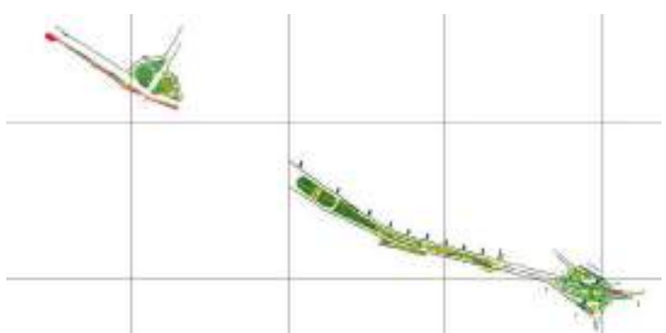

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**3,3,4**	**Instalación de vallas informativas**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Vallas informativas								2		2	
												TOTAL:	**2.00**	

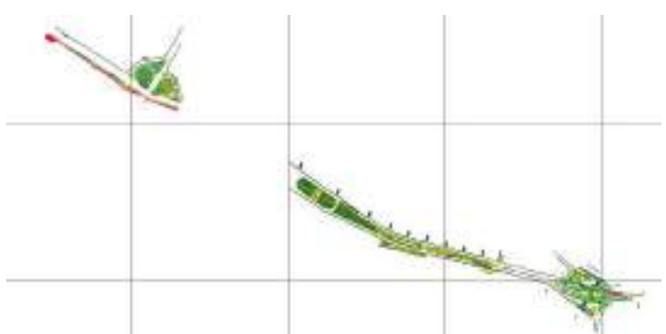

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,3,5**	**Construccion de dos corazones en material vegetal**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
17	2	2026	Construccion de dos corazones en material vegetal								1		1	
												TOTAL:	**1.00**	

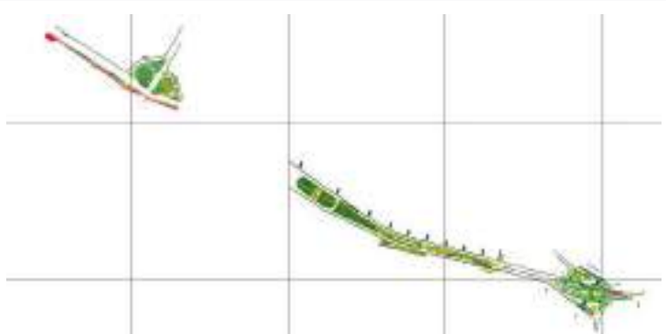

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**4,1**	**Riego programado**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**672.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**672.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Riego en las areas de intervencion del proyecto					672					672	
TOTAL:													**672.00**	

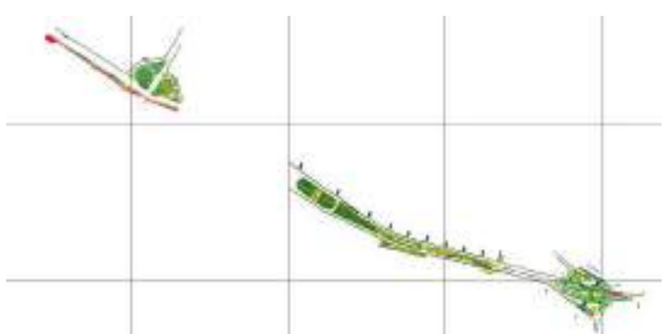

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**4,2**	**Limpieza continua de maleza**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**47600.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**47600.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Limpieza continua en las areas de intervencion del proyecto				47600						47600	
												TOTAL:	**47600.00**	

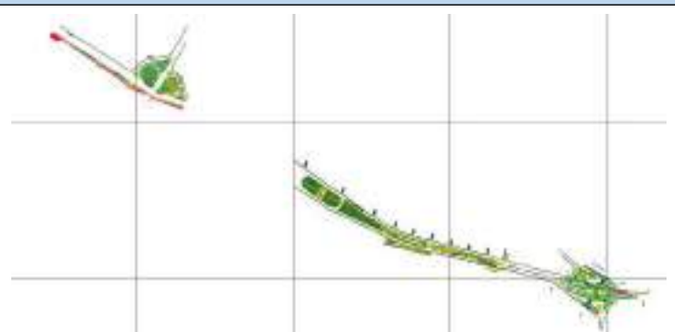

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**			**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**4,3**	**Nutrición y control fitosanitario**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**15400.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**15400.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Nutricion y control fitosanitario en las areas de intervencion del proyecto				15400						15400	
													TOTAL:	**15400.00**

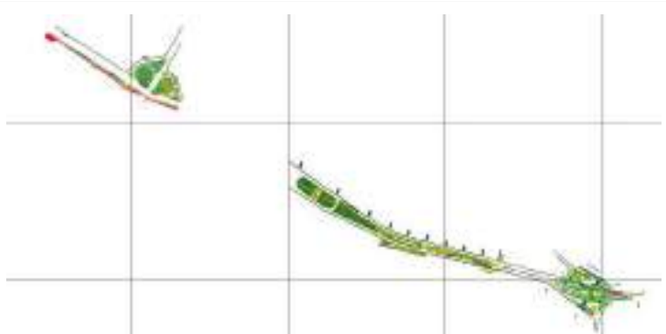

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	17	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**		**HASTA:**	17	2	2026

ÍTEM:	**4,4**	**Poda y jardinería**	**UNIDAD**	**m2**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**11000.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**11000.00**	

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LONGITUD**	**KILO**	**UNIDAD**	**HORAS**		
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**(M2)**	**(M3)**	**(ML)**	**(KG)**	**(UND)**	**(HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
17	2	2026	Poda y jarineria en las areas de intervencion del proyecto				11000						11000	
												TOTAL:	**11000.00**	

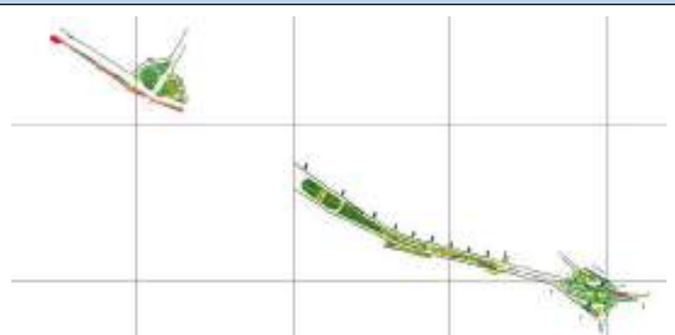

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**					**PERIODO REPORTADO**				
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**								**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**	
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**	

ÍTEM:	**4,5**	**Retiro de residuos de mantenimiento**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**1075.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**1075.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Retiro de residuos de mantenimiento					1075					1075	
												TOTAL:	**1075.00**	

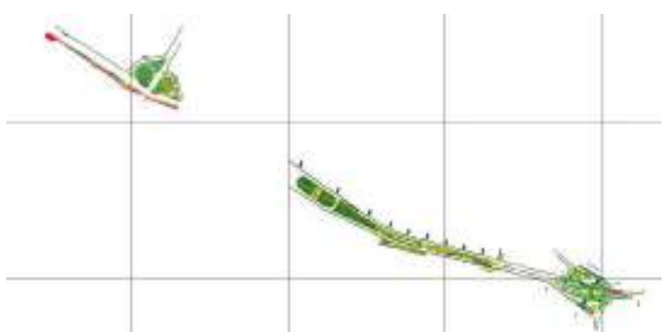

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**17**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	**MODIFICATORIO 2**	**HASTA:**	**17**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**5,1**	**Campaña de cultura ciudadana**	**UNIDAD**	**Per**	**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**2500.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**		**2500.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS		
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
17	2	2026	Campaña de cultura ciudadana										2500	
													TOTAL:	**2500.00**

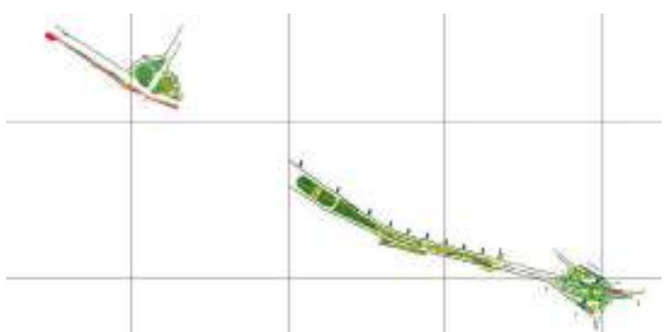

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1.00	20,000.00	20,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				20,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					941
SUBTOTAL EQUIPOS					941

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$29,941.00
ADMINISTRACION	22%	$ 6,587.00
IMPREVISTOS	2%	$ 599.00
UTILIDAD	6%	$ 1,796.00
COSTO TOTAL		**$38,923.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	60.00	5,250.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					5,250

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	1.00	3,500.00	3,500.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				3,500

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					589
SUBTOTAL EQUIPOS					589

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 9,339.00
ADMINISTRACION	22%	$ 2,055.00
IMPREVISTOS	2%	$ 187.00
UTILIDAD	6%	$ 560.00
COSTO TOTAL		**$12,141.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	1.00	12,000.00	12,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				12,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					943
SUBTOTAL EQUIPOS					943

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$21,943.00
ADMINISTRACION	22%	$ 4,827.00
IMPREVISTOS	2%	$ 439.00
UTILIDAD	6%	$ 1,317.00
COSTO TOTAL		**$28,526.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	1.00	24,000.00	24,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				24,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					945
SUBTOTAL EQUIPOS					945

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$33,945.00
ADMINISTRACION	22%	$ 7,468.00
IMPREVISTOS	2%	$ 679.00
UTILIDAD	6%	$ 2,037.00
COSTO TOTAL		**$44,129.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	1.00	31,698.00	31,698.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				31,698

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					909
SUBTOTAL EQUIPOS					909

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$41,607.00
ADMINISTRACION	22%	$ 9,154.00
IMPREVISTOS	2%	$ 832.00
UTILIDAD	6%	$ 2,496.00
COSTO TOTAL		**$54,089.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	26,999.00	26,999.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				26,999

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					940
SUBTOTAL EQUIPOS					940

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$36,939.00
ADMINISTRACION	22%	$ 8,127.00
IMPREVISTOS	2%	$ 739.00
UTILIDAD	6%	$ 2,216.00
COSTO TOTAL		**$48,021.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	1.00	20,239.59	20,240.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				20,240

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					942
SUBTOTAL EQUIPOS					942

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$30,182.00
ADMINISTRACION	22%	$ 6,640.00
IMPREVISTOS	2%	$ 604.00
UTILIDAD	6%	$ 1,811.00
COSTO TOTAL		**$39,237.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	25,000.00	25,000.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				25,000

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					941
SUBTOTAL EQUIPOS					941

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$34,941.00
ADMINISTRACION	22%	$ 7,687.00
IMPREVISTOS	2%	$ 699.00
UTILIDAD	6%	$ 2,096.00
COSTO TOTAL		**$45,423.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x1	175,000.00	1.80	315,000.00	35.00	9,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					9,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1.00	49,569.00	49,569.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				49,569

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					943
SUBTOTAL EQUIPOS					943

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$59,512.00
ADMINISTRACION	22%	$13,093.00
IMPREVISTOS	2%	$ 1,190.00
UTILIDAD	6%	$ 3,571.00
COSTO TOTAL		**$77,366.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL (DIA)	F.PRST	TOTAL JORNAL	RENDIMIENTO(C /DIA)	V TOTAL
Cuadrilla de Trabajo 1x2	240,000.00	1.80	432,000.00	1.00	432,000.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA					432,000

MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION Y REFERENCIA	UND	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	1.00	$ 3,905,782.00	3,905,782.00
Desperdicio	0%			0.00
SUBTOTAL MATERIALES				3,905,782

EQUIPO

DESCRIPCIPON	Cant.	UND	TARIFA /DIA	RENDIMIENTO/ DIA	V TOTAL
Herramienta menor					943
SUBTOTAL EQUIPOS					943

TRANSPORTE O ACARREO

MATERIAL	VOL	DIS	M3-KM	TARIFA	V TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE ACARREO					0

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 4,338,725.0
ADMINISTRACION	22%	$ 954,520.00
IMPREVISTOS	2%	$86,775.00
UTILIDAD	6%	$ 260,324.00
COSTO TOTAL		**$ 5,640,344.0**

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 18 Febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

DESARROLLO: Modificación de las siguientes cantidades de obra del presupuesto inicial presentado de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Mediante el acta de comité de obra N° 05 del 17 de Febrero del 2026 se justificó y las modificaciones de las cantidades de obra de los ítems contratados y modificados según acta de modificación n° 2 y otros ajustes recomendados , a continuación se presenta el balance de los mayores y menores cantidades de obra, así como la aprobación precios unitarios de los ítems no previstos

1. se Aumentan las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m2	3,552.74	$ 11,242.00	$ 39,939,903
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	M3	0.00	$ 117,873.00	$551
3,2					
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	116.00	$ 33,942.00	$ 3,937,272
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	188.00	$ 41,798.00	$ 7,858,024
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	160.00	$ 11,090.00	$ 1,774,400
3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	43.00	$ 422,609.00	$ 18,172,187
3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	416.00	$ 61,825.00	$ 25,719,200
3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	63.00	$ 54,109.00	$ 3,408,867
3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	349.00	$ 54,109.00	$ 18,884,041

3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	218.00	$ 54,109.00	$ 11,795,762
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	550.00	$ 26,109.00	$ 14,359,950
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	813.00	$ 17,650.00	$ 14,349,450
COSTO TOTAL					**$ 160,199,056**

2. se disminuyen las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2,1	Limpieza general y deshierbe	M2	8,127.53	$ 1,352.00	$ 10,988,420.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	3.00	$ 670,200.00	$ 2,010,600.00
2,4	Retiro de material sobrante	M3	211.21	$ 40,224.00	$ 8,495,767.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.2	**siembra de material vegetal**				
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	50	$ 26,974.00	$ 1,348,700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	74	$ 16,090.00	$ 1,190,660.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	90	$ 12,737.00	$ 1,146,330.00

3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	150	$ 14,090.00	$ 2,113,500.00
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	10	$ 20,090.00	$ 200,900.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	60	$ 20,090.00	$ 1,205,400.00
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	40	$ 426,984.00	$ 17,079,360.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	70	$ 390,942.00	$ 27,365,940.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	25	$ 387,609.00	$ 9,690,225.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	60	$ 387,609.00	$ 23,256,540.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	50	$ 61,942.00	$ 3,097,100.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCIÓN DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	50	$ 62,442.00	$ 3,122,100.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	500	$ 26,442.00	$ 13,221,000.00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	32	$ 129,942.00	$ 4,158,144.00

NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	12	$ 129,942.00	$ 1,559,304.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	230	$ 17,650.00	$ 4,059,500.00
3.3	**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS**				
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	M3	272.00	$ 112,873.00	$ 30,701,079.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	M3	40.00	$ 128,873.00	$ 5,154,920.00
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	M3	0.12	$ 40,142.00	$ 4,676.00
COSTO TOTAL					**$ 171,170,165.00**

3. Se incluyen las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
3.2	**siembra de material vegetal**				$ -
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	99.00	$ 29,941.00	$ 2,964,159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limón de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	600.00	$ 9,339.00	$ 5,603,400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	200.00	$ 21,943.00	$ 4,388,600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	100.00	$ 33,945.00	$ 3,394,500.00
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum ‘Choconiana’ En bolsa de 1 kg	Und	90.00	$ 41,607.00	$ 3,744,630.00

	número 9 de largo entre 10 y 30 cm				
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	90.00	$ 36,939.00	$ 3,324,510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	100.00	$ 30,182.00	$ 3,018,200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	50.00	$ 34,941.00	$ 1,747,050.00
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	7.00	$ 59,512.00	$ 416,584.00
3,3	**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS**				
NP 3,3,5	Construcción de dos corazones en materia vegetal	Und	1	$ 4,338,725.00	$ 4,338,725.00
COSTO TOTAL					**$ $ 32,940,358.00**

4. Se Eliminan las cantidades de los siguientes ítems, las cuales quedarán así

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ($)
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.2	**siembra de material vegetal**				
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100	$ 46,798.00	$ 4,679,800
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	M2	1000	$ 17,290.00	$ 17,290,000
					$ -
COSTO TOTAL					**$ 21,969,800.00**

ACTA DE MODIFICACIÓN
MPA-01-F-11, versión 5, 08/07/2024

BALANCE FINANCIERO	DEBE	HABER
AUMENTAR		$ 160,199,607.00
DISMINUIR	$ 171,170,165.00	
INCLUIR		$ 32,940,358.00
ELIMINAR	$ 21,969,800.00	
TOTAL	**$ 193,139,965.00**	**$ 193,139,965.00**
DIFERENCIA A FAVOR DE CORPONOR	$ -	
	$ 193,139,965.00	**$ 193,139,965.00**

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 06

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 25 de Febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

1. Entrega y aprobación de planos faltantes (Redoma Corponor y Separador Malecón).
2. Seguimiento a informes quincenales de avance de obra.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

1. Tema: Entrega y aprobación de planos faltantes (Redoma Corponor y Separador Malecón)

El Contratista informó que han sido entregados los planos faltantes correspondientes a la Redoma Corponor y al Separador Malecón, completando así la documentación técnica requerida para estas áreas. Acto seguido, la Interventoría tomó la palabra y comunicó que, una vez revisada la documentación, dichos planos cuentan con su aprobación, validando que se ajustan a las especificaciones técnicas y al diseño paisajístico establecido para el proyecto.

El Contratista manifestó que, si bien los diseños han sido aprobados, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el proceso paisajístico y las condiciones y dinámicas que se vayan observando y analizando en cada área, estos podrán estar sujetos a modificaciones dependiendo de las necesidades que surjan en el terreno. Se aclaró que esto se realiza con el fin de desarrollar un diseño armónico y amable con los espacios, garantizando que la intervención se integre de manera natural y coherente con el entorno. La Interventoría tomó nota de lo expuesto y reiteró que cualquier ajuste deberá ser debidamente comunicado y contar con su visto bueno previo a su ejecución.

3. Tema: Seguimiento a informes quincenales de avance de obra

El Contratista informó que el primer informe quincenal correspondiente al avance de la obra ya fue entregado en los plazos establecidos, dando cumplimiento al compromiso adquirido en reuniones anteriores. Asimismo, se comprometió a realizar la entrega del segundo informe quincenal al finalizar el mes en curso, dando continuidad al cronograma de reportes periódicos acordado para el seguimiento del proyecto.

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

2. Se deja constancia de la aprobación por parte de la Interventoría de los planos correspondientes a la Redoma Corponor y al Separador Malecón.

3. El Contratista reafirma el compromiso de entregar el segundo informe quincenal al finalizar el mes, dando continuidad a los reportes periódicos de avance de obra.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

Anexo N°1 *Cronograma de actividades y flujo de fondos*

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	2/1/2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	2/28/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	MES No. 1 24/12/2025 - 31/12/2025			MES No. 2 01/01/22026 - 31/01/2026			MES No. 3 01/02/2026 - 28/02/2026			MES No. 4 **/**/**** - **/**/****			ACUMULADO			PORCENTAJE EJECUTADO
						Semana	CANT	V. TOTAL	Semana	CANT	V. TOTAL	Semana	CANT	V. TOTAL	Semana	CANT	V. TOTAL	Semana	CANT	V. TOTAL	
1	**DIAGNÓSTICO**																				
1.1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00	1.00	0.13	$ 1,174,771.00	4.00	0.50	$ 4,699,085.00	3.00	0.38	$ 3,524,313.00			$ -	8	1.00	$ 9,398,169.00	30%
						1.00	0.30	$ 2,819,451.00			$ -			$ -			$ -	1	0.30	$ 2,819,451.00	
1.2	Identificación de Puntos Criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00	1.00	0.13	$ 273,029.00	4.00	0.50	$ 1,092,115.00	3.00	0.38	$ 819,086.00			$ -	8	1.00	$ 2,184,230.00	30%
						1.00	0.30	$ 655,269.00			$ -			$ -			$ -	1	0.30	$ 655,269.00	
1.3	Inventario del Arbolado Existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00	1.00	0.13	$ 266,910.00	4.00	0.50	$ 1,067,638.00	3.00	0.38	$ 800,729.00			$ -	8	1.00	$ 2,135,277.00	30%
						1.00	0.30	$ 640,583.00			$ -			$ -			$ -	1	0.30	$ 640,583.00	
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**																	0	0.00	$ -	
																		0	0.00	$ -	
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	13,161.69	$ 1,352.00	$ 17,794,605.00		0.00	$ -	3.00	3,948.51	$ 5,338,381.00	4.00	5,264.68	$ 7,117,842.00			$ -	7	9,213.18	$ 12,456,223.00	47%
						1.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	4.00	2,895.52	$ 3,914,743.00			$ -			$ -	5	6,223.73	$ 8,414,483.00	
2.2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		0.00	$ -	3.00	595.84	$ 35,810,000.00	4.00	3.66	$ 220,000.00			$ -	7	599.50	$ 36,030,000.00	98%
						1.00	332.84	$ 20,003,684.00	4.00	98.76	$ 5,935,476.00	4.00	154.98	$ 9,314,298.00			$ -	9	586.58	$ 35,253,458.00	
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	47.00	$ 670,200.00	$ 31,499,400.00			$ -	3.00	14.10	$ 9,449,820.00	4.00	18.80	$ 12,599,760.00			$ -	7	32.90	$ 22,049,580.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
2.4	Retiro de material sobrante	m3	649.03	$ 40,224.00	$ 26,106,583.00		0.00	$ -	3.00	194.71	$ 7,831,975.00	4.00	259.61	$ 10,442,633.00			$ -	7	454.32	$ 18,274,608.00	100%
						1.00	649.03	$ 26,106,583.00			$ -			$ -			$ -	1	649.03	$ 26,106,583.00	
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	12,104.00	$ 11,242.00	$ 136,073,168.00			$ -	2.00	2,689.78	$ 30,238,482.00	4.00	5,379.56	$ 60,476,964.00			$ -	6	8,069.33	$ 90,715,446.00	91%
								$ -	4.00	2,895.52	$ 32,551,436.00	4.00	8127.93	$ 91,374,189.00			$ -	8	11,023.45	$ 123,925,625.00	
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**																	0	0.00	$ -	
																		0	0.00	$ -	
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda(mezcla de suelo área y orgánico)	m3	554.04	$ 117,873.00	$ 65,306,357.00			$ -	3.00	439.03	$ 51,750,357.00	4.00	112.74	$ 13,289,000.00			$ -	7	551.77	$ 65,039,357.00	69%
								$ -	4.00	98.76	$ 11,641,137.00	4.00	284.94	$ 33,586,733.00			$ -	8	383.70	$ 45,227,870.00	
3.2	**SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL**																	0	0.00	$ -	
																		0	0.00	$ -	
3.2.1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	416.00	$ 33,942.00	$ 14,119,872.00			$ -	3.00	124.80	$ 4,235,962.00	4.00	166.40	$ 5,647,949.00			$ -	7	291.20	$ 9,883,911.00	99%
								$ -	4.00	153.00	$ 5,193,126.00	4.00	258.00	$ 8,757,036.00			$ -	8	411.00	$ 13,950,162.00	
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	288.00	$ 41,798.00	$ 12,037,824.00			$ -	3.00	86.40	$ 3,611,347.00	4.00	115.20	$ 4,815,130.00			$ -	7	201.60	$ 8,426,477.00	98%
								$ -	4.00	100.00	$ 4,179,800.00	4.00	183.00	$ 7,649,034.00			$ -	8	283.00	$ 11,828,834.00	
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	0.00	$ 46,798.00	$ -			$ -	3.00	0.00	$ -	4.00	0.00	$ -			$ -	7	0.00	$ -	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	0.00	$ 66,974.00	$ -			$ -	3.00	0.00	$ -	4.00	0.00	$ -			$ -	7	0.00	$ -	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	0.00	$ 86,974.00	$ -			$ -	3.00	0.00	$ -	4.00	0.00	$ -			$ -	7	0.00	$ -	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	50.00	$ 26,974.00	$ 1,348,700.00			$ -	3.00	15.00	$ 404,610.00	4.00	20.00	$ 539,480.00			$ -	7	35.00	$ 944,090.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	26.00	$ 16,090.00	$ 418,340.00			$ -	3.00	7.80	$ 125,502.00	4.00	10.40	$ 167,336.00			$ -	7	18.20	$ 292,838.00	81%
								$ -			$ -	4.00	21.00	$ 337,890.00			$ -	4	21.00	$ 337,890.00	
3.2.8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	260.00	$ 11,090.00	$ 2,883,400.00			$ -	3.00	78.00	$ 865,020.00	4.00	104.00	$ 1,153,360.00			$ -	7	182.00	$ 2,018,380.00	98%
								$ -			$ -	4.00	255.00	$ 2,827,950.00			$ -	4	255.00	$ 2,827,950.00	
3.2.9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	10.00	$ 12,737.00	$ 127,370.00			$ -	3.00	3.00	$ 38,211.00	4.00	4.00	$ 50,948.00			$ -	7	7.00	$ 89,159.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	50.00	$ 14,090.00	$ 704,500.00			$ -	3.00	15.00	$ 211,350.00	4.00	20.00	$ 281,800.00			$ -	7	35.00	$ 493,150.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	0.00	$ 64,778.00	$ -			$ -	3.00	0.00	$ -	4.00	0.00	$ -			$ -	7	0.00	$ -	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	10.00	$ 20,090.00	$ 200,900.00			$ -	3.00	3.00	$ 60,270.00	4.00	4.00	$ 80,360.00			$ -	7	7.00	$ 140,630.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00			$ -	3.00	6.00	$ 120,540.00	4.00	8.00	$ 160,720.00			$ -	7	14.00	$ 281,260.00	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
3.2.14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	0.00	$ 17,290.00	$ -			$ -	3.00	0.00	$ -	4.00	0.00	$ -			$ -	7	0.00	$ -	
								$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -	
NP 3.2.15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a	Und	40.00	$426,984.00	$ 17,079,360.00			$ -	2.00	8.89	$ 3,795,413.00	4.00	17.78	$ 7,590,827.00			$ -	6	26.67	$ 11,386,240.00	

CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025												PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.																DESDE:	2/1/2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025			SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR			INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES						INFORME No.	3	HASTA:	2/28/2026

3,2,15	2.50						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	10.00	$390,942.00	$ 3,909,420.00		$ -	2.00	2.22	$ 868,760.00	4.00	4.44	$ 1,737,520.00			$ -	6	6.67	$ 2,606,280.00		
							$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$535,942.00	$ 7,503,188.00		$ -	2.00	3.11	$ 1,667,375.00	4.00	6.22	$ 3,334,750.00			$ -	6	9.33	$ 5,002,125.00		100%
							$ -	4.00	14.00	$ 7,503,188.00			$ -			$ -	4	14.00	$ 7,503,188.00		
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$410,942.00	$ 20,547,100.00		$ -	2.00	11.11	$ 4,566,022.00	4.00	22.22	$ 9,132,044.00			$ -	6	33.33	$ 13,698,066.00		10%
							$ -			$ -	4.00	5.00	$ 2,054,710.00			$ -	4	5.00	$ 2,054,710.00		
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	10.00	$387,609.00	$ 3,876,090.00		$ -	2.00	2.22	$ 861,353.00	4.00	4.44	$ 1,722,707.00			$ -	6	6.67	$ 2,584,060.00		
							$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$537,609.00	$ 19,353,924.00		$ -	2.00	8.00	$ 4,300,872.00	4.00	16.00	$ 8,601,744.00			$ -	6	24.00	$ 12,902,616.00		100%
							$ -	4.00	36.00	$ 19,353,924.00			$ -			$ -	4	36.00	$ 19,353,924.00		
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$537,609.00	$ 4,838,481.00		$ -	2.00	2.00	$ 1,075,218.00	4.00	4.00	$ 2,150,436.00			$ -	6	6.00	$ 3,225,654.00		100%
							$ -	4.00	9.00	$ 4,838,481.00			$ -			$ -	4	9.00	$ 4,838,481.00		
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	20.00	$387,609.00	$ 7,752,180.00		$ -	2.00	4.44	$ 1,722,707.00	4.00	8.89	$ 3,445,413.00			$ -	6	13.33	$ 5,168,120.00		
							$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	123.00	$422,609.00	$ 51,980,907.00		$ -	2.00	27.33	$ 11,551,313.00	4.00	54.67	$ 23,102,625.00			$ -	6	82.00	$ 34,653,938.00		96%
							$ -	4.00	10.00	$ 4,226,090.00	4.00	108.00	$ 45,641,772.00			$ -	8	118.00	$ 49,867,862.00		
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$389,275.00	$ 31,142,000.00		$ -	2.00	17.78	$ 6,920,444.00	4.00	35.56	$ 13,840,889.00			$ -	6	53.33	$ 20,761,333.00		100%
							$ -	4.00	80.00	$ 31,142,000.00			$ -			$ -	4	80.00	$ 31,142,000.00		
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	716.00	$61,825.00	$ 44,266,700.00		$ -	2.00	159.11	$ 9,837,044.00	4.00	318.22	$ 19,674,089.00			$ -	6	477.33	$ 29,511,133.00		93%
							$ -	4.00	221.00	$ 13,663,325.00	4.00	445.00	$ 27,512,125.00			$ -	8	666.00	$ 41,175,450.00		
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$61,942.00	$ 6,194,200.00		$ -	2.00	22.22	$ 1,376,489.00	4.00	44.44	$ 2,752,978.00			$ -	6	66.67	$ 4,129,467.00		
							$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$62,442.00	$ 9,366,300.00		$ -	2.00	33.33	$ 2,081,400.00	4.00	66.67	$ 4,162,800.00			$ -	6	100.00	$ 6,244,200.00		43%
							$ -	4.00	55.00	$ 3,434,310.00	4.00	10.00	$ 624,420.00			$ -	8	65.00	$ 4,058,730.00		
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$60,109.00	$ 10,819,620.00		$ -	2.00	40.00	$ 2,404,360.00	4.00	80.00	$ 4,808,720.00			$ -	6	120.00	$ 7,213,080.00		56%
							$ -	4.00	100.00	$ 6,010,900.00			$ -			$ -	4	100.00	$ 6,010,900.00		
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$60,109.00	$ 6,010,900.00		$ -	2.00	22.22	$ 1,335,756.00	4.00	44.44	$ 2,671,511.00			$ -	6	66.67	$ 4,007,267.00		
							$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -		
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	500.00	$26,442.00	$ 13,221,000.00		$ -	2.00	111.11	$ 2,938,000.00	4.00	222.22	$ 5,876,000.00			$ -	6	333.33	$ 8,814,000.00		94%
							$ -			$ -	4.00	470.00	$ 12,427,740.00			$ -	4	470.00	$ 12,427,740.00		
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$54,109.00	$ 21,643,600.00		$ -	2.00	88.89	$ 4,809,689.00	4.00	177.78	$ 9,619,378.00			$ -	6	266.67	$ 14,429,067.00		53%
							$ -	4.00	85.00	$ 4,599,265.00	4.00	125.00	$ 6,763,625.00			$ -	8	210.00	$ 11,362,890.00		
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$26,775.00	$ 6,693,750.00		$ -	2.00	55.56	$ 1,487,500.00	4.00	111.11	$ 2,975,000.00			$ -	6	166.67	$ 4,462,500.00		98%
							$ -			$ -	4.00	245.00	$ 6,559,875.00			$ -	4	245.00	$ 6,559,875.00		
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	313.00	$54,109.00	$ 16,936,117.00		$ -	2.00	69.56	$ 3,763,582.00	4.00	139.11	$ 7,527,163.00			$ -	6	208.67	$ 11,290,745.00		98%
							$ -			$ -	4.00	308.00	$ 16,665,572.00			$ -	4	308.00	$ 16,665,572.00		
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	849.00	$54,109.00	$ 45,938,541.00		$ -	2.00	188.67	$ 10,208,565.00	4.00	377.33	$ 20,417,129.00			$ -	6	566.00	$ 30,625,694.00		99%
							$ -	4.00	259.00	$ 14,014,231.00	4.00	585.00	$ 31,653,765.00			$ -	8	844.00	$ 45,667,996.00		
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	453.00	$54,109.00	$ 24,511,377.00		$ -	2.00	100.67	$ 5,446,973.00	4.00	201.33	$ 10,893,945.00			$ -	6	302.00	$ 16,340,918.00		99%
							$ -	4.00	32.00	$ 1,731,488.00	4.00	416.00	$ 22,509,344.00			$ -	8	448.00	$ 24,240,832.00		
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$57,442.00	$ 3,446,520.00		$ -	2.00	13.33	$ 765,893.00	4.00	26.67	$ 1,531,787.00			$ -	6	40.00	$ 2,297,680.00		75%
							$ -	4.00	38.00	$ 2,182,796.00	4.00	7.00	$ 402,094.00			$ -	8	45.00	$ 2,584,890.00		
NP	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En	Und	500.00	$26,609.00	$ 13,304,500.00		$ -	2.00	111.11	$ 2,956,556.00	4.00	222.22	$ 5,913,111.00			$ -	6	333.33	$ 8,869,667.00		

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025						CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025													PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.																	DESDE:	2/1/2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025				SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR				INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES						INFORME No.	3	HASTA:	2/28/2026

3,2,37	Suministro de material vegetal especie SIVA EN KG: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$26,609.00	$ 13,304,500.00																
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$27,942.00	$ 614,724.00	$ -	2.00	4.89	$ 136,605.00	4.00	9.78	$ 273,211.00			$ -	6	14.67	$ 409,816.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,550.00	$26,109.00	$ 40,468,950.00	$ -	2.00	344.44	$ 8,993,100.00	4.00	688.89	$ 17,986,200.00			$ -	6	1,033.33	$ 26,979,300.00			56%
						$ -	4.00	50.00	$ 1,305,450.00	4.00	819.00	$ 21,383,271.00			$ -	8	869.00	$ 22,688,721.00			
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$26,109.00	$ 2,610,900.00	$ -	2.00	22.22	$ 580,200.00	4.00	44.44	$ 1,160,400.00			$ -	6	66.67	$ 1,740,600.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$55,275.00	$ 1,105,500.00	$ -	2.00	4.44	$ 245,667.00	4.00	8.89	$ 491,333.00			$ -	6	13.33	$ 737,000.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	5.00	$129,942.00	$ 649,710.00	$ -	2.00	1.11	$ 144,380.00	4.00	2.22	$ 288,760.00			$ -	6	3.33	$ 433,140.00			100%
						$ -	4.00	5.00	$ 649,710.00			$ -			$ -	4	5.00	$ 649,710.00			
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	25.00	$129,942.00	$ 3,248,550.00	$ -	2.00	5.56	$ 721,900.00	4.00	11.11	$ 1,443,800.00			$ -	6	16.67	$ 2,165,700.00			76%
						$ -	4.00	19.00	$ 2,468,898.00			$ -			$ -	4	19.00	$ 2,468,898.00			
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$54,942.00	$ 2,747,100.00	$ -	2.00	11.11	$ 610,467.00	4.00	22.22	$ 1,220,933.00			$ -	6	33.33	$ 1,831,400.00			22%
						$ -			$ -	4.00	11.00	$ 604,362.00			$ -	4	11.00	$ 604,362.00			
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1,713.00	$17,650.00	$ 30,234,450.00	$ -	2.00	380.67	$ 6,718,767.00	4.00	761.33	$ 13,437,533.00			$ -	6	1,142.00	$ 20,156,300.00			99%
						$ -	4.00	60.00	$ 1,059,000.00	4.00	1643.00	$ 28,998,950.00			$ -	8	1,703.00	$ 30,057,950.00			
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	20.00	$17,650.00	$ 353,000.00	$ -	2.00	4.44	$ 78,444.00	4.00	8.89	$ 156,889.00			$ -	6	13.33	$ 235,333.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	99.00	$29,941.00	$ 2,964,159.00					2.00	39.60	$ 1,185,664.00				2	39.60	$ 1,185,664.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	600.00	$9,339.00	$ 5,603,400.00					2.00	240.00	$ 2,241,360.00				2	240.00	$ 2,241,360.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	200.00	$21,943.00	$ 4,388,600.00					2.00	80.00	$ 1,755,440.00				2	80.00	$ 1,755,440.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	100.00	$33,945.00	$ 3,394,500.00					2.00	40.00	$ 1,357,800.00				2	40.00	$ 1,357,800.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	90.00	$41,607.00	$ 3,744,630.00					2.00	36.00	$ 1,497,852.00				2	36.00	$ 1,497,852.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	90.00	$36,939.00	$ 3,324,510.00					2.00	36.00	$ 1,329,804.00				2	36.00	$ 1,329,804.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	100.00	$30,182.00	$ 3,018,200.00					2.00	40.00	$ 1,207,280.00				2	40.00	$ 1,207,280.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	50.00	$34,941.00	$ 1,747,050.00					2.00	20.00	$ 698,820.00				2	20.00	$ 698,820.00			
																0	0.00	$ -			
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	7.00	$59,512.00	$ 416,584.00					2.00	2.80	$ 166,634.00				2	2.80	$ 166,634.00			
																0	0.00	$ -			
3.3	**Instalación de elementos decorativos y duros**															0	0.00	$ -			
																0	0.00	$ -			
3.3.1	Suministro e instalación de material triturado	m3	13.92	$ 112,873.00	$ 1,571,192.00	$ -	3.00	4.18	$ 471,358.00	4.00	5.57	$ 628,477.00			$ -	7	9.74	$ 1,099,835.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
3.3.2	Suministro e instalacion de piedra bola	m3	60.00	$ 128,873.00	$ 7,732,380.00	$ -	3.00	18.00	$ 2,319,714.00	4.00	24.00	$ 3,092,952.00			$ -	7	42.00	$ 5,412,666.00			76%
						$ -			$ -	4.00	45.75	$ 5,895,940.00			$ -	4	45.75	$ 5,895,940.00			
3.3.3	Instalacion de nombre en materiales vegetal	Und	2.00	$2,090,200.00	$ 4,180,400.00	$ -	3.00	0.60	$ 1,254,120.00	4.00	0.80	$ 1,672,160.00			$ -	7	1.40	$ 2,926,280.00			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
3.3.4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$2,538,200.00	$ 5,076,400.00	$ -	3.00	0.60	$ 1,522,920.00	4.00	0.80	$ 2,030,560.00			$ -	7	1.40	$ 3,553,480.00			100%
						$ -	4.00	2.00	$ 5,076,400.00			$ -			$ -	4	2.00	$ 5,076,400.00			
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	1.00	$4,338,725.00	$ 4,338,725.00					2.00	0.40	$ 1,735,490.00				2	0.40	$ 1,735,490.00			
																0	0.00	$ -			
4	**MANTENIMIENTO**															0	0.00	$ -			
																0	0.00	$ -			
4.1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00	$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
4.2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00	$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			
						$ -			$ -			$ -			$ -	0	0.00	$ -			

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.								DESDE:	2/1/2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025		SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES TEMPORAL INTER VERDES	UNION	INFORME No.	3	HASTA: 2/28/2026

| | | | | | | | |

Anexo N°2 *Balance*
Físico - Financiero

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	2/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 24/12/2025 - 31/12/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 31/01/2026		INFORME No. 3 01/02/2026 - 28/02/2026		ACUMULADO EJECUTADO		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)		CANTIDAD	VALOR ($)	
1	**DIAGNÓSTICO**																					
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00	**70.00%**
1,2	Identificación de puntos críticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00	**70.00%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00	**70.00%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**						- .00	$ -									- .00			-		
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**47%**	6,937.96	$ 9,380,122.00	**52.71%**
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00	154.98	$ 9,314,298.00	586.58	$ 35,253,458.00	**98%**	13.42	$ 806,542.00	**2.24%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00	-	$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		47.00	$ 31,499,400.00	**100.00%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**100%**	-	$ -	
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	8,127.93	$ 91,374,189.00	11,023.45	$ 123,925,625.00	**91%**	1,080.55	$ 12,147,543.00	**8.93%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**						- .00	$ -									- .00			-		
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00	-	$ -	98.76	$ 11,641,373.00	284.94	$ 33,586,733.00	383.70	$ 45,227,870.00	**69%**	170.34	$ 20,078,487.00	**30.75%**
3,2	**siembra de material vegetal**						- .00	$ -									- .00			-		
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00	-	$ -	153.00	$ 5,193,126.00	258.00	$ 8,757,036.00	411.00	$ 13,950,162.00	**99%**	5.00	$ 169,710.00	**1.20%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	183.00	$ 7,649,034.00	283.00	$ 11,828,834.00	**98%**	5.00	$ 208,990.00	**1.74%**
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		-	$ -	
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		50.00	$ 1,348,700.00	**100.00%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00		$ -		$ -	21.00	$ 337,890.00	21.00	$ 337,890.00	**81%**	5.00	$ 80,450.00	**19.23%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00		$ -		$ -	255.00	$ 2,827,950.00	255.00	$ 2,827,950.00	**98%**	5.00	$ 55,450.00	**1.92%**
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		10.00	$ 127,370.00	**100.00%**
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		50.00	$ 704,500.00	**100.00%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		-	$ -	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		10.00	$ 200,900.00	**100.00%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		20.00	$ 401,800.00	**100.00%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		-	$ -	

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	2/28/2026

NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		40.00		$ 17,079,360.00	**100.00%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		10.00		$ 3,909,420.00	**100.00%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%**	-		$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -	5.00	$ 2,054,710.00	5.00	$ 2,054,710.00	**10%**	45.00		$ 18,492,390.00	**90.00%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		10.00		$ 3,876,090.00	**100.00%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%**	-		$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%**	-		$ -	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		20.00		$ 7,752,180.00	**100.00%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	108.00	$ 45,641,772.00	118.00	$ 49,867,862.00	**96%**	5.00		$ 2,113,045.00	**4.07%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%**	-		$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	445.00	$ 27,512,125.00	666.00	$ 41,175,450.00	**93%**	50.00		$ 3,091,250.00	**6.98%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		100.00		$ 6,194,200.00	**100.00%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	10.00	$ 624,420.00	65.00	$ 4,058,730.00	**43%**	85.00		$ 5,307,570.00	**56.67%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%**	80.00		$ 4,808,720.00	**44.44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		100.00		$ 6,010,900.00	**100.00%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00		$ -		$ -	470.00	$ 12,427,740.00	470.00	$ 12,427,740.00	**94%**	30.00		$ 793,260.00	**6.00%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	125.00	$ 6,763,625.00	210.00	$ 11,362,890.00	**53%**	190.00		$ 10,280,710.00	**47.50%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -	245.00	$ 6,559,875.00	245.00	$ 6,559,875.00	**98%**	5.00		$ 133,875.00	**2.00%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00		$ -		$ -	308.00	$ 16,665,572.00	308.00	$ 16,665,572.00	**98%**	5.00		$ 270,545.00	**1.60%**

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	2/28/2026

NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	585.00	$ 31,653,765.00	844.00	$ 45,667,996.00	**99%**	5.00	$ 270,545.00	**0.59%**
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	416.00	$ 22,509,344.00	448.00	$ 24,240,832.00	**99%**	5.00	$ 270,545.00	**1.10%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	7.00	$ 402,094.00	45.00	$ 2,584,890.00	**75%**	15.00	$ 861,630.00	**25.00%**
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	**100.00%**
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		22.00	$ 614,724.00	**100.00%**
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	819.00	$ 21,383,271.00	869.00	$ 22,688,721.00	**56%**	681.00	$ 17,780,229.00	**43.94%**
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	**100.00%**
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	**100.00%**
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	**76%**	6.00	$ 779,652.00	**24.00%**
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -	11.00	$ 604,362.00	11.00	$ 604,362.00	**22%**	39.00	$ 2,142,738.00	**78.00%**
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	1,643.00	$ 28,998,950.00	1,703.00	$ 30,057,950.00	**99%**	10.00	$ 176,500.00	**0.58%**
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		20.00	$ 353,000.00	**100.00%**
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		99.00	$ 2,964,159.00	**100.00%**
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		600.00	$ 5,603,400.00	**100.00%**
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		200.00	$ 4,388,600.00	**100.00%**
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		100.00	$ 3,394,500.00	**100.00%**
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		90.00	$ 3,744,630.00	**100.00%**
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		90.00	$ 3,324,510.00	**100.00%**
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		100.00	$ 3,018,200.00	**100.00%**
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -		50.00	$ 1,747,050.00	**100.00%**

ANEXO 3. BALANCE FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	02/01//2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER VERDES NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	INFORME No.	3	HASTA:	2/28/2026

NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	7.00		$ 416,584.00	100.00%
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**						- .00	$ -				$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	-		$ -	
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	13.92		$ 1,571,192.00	100.00%
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00		$ -		$ -	45.75	$ 5,895,940.00	45.75	$ 5,895,940.00	76%	14.25	$ 1,836,440.00	23.75%
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	2.00		$ 4,180,400.00	100.00%
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	100%	-	$ -	
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	1.00		$ 4,338,725.00	100.00%
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**						- .00	$ -									- .00			-		
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	672.00		$ 52,080,000.00	100.00%
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	47,600.00		$ 64,355,200.00	100.00%
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	15,400.00		$ 86,886,800.00	100.00%
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	11,000.00		$ 32,395,000.00	100.00%
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$ 43,152,650.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	1,075.00		$ 43,152,650.00	100.00%
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**						- .00	$ -									- .00			-		
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	- .00	$ -	2,500.00		$ 27,735,000.00	100.00%
Ajuste compensatorio																**$ (356.00)**							
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$186,675,530.00**		**$ 383,544,339.00**		**$624,945,179.00**			**$ 564,329,353.00**	
ADMINISTRACION			22%		$ 261,640,397.00			$ -		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		$ 41,068,616.60		$ 84,379,755.00		$ 137,487,939.00			$ 124,152,458.00	
IMPREVISTOS			2%		$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		$ 3,733,510.60		$ 7,670,887.00		$ 12,498,904.00			$ 11,286,587.00	
UTILIDADES			6%		$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		$ 11,200,531.80		$ 23,012,660.00		$ 37,496,711.00			$ 33,859,761.00	
IVA sobre utilidad			19%		$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		$ 2,128,101.04		$ 4,372,405.00		$ 7,124,375.00			$ 6,433,355.00	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$119,435,707.00**		**$194,607,929.00**			**$ 175,732,161.00**	
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$244,806,290.00**		**$ 502,980,046.00**		**$819,553,108.00**			**$ 740,061,514.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**32.25%**		**52.55%**			**47.45%**	

AVANCE FÍSICO : 52.55%

OBSERVACIONES:

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 2.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$120 Pesos M/CTE.

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 3.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$236 Pesos M/CTE.

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

UT Corredores Verdes 2025

Anexo N°3 *Memorias de Cálculo*

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	2,2	Excavación y nivelación	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	600.00	CANT EJECUTADA	154.98	CANTIDAD ACUMULADA	154.98

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.20	0.20	0.20					258		2.06	VERANERA
28	2	2026	Lateral derecho y izquierdo debajo del puente AREA 1	0.30	0.30	0.30					183		4.94	AGAVE
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					21		0.57	CACTUS
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					255		6.89	IXORA
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 2	0.70	0.70	0.70					5		1.72	PALMA BILMARSKIA
28	2	2026	Lateral derecho y izquierdo debajo del puente AREA 1 -2 y Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2	0.70	0.70	0.70					108		37.04	PALMA MANILA
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					445		12.02	CORDYLINE
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2	0.30	0.30	0.30					470		12.69	FRAILEJON
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente AREA 1	0.20	0.20	0.20					125		1	MANCAYA
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puenteAREA 2	0.30	0.30	0.30					245		6.62	SPRING
TOTAL:													85.55	





OBSERVACIONES: Hoja 1 de 2

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	2,2	Excavación y nivelación	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	600.00	CANT EJECUTADA	154.98	CANTIDAD ACUMULADA	154.98

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1 -2	0.40	0.40	0.40					308		19.71	PHILODENDRON CORAZON
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1 -2	0.40	0.40	0.40					585		37.44	PHILODENDRON SELLIUM
28	2	2026	Lateral der- izq debajo de los puentes AREA 1 -2	0.20	0.20	0.20					416		3.33	PANDANUS VARIEGADO
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1	0.30	0.30	0.30					7		0.19	VERANERA DE TALLO ALTO
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 2	0.20	0.20	0.20					819		6.55	FLOR DEL LLANO
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1	0.30	0.30	0.30					11		0.3	IXORA PATILLA
28	2	2026	Lateral der- izq debajo de los puentes AREA 1 -2	0.10	0.10	0.10					1643		1.64	PLANTAS RATRERAS
28	2	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					10		0.27	
								0.02					0	
													0	
TOTAL:													69.43	
TOTAL ACUMULADO													154.98	







OBSERVACIONES: Hoja 2 de 2

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	UNIDAD	m2	CANTIDAD TOTAL	12,104.00	CANT EJECUTADA	8127.93	CANTIDAD ACUMULADA	8127.93

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 3				893.13						893.13	
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4				3204.39						3204.39	
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5				2001.78						2001.78	
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6				2028.63						2028.63	
TOTAL:													8127.93	

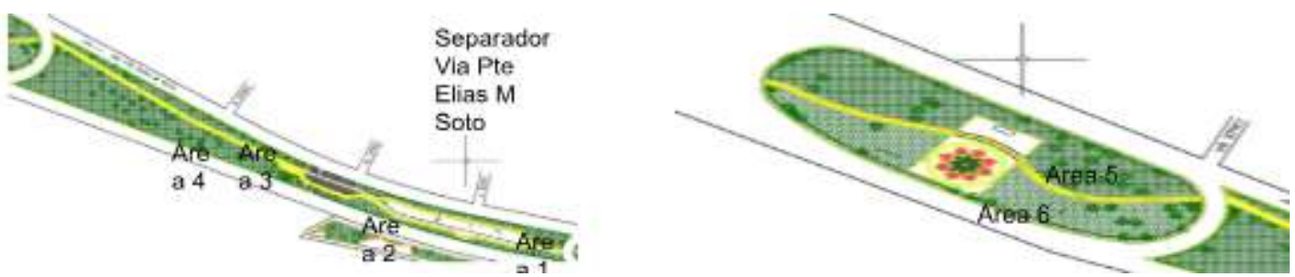

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	554.04	CANT EJECUTADA	284.94	CANTIDAD ACUMULADA	284.94

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.20	0.20	0.20					258		2.06	VERANERA
28	2	2026	Lateral derecho y izquierdo debajo del puente AREA 1 Y 2 y Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2	0.30	0.30	0.30					183		4.94	AGAVE
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					21		0.57	CACTUS
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					255		6.89	IXORA
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 2	0.70	0.70	0.70					5		1.72	PALMA BILMARSKIA
28	2	2026	Lateral derecho y izquierdo debajo del puente AREA 1 -2 y Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2	0.70	0.70	0.70					108		37.04	PALMA MANILA
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 1 -2	0.30	0.30	0.30					445		12.02	CORDYLINE
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente ÁREA 2	0.30	0.30	0.30					470		12.69	FRAILEJON
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puente AREA 1	0.20	0.20	0.20					125		1	MANCAYA
28	2	2026	Lateral derecho debajo del puenteAREA 2	0.30	0.30	0.30					245		6.62	SPRING
TOTAL:													85.55	

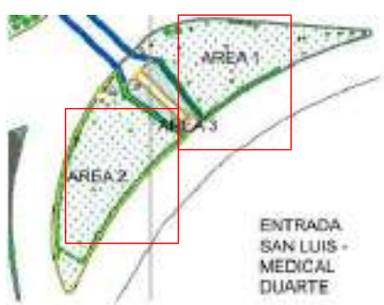



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026


ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	554.04	CANT EJECUTADA	284.94	CANTIDAD ACUMULADA	284.94

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1 -2	0.40	0.40	0.40					308		19.71	PHILODENDRON CORAZON
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1 -2	0.40	0.40	0.40					585		37.44	PHILODENDRON SELLIUM
28	2	2026	Lateral der- izq debajo de los puentes AREA 1 -2	0.20	0.20	0.20					416		3.33	PANDANUS VARIEGADO
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1	0.30	0.30	0.30					7		0.19	VERANERA DE TALLO ALTO
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 2	0.20	0.20	0.20					819		6.55	FLOR DEL LLANO
28	2	2026	Lateral derecho debajo de los puentes AREA 1	0.30	0.30	0.30					11		0.3	IXORA PATILLA
28	2	2026	Lateral der- izq debajo de los puentes AREA 1 -2	0.10	0.10	0.10					1643		1.64	PLANTAS RATRERAS
28	2	2026	Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles	0.30	0.30	0.30					10		0.27	
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	4.91						1.47	Anillo con material de enmienda en arbol N°1
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	4.52						1.36	Anillo con material de enmienda en arbol N°2
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	4.91						1.47	Anillo con material de enmienda en arbol N°3
TOTAL:													73.73	









OBSERVACIONES: Hoja 2 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	554.04	CANT EJECUTADA	284.94	CANTIDAD ACUMULADA	284.94

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°4
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°5
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°6
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.15						1.55	Anillo con material de enmienda en arbol N°7
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.73						1.72	Anillo con material de enmienda en arbol N°8
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	6.16						1.85	Anillo con material de enmienda en arbol N°9
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	4.91						1.47	Anillo con material de enmienda en arbol N°10
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.73						1.72	Anillo con material de enmienda en arbol N°11
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	6.16						1.85	Anillo con material de enmienda en arbol N°12
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	6.88						2.06	Anillo con material de enmienda en arbol N°13
TOTAL:													16.99	



OBSERVACIONES: Hoja 3 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**284.94**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**284.94**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.73						1.72	**Anillo con material de enmienda en arbol N°14**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°15
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	6.88						2.06	Anillo con material de enmienda en arbol N°16
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	4.91						1.47	Anillo con material de enmienda en arbol N°17
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	8.04						2.41	Anillo con material de enmienda en arbol N°18
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.73						1.72	Anillo con material de enmienda en arbol N°19
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°20
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	7.55						2.27	Anillo con material de enmienda en arbol N°21
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	9.08						2.72	Anillo con material de enmienda en arbol N°22
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4			0.30	5.98						1.79	Anillo con material de enmienda en arbol N°23
TOTAL:													**19.34**	



OBSERVACIONES: Hoja 4 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	DESDE:	1	2	2026
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.											
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026	

ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	554.04	CANT EJECUTADA	284.94	CANTIDAD ACUMULADA	284.94

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6			0.30	13.85						4.16	**Anillo con material de enmienda en arbol N°24**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6			0.30	13.2						3.96	Anillo con material de enmienda en arbol N°25
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6			0.30	15.9						4.77	Anillo con material de enmienda en arbol N°26
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6			0.30	13.2						3.96	Anillo con material de enmienda en arbol N°27
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6			0.30	15.9						4.77	Anillo con material de enmienda en arbol N°28
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	15.9						4.77	Anillo con material de enmienda en arbol N°29
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	8.04						2.41	Anillo con material de enmienda en arbol N°30
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	8.55						2.57	Anillo con material de enmienda en arbol N°31
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	5.31						1.59	Anillo con material de enmienda en arbol N°32
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	6.16						1.85	Anillo con material de enmienda en arbol N°33
TOTAL:													**34.81**	

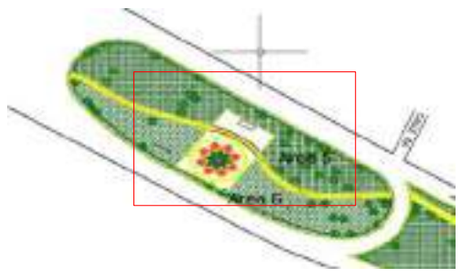

OBSERVACIONES: Hoja 5 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026

ÍTEM:	3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	554.04	CANT EJECUTADA	284.94	CANTIDAD ACUMULADA	284.94

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	7.55						2.27	Anillo con material de enmienda en arbol N°34
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	4.91						1.47	Anillo con material de enmienda en arbol N°35
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	4.52						1.36	Anillo con material de enmienda en arbol N°36
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	7.07						2.12	Anillo con material de enmienda en arbol N°37
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	17.35						5.21	Anillo con material de enmienda en arbol N°38
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	8.55						2.57	Anillo con material de enmienda en arbol N°39
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	9.08						2.72	Anillo con material de enmienda en arbol N°40
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	15.21						4.56	Anillo con material de enmienda en arbol N°41
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	6.16						1.85	Anillo con material de enmienda en arbol N°42
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	10.75						3.23	Anillo con material de enmienda en arbol N°43
TOTAL:													**27.36**	



OBSERVACIONES: Hoja 6 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez RESIDENTE DE OBRA	**Nelson David Acevedo Torres** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre** DIRECTOR DE OBRA	**Freddy Alexili Villan Valencia** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**		
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**										**DESDE:**	1 2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	3			**HASTA:**	28 2	2026

ÍTEM:	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**554.04**	**CANT EJECUTADA**	**284.94**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**284.94**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	18.86						5.66	**Anillo con material de enmienda en arbol N°44**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	16.33						4.9	**Anillo con material de enmienda en arbol N°45**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	8.04						2.41	**Anillo con material de enmienda en arbol N°46**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	7.55						2.27	**Anillo con material de enmienda en arbol N°47**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	7.84						2.35	**Anillo con material de enmienda en arbol N°48**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	12.57						3.77	**Anillo con material de enmienda en arbol N°49**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5			0.30	19.32						5.8	**Anillo con material de enmienda en arbol N°50**
TOTAL:													**27.16**	
TOTAL ACUMULADO													**284.94**	

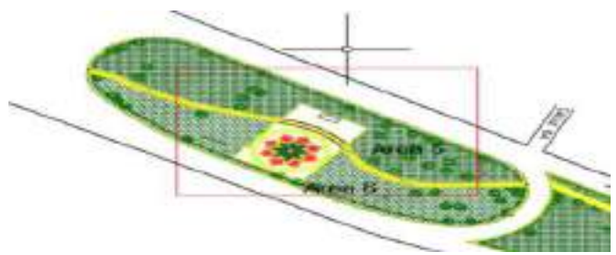

OBSERVACIONES: Hoja 7 de 7

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3			**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**416.00**	**CANT EJECUTADA**	**258.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**258.00**	

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								122		122	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								40		40	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								40		40	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								15		15	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral izquierdo debajo del puente AREA 2								41		41	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**258.00**	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**288.00**	**CANT EJECUTADA**	**183.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**183.00**	

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								72		72	REDOMA ARNULFO BRICEÑO DEBAJO PUENTES
28	2	2023	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								24		24	REDOMA ARNULFO BRICEÑO DEBAJO PUENTES
28	2	2023	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								12		12	REDOMA ARNULFO BRICEÑO DEBAJO PUENTES
28	2	2023	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2								25		25	REDOMA ARNULFO BRICEÑO DEBAJO PUENTES
28	2	2023	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2								30		30	REDOMA ARNULFO BRICEÑO DEBAJO PUENTES
28	2	2023	Monumento Arnulfo Briceño Área 2								20		20	MONUMENTO ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**183.00**	



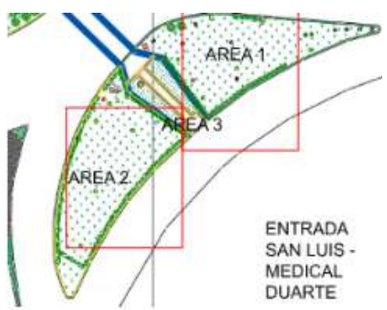



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026

ÍTEM:	3,2,7	**Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**26.00**	**CANT EJECUTADA**	**21.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**21.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2								9		9	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1-2								12		12	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**21.00**	

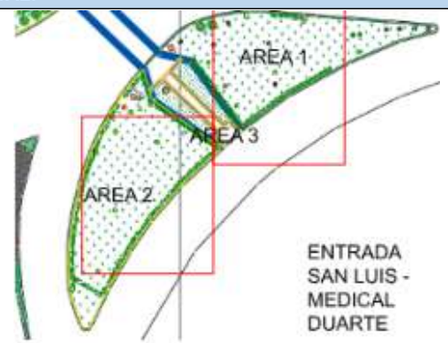

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	260.00	CANT EJECUTADA	255.00	CANTIDAD ACUMULADA	255.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								35		35	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								20		20	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1 - 2								100		100	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
			Lateral Derecho debajo del puente AREA 2								100		100	
TOTAL:													255.00	



OBSERVACIONES:


Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3			**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,18**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**50.00**	**CANT EJECUTADA**	**5.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**5.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 2								5		5	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**5.00**	

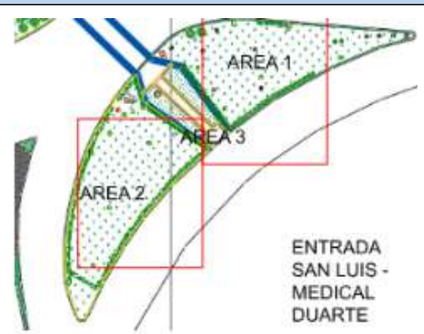

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025					**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**										**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES		**INFORME No.**	3	**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**123.00**	**CANT EJECUTADA**	**108.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**108.00**	

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								12		12	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								12		12	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								13		13	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								11		11	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								12		12	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								13		13	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								25		25	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Izqui debajo del puente AREA 2								10		10	
TOTAL:													**108.00**	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**716.00**	**CANT EJECUTADA**	**445.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**445.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								80		80	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								58		58	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								51		51	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								80		80	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der - Izqui debajo del puente AREA 1 - 2								100		100	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño								45		45	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño								30		30	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Monumento Arnulfo Briceño								1		1	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**445.00**	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	150.00	CANT EJECUTADA	10.00	CANTIDAD ACUMULADA	10.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
			Lateral izquierdo puente de guadua; entrada túneles								10		10	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													10.00	



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026

ÍTEM:	**NP 3,2,30**	**Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**500.00**	**CANT EJECUTADA**	**470.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**470.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 2								100		100	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
			Lateral Izquierdo debajo del puente AREA 2								100		100	
			Lateral Izquierdo debajo del puente AREA 2								130		130	
			Lateral Izquierdo debajo del puente AREA 2								140		140	
TOTAL:													**470.00**	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	400.00	CANT EJECUTADA	125.00	CANTIDAD ACUMULADA	125.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1								24		24	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1								25		25	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Izquierdo debajo del puente AREA 2								16		16	
28	2	2026	Lateral Izquierdo debajo del puente AREA 2								60		60	
TOTAL:													125.00	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	250.00	CANT EJECUTADA	245.00	CANTIDAD ACUMULADA	245.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 2								144		144	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral izquierdo debajo del puente AREA 3								101		101	
TOTAL:													245.00	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	313.00	CANT EJECUTADA	308.00	CANTIDAD ACUMULADA	308.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								18		18	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								90		90	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								100		100	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								100		100	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													308.00	



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	849.00	CANT EJECUTADA	585.00	CANTIDAD ACUMULADA	585.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1-2								205		205	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1-2								200		200	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1-2								80		80	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral izquierdo debajo del puente AREA 2								100		100	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													585.00	





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	453.00	CANT EJECUTADA	416.00	CANTIDAD ACUMULADA	416.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								45		45	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								60		60	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								20		20	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								20		20	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								50		50	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								47		47	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								20		20	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								20		20	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								24		24	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								50		50	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													356.00	



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026

ÍTEM:			**UNIDAD**		**CANTIDAD TOTAL**		**CANT EJECUTADA**	**60.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**60.00**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral izq debajo del puente AREA 2								60		60	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													**60.00**	
TOTAL ACUMULADO:													**416.00**	

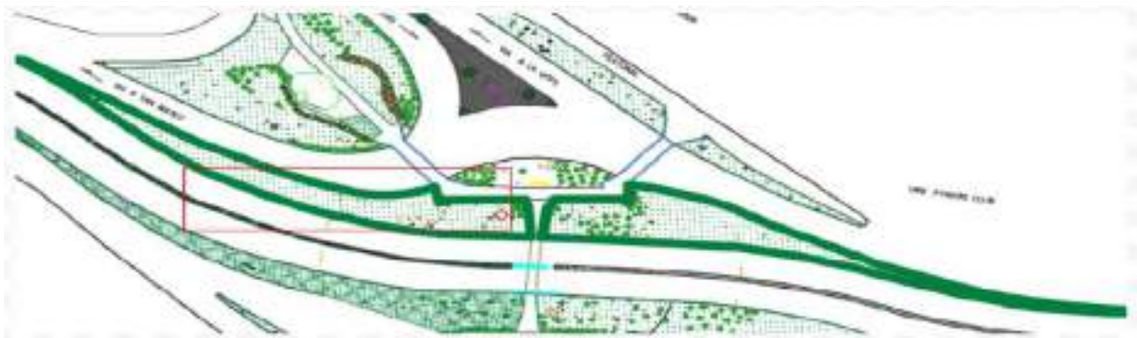

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	60.00	CANT EJECUTADA	7.00	CANTIDAD ACUMULADA	7.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte AREA 1								7		7	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													7.00	



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025


CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**1,550.00**	**CANT EJECUTADA**	**819.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**819.00**	

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 2								100		100	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Peatonal UFPS Área 1								480		480	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Entrada San Luis - Medical Duarte ÁREA 1 - 2								239		239	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
TOTAL:													**819.00**	



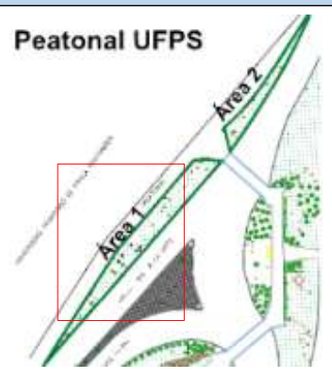

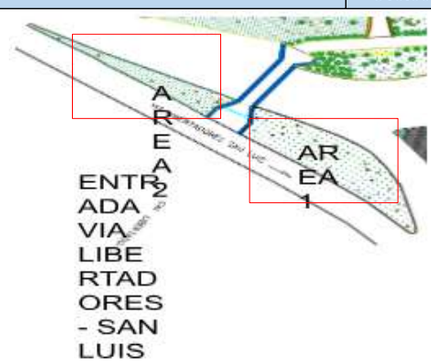

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez RESIDENTE DE OBRA	**Nelson David Acevedo Torres** RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre** DIRECTOR DE OBRA	**Freddy Alexili Villan Valencia** DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	UNIDAD	Und	CANTIDAD TOTAL	50.00	CANT EJECUTADA	11.00	CANTIDAD ACUMULADA	11.00

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Lateral Derecho debajo del puente AREA 1								11		11	REDOMA ARNULFO BRICEÑO
TOTAL:													11.00	



OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	Nelson David Acevedo Torres	Diego Eduardo Cuadros Aguirre	Freddy Alexili Villan Valencia
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Corponor	**ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	28	2	2026


ÍTEM:	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**UNIDAD**	**Und**	**CANTIDAD TOTAL**	**1,713.00**	**CANT EJECUTADA**	**1643.00**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**1643.00**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								413		413	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								400		400	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								120		120	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								130		130	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral Der- izq debajo del puente AREA 1-2								270		270	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Peatonal UFPS Área 1 - 2								200		200	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
28	2	2026	Lateral der - izq puente de guadua; entrada túneles								110		110	**REDOMA ARNULFO BRICEÑO**
TOTAL:													**1643.00**	



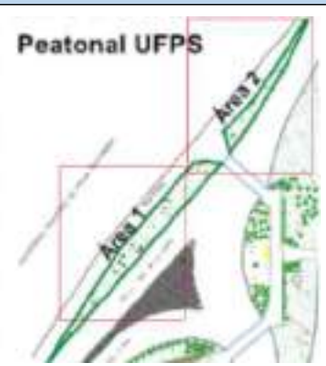





OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	60.00	CANT EJECUTADA	45.75	CANTIDAD ACUMULADA	45.75

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.3	0.3							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°1**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.54	0.3	0.3							0.68	**Anillo de piedra en arbol N°2**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.84	0.3	0.3							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°3**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°4**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°5**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°6**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.04	0.3	0.3							0.72	**Anillo de piedra en arbol N°7**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.3	0.3							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°8**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.80	0.3	0.3							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°9**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.3	0.3							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°10**
TOTAL:													**7.30**	



OBSERVACIONES: Hoja 1 de 5

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	60.00	CANT EJECUTADA	45.75	CANTIDAD ACUMULADA	45.75

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.3	0.3							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°11**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.8	0.3	0.3							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°12**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.3	0.3	0.3							0.84	**Anillo de piedra en arbol N°13**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.3	0.3							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°14**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°15**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.30	0.3	0.3							0.84	**Anillo de piedra en arbol N°16**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	7.85	0.3	0.3							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°17**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	10.05	0.3	0.3							0.9	**Anillo de piedra en arbol N°18**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.48	0.3	0.3							0.76	**Anillo de piedra en arbol N°19**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°20**
TOTAL:													**7.84**	

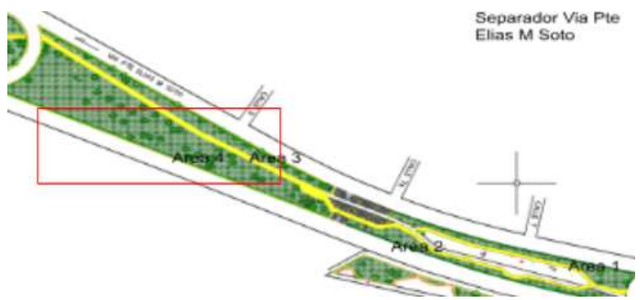

OBSERVACIONES: Hoja 2 de 5

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**				**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**60.00**	**CANT EJECUTADA**	**45.75**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**45.75**

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA (M2)	VOLUMEN (M3)	LONGITUD (ML)	KILO (KG)	UNIDAD (UND)	HORAS (HR)	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO								
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	9.74	0.3	0.3							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°21**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	10.68	0.3	0.3							0.96	**Anillo de piedra en arbol N°22**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 4	8.67	0.3	0.3							0.78	**Anillo de piedra en arbol N°23**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	13.19	0.3	0.3							1.19	**Anillo de piedra en arbol N°24**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	12.88	0.3	0.3							1.16	**Anillo de piedra en arbol N°25**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	14.14	0.3	0.3							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°26**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	12.88	0.3	0.3							1.16	**Anillo de piedra en arbol N°27**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 6	14.14	0.3	0.3							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°28**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.14	0.3	0.3							1.27	**Anillo de piedra en arbol N°29**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.05	0.3	0.3							0.9	**Anillo de piedra en arbol N°30**
TOTAL:													**10.84**	

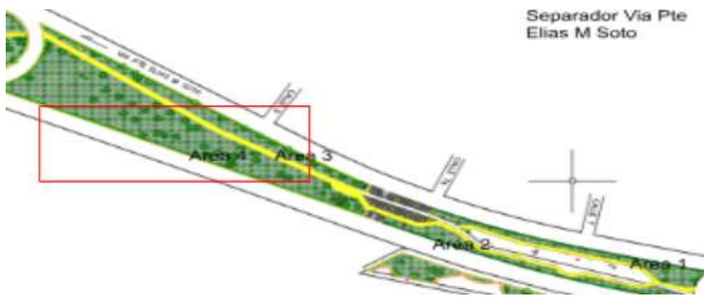



OBSERVACIONES: Hoja 3 de 5

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**						**PERIODO REPORTADO**			
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**									**DESDE:**	**1**	**2**	**2026**
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3			**HASTA:**	**28**	**2**	**2026**

ÍTEM:	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**UNIDAD**	**m3**	**CANTIDAD TOTAL**	**60.00**	**CANT EJECUTADA**	**45.75**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**45.75**

FECHA			**UBICACIÓN**	**DIMENSIONES**			**ÁREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**	**KILO (KG)**	**UNIDAD (UND)**	**HORAS (HR)**	**SUBTOTAL**	**OBSERVACIONES**
DIA	**MES**	**AÑO**	**DESCRIPCIÓN - ABSCISA**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**								
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.37	0.3	0.3							0.93	**Anillo de piedra en arbol N°31**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.17	0.3	0.3							0.74	**Anillo de piedra en arbol N°32**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.8	0.3	0.3							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°33**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.74	0.3	0.3							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°34**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	7.85	0.3	0.3							0.71	**Anillo de piedra en arbol N°35**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	7.54	0.3	0.3							0.68	**Anillo de piedra en arbol N°36**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.42	0.3	0.3							0.85	**Anillo de piedra en arbol N°37**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.77	0.3	0.3							1.33	**Anillo de piedra en arbol N°38**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.37	0.3	0.3							0.93	**Anillo de piedra en arbol N°39**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.68	0.3	0.3							0.96	**Anillo de piedra en arbol N°40**
TOTAL:													**8.80**	



OBSERVACIONES: Hoja 4 de 5

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 4. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO			
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	1	2	2026
CONTRATISTA:	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	28	2	2026

ÍTEM:	3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	UNIDAD	m3	CANTIDAD TOTAL	60.00	CANT EJECUTADA	45.75	CANTIDAD ACUMULADA	45.75

FECHA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	VOLUMEN	LONGITUD	KILO	UNIDAD	HORAS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
DIA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN - ABSCISA	LARGO	ANCHO	ALTO	(M2)	(M3)	(ML)	(KG)	(UND)	(HR)		
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	13.85	0.3	0.3							1.25	**Anillo de piedra en arbol N°41**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	8.8	0.3	0.3							0.79	**Anillo de piedra en arbol N°42**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	11.62	0.3	0.3							1.05	**Anillo de piedra en arbol N°43**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	15.39	0.3	0.3							1.39	**Anillo de piedra en arbol N°44**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	14.33	0.3	0.3							1.29	**Anillo de piedra en arbol N°45**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	10.05	0.3	0.3							0.9	**Anillo de piedra en arbol N°46**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.74	0.3	0.3							0.88	**Anillo de piedra en arbol N°47**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	9.93	0.3	0.3							0.89	**Anillo de piedra en arbol N°48**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	12.57	0.3	0.3							1.13	**Anillo de piedra en arbol N°49**
28	2	2026	Separador Via Pte Elias M Soto ÁREA 5	15.58	0.3	0.3							1.4	**Anillo de piedra en arbol N°50**
TOTAL:													**10.97**	
TOTAL ACUMULADO:													**45.75**	



OBSERVACIONES: Hoja 5 de 5

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo N°4 *Registro Fotográfico*

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**2,2**	**Excavación y nivelación**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



ejecucion de excavacio en lateral del puentes



Excavaciones para siembra en laderal ufps



continuan con Excavaciones en laterales de puente



Laterales ufps se realizan excavaciones

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 2,5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Conformacion proveniente de la misma excavacion



Conformacion de terreno Frente a clinica medical duarte .



Conformacion y nivelacion en el area de redoma arnulfo Briseño



Conformacion y nivelacion en el area de redoma arnulfo Briseño

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Instalacion de mejora del suelo a todas las areas donde se siembra cada planta



Instalacion de mejora del suelo a todas las areas donde se siembra cada planta



Instalacion de mejora del suelo a todas las areas donde se siembra cada planta



Instalacion de mejora del suelo a todas las areas donde se siembra cada planta

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



se realizo instalacion de veraneras en las areas de la redoma de arnulfo briseño , esta area es donde esta el monumento de arnulfo briseño



se realizo instalacion de veraneras en las areas de la redoma de arnulfo briseño , esta area es donde esta el monumento de arnulfo briseño



se realizo instalacion de veraneras en las areas de la redoma de arnulfo briseño , esta area es donde esta el monumento de arnulfo briseño



en los laterales del puente de guauda

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



instalacion de agaves en los laterales frente a la clinica medical duarte



siembra en los laterales debajo de los puentes de concreto



siembra en los laterales debajo de los puentes de concreto



instalacion de agaves en los laterales frente a la clinica medical duarte

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,7**	**Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



siembra en los laterales frente a la clinica medical duarte



siembra en los laterales frente a la clinica medical duarte



siembra en los laterales frente a la clinica medical duarte



siembra en los laterales frente a la clinica medical duarte

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,2,8**	**Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



se realizo siembra en los laterales derecho y izquierdo del puente de la redoma arnulfo briseño



se realizo siembra en los laterales derecho y izquierdo del puente de la redoma arnulfo briseño



se realizo siembra en los laterales derecho y izquierdo del puente de la redoma arnulfo briseño



se realizo siembra en los laterales derecho y izquierdo del puente de la redoma arnulfo briseño

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,18** — **Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m**	**DESDE:**	**02/01//2026**
		HASTA:	**28/2/2026**



se realizo la siembra en el area de la redoma de arnulfo briseño



se realizo la siembra en el area de la redoma de arnulfo briseño



en el area de lateral de la clinica medical duarte



en el area de lateral de la clinica medical duarte

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Siembra en el lateral del puente sobre el nombre



en los laterales derecho y izquierdo debajo del puente de guadua



en los laterales derecho y izquierdo debajo del puente de guadua



Siembra en el lateral del puente sobre el nombre

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



instalacion en el area del monumento arnulfo Briseño



instalacion en la parte baja del puente de guadua



instalacion en la parte baja del puente de guadua



instalacion en el area del monumento arnulfo Briseño

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



siembra en los laterales derecho y izquierdo en las entradas y salidas del puente de guadua



siembra en los laterales derecho y izquierdo en las entradas y salidas del puente de guadua



siembra en los laterales derecho y izquierdo en las entradas y salidas del puente de guadua



siembra en los laterales derecho y izquierdo en las entradas y salidas del puente de guadua

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,30**	**Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Siembra en los laterales de puente arnnulfo briseño



Siembra en los laterales de puente arnnulfo briseño



Siembra en los laterales de puente arnnulfo briseño



Siembra en los laterales de puente arnnulfo briseño

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,31** — **Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
		HASTA:	**28/2/2026**



siembra de material vegeral en el sector de redoma arnulfo Briseño



siembra de material vegeral en el sector de redoma arnulfo Briseño



siembra de material vegeral en el sector de redoma arnulfo Briseño



siembra de material vegeral en el sector de redoma arnulfo Briseño

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,32**	**Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



siembra en los laterales de talud en la salidad del puente de guadua



siembra en los laterales de talud en la salidad del puente de guadua



lateral DErecho



lateral izquierdo

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,33**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



siembra en el area de la redoma arnulfo briseño, debajo de los puentes de concreto



siembra en el area de la redoma arnulfo briseño, debajo de los puentes de concreto



siembra en el area de la redoma arnulfo briseño, debajo de los puentes de concreto



siembra en el area de la redoma arnulfo briseño, debajo de los puentes de concreto

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Laterales en el puente de guadua



parte derecha e izquierda puente de guadua .



Laterales derecho



Laterales izquierdo

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



instalacion de pandanus en el area del munimento arnulfro briseño



siembra en el area laterales al lado de puente de guadua dentro del oasis de palmas



siembra en el area laterales al lado de puente de guadua dentro del oasis de palmas



siembra en el area laterales al lado de puente de guadua dentro del oasis de palmas

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



Lateral dercho puente de guadua



Lateral dercho puente de guadua



lateral izquierdo puente de guadua



lateral izquierdo puente de guadua

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



laterales del puente de la redoma de arnulfo briseño



en el monumento arnulfo briseño



en los laterales frente a la universidad



en el monumento arnulfo briseño

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.		**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,44**	**Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



se realizo instalacion de esta especie en el lateral derecho y izuierdo del puente de guadua



se realizo instalacion de esta especie en el lateral derecho y izuierdo del puente de guadua



se realizo instalacion de esta especie en el lateral derecho y izuierdo del puente de guadua



se realizo instalacion de esta especie en el lateral derecho y izuierdo del puente de guadua

ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**DESDE:**	**02/01//2026**
			HASTA:	**28/2/2026**



siembra de plantas en el area debajo de los puestes estas plantas se conocen como rastreras, creanddo una capa vegetal en la superficia



Variedad de plantas rastreras



instalacion en las areas debajo de los puentes



instalacion en las areas debajo de los puentes

Corponor	**ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA** MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024	UT Corredores Verdes 2025

01 de Febrero a 28 de febrero 2026

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

OBJETO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.	**INFORME No.**	**3**
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	**3,3,2** — **Suministro e instalación de piedra bola**	**DESDE:**	**02/01//2026**
		HASTA:	**28/2/2026**



Instalacion de piedra bola en el borde de los arboles en el separador frente a circus pop



Instalacion de piedra bola en el borde de los arboles en el separador frente a circus pop



Instalacion de piedra bola en el borde de los arboles en el separador frente a circus pop



Instalacion de piedra bola en el borde de los arboles en el separador frente a circus pop

Anexo N°5 *Relación de Pagos*

ANEXO 6. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025**		**PERIODO REPORTADO**
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**				**DESDE:** 2/1/2026
CONTRATISTA:	EDINSON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES **INFORME No.** 3		**HASTA:** 2/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 24/12/2025 - 31/12/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 31/01/2026		ACTA PARCIAL No. 3 01/02/2026 - 28/02/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)
1	**DIAGNÓSTICO**																				
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$(10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**47%**	6,937.96	$ 9,380,122.00
2,2	Excavación y nivelación	m2	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	5,935,596.00	154.98	$ 9,314,298.00	586.58	$ 35,253,458.00	**98%**	13.42	$ 806,542.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -		47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**100%**	-	$ -
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	8,127.93	$ 91,374,189.00	11,023.45	$123,925,625.00	**91%**	1,080.55	$ 12,147,543.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00	-	$ -	98.76	11,641,373.00	284.94	$ 33,586,733.00	383.70	$ 45,227,870.00	**69%**	170.34	$ 20,078,487.00
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00	-	$ -	153.00	$ 5,193,126.00	258.00	$ 8,757,036.00	411.00	$ 13,950,162.00	**99%**	5.00	$ 169,710.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	183.00	$ 7,649,034.00	283.00	$ 11,828,834.00	**98%**	5.00	$ 208,990.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 1,348,700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00		$ -		$ -	21.00	$ 337,890.00	21.00	$ 337,890.00	**81%**	5.00	$ 80,450.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00		$ -		$ -	255.00	$ 2,827,950.00	255.00	$ 2,827,950.00	**98%**	5.00	$ 55,450.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		10.00	$ 127,370.00

3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	50.00	$ 704,500.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 200,900.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 401,800.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$(17,290,000.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$(17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	40.00	$ 17,079,360.00
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$(27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 3,909,420.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%** -	$ -
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -	5.00	$ 2,054,710.00	5.00	$ 2,054,710.00	**10%** 45.00	$ 18,492,390.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10.00	$ 3,876,090.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%** -	$ -
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%** -	$ -
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$(23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 7,752,180.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	108.00	$ 45,641,772.00	118.00	$ 49,867,862.00	**96%** 5.00	$ 2,113,045.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%** -	$ -
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	445.00	$ 27,512,125.00	666.00	$ 41,175,450.00	**93%** 50.00	$ 3,091,250.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 6,194,200.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	10.00	$ 624,420.00	65.00	$ 4,058,730.00	**43%** 85.00	$ 5,307,570.00
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%** 80.00	$ 4,808,720.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 6,010,900.00

NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$(13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00		$ -		$ -	470.00	$ 12,427,740.00	470.00	$ 12,427,740.00	**94%** 30.00	$ 793,260.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	125.00	$ 6,763,625.00	210.00	$ 11,362,890.00	**53%** 190.00	$ 10,280,710.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -	245.00	$ 6,559,875.00	245.00	$ 6,559,875.00	**98%** 5.00	$ 133,875.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00		$ -		$ -	308.00	$ 16,665,572.00	308.00	$ 16,665,572.00	**98%** 5.00	$ 270,545.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	585.00	$ 31,653,765.00	844.00	$ 45,667,996.00	**99%** 5.00	$ 270,545.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	416.00	$ 22,509,344.00	448.00	$ 24,240,832.00	**99%** 5.00	$ 270,545.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	7.00	$ 402,094.00	45.00	$ 2,584,890.00	**75%** 15.00	$ 861,630.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	22.00	$ 614,724.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	819.00	$ 21,383,271.00	869.00	$ 22,688,721.00	**56%** 681.00	$ 17,780,229.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 2,610,900.00
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	**100%** -	$ -
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	**76%** 6.00	$ 779,652.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -	11.00	$ 604,362.00	11.00	$ 604,362.00	**22%** 39.00	$ 2,142,738.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	1,643.00	$ 28,998,950.00	1,703.00	$ 30,057,950.00	**99%** 10.00	$ 176,500.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20.00	$ 353,000.00
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	99.00	$ 2,964,159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	600.00	$ 5,603,400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	200.00	$ 4,388,600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 3,394,500.00

NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	90.00	$ 3,744,630.00
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	90.00	$ 3,324,510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100.00	$ 3,018,200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	50.00	$ 1,747,050.00
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7.00	$ 416,584.00
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$(30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00		$ -		$ -	45.75	$ 5,895,940.00	45.75	$ 5,895,940.00	**76%** 14.25	$ 1,836,440.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	**100%** -	$ -
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.00	$ 4,338,725.00
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	672.00	$ 52,080,000.00
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	47,600.0	$ 64,355,200.00
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,400.0	$ 86,886,800.00
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,000.0	$ 32,395,000.00
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$ 43,152,650.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,075.00	$ 43,152,650.00
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00
Ajuste compensatorio																**$ (356.00)**				
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ 383,544,339.0**		**$624,945,179.00**		**$ 564,329,353.00**
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		$41,068,616.60		$84,379,754.58		$137,487,939.38		$ 124,152,457.66
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		$3,733,510.60		$7,670,886.78		$ 12,498,903.58		$ 11,286,587.06
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		$11,200,531.80		$23,012,660.34		$ 37,496,710.74		$ 33,859,761.18
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		$2,128,101.04		$4,372,405.46		$ 7,124,375.04		$ 6,433,354.62
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ 119,435,707.0**		**$194,607,929.00**		**$ 175,732,161.00**
VALOR TOTAL					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ 502,980,046.0**		**$819,553,108.00**		**$ 740,061,514.00**
PORCENTAJE DE AVANCE												**4.60%**		**15.70%**		**32.25%**		**52.55%**		**47.45%**

AVANCE FÍSICO : **52.55%**

OBSERVACIONES:

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexiñ Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
Acta Parcial N°1	$ 71,766,772.00	$ 71,766,772.00	$ 1,487,847,850.00	4.60%	4.60%	24/12/2025	31/12/2025			
Acta Parcial N°2	$ 244,806,290.00	$ 316,573,062.00	$ 1,243,041,560.00	15.70%	20.30%	01/01/2026	31/01/2026			
Acta Parcial N°3	$ 502,980,046.00	$ 819,553,108.00	$ 740,061,514.00	32.25%	52.55%	01/02/2026	28/02/2026			

Darlin Yeritza Martinez Martinez
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Diego Eduardo Cuadros Aguirre
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexiir Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO No Y FECHA	LC731-2025 30 DE DICIEMBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO	OBRA	
SEMANA No:	10	
FECHA DEL INFORME	DESDE: 01/02/2026	HASTA: 28/02/2026
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	28/02/2026	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES	
SUPERVISOR CORPONOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ	
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO	

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE EJECUCION
Contratación	Durante el período evaluado, la Unión Temporal Corredores Verdes 2025 adelantó las actividades de contratación del personal requerido para dar continuidad con el contrato, conforme a las necesidades operativas y a los lineamientos legales vigentes.
Afiliación	El personal contratado fue afiliado oportunamente al Sistema General de Seguridad Social Integral, garantizando su vinculación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS), Caja de Compensación Familiar (CCF) y Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), según corresponda.
Exámenes médicos ocupacionales	Al personal vinculado se le practicaron los exámenes médicos ocupacionales de preingreso, con el propósito de verificar su aptitud física y mental para el desempeño de las labores asignadas, de acuerdo con los factores de riesgo identificados y las exigencias del cargo.
Inducción en seguridad y salud en el trabajo	Se realizó la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo, socializando las políticas internas, normas de seguridad, identificación de peligros, medidas de control, uso adecuado de los elementos de protección personal y los riesgos asociados a las actividades a ejecutar.

Dotación y elementos de protección personal	Se efectuó la entrega de la dotación y de los elementos de protección personal necesarios, conforme a los riesgos identificados y a las actividades a desarrollar, asegurando su adecuado uso y conservación por parte del personal.
Inspección de áreas	Se llevó a cabo la inspección de las áreas donde se desarrollarán las actividades de la obra, con el fin de identificar condiciones locativas, actos y condiciones inseguras, así como factores de riesgo, estableciendo las acciones preventivas y correctivas correspondientes.
Inspección de equipos de emergencia	Se realizó la inspección de los equipos de atención y respuesta a emergencias, tales como botiquines, camilla de emergencia, inmovilizadores y extintores, verificando su disponibilidad, estado y condiciones de operatividad.
Inspección de volquetas	Se realizó la inspección de las volquetas utilizadas para el transporte de residuos vegetales y material de desecho, verificando sus condiciones mecánicas, de seguridad y documentación, con el fin de garantizar una operación segura y el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante el desarrollo de las actividades.
Capacitación	Se desarrollaron capacitaciones en identificación de peligros y valoración de riesgos dirigidas a todo el personal, tanto directo como indirecto. Asimismo, se socializó el mecanismo y la forma adecuada de reportar actos y condiciones inseguras, con el fin de promover su correcto uso y prevenir riesgos laborales. Se realizó capacitación en el uso adecuado de las señalizaciones y en el control del tránsito a nivel de vía, incluyendo el uso correcto de señales preventivas, colombinas, conos y barreras. Igualmente, se llevó a cabo capacitación en prevención del riesgo biológico, sensibilizando al personal sobre los riesgos asociados a la labor, mediante la identificación de avispas, abejas, hormigas y serpientes.

Atentamente,

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Tabla registro de anexos

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA
1.	Anexo 0. Novedades de personal de obra.	X	
2.	Anexo 1. Empleos generados de obra.	X	
3.	Anexo 2. Constancia de entrega de dotación en obras.	X	
4.	Anexo 3. Capacitación o charla en obras públicas.	X	
5.	Anexo 4. Formato inspección de botiquín y camilla en obras públicas.	X	
6.	Anexo 5. Formato inspección de extintores en obras públicas.	X	
7.	Anexo. Formato inspección de vehículos en obras públicas.		X
8.	Anexo 6. Formato inspección de volquetas en obras públicas.	X	
9.	Anexo 7. Formato inspección de maquinaria pesada y equipos ligeros en obras públicas.	X	
10.	Anexo 8. Formato señalización en obras públicas.	X	
11.	Anexo 9. Matriz de riesgo de la obra.	X	
12.	Anexo 10. Plan de manejo ambiental (Formato propio de la unión temporal o consorcio).	X	
13.	Anexo 11. Plan de señalización.	X	
14.	Anexo 12. Plan de emergencia.	X	
15.	Anexo 13. Plan calidad.	X	
16.	Anexo 14. Seguimiento y aplicación de planes (plan de trabajo SST).	X	
17.	Anexo 15. Listado de personal administrativo y de obra.	X	
18.	Anexo 16. Control diario del personal de obra (asistencia).	X	
19.	Anexo 17. Exámenes de ingreso.	X	
20.	Anexo 18. Certificado EPS	X	
21.	Anexo 18. Certificado AFP.	X	
22.	Anexo 19. Certificado ARL.	X	
23.	Anexo 20. Exámenes de retiro.	X	
24.	Anexo 21. Planilla de pago al sistema de seguridad social.	X	

Nota. Para uso exclusivo en los contratos de Obra, Consultorías o Convenios

El presente informe se entrega como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y manejo ambiental, correspondientes a la obra, contando con personal contratado.

REGSITRO FOTOGRAFICO

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO No.1 Inducción generalidades en SST</td><td>FOTO No. 2 Inducción generalidades en SST</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO No. 3 Inducción generalidades en SST</td><td>FOTO No. 4 Inducción generalidades en SST</td></tr>
</table>

	
FOTO No. 5 Capacitación de identificación de peligros y valoración de los riesgos.	FOTO No. 6 Capacitación prevención de riesgo biológico.
	
FOTO No. 7 Formato de reporte condiciones y actos inseguros.	FOTO No. 8 Uso de señalización y control del tránsito en actividades a nivel de vial.

	
FOTO No. 9 Uso de señalización y control del tránsito en actividades a nivel de vial.	FOTO No. 10 Inspección de equipos de emergencia (camilla)
	
FOTO No. 11 Inspección de volquetas	FOTO No. 12 Inspección de volquetas

	
FOTO No. 13 Inspección de equipos de emergencia (botiquín)	FOTO No. 14 Inspección de equipos de emergencia (botiquín)
	
FOTO No. 15 Inspección de señalización de obra	FOTO No. 16 Inspección de señalización de obra

	
FOTO No. 17 Inspección de EPP	FOTO No. 18 Inspección de señalización
	
FOTO No. 19 Inspección de máquinas y equipos (Equipos – martillo neumático)	FOTO No. 20 Inspección de máquinas y equipos (planta eléctrica -gasolina)

ANEXOS 0. NOVEDADES DEL PERSONAL DE OBRA

ANEXO 1. NOVEDADES DE PERSONAL DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.: LC731-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA765-2025
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO DEL CONTRATO

MES No.	3	DESDE:	1/02/2026
		HASTA:	28/02/2026

No.	NOMBRE	APELLIDO	C.C.	NOVEDAD			Nº DIAS LABORADOS	DIRECTO	INDIRECTO	SALUD	ARL	PENSIÓN
				ING	RET	INC						
1	DIEGO EDUARDO	CUADROS AGUIRRE	88032705	2/02/2026			26	X		Sanitas	AXA COLPATRIA	Porvenir
2	DARLIN YERITZA	MARTINEZ MARTINEZ	1093779650	2/02/2026			26	X		Sanitas	AXA COLPATRIA	Porvenir
3	DANNY SURELLY	PARRA LIZCANO	1094276397	2/02/2026			26	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Colpensiones
4	GIOVANI	MANDON AVENDAÑO	88282209	6/02/2026	28/02/2026		22	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
5	JUAN CARLOS	LAMUS FLOREZ	13499606	7/02/2026	28/02/2026		21	X		Coosalud	AXA COLPATRIA	Porvenir
6	RONALD JUNIOR	MARCANO VIDAL	PPT 6236792	7/02/2026			21	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Proteccion
7	SILFRED	MONTERO SAMPAYO	19773673	10/02/2026			18	X		Sanitas	AXA COLPATRIA	Proteccion
8	ISAIAS	ERNANDEZ HERNANDE	13497841	12/02/2026			16	X		Coosalud	AXA COLPATRIA	Proteccion
9	MARTIN FREDY	ORTIZ COOLMENARES	13505985	12/02/2026			16	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Colpensiones
10	RUBEN DARIO	VILLAN YAÑEZ	13277198	17/02/2026			11	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
11	LUIS FERNANDO	SUAREZ DELGADO	13719287		28/02/2026		28	X		Sanitas	AXA COLPATRIA	Proteccion
12	ANGELA GIOCONDA	JAIMES CORONADO	1096952550		28/02/2026		28	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir
13	LINA MARCELA	LOZADA PIMENTEL	1096249395		28/02/2026		28	X		Nueva EPS	AXA COLPATRIA	Porvenir

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXOS 1. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

ANEXO 2. EMPLEOS GENERADOS DE OBRA

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.: LC731-2025	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: CMA765-2025
CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO DEL CONTRATO

MES No.	**3**	**DESDE:**	1/02/2026
		HASTA:	28/02/2026

No.	CARGO	DIRECTOS	INDIRECTOS
1	DIRECTOR DE OBRA	CUADROS AGUIRRE DIEGO EDUARDO	
2	RESIDENTE DE OBRA	DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ	
3	INSPECTOR HSEQ	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	
4	AYUDANTE	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	
5	AYUDANTE	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	
6	AYUDANTE	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	
7	AYUDANTE	SILFRED MONTERO SAMPAYO	
8	AYUDANTE	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	
9	AYUDANTE	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	
10	AYUDANTE	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	
TOTAL		10	0

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 2. ENTREGA DE DOTACIÓN DE OBRA

Corponor

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	Bbotas	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Cristian	Londoño	06-02-26	01	X	X	X	X	X	X	
2	Juan Carlos	Lopez Florez	09-02-26	X	X	X	X	X	X	X	
3	RONALD	MARCANOV	07-02-26	X	X	X	X	X	X	X	
4	Sil[illegible]	Montero	10-02-26	X	X	X	X	X	X	X	
5	[illegible]	Ortiz	12-02-26	X	X	X	X	X	X	X	
6	ISAIAS	Hernandez	12-02-26	X	X	X	X	X	X	X	
7	Rubén	Darío	17-02-26	X	X	X	X	X	X	X	

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTÁ EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES
2025

Corponor

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Rubén	villan	25/02/26		X		X				Rubén
2	Eyeani	Mendoza	25/02/26		X		X				
3	Ronald	Marcano	25/02/26		X		X				
4	Isaías	Hernandez	25/02/26		X		X				
5	Ariana	Hernandez	25/02/26		X	X	X				Ariana
6	wilmer AP6	torres	25/02/26		X		X				wilmer AP6
7	Junior	Alexander	25/02/26		X	X	X				Junior N.
8	REDYS	Benitez	25/02/26		X		X				REDYS
9	Luis	Garrido	25/02/26		X		X				
10	Samuel	Martinez	25/02/26		X		X				Samuel
11	Yimmel	Mejia Caicedo	25/02/26		X		X				Yimmel Mejia
12	Juan	Hernandez	25/02/26.		X		X				Juan Hernandez

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 3. CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE ENTREGA	CASCO	TAPA BOCAS	GAFAS	GUANTES	BOTAS	PANTALON	CAMISA	FIRMA DEL TRABAJADOR
13	[illegible]	Villota	25/02/26		X			X			
14	Miguel	[illegible]	25/02/26		X			X			
15	Jean carlos	Lorbis Ibarra	25/02/26		X	X		X			
16	[illegible]	[illegible]	25/02/26		X			X			
17	[illegible]	[illegible]	25/02/26		X			X			

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTÁ EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 3. CAPACITACIONES

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	**FORMATO DE REPORTE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS:** Socializar el formato de reporte de actos y condiciones inseguras para promover su correcto uso y prevenir accidentes y riesgos laborales.
FECHA DE REALIZACIÓN:	Jueves, 5 de febrero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Ismael Mejia	Mejia cejudo	88001.405	Ismael Mejia
2	Luis Carlos	Carras	1090175835	Luis Carlos
3	FREDDY Villaba	Villaba	13572744	FREDDY
4	Wilmer Alexander	Torres Garido	1092342880	Wilmer ATG
5	Samuel	Martinez	7143344	Samuel
6	Luis	Garido	5330617	
7	Miguel	Diaz	1090765600	
8	Junior Alexander	Useche	1092386993	Junior
9	Juan Manuel	Fernandez	1005066478	Juan Fernandez
10	FREDDY	Benitez	1090174911	FREDDY Benitez
11	Alan Jenny	Lopez	1090177446	Alan Lopez
12	Ariana Hernandez	Hernandez	1090461423	Ariana H
13				
14				
15				
16				
17				

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA795-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	**CAPACITACION EN IDENTIFICACION PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGO:** Capacitar a todos los trabajadores, en los conceptos y eventos que se puedan presentar relacionados con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos incluyendo el personal contratista y visitantes siendo el caso.
FECHA DE REALIZACIÓN:	lunes, 2 de febrero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	Samuel	Martinez	7143344	Samuel
2	Luis	Garido	533061[illegible]	
3	Miguel	Diaz	1090176560	
4	Junior	Useche	1092386993	
5	Juan Manuel	Fernandez	1005066478	Juan Fernandez
6	Hedds	Benitez	1090174911	Hedds Benitez
7	Ismael	Mesia caiced	8800[illegible]405	Ismael Mesia
8	Luis Carlos	Cañas P	1090175835	
9	Wilmer Alexande	Torres Galindo	1092342880	
10	FREDDY Villaba	Villaba	13572744	
11	Alan Lopez	Lopez	1090[illegible]446	Alan Lopez
12	Ariana Hernandez	Hernandez	1090461423	
13				
14				
15				
16				
17				

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA755-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	**Uso de Señalización y Control del Tránsito en actividades a nivel de vía.:** Formar al personal en el correcto uso de señales preventivas, colombinas, conos, barreras y elementos reflectivos, garantizando la protección de los trabajadores y de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades.
FECHA DE REALIZACIÓN:	miércoles, 11 de febrero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	[illegible]	[illegible]	6236792	
2	[illegible]	[illegible]	1973673	
3	[illegible]	Villaba	13272744	
4	[illegible]	[illegible]	13499.606	
5	[illegible]	[illegible]	88282209	
6	[illegible]	[illegible]	1090175885	
7	[illegible]	[illegible]	5320618	
8	[illegible]	[illegible]	1092342880	
9	[illegible]	[illegible]	1092386993	
10	[illegible]	[illegible]	7143344	
11	[illegible]	[illegible]	1090[illegible]78	
12	[illegible]	[illegible]	1093[illegible]412	
13	[illegible]	[illegible]	1090[illegible]423	
14	[illegible]	[illegible]	1090176560	
15	[illegible]	[illegible]	88[illegible].405	
16	[illegible]	[illegible]	1090177446	
17	[illegible]	[illegible]	1090174911	

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O
PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

Corponor

ANEXO 4. CAPACITACIÓN O CHARLAS EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
OBJETO DE LA CAPACITACIÓN	PREVENCIÓN RIESGO BIOLÓGICO: Sensibilizar al personal sobre los riesgos asociados a la posible presencia de insectos, ofidios, roedores y material punzante y cortante en tierra y vegetación así como las medidas de prevención, actuación y uso de EPP.
FECHA DE REALIZACIÓN:	miércoles, 25 de febrero de 2026

No.	Nombre	Apellido	Cédula	Firma
1	RONALD J	MARCANOV	14.222.040	
2	ISAIAS	Hernandez H.	13497841	
3	Ruben Dario	VILLADA	13279199	
4	Eyvani Mendoza	Mendoza	88282209	
5	Ariana Hernandez	Hernandez	1090461423	
6	Wilmer Alexander	torres	1092342880	
7	Junior Usodne	Alexander	1092386993	
8	[illegible]	Benitez	1090174911	
9	Luis	Barrido	5330616	
10	Samuel	Martinez	71433414	
11	Asmed	Mejia Caicedo	88001.405	
12	Juan	Hernandez	1005066478	
13	[illegible]	Villabo	[illegible]	
14	Miguel	Diaz	1090476560	
15	Juan Carlos Lamos Fl	Lamos Florez	13499606	
16	[illegible]	Ortiz Echeverri	13505985	
17	[illegible]	Montero	19773673	
18	Alan Kenny	Lopez	1090177446	
19				
20				
21				
22				

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O

PERSONA ENCARGADA

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		06	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Giovanni Mondon Avendaño	N° de Identificación	5752822 09
Cargo	AYUDANTE DE OBRA		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	✓			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	✓			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	✓			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	✓			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
OBJETIVOS DEL SG-SST	✓			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	✓			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	✓			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	✓			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	✓			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓			
RESPONSABILIDADES EN SST	✓			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL	✓			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Giovanni Mondon

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL									
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION								
Dia	06	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración		01:00 hora	
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado			
Participante	Giovani Manchon Avendaño			Documento	9828229	Cargo	Ayudante		

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   X. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   X. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   X. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   X. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Axa Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Giovani Manchon

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		07	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Juan Carlos Lanos Flores	N° de Identificación	13'199.606
Cargo	Ayudante Obras		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	✓			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	✓			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	✓			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	✓			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
OBJETIVOS DEL SG-SST	✓			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	✓			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	✓			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	✓			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	✓			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓			
RESPONSABILIDADES EN SST	✓			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	✓			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Juan Carlos Lanos Flores

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL								
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION							
Dia	07	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración	0050: 40 minutos	
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado		Reprobado		
Participante	Juan Carlos Lemus Florez			Documento	13999606	Cargo	Ayudante	

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   X Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   X A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   X Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   X La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado ARL colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Juan Carlos Lemus Florez

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
UT Corredores Verdes 2025		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		07	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	N° de Identificación	6236792
Cargo	Ayudante de Obra		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECIFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS		✓		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		✓		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		✓		
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		✓		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		✓		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
OBJETIVOS DEL SG-SST		✓		
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL		✓		
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		✓		
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO		✓		
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL		✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		✓		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL		✓		
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		✓		
RESPONSABILIDADES EN SST		✓		
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.		✓		
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO			✓	
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	RONALD

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Día	02	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración	00:050:00 minutos
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	Ronald Junior H			Documento	PPT623692	Cargo	Ayudante

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   ☒. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   ☒. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   ☒. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   ☒. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado
   Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Ronald

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		10	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Silfredo Mateo S	N° de Identificación	1977367 3
Cargo	Ayudante Jardinero		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS		✓		
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		✓		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		✓		
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		✓		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		✓		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
OBJETIVOS DEL SG-SST		✓		
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL		✓		
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		✓		
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO		✓		
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL		✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		✓		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL		✓		
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		✓		
RESPONSABILIDADES EN SST		✓		
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.		✓		
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE		✓		
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO		✓		
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS		✓		
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA		✓		

contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Silfredo Mateo S.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Dia	10	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración	01:00 hora
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	Silfred Mateus F.			Documento	1193637	Cargo	Ayudante J.

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   X. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   X. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   X. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   X. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado
   ARL Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Silfred Mateus F.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de Inducción		
Inducción	X	Reinducción		12	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Martin Frady Castro	N° de Identificación	13505985.
Cargo	Aguadank Obra		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	✓			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	✓			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	✓			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	✓			
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
OBJETIVOS DEL SG-SST	✓			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	✓			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL		✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		✓		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL		✓		
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		✓		
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓			
RESPONSABILIDADES EN SST	✓			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	✓	✓		
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE		✓		
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO		✓		
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Martin Frady Castro

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Dia	02	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración	01:00hora
Evaluador	Danny Sorelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	Martin Fredy Ortiz Colmenares			Documento	1350985	Cargo	Ayudante Obra

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Ala Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Martin Fredy Ortiz Colmenares

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de inducción		
Inducción	X	Reinducción		12	02	2026

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Isaias Alvarado Hernandez	N° de Identificación	13 497841
Cargo	ayudante de juridica		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	✓			
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	✓			
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO	✓			
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES	✓			
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
OBJETIVOS DEL SG-SST	✓			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	✓			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	✓			
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	✓			
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	✓			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓			
RESPONSABILIDADES EN SST	✓			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	✓			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓			
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL							
Evento	INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN SG-SST / EVALUACION						
Dia	12	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración	01:00 hora
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado	
Participante	Isaias Hernandez H.			Documento	1349181	Cargo	Aplante

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado
   ARL Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

				Fecha de Inducción		
Inducción	X	Reinducción		17	02	2026.

DATOS DEL TRABAJADOR			
Nombre Completo	Ruben Villan	N° de Identificación	1327198
Cargo	Ayudante obra		

Marque con X según considere en calificación, respecto a la información suministrada.

E	Excelente	La información fue completa y detallada.
B	Bueno	La información fue suficiente.
R	Regular	La información fue muy general e incompleta.
N	Nulo	No obtuve ninguna información al respecto.

INDUCCIÓN ESPECÍFICA EN:	Lineamientos Generales de la empresa y específicos de Talento Humano

TEMAS TRATADOS	E	B	R	N
RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
ASPECTOS CONTRACTUALES | JORNADA LABORAL | HORARIOS	✓			
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO		✓		
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		✓		
FALTAS | SANCIONES | RÉGIMEN DISCIPLINARIO		✓		
CARGO | FUNCIONES | RESPONSABILIDADES		✓		
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
OBJETIVOS DEL SG-SST	✓			
POLÍTICA DE CONVIVENCIA Y ACOSO LABORAL	✓			
POLÍTICA DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	✓			
POLÍTICA DE ORDEN Y ASEO	✓			
POLÍTICA PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL	✓	✓		
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS		✓		
POLÍTICA DE DESCONEXIÓN LABORAL	✓			
VIGIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	✓			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	✓			
RESPONSABILIDADES EN SST	✓			
CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGO, PELIGRO, INCIDENTE LABORAL, ACCIDENTE LABORAL Y ENFERMEDAD LABORAL.	✓			
QUE HACER EN CASO EN DE ACCIDENTE	✓			
PELIGROS Y RIESGOS PRESENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO	✓	✓		
REPORTE DE ACCIDENTES, INCIDENTES, ACTOS INSEGUROS Y CONDICIONES INSEGURAS	✓			
PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA Y BRIGADA DE EMERGENCIA	✓			

Responsable de Ejecución	
Nombre	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
Cargo	INSPECTOR HSEQ
FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Al firmar la presente acta el trabajador declara, reconoce y afirma que he recibido de manera completa y ha satisfacción la inducción o Reinducción a la empresa en cada uno de los temas que se relacionan y especifican en el presente documento. Así mismo reconoce, afirma y asume el compromiso en el cumplimiento de cada una de las Normas, Directrices, Procedimientos, Lineamientos y demás aspectos expuestos y relacionados a cada tema; los cuales a partir de este momento asumo como conocidos. De igual forma entiende y se da por informado que el hecho de violar u omitir cualquier Norma, Directriz, Procedimiento, Lineamiento o cualquier aspecto o tema del cual ya fue capacitado, se considera una falta, la cual podría acarrear una sanción u otro según lo considere y/o estime el régimen disciplinario contenido dentro del reglamento interno de trabajo.

Confirmación de Recibido por el Trabajador	
FIRMA	Ruben

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-AC-02
		Versión: 01
	ACTA DE INDUCCION EN SG-SST	Fecha: 02-12-2025

INFORMACIÓN GENERAL								
Evento	INDUCCIÒN Y/O REINDUCCIÒN SG-SST / EVALUACION							
Dia	07	Mes	02	Año	2026	Tiempo de duración		01:00 Hora
Evaluador	Danny Surelly Parra Lizcano			Aprobado	✓	Reprobado		
Participante	Ruben David Ulian Yañez			Documento	1327795	Cargo		Ayudante obra

1. ¿Los accidentes de trabajo son sucesos que?

   A. Porque siempre son planeados y ocurren únicamente por descuido del trabajador.
   B. Porque son situaciones normales que deben aceptarse como parte de la rutina laboral.
   C. Son repentinos y que se dan por causa o con ocasión del trabajo.

2. ¿En caso de accidente de trabajo debo informar a?
   A. Jefe Inmediato.
   B. Únicamente a mis compañeros de turno para que estén enterados.
   C. Alguno de los clientes.

3. ¿Qué es el peligro?
   A. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores.
   B. Un accidente que siempre ocurre en el trabajo y que no puede evitarse.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

4. ¿Qué es el riesgo?
   A. La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.
   B. aquellos que es un accidente de trabajo.
   C. Probabilidad de que ocurra algo que cause daño.

5. A que administradora de riesgos laborales (ARL) se encuentra afiliado Arg Colpatria

Observaciones y/o Recomendaciones para próximos eventos
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Firma del Trabajador Ruben

ANEXO 4. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

ANEXO 5. FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUIN Y CAMILLA EN PÚBLICAS

Corponor

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
FECHA DE INSPECCIÓN	19 de febrero de 2026.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	ESTADO		FECHA DE VECIMIENTO	OBSERVACIONES
		BUENO	NO TIENE		
ALCOHOL	1	✓		Nov 2029	
ALGODÓN (PAQUETE)	1	✓		Nov 2028	
ISODINE ESPUMA (FRASCO)	1	✓		Abr 2026	
ISODINE SOLUCION (FRASCO)	1	✓		Nov 2026	
GASA ESTERIL (PAQUETES PRECORTADA)	1	✓		May 2028	
CURITAS	1	✓		Jul. 2026	
AGUA OXIGENADA	1	✓		Ene. 2029	
VENDAS	1	✓		Ene 2029	
TIJERAS	1	✓		N/A	
SUERO ORAL (SOBRES)	1	✓		Jul 2026	
MICROPORE	1	✓		Abr 2026	
ESPARADRAPO	1	✓		Dic 2029	
TOALLAS HIGIENICAS	1	✓		N/A	
LINTERNA PEQUEÑA	1	✓		N/A	
BAJA LENGUAS	1	✓		Abr 2029	
GUANTES EN LATEX (PARES)	1	✓		Jul. 2026	
JERINGA	1	✓		N/A	
TAPABOCAS DESECHABLES	1	✓		Nov 2029	
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTOS DE LA CAMILLA	CANTIDAD RECOMENDADA (UND)	ESTADO		FECHA DE VECIMIENTO	OBSERVACIONES
		BUENO	NO TIENE		
SEÑALIZACIÓN	1	✓		N/A	—
ESTADO DE LA LONA	1	✓		N/A	—
CORREAS DE SEGURIDAD	1	✓		N/A	—
SUJTADORES PARA CARGUE	1	✓		N/A	—
CRUCETAS DE SEGURIDAD	1	✓		N/A	—
SOPORTE DE DESCANSO	1		N/A	N/A	—
JUEGO DE INMOVILIZADORES DE MIEBRO INFERIOR Y SUPERIOR	PARES	✓		N/A	—

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 5. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Corponor

ANEXO 6. FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

TIPO DE EXTINTOR: Multipropósito.			A	X	B	X	C	X	D
FECHA DE INSPECCIÓN:	24/02/2026		FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR:				Diciembre 2026.		

No.	ESTADO DEL EXTINTOR	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1.	MANOMETRO	✓			
2.	PASADOR DE SEGURIDAD	✓			
3.	MANGUERA	✓			
4.	BOQUILLA	✓			
5.	MANIJA	✓			
6.	CILINDRO	✓			
7.	PINTURA	✓			
8.	SEÑALIZACIÓN	✓			
9.	ACCESO Y VISIBILIDAD	✓			

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 6. INSPECCIÓN DE VOLQUETAS

Corponor

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	Daewoo	PLACA:	TPJ 324	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	September 2026	SEGURO	20 August 2026

FECHA DE INSPECCIÓN:																
ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR	X		X		X									
	LLANTAS	X		X		X									
	GATO HIDRAULICO	X		X		X									
	ESTRUCTURA PLATON	X		X		X									
	TERMINALES DE DIRECCION	X		X		X									
	MUELLES	X		X		X									
	TRANSMISION Y CAJA	X		X		X									
	ESTRUCTURA CABINA	X		X		X									
	FRENOS	X		X		X									
	LUCES	X		X		X									
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR	X		X		X									
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS	X		X		X									
	FUGAS TRANSMISION	X		X		X									
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	X		X		X									
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	X		X		X									
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	X		X		X									
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO	X		X		X									
	FRENO MOTOR	X		X		X									
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO	X		X		X									
	EXTINTOR	X		X		X									
	CINTURON DE SEGURIDAD	X		X		X									
	BOTIQUIN	X		X		X									

OBSERVACIONES:			
OPERADOR RESPONSABLE:	Sandos Bautista	FIRMA	Sandos Bautista
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

Cerponor

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	Kenworth	PLACA:	UBA079	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	26/10/2016	SEGURO	03/11/2026

FECHA DE INSPECCIÓN:

ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR	✓															
	LLANTAS	✓															
	GATO HIDRAULICO	✓															
	ESTRUCTURA PLATON	✓															
	TERMINALES DE DIRECCION	✓															
	MUELLES	✓															
	TRANSMISION Y CAJA	✓															
	ESTRUCTURA CABINA	✓															
	FRENOS	✓															
	LUCES	✓															
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR	✓															
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓															
	FUGAS TRANSMISION	✓															
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓															
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓															
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓															
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO	✓															
	FRENO MOTOR	✓															
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓															
	EXTINTOR	✓															
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓															
	BOTIQUIN	✓															

OBSERVACIONES:

OPERADOR RESPONSABLE:	Victor Julio Saenz	FIRMA	Victor Julio Saenz
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

Carponor

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	Foerphkner	PLACA:	WFJ530	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	05/12/2026	SEGURO	19/09/26

FECHA DE INSPECCIÓN:

ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR	✓		✓		✓									
	LLANTAS	✓		✓		✓									
	GATO HIDRAULICO	✓		✓		✓									
	ESTRUCTURA PLATON	✓		✓		✓									
	TERMINALES DE DIRECCION	✓		✓		✓									
	MUELLES	✓		✓		✓									
	TRANSMISION Y CAJA	✓		✓		✓									
	ESTRUCTURA CABINA	✓		✓		✓									
	FRENOS	✓		✓		✓									
	LUCES	✓		✓		✓									
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR	✓		✓		✓									
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓									
	FUGAS TRANSMISION	✓		✓		✓									
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓		✓		✓									
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓		✓		✓									
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓		✓		✓									
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO	✓		✓		✓									
	FRENO MOTOR	✓		✓		✓									
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓									
	EXTINTOR	✓		✓		✓									
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓									
	BOTIQUIN	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:			
OPERADOR RESPONSABLE:	Jaime Rodriguez James	FIRMA	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

Corponor

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	Dodge	PLACA:	GHV826	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	30/Nov/2026	SEGURO	02/10/2026

FECHA DE INSPECCIÓN:																	
ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO			
ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)	ASEO EXTERIOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	GATO HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRUCTURA PLATON	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TERMINALES DE DIRECCION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	MUELLES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	TRANSMISION Y CAJA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	ESTRUCTURA CABINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	LUCES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CHEQUEO EN MAQUINA	FUGAS EN MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUGAS TRANSMISION	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CHEQUEO EN CABINA	INDICADORES EN TABLERO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	FRENO MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	EXTINTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	BOTIQUIN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES:			
OPERADOR RESPONSABLE:	Rafael Morales	FIRMA	Rafael Morales
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	DANNY SURELLY PARRA UZCANO	FIRMA	Danny Surelly Parra Uzcano

ANEXO 8. FORMATO INSPECCIÓN DE VOLQUETAS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

Corpenor

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

MARCA EQUIPO:	Daewoo	PLACA:	EWD672	CERTIFICADO DE GASES Y REVISIÓN TECNICO MECANICA	17 Julio de 2026	SEGURO	25 Junio de 2026

FECHA DE INSPECCIÓN:

		ESTADO	BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO		BUEN ESTADO	
ITEM		DESCRIPCION	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CHEQUEO ESTRUCTURAL (Marcar con una X la opción correcta)		ASEO EXTERIOR	✓		✓		✓									
		LLANTAS	✓		✓		✓									
		GATO HIDRAULICO	✓		✓		✓									
		ESTRUCTURA PLATON	✓		✓		✓									
		TERMINALES DE DIRECCION	✓		✓		✓									
		MUELLES	✓		✓		✓									
		TRANSMISION Y CAJA	✓		✓		✓									
		ESTRUCTURA CABINA	✓		✓		✓									
		FRENOS	✓		✓		✓									
		LUCES	✓		✓		✓									
CHEQUEO EN MAQUINA		FUGAS EN MOTOR	✓		✓		✓									
		FUGAS CAJA DE CAMBIOS	✓		✓		✓									
		FUGAS TRANSMISION	✓		✓		✓									
		FUGAS SISTEMA ENFRIAMIENTO	✓		✓		✓									
		FUGAS SISTEMA AIRE FRENOS	✓		✓		✓									
		FUGAS SISTEMA HIDRAULICO	✓		✓		✓									
CHEQUEO EN CABINA		INDICADORES EN TABLERO	✓		✓		✓									
		FRENO MOTOR	✓		✓		✓									
		PITO Y ALARMA DE RETROCESO	✓		✓		✓									
		EXTINTOR	✓		✓		✓									
		CINTURON DE SEGURIDAD	✓		✓		✓									
		BOTIQUIN	✓		✓		✓									

OBSERVACIONES:			
OPERADOR RESPONSABLE:	Jose Luis Ramiro.	FIRMA	Jose Luis
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO	FIRMA	Danny Surelly Parra Lizcano

ANEXO 7. INSPECCIÓN DE MÁQUINAS PESADAS Y EQUIPOS LIGEROS

Corponor

ANEXO 9. FORMATO INSPECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS LIGEROS EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

No.	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO		FECHA DE INSPECCIÓN	OBSERVACIONES
			M	E		
1.	Planta Electrica	Elektric		X	2/febrero/2026	Planta electrica a gasolina
2.	Martillo de demolicion	Einhell		X	2/febrero/2026	Martillo TE-DH 50 Einhell

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PERSONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 8. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

ANEXO 10. FORMATO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

MPA-01-F-28, versión 3, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No./NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	LC731-2025 UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No./NOMBRE CONTRATISTA DE INTERVETORIA:	CMA765-2025 UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
FECHA DE INSPECCIÓN	26 de febrero de 2026.

No.	PARAMETROS A REVISAR	SI	NO	NA
1	Hay señales informativas y preventivas en la obra.	✓		
2	Hay carteles que recuerden la importancia de utilizar los EPP en la obra.	✓		
3	Hay carteles que induzcan a mantener las áreas de trabajo ordenadas y limpias.	✓		
4	Hay señales de prohibido fumar en la obra.	✓		
5	Estan demarcadas las zonas donde se encuentran el extintor dentro de la obra.			X
6	Estan demarcadas las zonas donde se encuentra la camilla dentro de la obra.			X
7	Estn demarcadas la zona donde se encuentra el punto ecologico dentro de la obra.			X
8	Están demarcadas las áreas de trabajo.			X
9	Hay señales en las áreas de almacenamiento donde hay sustancias, grasas, aceiles o productos inflamables dentro de la obra.			X
10	Hay señales preventivas en las zonas de alto riesgo dentro de la obra.			X
11	Hay señales de información para el personal que ingresa o es ajeno a la obra	✓		
12	Hay señales de entrada y salida de vehiculo pesado.	✓		
13	Hay señales de inicio y fin de la obra.	✓		

OBSERVACIONES: Se mantiene señalizado el frente en que se desarrollan las actividades brindando la información preventiva

Danny Surelly Parra Lizcano

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Y/O PESONA ENCARGADA
UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

ANEXO 9. MATRIZ DE PELIROS Y RIESGOS IPEVR

UT Comederos Verdes 2025	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	SST-MT-01
		Versión:	1
	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	Fecha:	20/08/2025

ACTUALIZACIONES		
FEHA	QUIEN REALIZA LA ACTUALIUZACION	DESCRIPCION
2/12/2025	COORDINADOR SST	**Creación de matriz**
4/12/2025	COORDINADOR SST	**Actualziación de matriz**

| | | |

				Golpes, contuciones, caidas, fracturas, traumas	Actividades desarrolladas cerca a carreteras con transito vehicular	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Accidentes de transito)				2	2	4	B	10	40	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitacion prevención de riesgos viales	**GERENCIA / CORDINADORA SST**
				Golpe, traumas, machucones, fracturas, laseracion, amputaciones	Manejo de maquinas ligerias y equipos livianos	CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecanico)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		señalizacion alusiva a la prevención del riesgo CA: Realizar inspecciones a maquinas y equipos	**GERENCIA / CORDINADORA SST**
				Golpe, traumas, fracturas, laseracion, amputaciones	Exposicion al desarrollo de actividades cerca de peatones	CONDICIONES DE SEGURIDAD (publico)				2	2	4	B	25	100	III	Mejorable	6				X		CA: Capacitacion prevención de riesgos publicos	**GERENCIA / CORDINADORA SST**

ANEXO 10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANEXO 11. PLAN DE SEÑALIZACIÓN

UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

NIT 902018300

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS

SAN JOSE DE CUCUTA

DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
2.1. OBJETIVO GENERAL 6
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3. MARCO LEGAL 7
4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 8
4.1. Generalidades 8
4.3. SEÑALES DE SEGURIDAD 10
4.4. COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN) 15
4.5. BALIZAMIENTO 16
4.6. SEÑALIZACION VIAL 16
5.5. IDENTIFICACION DE TUBERÍAS 22

TABLA DE CONTENIDO (TABLAS)

Tabla 1 MARCO LEGAL SOBRE SEÑALIZACIÓN 7
Tabla 2 SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 10
Tabla 3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 11
Tabla 4 SEÑALES DE OBLIGACIÓN 11
Tabla 5 SEÑALES DE PREVENCIÓN 12
Tabla 6 SEÑALES DE INFORMACIÓN 13
Tabla 7 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 13
Tabla 8 DIMENSIONES Y MATERIALES 14
Tabla 9 CÓDIGO DE COLORES 15
Tabla 10 SEÑALIZACIÓN VIAL 17
Tabla 11 COLORES DE CONTRASTE 18
Tabla 12 FORMA GEOMÉTRICA, COLOR Y SIGNIFICADO 19
Tabla 13 TAMAÑO DE LAS SEÑALES Y DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN SEGÚN SU FORMA 20
Tabla 14 COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS 23

0. PRESENTACION DE LA EMPRESA:

Empresa	**UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025**
Nit:	NIT. 900.069.751-5
Actividad Económica	SERVICIO DE APOYO A LA SILVICULTURA
Gerente	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
Dirección	MZ 41 Lote 3 Barrio Claret – SAN JOSE DE CUCUTA
Teléfonos	3022726357
Correo electrónico	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las estrategias de prevención de accidentes a nivel colectivo y que se utiliza cuando los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el diseño de los procesos productivos o cuando se quiere enfatizar en algunos controles, ocupa un lugar destacado la señalización y demarcación, que brinda la posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales.

Por este motivo, UT CORREDORES VERDES 2025**.** consciente de su compromiso de velar por la seguridad y bienestar integral de su población trabajadora y de la comunidad (visitantes, clientes y proveedores), ha realizado esta guía metodológica para el diseño e implementación de medidas básicas de prevención de riesgos, dando cumplimiento a las normas nacionales e internacionales existentes sobre señalización y demarcación, y así facilitar la identificación de áreas o zonas de riesgo, contribuyendo de esta manera a la prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional.

La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna, ayuda a prevenir los diferentes factores de riesgo ocupacionales, a realizar los trabajos en forma segura e indica óptima organización empresarial. Sin embargo, es importante recordar que la existencia de la misma no elimina el riesgo, ni la responsabilidad de realizar inspecciones periódicas de seguridad de acuerdo a lo establecido en los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UT CORREDORES VERDES 2025.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar la señalización y demarcación, dando cumplimiento a la resolución 2400 del 22 de mayo de 1979, por medio de la definición clara de necesidades que permitan la delimitación e identificación de áreas o zonas de posibles riesgos, encaminando las intervenciones a la disminución de la potencialidad de ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dar a conocer a la empresa herramientas que permitan facilitar la identificación de necesidades de señalización y demarcación por medio de un completo reconocimiento de los procesos productivos.
- A partir de las necesidades identificadas, proponer la implementación de la señalización y demarcación de áreas, zonas de trabajo y/o vías de circulación, dando a conocer a forma y los colores y símbolos utilizados y recomendados para la prevención de accidentes de trabajo.
- Identificar las necesidades de señalización y demarcación de acuerdo a los riesgos de exposición en las diferentes áreas de trabajo.

3. MARCO LEGAL

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos de producción que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora.

En la tabla 1 se presenta un resumen de la normatividad sobre señalización y demarcación.

Tabla 1 MARCO LEGAL SOBRE SEÑALIZACIÓN

NORMAS LEGALES	DISPOSICIÓN
Resolución 1016 de 1989. Artículo 11 (Numeral 17).	Entre las principales actividades de Higiene y Seguridad Industrial se encuentra: "Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes".
Res. 2400 de 1979 **Título V. Artículo 202. Código de colores.**	"En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomendados por la **AMERICAN STANDARS ASSOCIATION (A.S.A)** y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc., y demás elementos específicos que determinen o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales".

Teniendo en cuenta lo anterior y otra reglamentación vigente, se pueden definir las siguientes responsabilidades del empleador frente a la señalización y demarcación:

- Establecer las medidas necesarias para asegurar que las señales y la aplicación del color para propósitos de seguridad e higiene.
- Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización indicados en el apartado anterior.
- Ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitar que sean obstruidas.

Así mismo, los trabajadores deben comprometerse a:

- Participar en las actividades de formación
- Respetar y aplicar las instrucciones de los elementos de señalización y demarcación establecidos por el empleador.

4. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

4.1. Generalidades

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- Atraer la atención de quien la observa
- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
- Informar sobre la conducta a seguir
- Ser clara y de interpretación única
- Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidas de control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto

preventivo; la utilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarla sólo en los siguientes casos:

- Cuando no es posible eliminar el riesgo
- Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)
- Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección
- Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos de seguridad y protección personal.

4.2. CLASES DE SEÑALIZACIÓN

La señalización, empleada como técnica de seguridad, se puede clasificar en función del sentido por el cual se percibe:

Señalización óptica: Es el sistema de señalización que se basa en la apreciación de las formas y los colores por medio del sentido de la vista. Incluye:

- Señales de seguridad
- Colores de señalización
- Iluminación de emergencia

Señalización acústica: Se basa principalmente en la emisión de ondas sonoras que son recibidas por el oído en forma instantánea (alarmas, timbres, altavoces, etc.) y que, de acuerdo a códigos conocidos, informa de un determinado mensaje a las personas. Se usa principalmente para dar a conocer diferentes tipos de alerta en la empresa, en casos de emergencia.

Señalización Olfativa: Utiliza las propiedades odorantes que poseen ciertos productos para estimular las neuronas olfativas, a fin de combinarlos con otros productos determinados y poderlos detectar. Por eje
mplo al gas natural inoloro se le agrega un producto oloroso con el fin de ser detectado en caso de fuga.

Señalización Táctil: Se basa en las diferentes sensaciones experimentadas cuando se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Aunque en general no está contemplada en la legislación, debido a su importancia se contempla en el diseño de los órganos de mando, herramientas y objetos manuales.

4.3. SEÑALES DE SEGURIDAD

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información que se quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más ampliamente usado. Según su significado, las señales se clasifican en:

- **DE PROHIBICION**: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
- **DE OBLIGACION:** Obligan a un comportamiento determinado.
- **DE PREVENCION:** Advierten de un peligro.
- **DE INFORMACION:** Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilios o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.

Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461. Su significado se relaciona en la tabla 2.

Tabla 2 SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

Color	Significado	Ejemplos de aplicación
ROJO	Prohibición Lucha contra incendios	Señales de prohibición Equipos contra incendio: Señalización, localización
AZUL *	Obligación	Uso obligatorio de elementos de protección personal
AMARILLO	Precaución Zona de riesgo	Señalización de riesgos Señalización de umbrales, pasillos de poca altura, obstáculos, etc.
VERDE	Condición de seguridad Primeros auxilios	Señalización de vías y salidas de emergencia Duchas de emergencia Puestos de primeros auxilios

* El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular

En las tablas 3, 4, 5, 6, y 7 se dan algunos ejemplos de las señales más comúnmente empleadas.

Tabla 3 SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Indicación	Contenido de imagen del símbolo	Símbolo
Prohibido fumar	Cigarrillo encendido	
Prohibido el paso	Silueta humana caminando	
Prohibido usar agua como agente extintor	Agua cayendo sobre el fuego	

Tabla 4 SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Indicación	Contenido de imagen del símbolo	Símbolo
Uso obligatorio de casco	Cabeza portando casco	
Uso obligatorio de protección auditiva	Cabeza llevando elementos de protección auditiva	
Uso obligatorio de protección ocular	Cabeza llevando anteojos de seguridad	

Uso obligatorio de calzado de seguridad	Un zapato de seguridad	
Uso obligatorio de guantes de seguridad	Un par de guantes	

Tabla 5 SEÑALES DE PREVENCIÓN

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**
Prevención general, precaución, riesgo de daño	Signo de admiración	
Precaución riesgo de intoxicación	Calavera y huesos cruzados	
Precaución, riesgo de incendio	Llama	
Precaución, riesgo de corrosión	Líquido goteando sobre una mano y una barra	
Precaución materiales oxidantes y comburentes	Corona circular con una flama	

Precaución, riesgo de explosión	Bomba estallando	
Precaución, riesgo de choque eléctrico	Flecha cortada en posición vertical hacia abajo	

Tabla 6 SEÑALES DE INFORMACIÓN

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**
Ubicación de extintor	Silueta de un extintor con flecha direccional	
Ubicación de salida de emergencia	Silueta humana avanzando hacia una salida de emergencia indicando con flecha direccional el sentido requerido	
Ubicación de estaciones y botiquín de primeros auxilios	Cruz y flecha direccional	
Ubicación de áreas y oficinas administrativas	Texto indicativo del nombre de la dependencia y número de oficina	

Tabla 7 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Indicación	**Contenido de imagen del símbolo**	**Símbolo**

Ubicación de Líquido Inflamable	Flama sobre barra horizontal	
Ubicación sustancias corrosivas	Líquido goteando sobre una mano y una barra	
Ubicación Gas Inflamable	Flama sobre barra horizontal	
Ubicación sólido Inflamable	Flama sobre barra horizontal. Barras rojas y blancas verticales	

La señalización para identificación de productos químicos se utilizará para indicar las zonas de almacenamiento. Aeronáutica Civil no rotulara cada uno de los contenedores o envases del producto químico, ya que esa responsabilidad corresponde al proveedor del producto.

Tabla 8 DIMENSIONES Y MATERIALES

DIMENSIONES (cm)		MATERIAL	
CUADRADA*	RECTANGULAR*	USO INTERIOR	USO EXTERIOR
22 X 22	20 X 40	Polietileno (calibre 40 o 1 mm)	Hojalata (Electrolítica calibre 0.18) Ó Polietileno (calibre 40 o 1 mm)

*La forma de la señal a utilizar se podrá elegir según las necesidades específicas de visualización y ubicación.

Para las áreas de almacenamiento de productos químicos se utilizará la forma de cuadrado teniendo en cuenta las características anotadas en la **tabla 7**

4.4. COLORES DE SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN)

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 2), la Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la **tabla 9.**

Tabla 9 CÓDIGO DE COLORES

Color	Significado	Ejemplos
ROJO	Señala elementos y equipos de protección contra el fuego, recipientes comunes y de seguridad para el almacenamiento de toda clase de líquidos inflamables, mecanismos de parada	Hidrantes y tubería de alimentación de los mismos, cajas para mangueras, paradas de emergencia
AMARILLO	Señala áreas o zonas de trabajo, almacenamiento, áreas libres frente a equipos de incendios, puertas bajas, vigas, grúas de taller y equipos utilizados para transporte y movilización de materiales, etc.	áreas de maquinaria, Plantas de energía eléctrica , objetos sobresalientes, riesgos de caída.
NARANJA	Señala partes peligrosas de maquinaria, que puedan cortar, golpear, prensar, etc.	Bordes, expuestos de piñones, engranajes, poleas, rodillos, mecanismos de corte, entre otras.
BLANCO	Demarcación de zonas de circulación, indicación en el piso de recipientes de basura	Dirección o sentido de una circulación o vía.
ALUMINIO	Señala superficies metálicas expuestas a radiación solar y altas temperaturas	Cilindros de gas propano, tapas de hornos

GRIS	Señala recipientes para basuras, armarios y soportes para elementos de aseo.	Retales, desperdicios, lockers.
MARFIL	Partes móviles de maquinaria, bordes del área |de operación en maquinaria	Volantes de operación manual, brazos de palanca; marcos de tableros y carteleras
PURPURA	Señala los riesgos de radiación	Recipientes que contengan materiales radiactivos, equipo contaminado, rayos X, etc.
AZUL	Obligación Indicaciones	Uso obligatorio de elementos de protección personal. Localización de teléfono, talleres, etc.

4.5. **BALIZAMIENTO**

Consiste en la delimitación de una zona de trabajo para evitar el paso de personal. Esto puede efectuarse por varios métodos, como los siguientes:

- Banderolas, banderas o estandartes, generalmente en plástico e impresas con pintura reflectante. Deben tener el color de seguridad correspondiente a lo que se quiere indicar, con figuras o leyendas en el color de contraste.
- Barandillas o barreras: Estructuras apoyadas sobre el piso, a las que van unidos elementos horizontales que impiden el paso. Normalmente van pintadas en amarillo y negro.
- Cintas de delimitación: Son cintas plásticas que se colocan sobre varas o elementos clavados en el suelo para delimitar una zona.
- Luces: Consiste en la delimitación de áreas mediante un circuito de lámparas fijas o intermitentes.

4.6. **SEÑALIZACION VIAL**

Corresponde a los dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta como deben circular los usuarios de las calles o carreteras. Los mensajes de las señales de tránsito se dan por medio de símbolos y/o leyendas de fácil y rápida interpretación.

Su función es indicar al usuario de las vías las precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones en los tramos de circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la vía. Sirven para:

- ✓ Advertir la existencia de posibles peligros;
- ✓ Dar a conocer determinadas restricciones;
- ✓ Indicar en forma concisa ciertas disposiciones legales;
- ✓ Determinar el derecho de paso de los vehículos y el sentido de las vías; y
- ✓ Ayudar a los peatones para atravesar las vías.

Las señales de tránsito deben ser refractivas o estar convenientemente iluminadas, para garantizar su visibilidad en las horas de oscuridad. La reflectividad puede lograrse cubriendo las señales con pinturas o materiales adecuados que reflejen las luces de los vehículos sin deslumbrar al conductor. La iluminación puede ser directa o indirecta; en el primer caso, la señal posee iluminación interna, mientras que en el segundo está iluminada por luces interiores.

4.7. CLASIFICACIÓN: Según la función que desempeñan, los dispositivos se clasifican en tres categorías:

4.8. SEÑALES DE PREVENCIÓN O PREVENTIVAS: Tienen por objeto advertir al trabajador de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta, todas las señales de prevención excepto la de paso a nivel de ferrocarril tienen forma cuadrada, esquinas redondeadas, fondo color amarillo, leyendas y bordes negros, Su empleo en las empresas depende de las características de las vías y de las instalaciones.

4.9. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN O REGLAMENTARIAS: Su objetivo es indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, la mayoría de las señales de reglamentación son circulares, con fondo blanco, borde rojo y leyenda o símbolo negro. Si la señal está cruzada por una barra roja, la restricción consiste en una prohibición completa.

Las más usadas a nivel empresarial son:

Tabla 10 SEÑALIZACIÓN VIAL

SEÑAL	INDICACION	SIMBOLO

Altura máxima	Se emplea para notificar la altura máxima permitida para la entrada de vehículo por debajo de canopy	
Prohibido Parquear	Se emplea para notificar que en esa zona está prohibido parquear. Debe colocarse en todo lugar donde no esté permitido estacionar, puede ir pintado en el piso o aviso visible en la pared o de forma vertical.	
Prohibido Tocar la bocina	Se usa para notificar que está prohibido el uso de la bocina, esperar su turno para ser atendido sin causar contaminación auditiva.	
Velocidad máxima permitida	Indica la velocidad máxima a la cual se debe circular dentro de la estación de servicio y, expresada en kilómetros por hora.	
Sentido de circulación	Se emplea para notificar el sentido único de circulación en la vía a la cual se va a entrar o interceptar.	

Si se requiere un color de contraste para un color de seguridad, se debe usar el indicado en la tabla 3.

Tabla 11 COLORES DE CONTRASTE


COLOR	COLOR DE CONTRASTE
Rojo	Blanco

Azul	Blanco
Amarillo	Negro
Verde	Blanco

* El color de contraste para blanco será negro y para negro será blanco

Debido a los problemas que tienen algunas personas para percibir ciertos colores, se emplean formas geométricas a las cuales se les asignan algunos significados, tal como se aprecia en la tabla 4.

Tabla 12 FORMA GEOMÉTRICA, COLOR Y SIGNIFICADO.

Forma / **Color**	**Círculo*** 	**Triángulo** 	**Cuadrado o rectángulo** 
ROJO	Prohibición		Equipos de lucha contra incendios
AMARILLO		Prevención	
VERDE			Situación de seguridad Salidas de emergencia Primeros auxilios
AZUL	Obligación, acción de mando		Información o instrucciones Otras indicaciones

* Cuando el círculo se utilice en señales de prohibición, tendrá una línea oblicua de color rojo.

El tamaño de las señales depende de la distancia desde la cual debe observarse, según la expresión

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

en la que S representa la superficie de la señal en metros cuadrados y L la distancia en metros desde la cual debe verse la señal. La tabla 9 presenta el tamaño recomendado de las señales, de acuerdo a la distancia desde la cual debe poderse observar.

Tabla 13 TAMAÑO DE LAS SEÑALES Y DISTANCIA MÁXIMA DE OBSERVACIÓN SEGÚN SU FORMA

Dimensión en mm	**Distancia máxima (en metros) según la forma**		
Diámetro o lado mayor	Triángulo	Círculo	Cuadrado - Rectángulo
1189	34.98	49.73	53.17
841	24.74	35.18	37.61
594	17.48	24.85	26.56
420	12.36	17.57	18.78
297	8.74	12.42	13.28
210	6.18	8.78	9.39
148	4.36	6.19	6.62
105	3.09	4.39	4.7

5. DEMARCACIÓN

Se entiende por áreas de trabajo todas las instalaciones comprendidas en el espacio utilizado por una empresa para el desarrollo de una actividad específica ; la eficacia y seguridad en las operaciones mejoran notablemente con una planificación cuidadosa de la ubicación y distribución de los diferentes sitios como : bodegas, maquinaria, almacenamiento, circulación entre otros ; los factores principales que determinan las dimensiones, forma y tipo de las estructuras son la naturaleza de los procesos y materiales, el equipo de manipulación y las condiciones de trabajo. (No se permiten espacios entre maquinas o equipos, o entre estos y muros, paredes u otros objetos estacionarios menores de 40cms de ancho. Resolución 2400 –79 Art. 281).

5.1. Dimensiones de la demarcación

- Áreas de trabajo: Franja de 5 centímetros de ancho.
- Demarcación de áreas libres frente a equipos de control de incendios: Semicírculos de 50 centímetros de radio y franja de 5 centímetros de ancho.
- Indicación de recipientes de basura: Un metro cuadrado por caneca.

5.2. EVALUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Cuando se proyecta una instalación y distribución de áreas operativas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de identificar la necesidad de señalización a ubicar y demarcación a utilizar. (El espacio que se debe tener entre maquinas, equipos o muros es de 40cms de ancho. Ver Resolución 2400 –79 Articulo 281).

- Salidas y puertas de acceso y de emergencia.
- Pisos, pasillos, tipos de escaleras, rampas y plataformas.
- Locales e instalaciones para almacenamiento incluyendo los necesarios para materiales explosivos e inflamables y sustancias peligrosas.
- Equipo de manipulación de materiales: Grúas, transportadores, vehículos industriales (montacargas y ascensores).
- Calderas y otros equipos que trabajen a presión.
- Redes de tuberías para el transporte de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas.

5.3. VÍAS DE CIRCULACIÓN

Dentro de las instalaciones de un local existen áreas de circulación tanto del personal como de vehículos de carga, donde se debe proteger a estos, instalando barandas o barreras firmes pintadas de color amarillo y negro a una distancia mínima de 60 cms de las maquinas o partes móviles de las mismas para impedir el acceso directo al igual se debe pintar sobre el piso con franjas de color amarillo de 10 cms de ancho en línea continua.

5.4. PARQUEADEROS

Para reducir el tráfico en los terrenos de la empresa, se deben adaptar zonas especiales de parqueo que deben estar definidas, delimitadas, pavimentadas y en perfectas condiciones.

Estos sitios de parqueo deben ser demarcados con líneas amarillas pintadas en el suelo, teniendo en cuenta las dimensiones de parqueo para automóviles las cuales deben ser como mínimo de 2.75 m. de ancho por 6 m. de largo.

Como medida de seguridad los vehículos se deben parquear en reverso para facilitar su movilización es casos de urgencias o emergencia.

El campo de la señalización por medio del color no queda restringido al uso de señales o avisos de seguridad, sino que puede emplearse para identificar algo sin necesidad de leyendas o para resaltar o indicar cualquier cosa.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente (tabla 2), la Resolución 2400 de 1979 establece el código de colores presentado en la tabla 10.

5.5. IDENTIFICACION DE TUBERÍAS

Tanto la Resolución 2400 de 1979 como la norma técnica colombiana NTC 3458 establecen códigos de colores para la identificación de tuberías en instalaciones industriales. Teniendo en cuenta que esta última es más amplia en la definición de especificaciones, las recomendaciones que aparecen a continuación corresponden a la misma.

5.5.1 Colores de identificación: **Deben de estar de acuerdo con la tabla 9**

Tabla 14 COLORES DE IDENTIFICACIÓN PARA TUBERÍAS

Contenido de la tubería	Color
Agua Potable	**VERDE**
Aguas Negras	NEGRO
Agua Sistema contra Incendio	ROJO
Instalaciones Telefónicas	GRIS
Instalaciones Eléctricas	NARANJA
Red Transmisión de Datos	AZUL OSCURO
Líquidos Combustibles	AMARILLO
Aire	AZUL CLARO
Conductos de ventilación	BLANCO

ANEXO 12. PLAN DE EMERGENCIA

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 5

2 GENERALIDADES 5

3 MARCO CONCEPTUAL 6

4 MARCO LEGAL 10

5 OBJETIVOS 14

5.1 Objetivo General 14

5.2 Objetivos Específicos 14

6 ALCANCE 15

7 PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO 15

7.1 Personas 15

7.2 Medio Ambiente 16

7.3 Equipos y elementos a proteger 16

8 IDENTIFICACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 . 16

8.1 Descripción de instalaciones locativas 16

8.2 Características físicas 17

8.2.1 Área total de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 17

8.2.2 Elementos estructurales 17

8.2.3 Carga Ocupacional 17

8.2.4 Descripción de la Ocupación 18

9 INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 18

10 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 21

10.1 Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas 21

10.2 Análisis de Vulnerabilidad 24

10.2.1 Calificación de las variables 24

10.2.2 Calificación de la vulnerabilidad 25
10.2.3 Vulnerabilidad 25
10.3 Consolidado Análisis de Vulnerabilidad 28
10.4 Clasificación Nivel De Riesgo Amenazas 29
10.4.1 Priorización de Amenazas 32
11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA 32
11.1 Niveles de Respuesta, Funciones y Responsabilidades 35
11.2 Esquema de Mando Durante las Emergencias 35
11.3 Soporte Administrativo: Brigada De Emergencias 36
11.3.1 Soporte Operativo: Brigada de Emergencias 38
11.3.2 Funciones generales de la brigada de emergencias 38
12 PLAN DE EVACUACIÓN 40
12.1 Objetivos 40
12.2 Alarmas 41
12.3 Responsable de activar la Alarma 41
12.4 Frecuencia de Instrucción 42
12.5 Fases del Proceso de Alarma 42
12.5.1 Primera Fase: Detección de la Emergencia 42
12.5.2 Segunda Fase: Alarma 42
12.5.3 Tercera Fase: Preparación de la Evacuación 43
12.5.4 Cuarta Fase: Salida del Personal 43
12.6 Procedimiento General para Evacuar las Instalaciones 43
12.7 Procedimiento para Coordinadores de Evacuación 45
12.7.1 Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Evacuación 45
12.8 Punto de Encuentro 46
12.9 Evacuación de Heridos 46
12.10 Reconteo de Personal 47
12.11 Protección de Documentos de Interés 47
12.12 Restablecimiento de Actividades 47

13 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO 48

13.1 Casos positivos y sospechosos 48

13.1.1 Reporte de casos 48

14 PLANES OPERATIVOS 48

Procedimientos Operativos Normalizados 49

14.1 Instrucciones de Convivencia con una persona de alto riesgo 49

14.2 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Movimiento Sísmico 50

14.3 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendio 51

14.4 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Explosión 52

14.5 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Evacuación 53

14.6 Otros PON Complementarios 54

15 PLAN DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN 65

15.1 Divulgación Del Plan De Emergencias 66

16 CONTACTOS DE EMERGENCIA Y APOYO 66

17 SIMULACROS 67

17.1 Objetivos 67

17.2 Clasificación de los Simulacros 68

17.3 Planeación de la actividad 68

17.4 Ejecución de la actividad 69

17.5 Evaluación de la actividad 69

17.6 Seguimiento y control 70

18 EL PLAN DE EMERGENCIA MÉDICO (PAEMED) 70

18.1 Objetivo 71

18.2 Clasificación 71

18.3 Responsabilidades y Funciones 72

18.4 Coordinación General del PAEMED 73

18.5 Directores, subdirectores o Jefe de Área 73
18.6 Brigada De Emergencias (Primeros Auxilios) 74
18.7 Grupo de Seguridad Física 75
18.8 Personal General de la empresa 75
18.9 Área de Triage 76
18.10 Rutas de Desplazamiento Interno 76
18.11 Rutas de Desplazamiento Externo 76
19 EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 76

1 INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que para la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 es importante contar con los recursos, personal competente, protocolos y estrategias adecuadas para la atención y mitigación de los peligros en situaciones de emergencia, se requiere establecer, divulgar e implementar el presente Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias; de tal manera que se propenda por la oportuna intervención antes, durante, y después de que suceda una eventual situación de emergencia.

El presente Plan de Prevención tiene alcance a todos los frentes de la obra y sus partes interesadas, con la sede ubicada en la Mz 41 Lote 3 barrio Claret. En este documento se encuentran detallados los procedimientos y estrategias que se deben implementar y atender por los trabajadores y contratistas de la empresa con el propósito de que en un evento fortuito se pueda minimizar, tanto el impacto socio-económico como la afectación individual o colectiva, salvaguardando la vida de las personas ocupantes de las instalaciones de la empresa en el momento de una emergencia.

2 GENERALIDADES

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y sus procedimientos operativos Normalizados se encuentran disponibles a todos los trabajadores en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, su revisión y actualización será responsabilidad del responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Los procedimientos Operativos Normalizados se darán a conocer igualmente en la inducción y reinducción si aplica.

El Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias se practicará mediante el desarrollo de mínimo un simulacro al año y deberá ser actualizado cada año o antes si llegase a presentarse cambios significativos en las condiciones sobre las cuales fue elaborado.

.

3 MARCO CONCEPTUAL

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias: Instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025.

Alarma: Aviso o señal preestablecido, que implica ejecutar una acción o se da para que se sigan instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente de un evento adverso.

Amenaza: Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado.

Análisis de vulnerabilidad: Es la medida o grado de debilidad de ser afectado por amenazas o riesgo según la frecuencia y severidad de los mismos. La vulnerabilidad depende de varios factores, entre otros: la posibilidad de ocurrencia del evento, la frecuencia de ocurrencia de éste, los planes y programas preventivos existentes, la posibilidad de programación anual entre otros.

Organización: Define el papel que tiene cada trabajador o grupo de trabajadores y trabajadores de la empresa para la prevención o atención de emergencias.

Planes de acción: Informa las acciones esperadas de los grupos de apoyo en los diferentes momentos de una emergencia antes, durante y después.

Procedimientos operativos normalizados: Planes específicos prefabricados para actuar en caso de que se presenten las situaciones de emergencia más probables y riesgosas dentro de cada empresa según su actividad. Su conocimiento facilita una respuesta rápida y eficiente.

PAEMED: Plan de Emergencias Médicas: Programa por medio del cual con procedimientos sencillos, claros y precisos todas las personas estarán en capacidad de responder de manera adecuada y segura ante un evento imprevisto en el cual se ven comprometidas vidas humanas.

Brigada de Emergencia: Es un grupo humano con liderazgo y formación para asumir procedimientos administrativos y operativos que han sido diseñados para prevenir o controlar una emergencia, este grupo de trabajadores especializados y equipados, cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de una emergencia para atender emergencias incipientes.

Comité Operativo de Emergencia COE: Instalación o estructura preestablecida responsable de diseñar y coordinar la ejecución de las actividades antes, durante y después de una emergencia o desastre, Para la empresa estará integrado por: El Coordinador de Evacuación, el Coordinador de Rescate y El Coordinador de Primeros Auxilios.

Coordinador de Evacuación: Son personas a las que se asignan funciones para coordinar actividades de evacuación

Control: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias.

Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Emergencia Médica: Se denomina a toda situación que se presenta repentinamente, ocasionando perturbación, al poner en peligro la integridad física o mental de las personas.

Triage: Método utilizado para clasificar al personal accidentado de acuerdo con la severidad de la lesión (Código de colores), para determinar la prioridad de atención y el sitio al cual debe ser remitido.

Emergencia: Es toda perturbación parcial o total del sistema, que pueda poner en peligro su estabilidad y pueda requerir para su control, recursos y procedimientos

diferentes y/o superiores a los normalmente utilizados y la modificación temporal, parcial o total de la organización para poder atenderla.

Equipos para Atención de Emergencias: Equipos destinados para ser operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.

Escenario: Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él.

Evacuación: Es el conjunto integral de acciones tendientes a desplazar personas de una zona de mayor amenaza a otra de menor peligro, estableciendo una barrera (distancia) entre la fuente de riesgo y las personas amenazadas, mediante el desplazamiento de estas.

Impacto: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas.

Jefe de Brigada: Es la persona asignada por el Coordinador de Emergencia para direccionar todas las actividades del grupo de apoyo interno (Brigada de Emergencias) ante cualquier emergencia.

Mitigación: Medidas tomadas con anticipación al desastre, con el ánimo de reducir o eliminar su impacto sobre la sociedad y el medio ambiente.

Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que sucesos naturales, tecnológicos o generados por la actividad humana, causen desastres. Son la secuencia lógica de la forma como debe actuar una persona en caso Procedimientos Operativos Normalizados para Emergencia (PONS): de emergencias, en los procedimientos operativos se establecen las directrices y se complementan con los diagramas.

Punto de Encuentro: Es un lugar amplio y libre de riesgos adecuado para recibir a todo el Personal que ha realizado la evacuación y en él se realiza el recuento o conteo para verificar que ocupantes pudieron salir con éxito y cuáles no.

PPPRAE: Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante una Emergencia.

PCN: Plan de Continuidad del Negocio

Recuperación: Actividad final en el proceso de respuesta a una emergencia. Consiste en restablecer la operatividad de un sistema interferido.

Respuesta: Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento humano y disminuir pérdidas.

Riesgo: Es definido como la probabilidad de ocurrencia de unas consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado, que puede perturbar la integridad física de las personas o el medio. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD

Esta expresión no es una fórmula matemática que se desarrolla con valores numéricos, solo es una expresión en la que se relacionan las variables amenaza y vulnerabilidad.

Ruta: Se entiende como ruta de evacuación, aquella que aleje a la persona que evacua de la zona de peligro en el menor tiempo posible y constituya un trayecto seguro hacia las zonas de refugio final.

Salida de Evacuación: Es la vía de salida de las instalaciones hacia el exterior proporcionando un camino protegido necesario para que los ocupantes puedan acceder con seguridad suficiente a la zona de refugio.

Sistema de Alarma: Es un sistema de comunicación que le indica al personal que debe seguir instrucciones de emergencias y estar preparados para evacuar.

Simulacro: Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o construido en la mejor forma posible para asemejar una emergencia en una o varias áreas para evaluar la respuesta de las personas y su capacidad de reacción, comparando los resultados obtenidos con los esperados.

Siniestro: Es un evento no deseado, no esperado, que puede producir consecuencias negativas en las personas y en los bienes materiales. El siniestro genera la emergencia, si la capacidad de respuesta de la empresa es insuficiente para controlarlo.

Vías de Evacuación: Pasillos, puertas, etc., que conducen a la salida de evacuación.

Vulnerabilidad: Factor de riesgo interno de un sujeto a sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una perdida, la diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuesta ante un evento determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos.

Explosión: Liberación brusca de una gran cantidad de energía con desprendimiento de calor, luz y gases.

Incendio: Fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales combustibles o inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas ya sea de vidas o de bienes valores.

Movimiento Sísmico: El rozamiento entre placas tectónicas ocasionando una enorme acumulación de energía, este proceso lento provoca fuertes deformaciones en rocas al interior de la tierra, las cuales, al romperse, hacen que la energía acumulada se libere de repente en forma de ondas y sacuda la superficie terrestre.

Nivel de Riesgo: Calificación relativa de un riesgo en función de la combinación de la amenaza por la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo.

Primeros Auxilios: Son aquellas medidas o cuidados adecuados que se ponen en práctica en forma profesional, tan pronto se reconoce una emergencia y antes de su atención.

Probable: Amenaza que según su diagnóstico ya ha ocurrido bajo esas condiciones.

Partes Interesadas: Clientes, trabajadores, viajeros, Vigilantes, contratistas, arrendatarios Subcontratistas, proveedores y visitantes en general.

4 MARCO LEGAL

La legislación de Colombia en materia en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión del Riesgo establece en normas de obligatoriedad que las instituciones deben implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como organizar en sus instalaciones las brigadas de emergencias.

Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos resaltar:

NORMA	TÍTULO
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
Ley 1523 de 2012	Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su libro 2 parte 2 titulo 4 capitulo 6 establece los lineamientos aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencia
Ley 9 Título III enero 24 de 1979 Congreso de la República	Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Ley 46 de 1988	“Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.”
Decreto 1400 de 1984	“Disposiciones Reglamentarias conforman el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y actualizado por la Ley 400 de 1997 y el Decreto 33 de 1998”.
Resolución 1016 de 1989	“Programa de Salud Ocupacional de empresa. Orienta la Organización y desarrollo de un Plan de Emergencias con todos sus componentes”. Artículo 11. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. Número 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias teniendo en cuenta las siguientes ramas: Preventiva, Pasiva, Rama activa o control de las emergencias.
Ley 100 de 1993	“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”.
Decreto 1295 de 1994	“Por el cual se determina la organización y

NORMA	TÍTULO
	administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Ley 322 de 1996. Sistema Nacional de Bomberos. Artículo 1	La prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este riesgo en los bienes inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad.
Ley 1523 de 2012	"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".
Ley 1562 de 2012	"Por la cual se modifica el Sistemas de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud Ocupacional."
Decreto 919 de 1989	Por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones. Este decreto consta de cinco capítulos en los que se plantean las actividades a realizar, los responsables de cada una de ellas y la disposición y distribución de los recursos necesarios en las situaciones de emergencia en el país.
Resolución 044 de 2014	La capacitación y entrenamiento de las Brigadas Contra incendio Industriales, Comerciales y similares debe llevarse a cabo por intermedio de las Escuelas, Academias, Departamentos o Áreas de Capacitación de los Cuerpos de Bomberos, las que han de estar debidamente reconocidos por las Secretarías de Educación y Salud Municipal o Departamental, y contar con la maquinaria, equipos y herramientas necesarias, en óptimo estado, para garantizar la capacitación y el entrenamiento."
NFPA 1071	Norma para calificaciones profesionales para miembros de brigadas industriales de incendios.

NORMA	TÍTULO
NFPA 600	Requisitos mínimos para organizar, operar y equipar una brigada.
NTC 31000/2011	Gestión de Riesgo
Guía Técnica Colombiana 202/06.	Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
NT- 1700	Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. Medios de evacuación y código NFPA 101. Código de seguridad humana.
NTC-2885	Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. Establece en uno de sus apartes los requisitos para la inspección y mantenimiento de portátiles, igualmente el código 25 de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water – Based fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidráulico contra incendio.
NTC-4764	Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales
NTC-4140	Edificios. Pasillos y corredores
NTC-4143	Edificios. Rampas fijas
NTC-4144	Edificios. Señalización
NTC-4145	Edificios. Escaleras.
NTC-4201	Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas
NTC-4279	Vías de circulación peatonal planas
NTC-4695	Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano.
NTC-2388	Símbolos para la información del público
NTC-1867	Sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos
Resolución 666 del 24 de abril de 2020	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19
Resolución 777 de	Por medio de la cual se definen los criterios y

NORMA	TÍTULO
2021	condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.
Resolución 0350 del 01 de marzo del 2022	Por medio del cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas".

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Establecer una estructura de respuesta ante cualquier emergencia e implementar un esquema administrativo y operativo de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 que permita prevenir y controlar eventos de tipo catastrófico provocados por emergencias o desastres naturales o antrópicos mediante el desarrollo de un esquema organizado y documentado para su intervención, además de la protección de los bienes y activos, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

5.2 Objetivos Específicos

1. Analizar la vulnerabilidad ante emergencias y desastres en que pueda estar involucrada la empresa, frente a las amenazas identificadas.
2. Valorar y evaluar los riesgos teniendo en cuenta a la comunidad, los bienes y servicios de la empresa.
3. Elaborar y establecer los procedimientos operativos normalizados de atención que permitan una eficaz actuación en emergencias.
4. Definir las funciones, responsabilidades y formas de actuar de todas las partes involucradas en el control de emergencias de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025para dar respuesta oportuna y eficaz a las emergencias.
5. Evaluar a través del simulacro los procedimientos operativos normalizados y la implementación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias.

6. Informar, capacitar y entrenar a los miembros de la brigada de emergencia de UNIÓN TEMPROAL CORREDORES VERDES 2025, y el personal en general en los temas específicos de atención a emergencias.
7. Gestionar los recursos necesarios para la implementación del plan de emergencias.
8. Identificar y aplicar un proceso de planeación en prevención, previsión, mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de desastres.

6 ALCANCE

El presente Plan de Emergencia aplica para la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 en su operación diaria durante las horas laborales e involucra a todo tipo de personal propio y flotante de la empresa que ocupe las edificaciones: trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, usuarios regulares y esporádicos que en el momento de una emergencia se encuentren dentro de las instalaciones, así mismo este documento aplica para todos los procesos y áreas de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, con sede de Cúcuta en la Mz 41 Lote 3 barrio Claret.

Dada la importancia de las acciones establecidas en el presente documento en caso de presentarse una situación de emergencia real o potencial dentro de la UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, su conocimiento, divulgación y aplicación se considera obligatorio por todas las partes interesadas.

7 PRIORIDADES DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO

7.1 Personas

Como primera prioridad de protección y salvamento, se tiene a las personas, así:

- Niños
- Clientes
- Visitantes
- Trabajadores
- Contratistas
- Afectados de áreas cercanas y comunes de la zona.

7.2 Medio Ambiente

Todas las actividades adelantadas para la prevención y atención de emergencias y contingencias se desarrollarán atendiendo a la conservación o mínima afectación del entorno ambiental, así:

- Evacuar y/o proteger los equipos y elementos que puedan contaminar el ambiente.
- Disminuir el impacto ambiental que pueda generar la emergencia, por medio de intervenciones de recuperación ambiental, reposición de entes afectados y mitigación posterior de efectos.

7.3 Equipos y elementos a proteger

Los equipos propios de la labor deberán ser recuperados en el evento posterior inmediato a la emergencia, y de ser posible se protegerán durante la ocurrencia del evento.

Estos se han dividido en dos grandes grupos:

- Equipos de cómputo y archivos de documentos importantes.
- Equipos y elementos para atención de emergencias: Como botiquines, camillas, etc.
- Equipos que se empleen para la prestación del servicio.

8 IDENTIFICACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

8.1 Descripción de instalaciones locativas

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT:	902018300-6
Actividad económica	Servicio de apoyo a la silvicultura
Departamento:	Norte de Santander
Municipio:	Cúcuta
Dirección:	Manzana 41 Lote 3 barrio Claret
Horario de trabajo	8:00 a.m de 12 pm y de 2:00 p.m a 6:00 p.m lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m a 12:00 a.m
Representante legal:	Edison Ramiro Castro Hernandez
Teléfonos:	3022726357
Correo electrónico:	Corredoresverdes2025@gmail.com

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
NIT:	902018300-6
Actividad económica	Servicio de apoyo a la silvicultura
Departamento:	Norte de Santander
Municipio:	Cúcuta
Dirección:	Frentes, avenida libertadores
Horario de trabajo	9:00 a.m de 01 pm y de 2:00 p.m a 5:00 p.m lunes a viernes y sábados de 9:00 a.m a 01:00 p.m
Representante legal:	Edison Ramiro Castro Hernandez
Teléfonos:	3022726357
Correo electrónico:	Corredoresverdes2025@gmail.com

8.2 Características físicas

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, cuenta con dos plantas. Igualmente se cuenta con baño, cocina y las áreas de administrativas

8.2.1 Área total de ***UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025***

160 m^2 de área total.

8.2.2 Elementos estructurales

DETALLE	DESCRIPCION
FACHADA	la fachada está ubicada sobre la Manzana 41 Lote 3 barrio Claret la cual está construida en ladrillo y concreto, pintura Blanca, pañete un portón de metal color plateado.

8.2.3 Carga Ocupacional

Las instalaciones están distribuidas en el área administrativa y operativas la planta de personal de la empresa estará conformada por los trabajadores y posibles contratistas de prestación de servicios.

8.2.4 Descripción de la Ocupación

La ocupación de las instalaciones de UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025, está dada por el personal que en primera instancia trabaja en las instalaciones de la empresa, y otro grupo que está conformado por trabajadores que se encuentran en los diferentes frentes de trabajo.

El resto de la ocupación se relaciona al personal que visita las instalaciones por diferentes motivos. En determinado momento pueden ingresar personas con limitaciones físicas.

9 INVENTARIO DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
HUMANOS			
Existe comité de emergencia		X	
Tiene funciones asignadas		X	
Existen Brigadas de Emergencia	X		
Capacitada en primeros auxilios	X		
Capacitada en simulacro contraincendios y manejo de extintores.	X		
Capacitada contra siniestros	X		
Capacitada en evacuación	X		
Tiene dotación		X	
Existen otros grupos de apoyo			
De vigilancia		X	
Existe personal médico y/o paramédico		X	
Los trabajadores saben qué hacer			
Antes	X		
Durante	X		
Después de una emergencia	X		
RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
FÍSICOS: Infraestructura			
La construcción es sismo resistente		X	
Hay estructuras inflamables (como papel, madera, tapetes, cortinas, etc.).	X		Archivos, muebles, material sólido como documentos contables, documentación, entre otros.
Existe:			
*Puertas contra fuego		X	
*Muros contra fuego		X	
*Barreras y diques		X	
El agua es:			
*Suministrada por el acueducto urbano	X		
*Tiene algún sistema de almacenaje		X	
La electricidad es:			
*Tomada de la red urbana	X		
*Tiene subestación interna		X	
*Tiene planta eléctrica		X	
*Combustible		X	
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
RECURSOS			
*Almacenan combustible		X	
*Cumplen con la norma para almacenar combustibles.		N/A	
Las telecomunicaciones:			
*Tienen teléfono		X	
*Tienen otro sistema de comunicación	X		Se cuenta con el celular asignado a la empresa.
El gas es:			
*Gas natural	X		
*Gas propano		X	
Para emergencias:			
Existen salidas de emergencia	X		
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
FÍSICOS – TÉCNICOS			

RECURSOS	SI	NO	OBSERVACIONES
Extintores	X		
Hidrantes		X	
Gabinetes		X	
Red contra incendios		X	
Herramientas		X	
Dotación de Brigadas		X	
Botiquines	X		
Equipos especiales		X	
Camillas	X		
Equipos de transporte		X	
Sistemas de alarma	X		Actualmente cuentan con un pito ubicado en la empresa, y el timbre de la misma puede apoyar el sistema de alarma.
Sistemas de detección de humo.	X		
Mapa de la zona donde está la empresa	X		Pendiente actualización
Listado de empresas que puedan prestar auxilios		X	
Listado de áreas y capacidad para alojar personas.		X	
Teléfonos y números de emergencia	X		Se cuenta con la lista de números de emergencia.
Planos de la empresa con:			
*Sistemas de comunicación		X	
*Sistemas alternos de energía		X	
*Rutas de evacuación		X	
*Puntos de encuentro	X		No esta demarcado
RECURSOS	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
ECONÓMICOS			
Seguros para:			
Personas	X		Los trabajadores contratados directamente cuentan con el seguro de la ARL AXA COLPATRIA.
Recursos		X	
Sistemas	X		
Procesos	X		

10 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VALORACIÓN DEL RIESGO




En forma general, el análisis o evaluación de riesgos se define como el proceso de desestimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. De acuerdo a las necesidades de la empresa, las amenazas más representativas son:


NATURAL	TECNOLÓGICO	SOCIAL
Movimientos Sísmicos	Incendios	Hurto
Vendavales / Caída de árboles	Explosiones	Robo
Tormentas eléctricas - Caída de rayos	Fugas	Secuestros
Inundación	Derrames	Asonadas
Lluvias torrenciales	Fallas Estructurales	Terrorismo
Vientos fuertes	Fallas en equipos y sistemas	Concentraciones masivas
Otros dependiendo de la ubicación geográfica y el clima	Intoxicaciones	Otros


10.1 Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá. NUNCA HA SUCEDIDO	Verde 
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. YA HA OCURRIDO	Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. EVIDENTE, DETECTABLE	Rojo 

A continuación, se valoran los riesgos para UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 que pueden afectar a las personas, los procesos y a la economía misma son:

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Movimiento sísmico	San José de Cúcuta se encuentra ubicada sobre la falla frontal de la cordillera Oriental atravesada por las fallas Bocono y la Uribante – Caparo	PROBABLE	
Vendavales / Caída de árboles	Temporada invernal aumenta la posibilidad de vendavales, lo cual puede afectar las edificaciones por caídas de árboles y desprendimientos de las líneas de redes eléctricas.	INMINENTE	
Tormentas eléctricas - Caída de rayos	Temporada invernal Aumenta la posibilidad de tormentas eléctricas para las edificaciones aumenta el riesgo.	POSIBLE	
Inundaciones	En temporada invernal las calles se inundan por deficiencias en el alcantarillado de la ciudad.	INMINENTE	
Lluvias torrenciales	Temporada invernal aumenta la posibilidad de lluvias torrenciales que pueden afectar las edificaciones, sin embargo, las instalaciones están cerradas lo que evita que el agua se filtre o cree caos al interior.	INMINENTE	
Vientos fuertes	Temporada invernal aumenta la posibilidad de vendavales, y vientos fuertes que puede afectar las edificaciones.	POSIBLE	
Incendio Explosiones	Presencia de material combustible (papel, plásticos, maderas, cartones, sistemas eléctricos energizados). Incluso por falla con alguna herramienta o equipo.	INMINENTE	

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Fugas	La empresa utiliza sistema de gas para la parte administrativa	POSIBLE	
Fallas estructurales	Deterioro de muros, ventanas y techos por el paso del tiempo.	POSIBLE	
Fallas de Equipos y Sistemas	Cortocircuito en Servidores y Equipos.	POSIBLE	
Eventos Biológicos	Cuando se manipulan productos de limpieza, el personal de servicios generales manipula residuos cuando hacen su labor.	INMINENTE	
Robo	La empresa está expuesta a sufrir robos de sus bienes, así como tiene este riesgo por el flujo de personal que tiene la parte operativa.	INMINENTE	
Hurto	La población que se mueve diario hace que esto se presente en la parte operativa y administrativa.	INMINENTE	
Terrorismo – secuestro	Situación del país, grupos al margen de la ley. Orden público.	INMINENTE	
Disturbios Civiles - Asonadas	Distintas manifestaciones de origen civil, por las actuales condiciones del sector.	INMINENTE	

AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR
Posibles atentados contra las instalaciones o integrantes de la comunidad en general.	Cualquier integrante de la empresa Administrativo, operativo.	INMINENTE	

10.2 Análisis de Vulnerabilidad


Nos permite evaluar la sensibilidad del sistema ante los diferentes riesgos de tipo colectivo que se puedan desencadenar, como son los incendios, atentados, descargas atmosféricas, sismos, etc. La calificación de la amenaza se realiza mediante colores teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, de la siguiente forma:

1. PERSONAS	2. RECURSOS	3. SISTEMAS Y PROCESOS
Organización	Materiales	Servicios públicos
Capacitación	Edificación	Sistemas alternos
Dotación	Equipos	Procedimientos de recuperación

10.2.1 Calificación de las variables

Calificación Cuantitativa	Calificación Cualitativa	INTERPRETACION
0	Bueno	Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los Procedimientos, entre otros.
0,5	Regular	Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos de manera parcial, entre otros.
1	Malo	Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los procedimientos, entre otros.

10.2.2 Calificación de la vulnerabilidad

RANGO	CALIFICACION	VALOR
0.0 – 1.0	BAJA	VERDE 
1.1 – 2.0	MEDIA	AMARILLO
2.1 – 3.0	ALTA	ROJO 

10.2.3 Vulnerabilidad

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Organización		
Se conformara brigada de emergencias y se le asignara funciones	0	
La empresa participa y promueve activamente a los trabajadores y público en general el Plan de Prevención y Respuesta ante emergencias.	0	
Los trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias	0	
Existe formato para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias	0	
Existe formato para realizar inspecciones a los equipos utilizados en emergencias.	0	
SUBTOTAL	1	
2. Capacitación		
Se cuenta con un programa de capacitación donde se incluyen actividades de prevención y control de emergencias	0	
Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse	0	

VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
El personal de la brigada recibira entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias	0	
Esta divulgado el plan de prevención y preparación ante emergencias.	1	
Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias	1	
SUBTOTAL	0.33	
3. Dotación		
Existe dotación personal para el personal de la brigada y del comité de emergencias	1	
Se tienen implementos básicos de primeros auxilios en caso de requerirse	0.5	
Se cuenta con implementos básicos para el control de incendios tales como herramientas manuales, extintores, palas entre otros de acuerdo con las necesidades específicas y realmente necesarias para la Sede.	0	
Se cuenta con implementos básicos para el rescate de personas y bienes.	0	
SUBTOTAL	0.37	


VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Materiales		
Existen materiales inflamables al interior de las instalaciones	0.5	Existe material inflamable representado en solidos inflamables (papel, madera).
SUBTOTAL	0.5	
2. Edificaciones		
El tipo de construcción es sismo resistente	0	
Existen puertas y muros cortafuego.	0.5	

VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Las escaleras para el uso de emergencias cuentan con banda antideslizante y doble pasamanos	0	
Existe más de una salida	0	
Existen rutas de evacuación	0	
Se cuenta con parqueaderos	0	
Están señalizadas vías de evacuación y equipos contra incendio	0	
SUBTOTAL	0.14	
3. Equipos		
Se cuenta con algún sistema de alarmas	1	
Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios	0	
Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios	0	
Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas	0	
Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia	0	
SUBTOTAL	0.25	

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
1. Servicios públicos		
Se cuenta con buen suministro de energía	0	
Se cuenta con buen suministro de agua	0	Es suministrada directamente de la Red Pública.

VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS		
PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR	CALIFICACION	OBSERVACIONES
Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras	0	
Se cuenta con buen servicio de comunicaciones.	0	
SUBTOTAL	0.0	
2. Sistemas alternos		
Se cuenta con un tanque de reserva de agua	0	
Se cuenta con una planta de energía	1	
Sistema de iluminación autónoma de emergencia	0	
Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física	0.5	
SUBTOTAL	0.37	
3. Recuperación		
Se cuenta con algún sistema de seguro para los trabajadores.	0	ARL – AXA COLPATRIA
Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.	1	
Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes medio magnético	1	
Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general	1	
SUBTOTAL	0.75	

10.3 Consolidado Análisis de Vulnerabilidad








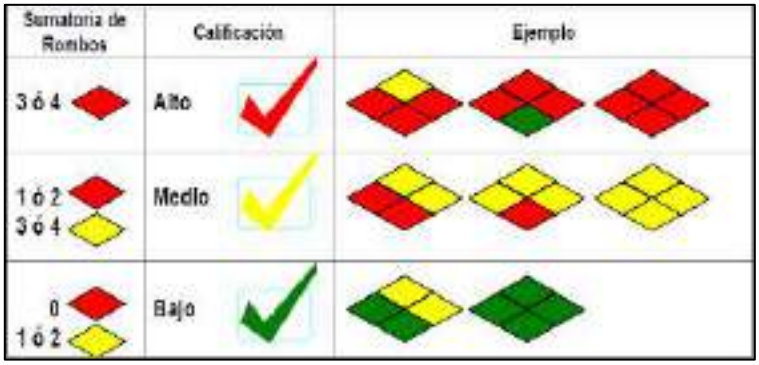










PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR		CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	COLOR
EN LAS PERSONAS		1.17	MEDIO	
Organización	1			
Capacitación	0.33			
Dotación	0.37			
EN LOS RECURSOS		0.89	BAJO	
Materiales	0.5			
Edificación	0.14			
Equipos	0.25			
SISTEMAS Y PROCESOS		1.12	MEDIO	
Servicios Públicos	0.0			
Sistemas Alternos	0.37			
Recuperación	0.75			
	BAJO 0,0 - 1,0	MEDIO 1,1 - 2,0	ALTO 2,1 - 3,0	
	POSIBLE	PROBABLE	INMINENTE	




10.4 Clasificación Nivel De Riesgo Amenazas

P = Personas / R= Recursos / A= Amenaza / SP= Sistemas y Procesos

Teniendo en cuenta la calificación y asignación de colores realizadas anteriormente tanto para las amenazas como para la vulnerabilidad, a continuación, se presenta el nivel de riesgo utilizando el diamante de riesgo para las amenazas presentes en UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 así

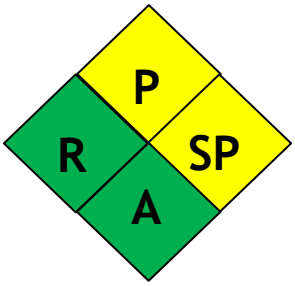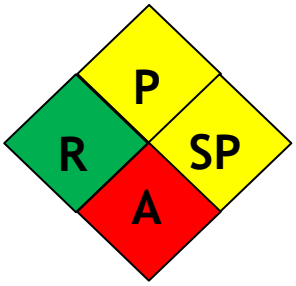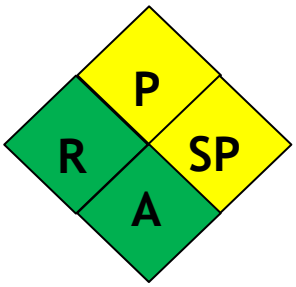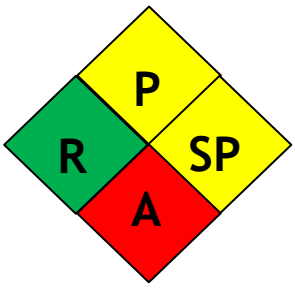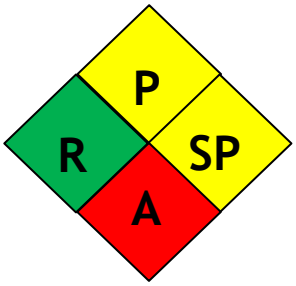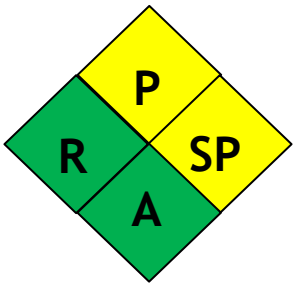AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Movimiento sísmico		BAJO	**Vendavales / Caída de árboles**		MEDIO
Tormentas eléctricas - Caída de rayos		BAJO	**Inundaciones**		MEDIO
Lluvias torrenciales		MEDIO	**Vientos fuertes**		BAJO
Incendio Explosiones		MEDIO	**Fugas**		BAJO

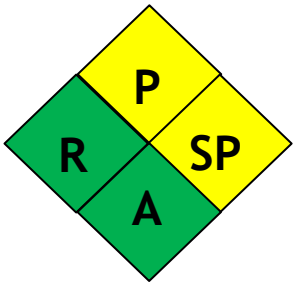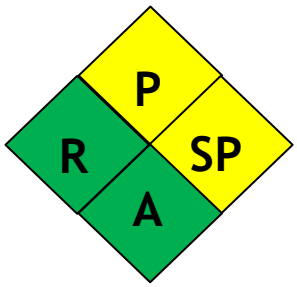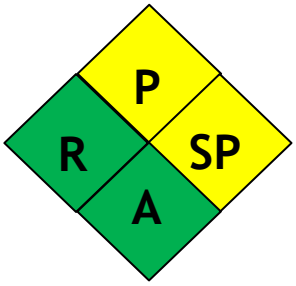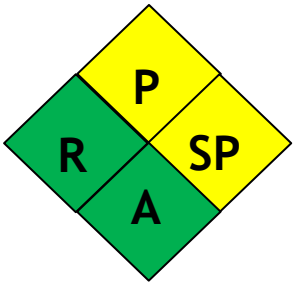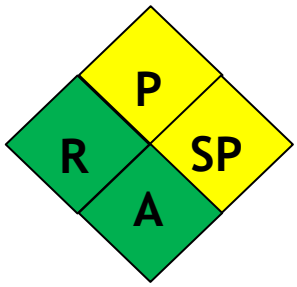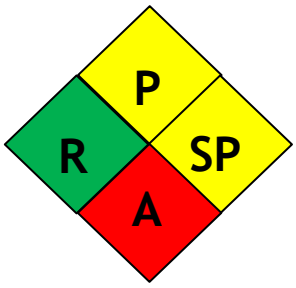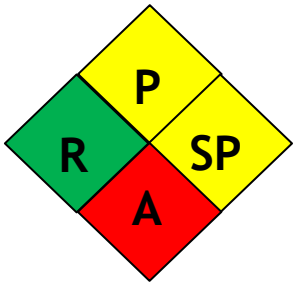AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Derrames		BAJO	**Fallas estructurales**		BAJO
Fallas de Equipos y Sistemas		BAJO	**Intoxicaciones**		BAJO
Eventos Biológicos		MEDIO	**Trabajos de alto riesgo**		BAJO
Robo		MEDIO	**Hurto**		MEDIO

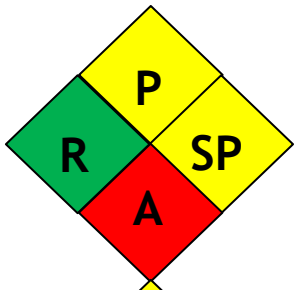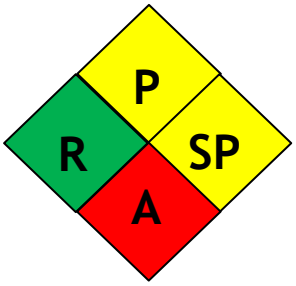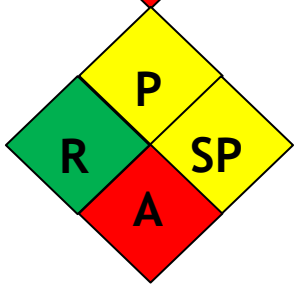AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL	AMENAZA	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	NIVEL
Terrorismo – secuestro		MEDIO	**Disturbios Civiles - Asonadas**		MEDIO
Posibles atentados contra las instalaciones o integrantes de la Empresa		MEDIO			

10.4.1 Priorización de Amenazas

Las amenazas analizadas en Riesgo MEDIO, por lo general no dependen de la empresa, como por ejemplo las amenazas relacionadas con la zona de ubicación de la empresa por el conflicto armado o por los desastres naturales que son difícilmente prevenibles.

Mantener medidas de prevención relacionados con riesgo público en la empresa; promover el autocuidado; igualmente la empresa ha realizado acciones con los trabajadores, se requiere continuar con el reentrenamiento a la brigada, realizar la dotación de la misma. UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 se compromete a partir de la fecha al establecimiento de todas las acciones para la mejora de los procesos y la seguridad y salud de sus trabajadores.

11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA


En la prevención, preparación y atención de emergencias y contingencias de la

empresa se necesita del compromiso, liderazgo y apoyo de todos los trabajadores, teniendo en cuenta que este apoyo es la clave del éxito o fracaso de toda organización, expresándolo mediante la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos, incluso facilitando el cambio de la cultura organizacional hacia la prevención y el comportamiento seguro.


Este compromiso está reflejado en la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, mediante el cual se manifieste el alcance y el nivel de compromiso de todos los trabajadores en el tema.

En situaciones de emergencia, la empresa ha establecido funciones especiales que permitan actuar de manera eficiente y oportuna, aclarando que, ante la ocurrencia de una emergencia, esta forma organizativa, reemplaza las funciones de autoridad y la normalidad de la empresa en cuanto a roles laborales.

El siguiente es el modelo de actuación en casos generales de emergencias:

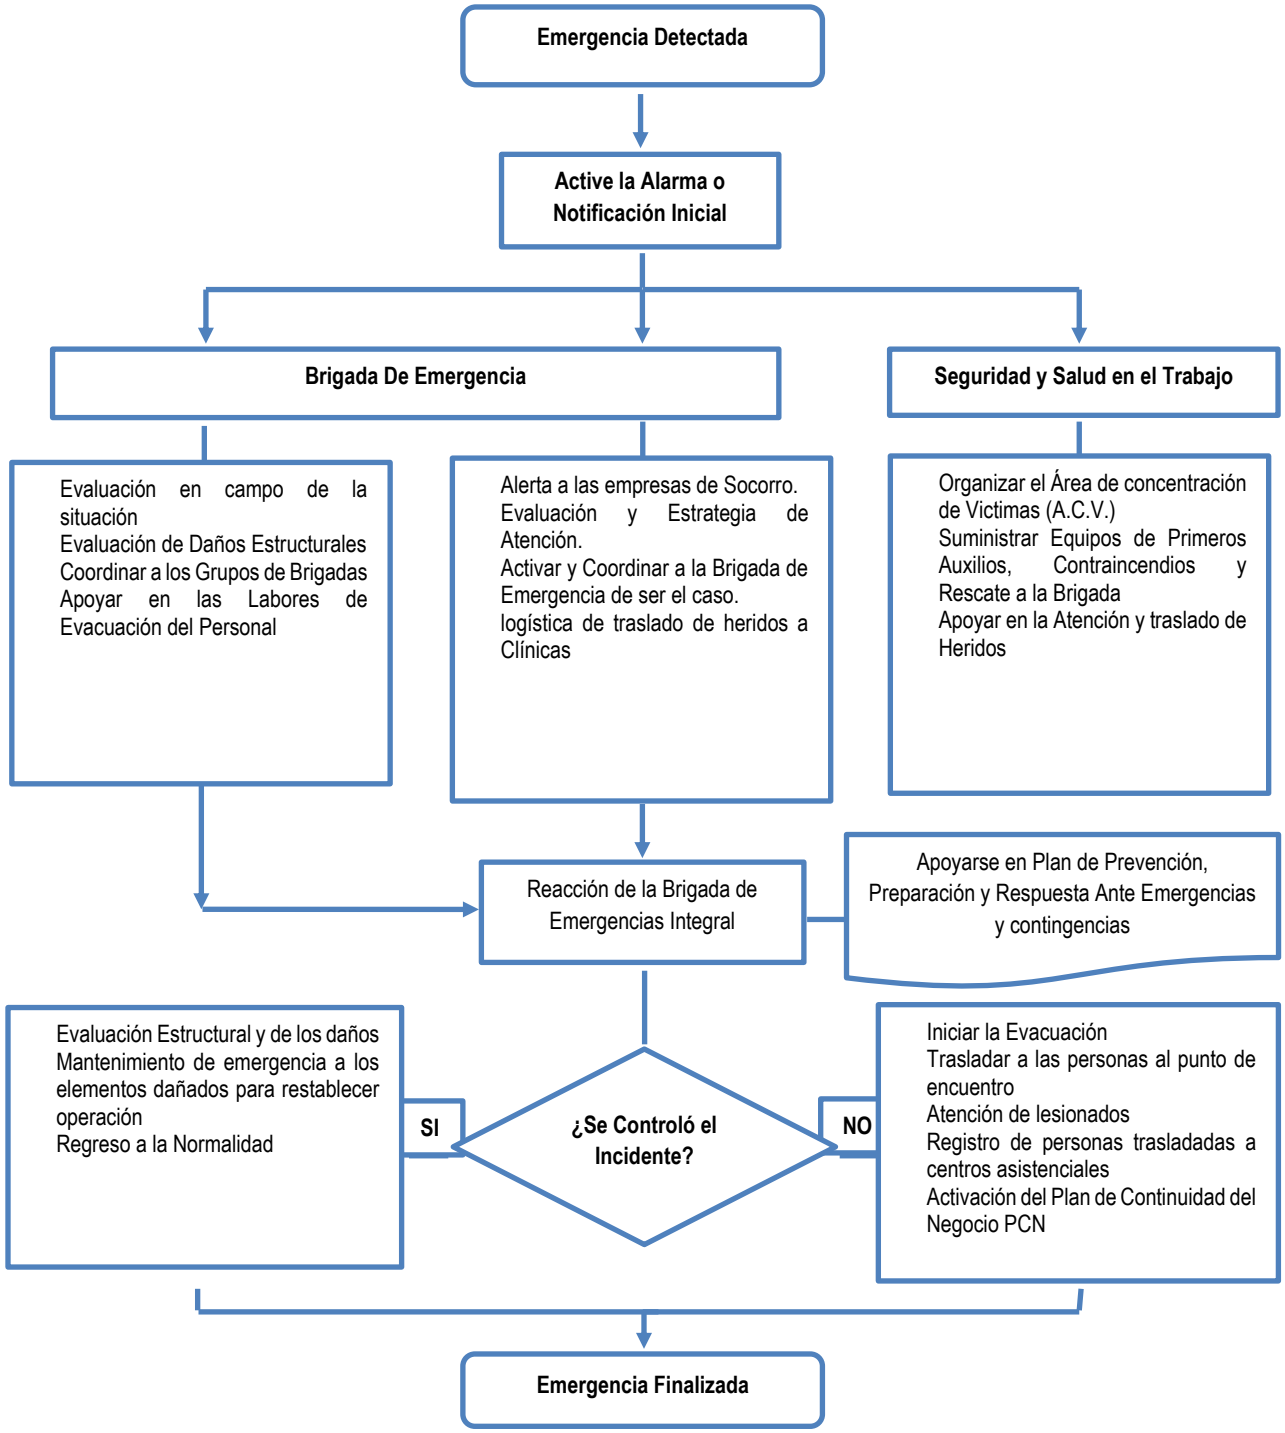


11.1 Niveles de Respuesta, Funciones y Responsabilidades

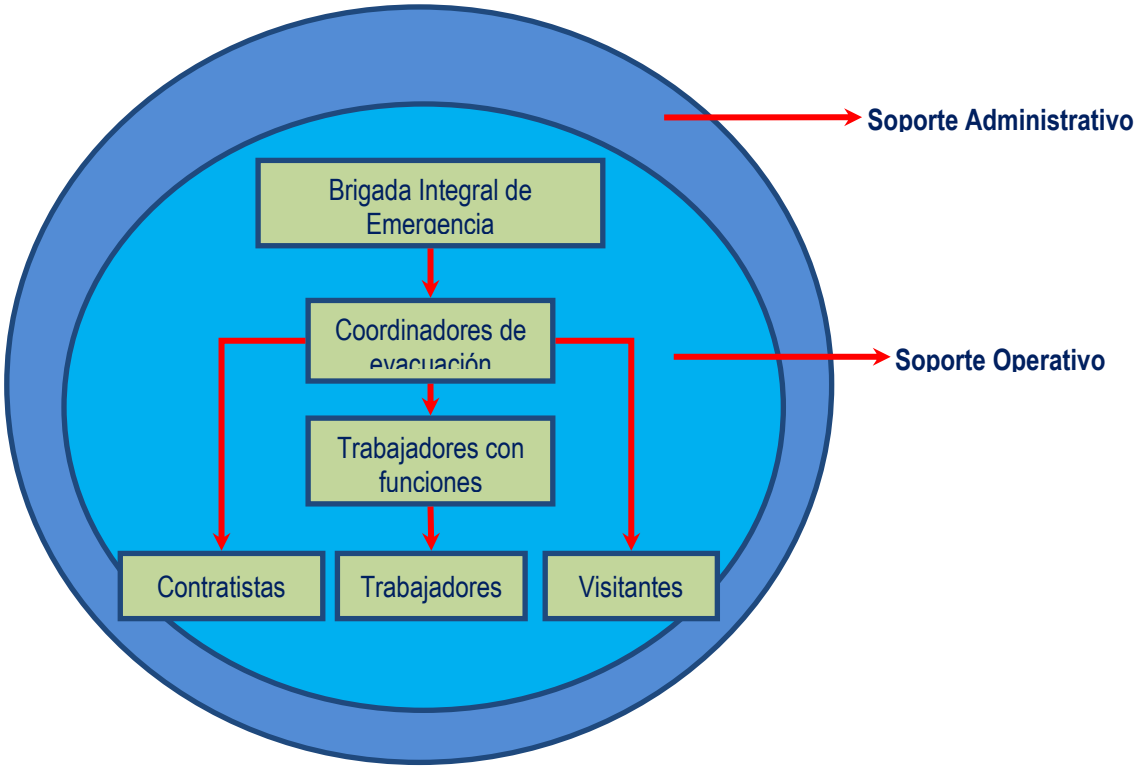

11.2 Esquema de Mando Durante las Emergencias

El esquema que se implementa en la empresa involucra y compromete a todas las partes interesadas, incluyendo la Gerencia, trabajadores, Contratistas y Visitantes, garantizando de esta manera una acción eficaz y coordinada ante una situación de emergencia.

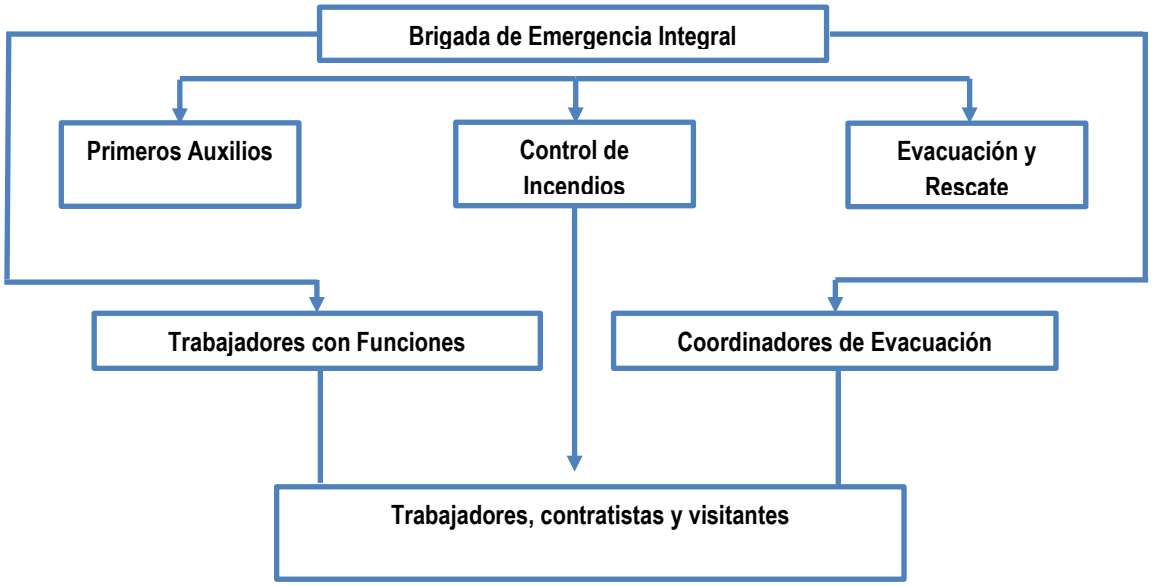

11.3 Soporte Administrativo: Brigada De Emergencias

La brigada de Emergencias está conformada por la Gerencia quienes se encargan de crear, planear y administrar el presente documento.

Funciones de la brigada de Emergencias

Antes de la Emergencia

- Dar soporte y solidez a la estructura orgánica del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias, asumiendo el liderazgo y responsabilidad desde el más alto nivel jerárquico.
- Crear políticas, procedimientos, programas y actividades propias del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias en fases de pre-planteamiento, entrenamiento y situaciones de emergencias.
- Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y control del plan para atención de emergencias, velando porque se realice por lo menos un simulacro anual del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Emergencias y Contingencias, con la participación de todos los niveles de la empresa.

- Decidir la información que debe suministrar, la coordinación de prensa a los medios de comunicación pública en caso de emergencias.
- Aprobar los lineamientos por los cuales se rige la brigada de emergencia sea reglamento o políticas.
- Establecer y avalar los objetivos del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y su alcance.
- Recopilar la información histórica de la empresa en cuanto a realización de simulacros.
- Elaborar y revisar el análisis de vulnerabilidad.
- Recopilar la documentación necesaria para establecer los diferentes planes.
- Determinar cuáles son los parámetros para la selección de los brigadistas.
- Realizar reuniones periódicas para mantener actualizado el PPPRAE y garantizar el mantenimiento del mismo.
- Tener actas de todas las reuniones realizadas por el Comité de Emergencias.
- Evaluar los procesos de atención de las emergencias para retroalimentar las acciones de planificación.

Durante la Emergencia

- Evaluar las condiciones naturaleza y magnitud de la emergencia.
- Distribuir los recursos físicos y humanos para la atención oportuna de la emergencia.
- Establecer contactos con los Grupos de Apoyo Interno y Externo (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Tránsito).
- Tomar decisiones en cuanto a evacuación total o parcial de la empresa.
- Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias.
- Recoger y procesar toda la información relacionada con la emergencia.
- Coordinar el traslado de los heridos a los centros de asistencia médica.

Después de la Emergencia


- Evaluar las diferentes actividades desarrolladas, después de una emergencia o de un simulacro.
- Elaborar y presentar el informe del evento ocurrido.

- Determinar el grado de alerta en el que se debe permanecer mientras se vuelve a la normalidad.
- Coordinar la reiniciación de labores
- Retroalimentar cada uno de los elementos del PPPRAE.

11.3.1 Soporte Operativo: Brigada de Emergencias

Es el grupo de trabajadores capacitados y entrenados para prevenir y controlar los eventos que pueden generar pérdidas económicas y humanas en la empresa.

Para efectos del funcionamiento de la brigada de emergencias en la empresa, se ha establecido la siguiente conformación, con la claridad, que su capacitación y entrenamiento es enfocada desde la perspectiva integral de emergencias, en la cual todos los integrantes deben recibir transversalmente los mismos conocimientos de los tres componentes, en coherencia con el principio del Sistema comando de Incidentes de "*organización modular*":

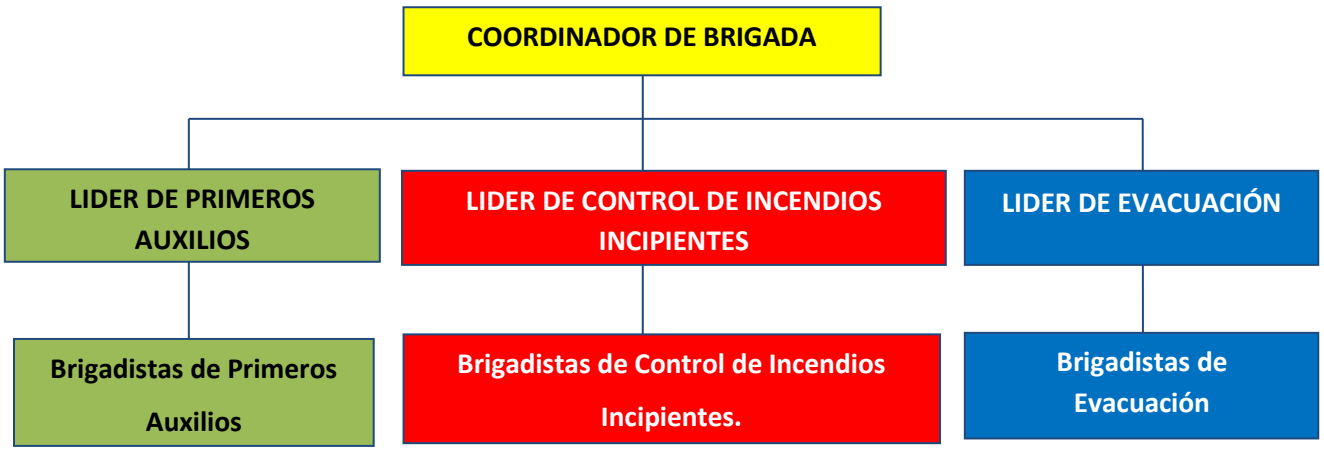

11.3.2 Funciones generales de la brigada de emergencias

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIOS INCIPIENTES		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Inspeccionar periódicamente todas las áreas de la empresa.	Ubicar el área afectada	Inspeccionar el área afectada

GRUPO DE CONTROL DE INCENDIOS INCIPIENTES		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Asistir a las capacitaciones	Evaluar el área afectada	Mantener y reponer equipos y elementos de protección personal utilizados.
Realizar prácticas para mantenerse actualizado	Realizar control del evento	Evaluar la empresa.
Entrenar permanentemente	Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición	Ajustar el procedimiento
Mantener un buen estado físico	Apoyar grupos de Primeros Auxilios y Evacuación	

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Revisar e inventariar los equipos para atención de lesionados.	Ubicar el área del evento	Evaluar la reacción y respuesta
Revisar periódicamente el manual de primeros auxilios	Utilizar elementos necesarios para bioseguridad	Corregir procedimientos
Asistir a capacitaciones y entrenamientos	Evaluar el área y número de pacientes a atender.	Mantener y reponer equipos y elementos de protección personal utilizados.
Entrenar permanentemente	Limitar riesgos para el auxiliador y paciente	
Mantener un buen estado físico.	Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna	
	Atender a los pacientes de acuerdo con recomendaciones del médico y/o profesional de la salud.	
	Transportar al centro de asistencia los pacientes en forma rápida y segura	

GRUPO DE EVACUACIÓN		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
Conocer y dominar los planos, así como toda la empresa.	Informar a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar.	Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final
Conocer vías de evacuación y punto de	Recordar al personal a evacuar los procedimientos.	Verificar el área de trabajo cuando se autorice el

GRUPO DE EVACUACIÓN		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
reunión final		reingreso
Conocer procedimientos para evacuación	Dirigir la evacuación	Dirigir el reingreso del personal del área asignada
Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones	Controlar brotes de pánico y/o histeria	Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones
Discutir y practicar procedimientos	Evitar que los ocupantes se devuelvan	Ajustar plan de evacuación
	Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones	
	Verificar el listado del personal asignado y comunicar al coordinador de la brigada y comandante del incidente.	

12 PLAN DE EVACUACIÓN

El Plan de Evacuación de la empresa son el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que todas las personas presentes en la empresa y que en un momento dado estén inmersas en una de las amenazas o riesgos descritos en el análisis de vulnerabilidad u otros, sean manifestados o materializados, protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares de menos riesgo.

El plan de evacuación de la empresa está:

- Escrito para que permanezca.
- Aprobado para que se institucionalice.
- Publicado para que todos lo conozcan.
- Enviado a todos los trabajadores para ser puesto en práctica y saber cómo actuar frente a una emergencia.
- Publicado en la plataforma que utilizar la empresa para que esté al alcance de todos los trabajadores.

12.1 Objetivos

- Desarrollar una rápida detección, un rápido y adecuado reporte de cualquier

tipo de amenaza que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

- Frente a la detección de una amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal de la empresa, la necesidad de desalojar las instalaciones.
- Garantizar que los ocupantes de las instalaciones se logren poner a salvo de cualquier amenaza que pueda poner en peligro su integridad personal. Esta acción de ponerse a salvo debe hacerse de manera rápida, organizada y tangible.
- Suministrar una metodología rápida y confiable de verificación, en los sitios de reunión, del número de personas evacuadas de la empresa, y si todos los ocupantes lograron salir de ella, en su defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el siniestro.
- Prestar Primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo requieran.
- Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la emergencia INCIPIENTE, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de las personas.
- Mantener un adecuado reporte informativo a trabajadores y comunidad en general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas.
- Dar a conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

12.2 Alarmas

Actualmente la empresa no posee un sistema de alarma general, se utiliza un pito y el timbre de las instalaciones, por ahora se prevé como plan la utilización del sonido de silbatos que dará la voz de alerta, como se presenta a continuación:

- Dos silbatos (continuos, prolongados): Situación de emergencia, situación de alerta para las personas, estar atentos a las instrucciones de la brigada.
- Tres silbatos (prolongados): Preparación y alerta para evacuar, apagar los equipos, recoger las llaves y documentos personales.
- Sonido constante e intermitente: Evacuación inmediata.

12.3 Responsable de activar la Alarma

Según el tipo de emergencias y sus posibles consecuencias, la empresa define como el responsable de activar la alarma al líder de la brigada y los vigilantes con

los que cuenta la empresa, los cuales se encuentran cerca a la activación de la alarma manual.

Si es el caso de utilizar la opción del silbato el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo apoyara junto con los vigilantes y policías.

La Brigada de emergencias, estudiaran según el caso, la necesidad de evacuar o no. En caso de activación del sistema contra incendios y que se supere la capacidad de respuesta, la evacuación será inmediata.

12.4 Frecuencia de Instrucción

Para el personal nuevo, se realizará en el proceso de inducción y para el personal antiguo se realizarán capacitaciones por grupos en sus puestos de trabajo, de manera periódica, mínimo dos veces al año.

Periódicamente el personal antiguo tendrá una sesión teórica práctica, sin salir del área, la cual será dirigida por el responsable SST, brigadistas, apoyo de la ARL o quien tenga UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 y responsabilidades en el tema.

12.5 Fases del Proceso de Alarma

12.5.1 Primera Fase: Detección de la Emergencia

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina la emergencia hasta cuando alguien la reconoce y comprende:

- La clase y origen del Peligro, Riesgo o Amenaza según el análisis de vulnerabilidad.
- El día y la hora: una situación de emergencia en las instalaciones puede presentarse más comúnmente en horas laborables, aunque también podría ocurrir en horas en que la edificación se encuentre sola.

12.5.2 Segunda Fase: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se detecta hasta que se activa y se mantiene sonando la alarma de evacuación. En lo posible, todo el

personal debe tener los conocimientos básicos para identificar los diferentes riesgos o amenazas o en su defecto, conocer la ubicación de las personas que tengan esta capacidad, ellas serán responsables de dar la voz de alarma.

12.5.3 Tercera Fase: Preparación de la Evacuación

Es el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar (se da el accionamiento de la alarma) hasta que empieza a salir el personal.

En este proceso en lo posible se debe:

- Verificar por parte de la brigada y/o jefes, quiénes y/o cuantas personas están en las instalaciones.
- Apagar los equipos con los cuales se está trabajando por parte de cada usuario de equipo.
- Interrumpir el fluido eléctrico de los equipos por parte de cada usuario de equipo.
- Cerrar las puertas sin seguro por parte del personal de seguridad, brigadista designado o última persona que se crea es la que sale.
- Proteger valores, cuando sea posible.
- Recordar las vías de evacuación y el lugar de la reunión final por parte de los brigadistas.

12.5.4 Cuarta Fase: Salida del Personal

Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de las instalaciones hasta el momento en que sale la última. El tiempo dependerá de:

- Distancia por recorrer.
- Número de personas por evacuar.
- Capacidad de las vías

12.6 Procedimiento General para Evacuar las Instalaciones

Luego de dar la señal de alarma se da el desarrollo de los procedimientos tendientes a evacuar el personal y todos los visitantes y de ser posible el control de la situación que la origina.

Las siguientes son las actividades que deberán llevarse a cabo luego de la detección de la emergencia y activación de la alarma, teniendo en cuenta la magnitud del evento:

- Comunicarse con el comandante de incidente y/o Brigada de Emergencias e informar del tipo de evento y el sitio en que se está presentando y quede alerta a recibir las instrucciones pertinentes. Esto lo hace quien lo detecta.
- El Coordinador de la Brigada o brigadista, una vez informado del sitio, se desplaza hasta allí para evaluar la magnitud del peligro, controlar la situación y reportar al comandante de Incidente, en casos extremos, quien decidirá si es necesario evacuar parcial o totalmente.
- En el caso de evacuación general se dará aviso por medio del director de Emergencias o a quien este designe, para que se confirme la activación del sistema de alarma y todo el personal realiza el desplazamiento hacia el sitio de reunión final.
- El comandante de incidente debe comunicarse con el oficial de enlace o personal designado, para dar la orden de iniciar si es necesaria la comunicación con los organismos de socorro correspondientes (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.) y debe mantener despejadas las líneas telefónicas.
- Los demás Coordinadores de Evacuación inician el proceso de preparación para la salida en cada una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de evacuación para desplazarse junto con el personal.
- El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación para la salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la evacuación.
- Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el punto de reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden.
- Una vez en el punto de reunión, cada coordinador de evacuación efectúa el recuento de las personas a su cargo y lo informa al comandante de Incidente.
- Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las instalaciones, el comandante de Incidente lo comunica al personal en el punto de reunión final.

  NOTA: los anteriores procedimientos, se podrán desarrollan de manera alterna, de manera consecuente o no ser desarrollados todos según el tipo de evento y magnitud del mismo.

12.7 Procedimiento para Coordinadores de Evacuación

Los coordinadores evacuación son las personas a las cuales la empresa les ha asignado labores de coordinar y apoyar la evacuación de un área en particular. Al igual que el comandante del Incidente, los Coordinadores de Evacuación también tienen su suplente para garantizar la ejecución del plan en todo momento.

Estos Coordinadores se dan a conocer a toda los trabajadores o contratistas para que, en el momento de la evacuación, se tenga un mejor control y disciplina del evento.

12.7.1 Funciones y Responsabilidades de los Coordinadores de Evacuación

Antes de la emergencia:

- Verificar periódicamente y notificar al comandante de Incidente, los parámetros que condicionan la evacuación de su área.
- Instruir periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de evacuación.
- Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad asignada.

Durante la emergencia:

- Verificar (según lo establecido y hasta donde le sea posible) la veracidad de la alarma.
- Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área.
- Verificar la lista de personas presentes en el área.
- Indicar a todos, la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar.
- Recordar el sitio de reunión final.
- Verificar que el área quede evacuada completamente.
- Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir.
- Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final.
- Reportar al brigadista encargado.

Después de la emergencia:

- Entregar al comandante de incidente un reporte sobre el resultado del

funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad.

- Volver a la normalidad a la mayor brevedad posible.

12.8 Punto de Encuentro

Con el objetivo de garantizar salvaguardar la vida y seguridad del personal evacuado, este deberá ser reunido en una zona segura y alejada lo más y mejor posible del lugar de la emergencia y en un espacio que no implique riesgo para quienes evacuaron y allí se reúnen.

Igualmente se deberá realizar en dicho lugar un conteo del personal evacuado por áreas y según condiciones o estado de salud de los mismos, esto por parte del jefe de área y el encargado o coordinador de evacuación correspondiente.

Los puntos de reunión final establecidos para la empresa:

PUNTO	PERSONAL
Uno	Ubicado afuera de las instalaciones por el ingreso principal.

Los puntos de encuentro serán señalizados y se tendrá la cinta de cierre para las avenidas y las calles, actividad que realizaran los brigadistas antes de evacuar el personal.

12.9 Evacuación de Heridos

En caso de presentarse algún lesionado durante la emergencia o durante el proceso de evacuación, este deberá ser trasladado al sitio de reunión final y de ser necesario, el Coordinador de la Brigada de Emergencia ordenará su traslado a las Instituciones asistenciales establecidas.

A su vez todos los recursos que haya en existencia para la atención de lesionados deben llegar al ACV (Área de Concentración de Víctimas), tales como camillas, botiquines, inmovilizadores, personal de salud, brigadistas de primeros auxilios, etc.

Esta instalación del sistema comando de incidentes, debe ser establecida cerca al punto de encuentro asignado, pero a la espalda de las personas evacuadas con el fin de no generar traumatismos en las personas. Además, esta instalación debe

estar ubicada cerca de vías de acceso para la remisión de lesionados en ambulancia, cuando se requiera.

12.10 Reconteo de Personal

Ya en el punto de encuentro, entre el jefe y el coordinador de evacuación correspondiente, deberán confirmar la cantidad de personas que no lograron evacuar. Para ello las personas se deberán formar por áreas de trabajo, verificando si algún compañero no se encuentre presente, al encontrar alguien faltante se deberá conseguir la mayor información sobre su última ubicación conocida para dar el reporte a los organismos en conjunto con los datos de emergencia (contacto de emergencia, RH, patologías, medicamentos, alergias, EPS, ARL y fobias).

12.11 Protección de Documentos de Interés

Cada responsable de proceso o cargo que considere manejar documentos de interés o alta importancia, en el momento de ser activada la alarma, si estos los tiene cerca, salga con ellos a la mano. En caso de no poderlos sacar, se debe tener en cuenta que por seguridad deben quedarían bajo llave en cada puesto de trabajo. En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger en el lugar destinado o ser llevados por la persona responsable.

12.12 Restablecimiento de Actividades

Luego de los eventos que se planeen como simulacros, la orden de reingreso se efectuará al concluir el proceso de reconteo del personal. Esta orden de reingreso será dada exclusivamente por el director del Comando de Emergencias o la máxima autoridad de la empresa en ese momento.

Ya para casos de eventos con evacuación por emergencias reales, como sismo, incendio o estallido de artefacto explosivo, se deberá esperar las indicaciones de las autoridades competentes, y por ningún motivo se debe reingresar a las instalaciones si no se puede comprobar que es seguro hacerlo por parte de personal de rescate competente.

13 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO DE CONTAGIO

Una vez que se identifique que algún trabajador tiene sospecha o confirmación de la infección, los pasos que seguiremos serán usar mascarilla y cumplir aislamiento en su casa de manera inmediata hasta tener una indicación de su EPS o ARL que permita su retorno de manera presencial, adicionalmente se realizarán las siguientes acciones:

13.1 Casos positivos y sospechosos

13.1.1 Reporte de casos

Ante cada caso de un trabajador con resultado positivo para COVID-19 se reportará el caso a la Secretaría de Salud del municipio y se realizará un cerco epidemiológico identificando cuales trabajadores tuvieron contacto estrecho en los últimos 14 días para que estos también consulten en su EPS.

- Se informará a la ARL de la situación para recibir orientación y seguimiento.
- Se orientará y acompañará a cada trabajador con síntomas para que consulte en su EPS.
- Permanecerá en su casa cada trabajador confirmado o sospechoso durante 14 días mientras no tenga certificado médico que avale su retorno antes de ese periodo.
- Si se confirma un caso para un rol de riesgo se diligenciará el Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral (FUREL) y se enviará a la ARL y EPS.
- Los casos sospechosos y confirmados, tendrán seguimiento diario telefónico por el respectivo líder.
- Cada trabajador confirmado para coronavirus, una vez finalice su incapacidad, entregará las recomendaciones dadas por su médico tratante o EPS para definir las condiciones de reincorporación y la realización de evaluación ocupacional post incapacidad.

14 PLANES OPERATIVOS

Teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad de la empresa y la determinación del nivel de Riesgo se elabora una guía básica la atención de emergencias y los Procedimientos Operativos Normalizados para actuar frente a las amenazas con mayor relevancia.

Procedimientos Operativos Normalizados

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 ha determinado los siguientes PON, Planes Operativos Normalizados, los cuales, son el conjunto de actividades y e instructivos que desarrollarán las diferentes partes de la empresa y que son tendientes a conservar la vida y la seguridad de las personas en el evento de materializarse una amenaza, es decir la ocurrencia de una emergencia. Los procedimientos Operativos Normalizados se elaboraron teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad y determinación del nivel de riesgo de la empresa.

Estos PON son:

14.1 Instrucciones de Convivencia con una persona de alto riesgo


La empresa realizará una validación inicial para asegurarse de que los trabajadores que conviven con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular -Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, cumplan las siguientes medidas.

1. Mantener la distancia al menos de un metro.
2. Utilizar tapabocas en las instalaciones, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo.
3. Aumentar la ventilación de las instalaciones.
4. Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
5. Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de Luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles. juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales los trabajadores tienen contacto constante y directo.
6. La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv).
7. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de las instalaciones o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse,


teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

8. Lavar con regularidad las toallas, etc.


14.2 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Movimiento Sísmico

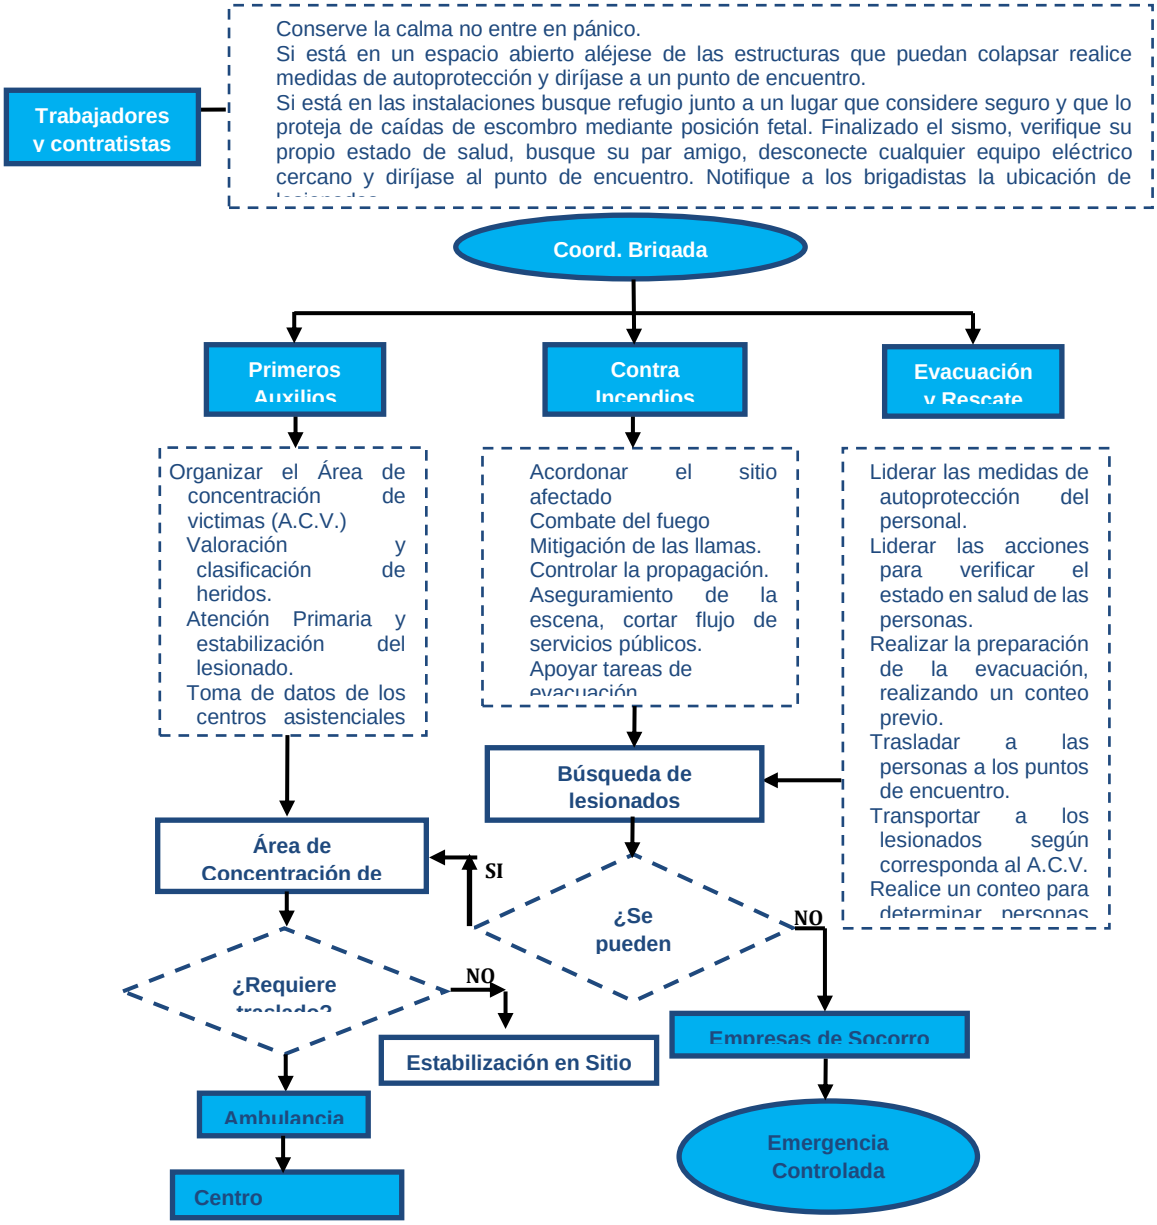


14.3 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Incendio

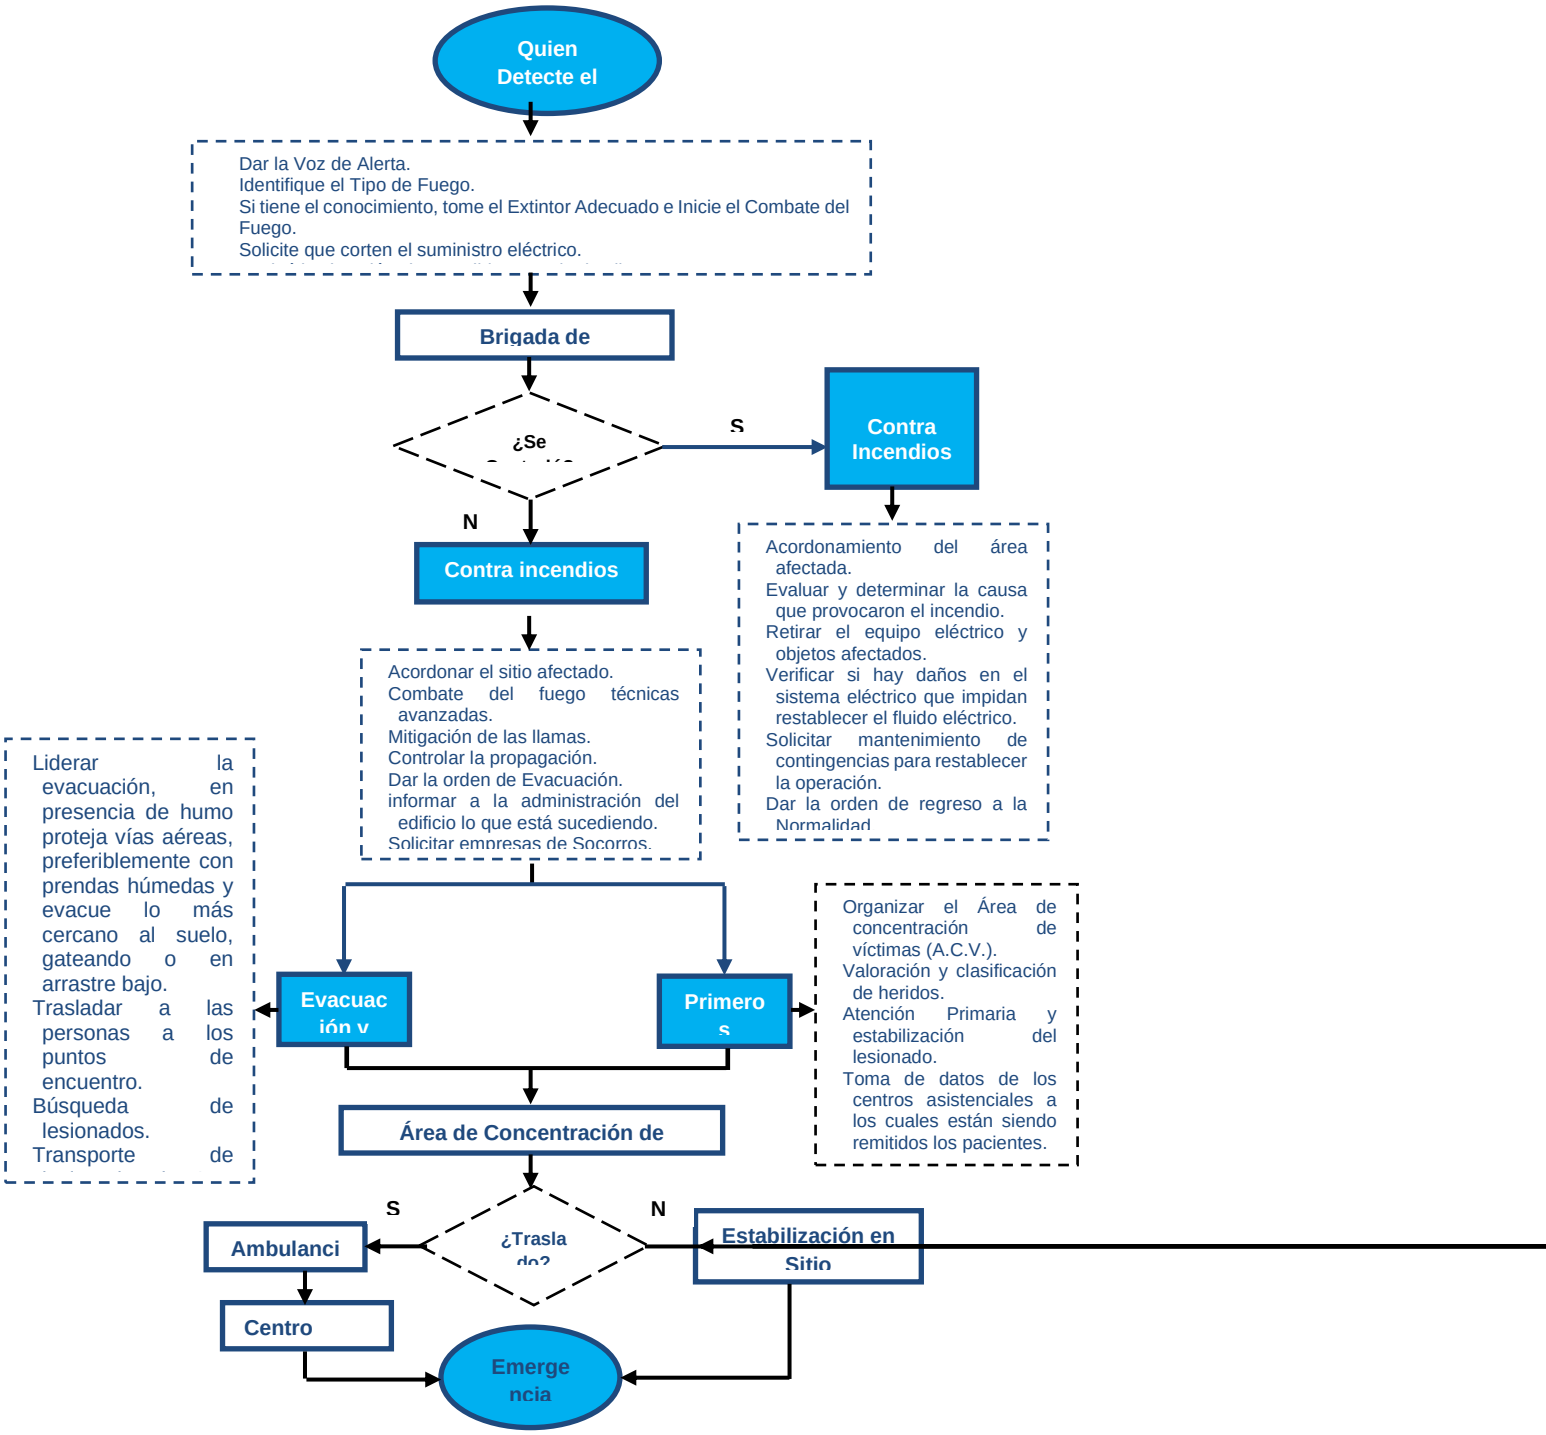

14.4 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Explosión

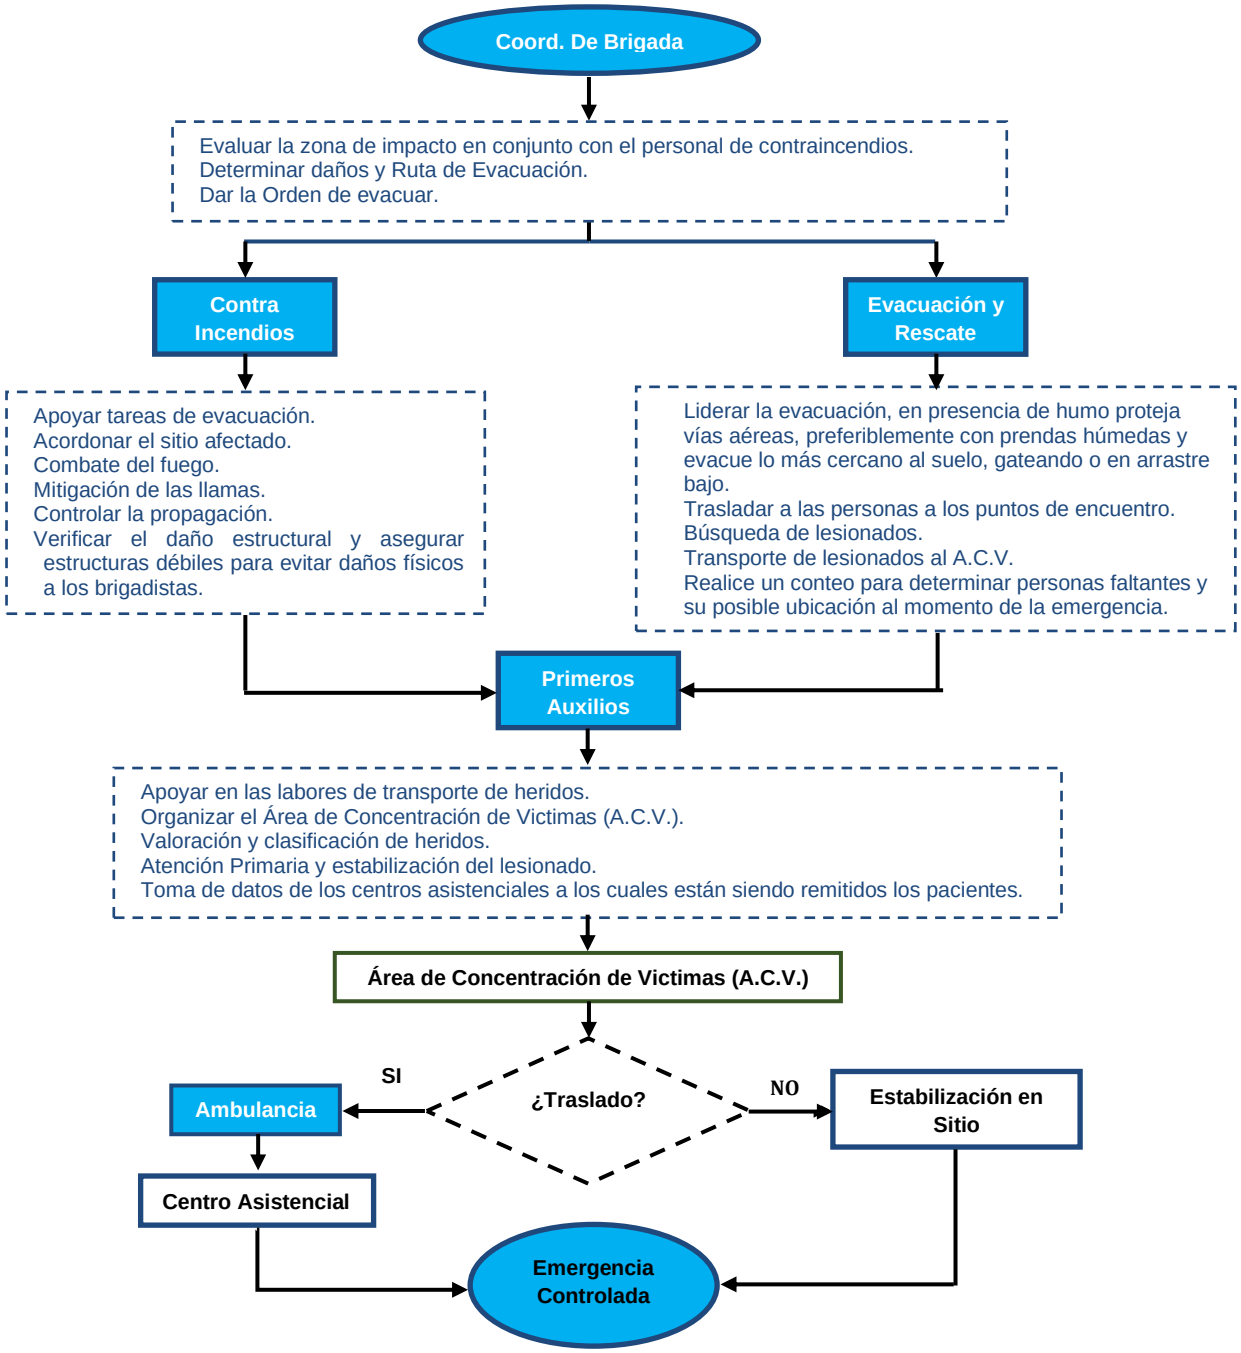

14.5 Procedimiento Operativo Normalizado en Caso de Evacuación

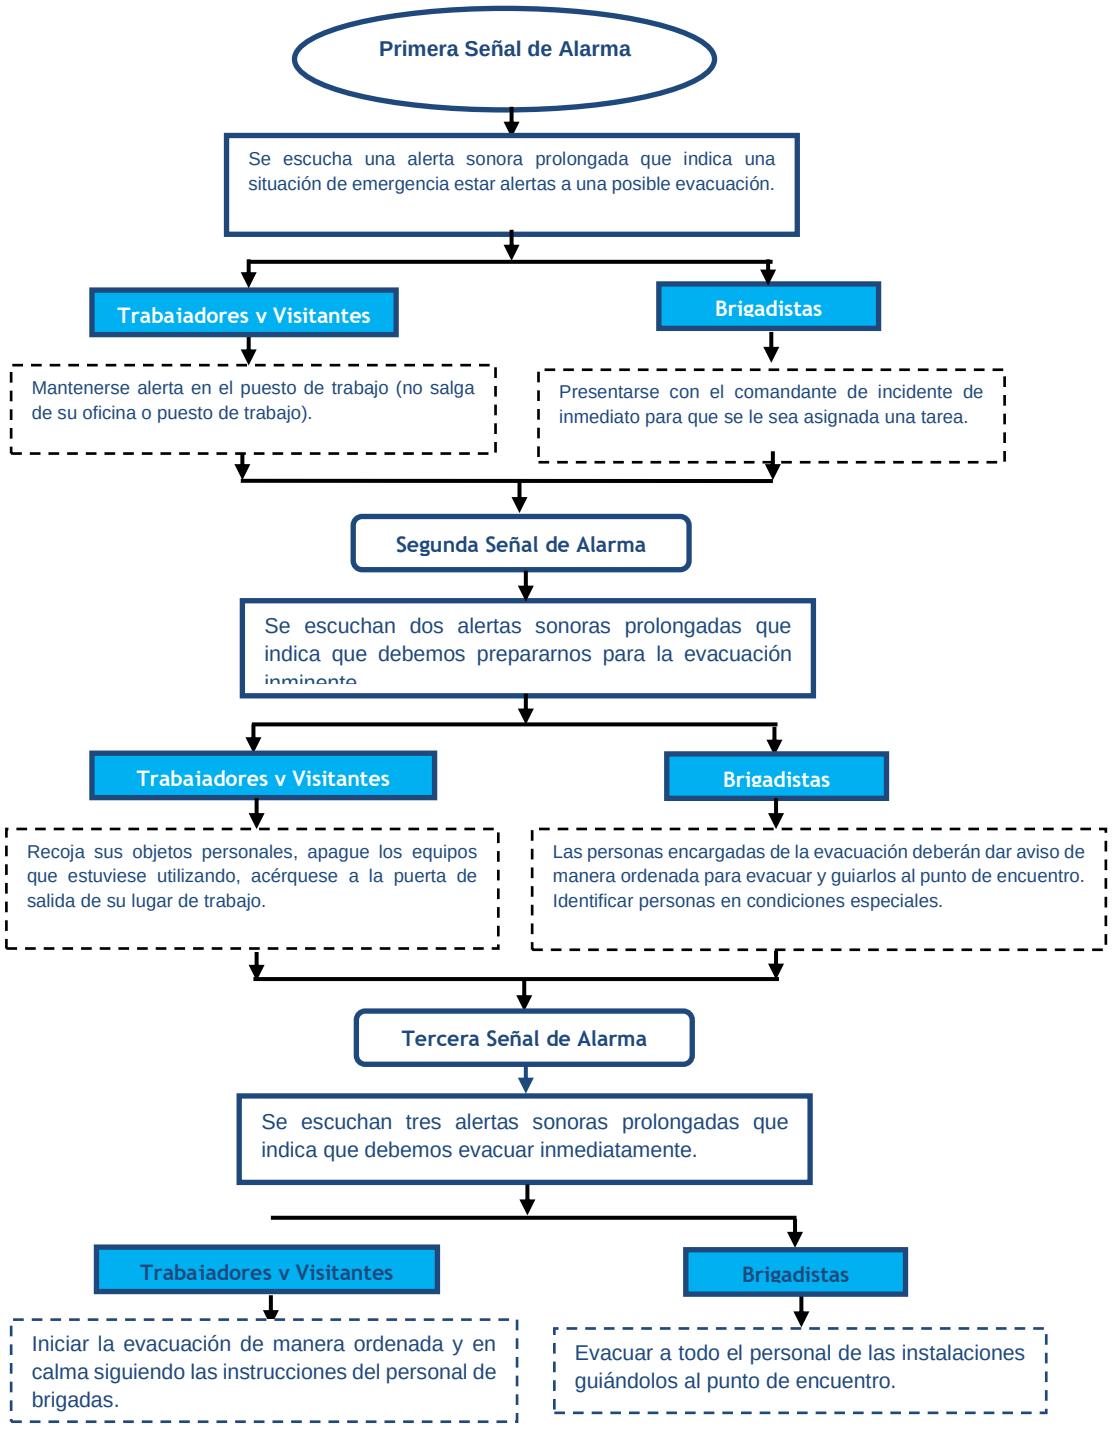

14.6 Otros PON Complementarios

Procedimiento General Operativo en Caso de Emergencia

Las acciones a desarrollar en el ejercicio del control de emergencias, obedecen a un esquema general donde cada uno de los participantes tiene funciones generales cualquiera que sea el escenario de la emergencia y particulares de acuerdo a la naturaleza de la misma:

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
PÚBLICO EN GENERAL	EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA DENTRO DEL AREA EN EL QUE USTED SE ENCUENTRA, USTED DEBE: 👉 Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza 👉 Mantenga la Calma 👉 No grite 👉 No corra precipitadamente 👉 No generar pánico 👉 Identificar al personal de brigadistas 👉 Atender indicaciones de los trabajadores 👉 Atender Indicaciones de las brigadas y de los cuerpos de socorro
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	👉 Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. 👉 Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. 👉 Contactar los organismos de apoyo externo 👉 Dar aviso a ARL, EPS, según la situación.

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	👉 Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. 👉 Ser el único vocero de la empresa 👉 Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. 👉 Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. 👉 Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** 👉 Mantiene contacto con el director de Emergencias, informa respecto a daños en estructuras, presencia de víctimas y riesgos potenciales. 👉 Activa brigada de emergencias. 👉 Determina acciones de control básicas. 👉 Prepara el personal para acciones de evacuación de acuerdo a instrucciones del director de Emergencias. 👉 Solicita activación del Pla de Prevención de Emergencias en caso de necesidad y del Plan de Ayuda mutua. 👉 Evalúa la necesidad de acudir a cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja) o a las brigadas de otros sectores, solicita la asignación de esos recursos y los que considere necesarios. 👉 Evalúa la necesidad de usar los otros recursos de la empresa. **COORDINADORES DE EVACUACION:** 👉 Lideran evacuación de los operarios por área. 👉 Adelanta plan de evacuación.

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	☞ Protege vías de escape. ☞ Identifica Punto de Reunión. ☞ Verifica cumplimiento de normas básicas de evacuación. ☞ Repite consignas de evacuación en forma clara. ☞ Orienta a las personas en la ruta de escape. ☞ Evita pánico. ☞ Vigila Instalaciones. ☞ Realizan el conteo de personal y reportan al director de Emergencias el número de personas que lograron salir. **GRUPO PREVENCIÓN DE INCENDIOS:** ☞ Actúan en combate de conatos de incendio. ☞ Determinan la clase de fuego. ☞ Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de conato de incendio. ☞ Colaboran al cuerpo de bomberos. ☞ Aíslan área del conato. ☞ Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos. ☞ Apoya acciones de evacuación. **GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS:** ☞ Determinan existencia de víctimas. ☞ Aseguran el área y controlan peligros inmediatos. ☞ Adelantan clasificación y valoración de víctimas. ☞ Prestan primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas. ☞ Preparan a las víctimas para evacuación. ☞ Evacúan víctimas de acuerdo al PAEMED (Plan de Emergencias Médicas).

EMERGENCIA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una Emergencia**
	👉 Apoya acciones de búsqueda y rescate. **GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE** 👉 Adelantan búsqueda y localización de víctimas. 👉 Aseguran área de acción y acceden al lugar. 👉 Clasifican las víctimas por su situación. 👉 Contactan y extraen paciente. 👉 Apoya acciones de primeros auxilios.

En caso de EVACUACIÓN DE LESIONADOS se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además tener en cuenta las siguientes acciones:

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
PERSONAL EN GENERAL	**SI EXISTEN LESIONADOS EN LA EMPRESA QUE DEBAN SER EVACUADOS:** 👉 Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y contagiarlo a los demás. 👉 Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones correctas. 👉 Demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 👉 Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 👉 Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que la situación que originó las lesiones pueda agravarse. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS CUERPOS DE AYUDA

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	☞ Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. ☞ Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. ☞ Contactar los organismos de apoyo externo ☞ Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. ☞ Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. ☞ Ser el único vocero de la compañía. ☞ Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. ☞ Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Lidera acciones de primeros auxilios y si es el caso de búsqueda y rescate ☞ Apoya al COPASST y al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación del Accidente de Trabajo (AT) **BRIGADA DE EMERGENCIAS:**

EVACUACION DE LESIONADOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación de lesionados de las instalaciones de la empresa**
	☞ Adelantan procedimientos de contingencia de acuerdo al flujo gramas y protocolos establecidos para cada caso y adelantan acciones de primeros auxilios
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** ☞ Apoya en el traslado de paciente ☞ Adelanta investigación del AT. ☞ Hace seguimiento de la evolución del paciente y su caso. **COMITÉ PARITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST):** ☞ Apoyan al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo en el análisis, investigación y conclusiones del accidente ☞ Hacen seguimiento a las recomendaciones emanadas para controlar el riesgo.

En CASO DE EMERGENCIA AMBIENTAL, se deben seguir los siguientes pasos:

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED SE VE INVOLUCRADO EN DERRAME Y/O FUGAS DE PRODUCTO, DEBE:** ☞ Mantener la calma. ☞ Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. ☞ Notificar al responsable Seguridad y Salud en el Trabajo por medio de supervisores o brigadistas, para la activación del COE.

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
	👉 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria y suspenda el suministro de producto si en su área existen y está capacitado para hacerlo. 👉 Si no tiene capacitación y entrenamiento para el control de fugas y/o derrames retírese inmediatamente del lugar e informe. 👉 En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada puerta. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS DE APOYO.
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	👉 Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. 👉 Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. 👉 Contactar los organismos de apoyo externo 👉 Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. 👉 Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. 👉 Ser el único vocero de la empresa. 👉 Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. 👉 Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. 👉 Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias

EMERGENCIA AMBIENTAL – FUGAS Y DERRAMES QUIMICOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de FUGA Y/O DERRAMES PRODUCTOS QUÍMICOS en los sitios de trabajo o sus alrededores.**
GRUPO MIPE (Grupo de Control de Derrames y Fugas)	👉 Notificar a su jefe inmediato, el a su vez lo hará al responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (por radio o teléfono celular) para la activación del COE. 👉 Si tiene los EPP (Elementos de Protección Personal) que corresponden al grupo de aspersión, bombas y/o pesaje de productos químicos, acordone el área y evacue el personal del área. 👉 Reúna al grupo de aspersión con sus respectivos EPP y pongan en marcha el procedimiento para contención de derrames. 👉 Tomar el control del evento de acuerdo a las hojas de MSDS del producto en fuga o derrame, en caso contrario aléjese del área, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones. 👉 Tenga en cuenta la toxicidad, velocidad de propagación y demás características de los productos a manejar y permita la ventilación del área afectada. 👉 Si se ven involucradas personas con síntomas de intoxicación, proceder a retirarlas del área e iniciar el proceso de descontaminación y atención de la emergencia (Brigadistas)
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** 👉 Determina acciones específicas con el grupo de Primeros Auxilios en caso que se presenten personas afectadas por el suceso.

En caso de AMENAZA TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

AMENAZA TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio.**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE ACCIONES TERRORISTAS, DEBE:** 👉 Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores. 👉 Notificar inmediatamente al responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 👉 Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y obtener la información que pueda orientarle sobre: 👉 Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a trabajadores, ocupación armada, etc.). 👉 Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, etc) 👉 Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, usuarios de la Compañía, empleados o ex empleados, etc.). 👉 Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte a la Coordinación de Gestión Humana. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	👉 Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de emergencias. 👉 Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. 👉 Contactar los organismos de apoyo externo 👉 Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. 👉 Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. 👉 Ser el único vocero de la empresa. 👉 Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución.

AMENAZA TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio.**
	☞ Velar por la imagen de la empresa comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. ☞ Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** ☞ Acopia información respecto a la existencia, ubicación, cantidad, forma etc., de elementos sospechosos o posibles artefactos explosivos ☞ Informa al director de emergencias y/o al director de Seguridad y/o al director de Apoyos. **COORDINADORES DE EVACUACION:** ☞ Lideran los procesos de evacuación. **OTROS GRUPOS:** ☞ Funciones propias del grupo en caso de requerirse. ☞ Acciones de apoyo mutuo intergrupal según plan. ☞ Acciones de búsqueda de artefactos, según criterio de jefe de Brigada.

En caso de ACCIÓN TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
PÚBLICO EN GENERAL	**SI USTED ES VICTIMA O SE VE INVOLUCRADO EN ACCIONES TERRORISTAS, DEBE:** ☞ Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar acciones desesperadas de parte de los autores del hecho. ☞ Evitar la manipulación de cualquier objeto sospechoso. ☞ Notificar si le es posible a la responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
	👉 Deshacerse si es posible, de los documentos que lo vinculen como trabajar de la empresa. 👉 Obedecer las órdenes del personal que está adelantando la acción armada; no contrariarles. 👉 Estar atento a la presencia de otros sujetos que puedan pertenecer al grupo que adelanta la acción. 👉 Prepararse para cubrirse en caso de acción armada por parte de las autoridades. ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DIRECCIÓN DE EMERGENCIA	👉 Verificar la alerta y la situación de emergencia que se presente, Autorizar la activación del sistema de alarma. Poner en marcha el plan de prevención y respuesta ante emergencias. 👉 Establecer comunicación permanente con los integrantes de la Brigada de emergencia, establecer las prioridades de los requerimientos que se hagan por parte de la Brigada. 👉 Contactar los organismos de apoyo externo 👉 Dar aviso a ARL, EPS, según la situación. 👉 Informar a los grupos de apoyo externo las características y desarrollo de la emergencia, su avance o control, al momento de llegada de éstos. 👉 Ser el único vocero de la empresa. 👉 Contactara e informara a los familiares de las victimas sobre su evolución. 👉 Velar por la imagen de la empresa, comunicando las acciones que se han llevado a cabo para el control de la emergencia. 👉 Colaborar en las acciones administrativas de control de emergencias.
BRIGADA DE	**JEFE DE BRIGADA:**

ACCION TERRORISTA	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima o verse involucrado en acciones terroristas**
EMERGENCIAS	👉 Permanece alerta a la evolución de las negociaciones si las hubiese y espera instrucciones del director de Emergencias y/o el director de Seguridad **BRIGADA:** 👉 Permanece alerta a las instrucciones del jefe de Brigada

En caso de INTOXICACION ALIMENTARIA se deben adelantar las acciones consignadas en los procedimientos específicos y además las siguientes acciones:

INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS	
OBJETIVOS	**Establecer Procedimientos estándar en caso de INTOXICACION POR ALIMENTOS**
PÚBLICO EN GENERAL	En Caso de presentar síntomas de Intoxicación alimentaria debe: 👉 Reporte a su jefe inmediato para ser valorado y ser remitido a la IPS en caso de ser necesario.
BRIGADA DE EMERGENCIAS	**JEFE DE BRIGADA:** Copiar información respecto a la ocurrencia de una intoxicación masiva del personal, informa a Seguridad y Salud en el Trabajo. **GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS.** 👉 Estabiliza a los afectados por la intoxicación alimentaria. 👉 Clasifica los pacientes de acuerdo a su gravedad.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	👉 Coordina con las IPS adscritas la atención de los pacientes. 👉 Hace seguimiento a los pacientes remitidos a cada una de las IPS. 👉 Inicia proceso de investigación de las causas que generaron el evento.

15 PLAN DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN

La divulgación del Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias debe ser planeadas y desarrollada en primer lugar por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien determina las estrategias para su divulgación contando con el apoyo

del Comité de Emergencias desde el punto de vista técnico y con la Gerencia de la empresa desde el punto de vista de Compromiso Gerencial.

El trabajador designado como Oficial de Información Pública (comunicaciones) deberá participar activamente en el diseño de las estrategias para tal fin. El sistema de divulgación se desarrollará permanentemente a través de capacitaciones, folletos, afiches, medios electrónicos, audiovisuales o cualquier otro medio que se tenga disponible al interior de la empresa.

15.1 Divulgación Del Plan De Emergencias

Se realizará con las personas de: Brigadas de Emergencias, Coordinadores de Evacuación, Grupos de Apoyo Interno, COPASST, SST, apoyo de la ARL.

Procedimientos Operativos Normalizados para los trabajadores en general que no participan en el control administrativo u operativo de la emergencia y para visitantes frecuentes.

UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 deberá siempre evidenciar las actividades de capacitación y formación mediante registros firmados por quienes reciban las capacitaciones y/o divulgaciones del Plan.

16 CONTACTOS DE EMERGENCIA Y APOYO

LISTA DE APOYO	TELÉFONO
ARL AXA COLPATRIA	#247

EMPRESAES DE EMERGENCIAS	TELÉFONOS
Numero Único de Seguridad y Emergencias -NUSE-	123
Cuerpo Oficial Bomberos	195
Defensa Civil	144
Cruz Roja	132
Policía Metropolitana	112
Ambulancias	132 - 144

EMPRESAES DE EMERGENCIAS	TELÉFONOS
Gas Natural	164
Energía Eléctrica	115

Nota: Estos números son publicados en lugares visibles de la empresa

17 SIMULACROS

Son eventos que le permiten a UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 practicar sus procedimientos de actuación ante una posible emergencia y así saber de manera acertada, cómo actuar en caso de una emergencia real, siguiendo un plan previamente establecido con una serie de procedimientos de seguridad y protección.

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la empresa y le permite evaluar y retroalimentar sus planes.

Es importante que todos los trabajadores, directa e indirecta, contratistas y visitantes, puedan prever una actuación rápida y eficaz para salvaguardar la integridad y salud de las personas, y minimizar los posibles daños a las instalaciones y al medio ambiente.

17.1 Objetivos

- Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.
- Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente.
- Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la empresa, teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y recursos técnicos disponibles.
- Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su entrenamiento.
- Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.
- Promover la difusión del plan entre los trabajadores y prepararlos para afrontar una situación de emergencia.
- Identificar las instituciones que pueden acudir a la empresa, a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.

17.2 Clasificación de los Simulacros

Los simulacros que se planean desarrollar en la empresa se clasifican en dos grupos:

- Simulacros avisados o programados: Cuando todas las personas presentes en la empresa conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.
- Simulacros sorpresivos o no programados: cuando las personas de la empresa no han sido informadas de la actividad. La empresa No desarrolla simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con anterioridad.
- Existen también simulacros de reconocimiento, parciales y totales.

Para realizar un simulacro en la empresa, se tienen en cuenta las siguientes tres fases:

- De planeación de la actividad.
- De ejecución.
- De evaluación.

17.3 Planeación de la actividad

- La actividad que se va a realizar (de acuerdo con la priorización de los riesgos).
- Los recursos humanos y recursos técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.
- Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.
- El área seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras, las puertas de salida, los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.
- La empresa de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.
- El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.
- El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

17.4 Ejecución de la actividad

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad de parte de las personas que participan. Se sugiere dividir esta actividad en varias partes:

- Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.
- Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.
- Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.
- Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.
- Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.
- Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.
- Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles
- Definición de la evacuación y del tipo de evacuación: total o parcial. Orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.
- Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.
- Instalación del centro de atención a los lesionados.
- Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias, si es el caso.
- Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.
- Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

17.5 Evaluación de la actividad

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.

- Pre diseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante: lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc.
- Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro y número de personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.
- Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.
- Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto y qué fallas se presentaron.
- Evaluar el tiempo de la evacuación y si fue óptimo o no, de acuerdo con lo planeado.
- Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán anexadas al Plan.
- Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los trabajadores, no sólo señalando los errores, sino resaltando el acierto.

17.6 Seguimiento y control

Se recomienda realizar los siguientes pasos con el fin de cerrar el ciclo de mejora continua:

- Establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre la eficacia de las medidas de control implementadas.
- Mantener un registro actualizado con la información de todo el proceso.
- Hacer seguimiento y divulgar periódicamente los indicadores de gestión definidos.

UNIÓN TEMPROAL CORREDORES VERDES 2025**,** establecerá un plan de acción, con responsable y fecha de cumplimiento. El plan de acción lo realizará la empresa, dando cumplimiento a las recomendaciones determinadas en el análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad respectivos, con la implementación de acciones correctivas y preventivas.

18 EL PLAN DE EMERGENCIA MÉDICO (PAEMED)

18.1 Objetivo

Suministrar una herramienta básica de reacción ante una Emergencia Médica, para asegurar una atención adecuada, oportuna e inmediata a cualquier persona enferma o lesionada.

18.2 Clasificación

De acuerdo con la severidad, se pueden clasificar las lesiones en: leve (color Verde), moderada (Amarilla) y severa (Roja)

LEVE (VERDE)

Pueden considerarse los siguientes casos:

- Heridas que solo comprometen piel, de extensión mínima.
- Golpes con inflamación y dolor leve, sin alteración de movimiento. Quemaduras Grado I (solo enrojecimiento de la piel), de extensión mínima.
- Estados de salud por enfermedad repentina.
- En general en estos casos los síntomas no comprometen el estado general del paciente.

Atención: Por Brigadista, remisión a Centro Médico según red asistencial ARL o centro más cercano. **Nivel I** o, se solicitará la atención por parte de emergencias del 123.

MODERADA: (AMARILLA)

Ejemplos:

- Heridas con sangrado moderado, el paciente no presenta signos de shock (Palidez, sudoración, mareo, desorientación, desmayo)
- Fracturas óseas cerradas.
- Trauma en cráneo sin deformidad ósea, ni pérdida de conciencia, paciente hablando de forma coordinada (sabe su nombre, que le paso, en donde está, etc.).
- Quemaduras de Segundo Grado (II), en las cuales hay formación de ampolla y no comprometa grandes extensiones.

- Estados de salud por enfermedad repentina.

Atención: Estabilización por Brigadista o por parte de: Emergencias del 123 - se remitirá a Centros de atención Médica de **II Nivel**.

SEVERAS: (ROJO)

Ejemplos:

- Hemorragias severas (sangrado abundante, paciente en shock).
- Amputaciones.
- Politraumatismo (lesión que compromete varias áreas del cuerpo y/o diferentes órganos).
- Sospecha de Trauma abdominal cerrado con ruptura de víscera (dolor abdominal severo, paciente en shock)
- Quemaduras GIII (compromete piel, músculo, el paciente no manifiesta dolor).
- Quemaduras G II extensas o que comprometen articulaciones.
- Fracturas abiertas.
- Sospecha de infarto (dolor en región precordial que se irradia a extremidades superiores, espalda, palidez, sudoración, angustia)
- Trauma cráneo encefálico con cualquiera de los siguientes signos: pérdida de conciencia, vómito, salida de sangre por oídos, persona desorientada, hablando incoherentemente, se observa deformidad en cráneo, herida abierta que compromete hueso.
- Trauma raquimedular (alteración de movimiento, sensibilidad en extremidades)
- Estados de asfixia (secundarios a inhalación de vapores, inmersión, ahogamiento, electrocución)

Atención: Estabilización por Brigadista o por parte de: Emergencias– remitir lo más pronto posible a Centro Asistencial.

Transporte: Ambulancias de ARL o Área Protegida

18.3 Responsabilidades y Funciones

El Plan de Emergencia Médico (PAEMED), es responsabilidad de todas las personas que laboran en un área de trabajo, pero es importante establecer responsabilidades y funciones específicas que repercutan en una mayor agilidad y efectividad del Plan.

18.4 Coordinación General del PAEMED

- Evalúa vulnerabilidad y recursos existentes permanentemente en las instalaciones, y Oficinas.
- Genera y actualiza según necesidades el Plan de Emergencia (PAEMED).
- Supervisa y asesora la conformación y funcionamiento de los Planes de Emergencia (PAEMED), en cada centro de trabajo.
- Divulga el Plan de Emergencia Médica y aclara dudas sobre el mismo.
- Identifica necesidades de Capacitación y coordina la programación de estas.
- Apoya a la Brigada de Primeros Auxilios.
- Recibe la información para orientar sobre acciones a seguir en caso de Emergencia.
- Apoya la coordinación de servicios con Instituciones de Salud.
- Participa en Simulacros para evaluar la viabilidad y efectividad del Plan.
- Verifica y audita el servicio (interno y externo) proporcionado en caso de emergencia.
- Revisa la actividad de convenios de EPS y ARL con las Instituciones de Salud, para mantener vigente el PAEMED.
- Coordina convenios necesarios con ARL POSITIVA
- Hace visitas de reconocimiento a Instituciones nuevas, que sean consideradas como alternativa de atención, para incluirlas en el Plan de Emergencia.
- Estudia posibilidades de convenios con empresas de apoyo, para el PAEMED

18.5 Directores, subdirectores o Jefe de Área

- Conocer el PAEMED, la organización local del mismo y las actividades de preparación.
- Supervisa la organización Local del PAEMED.
- Esta actualizado sobre las modificaciones que se hagan al Plan.

- Tiene la capacidad de intervenir directamente en caso de activación del PAEMED, haciendo el enlace con el Plan de Contingencia.
- Apoya desde el punto de vista logístico al coordinador local del PAEMED.
- Colabora en la divulgación general del Plan de Emergencia Médica (capacitaciones, simulacros, etc.)
- Participa en la evaluación del evento y la activación del PAEMED.
- Participa en la formación o selección de la Brigada de Emergencias y motiva a la misma para que sea activa.

18.6 Brigada De Emergencias (Primeros Auxilios)

La empresa actualmente cuenta con una Brigada Integral, la cual es un apoyo fundamental en el Plan de Emergencias, se identificará con con brazalete y tendrá escrito “BRIGADISTA” según corresponda.

Las funciones de esta Brigada se pueden clasificar de acuerdo a las etapas relacionadas con la Emergencia así:

Etapa Preventiva: (antes del evento)

- Conoce y divulga el Plan de Emergencias Médicas.
- Se capacita periódicamente (temas que se deben programar: actitud ante una emergencia, manejo del Botiquín, Signos Vitales, Reanimación Cardio Pulmonar, Curaciones, Hemorragias y heridas, Quemaduras, Fracturas, Inmovilización y transporte, tipos de incendios y control, evacuación, entre otros).
- Está pendiente de las actualizaciones de los mapas con la ubicación de Botiquines, camillas y equipos para emergencias.
- Apoya en la dotación de Botiquines y control del manejo (registros)
- Procura el mantenimiento de la dotación para una mejor atención (Camillas, equipos, sistemas etc.)
- Se comunica periódicamente con el Coordinador general del PAEMED, para sugerir actividades y simulacros.

Etapa Operativa (en el evento)

- Activa y responde a la alarma de manera Rápida, tranquila y segura.

- Se identifica como Brigadista ante el paciente y las demás personas.
- Aplica permanentemente las normas de bioseguridad.
- Alista y transporta el equipo, para atención (según) el evento.
- Atiende los lesionados, aplicando los conocimientos adquiridos durante su capacitación mientras llega la enfermera o el médico de Área Protegida
- Clasifica los lesionados de acuerdo a la severidad de la lesión (Triage) y colabora en la remisión, a (EPS – ARL)
- Apoya al coordinador del PAEMED.
- Colabora con la ayuda externa, de ser necesario.

Etapa Evaluativa

- Informa para la reposición del material y equipo utilizado.
- Participa en la evaluación local del evento (elaboración de informe)

18.7 Grupo de Seguridad Física

- Colabora con el ingreso y salida del grupo de atención.
- Apoya al Médico o a la Brigada de Primeros Auxilios.
- Mantiene despejada el área de curiosos y las vías de acceso a la empresa.
- Si el área del siniestro es considerada de riesgo, coordina con la policía o las Fuerzas Militares el aseguramiento de la zona, para facilitar y autorizar los desplazamientos.

18.8 Personal General de la empresa

- Conocer el PAEMED
- En caso de estar en una Emergencia, avisar rápidamente al jefe inmediato para activar el PAEMED.
- Identificar al Brigadista más cercano e informarle del siniestro.
- Identificar los sistemas de alarmas y su funcionamiento.
- Conocer la ubicación de los Botiquines, camillas y equipos para emergencia.
- Colaborar con las Brigadas, siguiendo las instrucciones de manera ordenada, sin interferir o retardando la acción.

- Si no tiene capacitación adecuada para atender al lesionado prestando un primer auxilio, espere al Brigadista.

18.9 Área de Triage

Es el lugar destinado para la clasificación y atención de heridos, para esto se ha destinado.

Bienestar Institucional – Auditorios.

18.10 Rutas de Desplazamiento Interno

Las rutas de desplazamiento interno serán, las mismas de evacuación las cuales estarán señalizadas y despejadas, también se identificarán en el plano de evacuación.

18.11 Rutas de Desplazamiento Externo

Son las rutas utilizadas para trasladar a los lesionados hasta los centros asistenciales identificados en la Red Asistencial. Por rutas principales y alternas, como información de apoyo, teniendo en cuanta la movilidad que actualmente presenta la ciudad.

19 EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

- Mínimo una vez al año se reunirán la alta dirección, donde deberán evaluar, revisar y ajustar actualizaciones, independientemente que se haya presentado emergencias o no.
- Extraordinariamente o con presencia de un evento, se harán los ajustes necesarios que sean exigidos por una situación específica dada.
- El responsable SST y/o Coordinador de la brigada de emergencias, dará a conocer los resultados de evaluaciones, cambios y/o ajustes que se realicen, ante toda la empresa.
- La brigada de emergencias se deberá reunir por lo menos una vez cada semestre para establecer acciones de seguimiento al plan y sus componentes de tal manera que se puedan generar acciones de mejora.

Estas reuniones quedarán establecidas en un acta con lo hablado, lo acordado, responsables, recursos y fechas.

ANEXO 13. PLAN DE CALIDAD

ANEXO 14. PLAN DE TRABAJO SST

UT Corredores Verdes 2025	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Código: SST-PL-01**
		Versión: 01
	PLAN DE TRABAJO ANUAL	**Fecha: 22/08/2025**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	**2/01/2026**

Convenciones:	SST: Seguridad y Salud en el Trabajo; SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo F: Recursos Financieros, T: Recursos Técnicos y H: Recursos Humanos.	PROGRAMADO: P	CANCELADO: C	EJECUTADO: E

OBJETIVO DEL SG-SST	Prevenir y mitigar los incidentes, accidentes y aparición de enfermedades laborales, a través de la gestión de los peligros y riesgos mediante el establecimiento de una metodología adecuada para la identificación de peligros y valoración de los riesgos que permita priorizar y establecer controles. Evitar la ocurrencia de eventos que puedan afectar a las personas, equipos e instalaciones de la empresa, mediante la aplicación de actividades en promoción y prevención, así como en el establecimiento de procedimientos, programas, protocolos, planes y demás lineamientos necesarios para la seguridad y salud en el trabajo.
ALCANCE	1. PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: COPASST SST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 4. PLAN DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.
METAS	Cumplir con el mantenimiento del SG-SST, Diseño, Documentacion y Actualización; para la vigencia 2026. Planificación de actividades para el año 2026 en la que se incluye entre otras la definición de la matriz legal y presupuesto.

GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	1. Marque con una X segun corresponda en las casillas de los recursos si para ejecutar dicha actividad requiere un recurso F: financiero, asignacion que tambien se realiza en la designación presupuestal de la empresa, en el cual se contempla las inversiones económicas de los aspectos descritos en el presente plan de trabajo y otros que la empresa identifica para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; Recurso T: Técnico: Contemplan aspectos de inversión en equipos utilizados y su mantenimiento, en el marco de la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. y el Recurso H: Humano: Contemplan aspectos de implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás funciones directas en la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual pueden estar relacionadas las siguientes personas: * COPASST * Miembros del Comité de Convivencia Laboral. * Miembros de la Brigada de emergencia. * Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Los recursos seran solicitados de acuerdo a las funciones y competencias de cada trabajador al interior de la empresa. 2. El seguimiento y verificación del cumplimiento del plan de trabajo anual se realizara de forma semestral, con participación del COPASST; el registro del seguimiento quedará en actas de reunion del COPASST, informes de avances (gestión y/o rendición de cuentas), revisión por la dirección, auditorias y/o actas de reunion del asesor externo. 3. Las actividades establecidas en el Plan de Trabajo, incluyen a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y sus centros de trabajo si los hubiera

ACTIVIDADES	RECURSOS			RESPONSABLES EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	PLAN DE TRABAJO AÑO 2026			
	F	T	H			FEBRERO			
						1	2	3	4
Revisión y actualización de la información documentada, incluyendo planes, programas, manuales y demás documentos necesarios para la implementación del SG-SST.	X	X	X	Representante Legal -Asesor externo	Dar inicio a la revisón de la ducumentacion acorde a la empresa.	P			
						E			
Validación del estado de afiliaciones sin importar la forma de vinculación		X	X	Asesor externo	Descargar reporte mensual de afiliados (Dependientes e Independientes)	P			
						E			
Apoyar las reuniones mensuales del COPASST		X	X	Responsable del SG-SST	Apoyar las reuniones mensuales del Comité y el seguimiento a compromisos.				P
									E
Apoyo a reuniones del Comité de Convivencia Laboral		X	X	Responsable del SG-SST	Apoyo a las reuniones del comité y seguimiento al compromiso.				p
									E

OBJETIVO DEL SG-SST	Evitar la ocurrencia de eventos que puedan afectar a las personas, equipos e instalaciones de la empresa mediante la aplicación de actividades en promoción y prevención, así como en el establecimiento de procedimientos, programas, protocolos, planes y demás lineamientos necesarios para la seguridad y salud en el trabajo. Promover la seguridad y salud en el trabajo en la empresa a través de la ejecución de actividades en medicina preventiva que permita adquirir hábitos y estilos de vida saludable que aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores.
ALCANCE	PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACION Y ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVENCIÓN EN RIESGO PSICOSOCIAL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

METAS	Cumplir con las inspecciones programadas en el programa de inspecciones y adelantar las acciones resultado de estas. Realizar el 100% de las investigaciones de los accidentes o incidentes que se presenten, igualmente analizar, hacer seguimiento y gestión de las enfermedades laborales que se lleguen a detectar y hacer seguimiento a los trabajadores que tienen restricciones. Controlando la accidentalidad a cero. Realizar los mantenimientos necesarios para la operatividad de los procesos y la seguridad de los trabajadores. Desarrollar las actividades enfocadas a la promoción y prevención Promover en los trabajadores el Autocuidado Promover el ambiente sano y la convivencia laboral.
GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	Para el cumplimiento de este objetivo se tendran en cuenta las generalidades establecidas para el objetivo anterior, igualmente se contará con el apoyo del COPASST para la ejecución de estas. Los examenes ocupacionales son aplicados al personal vinculado directamente a la empresa cuando ingresa por primera vez, de forma bianual se aplicaran examenes de periodicos.

ACTIVIDADES	**RECURSOS**			**RESPONSABLES EJECUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**PLAN DE TRABAJO AÑO 2026**			
						FEBRERO			
	F	**T**	**H**			1	2	3	4
Inspecciones de condiciones de seguridad		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección con participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST				**P**
									E
Inspecciones lista de chequeo inspecciones a extintores y botiquin		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección con participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST			**P**	
								E	
Inspeccion a Vehículos y/o volquetas		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST	Se deben ejecutar las inspecciones conforme el programa de inspección			**P**	

Inspección a vehículos y/o volquetas		X	X	SST	con participación del COPASST SST y/o Responsable del SG-SST			E	
Apoyo en la gestión para exámenes ocupacionales y validación de resultados.	X	X	X	Representante Legal	Se aplicaran los examenes que se evidencien en el profesiograma				P
									E
Analisis y seguimiento de casos ingresados en manual de rehabilitación: Restricciones, recomendaciones y reubicación		X	X	Responsable del SG-SST y COPASST SST	Analisis y seguimiento de casos con restricciones, rreubicación de personal		P		
							E		
Socialización de los resultados de condiciones de salud de acuerdo a los resultados de examanes ocupacionales		X	X	Responsable del SG-SST	Cuando se tengan los resultados de los examenes se deben compartir con los trabajadores y hacer seguimiento a estos para la toma de acciones hacer seguimiento a las recomendaciones medicas (control de tension arterial,				P
									E
Apoyo en el proceso de entrega de dotación y de elementos de protección personal.	X	X	X	Representante Legal	La empresa entrega la dotación conforme la normatividad				P
									E

OBJETIVO DEL SG-SST	Fortalecer, promover, comunicar y sensibilizar los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, manteniendo comunicación constante y veraz con los trabajadores, contratista, comunidad y demás partes interesadas de la empresa.
ALCANCE	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN:COPASST Y COVILA PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
METAS	Realizar las CAPACITACIONES con participación de los trabajadores de la empresa, incluyento contratistas. Ejecutar la Inducción y Reinducción Lograr la toma de conciencia por parte de los trabajadores a través de la ejecución de las actividades.
GENERALIDADES DEL PLAN DE TRABAJO	Para el cumplimiento de este objetivo se tendran en cuenta las generalidades establecidas para el objetivo anterior, igualmente se contará con el apoyo del COPASST para la ejecución de estas.

ACTIVIDADES	**RECURSOS**			**RESPONSABLES EJECUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**PLAN DE TRABAJO AÑO 2026**			
	F	**T**	**H**			**FEBRERO**			
						1	2	3	4
Socialización de formatos y forma de reportar actos y		X	X	Responsable del SG-SST	Incluir en la inducción la entrega y socialización para el reporte de actos y	P			

condiciones inseguras.		X	X	Responsable del SG-SST	socialización para el reporte de actos y condiciones inseguras.	E			
Realizar inducción o reinducción de SST y evaluación de eficacia de la inducción	X	X	X	Responsable del SG-SST	Se debe incluir en la inducción o reinducción los peligros a los que se expone el trabajador. Se desarrollara uno para el primer trimestre y se seguiran ejecutando de acuerdo a la necesidad.		P		
							E		
Capacitación en identificación de peligros y riesgos. Realización de Inspecciones e investigación de Accidentes.	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	La capacitación enfocada ayudar a la identificación de peligros , investigacion de accidentes.		P		
							E		
Uso de Señalización y Control del Tránsito en actividades a nivel de via.	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	Formar al personal en el correcto uso de señales preventivas, conos, barreras y elementos reflectivos, garantizando la protección de los trabajadores y de los usuarios de la vía durante la ejecución de las actividades.		P		
							E		
Capacitación en Riesgo Biológico	X	X	X	COPASST SST- responsable del SG-SST	Sensibilizar al personal sobre los riesgos asociados a la posible presencia de insectos, avispas, serpientes y microorganismos presentes en tierra y vegetación, así como las medidas de prevención			P	
								E	

	FEBRERO
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**16**
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS	**16**
CUMPLIMIENTO MES A MES	**100%**
CUMPLIMIENTO ANUAL	**TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

Danny Surelly Parra Lizcano		
ELABORÓ		**APROBÓ**
DANNY SURELLY PARRA LIZCANO		**EDISON RAMIRO CASTRO**
INSPECTORA HSEQ		REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 15. LISTADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE OBRA

ADMINISTRATIVOS

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	DIRECCION	CORREO	CELULAR	EPS	AFP	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO	13719287	Residente de obra	CALLE 11 AN 5 108 BARRIO EL BOSQUE NAPOLES	lfsuadel@hotmail.com	3115105923	Sanitas	protección	1423500	24/12/2025	28/02/2026
2	José Alexander Salazar Goyeneche	13928770	Profesional Ambiental	Avenida 8 # 9-185 MZ D Casa D4 Conjunto Pinares	aleksalaz@hotmail.com	3112813737	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	24/12/2025	
3	JESUS ALBEIRO GUTIERREZ PEÑARANDA	13195283	Tecnologo agropecuari	CALLE 29 15 40 VISTA HERMOSA VILLAROSARIO	jalbeiro55@hotmail.com	3133960831	Sanitas	Colpensiones	1423500	24/12/2025	
4	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO	1096952550	Director de Obra	Conjunto Sanara House CASA H185- Cúcuta	angelajaimes88@gmail.com	3145353086	Nueva EPS	Porvenir	1423500	24/12/2025	28/02/2026
5	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL	1096249395	Inpsector HSEQ	CALLE 25 Nª 11-40 BELLAVISTA	linamark12@hotmail.com	3158849134	Nueva EPS	Porvenir	1423500	24/12/2025	28/02/2026
6	CASTRO HERNANDEZ EDINSON RAMIRO	1090379197	REPRESENTANTE LEGA	Casa G4 conjunto venetto club house	Edcas06@gmail.com	3022716357	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	20/12/2025	
7	Ariana Prhistley Hernandez Bohorquez	1090461423	ARQUITECTA	calle 1n #16e-02 conjunto parque real	Arianahboho@gmail.com	3102955002	Nueva EPS	Porvenir	1423500	29/12/2025	
8	Cuadros Aguirre Diego Eduardo	88032705	Director de obra	Calle 11AN # 11AE-68 Conjunto Torres del centenario	diegocuadrosaguirre@gmail.com	3134612258	Sanitas	Porvenir	1750905	2/02/2026	
9	Darlin Yeritza Martinez Martinez	1093779650	Residente de obra	Calle 25 # 11-40 b. bellavista	darlinmm17@gmail.com	3108624689	Sanitas	Porvenir	1750905	2/02/2026	
10	Danny Surelly Parra Lizcano	1094276397	Inpsector HSEQ	Calle 4 # 8-54 Urb. Los Naranjos Cucutilla	parra_su@hotmail.com	3175933914	Nueva EPS	Colpensiones	1750905	2/02/2026	

OPERATIVOS

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	DIRECCION	CORREO	CELULAR	EPS	AFP	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	JARDINERO	Manzana e lote 20 nora puyana chinácota	juanmfernandez850@gmail.com	3224069402	Nueva EPS	Colpensiones	1423500	29/12/2025	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	JARDINERO	Fca Monteverde KM 3 vda mansanares, Chinácota N de S	alanrea95@gmail.com	3143851338	Sanitas	Porvenir	1423500	29/12/2025	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	JARDINERO	kdx 13 vda san isidro Cucuta	juanmigar275@gmail.com	3224679274	Sanitas	protección	1423500	29/12/2025	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	JARDINERO	BARRIO NOHORA PUYANA MANZANA A CASA 7-CHINACOTA	miguelhumbertotoloza@gmail.com	3148896649	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	JARDINERO	manzana f casa 8 barrio 4 julio chinacota	freddybenitez903@gmail.com	3208336066	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	JARDINERO	cra 8 # 4an-10 Chinacota	luiskarloz1991@gmail.com	3169660898	Nueva EPS	Porvenir	1423500	30/12/2025	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	JARDINERO	Crra 10 #14-27 La Palmita Villa Rosario	Samueljosemartinezgonzales@gm	3124946568	Nueva EPS	Proteccion	1750905	5/01/2026	
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	JARDINERO	barrio 4 de julio manzana M Chinacota	Danaty950@hotmail.com	3224635357	Coosalud	Porvenir	1750905	5/01/2026	
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	JARDINERO	Crra 10 #14-27 La Palmita Villa Rosario	Villalbafreddy@gmail.com	3171730511	Coosalud	Proteccion	1750905	5/01/2026	
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	JARDINERO	Carrera 13 8.87 barrio gramalote VR	luisgarridorivas.2024@gmail.com	3212732089	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	JARDINERO	calle 11 #10-43 B. El Paramo VR	wilmertorres205@gmail.com	3232116996	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCOURT	1092386993	JARDINERO	Carrera 13 8.87 barrio gramalote VR	usecheyunior54@gmail.com	3214223259	Nueva EPS	Porvenir	1750905	23/01/2026	
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	JARDINERO	Av 2 # 31 -51 B. La CORDIALIDAD LOS PATIOS	yovanimandon@gmail.com	3045399473	Nueva EPS	Porvenir	1750905	6/02/2026	28/02/2026
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	JARDINERO	Calle 19#6A -20 B. 11 DE NOVIEMBRE	juanlamus216@gamil.com	3180936578	Coosalud	Porvenir	1750905	7/02/2026	28/02/2026
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	JARDINERO	Manzana 31 Lote 2 Sector Atalaya Palmera parte alta	Vidaljunior56@gmail.com	3204092987	Nueva EPS	Proteccion	1750905	7/02/2026	
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	JARDINERO	Av 3 #7-51 la victoria atalaya	monterosampayo@gmail.com	3164579517	Sanitas	Proteccion	1750905	10/02/2026	
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	JARDINERO	CALLE 22 #4-26 OSPINA PEREZ	santionate54@hotmail.com	3249839504	Coosalud	Proteccion	1750905	12/02/2026	
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	JARDINERO	CALLE 18 av 4 OSPINA PEREZ	ludaloes@gmail.com	3123060955	Nueva EPS	Colpensiones	1750905	12/02/2026	
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	JARDINERO	Calle 20 64-16 B. El Progreso	rubendariovillan0@gmail.com		Nueva EPS	Porvenir	1750905	17/02/2026	

ANEXO 16. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE OBRA

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 02 de febrero al 08 de febrero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCO	1092386993	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	Ayudante					Ingreso	✓	
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	Ayudante						Ingreso	
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	Ayudante						Ingreso	
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	Ayudante							
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	Ayudante							
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	Ayudante							
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	Ayudante							
20										
21										
22										
23										
24										

Alan Kenny Lopez

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 09 de febrero al 15 de febrero 2026

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCO	1092386993	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88262209	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	Ayudante		Ingreso	✓	✓	✓	✓	
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	Ayudante				Ingreso	✓	✓	
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	Ayudante				Ingreso.	✓	✓	
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	Ayudante							
20										
21										
22										
23										
24										

Alan Kenny Lopez

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia: 16 de febrero al 22 de febrero 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCO	1092386993	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	Ayudante		Ingreso	✓	✓	✓	✓	
20										
21										
22										
23										
24										

Alan Kenny Lopez

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

UT Corredores Verdes 2025

CONTROL DIARIO PERSONAL DE OBRA

Control de asistencia 23 de Febrero al 28 de Febrero. 2026

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	Cargo	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
1	JUAN MANUEL FERNANDEZ JAUREGUI	1005066478	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ	1090177446	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	JUAN MIGUEL GARAVITO RAMIREZ	1093144012	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	MIGUEL HUMBERTO DIAZ TOLOZA	1090176560	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	FREDDY ALONSO BENITEZ CARVAJAL	1090174911	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	LUIS CARLOS CAÑAS PEÑARANDA	1090175835	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	SAMUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ	PPT 7143344	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ISMAEL MEJIA CAICEDO	88001405	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	FREDDY JESUS VILLALBA MATA	PPT 6914058	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	LUIS JOSE GARRIDO RIVAS	PPT 5330612	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	WILMER ALEXANDER TORRES GALINDO	1092342880	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	JUNIOR ALEXANDER USECHE BETANCO	1092386993	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	Retiro.	
14	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	Retiro	
15	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL	PPT 6236792	Ayudante							
16	SILFRED MONTERO SAMPAYO	19773673	Ayudante							
17	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	13497841	Ayudante							
18	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES	13505985	Ayudante							
19	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ	13277198	Ayudante							
20										
21										
22										
23										
24										

Alan Kenny Lopez

ALAN KENNY LOPEZ RAMIREZ

CC. 1090177446

AYUDANTE ENCARGADO DE LA ASISTENCIA

ANEXO 17. EXÁMENES DE INGRESO

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 31/01/2026 HORA 08:49:31 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE

CC : 88032705 **DE** PAMPLONA

CARGO DIRECTOR DE OBRA

DIRECCION AV 1 # 45-64 EL PÓRTICO

TELEFONO 313 4612258 **EDAD** 43 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** SANITAS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	SI		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE RIESGO BIOMECANICO, FISICO Y TRABAJO SEGURO APLICACION DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA EN EL SG-SST. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE,

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

FEDERICO MIGUEL MARQUEZ H.
C.C. 8724372
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 6998 - LICENCIA S.O.1832

DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE
CC : 88032705

880327053112026


CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 31/01/2026 HORA 08:22:03 **CUCUTA - N. DE SDER.**

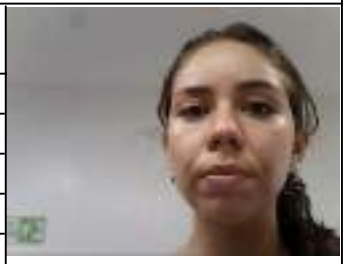

EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ

CC : 1093779650 **DE** PATIOS

CARGO INSPECTOR HSEQ

DIRECCION MANZANA 51 LOTE 22 BARRIO CLARET

TELEFONO NO TIENE - 3108624689 **EDAD** 30 **GENERO** F **RH** O+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** SANITAS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	SI		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS,

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

FEDERICO MIGUEL MARQUEZ H.
C.C. 8724372
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 6998 - LICENCIA S.O.1832

DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ
CC : 1093779650

*1093779650311202

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 31/01/2026 HORA 08:53:47 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE DANNY SURELLY PARRA LIZCANO

CC : 1094276397 **DE** PAMPLONA

CARGO RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION CALLE 4 # 8-54 URB. LOS NARANJOS CUCUTILLA

TELEFONO 3175933914 **EDAD** 30 **GENERO** F **RH** O+

A.F.P. COLPENSIONES **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	NO	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	SI		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE RIESGO BIOMECANICO, FISICO Y TRABAJO SEGURO APLICACION DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA LA REALIZACION DE LAS TAREAS. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LA EMPRESA EN EL SG-SST. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE,

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

FEDERICO MIGUEL MARQUEZ H.
C.C. 8724372
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 6998 - LICENCIA S.O.1832

DANNY SURELLY PARRA LIZCANO
CC : 1094276397

*1094276397311202

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 11/02/2026 HORA 11:39:35 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ

CC : 13497841 **DE** CUCUTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION CALLE 22 #4-26 BARRIO OSPINA PEREZ

TELEFONO 3249839504 **EDAD** 56 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. PROTECCION **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** COOSALUD

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : - CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

REMITIDO A EPS : SI; ENTREGA DE REMISIÓN A EPS : SI

RECOMENDACIONES : SI REALIZA MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE FLEXOEXTENSIÓN O POSTURAS PROLONGADAS DE COLUMNA LUMBAR > 2 HORAS, REALICE PAUSAS ACTIVAS COMPENSADORAS. EVITAR MOVIMIENTOS DE HIPERFLEXOEXTENSION O HIPERROTACIÓN LUMBAR ASOCIADO A MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS HASTA 15 KG; PARA PESOS SUPERIORES USAR AYUDAS MECÁNICAS O HUMANAS. ENFÁSIS EN ADECUADA HIGIENE Y CAMBIOS POSTURALES

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

RUBY LOZADA

RUBY LORENA LOZADA MUÑOZ
C.C. 1030643060
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1030643060 - LICENCIA S.O.1359

ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ
CC : 13497841

13497841122026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 05/02/2026 HORA 07:25:54 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE JUAN CARLOS LEMUS FLOREZ

CC : 13499606 **DE** CUCUTA

CARGO OPERARIO

DIRECCION CALLE 6 9-50 ALTO PAMPLONITA

TELEFONO 3180936578 **EDAD** 57 **GENERO** M **RH** A+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** COOSALUD

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CAPACITACION SOBRE TRABAJO SEGURO, RIESGO BIOMECANICO Y PSICOLABORAL, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, PAUTAS DE CONSERVACION AUDITIVA.

INGRESA AL SVE Auditivo N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANGELA MARIA BARRIOS ROJAS
C.C. 1090374591
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 3376 - LICENCIA S.O.005238

JUAN CARLOS LEMUS FLOREZ
CC : 13499606

13499606522026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 05/02/2026 HORA 07:54:32 — **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE GIOVANI MANDON AVENDAÑO

CC : 88282209 **DE** OCAÑA (N/S)

CARGO OPERARIO

DIRECCION CALLE 8 # 17-30 BARRIO 11 DE NOVIEMBRE

TELEFONO 3045399473-3219490586 **EDAD** 49 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, IMPLEMENTAR AUTOCUIDADO, PRACTICAR ESTILO DE VIDA SALUDABLE, CAPACITACIÒN EN RIESGOS ASOCIADOS A SU LABOR.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

EDITH YAJAIRA ANAVITARTE CORREA
C.C. 37440487
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 2894 - LICENCIA S.O.03914

GIOVANI MANDON AVENDAÑO
CC : 88282209

88282095220 26

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 23/01/2026 HORA 16:09:18 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES

CC : 13505985 **DE** CUCUTA

CARGO JARDINERO

DIRECCION CALLE 17 #3-20 BARRIO OSPINA PEREZ

TELEFONO 3123060955 **EDAD** 56 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : SE SUGIERE: HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS. CAPACITACION SOBRE TRABAJO SEGURO, RIESGO BIOMECANICO, RIEGO QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO, HUMOS), CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVOS, FENOMENOS NATURALES), ADECUADO MANEJO DE CARGAS , RIESGO PUBLICO Y PSICOLABORAL. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A LOS LINEMIENTOS VIGENTES DEL SG-SST DE LA EMPRESA. APLICACIÓN DE NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ADECUADOS SEGÚN LA FUNCION. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

FEDERICO MIGUEL MARQUEZ H.
C.C. 8724372
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 6998 - LICENCIA S.O.1832

MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES
CC : 13505985

13505985231202 6

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 05/02/2026 HORA 09:53:01 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL

PPT : 6236792 **DE** BOGOTA D.C

CARGO OBRERO

DIRECCION BARRIO PALMERAS CALLE 32 CASA 1

TELEFONO 3204092987 **EDAD** 49 **GENERO** M **RH** O-

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** OTRO

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

REMITIDO A PYP : SI; ENTREGA DE REMISIÓN A PYP : SI

RECOMENDACIONES : REALIZAR PAUSAS ACTIVAS, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGUN LABOR A REALIZAR, ADECUADA HIGIENE POSTURAL, ADECUADO MANEJO DE CARGAS, BAJAR DE PESO, REALIZAR ACTIVIDAD FISICA, CONTROL ANUAL OPTOMETRIA.

INGRESA AL SVE

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANDRES DAVID RAMIREZ BECERRA
C.C. 1090426889
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 1090426889 - LICENCIA S.O.2800

RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL
PPT : 6236792

6236792522026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 06/02/2026 HORA 17:48:13 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE SILFRED MONTERO SAMPAYO

CC : 19773673 **DE** TALAIGUA NUEVO

CARGO JARDINERO

DIRECCION AVENIDA 3 #7-51 BARRIO LA VICTORIA

TELEFONO 3164579517 **EDAD** 53 **GENERO** M **RH** O+

A.F.P. OTRO **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** OTRO

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : HIGIENE POSTURAL (CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO DE CARGAS (MACETAS, BULTOS DE TIERRA) Y POSTURAS ADECUADAS PARA EL TRABAJO A NIVEL DE SUELO (USO DE RODILLERAS). ROTACIÓN DE TAREAS: ALTERNAR EL USO DE HERRAMIENTAS VIBRATORIAS. REALIZAR ESTIRAMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ANTES DE INICIAR LA JORNADA. PROTECCIÓN SOLAR: BLOQUEADOR SOLAR, SOMBREROS DE ALA ANCHA Y CAMISAS DE MANGA LARGA. ESQUEMA DE VACUNACIÓN AL DÍA. USO DE EPP SEGÚN TAREA.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARMANDO LOZADA ESTEBAN
C.C. 13439755
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 19360 - LICENCIA S.O.0383

SILFRED MONTERO SAMPAYO
CC : 19773673

19773673622026

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

LICENCIA S.O. No. 004568

EVALUACIÓN MÉDICA DE PREINGRESO

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

FECHA 16/02/2026 HORA 11:31:32 **CUCUTA - N. DE SDER.**



EMPRESA 902018300-6 UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 Actividad Económica 0240 SERVICIOS DE APOYO A LA SILVICULTURA

NOMBRE RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ

CC : 13277198 **DE** CUCUTA

CARGO AYUDANTE

DIRECCION CERRO PICO EL PROGRESO CALLE 20 NUMERO 64-16

TELEFONO 3150810918 **EDAD** 41 **GENERO** M **RH** A+

A.F.P. PORVENIR **A.R.L.** OTRO **E.P.S.** NUEVA EPS

EXAMENES MEDICOS : EXAMEN PSICOFÍSICO COMPLETO, TAMIZAJE VISUAL, SISTEMA CARDIOPULMONAR, PRUEBAS DE COORDINACIÓN, EXPLORACIÓN DIRIGIDA POR MANIOBRAS INDIVIDUALES DE CADA EXTREMIDAD Y DE CADA MÚSCULO (CUELLO, HOMBROS, MUÑECA, MANOS, TRONCO, CADERA, RODILLA, TOBILLO, PIES) PRUEBA PARA TÚNEL DEL CARPO, PRUEBA PARA TENDINITIS, TENOSINOVITIS Y TRASTORNOS DE HOMBRO, PRUEBAS DINÁMICAS DE COLUMNA, EXPLORACIÓN DE ARCOS DE MOVILIDAD, REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS, EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES DE PIEL Y VARICES, EXPLORACIÓN DE HERNIAS.

AUDIOMETRIA	NO	**EXAMEN DE VOZ**	NO	**OPTOMETRIA**	NO	**VISIOMETRIA**	NO	**ESPIROMETRIA**	NO	**EKG**	NO
PSICOLOGIA	NO	**RX TORAX**	NO	**RX COLUMNA**	SI	**PSICOSENSOMETRICA**	NO	**COORDINA. MOTRIZ**	NO		

LABORATORIO :

OTROS EXAMENES :

CONCEPTO DE APTITUD : SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES : USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA RIESGOS DEL CARGO, HIGIENE POSTURAL DE COLUMNA Y EXTREMIDADES, CAPACITAR EN RIESGOS BIOMECANICOS Y ADECUADO MANEJO DE CARGAS, CUMPLIR NORMATIVAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL , SEGUIR LINEAMIENTOS DEL SG- SST, PAUSAS ACTIVAS Y COMPENSADORAS, VIGILANCIA DEL RIESGO BIOMECANICO HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

INGRESA AL SVE N/A

ENFASIS OSTEOMUSCULAR

Certifico que toda la información suministrada en este documento es veraz y que no he ocultado antecedentes de salud, enfermedad laboral y/o accidente de trabajo ocurridos antes de la realización de este examen médico ocupacional.
Se hace entrega al trabajador de la información correspondiente a los resultados, pruebas y valoraciones complementarias del presente examen(de preingreso, periódico y/o de egreso), en cumplimiento de la Resolución 1843 de 2025, con el único propósito de promover su salud y fortalecer los mecanismos de prevención y control de alteraciones relacionadas con su actividad laboral, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

RAFAEL IGNACIO RAGUA GUERRERO
C.C. 13352247
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
REG. MÉDICO 13352247 - LICENCIA S.O.5128

RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ
CC : 13277198

13277198162026

ANEXO 18. AFILIACIÓN A SALUD

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	88032705
NOMBRES	DIEGO EDUARDO
APELLIDOS	CUADROS AGUIRRE
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO	CUCUTA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/09/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/16/2026 09:48:03	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el

Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1093779650
NOMBRES	DARLIN YERITZA
APELLIDOS	MARTINEZ MARTINEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO	CUCUTA

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	04/05/2018	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	03/16/2026 09:50:05	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el

Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/03/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10114799	14/03/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1094276397	DANNYSURELLY PARRA LIZCANO	1750905	INSPECTOR DE SALUD Y SEGURIDAD	2026-02-02

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Marzo del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	**Número de Ident.**	**Nombres**	**Apellidos**	**Fecha de Afiliación**	**Departamento**	**Ciudad**	**Dirección**	**Teléfono**	**Regimen**	**Estado**
CC	13499606	JUAN CARLOS	LAMUS FLOREZ	28/10/2022 12:00:00 a. m.	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CRV 122 ESTE # 11 AV 9 N 7N 118		Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	**Razon Social**	**Estado**	**Rango Cotizante**	**Fecha Vinculacion**
902018300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	N		07/02/2026

La anterior certificación se expide y firma, a los 19 días del mes de Febrero de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 19 días del mes de Marzo de 2026

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 10/02/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9957038	10/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	88282209	GIOVANI MANDON AVENDAÑO	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-02-06

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 10/02/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9957051	10/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
PERMISO POR PROTECCIÓN	6236792	RONALDJUNIOR MARCANO VIDAL	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-02-07

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 10 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

NIT 800.251.440-6

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Fecha de Radicado: 20/02/2026

200895346

J

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación ; B. Reporte de Novedades ✔

2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia ✔ - Beneficiario o Afiliado adicional ; B. Colectiva ; C. Institucional ; D. De Oficio

3. Régimen: A. Contributivo X ; B. Subsidiado

4. Contribución solidaria: Si ; No X

5. Tipo de Afiliado: A. Cotizante ✔ ; B. Cabeza de Familia ; C. Beneficiario ; D. Afiliado adicional

6. Tipo de Cotizante: A. Dependiente ✔ ; B. Independiente ; C. Pensionado

7. Código (a registrar por la EPS):

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional)

8. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
MONTERO	SAMPAYO	SILFRED	

9. Tipo de documento de identidad	10. Número del documento de identidad	11. Sexo biológico	12. Sexo identificación	Cuál	13. Nacionalidad
cc	19773673	Femenino ; Masculino ✔	F ; M ✔ ; T ; NB ; Otro		COLOMBIANA

14. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	15. Fecha de nacimiento
	COLOMBIA	BOLIVAR	TALAIGUA NUEVO	D 28/04/1972 A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

16. Etnia	17. Comunidad	18. Discapacidad	19. Tiene encuesta SISBÉN	20. Clasificación SISBÉN	21. Grupo de población especial
6		Si ; No X ; Categoría de discapacidad	Si ; No X	Nivel ; Grupo	

22. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	23. Administradora de Pensiones	24. Ingreso base de cotización - IBC	25.Tarifa Contribución Solidaria
AXA COLPATRIA	PROTECCION	$ 1.750.905	

26. Residencia — Dirección: av 3 #7-51 la victoria atalaya ; Teléfono Fijo:

Teléfono Celular: 3164579517 ; Correo Electrónico: monterosampayo@gmail.com

Departamento	Municipio / Distrito	Localidad / Comuna	Zona
NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	URBANA	Cabecera Municipal X ; Rural Disperso ; Centro Poblado ; Resto Rural

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente del cotizante

27. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

28. Tipo de documento de identidad	29. Número del documento de identidad	30. Sexo biológico	31. Sexo identificación	Cuál	32. Nacionalidad
		Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro		

33. Lugar de nacimiento	País	Departamento	Municipio	34. Fecha de nacimiento
				D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

35. Apellidos y nombres

	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	36. Tipo de documento de identidad	37. Número del documento de identidad	38. Nacionalidad	39. Sexo biológico	40. Sexo identificación	41. Lugar de nacimiento	42. Fecha de nacimiento
B1				Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro ; Cuál	País ; Departamento ; Municipio	D D M M A A A A
B2				Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro ; Cuál	País ; Departamento ; Municipio	D D M M A A A A
B3				Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro ; Cuál	País ; Departamento ; Municipio	D D M M A A A A
B4				Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro ; Cuál	País ; Departamento ; Municipio	D D M M A A A A
B5				Femenino ; Masculino	F ; M ; T ; NB ; Otro ; Cuál	País ; Departamento ; Municipio	D D M M A A A A

Datos complementarios del Beneficiario

	43. Parentesco	44. Etnia	45. Comunidad	46. Grupo de población especial	47. Tiene encuesta SISBÉN	48. Clasificación SISBÉN	49. Discapacidad	50. Incapacidad permanente
B1					Si ; No	Nivel ; Grupo	Si ; No ; Categoría de discapacidad	Si ; No
B2					Si ; No	Nivel ; Grupo	Si ; No ; Categoría de discapacidad	Si ; No
B3					Si ; No	Nivel ; Grupo	Si ; No ; Categoría de discapacidad	Si ; No
B4					Si ; No	Nivel ; Grupo	Si ; No ; Categoría de discapacidad	Si ; No
B5					Si ; No	Nivel ; Grupo	Si ; No ; Categoría de discapacidad	Si ; No

51. Datos de residencia

	Departamento	Municipio/ Distrito	zona	Teléfono fijo y/o celular	52. Valor de la UPC del afiliado adicional (a cargo del ente territorial)
B1			Cabecera Municipal ; Centro Poblado ; Rural Disperso ; Resto Rural		
B2			Cabecera Municipal ; Centro Poblado ; Rural Disperso ; Resto Rural		
B3			Cabecera Municipal ; Centro Poblado ; Rural Disperso ; Resto Rural		
B4			Cabecera Municipal ; Centro Poblado ; Rural Disperso ; Resto Rural		
B5			Cabecera Municipal ; Centro Poblado ; Rural Disperso ; Resto Rural		

	Dirección	Localidad/Comuna	Correo Electrónico
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

A/ Afiliación

200895346

53. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		54. Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C	CENTRO MEDICO CUCUTA	
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE, DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA O RESPONSABLES DEL PAGO

55. Nombre o razón social	56. Tipo documento de Identificación	57. Número del documento de identificación	58. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	NIT	902018300	

59. Ubicación

Dirección	Teléfono fijo o Celular
MZ 41 LT 3 BRR CLARET	5879632

Correo Electrónico	Departamento	Municipio / Distrito
kateaceros@gmail.com	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA

60. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identificación.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reporte de pago a través de un tercero Código
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Inscripción EPS retorno al país.
- [ ] 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 14. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 15. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 16. Reporte de fallecimiento del Cotizante o Cabeza de familia.
- [ ] 17. Reporte del fenecimiento de protección al cesante.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pre- pensionado.
- [ ] 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
- [ ] 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
- [ ] 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS ACTUALIZADOS SEGÚN REPORTE DE LA NOVEDAD

61. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
MONTERO	SAMPAYO	SILFRED	

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	62. Sexo biológico	63. Sexo identificación	64. Fecha de nacimiento
cc	19773673	Femenino [ ] Masculino [x]	F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual	D 28/04/1972 A

65. EPS anterior	66. Fecha de novedad	67. Motivo de traslado	68. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
	D 10/02/2026 A	Código 1	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 69. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [x] 71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 72. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
- [x] 75. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 76. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.
- [ ] 77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes.
- [ ] 78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente.

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento de identidad	No. de documento de identidad

IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique o afiliado adicional	81. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
SILFRED MONTERO	Katerine Aceros

X. ANEXOS

- [x] 82. Anexo copia del documento de identidad. Cantidad de documentos de identidad anexos: CN RC TI CC 1 CE PA CD SC PT
- [ ] 83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 84. Copia del registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016.
- [ ] 90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

Total Anexos 1

XI. DATOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

92. Identificación de la Entidad Territorial	Código del municipio	Código del departamento	93. Nombre de la Institución

XII. DATOS DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL O DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE POBLACIÓN ESPECIAL

94. Apellidos y nombres

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	95. Firma del funcionario	96. Fecha de radicación	97. Fecha de validación
			D D M M A A A A	D D M M A A A A

OBSERVACIONES:
R

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

Doc identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
63435851 LIA MEJIA		

8. REPORTE DE NOVEDADES

FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

SILFRED MONTERO, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el **Responsable del Tratamiento** de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi estado de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: **www.epssanitas.com.** Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma: SILFRED MONTERO

Nombre: SILFRED MONTERO

Identificación: 19773673

Fecha: 20/02/2026

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.

Nombre del Afiliado SILFRED MONTERO

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	X	NO
Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	X	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	X	NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	X	NO
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?	X	NO
¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?	X	NO

SILFRED MONTERO
Firma del Afiliado

Documento de Identidad 19773673

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella índice

Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
Edad:
Dirección de domicilio:

Nombre de la persona que no sabe firmar

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 14/02/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9979122	14/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	13505985	MARTINFREDY ORTIZ COLMENARES	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-02-12

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 19/02/2026, el empleador UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 identificado con NIT número 902018300 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
10006822	19/02/2026	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	13277198	RUBENDARIO VILLAN YANEZ	1750905	AYUDANTE AGRICOLA	2026-02-17

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Febrero del año 2026.

Cordialmente,



GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

COOSALUD
En Pos de tu bienestar

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

Para la atención de servicios de salud POS, el suscrito afiliado se encuentra registrado en la EPS con los siguientes datos.

Información del Cotizante y/o Cabeza de Familia										
Tipo Ident.	**Número de Ident.**	**Nombres**	**Apellidos**	**Fecha de Afiliación**	**Departamento**	**Ciudad**	**Dirección**	**Teléfono**	**Regimen**	**Estado**
CC	13497841	ISAIAS	HERNANDEZ HERNANDEZ	17/03/2022 12:00:00 a. m.	NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	CRV 122 ESTE # 11 CLL 24 1 42 OSPINA PEREZ	5785117	Contributivo	Activo

Informacion del Aportante				
NIT/CC	**Razon Social**	**Estado**	**Rango Cotizante**	**Fecha Vinculacion**
902018300	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	N		12/02/2026

La anterior certificación se expide y firma, a los 19 días del mes de Febrero de 2026, a solicitud del interesado y es válida hasta los 19 días del mes de Marzo de 2026

Cordialmente,

CARLOS TORRES SALAZAR
SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO NACIONAL

ANEXO 19. AFILIACIÓN A PENSIÓN

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.032.705**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.093.779.650**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 14 de Marzo del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **DANNY SURELLY PARRA LIZCANO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1094276397,** se encuentra afiliado/a desde **14/05/2019** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de marzo de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS** identificado(a) con **CC** número **13.497.841** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de diciembre de 1998 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.499.606**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Febrero del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

FIRMA CLIENTE

Protección

Nit. 800.138.188-1

Pensión Obligatoria ☐ Pensión Voluntaria ☐ Cesantías ☐

Nombre producto voluntario: _____

Fecha de Solicitud

Año Mes Día

DATOS PERSONALES

Tipo de Vinculación
☐ Vinculación inicial
☐ Traslado de AFP - Pensión Familiar
☐ Traslado AFP
☐ Traslado de régimen
☐ Traslado de Régimen - Pensión Familiar

Código de verificación

☐ C.C. ☐ C.E. ☐ RCN ☐ T.I. ☐ Pasaporte ☐ Pasaporte Diplomático ☐ PEP ☒ PT

Número documento de identidad: 6236792

Nombre completo: Ronald Junior Marcano Vidal

ACEPTACIÓN SOLICITUD AFILIACIÓN ELECTRÓNICA

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual con solidaridad lo he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. También declaro que previo al diligenciamiento de este formulario he recibido una asesoría clara, oportuna y adecuada, en virtud de lo cual manifiesto que de manera informada he elegido a PROTECCIÓN S.A para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado información relacionada con el producto previo a la afiliación al Fondo de Cesantías. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica. Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Manifiesto de manera libre y voluntaria que Protección S.A, me ha brindado la información de las condiciones del producto, de manera clara y previa a mi afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias. Garantizo que la información suministrada y consignada en el formulario digital, asociada con el código de verificación que se encuentra en la parte superior de este documento es cierta y verídica.

En tal sentido, y cuando resulte procedente de acuerdo con los términos y condiciones del producto respectivo, Protección elaborará el Perfil de Cliente que le permita realizar el Análisis de Conveniencia y proceder con el suministro de una Recomendación Profesional. Manifiesto igualmente, que en los eventos en que en mi calidad de Afiliado ejecute una decisión de inversión, contraria a la Recomendación Profesional suministrada por Protección, se entenderá que me he apartado de la misma, y tal ejecución servirá de constancia en los términos del artículo artículo 2.40.1.3.2. del Decreto 2555 de 2010.

Declaro que en el formulario de afiliación digital se encuentra establecida la manera en que se deberá dar tratamiento a mis datos personales.

Conozco y acepto las obligaciones que en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo quedaron expresas en el formulario de afiliación digital.

El afiliado tiene el derecho a retractarse de su decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la que se le informe de la validación de la afiliación o del traslado por parte de la administradora seleccionada.

AFILIADO

Huella

Firma Afiliado / Firma del cliente / Representante del menor

Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada.

9020186300

Firma y NIT empleador.
(En el caso que sea Obligatoria).

Nombre completo Asesor Comercial

Número documento de Identidad

Firma representante Legal.
Nombres y apellidos JUAN PABLO ARANGO BOTERO

INFORMACIÓN DE DILIGENCIAMIENTO OPCIONAL

Dirección residencia (Apartamento, barrio, urbanización)			Departamento
Manzana 31 Lote 2 Sector Atalaya Parte Alta			Norte de Santander
Ciudad	**Teléfono o Celular**	**Correo electrónico personal o laboral**	
Cucuta	320-4612987	v.deljunior56@gmail.com	
Dirección de Oficina	**Ciudad o Municipio**	**Departamento**	**Teléfono Oficina**
Mz 41 Lote 3 B. Claret	Cucuta	Norte de Santander	3022726357

Autorizo el envío de información al celular	Autorizo el envío de correspondencia y notificaciones al correo electrónico	En caso de ser negativo seleccione el lugar para el envío de correspondencia física
Si [X] No [ ]	Si [X] No [ ]	Residencia [ ] Empresa [ ]

Ocupación o cargo actual	Profesión	Integral	Salario mensual	Fecha ingreso empresa
Ayudante		Si [ ] No [ ]	1750905	Año 2026 Mes 02 Día 07

NIT	Razón Social
902018300	Unión Temporal Corredores Viejos 2025

INFORMACIÓN ADICIONAL PENSIÓN VOLUNTARIA

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta Financiera
	Ahorro [ ] Corriente [ ]	




LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **13505985,** se encuentra afiliado/a desde **01/07/1989** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 28 de febrero de 2026.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MONTERO SAMPAYO SILFRED** identificado(a) con **CC** número **19.773.673** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de diciembre de 2010 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RUBEN DARIO VILLAN YANEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.277.198**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

GIOVANI MANDON AVENDAÑO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **88.282.209**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

ANEXO 20. AFILIACIÓN A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13505985
Nombre:	MARTIN FREDY ORTIZ COLMENARES
Fecha Ingreso:	12/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	11/02/2026 06:13:14 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13497841
Nombre:	ISAIAS HERNANDEZ HERNANDEZ
Fecha Ingreso:	12/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	11/02/2026 06:10:16 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13499606
Nombre:	JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ
Fecha Ingreso:	07/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	06/02/2026 04:00:15 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	88282209
Nombre:	GIOVANI MANDON AVENDAÑO
Fecha Ingreso:	06/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	05/02/2026 05:49:52 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	PERMISO PROTECCIÓN TEMPORAL
Número de Documento	6236792
Nombre:	RONALD JUNIOR MARCANO VIDAL
Fecha Ingreso:	07/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	06/02/2026 04:07:14 p. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	19773673
Nombre:	SILFRED MONTERO SAMPAYO
Fecha Ingreso:	10/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	09/02/2026 09:26:16 a. m.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	902018300
Número Afiliación:	9047221
Razón social:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	13277198
Nombre:	RUBEN DARIO VILLAN YAÑEZ
Fecha Ingreso:	17/02/2026
Salario básico:	1,750,905
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	CTR002
Tasa:	1.044
Fecha hora transacción:	16/02/2026 05:55:39 p. m.

ANEXO 21. EXÁMENES DE RETIRO

UT Corredores Verdes 2020	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 28 de febrero de 2026

Señores
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21ª # 08-75 Barrio EL ROSAL - **5489755 -3042479158 - 3172352910**

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Examenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO	1096952550	Director de Obra

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					


MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometria		Audiometria		Espirometria	
RX Columna		Rx Tórax		Psicologia		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, trigliceridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometria Audiometria glicemia, Colesterol, triglicéridos Espirometria Psicologia		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipidico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapeuta	
EKG > 40 años		sustancias Psicoactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTA!: Preséntese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clinicas; se atenderá por orden llegada hora de inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIOLABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m 02:00 p.m.- 05:00 p.m	06:00 a.m. -12:00 m



FIRMA

UT Corredoras Verdes 2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 28 de febrero de 2026

Señores:
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21ª # 0B-75 Barrio EL ROSAL - **5489755 -3042479156 - 3172352910**

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Exámenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO	13719287	Residente de obra

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					

MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometria		Audiometria		Espirometria	
RX Columna		Rx Tórax		Psicologia		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, triglicéridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometria Audiometria glicemia, Colesterol, triglicéridos Espirometria Psicologia		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipidico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapeuta	
EKG > 40 años		sustancias Psiccactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTAL: Preséntese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clinicas; se atenderá por orden llegada hora de Inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIOLABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m 02:00 p.m.- 05:00 p.m	06:00 a.m. -12:00 m



FIRMA

UT Corredores Verdes 2026	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 28 de febrero de 2026

Señores:
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21ª # 0B-75 Barrio EL ROSAL - **6489755 -3042479155 - 3172352910**

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Exámenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL	1096249395	Inpsector HSEQ

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					

MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometria		Audiometria		Espirometria	
RX Columna		Rx Tórax		Psicologia		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, triglicéridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometria Audiometria glicemia Colesterol, triglicéridos Espirometria Psicologia		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipidico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapeuta	
EKG > 40 años		sustancias Psicoactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTAL: Presentese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clinicas; se atenderá por orden llegada hora de inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIOLABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m 02:00 p.m.- 05:00 p.m	06:00 a.m. -12:00 m



FIRMA

UT Corredores Verdes 2020	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 28 de febrero de 2026

Señores:
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21ª # 06-75 Barrio EL ROSAL - **5489755 -3042479156 - 3172352910**

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Exámenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
JUAN CARLOS LAMUS FLOREZ	13499606	JARDINERO

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					

MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometria		Audiometria		Espirometria	
RX Columna		Rx Tórax		Psicologia		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, triglicéridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometria Audiometria glicemia, Colesterol, triglicéridos Espirometria Psicologia		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipídico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapauta	
EKG > 40 años		sustancias Psicoactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTA: Preséntese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clínicas; se atenderá por orden llegada hora de inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIO LABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m 02:00 p.m.- 05:00 p.m	06:00 a.m. -12:00 m

Juan Carlos Lamus Flórez

FIRMA

UT Corredores Verdes 2025	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-FO-18
		VERSION: 01
	ORDEN DE SERVICIOS	FECHA: 29-11-2025

FECHA: 28 de febrero de 2026

Señores:
IPS PROGRESANDO EN SALUD SAS
Calle 21ª # 0B-75 Barrio EL ROSAL - 5469755 -3042479155 - 3172352910

Por medio de la presente se autoriza al siguiente personal, para la realización de los Exámenes Médicos Laborales.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
GIOVANI MANDON AVENDAÑO	88282209	JARDINERO

TIPO DE EXAMEN:

Ingreso		Periodico		Retiro	X	Post-Incapacidad	
Valoracion Médica		Cambio de oficio					

MARCAR CON UNA X EN LOS CUADROS

Examen Médico	X	Optometría		Audiometría		Espirometría	
RX Columna		Rx Tórax		Psicología		Coordinación Motriz	
EXÁMENES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS: Examen Médico, optometria, audiometria, glicemia, colesterol, triglicéridos		**EXÁMENES PARA ESPACIOS CONFINADOS** Examen Médico, Optometría Audiometría glicemia, Colesterol, triglicéridos Espirometría Psicología		**EXÁMENES PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS:** K.O.H uñas Frotis de garganta Coprologico		Hemoclasificación	
						Cuadro hemático	
						Perfil Lipidico completo	
						Curso Teórico práctico	
						Curso de manipulacion de alimentos - virtual	
						Valoracion con Fisioterapeuta	
EKG > 40 años		sustancias Psicoactivas Cocaina - Marihuana		Pool de drogas		Vacunacion: Cual?	

NOTAL: Preséntese con cedula original, no llevar acompañante, usar tapabocas, presentarse con las historias clínicas; se atenderá por orden llegada hora de inicio desde las 06:00 a.m.

HORARIOLABORAL

Lunes - Viernes	Sábados
06:00 a.m. -12:00 m	06:00 a.m. -12:00 m
02:00 p.m.- 05:00 p.m	

Coyoatri Mondon

FIRMA

ANEXO 22. PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36581907	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.857.800	7.400	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
26	36581907	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1090174911	BENITEZ CARVAJAL FREDDY ALONSO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
2	CC 1090379197	CASTRO HERNANDEZ EDISON RAMIRO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
3	CC 1090175835	CAÑAS PEÑARANDA LUIS CARLOS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
4	CC 1090176560	DIAZ TOLOZA MIGUEL HUMBERTO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
5	CC 1005066478	FERNANDEZ JAUREGUI JUAN MANUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
6	CC 1093144012	GARAVITO RAMIREZ JUAN MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
7	PT 5330612	GARRIDO RIVAS LUIS JOSE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
8	CC 13195283	GUTIERREZ PEÑARANDA JESUS ALBEIRO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
9	CC 1090461423	HERNANDEZ BOHORQUEZ ARIANA PRHISTLEY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAORIENTE-CCF36	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	2024001
10	CC 13497841	HERNANDEZ HERNANDEZ ISAIAS	1.750.905	F	X															0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.108.907	177.500	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.108.907	44.400	COMFAORIENTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	11.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	277.900	S	2024001
11	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
12	CC 13499606	LAMUS FLOREZ JUAN CARLOS	1.750.905	F	X	X														0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.400.724	224.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.400.724	56.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.459.088	58.400	1.400.724	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	353.400	S	2024001
13	CC 1090177446	LOPEZ RAMIREZ ALAN KENNY	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
14	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
15	CC 88282209	MANDON AVENDAÑO GIOVANI	1.750.905	F	X	X														0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	COMFANORTE-CCF37	1.519.883	60.800	1.459.088	15.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	368.000	S	2024001
16	PT 6236792	MARCANO VIDAL RONALD JUNIOR	1.750.905	F	X															0			24	24	24	24	PROTECCION-230201	1.400.724	224.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.400.724	56.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.400.724	56.100	1.400.724	14.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	351.100	S	2024001
17	PT 7143344	MARTINEZ GONZALEZ SAMUEL JOSE	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
18	CC 88001405	MEJIA CAICEDO ISMAEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
19	CC 19773673	MONTERO SAMPAYO SILFRED	1.750.905	F	X															0			21	21	21	21	PROTECCION-230201	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.225.634	49.100	1.225.634	12.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S	2024001
20	CC 13505985	ORTIZ COLMENARES MARTIN FREDY	1.750.905	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	1.108.907	177.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.108.907	44.400	COMFAORIENTE-CCF36	1.108.907	44.400	1.108.907	11.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	277.900	S	2024001
21	CC 13928770	SALAZAR GOYENECHE JOSE ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
22	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
23	CC 1092342880	TORRES GALINDO WILMER ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
24	CC 1092386993	USECHE BETANCOURT JUNIOR ALEXANDER	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
25	PT 6914058	VILLALBA MATA FREDDY JESUS	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	438.700	S	2024001
26	CC 13277198	VILLAN YANEZ RUBEN DARIO	1.750.905	F	X															0			14	14	14	14	COLPENSIONES-25-14	817.089	130.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	817.089	32.700	COMFAORIENTE-CCF36	817.089	32.700	817.089	8.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	204.800	S	2024001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36581907	E	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.857.800	7.400	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
26	36581907	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
43.286.458	43.286.458	43.286.458	43.405.617	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				26	6.927.300	0	4.600	0	6.931.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.548.900	0	1.000	0	1.549.900
PORVENIR	230301	800224808	8	13	3.659.700	0	2.400	0	3.662.100
PROTECCION	230201	800229739	0	7	1.718.700	0	1.200	0	1.719.900
EPS(Administradoras: 4)				26	1.732.900	0	1.300	0	1.734.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	399.600	0	300	0	399.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	240.700	0	200	0	240.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	280.400	0	200	0	280.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	12	812.200	0	600	0	812.800
ARP(Administradoras: 1)				26	452.600	0	300	0	452.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	26	452.600	0	300	0	452.900
CCF(Administradoras: 2)				26	1.737.600	0	1.200	0	1.738.800
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	25	1.676.800	0	1.100	0	1.677.900
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	60.800	0	100	0	60.900
Gran Total					10.850.400	0	7.400	0	10.857.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753185	E	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.283.500	10.900	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	36753185	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88032705	CUADROS AGUIRRE DIEGO EDUARDO	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.692.542	67.800	COMFAORIENTE-CCF36	1.692.542	67.800	1.692.542	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	424.200	S	2024001
2	CC 1093779650	MARTINEZ MARTINEZ DARLIN YERITZA	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.692.542	270.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.692.542	67.800	COMFAORIENTE-CCF36	1.692.542	67.800	1.692.542	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	424.200	S	2024001
3	CC 1094276397	PARRA LIZCANO DANNY SURELLY	1.750.905	F	X															0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	1.692.542	270.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.692.542	67.800	COMFAORIENTE-CCF36	1.692.542	67.800	1.692.542	17.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	424.200	S	2024001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET	3022726357	CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753185	E	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.283.500	10.900	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	36753185	2026-03-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.077.626	5.077.626	5.077.626	5.077.626	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	812.700	0	6.900	0	819.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	541.800	0	4.600	0	546.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	270.900	0	2.300	0	273.200
EPS(Administradoras: 2)				3	203.400	0	1.800	0	205.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	135.600	0	1.200	0	136.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	67.800	0	600	0	68.400
ARP(Administradoras: 1)				3	53.100	0	500	0	53.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	53.100	0	500	0	53.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	203.400	0	1.700	0	205.100
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	3	203.400	0	1.700	0	205.100
Gran Total					1.272.600	0	10.900	0	1.283.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753440	N	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36753440		Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
2	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F		X						C								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
3	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
4	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F		X						C								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
5	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
6	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F		X						C								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753440	N	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	0	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36753440		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	0	0	0

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753420	N	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.700	200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36753420	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
2	CC 1096952550	JAIMES CORONADO ANGELA GIOCONDA	1.750.905	F								C								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.912.631	76.600	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	445.200	S	2024001
3	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
4	CC 1096249395	LOZADA PIMENTEL LINA MARCELA	1.750.905	F								C								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.912.631	76.600	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	445.200	S	2024001
5	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F								A								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	438.700	S	2024001
6	CC 13719287	SUAREZ DELGADO LUIS FERNANDO	1.750.905	F								C								0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	70.100	COMFAORIENTE-CCF36	1.912.631	76.600	1.750.905	18.300	0,01044	0	0	0	0	0	1	0	445.200	S	2024001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 902018300	6	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	0240	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	MZ 41 LT 3 BRR CLARET		3022726357			CORREDORESVERDES2025@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36753420	N	2026-03-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.700	200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36753420	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	0	485.178	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				3	19.500	0	200	0	19.700
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	3	19.500	0	200	0	19.700
Gran Total					19.500	0	200	0	19.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

7. Formato de informe de interventoria del periodo del acta MPA-01-F-07 INFORME DE INTERVENTORÍA v4 y formato MPA-01-F28 V2 con sus respectivos anexos.

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE INTERVENTORÍA
02/01/2026 al 02/28/2026

PROYECTO:

ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

Actualmente el estado de embellecimiento de la gran mayoría de zonas verdes de diferentes e importantes espacios públicos de la ciudad presentan deterioro por falta de mantenimiento e intervención, lo que ha ocasionado perdida de cubertura vegetal producto del crecimiento descontrolado de malezas y falta de riego y mantenimiento en las zonas verdes, lo que genera una percepción negativa de los habitantes del sector y a su vez que disminuya el sentido de pertenencia del ciudadano en referencia al cuidado de sus espacios públicos.

Conforme a lo anterior se puede inferir que la causa principal de apatía del ciudadano por su entorno natural en el sentido del disfrute y goce del paisaje urbano público, está ligado al descuido que estos espacios públicos presentan por la falta de mantenimiento y deterioro, así que para lograr desarrollar el fortalecimiento de la identidad ciudadana y el cuidado de las zonas públicas como elemento importante del tejido urbano, se debe asegurar la recuperación progresiva de las zonas verdes de los hitos de importancia de nuestra ciudad como es el caso de sus redomas, avenidas principales, parques, plazas, plazoletas y demás espacio público del municipio de San José de Cúcuta, por medio de actividades de recuperación y mantenimiento que permita su sostenibilidad y conservación.

Este proyecto, se enfoca exclusivamente en las zonas verdes constitutivas de los corredores verdes, puntos estratégicos como las redomas de la Avenida Libertadores en la ciudad de Cúcuta. La intervención busca mejorar de manera significativa el aspecto verde de esta importante arteria vial. Se priorizarán tramos y puntos específicos de la Avenida Libertadores basados en un diagnóstico detallado que considerará el nivel de deterioro actual de dichas zonas verdes, el potencial de impacto visual y ambiental, y la coherencia con el entorno urbano inmediato. la La intervención se alinea con el objeto general que es el de promover la conservación y el mejoramiento ambiental de la ciudad, enfocándose en este caso en la infraestructura verde urbana de la Avenida Libertadores. Aunque existen proyectos de la Alcaldía para la mejora general del sector del Malecón, esta iniciativa se concentra específicamente desde redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Liberadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y

parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Liberadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo) buscando una sinergia y complementariedad con otras intervenciones que puedan estar en curso o planificadas para la zona.

Es crucial que la intervención en estos elementos específicos (corredores verdes, redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Libertadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo) se conciba como una actuación integral que contribuya a la continuidad ecológica y estética de la avenida. La selección de los puntos de intervención dentro de estos elementos priorizará aquellos que maximicen el impacto positivo en el paisaje urbano y la calidad ambiental de la Avenida Libertadores.

Conforme a lo anterior, entre el Municipio de San José de Cúcuta y CORPONOR, celebraron Convenio Interadministrativo N° 00005321 de 24 de octubre de 2025, el cual tiene por objeto: 2025MA-33 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ZONAS VERDES EN EL ESPACIO PÚBLICO", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

1.2 ALCANCES DEL

PROYECTO FASE 1:

DIAGNÓSTICO Y ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN: Esta fase inicial es la base analítica del proyecto. Su objetivo es comprender a fondo las problemáticas existentes para asegurar que las intervenciones sean pertinentes y efectivas.

Análisis del Estado Actual: Se evalúan las condiciones de las zonas verdes esta iniciativa se concentra específicamente desde la redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Liberadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Liberadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo). Identificación de puntos críticos:

- Cobertura Vegetal: Se documenta el grado de deterioro de la vegetación, identificando áreas con césped ralo, plantas en mal estado y suelos compactados o pobres en nutrientes
- Residuos Sólidos: Se mapean los focos de acumulación de basura y se analiza la dinámica que genera esta contaminación.
- Mantenimiento: Se evalúan las fallas en las rutinas de mantenimiento actuales, identificando la falta de riego, poda técnica y limpieza continua.
- Arbolado Existente: Se realiza un inventario de los árboles actuales para determinar cuáles requieren podas fitosanitarias o de formación y cuáles, por su estado o riesgo, deben ser erradicados, siempre con la debida autorización ambiental.
- Planteamiento de la alternativa de intervención.
- Actividad que resulta del diagnóstico y se definen lugares, acciones y actividades a desarrollar.

FASE 2:

DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL: El objetivo de esta fase es el inicio de las labores de campo después de aprobado el diseño y plan de mantenimiento como es: preparar el terreno, dejando las áreas de intervención completamente limpias y listas para la nueva siembra. Corresponde a los preliminares y podas del presupuesto.

- Limpieza General y Deshierbe: Se realiza el retiro manual de toda la maleza. vegetación no deseada, basura y escombros de las áreas a intervenir.
- Excavación y Nivelación: Se ejecuta la excavación manual para remover la capa de tierra superficial compactada y no apta, preparando el terreno para recibir el nuevo sustrato
- Poda: Se interviene el arbolado existente según el diagnóstico. Se realizan podas técnicas a árboles de porte mediano y se erradican árboles de porte alto que representan un riesgo o impiden el nuevo diseño. (con base en el diagnóstico)
- Retiro de Material Sobrante: Todo el material orgánico e inorgánico resultante de esta fase se recolecta y se prepara para su transporte y disposición final.

FASE 3:

ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE: Esta es la fase central de la intervención física, donde se materializa el nuevo diseño paisajístico.

- Mejora del Suelo: Se suministra e instala una capa de abono preparado, creando un sustrato fértil y adecuado para el desarrollo de la nueva vegetación.

- Siembra de Material Vegetal: Se realiza la siembra planificada de todas las especies ornamentales, distribuidas estratégicamente según el diseño, basados en el diagnóstico.

- Instalación de Elementos Decorativos y Duros.

- Se instala material triturado como base decorativa en zonas específicas.
- Se colocan piedra bola para crear texturas y proteger ciertas áreas
- Instalación de Vallas Informativas: Se instalan 2 letreros de obra (1m x 1.20m) con la información del proyecto y los logos de la Alcaldía y la Corporación.

FASE 4:

MANTENIMIENTO (FASE DE CONSOLIDACIÓN - 6 MESES): Esta fase es crucial para asegurar el correcto establecimiento de la vegetación y la sostenibilidad inicial del proyecto.

- Riego Programado: Se garantiza el suministro de agua constante a todo el componente verde recién sembrado y con una proyección de mantenimiento mínimo de seis (6) meses una vez finalizado el convenio asegurando la supervivencia durante la etapa de adaptación implementando un sistema de riego por aspersión
- Limpieza Continua: Se realizan labores periódicas de limpieza de zonas verdes y de áreas duras (con piedra), retirando hojas secas y cualquier residuo.
- Nutrición y Control Fitosanitario: Se aplican fertilizantes de zonas verdes para fortalecer las plantas y se realizan fumigaciones preventivas o correctivas si se detecta presencia de plagas.
- Poda y Jardinería: Se realizan podas de formación a los arbustos y se mantiene el plateo de los árboles para asegurar un crecimiento saludable y estético.
- Retiro de Residuos: Se recolectan y transportan todos los residuos generados durante las labores de mantenimiento.

FASE 5:

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO: El objetivo de esta fase es asegurar que la inversión perdure en el tiempo, fomentando corresponsabilidad ciudadana y creando mecanismos de sostenibilidad.

- Campaña de Cultura Ciudadana:
- Objetivo: Promover la concientización y el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales a través de la gestión social participativa, la educación y la comunicación, mediante un proceso de capacitación dirigido a un mínimo de 2.500 personas, con el fin de impulsar prácticas sostenibles y responsables en la comunidad, fomentando la apropiación del espacio por parte de la comunidad y promover comportamientos cívicos como la correcta disposición de basuras y el cuidado de las zonas verdes.

- Acciones: Implementación de un equipo de gestores ambientales terreno, instalación de señalética pedagógica y organización de eventos Página 18 Corponor ESTUDIO PREVIO MPA-01-F-01, versión 9, 29/01/2025 comunitarios para generar un vínculo positivo con el espacio recuperado.

.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Área de mantenimiento (área intervenida previamente por la Alcaldía de San José de Cúcuta), Área de Intervención: Se concentra desde la redoma del puente de Guadua y zonas verdes aledañas a esta redoma (separadores de la avenida Libertadores hasta el retorno de Circuspop calle 9 con Avenida Libertadores), (redomas del parque CORPONOR y parque de ingenieros), (jardineras desde Calle 15 con Avenida Libertadores hasta el puente Elías M. Soto). Adicional (jardineras desde parque pamplonita CENS hasta 50 metros hacia parque Rodizzio) y los (laterales frente al puente peatonal de San Luis hasta la terminación de las bahías zona de parqueo

La siguiente imagen plantea el área total de intervención:



Imagen. 1 Localización de intervención del proyecto

1.4 POBLACIÓN BENEFICIADA

Directos: Residentes de las comunas colindantes (Comunas 1 y 2), deportistas y peatones que utilizan el corredor del Malecón y la Av. Libertadores para recreación, deporte y esparcimiento diario**.**

Indirectos (Población Flotante): Conductores, pasajeros y turistas que transitan por esta arteria vial principal, quienes se benefician de la mejora en la seguridad vial, la reducción del estrés visual y la regulación térmica del entorno.

Sector Comercial: Comerciantes y empresarios del sector servicios, hoteles y restaurantes ubicados sobre el corredor, beneficiados por la valorización del paisaje urbano y el aumento de la afluencia de clientes.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 731-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1405 del 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
OBJETO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

	(1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (1,559,614,622.00), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	09 MESES
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	09 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA DE MODIFICACIÓN No. 1.	01/20/2026
FECHA DE MODIFICACIÓN No. 2.	02/18/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	9/24/2026

2.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA765-2025

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSOS DE MÉRITO
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1406 19 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL-CORPONOR
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA al Contrato de Obra resultante de la Licitación Pública N° LIC731-2025, cuyo objeto es: ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PAISAJE URBANO.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.194.451), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.

VALOR ADICIONAL	N/A

VALOR TOTAL CONTRATADO	CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($109.194.451), IVA incluido y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	10 MESES
FECHA DE INICIO	12/24/2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	10/24/2026

2.3 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de NUEVE (9) meses que corresponde a 270 días calendario para el contrato de obra para el contrato de interventoría DIEZ (10) meses que corresponde a 300 días.

2.4 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2.4.1 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS INICIALES

2.4.1.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICION:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2025	19/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA		2 Años a partir de acta de recibo final	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICION:	23/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	24/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	19/12/2025	19/09/2025	284,700,000.00

2.4.1.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CMA 765-2025			
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 47 994000094073
FECHA DE EXPEDICION:	19/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	19/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	19/12/2025	19/02/2027	10,919,445.10
PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2025	19/10/2029	5,459,722.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	19/10/2026	19/10/2031	10,919,445.10

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 74 994000009265
FECHA DE EXPEDICION:		**FECHA DE APROBACION:**	
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/12/2025	19/10/2026	284,700,000.00

Anexo *Pólizas iniciales*, *En el informe 1*.

2.4.2 RELACIÓN DE PÓLIZAS SUSCRITAS POR ACTA DE INICIO

2.4.2.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA LIC 731-2025			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-44-101488408
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	24/12/2025	24/01/2027	155,961,462.20
PRESTACIONES SOCIALES	24/12/2025	24/09/2029	155,961,462.20
CALIDAD DEL SERVICIO	24/12/2025	24/01/2027	155,961,462.20
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/09/2026	24/09/2028	467,884,386.60

ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA	**PÓLIZA No.:**	21-40-101268130
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	24/12/2025	24/09/2025	284,700,000.00

2.4.2.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 47 994000094073
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	24/12/2025	24/02/2027	10,919,445.10

PRESTACIONES SOCIALES	24/12/2025	24/10/2029	5,459,722.55
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/10/2026	24/10/2031	10,919,445.10

ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**PÓLIZA No.:**	460 74 994000009265
FECHA DE EXPEDICION:	26/12/2025	**FECHA DE APROBACION:**	26/12/2025
NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	24/12/2025	24/10/2026	284,700,000.00

Anexo *Polizas actualizadas En el informe 1.*

2.5 SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Las actividades de cantidades de obra a desarrollar vigentes según el modificatorio No. 2:

ÍTEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			VALORES ACTUALIZADOS ACTA DE MODIFICATORIO N° 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	DIAGNÓSTICO									
1,1	Análisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00
1,2	Identificación de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00
2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL									
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00
3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE									
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00
3,2	siembra de material vegetal						- .00	$ -		$ -
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00

3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- .00	$ -
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00

NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00

NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00

NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum ‘Choconiana’ En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00

NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00
3,3	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construcción de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00
4	MANTENIMIENTO (6 MESES)									
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00	1,075.00	$ 43,157,326.00
5	EDUCACIÓN AMBIENTAL									
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00
COSTO DIRECTO					$ 1,189,274,532.00			$ -		$ 1,189,274,532.00
ADMINISTRACIÓN				22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00
IMPREVISTOS				2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00
UTILIDADES				6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00
IVA sobre utilidad				19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00
COSTO INDIRECTO					$ 370,340,090.00			$ -		$ 370,340,090.00
VALOR TOTAL					$ 1,559,614,622.00			$ -		$ 1,559,614,622.00

2.5.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	***FECHA***
***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.* CMA 765-2025**	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19/12/2025
ACTA DE INICIO	24/12/2025

Anexo. *Acta de inicio , En el informe N°1*

2.5.2 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°1	06/01/2026
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°2	13/01/2026
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°3	19/01/2026
ACTA DE MODIFICACIÓN N°1	20/01/2026
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°4	01/02/2026
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°5	17/02/2026
ACTA DE MODIFICACIÓN N°2	18/02/2026
COMITE DE OBRA O INTERVENTORIA N°6	25/02/2026

Anexo. *Acta de comite N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comite N°2. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comite N°3 En el informe N°2*

Anexo. *Acta de modificación N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comité N°4*

Anexo. *Acta de comité N°5*

Anexo. *Acta de modificación N°2.*

Anexo. *Acta de comité N°6*

3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Con relación al plazo contractual, han transcurrido treinta y ocho (66) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.

Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 24,44 %

Ver Anexo No. 01. (*Cronograma de actividades y Flujo de fondos)*

4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

Al corte del presente informe, la obra presenta un estado de avance respecto al cronograma vigente. Mientras que la meta establecida en la planificación inicial era de un 52,30%, el equipo de obra ha presentado un avance físico real del 52,55%, teniendo una evolución superior a la programada por 0,25%.

.

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	22,64%	20,30%	0,25%
Durante el periodo	29,66%	32,25%	
Acumulado actual	52,30%	52,55%	



Imagen. Gráfico de avance de contrato

5 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra e interventoría es 52.55 % del valor total contratado. El avance de ejecución del proyecto es de 52.55 %.

Ver Anexo No. 2*. (Balance físico – financiero de obra e interventoría)*

6 CONDICIONES CLIMÁTICAS Y/O ORDEN PÚBLICO

El comportamiento climático estuvo marcado por la influencia de días cálidos, que favorecen condiciones mayormente secas y cielos con nubosidad parcial que favorecen la ejecución de actividades.

7 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS OBRA E INTERVENTORÍA.

2.2 Excavación y nivelación

Esta actividad comprende los movimientos de tierra necesarios para adecuar el terreno a las cotas de diseño paisajístico, garantizando que el suelo tenga la profundidad y la pendiente adecuadas para el sostenimiento de la vegetación.

Objetivo: Proporcionar una base física óptima que facilite la aireación del suelo y el correcto desarrollo radicular, asegurando que el diseño paisajístico sea funcional, estético y duradero frente a las condiciones climáticas de la ciudad.

NP 2,5 Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.

Esta labor consiste en el aprovechamiento del material extraído durante las excavaciones de obra para el relleno y la nivelación de las áreas de intervención. El proceso incluye el extendido, la eliminación de elementos sobredimensionados y la conformación del material, ajustándose a las pendientes y niveles topográficos establecidos en el diseño paisajístico.

El propósito fundamental de esta intervención es estabilizar y uniformar la superficie del terreno mediante una estrategia de compensación de volúmenes, eliminando la necesidad de importar rellenos externos y optimizando el manejo de sobrantes en sitio.

3,1 Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)

Esta actividad comprende el suministro, preparación e incorporación de una mezcla técnica compuesta por suelo seleccionado, arena y materia orgánica en las áreas destinadas a la siembra. El proceso se ejecuta de manera focalizada mediante la integración manual de estos componentes con la tierra del sitio, asegurando una distribución homogénea que optimice la estructura física y la composición química del sustrato en la zona radicular de cada especie.

3,2,1 Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Veranera, entregados en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 8 y 15 cm. El proceso técnico integra la selección de plantas con óptimo estado fitosanitario, su transporte protegido y la instalación definitiva en campo.

3,2,2 Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Agave, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 20 y 30 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas.

3,2,7 Suministro de material vegetal especie Cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de la especie Agave, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 30 y 50 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas designadas.

3,2,8 Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja : En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de la isora blanca y roja, los cuales se entregan en bolsa de 1 kg (números 26 y 35) con una altura establecida entre los 15 y 25 cm. El proceso operativo abarca la selección de especímenes con vigor, su transporte adecuado al sitio de intervención y la instalación definitiva en las áreas

designadas.

NP 3,2,18 Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 y 70, con una altura Con altura de 1 y 1.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Bismarckia, entregados en bolsa de 60 kg (número 50 y 70) con una altura de 1 y 1.50 metros. El proceso técnico abarca la selección de individuos con óptimo vigor fitosanitario, su transporte especializado hasta el sitio de obra para proteger el follaje y el estípite, y la instalación definitiva.

NP 3,2,23 Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Palma Manila, entregados en presentaciones de bolsa de 30 kg (números 60 a 80) y con una altura total entre los 2.00 y 2.50 metros. El proceso operativo abarca la verificación fitosanitaria de cada individuo, su traslado protegido al área de intervención y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,25 Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Cordyline, entregados en bolsa de 3 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 0.70 y 1.00 metros. El proceso técnico integra la selección de plantas con follaje vigoroso y coloración característica, su transporte protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,27 Suministro de material vegetal especie CANCIÓN DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Canción de la India, entregados en bolsa de 6 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,30 Suministro de material vegetal especie FRAILEJÓN: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 y 30 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Frailejón, entregados en bolsa de 6 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,31 Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 30 y 50 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Amancay, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los

30 y 50 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,32 Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Spring, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 20 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con follaje variado y vigoroso, su transporte protegido para evitar el maltrato de las hojas y la instalación definitiva en el área de intervención.

NP 3,2,33 Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 y 40, de largo entre 80 a 100 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Philodendro Corazón, entregados en bolsa de 6 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 80 a 100 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con óptima ramificación y coloración foliar, su traslado protegido al sitio de obra y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,34 Suministro de material vegetal especie PHILODENDRON SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Philodendron Selloum, entregados en bolsa de 6 kg (números 35 y 40) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El proceso técnico incluye la selección de especímenes con hojas lobuladas de aspecto vigoroso, su transporte especializado para proteger la integridad de sus grandes frondas y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,35 Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Pandanus Variegado, entregados en bolsa de 10 kg (números 40 y 60) con una longitud establecida entre los 70 y 80 cm. El procedimiento incluye la selección de plantas con su característico follaje cintiforme y variegación definida, su transporte protegido para evitar lesiones en las hojas y la instalación definitiva en el terreno.

NP 3,2,36 Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Veranera Tallo Alto, entregados en bolsa de 10 kg (números 60 y 80) con una longitud establecida entre los 30 y 70 cm. El proceso técnico incluye la selección de individuos con un eje principal leñoso y definido, su transporte protegido para preservar la estructura del tallo y el follaje, y la instalación definitiva en sitio.

NP 3,2,39 Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Flor del Llano, entregados en bolsa de 3 kg (número 26) con una longitud establecida entre los 20 y 40 cm. El proceso operativo incluye la selección de individuos con tallos vigorosos y follaje sano, su transporte protegido para evitar el maltrato de sus brotes y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,34 Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de la especie Flor del Llano, entregados en bolsa de 8 kg (número 40) con una longitud establecida entre los 30 Y 70 cm. El proceso operativo incluye la selección de individuos con tallos vigorosos y follaje sano, su transporte protegido para evitar el maltrato de sus brotes y la instalación definitiva en campo.

NP 3,2,45 Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm

Esta actividad comprende el suministro y la siembra técnica de ejemplares de especies Rastreras, entregados en bolsa de 1 kg (número 14) con una longitud establecida entre los 10 y 20 cm. El procedimiento operativo incluye la selección de plantas con guías vigorosas y brotes sanos, su transporte protegido para evitar el maltrato del follaje rastrero y la instalación definitiva en campo.

3,3,2 Suministro e instalación de piedra bola

Esta actividad comprende el suministro e instalación de piedra bola para elementos decorativos en el diseño paisajístico

3,3,5 Suministro e instalación de piedra bola

Esta actividad comprende el suministro e instalación de piedra bola para elementos decorativos en el diseño paisajístico

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas en el presente periodo

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				
2.2	Excavación y nivelación	m3	154.98	$ 60,100.00	$ 9,314,298.00
NP 2,5	Conformación, relleno y nivelación con material de excavación.	m2	8127.93	$ 11,242.00	$ 91,374,189.00
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				
3.1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	284.94	$ 117,873.00	$ 33,586,733.00

3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	258	$ 33,942.00	$ 8,757,036.00
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	183	$ 41,798.00	$ 7,649,034.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	21	$ 16,090.00	$ 337,890.00
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	255	$ 11,090.00	$ 2,827,950.00
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	5	$ 410,942.00	$ 2,054,710.00
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	108	$ 422,609.00	$ 45,641,772.00
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	445	$ 61,825.00	$ 27,512,125.00
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	10	$ 62,442.00	$ 624,420.00
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	470	$ 26,442.00	$ 12,427,740.00
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	125	$ 54,109.00	$ 6,763,625.00
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	245	$ 26,775.00	$ 6,559,875.00
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	308	$ 54,109.00	$ 16,665,572.00

NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	585	$ 54,109.00	$ 31,653,765.00
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	416	$ 54,109.00	$ 22,509,344.00
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	7	$ 57,442.00	$ 402,094.00
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	819	$ 26,109.00	$ 21,383,271.00
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	11	$ 54,942.00	$ 604,362.00
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	1643	$ 17,650.00	$ 28,998,950.00
3.3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	45.75	$ 128,873.00	$ 5,895,940.00
Ajuste compensatorio				$ (356.00)	$ (356.00)
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 383,544,339.00
ADMINISTRACIÓN 22%					$ 84,379,755.00
IMPREVISTOS 2%					$ 7,670,887.00
UTILIDAD 6%					$ 23,012,660.00
IVA 19%					$ 4,372,405.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 119,435,707.00
COSTO TOTAL OBRA					$ 502,980,046.00
INTERVENTORÍA					$ 19,634,049.00
TOTAL PROYECTO					$ 522,614,095.00

Ver Anexo No. 03. (*Registro fotográfico de interventoría del avance del proyecto del periodo del*

informe presentado y condiciones climáticas).

7.1 ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS (CONTRAMUESTRA)

Se informa que, de acuerdo con el presupuesto oficial del proyecto y los alcances contratados, **no se tiene contemplada la ejecución de ensayos de laboratorio** por parte de la interventoría.

En consecuencia, el control de calidad realizado durante este periodo por la Interventoría se basó en:

- **Inspección Visual:** Verificación directa en campo de los procesos constructivos.
- **Fichas Técnicas:** Revisión de la calidad de los materiales e insumos suministrados por los proveedores.
- **Certificados de Calidad:** Validación de los documentos de origen de los materiales utilizados.

Se certifica que, mediante estos mecanismos de control, las actividades ejecutadas cumplen con las normas técnicas y las especificaciones requeridas para la naturaleza del proyecto

7.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el presente periodo de corte 02/01/2026 al 02/28/2026, la Interventoría realizó el seguimiento al componente humano del Contratista de Obra, tras verificar los procesos de desvinculación e ingreso, se constató una reestructuración en el equipo de trabajo, el personal anterior tuvo fecha de salida efectiva el 02/02/2026 dando paso al nuevo personal que inició labores el 02/03/2026, Este relevo fue validado por la Interventoría bajo criterios de idoneidad y cumplimiento de requisitos legales, quedando el esquema de personal conformado de la siguiente manera:

CARGO	PERSONAL ANTERIOR	PERSONAL ACTUALIZADO
DIRECTOR DE OBRA	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO CC. 1.096.952.550	DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE CC. 88.032.705
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO CC. 13.719.287	DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ CC. 1.093.779.650
INSPECTOR HSEQ	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL CC. 1.096.249.395	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO CC. 1.094.276.397

De igual manera, esta Interventoría informa que dio cumplimiento estricto a su propuesta técnica, garantizando la permanencia del personal profesional y de apoyo necesario para

el correcto control y vigilancia del contrato, sin que se presentaron ausencias que afectaran la supervisión técnica, administrativa o financiera del proyecto

7.3 PERMISOS GESTIONADOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se certifica que el Contratista de Obra ha dado cumplimiento a la entrega de los documentos exigidos en el pliego de condiciones y el contrato. Especial atención se ha dado a los requerimientos de la supervisión de **Corponor**, logrando la aprobación en el informe N°1 del Plan de Manejo Ambiental, plan de calidad , plan de seguridad y salud en el trabajo del presente periodo

Esta Interventoría ha verificado que cada documento cumpla con la normativa técnica vigente, asegurando que la ejecución del proyecto cuente con el blindaje jurídico y ambiental necesario para evitar sanciones o suspensiones."

7.4 INFORMES EJECUTIVOS DE ACCIONES MENSUALES DE LOS ASESORES ESPECIALISTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con la estructura organizacional definida en la propuesta técnica del Contrato de Interventoría, se informa que el equipo de trabajo está conformado exclusivamente por el personal base descrito en la sección de "Personal de Interventoría".

Toda vez que la propuesta aprobada **no contempla la vinculación de asesores o especialistas externos**, no se generan informes individuales de especialidades durante el presente periodo de corte. Las actividades de control técnico, administrativo, financiero y ambiental han sido asumidas y reportadas integralmente por el Director, Residente de Interventoría, profesional ambiental de interventoría y inspector HSEQ quienes garantizan el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

7.5 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS

7.5.1 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 1 es 4.60 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $71,766,772.00, para un valor total a cobrar de $ **$71,766,772.00** del valor total contratado de $1,559,614,622.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 2 es 15.70 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $244,806,290, para un valor total a cobrar de **$244,806,290** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción del acta parcial de obra No. 3 es 32.25 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 3 por valor de, **$502,980,046.00** para un valor total a cobrar de **$502,980,046.00** del valor total contratado de $1,559,614,622.00.

El avance físico – financiero del contrato de obra en la suscripción acumulada de las actas parciales es 52.55 % del valor total contratado.

Saldo por pagar **$ 740,061,514.00**, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

7.5.2 ESTADO FINANCIERO Y RELACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El avance físico – financiero del contrato de interventoría en la suscripción del acta parcial de obra No. 1 es 4.50 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $ 4,908,512.00, para un valor total a cobrar de $ **4,908,512.00** del valor total contratado de $ 109,194,451.00

El avance físico – financiero del contrato de interventoría en la suscripción del acta parcial de obra No. 2 es 19.91 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $ 21,737,698.00, para un valor total a cobrar de $ **21,737,698.00** del valor total contratado de $ 109,194,451.00

El avance físico – financiero del contrato de interventoría en la suscripción del acta parcial de obra No. 3 es 17.98 % del valor total contratado.

Se suscribió acta parcial de obra No. 3 por valor de **$ 19,634,049.00** para un valor total a cobrar de $ **$ 19,634,049.00** del valor total contratado de $ 109,194,451.00

Saldo por pagar **$62,914,192.00**, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO DE UTILIZACIÓN (meses)	OCUPACIÓN	COSTO / MES	F.M.	COSTO PERSONAL / MES
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	1	50%	$ 3,558,750	2.160	$ 3,587,220
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	1	100%	$ 2,135,250	2.160	$ 4,304,664
PROFESIONAL AMBIENTAL	1	1	50%	$ 2,135,250	2.160	$ 2,152,332

TECNÓLOGO FORESTAL Y/O AGROFORESTAL Y/O AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL	1	1	100%	$ 1,708,200	2.160	$ 3,443,731
INSPECTOR HSEQ	1	1	50%	$ 2,135,250	2.160	$ 2,152,332
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 15,640,279**
2. COSTOS GENERALES						
DESCRIPCIÓN	**OCUPACIÓN**	**UNIDAD**	**TIEMPO (meses)**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR / MES**
PÓLIZAS Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATO		GLB				$ 392,255.00
EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, OTROS		MES	1		$ 500,000.00	$ 466,667.00
SUBTOTAL COSTOS GENERALES						**$ 858,922**
COSTO BÁSICO: COSTO DE PERSONAL (1) + COSTOS GENERALES (2)						**$ 16,499,201**
VALOR IVA (19%)						**$ 3,134,848**
VALOR TOTAL PROPUESTA						**$ 19,634,049**

Ver Anexo No. 4 *(Relación de pagos obra e interventoría)*

8 VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL

Se informa que, durante el presente periodo de corte de ejecución, **no se realizaron visitas presenciales** por parte de los miembros del Comité Veedor ni de representantes de la Junta de Acción Comunal a las instalaciones de la obra o a la oficina técnica.

Sin embargo, es importante precisar lo siguiente:

- **Canales Abiertos:** Se mantienen los canales de comunicación dispuestos por el Contratista y la Interventoría para atender cualquier requerimiento de la comunidad.

- **Soportes:** En el evento en que se realicen dichas visitas en periodos futuros, las constancias, actas de vecindad o registros de asistencia serán anexados debidamente en el **Informe de Ejecución del Contratista de Obra**, previa validación de esta Interventoría.

A la fecha del presente informe, no se han radicado inquietudes o solicitudes por parte de la comunidad que requieran el desplazamiento del comité veedor al sitio de los trabajos.

9 VERIFICACIÓN CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE HSEQ DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría realizó el seguimiento, control y auditoría constante a los criterios de cumplimiento del Contratista de Obra en materia de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** y **Manejo Ambiental**.

Se certifica que el contratista cumplió con los estándares exigidos para obras públicas. Los soportes documentales (registros fotográficos, planillas, certificados y listas de chequeo) que avalan este seguimiento se encuentran relacionados y **anexados en el informe de ejecución del contratista de obra** que hace parte integral del presente reporte.
Anexo MPA-01-F-25 - Versión 3 *(Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). (Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

9.4 LISTADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal:

CARGO	Nombre	Cédula
Director de Interventoría	Freddy Alexili Villan Valencia	88226106
Residente de Interventoría	Nelson David Acevedo Torres	1090490104
Profesional ambiental de interventoría	Adriana Teresa Monsalve Perez	1098783455
Inspector de obra de interventoría	Karin Farley Bermon Rolon	1093779618
Inspector HSQ	Luis Carlos Ortega Amaya	1094268644

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

9.4.1 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

Listado del personal ingresado en orden alfabético del personal técnico y administrativo

NOMBRE	CEDULA
Adriana Teresa Monsalve Perez	1098783455
Freddy Alexili Villan Valencia	88226106
Karin Farley Bermon Rolon	1093779618
Luis Carlos Ortega Amaya	1094268644
Nelson David Acevedo Torres	1090490104

9.4.1.1 EXÁMENES DE INGRESO

Anexo. *En el informe N°1*

9.5 AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Debido a que no se registraron ingresos de personal en el presente periodo, no se adjuntan las certificaciones de afiliación a salud, pensión y ARL del equipo técnico y administrativo.

9.2.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.2.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.2.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ARL

No se relaciona al no presentar ingreso de personal, en el periodo del presente informe.

9.3 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

En cumplimiento de los protocolos de seguimiento administrativo, se informa que durante el presente periodo de ejecución **no se presentaron retiros de personal** por de la Interventoría.

Por lo tanto, no se genera el listado de personal retirado en orden alfabético para este reporte. Se mantiene la planta de personal reportada al inicio del periodo, garantizando la continuidad y estabilidad en el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del proyecto.

9.3.2 EXÁMENES DE RETIRO

En cumplimiento de los protocolos de seguimiento administrativo, se informa que durante

el presente periodo de ejecución **no se presentaron retiros de personal** por parte de la Interventoría.

9.4 PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA Y REVISIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría. Y revisión de los pagos realizados por el contratista de obra.

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

9.5 CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Se informa que, para el presente periodo de ejecución, **no se requiere** el seguimiento a la aplicación del protocolo de bioseguridad.

Lo anterior obedece a las disposiciones normativas vigentes y a que las condiciones actuales del proyecto no exigen la implementación de medidas excepcionales de bioseguridad adicionales a las establecidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ordinario.

9.6 SEGUIMIENTO DE PLANES (SOCIOAMBIENTAL, CALIDAD, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN)

En su calidad de organismo de control, la Interventoría realizó la revisión y el seguimiento exhaustivo a la aplicación de los planes de gestión por parte del contratista de obra durante el periodo reportado. Se constató el cumplimiento de los siguientes instrumentos:

- **Plan de Gestión Ambiental:** Verificación de medidas de mitigación y protección de recursos naturales bajo los estándares de **Corponor**.
- **Plan de Gestión del Riesgo:** Monitoreo de los puntos críticos identificados para prevenir incidentes técnicos o sociales.
- **Plan de Señalización:** Supervisión de la demarcación de seguridad para el personal y el tránsito en el área de influencia.
- **Plan de Emergencia:** Validación de la capacidad de respuesta y disponibilidad de recursos de primeros auxilios y contra incendios.
- **Plan de Calidad:** Control de procesos constructivos y cumplimiento de especificaciones técnicas.

Se certifica que la aplicación de estos planes fue satisfactoria. Los soportes documentales, registros de inspección y evidencias de campo que avalan este seguimiento se encuentran relacionados y **anexados en el informe de ejecución del contratista de obra**, los cuales fueron validados por esta Interventoría

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES

ANEXOS

Anexo *Pólizas iniciales, En el informe 1.*

Anexo *Polizas actualizadas En el informe 1.*

Anexo. *Acta de inicio , En el informe N°1*

Anexo. *Acta de comite N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comite N°2. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comite N°3 En el informe N°2*

Anexo. *Acta de modificación N°1. En el informe N°2*

Anexo. *Acta de comité N°4*

Anexo. *Acta de comité N°5*

Anexo. *Acta de modificación N°2.*

Anexo. *Acta de comité N°6*

Ver Anexo No. 01. (*Cronograma de actividades y Flujo de fondos)*

Ver Anexo No. 02*. (Balance físico – financiero de obra e interventoría)*

Ver Anexo No. 03. (*Registro fotográfico de interventoría del avance del proyecto del periodo del informe presentado y condiciones climáticas)*.

Ver Anexo No. 04. *(Relación de pagos obra e interventoría)*

Anexo MPA-01-F-25 - Versión 3 *(Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

Anexo *(Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2). (Informes mensuales HSEQ con sus respectivos anexos al informe solicitados en el formato MPA-01-F28 Versión 2).*

Anexo. *Control diario del personal de interventoría (Asistencia)*

Anexo *(planillas de pago al sistema de seguridad social)*

Anexo. Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 04

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 1 de Febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

1. Compromisos de entrega de informes quincenales de avance de obra.
2. Aprobación al diseño arquitectónico (Plano 1/3 Redoma Arnulfo Briceño) y diseños arquitectónico de las otras áreas a intervenir
3. Solicitud de modificatorio (cuadro de mayores y menores).
4. Solicitud de Aprobación de cambio de personal(Director de Obra, Residente de Obra; Inspector HSEQ)

.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 9 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

1. Tema: Informes quincenales de avance de obra

La Interventoría, y supervisión comunica al Contratista las importancias de entrega periódica de informes de avance de obra, los cuales deberán ser presentados de manera quincenal. Se indicó que esto permitirá llevar un control detallado de la ejecución del proyecto y garantizar el seguimiento continuo por parte de la supervisión e interventoría. El Contratista tomó nota de lo expuesto y reafirmó su compromiso de cumplir con dichos informes.

2. Tema: Diseños aprobados y (Plano 1/3 Redoma Arnulfo Briceño) y demás planos arquitectónicos.

La Interventoría informó al Contratista que, una vez revisado, el plano arquitectónico correspondiente a la Redoma Arnulfo Briceño (plano 1/3) ha sido aprobado. No obstante, se aclaró que cualquier modificación durante la ejecución deberá ser comunicada a la interventoria. Por su parte, el Contratista manifestó que, dependiendo del avance de la obra y de las condiciones reales que se presenten en terreno, los diseños podrán estar sujetos a ajustes, garantizando en todo momento la calidad del proyecto y la coherencia con el diseño paisajístico general.

3. Tema: Solicitud de modificatorio contractual (cuadro de mayores y menores)

El Contratista expuso que, conforme al avance de la obra y a las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar, se evidencia la necesidad de realizar un modificatorio contractual que contemple un cuadro de mayores y menores cantidades, así como la posible inclusión de ítems no previstos que permitan ajustar el alcance del contrato a las condiciones reales del terreno y al diseño aprobado. La Interventoría respondió que, para proceder con la revisión formal del modificatorio, el Contratista deberá entregar la documentación completa que sustente técnica, financiera y administrativamente la solicitud, incluyendo memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, justificaciones técnicas y estudios de mercado, entre otros.

- Sábana o presupuesto ajustado, donde se evidencien claramente:
    - Cantidades contractuales que aumentan

- Cantidades contractuales que disminuyen
- Inclusión de ítems no previstos

- Memorias de cantidades de obra, debidamente enlazadas con el presupuesto.
- Informe técnico de justificación del balance presupuestal del contratista de obra.
- Justificación técnica, administrativa y financiera de la interventoría.
- APU's (Análisis de Precios Unitarios).
- Cotizaciones.
- Estudio de mercado.
- Especificaciones técnicas.

La Interventoría aclara que únicamente con la entrega completa de la documentación anteriormente relacionada se procederá a la revisión, emisión de recibido y posterior evaluación del modificatorio.

4. Tema: Solicitud de Aprobación de cambio de personal(Director de Obra, Residente de Obra; Inspector HSEQ)

Toma la palabra el contratista, manifestando la necesidad de aprobación de cambio de personal, proponiendo nuevos profesionales para los roles de Director de Obra, Residente de Obra e Inspector HSEQ. Se aclara que la fecha de retiro del personal saliente corresponde al 02/02/2026, con el ingreso inmediato del personal nuevo el 03/02/2026 para evitar vacíos en la supervisión de campo, por lo cual la conformación del personal se establece bajo el siguiente esquema:

CARGO	PERSONAL ANTERIOR	PERSONAL ACTUALIZADO
DIRECTOR DE OBRA	ANGELA GIOCONDA JAIMES CORONADO CC. 1.096.952.550	DIEGO EDUARDO CUADROS AGUIRRE CC. 88.032.705
RESIDENTE DE OBRA	LUIS FERNANDO SUAREZ DELGADO CC. 13.719.287	DARLIN YERITZA MARTINEZ MARTINEZ CC. 1.093.779.650
INSPECTOR HSEQ	LINA MARCELA LOZADA PIMENTEL CC. 1.096.249.395	DANNY SURELLY PARRA LIZCANO CC. 1.094.276.397

El Contratista hace constar que la solicitud de actualización de personal fue radicada oportunamente ante la Interventoría, adjuntando los perfiles que acreditan el cumplimiento de las exigencias del Pliego de Condiciones. Al respecto, la Interventoría manifiesta su aval técnico tras verificar que los profesionales propuestos cumplen con la idoneidad y experiencia requerida. Acto seguido, la Supervisión otorga su aprobación definitiva, validando que la transición se ajusta estrictamente a los requerimientos contractuales. No obstante, ambas

instancias aclaran que el Contratista queda obligado a formalizar la vinculación mediante la entrega inmediata de los certificados de afiliación a seguridad social y los exámenes médicos de ingreso del nuevo personal.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. El contratista deberá realizar la revisión integral de los manuales técnicos de señalización aplicables al proyecto y determinar la necesidad de implementar
2. El contratista deberá estructurar y presentar el paquete completo de documentos requeridos para la solicitud de modificatorio.
3. El contratista deberá hacer la entrega de las certificaciones de afiliación de seguridad social y los exámenes médicos del nuevo personal.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 05

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 17 enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Intervento LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

Aclaración referente al aumento de cantidad estipulado en el ítem. NP 2,5 - 3,1 - 3,2,1 - 3,2,2 - 3,2,8 - 3,2,23 - 3,2,25 - 3,2,33 - 3,2,34 - 3,2,35 - NP 3,2,39 - NP 3,2,45

Necesidad de disminución de cantidad en los ítems: 2,1 - 2,3 - 2,4 - 3,2,6 - 3,2,7 - 3,2,9 - 3,2,10 - 3,2,12 - 3,2,13 - NP 3,2,15 - NP 3,2,16 - NP 3,2,19 - NP 3,2,22 - NP 3,2,26 - NP 3,2,27 - NP 3,2,30 - NP 3,2,42 - NP 3,2,43 - NP 3,2,46 - 3,3,1 - 3,3,2 - 4,5

Aclaración de eliminación de ítems: 3,2,3 - 3,2,14

Necesidad de crear ítems no previstos: NP 3,2,47 - NP 3,2,48 - NP 3,2,49 - NP 3,2,50 - NP 3,2,51 - NP 3,2,52 - NP 3,2,53 - NP 3,2,54 - NP 3,2,55 - NP 3,3,5

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del proceso de revisión de cantidades, se realizó una corrección en el **ítem 3,1** mediante el redondeo de sus unidades a dos decimales. La medida responde a la necesidad de **corregir una distorsión en el cálculo** derivada del uso de múltiples cifras decimales, lo cual afectaba la exactitud de los valores totales. Esta precisión técnica conlleva un incremento residual de **$551.00 pesos** en el costo total del ítem; una cifra que, aunque porcentualmente despreciable, es necesaria para reflejar el valor real y exacto de la ejecución dentro del presupuesto contractual.

3	ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE							- 00	$ -			
3.1	Mejora del suelo con material de enriqueci (mezcla de suelo arena y orgánico)	m3	554.0	$ 117.873.00	$ 65.305.806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00		

A su vez se detectó una inconsistencia de precisión en el **ítem 4.5**, procediendo a su respectiva corrección aritmética. A diferencia del ajuste anterior, en esta actividad se optó por **estandarizar la cantidad a un valor entero**, eliminando la dispersión generada por los decimales excedentes. Esta simplificación técnica derivó en una **reducción mínima en la cantidad total del ítem**, permitiendo una liquidación más exacta, acorde a las unidades reales de ejecución en campo.

4	MANTENIMIENTO (6 MESES)							- 00	$ -			
4.1	Riego programado	m3	672.00	$ 77.500.00	$ 52.080.000.00		- 00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		
4.2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- 00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		
4.3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- 00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		
4.4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- 00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		
4.5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$ 43,152,650.00		

En relación con el ítem **2.1 (Limpieza general y deshierbe)**, se informa que, una vez realizadas las inspecciones técnicas en campo se pudo constatar que diversas áreas contempladas originalmente dentro del alcance de esta actividad no requieren intervención.
Lo anterior obedece a que dichas zonas presentan condiciones adecuadas de terreno, baja presencia de vegetación invasiva. Como resultado de esta verificación, se ha determinado una disminución justificada en el área total a intervenir, ajustando así las cantidades de obra a la realidad física del proyecto y optimizando los recursos disponibles.

2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2.1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.27	$ 1,352.00	$ 28,783,629.89	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,429.68)	13,161.89	$ 17,794,609.89		
2.2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$ 68,180.00	$ 30,960,000.00		- 00	$ -	600.00	$ 30,960,000.00		
2.3	Poda y/o erradicación de árboles de porte alto	Und	50.00	$ 678,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00		
2.4	Retiro de material sobrante	m3	800.24	$ 48,224.00	$ 34,602,200.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00		
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion	m2	8,551.28	$ 11,242.00	$ 96,133,285.00	(+)	3,582.74	$ 39,939,583.00	12,134.00	$ 136,073,168.00		

con el objetivo de lograr la nivelación del terreno y mejorar las condiciones del suelo existente, en las áreas restantes del proyecto se realizará una conformación y nivelación del terreno en las demás áreas a intervenir

Esta intervención consiste en retirar el material sobrante de los puntos más elevados para utilizarlo en las zonas que requieren relleno y nivelación. De esta manera, se optimiza el uso del material disponible y se mejora la eficiencia en la ejecución de la obra.

Bajo este criterio de aprovechamiento de recursos y eficiencia técnica, el aumento del ítem **NP 2.5 (Conformación, relleno y nivelación con material de excavación)**, lo cual permite una adecuación del terreno técnicamente viable para el proyecto.



2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,288.22	$	1,262.00	$	26,783,025.00	(-)	(8,127.52)	$ (10,068,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$	60,166.00	$	36,099,600.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$	670,260.00	$	33,513,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,690.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	890.24	$	40,224.00	$	34,682,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,797.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$	11,242.00	$	96,133,285.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,993.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

En cuanto al ítem **2.4 (Retiro de material sobrante)**, se informa una reducción en las cantidades ejecutadas. Esto se debe a que el material obtenido de las excavaciones será reutilizado dentro del mismo proyecto para las labores de conformación y nivelación del terreno. Al aprovechar este material en el sitio de la obra, se reduce la necesidad de retirarlo y disponerlo fuera del proyecto, lo que disminuye el volumen de material sobrante que inicialmente se tenía previsto retirar.



2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,288.22	$	1,262.00	$	26,783,025.00	(-)	(8,127.52)	$ (10,068,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$	60,166.00	$	36,099,600.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$	670,260.00	$	33,513,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,690.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	890.24	$	40,224.00	$	34,682,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,797.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$	11,242.00	$	96,133,285.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,993.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

Continuando con el ítem **2.3 (Poda y/o erradicación de árboles de porte alto)**, y conforme al análisis técnico y al inventario del arbolado existente, se identificó un número menor de ejemplares a intervenir, ya sea para poda o erradicación. Esta situación conlleva a una disminución justificada en la cantidad total considerada inicialmente para el presente ítem.



2	DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL										
2,1	Limpieza general y desherbe	m2	21,288.22	$	1,262.00	$	26,783,025.00	(-)	(8,127.52)	$ (10,068,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00
2,2	Excavación y nivelación	m3	600.00	$	60,166.00	$	36,099,600.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$	670,260.00	$	33,513,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,690.00)	47.00	$ 31,499,400.00
2,4	Retiro de material sobrante	m3	890.24	$	40,224.00	$	34,682,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,797.00)	649.03	$ 26,106,583.00
NP 2.5	Conformación, relleno y Nivelación con material de excavación	m2	8,551.26	$	11,242.00	$	96,133,285.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,993.00	12,104.00	$ 136,073,168.00

Según los objetivos de impacto urbano y paisajístico del proyecto, se ha realizado un diagnóstico integral de las áreas de intervención. Considerando las condiciones bioclimáticas de la región, caracterizada por zonas áridas, se determinó la necesidad de incorporar especies vegetales idóneas que garanticen la sostenibilidad y supervivencia en el entorno.

Como resultado de este análisis y en atención a las necesidades específicas identificadas en campo, se ajustaron las cantidades de algunas especies previamente contempladas, disminuyendo algunas y se formaliza la creación de nuevos ítems que responden a las condiciones reales de los espacios y a los requerimientos paisajísticos del proyecto
NP 3,2,47 - NP 3,2,48 - NP 3,2,49 - NP 3,2,50 - NP 3,2,51 - NP 3,2,52 - NP 3,2,53 - NP 3,2,54 - NP 3,2,55

NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	-	00	$ 29.941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2.964.159.00	99.00	$	2.964.159.00
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 9.339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5.603.400.00	600.00	$	5.603.400.00
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	-	00	$ 21.943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4.388.600.00	200.00	$	4.388.600.00
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Ruscuela aculeatBorrás: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	-	00	$ 33.946.00	$ -	(+)	100.00	$ 3.394.600.00	100.00	$	3.394.600.00
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 41.807.00	$ -	(+)	90.00	$ 3.744.630.00	90.00	$	3.744.630.00
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 36.939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3.324.510.00	90.00	$	3.324.510.00
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 5 de largo entre 10 y 30 cm	Und	-	00	$ 30.182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3.018.200.00	100.00	$	3.018.200.00
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Cristo fidee: En bolsa de 3 kg número 35 de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 34.941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1.747.050.00	50.00	$	1.747.050.00
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	-	00	$ 59.512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416.584.00	7.00	$	416.584.00

Estas especies han sido seleccionadas por su alta resistencia y adaptabilidad climática.

En consecuencia, y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una reducción proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,6 - 3,2,7 - 3,2,9 - 3,2,10 - 3,2,12 - 3,2,13 - NP 3,2,15 - NP 3,2,16 - NP 3,2,19 - NP 3,2,22 - NP 3,2,26 - NP 3,2,27 - NP 3,2,30 - NP 3,2,42 - NP 3,2,43 - NP 3,2,46**

3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$	26.674.00	$ 2.667.400.00	(-)	(50.00)	$ (1.348.700.00)	50.00	$	1.348.700.00
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$	16.890.00	$ 1.689.000.00	(-)	(74.00)	$ (1.190.660.00)	26.00	$	416.340.00
3,2,9	Suministro de material vegetal especie bora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$	11.590.00	$ 1.159.000.00	(+)	160.00	$ 1.774.400.00	260.00	$	2.933.400.00
3,2,10	Suministro de material vegetal especie diamela: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$	12.737.00	$ 1.273.700.00	(-)	(90.00)	$ (1.146.330.00)	10.00	$	127.370.00
3,2,12	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$	14.050.00	$ 2.810.000.00	(-)	(150.00)	$ (2.113.500.00)	50.00	$	704.500.00
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rabelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 00 cm	Und	-	00	$ 64.778.00	$ -		-	00 $ -	-	00 $	-
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Uraga: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$	20.090.00	$ 401.800.00	(-)	(10.00)	$ (200.900.00)	10.00	$	200.900.00
3,2,15	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 35 y 60 cm	Und	80.00	$	20.090.00	$ 1.607.200.00	(-)	(50.00)	$ (1.004.500.00)	30.00	$	601.800.00

NP 3.2.16	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80. Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	88.00	$ 426,984.00	$ 34,166,720.00	(-)	(48.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00
NP 3.2.16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60 , Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	88.00	$ 356,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(78.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00
NP 3.2.17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 45 kg número 90, con una altura Con altura de 2.00 m	Und	14.00	$ 536,942.00	$ 7,503,188.00		- 00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00
NP 3.2.18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 68 kg número 90 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	58.00	$ 616,942.00	$ 20,547,180.00		- 00	$ -	58.00	$ 20,547,180.00
NP 3.2.19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00
NP 3.2.20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.80 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- 00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00
NP 3.2.21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.80 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- 00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00
NP 3.2.22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60 , con una altura total de 0.80 a 1.00 m	Und	88.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(68.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00
NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg numero 60 a 80, con una altura total 2.80 a 2.50 m	Und	88.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00
NP 3.2.26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	159.00	$ 61,542.00	$ 9,291,378.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,126.00)	100.00	$ 6,194,252.00
NP 3.2.27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00
NP 3.2.28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 6 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 68,109.00	$ 10,819,620.00		- 00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00
NP 3.2.29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 68,109.00	$ 6,810,900.00		- 00	$ -	100.00	$ 6,810,900.00
NP 3.2.30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00
NP 3.2.31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de larga entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- 00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00
NP 3.2.32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	260.00	$ 26,775.00	$ 6,960,750.00		- 00	$ -	260.00	$ 6,960,750.00
NP 3.2.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 90 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,888,641.00	849.00	$ 45,938,641.00
NP 3.2.35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 15 a	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00
NP 3.2.42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 18 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00
NP 3.2.43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OTI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00
NP 3.2.44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- 00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 15, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,550.00	$ 15,795,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00
NP 3.2.46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,550.00	$ 4,413,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,039,500.00)	20.00	$ 383,000.00

de acuerdo con las disminuciones. necesidades de la obra , y con el fin de optimizar el diseño y mantener el equilibrio presupuestal de la intervención, se ha procedido a realizar una aumento

proporcional en las cantidades de los siguientes ítems existentes: **3,2,1 - 3,2,2 - 3,2,8 - NP3,2,23 - NP3,2,25 - NP3,2,33 - NP3,2,34 - NP3,2,35 - NP 3,2,39 - NP3,2,45**

3.2.1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 5 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.80	$ 10,182,800.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.80	416.00	$ 14,119,072.00
3.2.2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,796.00	$ 4,179,600.00	(+)	188.00	$ 7,858,324.00	288.00	$ 12,037,924.00
3.2.3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 65,796.00	$ 6,579,600.00	(-)	(100.00)	$ (6,579,600.00)	- 00	$ -
3.2.4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 20 y 95, con una altura entre 30 y 50 cm durante el desarrollo del contrato	Und	- 00	$ 66,974.00	$ -		- 00	$ -	- 00	$ -
3.2.5	Suministro de material vegetal especial Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- 00	$ 66,974.00	$ -		- 00	$ -	- 00	$ -
3.2.6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00
3.2.7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,026.00	$ 1,602,600.00	(-)	(74.00)	$ (1,186,062.00)	26.00	$ 416,538.00
3.2.8	Suministro de material vegetal especie ixora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,096.00	$ 1,109,600.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,600.00
NP 3.2.23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 66 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,669.00	$ 33,800,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00
NP 3.2.24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROLBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.80 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- 00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00
NP 3.2.25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE: En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,715,200.00	716.00	$ 44,262,700.00
NP 3.3.33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,888,887.00	313.00	$ 16,936,137.00
NP 3.2.34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00
NP 3.2.36	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 18 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,716,615.00	(+)	218.00	$ 11,796,762.00	453.00	$ 24,513,377.00
NP 3.2.39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,800.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	568.00	$ 14,358,960.00	1,590.00	$ 48,468,960.00
NP 3.2.45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,600.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00

En relación con el ítem no previsto **NP 3.3.5 (Construcción de dos corazones en material vegetal)**, y de acuerdo con el avance de la obra, se hace necesaria su incorporación para lograr una integración orgánica con el diseño paisajístico. Esta intervención responde al impacto visual que se busca generar en los transeúntes, permitiendo que el elemento vegetal se funda de manera armónica con el entorno y potencie la intención estética del proyecto

3,3	INSTALACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y DUROS									
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- 00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00

En lo referente al ítem **3,3,1 (Suministro e instalación de material triturado) 3,3,2 (Suministro e instalación de piedra bola)**, tras un análisis detallado del diseño paisajístico final y los criterios estéticos del proyecto, se ha determinado una modificación en el uso decorativos. Se concluye que se priorizará el uso de material vegetal por sobre la piedra bola y triturado En consecuencia, se procede a realizar una reducción en las cantidades ejecutadas de este ítem, ajustando el volumen de suministro a los requerimientos actuales de la propuesta paisajística.

3,3	Instalación de elementos decorativos y duros				$ -		- 00	$ -		$ -
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- 00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- 00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00

De acuerdo con las necesidades identificadas durante el avance del proyecto, y conforme a los criterios técnicos y paisajísticos establecidos, se determinó que no resulta viable ni funcional la siembra de las especies inicialmente contempladas. En particular, se evaluaron las condiciones del terreno, los requerimientos de mantenimiento y la integración con el entorno, concluyendo que no se justifica la incorporación de las siguientes especies: **3.2.3** (Suministro de material vegetal especie Maguey: en bolsa de 1 kg, números 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm). - **3.2.14** (Suministro e instalación de Grama maní forrajero.)

En consecuencia, se procede a eliminar dichos ítems del alcance del proyecto, ajustando las cantidades y actividades a las condiciones reales de intervención.

3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg números 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 48,788.00	$ 4,878,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,878,800.00)	- 00	$ -
3,2,14	Suministro e instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- 00	$ -

Tras el análisis del modificatorio del proyecto, la **Interventoría** ha verificado que los ajustes propuestos, correspondientes al balance de cantidades y a la inclusión de ítems no previstos, no alteran el alcance financiero establecido inicialmente

Así mismo, se ha constatado que la solicitud de balance no requiere la adición de recursos financieros, ya que el contrato mantiene su equilibrio económico a la fecha del presente informe.

Una vez elaborado y revisado el balance detallado, la **Interventoría** evidencia que la compensación entre ítems garantiza la ejecución total de las obras proyectadas sin incrementar el valor contractual vigente, asegurando así la eficiencia administrativa y presupuestal de la intervención.

Por las anteriores consideraciones expresadas la presente interventoría considera que la modificación de mayores y menores cantidades es conveniente para el proyecto.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.



EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA



NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA



LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

ACTA DE COMITÉ No. 06

CONTRATO No Y FECHA	LIC731-2025 del 19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Obra
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 25 de Febrero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
ASISTENTES:	UNIÓN TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025 R/L EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ Contratista UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES R/L NELSON DAVID ACEVEDO TORRES Interventor LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS Supervisor

1. TEMAS A TRATAR/ AGENDA A DESARROLLO:

1. Entrega y aprobación de planos faltantes (Redoma Corponor y Separador Malecón).
2. Seguimiento a informes quincenales de avance de obra.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 8 am en las instalaciones de la subdirección de Corponor, para revisión de las actividades contractuales de la ejecución del proyecto ESTABLECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA; PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA O INTERVENTORÍA

MPA-01-F-18, versión 5, 08/07/2024

1. Tema: Entrega y aprobación de planos faltantes (Redoma Corponor y Separador Malecón)

El Contratista informó que han sido entregados los planos faltantes correspondientes a la Redoma Corponor y al Separador Malecón, completando así la documentación técnica requerida para estas áreas. Acto seguido, la Interventoría tomó la palabra y comunicó que, una vez revisada la documentación, dichos planos cuentan con su aprobación, validando que se ajustan a las especificaciones técnicas y al diseño paisajístico establecido para el proyecto.

El Contratista manifestó que, si bien los diseños han sido aprobados, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el proceso paisajístico y las condiciones y dinámicas que se vayan observando y analizando en cada área, estos podrán estar sujetos a modificaciones dependiendo de las necesidades que surjan en el terreno. Se aclaró que esto se realiza con el fin de desarrollar un diseño armónico y amable con los espacios, garantizando que la intervención se integre de manera natural y coherente con el entorno. La Interventoría tomó nota de lo expuesto y reiteró que cualquier ajuste deberá ser debidamente comunicado y contar con su visto bueno previo a su ejecución.

3. Tema: Seguimiento a informes quincenales de avance de obra

El Contratista informó que el primer informe quincenal correspondiente al avance de la obra ya fue entregado en los plazos establecidos, dando cumplimiento al compromiso adquirido en reuniones anteriores. Asimismo, se comprometió a realizar la entrega del segundo informe quincenal al finalizar el mes en curso, dando continuidad al cronograma de reportes periódicos acordado para el seguimiento del proyecto.

1. ACUERDOS Y COMPROMISOS

2. Se deja constancia de la aprobación por parte de la Interventoría de los planos correspondientes a la Redoma Corponor y al Separador Malecón.

3. El Contratista reafirma el compromiso de entregar el segundo informe quincenal al finalizar el mes, dando continuidad a los reportes periódicos de avance de obra.

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ
UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
CONTRATISTA

NELSON DAVID ACEVEDO TORRES
UNIÓN TEMPORAL INTER VERDES
INTERVENTORÍA

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR - CORPONOR

Ver Anexo No. 1. *BALANCE FISICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA*

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**DIAGNOSTICO**				$ -			$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -			$ -	
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	$ 2,819,451.00		$ -		$ -	0.30	$ 2,819,451.00	**30%**	0.70	$ 6,578,718.00	**70%**
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	$ 655,269.00		$ -		$ -	0.30	$ 655,269.00	**30%**	0.70	$ 1,528,960.00	**70%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	$ 640,583.00		$ -		$ -	0.30	$ 640,583.00	**30%**	0.70	$ 1,494,693.00	**70%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.22	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00	3,328.21	$ 4,499,740.00	2,895.52	$ 3,914,743.00		$ -	6,223.73	$ 8,414,483.00	**47%**	6,937.96	$ 9,380,122.00	**53%**
2,2	Excavacion y nivelacion	m3	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	$ 20,003,684.00	98.76	$ 5,935,596.00	154.98	$ 9,314,298.00	586.58	$ 35,253,458.00	**98%**	13.42	$ 806,542.00	**2%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -		47.00	$ 31,499,400.00	**100%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00	649.03	$ 26,106,583.00		$ -		$ -	649.03	$ 26,106,583.00	**100%**	-	$ -	
NP 2.5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00		$ -	2,895.52	$ 32,551,436.00	8,127.93	$ 91,374,189.00	11,023.45	$ 123,925,625.00	**91%**	1,080.55	$ 12,147,543.00	**9%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00	(+)	0.00	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00		$ -	98.76	$ 11,641,373.00	284.94	$ 33,586,733.00	383.70	$ 45,227,870.00	**69%**	170.34	$ 20,078,487.00	**31%**
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00		$ -	153.00	$ 5,193,126.00	258.00	$ 8,757,036.00	411.00	$ 13,950,162.00	**99%**	5.00	$ 169,710.00	**1%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00		$ -	100.00	$ 4,179,800.00	183.00	$ 7,649,034.00	283.00	$ 11,828,834.00	**98%**	5.00	$ 208,990.00	**2%**
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 1,348,700.00	**100%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00		$ -		$ -	21.00	$ 337,890.00	21.00	$ 337,890.00	**81%**	5.00	$ 80,450.00	**19%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00		$ -		$ -	255.00	$ 2,827,950.00	255.00	$ 2,827,950.00	**98%**	5.00	$ 55,450.00	**2%**
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90.00)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		10.00	$ 127,370.00	**100%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 704,500.00	**100%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		10.00	$ 200,900.00	**100%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 401,800.00	**100%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- .00	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		40.00	$ 17,079,360.00	**100%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		10.00	$ 3,909,420.00	**100%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00		$ -	14.00	$ 7,503,188.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00		$ -		$ -	5.00	$ 2,054,710.00	5.00	$ 2,054,710.00	**10%**	45.00	$ 18,492,390.00	**90%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		10.00	$ 3,876,090.00	**100%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00		$ -	36.00	$ 19,353,924.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00		$ -	9.00	$ 4,838,481.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 7,752,180.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00		$ -	10.00	$ 4,226,090.00	108.00	$ 45,641,772.00	118.00	$ 49,867,862.00	**96%**	5.00	$ 2,113,045.00	**4%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00		$ -	80.00	$ 31,142,000.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00		$ -	221.00	$ 13,663,325.00	445.00	$ 27,512,125.00	666.00	$ 41,175,450.00	**93%**	50.00	$ 3,091,250.00	**7%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 6,194,200.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00		$ -	55.00	$ 3,434,310.00	10.00	$ 624,420.00	65.00	$ 4,058,730.00	**43%**	85.00	$ 5,307,570.00	**57%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -	100.00	$ 6,010,900.00	**56%**	80.00	$ 4,808,720.00	**44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 6,010,900.00	**100%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00		$ -		$ -	470.00	$ 12,427,740.00	470.00	$ 12,427,740.00	**94%**	30.00	$ 793,260.00	**6%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00		$ -	85.00	$ 4,599,265.00	125.00	$ 6,763,625.00	210.00	$ 11,362,890.00	**53%**	190.00	$ 10,280,710.00	**48%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00		$ -		$ -	245.00	$ 6,559,875.00	245.00	$ 6,559,875.00	**98%**	5.00	$ 133,875.00	**2%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00		$ -		$ -	308.00	$ 16,665,572.00	308.00	$ 16,665,572.00	**98%**	5.00	$ 270,545.00	**2%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00		$ -	259.00	$ 14,014,231.00	585.00	$ 31,653,765.00	844.00	$ 45,667,996.00	**99%**	5.00	$ 270,545.00	**1%**
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00		$ -	32.00	$ 1,731,488.00	416.00	$ 22,509,344.00	448.00	$ 24,240,832.00	**99%**	5.00	$ 270,545.00	**1%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00		$ -	38.00	$ 2,182,796.00	7.00	$ 402,094.00	45.00	$ 2,584,890.00	**75%**	15.00	$ 861,630.00	**25%**

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		500.00	$ 13,304,500.00	100%
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		22.00	$ 614,724.00	100%
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00		$ -	50.00	$ 1,305,450.00	819.00	$ 21,383,271.00	869.00	$ 22,688,721.00	56%	681.00	$ 17,780,229.00	44%
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 2,610,900.00	100%
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 1,105,500.00	100%
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00		$ -	5.00	$ 649,710.00	100%	-	$ -	
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00		$ -	19.00	$ 2,468,898.00	76%	6.00	$ 779,652.00	24%
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00		$ -		$ -	11.00	$ 604,362.00	11.00	$ 604,362.00	22%	39.00	$ 2,142,738.00	78%
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00		$ -	60.00	$ 1,059,000.00	1,643.00	$ 28,998,950.00	1,703.00	$ 30,057,950.00	99%	10.00	$ 176,500.00	1%
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		20.00	$ 353,000.00	100%
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		99.00	$ 2,964,159.00	100%
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		600.00	$ 5,603,400.00	100%
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		200.00	$ 4,388,600.00	100%
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 3,394,500.00	100%

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR ($)**	**+/-**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**	**CANT**	**VALOR ($)**		**CANT**	**VALOR ($)**	
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		90.00	$ 3,744,630.00	**100%**
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		90.00	$ 3,324,510.00	**100%**
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		100.00	$ 3,018,200.00	**100%**
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		50.00	$ 1,747,050.00	**100%**
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		7.00	$ 416,584.00	**100%**
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		13.92	$ 1,571,192.00	**100%**
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00		$ -		$ -	45.75	$ 5,895,940.00	45.75	$ 5,895,940.00	**76%**	14.25	$ 1,836,440.00	**24%**
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		2.00	$ 4,180,400.00	**100%**
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00		$ -	2.00	$ 5,076,400.00	**100%**	-	$ -	
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00		$ -		$ -		$ -		$ -		1.00	$ 4,338,725.00	**100%**
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		672.00	$ 52,080,000.00	**100%**
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.00	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		47,600.00	$ 64,355,200.00	**100%**
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.00	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		15,400.00	$ 86,886,800.00	**100%**
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.00	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		11,000.00	$ 32,395,000.00	**100%**
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00	(-)	(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$ 43,152,650.00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		1,075.00	$ 43,152,650.00	**100%**
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	$ -	
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		$ -		$ -		$ (356.00)	-	$ -		2,500.00	$ 27,735,000.00	**100%**
Ajuste compensatorio																						
COSTO DIRECTO					**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$ 1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$186,675,530.00**		**$383,544,339.00**		**$ 624,945,179.00**			**$ 564,329,353.00**	
ADMINISTRACIÓN			22%		$261,640,397.00			0		$261,640,397.00		12039568.2		41068616.6		84379754.58		137487939.4			124152457.7	
IMPREVISTOS			2%		$23,785,491.00			0		$23,785,491.00		1094506.2		3733510.6		7670886.78		12498903.58			11286587.06	
UTILIDADES			6%		$71,356,472.00			0		$71,356,472.00		3283518.6		11200531.8		23012660.34		37496710.74			33859761.18	
IVA sobre utilidad			19%		$13,557,730.00			0		$13,557,730.00		623868.534		2128101.042		4372405.465		7124375.041			6433354.624	
COSTO INDIRECTO					**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$119,435,707.00**		**$ 194,607,929.00**			**$ 175,732,161.00**	
VALOR TOTAL OBRA					**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$ 1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$244,806,290.00**		**$502,980,046.00**		**$ 819,553,108.00**			**$ 740,061,514.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE OBRA												**4.60%**		**15.70%**		**32.25%**		**52.55%**			**47.45%**	

INTERVENTORIA					**$ 91,760,043.00**					**$ 91,760,043.00**		**$ 4,124,800.00**		**$ 18,266,973.00**		**$ 16,499,201.00**		**$ 38,890,974.00**			**$ 52,869,069.00**	
IVA Interventoria			19%		$ 17,434,408.17			$ -		$ 17,434,408.17		$ 783,712.00		$ 3,470,724.87		$ 3,134,848.19		$ 7,389,285.06			$ 10,045,123.11	
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO					**$ 109,194,451.00**			**$ -**		**$ 109,194,451.00**		**$ 4,908,512.00**		**$ 21,737,698.00**		**$ 19,634,049.00**		**$ 46,280,259.00**			**$ 62,914,192.00**	
PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA												**4.50%**		**19.91%**		**17.98%**		**42.38%**			**57.62%**	

ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							DESDE:	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	SUPERVISOR:	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER VERDES	INFORME No.	3	HASTA:	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		INFORME No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		INFORME No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		INFORME No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE		% EJECUTADO	POR EJECUTAR		% POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
TOTAL PROYECTO :					$ 1,668,809,073.00		$ -		$ 1,668,809,073.00		$ 76,675,284.00		$ 266,543,988.00		$ 522,614,095.00		$ 865,833,367.00			$ 802,975,706.00		
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :											4.59%		15.97%		$ 0.31		51.88%			48.12%		

OBSERVACIONES:

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 2.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$120 Pesos M/CTE.

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 3.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$236 Pesos M/CTE.

Darlin Yeritza Martinez Martinez
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Diego Eduardo Cuadros Aguirre
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Ver *Anexo No. 2.* *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA*.

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2,2**	**Excavacion y nivelacion**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA	**02/28/2026**



Se llevaron acabo actividades de excavacion y nivelacion



Se llevaron acabo actividades de excavacion y nivelacion



Se llevaron acabo actividades de excavacion y nivelacion



Se llevaron acabo actividades de excavacion y nivelacion

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 2.5**	**Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA	**02/28/2026**



Se realizo la conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Se realizo la conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Se realizo la conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion



Se realizo la conformacion, relleno y nivelacion con material de excavacion

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,1**	**Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Se hizo uso de mejora de suelo con material de enmienda



Se hizo uso de mejora de suelo con material de enmienda



Se hizo uso de mejora de suelo con material de enmienda



Se hizo uso de mejora de suelo con material de enmienda

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,1**	**Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Veranera



Suministro e instalacion de Veranera



Suministro e instalacion de Veranera



Suministro e instalacion de Veranera

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,2**	**Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave



Suministro e instalacion de Agave

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,7**	**Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Cactus



Suministro e instalacion de Cactus



Suministro e instalacion de Cactus



Suministro e instalacion de Cactus

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,2,8**	**Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm**	**DESDE**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de isora blanca



Suministro e instalacion de isora blanca



Suministro e instalacion de isora blanca



Suministro e instalacion de isora blanca

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,18**	**Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia



Suministro e instalacion de Palma Bismarckia

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,23**	**Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila



Suministro e instalacion de Palma Manila

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,25**	**Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline



Suministro e instalacion de Cordyline

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,27**	**Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Cancion de la India



Suministro e instalacion de Cancion de la India



Suministro e instalacion de Cancion de la India



Suministro e instalacion de Cancion de la India

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,30**	**Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de frailejon



Suministro e instalacion de frailejon



Suministro e instalacion de frailejon



Suministro e instalacion de frailejon

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,31**	**Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay



Suministro e instalacion de Amancay

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,32**	**Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Spring



Suministro e instalacion de Spring



Suministro e instalacion de Spring



Suministro e instalacion de Spring

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,33**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion Philodendro corazon



Suministro e instalacion Philodendro corazon



Suministro e instalacion Philodendro corazon



Suministro e instalacion Philodendro corazon

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,34**	**Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum



Suministro e instalacion de Philodendro selloum

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,35**	**Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado



Suministro e instalacion de Pandanus Variegado

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,36**	**Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Verena tallo alto



Suministro e instalacion de Verena tallo alto



Suministro e instalacion de Verena tallo alto



Suministro e instalacion de Verena tallo alto

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,39**	**Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de flor del llano



Suministro e instalacion de flor del llano



Suministro e instalacion de flor del llano



Suministro e instalacion de flor del llano

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,44**	**Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm**	**DESDE :**	**2/1/2026**
			HASTA :	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Ixora Patilla



Suministro e instalacion de Ixora Patilla



Suministro e instalacion de Ixora Patilla



Suministro e instalacion de Ixora Patilla

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**NP 3,2,45**	**Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



Suministro e instalacion de Plantas rastreras



Suministro e instalacion de Plantas rastreras



Suministro e instalacion de Plantas rastreras



Suministro e instalacion de Plantas rastreras

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**			
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**3,3,2**	**Suministro e instalación de piedra bola**	**DESDE:**	**2/1/2026**
			HASTA:	**02/28/2026**



se realizaron tareas de suministro e instalacion de piedra bola en anillos de arboles



se realizaron tareas de suministro e instalacion de piedra bola en anillos de arboles



se realizaron tareas de suministro e instalacion de piedra bola en anillos de arboles



se realizaron tareas de suministro e instalacion de piedra bola en anillos de arboles

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**1.1 Analisis del estado actual**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



areas con ausencia de vegetacion



areas con ausencia de vegetacion



areas con ausencia de vegetacion



areas con desorganizacion de vegetacion.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**1.2 Identificacion de puntos criticos**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



Area debajo de los puentes



Area debajo de los puentes



pozo sin cubierta o tapa



Falta de mantenimiento

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**1.3 Inventario del arbolado existente**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



Localizacion de arboles



marcacion de arboles



marcacion de arboles



medicion de arboles

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2.1 Limpieza general y deshierbe**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



area puente de guadua realizacion de deshierve en las plantas existentes para limpiar las zonas



area puente de guadua realizacion de deshierve en las plantas existentes para limpiar las zonas



area puente de guadua realizacion de deshierve en las plantas existentes para limpiar las zonas



area puente de guadua realizacion de deshierve en las plantas existentes para limpiar las zonas

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2.2 Excavacion y nivelacion**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



Excavacion y nivelacion area puente de guadua



Excavacion y nivelacion area puente de guadua



Excavacion y nivelacion area puente de guadua



Excavacion y nivelacion area puente de guadua

Corponor	**ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA** MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024	UNION TEMPORAL INTER VERDES

12/24/2025 AL 12/31/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

UNION TEMPORAL INTER VERDES

OBJETO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**		
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	**2.4 Retiro de material sobrante**	**DESDE**	**12/24/2024**
		HASTA	**12/31/2025**



Se realizo la recogida del material sobrante generado durante las actividades de limpieza



Acopio de materia sobrante



Acopio de materia sobrante



Se realizó la recogida del material sobrante generado durante las actividades de limpieza

Ver *Anexo No. 3.* *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
1	**DIAGNOSTICO**				$ -			$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -			$ -	
1,1	Analisis del estado actual	Und	1.00	$ 9,398,169.00	$ 9,398,169.00		- .00	$ -	1.00	$ 9,398,169.00	0.30	2,819,451.00		- .00		- .00	0.30	2,819,451.00	**30%**	0.70	6,578,718.00	**70%**
1,2	Identificacion de puntos criticos	Und	1.00	$ 2,184,229.00	$ 2,184,229.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,184,229.00	0.30	655,269.00		- .00		- .00	0.30	655,269.00	**30%**	0.70	1,528,960.00	**70%**
1,3	Inventario del arbolado existente	Und	1.00	$ 2,135,276.00	$ 2,135,276.00		- .00	$ -	1.00	$ 2,135,276.00	0.30	640,583.00		- .00		- .00	0.30	640,583.00	**30%**	0.70	1,494,693.00	**70%**
2	**DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
2,1	Limpieza general y deshierbe	m2	21,289.2	$ 1,352.00	$ 28,783,025.00	(-)	(8,127.53)	$ (10,988,420.00)	13,161.69	$ 17,794,605.00	3,328.21	4,499,740.00	2,895.52	3,914,743.00		- .00	6,223.73	8,414,483.00	**47%**	6,937.96	9,380,122.00	**53%**
2,2	Excavacion y nivelacion	m2	600.00	$ 60,100.00	$ 36,060,000.00		- .00	$ -	600.00	$ 36,060,000.00	332.84	20,003,684.00	98.76	5,935,596.00	154.98	9,314,298.00	586.58	35,253,458.00	**98%**	13.42	806,542.00	**2%**
2,3	Poda y/o erradicacion de arboles de porte alto	Und	50.00	$ 670,200.00	$ 33,510,000.00	(-)	(3.00)	$ (2,010,600.00)	47.00	$ 31,499,400.00	- .00	- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		47.00	31,499,400.00	**100%**
2,4	Retiro de material sobrante	m3	860.24	$ 40,224.00	$ 34,602,350.00	(-)	(211.21)	$ (8,495,767.00)	649.03	$ 26,106,583.00	649.03	26,106,583.00		- .00		- .00	649.03	26,106,583.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 2,5	Conformacion, relleno y Nivelacion con material de excavacion.	m2	8,551.26	$ 11,242.00	$ 96,133,265.00	(+)	3,552.74	$ 39,939,903.00	12,104.00	$ 136,073,168.00		- .00	2,895.52	32,551,436.00	8,127.93	91,374,189.00	11,023.45	123,925,625.00	**91%**	1,080.55	12,147,543.00	**9%**
3	**ESTABLECIMIENTO DE COMPONENTE VERDE**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,1	Mejora del suelo con material de enmienda (mezcla de suelo arena y organico)	m3	554.0	$ 117,873.00	$ 65,305,806.00		0.0	$ 551.00	554.04	$ 65,306,357.00		- .00	98.76	11,641,373.00	284.94	33,586,733.00	383.70	45,227,870.00	**69%**	170.34	20,078,487.00	**31%**
3,2	**siembra de material vegetal**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,2,1	Suministro de material vegetal especie Veranera: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	300.00	$ 33,942.00	$ 10,182,600.00	(+)	116.00	$ 3,937,272.00	416.00	$ 14,119,872.00		- .00	153.00	5,193,126.00	258.00	8,757,036.00	411.00	13,950,162.00	**99%**	5.00	169,710.00	**1%**
3,2,2	Suministro de material vegetal especie Agave: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 30 cm	Und	100.00	$ 41,798.00	$ 4,179,800.00	(+)	188.00	$ 7,858,024.00	288.00	$ 12,037,824.00		- .00	100.00	4,179,800.00	183.00	7,649,034.00	283.00	11,828,834.00	**98%**	5.00	208,990.00	**2%**
3,2,3	Suministro de material vegetal especie Maguey: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 50 y 70 cm	Und	100.00	$ 46,798.00	$ 4,679,800.00	(-)	(100.00)	$ (4,679,800.00)	- .00	$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,2,4	Suministro de material vegetal especie Palma cica: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm; durante el desarrollo del contrato	Und	- .00	$ 66,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,2,5	Suministro de material vegetal especiel Palma manila: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 40 y 60 cm	Und	- .00	$ 86,974.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,2,6	Suministro de material vegetal especie cinta de colores: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,974.00	$ 2,697,400.00	(-)	(50.00)	$ (1,348,700.00)	50.00	$ 1,348,700.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		50.00	1,348,700.00	**100%**
3,2,7	Suministro de material vegetal especie cactus: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 50 cm	Und	100.00	$ 16,090.00	$ 1,609,000.00	(-)	(74.00)	$ (1,190,660.00)	26.00	$ 418,340.00		- .00		- .00	21.00	337,890.00	21.00	337,890.00	**81%**	5.00	80,450.00	**19%**
3,2,8	Suministro de material vegetal especie isora blanca y roja: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 15 y 25 cm	Und	100.00	$ 11,090.00	$ 1,109,000.00	(+)	160.00	$ 1,774,400.00	260.00	$ 2,883,400.00		- .00		- .00	255.00	2,827,950.00	255.00	2,827,950.00	**98%**	5.00	55,450.00	**2%**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	**ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.**							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
3,2,9	Suministro de material vegetal especie duranta: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 6 y 12 cm	Und	100.00	$ 12,737.00	$ 1,273,700.00	(-)	(90)	$ (1,146,330.00)	10.00	$ 127,370.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		10.00	127,370.00	**100%**
3,2,10	Suministro de material vegetal especie lengua de suegra: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 20 y 45 cm	Und	200.00	$ 14,090.00	$ 2,818,000.00	(-)	(150.00)	$ (2,113,500.00)	50.00	$ 704,500.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		50.00	704,500.00	**100%**
3,2,11	Suministro de material vegetal especie Palma rubelina: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 60 cm	Und	- .00	$ 64,778.00	$ -		- .00	$ -	- .00	$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,2,12	Suministro de material vegetal especie Urapo: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	20.00	$ 20,090.00	$ 401,800.00	(-)	(10.00)	$ (200,900.00)	10.00	$ 200,900.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		10.00	200,900.00	**100%**
3,2,13	Suministro de material vegetal especie Guayacán: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 30 y 40 cm	Und	80.00	$ 20,090.00	$ 1,607,200.00	(-)	(60.00)	$ (1,205,400.00)	20.00	$ 401,800.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		20.00	401,800.00	**100%**
3,2,14	Suministro e Instalación de Grama maní forrajero	m2	1,000.00	$ 17,290.00	$ 17,290,000.00	(-)	(1,000.00)	$ (17,290,000.00)	- .00	$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
NP 3,2,15	Suministro de material vegetal especie PALMA MARIPOSA: En bolsa de 30 kg número 60 y 80, Con altura total de 1.50 a 2.50	Und	80.00	$ 426,984.00	$ 34,158,720.00	(-)	(40.00)	$ (17,079,360.00)	40.00	$ 17,079,360.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		40.00	17,079,360.00	**100%**
NP 3,2,16	Suministro de material vegetal especie PALMA COLA DE ZORRO: En bolsa de 30 kg número 40 y 60, Con altura total de 1.50 a 3.00 m	Und	80.00	$ 390,942.00	$ 31,275,360.00	(-)	(70.00)	$ (27,365,940.00)	10.00	$ 3,909,420.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		10.00	3,909,420.00	**100%**
NP 3,2,17	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 40 kg número 90, con una altura Con altura de 2,00 m	Und	14.00	$ 535,942.00	$ 7,503,188.00		- .00	$ -	14.00	$ 7,503,188.00		- .00	14.00	7,503,188.00		- .00	14.00	7,503,188.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 3,2,18	Suministro de material vegetal especie PALMA BISMARCKIA: En bolsa de 60 kg número 50 Y 70, con una altura total entre 1.00 y 1.50 m	Und	50.00	$ 410,942.00	$ 20,547,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 20,547,100.00		- .00		- .00	5.00	2,054,710.00	5.00	2,054,710.00	**10%**	45.00	18,492,390.00	**90%**
NP 3,2,19	Suministro de material vegetal especie PALMA AREKA: En bolsa de 30 kg número 70, con una altura total entre 2.00 a 2.50 m	Und	35.00	$ 387,609.00	$ 13,566,315.00	(-)	(25.00)	$ (9,690,225.00)	10.00	$ 3,876,090.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		10.00	3,876,090.00	**100%**
NP 3,2,20	Suministro de material vegetal especie PALMA REAL: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre de 2.00 a 3.00 m	Und	36.00	$ 537,609.00	$ 19,353,924.00		- .00	$ -	36.00	$ 19,353,924.00		- .00	36.00	19,353,924.00		- .00	36.00	19,353,924.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 3,2,21	Suministro de material vegetal especie PALMA BOTELLA: En bolsa de 30 kg número 80, con una altura total entre 2.00 a 3.00 m	Und	9.00	$ 537,609.00	$ 4,838,481.00		- .00	$ -	9.00	$ 4,838,481.00		- .00	9.00	4,838,481.00		- .00	9.00	4,838,481.00	**100%**	- .00	- .00	

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,22	Suministro de material vegetal especie PALMA CICA: En bolsa de 30 kg número 50 a 60, con una altura total de 0,80 a 1,00 m	Und	80.00	$ 387,609.00	$ 31,008,720.00	(-)	(60.00)	$ (23,256,540.00)	20.00	$ 7,752,180.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		20.00	7,752,180.00	**100%**
NP 3,2,23	Suministro de material vegetal especie PALMA MANILA: En bolsa de 30 kg número 60 a 80, con una altura total 2.00 a 2.50 m	Und	80.00	$ 422,609.00	$ 33,808,720.00	(+)	43.00	$ 18,172,187.00	123.00	$ 51,980,907.00		- .00	10.00	4,226,090.00	108.00	45,641,772.00	118.00	49,867,862.00	**96%**	5.00	2,113,045.00	**4%**
NP 3,2,24	Suministro de material vegetal especie PALMA ROUBELINA: En bolsa de 30 kg número 50 A 70, con una altura Total entre 1.00 a 1.50 m	Und	80.00	$ 389,275.00	$ 31,142,000.00		- .00	$ -	80.00	$ 31,142,000.00		- .00	80.00	31,142,000.00		- .00	80.00	31,142,000.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 3,2,25	Suministro de material vegetal especie CORDYLINE En bolsa de 3 kg número 35 y 40, de largo entre 0.70 a 1.00 m	Und	300.00	$ 61,825.00	$ 18,547,500.00	(+)	416.00	$ 25,719,200.00	716.00	$ 44,266,700.00		- .00	221.00	13,663,325.00	445.00	27,512,125.00	666.00	41,175,450.00	**93%**	50.00	3,091,250.00	**7%**
NP 3,2,26	Suministro de material vegetal especie GINGER AMARILLA En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	150.00	$ 61,942.00	$ 9,291,300.00	(-)	(50.00)	$ (3,097,100.00)	100.00	$ 6,194,200.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		100.00	6,194,200.00	**100%**
NP 3,2,27	Suministro de material vegetal especie CANCION DE LA INDIA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	200.00	$ 62,442.00	$ 12,488,400.00	(-)	(50.00)	$ (3,122,100.00)	150.00	$ 9,366,300.00		- .00	55.00	3,434,310.00	10.00	624,420.00	65.00	4,058,730.00	**43%**	85.00	5,307,570.00	**57%**
NP 3,2,28	Suministro de material vegetal especie CHEFLERA VARIAGADA: En bolsa de 8 kg número 40 Y 60, de largo entre 20 y 40 cm	Und	180.00	$ 60,109.00	$ 10,819,620.00		- .00	$ -	180.00	$ 10,819,620.00		- .00	100.00	6,010,900.00		- .00	100.00	6,010,900.00	**56%**	80.00	4,808,720.00	**44%**
NP 3,2,29	Suministro de material vegetal especie MARGITANA: En bolsa de 6 kg número 40, de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 60,109.00	$ 6,010,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 6,010,900.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		100.00	6,010,900.00	**100%**
NP 3,2,30	Suministro de material vegetal especie FRAILEJON: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 30 cm	Und	1,000.00	$ 26,442.00	$ 26,442,000.00	(-)	(500.00)	$ (13,221,000.00)	500.00	$ 13,221,000.00		- .00		- .00	470.00	12,427,740.00	470.00	12,427,740.00	**94%**	30.00	793,260.00	**6%**
NP 3,2,31	Suministro de material vegetal especie AMANCAY: En bolsa de 4 kg número 35 Y 40, de largo entre 30 y 50 cm	Und	400.00	$ 54,109.00	$ 21,643,600.00		- .00	$ -	400.00	$ 21,643,600.00		- .00	85.00	4,599,265.00	125.00	6,763,625.00	210.00	11,362,890.00	**53%**	190.00	10,280,710.00	**48%**
NP 3,2,32	Suministro de material vegetal especie SPRING: En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 20 cm	Und	250.00	$ 26,775.00	$ 6,693,750.00		- .00	$ -	250.00	$ 6,693,750.00		- .00		- .00	245.00	6,559,875.00	245.00	6,559,875.00	**98%**	5.00	133,875.00	**2%**
NP 3,2,33	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO CORAZON: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 80 a 100 cm	Und	250.00	$ 54,109.00	$ 13,527,250.00	(+)	63.00	$ 3,408,867.00	313.00	$ 16,936,117.00		- .00		- .00	308.00	16,665,572.00	308.00	16,665,572.00	**98%**	5.00	270,545.00	**2%**
NP 3,2,34	Suministro de material vegetal especie PHILODENDRO SELLOUM: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	500.00	$ 54,109.00	$ 27,054,500.00	(+)	349.00	$ 18,884,041.00	849.00	$ 45,938,541.00		- .00	259.00	14,014,231.00	585.00	31,653,765.00	844.00	45,667,996.00	**99%**	5.00	270,545.00	**1%**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,35	Suministro de material vegetal especie PANDANUS VARIEGADO: En bolsa de 10 kg número 40 Y 60 , de largo entre 70 a 80 cm	Und	235.00	$ 54,109.00	$ 12,715,615.00	(+)	218.00	$ 11,795,762.00	453.00	$ 24,511,377.00		- .00	32.00	1,731,488.00	416.00	22,509,344.00	448.00	24,240,832.00	**99%**	5.00	270,545.00	**1%**
NP 3,2,36	Suministro de material vegetal especie VERANERA TALLO ALTO: En bolsa de 10 kg número 60 Y 80 , de largo entre 30 a 70 cm	Und	60.00	$ 57,442.00	$ 3,446,520.00		- .00	$ -	60.00	$ 3,446,520.00		- .00	38.00	2,182,796.00	7.00	402,094.00	45.00	2,584,890.00	**75%**	15.00	861,630.00	**25%**
NP 3,2,37	Suministro de material vegetal especie CINTA LIRIOPE: En bolsa de 4 kg número 26 Y 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	500.00	$ 26,609.00	$ 13,304,500.00		- .00	$ -	500.00	$ 13,304,500.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		500.00	13,304,500.00	**100%**
NP 3,2,38	Suministro de material vegetal especie LILIÁCEA: En bolsa de 6 kg número 35 Y 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	22.00	$ 27,942.00	$ 614,724.00		- .00	$ -	22.00	$ 614,724.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		22.00	614,724.00	**100%**
NP 3,2,39	Suministro de material vegetal especie FLOR DEL LLANO: En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	1,000.00	$ 26,109.00	$ 26,109,000.00	(+)	550.00	$ 14,359,950.00	1,550.00	$ 40,468,950.00		- .00	50.00	1,305,450.00	819.00	21,383,271.00	869.00	22,688,721.00	**56%**	681.00	17,780,229.00	**44%**
NP 3,2,40	Suministro de material vegetal especie LANTANA : En bolsa de 3 kg número 26 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	100.00	$ 26,109.00	$ 2,610,900.00		- .00	$ -	100.00	$ 2,610,900.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		100.00	2,610,900.00	**100%**
NP 3,2,41	Suministro de material vegetal especie PANAMEÑAS: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	20.00	$ 55,275.00	$ 1,105,500.00		- .00	$ -	20.00	$ 1,105,500.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		20.00	1,105,500.00	**100%**
NP 3,2,42	Suministro de material vegetal especie ARBOL CARBONERO: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00	(-)	(32.00)	$ (4,158,144.00)	5.00	$ 649,710.00		- .00	5.00	649,710.00		- .00	5.00	649,710.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 3,2,43	Suministro de material vegetal especie ARBOL OITI: En bolsa de 10 kg número 60 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	37.00	$ 129,942.00	$ 4,807,854.00		(12.00)	$ (1,559,304.00)	25.00	$ 3,248,550.00		- .00	19.00	2,468,898.00		- .00	19.00	2,468,898.00	**76%**	6.00	779,652.00	**24%**
NP 3,2,44	Suministro de material vegetal especie IXORA PATILLA: En bolsa de 8 kg número 40 , de largo entre 30 y 70 cm	Und	50.00	$ 54,942.00	$ 2,747,100.00		- .00	$ -	50.00	$ 2,747,100.00		- .00		- .00	11.00	604,362.00	11.00	604,362.00	**22%**	39.00	2,142,738.00	**78%**
NP 3,2,45	Suministro de material vegetal especie PLANTAS RASTRERAS: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	900.00	$ 17,650.00	$ 15,885,000.00	(+)	813.00	$ 14,349,450.00	1,713.00	$ 30,234,450.00		- .00	60.00	1,059,000.00	1,643.00	28,998,950.00	1,703.00	30,057,950.00	**99%**	10.00	176,500.00	**1%**
NP 3,2,46	Suministro de material vegetal especie TU Y YO : En bolsa de 3 kg número 26, de largo entre 10 y 20 cm	Und	250.00	$ 17,650.00	$ 4,412,500.00	(-)	(230.00)	$ (4,059,500.00)	20.00	$ 353,000.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		20.00	353,000.00	**100%**
NP 3,2,47	Suministro de material vegetal especie Philodendron Lemon: En bolsa de 1 kg número 14, de largo entre 10 y 20 cm	Und	- .00	$ 29,941.00	$ -	(+)	99.00	$ 2,964,159.00	99.00	$ 2,964,159.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		99.00	2,964,159.00	**100%**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
NP 3,2,48	Suministro de material vegetal especie Limon de Cerca: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 9,339.00	$ -	(+)	600.00	$ 5,603,400.00	600.00	$ 5,603,400.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		600.00	5,603,400.00	**100%**
NP 3,2,49	Suministro de material vegetal especie Pennisetum: En bolsa de 1 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 21,943.00	$ -	(+)	200.00	$ 4,388,600.00	200.00	$ 4,388,600.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		200.00	4,388,600.00	**100%**
NP 3,2,50	Suministro de material vegetal especie Russelia equisetiformis: En bolsa de 3 kg número 26 y 35, con una altura entre 8 y 15 cm	Und	- .00	$ 33,945.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,394,500.00	100.00	$ 3,394,500.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		100.00	3,394,500.00	**100%**
NP 3,2,51	Suministro de material vegetal especie: Heliconia psittacorum 'Choconiana' En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 41,607.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,744,630.00	90.00	$ 3,744,630.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		90.00	3,744,630.00	**100%**
NP 3,2,52	Suministro de material vegetal especie Pluma de indio: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 36,939.00	$ -	(+)	90.00	$ 3,324,510.00	90.00	$ 3,324,510.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		90.00	3,324,510.00	**100%**
NP 3,2,53	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa pequeña: En bolsa de 1 kg número 9 de largo entre 10 y 30 cm	Und	- .00	$ 30,182.00	$ -	(+)	100.00	$ 3,018,200.00	100.00	$ 3,018,200.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		100.00	3,018,200.00	**100%**
NP 3,2,54	Suministro de material vegetal especie Croto fideo: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 34,941.00	$ -	(+)	50.00	$ 1,747,050.00	50.00	$ 1,747,050.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		50.00	1,747,050.00	**100%**
NP 3,2,55	Suministro de material vegetal especie Monstera deliciosa grande: En bolsa de 3 kg número 35 , de largo entre 20 y 40 cm	Und	- .00	$ 59,512.00	$ -	(+)	7.00	$ 416,584.00	7.00	$ 416,584.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		7.00	416,584.00	**100%**
3,3	**Instalación de elementos decorativos y duros**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
3,3,1	Suministro e instalación de material triturado	m3	285.92	$ 112,873.00	$ 32,272,271.00	(-)	(272.00)	$ (30,701,079.00)	13.92	$ 1,571,192.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		13.92	1,571,192.00	**100%**
3,3,2	Suministro e instalación de piedra bola	m3	100.00	$ 128,873.00	$ 12,887,300.00	(-)	(40.00)	$ (5,154,920.00)	60.00	$ 7,732,380.00		- .00		- .00	45.75	5,895,940.00	45.75	5,895,940.00	**76%**	14.25	1,836,440.00	**24%**
3,3,3	Instalación de nombres en material vegetal	Und	2.00	$ 2,090,200.00	$ 4,180,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 4,180,400.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		2.00	4,180,400.00	**100%**
3,3,4	Instalación de vallas informativas	Und	2.00	$ 2,538,200.00	$ 5,076,400.00		- .00	$ -	2.00	$ 5,076,400.00		- .00	2.00	5,076,400.00		- .00	2.00	5,076,400.00	**100%**	- .00	- .00	
NP 3,3,5	Construccion de dos corazones en material vegetal	Und	- .00	$ 4,338,725.00	$ -	(+)	1.00	$ 4,338,725.00	1.00	$ 4,338,725.00		- .00		- .00		- .00		- .00		1.00	4,338,725.00	**100%**
4	**MANTENIMIENTO (6 MESES)**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
4,1	Riego programado	m3	672.00	$ 77,500.00	$ 52,080,000.00		- .00	$ -	672.00	$ 52,080,000.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		672.00	52,080,000.00	**100%**
4,2	Limpieza continua de maleza	m2	47,600.0	$ 1,352.00	$ 64,355,200.00		- .00	$ -	47,600.00	$ 64,355,200.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		47,600.00	64,355,200.00	**100%**
4,3	Nutrición y control fitosanitario	m2	15,400.0	$ 5,642.00	$ 86,886,800.00		- .00	$ -	15,400.00	$ 86,886,800.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		15,400.00	86,886,800.00	**100%**
4,4	Poda y jardinería	m2	11,000.0	$ 2,945.00	$ 32,395,000.00		- .00	$ -	11,000.00	$ 32,395,000.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		11,000.00	32,395,000.00	**100%**
4,5	Retiro de residuos de mantenimiento	m3	1,075.12	$ 40,142.00	$ 43,157,326.00		(0.12)	$ (4,676.00)	1,075.00	$ 43,152,650.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		1,075.00	43,152,650.00	**100%**
5	**EDUCACIÓN AMBIENTAL**				$ -		- .00	$ -		$ -		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		- .00	- .00	
5,1	Campaña de cultura ciudadana	Per	2,500.00	$ 11,094.00	$ 27,735,000.00		- .00	$ -	2,500.00	$ 27,735,000.00		- .00		- .00		- .00	- .00	- .00		2,500.00	27,735,000.00	**100%**

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
Ajuste compensatorio																$ (356.00)						
	COSTO DIRECTO				**$ 1,189,274,532.00**			**$ -**		**$1,189,274,532.00**		**$ 54,725,310.00**		**$ 186,675,530.00**		**$ 383,544,339.00**		**$ 624,945,179.00**			**$ 564,329,353.00**	
	ADMINISTRACIÓN			22%	$ 261,640,397.00			0		$ 261,640,397.00		$ 12,039,568.20		41068616.6		84379754.58		$ 137,487,939.38			$ 124,152,457.66	
	IMPREVISTOS			2%	$ 23,785,491.00			0		$ 23,785,491.00		$ 1,094,506.20		3733510.6		7670886.78		$ 12,498,903.58			$ 11,286,587.06	
	UTILIDADES			6%	$ 71,356,472.00			0		$ 71,356,472.00		$ 3,283,518.60		11200531.8		23012660.34		$ 37,496,710.74			$ 33,859,761.18	
	IVA sobre utilidad			19%	$ 13,557,730.00			0		$ 13,557,730.00		$ 623,868.53		2128101.042		4372405.465		$ 7,124,375.04			$ 6,433,354.62	
	COSTO INDIRECTO				**$ 370,340,090.00**			**$ -**		**$ 370,340,090.00**		**$ 17,041,462.00**		**$ 58,130,760.00**		**$ 119,435,707.00**		**$ 194,607,929.00**			**$ 175,732,161.00**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 1,559,614,622.00**			**$ -**		**$1,559,614,622.00**		**$ 71,766,772.00**		**$ 244,806,290.00**		**$ 502,980,046.00**		**$ 819,553,108.00**			**$ 740,061,514.00**	
	PORCENTAJE DE AVANCE OBRA											**4.60%**		**15.70%**		**32.25%**		**52.55%**			**47.45%**	

	INTERVENTORIA				**$ 91,760,043.00**					**$ 91,760,043.00**		**$ 4,124,800.00**		**$ 18,266,973.00**		**$ 16,499,201.00**		**$ 38,890,974.00**			**$ 52,869,069.00**	
	IVA Interventoria			19%	$ 17,434,408.17			$ -		$ 17,434,408.17		$ 783,712.00		$ 3,470,724.87		$ 3,134,848.19		$ 7,389,285.06			$ 10,045,123.11	
	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO				**$ 109,194,451.00**			**$ -**		**$ 109,194,451.00**		**$ 4,908,512.00**		**$ 21,737,698.00**		**$ 19,634,049.00**		**$ 46,280,259.00**			**$ 62,914,192.00**	
	PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA											**4.50%**		**19.91%**		**17.98%**		**42.38%**			**57.62%**	

TOTAL PROYECTO :	$ 1,668,809,073.00	$ -	$ 1,668,809,073.00	$ 76,675,284.00	$ 266,543,988.00	$ 522,614,095.00	$ 865,833,367.00	$ 802,975,706.00
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :				4.59%	15.97%	$ 0.31	51.88%	48.12%

OBSERVACIONES:

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 2.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$120 Pesos M/CTE.

Se realiza un ajuste compensatorio en la presente acta parcial N°3 debido a una discrepancia en el cálculo de cantidades del Acta Parcial N°2, detallada de la siguiente manera: Item 3.1; Cantidad Real Ejecutada: 98.76 ; Cantidad Pagada (Error de Redondeo):98.762;Diferencia en Cantidad: +0.002 ;Valor del Excedente Pagado:$236 Pesos M/CTE.

Darlin Yeritza Martinez Martinez	**Nelson David Acevedo Torres**	**Diego Eduardo Cuadros Aguirre**	**Freddy Alexili Villan Valencia**
RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Valor inicial del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**
Valor Adicional del contrato	**$**	**-**
Valor Total del contrato	**$**	**1,559,614,622.00**

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
1	$ 71,766,772.00	$71,766,772.00	$ 1,487,847,850.00	4.60%	4.60%	12/24/2025	12/31/2025			
2	$ 244,806,290.00	$ 316,573,062.00	$ 1,243,041,560.00	15.70%	20.30%	01/01/2026	01/31/2026			
3	$ 502,980,046.00	$ 819,553,108.00	$ 740,061,514.00	32.25%	52.55%	02/01/2026	02/28/2026			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA

ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, versión 5, 08/07/2024

CONTRATO DE OBRA No.LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA765-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025				PERIODO REPORTADO	
PROYECTO:	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL AREA METROPLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCION Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.							**DESDE:**	02/01/2026
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025	**SUPERVISOR:**	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR	**INTERVENTOR:**	UNION TEMPORAL INTER VERDES	**INFORME No.**	3	**HASTA:**	02/28/2026

ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1 01/19/2026						MODIFICACIÓN O ADICIÓN 17 febrero 2026			TOTAL CONTRATADO		ACTA PARCIAL No. 1 12/24/2025 - 12/31/2025		ACTA PARCIAL No. 2 01/01/2026 - 01/31/2026		ACTA PARCIAL No. 3 02/01/2026 - 02/28/2026		ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS		% PAGADO	POR COBRAR		% POR COBRAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO ($)	VALOR ($)	+/-	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)		CANT	VALOR ($)	
Valor inicial del contrato		**$**			**109,194,451.00**																	
Valor Adicional del contrato		**$**			**-**																	
Valor Total del contrato		**$**			**109,194,451.00**																	

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta	Comprobante de egreso	Observaciones
						Desde	Hasta			
1	$ 4,908,512.00	$ 4,908,512.00	$ 104,285,939.00	4.50%	4.50%	12/24/2025	12/31/2025			
2	$ 21,737,698.00	$ 26,646,210.00	$ 82,548,241.00	19.91%	24.40%	01/01/2026	01/31/2026			
3	$ 19,634,049.00	$ 46,280,259.00	$ 62,914,192.00	17.98%	42.38%	02/01/2026	02/28/2026			

Darlin Yeritza Martinez Martinez
RESIDENTE DE OBRA

Nelson David Acevedo Torres
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Diego Eduardo Cuadros Aguirre
DIRECTOR DE OBRA

Freddy Alexili Villan Valencia
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8. Formato del acta MPA-01-F-25 LISTA VERIFICACION HSE v3

LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25, versión 4, 08/07/2024

Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.

CONTRATO N° Y FECHA	CONTRATO DE OBRA No. LIC731-2025 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ESTABLECIMIENTO, CONSERVACION Y RECUPERACION CORREDORES VERDES, REDOMAS Y SEPARADOR VIAL DE LA AVENIDA LIBERTADORES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JOSE DE CUCUTA, PRIMERA ETAPA, PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AL PAISAJE URBANO.
CONTRATISTA	EDISON RAMIRO CASTRO HERNANDEZ UNION TEMPORAL CORREDORES VERDES 2025
INTERVENTOR	NELSON DAVID ACEVEDO TORRES UNION TEMPORAL INTER VERDES
SUPERVISOR	LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ JEFE DE OFICINA GESTION DE PROYECTOS DE CORPONOR

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	Variable de control	Criterio de aceptabilidad	Frecuencia de control	Responsable del control	Registro	VERIFICACIÓN				OBSERVACIONES
						Fecha de inspección:	Registro de verificación			
							C	N/C	N/A	
1	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**									
1.1	Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN y PARAFISCALES) y pagos correspondientes.	* Todo el personal de la obra debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. * El empleador realizará oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social. (Nota: Los primeros 5 días de cada mes)	Antes y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Planilla de pagos mensuales de la seguridad social.	**28-feb-25**	**X**			Afiliado a la ARL, EPS, AFP y CCF todo el personal y pago de planillas sin moras
1.2	Inducción a los trabajadores sobre la exposición a los peligros.	Conocimiento del PLAN DE CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Al ingreso del personal	Residente de Obra e interventoría	Acta de induccion	**28-feb-25**	**X**			Personal de la obra con inducción general en Seguridad y salud en el trabajo, se les capacita en la identifiacion de peligros y riesgos asociados a su labor
1.3	Entrega de EPP y capacitación del uso de los mismos.	* Todo el personal de la obra debe estar dotado de EPP que correspondan a la actividad que realizan y capacitarlo en el uso adecuado de los mismos.	Al ingreso y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Planilla de entrega de EPP / Capacitación del uso de los EPP.	**28-feb-25**	**X**			Entrega de EPP y socialización en la inducción de la importancia y el uso adecuado de los mismos.
1.4	Exámenes de ingreso y retiro	Todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Examen de ingreso y al retirarse se le realizará Examen de retiro.	Al ingreso y al retiro de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Exámenes de ingreso y Exámenes de retiro.	**28-feb-25**	**X**			Todo el personal de ingreso cuenta con el examen medico ocupacional, se presentan dos retiros y se soporta con orden de examen medico de retiro.
1.5	Reporte e investigación de Accidente de trabajo	inmediatamente suceda al jefe inmediato. Investigar la causa real y las condiciones en que se dio. Nota: La ARL solo reconoce los accidentes que	Al momento de ocurrir un Accidente de trabajo ó Incidente de trabajo.	Residente de Obra e interventoría	Reporte ante la ARL del Accidente de trabajo y Registro de la investigación del accidente sea a la ARL ó propio de la empresa	**28-feb-25**	**X**			A la fecha no ha ocurrido ningun accidente
1.6	Reporte e investigación de Incidente de trabajo					**28-feb-25**	**X**			A la fecha no ha ocurrido ningun accidente
1.7	Demarcación y señalización de áreas de trabajo	Informar a las personas en general y en especial a los usuarios de las áreas existentes. Una adecuada señalización permitirá disminuir el riesgo de accidentes,	Al inicio y durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de la obra y Registro fotográfico.	**28-feb-25**	**X**			Se les socializa al personal la importancia del uso de las colombinas, conos y señalización en la obra.
2	**PLAN DE EMERGENCIA**									
2.1	Capacitación plan de emergencia en caso de evacuación.	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de evacuación.	En la inducción al personal	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación	**28-feb-25**	X			En la inducción se socializa como actuar en caso de emrgencia y se programa capacitación de la misma
2.2	Ocurrencia de un evento	Diligenciar informe de reporte.	Cuando ocurra el evento.	Residente de Obra	Informe con VoBo de interventoría	**28-feb-25**	**X**			A la fecha no ha ocurrido ningun evento
3	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**POLITRAUMATISMO, GOLPES, CONTUSIONES, CAÍDA DE OBJETOS, ACCIDENTES .**								
3.1	Uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad.	* Todo el personal de la obra debe portar adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad que realicen. * Realizar capacitación al personal en el uso de los EPP.	Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad.	Residente de Obra e interventoría	Planilla entrega de dotación de los EPP por trabajador y Registro de capacitación del uso de los EPP.	**28-feb-25**	X			Se hace entrega de los EPP corresponidentes a la labor y se socializa en la inducción el uso adecuado de los EPP
3.2	Autocuidado	Capacitación en higiene postural y manejo de cargas	Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad.	Residente de Obra e interventoría	Registro de capacitación y registro fotográfico.	**28-feb-25**	X			Se socializa en la inducción la de prevención de riesgo biomecánico orientada a al manejo de cargas e higiene postural.
4	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN DURANTE OPERACIONES (POLVO POR SOLDADURAS, CORTE DE LADRILLO , CORTE CERÁMICA , DEMOLICIÓN, PARTICULAS DE CEMENTO).**								

4.1	Uso obligatorio del tapabocas, y protección visual.	Todo el personal que realice actividades donde se genere dispersión de partículas, debe usar debidamente el tapabocas y la protección visual.	Permanente	Residente de Obra e interventoría	Registro de capacitación del uso de los EPP y Registro fotográfico.	**28-feb-25**	**X**			Se hace entrega de gafas y tapabocas
4.2	Riego de agua sobre superficies polvorientas.	Las superficies con exceso de polvo se le debe hacer riego de agua.	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Registro fotográfico.				X	
5	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE ACCIDENTE POR ALMACENAMIENTO INADECUADO Y POR FALTA DE ORDEN Y ASEO.**								
5.1	Almacenamiento inadecuado de materiales en la obra	Disponer adecuadamente los materiales en obra.	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al almacenista sobre el almacenamiento de materiales / Registro fotográfico.	**28-feb-25**	**X**			Se realiza almacenamiento y disposición final de los materiales en obra
5.2	Orden y aseo en la obra	Mantener limpio y ordenada la obra.	Periódicamente	Residente de Obra e interventoría	Anotación en la bitácora / Registro fotográfico.	**28-feb-25**	**X**			Socialización del orden y aseo en la obra, se entrega y hace uso de señalizacion de orden y aseo
6	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS INADECUADAS Y MANEJO DE CARGAS.**								
6.1	Manejo de buenas posturas y manejo de cargas	* Aplicar la información dada en la capacitaciones referentes al manejo adecuado de cargas y las buenas posturas. * Nota: La carga máxima será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, será de 12,5 kilogramos de carga compacta (Resolución 2400 del 22/05 1979 Articulo 392).	Durante la ejecución de la obra.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de obra en el Manejo adecuado de cargas y posturas.	**28-feb-25**	**X**			Se socializa en la inducción la prevención de riesgo biomecánico orientada a al manejo de cargas e higiene postural.
7	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**RIESGO DE TRABAJO EN ALTURA.**								
7.1	Trabajo Seguro en Alturas	* Desarrollar un procedimiento seguro para las actividades en altura, teniendo en cuenta los peligros y el análisis de tareas críticas, con el fin de asegurar la integridad física del personal involucrado en este proceso y otras condiciones que puedan verse afectadas (ambientales, bienes y particulares). * Aplicable para todas las actividades que involucren trabajos en alturas, entendiéndose como toda labor o desplazamiento ejecutado a 1,5 m o más sobre un nivel inferior.	Durante la ejecución de la Actividad.	Residente de Obra e interventoría	Capacitación al personal de obra en el Trabajo en alturas, registro fotográfico				**X**	
7.2	Capacitación y entrenamiento requerido para trabajos en alturas	Todo Trabajador o Supervisor que está expuesto recibirá inducción y debe evidenciar la certificación respectiva de acuerdo a: Operativo nivel avanzado: actividades de alto riesgo . Operativo nivel medio: labores en alturas asegurado con sistemas de tránsito vertical que no implique desplazamientos horizontales en alturas Operativo nivel básico: trabaje en plataformas de acceso a los sitios de baja alturas protegidas por barandas. Adicionalmente se le darán capacitaciones sobre elementos de protección personal para trabajo en alturas	Antes, durante la actividad	Residente de Obra e interventoría	Certificados del personal de obra y Supervisores que se involucren en trabajos en alturas, Asistencia de charlas de trabajo seguro / Registro Fotográfico				**X**	
8	**PELIGRO A CONTROLAR:**	**MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON GRADO DE PELIGROSIDAD**								
8.1	Manejo adecuado de sustancias químicas	* Obligatoriedad en uso de los elementos de protección personal requerido * Adecuado rotulado de elementos químicos y almacenamiento de acuerdo a su peligrosidad. * Las fichas de seguridad de las sustancias deben estar publicadas en sitios visibles. * La disposición final de las sustancias peligrosas debe efectuarse de acuerdo lo dispuesto por la Entidad competente. Nota: cuando aplica	Antes, durante y al finalizar el uso de los productos.	Residente de Obra e interventoría o personal calificado	Fichas de seguridad, Registro fotográfico.				**X**	
	MANEJO AMBIENTAL									
9	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN AL RUIDO**								

9.1	Criterios de valoración del ruido	Según la legislación colombiana los valores limites permitidos para el ruido dependerán del tiempo de exposición para ruido continuo y del número de impulsos, para ruidos de impacto. Este valor ha sido especificado por el gobierno colombiano, a través de las resoluciones 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud y la 1792 de 1990 expedida por los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social.	Cuando Aplique	Residente de obra/ Interventoría	Reporte de Decibeles				**X**	
9.2	Normatividad relacionada con los riesgos derivados dela exposición al ruido	*Proteger a los trabajadores contra los riesgos de ruidos. *Reducir al nivel mas bajo, técnica y razonablemente posible. *Evaluar la exposición de los trabajadores * Realizar control medico auditivo (Audiometría). *Proporcionar equipos de protección (tapones auditivos, tapa oídos). *Acondicionar acústicamente los centros de trabajo. *Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea superior a 90 dB (A) o el nivel pico supere a los 140 dB y señalizar dichos lugares.	*Señalización *Formato de entrega de Elementos de Protección Personal. *Registro de Exámenes médicos	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico y Documentos				**X**	
10	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.**								
10.1	Disposición adecuada de las aguas que se generen	Aguas Residuales en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el alcantarillado Municipal. Aguas Residuales en Zona Rural: Si no se cuenta con alcantarillado, enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua.	Semanalmente durante la ejecución de la obra.	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				**X**	
10.2	Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta, maquinaria y equipo	Enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua, y el sedimento será tratado como escombro.	Cuando aplique	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico.				**X**	
11	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS COMUNES, RESIDUOS DE COMIDA, EMPAQUES.**								
11.1	Separación de residuos	Realizar separación de residuos generados y disponerlos adecuadamente dentro de recipientes debidamente marcados, identificando el tipo de residuo almacenado en cada uno de ellos.	Permanente	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
11.2	Almacenamiento de residuos	Almacenar temporalmente los residuos generados en un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas y con condiciones adecuadas de ventilación	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
11.3	Disposición final	En zona rural, transportarlo a la zona urbana; para su posterior entrega a la empresa de recolección de basuras.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
12	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS.**								
12.1	Separación de residuos especiales y/o peligrosos	Realizar separación de residuos especiales y/o peligrosos y disponerlos adecuadamente en un lugar de la obra identificado y delimitado.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico / Hojas de seguridad.				**X**	
12.2	Almacenamiento de residuos especiales y/o peligrosos	Almacenar temporalmente los residuos generados dentro de un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Registro fotográfico				**X**	
12.3	Disposición final	Entrega a la empresa avalada para la recepción de estos residuos.	Cada que se generen	Residente de obra/ Interventoría	Certificado de entrega de residuos expedido por la entidad encargada.				**X**	
13	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA O ESCOMBROS.**								

13.1	Disposición final de residuos y escombros	Cargue: Al momento del cargue del material se debe señalizar el sitio de cargue donde esta el material y la volqueta. Transporte: Al momento de transportarse el material al sitio de la disposición final, la volqueta se cubrirá completamente con una carpa asegurada a la volqueta, para impedir la dispersión del material. Disposición final: Al momento del descargue el material se dispondrá adecuadamente, y si se requiere se apisonará y compactará. Si el material se deposita en un botadero, este debe estar autorizado por la entidad competente del Municipio.	Cada que se deposite material en la escombrera	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro fotográfico y Comprobante de la escombrera, cuando aplique.	**28-feb-25**	**X**			
14	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGREGADOS PÉTREOS**								
14.1	Material utilizado	Utilizar material sólo de sitios autorizados.	Antes de iniciar la extracción del material.	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Licencia ambiental y/o titulo minero de donde se extraen los materiales (Cuando aplique, dependiendo del impacto)				**X**	
15	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**USO DE AGUA**								
15.1	Uso adecuado del agua	Hacer sensibilización del uso adecuado del agua.	En la inducción al personal y durante la ejecución de la obra	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación y Registro fotográfico.	**28/02/2025**	**X**			
16	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS**								
16.1	Capacitación plan de emergencia en caso de derrame sustancia química.	Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de derrame sustancia química.	Cuando aplica (En las inducciones de personal)	Ingeniero Residente de obra, y de interventoría	Registro de capacitación				**X**	
17	**ASPECTO A CONTROLAR:**	**GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE MOTORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO**								
17.1	Mantenimiento de maquinaria y equipo	Que los equipos trabajen de manera aceptable y cuente con los registros de mantenimiento periódicos según su uso	Cada que se requiera	Residente de obra/ Interventoría	Anotación en la bitácora	**28-feb-25**	**X**			
