REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MES DE FEBRERO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 435 DE 2025 **ARQUITECTURA URBANA LTDA** **CONTRATO DE OBRA No. 419 DE 2025** **ZION CONSTRUCCIONES SAS**	**FECHA: DOS (02) DE MARZO DE 2026**

MATERIALES UTILIZADOS



FOTO No 1: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de las puertas en perfilería tubular en aluminio anodizado tipo pesado - vidrio templado 5 mm para la actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE, para la bodega y oficina de infraestructura, tercer piso del edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL) ,

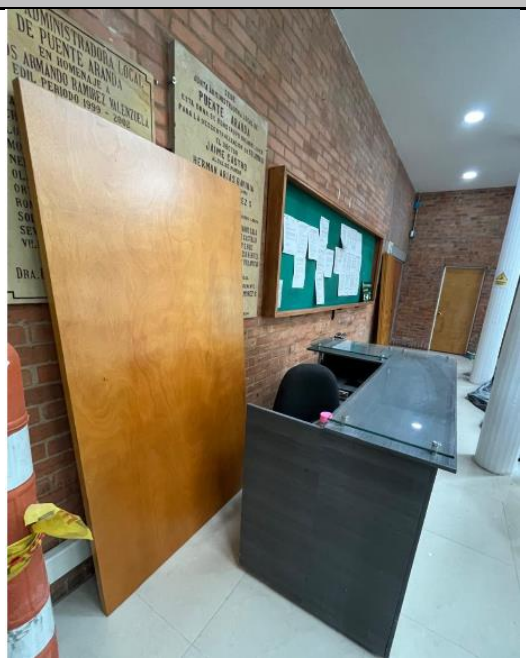


FOTO No 2: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de las puertas en MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO para la actividad SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA, del edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL) y baños del edificio de la ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA,



FOTO No 3: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada la tubería sanitaria de 2" y tubería hidráulica de ½", para las instalaciones del lavamanos quirúrgico, del AREA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No 4: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada del lavamanos quirúrgico para instalar en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA),



FOTO No 5: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de canaleta metálica para instalaciones eléctricas y marco metálico para luminaria de 60cmx60cm, materiales para el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No 6: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de materiales para muros en superboard (Masilla) para el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) y edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL)..



FOTO No 7: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de materiales para muros en superboard (laminas superboard) para el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA) y edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL)..



FOTO No 8. La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA., revisa y verifica la llegada de LUMINARIAS LED CUADRADO 60x60X4 POTENCIA 40w Luz Blanca 100-277v, y TUBERIA PVC ELECTRICA Y EMT, la cuales serán usados en el edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL) y edificio de ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA..

ACTIVIDADES EJECUTADAS



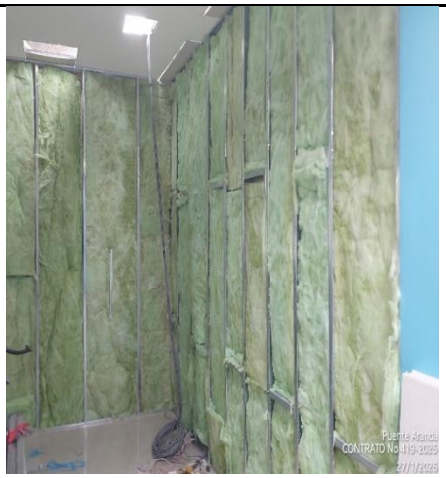


FOTO No 9 y FOTO No 10: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la instalación de MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10 CM, incluyendo estructura, accesorios y pintura; así como el refuerzo en madera pino 4x8 cms y la instalación de aislante térmico tipo Frescasa espesor 2-1/2", garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).



FOTO No 11: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DRYWALL, incluyendo tornillería, masilla y andamios; actividad que no contempla perfilería ni pintura, garantizando la correcta ejecución de los trabajos en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.



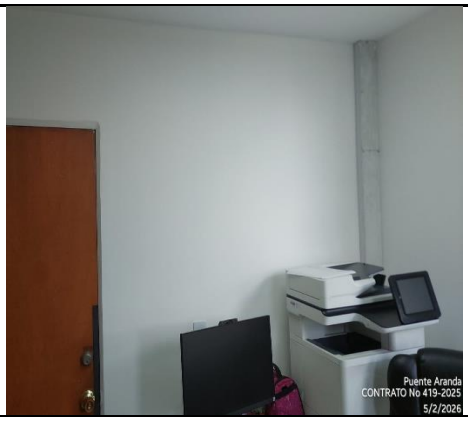
FOTO No 12: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).



FOTO No 13: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN BAÑOS DE 4 MM FLOTADOS, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO CALIDAD PELDAR O EQUIVALENTE, incluyendo anclajes a muros; así mismo, la instalación de cinta LED en espejos flotados



FOTO No 14: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el DESMONTE DE LÁMPARAS, garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA y JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).

con estructura en aluminio, garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA	
	
FOTO No 15: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA, garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).	**FOTO No. 16:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el suministro e instalación de LÁMINA ANCHO 0.09 A 0.15 M CALIBRE 12, SOLDADA SOBRE CORREAS (PARA ASEGURAR LAS TEJAS A LAS CORREAS), garantizando la correcta ejecución de la actividad en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).
	
FOTO No. 17: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el suministro poyo en concreto para cocina del edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.	**FOTO No. 18:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica el suministro poyo en concreto para cocina del edificio de la ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA.
	
FOTO No. 19: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la pintura en muros interiores tipo I lavable a tres manos en el edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).	**FOTO No. 20:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la instalación de SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE, en algunas huellas en las escaleras del tercer piso de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL), sin embargo,


	se realiza un requerimiento por calidad de la actividad por fallas en el adhesivo el día 12 de febrero de 2026 oficio AU-INTERV-PA-435-2025-OF-170, aun sin subsanar.
	
FOTO No 21: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de PINTURA VINILO TECHOS (2 manos), incluyendo andamios; en la oficina de ARCHIVO del tercer piso del edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).	**FOTO No. 22:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de PINTURA VINILO TECHOS (2 manos), incluyendo andamios; en la oficina de SALA DE REUNIÓN del tercer piso del edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).
	
FOTO No. 23: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de VINILO MUROS INTERIORES TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS. incluye resanes, filos y dilataciones. sin andamios; en la oficina de SALA DE REUNIÓN del tercer piso del edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).	**FOTO No. 24:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de VINILO MUROS INTERIORES TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS. incluye resanes, filos y dilataciones. sin andamios; en la oficina de ARCHIVO del tercer piso del edificio JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).
	
FOTO No. 25: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de suministro e instalación de DOMO ACRÍLICO CIRCULAR 1,60 MTS - CALIBRE 4MM COLOR BRONCE CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN, garantizando el cumplimiento de la especificación técnica, para la cubierta del edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).	**FOTO No. 26:** La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DESMONTE DE DOMO ACRÍLICO CIRCULAR, en la cubierta del edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).



FOTO No. 27: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad DEMOLICIÓN DE MURO EN SISTEMA LIVIANO EN SECO (DRYWALL - SUPERBOARD). incluye retiro de escombros, en el tercer piso del edificio de la JUNTA ADMINISTRATIVA LOCAL (JAL).



FOTO No. 28: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DESMONTES DIVISIONES OFICINA EN ALUMINIO Y VIDRIO, incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).

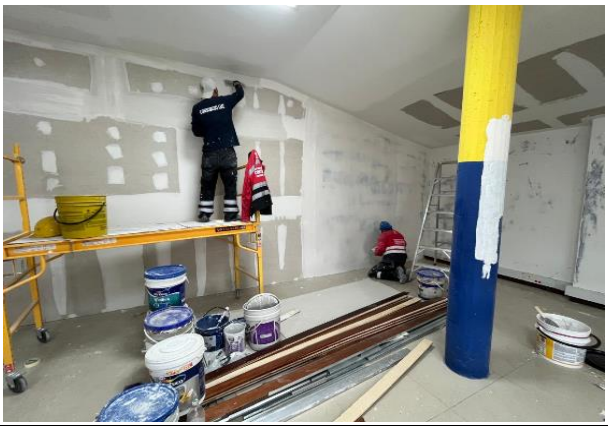

FOTO No. 29: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS. incluye andamios, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No. 30: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DEMOLICIÓN PISO. incluye cargue y disposición en sitio autorizado; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).

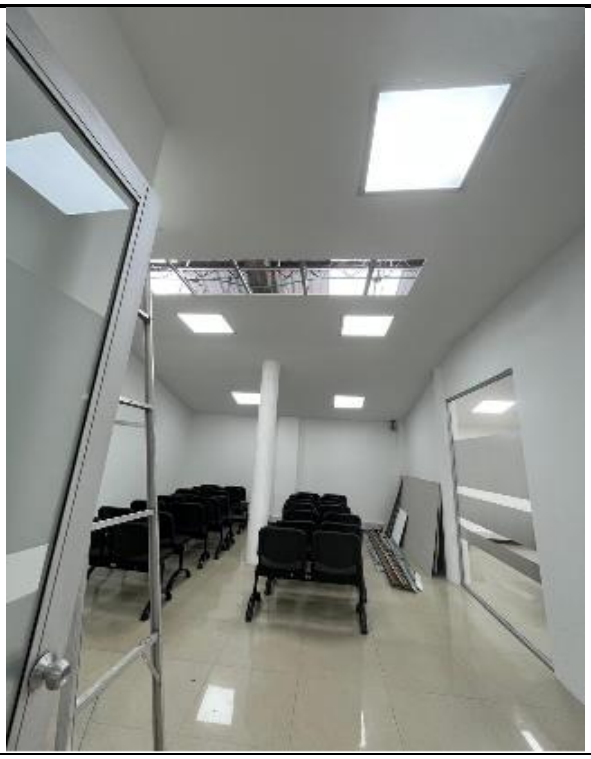


FOTO No. 31: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de suministro e instalación de PANEL LED CUADRADO 60x60X4 POTENCIA 40w Luz Blanca 100-277v, incluye estructura en aluminio y policarbonato; en el área de ARCHIVO edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

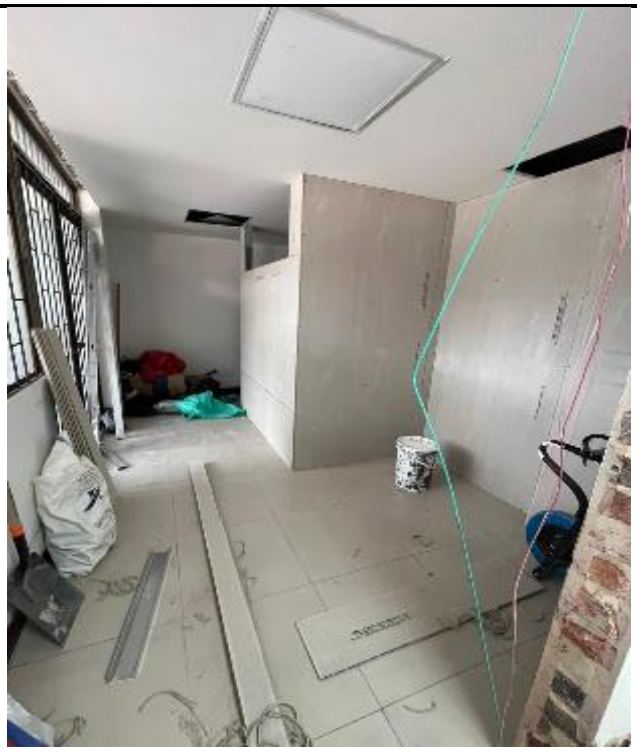


FOTO No. 32: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM VISTO DOS CARAS, Incluye estructura, accesorios, pintura; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No. 33: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA; en el área del tercer piso en las oficinas de ARCHIVO Y SALA DE JUNTAS, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

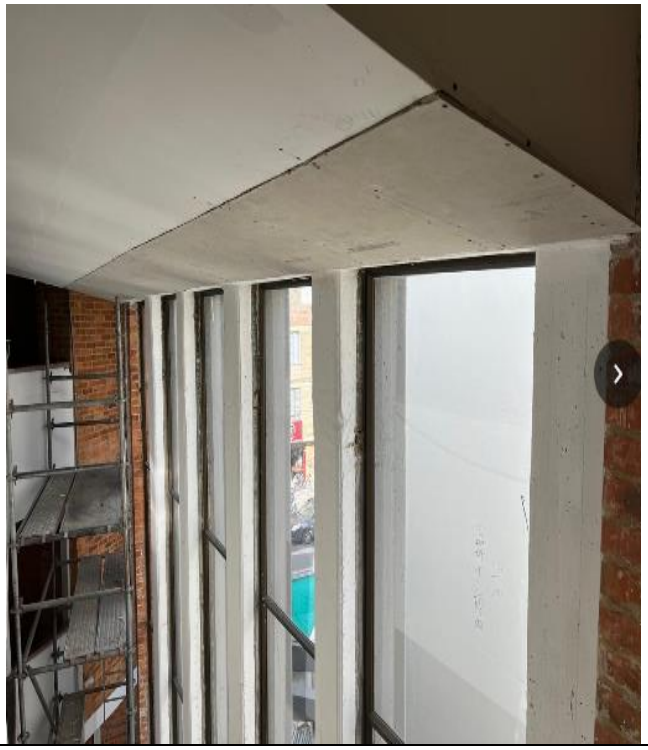


FOTO No. 34: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6MM incluye estructura metálica, masilla y andamios certificados; en el área del tercer piso, en el vacío junto a fachada, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).



FOTO No. 35: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de suministro e instalación de AISLANTE TÉRMICO TIPO FRESCASA ESPESOR 2-1/2", en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No. 36: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de VINILO MUROS INTERIORES TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS, incluye resanes, filos y dilataciones. sin andamios, de archivo tercer piso, edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

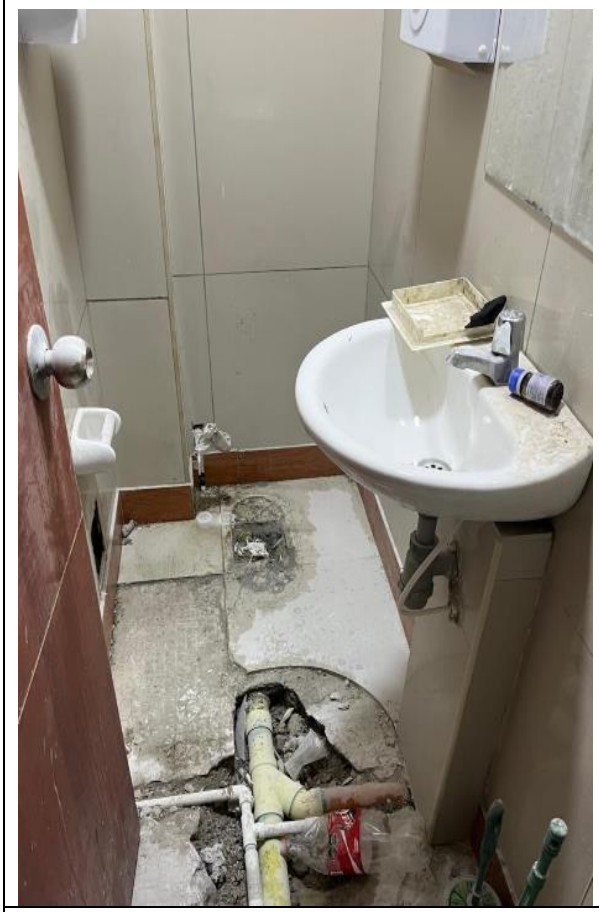


FOTO No. 37 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Sanitario), incluye tapón y retiro a sitios autorizados; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).

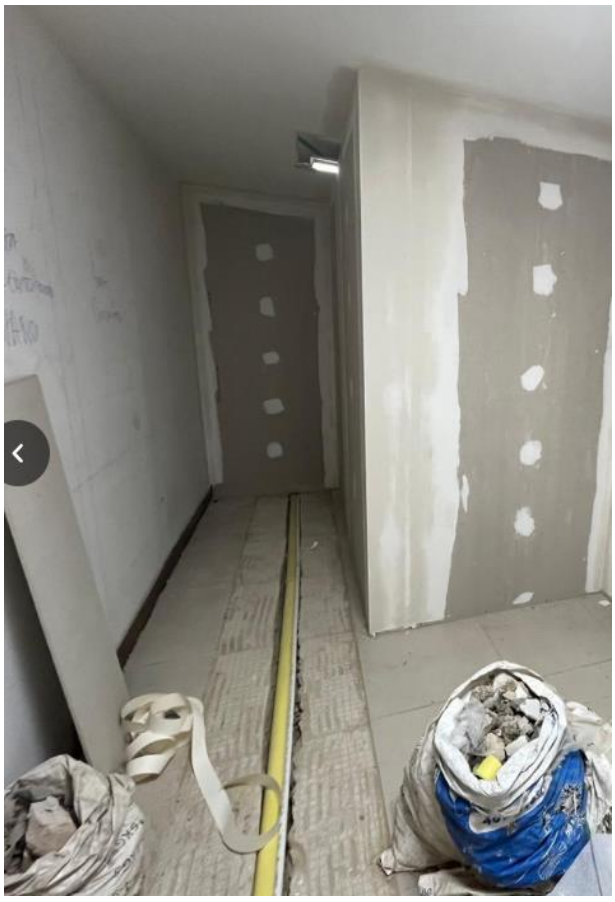



FOTO No. 38: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No. 39: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" y PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).



FOTO No. 40: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS; en el área de PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (PYBA).

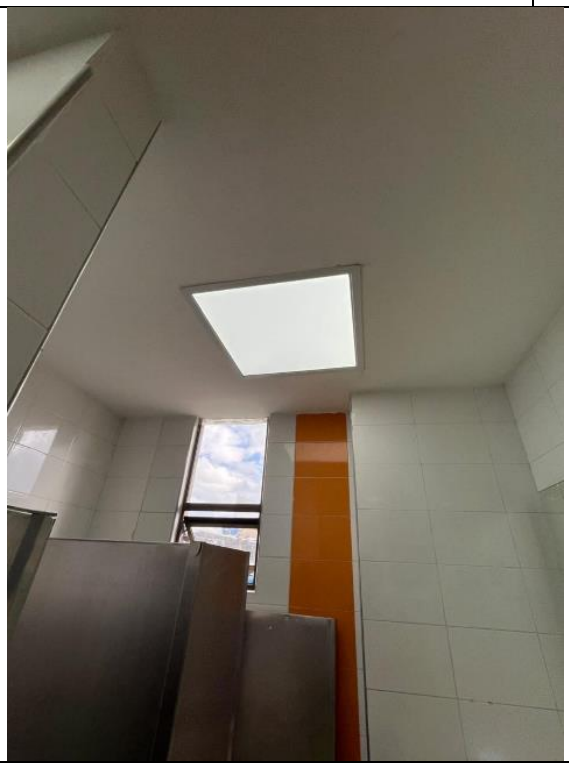


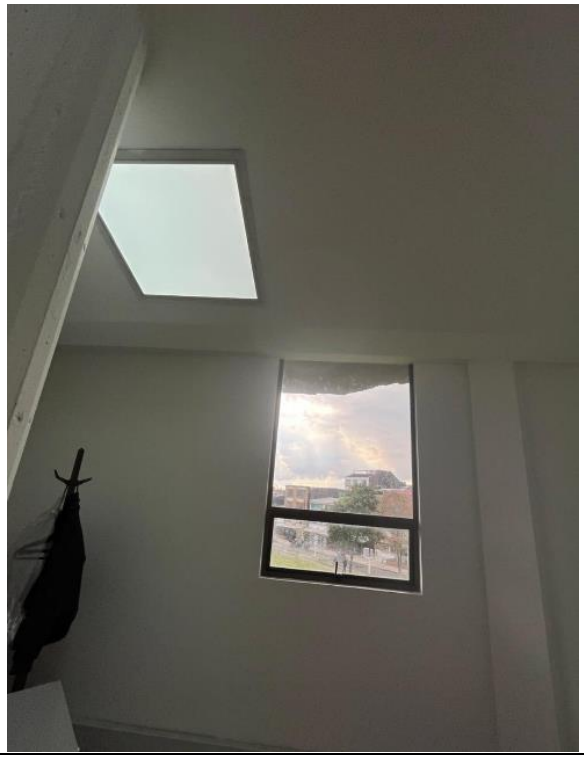


FOTO No. 41 y 42 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de PANEL LED CUADRADO 60x60X4 POTENCIA 40w Luz Blanca 100-277v; en baños tercer piso mujeres y oficina infraestructura tercer piso, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

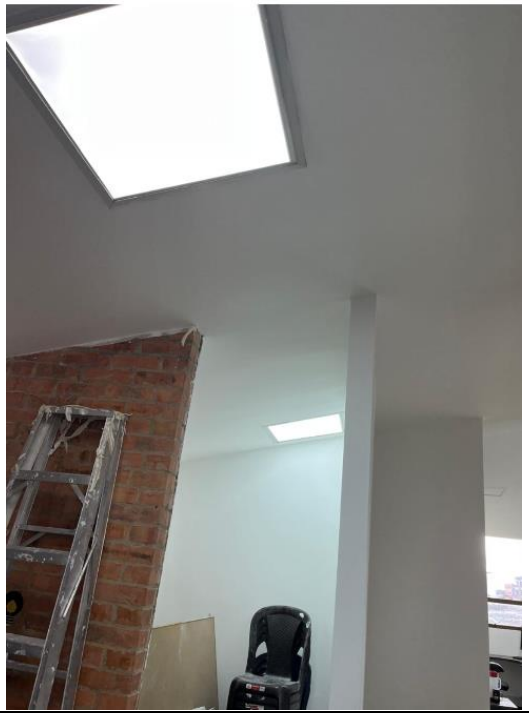

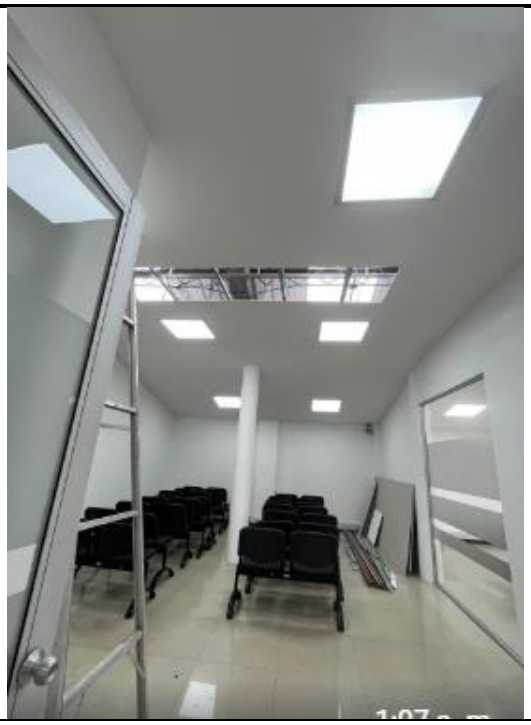


FOTO No. 43 y 44 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de PANEL LED CUADRADO 60x60X4 POTENCIA 40w Luz Blanca 100-277v; en bodega, hall de oficinas, oficina archivo y sala de reuniones tercer piso, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

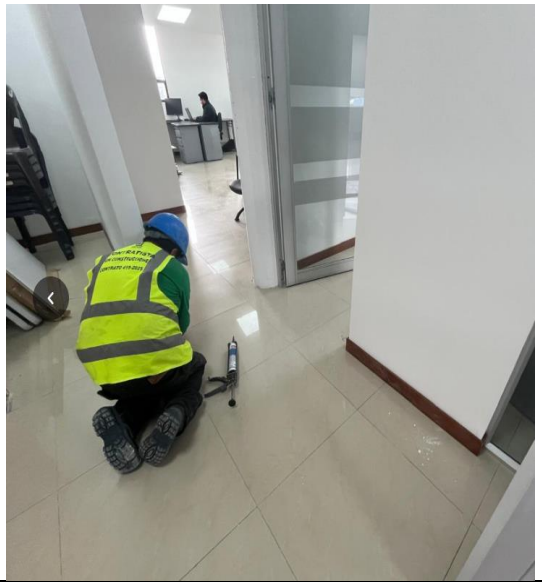


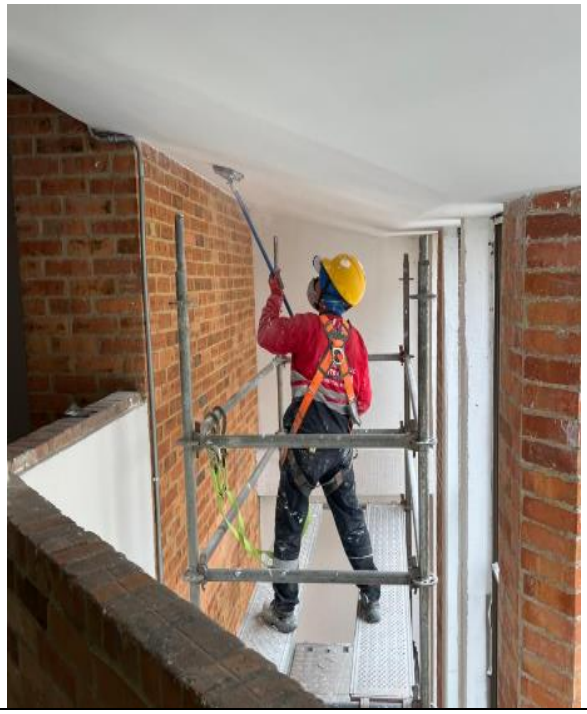


FOTO No. 45 y 46 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad GUARDAESCOBA EN MADERA IGUAL A EL EXISTENTE 8cm; en el área del tercer piso en las oficinas de ARCHIVO, SALA DE JUNTAS, BODEGA, INGRESO OFICINA INFRAESTRUCTURA Y HALL, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).





FOTO No. 47 y 48 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de VINILO MUROS INTERIORES TIPO I LAVABLE A TRES MANOS; en el área del tercer piso, en el vacío junto a fachada, muro superior a la salida se emergencia, muros punto fijo, columnas circulaciónes, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).




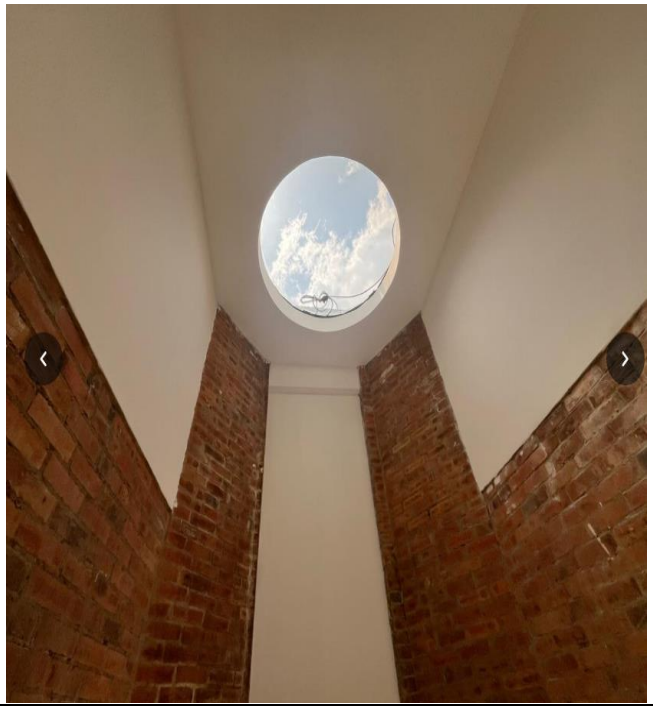


FOTO No. 49 y 50 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de PINTURA VINILO TECHOS (2 manos); en el área del tercer piso, en el vacío junto a fachada y punto fijo, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

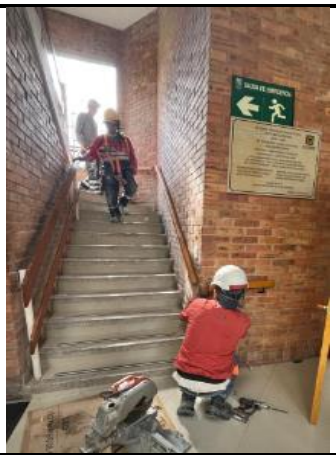

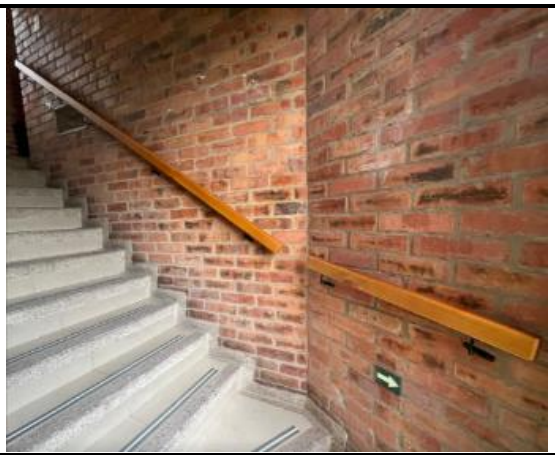


FOTO No. 51 y 52 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de suministro e instalación de BARANDA EN MADERA, INCLUYE ANCLAJE AL MURO; en el área de punto fijo, del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).





FOTO No. 53 y 54 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, incluye herrajes, cerradura tipo manija metálica, terminada, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas; en el área de punto fijo, para acceso cubierta, cocina y oficina secretaria general del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).

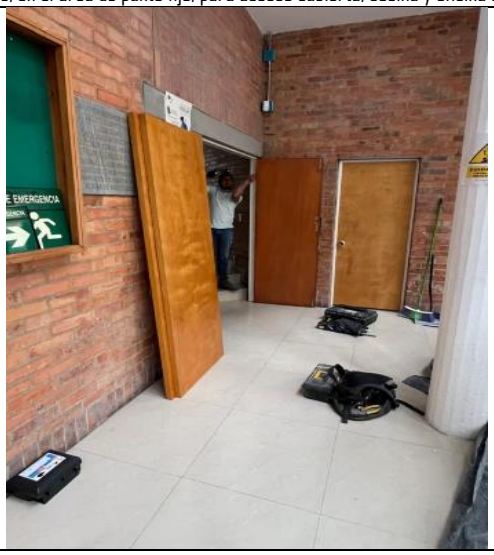




FOTO No. 55 y 56 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, incluye herrajes, cerradura tipo manija metálica, terminada, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas; en el área de punto fijo, para el auditorio del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).





FOTO No. 57 y 58 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, incluye herrajes, cerradura tipo manija metálica, terminada, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas; en el área de punto fijo, para baños primer y segundo piso del edificio de la ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA.



FOTO No. 59: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de suministro e instalación de VENTANA EN ALUMINIO; bodega y oficina de infraestructura, tercer piso del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).





FOTO No. 60 y 61 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE Perfilería Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO - VIDRIO TEMPLADO 5 mm., para bodega y oficina de infraestructura, tercer piso del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL)..



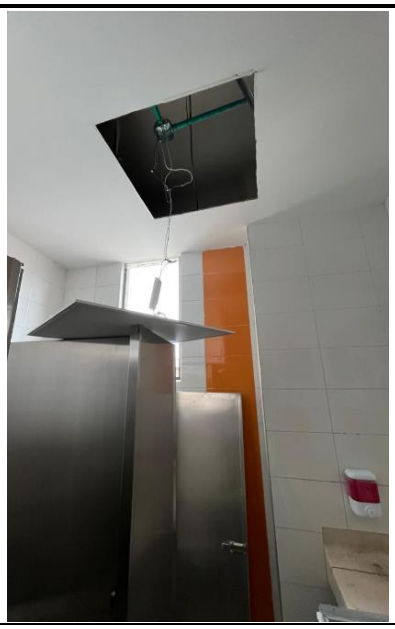


FOTO No. 62 y 63 La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad de DESMONTE DE LAMPARAS, tercer piso del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL)..



FOTO No. 64: La interventoría ARQUITECTURA URBANA LTDA. revisa y verifica la actividad IMPERMEABILIZACIÓN DE PEDESTALES METALICOS; cubierta del edificio JUNTA DE ACCIÓN LOCAL (JAL).
