Valparaíso Caquetá, 27. de marzo de 2026

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía de Valparaíso – Caquetá

Asunto: entrega de cuenta de cobro de contrato de prestación de servicio CPS-054-2026

Cordial Saludo.
Para su conocimiento y fines pertinentes, nos permitimos remitir los documentos soporte en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de prestación de servicio CPS-054-2026, cuyo objeto del contrato es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON RECURSOS DE EMPRÉSTITO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**. Ejecutada durante el periodo del 29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

Anexos: 52 Folios.
Informe de supervisión.
Certificado de recibo de satisfacción
Informe de actividades
Planilla de seguridad social
Factura

Atentamente,

ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO
1.006.487.317 de Florencia
Representante legal
INGSTEC S.A.S.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE VALPARAÍSO
NIT. 800.050.407-1

RECIBIDO

FECHA: 31/03/2026
HORA: 3:14 pm
ANEXOS: 54 Folios
Yudy Nuñez
OFICINA CONTRATACIÓN

ACTA No. 001 DE SUPERVISIÓN

En las instalaciones de la secretaria de planeación, Desarrollo e Infraestructura del Palacio Municipal, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Valparaíso:

SUPERVISOR	YESSIKA ADRIANA JIMÉNEZ FORERO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.117.522.940 de Florencia - Caquetá
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA ALCALDIA VALPARAISO - CAQUETA

Y por el otro:

CONTRATISTA:	INGSTEC SAS
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.108.395-8
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO
TIPO Y No. IDENTIFICACIÓN	1.006.487.317 de Florencia Caquetá

Una vez recepcionado el informe de ejecución de actividades presentado por parte de INGSTEC SAS referente al contrato de Prestación de Servicios CPS-054-2026:

TIPO	Prestación de Servicio
No.	CPS-054-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON RECURSOS DE EMPRÉSTITO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
FECHA DE CELEBRACIÓN	27 de enero 2026
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ SEIS (06) MESES- CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES.

VALOR	VALOR CONTRATADO CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($106.892.600,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO	El contrato resultante del presente proceso de contratación se cancelara pagos mensuales, correspondientes cada uno al valor de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($17.815.433,33) M/CTE, mensuales o equivalente proporcional al número de días ejecutados entendiendo el mes como 30 días, como calor a cancelar mensualmente al contratista por concepto de honorarios para la ejecución del mismo, a los cuales deberá acogerse el contratista. De acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo) 2. Factura o documento similar y/o equivalente. 3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales cuando correspondan 4. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial. 5. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir ¨certificado, Acta de Supervisión o informe de Supervisión y deberá verificar el cumplimiento para

	cada pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	2026000023 DE 09 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	2026000054 DE 27 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
No. GARANTÍA	61-46-101039220
MODIFICACIONES A LA GARANTÍA	N/A
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: Sanitas, Asmet Salud, Nueva EPS, Pensiones: Porvenir, Colpensiones Riesgos Profesionales: Positiva Aportes Parafiscales:
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2026
PLAZO INICIAL	Seis (06) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de julio de2026
FECHA TERMINACIÓN FINAL	N/A
VALOR EJECUTADO	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. ($17.815.428,33) M/CTE.
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.077.171,67) M/CTE
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00
VALOR PAGADO	0,00

VALOR A PAGAR	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. ($17.815.428,33) M/CTE.		
PERIODO EJECUTADO:	29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026		
INFORMACIÓN ANTICIPO			
% ANTICIPO	_____%	VALOR:	
FECHA DE DESEMBOLSO			
	No. ACTA	VALOR	
AMORTIZACIÓN REALIZADA			
	Total amortizado:		
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

El Supervisor manifiesta que ha adelantado en ejercicio de la supervisión las siguientes actividades:

NO	OBJECTO DEL PROYECTO.	ACCIONES DE SUPERVISIÓN	OBSERVACIONES
1	Construcción de placa	1.1 Realizar la supervisión técnica de las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de planos, especificaciones técnicas, normas vigentes y condiciones contractuales. 1.2 Verificar el avance físico de la obra frente	Las actividades constructivas se ejecutan conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, con un avance acorde al cronograma y sin retrasos. Se evidencia cumplimiento en la calidad de materiales y procesos. Los informes de supervisión se presentan oportunamente con su respectivo registro, y se cumple con los lineamientos de SST. Así mismo, se realizan

	deportiva en la vereda santa fe trocha 10 en el municipio de Valparaíso, Caquetá.	al cronograma aprobado y las cantidades de obra ejecutadas. 1.3 Revisar la calidad de los materiales y procesos constructivos empleados en la obra. 1.4 Elaborar y presentar informes periódicos de supervisión, con registro fotográfico y observaciones técnicas. 1.5 Verificar el cumplimiento de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del proyecto, mediante visitas de seguimiento y la elaboración de informes mensuales de supervisión en SST. 1.6 Realizar comités operativos de seguimiento del proyecto, con el fin de revisar avances y dejar actas de las observaciones realizadas.	comités de seguimiento con actas de control y avance.
		2.1 Realizar la supervisión técnica de las actividades de construcción de alcantarillas y box	Las actividades se ejecutan conforme a diseños, especificaciones y normativa vigente, con adecuada calidad,

2	Mejoramiento de la red terciaria con alcantarillas y box culvert construidos para la transitabilidad en la red vial perteneciente al municipio de Valparaíso.	culvert, verificando cumplimiento de diseños, especificaciones técnicas y normativa aplicable. 2.2 Verificar la correcta ejecución de las obras en cuanto a calidad, cantidades y procesos constructivos. 2.3 Hacer seguimiento al avance físico del proyecto frente al cronograma contractual. 2.4 Elaborar y presentar informes técnicos de supervisión, incluyendo registro fotográfico y recomendaciones. 2.5 Verificar el cumplimiento de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del proyecto, mediante visitas de seguimiento y la elaboración de informes mensuales de supervisión en SST. 2.6 Realizar comités operativos de seguimiento del proyecto, con el fin de revisar avances y dejar actas de las	cantidades y un avance acorde al cronograma. Los informes de supervisión se presentan oportunamente, se cumple con los lineamientos de SST y se realizan comités de seguimiento con sus respectivas actas.

		observaciones realizadas.	

De otra parte, el Supervisor efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de enero y febrero de 2026, para todo el personal que laboro para el contratista, así:

MES DE ENERO

HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	36730703	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	EPS: SANITAS	$ 218.900
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$18.300
	Total:	$517.400

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	4644468522	Empresa liquidadora: SOI
Salud	EPS: SANITAS	$219.900
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$281.500
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	$9.300
	Total:	$510.700

JAIME HERMOSA SAAVEDRA

Periodo pagado:	ENERO de 2026

No. Planilla	4644468522	Empresa liquidadora: SOI
Salud	EPS: SANITAS	$246.300
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$315.200
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	$137.100
	Total:	$698.600

ANTURI MENA VALENTINA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	36730703	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	EPS: ASMET SALUD	$109.500
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$140.100
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$61.000
	Total:	$255.700

MES DE MARZO

HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	36730710	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	EPS: SANITAS	$218.900
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$18.300
	Total:	$517.400

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	6007324881	Empresa liquidadora: SOI
Salud	EPS: NUEVA EPS	$280.200
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$218.900
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$9.200
	Total:	$508.300

JAIME HERMOSA SAAVEDRA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	4644469561	Empresa liquidadora: SOI
Salud	EPS: SANITAS	$246.300
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$396.800
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$172.700
	Total:	$815.800

ANTURI MENA VALENTINA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	36730710	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	EPS: ASMET SALUD	$218.900
Pensión	Fondo de Pensiones: PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	ARL: POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$121.900
	Total:	$621.000

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de esta en cuantía de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. ($17.815.428,33) M/CTE.,** correspondiente al mes del 29 de enero al 28 de febrero de 2026, adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Valparaíso, Departamento del Caquetá, a los 26 días del mes de marzo.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO	**ANGIE VIVIANDA HERNANDEZ ALVARADO**
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura	Contratista
Supervisor	

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

El recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas del siguiente contrato:

No.	CPS-054-2026
Tipo	PRESTACION DE SERVICIO
Contratista	INGSTEC SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON RECURSOS DE EMPRÉSTITO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Fecha de celebración	27 de enero de 2026
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será seis (06) meses- contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades.
Fecha de inicio	29 de enero de 2026
Fecha de Terminación final	28 de julio de 2026
Valor contratado	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($89.077.171,67) M/CTE
Valor ejecutado	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. ($17.815.428,33) M/CTE.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas:

NO	OBJECTO DEL PROYECTO.	ACCIONES DE SUPERVISIÓN	OBSERVACIONES
1	Construcción de placa deportiva en la vereda santa fe trocha 10 en el municipio de Valparaíso, Caquetá.	1.1 Realizar la supervisión técnica de las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de planos, especificaciones técnicas, normas vigentes y condiciones contractuales. 1.2 Verificar el avance físico de la obra frente al cronograma aprobado y las cantidades de obra ejecutadas. 1.3 Revisar la calidad de los materiales y procesos constructivos empleados en la obra. 1.4 Elaborar y presentar informes periódicos de supervisión, con registro fotográfico y observaciones técnicas. 1.5 Verificar el cumplimiento de los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del proyecto, mediante visitas de seguimiento y la elaboración de	Las actividades constructivas se ejecutan conforme a planos, especificaciones técnicas y normativa vigente, con un avance acorde al cronograma y sin retrasos. Se evidencia cumplimiento en la calidad de materiales y procesos. Los informes de supervisión se presentan oportunamente con su respectivo registro, y se cumple con los lineamientos de SST. Así mismo, se realizan comités de seguimiento con actas de control y avance.

		informes mensuales de supervisión en SST. 1.6 Realizar comités operativos de seguimiento del proyecto, con el fin de revisar avances y dejar actas de las observaciones realizadas.	
2	Mejoramiento de la red terciaria con alcantarillas y box culvert construidos para la transitabilidad en la red vial perteneciente al municipio de Valparaíso.	2.1 Realizar la supervisión técnica de las actividades de construcción de alcantarillas y box culvert, verificando cumplimiento de diseños, especificaciones técnicas y normativa aplicable. 2.2 Verificar la correcta ejecución de las obras en cuanto a calidad, cantidades y procesos constructivos. 2.3 Hacer seguimiento al avance físico del proyecto frente al cronograma contractual. 2.4 Elaborar y presentar informes técnicos de supervisión, incluyendo registro fotográfico y recomendaciones. 2.5 Verificar el cumplimiento de los elementos de	Las actividades se ejecutan conforme a diseños, especificaciones y normativa vigente, con adecuada calidad, cantidades y un avance acorde al cronograma. Los informes de supervisión se presentan oportunamente, se cumple con los lineamientos de SST y se realizan comités de seguimiento con sus respectivas actas.

		Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución del proyecto, mediante visitas de seguimiento y la elaboración de informes mensuales de supervisión en SST. 2.6 Realizar comités operativos de seguimiento del proyecto, con el fin de revisar avances y dejar actas de las observaciones realizadas.	

La presente certificación se expide para dar trámite al proceso de pago, en consideración a lo dispuesto en el "Manual de Contratación" del municipio de Valparaíso, adoptado mediante la Resolución No. 471 del 27 de diciembre de 2024.

Dada a los 26 días del mes de marzo de 2026.

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA VALPARAISO – CAQUETA
SUPERVISORA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON RECURSOS DE EMPRESTITO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO NO. CPS-054-2026

INFORME MENSUAL DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía municipal de Valparaíso Caquetá

Fecha del Informe: (26/03/2026)

Periodo Reportado: (del 29/01/2026 al 28/02/2026)

Correo electrónico: ingstecsas@gmail.com Ubicación: Florencia-Caquetá CEL: 3118973228

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... *¡Error! Marcador no definido.*
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN *6*
1.1. DATOS DEL CONTRATO *6*
1.2. GARANTÍAS *7*
1.3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION *7*
2. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE SUPERVISION *7*
3. EJECUCIÓN FINANCIERA *8*
3.1 PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE SUPERVISION *9*
3.2 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE SUPERVISION *9*
3.3 DESEMBOLSOS APROBADOS A LA FECHA DE LOS CONTRATOS No. 002 DE 2025 Y 003 DE 2025 ..... *10*
4. MECANISMOS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN *12*
6. GESTIÓN DOCUMENTAL *25*
7. COMPONENTE DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ASST) *27*
8. REPORTE DEL AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 002 DE 2025 Y 003 DE 2025. ..... *33*
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES *34*

INTRODUCCION

En el marco del desarrollo de proyectos estratégicos orientados al cierre de brechas de infraestructura en el municipio de Valparaíso, Caquetá, se adelantan intervenciones integrales destinadas a fortalecer la competitividad del sector rural y la seguridad vial de sus habitantes. Estas acciones se ejecutan mediante contratos de obra que priorizan la estabilidad de la red vial terciaria y la creación de espacios técnicos adecuados para la integración y el bienestar de las comunidades.

Dentro de los ejes de acción técnica, se destaca la ejecución de obras de drenaje transversal mediante la construcción de alcantarillas y estructuras tipo box culvert. Estas estructuras son fundamentales para garantizar el manejo eficiente de las escorrentías superficiales, evitando el deterioro prematuro de la banca y asegurando la transitabilidad permanente en los corredores intervenidos. De esta manera, se facilita el transporte de productos agrícolas y el acceso de la población a servicios básicos, mitigando los impactos que las temporadas de lluvias generan sobre la infraestructura vial rural.

De forma complementaria, el proyecto contempla el fortalecimiento de la infraestructura física recreativa con la construcción de la placa deportiva en la vereda Santa Fe - Trocha 10. Esta obra se proyecta como un espacio clave para el desarrollo de actividades físicas y el encuentro comunitario, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar su durabilidad y funcionalidad técnica en favor de los habitantes de la zona.

El presente informe mensual tiene como finalidad presentar el seguimiento detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, actuando como el principal instrumento de control y vigilancia técnica. En él se documenta de manera objetiva el avance físico de las obras, la verificación de los estándares de calidad en el uso de materiales, y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales. Asimismo, este documento sirve como soporte para el ejercicio de las facultades de supervisión, permitiendo identificar novedades en la ejecución y asegurar que los recursos se transformen en obras que cumplan estrictamente con los diseños y normas de ingeniería vigentes.


INFORME MENSUAL DE AVANCE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 002 DE 2025 Y 003 DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA A CARGO DE LA SUPERVISION INGSTEC S.A.S

Imagen 1: Localización del municipio objeto de intervención



Fuente: Supervisión.

Imagen 2: Localización Alcantarillas y Box

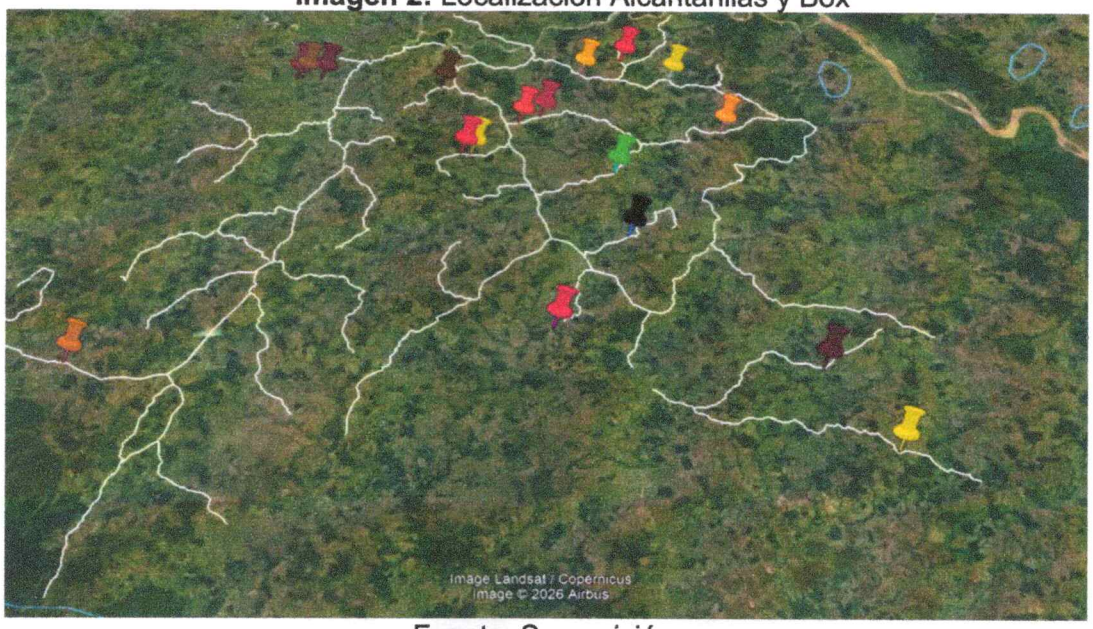

Fuente: Supervisión.

Imagen 3: Localización Placa Deportivita



Fuente: Supervisión.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

1.1. DATOS DEL CONTRATO

Cuadro No.1: Datos del contrato de interventoría

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.	CPS-054-2026	
CONTRATISTA SUPERVISOR	INGSTEC SAS	
NIT/CÉDULA DEL CONTRATISTA	901.108.395-8	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /CONTRATISTA	ANGIE VIVIANA HERNANDEZ ALVARADO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$106.892.600,00	CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como apoyo a la supervisión de obras de infraestructura financiados con recursos de empréstito en la jurisdicción del municipio de Valparaíso departamento del Caquetá.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (06) meses	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de enero de 2026	
FECHA INICIO DEL CONTRATO	Veintinueve (29) de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Veintiocho (28) de enero de 2026	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Veintiocho (28) de enero de 2026	
OTROSÍ No.	**Fecha:** N/A	**Objeto:** N/A
	N/A	
	N/A	
ADICION No.	**Fecha:** N/A	**Objeto:** N/A
	N/A	
	N/A	
CONTRATANTE	Alcaldía municipal de Valparaíso Caquetá	

Fuente: Información contractual.

1.2. GARANTÍAS

Cuadro No.2: Información de las garantías del contrato de interventoría

GARANTIAS INICIALES DE CUMPLIMIENTO – CON CONTRATO (ANEXO 0)						
No.	**GARANTIA**	**INICIO**	**FIN**	**VALOR**	**ASEGURADORA**	**FECHA DE EXPEDICION**
61-46-101039220	Cumplimiento	27/01/2026	28/01/2027	$10.689.260,00	Seguros del Estado S.A	28 de enero de 2026
	Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnización laborales	27/01/2026	28/01/2029	$5.334.630,00		
Total, Asegurado				$ 16.033.890,00		

Fuente: Información contractual al 28 de febrero de 2026

1.3. PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

De acuerdo con lo descrito en la CLAUSULA Novena (09) del contrato de prestación de servicio No. CPS-054 de 2026, el valor total estipulado para la ejecución de este es de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($106.892.600 COP), incluido IVA y demás gravámenes e impuestos.

2. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE SUPERVISION

De manera general se puede evidenciar que la supervisión viene desarrollando de forma adecuada el objeto del contrato, realizando el seguimiento correspondiente a la ejecución de los contratos de obra y verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los mismos.

Durante el periodo del 29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026 se efectuó el seguimiento a los Contratos de Obra No. 002 de 2025 y No. 003 de 2025, verificando el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos contemplados en dichos contratos.

En el caso del Contrato de Obra No. 002 de 2025, correspondiente al mejoramiento de la red terciaria mediante la construcción de alcantarillas y box culvert para la transitabilidad de la red vial del municipio de Valparaíso, se ha realizado la verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato para el desarrollo de las actividades.

De igual manera, se realiza el seguimiento al Contrato de Obra No. 003 de 2025, relacionado con la ejecución del proyecto de construcción de una placa deportiva en la vereda Santa Fe Trocha 10 del municipio de Valparaíso, Caquetá, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales por parte del contratista.

En este sentido, la supervisión continúa desarrollando las actividades de control y seguimiento necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las obras conforme a las condiciones establecidas en los respectivos contratos.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante los días 29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades financieras para el contrato CPS 054 de 2026.

- Diligenciamiento de los formatos requeridos para la solicitud del primer pago de la Supervisión
- Realizar la certificación de pago de aportes de sistema de seguridad social y parafiscales para el proyecto de INGSTEC.
- Dar seguimiento a compromisos financieros (impuestos, nómina, deudas, pagos a proveedores, etc.).
- Realizar la factura proforma del primer pago de avance el proyecto
- Realizar las demás funciones o documentos solicitados por parte de presentante legal de INGSTEC dentro del marco financiero.
- Enviar la resolución de facturación electrónica y Rut al supervisor del proyecto.

3.1 PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DEL CONTRATO DE SUPERVISION.

A la fecha no se ha efectuado ningún pago, teniendo en cuenta que el presente informe corresponde al seguimiento, control y avance de la ejecución contractual de los Contratos de Obra No. 002 de 2025 y No. 003 de 2025, relacionados con la construcción de alcantarillas y box culvert para el mejoramiento de la red vial del municipio de Valparaíso y la construcción de una placa deportiva en la vereda Santa Fe Trocha 10, el cual corresponde al primer periodo reportado comprendido entre el 29 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

Cuadro No.6: Pagos efectuados al contrato de supervisión

No. DE PAGO	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DEL PAGO	VALOR PAGADO	%
Pago 01 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
Pago 02 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
Pago 03 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
Pago 04 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
Pago 05 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
Pago 06 EG	Equipo profesional y Alquiler de Equipo			
TOTAL, PAGOS REALIZADOS			$0,00	0%

Fuente: Soportes de pago **28 de febrero de 2026**

3.2 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Durante el presente Periodo el porcentaje de ejecución financiera corresponde a un 16.7% correspondiente a la etapa de implementación de los contratos de obra No. 002 de 2025 y No. 003 de 2025, relacionados con la construcción de alcantarillas tipo box culvert para el mejoramiento de la red vial del municipio de Valparaíso y la construcción de una placa deportiva en la vereda Santa Fe Trocha 10, por ende, para este mes se presentó cuenta de cobro #1 de pago para esta Supervisión.

Cuadro No.7: Ejecución financiera del contrato de interventoría

No.	CATEGORIAS DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO					MES 11 EJECUTADO		ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	
		Valor Unitario ($)	Cantidad	Unidad de Medida	($)	%	($)	%	($)	%
1	**EQUIPO GERENCIAL**				**106,892,600**	**100.00%**	**17,815,433.33**	**16.67%**	**17,815,433.33**	**16.67%**
1.1	Pago 01	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%	17,815,433.33	**16.67%**	17,815,433.33	16.67%
1.2	Pago 02	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%				
1.3	Pago 03	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%				
1.4	Pago 04	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%				
1.5	Pago 05	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%				
1.6	Pago 06	17,815,433.33	1	MES	17,815,433.33	16.67%				
	TOTAL				**106,892,600**	**100.00%**		**16.67%**		**16.67%**

Fuente: Supervisión – 28 de febrero de 2026

3.3 DESEMBOLSOS APROBADOS A LA FECHA DE LOS CONTRATOS No. 002 DE 2025 Y 003 DE 2025

CONTRATO 002 DE 2025 EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED TERCIARIA CON ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT CONSTRUIDOS PARA LA TRANSPIRABILIDAD DE LA RED VIAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALPARAISO

De acuerdo con el presupuesto inicial del contrato No. 002 de 2025 por un valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PÉSOS M/CTE ($685.000.000), a la fecha de corte del presente informe, se ha efectuado un primer pago al contratista equivalente al 50% por un valor de $342.500.000, como se encuentra estipulada a continuación:

No. DE PAGO	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DEL PAGO	VALOR PAGADO	%
PAGOS1	ANTICIPO	21/11/2025	$342.500.000,00	50%
PAGOS2		DD/MES/AÑO	$0,00	0%
PAGOS3		DD/MES/AÑO	$0,00	0%
ETC				
TOTAL PAGOS REALIZADOS			**$0,00**	**0%**

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que, se ha generado el pago por un valor de $342.500.000 al contratista correspondiente al 50%, quedando un valor de $342.500.000 por pagar correspondiente al 50% del presupuesto total $685.000.000 del contrato N°002 de 2025.




CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 EJECUCIÓN DEL PROYECTO ONSTRUCCION DE PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA SANTA FE TROCHA 10 DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO CAQUETÁ.

De acuerdo con el presupuesto inicial del contrato No. 003 de 2025 por un valor de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PÉSOS M/CTE ($205.000.000), a la fecha de corte del presente informe, se ha efectuado un primer pago al contratista equivalente al 50% por un valor de $102.500.000, como se encuentra estipulada a continuación:

No. DE PAGO	CONCEPTO DEL PAGO	FECHA DEL PAGO	VALOR PAGADO	%
PAGOS1	ANTICIPO	22/11/2025	$102.500.000,00	50%
PAGOS2		DD/MES/AÑO	$0,00	0%
PAGOS3		DD/MES/AÑO	$0,00	0%
ETC				
TOTAL PAGOS REALIZADOS			$0,00	

De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que, se ha generado el pago por un valor de $102.500.000 al contratista correspondiente al 50%, quedando un valor de $102.500.000 por pagar correspondiente al 50% del presupuesto total $205.000.000 del contrato N°003 de 2025.

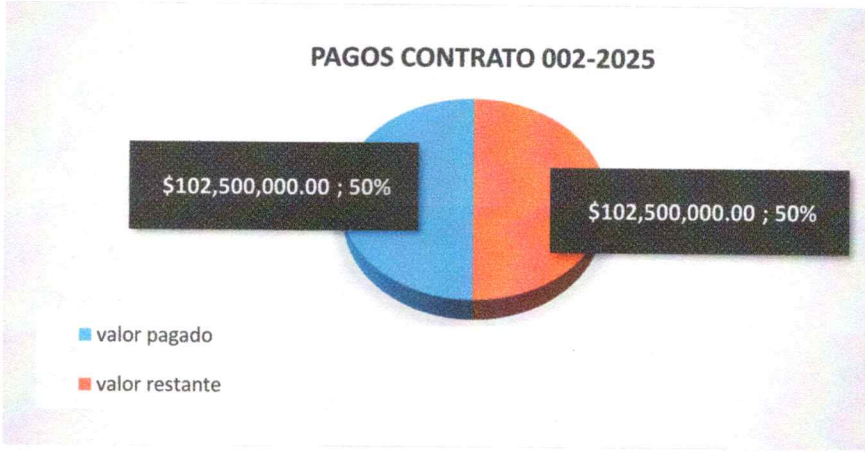

4. MECANISMOS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTUADAS POR LA SUPERVISIÓN

La supervisión ha realizado el seguimiento y control integral a las diferentes actividades que deben desarrollar los contratistas, garantizando un acompañamiento permanente durante las etapas de implementación, estructuración y ejecución del contrato, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos, alcances y obligaciones contractuales establecidos.

Dentro de las actividades de control aplicadas, se destaca el seguimiento continuo al anexo técnico de los contratistas, verificando el cumplimiento de las especificaciones, condiciones y lineamientos definidos. Asimismo, se ha llevado a cabo el acompañamiento constante en el desarrollo de las actividades, realizando requerimientos oportunos frente a los compromisos adquiridos, con el fin de prevenir incumplimientos y asegurar la correcta ejecución contractual.

De igual manera, la supervisión ha efectuado la revisión y validación de los entregables presentados por los contratistas, verificando su coherencia, calidad y correspondencia con lo estipulado en el contrato. Se ha realizado también el control

y seguimiento a los cronogramas de ejecución, identificando posibles desviaciones, riesgos o retrasos, y proponiendo acciones correctivas y preventivas que permitan mantener el desarrollo adecuado de las actividades.

Adicionalmente, se han documentado las actuaciones de supervisión, dejando trazabilidad de los requerimientos, observaciones y recomendaciones realizadas, así como de las respuestas y ajustes efectuados por los contratistas. Todo lo anterior con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y cumplimiento en la ejecución del contrato, velando por el adecuado uso de los recursos y el logro de los resultados esperados.

CONTRATO 002 DE 2025

INTEC-001-2026 (12/02/2026): Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra

INTEC-002-2026 (18/02/2026): Requerimiento al comunicado INTEC-001-2026 Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra

INTEC-003-2026 (24/02/2026): Segunda Reiteración al comunicado número INTEC-001-2026 y al comunicado número INTEC-002-2026 del contrato No. 002-2025.

INTEC-004-2026: (27/02/2026): SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN NO ALLEGADA – INICIO DE ACTIVIDADES ALCANTARILLA PR 2+500

CONTRATO 003 DE 2025

INTEC-001-2026 (17/02/2026) Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra

NTEC-002-2026 (24/02/2026) Primera Reiteración al comunicado Numero INTEC-001-2026 Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra.

INTEC-003-2026 (25/02/2026) Requerimiento Plan de Choque – Avance de Obra Contrato No.003-2025

Visitas a campo realizadas por la supervisión Contrato 002-2025 – Valparaíso

REGISTRO FOTOGRÁFICO

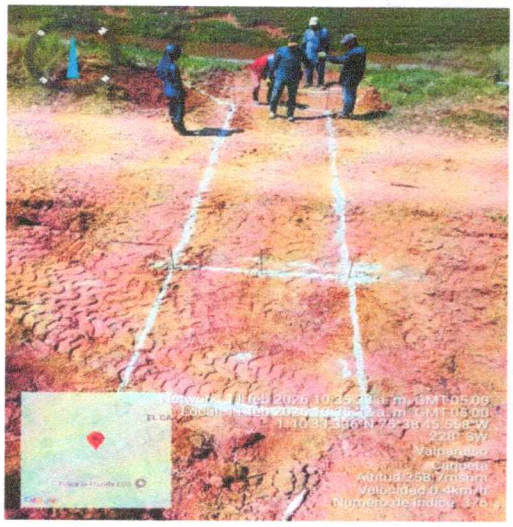


Foto1. *Alcantarilla PR 3+800 vía La Florida-la Paujila-Buenavista*



Foto2. *Alcantarilla PR 3+800 vía La Florida-la Paujila-Buenavista*

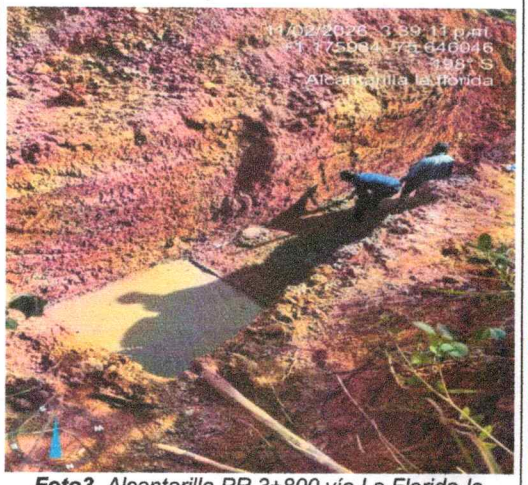


Foto3. *Alcantarilla PR 3+800 vía La Florida-la Paujila-Buenavista*

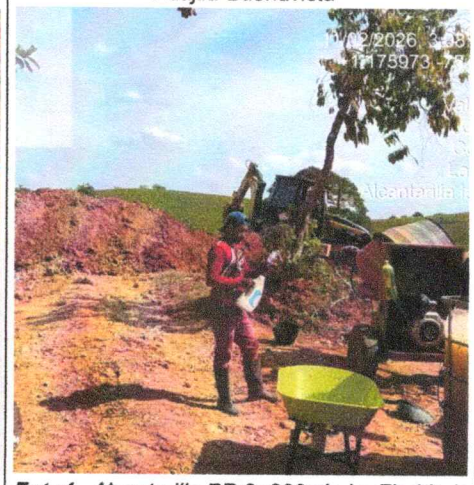


Foto4. *Alcantarilla PR 3+800 vía La Florida-la Paujila-Buenavista*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

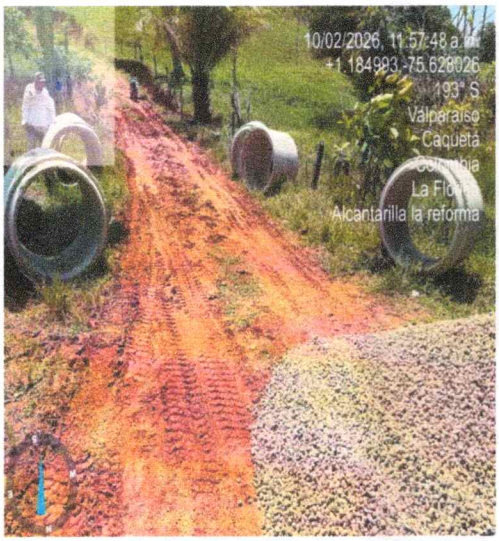


Foto1. *Alcantarilla PR 0+400 vía la Curvinata – la Reforma*

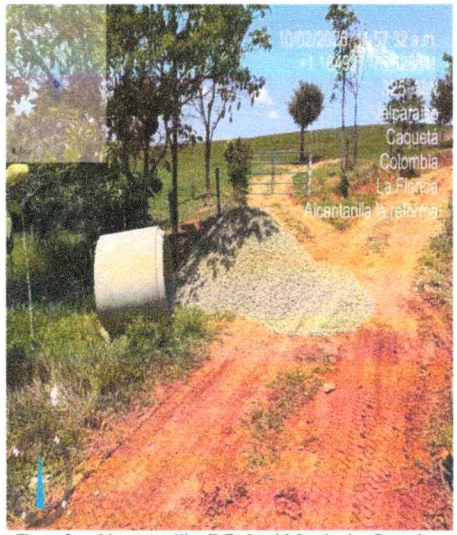


Foto2. *Alcantarilla PR 0+400 vía la Curvinata – la Reforma*



Foto3. *Alcantarilla PR 0+400 vía la Curvinata – la Reforma*

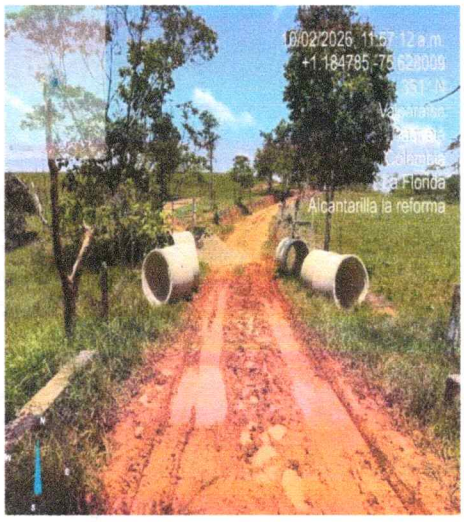


Foto4. *Alcantarilla PR 0+400 vía la Curvinata – la Reforma*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto1. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida-Curvinata*

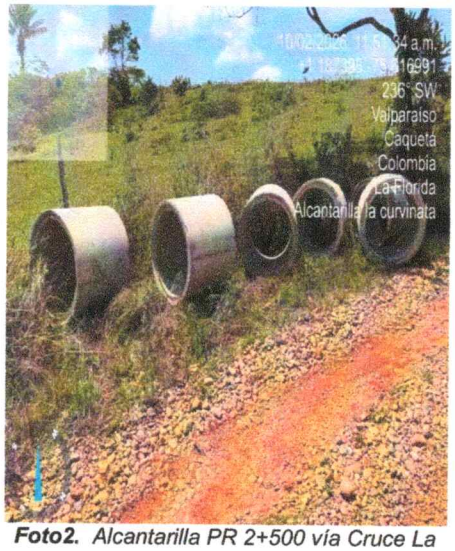


Foto2. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida-Curvinata*



Foto3. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida-Curvinata*

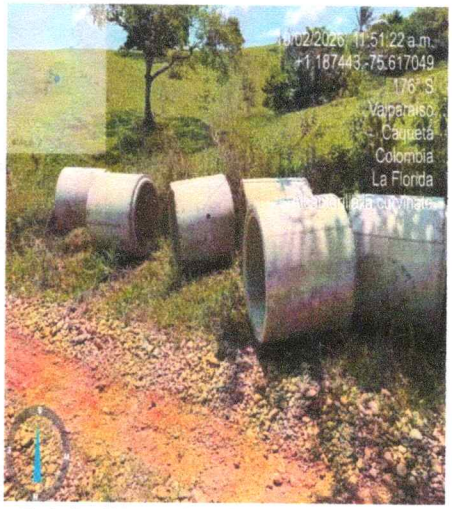


Foto4. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida-Curvinata*

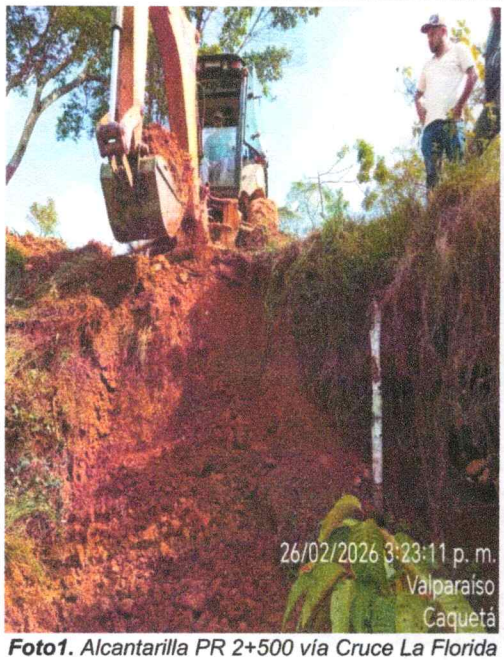


Foto1. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida – Curvinata*

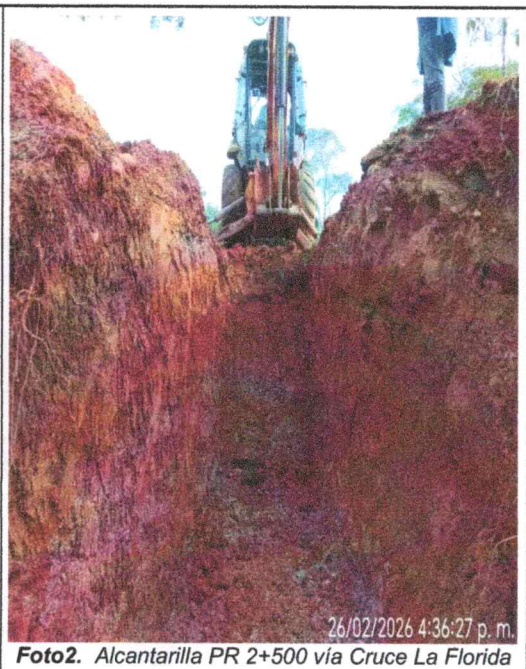


Foto2. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida – Curvinata*



Foto3. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida – Curvinata*

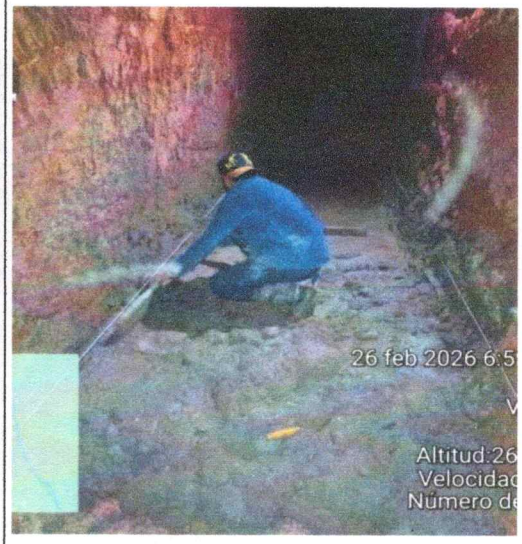


Foto4. *Alcantarilla PR 2+500 vía Cruce La Florida – Curvinata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto1. *Alcantarilla No. 01 San Pedro Medio.*



Foto2. *Alcantarilla No. 01 San Pedro Medio.*



Foto3. *Alcantarilla No. 01 San Pedro Medio*

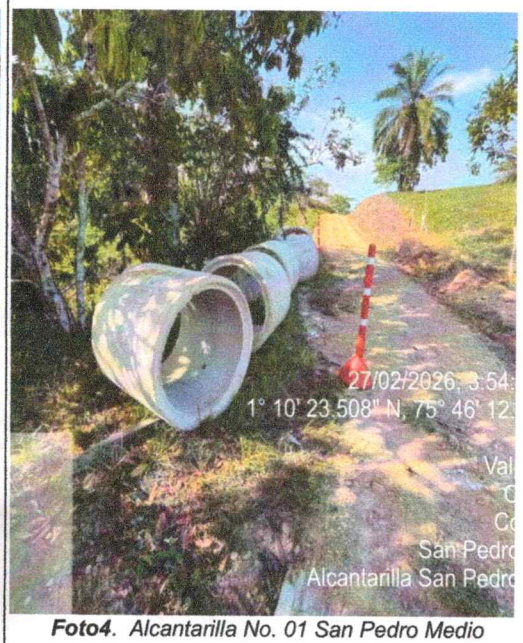


Foto4. *Alcantarilla No. 01 San Pedro Medio*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

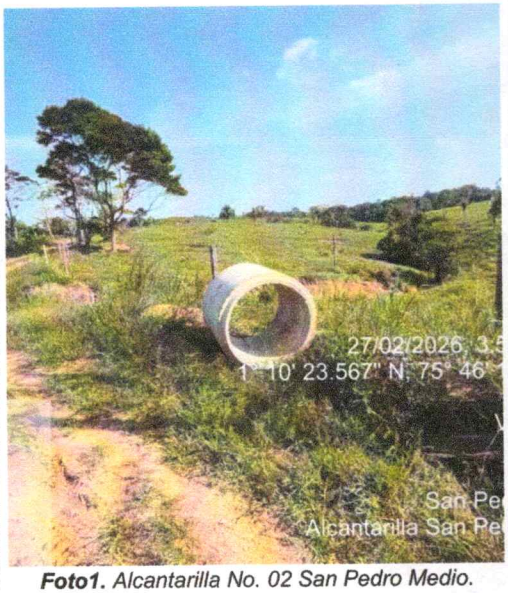


Foto1. *Alcantarilla No. 02 San Pedro Medio.*

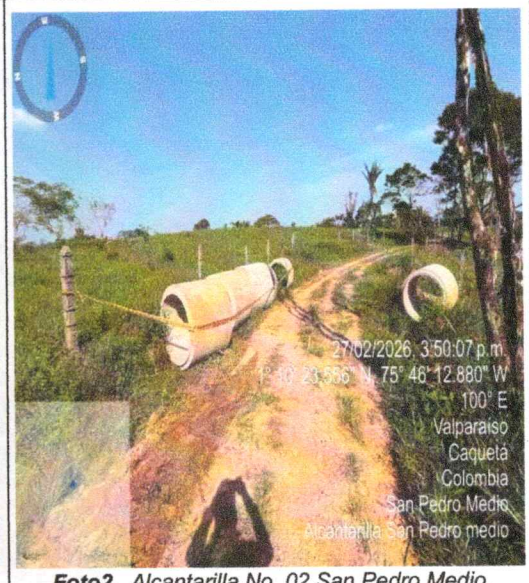


Foto2. *Alcantarilla No. 02 San Pedro Medio.*

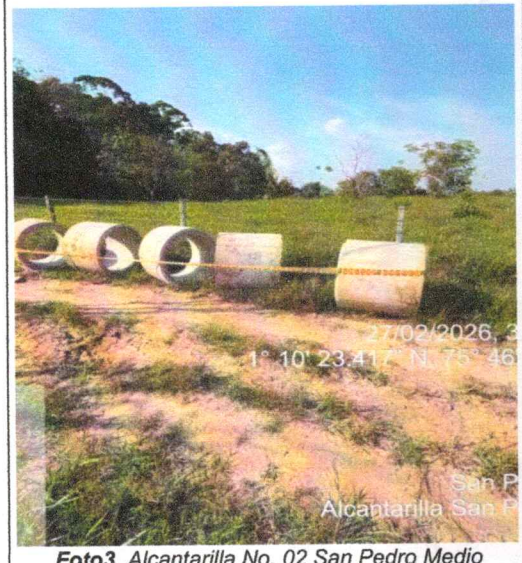


Foto3. *Alcantarilla No. 02 San Pedro Medio*



Foto4. *Alcantarilla No. 02 San Pedro Medio*

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto1. *Alcantarilla No. 03 San Pedro Medio.*



Foto2. *Alcantarilla No. 03 San Pedro Medio.*

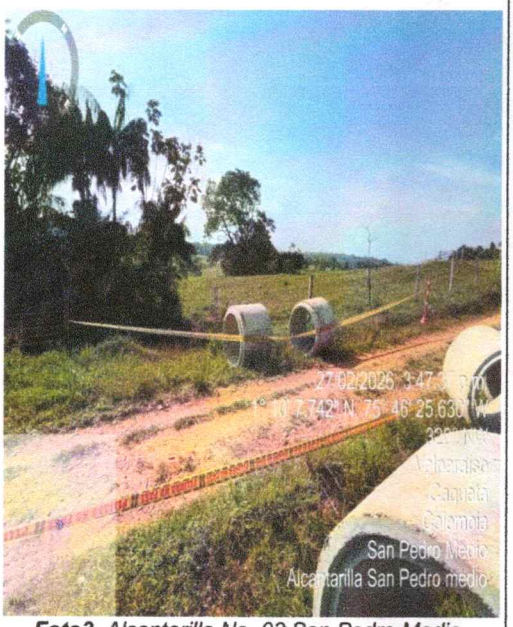


Foto3. *Alcantarilla No. 03 San Pedro Medio*



Foto4. *Alcantarilla No. 03 San Pedro Medio*

Visitas a campo realizadas por la supervisión Contrato 003-2025 – Valparaíso

REGISTRO FOTOGRÁFICO

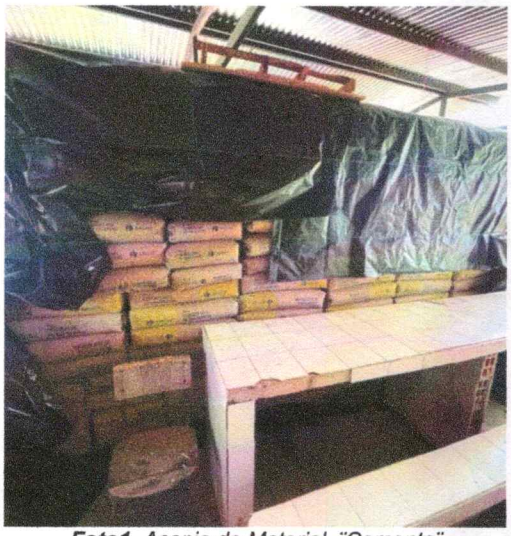


Foto1. *Acopio de Material, "Cemento"*

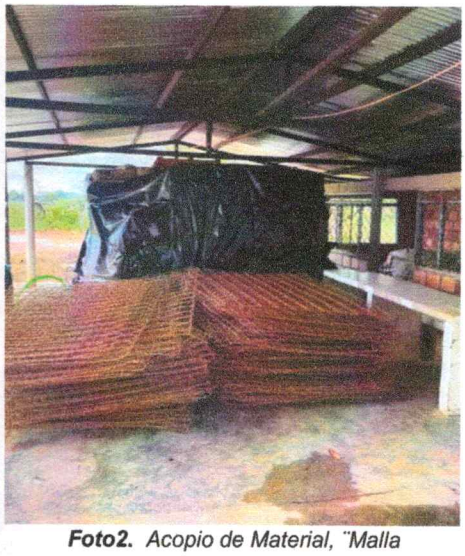


Foto2. *Acopio de Material, "Malla electrosoldada de 5 mm"*



Foto3. *Acopio de Perfiles Tipo C*

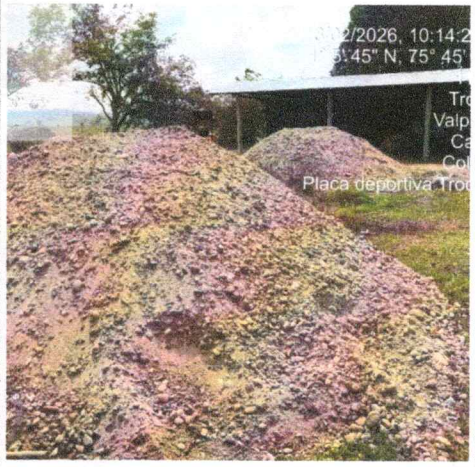


Foto4. *Acopio de Material pétreo.*



Foto1. *Descapote y conformación de terreno*

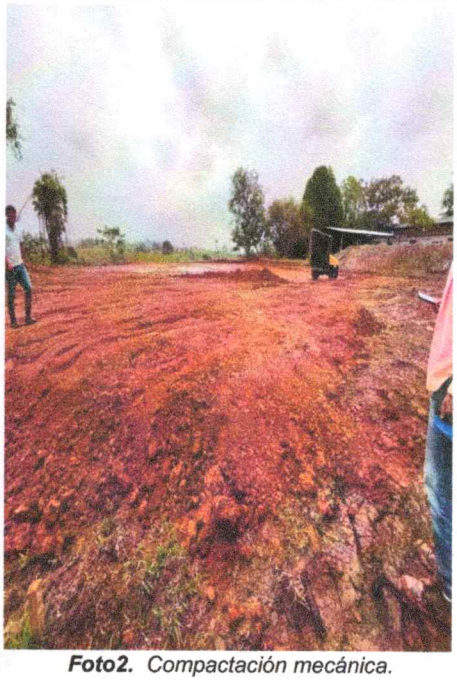


Foto2. *Compactación mecánica.*



Foto3. *Localización y Replanteo.*

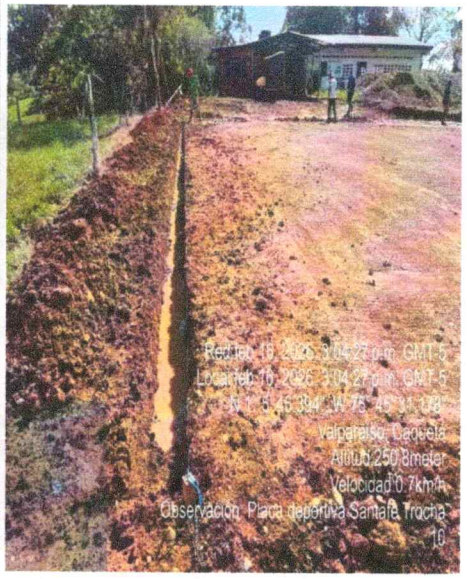


Foto4. Localización, trazado, replanteo y excavación para bordillo de confinamiento.



Foto1. *Localización, trazado, replanteo y excavación para bordillo de confinamiento.*

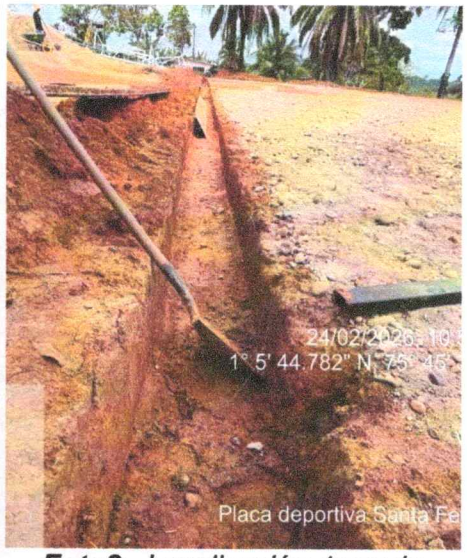


Foto2. *Localización, trazado, replanteo y excavación para bordillo de confinamiento.*



Foto3. *Relleno de material tipo base granular compactado.*



Foto4. *Relleno de material tipo base granular compactado.*

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTUADO AL CONTRATO 002 DE 2025 Y 003 DE 2025

Se ha realizado la verificación técnica y operativa al cumplimiento de los cronogramas de obra, planes de manejo de materiales y protocolos aprobados por la supervisión, efectuando el acompañamiento directo en los frentes de trabajo de la Placa Deportiva ubicada en la vereda Santafé - Trocha 10 y la alcantarilla en el PR 3+800 de la vía la Florida – La Paujila – Buenavista durante febrero de 2026.

En el sector de Santafé, se supervisaron las actividades de movimiento de tierras y nivelación mecánica mediante excavadora de orugas, asegurando el trazado perimetral y la excavación de vigas de cimentación.

Asimismo, en la alcantarilla del PR 3+800 se inspeccionó la excavación estructural, el armado de refuerzo en acero corrugado, la instalación de formaletas y el vaciado de concreto para el solado, logrando la culminación total de dicha estructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y garantizando la capacidad portante y el ajuste estricto a los diseños.

Igualmente, se realizó la ejecución de excavación mecánica e instalación de solado en la alcantarilla del PR 2+500 vía Cruce La Florida-Curvinata.

Paralelamente, se realizaron visitas de inspección a otros puntos críticos, evidenciando materiales en sitio en la alcantarilla del PR 0+400 vía la Curvinata – la Reforma y en las alcantarillas No. 01, 02 y 03 de San Pedro Medio.

Todo este proceso incluyó el control de acopios protegidos de la humedad y la validación de medidas de mitigación mediante motobombas y canales de desviación para el drenaje de lodos ante las condiciones climáticas, asegurando áreas de trabajo óptimas bajo un estricto seguimiento al uso de elementos de protección personal y señalización preventiva para minimizar impactos en la comunidad y el corredor vial.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante el periodo comprendido del 29 de enero al 28 de febrero del presente año se adelantó la siguiente gestión documental.

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO 002 DE 2025			
Fecha	**Oficio No**	**Asunto**	**Destinatario**
12/02/2026	INTEC-001-2026	Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra	Fwhitecs@gmail.com Arqfwhitej@gmail.com, asomunus@gmail.com, S-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
18/02/2026	INTEC-002-2026	Requerimiento al comunicado INTEC-001-2026 Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra	Fwhitecs@gmail.com Arqfwhitej@gmail.com, asomunus@gmail.com, S-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
24/02/2026	INTEC-003-2026	Segunda Reiteración al comunicado número INTEC-001-2026 y al comunicado número INTEC-002-2026 del contrato No. 002-2025	Fwhitecs@gmail.com Arqfwhitej@gmail.com, asomunus@gmail.com, S-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co
27/02/2026	INTEC-004-2026	Solicitud de documentación no allegada – inicio de actividades alcantarilla PR 2+500	Fwhitecs@gmail.com Arqfwhitej@gmail.com, asomunus@gmail.com, S-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO 002 DE 2025			
Fecha	**Oficio No**	**Asunto**	**Remitente**
19/02/2026	Vía Gmail	Notificación de cierre temporal de vía por ejecución de obra – Veredas La Florida y Curvinata, municipio de Valparaíso	CONARQING OBRAS Y MENTORIAS W SAS
22/02/2026	Vía Gmail	Invitación a reunión de socialización y conformación del comité de veeduría ciudadana	Wilmer Esneyder Olaya Cerquera
24/02/2026	Vía Gmail	Requerimiento al comunicado INTEC-001-2026 Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra	Planeación Valparaíso

CORRESPONDENCIA ENVIADA CONTRATO 003 DE 2025			
Fecha	**Oficio No**	**Asunto**	**Destinatario**
17/02/2026	INTEC-001-2026	Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de Ejecución de Obra	crhsointegralsas@gmail.com s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co, asomunus@gmail.com,
24/02/2026	INTEC-002-2026	Primera Reiteración al comunicado Numero INTEC-001-2026 Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales y Programación de E	crhsointegralsas@gmail.com s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co, asomunus@gmail.com,
25/02/2026	INTEC-003-2026	Requerimiento Plan de Choque – Avance de Obra Contrato No.003-2025	crhsointegralsas@gmail.com s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co, asomunus@gmail.com,

CORRESPONDENCIA RECIBIDA CONTRATO 003 DE 2025			
Fecha	**Oficio No**	**Asunto**	**Remitente**
26/02/2026	OFIC-CO-003-004-2026	Respuesta a oficio INTEC-001-2026 – Seguimiento al Cumplimiento de Obligaciones Contractuales Contrato No. 003-2025	crhsointegralsas@gmail.com
27/02/2026	FIC-CO-003-005-2026	Respuesta a oficio INTEC-003-2026 – Requerimiento Plan de Choque – Avance de Obra Contrato No.003-2025	crhsointegralsas@gmail.com

7. COMPONENTE DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ASST)

INGSTEC, continua con el diseño y estructuración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando, cumplimiento a la normatividad vigente.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN Y RESPONSABLE DEL SG-SST

La empresa continua en su función de seguimiento a la aplicación del SG-SST, INGSTEC, realizo la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el periodo del presente informe.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según los requerimientos y necesidades del proyecto para dar cumplimiento a los requisitos legales.

Las actividades referentes al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se documentan de acuerdo con los lineamientos del SG-SST, teniendo como base lo pertinente con la legislación vigente que aplica para garantizar cabal cumplimiento y velar por el bienestar de los trabajadores que pertenecen a la obra.

Accidentes o Incidentes Laborales

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero del año 2026 y el 28 de febrero de 2026, no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo como tampoco enfermedades de origen laboral.

Se puede evidenciar en la siguiente tabla que no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, los índices y promedios de ausentismo por tasa de accidentalidad; Accidente de Trabajo (A.T), Enfermedad Laboral (E.L) se ubican en 0%, Lo cual se indica que la gestión realizada por parte del profesional Seguridad y Salud en el Trabajo han sido efectivas.

Se reportan e investigan los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales		CUMPLE		N/A	OBSERVACIONES/EVIDENCIA									
		SI	NO											
				X	En el mes de enero y febrero, no se reportaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.									
NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MES												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/número de trabajadores en el mes)*100	0	0											
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100	0	0											
PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año)*100	0	0											
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	0	0											
INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z" / Promedio de trabajadores en el periodo "Z")*100,000	0	0											
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	(Número de días ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) *100	0	0											

Tabla No. 1. Accidentes e incidentes de Trabajo.

Ausentismo laboral

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero al 28 de febrero del 2026, los indicadores no arrojan índices de ausentismo laboral.

Políticas.

Las políticas de la empresa **INGSTEC**, van enfocadas a garantizar su misión como organización dedicada a la realización de obras de ingeniería civil, interventorías, asesorías jurídicas y financieras, teniendo además como objetivo principal la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, con compromiso ético, profesional y responsable, lo cual se enmarca en el cumplimiento de la normatividad establecida frente al derecho al trabajo digno y seguro, a la generación de oportunidades de desarrollo regional a través de su responsabilidad empresarial, es por ello que a continuación se enuncian cada una de ellas.

Políticas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

INGSTEC, la excelencia en el desempeño se alcanza con el liderazgo, satisfacción, necesidades y expectativas del cliente, compromiso de responsabilidad social, participación y competencia e idoneidad del personal, proveedores y subcontratistas confiables que suministren productos y servicios de excelente calidad, con el fin de alcanzar una mayor participación en el mercado, fidelización y confianza de nuestros clientes, logrando así el crecimiento y viabilidad económica del negocio. Es por eso que estamos comprometidos con la mejora continua del Sistema de Gestión Integral y el desempeño HSE, involucrando en este proceso a nuestros grupos de interés tales como proveedores, colaboradores, vecinos, visitantes, subcontratistas y entidades gubernamentales durante el desarrollo de los diferentes proyectos brindando y/o prestando servicios de Consultoría de Gestión.

Política de prevención y atención de consumo del alcohol y sustancias psicoactivas. INGSTEC, busca el mejoramiento y la calidad de vida de su región a través de la prestación de sus servicios de Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, por esto su especial interés, es brindar un ambiente de trabajo seguro para sus empleados, clientes, usuarios, contratistas y proveedores, y garantizar el desarrollo de las actividades de manera sobria y segura, con el fin de mantener estándares de seguridad, salud, proteger los bienes, el medio ambiente y la imagen corporativa frente a los clientes y la comunidad en general.

Política de seguridad vial.

Es compromiso de **INGSTEC**, establecer campañas de promoción y prevención de accidentes de tránsito, por ello todos los empleados, son responsables en la participación de las actividades que desarrolle la empresa con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de la compañía, contratistas, proveedores, comunidad en general y el medio ambiente.

Informe de Actividades S.S.T.

Para esto, La empresa continua en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST, divulga y mantiene las políticas y programas que garantizan un ambiente laboral sano y seguro que favorezca el bienestar físico, mental y social de la organización, a través de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando así el cumplimiento del marco legal vigente (1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019).

Frente a lo anterior expuesto frente al rol de la Seguridad Salud en el Trabajo, se llevan a cabo las siguientes actividades en el mes de enero y febrero de 2026:

Vinculación del personal mínimo requerido de la Supervisión.

Tal vinculación el personal mínimo requerido, vinculación que se efectuó luego de la administración del contrato aprobara las respectivas hojas de vida. Para presente periodo no tuvimos novedades con el personal mínimo requerido.

El personal vinculado a la empresa cuenta con:

Pago al Sistema de Seguridad Social.
Inducción y reinducción al personal vinculado
Comité del Vigía Ocupacional
Publicación de las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Seguridad social enero 2026

Representante legal.
HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	36730703	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	SANITAS	$218.900
Pensión	PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$18.300
CCF	COMFACA	$70.100
Sena		$35.100
ICBF		$52.600
	Total, final:	**$675.600**

Contador:
ARBOLEDA CASTRO CARLOS ANDRES

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	36730703	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	ASMET SALUD	$109.500
Pensión	COLPENSIONES	$140.100
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$61.000
CCF	COMFACA	$35.100
Sena		$17.600
ICBF		$26.300
	Total, final:	**$389.600**

Director:
JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	6001652291	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS	$219.900
Pensión	PORVENIR	$281.500
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$9.300
	Total, final:	**$510.700**

Residente:
JAIME HERMOSA SAAVEDRA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	4644468522	Empresa liquidadora: SOI
Salud	SANITAS	$246.300
Pensión	PORVENIR	$315.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$137.100
	Total, final:	**$698.600**

Inspector de SST
ANTURI MENA VALENTINA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	36730703	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	ASMET SALUD	$109.500
Pensión	PORVENIR	$140.100
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$61.000
CCF	COMFACA	$35.100
Sena		$17.600
ICBF		$26.300
	Total, final:	**$389.600**

Seguridad social febrero 2026

Representante legal.
HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	36730710	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	SANITAS	$218.900
Pensión	PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$18.300
CCF	COMFACA	$70.100
Sena		$35.100
ICBF		$52.600
	Total, final:	**$675.600**

Contador:
ARBOLEDA CASTRO CARLOS ANDRES

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	36730710	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	ASMET SALUD	$218.900
Pensión	COLPENSIONES	$280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$121.900
CCF	COMFACA	$70.100
Sena		$35.100
ICBF		$52.600
	Total, final:	**$778.800**

Director:
JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	6007324881	Empresa liquidadora: SOI
Salud	NUEVA EPS	$280.200
Pensión	PORVENIR	$218.900
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$9.200
	Total, final:	**$508.300**

Residente:
JAIME HERMOSA SAAVEDRA

Periodo pagado:	ENERO de 2026	
No. Planilla	4644469561	Empresa liquidadora: SOI
Salud	SANITAS	$246.300
Pensión	PORVENIR	$396.800
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$172.700
	Total, final:	$879.500

Inspector de SST
ANTURI MENA VALENTINA

Periodo pagado:	FEBRERO de 2026	
No. Planilla	36730710	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	ASMET SALUD	$218.900
Pensión	PORVENIR	$280.200
Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$121.900
CCF	COMFACA	$70.100
Sena		$35.100
ICBF		$52.600
	Total, final:	$778.800

8. REPORTE DEL AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 002 DE 2025 Y 003 DE 2025.

A la fecha de corte del mes de febrero de 2026, el avance general de los contratos se encuentra alineado con la programación establecida, destacando la transición exitosa de la fase de preliminares a la fase estructural. En el sector La Florida (Contrato 002-2025), se ha consolidado la infraestructura de soporte de la alcantarilla con el vaciado de solados y el armado del acero de refuerzo, quedando listo para la etapa de fundición de muros.

Por su parte, en el sector Santafé Trocha 10 (Contrato 003-2025), se ha logrado la estabilización del terreno y la conformación de la subrasante para la placa deportiva, garantizando la geometría del proyecto mediante excavaciones técnicas controladas. Es importante señalar que la gestión logística ha permitido mantener un flujo constante de materiales en obra (cemento, acero y agregados), asegurando la operatividad de las cuadrillas. A pesar de las precipitaciones registradas en la zona de Valparaíso, la implementación efectiva de sistemas de bombeo y drenaje ha mitigado retrasos, permitiendo reportar un estado de ejecución satisfactorio y una disposición de obra óptima para alcanzar los hitos programados para el siguiente mes."

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se concluye que la ejecución de los contratos 002 y 003 de 2025 avanza conforme a los requerimientos de diseño.
- Se evidencia un control riguroso en el almacenamiento de materiales, logrando preservar la integridad del cemento y el acero ante las condiciones de alta humedad de Valparaíso, lo cual asegura que la resistencia de las estructuras finales no se vea comprometida.
- Debido al avance en las excavaciones y el flujo de maquinaria, se sugiere mantener y reforzar la señalización preventiva y el cerramiento de áreas críticas, garantizando la seguridad de la comunidad que transita por los corredores intervenidos.
- Continuar con el manejo adecuado de los sobrantes de excavación y el control de sedimentos, asegurando que las obras de drenaje no afecten los predios colindantes ni las fuentes hídricas cercanas durante la etapa de construcción.

Atentamente,

ANGIE VIVIANA HERNANDEZ NALVARADO
1.006.487.317 de Florencia
Representante legal
INGSTEC S.A.S.

YOALBER DURÁN CÁRDENAS
CONTADOR PÚBLICO
TP-295077 -T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA QUE:

La Empresa **INGSTEC S.A.S**, identificada con Nit. **901.108.395-8** en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50, Ley 789 de 2002, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de Aportes Al Sistema Integral De Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, y Nomina), y se encuentra exonerada de aportes a parafiscales según el articulo 114-1 del estatuto tributario.

La presente certificación se expide el diecisiete (17) del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

Yoalber Durán Cárdenas
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 295077-T

YOALBER DURÁN CÁRDENAS
CONTADOR PÚBLICO
TP-295077 -T

Oficina 202: CLL 13 N° 11-48 Centro Cel. 3107731941
e-mail: yoalberduranc25@gmail.com

"Profesionales construyendo éxito empresarial"

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BB0690A6B8F774B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOALBER DURAN CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1061776999 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 295077-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



295077-T

YOALBER
DURAN CARDENAS
C.C. 1061776999
RES. INSCRIPCION 757 DEL 29/03/2022
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318068 **339929**

229354 / 05/22

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.061.776.999

Apellidos
DURAN CARDENAS

Nombres
YOALBER

Nacionalidad
COL

Estatura
1.69

Sexo
M

Fecha de nacimiento
25 ENE 1995


G.S.
O+

Lugar de nacimiento
FLORENCIA (CAQUETA)

Fecha y lugar de expedición
28 ENE 2013, POPAYAN

Firma

Fecha de expiración
02 SEPT 2034


.CO

053854443

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL053854443611001<<<<<<<<<<
9501256M3409028COL1061776999<6
DURAN<CARDENAS<<YOALBER<<<<<<<

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901108395	8	INGSTEC SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 23 4B#80 B LA LIBERTAD		3112647113			INGSTECSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36730703	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.133.100	16.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36730703	2026-02-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1006530468	ANTURI MENA VALENTINA	1.750.905	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	18.700	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	116.727	14.600	COMFACA-CCF13	116.727	4.700	116.727	8.200	0,06960	116.727	2.400	3.600	0	0	01	0	52.300	N	5711001
2	CC 1117485300	ARROLEDA CASTRO CARLOS ANDRES	1.750.905	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	875.453	140.100	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	875.453	109.500	COMFACA-CCF13	875.453	35.100	875.453	61.000	0,06960	875.453	17.600	26.300	0	0	01	0	389.600	N	1970002
3	CC 1006487317	HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFACA-CCF13	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901108395	8	INGSTEC SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 23 4B#80 B LA LIBERTAD		3112647113			INGSTECSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36730703	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.133.100	16.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36730703	2026-02-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.743.085	2.743.085	2.743.085	2.743.085	2.743.085

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	439.000	0	6.300	0	445.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	298.900	0	4.300	0	303.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	140.100	0	2.000	0	142.100
EPS(Administradoras: 2)				3	343.000	0	4.900	0	347.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	124.100	0	1.800	0	125.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	3.100	0	222.000
ARP(Administradoras: 1)				3	87.500	0	1.300	0	88.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	87.500	0	1.300	0	88.800
CCF(Administradoras: 1)				3	109.900	0	1.600	0	111.500
COMFACA	CCF13	891190047	2	3	109.900	0	1.600	0	111.500
SENA(Administradoras: 1)				3	55.100	0	800	0	55.900
SENA	PASENA	899999034	1	3	55.100	0	800	0	55.900
ICBF(Administradoras: 1)				3	82.500	0	1.200	0	83.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	82.500	0	1.200	0	83.700
Gran Total					1.117.000	0	16.100	0	1.133.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 7692121

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	JAIME HERMOSA SAAVEDRA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	7692121
Ciudad/Municipio	FLORENCIA	Departamento	CAQUETA
Dirección	CARRERA 12 A 2 SUR 13	Teléfono	1234567
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otros trabajos de edición.
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**4644468522**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	enero / 2026
Dias de Mora	26	Fecha Pago	2026/03/03
Número Autorización	9995909916		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JAIME	Apellidos	HERMOSA SAAVEDRA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	7692121
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CAQUETA	Municipio	FLORENCIA
Salario Básico	$ 2.480.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-21									

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.969.634
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 315.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 315.200**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.969.634
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 246.300
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 246.300**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.969.634
Centro de Trabajo	7692121	Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 137.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 698.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16185320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KRA 2 16 30 MIRAFLORES	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6001652291	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		58201581

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 280.200	$ 1.300	$ 281.500
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 1.300**	**$ 281.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 218.900	$ 1.000	$ 0	$ 219.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 219.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:										**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16185320	GOMEZ ROA JAIRO ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	16185320	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 510.700

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901108395	8	INGSTEC SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 23 4B#80 B LA LIBERTAD		3112647113			INGSTECSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36730710	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.232.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36730710	2026-03-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1006530468	ANTURI MENA VALENTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	218.900	COMFACA-CCF13	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	778.800	N	5711001
2	CC 1117485300	ARBOLEDA CASTRO CARLOS ANDRES	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	218.900	COMFACA-CCF13	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	778.800	N	1970002
3	CC 1006487317	HERNANDEZ ALVARADO ANGIE VIVIANA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	COMFACA-CCF13	1.750.905	70.100	1.750.905	18.300	0,01044	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	675.200	N	4429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901108395	8	INGSTEC SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 23 4B#80 B LA LIBERTAD		3112647113			INGSTECSAS@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36730710	E	2026-03-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.232.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	36730710	2026-03-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.252.715	5.252.715	5.252.715	5.252.715	5.252.715

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	840.600	0	0	0	840.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	560.400	0	0	0	560.400
EPS(Administradoras: 2)				3	656.700	0	0	0	656.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	437.800	0	0	0	437.800
ARP(Administradoras: 1)				3	262.100	0	0	0	262.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	262.100	0	0	0	262.100
CCF(Administradoras: 1)				3	210.300	0	0	0	210.300
COMFACA	CCF13	891190047	2	3	210.300	0	0	0	210.300
SENA(Administradoras: 1)				3	105.300	0	0	0	105.300
SENA	PASENA	899999034	1	3	105.300	0	0	0	105.300
ICBF(Administradoras: 1)				3	157.800	0	0	0	157.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	3	157.800	0	0	0	157.800
Gran Total					2.232.800	0	0	0	2.232.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7692121
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME HERMOSA SAAVEDRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 A 2 SUR 13	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4644469561**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995835863

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 396.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 396.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 310.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 310.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 172.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 172.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 879.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 879.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16185320
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	KRA 2 16 30 MIRAFLORES	TELÉFONO:	4444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6007324881**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		87087070

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0		$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**		**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0		$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:										**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16185320	GOMEZ ROA JAIRO ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	16185320	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

INGSTEC SAS
NIT 901.108.395-8
CALLE 23 4B80 BRR LA LIBERTAD
Tel: (608) 3118973228
Florencia - Colombia
jholarpa90@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 546

Señores	MUNICIPIO DE VALPARAISO		
NIT	800.050.407-1	**Teléfono**	(000) 3181557065
Dirección	CL 11 3 50 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Valparaíso - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/03/2026, 15:19
Expedición	25/03/2026, 15:27
Vencimiento	24/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRIMER PAGO SEGUN ACTA No 1, DEL CONTRATO CPS-054-2026, QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIADOS CON RECURSOS EMPRESTITO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.00	17,815,428.33

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones ochocientos quince mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por $ 17,815,428.33

Total Bruto	14,970,107.84
IVA 19%	2,844,320.49
Total a Pagar	17,815,428.33

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106367367 aprobado en 20260224 prefijo FE desde el número 545 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería Tarifa
CUFE: f9011a6c43a222baf985565c860b4c4775db0fcab9c44653f87b756408d63bdfc1e94275dd968ccb6c36442047a6ced7
