

CONSTRUCTORA GED S.A.S.
CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricación de productos metálicos para uso estructural • Construcción y remodelación de edificios residenciales y no residenciales • Construcción de obras de ingeniería civil.

INFORME ENTREGA DE ACTIVIDADES CORTE NUMERO 4

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C

BOGOTA D.C, 18 MARZO DEL 2026

Carrera 25 No. 7-68 Sur, Barrio la Fraguita, Bogotá D.C. – Colombia
+57 (1) 391 1755 • Celulares: 313 208 1584 - 320 943 8792
edisondiaz@constructoraged.com - licitaciones@constructoraged.com
www.constructoraged.com



INTRODUCCION

La SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. contrato con **CONSTRUCTORA GED S.A.S** el suministro e instalación de carpintería metálica de las sedes de la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. El valor de cada bien o servicio ofertado es a todo costo, incluye: Suministro e Instalación, desmonte de lo existente y su correcto funcionamiento, mano de obra, transporte; cuyas actividades realizadas quedan evidenciadas como se muestra a continuación.

CAPÍTULO 1.

PERSONAL

Para el desarrollo de las actividades de suministro e instalación de carpintería metálica en las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., CONSTRUCTORA GED S.A.S. dispuso del personal técnico y operativo idóneo, cumpliendo con los requisitos legales y de seguridad establecidos.

El personal asignado contó con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), cuyas planillas de pago se anexan al presente informe.

Durante la ejecución de las actividades, el personal utilizó de manera permanente los Elementos de Protección Personal (EPP) correspondientes, tales como casco, guantes, botas de seguridad, gafas de protección y demás elementos requeridos según la labor desempeñada.

Así mismo, se realizó la debida señalización de las áreas de trabajo con el fin de garantizar la seguridad del personal y de terceros dentro de las instalaciones intervenidas.

Se anexa registro fotográfico del personal en obra, formatos de entrega de EPP y evidencia del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Anexos de este capítulo:

- **Planillas de pago de seguridad social**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pág. 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900373167	CONSTRUCTORA G E D SAS	CR 25 T 68 SUR BRR LA FRAGUITA	3227888857	gestion@constructoraged.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	ESTADO	DEPARTAMENTO	CIUDAD - MUNICIPIO	
UNICA	A – Aportes Ley 590/ 2000			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	N

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASISTIDA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD VSP
		2006419	12/05/2026	1	0
PERIODO - SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$6.345.810	$7.975.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																						PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Extranjero no obligado a cotizar a pensiones	Colombiano en el exterior	Actividad de alto riesgo pensional	Tipo de Mora	Variación Transitoria Salario	Correcciones	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	Días COT	IBC APS	Días	Cotización	Tarifa Aportes	Aporte Voluntario	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Días COT	IBC APS	Días	Cotización	Días COT	IBC ARL	Clase	Tarifa	Cotización	Tarifa CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019000000	[redacted]	1	0	0																					30	1.750.905	12	210.108					30	1.750.905	12	210.108	30	1.750.905	III	0,522	9.144	CCF004	1.750.905	30	52.527	0	0	0	0	0
2	CC 1019000001	[redacted]	1	0	0																					30	1.750.905	12	210.108					30	1.750.905	12	210.108	30	1.750.905	III	0,522	9.144	CCF004	1.750.905	30	52.527	0	0	0	0	0
3	CC 1019000002	[redacted]	1	0	0																					30	2.067.000	12	248.040					30	2.067.000	12	248.040	30	2.067.000	III	0,522	10.795	CCF004	2.067.000	30	62.010	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CAPÍTULO 2.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARCHIVO

NP 19. Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electrostática tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diámetro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre sí;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	13 M2

ANTES



DESPUES

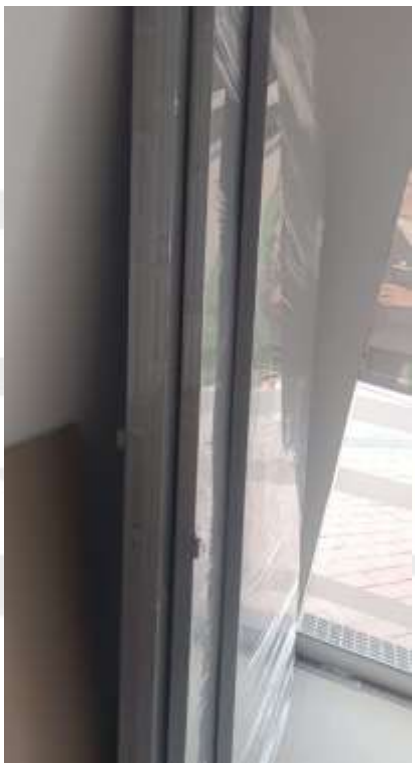


ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE AMERICAS

NP 20. Suministro e instalación de ventana en persiana metálica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática Incluye todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalación y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra	8 unidades

ANTES	DESPUES
	

NP 21. Suministro e instalación de marco y puerta tipo panel en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostática Incluye chapa de seguridad, pasador bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, ángulos y platinas según el caso para su correcta instalación y función	9.4 M2

ANTES	**DESPUES**
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE CALLE 13

NP 22. Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventanería de fachadas. (incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el pegue.)	4.85 M2

ANTES	**DESPUES**
	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN SUPER CADE SUBA

NP 24. Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul océano con película Frost para ventanería de fachadas a instalar. (incluye transporte y material para el pegue).	13.4 M2

ANTES	DESPUES
	

CAPÍTULO 3.

CORTE DE OBRA

En el presente capítulo se relaciona corte de obra, indicando el correspondiente al presente corte.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE CORTE No.4
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CODIGO No. 4233890-781-2025
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE LAS SEDES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	411.448.900,00	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO		17/07/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	274.299.000,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		29/07/2025
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$	137.149.900,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		29/07/2025
VALOR PAGADO DEL CONTRATO	$	336.849.689,00	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		29/07/2025
SALDO TOTAL DEL CONTRATO	$	74.598.811,00	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO		28/12/2025

Surtida las revisión de los elementos suministrados a través del contrato 781-2025, la supervisión del contrato aprueba el siguiente corte a 17/03/2026 para el contrato:

CORTE TOTAL APROBADO AL 17/03/2026	$	22.945.345,00
DESCUENTO PAGO No.1	$	-
TOTAL A PAGAR ESTE CORTE	$	22.945.345,00
I. ZONA SUR	$	8.258.600,00
1. SuperCADE Américas	$	8.258.600,00
2. Centro de Encuentro Bosa	$	-
3. SuperCADE Bosa	$	-
4. Centro de Encuentro Yomasa	$	-
5. CADE La Victoria	$	-
6. SuperCADE 20 de Julio	$	-
7. Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe	$	-
II. ZONA NORTE	$	3.576.545,00
8. CADE La Gaitana	$	-
9. SuperCADE Suba	$	2.710.820,00
10. SuperCADE Engativá	$	-
11. SuperCADE CAD	$	-
12. CADE Servita	$	-
14. SUPERCADE Calle 13	$	865.725,00
III. ZONA CENTRO	$	10.210.200,00
13. Archivo de Bogotá	$	10.210.200,00
14. Manzana Lleraro	$	-

SUPER CADE AMERICAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 20	Suministro e instalación de ventana en persiana metalica en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye todos los accesorios de anclaje, pines, angulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, transporte al sitio, equipos y mano de obra	8	UNIDAD	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200	$ 2.665.600
NP 21	Suministro e instalación de marco y puerta tipo panel en lamina cold rolled calibre 18, con pintura electrostatica Incluye chapa de seguridad, pasador bisagras, manijas y todos los accesorios de anclaje, pines, angulos y platinas según el caso para su correcta instalacion y funcionamiento, refuerzos internos cold rolled calibre 18	9.4	M2	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	$ 5.593.000
TOTAL						$	8.258.600,00

SUPER CADE SUBA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 24	Suministro e instalación de vidrio laminado 4 + 4 color azul oceano con pelicula frost para ventaneria de fachadas a instalar (incluye transporte y material para el pegue).	13.4	M2	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300	$ 2.710.820
TOTAL						$	2.710.820,00

SUPERCADE CALLE 13							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 22	Suministro e instalación de vidrio incoloro templado en 6 mm para ventaneria de fachadas .(incluye desmonte del vidrio existente, transporte del nuevo vidrio y material para el peque.)	4,85	M2	$ 150.000	$ 28.500,00	$ 178.500,00	$ 865.725
TOTAL						$	865.725,00

ARCHIVO DE BOGOTA							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA	VALOR DEL IVA	VR. SUBTOTAL OFERTADO CON (IVA)	VR. TOTAL CON (IVA)
NP 19	Suministro e instalación de barandilla metálica DOBLE pintura electróstatica tipo cofrado, color a escoger en acabado semimate, con bastidor (pasamanos) sencillo de diametro de 2" calibre 16, remate en curva uniendo los dos sentidos de la baranda, formada por montantes verticales provistos de remate superior inclinado EN 2 DIRECCIONES, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de platina rectangular de 8 mm la cual va doble para empotrar soporte de pasamanos construido en platina diseño igual a las barandas existentes con una separación de 120 cm entre si;, con su base respectiva para facilitar el anclaje a piso, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. (Incluye transporte al sitio, todos los accesorios, escudos, equipos y mano de obra, necesarios para su instalación). Diseño según plano entregado	13	M2	$ 660.000,00	$ 125.400,00	$ 785.400,00	$ 10.210.200
TOTAL						$	10.210.200,00

MAURO PALTA CERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISO DEL CONTRATO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS

ELABORÓ: JAHIR ERNESTO GUERRERO ROZO - APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No. 4233000-781-2025
REVISÓ:

Los valores aquí relacionados corresponden a las actividades efectivamente ejecutadas y debidamente soportadas en el presente informe.

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA GED SAS
