5 Noviembre 2020
Dia - Soleado
Personal: 3 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continuan demoliciones faltantes al interior de las aulas sobre piso
- Se continua con la mamposteria estructural
- se continua con el trasiego de material.

6 Noviembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltantes al interior de las aulas sobre piso
- Se continua con la mamposteria estructural
- Se continua con el trasiego de material
- Se funden lozas al interior de los salones para mejoramiento

7 Noviembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltantes de las aulas al interior

Escaneado con CamScanner

sobre piso
- se continua con la mamposteria estructural
- se continua con el trasiego de material
- se funden lozas al interior de los salones para mejoramiento.

9 Noviembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 2 oficiales, 8 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso
- se continua con la mamposteria estructural
- Se continua con el trasiego de material
- Se funden lozas al interior de los salones para mejoramient

10 Noviembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 2 oficiales, 8 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso
- Se continua con la mamposteria estructural.
- Se funden lozas al interior de los salones para mejoramient

Escaneado con CamScanner

11 Noviembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso
- Se continua con la mampostería estructural
- Se funden losas al interior de los salones para mejoramiento

12 Noviembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso.
- Se continua con la mampostería estructural.
- Se funden losas al interior de los salones para mejoramiento.
- Se continua la fundición del anden Bloque C.

13 Noviembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente

Escaneado con CamScanner

- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso.
- Se continua con la mampostería estructural.
- Se Funden losas al interior de los salones para mejoramiento.
- Se continua la Fundición del anden Bloque C.

14 Noviembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 6 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso
- Se continua con la mampostería estructural.
- Se Funden losas al interior de los salones para mejoramiento.
- Se continua la Fundición del anden Bloque C.

19 Noviembre 2020
Día: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente.
- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso.

Escaneado con CamScanner

- Se continua con la mamposteria estructural
- Se continua con la fundición de lozas para el mejoramiento al interior de los salones
- Se continua la fundición del anden Bloque C.

18 Noviembre 2020
Dia: Soleado
Personal: 2 oficiales, 7 ayudantes, 1 siso, 1 interventor, 1 residente
- Se continua demolición faltante de las aulas al interior sobre piso
- Se continua con la mamposteria estructural.
- Se continua con la fundición de lozas para el mejoramiento al interior de los salones.
- Se continua la fundición del anden Bloque C

Escaneado con CamScanner

JUANA ESCOBAR - SEDE B - SAN LUIS.

15-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, CONTINUA ACTIVIDAD DE EMBALDOSADO EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1, SE HACE REMATE DE PAÑETE DONDE SE INSTALO TUBERIA SANITARIA DE LA BATERIA SANITARIA DEL SOTANO, DURANTE LA JORNADA LABORAL, HACE PRESENCIA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LAS OBRAS EN ESTE FRENTE, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EL AUMENTO DE PERSONAL EN ESTE FRENTE PARA NO GENERAR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

1 Diego Cetina

16-10-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, HUBO SUMINISTRO DE BALDOSIN BH-5, 2 METROS DE MIXTO, CONTINUA ACTIVIDAD DE EMBALDOSADO EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1, SE HACE LA INSTALACIÓN DE WIN EN ALUMINIO, SE HACE ASEO GENERAL AL FRENTE DE OBRA, 1 INSP. DE INTER, 1 PROF. SI

Diego Cetina

17-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROF. SISO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 INSP. DE INTER., SE INICIAN ACTIVIDADES DE EMBALDOSADO EN BATERIA SANITARIA DEL SOTANO, SE RECUERDA AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE INCLUIR MAS PERSONAL AL FRENTE DE OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS EN ESTE FRENTE DE OBRA.

1 Diego Cetina

19-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDAD DE EMBALDOSADO EN BATERIA SANITARIA DEL

SOTANO, SE HACE RECOMENDACIÓN AL CONTRATISTA PARA HACER INCREMENTO DE PERSONAL AL FRENTE DE OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS EN ESTE FRENTE DE OBRA.

Diego Cetina

20-10-20

DIA SOLEADO. PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTES CONTINUA ACTIVIDAD DE CUCHARE EN BATERIA SANITARIA DEL SOTANO, SE HACE INSTALACIÓN DE WIN EN LOS MUROS DIVISORIOS DE LA BATERIA SANITARIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Diego Cetina.

21-10-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES, HUBO SUMINISTRO DE PERFILERIA PARA INSTALACION DE TECHO EN PVC, CONTINUA ACTIVIDAD DE CUCHARE EN BATERIA SANITARIA DEL SOTANO E INICIAL ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE PERFILERIA PARA TECHO EN PVC EN LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, SE RECOMIENDA AL PERSONAL DE OBRA EL USO DEL TAPABOCA ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Diego Cetina

22-10-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES, 1 INSTALADOR DE TECHO PVC, 1 PLOMERO, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, INICIAN ACTIVIDADES DE CUCHARE EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, SE REALIZA ASEO GENERAL A LA OBRA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PERFILERIA EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 2.

Diego Cetina

23-10-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Profesional SISO, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 instalador de Techo PVC, 1 Plomero, Continua Actividad de Enchape en Piso 2 y Sotano, inician Actividades de Instalación de Piso en Baldosin en Baño del Piso 1, Hace Presencia la Supervisión por parte de la Secretaria de Educación para Verificar el Estado de las Obras.

3P. 2P. Diego Cetina.

24-10-20

Dia Soleado, Personal, en Obra 1 Profesional SISO, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoria, 3 Oficiales, 3 Ayudantes, Continuan de Instalación de Piso en Bateria Sanitaria del Piso 1, Instalación de Enchape en Bateria Sanitaria del Piso 2, Se Hace Observación para Que Se Ajuste la Tuberia Sanitaria donde van Instalados los Sanitarios para Evitar Futuros Inconvenientes de Humedad.

2P. Diego Cetina 3P.

26-10-20

Dia Soleado Personal en Obra 1 Profesional SISO, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 3 Oficiales, 2 Ayudantes, Continua Actividad de Enchape en la Bateria Sanitaria del Piso 2, Se Hace Instalación de Cenefa en la Bateria Sanitaria del Piso 1, Se Hace Instalación de Piso en Baldosin en Bateria Sanitaria del Sotano, 1 Inspector de Interventoria.

Diego Cetina 3P. 2P.

27-10-20

Dia Soleado, Personal en Obra, 1 Profesional SISO, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Interventoria Se inicia Actividad de Malla Loza en Granito Alcazar

En la Batería Sanitaria del Piso 1, se inicia instalación de Cerámica en la Batería Sanitaria del Sótano, continua Actividad de Enchape en Piso 2, se Hace instalación de Win en Aluminio en Batería Sanitaria del Piso 2.

Jf. Jf" Diego Petina.

28-10-20

Día Sábado, Personal en Obra, 1 Profesional Siso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 3 Oficiales, 4 Ayudantes, continua Actividad de instalación de Media Caña en Granito en la Batería Sanitaria del Piso 1, Continua Actividad de Enchape en Batería Sanitaria del Piso 2. y en Sótano.

Diego Petina Jf" Jf.

29-10-20

Día Sábado, Personal en Obra, 1 Profesional Siso, Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Inspectora de Interventoría, 3 Oficiales, 3 Ayudantes, se Hace instalación de Media Caña en Batería Sanitaria del ~~Piso~~ Sótano, Continua Actividad de Enchape en Batería Sanitaria del Piso 2.

Jf. Diego Petina Jf"

30-10-20

Día Sábado, Personal en Obra, 1 Profesional Siso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 3 Oficiales, 3 Ayudantes, 1 Inspectora de Interventoría, Continua instalación de Media Caña en Batería Sanitaria del Sótano, Continua instalación de Cerámica en Sótano y Continua la Actividad de Enchape en Batería Sanitaria del Piso 2, Hace Presencia la Supervisión del Contrato para Verificar el Estado de las Obras, se Solicita el Cambio de unas Baldosas.

DE PISO UBICADOS EN LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, PISO 1, SOTANO Y CUARTO DE ASEO.

Diego Cetina

31-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 3 OFICIALES, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDAD DE ENCHAPE EN PISO 2, REMATE DE ENCHAPE EN BATERIA SANITARIA DEL SOTANO

Diego Cetina

03-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 2 OFICIALES REALIZANDO CORRECCIONES DE ENCHAPE EN EL PISO 2, 1 OFICIAL + AYUDANTE REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE [illegible] EN GRANITO EN LA BATERIA SANITARIA DEL SOTANO, SE ADELANTA ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO EN LAS BATERIAS SANITARIAS

Diego Cetina

04-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 3 OFICIALES, REALIZANDO ACTIVIDAD DE ENCHAPE, 1 AYUDANTE ADELANTANDO ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO EN EL BAÑO DEL SOTANO.

Diego Cetina.

05-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL + AYUDANTE REALIZANDO ACTIVIDADES DE EMBOQUILLADO EN LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, 1 OFICIAL HACIENDO LA

INSTALACION DE ~~MESON~~ EN LA PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS DIVISORIOS DE LOS BATERIAS SANITARIAS, 1 AYUDANTE AYUDANDO EN LA ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO EN LA BATERIA SANITARIA DEL SOTANO.

3ª. 2ª. Diego Cetina

06-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE REALIZA FUNDIDA DE MESON EN CONCRETO DE LA BATERIA SANITARIA DEL SOTANO, CONTINUA ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO EN LA BATERIA SANITARIA DEL SOTANO.

3ª. 2ª. Diego Cetina.

07-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 2 OFICIALES REALIZANDO INTERVENCIÓN EN BAÑO DE PROFESORES, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA HABILITAR UN BAÑO PROVISIONAL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.

2ª Diego Cetina 3ª

09-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE HACE INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSIN EN BAÑO DE PROFESORES, SE HACE ENCHAPADO DE MESON EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 2.

1 Diego Cetina 4ª 3ª

10-11-20

Dia Soleado, Personal en Obra 1 Residente de Intervencion, 1 Residente de Obra, 1 Profesional Sisso, 1 Inspector de Intervencion, 1 Oficial, 2 Ayudantes, se Funde el Muro en Concreto de la Bateria Sanitaria del Piso 2, se Hacen Embaquillados de Enchape en Bateria Sanitaria del Sotano y se Preparan Superficies de los Pozos para Posibles Estucar.

3ª Diego Cetina 2-3

11-11-20

Dia Nublado, Personal en Obra, 1 Profesional Sisso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervencion, 1 Maestro, 2 Oficiales, Continua Actividad de Embaquillado en Enchape del Sotano, se Hacen Remates en el Piso del Baño del Sotano, se Cozo con Concreto la Tapa de Inspeccion del Baño del Sotano, Inician Actividades de Estucado en Pozos del Baño del Sotano.

Diego Cetina 3ª, 2ª

12-11-20

Dia Lluvioso, Personal en Obra, 1 Profesional Sisso, 1 Residente de Intervencion, 1 Residente de Obra, 1 Maestro, 2 Oficiales, se Inician Actividades de Estucado en Baño del Piso 2, se Hace Instalacion de Wc en la Parte Superior de los Muros Divisorios de las Baterias Sanitarias, Continua Actividad de Embaquillado en la Bateria Sanitaria del Sotano.

3ª, 2ª Diego Cetina.

13-11-20

Dia Lluvioso, Personal en Obra, 1 Profesional Sisso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Intervencion, 1 Oficial, 2 Ayudantes, se Hace Desencofrando del Muro de la Bateria Sanitaria

DEL PISO 2, SE HACE PULIDA DE PISO EN BATERIA SANITARIA DEL PISO 1, SE HACE INSTALACIÓN DE DRYWALL EN BAJANTE DE TUBERIA SANITARIA DEL PISO 2 QUE PASA SOBRE EL TECHO DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 1, CONTINUA LA ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO.

Z—3+. Diego Cetina Zy"

14-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE INICIA ACTIVIDAD DE PULIDA DE PISO EN LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, SE INICIA CON EL EMBOQUILLADO DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2.

Diego Cetina Z—3+. Zy"

17-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, SE INICIA INSTALACIÓN DE TECHO EN PVC DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, SE INICIA ACTIVIDAD DE ESTUCADO EN MUROS DE BATERIA SANITARIA DEL PISO 2.

Diego Cetina Z—3+ Zy"

18-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, CONTINUA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE TECHO EN PVC DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 2, SE ADELANTA INSTALACIÓN DE WIN DE SUPERFICIE SUPERIOR DE LOS MUROS DIVISORIOS DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO 1.

Diego Cetina Zy" Z—3+.

JUANA ESCOBAR – SEDE C - REPUBLICA DE CANADÁ II.

15-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 PROF. SISO, 2 AYUDANTES, SE REALIZO ASEO GENERAL DEL FRENTE DE OBRA, CONTINUO LA ACTIVIDAD DE REGISTRO EN BAÑO DE PROFESORES PARA INSTALACION DE INTELIA, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EL INCREMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS EN ESTE FRENTE DE OBRA, HACE PRESENCIA LA SUPERVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA VERIFICAR EL AVANCE EN ESTE FRENTE DE OBRA.

3T. Diego Cetina. J.I.

16-10-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTEL., 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE HACE SUMINISTRO DE MIXTO Y DE BALDOSIN BH-5, SE REALIZA EL ACOPIO DE MATERIAL.

Diego Cetina 3T. J.I.

17-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 AYUDANTE, SE HACE INSTALACION DE MAESTRAS PARA PONER PORCELANATO EN EL BAÑO PROFESORES, LA INTERVENTORIA RECUERDA AL CONTRATISTA LA IMPORTANCIA DE HACER AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS EN ESTE FRENTE.

3T. J.I. Diego Cetina.

19-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE INSTALA APARATO SANITARIO EN BAÑO DE PROFESORES, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EL AUMENTO DE PERSONAL EN OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS SEGUN

Programación de Obra.

Diego Petina

20-10-20

Día Soleado, Personal de Obra, 1 Profesional Siso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 2 Ayudantes, 1 Oficial, Se hace el Cargue de la Placa en Batería Sanitaria del Bloque de Profesores, Se Realiza Aseo General al Frente de Obra.

Diego Petina

21-10-20

Día Nublado, Personal de Obra, 1 Oficial, 4 Ayudantes, Se Inicia Instalación de Piso en Bordillo de Batería Sanitaria de Niños, Se Inicia Enchape en Bajo de Profesores, Frente al Montaje de los Tanques de ~~Agua~~ Tanque es de Agua de los Tanques Estarán en Buenas Condiciones.

Diego Petina

22-10-20

Día Nublado, Personal de Obra, 1 Profesional Siso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Oficial, 3 Ayudantes, Continua Actividad de Instalación de Piso en Bordillo de la Batería de Niños, Continua Actividad de Enchape en Batería Sanitaria de Profesores, Se Recomienda al Personal de Obra Hacer el Uso de Tapabocas Así Como el Cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad, Hay Suministro de Electricidad.

Diego Petina

23-10-20

Día Soleado, Personal de Obra, 1 Profesional Siso, 1 Residente de Obra, 1 Residente de Interventoría 3 Oficiales, 3 Ayudantes, Se Inicia Actividad.

De instalación de piso en módulo sanitario de niños, continúa actividad de enchape en batería sanitaria de profesores, se inicia actividad de instalación de mediacaña en baño de niños.

Diego Letina.

24-10-20

Día soleado, personal en obra 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 maestro, 1 profesional siso, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de inter; se hace desmonte de cubierta de asbesto, desmonte de lámparas, continúa actividad de enchape en baño de profesores.

Diego Letina.

26-10-20

Día soleado, personal en obra, 2 herramenteros, 1 profesional siso, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 ayudante se inician actividades de carpintería metálica, se hace aseo general del frente de obra.

Diego Letina.

27-09-20

Día soleado, personal en obra, 1 profesional siso, 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 ayudante, 2 herramenteros, continuan en la actividad de soldadura en estructura metálica de cubierta, se hace desmonte de tanques de agua posible.

Diego Letina.

28-10-20

Día Soleado, Personal en obra, 1 Profesional sisa, 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Herramenteros, se hace instalación Hidráulica para los Tanques, continua Actividad de Carpintería Metálica para Estructura de Cubierta, Hubo Suministro de Material para la Construcción de Muros en Baterías Sanitarias de Niños y Niñas.

Diego Latina.

29-10-20

Día Soleado, Personal en obra, 1 Profesional sisa, 1 Residente de Interventoría, 1 Residente de obra, 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Herramenteros, se inicia Construcción de Muro en Batería Sanitaria de Niñas continuan Actividades de Soldadura en Estructura Metálica de Cubierta.

Diego Latina

30-10-20

Día Soleado, Personal en obra, 1 Profesional sisa, 1 Residente de obra, 1 Residente de Interventoría, 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Herramenteros 1 Inspector de Interventoría, se inicia Construcción de Muro en Baterías Sanitaria de Niños, y la instalación de Granito en Muro de la Batería Sanitaria de Niños, Continuan Actividad de Soldadura en Cubierta.

31-10-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, CONTINUAN ACTIVIDADES DE SOLDADURA PARA CUBIERTA, SE HACE INSTALACIÓN DE BOLDOSIN PARA PISO DE LA BATERIA SANITARIA DE PROFESORES. SE HACE LA INSTALACIÓN DE BLOCAPUERTA EN GRANITO PARA LOS BATERIAS SANITARIAS.

Diego Petina

3-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, SE INICIAN ACTIVIDADES DE RESANADO DE FISURAS EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACIÓN, CONTINUAN ACTIVIDADES DE SOLDADURA PARA CUBIERTA, 2 HERRAMENTEROS, 1 AYUDANTE.

Diego Petina

4-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 AYUDANTE AUSENTANDO CON ACTIVIDAD DE RESANADO DE FISURAS DE EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACIÓN, CONTINUA ACTIVIDAD DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA.

Diego Petina

05-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 HERRAMENTEROS, SE INICIA CON EL MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SE INSTALO GRANITO EN MESON DE LA BATERIA SANITARIA PARA NIÑOS, CONTINUA ACTIVIDAD DE RESANADO DE FISURAS.

Diego Petina

06-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, CONTINUA ACTIVIDAD DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA, SE INICIA ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA PARA CUBIERTA, SE SIGUE CON FORMALETA DE FACHADA, SE DESCARGA MUEBLE DE TELEVISOR UBICADO EN EL SALON.

Diego Petina

07-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, CONTINUA ACTIVIDAD DE MAMPOSTERIA PARA CUBIERTA, SE FORMALETA PRIMER TRAMO PARA FUNDIR VIGA DE AMARRE SITUADA SOBRE LA MAMPOSTERIA DE CUBIERTA.

Diego Petina

09-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, INICIA ACTIVIDAD DE PULIDO DE PISOS EN BODEGA PORTERIA DE NIVEL 3, SE ARMA FIGURADO DE ACERO PARA FUNDIR SEGUNDO TRAMO DE VIGA SITUADA EN LA CUBIERTA, 2 OFICIALES, 2 AYUDANTES.

Diego Petina

10-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL EN OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE INICIA RUDIA DE MURO DE LA BODEGA PORTERIA DE NIVEL 3, SE FUNDE SEGUNDO TRAMO DE VIGA SITUADA EN CUBIERTA.
2 OFICIALES, 1 AYUDANTE -

Diego Petina

11-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL DE OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, CONTINUA ACTIVIDAD DE PULIDO DE MESONES, INICIA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA.

Diego Cetina

12-11-20

DIA LLUVIOSO, PERSONAL DE OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, INICIO ACTIVIDAD DE PULIDO DE PISO EN BATERIA SANITARIA DE NIÑAS, SIGUE EN ACTIVIDAD DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA.

Diego Cetina

13-11-20

DIA LLUVIOSO, PERSONAL DE OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DE CERCA EN BATERIAS SANITARIAS, CONTINUA ACTIVIDAD DE PINTURA SOBRE CUBIERTA.

Diego Cetina

14-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL DE OBRA, 1 PROFESIONAL SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, INICIA LA INSTALACION DE ESTUCO EN FACHADA DE EDIFICIO DE AULAS Y SE CONTINUA CON EL ROSTRADO DE FACHADA.

Diego Cetina

17-11-20

DIA SOLEADO - PERSONAL DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL DISO, 1 PROFESIONAL DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 2 OFICIALES, 3 AYUDANTES. SE INICIA CON RESANE DE FACHADA DE LOS MUROS INTERNOS DEL EDIFICIO DE AULAS, SE INICIA CON LA DEMOLICIÓN DE BAÑOS UBICADO FRENTE A LOS BAÑOS Y OFICINA DE COORDINACIÓN

Diego Cetina

18-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 PROFESIONAL DISO, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, CONTINUA ACTIVIDAD DE RESANE DE FACHADA DE MUROS INTERNOS DE LOS SALONES, CONTINUA ACTIVIDAD DE ESTUCADO DE FACHADA, 2 OFICIALES 1 AYUDANTE.

Diego Cetina

19-11-20

DIA SOLEADO, PERSONAL DE OBRA, 1 PROFESIONAL DISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 INSPECTOR, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE INICIA ACTIVIDAD PARA ASENTAR FILOS EN VENTANAS Y PUERTAS UBICADOS FRENTE DEL EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE COORDINACIÓN

Diego Cetina

20-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 PROFESIONAL DISO, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, SE HACE EL DESMONTE DE VENTANAS DE LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE AULAS, INICIAN ACTIVIDAD DE ESTUCADO EN BATERIAS SANITARIAS

Diego Cetina

LOS ALPES.

Colegio Alpes IED

Alcaldia Mayor de Bogota
Secretaria de Educacion distrital.

Objeto:

Adelantar obras de educacion, mejoramiento Mantenimiento, correctivo de las plantas Fisicas Asi como la adecuacion y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales con el fin de Atender los requerimientos y necesidades en terminos de Infraestructura para la prestacion del servicio educativo.

2020.

Escaneado con CamScanner

9 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente
Se inicia con la desinstalación de puertas metalicas y divisiones de los baños, en el sector de la cancha se inicia demolición de la placa con dos martillos neumaticos.

10 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residen.
Se continua con la desinstalación de puertas metalicas y divisiones de los baños e inodoros, en el sector de la cancha se continua demolición de la placa con dos martillos neumaticos.

11 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
En los baños ya se inicia la demolición del enchape, y en la cancha se continua la demolición.

12 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
En los baños se continua con demolición de enchape y en la cancha se continua demolición.

Escaneado con CamScanner

13 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
se continua con demolición de enchape y pega, se continua demolición de la cancha y se inicia recogida de escombro.

14 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
Se continua con demolición de enchape y pega, se continua demolición de la cancha y se inicia recogida de escombro.

17 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
Se inicia con demolición de mesones en los baños, y antepechos se culmina la demolición de la cancha y se continua con el acopio de escombro a disposición final.

18 Noviembre 2020
Clima: Soleado
Personal: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 interventor, 1 siso, 1 residente.
Se continua con demolición de mesones y antepechos en los baños, se solicita al contratista realizar apiques en la cancha para determinar como se encuentra y asi poder tener una proyección de excavación y a su vez un diseño estructural para ser previamente

Escaneado con CamScanner

RURAL GRAN COLOMBIA.

06-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, INSPECTOR SISO, INSPECTOR DE INTERVENTORIA, LA INTERVENTORIA HACE ACOMPAÑAMIENTO PARA HACER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA PODER DAR INICIO A LAS OBRAS.

Diego Cetina

07-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, INSPECTOR DE INTERVENTORIA, INSPECTOR SISO DE OBRA, HUBO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, ESTO INCLUYE, GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, SEÑALIZACIÓN PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD, HUBO SUMINISTRO DE TAPABOCAS.

09-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, INICIAN LABORES DE DEMOLICIÓN DE ANDEN UBICADO FRENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EQUIPO UTILIZADO MARTILLO DEMOLEDOR, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Diego Cetina

DD MM AA 4

10-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, CONTINUA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE ANDEN, HUBO RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS A VOLTRUETA, PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS.

Diego Patiño

11-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR SISO, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE DA INICIO A LA EXCAVACIÓN DONDE SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR LA RAMPA DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Diego Patiño

12-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DONDE SE CONTEMPLA CONSTRUIR EL ANDEN, HUBO SUMINISTRO DE CEMENTO.

Diego Patiño

13-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 OFICIAL, 1 INSPECTOR SISO, 1 AYUDANTE, 1 INPECTOR DE INTERVENTORIA, HUBO SUMINISTRO DE ACERO PARA CONASTA DE RAMPA DE ACCESO, CONTINUA LA EXCAVACIÓN PARA ANCLAJE, SE RETROALIMENTA AL CONTRATISTA HACER AUMENTO DE PERSONAL EN EL FRENTE DE OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS, SE REITERA LA SOLICITUD DE ALLEGAR LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.

Diego Patiño

14-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 TECNICO SISO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE HACE TRASLADO DE CONTADOR DE AGUA PARA CIMENTACIÓN DE INICIO DE RAMPA, DURANTE EL TRASLADO DEL CONTADOR DE AGUA SE PRESENTA UNA FUGA DE AGUA, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE DEBE HACER EL ARREGLO DE LA FUGA PROVENIENTE DEL CONTADOR PARA QUEDAR EN OPTIMAS CONDICIONES.

Diego Patiño

17-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 INSPECTOR SISO, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA, SE INICIAN ACTIVIDADES DE FIGURADO DE ACERO PARA CANASTA DE INICIO DE RAMPA, HUBO SUMINISTRO DE RECEBO COMUN PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ANDEN.

Ing. Diego Patiño Ing.

18-11-20

DIA NUBLADO, PERSONAL EN OBRA, 1 INSPECTOR SISO, TOPOGRAFO, 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CONTINUAN ACTIVIDADES DE FIGURADO DE ACERO Y SE CUMENTA CON EL ARMADO DE LA CANASTA PARA INICIO DE RAMPA, SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA HACER AUMENTO DE PERSONAL EN ESTE FRENTE DE OBRA PARA NO GENERAR RETRASOS.

Ing. Ing. Diego Patiño.

ANEXO 7.
INFORMES SEMANALES.

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 8**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	8	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -	0.31%			
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.64%			
4	ESTRUCTURA	1.45%			
5	MAMPOSTERÍA	1.14%			
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0.08%			
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES	0.03%			
10	PISOS	0.85%			
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0.83%	1.34%	DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	SE REALIZA EL DESMONTE DE CUBIERTA CAFETERIA Y BAÑOS
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES		1.00%	ENCHAPE PARED 20 x 25 - ANALFI ITALIA Ó EQUIVALENTE	SE REALIZA LA INSTALACION DEL ENCHAPE PARA SHUT DE BASURAS
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**5.33%**	**2.34%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 8**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	8	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 64,238,436	$ 8,576,389	**$ 55,662,047**		2.34%	13.35%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	1
ELECTRICISTA		AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

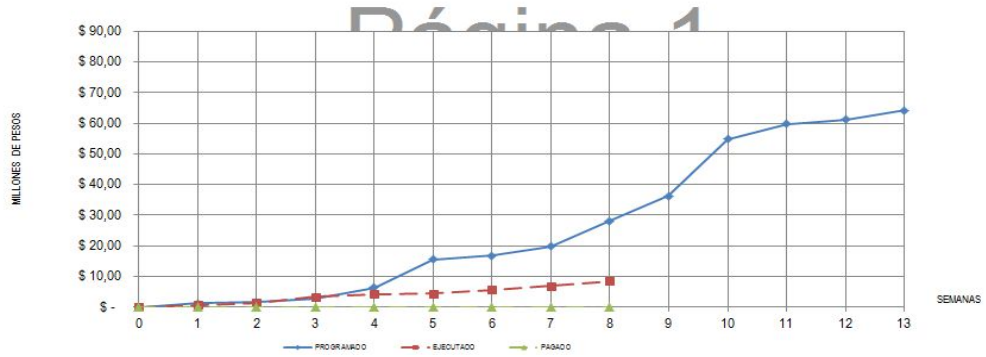

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

se reliza el desmonte de la cubierta en la cafeteria y baños queda pendiente espacio de cambio de aseadoras

se realiza instalacion del enchape al interior del shut de basuras

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 08






CURADO PLACA ENTREPISO





ENCHAPE PARED 20 x 25 - ANALFI ITALIA Ó EQUIVALENTE

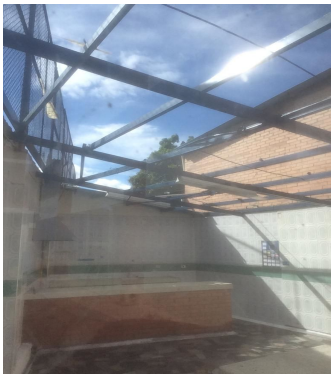



DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. CAFETERIA Y BAÑOS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
6 de septiembre de 2020	$ 1,292,267.26	$ 1,292,267.26	1	2.00%	2.00%
13 de septiembre de 2020	$ 303,282.00	$ 1,595,549.26	2	0.00%	2.00%
20 de septiembre de 2020	$ 1,263,521.50	$ 2,859,070.76	3	2.00%	4.00%
27 de septiembre de 2020	$ 3,479,891.55	$ 6,338,962.31	4	5.00%	9.00%
4 de octubre de 2020	$ 9,245,262.02	$ 15,584,224.33	5	14.00%	23.00%
11 de octubre de 2020	$ 1,143,056.25	$ 16,727,280.58	6	2.00%	25.00%
18 de octubre de 2020	$ 3,063,692.69	$ 19,790,973.27	7	5.00%	30.00%
25 de octubre de 2020	$ 8,225,751.96	$ 28,016,725.23	8	13.00%	43.00%
1 de noviembre de 2020	$ 8,234,447.00	$ 36,251,172.23	9	13.00%	56.00%
8 de noviembre de 2020	$ 18,605,495.59	$ 54,856,667.82	10	29.00%	85.00%
15 de noviembre de 2020	$ 4,879,326.20	$ 59,735,994.02	11	8.00%	93.00%
22 de noviembre de 2020	$ 1,495,315.92	$ 61,231,309.94	12	2.00%	95.00%
27 de noviembre de 2020	$ 3,007,126.40	$ 64,238,436.34	13	5.00%	100.00%
TOTAL	**$ 64,238,436.34**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 8 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	8	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 de octubre de 2020	Y EL	25 de octubre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

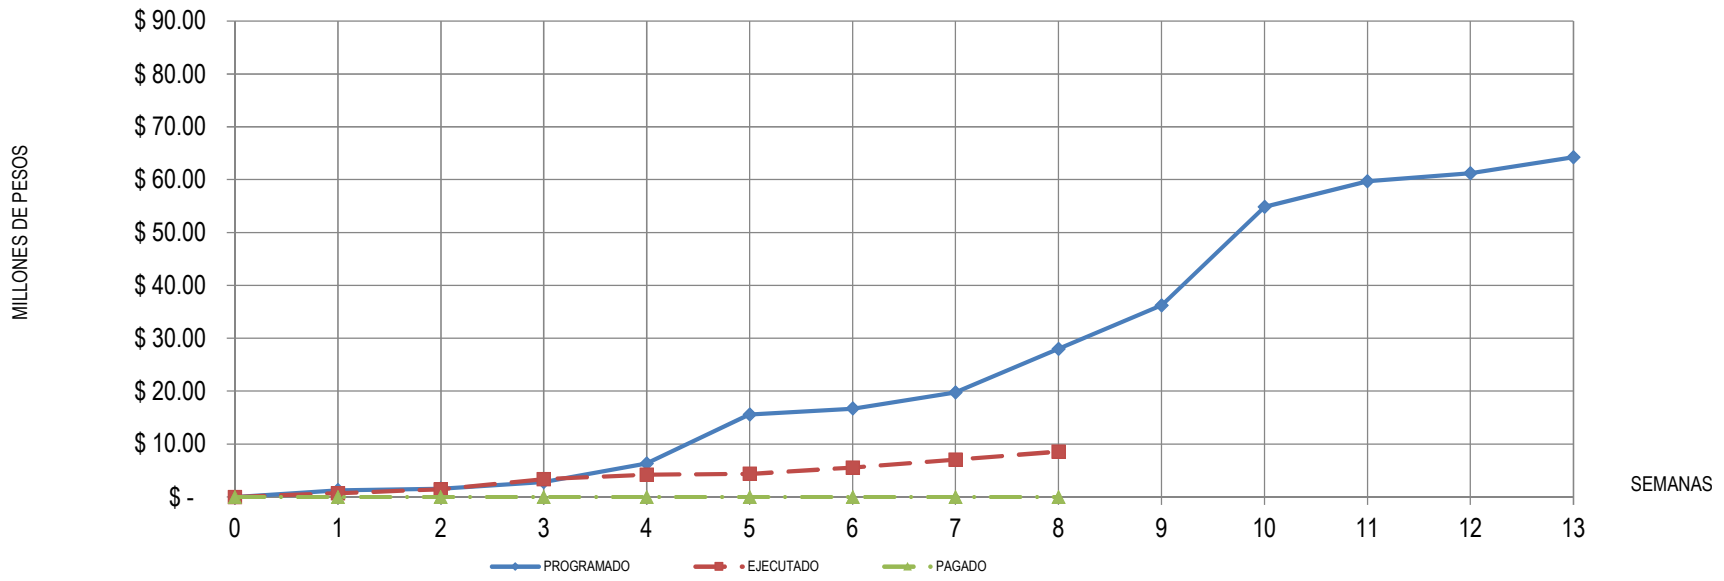

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 9**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	9	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.64%			
4	ESTRUCTURA	1.45%			
5	MAMPOSTERÍA	1.14%			
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS	0.08%			
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES	0.14%			
10	PISOS				
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	8.58%	4.14%	DESMONTE	SE REALIZA EL DESMONTE DE CORREAS CAFETERIA Y BAÑOS
12	CARPINTERIA METALICA		3.28%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PUERTA Y VENTANA DEL SHUT DE BASURAS
14	ENCHAPES	0.78%			
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**12.81%**	**7.42%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 9**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	9	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 64,238,436	$ 13,342,342	**$ 50,896,094**		7.42%	20.77%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	1
ELECTRICISTA		AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

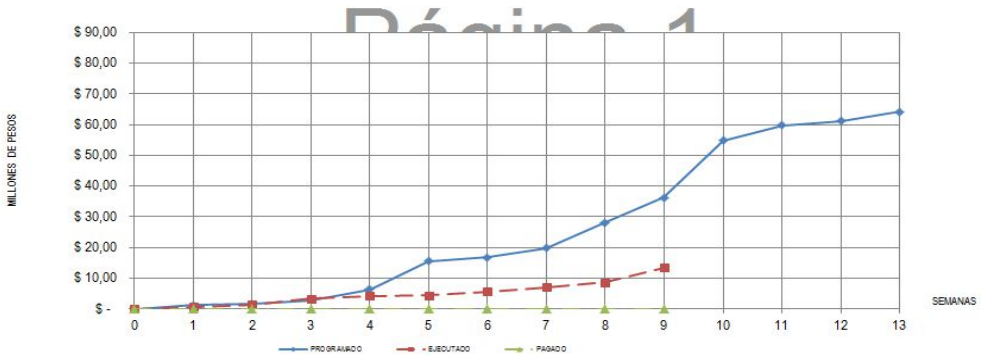

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

se reliza el desmonte de cerchas y correas en la cafeteria y baños queda pendiente espacio de cambio de aseadoras

se realiza la instalacion de puestas y ventanas en aluminio shut de basuras

Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 09





INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO SHUR DE BASURAS





INSTALACIÓN DE VENTANA Y PUERTA DE ALUMINIO SHUR DE BASURAS





DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
6 de septiembre de 2020	$ 1,292,267.26	$ 1,292,267.26	1	2.00%	2.00%
13 de septiembre de 2020	$ 303,282.00	$ 1,595,549.26	2	0.00%	2.00%
20 de septiembre de 2020	$ 1,263,521.50	$ 2,859,070.76	3	2.00%	4.00%
27 de septiembre de 2020	$ 3,479,891.55	$ 6,338,962.31	4	5.00%	9.00%
4 de octubre de 2020	$ 9,245,262.02	$ 15,584,224.33	5	14.00%	23.00%
11 de octubre de 2020	$ 1,143,056.25	$ 16,727,280.58	6	2.00%	25.00%
18 de octubre de 2020	$ 3,063,692.69	$ 19,790,973.27	7	5.00%	30.00%
25 de octubre de 2020	$ 8,225,751.96	$ 28,016,725.23	8	13.00%	43.00%
1 de noviembre de 2020	$ 8,234,447.00	$ 36,251,172.23	9	13.00%	56.00%
8 de noviembre de 2020	$ 18,605,495.59	$ 54,856,667.82	10	29.00%	85.00%
15 de noviembre de 2020	$ 4,879,326.20	$ 59,735,994.02	11	8.00%	93.00%
22 de noviembre de 2020	$ 1,495,315.92	$ 61,231,309.94	12	2.00%	95.00%
27 de noviembre de 2020	$ 3,007,126.40	$ 64,238,436.34	13	5.00%	100.00%
TOTAL	**$ 64,238,436.34**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 9 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	9	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	26 de octubre de 2020	Y EL	1 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

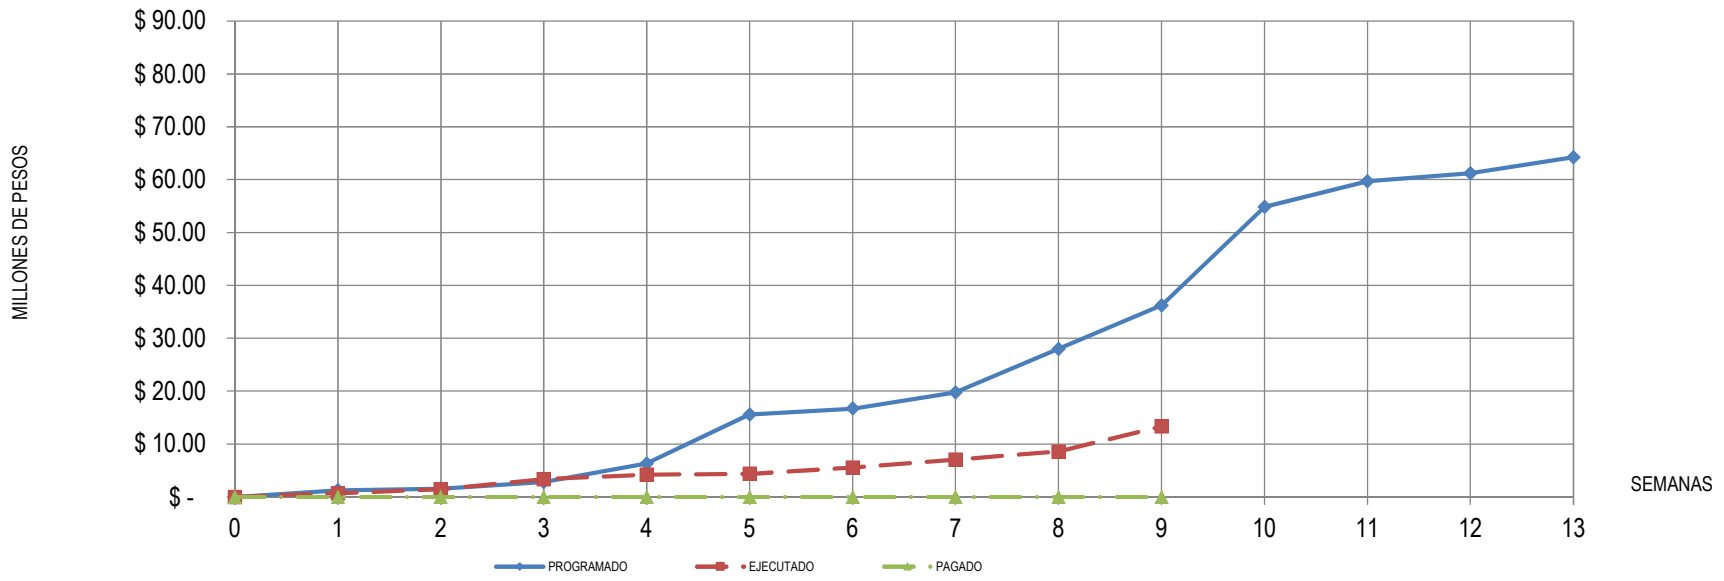

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 10**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0.13%			
4	ESTRUCTURA				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS		0.67%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PISO SHUT DE BASURAS
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	27.62%	1.12%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN	SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE LAS CERCHAS EN SITO PARA BAÑOS
12	CARPINTERIA METALICA	0.37%			
14	ENCHAPES	0.78%			
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	0.07%			
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**28.97%**	**1.79%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME SEMANAL # 10	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 64,238,436	$ 14,494,693	**$ 49,743,743**		1.79%	22.56%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO	1	OFICIALES	1
ELECTRICISTA		AYUDANTES	1
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

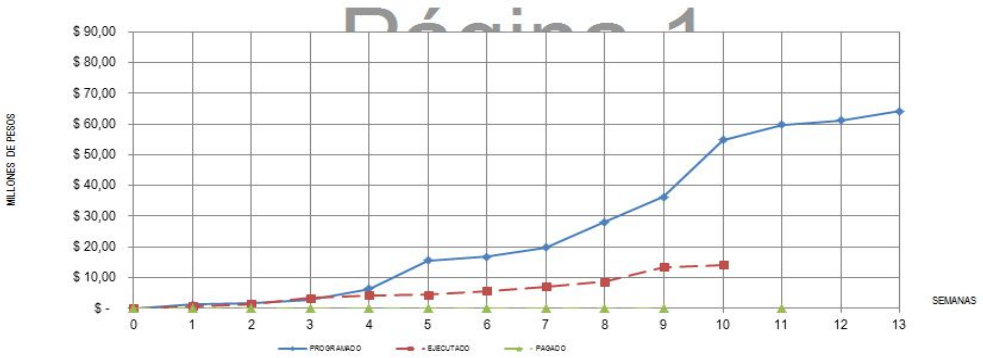

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se inicia la elaboración en sitio de cerchas para la cubierta.

Se instala el piso en P5 en Shut de Basuras

Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 10





SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE



ARMADO EN SITIO DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACIÓN DE PISO SHUT DE BASURAS





INSTALACIÓN DE PISO SHUT DE BASURAS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
6 de septiembre de 2020	$ 1,292,267.26	$ 1,292,267.26	1	2.00%	2.00%
13 de septiembre de 2020	$ 303,282.00	$ 1,595,549.26	2	0.00%	2.00%
20 de septiembre de 2020	$ 1,263,521.50	$ 2,859,070.76	3	2.00%	4.00%
27 de septiembre de 2020	$ 3,479,891.55	$ 6,338,962.31	4	5.00%	9.00%
4 de octubre de 2020	$ 9,245,262.02	$ 15,584,224.33	5	14.00%	23.00%
11 de octubre de 2020	$ 1,143,056.25	$ 16,727,280.58	6	2.00%	25.00%
18 de octubre de 2020	$ 3,063,692.69	$ 19,790,973.27	7	5.00%	30.00%
25 de octubre de 2020	$ 8,225,751.96	$ 28,016,725.23	8	13.00%	43.00%
1 de noviembre de 2020	$ 8,234,447.00	$ 36,251,172.23	9	13.00%	56.00%
8 de noviembre de 2020	$ 18,605,495.59	$ 54,856,667.82	10	29.00%	85.00%
15 de noviembre de 2020	$ 4,879,326.20	$ 59,735,994.02	11	8.00%	93.00%
22 de noviembre de 2020	$ 1,495,315.92	$ 61,231,309.94	12	2.00%	95.00%
27 de noviembre de 2020	$ 3,007,126.40	$ 64,238,436.34	13	5.00%	100.00%
TOTAL	**$ 64,238,436.34**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 10 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	2 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

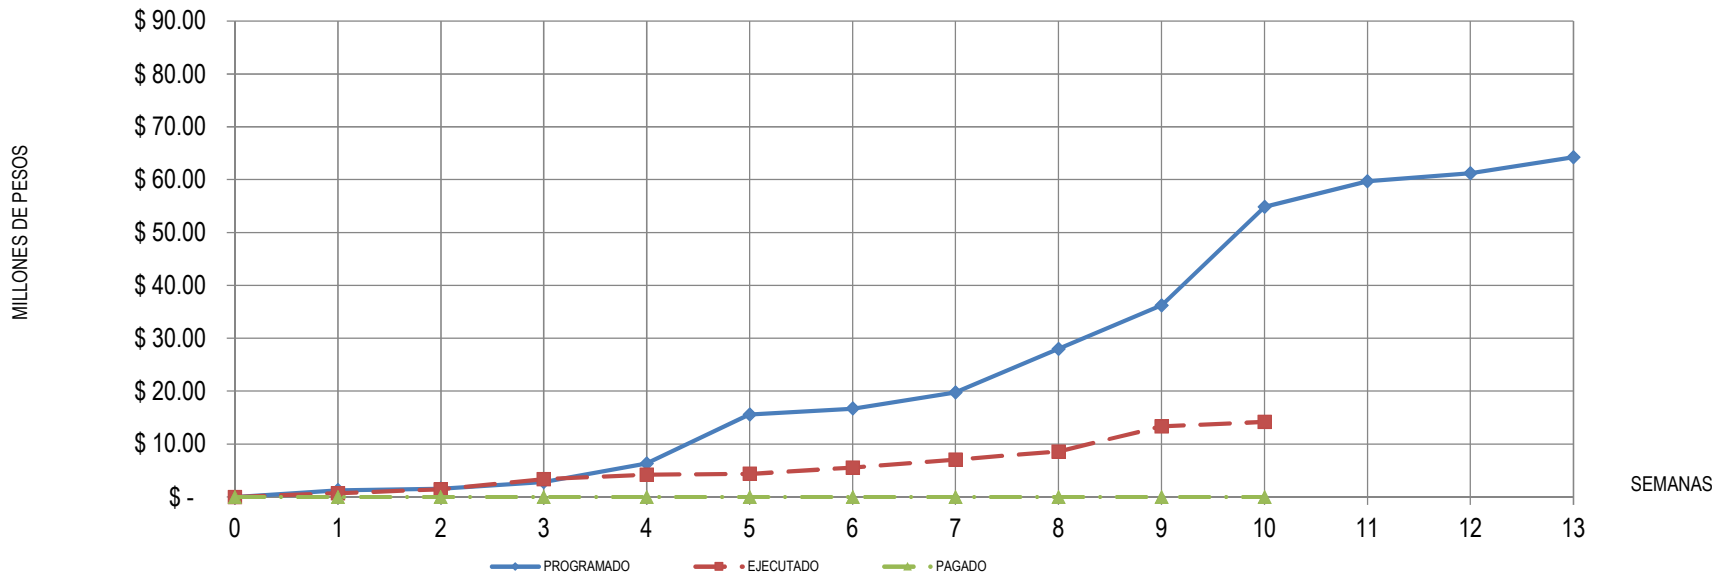

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 11**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		0.16%	DESMONTE	DESMONTE DE CANAL
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	ESTRUCTURA				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES		0.75%	ESTRUCTURA METALICA	ELABORACIÓN EN SITIO DE CERCHAS PARA CUBIERTA
12	CARPINTERIA METALICA	5.48%			
14	ENCHAPES	0.78%			
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA	0.48%			
19	CERRADURAS Y VIDRIOS	1.10%			
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**7.84%**	**0.91%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 11**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ATENAS (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 64,238,436	$ 15,078,557	**$ 49,159,879**		0.91%	23.47%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	
ELECTRICISTA		AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

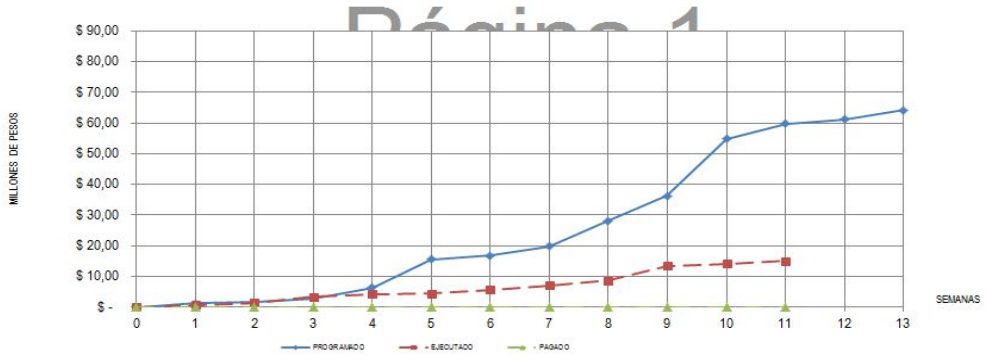

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se continua la elaboración en sitio de cerchas para la cubierta.

Se emboquillo el piso P5 en Shut de Basuras.

Se realiza desmonte de canal.

Se estan presentando humedades en el shut de basuras dado que no se ha realizado su impermeabilización, se recordo al contratista la continuidad de actividades ya que se ha evidenciado que se hacen actividades a medias y se dejan sin ser consecuentes hasta su terminación, por lo cual estas se van deteriorando con el pasar de los días.

Se solicito al contratista la disposición de los escombros de este frente de obra.

De acuerdo al presupuesto actualizado entregado por el contratista se realizaron observaciones igualmente a la programación y el flujo de inversión, el contratista debio de entregar estas correcciones el miercoles 11 de noviembre de 2020, sin embargo a la fecha de corte de este informe no han sido recibidas.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA


ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11



EMBOQUILLADO DE PISO SHUT DE BASURAS




ELABORACIÓN EN SITIO DE CERCHAS PARA CUBIERTA

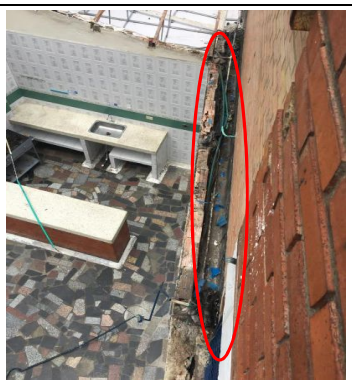

DESMONTE CANAL



DESMONTE CANAL

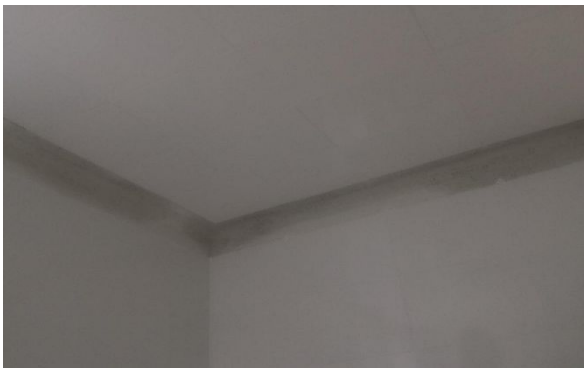

HUMEDADES PRESENTADAS EN SHUT POR FALTA DE IMPERMEABILIZACIÓN



RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
6 de septiembre de 2020	$ 1,292,267.26	$ 1,292,267.26	1	2.00%	2.00%
13 de septiembre de 2020	$ 303,282.00	$ 1,595,549.26	2	0.00%	2.00%
20 de septiembre de 2020	$ 1,263,521.50	$ 2,859,070.76	3	2.00%	4.00%
27 de septiembre de 2020	$ 3,479,891.55	$ 6,338,962.31	4	5.00%	9.00%
4 de octubre de 2020	$ 9,245,262.02	$ 15,584,224.33	5	14.00%	23.00%
11 de octubre de 2020	$ 1,143,056.25	$ 16,727,280.58	6	2.00%	25.00%
18 de octubre de 2020	$ 3,063,692.69	$ 19,790,973.27	7	5.00%	30.00%
25 de octubre de 2020	$ 8,225,751.96	$ 28,016,725.23	8	13.00%	43.00%
1 de noviembre de 2020	$ 8,234,447.00	$ 36,251,172.23	9	13.00%	56.00%
8 de noviembre de 2020	$ 18,605,495.59	$ 54,856,667.82	10	29.00%	85.00%
15 de noviembre de 2020	$ 4,879,326.20	$ 59,735,994.02	11	8.00%	93.00%
22 de noviembre de 2020	$ 1,495,315.92	$ 61,231,309.94	12	2.00%	95.00%
27 de noviembre de 2020	$ 3,007,126.40	$ 64,238,436.34	13	5.00%	100.00%
TOTAL	**$ 64,238,436.34**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	11	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	9 de noviembre de 2020	Y EL	15 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

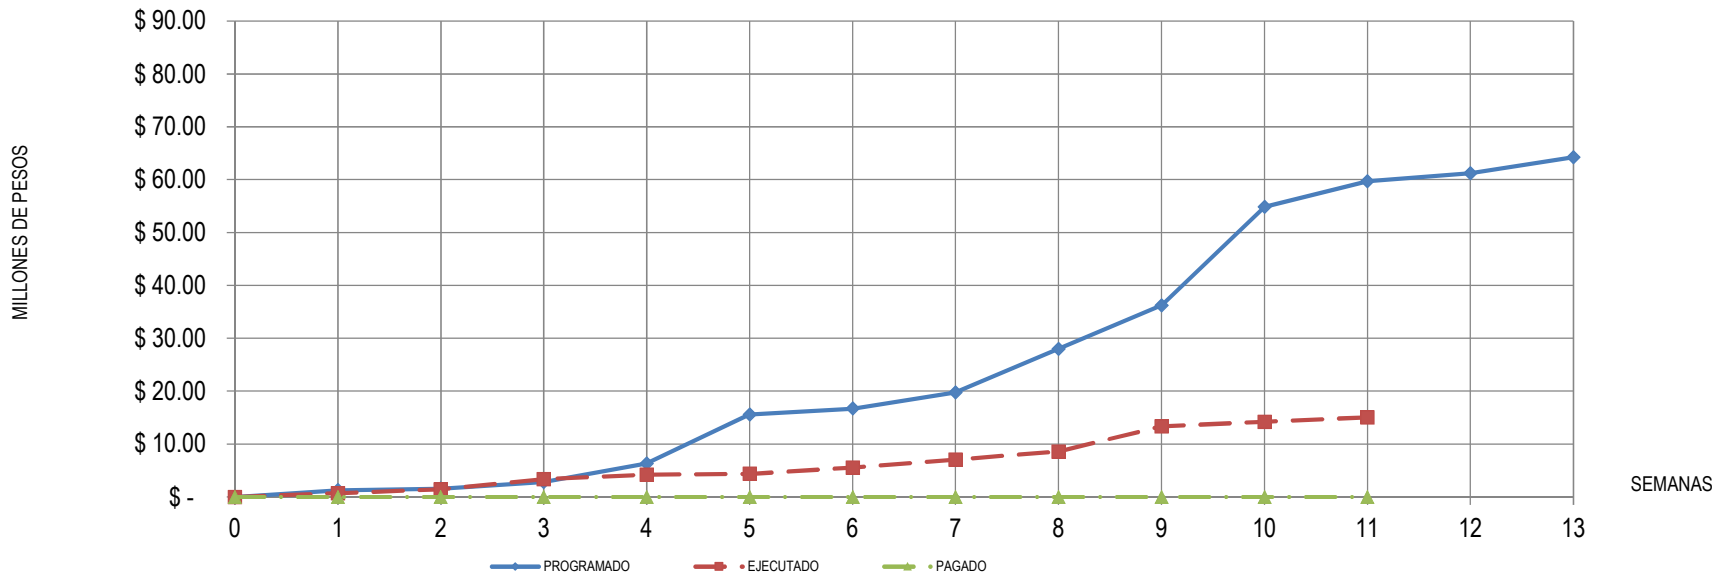

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 9**	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	9	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES	0.64%	0.24%	DEMOLICIONES	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EN AULAS
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA	1.55%	1.26%	MAMPOSTERIA	MURO EN MAMAPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA LA FACHADA DEL BLOQUE C
10	PISOS	6.45%	3.89%	BALDOSIN GRANITO BH-5	INSTALACION DE TABLETAS DE GRANITO AL INTERIOR DE LOS SALONES BLOQUE C
12	CARPINTERIA METALICA	7.52%			
18	PINTURA				
20	OBRAS EXTERIORES		0.89%	CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO	ANDEN DEL BLOQUE C
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**16.16%**	**6.28%**		

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 9**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	9	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 173,187,893	$ 42,492,878	**$ 130,695,016**		6.28%	24.54%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA		AYUDANTES	13
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

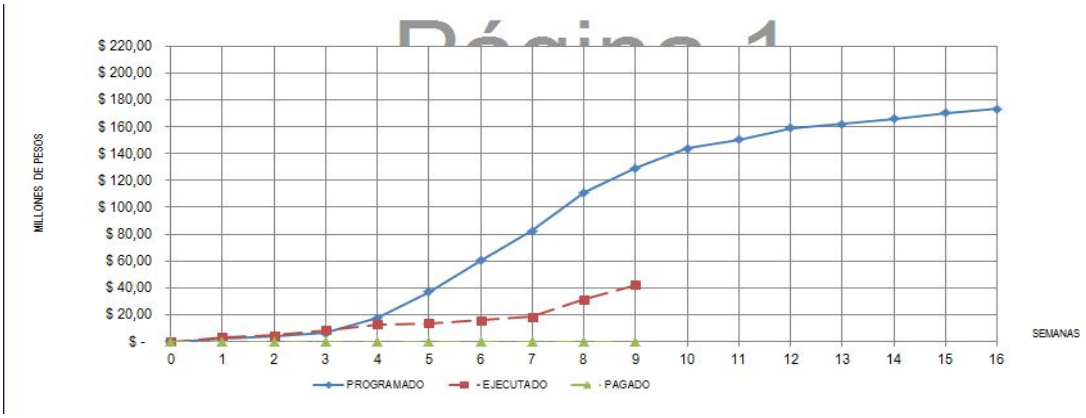

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza demolicion de muro tolete de aulas para dar inicio al muro en mamposteria estructural fachada bloque c

Se realiza la construccion de muro en mamposteria ala vista para fachada de aulas bloque c se le recomienda al contratista el amarre del muro nuevo al existente

se continua la instalacion de baldosa en marmol para salones del bloque c

se realiza fundida de tramos del anden del bloque c teniendo en cuenta recomendaciones de interventoria en la cañuela y media cana la cual determinaron realizarla en otra fundida

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 09





DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE E=12 CM. (INC. RETIRO DE SOBR.)





MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm





CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO





BALDOSIN GRANITO BH-5

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
30 de Agosto de 2020	$ 2,631,781.99	$ 2,631,781.99	1	1.52%	1.52%
6 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 4,438,920.19	2	1.04%	2.56%
13 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 6,246,058.39	3	1.04%	3.61%
20 de septiembre de 2020	$ 11,538,264.64	$ 17,784,323.03	4	6.66%	10.27%
27 de septiembre de 2020	$ 19,477,794.54	$ 37,262,117.57	5	11.25%	21.52%
4 de octubre de 2020	$ 23,016,112.02	$ 60,278,229.59	6	13.29%	34.81%
11 de octubre de 2020	$ 22,103,987.80	$ 82,382,217.39	7	12.76%	47.57%
18 de octubre de 2020	$ 28,533,477.17	$ 110,915,694.56	8	16.48%	64.04%
25 de octubre de 2020	$ 18,379,548.14	$ 129,295,242.70	9	10.61%	74.66%
1 de noviembre de 2020	$ 14,460,945.90	$ 143,756,188.60	10	8.35%	83.01%
8 de noviembre de 2020	$ 6,508,680.73	$ 150,264,869.33	11	3.76%	86.76%
15 de noviembre de 2020	$ 8,641,182.29	$ 158,906,051.62	12	4.99%	91.75%
22 de noviembre de 2020	$ 3,126,627.05	$ 162,032,678.67	13	1.81%	93.56%
29 de noviembre de 2020	$ 4,026,600.45	$ 166,059,279.52	14	2.32%	95.88%
6 de diciembre de 2020	$ 4,026,600.85	$ 170,085,880.37	15	2.32%	98.21%
11 de diciembre de 2020	$ 3,102,013.26	$ 173,187,893.23	16	1.79%	100.00%
TOTAL	**$ 173,187,893.23**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 8 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	9	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 de octubre de 2020	Y EL	25 de octubre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

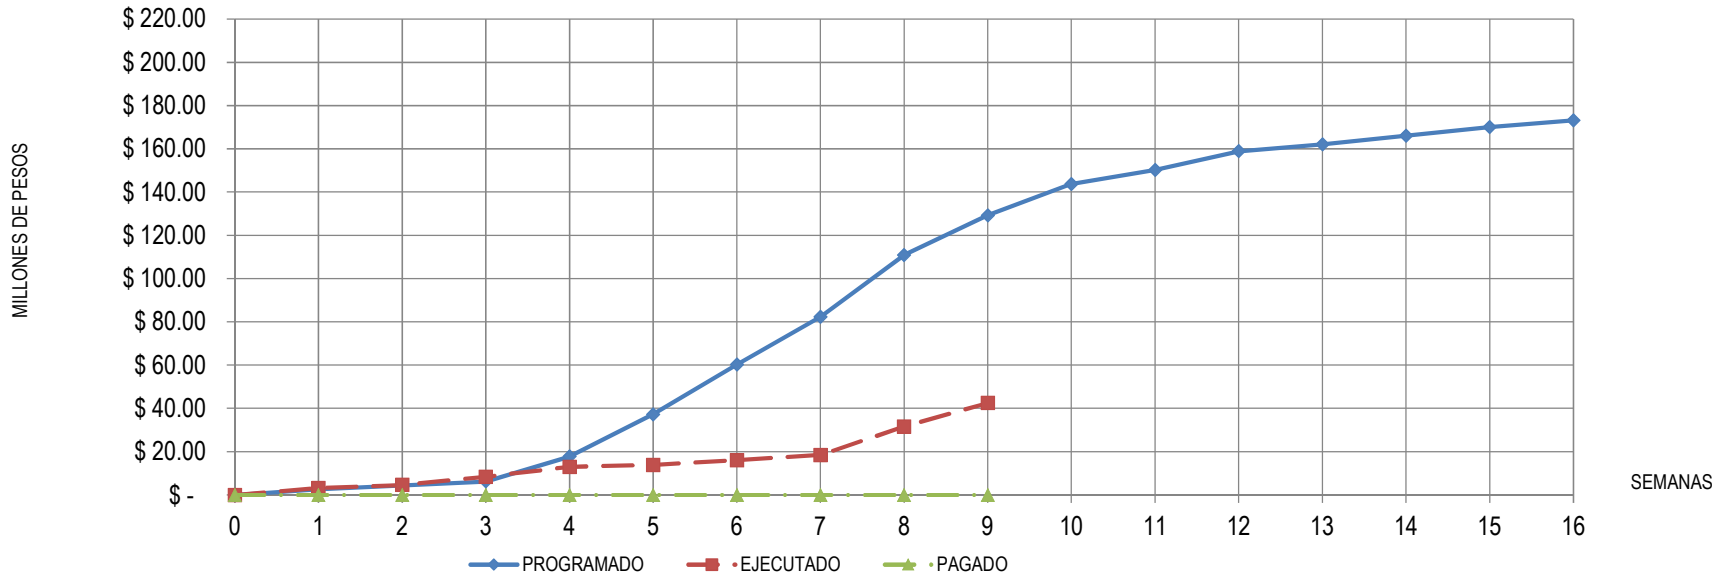

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 10**	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		2.19%	DEMOLICIONES	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA, ENCAHPE DE PISO, AFINADO Y PLACA.
2	CIMENTACIÓN	0.31%	2.55%	RELLENO Y PLACA	RELLENO EN RECEBO COMUN Y PLACA DE CONTRAPISO E=10 CM.
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS		0.72%	TUBERIA	SE RELIZA CAMBIO DE TUBERIA DE GRES A TUBERIA NOVAFORT
5	MAMPOSTERÍA	1.47%	0.62%	MAMPOSTERIA	SE CONTINUA CON EL MURO EN MAMAPOSTERIA ESTRUCTURAL PARA LA FACHADA DEL BLOQUE C
10	PISOS	0.16%			
12	CARPINTERIA METALICA	6.41%			
18	PINTURA				
20	OBRAS EXTERIORES		1.18%	CONCRETO ESCOBEADO	SE FUNDEN TRAMOS DE ANDEN DEL BLOQUE C
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**8.35%**	**7.26%**		

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 10	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 173,187,893	$ 55,073,088	**$ 118,114,805**		7.26%	31.80%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	
MAESTRO	1	OFICIALES	1
ELECTRICISTA		AYUDANTES	8
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

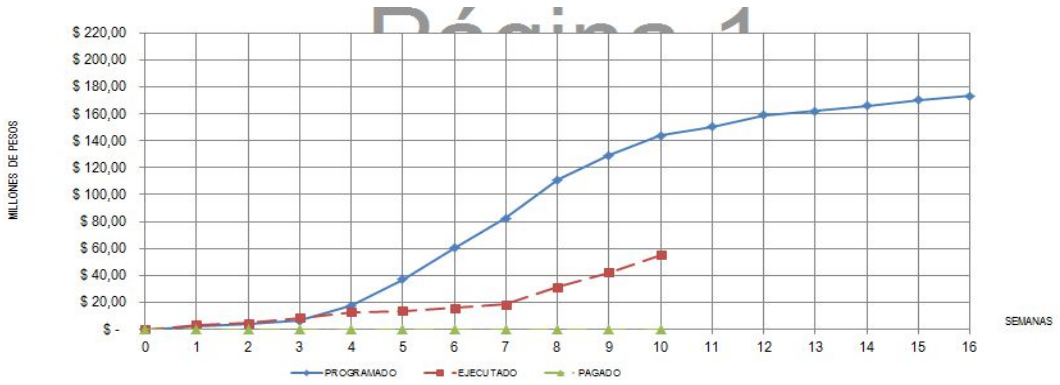

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza demolicion de muro tolete de aulas para dar inicio al muro en mamposteria estructural fachada bloque c
Se realiza la construccion de muro en mamposteria ala vista para fachada de aulas bloque c se le recomienda al contratista el amarre del muro nuevo al existente
Se realizan mejoreminetos al interior de las aulas ya que se encontraban socavadas por el nivel freatico tan alto que presentan
Se realiza cambio de tuberia ya que se encontaba en gres y se aumenta el diametro a 10`pvc novafort
se realiza fundida de los siguientes tramos del anden del bloque c teniendo en cuenta recomendaciones de interventoria en la cañuela y media cana la cual determinaron realizarla en otra fundida
Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.
Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA


LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 10






DEMOLICIÓN DE MUROS TOLETE

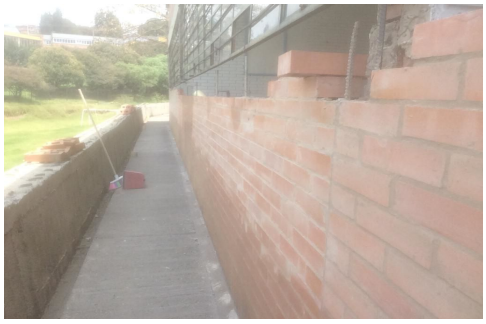



MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO

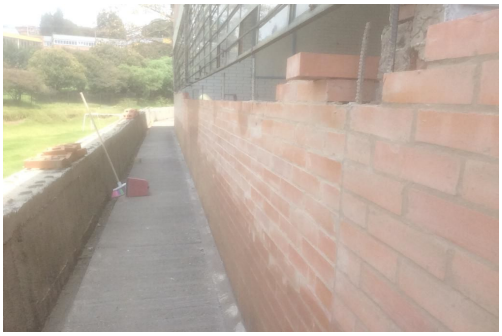



CONCRETO ESCOBEADO





RELLENO EN RECEBO COMUN MEJORAMIENTO AL INTERIROR DE LOS SALONES

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
30 de Agosto de 2020	$ 2,631,781.99	$ 2,631,781.99	1	1.52%	1.52%
6 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 4,438,920.19	2	1.04%	2.56%
13 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 6,246,058.39	3	1.04%	3.61%
20 de septiembre de 2020	$ 11,538,264.64	$ 17,784,323.03	4	6.66%	10.27%
27 de septiembre de 2020	$ 19,477,794.54	$ 37,262,117.57	5	11.25%	21.52%
4 de octubre de 2020	$ 23,016,112.02	$ 60,278,229.59	6	13.29%	34.81%
11 de octubre de 2020	$ 22,103,987.80	$ 82,382,217.39	7	12.76%	47.57%
18 de octubre de 2020	$ 28,533,477.17	$ 110,915,694.56	8	16.48%	64.04%
25 de octubre de 2020	$ 18,379,548.14	$ 129,295,242.70	9	10.61%	74.66%
1 de noviembre de 2020	$ 14,460,945.90	$ 143,756,188.60	10	8.35%	83.01%
8 de noviembre de 2020	$ 6,508,680.73	$ 150,264,869.33	11	3.76%	86.76%
15 de noviembre de 2020	$ 8,641,182.29	$ 158,906,051.62	12	4.99%	91.75%
22 de noviembre de 2020	$ 3,126,627.05	$ 162,032,678.67	13	1.81%	93.56%
29 de noviembre de 2020	$ 4,026,600.45	$ 166,059,279.52	14	2.32%	95.88%
6 de diciembre de 2020	$ 4,026,600.85	$ 170,085,880.37	15	2.32%	98.21%
11 de diciembre de 2020	$ 3,102,013.26	$ 173,187,893.23	16	1.79%	100.00%
TOTAL	**$ 173,187,893.23**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 10 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	26 de octubre de 2020	Y EL	1 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

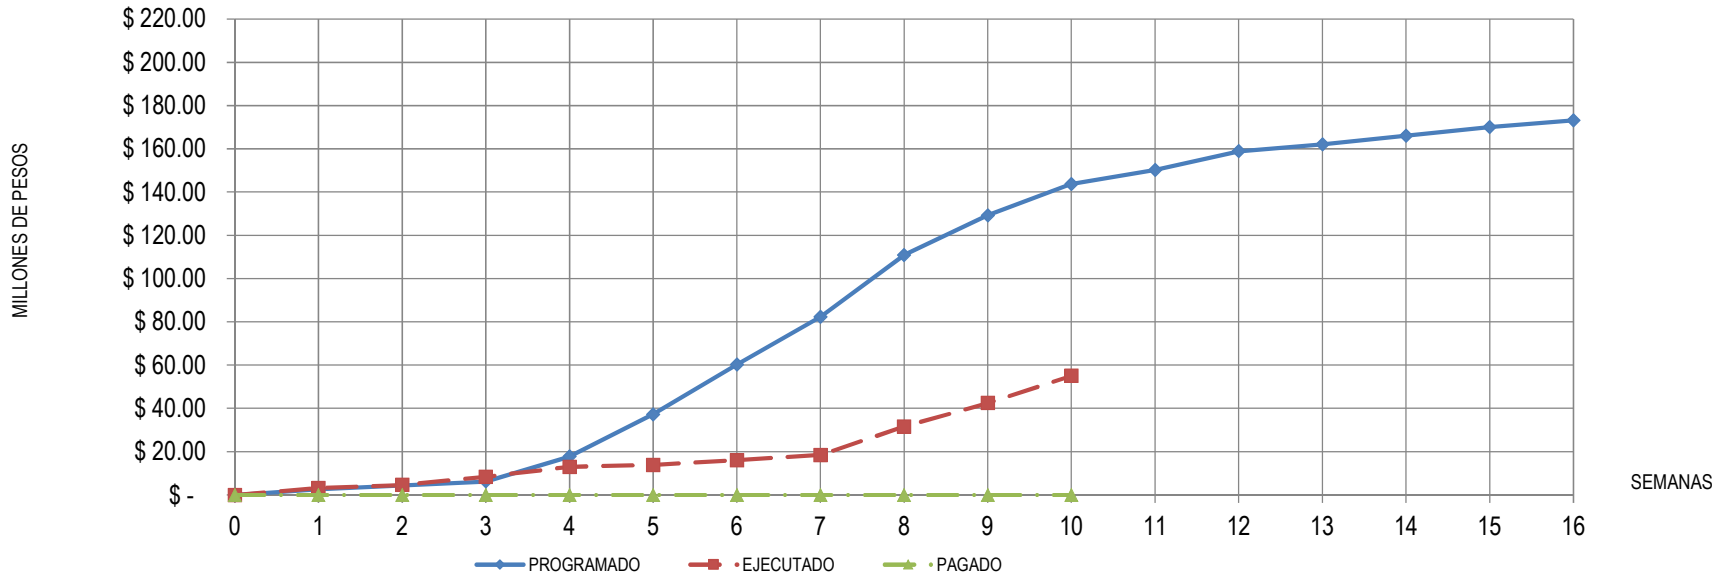

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 11**	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN		3.13%	PLACA DE CONTAPISO	SE FUNDE PLACA DE CONTRAPISO
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA	0.13%			
10	PISOS		3.46%	ENCHAPE PISO	SE CONTINUA INSTALACIÓN DE PISO P5
12	CARPINTERIA METALICA				
18	PINTURA	3.63%			
20	OBRAS EXTERIORES				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**3.76%**	**6.59%**		

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 11**	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 173,187,893	$ 66,485,599	**$ 106,702,294**		6.59%	38.39%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA		AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

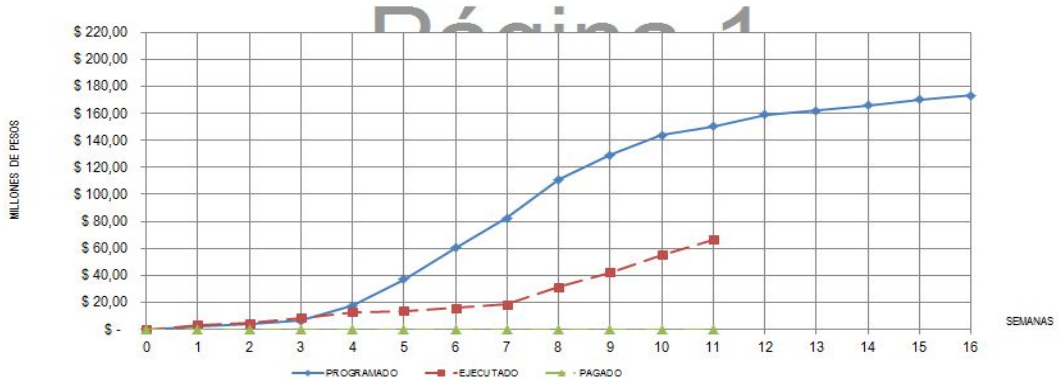

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza placa contra piso al interior de las aulas para previo enchape de piso.

Se continua la instalacion de piso P5 en las aulas del bloque C, durante este periodo se ha bajado el rendimiento en su instalación dado que se tiene dificultad con su despacho y su instalación se ha realizado de acuerdo a medida que este llega a obra.

Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11





PLACA DE CONTRAPISO





PLACA DE CONTRAPISO





PLACA DE CONTRAPISO Y PISO P5





INSTALACIÓN DE PSIO P5

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
30 de Agosto de 2020	$ 2,631,781.99	$ 2,631,781.99	1	1.52%	1.52%
6 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 4,438,920.19	2	1.04%	2.56%
13 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 6,246,058.39	3	1.04%	3.61%
20 de septiembre de 2020	$ 11,538,264.64	$ 17,784,323.03	4	6.66%	10.27%
27 de septiembre de 2020	$ 19,477,794.54	$ 37,262,117.57	5	11.25%	21.52%
4 de octubre de 2020	$ 23,016,112.02	$ 60,278,229.59	6	13.29%	34.81%
11 de octubre de 2020	$ 22,103,987.80	$ 82,382,217.39	7	12.76%	47.57%
18 de octubre de 2020	$ 28,533,477.17	$ 110,915,694.56	8	16.48%	64.04%
25 de octubre de 2020	$ 18,379,548.14	$ 129,295,242.70	9	10.61%	74.66%
1 de noviembre de 2020	$ 14,460,945.90	$ 143,756,188.60	10	8.35%	83.01%
8 de noviembre de 2020	$ 6,508,680.73	$ 150,264,869.33	11	3.76%	86.76%
15 de noviembre de 2020	$ 8,641,182.29	$ 158,906,051.62	12	4.99%	91.75%
22 de noviembre de 2020	$ 3,126,627.05	$ 162,032,678.67	13	1.81%	93.56%
29 de noviembre de 2020	$ 4,026,600.45	$ 166,059,279.52	14	2.32%	95.88%
6 de diciembre de 2020	$ 4,026,600.85	$ 170,085,880.37	15	2.32%	98.21%
11 de diciembre de 2020	$ 3,102,013.26	$ 173,187,893.23	16	1.79%	100.00%
TOTAL	**$ 173,187,893.23**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	11	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	2 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

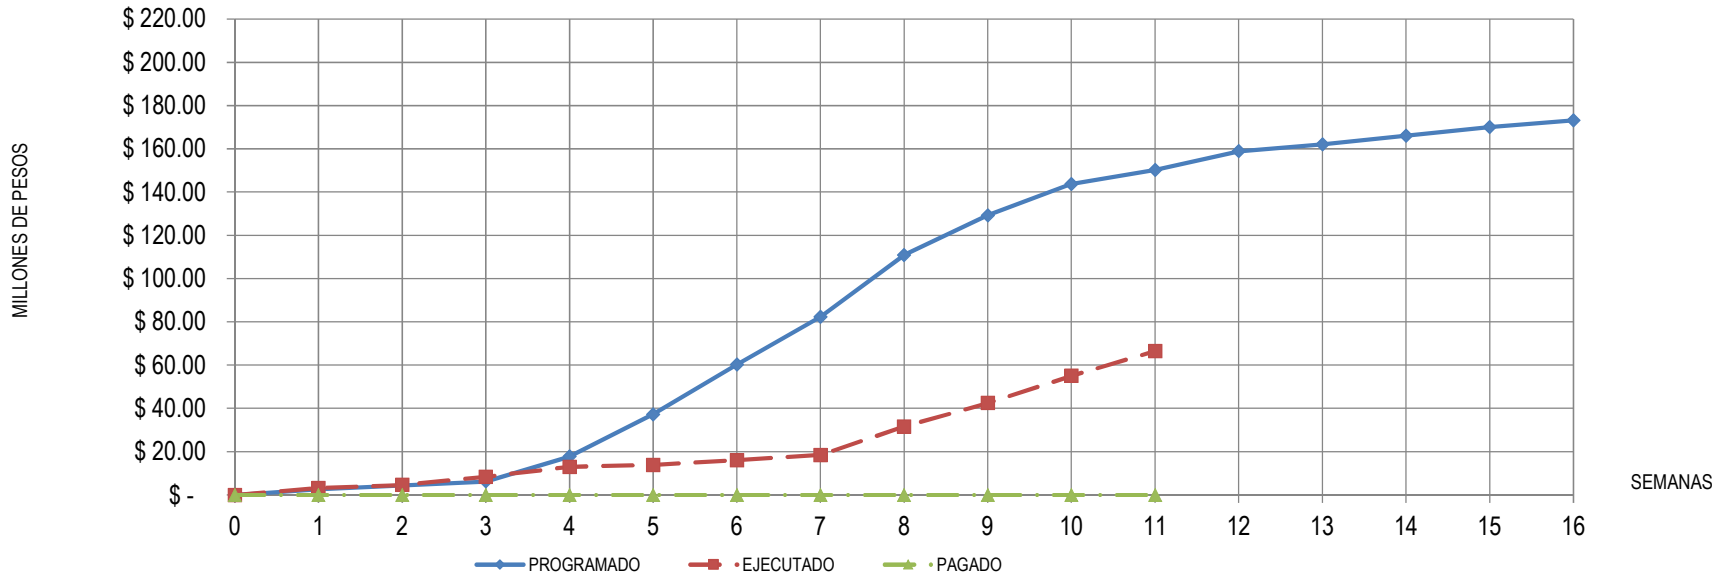

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 12**	VERSIÓN 01 Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	3-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		1.58%	DEMOLICIONES Y DESMONTES	DEMOLICIÓN DE PISOS, DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS
2	CIMENTACIÓN	0.09%	0.33%	PLACA DE CONTAPISO	SE FUNDE PLACA DE CONTRAPISO
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA		0.59%	MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA	CONSTRUCCIÓN DE MUROS
10	PISOS	0.02%			
12	CARPINTERIA METALICA				
18	PINTURA	3.63%			
20	OBRAS EXTERIORES	1.26%			
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**5.00%**	**2.50%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 12**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	3-Nov-20	**AL**	15-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 173,187,893	$ 70,820,503	**$ 102,367,390**		2.50%	40.89%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA		AYUDANTES	7
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

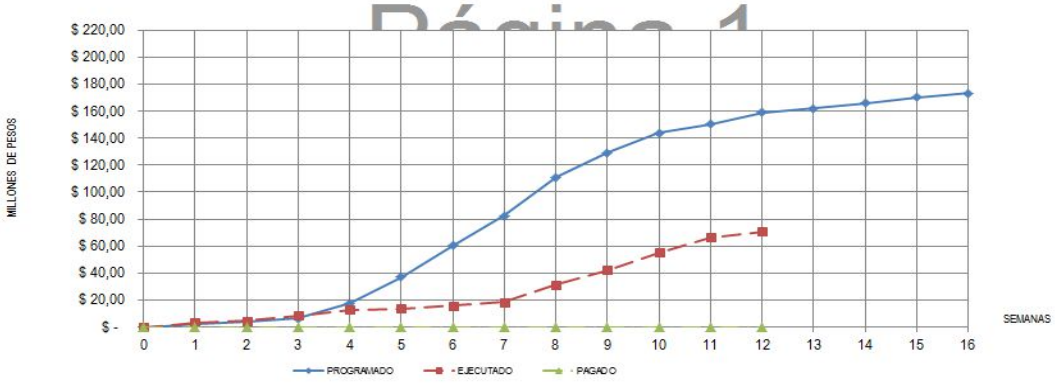

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Demolicion de muros en mampostria
Desmonte de rejas y inicio desmonte de ventanas
Demolicion de Baldosa en salones restantes
Mejoramiento placa contrapiso salones
Durante esta semana no se realizo instalacion de piso P5 dado que se tiene dificultad con su despacho y su instalación se ha realizado de acuerdo a medida que este llega a obra.
Se solicito al contratista la disposición de los escombros de este frente de obra.
De acuerdo al presupuesto actualizado entregado por el contratista se realizaron observaciones igualmente a la programación y el flujo de inversión, el contratista debio de entregar estas correcciones el miercoles 11 de noviembre de 2020, sin embargo a la fecha de corte de este informe no han sido recibidas.
Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.
Se solicito al contratista desde hace dos semanas la corrección de mamposteria en 4 aulas ya que no se encontraban ancladas a los muros existentes, hasta la fecha no se han realizado estas correcciones.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 12



DEMOLICIÓN DE PISO EN BALDOSA



DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS



DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA



PLACA DE CONTRAPISO





CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA





CORRECCIÓN DE MUROS SOLICITADA ANCLAJE A MURO EXISTENTE

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
30 de Agosto de 2020	$ 2,631,781.99	$ 2,631,781.99	1	1.52%	1.52%
6 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 4,438,920.19	2	1.04%	2.56%
13 de septiembre de 2020	$ 1,807,138.20	$ 6,246,058.39	3	1.04%	3.61%
20 de septiembre de 2020	$ 11,538,264.64	$ 17,784,323.03	4	6.66%	10.27%
27 de septiembre de 2020	$ 19,477,794.54	$ 37,262,117.57	5	11.25%	21.52%
4 de octubre de 2020	$ 23,016,112.02	$ 60,278,229.59	6	13.29%	34.81%
11 de octubre de 2020	$ 22,103,987.80	$ 82,382,217.39	7	12.76%	47.57%
18 de octubre de 2020	$ 28,533,477.17	$ 110,915,694.56	8	16.48%	64.04%
25 de octubre de 2020	$ 18,379,548.14	$ 129,295,242.70	9	10.61%	74.66%
1 de noviembre de 2020	$ 14,460,945.90	$ 143,756,188.60	10	8.35%	83.01%
8 de noviembre de 2020	$ 6,508,680.73	$ 150,264,869.33	11	3.76%	86.76%
15 de noviembre de 2020	$ 8,641,182.29	$ 158,906,051.62	12	4.99%	91.75%
22 de noviembre de 2020	$ 3,126,627.05	$ 162,032,678.67	13	1.81%	93.56%
29 de noviembre de 2020	$ 4,026,600.45	$ 166,059,279.52	14	2.32%	95.88%
6 de diciembre de 2020	$ 4,026,600.85	$ 170,085,880.37	15	2.32%	98.21%
11 de diciembre de 2020	$ 3,102,013.26	$ 173,187,893.23	16	1.79%	100.00%
TOTAL	**$ 173,187,893.23**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 12 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	12	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	3 de noviembre de 2020	Y EL	15 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

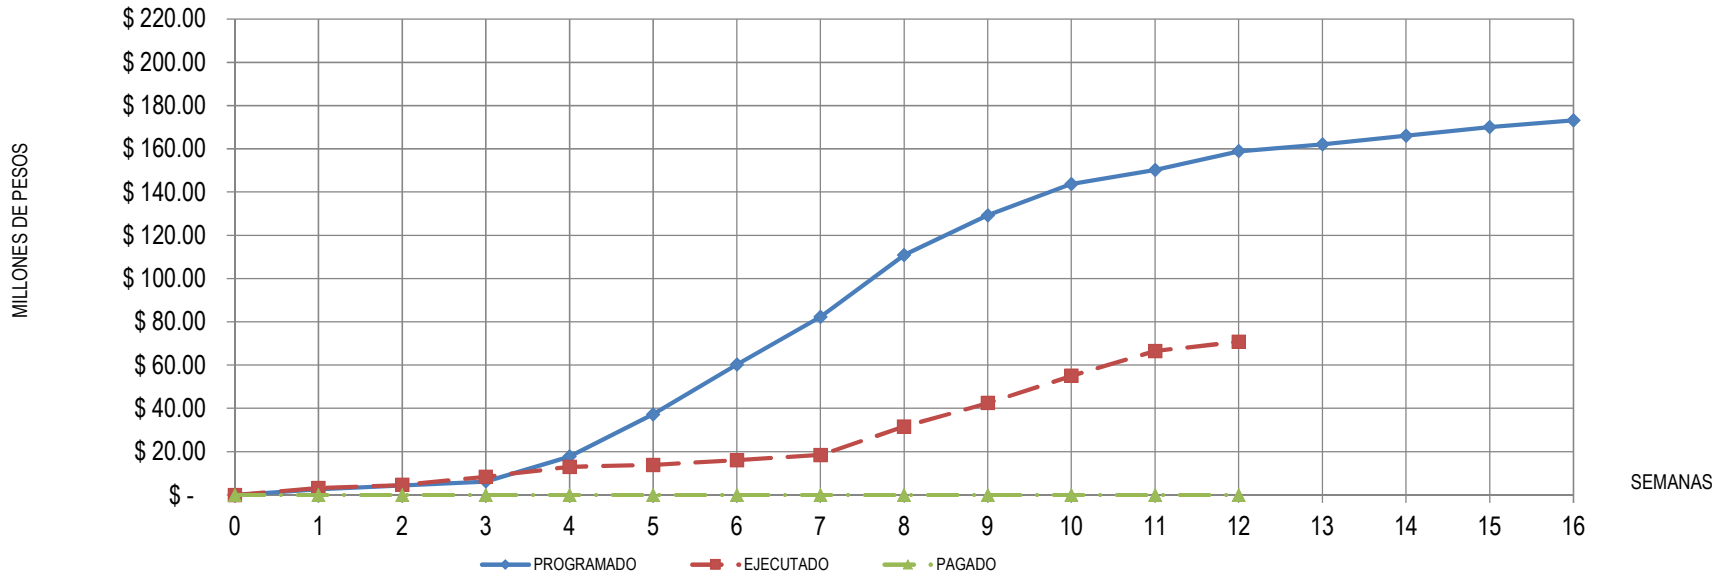

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME GRÁFICO SEMANAL # 10	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS		0.07%	INSTALACION HIDRAULICA	INSTALACION DE LLAVE MANGUERA EN PISO 1 Y SOTANO
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	0.25%			
9	PAÑETES				
10	PISOS	3.18%	4.84%	PISOS	BALDOSIN GRANITO BH-5
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES	6.30%	2.88%	ENCHAPE SOBRE MUROS	INSTALACION HECHA EN BATERIA SANITARIA DE PISO 1 Y PARTE DEL SOTANO
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS				
26	ITEMS NO PREVISTOS				
TOTALES		**9.73%**	**7.79%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME GRÁFICO SEMANAL # 10	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 92,328,596	$ 41,786,135	**$ 50,542,461**		7.79%	45.26%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	3
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

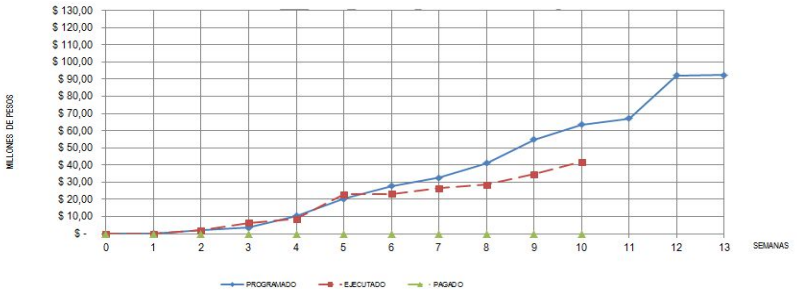

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se iniciaron actividades de enchape con baldosa BH-5 en las baterias sanitarias del sotano y piso 1


Se realizo incremento de personal en este frente de obra.

Se continua con el enchape de pared, se realizo suministro de cenefa para baterias sanitarias.


ARLEY VARGAS RODRIGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 10

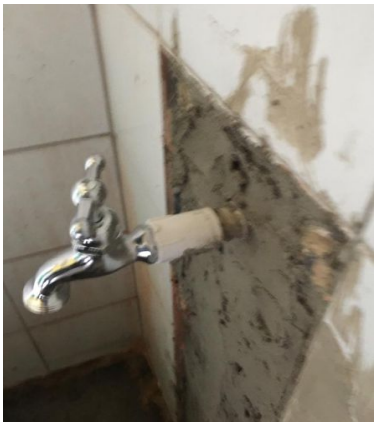

INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA

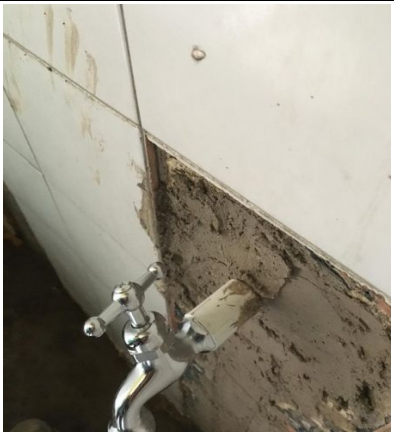

INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA



INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN GRANITO BH-5 - BAÑO SOTANO



INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN GRANITO BH-5 - BAÑO PISO 1



INSTALACION DE PISO EN BALDOSIN GRANITO BH-5 - BAÑO PISO 1





ENCHAPE BAÑO SOTANO Y PISO 2

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23 de agosto de 2020	$ 177,759.69	$ 177,759.69	1	0.19%	0.19%
30 de agosto de 2020	$ 1,911,287.29	$ 2,089,046.98	2	2.07%	2.26%
6 de septiembre de 2020	$ 1,534,758.06	$ 3,623,805.04	3	1.66%	3.92%
13 de septiembre de 2020	$ 6,754,101.61	$ 10,377,906.65	4	7.32%	11.24%
20 de septiembre de 2020	$ 9,913,365.27	$ 20,291,271.92	5	10.74%	21.98%
27 de septiembre de 2020	$ 7,420,944.49	$ 27,712,216.41	6	8.04%	30.01%
4 de octubre de 2020	$ 5,033,439.87	$ 32,745,656.28	7	5.45%	35.47%
11 de octubre de 2020	$ 8,347,753.35	$ 41,093,409.63	8	9.04%	44.51%
18 de octubre de 2020	$ 13,817,417.10	$ 54,910,826.73	9	14.97%	59.47%
25 de octubre de 2020	$ 8,743,830.89	$ 63,654,657.62	10	9.47%	68.94%
1 de noviembre de 2020	$ 3,586,271.74	$ 67,240,929.36	11	3.88%	72.83%
8 de noviembre de 2020	$ 24,931,404.60	$ 92,172,333.96	12	27.00%	99.83%
16 de noviembre de 2020	$ 156,262.33	$ 92,328,596.29	13	0.17%	100.00%
TOTAL	**$ 92,328,596.29**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 10 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 de octubre de 2020	Y EL	25 de octubre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

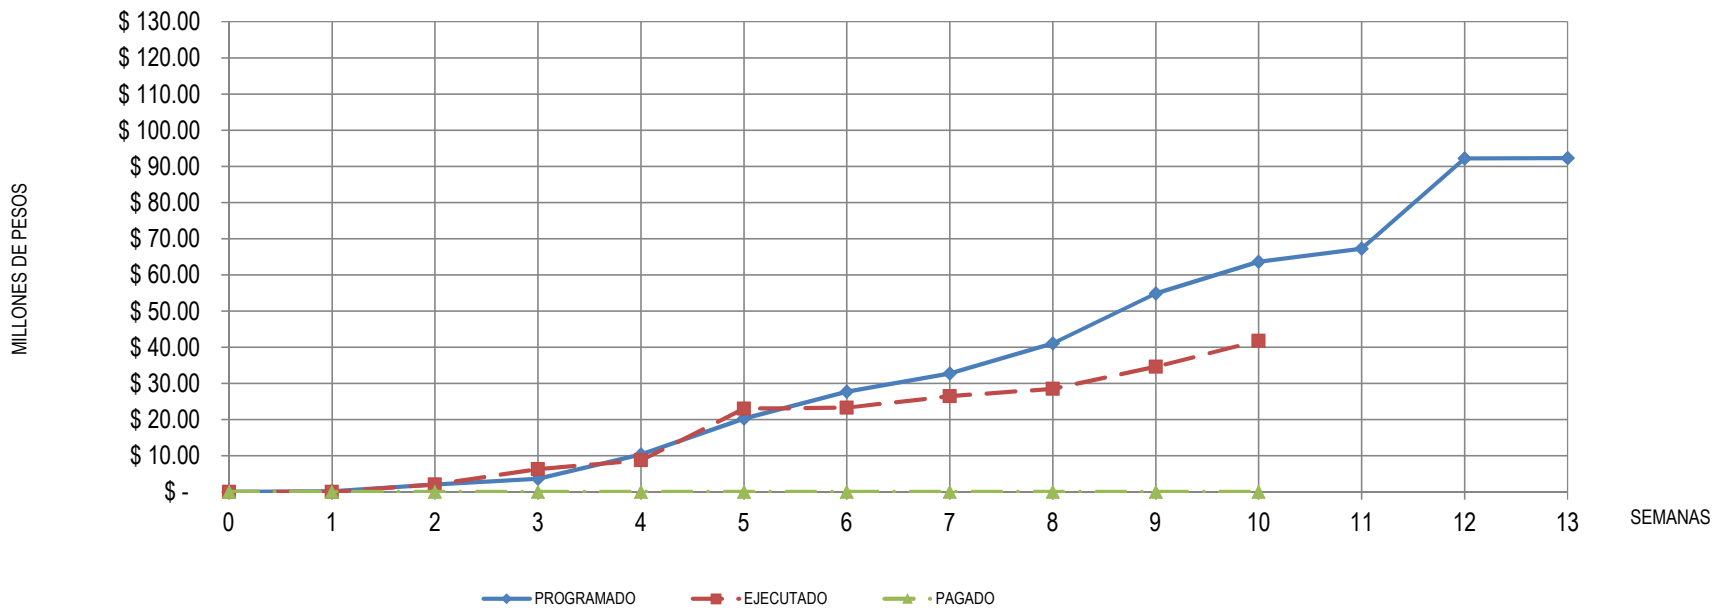

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME GRÁFICO SEMANAL # 11	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS	3.18%	3.04%	MEDIACAÑA Y CENEFA	MEDIACAÑA EN GRANITO, INSTALADA EN BATERIAS SANITARIAS PISO Y SOTANO
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES		0.30%	ENCHAPE SOBRE MUROS	INSTALACION DE CENEFA EN BATERIA SANITARIA PISO 1
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS	0.13%			
26	ITEMS NO PREVISTOS				
TOTALES		**3.18%**	**3.34%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 11**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 92,328,596	$ 44,867,517	**$ 47,461,079**		3.34%	48.60%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	3
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

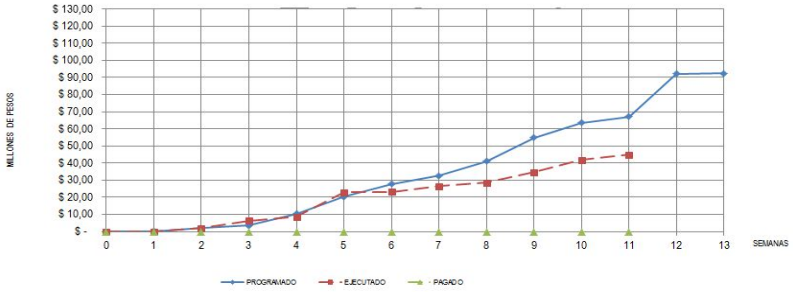

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realizo la instalacion de guarda escoba en mediacaña en granito en baterias sanitarias del piso 1 y sotano.
Se instalo cenefa en ceramica en bateria sanitaria del piso 1.
Se instalo cenefa en granito pulido en baterias sanitarias del piso 1 y sotano.
Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.
Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRIGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



INSTALACION DE CENEFA EN CERAMICA - BATERIA SANITARIA PISO 1



INSTALACION DE CENEFA EN CERAMICA - BATERIA SANITARIA PISO 1



INSTALACION DE CENEFA EN CERAMICA - BATERIA SANITARIA PISO 1



INSTALACION DE CENEFA EN CERAMICA - BATERIA SANITARIA PISO 1



INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO - BATERIA SANITARIA SOTANO



INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO - BATERIA SANITARIA PISO 1

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23 de agosto de 2020	$ 177,759.69	$ 177,759.69	1	0.19%	0.19%
30 de agosto de 2020	$ 1,911,287.29	$ 2,089,046.98	2	2.07%	2.26%
6 de septiembre de 2020	$ 1,534,758.06	$ 3,623,805.04	3	1.66%	3.92%
13 de septiembre de 2020	$ 6,754,101.61	$ 10,377,906.65	4	7.32%	11.24%
20 de septiembre de 2020	$ 9,913,365.27	$ 20,291,271.92	5	10.74%	21.98%
27 de septiembre de 2020	$ 7,420,944.49	$ 27,712,216.41	6	8.04%	30.01%
4 de octubre de 2020	$ 5,033,439.87	$ 32,745,656.28	7	5.45%	35.47%
11 de octubre de 2020	$ 8,347,753.35	$ 41,093,409.63	8	9.04%	44.51%
18 de octubre de 2020	$ 13,817,417.10	$ 54,910,826.73	9	14.97%	59.47%
25 de octubre de 2020	$ 8,743,830.89	$ 63,654,657.62	10	9.47%	68.94%
1 de noviembre de 2020	$ 3,586,271.74	$ 67,240,929.36	11	3.88%	72.83%
8 de noviembre de 2020	$ 24,931,404.60	$ 92,172,333.96	12	27.00%	99.83%
16 de noviembre de 2020	$ 156,262.33	$ 92,328,596.29	13	0.17%	100.00%
TOTAL	**$ 92,328,596.29**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	11	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	26 de octubre de 2020	Y EL	1 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

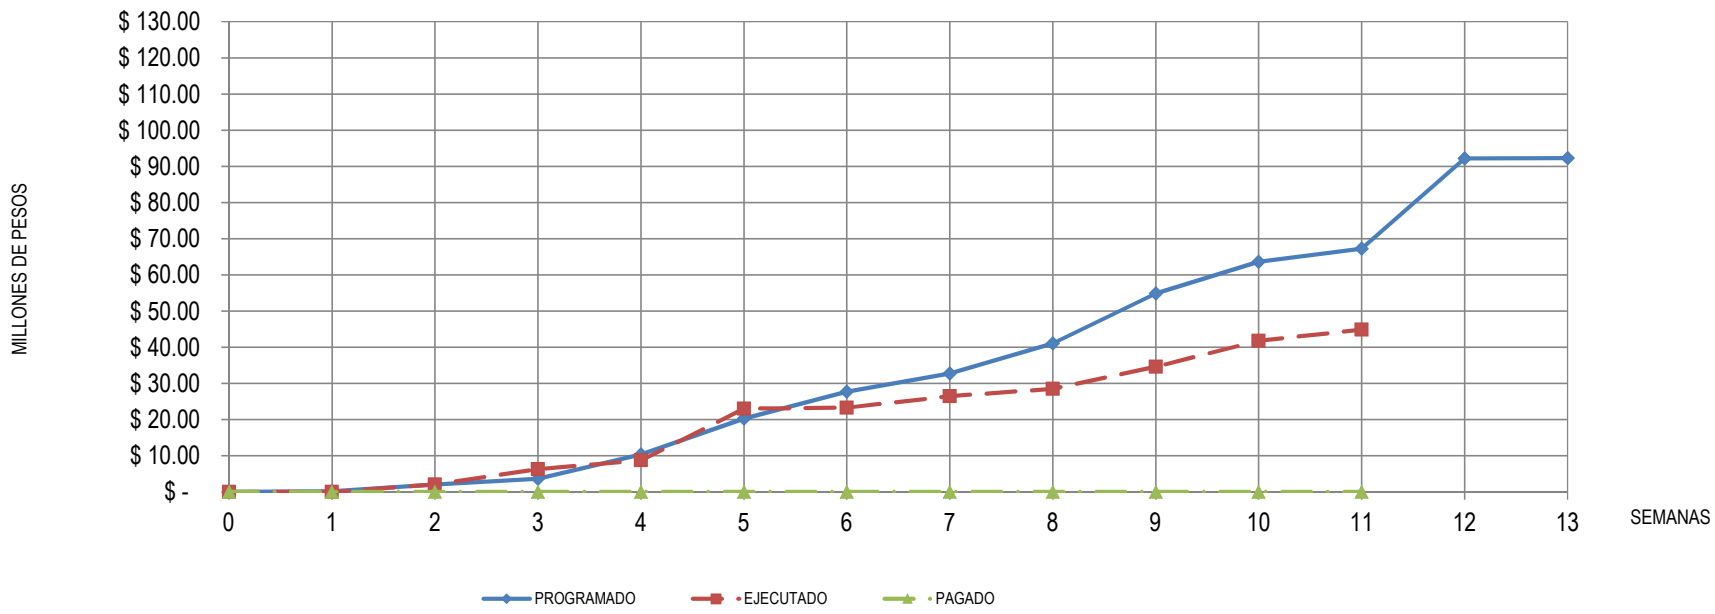

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME GRÁFICO SEMANAL # 12	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA		0.04%	MAMPOSTERIA	INSTALADA PARA SOPORTE DE MESON DE BATERIA SANITARIA DE SOTANO
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		0.42%	PREFABRICADO EN CONCRETO	MESON FUNDIDO EN BATERIA SANITARIA DE SOTANO
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES		0.06%	PAÑETES	PAÑETE INSTALADO SOBRE LOS MUROS DEL MESON FUNDIDO EN BATERIA SANITARIA DE SOTANO
10	PISOS				
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	18.06%			
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES	8.63%			
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS	0.31%			
26	ITEMS NO PREVISTOS				
TOTALES		**27.00%**	**0.52%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 12**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 92,328,596	$ 45,345,694	**$ 46,982,902**		0.52%	49.11%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

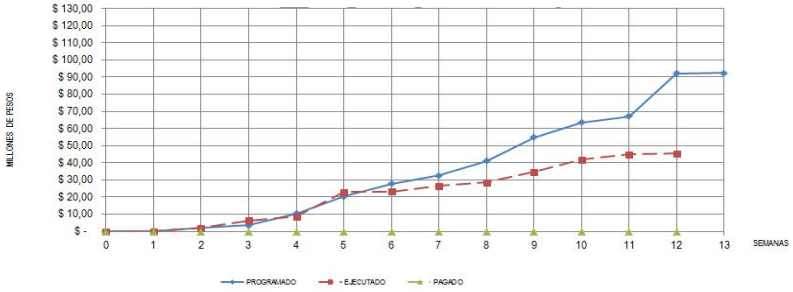

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realizo la fundida del meson en bateria sanitaria del sotano.
Durante el transcurso de esta semana se realizo remates en los enchapes de las baterias sanitarias, a la fecha no se ha terminado la actividad de enchapes en las baterias sanitarias.
Se solicita al contratista el incremento de personal para no generar retrasos en este frente de obra.
Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.
Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRIGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA



MAMPOSTERIA PARA SOPORTE DE MESON FUNDIDO EN BATERIA SANITARIA DE PROFESORES



MAMPOSTERIA PARA SOPORTE DE MESON FUNDIDO EN BATERIA SANITARIA DE PROFESORES



FORMALETA PARA MESON - BATERIA SANITARIA SOTANO



MESON FUNDIDO EN CONCRETO - BATERIA SANITARIA SOTANO



MESON FUNDIDO EN CONCRETO - BATERIA SANITARIA SOTANO



REMATES EN ENCHAPES DE BATERIAS SANITARIAS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23 de agosto de 2020	$ 177,759.69	$ 177,759.69	1	0.19%	0.19%
30 de agosto de 2020	$ 1,911,287.29	$ 2,089,046.98	2	2.07%	2.26%
6 de septiembre de 2020	$ 1,534,758.06	$ 3,623,805.04	3	1.66%	3.92%
13 de septiembre de 2020	$ 6,754,101.61	$ 10,377,906.65	4	7.32%	11.24%
20 de septiembre de 2020	$ 9,913,365.27	$ 20,291,271.92	5	10.74%	21.98%
27 de septiembre de 2020	$ 7,420,944.49	$ 27,712,216.41	6	8.04%	30.01%
4 de octubre de 2020	$ 5,033,439.87	$ 32,745,656.28	7	5.45%	35.47%
11 de octubre de 2020	$ 8,347,753.35	$ 41,093,409.63	8	9.04%	44.51%
18 de octubre de 2020	$ 13,817,417.10	$ 54,910,826.73	9	14.97%	59.47%
25 de octubre de 2020	$ 8,743,830.89	$ 63,654,657.62	10	9.47%	68.94%
1 de noviembre de 2020	$ 3,586,271.74	$ 67,240,929.36	11	3.88%	72.83%
8 de noviembre de 2020	$ 24,931,404.60	$ 92,172,333.96	12	27.00%	99.83%
16 de noviembre de 2020	$ 156,262.33	$ 92,328,596.29	13	0.17%	100.00%
TOTAL	**$ 92,328,596.29**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 12 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	12	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	2 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

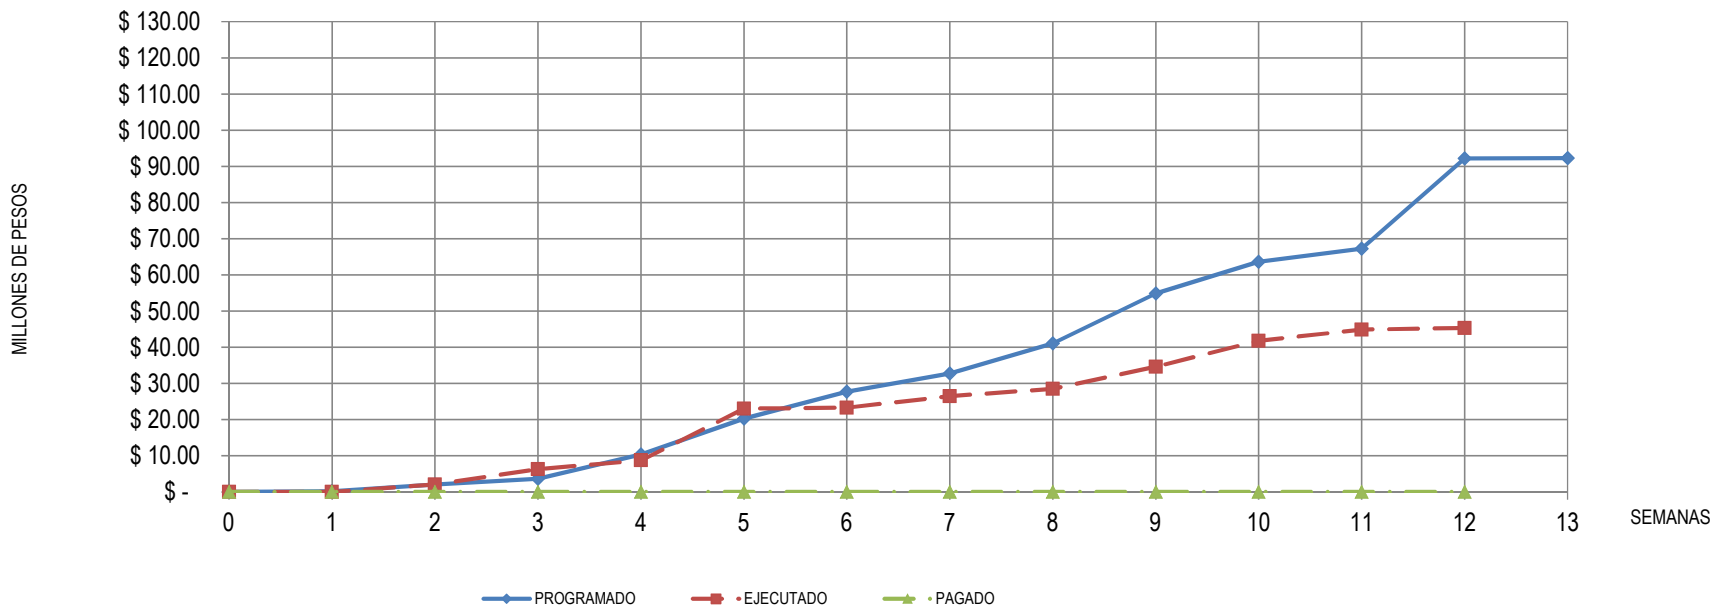

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	13	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	16-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES				
2	CIMENTACIÓN		0.03%	PLACA DE CONTRAPISO Y MALLA	SE REALIZA FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO CON MALLA ELECTROSOLDAD EN BAÑO DE PROFESORES
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA		0.04%	MAMPOSTERIA MESON	MUROS MESON LAVAMANOS PISO 2
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		0.25%	MESON EN CONCRETO	MESONES LAVAMANOS
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES		0.06%		PAÑETE MUROS MESONES
10	PISOS		1.77%	MEDIACAÑAS Y CENEFAS	MEDICAÑAS PISO Y CENEFAS BOCAPUERTA
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES		2.16%	ENCHAPE CENEFAS	ENCHAPE CENEFA BATERIAS DE BAÑOS
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELO RASOS Y DIVISIONES		2.00%	CIELO RASO	CIELO RASO SOTANO Y PISO 2
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS	0.14%			
26	ITEMS NO PREVISTOS				
TOTALES		**0.14%**	**6.31%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 13**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ECOBAR SEDE B (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	13	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	16-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 92,328,596	$ 51,169,702	**$ 41,158,895**		6.31%	55.42%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	2
MAESTRO	1	OFICIALES	3
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	4
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	0
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

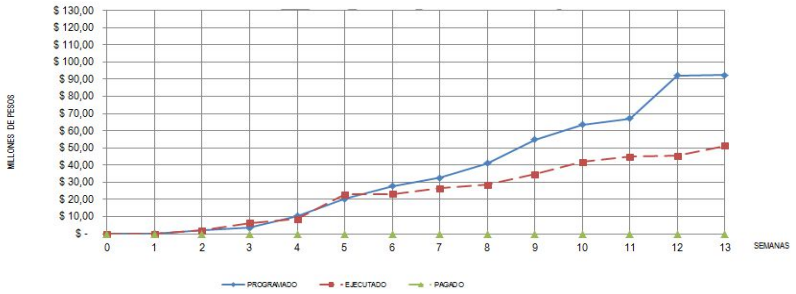

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza fundida de placa con malla electrosoldad en baño de profesores.

Construcción de mesones para lavamanos sotano y piso 2, se instala cenefa en todas la baterias de baños y se instala cielo raso en sotano y piso 2.

De acuerdo a la programación inicial entregada por el contratista las actividades en este frente de obra debieron terminar el 16 de noviembre de 2020, sin embargo falta la instalación de todos los aparatos y accesorios sanitarios, puertas, lamparas pintura general ya se solo se aplico una mano, pintura en carpinteria metalica y aseo general.

De acuerdo al presupuesto actualizado entregado por el contratista se realizaron observaciones igualmente a la programación y el flujo de inversión, el contratista debio de entregar estas correcciones el miercoles 11 de noviembre de 2020, sin embargo a la fecha de corte de este informe no han sido recibidas.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRIGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 13



INSTALACION DE MESONES EN CONCRETO



INTALACION DE CENEFAS EN BATERIAS SANITARIAS



INSTALACION DE CIELO RASO EN BATERIA SANITARIA DEL SOTANO



INSTALACION DE CIELO RASO N BATERIA SANITARIA DEL PISO 2



INSTALACION DE WIN EN MUROS DIVISORIOS DE BATERIAS SANITARIAS



INSTALACION DE CENEFA EN BATRIAS SANITARIAS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23 de agosto de 2020	$ 177,759.69	$ 177,759.69	1	0.19%	0.19%
30 de agosto de 2020	$ 1,911,287.29	$ 2,089,046.98	2	2.07%	2.26%
6 de septiembre de 2020	$ 1,534,758.06	$ 3,623,805.04	3	1.66%	3.92%
13 de septiembre de 2020	$ 6,754,101.61	$ 10,377,906.65	4	7.32%	11.24%
20 de septiembre de 2020	$ 9,913,365.27	$ 20,291,271.92	5	10.74%	21.98%
27 de septiembre de 2020	$ 7,420,944.49	$ 27,712,216.41	6	8.04%	30.01%
4 de octubre de 2020	$ 5,033,439.87	$ 32,745,656.28	7	5.45%	35.47%
11 de octubre de 2020	$ 8,347,753.35	$ 41,093,409.63	8	9.04%	44.51%
18 de octubre de 2020	$ 13,817,417.10	$ 54,910,826.73	9	14.97%	59.47%
25 de octubre de 2020	$ 8,743,830.89	$ 63,654,657.62	10	9.47%	68.94%
1 de noviembre de 2020	$ 3,586,271.74	$ 67,240,929.36	11	3.88%	72.83%
8 de noviembre de 2020	$ 24,931,404.60	$ 92,172,333.96	12	27.00%	99.83%
16 de noviembre de 2020	$ 156,262.33	$ 92,328,596.29	13	0.17%	100.00%
TOTAL	**$ 92,328,596.29**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 13 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	13	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	9 de noviembre de 2020	Y EL	16 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

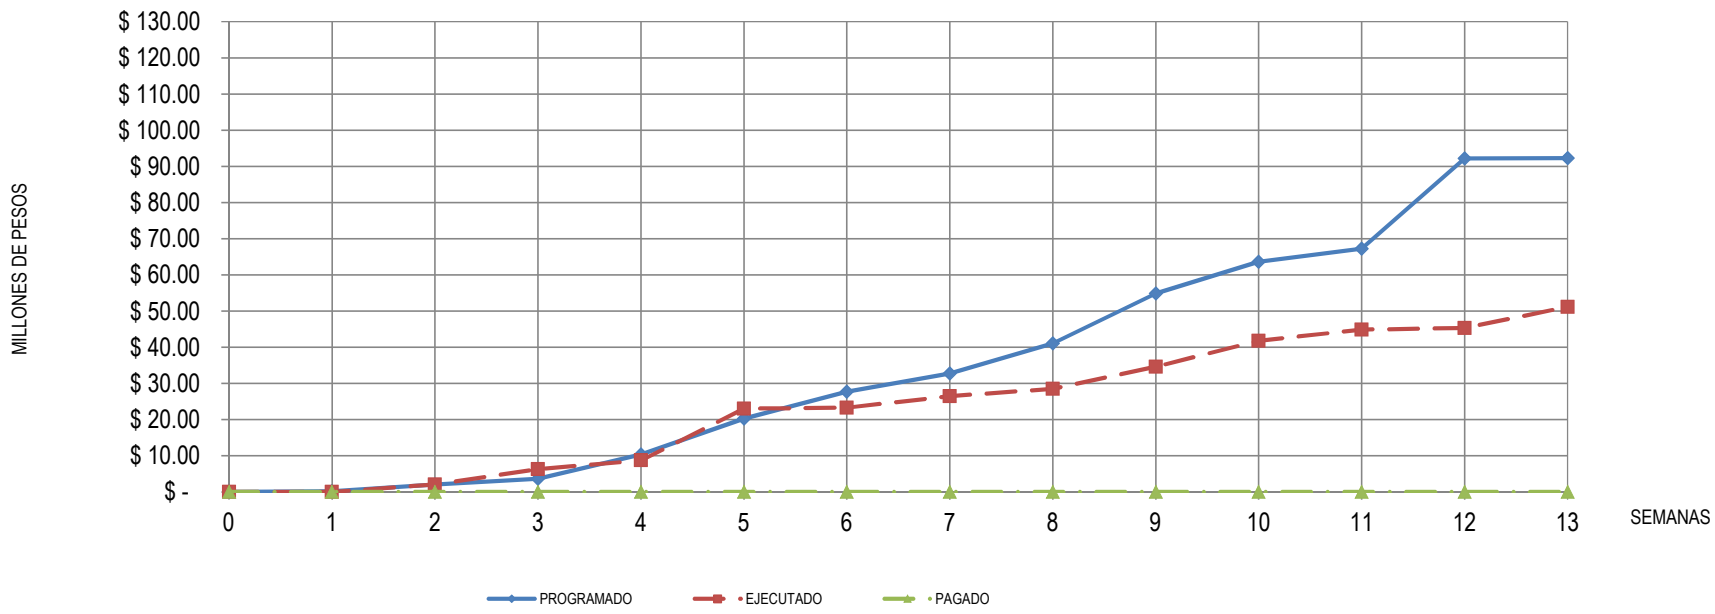

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 10**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		0.25%	PRELIMINARES	DESMONTE DE TANQUES ELEVADOS
2	CIMENTACIÓN		0.30%	CIMENTACION	PLACA CONTRAPISO
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES	0.09%			
9	PAÑETES				
10	PISOS	1.48%	4.25%	PISOS	INSTALACION DE BALDOSIN GRANITO BH-5
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	0.66%	0.87%	CUBIERTAS	DESMONTE DE CUBIERTA
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES	2.73%			
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS				
26	NO PREVISTOS				
TOTALES		**4.96%**	**5.67%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 10**	**VERSIÓN 01**
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	10	**DEL**	19-Oct-20	**AL**	25-Oct-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 109,561,156	$ 29,982,878	**$ 79,578,278**		5.67%	27.37%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	2
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	1
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

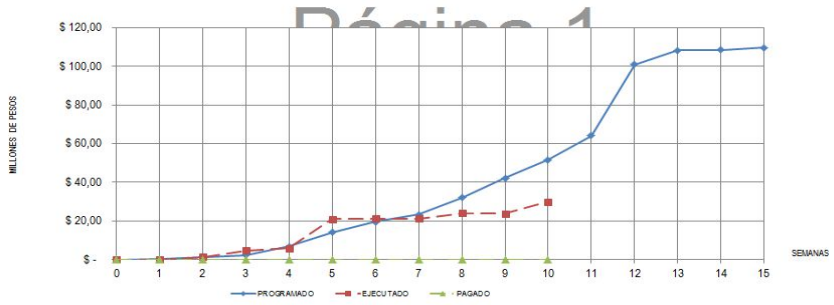

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza desmonte de tanques.

Se funde placa de contrapiso baño de profesores.

Se realiza afinado de pisos e incia la instalación de baldosa en granito.

Se inicia desmonte de teja ondulada.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 10



DESMONTE DE TANQUES



PLACA DE CONTRAPISO - BAÑO PROFESORES



BALDOSIN GRANITO BH-5 - BAÑO NIÑAS



BALDOSIN GRANITO BH-5 - BAÑO NIÑOS



MEDIACAÑA EN GRANITO - BAÑOS NIÑAS Y NIÑOS



DESMONTE DE CUBIERTA

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23-Aug-20	$ 121,587.77	$ 121,587.77	1	0.11%	0.11%
30-Aug-20	$ 1,151,100.09	$ 1,272,687.86	2	1.05%	1.16%
6-Sep-20	$ 1,095,230.87	$ 2,367,918.73	3	1.00%	2.16%
13-Sep-20	$ 4,352,625.04	$ 6,720,543.77	4	3.97%	6.13%
20-Sep-20	$ 7,407,769.04	$ 14,128,312.81	5	6.76%	12.90%
27-Sep-20	$ 5,380,535.36	$ 19,508,848.17	6	4.91%	17.81%
4-Oct-20	$ 3,701,685.92	$ 23,210,534.09	7	3.38%	21.19%
11-Oct-20	$ 8,909,840.76	$ 32,120,374.85	8	8.13%	29.32%
18-Oct-20	$ 9,959,683.50	$ 42,080,058.35	9	9.09%	38.41%
25-Oct-20	$ 9,570,200.26	$ 51,650,258.61	10	8.74%	47.14%
1-Nov-20	$ 12,561,692.54	$ 64,211,951.15	11	11.47%	58.61%
8-Nov-20	$ 36,611,294.35	$ 100,823,245.50	12	33.42%	92.02%
15-Nov-20	$ 7,294,617.10	$ 108,117,862.60	13	6.66%	98.68%
22-Nov-20	$ 252,637.52	$ 108,370,500.12	14	0.23%	98.91%
30-Nov-20	$ 1,190,655.77	$ 109,561,155.89	15	1.09%	100.00%
TOTAL	**$ 109,561,155.89**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 10 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	19 de octubre de 2020	Y EL	25 de octubre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

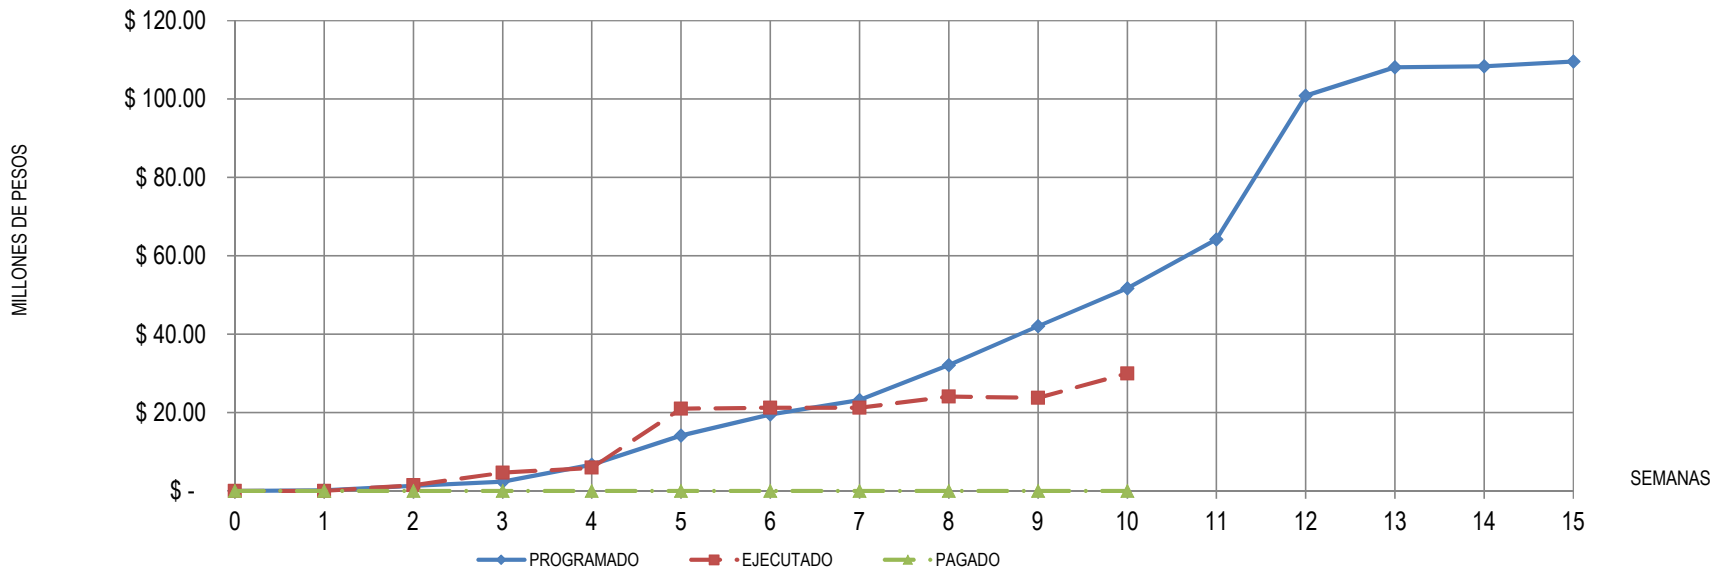

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 11**	**VERSIÓN 01**
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES	0.02%	0.10%	DESMONTES	DESMONTE DE LAMPARAS - UBICADAS EN SALONES Y OFICINA DE ORIENTACION
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA		0.26%	MAMPOSTERIA	INSTALADA EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		0.20%	MESONES	INSTALADOS EN BATERIAS SANITARIAS DE NIÑAS Y NIÑOS
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS	1.44%			
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	4.92%			
12	CARPINTERIA METALICA	0.71%			
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	4.30%			
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES				
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS				
26	NO PREVISTOS				
TOTALES		**11.39%**	**0.56%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 11**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	11	**DEL**	26-Oct-20	**AL**	1-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 109,561,156	$ 30,600,810	**$ 78,960,346**		0.56%	27.93%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	2
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	1
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

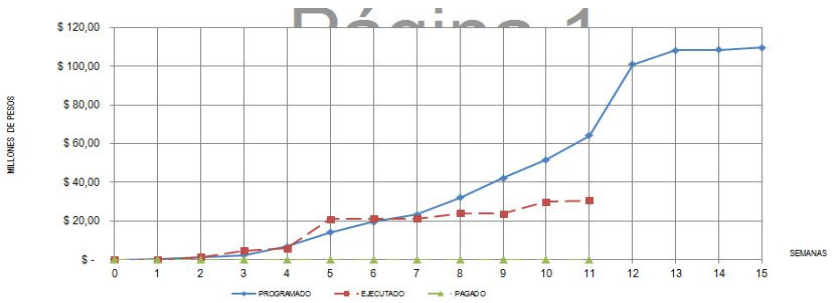

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se hace el desmonte de lamparas ubicadas en el edificio de aulas y oficina de orientacion.

Se hace la instalacion de mamposteria en edificio de aulas y oficina de orientacion para instalacion de estructura metalica de cubierta

Se hace la instalacion de mesones en baterias sanitarias de niñas y niños

Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 11



INSTALACION DE MESON - UBICADO EN BATERIA SANITARIA DE NIÑAS



INSTALACION DE MESON - UBICADO EN BATERIA SANITARIA DE NIÑOS



INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA



INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA



DESMONTE DE LAMPARAS - UBICADAS EN BLOQUE DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION



INSTALACION EN CURSO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23-Aug-20	$ 121,587.77	$ 121,587.77	1	0.11%	0.11%
30-Aug-20	$ 1,151,100.09	$ 1,272,687.86	2	1.05%	1.16%
6-Sep-20	$ 1,095,230.87	$ 2,367,918.73	3	1.00%	2.16%
13-Sep-20	$ 4,352,625.04	$ 6,720,543.77	4	3.97%	6.13%
20-Sep-20	$ 7,407,769.04	$ 14,128,312.81	5	6.76%	12.90%
27-Sep-20	$ 5,380,535.36	$ 19,508,848.17	6	4.91%	17.81%
4-Oct-20	$ 3,701,685.92	$ 23,210,534.09	7	3.38%	21.19%
11-Oct-20	$ 8,909,840.76	$ 32,120,374.85	8	8.13%	29.32%
18-Oct-20	$ 9,959,683.50	$ 42,080,058.35	9	9.09%	38.41%
25-Oct-20	$ 9,570,200.26	$ 51,650,258.61	10	8.74%	47.14%
1-Nov-20	$ 12,561,692.54	$ 64,211,951.15	11	11.47%	58.61%
8-Nov-20	$ 36,611,294.35	$ 100,823,245.50	12	33.42%	92.02%
15-Nov-20	$ 7,294,617.10	$ 108,117,862.60	13	6.66%	98.68%
22-Nov-20	$ 252,637.52	$ 108,370,500.12	14	0.23%	98.91%
30-Nov-20	$ 1,190,655.77	$ 109,561,155.89	15	1.09%	100.00%
TOTAL	**$ 109,561,155.89**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 11 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01
		Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	11	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	26 de octubre de 2020	Y EL	1 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

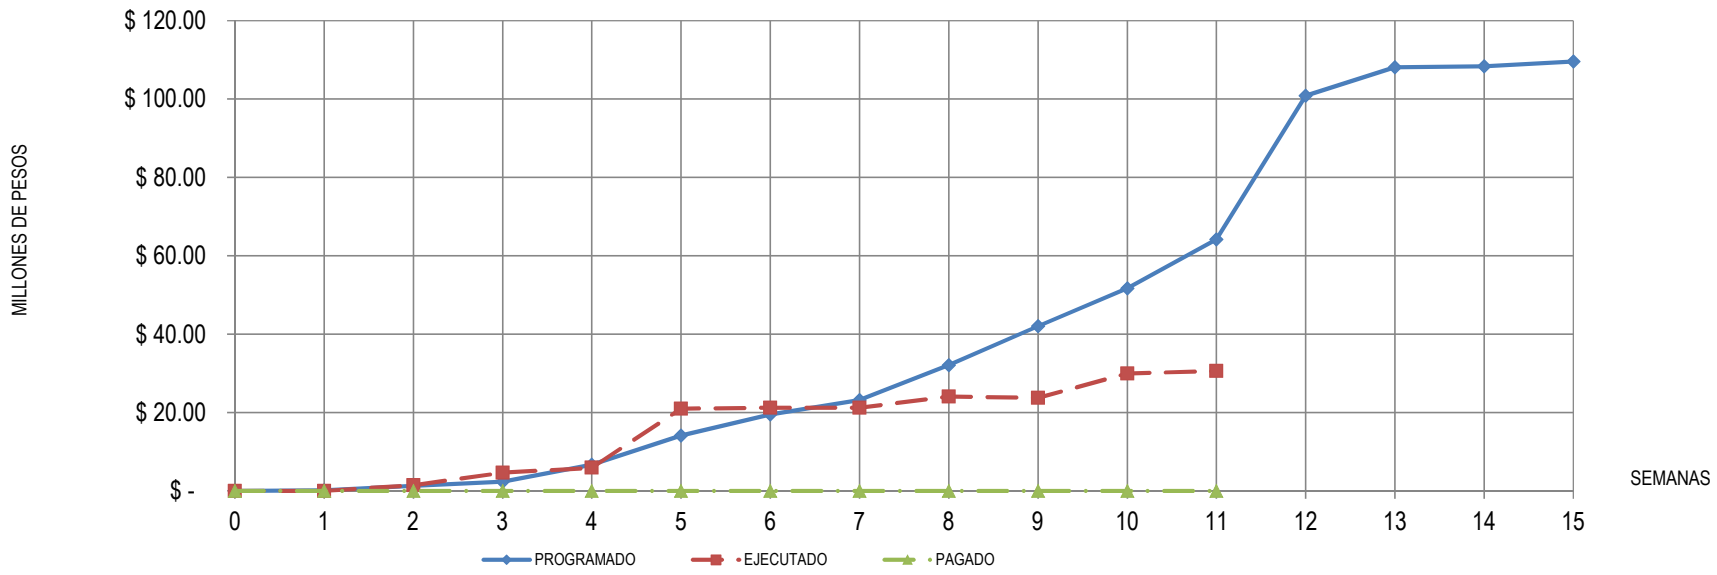

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 12**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES	0.10%			
2	CIMENTACIÓN				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
5	MAMPOSTERÍA		0.21%	MAMPOSTERIA	INSTALADA EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	18.09%	12.20%	DESMONTE DE CUBIERTA	CORRESPONDE AL DESMONTE TOTAL DE TEJA DE ASBESTO EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION
12	CARPINTERIA METALICA	0.57%			
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	10.17%			
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	4.30%			
18	PINTURA				
21	ASEO Y VARIOS	0.19%			
26	NO PREVISTOS				
TOTALES		**33.42%**	**12.41%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 12**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	12	**DEL**	2-Nov-20	**AL**	8-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 109,561,156	$ 44,145,822	**$ 65,415,334**		12.41%	40.29%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	0
MAESTRO	1	OFICIALES	
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

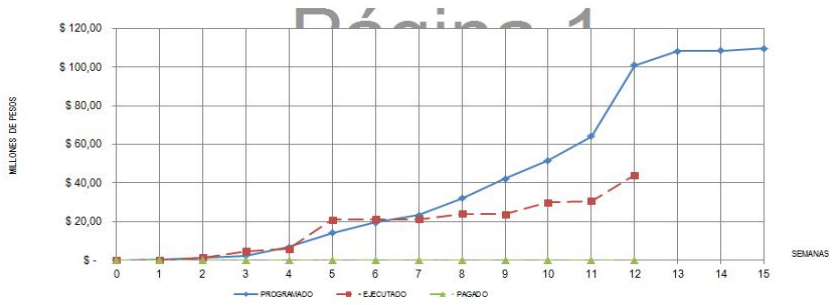

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se hace el desmonte total de tejade asbesto

Continua actividad de mamposteria en edificio de aulas para estructura metalica

Durante la actividad de demolicion para apertura de ventana en oficina de orientacion, se encuentra una viga, se replantela la ubicación de la ventana para dar mayor luminosidad a la oficina de orientacion

Se esta a la espera que el contratista realice la entrega del presupuesto actualizado de acuerdo a las nuevas activiades solicitadas e igualmente de la programación y el flujo de inversión.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 12



SE REALIZA EL DESMONTE TOTAL DE LA CUBIERTA DE ASBESTO EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION



MAMPOSTERIA EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION



MAMPOSTERIA EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION



APERTURA DE VENTANA - OFICINA DE ORIENTACION

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23-Aug-20	$ 121,587.77	$ 121,587.77	1	0.11%	0.11%
30-Aug-20	$ 1,151,100.09	$ 1,272,687.86	2	1.05%	1.16%
6-Sep-20	$ 1,095,230.87	$ 2,367,918.73	3	1.00%	2.16%
13-Sep-20	$ 4,352,625.04	$ 6,720,543.77	4	3.97%	6.13%
20-Sep-20	$ 7,407,769.04	$ 14,128,312.81	5	6.76%	12.90%
27-Sep-20	$ 5,380,535.36	$ 19,508,848.17	6	4.91%	17.81%
4-Oct-20	$ 3,701,685.92	$ 23,210,534.09	7	3.38%	21.19%
11-Oct-20	$ 8,909,840.76	$ 32,120,374.85	8	8.13%	29.32%
18-Oct-20	$ 9,959,683.50	$ 42,080,058.35	9	9.09%	38.41%
25-Oct-20	$ 9,570,200.26	$ 51,650,258.61	10	8.74%	47.14%
1-Nov-20	$ 12,561,692.54	$ 64,211,951.15	11	11.47%	58.61%
8-Nov-20	$ 36,611,294.35	$ 100,823,245.50	12	33.42%	92.02%
15-Nov-20	$ 7,294,617.10	$ 108,117,862.60	13	6.66%	98.68%
22-Nov-20	$ 252,637.52	$ 108,370,500.12	14	0.23%	98.91%
30-Nov-20	$ 1,190,655.77	$ 109,561,155.89	15	1.09%	100.00%
TOTAL	**$ 109,561,155.89**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 12 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	12	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	2 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

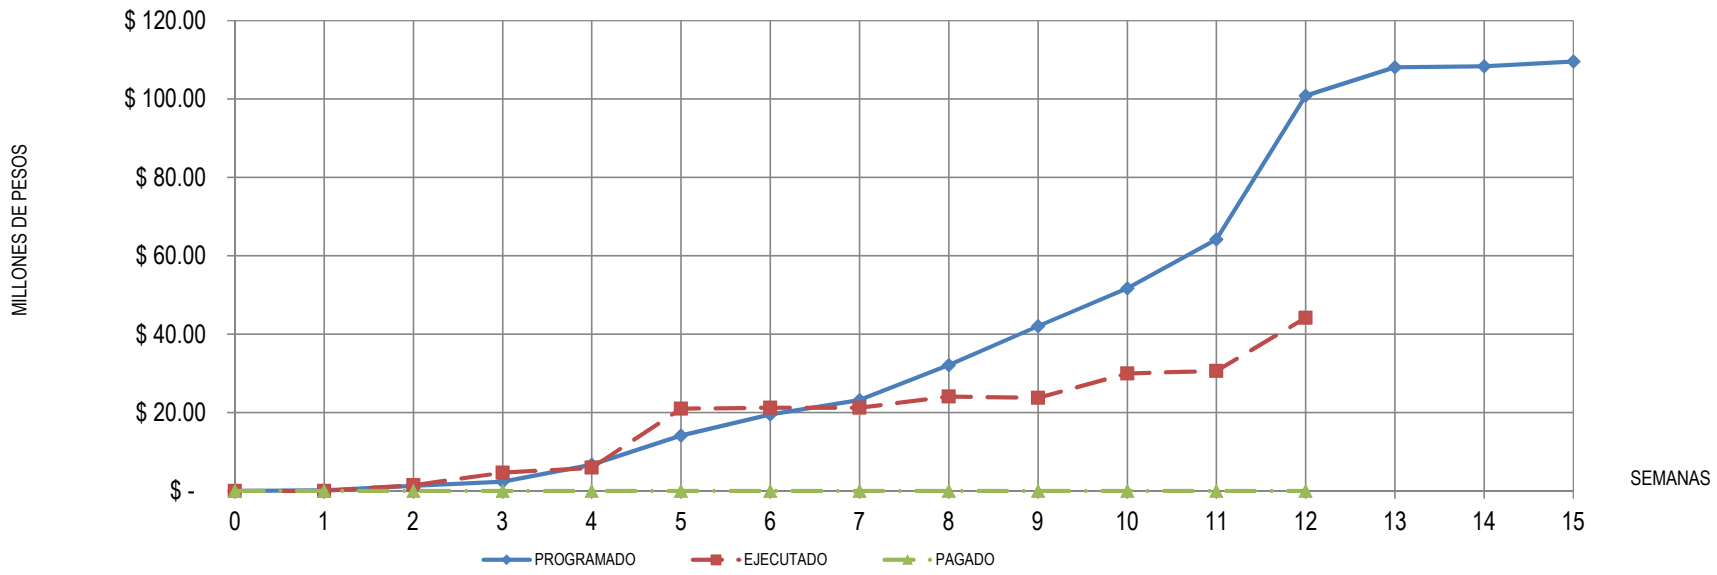

BOGOTÁ Secretaría de Educación	INFORME GRÁFICO SEMANAL # 13	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	13	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES	0.25%	0.50%	DESMONTES	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION
2	CIMENTACIÓN		0.05%	INSTALACION	MALLA ELECTROSOLDADA PARA CONSTRUCCION DE ANDEN
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	ESTRUCTURA		0.31%	ELEMENTOS HORIZANTALES	VIGA AEREA
5	MAMPOSTERÍA		0.20%	MAMPOSTERIA	INSTALADA PARA CONSTRUCCION DE CUBIERTA
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS		0.05%	MESONES EN CONCRETO	INSTALADOS EN BATERIAS SANITARIAS
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES		0.19%	FILOS	FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS
10	PISOS		0.09%	CENEFAS EN GRANITO	INSTALADOS EN BATERIAS SANITARIAS
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES	2.72%			
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES		0.62%	CENEFAS	INSTALADAS EN BATERIAS SANITARIAS
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES	3.44%			
18	PINTURA				
19	OBRAS EXTERIORES		0.79%	OBRAS EXTERIORES	CONSTRUCCION DE ANDEN
21	ASEO Y VARIOS	0.25%			
26	NO PREVISTOS				
TOTALES		**6.66%**	**2.80%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME GRÁFICO SEMANAL # 13**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE C (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	13	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20


3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 109,561,156	$ 47,208,101	**$ 62,353,055**		2.80%	43.09%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
		PINTORES	1
MAESTRO	1	OFICIALES	4
ELECTRICISTA	0	AYUDANTES	8
AYU. DE ELECTRICIDAD	0	ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO	0	RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS	0		

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

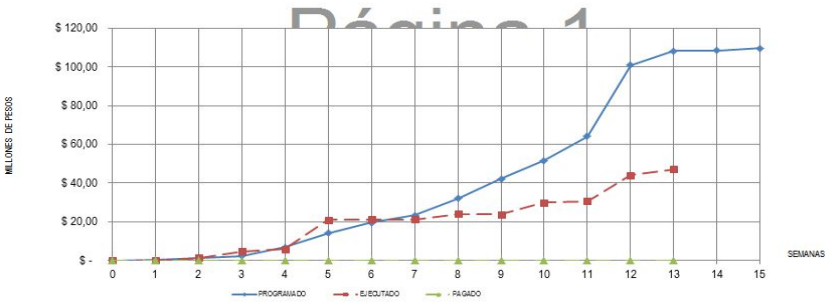

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realizo la construccion de anden ubicado frente al edificio de aulas y oficina de orientacion.

Se termino de instalar la mamposteria para construccion de cubierta.

Se hade construccion de viga de amarre en cubierta.

Se hace instalacion de cenefa en baterias sanitarias.

De acuerdo al presupuesto actualizado entregado por el contratista se realizaron observaciones igualmente a la programación y el flujo de inversión, el contratista debio de entregar estas correcciones el miercoles 11 de noviembre de 2020, sin embargo a la fecha de corte de este informe no han sido recibidas.

Se continuan realizando los informes con el presupuesto y programación inicial.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 13



DSMONTE DE VENTANAS Y PUERTAS EN EDIFICIO DE AULAS Y OFICINA DE ORIENTACION



DEMOLICION DE ANDEN EXISTENTE



OBRA EXTERIOR - CONSTRUCCION DE ANDEN



MAMPOSTERIA Y VIGA AEREA PARA CUBIERTA



INSTALACION DE CENEFAS EN BATERIAS SANITARIAS

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
23-Aug-20	$ 121,587.77	$ 121,587.77	1	0.11%	0.11%
30-Aug-20	$ 1,151,100.09	$ 1,272,687.86	2	1.05%	1.16%
6-Sep-20	$ 1,095,230.87	$ 2,367,918.73	3	1.00%	2.16%
13-Sep-20	$ 4,352,625.04	$ 6,720,543.77	4	3.97%	6.13%
20-Sep-20	$ 7,407,769.04	$ 14,128,312.81	5	6.76%	12.90%
27-Sep-20	$ 5,380,535.36	$ 19,508,848.17	6	4.91%	17.81%
4-Oct-20	$ 3,701,685.92	$ 23,210,534.09	7	3.38%	21.19%
11-Oct-20	$ 8,909,840.76	$ 32,120,374.85	8	8.13%	29.32%
18-Oct-20	$ 9,959,683.50	$ 42,080,058.35	9	9.09%	38.41%
25-Oct-20	$ 9,570,200.26	$ 51,650,258.61	10	8.74%	47.14%
1-Nov-20	$ 12,561,692.54	$ 64,211,951.15	11	11.47%	58.61%
8-Nov-20	$ 36,611,294.35	$ 100,823,245.50	12	33.42%	92.02%
15-Nov-20	$ 7,294,617.10	$ 108,117,862.60	13	6.66%	98.68%
22-Nov-20	$ 252,637.52	$ 108,370,500.12	14	0.23%	98.91%
30-Nov-20	$ 1,190,655.77	$ 109,561,155.89	15	1.09%	100.00%
TOTAL	**$ 109,561,155.89**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 13 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	13	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	9 de noviembre de 2020	Y EL	15 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

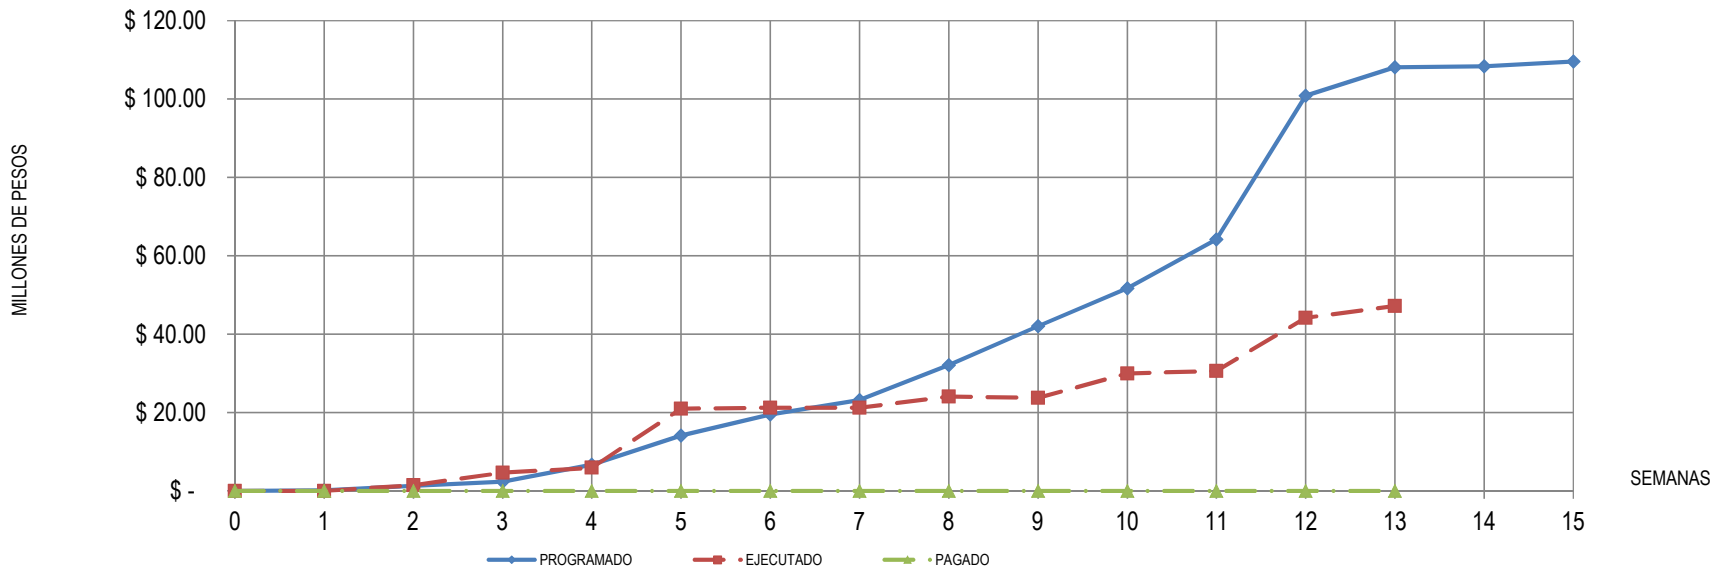

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 1**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	1	**DEL**	6-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		0.37%	DESMONTE	DESMONTE DE PUERTAS Y DIVISIONES DE BAÑO
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	MAMPOSTERÍA				
5	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
6	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
7	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
8	PAÑETES				
9	PISOS				
10	CARPINTERIA METALICA				
11	ENCHAPES				
12	ILUMINACIÓN				
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
14	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
15	PINTURA				
16	CERRADURAS Y VIDRIOS				
17	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**0.00%**	**0.37%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 1**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	1	**DEL**	6-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

3. RESUMEN FINANCIERO


BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 132,006,993	$ 489,296	**$ 131,517,696**		0.37%	0.37%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	
ELECTRICISTA		AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	
SISOMA			
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

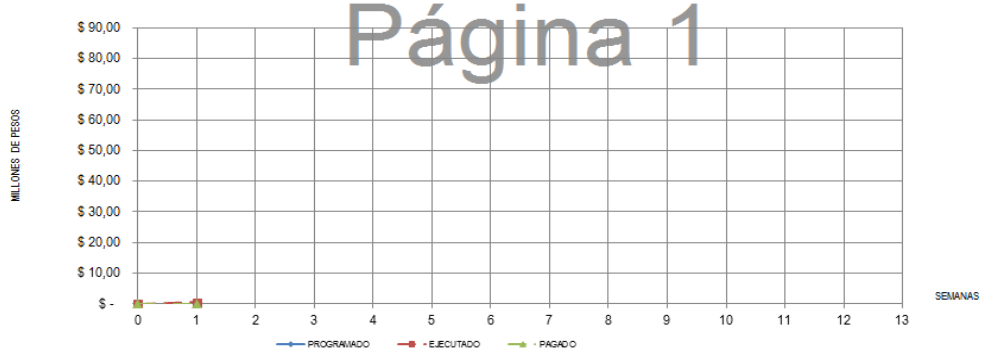

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se iniciaron actividades el 6 de noviembre de 2020
Se realiza la implementación del Protocolo de Bioseguridad.
Se realizo el desmonte de puertas y divisiones de baño.
No se ha entregado programación ni flujo de inversión.
Se realiza la curva con solo valores ejecutados.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01



IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD




IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



DESMONTE DE PUERTAS Y DIVISIONES EN BATERIAS DE BAÑOS.

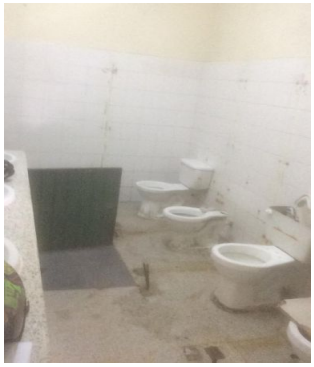

DESMONTE DE PUERTAS Y DIVISIONES EN BATERIAS DE BAÑOS.



PUERTAS Y DIVISIONES DEMONTADAS.

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
TOTAL	**$** -				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 1 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	6 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

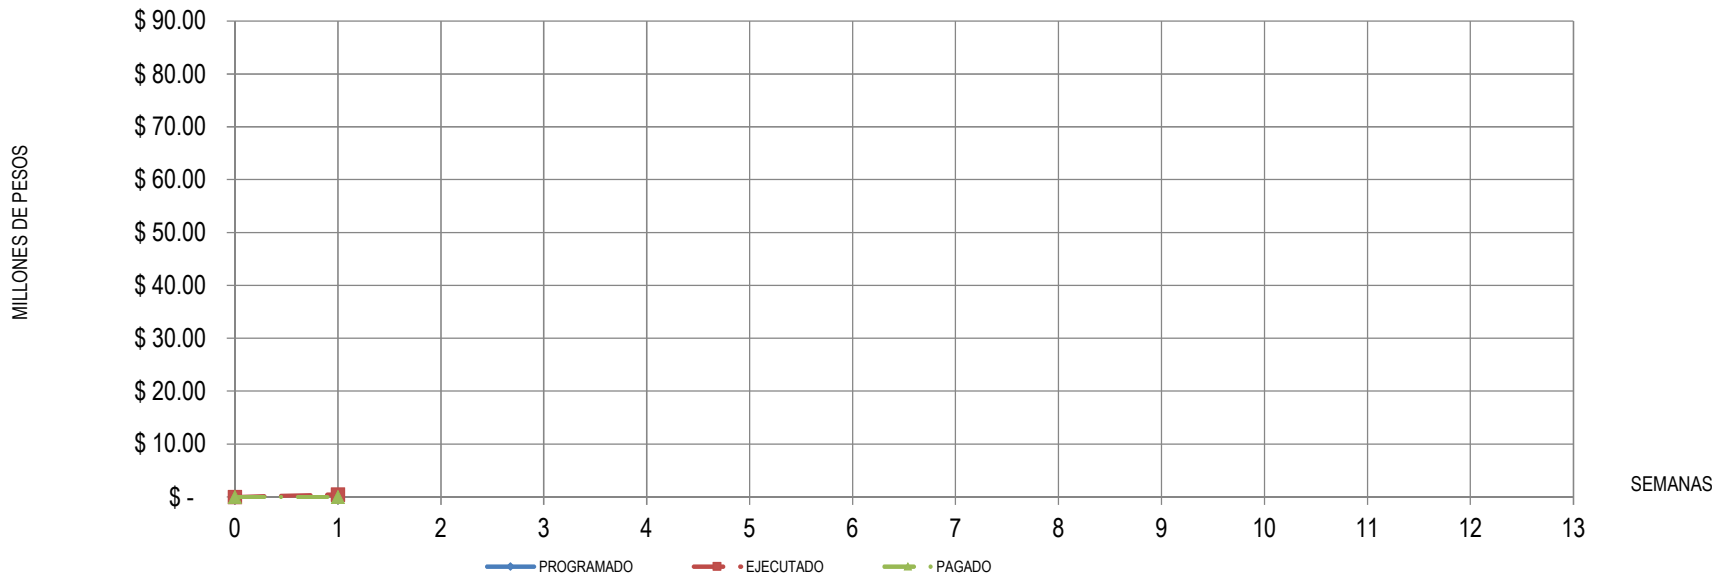

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 2**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	2	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		10.79%	DEMOLICIONES Y DESMONTES	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, MESON Y PLACA, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	MAMPOSTERÍA				
5	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
6	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
7	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
8	PAÑETES				
9	PISOS				
10	CARPINTERIA METALICA				
11	ENCHAPES				
12	ILUMINACIÓN				
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
14	CIELO RASOS Y DIVISIONES				
15	PINTURA				
16	CERRADURAS Y VIDRIOS				
17	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**0.00%**	**10.79%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 2**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO ALPES (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	2	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

3. RESUMEN FINANCIERO


BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 132,006,993	$ 14,245,347	**$ 117,761,645**		10.79%	11.16%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	1
ELECTRICISTA		AYUDANTES	5
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

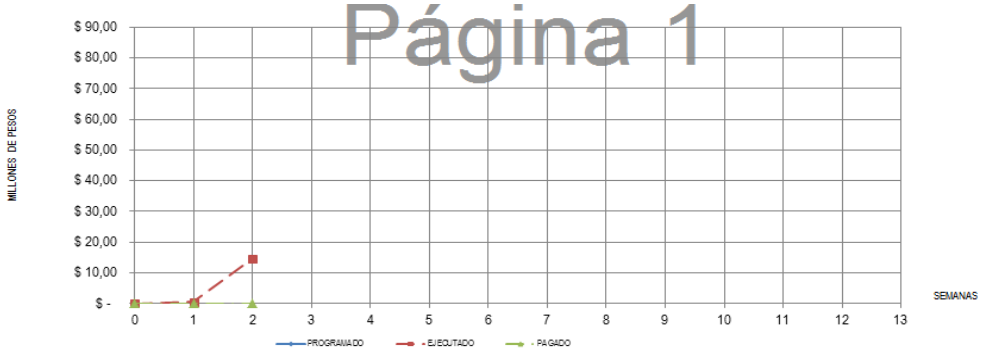

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se realiza demolición de enchape de pared y desmonte de aparatos sanitarios en baterias de baños.

Se realiza demolición de placa de cancha.

No se ha entregado programación ni flujo de inversión.

Se realiza la curva con solo valores ejecutados.

KEVIN RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 02



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED



DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED



DESMONTE DE SANITARIOS



DEMOLICIÓN DE MESONES





DEMOLICIÓN PLACA CANCHA

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
TOTAL	**$** -				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 1 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	9 de noviembre de 2020	Y EL	15 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

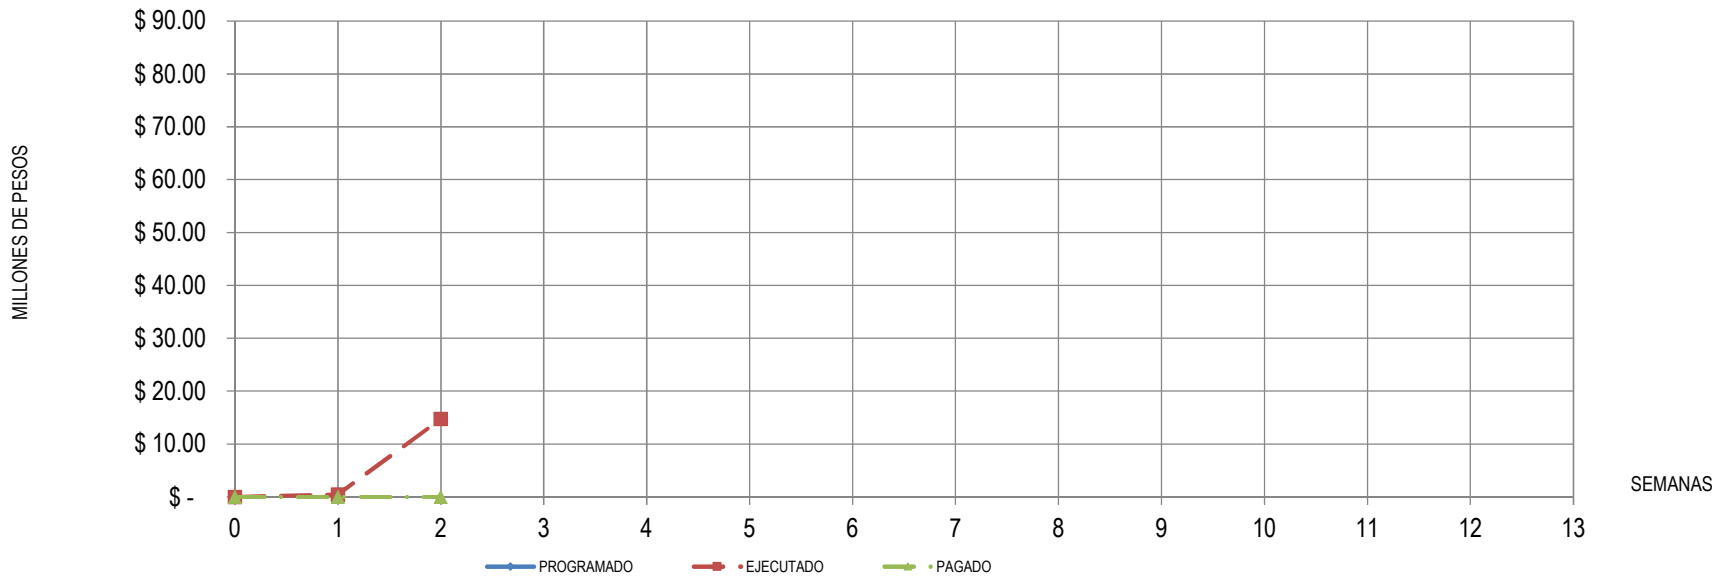

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	1	**DEL**	6-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		0.22%	DEMOLICIÓN	DEMOLICIÓN ANDEN FACHADA PRINCIPAL
2	CIMENTACIÓN -				
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	ESTRUCTURA				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**0.00%**	**0.22%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 1**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	1	**DEL**	6-Nov-20	**AL**	8-Nov-20

3. RESUMEN FINANCIERO


BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 50,001,183	$ 499,108	**$ 49,502,075**		1.00%	1.00%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	
ELECTRICISTA		AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	
SISOMA			
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1



5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se iniciaron actividades el 6 de noviembre de 2020

Se realiza implementación del Protocolo de Bioseguridad.

Se realizo demolición de anden de fachada.

No se ha entregado programación ni flujo de inversión.

Se realiza la curva con solo valores ejecutados.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 01



IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD







IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD



INICIO DE ACTIVIDADES



DEMOLICIÓN DE ANDEN FACHADA



DEMOLICIÓN DE ANDEN FACHADA



RECOLECCIÓN DE DEMOLICIÓN

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
TOTAL	**$** -				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	**INFORME SEMANAL # 1 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL**	**VERSIÓN 01** Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	6 de noviembre de 2020	Y EL	8 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

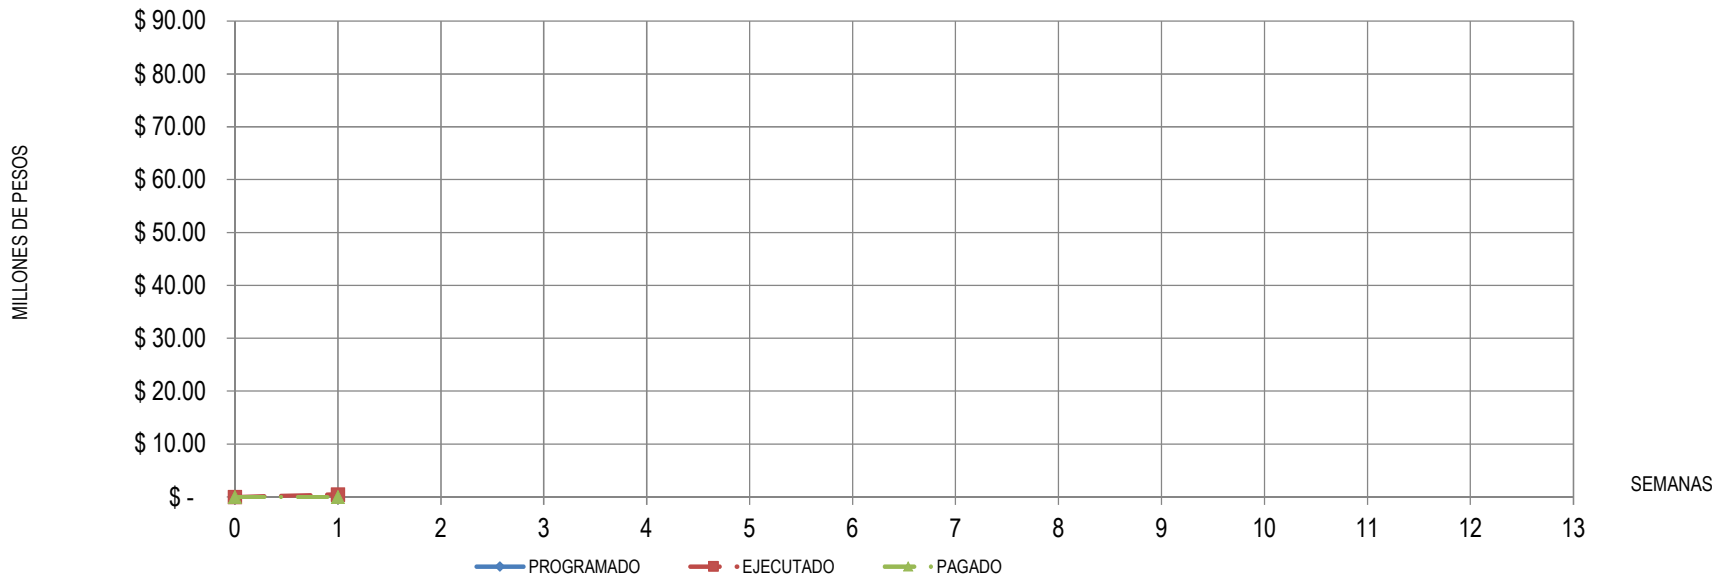

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 2**	VERSIÓN 01
		Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	2	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Contrato No .	CO1.PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020	**Contrato No .**	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
Fecha de Iniciación	12 de Agosto de 2020	**Fecha de Iniciación**	19 de Agosto de 2020
Fecha de Terminación	11 de Febrero de 2021	**Fecha de Terminación**	18 de Enero de 2021
Plazo Inicial	6 meses	**Plazo Inicial**	5 meses
Valor inicial	$ 160,550,040.00	**Valor inicial**	$ 1,023,694,436.00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**ACTIVIDADES**	
No.	**CAPÍTULO**	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**DESCRIPCIÓN**
1	PRELIMINARES		2.11%	CERRAMIENTO - DEMOLICIONES	INSTALACION DE POLISOMBRA ALTURA 2,00 MT - DEMOLICION DE TABLON Y PLACA MACIZA
2	CIMENTACIÓN -		8.60%	EXCAVACION MANUAL Y CONCRETO CICLOPEO	EXCAVACION MANUAL Y SUMINISTRO DE CICLOPEO PARA RAMPA DE ACCESO
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS				
4	ESTRUCTURA				
5	MAMPOSTERÍA				
6	PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS				
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS				
8	INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES				
9	PAÑETES				
10	PISOS				
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES				
12	CARPINTERIA METALICA				
14	ENCHAPES				
15	ILUMINACIÓN				
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
18	PINTURA				
19	CERRADURAS Y VIDRIOS				
21	ASEO Y VARIOS				
TOTALES		**0.00%**	**10.71%**		

BOGOTÁ Secretaría de Educación	**INFORME SEMANAL # 2**	**VERSIÓN 01** Pág. 1 De 4

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS				
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. OBRA Nº	CO1.PCCNTR. 1577474 DE MAYO 28 DE 2020	COLEGIO GRAN COLOMBIA (I.E.D)	**ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL.**
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)				

SEMANA N°	2	**DEL**	9-Nov-20	**AL**	15-Nov-20

3. RESUMEN FINANCIERO


BALANCE DE OBRA EJECUTADA	**VR.TOTAL DEL FRENTE DE OBRA**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	$ 50,001,183	$ 5,356,740	**$ 44,644,443**		10.71%	11.71%

4. PERSONAL EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
		PINTORES	
MAESTRO		OFICIALES	
ELECTRICISTA		AYUDANTES	2
AYU. DE ELECTRICIDAD		ALMACENISTA	
INSTALADORES DE PISO		RESIDENTE DE OBRA	1
SISOMA	1		
HIDRÁULICOS			

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

Página 1

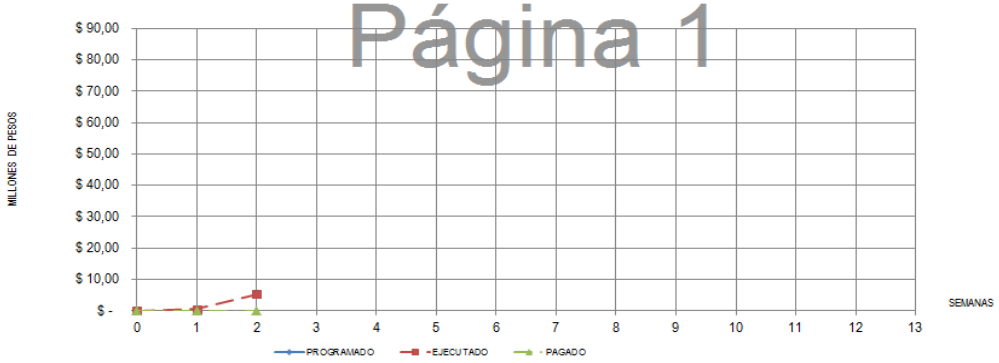

5. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se inicio construccion de rampa.

Hubo excavacion para anden.

Se recomienda al contratista incrementar el equipo de trabajo para no generar retrasos en el frente de obra.

No se ha entregado programación ni flujo de inversión.

Se realiza la curva con solo valores ejecutados.

ARLEY VARGAS RODRÍGUEZ
INSPECTOR DE INTERVENTORIA

LILIANA CUADROS GARCÍA
Vo. Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA 02



CICLOPEO PARA RAMPA




EXCAVACION MANUAL PARA RAMPA



EXCAVACION MANUAL PARA RAMPA



INSTALACION DE POLISOMBRA

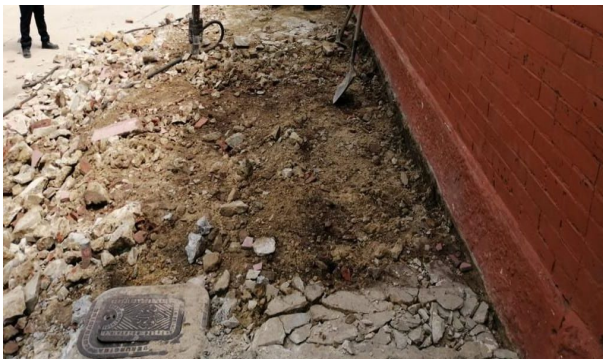

EXCAVACION MANUAL PARA RAMPA

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 2 FLUJOGRAMA	VERSIÓN 01
		Pág. 3 De 4

CONTRATO No./ NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DIST		
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS		
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A	C. DE OBRA Nº	CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ENTIDAD CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL (SED)		


PROYECTO					
FECHA	**VR. INVERSIÓN**	**VR. ACUMULADO**	**SEMANA**	**% PROGRAMADO**	**% PROGRAMADO ACUMULADO**
TOTAL	**$ -**				

BOGOTÁ Secretaria de Educación	INFORME SEMANAL # 2 CURVA DE INVERSIÓN SEMANAL	VERSIÓN 01 Pág. 4 De 4

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	9 de noviembre de 2020	Y EL	15 de noviembre de 2020
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.				
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL				

2. CURVA DE INVERSIÓN "S"

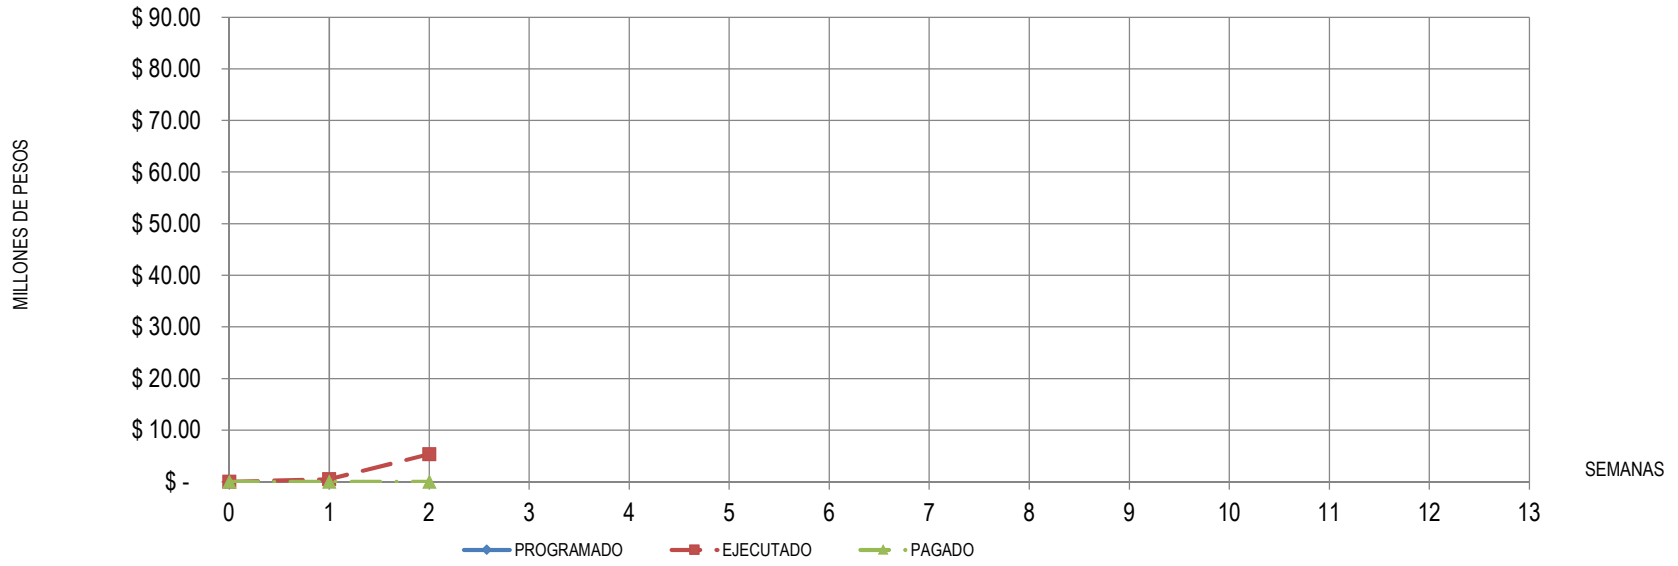

ANEXO 8.
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CONSORCIO INAR INGENIEROS	CONSORCIO INAR INGENIEROS
RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 3	

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
SUPERVISOR:	ING. JULIETA MERCADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO POR	ENVIADO A
19-10-2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-024-2020	REITERADA SOLICITUD AJUSTE PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
10/19/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-025-2020	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
10/29/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-026-2020	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 2	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
10/29/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-027-2020	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 3 – COSTO FIJO MENSUAL	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
11/3/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-028-2020	REMISIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No 2	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
11/3/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-029-2020	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No 4 – COSTO VARIABLE	CONSORCIO INAR INGENIEROS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO
11/9/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-030-2020	OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS PROGRAMACIONES Y FLUJOS DE INVERSIÓN	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
11/9/2020	CINAR-CO1.PCCNTR.1680516-031-2020	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE OBRA No 2	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
10/20/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 PARA FIRMA	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
10/20/2020	CORREO ELECTRONICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
11/3/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL No 2 AJUSTADA	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
11/5/2020	CORREO ELECTRONICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
11/9/2020	CORREO ELECTRONICO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INAR INGENIEROS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

CONSORCIO INAR INGENIEROS

CONSORCIO INAR INGENIEROS

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA INFORME No 3

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.1680516
OBJETO:	GRUPO 10. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA:	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INAR INGENIEROS
SUPERVISOR:	ING. JULIETA MERCADO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO POR	ENVIADO A
22-10-2020	MYH-SED-MNTO007-2020	ACTUALIZACION DE PRESUPUECTOS Y PROGRAMACIONES	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/20/2020	CORREO ELECTRONICO	REMISION DOCUMENTOS PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE OBRA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/20/2020	CORREO ELECTRONICO	FACTURA ACTA PARCIAL No 1 CORREGIDA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/22/2020	CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO 23 Y 24	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/23/2020	CORREO ELECTRONICO	AJUSTE PROGRAMACIÓN Y FLUJO JUANA B	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/23/2020	CORREO ELECTRONICO	ESTRUCTURA CUBIERTA JUANA C	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/19/2020	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No 1	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/23/2020	CORREO ELECTRONICO	AJUSTE PROGRAMACIÓN Y FLUJO JUANA C	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/23/2020	CORREO ELECTRONICO	AJUSTE ACTA PARCIAL No 1 Y FACTURA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/26/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS CORREGIDOS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/26/2020	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS Y ACTA 2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/27/2020	CORREO ELECTRONICO	AJUSTE PROGRAMACIÓN Y FLUJO ATENAS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
10/29/2020	CORREO ELECTRONICO	Recomendaciones para el Colegio Grancolombia: estructural e hidráulica	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/1/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA No 2 E INFORME TÉCNICO 2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/3/2020	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS JUANA C	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/3/2020	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS ACTA 2	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/6/2020	CORREO ELECTRONICO	ACTA PARCIAL No 2 AJUSTADA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN ING. JULIETA MERCADO	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/6/2020	CORREO ELECTRONICO	PRESUPUESTOS PROYECTADOS Y ACTUALIZADOS	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/8/2020	CORREO ELECTRONICO	Presupuestos proyectados Gran colombia, San Isidro y Los Alpes	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
9-11-202	CORREO ELECTRONICO	APUS CONTRACTUALES	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/10/2020	CORREO ELECTRONICO	VALLAS COLEGIOS SAN ISIDRO, LOS ALPES Y GRAN COLOMBIA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
11/18/2020	CORREO ELECTRONICO	Cronograma actividades estructura cubierta San Isidro.	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.	CONSORCIO INAR INGENIEROS
