**SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES**

Ingeniero
**CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| **Periodo:** | Del 01 al 31 del mes de Enero de 2026. |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 5408 de fecha 11 de Diciembre de 2025 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**PROYECTO:** "MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.".

## LOCALIZACIÓN Y TRAMO O SECTOR PARA INTERVENIR:

**SECTOR SANTA MARTA – RIO PALOMINO – 9008:** Vía de primer orden, ruta 90, código de tramo 9008, calzada sencilla, ruta Transversal del Caribe.

La ruta 9008 conecta a Santa Marta con Río Palomino, con una longitud aproximada de 72 km; es parte de la vía principal Santa Marta - Riohacha, una ruta mejorada que ofrece paisajes caribeños, acceso al Parque Tayrona, Palomino y destinos como Riohacha y Paraguachón, facilitando la movilidad en la costa Caribe colombiana.

Dentro de la ruta 9008 se encuentran priorizados 9 puentes dentro del proyecto "MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010

RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". En atención a la solicitud de intervención por parte de la concesión SANTA MARTA – PARAGUACHON S.A. y de esta supervisión donde mediante documento con numero de radicado GCONS-1907-25 se manifiesta la preocupación por el alto riesgo en tres estructuras estratégicas del tramo 9008, como son el Puente Vehicular de Camarones (PR 67+749 al PR 67+804), el Puente Perico Aguado (PR 58+012) y el Puente Los Coquitos (PR 64+790). Cabe resaltar que los puentes Camarones (PR 67+749 al PR 67+804) y Los Coquitos (PR 64+790). Ya se encuentran dentro del listado de puentes a intervenir. Por su parte el puente Perico Aguado (PR 58+012) no, por tal motivo y atendiendo a la solicitud del concesionario es incluido en el proyecto.




*Ilustración 1. Localización general de la Ruta 9008 (Fte: Anexo Técnico 1)*

| No | Dpto. | Código | Ruta | Puente | PR Inicial | Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAG | 9008 | Santa Marta - Rio Palomino | Quebrada la linea | 041+880 | 15,7 |
| 2 | MAG | 9008 | | Quebrada Valencia | 044+840 | 49,4 |
| 3 | MAG | 9008 | | Buritaca | 049+298 | 126,8 |
| 4 | MAG | 9008 | | Don Diego | 057+137 | 124,8 |
| 5 | MAG | 9008 | | Las Flores II | 061+363 | 24,6 |
| 6 | MAG | 9008 | | Jorora | 062+332 | 50,3 |
| 7 | MAG | 9008 | | Los Coquitos | 064+763 | 37,3 |
| 8 | MAG | 9008 | | Las Garzas | 066+900 | 28,4 |
| 9 | MAG | 9008 | | Los Camaronez | 067+749 | 54,8 |

*Tabla 1. Localización de Puentes en la Ruta 9008*

**SECTOR SANTA MARTA – RIO PALOMINO – 9009:** Vía de primer orden, código tramo 9009, ruta 90, Transversal del caribe, sector Rio Palomino Riohacha.

La Ruta 9009 se refiere a un tramo específico de la Transversal del Caribe (Ruta Nacional 90) en el departamento de La Guajira, Colombia, particularmente una sección cerca de Riohacha que conecta con la vía a Paraguachón y la frontera con Venezuela, crucial para el transporte en la costa Caribe colombiana. Es una arteria vial principal que une Turbo con Paraguachón, siendo parte vital de la red vial nacional.




*Ilustración 2. Localización general de la Ruta 9009*

| No | Dpto. | Código | Ruta | Puente | PR Inicial | Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUA | 9009 | Rio Palomino. Riohacha | Rio Negro | 07+019 | 38 |

*Tabla 2. Localización de Puentes en la Ruta 9009*

**SECTOR RIOHACA – PARAGUACHON – 9010**: Vía de primer orden, calzada sencilla, código de tramo 9010, ruta Transversal del Caribe, sector Riohacha – Paraguachón.




*Ilustración 3. Localización General de la Ruta 9010*

| No | Dpto. | Código | Ruta | Puente | PR Inicial | Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUA | 9010 | Riohacha - Paraguachón | Ranchería | 05+186 | 62 |
| 2 | GUA | 9010 | | Parrantial | 073+028 | 21 |

*Tabla 3. Localización de Puentes en la Ruta 9010*

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:** TRAMO VIAL 9007A (VIAL ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA) 7.4 **Km**, TRAMO VIAL 90A01 en el (PR 85+800 al PR 86+100 VIAL AL MAR BAQ - CART) 0.3 **Km**

**ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE**

El presente proyecto contempla como alcance priorizado el Mantenimiento de los puentes en las rutas 9008, 9009 y 9010 en los departamentos de Magdalena y Guajira, se contemplan bajo las siguientes actividades las cuales se ubican bajo el marco del alcance:

**Superestructura**

1. Aberturas en la placa del tablero.
2. Posibles fisuras con infiltraciones en la losa del tablero.
3. Fracturas en el concreto de transición de la junta.
4. Desprendimientos de concreto en la cara inferior de vigas, con exposición de ductos de cables y acero de refuerzo.
5. Elementos con descascaramiento, con acero de refuerzo expuesto y signos de corrosión.
6. Corrosión en elementos metálicos**.**

**Pavimento y superficie de rodadura**

7. Fisuras transversales, que requieren sellado de fisuras.
8. Fisuras, fracturas y desprendimientos en elementos de concreto y asfalto.
9. Juntas cubiertas de asfalto, con superficie irregular, desprendimientos o discontinuidades.
10. Piel de cocodrilo en la superficie de la carpeta asfáltica.

**Elementos de seguridad vial**

11. Afectaciones en la estructura de la baranda.
12. Señalización horizontal y vertical en mal estado.

**Subestructura y protección hidráulica**

13. Signos de socavación en aletas y áreas aferentes.
14. Pérdida de gaviones.

Además de lo anterior para el Puente Paraguachon ubicado en el PR 87+302 de la ruta 9010 Riohacha - Paraguachón, en el departamento de La Guajira, el cual posee una configuración estructural consistente en un tablero de concreto apoyado sobre vigas en concreto reforzado, simplemente apoyadas de una sola luz y longitud total de 22m. Dada la importancia del Puente Paraguachón, por su ubicación estratégica dentro de la Transversal del Caribe, se realizaran las revisiones correspondientes para las intervenciones que correspondan, conforme al diagnóstico de las necesidades estructurales del puente.

En el puente Paraguachon, Por parte de la Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación del INVIAS, de las cuales se pudo determinar la necesidad de su intervención, basado en las siguientes patologías identificadas, las cuales debes ser revisadas por parte del contratista.

- **Erosión en inmediaciones de los estribos y aletas laterales**, con avance acelerado del fenómeno debido a la ola invernal.
- **Socavación en la losa de fondo.**
- **Pérdida de gaviones y material granular** por acción de aguas lluvias, infiltraciones y del afluente.
- **Socavación en los estribos**, en ambos costados del puente.
- **Necesidad de ejecutar actividades de mantenimiento y rehabilitación del puente**, con el fin de mitigar los procesos de socavación y erosión presentes y evitar afectaciones a la estructura

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 1798 de 2025 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE | NIT: | 902.004.404-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | Integrado por CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S con NIT. 901.441.594-3 con un porcentaje de participación del 90% Y ENHERCO SOLUCIONES S.A.S con NIT. 901.756.691-2 con un porcentaje de participación del 10% | | |
| **OBJETO:** | "MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA." | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/12/2025 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $8.365.006.696 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | - | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $8.365.006.696 | | |
| **ANTICIPO** | $1.877.305.247,10 | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | - | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | - | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | - | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 15 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 3.5 meses (15 de abril del 2026) | | |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 4 meses | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 15/04/2026 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793725 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401024 02 | $ 4.250.760.480,00 | - | $ 4.250.760.480,00 |
| | | 16 | C-2401-0600-144-51102D-2401024 02 | $ 4.114.246.216,00 | - | $ 4.114.246.216,00 |
| **TOTAL** | | | | **$8.365.006.696,00** | **-** | **$8.365.006.696,00** |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| - | $- | - | - | $0 |

Nota: No presentadas a la fecha.

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de interventoría No. 7 se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación: 0%

**Nota:** El Seguimiento al avance de obra se está realizando, basado en la reprogramación al programa de inversiones No.1 con fecha 1 de enero del 2026, donde en el presente periodo el Contratista no ha iniciado las actividades de obra, que debía presentarse desde los 15 días después del acta de inicio, por lo anterior y en consecuencia a partir del 1 de enero y a fecha del presente informe han transcurrido 30 días del plazo contractual sin que se evidencie el inicio de dichas actividades.

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 6.257.684.157,0 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 994.089.480,49 | 16% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | - | - |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | - | - |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | - | - |

### 1.4.2. ANTICIPO

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | - |
| **Amortizado** | - |
| **Saldo** | - |

**Nota:** No solicitado a la fecha.

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 16%:
Meta física ejecutada 0%:

**Nota:** Lo anterior obedece en la reprogramación al programa de inversiones No.1 con fecha 1 de enero del 2026, de acuerdo a la Prorroga No.1 que tuvo una extensión de plazos hasta el 15 de abril del 2026

### 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| - | - | - |

**Nota:** *A fecha del presente informe no se han tramitado actas de fijación en el presente contrato.*

### 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| - | - |

**Nota:** *A fecha del presente informe no se han tramitado actas de modificación en el presente contrato.*

### 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | 0 | Aprobado |
| 01/01/2026 | 1 | Aprobado |

### 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

### 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| Modificación | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| - | -- | - |

**Prórrogas:**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| No.1 | 12/2025 | 01/01/2025 | 15/04/2026 |

**Adiciones**

| Adición | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| - | - | - |

### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA NO. 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**INCIALES:**

| **CONTROL DE POLIZAS**<br>NACIONAL DE SEGUROS<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $836.500.669.60 | 400068973 Anexo No.1 | 07/11/2025 | 30/06/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $2.509.502.008.80 | 400068973 Anexo No.1 | 07/11/2025 | 30/06/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.673.001.339.20 | 400068973 Anexo No.1 | 07/11/2025 | 31/12/2028 |
| Calidad de Estudios y | $2.509.502.008.80 | 400068973 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diseños | | Anexo No.1 | | |
| Estabilidad y/o Calidad de la Obra | $2.509.502.008.80 | 400068973<br>Anexo No.1 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

| CONTROL DE POLIZAS<br>NACIONAL DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $836.500.669.60 | 400068973<br>Anexo No.3 | 07/11/2025 | 15/10/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | $2.509.502.008.80 | 400068973<br>Anexo No.3 | 07/11/2025 | 15/10/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $1.673.001.339.20 | 400068973<br>Anexo No.3 | 07/11/2025 | 15/04/2029 |
| Calidad de Estudios y Diseños | $2.509.502.008.80 | 400068973<br>Anexo No.3 | 31/12/2025 | 15/04/2031 |
| Estabilidad y/o Calidad de la Obra | $2.509.502.008.80 | 400068973<br>Anexo No.3 | 31/12/2025 | 15/04/2031 |

**Garantía de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | $711,750,000.00 | 400068974<br>Anexo No.3 | 16/12/2025 | 15/04/2026 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| FECHA | NÚMERO DE OFICIO | PROCEDENCIA | DIRIGIDO A | REFERENCIA - ASUNTO OBJETO | No. FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01/2026 | TC-003-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Aceptación de condiciones para el manejo del Anticipo | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01/2026 | TC-004-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Radicación del Plan de Manejo del Anticipo para revisión | 1 |
| 5/01/2026 | EMAIL-001-S (TC-002-2026) | INVIAS - DT | Director Interventoría | Reenvía oficio TC-005-2026 del Contratista, sobre solicitud de corrección del Valor Básico del contrato de obras 1798-2025 | 2 |
| 6/01/2026 | TC-002-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Subsanación de Hojas de Vida del personal y presentación de nuevo personal de obras (Ingeniero auxiliar y profesionales social, ambiental, SST y de calidad) | 2 |
| 10/01/2026 | TC-002-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Subsanación de Hojas de Vida del Especialista en Estructuras | 2 |
| 14/01/2026 | TC-005-2026 | CONTRATISTA | Interventoría | Radicación de Programa de Obras, PMT y Relación de Equipo Mínimo. | 1 |
| 15/01/2026 | TC-006-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Aclaración Hoja de Vida del Profesional en Aseguramiento de la Calidad | 2 |
| 16/01/2026 | 2026S-VMAG-000072 | INVIAS - DT | Director Interventoría | Observaciones a presentación del informe Mensual de Interventoría 1 | 1 |
| 15/01/2026 | TC-007-2026 | CONTRATISTA | Interventoría | Respuesta a solicitud de inicio de actividades de Diagnostico - Informe preliminar de Visita de obra | 2 |
| 19/01/2026 | TC-009-2026 | CONTRATISTA | Interventoría - Concesión - Invias TM - Invias TG | Solicitud de Estudios y Diseños Existente de Estructura de Puentes | 3 |
| 20/01/2026 | EMAIL-002-G | INVIAS - GT | Director Interventoría | Solicitud de definición de Porcentajes de Participación de los Especialistas propuestos por la Interventoría. | 2 |
| 23/01/2026 | EMAIL-003-C | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Envío del Análisis de Precios Unitario - APU, para revisión y aprobación. | 2 |
| 23/01/2026 | EMAIL-004-C | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Envió Plan de Inversión del Anticipo Ajustado | 3 |
| 26/01/2026 | TC-010-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Solicitud de Arte para el diseño de Valla Informativa del Proyecto. | 1 |
| 27/01/2026 | TC-008-2026 | CONTRATISTA | Representante Legal Interventoría | Presentación Hojas de Vida del profesionales en Sostenibilidad y SIG, Auditor Interno y Especialista Ambiental. | 2 |
| 28/01/2026 | EMAIL-004-G | INVIAS - GT | Interventoría | Solicitud de diligenciamiento del Plan de Actividades de Participación Ciudadana Vigencia 2026 - ARCI-FR-1 | 4 |
| 28/01/2026 | TC-011-2026 | CONTRATISTA | INVIAS - Coordinación de comunicaciones | Solicitud de Arte para el diseño de Valla Informativa del Proyecto. | 2 |
| 29/01/2026 | TC-012-2026 | CONTRATISTA | INVIAS - Supervisor | Solicitud de Anticipo de Obra | 2 |
| 30/01/2026 | EMAIL-005-G | INVIAS - GT | Contratista | Remisión del diseño del Arte para Valla Publicitaria del Contrato por parte del Grupo de Comunicaciones del INV. | 3 |
| 30/01/2026 | TC-013-2026 | CONTRATISTA | Interventoría | Presentación Hojas de Vida del profesionales en Pavimentos, y Especialistas en Hidráulica y Geotecnia. | 1 |

## 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

**ACTIVIDADES EJECUTADAS.**

Considerando lo reportado en el informe No. 2 de interventoría correspondiente al periodo de Enero, a corte del presente informe se presentan las siguientes actividades:

Durante el presente periodo, el Contratista no ha iniciado las obras de mantenimiento de las estructuras de los puentes que hacen parte del alcance contractual. Esta situación ha sido reiterada en múltiples ocasiones mediante comunicaciones formales, entre ellas el oficio GJR-010 emitido por la interventoría y el radicado INVIAS-DT-MAG-OS-R25-0019 por parte del Supervisor del contrato.

Asimismo, en el Comité de Obra celebrado el 22 de enero de 2026, según consta en el Acta No. 1, el Supervisor reiteró la exigencia de dar inicio a las actividades contractuales, ante lo cual el Contratista se comprometió a iniciar las obras el día 02 de febrero de 2026.

**NECESIDADES URGENTES SOLICITADAS POR ESTA SUPERVISIÓN:**

En el presente periodo el contratista no ha iniciado las actividades de atención prioritaria de los puentes Camarones, Los Coquitos, Perico Aguado y Paraguachón, solicitadas por la entidad con oficios INVIAS-DT-MAG-OS-R25-0019 del 27 de diciembre de 2025 y INVIAS-DT-MAG-OS-R25-0020 del mismo 27 de diciembre de 2025.

Para el periodo de este informe, el Instituto no ha realizado requerimientos especiales sobre necesidades urgentes.

**ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORIA**

Durante el presente periodo, el Contratista no ha dado inicio de las actividades de Obra en las estructuras del alcance del proyecto. Durante el Comité de Obras, realizado el día 22 de enero de 2026, se solicitó al Contratista, la entrega urgente del diagnóstico de los puentes, la entrega de los documentos de seguimiento y control (Personal, Programa de obras, APU, PMT, Equipos, etc.). Asi mismo, se hizo el requerimiento del inicio prioritario de las actividades de obra, dado el estado de las estructuras, insistiendo específicamente en los puestes reportados por su estado crítico (Camarones, Los Coquitos, Perico Aguado y Paraguachón) y que podrían presentar afectaciones en la movilidad del corredor vial.

Sobre el inicio de la Gestión Social-Ambiental y PAGA del proyecto, el Contratista reporto el inicio de esta gestión.

## REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES Y MEJORAS EJECUTADAS.

**Quebrada la línea PR 41 + 880 RUTA 9008 longitud 15,7m Departamento del Magdalena.**










**Quebrada valencia PR 44 + 840 longitud 49,4 Departamento del Magdalena.**










**Jorora PR 062 + 332 longitud 50,3 departamento del Magdalena.**











**Los coquitos PR 064 + 763 longitud 37,3 departamento del Magdalena.**



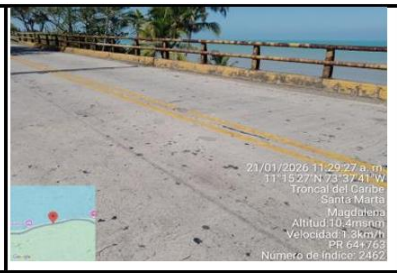


**Las garzas PR 066 + 900 longitud 28,4 departamento del Magdalena.**










**Don diego PR 057 + 137 longitud de 124,8 departamento del Magdalena.**










**Puente Perico Aguado PR 58+012 Departamento del Magdalena.**










**Rio Negro PR 07 + 019 Longitud 38m Departamento de La Guajira.**









**Rio Negro PR 07 + 019 Longitud 38m Departamento de La Guajira.**










**GESTIÓN DOCUMENTAL**







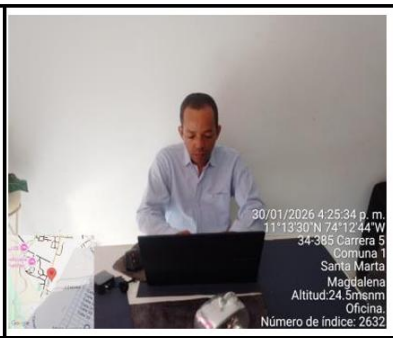

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1857 de 2025 | | |
| **CONTRATISTA:** | COBA B&C SAS | NIT: | 901.593.977-2. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N.A | | |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 16/12/2026 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $799.998.920,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | - | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $799.998.920,00 | | |
| **ANTICIPO** | No solicitado a la fecha. | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | - | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | - | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | - | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 16 días | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 3.5 meses (15 de abril del 2026) | | |
| **PLAZO ACUMULADO:** | 4 meses | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 15/04/2026 | | |

### 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833825 | 2025 | 10 | C-2401-0600-144-51102D-2401024 02 | $799.998.920,00 | $ - | $799.998.920,00 |
| **Total** | | | | $799.998.920,00 | **-** | $799.998.920,00 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| $- | $- | $- | $- | $- |

Nota: No presentadas a la fecha.

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal del Interventor No. 7, el contrato reporta un avance de: 8,11%

**2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $799.998.920,00 11,7%
Total inversión ejecutada: $64.881.656 8,11%

Nota: Lo anterior obedece a que dicho seguimiento se realiza con base en la reprogramación al plan de cargas No.1, la cual estipulaba la ejecución por la prórroga No.1 que se extiende hasta el 15 de abril del 2026.

**2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 1/01/2026 | No.1 |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

**2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

**Modificaciones**

| Modificación | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |

**Prorrogas.**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| No.1 | 01/01/2026 | 15/04/2026 |

**Adiciones.**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: PRÓRROGA NO. 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/25
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**INICIALES:**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 239.999.676,00 | 65-44-101245273 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 79.999.892,00 | 65-44-101245273 | 20/11/2025 | 30/06/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 159.999.784,00 | 65-44-101245273 | 20/11/2025 | 31/12/2028 |
| Calidad del servicio. | $ 184.136.472,00 | 65-44-101245273 | 20/11/2025 | 30/06/2026 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 239.999.676,00 | 65-44-101245273 Anexo 2 | 20/11/2025 | 31/12/2030 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 79.999.892,00 | 65-44-101245273 Anexo 2 | 20/11/2025 | 15/10/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 159.999.784,00 | 65-44-101245273 Anexo 2 | 20/11/2025 | 15/04/2029 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio. | $184.136.472,00 | 65-44-101245273 Anexo 2 | 31/12/2025 | 15/10/2026 |

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| NUMERO DE OFICIO | FECHA | ENVIADO A | REFERENCIA - ASUNTO OBJETO |
|---|---|---|---|
| GJR-034 | 2/02/2026 | CONTRATISTA | Revisión de Análisis de Precios Unitarios - APU |
| GJR-035 | 3/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-008-2026 – Revisión H.V. Personal Profesional Obra. |
| GJR-036 | 3/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-013-2026 – Revisión H.V. Personal Obra. |
| GJR-037 | 3/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-014-2026 – Revisión H.V. Personal Profesional Obra. |
| GJR-038 | 4/02/2026 | CONTRATISTA | Solicitud de Evaluación y Monitoreo de Puentes del corredor Santa Marta – Rio Palomino – RN9008. |
| GJR-039 | 4/02/2026 | INVIAS | INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO 001 |
| GJR-040 | 5/02/2026 | INVIAS | Presentación a la supervisión del Personal de Interventoría. |
| GJR-041 | 6/02/2026 | INVIAS | PROCESO APERTURA DE CUENTA PARA MANEJO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1857 DE 2025 |
| GJR-042 | 7/02/2026 | CONTRATISTA | Concepto Favorable – Programa inicial de Obras. |
| GJR-043 | 7/02/2026 | CONTRATISTA | Aprobación – Plan de Inversión del Anticipo. |
| GJR-044 | 7/02/2026 | INVIAS | Respuesta a observaciones del oficio 2026S-VBOG-001117 sobre Concepto de Hojas de Vida de Especialistas Contrato de Interventoría 1857-2025. |
| GJR-045 | 7/02/2026 | INVIAS | Alcance a oficio GJR-024 de Respuesta a oficio INVIAS-DT-MAG-OS-R26-0015 – Revisión Informes semanales 1, 2 y 3. |
| GJR-046 | 10/02/2026 | INVIAS | Respuesta a oficio 2026S-VMAG-000072 – Observaciones a Informe Mensual 01. |
| GJR-047 | 11/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a TC-021-2026 del Precosteo para la demolición del Puente Mendihuaca. |
| GJR-048 | 11/02/2026 | INVIAS | Solicitud Anticipo del Contrato de Obra 1798-2025. |
| GJR-049 | 13/02/2026 | CONTRATISTA | Traslado Informe Ingeniero Militares – Puente Mendihuaca. |
| GJR-050 | 14/02/2026 | INVIAS | Informe Mensual 02. |
| GJR-051 | 16/02/2026 | CONTRATISTA | Alcance a oficio GJR-049 – Informe Ingenieros Militares – Puente Mendihuaca. |
| GJR-052 | 16/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-019-2026 y TC-020-2026 – Revisión H.V. Personal Profesional Obra. |
| GJR-053 | 16/02/2026 | CONTRATISTA | Solicitud de inspección, evaluación y monitoreo de puentes del corredor 9008, 9009 y 9010 |
| GJR-054 | 18/02/2026 | INVIAS | Presentación a la supervisión del Personal de Interventoría (2). |
| GJR-055 | 18/02/2026 | CONTRATISTA | Requerimiento presentación Actas de Obra 1 y 2 |
| GJR-056 | 18/02/2026 | CONTRATISTA | Requerimiento Documentos Prorroga 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GJR-057 | 18/02/2026 | INVIAS | Alcance a oficio GJR-048 de Solicitud Anticipo del Contrato de Obra 1798-2025. |
| GJR-058 | 19/02/2026 | CONTRATISTA | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REITERADOS |
| GJR-059 | 19/02/2026 | CONTRATISTA | Revisión Precosteo Paso Provisional Mendihuaca |
| GJR-060 | 20/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio TC-027-2026 con Acta de Obra No 01 y el Oficio TC-028-2026 con<br>Acta de Obra No 02. |
| GJR-061 | 20/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio TC-025-2026 – Reprogramación al Programa de Inversión 01. |
| GJR-062 | | INVIAS | Entrega de acta de costo No.1 |
| GJR-063 | 23/02/2026 | INVIAS | Solicitud de ingreso de Especialista y presentación de cambio de personal de interventoría. |
| GJR-064 | 23/02/2026 | INVIAS | Informe Presunto Incumplimiento 002 – No inicio de obras. |
| GJR-065 | 24/02/2026 | CONTRATISTA | Remisión oficio 2026S-VMAG-007643 - Solicitud de inicio trámites y permisos ambientales Contrato No 1798-2025 |
| GJR-066 | 24/02/2026 | CONTRATISTA | Revisión Precosteo Paso Provisional Mendihuaca V2 |
| GJR-067 | | | |
| GJR-068 | 25/02/2026 | CONTRATISTA | Remisión oficio 2026S-VMAG-008827 - Solicitud de Inicio Construcción Viga Cabezal y demolición del Puente Mendihuaca |
| GJR-069 | 25/02/2026 | INVIAS | Respuesta a oficio 2026S-VMAG-005150 - Reprogramación Plan Cargas No1 y Acta de Modificación No1 – Prorroga 01 |
| GJR-070 | 25/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-018-2026 – Revisión Plan de Calidad |
| GJR-071 | 25/02/2026 | INVIAS | Concepto Favorable de la Reprogramación al Programa de Inversión 01. |
| GJR-072 | 26/02/2026 | CONTRATISTA | Remisión oficio 2026S-VMAG-009271 - Solicitud PDT demolición del Puente Mendihuaca |
| GJR-073 | 26/02/2026 | CONTRATISTA | Remisión oficio 2026S-VMAG-009515 – Obligatoriedad de Personal y Equipos en obra |
| GJR-074 | 26/02/2026 | CONTRATISTA | Remisión oficio 2026S-VMAG-009513 – Solicitud Intervención Prioritaria Puente<br>Quebrada La Línea |
| GJR-075 | 27/02/2026 | CONTRATISTA | Respuesta a oficio No TC-026 – Revisión H.V. Personal Profesional Obra. |

## Correspondencia INVIAS:

| FECHA | NÚMERO DE OFICIO | DIRIGIDO A | REFERENCIA - ASUNTO OBJETO |
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | INVIAS-DT-MAG-OS-R26-0015 | Director Interventoría | Observaciones a la presentación de los informes semanales de Interventoría 1, 2 y 3 |
| 15/01/2026 | MI-DT-MAG-R26-0010 | INVIAS - Subdirección procesos de selección contractuales | Solicitud de revisión de la situación presentada en el Valor Base del Contrato de obras 1798-2025, conceptuado por la Interventoría |
| 16/01/2026 | 2026S-VMAG-000072 | Director Interventoría | Observaciones a presentación del informe Mensual de Interventoría 1 |
| 16/01/2026 | 2026S-VMAG-000073 | Director Interventoría | Aprobación de Oficina y Vehículo (1) propuesto por la Interventoría |
| 27/01/2026 | 2026S-VBOG-001117 | Interventoría | Observaciones y Aval sobre personal de interventoría presentados en oficios GJR-013, 014, 016 y 030 |

**2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes técnicos durante el presente periodo

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes jurídicos durante el presente periodo.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes administrativos y/o financieros durante el presente periodo.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes ambientales, prediales, sociales y/o de sostenibilidad durante el presente periodo.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan comisiones bajo resolución al proyecto para el presente periodo.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


- Participación en reunión comités del proyecto.
- Revisión y aprobación de las actas de obra e interventoría. Revisión de los informes entregados por la Interventoría.
- En reiteradas ocasiones se ha requerido al contratista el inicio y la entrega de los diagnósticos correspondientes a los puentes objeto del contrato, con el fin de ajustar y efectuar el balance de las cantidades reales del proyecto.

## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se recomienda al contratista dar inicio de manera inmediata a las actividades de diagnóstico de los puentes objeto del contrato, así como realizar la entrega oportuna de los informes correspondientes, con el fin de contar con la información técnica necesaria para la determinación y ajuste de las cantidades reales de obra del proyecto.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación entre el contratista, la interventoría y la supervisión del contrato, con el fin de garantizar el flujo oportuno de información técnica y administrativa requerida para la correcta ejecución del proyecto.

- Se recomienda al contratista atender oportunamente los requerimientos realizados por la interventoría y la supervisión, relacionados con la entrega de información, informes técnicos y soportes necesarios para el seguimiento del contrato.
- Se recomienda realizar el balance de cantidades de obra una vez se cuente con los diagnósticos técnicos de los puentes objeto del contrato, con el fin de establecer las cantidades reales necesarias para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto.
- Se conminó a los contratistas a la radicación inmediata de las actas de facturación pendientes, así como a la presentación oportuna de los informes semanales, advirtiendo que el incumplimiento de dichas obligaciones podrá dar lugar al inicio de las acciones administrativas, imposición de multas y demás medidas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los documentos integrales del proceso y el contrato.

Cordialmente,



**FABIÁN ERNESTO**
**ARANGO PINEDA**
**Director Territorial de Magdalena.**
**MP.13202-097750 BLV.**
**c.c.909695**
