I. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No. **507 de 2025**	CONVENIO No. **N/A**	OS No. **N/A**

INFORME DE: **SUPERVISIÓN** _____ **INTERVENTORÍA** __**X**__

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

OBJETO: "ADECUACIONES ELÉCTRICAS, TECNOLÓGICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO: 6 de enero de 2026.

PLAZO INICIAL: Tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.

PLAZO ADICIONAL: N/A

PLAZO ACTUALIZADO: N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: N/A

FECHA DE REINICIO 1: N/A

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: N/A

FECHA DE REINICIO 2: N/A

FECHA DE OTROSI: 4 de marzo de 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de abril de 2026.

FECHA DEL INFORME: 27 de marzo de 2026.

II. ANTECEDENTES (BITACORA)

- El 16 de diciembre de 2025 se suscribe el contrato No.507 de 2025 entre Andrés Felipe Sánchez Rivera y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
- El 06 de enero de 2026 se suscribe el acta de inicio al contrato de obra No.507 de 2025.
- El 13 de enero de 2026 se realiza comité técnico en donde se señala que hay necesidad de hacer un ajuste al presupuesto buscando dar precisión a costos de

actividades y contrato. Se informa de la situación técnica y presupuestal con el fin de generar correcciones al costo parcial y/o final de ejecución.

- El 04 de marzo de 2026 se firma el acta de justificación adicional generando trámite a su vez del otrosí No.1 del contrato 507 del 2025.
- El 27 de marzo de 2026, se hizo entrega del **primer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 06 al 31 de enero de 2026, cargado al Secop II.
- El 27 de marzo de 2026, se hizo entrega del **segundo informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, cargado al Secop II.
- El 27 de marzo de 2026, se hizo entrega del **tercer informe de obra** de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el periodo comprendido entre el 01 al 21 de marzo de 2026, cargado al Secop II.
- El presente informe corresponde al periodo informado desde el 06 de enero de 2026 al 21 de marzo de 2026.

III. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
		GENERALIDADES	
1	Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios calidad exigible, los y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.	**87,36%**	El contratista de obra durante el periodo informado dio cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato conforme a las especificaciones técnicas.
2	Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las cajas-de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto al personal vinculado a la ejecución de la obra.	**87,36%**	El contratista de obra acreditó el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
3	Mantener indemne a la CAM de	**87,36%**	El contratista de obra durante el periodo mantuvo indemne a la CAM de

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.		cualquier tipo de reclamación.
4	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio a la CAM o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.	**87,36%**	El contratista de obra responde por el contrato con las pólizas adquiridas.
5	Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.	**87,36%**	El contratista de obra asume en cualquier caso las indemnizaciones que se lleguen a presentar por cualquier daño a tercero.
6	Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos de las cargas impositivas que se causen o lleguen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.	**87,36%**	El contratista de obra asumió todos los gastos de legalización del contrato.
7	Notificar a la CAM en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.	**87,36%**	El contratista de obra no ha cedido el contrato.
8	Notificar a la CAM cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	**87,36%**	El contratista cumplió con la limpieza de las áreas de trabajo una vez terminada la jornada laboral.
9	Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	**87,36%**	El contratista cuenta con las pólizas actualizadas al acta de inicio del contrato.
10	Proporcionar al Interventor, cuando este lo requiera, informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la	**87,36%**	El contratista de obra ha entregado la información requerida por el interventor.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	obra.		
11	Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.	**87,36%**	El contratista de obra asume los riesgos previsibles de la ejecución del contrato.
12	Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta durante la ejecución del Contrato.	**87,36%**	El contratista de obra ejecutó la obra de acuerdo a las condiciones ofrecidas desde el inicio del contrato.
13	Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Supervisor.	**87,36%**	El contratista de obra presento todos los documentos requeridos para firma de acta de inicio.
14	Acreditar el cumplimiento en el pago de sus aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión, ARP) y parafiscales, según lo establecido en el Art. 1 Parágrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2.007 Art. 23.	**87,36%**	El contratista de obra acreditó el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
15	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades.	**87,36%**	El contratista de obra doto a cada trabajador de los elementos de seguridad.
16	Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados; y a su terminación retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo con la normatividad vigente.	**87,36%**	El contratista de obra dispuso bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad de todos los mecanismos necesarios para la seguridad de la maquinaria y materiales que empleó durante el periodo, con el fin de evitar hurtos, pérdidas y daños.
17	Presentar acta de disposición de residuos contaminados y de construcción emitida por entidad autorizada para la disposición final.	**87,36%**	El contratista de obra cumplió con la disposición adecuada de los residuos generados por las actividades ejecutadas en el periodo.
18	Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos,	**87,36%**	El contratista de obra lleva la bitácora al día con todas las actividades realizadas en el periodo.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el plazo de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el contratista y el supervisor delegado, adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la entidad contratante.		
19	Mantener durante la ejecución del contrato las medidas de seguridad en el área de intervención, con el fin de garantizar la custodia de los bienes.	**87,36%**	El contratista de obra mantuvo las medidas de seguridad de los materiales, en el área de intervención.
20	El Contratista velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizara los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.	**87,36%**	El contratista de obra cumplió con la normatividad ambiental legal vigente para este tipo de obra.
OBLIGACIONES DEL ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA			

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Vincular el personal que requiera y utilice para dar alcance al objeto contractual.	**87,36%**	El contratista vincula el personal necesario para dar alcance al objeto contractual
2	Velar por la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato.	**87,36%**	El contratista mantiene permanente atención a la ejecución de los trabajos para dar cumplimiento al objeto, alcances y demás responsabilidades del contrato.
3	Prestar todos los servicios y desarrollar los trabajos, obras y actividades contratados, cumpliendo todas las especificaciones técnicas establecidas y garantizando la calidad de los mismos	**87,36%**	El contratista presta todos los servicios y desarrolla los trabajos, obras y actividades contratadas, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas, garantizando la calidad de los mismos.
4	Acatar las disposiciones o requerimientos que realice LA CORPORACIÓN y/o la Interventoría contratada para el seguimiento de las obras.	**87,36%**	El contratista acata las disposiciones y/o requerimientos que realiza LA CORPORACION y/o la Interventoría.
5	Asistir a las reuniones o comité de obra que solicite LA CORPORACIÓN	**87,36%**	El contratista asiste a las reuniones o comités de obra que solicita LA CORPORACION
6	No causar daños a personas y bienes de terceros o de LA CORPORACIÓN; y responder por los daños eventuales que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la de sus trabajadores	**87,36%**	El contratista ejecuta sus labores acatando normas de seguridad y salud en el trabajo, para no causar daños a terceros, a las instalaciones de LA CORPORACION, al personal vinculado a la obra, asi como el personal que labora en LA CAM.
7	Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades	**87,36%**	El contratista dota de elementos de protección personal (EPP) a sus trabajadores para el buen desempeño de las actividades a ejecutar o en ejecución
8	Aplicar los protocolos de bioseguridad según lo establecido por el Ministerio de Salud en la normatividad legal vigente, para el desarrollo de las actividades propias del contrato	**87,36%**	El contratista aplica los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud en la normatividad legal vigente, para el desarrollo de las actividades propias del contrato.
OBLIGACIONES DE INFORMACION DEL CONTRATISTA			
1	Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por LA	**87,36%**	El contratista atiende y resuelve las observaciones y requerimientos formulados por La corporación, EL Supervisor o de los organismos de control

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	CORPORACIÓN, el Supervisor o de los organismos de control		
2	Presentar informes mensuales y finales que contengan como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor	**87,36%**	El contratista presenta informe mensual que contienen la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Supervisor
3	Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá llevar una Bitácora (libro) en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Supervisor, en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente de EL CONTRATISTA y del Supervisor. Los responsables de mantener al día este diario serán los residentes de obra	**87,36%**	El contratista lleva el libro de bitácora de obra, en donde se consigna las actividades, hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra de manera diaria, así como las observaciones o sugerencias que hace el Supervisor, dejando constancia de todos los pormenores que puedan suceder frente al trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación de equipo, avance de obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación lleva la fecha y firma del personal residente de EL CONTRATISTA y del Supervisor.
4	Presentar a la Interventoría contratada, los informes conforme lo requieran LA CORPORACIÓN, para cada pago parcial que se efectúe y uno al final de la ejecución del contrato. Los informes deberán reportar el detalle de todas las actividades realizadas en el periodo, acompañados de los registros fotográficos y demás soportes que exija la Interventoría	**87,36%**	El contratista presentó los informes requeridos por la corporación para el pago parcial
5	Elaborar y presentar juntamente con el interventor, las actas de	**87,36%**	El contratista elaboró y presentó las actas de entrega de cada beneficiario

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación		
6	El contratista deberá publicar todos los documentos derivados de la ejecución contractual, a través de la plataforma transaccional del SECOP II	**87,36%**	El contratista publicó en el SECOP II todos los documentos generados durante la ejecución del contrato
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL			
1	Vincular y mantener en la ejecución de la obra, la totalidad del personal requerido y propuesto para tal fin.	**87,36%**	El contratista vincula y mantiene el personal propuesto y la mano de obra necesaria para la ejecución del contrato.
2	Como requisito para la suscripción del acta de inicio deberá presentar la afiliación del personal empleado (maestros, ingenieros, es decir el personal propuesto como equipo técnico) al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales en donde acredite que el personal empleado aparece como dependiente del ejecutor del contrato de obra derivado del presente proceso de contratación, y anexar las planillas de pago que se deberán presentar de forma mensual.	**87,36%**	El contratista, previo a la firma del acta de inicio, presentó la afiliación del personal empleado al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), acreditando que el personal empleado aparece como dependiente del ejecutor del contrato derivado del proceso de contratación, y anexa las planillas de pago que se deben presentar de forma mensual.
3	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y; dotación de calzado y vestido de labor.	**87,36%**	El contratista garantiza el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilizan para el cumplimiento del objeto contractual y dotación de calzado y vestido de labor.
4	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e	**87,36%**	El contratista asume el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupa en la ejecución de la

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.		obra.
5	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra LA CORPORACIÓN, por causa o con ocasión del contrato.	**87,36%**	El contratista está atento y dispuesto a responder cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra LA CORPORACION, por causa o con ocasión del contrato
6	No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	**87,36%**	El contratista observa rigurosamente la normativa y no ha contratado personal menor de edad de manera directa o por subcontratos derivados de la ejecución del presente contrato.
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		
1	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	**87,36%**	El contratista ejecuta los trabajos con todos los equipos necesarios, maquinaria, herramientas y demás elementos necesarios para cada actividad según se requiera.
2	Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra.	**87,36%**	El contratista suministra todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada del proyecto Anexo 1, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra.
3	Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que EL CONTRATISTA emplee en la	**87,36%**	El contratista garantiza la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales que EL CONTRATISTA emplea en la ejecución de los trabajos y que se han encontrado deficientes han sido rechazados por el Supervisor, acatando la recomendación y/o observación de la Entidad, Supervisión y/o Interventoría.

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Supervisor cuando no los encontraré convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la entidad revisará la situación, y la respuesta será acatada por EL CONTRATISTA.		
4	En caso de aplicar se deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.	**87,36%**	El contratista se dispone a atender el requerimiento de ensayos en la mediada técnica de su aplicación.
5	La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones a LA CORPORACIÓN por estos hechos.	**87,36%**	El contratista asume la seguridad de la maquinaria y materiales que emplea para la ejecución de la obra bajo su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, dispone de todos los mecanismos necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; entendiendo que no puede hacer reclamaciones a LA CORPORACIÓN por estos hechos
6	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad del personal de obra y terceros.	**87,36%**	El contratista realiza la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad del personal de obra y de terceros.
7	Retirar y disponer de forma adecuada cualquier tipo de residuo generado, tales como bolsas plásticas, bolsas de cemento, etc.	**87,36%**	El contratista retira y dispone de manera adecuada cualquier tipo de residuo generado, tales como bolsas plásticas, bolsas de empaque de cemento, etc.
8	En caso de generar residuos de construcción y demolición, el gestor a contratar debe estar inscrito ante la Autoridad Ambiental	**87,36%**	El contratista realizo la gestión con una empresa inscrita ante la autoridad ambiental
9	Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que	**87,36%**	El contratista realiza reparaciones necesarias en áreas intervenidas y/o contiguas como consecuencia de los efectos de la estabilidad de obra

ITEM	ACTIVIDAD O PRODUCTO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra		
	OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TRANSVERSAL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA		
1	Cumplir con la normativa vigente incluidas las directrices dispuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública de LA CORPORACIÓN	**87,36%**	El contratista cumple con las directrices dispuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública de LA CORPORACION.
2	Actuar con Honestidad en el desarrollo de nuestras obligaciones y responsabilidades contractuales con ética, evitando cualquier conducta, omisión o extralimitación que pueda comprometer nuestra integridad o la de LA CORPORACIÓN	**87,36%**	El contratista actúa con honestidad en el desarrollo de nuestras obligaciones y responsabilidades contractuales con ética, evitando cualquier conducta, omisión o extralimitación que pueda comprometer nuestra integridad o la de LA CORPORACIÓN
3	Prevenir dentro de LA CORPORACIÓN, el riesgo del Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, mediante una Debida Diligencia con nuestros beneficiarios, accionistas, contribuyentes, proveedores o socios comerciales.	**87,36%**	El contratista previene dentro de LA CORPORACIÓN, el riesgo del Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, mediante una debida diligencia con nuestros beneficiarios, accionistas, contribuyentes, proveedores o socios comerciales.
4	Denunciar toda irregularidad, reportando de manera oportuna cualquier situación que contravenga las políticas y valores de transparencia y ética pública establecidas por LA CORPORACIÓN	**87,36%**	El contratista está comprometido a denunciar toda irregularidad, reportando de manera oportuna cualquier situación que contravenga las políticas y valores de transparencia y ética pública establecidas por LA CORPORACIÓN.
	OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		
1	Adoptar la política de cero papel y demás programas de ahorro y uso eficiente de los recursos, implementados por LA CORPORACIÓN a través del Sistema Integrado de Gestión.	**87,36%**	El contratista de obra adopta la política de “Cero papel” y demás programas de uso eficiente de los recursos, implementados por LA CORPORACION a través del Sistema Integrado de Gestión.
2	Seguir las recomendaciones impartidas por el Sistema Integrado de Gestión, depositando adecuadamente los residuos sólidos en los puntos ecológicos y apagar y/o	**87,36%**	El contratista sigue las recomendaciones impartidas por el Sistema Integrado de Gestión, depositando adecuadamente los residuos sólidos en los puntos ecológicos y apagar y/o desconectar los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos que no se estén utilizando.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>desconectar los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos que no se estén utilizando.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Cumplir con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviere obligado a ello, de acuerdo con la normatividad vigente.</td><td>87,36%</td><td>El contratista cumple con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Presentar informes mensuales y uno final de ejecución del Contrato al supervisor.</td><td>87,36%</td><td>El contratista de obra presenta los informes mensuales.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Costear y mitigar los riesgos asignados en la Matriz de Riesgos.</td><td>87,36%</td><td>El contratista de obra costea y mitiga los riesgos asignados en la matriz de riesgo</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Suministro e Instalación de gravilla lavada</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó la actividad de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de obra.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Suministro e Instalación de gravilla lavada.</td><td>M3</td><td>38,71</td><td>38,71</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Revisión de cubierta y corrección de goteras incluida lamina</td><td>100%</td><td>El contratista de obra realizó la actividad de manera satisfactoria cumpliendo con todos los estándares de seguridad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Revisión de cubierta y corrección de goteras incluida lamina</td><td>M2</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.3</td><td>Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1,3</td><td>Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)</td><td>M2</td><td>114,12</td><td>114,12</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.4</td><td>Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio</td><td>UND</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Suministro e Instalación de manijas para puertas de baño</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.5</td><td>Suministro e Instalación de manijas para puertas de baño</td><td>UND</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.6</td><td>Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura auto ensamblada en aluminio</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.6</td><td>Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura autoensamblada en aluminio</td><td>M2</td><td>20,16</td><td>20,16</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.7</td><td>Emboquillado en alfacolor</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.7</td><td>Emboquillado en alfacolor</td><td>M2</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.8</td><td>Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio</td><td>100%</td><td>El contratista de obra ejecutó de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.8</td><td>Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio</td><td>UND</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Solución de hallazgo auditoría interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINANRIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.9</td><td>Solución de hallazgo auditoría interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINANRIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"</td><td>GLOBAL</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>1.10</td><td>Suministro e instalación de brazos hidráulicos para las puertas de las jaulas</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>1.10</td><td>Suministro e instalación de brazos hidráulicos para las puertas de las jaulas</td><td>UNA</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1.11</td><td>Jaula metálica para animales (Incluye demolición de la existente)</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.11</td><td>Jaula metálica para animales (Incluye demolición de la existente)</td><td>UND</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.12</td><td>Excavación h=1,00m, Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.12</td><td>Excavación h=1,00m, Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)</td><td>M2</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.13</td><td>Pintura Perimetral (Sección Amarilla)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.13</td><td>Pintura Perimetral (Sección Amarilla)</td><td>M2</td><td>240,10</td><td>240,10</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.14</td><td>Aseo y bote de escombros</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.14</td><td>Aseo y bote de escombros</td><td>M2</td><td>60,00</td><td>60,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.15</td><td>Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.15</td><td>Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación</td><td>M2</td><td>2,25</td><td>2,25</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.16</td><td>Pintura Perimetral (Sección Gris)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.16</td><td>Pintura Perimetral (Sección Gris)</td><td>M2</td><td>79,93</td><td>79,93</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.17</td><td>Cerca eléctrica perimetral (A todo Costo)</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.17</td><td>Cerca eléctrica perimetral (A todo Costo)</td><td>GLOBAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>1.18</td><td>Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.18</td><td>Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)</td><td>M3</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.19</td><td>Suministro e Instalación de rejillas para sumideros (0,40M de ancho)</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.19</td><td>Suministro e Instalación de rejillas para sumideros (0,40M de ancho)</td><td>ML</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>1.20</td><td>Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>1.20</td><td>Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros</td><td>M2</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NP1.21</td><td>Retiro y reinstalación de teja de barro</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>NP1.21</td><td>Retiro y reinstalación de teja de barro</td><td>M2</td><td>45,00</td><td>45,00</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NP1.22</td><td>Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo, incluye sustitución del 10% de adoquin y pintura tipo tráfico.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>NP1.22</td><td>Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo, incluye sustitución del 10% de adoquin y pintura tipo tráfico.</td><td>M2</td><td>186,65</td><td>186,65</td><td>100%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NP1.23</td><td>Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>NP1.23</td><td>Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)</td><td>M3</td><td>50,80</td><td>50,80</td><td>100.00%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NP1.24</td><td>Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo, incluye perfilada y compactación de la rasante</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr><tr><td>NP1.24</td><td>Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo, incluye perfilada y compactación de la rasante</td><td>M3</td><td>27,57</td><td>27,57</td><td>100.00%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP1.25</td><td>Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluye refuerzo en hierro de 3/8"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.25</td><td>Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluye refuerzo en hierro de 3/8"</td><td>ML</td><td>134,99</td><td>134,99</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.26</td><td>Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante</td><td>100%</td><td>Actividad llevada a cero.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.26</td><td>Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante</td><td>M2</td><td>54,25</td><td>54,25</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.27</td><td>Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0,40 m de ancho, con marco en ángulo de 2", contramarco en ángulo de 1½", refuerzos en platina de 1 1/2" y malla expandida IMT-40 calibre 12</td><td>63,58%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.27</td><td>Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0,40 m de ancho, con marco en ángulo de 2", contramarco en ángulo de 1½", refuerzos en platina de 1 1/2" y malla expandida IMT-40 calibre 12</td><td>ML</td><td>75,50</td><td>48,00</td><td>63,58%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.28</td><td>Construcción e instalación de jaula para animales de 3,00 x 3,00 m, en estructura metálica completa, incluyendo fabricación y montaje, con piso en concreto reforzado, elevado y separado del terreno, según diseño</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP7</td><td>Construcción e instalación de jaula para animales de 3,00 x 3,00 m, en estructura metálica completa, incluyendo fabricación y montaje, con piso en concreto reforzado, elevado y separado del terreno, según diseño</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>00.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.29</td><td>Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura metálica y cerramiento existente en la Cr. 1 y Calle 58</td><td>47,34%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.29</td><td>Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura metálica y cerramiento existente en la Cr. 1 y Calle 58</td><td>MI</td><td>295,75</td><td>140,00</td><td>47,34%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.30</td><td>Suministro y Aplicación de Esgrafiado en graniplast en zona del Archivo Histórico</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.30</td><td>Suministro y Aplicación de Esgrafiado en graniplast en zona del Archivo Histórico</td><td>M2</td><td>67,11</td><td>67,11</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP1.31</td><td>Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.31</td><td>Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora</td><td>M2</td><td>101,05</td><td>101,05</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.32</td><td>Poda de Limoncillos</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.32</td><td>Poda de Limoncillos</td><td>ML</td><td>86.00</td><td>86.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.33</td><td>Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2,50 m de altura. Incluye: excavación cepellón (50x50x60 cm), protección raíces, transporte interno en instalaciones, excavación y relleno de hueco nuevo (60x60x60 cm), aplicación fertilizante orgánico</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.33</td><td>Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2,50 m de altura. Incluye: excavación cepellón (50x50x60 cm), protección raíces, transporte interno en instalaciones, excavación y relleno de hueco nuevo (60x60x60 cm), aplicación fertilizante orgánico</td><td>UND</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP1.34</td><td>Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP1.34</td><td>Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).</td><td>UND</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>ARCHIVO HISTORICO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)</td><td>M2</td><td>217,80</td><td>217,80</td><td>100%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m</td><td>M2</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Lógica en ángulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Lógica en ángulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.</td><td>ML</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18 -refuerzo para colocación Cubierta Termo acústica en fibrocarbono tipo colonial</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.4</td><td>Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18 -refuerzo para colocación Cubierta Termo acústica en fibrocarbono tipo colonial</td><td>ML</td><td>6,60</td><td>6,60</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>Suministro e instalación de Caballete colonia en fibrocarbono</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.5</td><td>Suministro e instalación de Caballete colonia en fibrocarbono</td><td>ML</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.6</td><td>Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>2.6</td><td>Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC</td><td>M2</td><td>158.00</td><td>158.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP2.7</td><td>Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. Incluye arreglo estructura de cubierta (soldadura cerchas y correas)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP2.7</td><td>Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. Incluye arreglo estructura de cubierta (soldadura cerchas y correas)</td><td>M2</td><td>224,33</td><td>224,33</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP2.8</td><td>Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP2.8</td><td>Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.</td><td>ML</td><td>28.00</td><td>28.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP2.9</td><td>Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura existente y pintura</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP2.9</td><td>Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura existente y pintura</td><td>KG</td><td>305,17</td><td>305,17</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP2.10</td><td>Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta, mediante aplicación de mortero cemento–arena en proporción 1:4. Incluye la regularización de superficies, ajuste de nivel y alineación del paramento, instalación de ladrillo tolete para conformación del remate, y acabado final con pañete impermeable para garantizar una correcta unión entre muro y cubierta.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP2.10</td><td>Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta, mediante aplicación de mortero cemento–arena en proporción 1:4. Incluye la regularización de superficies, ajuste de nivel y alineación del paramento, instalación de ladrillo tolete para conformación del remate, y acabado final con pañete impermeable para garantizar una correcta unión entre muro y cubierta.</td><td>ML</td><td>64,50</td><td>64,50</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP2.11</td><td>Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP2.11</td><td>Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad</td><td>UND</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>CAFETERIA</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Corte y demolición de áreas afectadas</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.1</td><td>Corte y demolición de áreas afectadas</td><td>M2</td><td>45,52</td><td>45,52</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.2</td><td>Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas</td><td>M2</td><td>27,92</td><td>27,92</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.3</td><td>Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.3</td><td>Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)</td><td>ML</td><td>21.00</td><td>21.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>Bajantes 3” (Accesorios Incluidos)</td><td>72,28%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.4</td><td>Bajantes 3” (Accesorios Incluidos)</td><td>ML</td><td>50,50</td><td>36,50</td><td>72,28%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>3.5</td><td>Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosín rojo)</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>3.5</td><td>Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosín rojo)</td><td>M2</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP3.6</td><td>Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP3.6</td><td>Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm</td><td>M2</td><td>27,92</td><td>27,92</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>ADECUACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.1</td><td>Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD</td><td>UND</td><td>19.00</td><td>19.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>UPS 3KVA + Gabinete</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.2</td><td>UPS 3KVA + Gabinete</td><td>UND</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>Adecuación Tablero Eléctrico</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.3</td><td>Adecuación Tablero Eléctrico</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.4</td><td>Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.</td><td>0%</td><td>Actividad llevada a cero
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.4</td><td>Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.</td><td>UND</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP4.13</td><td>Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP4.13</td><td>Patch cord TERA 2PR/RJ45 2M.</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>NP4.14</td><td>Patch cord F.O. OM4 LC- LC 2M LS0H.</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP4.14</td><td>Patch cord F.O. OM4 LC-LC 2M LS0H.</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP4.15</td><td>Patch cord CAT6A - certificados 5m.</td><td>100%</td><td>el contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP4.15</td><td>Patch cord CAT6A - certificados 5m.</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DG</td></tr>
<tr><td>4.5</td><td>Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.5</td><td>Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.6</td><td>Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.7</td><td>Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.7</td><td>Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.8</td><td>Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio 108"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.8</td><td>Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio 108"</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.9</td><td>Suministro e Instalación de Sistema de Sonido</td><td>0%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.9</td><td>Suministro e Instalación de Sistema de Sonido</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.10</td><td>Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.10</td><td>Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD O PRODUCTO</th><th>% EJECUCIÓN</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>4.11</td><td>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.11</td><td>Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.12</td><td>Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>4.12</td><td>Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio</td><td>GLOBAL</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>NP4.16</td><td>Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 6A</td><td>100%</td><td>El contratista de obra la ejecuto de manera satisfactoria, atendiendo las especificaciones técnicas para este tipo de actividad.
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD CONTRATADA</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>% EJECUCION</th></tr>
<tr><td>NP4.16</td><td>Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 6A</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>Promedio de % Cumplimiento</td><td>87,36%</td><td>Según Acta de recibo parcial No.1 de obra y memorias de cantidades Anexo (2).</td></tr>
</table>

IV. ANALISIS DE EJECUCION FINANCIERA

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA			SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	**ACTIVIDADES GENERALES**										
1.1	Suministro e Instalación de gravilla lavada	M3	38.71	$ 8,295,253.56	1.54%	38.71	$ 8,295,253.56	1.54%	0.00	$ -	0.00%
1.2	Revision de cubierta y correción de goteras incluida lamina	M2	45.00	$ 2,771,308.00	0.51%	45.00	$ 2,771,308.00	0.51%	0.00	$ -	0.00%
1.3	Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)	M2	114.12	$ 4,377,175.00	0.81%	114.12	$ 4,377,175.00	0.81%	0.00	$ -	0.00%
1.4	Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio	Und	4.00	$ 256,692.00	0.05%	4.00	$ 256,692.00	0.05%	0.00	$ -	0.00%
1.5	Suministro e Instalacion de manijas para puertas de baño	Und	4.00	$ 153,430.00	0.03%	4.00	$ 153,430.00	0.03%	0.00	$ -	0.00%
1.6	Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura autoensablada en aluminio	M2	20.16	$ 1,847,178.00	0.34%	0.00	$ -	0.00%	20.16	$ 1,847,178.00	0.34%
1.7	Emboquillado en alfacolor	M2	8.00	$ 80,225.00	0.01%	8.00	$ 80,225.00	0.01%	0.00	$ -	0.00%
1.8	Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio	Und	4.00	$ 633,788.00	0.12%	0.00	$ -	0.00%	4.00	$ 633,788.00	0.12%
1.9	Solucion de hallazgo auditoria interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINANRIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"	Global	1.00	$ 5,945,954.00	1.10%	1.00	$ 5,945,954.00	1.10%	0.00	$ -	0.00%
1.10	Suministro e instalacion de brazos hidraulicos para las puertas de las jaulas	Und	10.00	$ 1,710,167.00	0.32%	10.00	$ 1,710,167.00	0.32%	0.00	$ -	0.00%
1.11	Jaula metalica para animales (Incluye demolicion de la existente)	Und	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
1.12	Excavación h=1,00m, Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)	M2	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
1.13	Pintura Perimetral (Sección Amarilla)	M2	240.10	$ 3,763,799.00	0.70%	240.10	$ 3,763,799.00	0.70%	0.00	$ -	0.00%
1.14	Aseo y bote de escombros	M3	60.00	$ 3,720,469.00	0.69%	60.00	$ 3,720,469.00	0.69%	0.00	$ -	0.00%
1.15	Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación	M2	2.25	$ 202,372.00	0.04%	2.25	$ 202,372.00	0.04%	0.00	$ -	0.00%
1.16	Pintura Perimetral (Sección Gris)	M2	79.93	$ 1,253,037.00	0.23%	79.93	$ 1,253,037.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
1.17	Cerca electrica perimetral (A todo Costo)	Global	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
1.18	Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)	M3	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
1.19	Suministro e Instalación de rejillas para sumideros (0,40M de ancho)	ML	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
1.20	Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros		0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
NP1.21	Retiro y reinstalación de teja de barro	M2	45.00	$ 3,263,331.00	0.61%	45.00	$ 3,263,331.00	0.61%	0.00	$ -	0.00%
NP1.22	Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo, incluye sustitución del 10% de adoquin y pintura tipo tráfico.	M2	186.65	$ 17,357,108.00	3.22%	186.65	$ 17,357,108.00	3.22%	0.00	$ -	0.00%
NP1.23	Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)	M3	50.80	$ 2,406,473.00	0.45%	50.80	$ 2,406,473.00	0.45%	0.00	$ -	0.00%
NP1.24	Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo, incluye perfilada y compactación de la rasante	M3	27.57	$ 4,753,399.00	0.88%	27.57	$ 4,753,399.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
NP1.25	Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluye refuerzo en hierro de 3/8"	ML	134.99	$ 8,097,242.00	1.50%	134.99	$ 8,097,242.00	1.50%	0.00	$ -	0.00%
NP1.26	Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante	M2	54.25	$ 5,779,474.00	1.07%	54.25	$ 5,779,474.00	1.07%	0.00	$ -	0.00%
NP1.27	Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0,40 m de ancho, con marco en ángulo de 2", contramarco en ángulo de 1½", refuerzos en platina de 1 1/2" y malla	ML	75.50	$ 35,241,547.00	6.54%	48.00	$ 22,405,223.14	4.15%	27.50	$ 12,836,323.86	2.38%
NP1.28	Construcción e instalación de jaula para animales de 3,00 x 3,00 m, en estructura metálica completa, incluyendo fabricación y montaje, con piso en concreto reforzado, elevado y separado del terreno, según diseño	Und	1.00	$ 9,124,107.00	1.69%	0.00	$ -	0.00%	1.00	$ 9,124,107.00	1.69%

NP1.29	Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura metálica y cerramiento existente en la Cr. 1 y Calle 58	ML	295.75	$ 39,942,698.00	7.41%	140.00	$ 18,907,786.04	3.51%	155.75	$ 21,034,911.96	3.90%
NP1.30	Suministro y Aplicación de Esgrafiado en graniplast en zona del Archivo Historico	M2	67.11	$ 2,294,064.00	0.43%	67.11	$ 2,294,064.00	0.43%	0.00	$ -	0.00%
NP1.31	Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora	M2	101.05	$ 2,102,671.00	0.39%	101.05	$ 2,102,671.00	0.39%	0.00	$ -	0.00%
NP1.32	Poda de Limoncillos	ML	86.00	$ 2,826,368.46	0.52%	86.00	$ 2,826,368.46	0.52%	0.00	$ -	0.00%
NP1.33	Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2,50 m de altura. Incluye: excavación cepellón (50x50x60 cm), protección raíces, transporte interno en	Und	11.00	$ 1,213,772.00	0.23%	11.00	$ 1,213,772.00	0.23%	0.00	$ -	0.00%
NP1.34	Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).	Und	2.00	$ 3,261,949.00	0.60%	2.00	$ 3,261,949.00	0.60%	0.00	$ -	0.00%
2	**ARCHIVO HISTORICO**										
2.1	Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)	M2	217.80	$ 4,750,408.00	0.88%	217.80	$ 4,750,408.00	0.88%	0.00	$ -	0.00%
2.2	Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m	M2	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
2.3	Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Logica en angulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.	ML	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
2.4	Correa en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18 -refuerzo para colocacion Cubierta Termoacustica en fibrocarbono tipo colonial	ML	6.60	$ 319,137.00	0.06%	6.60	$ 319,137.00	0.06%	0.00	$ -	0.00%
2.5	Suministro e instalacion de Caballete colonia en fibrocarbono	ML	0.00	$ -	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	$ -	0.00%
2.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC	M2	158.00	$ 15,264,916.00	2.83%	158.00	$ 15,264,916.00	2.83%	0.00	$ -	0.00%
NP2.7	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. Incluye arreglo estructura de cubierta (soldadura cerchas y correas)	M2	224.33	$ 22,202,950.00	4.12%	224.33	$ 22,202,950.00	4.12%	0.00	$ -	0.00%
NP2.8	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	28.00	$ 1,590,484.59	0.29%	28.00	$ 1,590,484.59	0.29%	0.00	$ -	0.00%
NP2.9	Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura existente y pintura	KG	305.17	$ 6,732,343.00	1.25%	305.17	$ 6,732,343.00	1.25%	0.00	$ -	0.00%
NP2.10	Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta, mediante aplicación de mortero cemento–arena en proporción 1:4. Incluye la regularización de superficies, ajuste de nivel y alineación del paramento, instalación de ladrillo tolete para conformación del remate, y acabado final con pañete impermeable para garantizar una correcta unión entre muro y cubierta.	ML	64.50	$ 3,231,773.00	0.60%	64.50	$ 3,231,773.00	0.60%	0.00	$ -	0.00%
NP2.11	Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND	2.00	$ 1,934,014.00	0.36%	2.00	$ 1,934,014.00	0.36%	0.00	$ -	0.00%
3	**CAFETERIA**										
3.1	Corte y demolición de áreas afectadas	M2	45.52	$ 3,113,576.00	0.58%	45.52	$ 3,113,576.00	0.58%	0.00	$ -	0.00%
3.2	Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas	M2	27.92	$ 1,995,334.00	0.37%	27.92	$ 1,995,334.00	0.37%	0.00	$ -	0.00%
3.3	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)	ML	21.00	$ 1,766,692.00	0.33%	21.00	$ 1,766,692.00	0.33%	0.00	$ -	0.00%
3.4	Bajantes 3" (Accesorios Incluidos)	ML	50.50	$ 3,454,589.00	0.64%	36.50	$ 2,496,881.16	0.46%	14.00	$ 957,707.84	0.18%
3.5	Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosin rojo)		36.00	$ 15,274,237.00	2.83%	36.00	$ 15,274,237.00	2.83%	0.00	$ -	0.00%
NP3.6	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm	M2	27.92	$ 3,794,385.00	0.70%	27.92	$ 3,794,385.00	0.70%	0.00	$ -	0.00%

4	**ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS**										
0	ADECUACION ELECTRICA BLOQUE DE GESTION DOCUMENTAL										
4.1	Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD	Global	1.00	$ 50,153,642.00	9.30%	1.00	$ 50,153,642.00	9.30%	0.00	$ -	0.00%
4.2	UPS 3KVA + Gabinete	Global	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
4.3	Adecuación Tablero Eléctrico	Global	1.00	$ 6,284,918.00	1.17%	1.00	$ 6,284,918.00	1.17%	0.00	$ -	0.00%
4.4	Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.	Global	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%	0.00	$ -	0.00%
NP.4.13	UPS 6KVA + Gabinete	UND	1.00	$ 19,363,659.00	3.59%	1.00	$ 19,363,659.00	3.59%	0.00	$ -	0.00%
NP.4.14	Adecuación Eléctrica Auditorio	UND	1.00	$ 7,162,078.00	1.33%	1.00	$ 7,162,078.00	1.33%	0.00	$ -	0.00%
NP.4.15	Red eléctrica interna archivo histórico	UND	1.00	$ 22,870,124.00	4.24%	1.00	$ 22,870,124.00	4.24%	0.00	$ -	0.00%
0	**MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DG**										
4.5	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A	Global	1.00	$ 1,122,690.00	0.21%	1.00	$ 1,122,690.00	0.21%	0.00	$ -	0.00%
4.6	Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm	Global	1.00	$ 25,578,345.00	4.74%	1.00	$ 25,578,345.00	4.74%	0.00	$ -	0.00%
4.7	Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10	Global	1.00	$ 20,691,193.00	3.84%	1.00	$ 20,691,193.00	3.84%	0.00	$ -	0.00%
4.8	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio superior a 90"	Global	1.00	$ 85,620,540.00	15.88%	1.00	$ 85,620,540.00	15.88%	0.00	$ -	0.00%
4.9	Suministro e Instalación de Sistema de Sonido	Global	1.00	$ 21,712,676.00	4.03%	0.00	$ -	0.00%	1.00	$ 21,712,676.00	4.03%
4.10	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"	Global	1.00	$ 15,206,971.00	2.82%	1.00	$ 15,206,971.00	2.82%	0.00	$ -	0.00%
4.11	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio	Global	1.00	$ 2,985,336.00	0.55%	1.00	$ 2,985,336.00	0.55%	0.00	$ -	0.00%
4.12	Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio	Global	1.00	$ 1,342,458.00	0.25%	1.00	$ 1,342,458.00	0.25%	0.00	$ -	0.00%
NP.4.16	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 6A	UND	1.00	$ 1,057,755.00	0.20%	1.00	$ 1,057,755.00	0.20%	0.00	$ -	0.00%
	VALOR TOTAL			$ 539,252,274.61	100.00%		$ 471,105,581.95	87.36%		$ 68,146,692.66	12.64%

La interventoría verifica y aprueba las cantidades de obra que el contratista ejecuta, cumpliendo con un avance en su ejecución del 87,36% del valor contractual.

Actividad o producto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	% de Ejecución	OBSERVACIONES
"Realizar adecuaciones de la infraestructura física, eléctrica y de red de datos en la sede principal de la corporación autónoma regional del alto magdalena CAM".	$539.252.274,61	$471.105.581,95	$ 68.146.692,66	87,36%	La ejecución de las actividades se realizó según lo establecido en el contrato.

V. OTROS

CONCEPTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión)	X		Se anexa planilla de pago de seguridad social del equipo técnico en los meses de ejecución del presente contrato.
Modificación de garantías			No aplica
Cláusulas de responsabilidad ambiental	X		
Cláusulas de responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo.	X		
Otros (Explicar)			No aplica

VI. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR (APLICA PARA INFORMES PARCIALES Y SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA)

Calificación Promedio mínima aceptable 3,5

VALORACION DE LA CALIFICACION

- **De 1 a 3,5: No confiable**
- **De 3,6 a 4,5: Confiable**
- **De 4,6 a 5: Muy confiable**

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño técnico	4.5
Oportunidad en entrega	5.0
Cantidad entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

VII. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista de obra, a la fecha tuvo una ejecución total por valor de $ 471.105.581,95 conforme al Acta de Parcial 1, el pago es de $ 471.105.581,95 correspondiente al 87,36%; por lo tanto, la interventoría en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA – FORMA DE PAGO, "*LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales según avance de la obra del objeto contractual hasta un 90% y el saldo del 10% se efectuará después de la liquidación del contrato de obra. Para cada pago parcial será necesario un acta parcial…*", por tanto, se autoriza el pago por la suma de **$471.105.581,95** del valor del contrato ejecutado y el valor restante se cancelará una vez se haga el recibo final y se suscriba el acta de liquidación del contrato.

DESCRIPCION	VALOR ($)
VALOR CONTRATO	**$ 539.252.274,61**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 471.105.581,95
VALOR A AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR DESEMBOLSO	**$ 471.105.581,95**

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

ANEXO 1
PROGRAMACION DE OBRA

PROGRAMACION DE OBRA
ADECUACIONES CAM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL UNITARIO	VR. TOTAL	PESO%	MES 1								MES 2								MES 3							
							SEM 1	SEM 2		SEM 3		SEM 4			SEM 5		SEM 6		SEM 7		SEM 8		SEM 9		SEM 10		SEM 11		SEM 12		SEM 13	
							11/01/2026	12/01/2026	18/01/2026	19/01/2026	25/01/2026	26/01/2026	1/02/2026		2/02/2026	8/02/2026	9/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	1/03/2026	2/03/2026	8/03/2026	9/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	22/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	6/04/2026
							Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado		Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado
1	**ACTIVIDADES GENERALES**																															
1.1	Suministro e Instalación de gravilla lavada	M3	50,00	$ 169.636,00	$ 8.481.800,00	2,24%	$ 3.855.364		$ -														$ 4.626.436				$ -				
1.2	Revision de cubierta y corrección de goteras incluida lamina	M2	45,00	$ 48.749,00	$ 2.193.705,00	0,58%			$ -											$ 626.773		$ 940.159	$ 470.080		$ 156.693		$ -				
1.3	Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)	M2	30,00	$ 30.363,00	$ 910.890,00	0,24%										$ 227.723		$ 341.584					$ 227.723		$ 113.861		$ -				
1.4	Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio	Und	4,00	$ 50.798,00	$ 203.192,00	0,05%					$ -		$ 203.192			$ -							$ -		$ -		$ -				
1.5	Suministro e Instalacion de manijas para puertas de baño	Und	4,00	$ 30.363,00	$ 121.452,00	0,03%							$ 121.452			$ -							$ -		$ -		$ -				
1.6	Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura autoensablada en aluminio	M2	20,00	$ 72.529,00	$ 1.450.580,00	0,38%										$ -				$ 1.450.580			$ -		$ -		$ -				
1.7	Emboquillado en alfacolor	M2	8,00	$ 7.938,00	$ 63.504,00	0,02%										$ 63.504							$ -		$ -		$ -				
1.8	Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio	Und	4,00	$ 125.423,00	$ 501.692,00	0,13%																	$ 501.692		$ -		$ -				
1.9	Solucion de hallazgo auditoria interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINARIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"	Global	1,00	$ 4.706.684,00	$ 4.706.684,00	1,24%			$ 2.353.342		$ 2.353.342												$ -		$ -		$ -				
1.10	Suministro e instalacion de brazos hidraulicos para las puertas de las jaulas	Und	10,00	$ 135.373,00	$ 1.353.730,00	0,36%					$ 1.353.730												$ -		$ -		$ -				
1.11	Jaula metalica para animales (Incluye demolicion de la existente)	Und	1,00	$ 1.856.715,00	$ 1.856.715,00	0,49%																	$ -		$ -		$ 1.856.715,00				
1.12	Excavación h=1,00m; Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)	M2	200,00	$ 58.930,00	$ 11.786.000,00	3,11%																	$ -		$ 3.466.471		$ 4.159.764,71		$ 4.159.765		
1.13	Pintura Perimetral (Sección Amarilla)	M2	15,36	$ 12.409,00	$ 190.602,24	0,05%																	$ 76.241		$ 114.361		$ -		$ -		$ -
1.14	Aseo y bote de escombros	M3	10,00	$ 49.084,00	$ 490.840,00	0,13%							$ 267.731										$ 44.622		$ 178.487		$ -		$ -		$ -
1.15	Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación	M2	2,25	$ 71.197,00	$ 160.193,25	0,04%												$ 160.193					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
1.16	Pintura Perimetral (Sección Gris)	M2	68,20	$ 12.409,00	$ 846.293,80	0,22%																	$ 362.697		$ 483.596		$ -		$ -		$ -
1.17	Cerca electrica perimetral (A todo Costo)	Global	1,00	$ 7.540.359,00	$ 7.540.359,00	1,99%																	$ -		$ -		$ 2.381.166,00		$ 2.381.166		$ 2.778.027
1.18	Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)	M3	43,05	$ 523.443,00	$ 22.534.221,15	5,94%																	$ -		$ 1.733.402		$ 10.400.409,76		$ 10.400.410		
1.19	Suministro e instalación de rejillas para sumideros (0.40M de ancho)	ML	75,50	$ 121.342,00	$ 9.161.321,00	2,41%																	$ 2.893.049		$ 2.893.049		$ 2.893.048,74		$ 482.175		
1.20	Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros	M2	861,00	$ 12.117,00	$ 10.432.737,00	2,75%																	$ 5.690.584		$ 4.742.153		$ -				
		SUBTOTAL			**$ 84.986.511,44**	**22,39%**	**$ 3.855.363,64**		**$ 2.353.342,00**		**$ 3.707.072,00**		**$ 592.374,91**			**$ 291.226,50**		**$ 501.777,00**		**$ 2.077.352,86**		**$ 940.159,29**		**$ 14.893.123,12**		**$ 13.882.073,67**		**$ 21.691.104,20**		**$ 17.423.515,26**		**$ 2.778.027,00**
2	**ARCHIVO HISTORICO**																										-	$ -				
2.1	Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)	M2	217,80	$ 17.265,00	$ 3.760.317,00	0,99%	$ 3.760.317															$ -					$ -				
2.2	Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m	M2	224,33	$ 78.634,00	$ 17.639.965,22	4,65%																$ -		$ 3.527.993		$ 10.583.979		$ 3.527.993			
2.3	Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Logica en angulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosia en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c. 3m	ML	40,68	$ 205.014,00	$ 8.339.969,52	2,20%												$ -				$ -		$ 8.339.970		$ -		$ -				
2.4	Correa en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18 - refuerzo para colocacion Cubierta Termoacustica en fibrocarbono tipo colonial	ML	333,37	$ 38.276,00	$ 12.760.070,12	3,36%										$ 8.506.713		$ 4.253.357		$ -		$ -				$ -		$ -				
2.5	Suministro e instalacion de Caballete colonia en fibrocarbono	ML	42,00	$ 54.549,00	$ 2.291.058,00	0,60%														$ -						$ 381.843		$ 1.909.215				
2.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC	M2	158,00	$ 76.477,00	$ 12.083.366,00	3,18%														$ -						$ 2.013.894		$ 10.069.472				
		SUBTOTAL			**$ 56.874.745,86**	**14,99%**	**$ 3.760.317,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 8.506.713,41**		**$ 4.253.356,71**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.867.962,56**		**$ 12.979.716,47**		**$ 15.506.679,71**		**$ -**		**$ -**
3,0	**CAFETERIA**																															
3.1	Corte y demolición de áreas afectadas	M2	25,00	$ 54.150,00	$ 1.353.750,00	0,36%							$ 1.353.750																			
3.2	Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas	M2	25,00	$ 56.571,00	$ 1.414.275,00	0,37%																	$ 235.713		$ 1.178.563							
3.3	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; d=50 (Accesorios Incluidos)	ML	22,50	$ 66.594,00	$ 1.498.365,00	0,39%										$ 1.498.365																
3.4	Bajantes 3" (Accesorios Incluidos)	ML	6,00	$ 54.150,00	$ 324.900,00	0,09%										$ 64.980		$ 259.920														
3.5	Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosin rojo)	M2	36,00	$ 335.854,00	$ 12.090.744,00	3,19%			$ 3.022.686		$ 4.534.029		$ 4.534.029																			
		SUBTOTAL SUMINISTRO			**$ 16.682.034,00**	**4,40%**			**$ 3.022.686**		**$ 4.534.029**		**$ 5.887.779**			**$ 1.563.345**		**$ 259.920**		**$ -**		**$ -**		**$ 235.713**		**$ 1.178.563**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4,0	**ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS**																															
	ADECUACION ELECTRICA BLOQUE DE GESTION DOCUMENTAL																															
4.1	Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD	Global	1,00	$ 39.700.500,00	$ 39.700.500,00	10,46%										$ 5.293.400		$ 15.880.200		$ 15.880.200		$ 2.646.700									
4.2	UPS 3KVA + Gabinete	Global	1,00	$ 14.875.250,00	$ 14.875.250,00	3,92%												$ -		$ -						$ 14.875.250						
4.3	Adecuación Tablero Eléctrico	Global	1,00	$ 4.975.000,00	$ 4.975.000,00	1,31%												$ 1.243.750		$ 3.731.250						$ -						
4.4	Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.	Global	1,00	$ 19.900.000,00	$ 19.900.000,00	5,24%																	$ 9.950.000		$ 9.950.000							
		SUBTOTAL SUMINISTRO			**$ 79.450.750,00**	**20,94%**			**$ -**		**$ -**		**$ -**			**$ 5.293.400**		**$ 17.123.950**		**$ 19.611.450**		**$ 2.646.700**		**$ 9.950.000**		**$ 24.825.250**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DG																															
4.5	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A	Global	5,00	$ 888.696,00	$ 4.443.480	1,17%																	$ 4.443.480		$ -							
4.6	Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm	Global	1,00	$ 20.247.245,00	$ 20.247.245	5,34%												$ 20.247.245								$ -						
4.7	Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm 10	Global	1,00	$ 16.378.685,00	$ 16.378.685	4,32%														$ 16.378.685						$ -						
4.8	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio superior a 90"	Global	1,00	$ 67.775.303,00	$ 67.775.303	17,86%																				$ 67.775.303						
4.9	Suministro e Instalación de Sistema de Sonido	Global	1,00	$ 17.187.268,00	$ 17.187.268	4,53%																				$ 11.458.179		$ 5.729.089				
4.10	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"	Global	1,00	$ 12.037.498,00	$ 12.037.498	3,17%																$ 12.037.498										
4.11	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio	Global	1,00	$ 2.363.125,00	$ 2.363.125	0,62%							$ 2.363.125																			
4.12	Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio	Global	1,00	$ 1.062.660,00	$ 1.062.660	0,28%					$ 354.220		$ 708.440									$ -	$ -									

PROGRAMACION DE OBRA
ADECUACIONES CAM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL UNITARIO	VR. TOTAL	PESO%	MES 1							MES 2							MES 3							
							SEM 1	SEM 2		SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6		SEM 7		SEM 8		SEM 9		SEM 10		SEM 11		SEM 12		SEM 13	
							11/01/2026	12/01/2026	18/01/2026	19/01/2026	25/01/2026	26/01/2026	1/02/2026	2/02/2026	8/02/2026	9/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	1/03/2026	2/03/2026	8/03/2026	9/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	22/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	6/04/2026
							Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado
	SUBTOTAL SUMINISTRO				$ 141.495.264,00	37,29%			$ -		$ 354.220,00		$ 3.071.565,00		$ -		$ 20.247.245,00		$ 16.378.685,00		$ 12.037.498,00		$ 4.443.480,00		$ 79.233.481,67		$ 5.729.089,33		$ -		$ -
	SUBTOTAL				$ 379.489.305,30	100,00%	$ 7.615.681		$ 5.376.028,00		$ 8.595.321,00		$ 9.551.718,91		$ 15.654.684,91		$ 42.386.248,71		$ 38.067.487,86		$ 15.624.357,29		$ 41.390.278,18		$ 132.099.084,30		$ 42.926.873,25		$ 17.423.515,26		$ 2.778.027,00
	ADMINISTRACION		15%		$ 56.923.395,80		$ 1.142.352		$ 806.404,20		$ 1.289.298,15		$ 1.432.757,84		$ 2.348.202,74		$ 6.357.937,31		$ 5.710.123,18		$ 2.343.653,59		$ 6.208.541,73		$ 19.814.862,65		$ 6.439.030,99		$ 2.613.527,29		$ 416.704,05
	IMPREVISTOS		3%		$ 11.384.679,16		$ 228.470		$ 161.280,84		$ 257.859,63		$ 286.551,57		$ 469.640,55		$ 1.271.587,46		$ 1.142.024,64		$ 468.730,72		$ 1.241.708,35		$ 3.962.972,53		$ 1.287.806,20		$ 522.705,46		$ 83.340,81
	UTILIDAD		7%		$ 26.564.251,37		$ 533.098		$ 376.321,96		$ 601.672,47		$ 668.620,32		$ 1.095.827,94		$ 2.967.037,41		$ 2.664.724,15		$ 1.093.705,01		$ 2.897.319,47		$ 9.246.935,90		$ 3.004.881,13		$ 1.219.646,07		$ 194.461,89
	IVA		19%		$ 5.047.207,76		$ 101.289		$ 71.501,17		$ 114.317,77		$ 127.037,86		$ 208.207,31		$ 563.737,11		$ 506.297,59		$ 207.803,95		$ 550.490,70		$ 1.756.917,82		$ 570.927,41		$ 231.732,75		$ 36.947,76
	TOTAL COSTO				$ 479.408.839,39		$ 9.620.889		$ 6.791.536		$ 10.858.469		$ 12.066.686		$ 19.776.563		$ 53.546.548		$ 48.090.657		$ 19.738.251		$ 52.288.338		$ 166.880.773		$ 54.229.519		$ 22.011.127		$ 3.509.482
	VALOR ACUMULADO MENSUAL								$ 16.412.426		$ 27.270.895		$ 39.337.581		$ 59.114.144		$ 112.660.692		$ 160.751.349,89		$ 180.489.600,4		$ 232.777.938,9		$ 399.658.712		$ 453.888.231		$ 475.899.357,88		$ 479.408.839,39
	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL						2,01%		1,42%		2,26%		2,52%		4,13%		11,17%		10,03%		4,12%		10,91%		34,81%		11,31%		4,59%		0,73%
	PORCENTAJE ACUMULADO SEMANAL						0,00%		3,42%		5,69%		8,21%		12,33%		23,50%		33,53%		37,65%		48,56%		83,36%		94,68%		99,27%		100,00%

REPROGRAMACION DE OBRA
ADECUACIONES CAM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL UNITARIO	VR. TOTAL	PESO%	MES 1								MES 2								MES 3							
							SEM 1		SEM 2		SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6		SEM 7		SEM 8		SEM 9		SEM 10		SEM 11		SEM 12		SEM 13	
							11/01/2026		12/01/2026	18/01/2026	19/01/2026	25/01/2026	26/01/2026	1/02/2026	2/02/2026	8/02/2026	9/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	1/03/2026	2/03/2026	8/03/2026	9/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	22/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	6/04/2026
							Ejecutado		Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado
1	**ACTIVIDADES GENERALES**																													
1.1	Suministro e Instalación de gravilla lavada	M3	38,71	$ 169.636,00	$ 6.566.338,14	2,28%	$ 2.984.699		$ -														$ 3.581.639		$ -		$ -				
1.2	Revision de cubierta y correción de goteras incluida lamina	M2	45,00	$ 48.749,00	$ 2.193.705,00	0,76%			$ -										$ 626.773		$ 940.159		$ 470.080		$ 156.693		$ -				
1.3	Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)	M2	114,12	$ 30.363,00	$ 3.464.873,75	1,20%										$ 866.218		$ 1.299.328						$ 866.218		$ 433.109		$ -				
1.4	Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio	Und	4,00	$ 50.798,00	$ 203.192,00	0,07%					$ -			$ 203.192		$ -								$ -		$ -		$ -				
1.5	Suministro e Instalacion de manijas para puertas de baño	Und	4,00	$ 30.363,00	$ 121.452,00	0,04%								$ 121.452		$ -								$ -		$ -		$ -				
1.6	Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura autoensoblada en	M2	20,16	$ 72.529,00	$ 1.462.184,64	0,51%										$ -								$ 1.253.301		$ 208.884		$ -				
1.7	Emboquillado en alfacolor	M2	8,00	$ 7.938,00	$ 63.504,00	0,02%										$ 63.504								$ -		$ -		$ -				
1.8	Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio	Und	4,00	$ 125.423,00	$ 501.692,00	0,17%																		$ 501.692		$ -		$ -				
1.9	Solucion de hallazgo auditoria interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE	Global	1,00	$ 4.706.684,00	$ 4.706.684,00	1,63%			$ 2.353.342		$ 2.353.342													$ -		$ -		$ -				
1.10	Suministro e instalacion de brazos hidraulicos para las puertas de las jaulas	Und	10,00	$ 135.373,00	$ 1.353.730,00	0,47%					$ 1.353.730													$ -		$ -		$ -				
1.11	Jaula metalica para animales (Incluye demolicion de la existente)	Und	0,00	$ 1.856.715,00	$ -	0,00%																		$ -		$ -		$ -				
1.12	Excavación h=1,00m, Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)	M2	0,00	$ 58.930,00	$ -	0,00%																		$ -		$ -		$ -				
1.13	Pintura Perimetral (Sección Amarilla)	M2	240,10	$ 12.409,00	$ 2.979.338,86	1,03%																		$ 1.191.736		$ 1.787.603		$ -			$ -	
1.14	Aseo y bote de escombros	M3	60,00	$ 49.084,00	$ 2.945.040,00	1,02%								$ 1.606.385										$ 267.731		$ 1.070.924		$ -			$ -	
1.15	Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación	M2	2,25	$ 71.197,00	$ 160.193,25	0,06%												$ 160.193						$ -		$ -		$ -			$ -	
1.16	Pintura Perimetral (Sección Gris)	M2	79,93	$ 12.409,00	$ 991.876,19	0,34%																		$ 425.090		$ 566.786		$ -			$ -	
1.17	Cerca electrica perimetral (A todo Costo)	Global	0,00	$ 7.540.359,00	$ -	0,00%																		$ -		$ -		$ -				
1.18	Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)	M3	0,00	$ 523.443,00	$ -	0,00%																		$ -		$ -		$ -				
1.19	Suministro e Instalación de rejillas para sumideros (0.40M de ancho)	ML	0,00	$ 121.342,00	$ -	0,00%																				$ -		$ -				
1.20	Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros	M2	0,00	$ 12.117,00	$ -	0,00%																				$ -		$ -				
NP1.21	Retiro y reinstalación de teja de barro	M2	45,00	$ 57.404,00	$ 2.583.180,00	0,90%																		$ 2.583.180		$ -		$ -				
NP1.22	Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo. incluye sustitución	M2	186,65	$ 73.613,00	$ 13.739.498,39	4,77%																		$ 4.579.833		$ 9.159.666		$ -				
NP1.23	Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)	M3	50,80	$ 37.500,00	$ 1.904.910,00	0,66%																		$ 1.904.910		$ -		$ -				
NP1.24	Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo. incluye perfilada y compactación de la	M3	27,57	$ 136.476,00	$ 3.762.684,26	1,31%																		$ -		$ 3.762.684		$ -				
NP1.25	Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluve refuerzo en hierro de 3/8"	ML	134,99	$ 47.482,00	$ 6.409.595,18	2,22%																		$ 6.409.595		$ -		$ -				
NP1.26	Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante	M2	54,25	$ 84.330,00	$ 4.574.902,50	1,59%																		$ 3.049.935		$ 1.524.968		$ -				
NP1.27	Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0.40 m de ancho. con marco en ángulo de 2".	ML	75,50	$ 369.489,00	$ 27.896.419,50	9,68%																		$ -		$ 9.298.807		$ 9.298.806,50		$ 9.298.807		
NP1.28	Construcción e instalación de jaula para animales de 3.00 x 3.00 m. en estructura metálica comoleta.	Und	1,00	$ 7.222.439,00	$ 7.222.439,00	2,51%																		$ -		$ -		$ 4.333.463,40		$ 2.888.976		
NP1.29	Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura	ML	295,75	$ 106.907,00	$ 31.617.745,25	10,98%																		$ -		$ -		$ 13.550.462,25		$ 13.550.462		$ 4.516.821
NP1.30	Suministro y Aplicación de Esgrafiado en granoplast en zona del Archivo Historico	M2	67,11	$ 27.059,00	$ 1.815.929,49	0,63%																		$ 1.210.620		$ 605.310				$ -		$ -
NP1.31	Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora	M2	101,05	$ 16.471,00	$ 1.664.427,49	0,58%																		$ 1.664.427						$ -		$ -
NP1.32	Poda de Limoncillos	ML	86,00	$ 26.015,00	$ 2.237.290,00	0,78%																				$ 2.237.290				$ -		$ -
NP1.33	Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2.50 m de altura. Incluve: excavación cepellón	Und	11,00	$ 87.345,00	$ 960.795,00	0,33%																				$ -				$ 576.477		$ 384.318
NP1.34	Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).	Und	2,00	$ 1.291.043,00	$ 2.582.086,00	0,90%																				$ 2.582.086				$ -		
			SUBTOTAL		**$136.685.705,88**	**47,45%**	**$ 2.984.699,16**		**$ 2.353.342,00**		**$ 3.707.072,00**		**$ 1.931.029,45**		**$ 929.722,44**		**$ 1.459.520,90**		**$ 626.772,86**		**$ 940.159,29**		**$ 29.959.986,56**		**$ 33.394.808,98**		**$ 27.182.732,15**		**$ 26.314.721,35**		**$ 4.901.138,75**
2	**ARCHIVO HISTORICO**																										-					
2.1	Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)	M2	217,80	$ 17.265,00	$ 3.760.317,00	1,31%	$ 3.760.317														$ -		$ -		$ -		$ -				
2.2	Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m	M2	0,00	$ 78.634,00	$ -	0,00%															$ -		$ -		$ -		$ -				
2.3	Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Logica en angulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c. 30	ML	0,00	$ 205.014,00	$ -	0,00%												$ -			$ -		$ -		$ -		$ -				
2.4	Correa en perfil metalico 3"x1 1/2" Cal. 18 - refuerzo para colocacion Cubierta Termoacustica en fibrocarbono tipo colonial	ML	6,60	$ 38.276,00	$ 252.621,60	0,09%										$ 168.414		$ 84.207		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				
2.5	Suministro e instalacion de Caballete colonia en fibrocarbono	ML	0,00	$ 54.549,00	$ -	0,00%														$ -				$ -		$ -		$ -				
2.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en pvc	M2	158,00	$ 76.477,00	$ 12.083.366,00	4,19%														$ -				$ -		$ 2.013.894		$ 10.069.472				
NP2.7	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color 1080 mm	M2	224,33	$ 78.346,00	$ 17.575.358,18	6,10%														$ -				$ -		$ 17.575.358		$ -				
NP2.8	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color 1080 mm	ML	28,00	$ 44.964,00	$ 1.258.992,00	0,44%														$ -				$ -		$ 503.597		$ 755.395				
NP2.9	Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura	KG	305,17	$ 17.463,00	$ 5.329.172,07	1,85%														$ 5.329.172				$ -		$ -		$ -				
NP2.10	Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta. mediante aplicación de	ML	64,50	$ 39.662,00	$ 2.558.199,00	0,89%																				$ 2.558.199		$ -				
NP2.11	Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluve chapa de seguridad	UND	2,00	$ 765.461,00	$ 1.530.922,00	0,53%																						$ 1.530.922				
			SUBTOTAL		**$ 44.348.947,85**	**15,39%**	**$ 3.760.317,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 168.414,40**		**$ 84.207,20**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.329.172,07**		**$ 22.651.048,31**		**$ 12.355.788,87**		**$ -**		**$ -**	
3,0	**CAFETERIA**																															
3.1	Corte y demolición de áreas afectadas	M2	45,52	$ 54.150,00	$ 2.464.637,25	0,86%							$ 2.464.637											$ -		$ -						

REPROGRAMACION DE OBRA
ADECUACIONES CAM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VAL UNITARIO	VR. TOTAL	PESO%	MES 1								MES 2								MES 3							
							SEM 1		SEM 2		SEM 3		SEM 4		SEM 5		SEM 6		SEM 7		SEM 8		SEM 9		SEM 10		SEM 11		SEM 12		SEM 13	
							11/01/2026		12/01/2026	18/01/2026	19/01/2026	25/01/2026	26/01/2026	1/02/2026	2/02/2026	8/02/2026	9/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	1/03/2026	2/03/2026	8/03/2026	9/03/2026	15/03/2026	16/03/2026	22/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	6/04/2026
							Ejecutado		Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado	Cant	Ejecutado
3.2	Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas	M2	27,92	$ 56.571,00	$ 1.579.462,32	0,55%																		$ 263.244		$ 1.316.218						
3.3	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)	ML	21,00	$ 66.594,00	$ 1.398.474,00	0,49%										$ 1.398.474								$ -								
3.4	Bajantes 3" (Accesorios Incluidos)	ML	50,50	$ 54.150,00	$ 2.734.575,00	0,95%										$ 546.915		$ 2.187.660						$ -								
3.5	Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosin rojo)	M2	36,00	$ 335.854,00	$ 12.090.744,00	4,20%				$ 3.022.686		$ 4.534.029		$ 4.534.029										$ -								
NP3.6	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm	M2	27,92	$ 107.577,00	$ 3.003.549,84	1,04%																		$ 3.003.550								
		SUBTOTAL SUMINISTRO			$ 23.271.442,41	8,08%				$ 3.022.686		$ 4.534.029		$ 6.998.666		$ 1.945.389		$ 2.187.660		$ -		$ -		$ 3.266.794		$ 1.316.218		$ -		$ -		$ -
4,0	ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS																															
	ADECUACION ELECTRICA BLOQUE DE GESTION DOCUMENTAL																															
4.1	Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD	Global	1,00	$ 39.700.500,00	$ 39.700.500,00	13,78%										$ 5.293.400		$ 15.880.200		$ 15.880.200		$ 2.646.700		$ -		$ -						
4.2	UPS 3KVA + Gabinete	Global	0,00	$ 14.875.250,00	$ -	0,00%												$ -		$ -				$ -		$ -						
4.3	Adecuación Tablero Eléctrico	Global	1,00	$ 4.975.000,00	$ 4.975.000,00	1,73%												$ 1.243.750		$ 3.731.250				$ -		$ -						
4.4	Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.	Global	0,00	$ 19.900.000,00	$ -	0,00%																		$ -		$ -						
NP.4.13	UPS 6KVA + Gabinete	UND	1,00	$ 15.327.839,00	$ 15.327.839,00	5,32%																		$ 15.327.839		$ -						
NP.4.14	Adecuación Eléctrica Auditorio	UND	1,00	$ 5.669.341,00	$ 5.669.341,00	1,97%																		$ -		$ 5.669.341						
NP.4.15	Red eléctrica interna archivo histórico	UND	1,00	$ 18.103.478,00	$ 18.103.478,00	6,28%																		$ 12.068.985		$ 6.034.493						
		SUBTOTAL SUMINISTRO			$ 83.776.158,00	29,08%				$ -		$ -		$ -		$ 5.293.400		$ 17.123.950		$ 19.611.450		$ 2.646.700		$ 27.396.824		$ 11.703.834		$ -		$ -		$ -
	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DG																															
4.5	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A	Global	0,00	$ 888.696,00	$ -	0,00%																		$ 888.696		$ -		$ -				
4.6	Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm	Global	0,00	$ 20.247.245,00	$ -	0,00%												$ 20.247.245								$ -		$ -				
4.7	Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10	Global	0,00	$ 16.378.685,00	$ -	0,00%														$ 16.378.685						$ -		$ -				
4.8	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio superior a 90"	Global	0,00	$ 67.775.303,00	$ -	0,00%																				$ 67.775.303		$ -				
4.9	Suministro e Instalación de Sistema de Sonido	Global	0,00	$ 17.187.268,00	$ -	0,00%																				$ 11.458.179		$ 5.729.089				
4.10	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"	Global	0,00	$ 12.037.498,00	$ -	0,00%																$ 12.037.498				$ -		$ -				
4.11	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio	Global	0,00	$ 2.363.125,00	$ -	0,00%								$ 2.363.125												$ -		$ -				
4.12	Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio	Global	0,00	$ 1.062.660,00	$ -	0,00%						$ 354.220		$ 708.440								$ -		$ -		$ -		$ -				
O DIRECTO	0	0	0,00	$ -	$ -	0,00%																				$ 627.971		$ 209.324				
		SUBTOTAL SUMINISTRO			$ -	0,00%				$ -		$ 354.220,00		$ 3.071.565,00		$ -		$20.247.245,00		$ 16.378.685,00		$ 12.037.498,00		$ 888.696,00		$ 79.861.452,92		$ 5.938.413,08		$ -		$ -
		SUBTOTAL			$288.082.254,14	100,00%	$ 6.745.016		$ 5.376.028,00		$ 8.595.321,00		$12.001.260,70		$ 8.336.925,84		$41.102.583,10		$ 36.616.907,86		$ 15.624.357,29		$ 66.841.472,63		$148.927.362,21		$45.476.934,10		$ 26.314.721,35		$ 4.901.138,75	
		ADMINISTRACION		15%	$ 43.212.338,12		$ 1.011.752		$ 806.404,20		$ 1.289.298,15		$ 1.800.189,11		$ 1.250.538,88		$ 6.165.387,47		$ 5.492.536,18		$ 2.343.653,59		$ 10.026.220,89		$ 22.339.104,33		$ 6.821.540,12		$ 3.947.208,20		$ 735.170,81	
		IMPREVISTOS		3%	$ 8.642.467,62		$ 202.350		$ 161.280,84		$ 257.859,63		$ 360.037,82		$ 250.107,78		$ 1.233.077,49		$ 1.098.507,24		$ 468.730,72		$ 2.005.244,18		$ 4.467.820,87		$ 1.364.308,02		$ 789.441,64		$ 147.034,16	
		UTILIDAD		7%	$ 20.165.757,79		$ 472.151		$ 376.321,96		$ 601.672,47		$ 840.088,25		$ 583.584,81		$ 2.877.180,82		$ 2.563.183,55		$ 1.093.705,01		$ 4.678.903,08		$ 10.424.915,35		$ 3.183.385,39		$ 1.842.030,49		$ 343.079,71	
		IVA		19%	$ 3.831.493,98		$ 89.709		$ 71.501,17		$ 114.317,77		$ 159.616,77		$ 110.881,11		$ 546.664,36		$ 487.004,87		$ 207.803,95		$ 888.991,59		$ 1.980.733,92		$ 604.843,22		$ 349.985,79		$ 65.185,15	
		TOTAL COSTO			$ 363.934.311,66		$ 8.520.979		$ 6.791.536		$ 10.858.469		$ 15.161.193		$ 10.532.038		$ 51.924.893		$ 46.258.140		$ 19.738.251		$ 84.440.832		$ 188.139.937		$ 57.451.011		$ 33.243.387		$ 6.191.609	
		VALOR ACUMULADO MENSUAL							$ 15.312.515		$ 26.170.984		$ 41.332.177		$ 51.864.215		$ 103.789.108		$ 150.047.248,09		$ 169.785.498,6		$ 254.226.331,0		$ 442.366.268		$ 499.817.279		$ 533.060.666,03		$ 539.252.274,61	
		PORCENTAJE EJECUTADO SEMANAL					2,34%		1,87%		2,98%		4,17%		2,89%		14,27%		12,71%		5,42%		23,20%		51,70%		15,79%		9,13%		1,70%	
		PORCENTAJE ACUMULADO SEMANAL					0,00%		4,21%		7,19%		11,36%		14,25%		28,52%		41,23%		46,65%		69,86%		121,55%		137,34%		146,47%		148,17%	

ANEXO 2
ACTA DE PARCIAL OBRA No.1
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1 Y MEMORIA DE CANTIDADES

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 507**	**AÑO:**	**2025**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA**			
	NIT y/o CC:	**C.C 7.963.769 DE NEIVA**			
	DIRECCIÓN:	**Calle 33 B # 4 - 89**	**TEL:**	**3103242949**	
	CIUDAD:	**NEIVA - HUILA**			
	REPRESENTANTE LEGAL:	**N/A**			
OBJETO:	"ADECUACIONES ELÉCTRICAS, TECNOLÓGICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA".				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2025001999** del **18/12/2025** **2026000577** del **05/03/2026 Adicional**				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 479.408.839,39**				
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE				
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**				
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$ 59.843.435,22			
VALOR TOTAL	**$ 539.252.274,61**				
PLAZO INICIAL:	**TRES (3) MESES**				
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A			
FECHA INICIO	06 de enero de 2026				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	N/A		
		REINICIACIÓN	N/A		
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A		
		REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de abril de 2026				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	24/03/2026				
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 06/01/2026 al 21/03/2026				
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ANDRES FELIPE CABRERA SANCHEZ**			
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR			
	NOMBRE:	**ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA**			

	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**06/01/2026**	**-**	**$ 479.408.839,39**	**$ 479.408.839,39**
VALOR ADICIONAL	**04/03/2026**	-	$ 59.843.435,22	**$ 539.252.274,61**
ANTICIPO	N/A	-		**$ 539.252.274,61**
VALOR EJECUTADO	21/03/2026	$ 471.105.581,95	-	**$ 68.146.692,66**
AMORTIZACION ANTICIPO		-		
PAGO PARCIAL No.1	Por pagar	$ 471.105.581,95	-	**$ 68.146.692,66**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron el 87,36% de las actividades objeto del contrato; recibiendo a satisfacción las actividades realizadas las instalaciones de La Corporación.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor $471.105.581,95, conforme al Acta de Recibo Parcial 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA CUARTA –FORMA DE PAGO: *LA CORPORACIÓN pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante pagos parciales según avance de la obra del objeto contractual hasta un 90% y el saldo del 10% se efectuará después de la liquidación del contrato de obra. Para cada pago parcial será necesario un acta parcial…"*; por tanto, se autoriza el primer pago correspondiente al **87,36%**, la suma a pagar será de **$471.105.581,95** del valor del contrato ejecutado.

1. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.1.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
Contratista de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
¡Cuida tu naturaleza!

OBJETO:	ADECUACIONES ELÉCTRICAS, TECNOLÓGICAS Y MANTENIMIENTO LOCATIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA				
CONTRATISTA DE OBRA:	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	FECHA DE INICIO:	6/01/2026
R. LEGAL	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA	R. LEGAL	CARLOS ARTURO QUIZA	OTRO SI No 1 OBRA:	4/03/2026
VALOR AJUSTADO OBRA:	$ 479.408.839,39	VALOR INTERVENTORÍA:	$ 46.556.370,00	FECHA SUSPENSION No.1:	N/A
VALOR OTRO SI No 1:	$ 59.843.435,22	VALOR OTRO SI No 1:	N/A	FECHA REINICIO No.1:	N/A
VALOR FINAL OBRA:	$ 539.252.274,61	VALOR FINAL	N/A	FECHA SUSPENSION	N/A
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES	FECHA REINICIO No.2:	N/A
PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A	PLAZO ADICIONAL:	N/A
				FECHA TERMINACIÓN:	5/04/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	TRES (03) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	TRES (03) MESES	PERIODO:	06/01/2026 al 21/03/2026

ACTA DE RECIBO DE OBRA No.1PARCIAL

24 DE MARZO DE 2026

		CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA DE RECIBO DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	INICIALES				CANTIDADES ACTUALIZADAS (OTROSÍ No.1)			PRESENTE ACTA		ACUMULADO			SALDO	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR
1.1	Suministro e Instalación de gravilla lavada	M3	50,00	$ 169.636,00	$ 8.481.800,00	-	38,71	$ 6.566.338,14	38,71	$ 6.566.338,14	38,71	$ 6.566.338,14	100,00%	-	$ -
1.2	Revisión de cubierta y corrección de goteras incluida lamina	M2	45,00	$ 48.749,00	$ 2.193.705,00		45,00	$ 2.193.705,00	45,00	$ 2.193.705,00	45,00	$ 2.193.705,00	100,00%	-	$ -
1.3	Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)	M2	30,00	$ 30.363,00	$ 910.890,00	+	114,12	$ 3.464.873,75	114,12	$ 3.464.873,75	114,12	$ 3.464.873,75	100,00%	-	$ -
1.4	Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio	Und	4,00	$ 50.798,00	$ 203.192,00		4,00	$ 203.192,00	4,00	$ 203.192,00	4,00	$ 203.192,00	100,00%	-	$ -
1.5	Suministro e Instalación de manijas para puertas de baño	Und	4,00	$ 30.363,00	$ 121.452,00		4,00	$ 121.452,00	4,00	$ 121.452,00	4,00	$ 121.452,00	100,00%	-	$ -
1.6	Mantenimiento y reparación de cielo raso en icopor, incluye estructura autoensablada en aluminio	M2	20,00	$ 72.529,00	$ 1.450.580,00	+	20,16	$ 1.462.184,64	-	$ -	-	$ -	0,00%	20,16	$ 1.462.184,64
1.7	Emboquillado en alfacolor	M2	8,00	$ 7.938,00	$ 63.504,00		8,00	$ 63.504,00	8,00	$ 63.504,00	8,00	$ 63.504,00	100,00%	-	$ -
1.8	Suministro e instalación de manijas para puertas en vidrio	Und	4,00	$ 125.423,00	$ 501.692,00		4,00	$ 501.692,00	-	$ -	-	$ -	0,00%	4,00	$ 501.692,00
1.9	Solución de hallazgo auditoria interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINANRIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"	Global	1,00	$ 4.706.684,00	$ 4.706.684,00		1,00	$ 4.706.684,00	1,00	$ 4.706.684,00	1,00	$ 4.706.684,00	100,00%	-	$ -
1.10	Suministro e instalación de brazos hidráulicos para las puertas de las jaulas	Und	10,00	$ 135.373,00	$ 1.353.730,00		10,00	$ 1.353.730,00	10,00	$ 1.353.730,00	10,00	$ 1.353.730,00	100,00%	-	$ -
1.11	Jaula metálica para animales (Incluye demolición de la existente)	Und	1,00	$ 1.856.715,00	$ 1.856.715,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
1.12	Excavación h=1,00m, Relleno y Nivelación Domo (Incluye limpieza de Adoquines)	M2	200,00	$ 58.930,00	$ 11.786.000,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
1.13	Pintura Perimetral (Sección Amarilla)	M2	153,6	$ 12.409,00	$ 190.602,24	+	240,10	$ 2.979.338,86	240,10	$ 2.979.338,86	240,10	$ 2.979.338,86	100,00%	-	$ -
1.14	Aseo y bote de escombros	M3	10,00	$ 49.084,00	$ 490.840,00	+	60,00	$ 2.945.040,00	60,00	$ 2.945.040,00	60,00	$ 2.945.040,00	100,00%	-	$ -
1.15	Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación	M2	2,25	$ 71.197,00	$ 160.193,25		2,25	$ 160.193,25	2,25	$ 160.193,25	2,25	$ 160.193,25	100,00%	-	$ -
1.16	Pintura Perimetral (Sección Gris)	M2	68,20	$ 12.409,00	$ 846.293,80	+	79,93	$ 991.876,19	79,93	$ 991.876,19	79,93	$ 991.876,19	100,00%	-	$ -
1.17	Cerca eléctrica perimetral (A todo Costo)	Global	1,00	$ 7.540.359,00	$ 7.540.359,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
1.18	Mantenimiento correctivo del concreto del polideportivo (e= 5cm)	M3	43,05	$ 523.443,00	$ 22.534.221,15	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
1.19	Suministro e Instalación de rejillas para sumideros (0,40M de ancho)	ML	75,50	$ 121.342,00	$ 9.161.321,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
1.20	Corte y demolición Polideportivo (e= 5cm) Incluye bote de escombros	M2	861,00	$ 12.117,00	$ 10.432.737,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
NP1.21	Retiro y reinstalación de teja de barro	M2		$ 57.404,00	$ -	+	45,00	$ 2.583.180,00	45,00	$ 2.583.180,00	45,00	$ 2.583.180,00	100,00%	-	$ -
NP1.22	Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo, incluye sustitución del 10% de adoquin y pintura tipo tráfico.	M2		$ 73.613,00	$ -	+	186,65	$ 13.739.498,39	186,65	$ 13.739.498,39	186,65	$ 13.739.498,39	100,00%	-	$ -
NP1.23	Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)	M3		$ 37.500,00	$ -	+	50,80	$ 1.904.910,00	50,80	$ 1.904.910,00	50,80	$ 1.904.910,00	100,00%	-	$ -
NP1.24	Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo, incluye perfilada y compactación de la rasante	M3		$ 136.476,00	$ -	+	27,57	$ 3.762.684,26	27,57	$ 3.762.684,26	27,57	$ 3.762.684,26	100,00%	-	$ -
NP1.25	Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluye refuerzo en hierro de 3/8"	ML		$ 47.482,00	$ -	+	134,99	$ 6.409.595,18	134,99	$ 6.409.595,18	134,99	$ 6.409.595,18	100,00%	-	$ -
NP1.26	Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante	M2		$ 84.330,00	$ -	+	54,25	$ 4.574.902,50	54,25	$ 4.574.902,50	54,25	$ 4.574.902,50	100,00%	-	$ -
NP1.27	Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0,40 m de ancho, con marco en ángulo de 2", contramarco en ángulo de 1½", refuerzos en platina de 1 1/2" y malla expandida IMT-40 calibre 12.	ML		$ 369.489,00	$ -	+	75,50	$ 27.896.419,50	48,00	$ 17.735.472,00	48,00	$ 17.735.472,00	63,58%	27,50	$ 10.160.947,50
NP1.28	Construcción e instalación de jaula para animales de 3,00 x 3,00 m, en estructura metálica completa, incluyendo fabricación y montaje, con piso en concreto reforzado, elevado y separado del terreno, según diseño	Und		$ 7.222.439,00	$ -	+	1,00	$ 7.222.439,00	-	$ -	-	$ -	0,00%	1,00	$ 7.222.439,00
NP1.29	Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura metálica y cerramiento existente en la Cr. 1 y Calle 58	ML		$ 106.907,00	$ -	+	295,75	$ 31.617.745,25	140,00	$ 14.966.980,00	140,00	$ 14.966.980,00	47,34%	155,75	$ 16.650.765,25
NP1.30	Suministro y Aplicación de Esgrafiado en graniplast en zona del Archivo Historico	M2		$ 27.059,00	$ -	+	67,11	$ 1.815.929,49	67,11	$ 1.815.929,49	67,11	$ 1.815.929,49	100,00%	-	$ -
NP1.31	Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora	M2		$ 16.471,00	$ -	+	101,05	$ 1.664.427,49	101,05	$ 1.664.427,49	101,05	$ 1.664.427,49	100,00%	-	$ -
NP1.32	Poda de Limoncillos	ML		$ 26.015,00	$ -	+	86,00	$ 2.237.290,00	86,00	$ 2.237.290,00	86,00	$ 2.237.290,00	100,00%	-	$ -
NP1.33	Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2,50 m de altura. Incluye: excavación cepellón (50x50x60 cm), protección raíces, transporte interno en instalaciones, excavación y relleno de hueco nuevo (60x60x60 cm), aplicación fertilizante orgánico	Und		$ 87.345,00	$ -	+	11,00	$ 960.795,00	11,00	$ 960.795,00	11,00	$ 960.795,00	100,00%	-	$ -
NP1.34	Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).	Und		$ 1.291.043,00	$ -	+	2,00	$ 2.582.086,00	2,00	$ 2.582.086,00	2,00	$ 2.582.086,00	100,00%	-	$ -
	TOTAL ACTIVIDADES GENERALES				$ 84.986.511,44			$ 136.685.705,88		$ 100.687.677,49		$ 100.687.677,49			$ 35.998.028,39
2	ARCHIVO HISTORICO														
2.1	Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)	M2	217,80	$ 17.265,00	$ 3.760.317,00		217,80	$ 3.760.317,00	217,80	$ 3.760.317,00	217,80	$ 3.760.317,00	100,00%	-	$ -
2.2	Suministro e Instalación de Cubierta en teja ondulada a.c con estructura acesco luz máx. 4 m	M2	224,33	$ 78.634,00	$ 17.639.965,22	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
2.3	Cercha para cubierta en ángulo y para soporte de Canaleta Lógica en ángulo 2<2"X1/8" superior y 2<1 1/2x3/16" inferior, celosía en <1 1/4"*1/8" y varilla de 1/2 c .30.	ML	40,68	$ 205.014,00	$ 8.339.969,52	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
2.4	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18 -refuerzo para colocación Cubierta Termo acústica en fibrocarbono tipo colonial	ML	333,37	$ 38.276,00	$ 12.760.070,12	-	6,60	$ 252.621,60	6,60	$ 252.621,60	6,60	$ 252.621,60	100,00%	0,00	$ 0,00
2.5	Suministro e instalación de Caballete colonia en fibrocarbono	ML	42,00	$ 54.549,00	$ 2.291.058,00	-	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -
2.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC	M2	158,00	$ 76.477,00	$ 12.083.366,00		158,00	$ 12.083.366,00	158,00	$ 12.083.366,00	158,00	$ 12.083.366,00	100,00%	-	$ -
NP2.7	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. Incluye arreglo estructura de cubierta (soldadura cerchas y correas)	M2		$ 78.346,00	$ -	+	224,33	$ 17.575.358,18	224,33	$ 17.575.358,18	224,33	$ 17.575.358,18	100,00%	-	$ -
NP2.8	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML		$ 44.964,00	$ -	+	28,00	$ 1.258.992,00	28,00	$ 1.258.992,00	28,00	$ 1.258.992,00	100,00%	-	$ -
NP2.9	Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura existente y pintura	KG		$ 17.463,00	$ -	+	305,17	$ 5.329.172,07	305,17	$ 5.329.172,07	305,17	$ 5.329.172,07	100,00%	-	$ -

		CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS (OTROSÍ No.1)			PRESENTE ACTA		ACUMULADO				SALDO					
NP2.10	Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta, mediante aplicación de mortero cemento–arena en proporción 1:4. Incluye la regularización de superficies, ajuste de nivel y alineación del paramento, instalación de ladrillo tolete para conformación del remate, y acabado final con pañete impermeable para garantizar una correcta unión entre muro y cubierta.	ML		$	39.662,00	$ -	+	64,50	$	2.558.199,00	64,50	$	2.558.199,00	64,50	$	2.558.199,00	100,00%	-	$	-
NP2.11	Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad	UND		$	765.461,00	$ -	+	2,00	$	1.530.922,00	2,00	$	1.530.922,00	2,00	$	1.530.922,00	100,00%	-	$	-
	TOTAL ARCHIVO HISTORICO					$ 56.874.745,86			$	44.348.947,85		$	44.348.947,85		$	44.348.947,85			$	0,00
3	CAFETERIA																				
3.1	Corte y demolición de áreas afectadas	M2	25,00	$	54.150,00	$ 1.353.750,00	+	45,52	$	2.464.637,25	45,52	$	2.464.637,25	45,52	$	2.464.637,25	100,00%	-	$	-
3.2	Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas	M2	25,00	$	56.571,00	$ 1.414.275,00	+	27,92	$	1.579.462,00	27,92	$	1.579.462,00	27,92	$	1.579.462,00	100,00%	-	$	-
3.3	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)	ML	22,50	$	66.594,00	$ 1.498.365,00	-	21,00	$	1.398.474,00	21,00	$	1.398.474,00	21,00	$	1.398.474,00	100,00%	-	$	-
3.4	Bajantes 3" (Accesorios Incluidos)	ML	6,00	$	54.150,00	$ 324.900,00	+	50,50	$	2.734.575,00	36,50	$	1.976.475,00	36,50	$	1.976.475,00	72,28%	14,00	$	758.100,00
3.5	Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosín rojo)	M2	36,00	$	335.854,00	$ 12.090.744,00		36,00	$	12.090.744,00	36,00	$	12.090.744,00	36,00	$	12.090.744,00	100,00%	-	$	-
NP3.6	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm	M2		$	107.577,00	$ -	+	27,92	$	3.003.550,00	27,92	$	3.003.550,00	27,92	$	3.003.550,00	100,00%	-	$	-
	CAFETERIA					$ 16.682.034,00			$	23.271.442,25		$	22.513.342,25		$	22.513.342,25			$	758.100,00
4	ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS																				
	ADECUACION ELECTRICA BLOQUE DE GESTION DOCUMENTAL																				
4.1	Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD	Global	1,00	$	39.700.500,00	$ 39.700.500,00		1,00	$	39.700.500,00	1,00	$	39.700.500,00	1,00	$	39.700.500,00	100,00%	-	$	-
4.2	UPS 3KVA + Gabinete	Global	1,00	$	14.875.250,00	$ 14.875.250,00	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	-	$	-
4.3	Adecuación Tablero Eléctrico	Global	1,00	$	4.975.000,00	$ 4.975.000,00		1,00	$	4.975.000,00	1,00	$	4.975.000,00	1,00	$	4.975.000,00	100,00%	-	$	-
4.4	Mano de Obra Incluye: Cambio Acometida NR, Instalación de UPS y Gabinete, Adecuación de tableros eléctricos, retiro de acometidas viejas de red regulada y no regulada hasta el Datacenter.	Global	1,00	$	19.900.000,00	$ 19.900.000,00	-	-	$	-	-	$	-	-	$	-	0,00%	-	$	-
NP.4.13	UPS 6KVA + Gabinete	UND		$	15.327.839,00	$ -	+	1,00	$	15.327.839,00	1,00	$	15.327.839,00	1,00	$	15.327.839,00	100,00%	-	$	-
NP.4.14	Adecuación Eléctrica Auditorio	UND		$	5.669.341,00	$ -	+	1,00	$	5.669.341,00	1,00	$	5.669.341,00	1,00	$	5.669.341,00	100,00%	-	$	-
NP.4.15	Red eléctrica interna archivo histórico	UND		$	18.103.478,00	$ -	+	1,00	$	18.103.478,00	1,00	$	18.103.478,00	1,00	$	18.103.478,00	100,00%	-	$	-
	TOTAL ADECUACION ELECTRICA BLOQUE DE GESTION DOCUMENTAL					$ 79.450.750,00			$	83.776.158,00		$	83.776.158,00		$	83.776.158,00			$	-
	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG																				
4,5	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A	Global	5,00	$	888.696,00	$ 4.443.480,00	-	1,00	$	888.696,00	1,00	$	888.696,00	1,00	$	888.696,00	100,00%	-	$	-
4,6	Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm	Global	1,00	$	20.247.245,00	$ 20.247.245,00		1,00	$	20.247.245,00	1,00	$	20.247.245,00	1,00	$	20.247.245,00	100,00%	-	$	-
4,7	Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10	Global	1,00	$	16.378.685,00	$ 16.378.685,00		1,00	$	16.378.685,00	1,00	$	16.378.685,00	1,00	$	16.378.685,00	100,00%	-	$	-
4,8	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio 108"	Global	1,00	$	67.775.303,00	$ 67.775.303,00		1,00	$	67.775.303,00	1,00	$	67.775.303,00	1,00	$	67.775.303,00	100,00%	-	$	-
4,9	Suministro e Instalación de Sistema de Sonido	Global	1,00	$	17.187.268,00	$ 17.187.268,00		1,00	$	17.187.268,00	-	$	-	-	$	-	0,00%	1,00	$	17.187.268,00
4.10	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"	Global	1,00	$	12.037.498,00	$ 12.037.498,00		1,00	$	12.037.498,00	1,00	$	12.037.498,00	1,00	$	12.037.498,00	100,00%	-	$	-
4.11	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio	Global	1,00	$	2.363.125,00	$ 2.363.125,00		1,00	$	2.363.125,00	1,00	$	2.363.125,00	1,00	$	2.363.125,00	100,00%	-	$	-
4.12	Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio	Global	1,00	$	1.062.660,00	$ 1.062.660,00		1,00	$	1.062.660,00	1,00	$	1.062.660,00	1,00	$	1.062.660,00	100,00%	-	$	-
NP.4.16	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 6A	UND		$	837.295,00	$ -	+	1,00	$	837.295,00	1,00	$	837.295,00	1,00	$	837.295,00	100,00%	-	$	-
	TOTAL MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG					$ 141.495.264,00			$	138.777.775,00		$	121.590.507,00		$	121.590.507,00			$	17.187.268,00
	TOTAL ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y TECNOLÓGICAS					$ 220.946.014,00			$	222.553.933,00		$	205.366.665,00		$	205.366.665,00			$	17.187.268,00
	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN					$ 379.489.305,30		COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	426.860.028,98	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	372.916.632,59	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	372.916.632,59	87,36%	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	53.943.396,39
	ADMINISTRACION 15% =					$ 56.923.395,80		ADMINISTRACION 15% =	$	64.029.004,35	ADMINISTRACION 15% =	$	55.937.494,89	ADMINISTRACION 15% =	$	55.937.494,89		ADMINISTRACION 15% =	$	8.091.509,46
	IMPREVISTOS 3% =					$ 11.384.679,16		IMPREVISTOS 3% =	$	12.805.800,87	IMPREVISTOS 3% =	$	11.187.498,98	IMPREVISTOS 3% =	$	11.187.498,98		IMPREVISTOS 3% =	$	1.618.301,89
	UTILIDAD 7,0% =					$ 26.564.251,37		UTILIDAD 7,0% =	$	29.880.202,03	UTILIDAD 7,0% =	$	26.104.164,28	UTILIDAD 7,0% =	$	26.104.164,28		UTILIDAD 7,0% =	$	3.776.037,75
	IVA % sobre utilidad 19% =					$ 5.047.207,76		IVA % sobre utilidad 19% =	$	5.677.238,39	IVA % sobre utilidad 19% =	$	4.959.791,21	IVA % sobre utilidad 19% =	$	4.959.791,21		IVA % sobre utilidad 19% =	$	717.447,17
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN					$ 99.919.534,09		TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	112.392.245,63	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN		98.188.949,36	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	98.188.949,36		TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN	$	14.203.296,27
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)					$ 479.408.839,39		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$	539.252.274,61	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)		471.105.581,95	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$	471.105.581,95		TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)	$	68.146.692,66
								VALOR TOTAL A PAGAR	$	539.252.274,61	VALOR TOTAL A PAGAR		471.105.581,95	VALOR ACUMULADO A PAGAR	$	471.105.581,95	87,36%	VALOR TOTAL A PAGAR	$	68.146.692,66

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $471.105.581,95

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Ing. ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR

Ing. ANDRES FELIPE CABRERA SANCHEZ
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 01 de 34		

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.1	Suministro e Instalación de gravilla
1, UNIDAD DE MEDIDA	M3		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Zona Jualas	7,00	19,00	0,12	1	LxAxP	15,96
Zona Jualas	2,20	2,10	0,12	1	LxAxP	0,55
Zona Jualas	5,00	2,10	0,12	1	LxAxP	1,26
Zona Fauna	3,00	1,20	0,12	1	LxAxP	0,43
Zona Fauna	4,50	1,90	0,12	1	LxAxP	1,03
Zona Fauna	6,50	1,70	0,12	1	LxAxP	1,33
Zona Fauna	5,00	1,50	0,12	1	LxAxP	0,90
Zona Fauna	8,00	5,00	0,12	1	LxAxP	4,80
Zona Fauna	5,00	4,00	0,12	1	LxAxP	2,40
Zona Fauna	-1,50	1,50	0,12	1	LxAxP	- 0,27
Zona Fauna	2,00	-2,00	0,12	1	LxAxP	- 0,48
Zona Fauna	5,00	3,30	0,12	1	LxAxP	1,98
Zona Domo	21,00	3,50	0,12	1	LxAxP	8,82
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	50,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	38,71

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	- 11,29

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 02 de 34		

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.2	Revisión de cubierta y corrección de goteras incluida lamina
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Oficina Planeación	9,00	5,00		1	LPxAxNE	45,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	45,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	45,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1


CODIGO:	**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 03 de 34**	
INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES			**1.3**	Tratamiento de muros por hongos y capilaridad (Incluye Pintura)	
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2					

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE o el Promed.	ANCHO o AnchoProm	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Atención al Ciudadano	5,00	1,50		4	LxAxNE	30,00
Archivo Historico	17,30	2,55		1	LxAxNE	44,12
Archivo Historico	2,00	2,00		10	LxAxNE	40,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	30,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	114,12
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	84,12

FOTO DE LA ACTIVIDAD

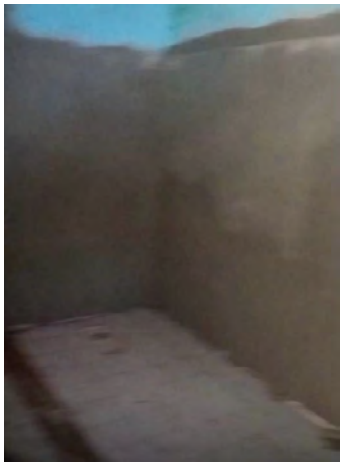



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1


CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 04 de 34


INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.4	Suministro e Instalación de manijas para puertas en aluminio
1, UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Zona administrativa				4		4,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	4,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	4,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

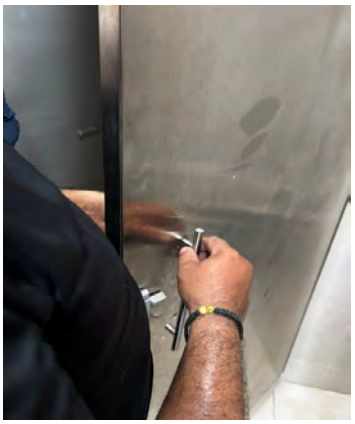

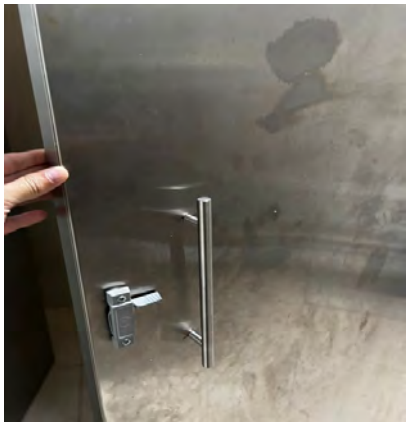

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 05 de 34		

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.5	Suministro e Instalación de manijas para puertas de baño
1, UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	VANOS		
Baños Contratación				4		4
						-
						-

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	4,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	4,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 07 de 34

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.7	Emboquillado en alfacolor
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Atención al Ciudadano	2,00	4,00			LxA	8,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	8,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	8,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:	**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 09 de 34**			

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.9	Solución de hallazgo auditoria interna de 2024 "REALIZAR ADECUACIONES AL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS OFICINAS DE VETERINANRIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM"
1, UNIDAD DE MEDIDA	GLOBAL		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Almacen Residuos Peligrosos				1		1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD







ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 10 de 34		

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.10	Suministro e instalación de brazos hidráulicos para las puertas de las jaulas
1, UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	Numero de Elementos	AREA		
Zona Fauna			10	-		10,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	10,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	10,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD







ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 13 de 34

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.13	Pintura Perimetral (Sección Amarilla)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Fachada	38,40	0,40		1	LxAxNE	15,36
Fachada	2,40	2,40		3	LxAxNE	17,28
Archivo Historico	20,10	3,00		1	LxAxNE	60,30
Archivo Historico	11,80	3,00		1	LxAxNE	35,40
Archivo Historico	16,10	2,55		1	LxAxNE	41,06
Archivo Historico	7,80	3,00		1	LxAxNE	23,40
Archivo Historico	3,90	1,60		1	LxAxNE	6,24
Cafeteria	21,00	2,40		1	LxAxNE	50,40
Archivo Historico	1,00	0,63		6	LxAxNE	3,78
Descuento Carpinteria	-1,20	0,40		4	LxAxNE	- 1,92
Descuento Carpinteria	-2,00	1,40		4	LxAxNE	- 11,20
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	15,36
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	240,10
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	224,74

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 14 de 34		

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.14	Aseo y bote de escombros
1, UNIDAD DE MEDIDA	M3		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
DISPOCISIÓN Final	3,00	2,00	1,00	10	LxAxPxNE	60,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	10,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	60,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	50,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 15 de 34


INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.15	Suministro e instalación de espejo para baño de Contratación
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	VANOS		
Baños Contratación	1,13		1,00	2,00	LxPxNE	2,25

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	2,25
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	2,25
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD

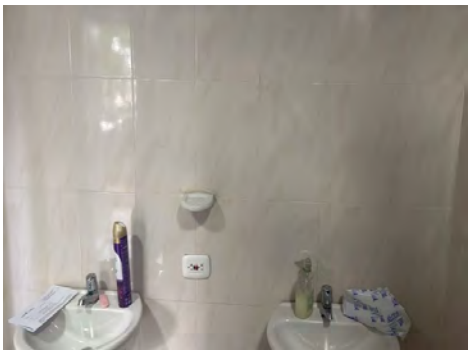



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 16 de 34

INFRAESTRUCTURA FISICA	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	1.16	Pintura Perimetral (Sección Gris)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Muro Fachada Cr 1	56,30	0,84			LxA	47,29
Descuento pintura amarilla	-38,40	0,40			LxA	- 15,36
Muro Fachada Cr 1	64,00	0,75			LxA	48,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	68,20
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	79,93
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	11,73

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:	**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 21 de 34**			

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.21	Retiro y reinstalación de teja de barro
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Oficina Planeación	9,00	5,00		1	LxAxNE	45,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	45,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	45,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 22 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.22	Retiro, limpieza y reinstalación de adoquin en concreto en la zona del domo, incluye sustitución del 10% de adoquin y pintura tipo tráfico.
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		


UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Domo	18,00	9,00		1	LxAxNE	162,00
Domo	9,76	2,00		1	LxAxNE	19,52
Domo	8,00	1,25		1	LxAxNE	10,00
Domo	7,20	2,50		1	LxAxNE	18,00
Domo	10,50	1,25		1	LxAxNE	13,13
Domo	-6,00	6,00		1	LxAxNE	- 36,00


OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	186,65
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	186,65

FOTO DE LA ACTIVIDAD



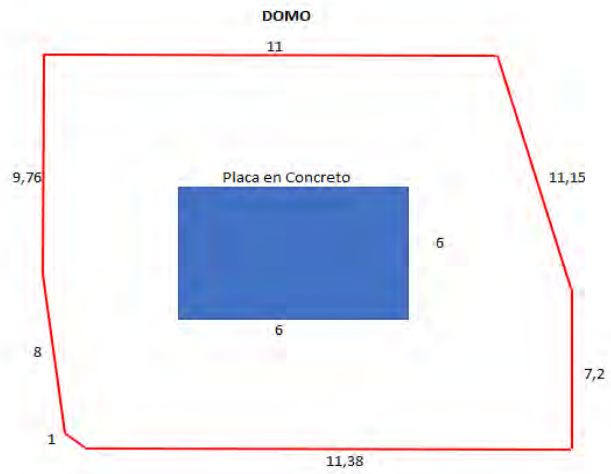

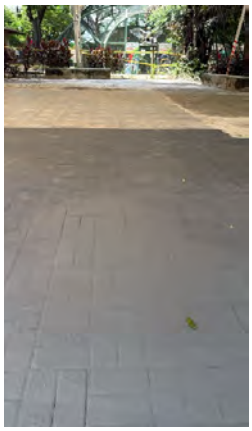

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 23 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.23	Excavación hasta h=0,50 m zona domo (cama de arena)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M3		


UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Domo	18,00	9,00	0,16	1	LxAxPxNE	25,92
Domo	9,76	2,00	0,16	1	LxAxPxNE	3,12
Domo	8,00	1,25	0,16	1	LxAxPxNE	1,60
Domo	7,20	2,50	0,16	1	LxAxPxNE	2,88
Domo	10,50	1,25	0,16	1	LxAxPxNE	2,10
Domo	-6,00	6,00	0,1	1	LxAxPxNE	- 3,60
Jaulas	19,00	7,00	0,12	1	LxAxPxNE	15,96
Jaulas	2,20	2,10	0,12	1	LxAxPxNE	0,55
Jaulas	5,00	2,10	0,12	1	LxAxPxNE	1,26
Cafeteria	2,00	1,00	0,50	1	LxAxPxNE	1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	50,80
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	50,80

FOTO DE LA ACTIVIDAD



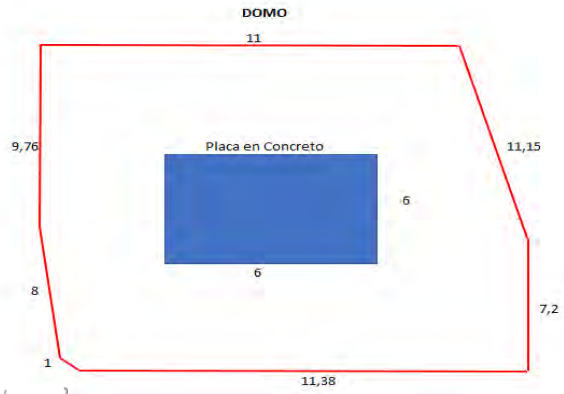



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:	FECHA:	18/03/26	Versión: 01	Pagina: 24 de 34

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.24	Relleno en Arena compactado mecánica zona Domo, incluye perfilada y compactación de la rasante
1, UNIDAD DE MEDIDA	M3		


UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
DOMO	18,00	9,00	0,14	1	LxAxPxNE	22,68
DOMO	9,76	2,00	0,14	1	LxAxPxNE	2,73
DOMO	8,00	1,25	0,14	1	LxAxPxNE	1,40
DOMO	7,20	2,50	0,14	1	LxAxPxNE	2,52
DOMO	10,50	1,25	0,14	1	LxAxPxNE	1,84
DOMO	-6,00	6,00	0,1	1	LxAxPxNE	- 3,60

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	27,57
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	27,57

FOTO DE LA ACTIVIDAD



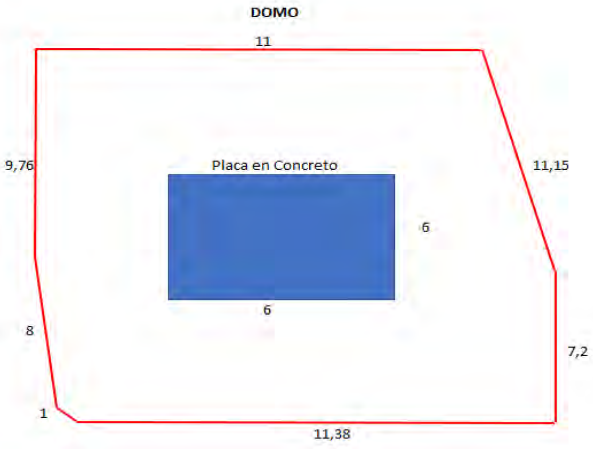



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 25 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.25	Bordillo en cocreto de 3000 psi. Sección 0,10x,10 m. Incluye refuerzo en hierro de 3/8"
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Zona Jaulas	63,50			1	L	63,50
Zona Domo	71,49			1	L	71,49

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	134,99
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	134,99

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:	**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 26 de 34**			

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.26	Suministro e instalación Piso Trafico 5 antideslizante
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
DOMO	6,00	6,00		1	LxA	36,00
ARCHIVO HISTORICO	3,50	2,50		1	LxA	8,75
ARCHIVO HISTORICO	3,80	2,50		1	LxA	9,50

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	54,25
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	54,25

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 27 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.27	Suministro e instalación de rejillas para sumideros de 0,40 m de ancho, con marco en ángulo de 2", contramarco en ángulo de 1½", refuerzos en platina de 1 1/2" y malla expandida IMT-40 calibre 12.
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Infraestructura Fisica	48,00			1	L	48,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	48,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	48,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 29 de 34		


Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.29	Construcción e instalación de cerca eléctrica perimetral de cuatro hilos sobre estructura metálica y cerramiento existente en la Cr. 1 y Calle 58
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		


UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Fachada Cr 1	-			1	L	-
Fachada Calle 58	140,00			1	L	140,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	140,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	140,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD

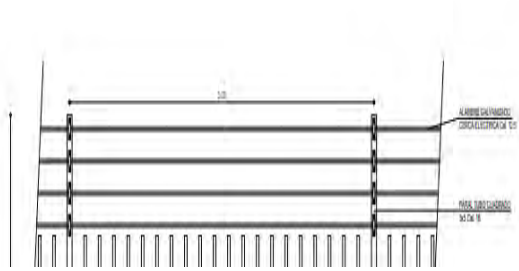



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 30 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.30	Suministro y Aplicación de Esgrafiado en graniplast en zona del Archivo Historico
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	56,20	0,40		1	LxAxNE	22,48
Archivo Historico	2,00	0,50		12	LxAxNE	12,00
Archivo Historico	3,00	0,80		3	LxAxNE	7,20
Archivo Historico	0,80	0,80		5	LxAxNE	3,20
Archivo Historico	0,30	0,30		7	LxAxNE	0,63
Cafeteria	21,60	1,00		1	LxAxNE	21,60

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	67,11
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	67,11

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 31 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.31	Lavado de muros fachadas cerramiento con hidrolavadora
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Fachada Cr 1	56,30	0,84		1	LxAxNE	47,29
Fachada Cr 1	64,00	0,75		1	LxAxNE	48,00
Fachada Cr 1	2,40	2,40		1	LxAxNE	5,76

OBSERVACIONES: Actividad con valor global

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	101,05
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	101,05

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 32 de 34		

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.32	Poda de Limoncillos
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Fachada Cr 1	33,00			1	L	33,00
Fachada Calle 58	53,00			1	L	53,00

OBSERVACIONES: Actividad con valor global

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	86,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	86,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:	**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 33 de 34**			

Ítem No previsto	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.33	Trasplante de palmas de areca (ARECA CATECHU) de 2,50 m de altura. Incluye: excavación cepellón (50x50x60 cm), protección raíces, transporte interno en instalaciones, excavación y relleno de hueco nuevo (60x60x60 cm), aplicación fertilizante orgánico
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Fachada Cr 1				11	UN	11,00

OBSERVACIONES: Actividad con valor global

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	11,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	11,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 34 de 34**		

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CAC	AREA: ACTIVIDADES GENERALES	NP1.34	Tala de árboles (incluye coordinador alturas, Gestión y disposición final).
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO/BASE	ANCHO	H ó Profundidad	Numero de elementos		
Perimetro Norte				1	UN	1,00
Perimetro Sur				1	UN	1,00

OBSERVACIONES: Actividad con valor global

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	2,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	2,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 01 de 16		

ADECUACION ELECTRICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4.1	Cambio de acometida NR Calibre 2 desde subestación hasta el bloque GD
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Subestación - Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 03 de 16**		

ADECUACION ELECTRICA	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DC	4.3	Adecuación Tablero Eléctrico
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 05 de 16**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DC	NP.4.13	UPS 6KVA + Gabinete
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	1,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 06 de 16**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DC	NP.4.14	Adecuación Eléctrica Auditorio
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Auditorio				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	1,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 07 de 16**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	MODERNIZACION TECNOLOGICA AUDITORIO Y DC	NP.4.15	Red eléctrica interna archivo histórico
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	1,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD

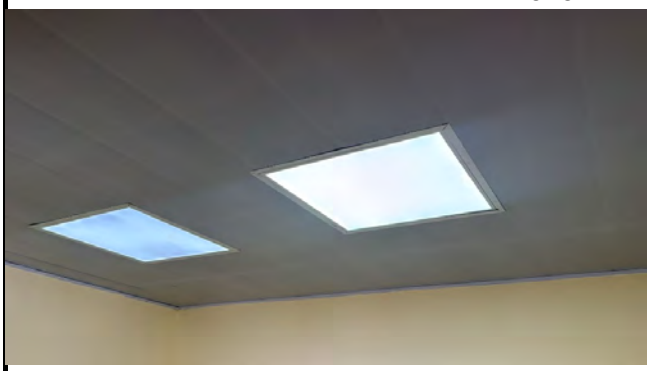



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 08 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4,5	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 7A
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Auditorio				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	5,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	- 4,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 09 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4,6	Suministro e Instalación Switch AT-x550-18XSPQm
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 10 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4,7	Suministro e Instalación Switch AT-x530-52GPXm-10
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 11 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4,8	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva Auditorio 108"
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Auditorio				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 13 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4.10	Suministro e Instalación de Pantalla LED Digital Interactiva DG 75"
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD

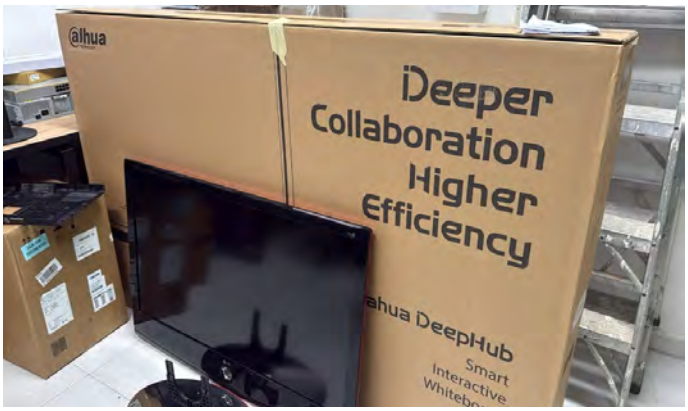

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 14 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4.11	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado 12000BTU Centro de Control Auditorio
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Auditorio				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 15 de 16**		

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	4.12	Suministro e Instalación de Puerta Centro de Control Auditorio
1, UNIDAD DE MEDIDA	Global		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Auditorio				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	1,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 16 de 16**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA AUDITORIO Y DG	NP.4.16	Suministro e Instalación de Puntos de Cableado Estructurado Cat 6A
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Bloque GD				1	Und	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	1,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	1,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No. 1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 01 de 11**		

INFRAESTRUCTURA FISICA	ARCHIVO HISTORICO	2.1	Desmonte de Cubierta (Incluye Retiro)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	22,22	9,80		1	LxAxNE	217,80

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	217,80
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	217,80
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 04 de 11**		

INFRAESTRUCTURA FISICA	ARCHIVO HISTORICO	2.4	Correa en perfil metálico 3"x1 1/2" Cal. 18 - refuerzo para colocación Cubierta Termo acústica en fibrocarbono tipo colonial
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
kiosko de la cafeteria	0,60			11	LxNE	6,60
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	333,37
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	6,60
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	- 326,77

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 06 de 11**		


INFRAESTRUCTURA FISICA	ARCHIVO HISTORICO	2.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	20,13	7,85		1	LxA	158,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	158,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	158,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD

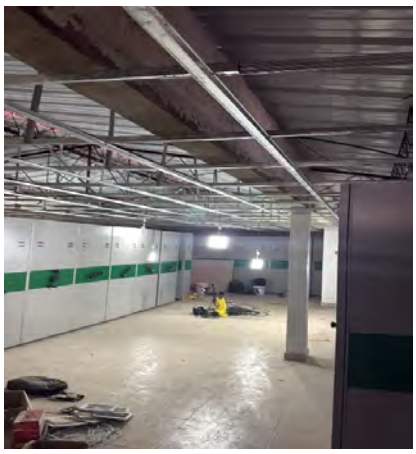



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 07 de 11**		


ÍTEMS NO PREVISTOS	ARCHIVO HISTORICO	NP2.7	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores. Incluye arreglo estructura de cubierta (soldadura cerchas y correas)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	17,10	10,00		1	LxA	171,00
Archivo Historico	5,33	10,00		1	LxA	53,33
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	224,33
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	224,33

FOTO DE LA ACTIVIDAD

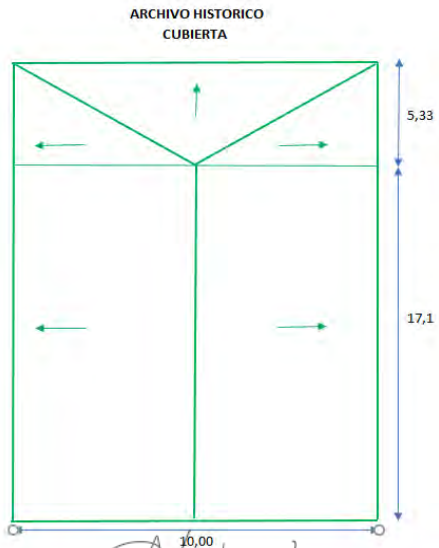

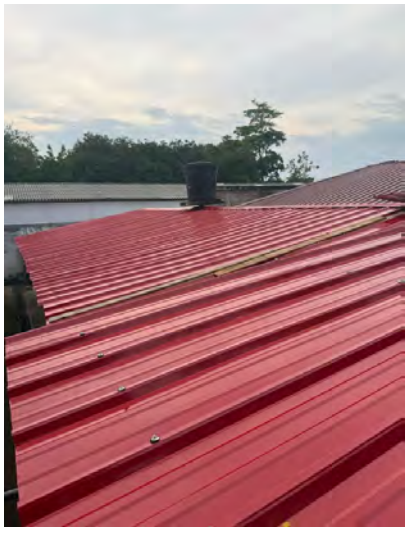

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 08 de 11**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	ARCHIVO HISTORICO	NP2.8	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	28,00			1	L	28,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	28,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	28,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD

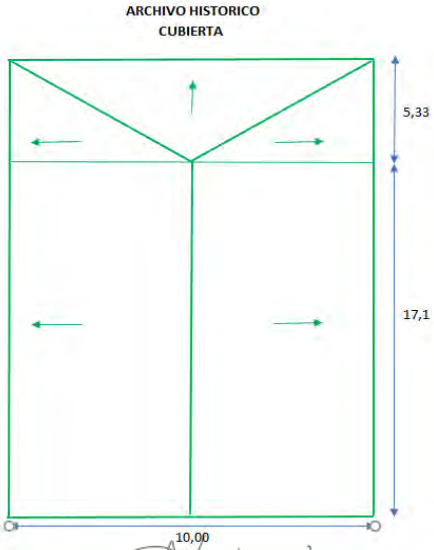



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 09 de 11**		


ÍTEMS NO PREVISTOS	ARCHIVO HISTORICO	NP2.9	Suministro e instalación perfil 2"x1" cal.18 soporte teja. Incluye refuerzo de la estructura existente y pintura
1, UNIDAD DE MEDIDA	KG		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Peso x ML (Kg)	Numero de elementos		
Perfil 2x1 cal 18	20,80		1,42	2	LxPxNEP	59,21
Perfil 2x1 cal 18	19,10		1,42	1	LxPxNEP	27,19
Perfil 2x1 cal 18	18,00		1,42	1	LxPxNEP	25,62
Perfil 2x1 cal 18	17,50		1,42	2	LxPxNEP	49,82
Perfil 2x1 cal 18	18,80		1,42	1	LxPxNEP	26,76
Perfil 2x1 cal 18	9,80		1,42	3	LxPxNEP	41,85
Perfil 2x1 cal 18	6,00		1,42	4	LxPxNEP	34,16
Perfil 2x1 cal 18	5,00		1,42	1	LxPxNEP	7,12
Perfil 2x1 cal 18	1,50		1,42	1	LxPxNEP	2,14
Angulo de 1 1/2"	9,00		3,48	1	LxAxP	31,32
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	305,17
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	305,17

FOTO DE LA ACTIVIDAD

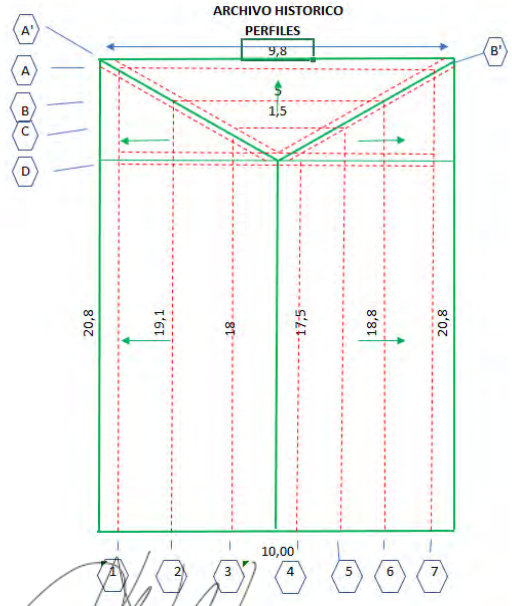

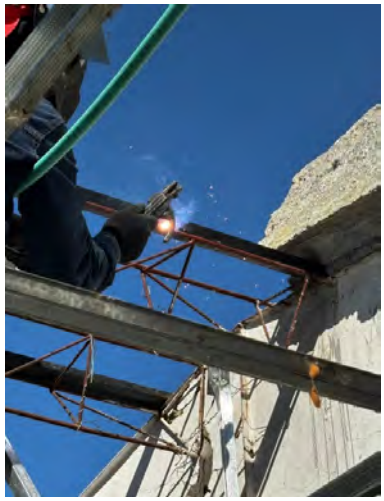

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No. 1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 10 de 11**		

ÍTEMS NO PREVISTOS	ARCHIVO HISTORICO	NP2.10	Remate y nivelación de muro existente para soporte de cubierta, mediante aplicación de mortero cemento–arena en proporción 1:4. Incluye la regularización de superficies, ajuste de nivel y alineación del paramento, instalación de ladrillo tolete para conformación del remate, y acabado final con pañete impermeable para garantizar una correcta unión entre muro y cubierta.
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico	20,15			2	LxNE	40,30
Archivo Historico	7,85			2	LxNE	15,70
Archivo Historico	8,50			1	LxNE	8,50
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	64,50
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	64,50

FOTO DE LA ACTIVIDAD

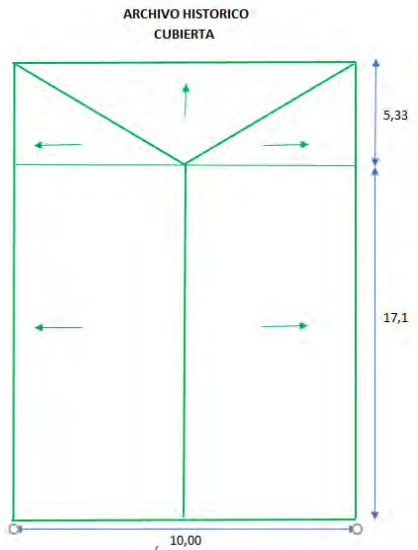



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No. 1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 11 de 11		

ÍTEMS NO PREVISTOS	ARCHIVO HISTORICO	NP2.11	Marco y puerta metálica cal. 18 1.00x2.00m, incluye chapa de seguridad
1, UNIDAD DE MEDIDA	UND		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Archivo Historico				2	Und	2,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	2,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	2,00

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor


	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 01 de 06**		

INFRAESTRUCTURA FISICA	CAFETERIA	3.1	Corte y demolición de áreas afectadas
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Cafeteria	2,90	2,85		1	LxAxNE	8,27
Cafeteria	1,00	3,15		1	LxAxNE	3,15
Cafeteria	0,90	2,90		1	LxAxNE	2,61
Cafeteria	1,00	2,50		1	LxAxNE	2,50
Cafeteria	1,00	2,00		1	LxAxNE	2,00
Cafeteria	2,30	0,85		1	LxAxNE	1,96
Archivo historico	2,50	2,55		1	LxAxNE	6,38
Archivo historico	1,50	2,00		1	LxAxNE	3,00
Archivo historico	0,60	2,00		2	LxAxNE	2,40
Archivo historico	1,80	2,00		1	LxAxNE	3,60
Archivo historico	2,50	0,60		1	LxAxNE	1,50
Archivo historico	2,00	1,00		3	LxAxNE	6,00
Archivo historico	1,80	0,60		2	LxAxNE	2,16
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	25,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	45,52
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	20,52

FOTO DE LA ACTIVIDAD

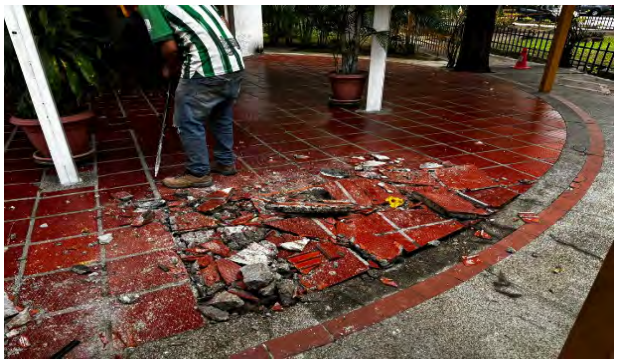



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
Contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 02 de 06**		

INFRAESTRUCTURA FISICA	CAFETERIA	3.2	Suministro e instalación de baldosas de las áreas retiradas
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Cafeteria	2,90	2,85		1	LxAxNE	8,27
Cafeteria	1,00	3,15		1	LxAxNE	3,15
Cafeteria	0,90	2,90		1	LxAxNE	2,61
Cafeteria	1,00	2,50		1	LxAxNE	2,50
Cafeteria	1,00	2,00		1	LxAxNE	2,00
Cafeteria	2,30	0,85		1	LxAxNE	1,96
Cafeteria	2,40	3,10		1	LxAxNE	7,44
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	25,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	27,92

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	2,92

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 03 de 06**		


INFRAESTRUCTURA FISICA	CAFETERIA	3.3	Suministro e Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50 (Accesorios Incluidos)
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Cafeteria	21,00			1	LxAxP	21,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	22,50
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	21,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	- 1,50

FOTO DE LA ACTIVIDAD



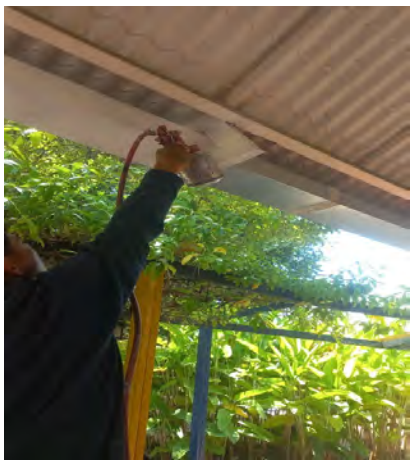

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

		MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA						
		ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA						
		ACTA PARCIAL No.1						
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 04 de 06**		

INFRAESTRUCTURA FISICA	CAFETERIA	3.4	Bajantes 3" (Accesorios Incluidos)
1, UNIDAD DE MEDIDA	ML		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Cafeteria bajante 1	2,10			1	L	2,10
Cafeteria bajante 2	4,00			1	L	4,00
Cafeteria bajante 3	3,40			1	L	3,40
Domo	27,00			1	L	27,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	6,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	36,50

TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	30,50

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA

ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA

ACTA PARCIAL No.1

CODIGO:		FECHA:	18/03/26	Versión: 01		Pagina: 05 de 06		

INFRAESTRUCTURA FISICA	CAFETERIA	3.5	Suministro e Instalación de piso en piedra lavada para corredores (Incluye baldosín rojo)
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Peatonal de acceso a Cafete	12,00	1,50		2	LxAxNE	36,00

OBSERVACIONES:

TOTAL AREA CONTRATADA	36,00
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	36,00
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	-

FOTO DE LA ACTIVIDAD





ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor

	MEMORIA DE CANTIDAES DE OBRA							
	ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA							
	ACTA PARCIAL No.1							
CODIGO:		**FECHA:**	**18/03/26**	**Versión: 01**		**Pagina: 06 de 06**		

ÍTEMS NO PREVISTO	CAFETERIA	NP3.6	Construcción de Placa de piso en concreto de 3000 psi e=0.14 incl. Malla electrosoldada de 4mm
1, UNIDAD DE MEDIDA	M2		

UBICACIÓN/ELEMENTO	DIMENSIONES				FORMULA	CANTIDAD PARCIAL
	LARGO Promedio	ANCHO	Altura ó Profundidad	Numero de elementos		
Cafeteria	2,90	2,85		1	LxAxNE	8,27
Cafeteria	1,00	3,15		1	LxAxNE	3,15
Cafeteria	0,90	2,90		1	LxAxNE	2,61
Cafeteria	1,00	2,50		1	LxAxNE	2,50
Cafeteria	1,00	2,00		1	LxAxNE	2,00
Cafeteria	2,30	0,85		1	LxAxNE	1,96
Cafeteria	2,40	3,10		1	LxAxNE	7,44
OBSERVACIONES:						

TOTAL AREA CONTRATADA	-
TOTAL AREA CALCULADA MEMORIAS	27,92
TOTAL CANTIDAD MAYOR O MENOR	27,92

FOTO DE LA ACTIVIDAD



ANDRES FELIPE SANCHEZ RIVERA
contratista

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
interventor
