	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025 **ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025
CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME MENSUAL SST No.9
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025
CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB

DICIEMBRE DE 2025

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

INFORME PARCIAL MENSUAL SST No.9
PERIODO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios

CONTRATISTA	
Realizado por	**Aprobado por**
	
Nohelia Pinto Ahumada Profesional SSTA	Ing. Luis Ballesteros Director de obra

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
INFORMACIÓN BÁSICA 5
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5
VALOR DEL CONTRATO 5
PERSONAL SST CONTRATISTA 6
EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA 6
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO 6
INGRESOS 7
Directo 8
Personal indirecto 8
Personal Mínimo Requerido 9
RETIROS 9
SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 10
ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
NILO: 10
PUENTE VEHICULAR TAMBORES: 10
VENECIA: 11
FUSA – SIBATÉ: 12
TIBACUY: 12
PANDI: 12
VILLAPINZÓN: 13
MANTA: 13
PERSONAL ROTATIVO 14
COPAS Y CCL 14

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) : 15
OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST 15
CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD 17
CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS 18
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 19
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20
DOTACIÓN Y EPP 21
SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS 21
PROGRAMA DE INSPECCIONES 21
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS 22
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS. 22
PLAN DE EMERGENCIAS 23
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24
SE EMPLEO MAQUINARIA AMARILLA 24
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST 26
COMPONENTE AMBIENTAL 29
Actividades realizadas: 29
MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 31
MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES: 31
REGISTRO FOTOGRÁFICO 33
GESTIÓN SOCIAL 34
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD 34
LISTADO DE ANEXOS 39

INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2025, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.
Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

INFORMACIÓN BÁSICA

Contratista	Consorcio Obras ICCU CJIK
Contrato N°	ICCU 201 DE 2025
Fecha de suscripción del contrato:	5 de Marzo de 2025
Fecha de suscripción de acta de inicio:	9 de Abril de 2025
Plazo inicial:	8 meses y 22 días
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre de 2025
Prórrogas:	N/A
Suspensiones:	N/A
Plazo actual:	8 meses y 22 días
Fecha de terminación actualizada:	12 de diciembre de 2025
Valor del contrato:	$ 6.800.000.000,00
Interventoría:	Consorcio Intervias PEB-BB

Tabla 1. Información Básica

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Una vez con la aprobación de pólizas a que hubiere lugar, a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, y en concordancia seleccionado contará con un plazo de (8) OCHO MESES Y (22) VEINTIDÓS DÍAS o hasta el 31 de diciembre de 2025 (lo que primero ocurra) para la ejecución del proyecto.

VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.800.000.000,00)

PERSONAL SST CONTRATISTA

Cargo	Nombre	Cédula	Fase
Residente SSTA	Nohelia Pinto Ahumada	52514856	Construcción
Total			**1**

Tabla 2. Responsables de SST

EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 1 al 31 diciembre se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.

Cargos	Informe No. 9	Novedades
Ingresos Nuevos	13	Ver Anexo 1. Ingresos
Retiro Antiguo	6	
Personal activo Antiguo	53	
Ingresos retiros	0	
Total Activos	66	

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km) presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas() y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.
Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 diciembre de 2025, se registró un total de (13) TRECE ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculación del personal directo de la zona se envió comunicado de vinculación laboral a la alcaldía del municipio. A continuación, se detallan dichos ingresos:

Directo

PERSONAL DIRECTO							
No	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
1	1031129717	CAMILO ANDRES	AVILA MOLLANO	ICCU CJIK	CONDUCTOR	17/12/2025	ROTATIVO

Tabla 4. Personal directo

Personal indirecto

PERSONAL INDIRECTO							
No	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
1	1152441470	MANUEL	BARRIOS	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO

PERSONAL INDIRECTO							
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
2	1099549757	LUIS	CHAVARRO	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
3	16233259	JOSE YONEY	MOSQUERA	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
4	1123405086	FABIO	PACHECO	EMECON	COORDINADOR SST	01/12/2025	NILO
5	80040862	CIRO	MARTINEZ	EMECON	ING PRODUCCIÓN	01/12/2025	NILO
6	1091670988	JORBAN	QUINTERO	EMECON	ING PRODUCCIÓN	01/12/2025	NILO
7	1045709918	DANILO	HOYOS	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
8	12021799	JORGE ELIECER	MARTINEZ	CONST GUERRERO	AYUDANTE	16/12/2025	MANTA
9	12022837	FRAILER	RENTERIA	CONST GUERRERO	AYUDANTE	16/12/2025	MANTA
10	91362135	GERMAN	FONTECHA	CONST GUERRERO	AYUDANTE	16/12/2025	VILLAPINZÓN
11	91362407	EULICES	FONTECHA	CONST GUERRERO	AYUDANTE	16/12/2025	VILLAPINZÓN
12	1096190963	KEINER STEVEN	FONTECHA PARDO	CONST GUERRERO	AYUDANTE	16/12/2025	VILLAPINZÓN
13	1015430238	EDUARDO CAMILO	BNAVIDEZ	EMECON	INSP CALIDAD	15/12/2025	NILO

Tabla 5. Personal indirecto

Personal Mínimo Requerido

PERSONAL MINIMO REQUERIDO								
No	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	% DE DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
1	52514856	NOHELIA	PINTO AHUMADA	CONSORCIO ICCU CIJK	PROFESIONAL SST-	100%	25-jun-25	OFICINA
2	1089481445	FRANCISCO	OTAYA BOLAÑOS	CONSORCIO ICCU CIJK	RESIDENTE OBRA	100%	02-sept-25	OFICINA
3	80003477	IBAN DARIO	CHAUTA DIAZ	CIMELEC	TOPOGRAFO	100%	27-may-25	FUSA-NILO
4	1109299894	TATIANA	GONZALEZ TRUJILLO	CIMELEC	INGENIERO INSPECTOR	100%	27-may-25	FUSA-NILO
5	1090987542	LUIS HERNANDO	BALLESTEROS LOPEZ	CONSORCIO ICCU CIJK	DIRECTOR DE OBRA	100%	1-may-25	OFICINA
6	79265782	ADONAI	TORO VALERO	INDEPENDIENTE	ESPEC. ESTRUCTURAL	25%	Abril 2025	OFICINA
7	11320288	NOE GERARDO	DIAZ JIMENEZ	INDEPENDIENTE	ESPECIALISTA GEOTECNIA	25%	01/08/2025	OFICINA
8	1013627428	JEIMY VIVIANA	FRESNEDA	JMS	INGENIERO INSPECTOR	100%	Mayo 2025	OFICINA

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de diciembre de 2025, se registró SEIS (6) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato.

PERSONAL RETIRADO					
No	NOMBRE APELLIDOS	CEDULA	CONTRATISTA	FECHA DE RETIRO	ANEXO
1	CESAR ALBERTO DUARTE CASTILLO	1023910682	ICCU CJIK	01/12/2025	CARTA TERMINACION DE CONTRATO LIQUIDACIÓN

PERSONAL RETIRADO					
No	**NOMBRE APELLIDOS**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**FECHA DE RETIRO**	**ANEXO**
2	JAVIER ORLANDO BARBOSA	1073697577	ICCU CJIK	01/12/2025	CARTA TERMINACION DE CONTRATO LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
3	LAURA NATALI PEÑARANDA	1007493943	ICCU CJIK	11/12/2025	CARTA TERMINACION DE CONTRATO LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
4	ANGEL LUIS OSPINO PAYARES	1002354220	ICCU CJIK	21/12/2025	CARTA TERMINACION DE CONTRATO LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO
5	HELBERT BOHORQUEZ	3111101	ICCU CJIK	22/12/2025	LIQUIDACIÓN CARTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
6	JESUS DAVID CAICEDO	11620934	CONNTRUCCIONES GUERRERO	30/11/2025	LIQUIDACIÓN, PAZ Y SALVO, SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 7. Retiro

SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 diciembre de 2025,

Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2025						
No	**NOMBRE APELLIDO**	**CEDULA**	**CONTRATISTA**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**NÚMERO EN LA PLANILLA**	**FRENTE**
1	RUIZ PEREZ KAREN DANIELA	1000728495	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	1	OFICINA
2	OSPINO PAYARES ANGEL LUIS	1002354220	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	2	BODEGA

3	GOMEZ LINARES CRISTIAN	1003632621	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	3	NILO
4	YANCE CABRILES JUAN CARLOS	1007167830	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	5	NILO
5	CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA	1007244192	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	6	VILLAPINZÓN
6	PEÑARANDA BARRERA LAURA NATALIA	1007493943	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	7	TIBACUY
7	PACHON RAMOS DAYANA PAOLA	1012399544	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	8	OFICINA
8	DUARTE CASTILLO CESAR ALBERTO	1023910682	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	9	PANDI
9	VILLA GONZALEZ PAULA TATIANA	1024542756	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	10	OFICINA
10	ORTA MOJICA KATIA LORENA	1067596706	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	11	OFICINA
11	MARTIN GARZON WILSON DAVID	1069078609	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	12	MANTA
12	GUERRERO PINILLA JUAN DAVID	1070587465	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	13	NILO
13	BARBOSA JAVIER ORLANDO	1073697577	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	14	PANDI
14	CONTRERAS ACOSTA WILSON FABIAN	1076649739	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	15	BODEGA
15	CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO	1077149553	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	16	VILLAPINZÓN
16	TRIANA FIERRO EDISON	1077970035	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	17	BODEGA
17	OTAYA BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER	1089481445	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	18	OFICINA
18	DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA	1104068887	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	19	OFICINA
19	PUCHE VIEIRA PLUTARCO JOSE	1127653361	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	20	FUSA
20	HIDALGO CASTAÑEDA HUGO	3099028	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	21	MANTA

21	MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL	3965630	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	22	BODEGA
22	PINTO AHUMADA NOHELIA	52514856	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	23	OFICINA
23	MUÑOZ PARDO ADRIANA MARIA	52876175	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	24	FUSA
24	MORA GALVIS HERNAN DARIO	80028785	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	25	FUSA
25	PINILLA COBALEDA WILSON FERNANDO	80491715	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	26	BODEGA
26	BOHORQUEZ ALVAREZ HERVERT ENRIQUE	3111101	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	27	VENECIA
27	BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO	1090987542	CONSORCIO ICCU CJIK	91855783	28	OFICINA
28	DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO	11320288	CONSORCIO ICCU CJIK	91854607	1	OFICINA
29	TORO VALERO ADONAI	79265782	CONSORCIO ICCU CJIK	91854607	2	OFICINA
30	JEIMY VIVIANA FRESNEDA	1013627428	JMS INGENIERIA SAS	9496064511	1	OFICINA
31	CHAUTA DIAZ IBAN DARIO	80003477	CIMELEC	91859699	1	OFICINA
32	TATIANA GONZALEZ TRUJILLO,	1109299894	CIMELEC	91860467	1	OFICINA
33	FONTECHA PARDO KEINER STIVEN	1096190963	CONST. GUERRERO	377278	1	MANTA
34	FONTECHA FORERO GERMAN	91362135	CONST. GUERRERO	377278	2	MANTA
35	FONTECHA FORERO EULICES	91362407	CONST. GUERRERO	377278	3	MANTA
36	LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO	80499650	CONST. GUERRERO	437189	1	ROTATIVO
37	BERMUDEZ CASTELLANOS REINEL STEVEN	1024585221	CONST. GUERRERO	437586	1	ROTATIVO
38	MOSQUERA CORDOBA JOSE EUGENIO	11798826	CONST. GUERRERO	437586	2	ROTATIVO

39	BERMUDEZ SOLARES PEDRO JESUS	5736163	CONST. GUERRERO	437586	3	ROTATIVO
40	CORDOBA MARTINEZ PEDRO	7252086	CONST. GUERRERO	437586	4	ROTATIVO
41	TORRES RODRIGUEZ GUSTAVO	2184566	CONST. GUERRERO	437586	1	MANTA
42	GUERRERO CUBILLOS HUGO	1072338423	CIMELCON	91854470	5	VILLAPINZÓN
43	PRADA TIQUE EDIMER	1105056246	CIMELCON	91854470	6	ROTATIVO
44	KEVIN CARDENAS	1233495295	EMECON	9496572173	23	NILO
45	JUAN BAUTISTA OVIEDO	80367987	EMECON	9496572173	75	NILO
46	CRISTIAN EDUARDO MACHADO	1105786491	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	30	NILO
47	ERMEN HOYOS	10766139	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	23	NILO
48	CESAR CRUZ_OFICIAL	1069716407	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	9	NILO
49	WILMAR ROMERO	1105780919	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	16	NILO
50	AUDONI DIAZ	1099545949	SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S	9495894040	1	NILO
51	ANDRES PECHENE	1061532744	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	7-8	NILO
52	LEIDER FONTALVO	1143266485	CONSTRUCCIONES METALICAS CRUZ SA	91916843	25-26	NILO
53	LAURA AYALA	1018412657	EMECON	9496572173	19	NILO

ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

NILO:

PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

ACTIVIDADES REALIZADAS: orden y aseo diario, inspección de equipos, acompañamiento a ensamblaje de estructura metálica para puente.

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE: Senderos Peatonales, áreas de influencia.

INDUCCIONES: Para el mes de diciembre se presentaron ingresos nuevos al frente. por lo tanto, se reporta personal activo.

	PERSONAL INDIRECTO						
N	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	INGRESO	FRENTE
1	1069716407	CESAR	CRUZ	EMECON	OFICIAL	04/11/2025	NILO
2	1105780919	WILMAR	ROMERO	EMECON	SOLDADOR	04/11/2025	NILO
3	1099545949	AUDONI	DIAZ	EMECON	OPERADOR	24/11/2025	NILO
4	1061532744	ANDRES	PECHENE	EMECON	AYUDANTE	25/11/2025	NILO

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

		PERSONAL INDIRECTO					
N	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDOS**	**EMPRESA**	**CARGO**	**INGRESO**	**FRENTE**
5	1143266485	LEIDER	FONTALVO	EMECON	OF. SOLDADOR	25/11/2025	NILO
6	1018412657	LAURA	AYALA	EMECON	GERENTE TECNICA	24/11/2025	NILO
7	1233495295	KEVIN	CARDENAS	EMECON	INSP. SST	06/10/2025	NILO
8	80367987	JUAN	OVIEDO	EMECON	OPERADOR CAMION GRUA	06/10/2025	NILO
9	10766139	ERMEN JOSE	HOYOS CASTILLO	EMECON	MONTADOR	06/10/2025	NILO
10	1105786491	CRISTIAN EDUARDO	MACHADO GOMEZ	EMECON	SOLDADOR	06/10/2025	NILO
11	115244170	MANUEL	BARRIOS	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
12	1099349751	LUIS	CHAVARRO	EMECON	TENSIONADOR	01/12/2025	NILO
13	16233259	JOSE	MOSQUERA	EMECON	TENSIONADOR	16/12/2025	NILO
14	1123405086	FABIO	PACHECO	EMECON	COORDINADOR SST	01/12/2025	NILO
15	80040862	CIRO	MARTINEZ	EMECON	DIRECTOR	01/12/2025	NILO
16	1091670988	YORBAN	QUINTERO	EMECON	ING PRODUCCIÓN	01/12/2025	NILO
17	1045709918	DANILO	HOYOS	EMECON	TENSIONADOR	11/12/2025	NILO
	1015430238	CAMILO EDUARDO	BENAVIDEZ	EMECON	INSPECTOR DE CALIDAD	15/12/2025	NILO
PERSONAL DIRECTO							
18	YANCE CABRILES JUAN CARLOS	1007167830	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	22-07-2025	INSPECTOR DE OBRA	NILO	
19	JUAN DAVID GUERRERO PINILLA	1070587465	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	16-06-2025	AYUDANTE	NILO	

VENECIA:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento a amarre de hierro, encofrada y fundida de base placa y aletas de box culvert, NO se presentan ingresos. por lo tanto, se relacionan personal activo.

PERSONAL DIRECTO

N	CEDULA	NOMBRE	APELLIDOS	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FRENTE
1	3111101	HERBERT ENRIQUE	BOHORQUEZ	ICCU	INSPECTOR DE OBRA	01/07/2025	VENECIA
PERSONAL INDIRECTO							
2	80499650	EDILBERTO	LOPEZ RODRIGUEZ	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	22/07/2025	VENECIA

FUSA – SIBATÉ:

ACTIVIDADES REALIZADAS: Jornada de orden y aseo, instalación y pintura de cerramiento en malla eslabonada completo en predio ya terminado (Gaviones), instalación de cerramiento perimetral de la finca en postes de concreto y alambre de púas. Retiro de Campamento y maquinaria.

PERSONAL DIRECTO							
1	80028785	HERNAN DARIO	MORA	CONSORCIO ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	01/09/2025	FUSA
2	1127653361	PLUTARCO JOSE	PUCHE	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	AUX TRAFICO	01/06/2025	FUSA
3	52876175	ADRIANA MARIA	MUÑOZ PARDO	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	INSP SST	07/07/2025	FUSA

TIBACUY:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de fundida de muro modulo B, señalización pmt, inspección de máquinas y equipos, protección de material y adecuación de campamento.

PERSONAL INDIRECTO							
No	CEDULA	NOMBRE	APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FECHA DE INGRESO	FRENTE DE OBRA
PERSONAL DIRECTO							

1	1007493943	LAURA NATALIA	PEÑARANDA	ICCU CJIK	INSP CIVIL	1/09/2025	TIBACUY

PANDI:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento fundido de Caisson y viga, señalización PMT, inspección de máquinas y equipos, protección de material y adecuación de campamento personal activo en obra.

PERSONAL INDIRECTO							
No	**CEDULA**	**NOMBRE**	**APELLIDO**	**EMPRESA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FRENTE DE OBRA**
1	5736163	PEDRO	BERMUDEZ	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	01/12/2025	PANDI
2	1024585221	STIVEN	BERMUDEZ	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	01/12/2025	PANDI
3	80499650	EDILBERTO	LOPEZ	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	22/07/2025	PANDI
PERSONAL DIRECTO							
4	3111101	HELBERT BOHORQUEZ	MORA	ICCU CJIK	INSP. CIVIL	26/06/2025	PANDY

VILLAPINZÓN:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y limpieza de campamento personal activo en obra. Inducción a personal nuevo.

PERSONAL DIRECTO							
1	1077149553	PABLO EMILIO	CHAVEZ	ICCU CJIK	AYUDANTE DE OBRA	05/09/2025	VILLAPINZÓN

2	1007244192	ANGI PAOLA	CARDENAS SANCHEZ	ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	12/08/2025	VILLAPINZÓN
PERSONAL INDIRECTO							
3	91362407	EULICES	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	OFICIAL	01/12/2025	VILLAPINZÓN
4	1096190963	STIVEN	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	AYUDANTE	01/12/2025	VILLAPINZÓN
5	91362135	GERMAN	FONTECHA	CONSTRUCCIONES GUERRERO	OFICIAL	01/12/2025	VILLAPINZÓN

MANTA:

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación y perfilación de talud, adecuación de campamento personal activo en obra. Inducción a personal nuevo.

PERSONAL DIRECTO							
1	1069078609	WILSON DAVID	MARTIN	ICCU CJIK	AUX TRAFICO	23/10/2025	MANTA
2	17415148	GUSTAVO	TORRES R	CIMECON	OPERADOR	09/09/2025	MANTA
3	3099028	HUGO	HIDALGO	ICCU CJIK	INSPECTOR CIVIL	01/09/2025	MANTA

PERSONAL INDIRECTO							
1	12021799	JORGE	MARTINEZ	CONSTR. GUERRERO	AYUDANTE	17/12/2025	MANTA
2	7252086	PEDRO	CÓRDOBA	CONST GUERRERO	OFICIAL	07/09/2025	MANTA
3	12022837	FRAIDER	PALACIOS	CONST GUERRERO	AYUDANTE	17/12/2025	MANTA

PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de noviembre el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de trabajo ya que realizan las actividades de excavación manual y fabricación de Caisson. (Pandi, Tibacuy, Villapinzón.

PERSONAL INDIRECTO							
1	11620934	JESUS DAVID	CAICEDO DURAN	CONST. GUERRERO	AYUDANTE	13/10/2025	ROTATIVO
2	11798826	JOSE EUGENIO	MOSQUERA	CONST. GUERRERO	OFICIAL	22/08/2025	ROTATIVO
3	1072338423	HUGO	GUERRERO CUBILLOS	CIMELCON	OPERADOR	06/08/2025	ROTATIVO
4	**1031129717**	CAMILO ANDRES	AVILA MOYANO	CIMELCON	CONDUCTOR	01/12/2025	ROTATIVO

COPAS Y CCL

El día 19 diciembre de 2025 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

Nombre del miembro del comité	Rol
Tatiana González	Secretaria
Karen Ruiz	Representante del empleador
PLUTARCO PUCHE	Representante de los colaboradores

Tabla 9. Representantes Comité

EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El día 19 diciembre de 2025 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 15 de diciembre de 2025. según la resolución 3461 de 2025.

Nombre del miembro del comité	Rol
Tatiana González	Representante del empleador
Karen Ruiz	Suplente del empleador
PLUTARCO PUCHE	Representante de los colaboradores

OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	DIC.
SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes	(N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT	0%	0%
FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes	(N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT	0%	0%


NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	META	DIC.
PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES	Número de accidentes de trabajo morales en el año	(N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	0%	Anual
PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo	(N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z	0	Anual
INDICE DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo	(N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z	0	Anual
AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica	(N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica	0%	0%

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolución 0312

CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto, presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.

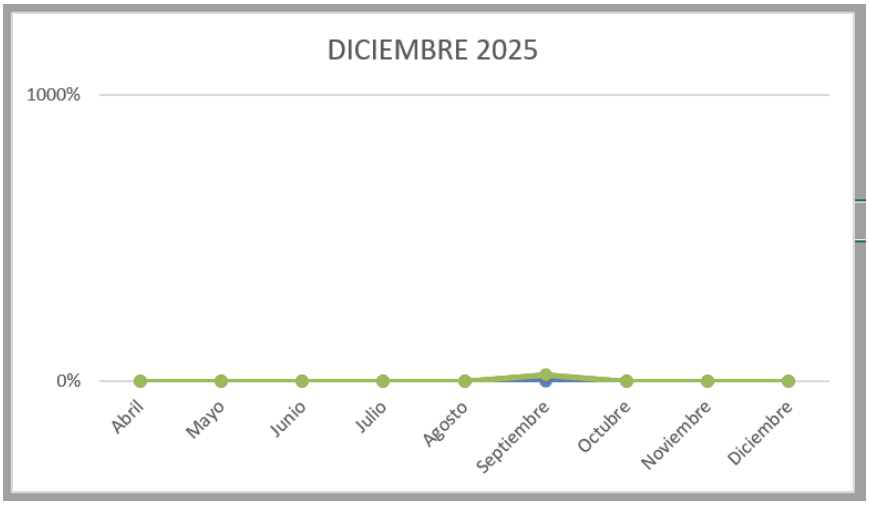

Análisis: El valor parcial de 1 al 31 de diciembre vuelve a ser **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.
Esto sugiere que las **acciones preventivas o correctivas implementadas tras llevar un índice alto en el mes de septiembre** fueron efectivas.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado

y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

Actividades básicas	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
INDUCCIÓN TOTAL	13	13	100%	100%	100%
VENECIA	0	0	0%	0%	0%
FUSA - SIBATÉ	0	0	0%	0%	0%
NILO	8	8	100%	100%	100%
OFICINA	0	0	0%	0%	0%
TIBACUY	0	0	0%	0%	0%
GACHALA	0	0	0%	0%	0%
VILLAPINZÓN	3	3	100%	100%	100%
PANDY	0	0	0%	0%	0%
ROTATIVO	1	1	100%	100%	100%
MANTA	1	1	0%	0%	0%
Notificación de riesgos	13	13	100%	100%	100%

Tabla 11. Inducciones del periodo

CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJIK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de diciembre** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la

promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

CHARLAS Y CAPACITACIONES FUSA		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
15 – 12 -2025	BOLETÍN DICIEMBRE	5
15 – 12 - 2025	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO, PAUSAS ACTIVAS RELACIONADAS CON CONSERVACIÓN VISUAL , BIOMECÁNICO RECREATIVO	7
16 – 12 - 2025	DIVULGACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA	5

CHARLAS Y CAPACITACIONES NILO		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
09-12-2025	CHARLA PREOPERACIONAL	6
26 - 12 -2025	PELIGROS Y RIESGOS DE LA ACTIVIDAD DE DESARMADO DE LA ESTRUCTURA. METÁLICA	7
27 - 12- 2025	CÓMO REACCIONAR EN CASO DE UNA EMERGENCIA	9
28- 12-2025	PROCEDIMIENTO DE DESARME DE ANDAMIO Y APOYO DE ESTRUCTURA	9
29 - 12 -2025	SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE DESCENSO DE ESTRUCTURA METALICA	6

CHARLAS Y CAPACITACIONES OFICINA		
FECHA	**TEMA**	**No. de Asistentes**
09/12/2025	BOLETIN DIC 2025	11
12/12/2025	CÓMO VERIFICAR CONDICIONES DE ACOPIO ETIQUETADO Y ROTULADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	11

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJIK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

Medicina del trabajo	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura	Novedad
Exámenes de ingreso	13	13	100%	100%	N/A
Exámenes periódicos	0	0	100%	100%	N/A
Exámenes de retiro	0	0	100%	N/A	N/A
Cartas de notificación de Examen de Retiro	13	13	100%	100%	100%
Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL	0	0	100%	100%	100%

Tabla 12. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

Medicina del trabajo	Total	Apto - satisfactorio	Apto con recomendaciones	Apto con restricciones	Otras novedades
Exámenes de ingreso	13	13	0	0	N/A
Exámenes periódicos	0	0	0	0	Ninguna

Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

Higiene industrial	Personal o actividad programada	Personal asistente o actividad realizada	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Entrega de EPP y dotación	13	13	100%	100%
Seguimiento a matriz IPERV	1	1	100%	100%
Inspecciones - preoperacionales Fusa	3	3	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Venecia	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Tibacuy	0	0	100%	100%
Inspecciones- preoperacionales Nilo	3	3	100%	100%
Análisis de trabajo Nilo	3	10	100%	100%
Análisis de trabajo Fusa-Sibaté	1	1	100%	100%
Análisis de trabajo Venecia	0	0	100%	100%
Análisis de trabajo Tibacuy	0	0	100%	100%
Análisis de trabajo Pandi	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Nilo	3	10	N/A	N/A
Permisos de trabajo Fusa	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Venecia	0	0	N/A	N/A
Permisos de trabajo Tibacuy	0	0	100%	100%
Permisos de trabajo Panadi	0	0	100%	100%

Tabla 14. Programa de seguridad

DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 1 al 31 diciembre de 2025 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de diciembre se realizó se realiza cumplimento del plan de trabajo con todos los frentes.

.

INSPECCIONES FUSA		
09 AL 14 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	MAQ- F-07A
12 AL 13 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL FRESADORA	MAQ- F-07A

INSPECCIONES NILO		
8-14 DICIEMBRE	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL	**MAQ-F-14- O V2**
15 AL 21 DIC	PREOPERACIONAL EQUIPO DE SOLDADURA	**MAQ-F-14- I V2**
22 -28 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE CORTE	**MAQ-F-14-J-V2**

28 -29 DIC	INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTURA LUIS CHAVARRO	**FORMATO PROPIO DEL CONTRATISTA**
28 -29 DIC	INSPECCIÓN EQUIPOS DE ALTURA ROSBEL MEJIA	**FORMATO PROPIO DEL CONTRATISTA**

INSPECCIONES PANDI		
01 AL 07 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	**MAQ-F-14- I V2**
01 AL 07 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS DE MANO	**MAQ-F-14- I V2**
08 AL 14 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA	**MAQ-F-14- I V2**
08 AL 14 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL HERRAMIENTA DE MANO	**MAQ-F-14- I V2**
14 AL 21 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL GENERADOR ELECTRICO	**MAQ-F-14- I V2**
15 AL 21 DIC	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE CORTE	**MAQ-F-14- I V2**

INSPECCIONES MANTA		
01 AL 07 DIC	INSPECCIÓN DE EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA DE MANO	**MAQ-F-14- O V2**
08 AL 14 DIC	INSPECCIÓN DE QUIPO MENOS Y HERRAMIENTA DE MANO	**MAQ-F-14- I V2**
15 AL 21 DIC	INSPECCIÓN DE EQUIPO MENOR Y HERRAMIENTA	**MAQ-F-14- I V2**

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 1 y el 31 diciembre de 2025, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un total de 13 ATS Y 2 PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:

PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

PERMISOS DE TRABAJO NILO		
FECHA	**PERMISO REALIZADO**	**SOPORTE**
5 AL 21 DIC	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	SSTA-F-91
15 AL 21 DIC	PERMISO DE IZAJE	SSTA-F-91
15 AL 21 DIC	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE Y CORTE CON LLAMA	SSTA-F-91

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO NILO		
FECHA	**ATS REALIZADO**	**SOPORTE**
08 AL 14 DIC	SOLDADURA DE EMPALMES Y RIOSTRAS	SSTA-F- 37
15 AL 21 DIC	SOLDADURA DE EMPALME, RIOSTRAS, LANZAMIENTO DE PUENTE	SSTA-F- 37
15 AL 21 DIC	SOLDADURA DE EMPALME,RIOSTRAS, LANZAMIENTO DE PUENTE	SSTA-F- 37
21 AL 28 DIC	ATS ACTIVIDADES GENERALES	PROPIO DEL CONTRATISTA
29-31 DIC	ATS ACTIVIDADES GENERALES	PROPIO DEL CONTRATISTA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO FUSA		
FECHA	**ATS REALIZADO**	**SOPORTE**
09AL 14 DIC	ATS FRESADO Y ASFALTO	SSTA-F- 37
		SSTA-F- 37

PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 1 al 31 diciembre de 2025, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.

Plan de emergencias y contingencias	Personal convocado	Personal asistente	Indicador de cumplimiento	Indicador de cobertura
Socialización del plan de emergencias (inducción).	13	13	100%	100%
Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores	0	0	N/A	N/A
Elaboración de informe y seguimiento	1	1	100%	100%

Tabla 15. Gestión en emergencias

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora PAJARITA JCB 3CXB ,VIBROCOMPACTADOR BOMAG, HITACHI ZX130 LCN-3, MINICARGADOR CASE SR 200, MINICARGADOR CASE SR 200B, EXCAVADORA SANY 75, RETRO LINK BELT 130, RETROCARGADOR CATERPILLAR 3200, lo cual se realizará cumplimento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada a partir del mes de septiembre permitiendo verificar el adecuado estado y funcionamiento de la maquinaria, esta maquinaria se encuentra como rotativa ya que están en los diferentes frentes tales como: (Venecia, Nilo, Fusa).

MAQUINARIA AMARILLA	CANTIDAD	FRENTE	FECHA DE RETIRO
RETROEXCAVADORA PAJARITA JCB 3CXB	1	VILLAPINZÓN	
HITACHI ZX130 LCN-3	1	ROTATIVO	13 DIC 2025
MINICARGADOR CASE SR 220B	1	ROTATIVO	23 DIC 2025
MINICARGADOR MC050376	1	ROTATIVO	09 DIC 2025
FRESADORA CATERPILLAR M	1	FUSA V. EL	22 DIC 2025

102 2014		PLACER	
PAVIMENTADORA INGERSOLL RAND PF 161	1	FUSA V. EL PLACER	

SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA

MAQUINARIA AMARILLA EN FUSA VEREDA EL PLACER







MAQUINARIA AMARILLA EN VILLA PINZON

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK









MAQUINARIA AMARILLA EN MANTA





MAQUINARIA AMARILLA PANDI







CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de noviembre, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva, medicina del trabajo, seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.
- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.

Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.

ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTES

ACOMPAÑAMIENTO ENSAMBLE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PUENTE



ACOMPAÑAMIENTOS FUSA

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK





ACOMPAÑAMIENTOS MANTA





ACOMPAÑAMIENTOS PANDI







ACOMPAÑAMIENTOS VILLAPINZON









COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades realizadas:

- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- Se realizan llenos y compactación con material granular extraído de las canteras autorizadas. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolución # 1326 del 12 de noviembre 2003 y Título Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2 de mayo de 2025.
- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.

JORNADA DE ORDEN Y ASEO



SEÑALIZACION DE AREAS INTERVENIDAS



MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

El material granular extraído de la cantera autorizada. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A,** jurisdicción Municipio de Mosquera, Y material de construcción Se acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminación y propagación de material particulado.

ACOPIOS TEMPORALES



MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:

En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones**.**
Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior # 3, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

	CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025	
ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: "ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**	ICCU CJIK 201-2025 CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK

ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL









REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 1 al 20 de diciembre de 2025 Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS CAPACITACIONES AMBIENTALES





INSTALACION DE BATERIAS SANITARIAS	
	
SE REALIZA RETIRO DE BATERIAS SANITARIAS DE LOS FRENTES A CULMINAR	SE REALIZA DESINFECCION A LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN FIJOS

GESTIÓN SOCIAL

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se revisaran actas de vecindad realizadas al inicio de obra.

Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.

PERSONAL VENECIA PERSONAL TOTAL 1					
CLASIFICACIÓN	30% y/o 5% DEL 100%	CANTIDAD DE TRABAJ	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE

			ADORES			
NO CALIFICADOS	100%	100%	1	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A
MUJERES	100%	100%	0	AUX TRAFICO	SI CON EL 5%	N/A

PERSONAL FUSA PERSONAL TOTAL 1						
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	1	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A
MUJERES	100%	100%	0	AUX TRAFICO	SI CON EL 5%	N/A

PERSONAL NILO PERSONAL TOTAL 5						
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE	NO CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	5	AYUDANTES	SI CON EL 30%	N/A

MUJERES	0	100%	0	N/A	no	N/A

PERSONAL TIBACUY PERSONAL TOTAL					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	0	AYUDANTES, AUX TRAFICO	NA
MUJERES	50%	100%	0	AYUDANTE	NA

PERSONAL PANDI PERSONAL TOTAL 3					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	3	AYUDANTES, AUX TRAFICO	SI CON EL 30%
MUJERES	50%	100%	0	AYUDANTE	SI CON EL 5%

PERSONAL VILLAPINZÓN PERSONAL TOTAL 2					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	2	AYUDANTES	SI CON EL 30%
MUJERES	0%	100%	0	N/A	NO CON EL 5%

PERSONAL MANTA PERSONAL TOTAL 3					
CLASIFICACIÓN	30% - 5% DEL 100%		CANTIDAD DE TRABAJADORES	CARGOS	CUMPLE
NO CALIFICADOS	90%	100%	3	AYUDANTES	SI CON EL 30%
MUJERES	0%	100%	0	N/A	NO CON EL 5%

Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.

PERSONAL NILO			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL FUSA - SIBATÉ			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL VENECIA			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**

MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL TIBACUY			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL GACHALA			
CLASIFICACIÓN	**desplazados**	**reintegración**	**víctimas de conflicto armado**
MUJERES	**0%**	**0%**	**0%**
HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

PERSONAL PANDI

CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

PERSONAL VILLA PINZON			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%
HOMBRES	0%	0%	0%

PERSONAL MANTA			
CLASIFICACIÓN	desplazados	reintegración	víctimas de conflicto armado
MUJERES	0%	0%	0%

HOMBRES	**0%**	**0%**	**0%**

Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

NACIONALIDAD DEL PERSONAL		
CLASIFICACIÓN	**PERSONAL EXTRANJERO**	**PERSONAL COLOMBIANO**
NILO	**0%**	**100%**
VENECIA	**0%**	**100%**
SIBATE-FUSA	**0%**	**100%**
TIBACUY	**0%**	**100%**
GACHALA	**0%**	**100%**
VILLA PINZON	**0%**	**100%**
PANDI	**0%**	**100%**

Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.

Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJIK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU la información necesaria para la creación de la valla informativa del CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK, lo cual no hemos recibido respuesta positiva a la fecha del presente corte.

LISTADO DE ANEXOS

- **Anexo 1. Ingresos**

- **Anexo 2. Notificación de Riesgos**
- **Anexo 3. Seguridad social**
- **Anexo 4. Copass y Cocola**
- **Anexo 5. Indicadores**
- **Anexo 6. Certificados de accidentalidad**
- **Anexo 7. Inducción SST**
- **Anexo 8. Medicina preventiva**
- **Anexo 9. Dotación y EPP**
- **Anexo 10. Maquinaria y equipos**
- **Anexo 11. Acta de vecindad**
- **Anexo 12. Ambiental**
