Fecha:	07	03	2025	**Hora Inicio:**	8:30am	**Hora Fin:**	12:00m	**Lugar:**	MEN
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN								
Asistentes:	MEN: Carlos Amaya ANIM: Natalia Valencia, Juan Camilo Ramirez								
Agenda	Verificación de Quorum (aplica para comités)								
	Cartillas.								
	Estado de los proyectos.								
	Sede Nueva - Ampliación								
	Master								
	Temas administrativos: Manual Operativo, PAD, Contrato, Flujo de pago.								
	Compromisos								

- ANIM informa que el MEN ha entregado parcialmente las cartillas con errores, sin coordinación técnica y sin cantidades ni especificaciones técnicas.
- ANIM presentó las primeras distribuciones esquemáticas que conforman el núcleo básico y ampliación para el proyecto de Ambientes Modulares.
- MEN presentó sus observaciones y sugerencias frente a las propuestas presentadas:
    - No se requiere módulo de cocina dado el estado de IES nueva.
    - Se recomienda implementar espacios especializados como laboratorios o talleres según los programas académicos ofrecidos por la IES adaptándolos a los módulos presentados en la Cartilla.
    - La implementación de los módulos administrativos debe facilitar la ubicación de áreas como salas de profesores, separado de los módulos de trabajo individuales para estudiantes/coordinadores.
    - Los módulos que funcionen como biblioteca pueden albergar salas de estudio para complementar el programa en la misma cantidad de módulos.
    - Es necesario incluir un Aula Múltiple que funcione como Auditorio.
    - Los espacios de bienestar pueden conformarse de distintas formas, como una cafetería o tienda de comida en la definición del núcleo básico, o una oficina con el coordinador encargado y puestos de estudio individual.
    - En los proyectos de ampliación, los espacios de comedor y bienestar se pueden alojar en la infraestructura existente.
    - Área de enfermería al ser una Sede Nueva Básica no es necesaria.
    - En general, el MEN no cuenta con una guía de áreas o unos requerimientos mínimos para el programa arquitectónico de las IES, dada la especificidad de los programas académicos ofrecidos por estas. Se pueden tomar como referentes de espacios los

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

exigidos por los comités de acreditación de alta calidad, pero estas pueden variar entre instituciones.

- Se diligenció la matriz de seguimiento semanal en conjunto con el equipo del MEN, permitiendo registrar el estado actualizado de las actividades y compromisos del proyecto.

1. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha Plazo
Conformar mesa de trabajo para definir el núcleo básico de sede nueva.	**ANIM - MEN**	8/07/202

Firmas Participantes:

Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa - MEN

Nombre del lider de la actividad: CARLOS AMAYA NACANTO

Tema: Seguimiento contrato ANIM

Hora de inicio: 8:00 am | Hora de fin: 11:00 am

Fecha: 03/09/2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Alino Amaya N	OIE - MEN	13.720203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018962280	jramirez@anim.gov.co	
3	Natalia Valencia	ANIM	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Fecha:	07	10	2025	**Hora Inicio:**	8:30am	**Hora Fin:**	12:00m	**Lugar:**	MEN
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN								
Asistentes:	MEN: Carolina Sánchez, Carlos Amaya, ANIM: Natalia Valencia, Juan Camilo Ramírez, Johana Vega.								
Agenda	Verificación de Quorum (aplica para comités)								
	Cartillas.								
	Estado de los proyectos.								
	Sede Nueva - Ampliación								
	Master								
	Temas administrativos: Manual Operativo, PAD, Contrato, Flujo de pago.								

- ANIM informa que el MEN ha entregado 5 módulos en REVIT de Metal y 5 de Madera. Aún no se reciben memorias eléctricas, hidrosanitarias ni de datos, necesarias para avanzar en el diseño de redes y acometidas. Por ello, se dará prioridad a los proyectos en sistema metálico, ya que ANIM debe verificar la información recibida para avanzar en los Anexos Técnicos y publicar el proceso.
- Natalia solicita mantener al equipo actual de diseño de módulos del MEN por un mes más, para que la ANIM reciba la Cartilla según lo esperado. Propone que el equipo trabaje desde la ANIM para agilizar los ajustes necesarios.
- Con la información disponible, se ha conformado un **núcleo básico** para **Sede Nueva** (lote vacío) y Ampliación de IES existente. El valor aproximado se definirá en la próxima mesa de trabajo. Este núcleo consta de:
    - 10 AT2 Aulas para 30 estudiantes.
    - 1 AT3 Aula que será diseñada para Sala de cómputo.
    - 2 BB2 Baños de 11 baterías cada uno.
    - 1 AD1 Área administrativa que será diseñada para zona de Bienestar.
    - 1 AD2 Área administrativa para coordinador y sala docente.
    - 1 AM1 Auditorio para 80 estudiantes.
    - 1 AM1 que se diseñará como posible laboratorio.
    - 4 MT1 correspondientes a: Cuarto técnico, área de basuras y aseo, portería, tienda de alimentos.
- Se debe realizar una mesa de trabajo para definir el diseño de los laboratorios. Johana propone hacerlo con el equipo de ETITC, ya que son quienes más laboratorios solicitan. Estos módulos requerirán redes adicionales que se definirán en dicha mesa.
- Natalia indica que los estudios de suelos y el levantamiento topográfico serán contratados con Alfonso Uribe, por su experiencia en diferentes territorios del país. La contratación se hará en modalidad de bolsa agotable, acorde con la naturaleza del proyecto.
- En temas administrativos, Natalia expone que el PAD se conformará el viernes 11 de julio.
- Carolina le informa a la Natalia que la fecha máxima para pasar la cuenta de cobro por parte de la ANIM es el 15 de julio.

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

- En temas de dotación básica, se proponen mesas de trabajo con María Teresa, ya que para ES no hay estándares definidos por el MEN y se evalúan según las propuestas de las IES. El objetivo es definir el mobiliario básico para cada módulo de la Cartilla.
- En temas técnicos, Natalia resalta que, en predios sin energía eléctrica, donde se soliciten laboratorios, se deberán instalar equipos de respaldo para su correcto funcionamiento.
- Sobre comunidades energéticas, Johana y Carlos informan que se han sostenido reuniones con MinMinas y el equipo CAF para definir en qué proyectos se pueden instalar paneles solares. La ANIM depende de la entrega total de las memorias eléctricas para calcular las cargas y continuar las mesas de trabajo.
- El MEN solicita a la ANIM una presentación para el ministro que incluya:
    - Soluciones energéticas, con sus pros y contras, mantenimiento y estructura de soporte.
    - Escenarios con suplencia 100% solar y suplencia complementaria conectada a red existente.
    - Vida útil de los sistemas.
- La ANIM se compromete a entregar las fichas de viabilidad de los predios donde se contará con: Información catastral, jurídico, SSPP, Necesidad de las IES, Firma del convenio con las IES (esta firma se realizará antes de realizarse el acta de inicio de obra). En los casos que sea necesario deberá incluirse el comodato.
- Se deberá complementar el documento de viabilidad con el documento técnico remitido por cada IES al MEN, el MEN comparte dicha información a la ANIM.
- La ANIM presenta el Avance de los proyectos, dando como conclusiones:
    - Agendar reunión con San José del Guaviare para definir quién se encargará de la demolición y presentar la implantación de la Fase a ejecutar por la ANIM. Invitar a Carolina y a la ART.
    - Se han realizado mesas de trabajo con ETITC para el proyecto en el Palacio de San Francisco. Sin embargo, en la reunión del 8 de julio con IDECUT se informó que no se cuenta con el certificado de uso del suelo, documento prioritario para avanzar, ya que el predio es un BIC y su aprobación por MinCultura podría tardar entre 4 y 7 meses. El MEN continuará con la intervención siempre y cuando no se exija reforzamiento estructural.
    - También el MEN comparte que el proyecto de Soacha ingresará en el paquete de la ANIM, nos sugieren que sea para el grupo 2.
- En temas de los procesos de contratación para la ejecución de los Ambientes Modulares Natalia los define en:
    - Estudios de suelos y levantamiento topográfico.
    - Adecuaciones.
    - Suministro e instalación.
- Se continua con la actualización de la Master, trabajo entre la ANIM y el MEN.

1. Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PLAZO
Definir Valor aproximado para núcleo básico – Sede Nueva.	**ANIM**	17/07/2025

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Realizar presentación para el ministro.	**ANIM**	17/07/2025
Radicar cuenta de cobro.	**ANIM**	15/07/2025
Conformar comité financiero.	**ANIM**	17/07/2025
Agendar primer comité técnico de seguimiento interinstitucional.	**ANIM**	17/07/2025

Firmas Participantes:
Se anexa lista de asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: OIE - MEN

Nombre del lider de la actividad. Carlos A. Amaya Naranjo

Tema. Seguimiento Semanal / contrato No. CO1.PCCNTR 7957998

Hora de inicio: 8:30 am | Hora de fin.

Fecha: 10/07/2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos A. Amaya Naranjo	OIE	13720203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018467280	jramirez@aub.gov.	
3	Johana Paola Vega Cabra	ANIM	1015442756	jvega@anim.gov.co	
4	Natalia Valencia	ANIM	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
5	Carolina Sanchez	MEN-UES	52809328	casanchezm	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del “Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria”

AGENDA

1. **Verificación de quorum.**
2. **Antecedentes.**
3. **Estado de proyectos.**
4. **Fichas de proyectos – Sede Nueva.**
5. **Fichas de proyectos – Ampliación.**
6. **Posibles proyectos con energías renovables** (paneles solares).
7. **Proposiciones y varios.**
8. **Compromisos.**

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

1. Verificación de quorum.

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

2. Antecedentes.

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

2.Antecedentes del contrato

CONTRATO NÚMERO **CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025** SUSCRITO ENTRE EL **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** Y LA **AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.**

Firmado el 7 de junio del 2025
Pólizas 17 de junio del 2025

CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA.”.

POR UN VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO. **$271.315.944.244**

3. Estado de proyectos.

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

1.Estrategias de trabajo

VALOR DEL PROYECTO
$271.315.944.244

TIEMPO DE EJECUCIÓN
18 meses

Estrategias de intervención (Tipo de proyecto)

1. **Implementación de 119 Ambientes Modulares**

   Entre 23-30 hasta 700m2 c/u
   70-89 hasta 200m2 modulares o adecuación
   $ 239.161.800.340

2. **Estudios y diseños en estructuras convencionales**


   5 proyectos
   $17.904.143.904

3. **Estudios, diseños y obra o adecuación en estructura convencionales**

   1-3 proyectos entre 200m2-1.000m2 c/u
   $14.000.000.000

4. **Dotación**

   1 proyecto
   $250.000.000

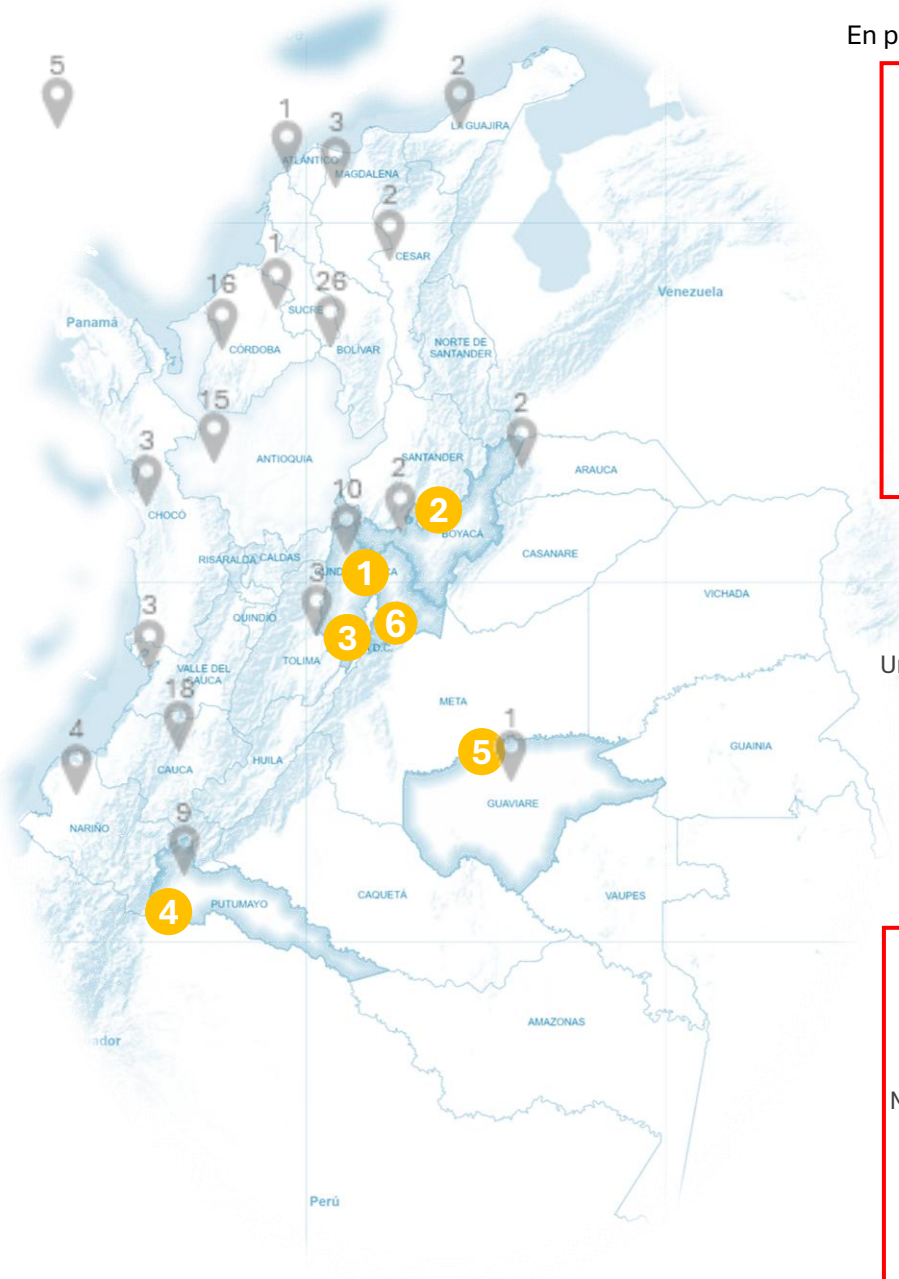

2.Proyectos piloto ambientes modulares

En proceso de validación con ME y Universidad de los proyectos piloto.

1 Funza Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Miércoles,16 de junio

2 Villeta Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Multi Campus
ÁREA LOTE:
65.866m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

3 Fusagasugá Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
22.571 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular

4 Valle del Guamuez-Hormiga Putumayo

UNIVERSIDAD:
Instituto Tecnológica de Putumayo - Gobernación del Putumayo
ÁREA LOTE:
41.690 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

5 San José del Guaviare

UNIVERSIDAD:
Multi Campus (están en negociación con diferentes universidades)
ÁREA LOTE:
17.334 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular y convencional.
VISITA:
Por definir fecha

6 Bogotá (Valmaría)

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular y convencional.

Estado de proyectos.

Ambientes Modulares

Piloto	Viabilización de predios	Mesas de trabajo con IES	DRT y Anexos técnicos	Visitas IES	Diseño de implantación
6	6	6	1	2	5

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

4. Fichas de proyectos – Sede Nueva.


Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

2. Programa Núcleo Básico - Sede nueva.

Institución nueva 300 alumnos

21 módulos
1 placa polideportiva

	ÁREA APROX.	
TOTAL ÁREA PROGRAMA	1.540 m²	
ÁREA CIRCULACIONES INTERNAS	230 m²	
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA		1.770 m²
ÁREA URBANISMO	550 m²	
ÁREA PLACA POLIDEPORTIVA	660 m²	
GRAN TOTAL ÁREA		2..980 m²
ÁREA POR ESTUDIANTE (Área Const.)	5,9 m²	
LINEAL CERRAMIENTO	250 ml	
PARQUEADEROS	10 unidades	

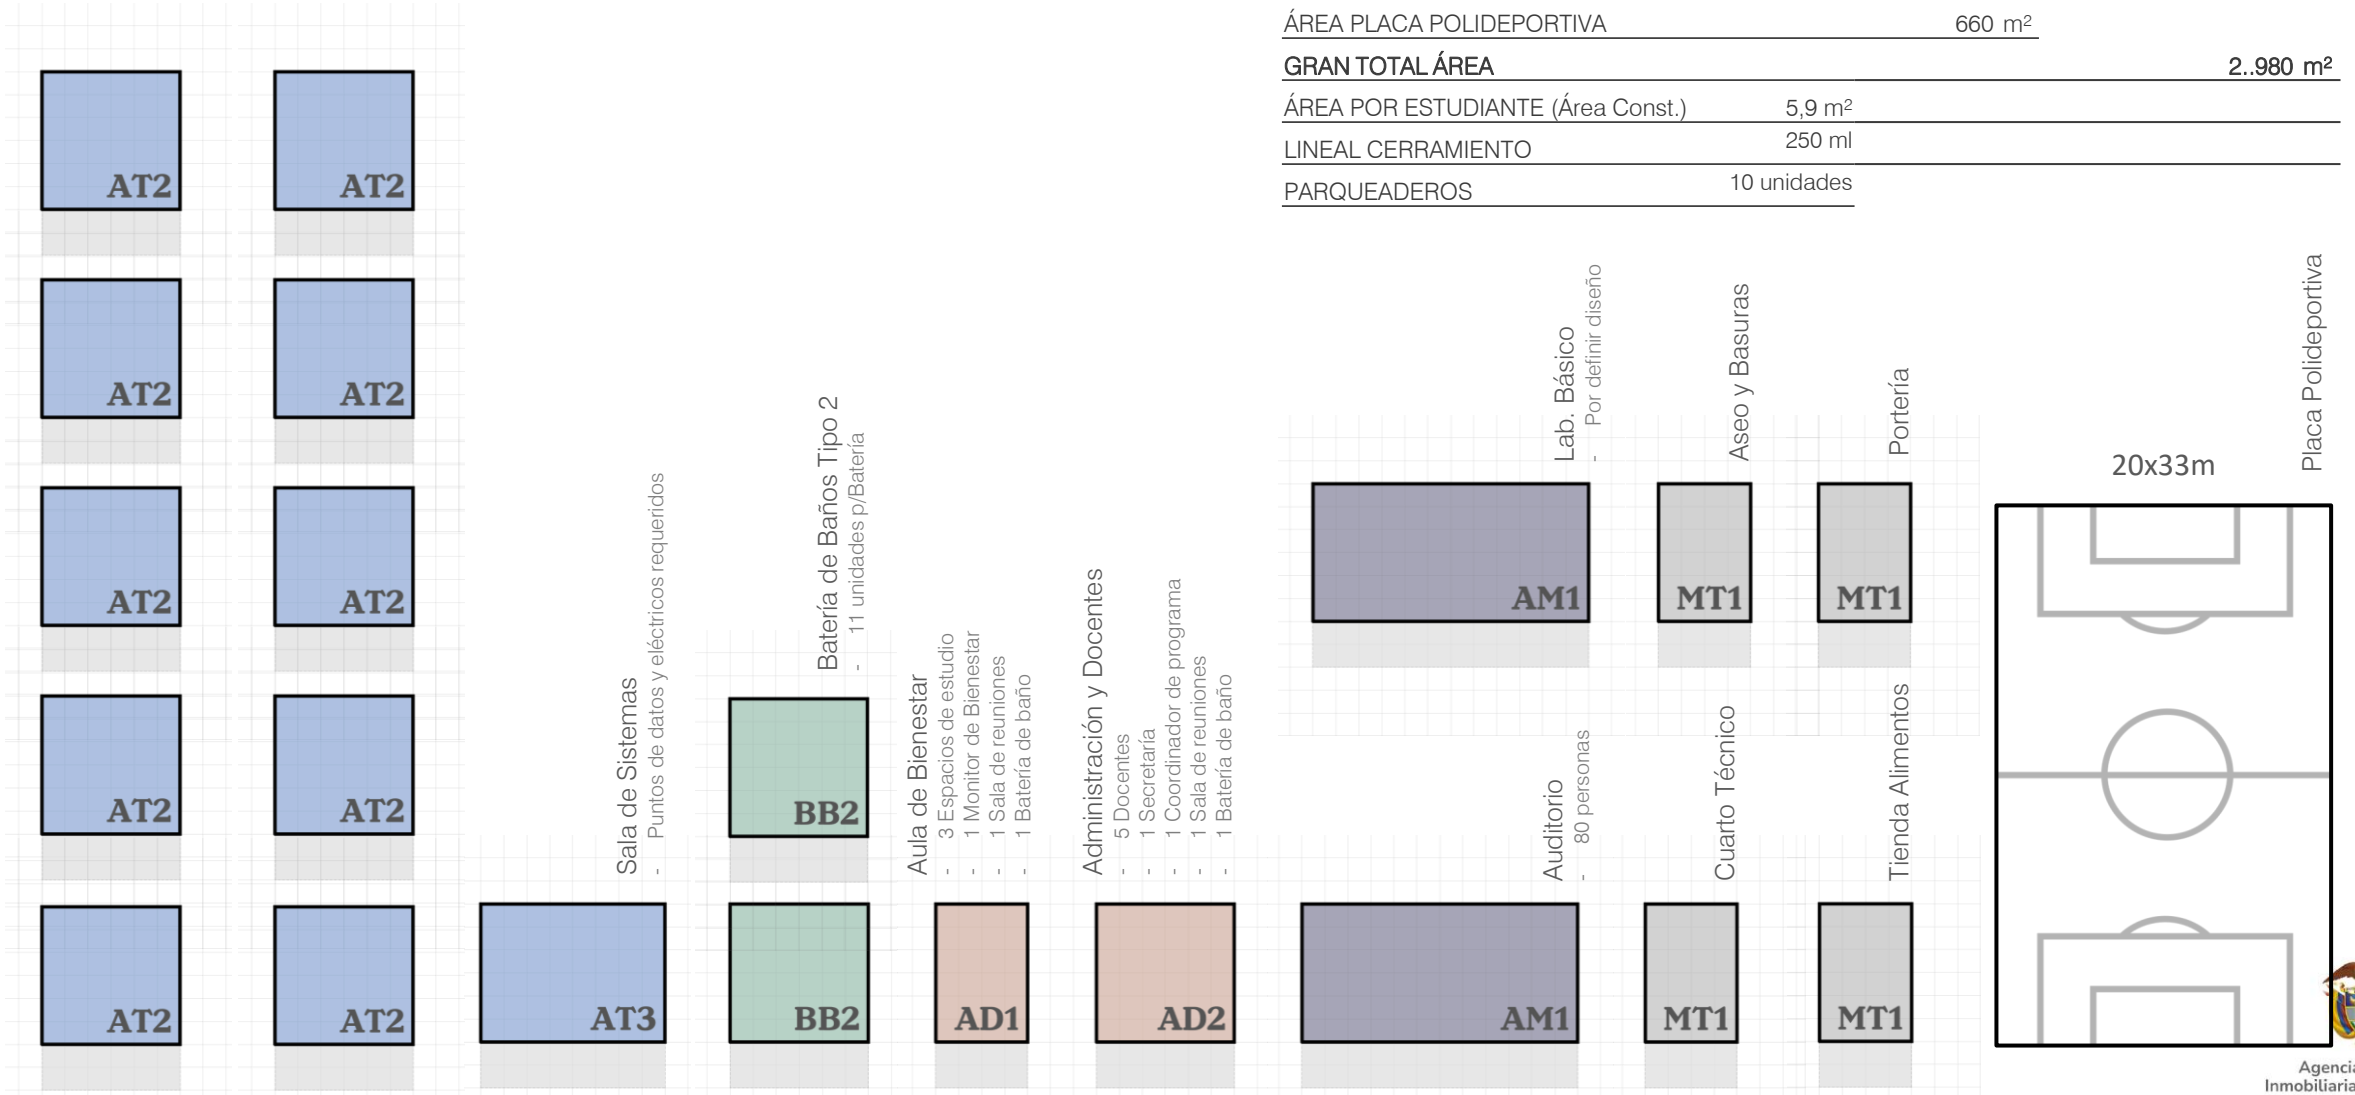

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

3. Avance de proyectos - Sede nueva.

ID_165_Valle del Guamuez

Ficha




TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	300 estudiantes
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Se está coordinando visita de campo.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Se está a la espera de las cartillas para módulos en madera.

3. Avance de proyectos - Sede nueva.

ID_165_Valle del Guamuez

Implantación

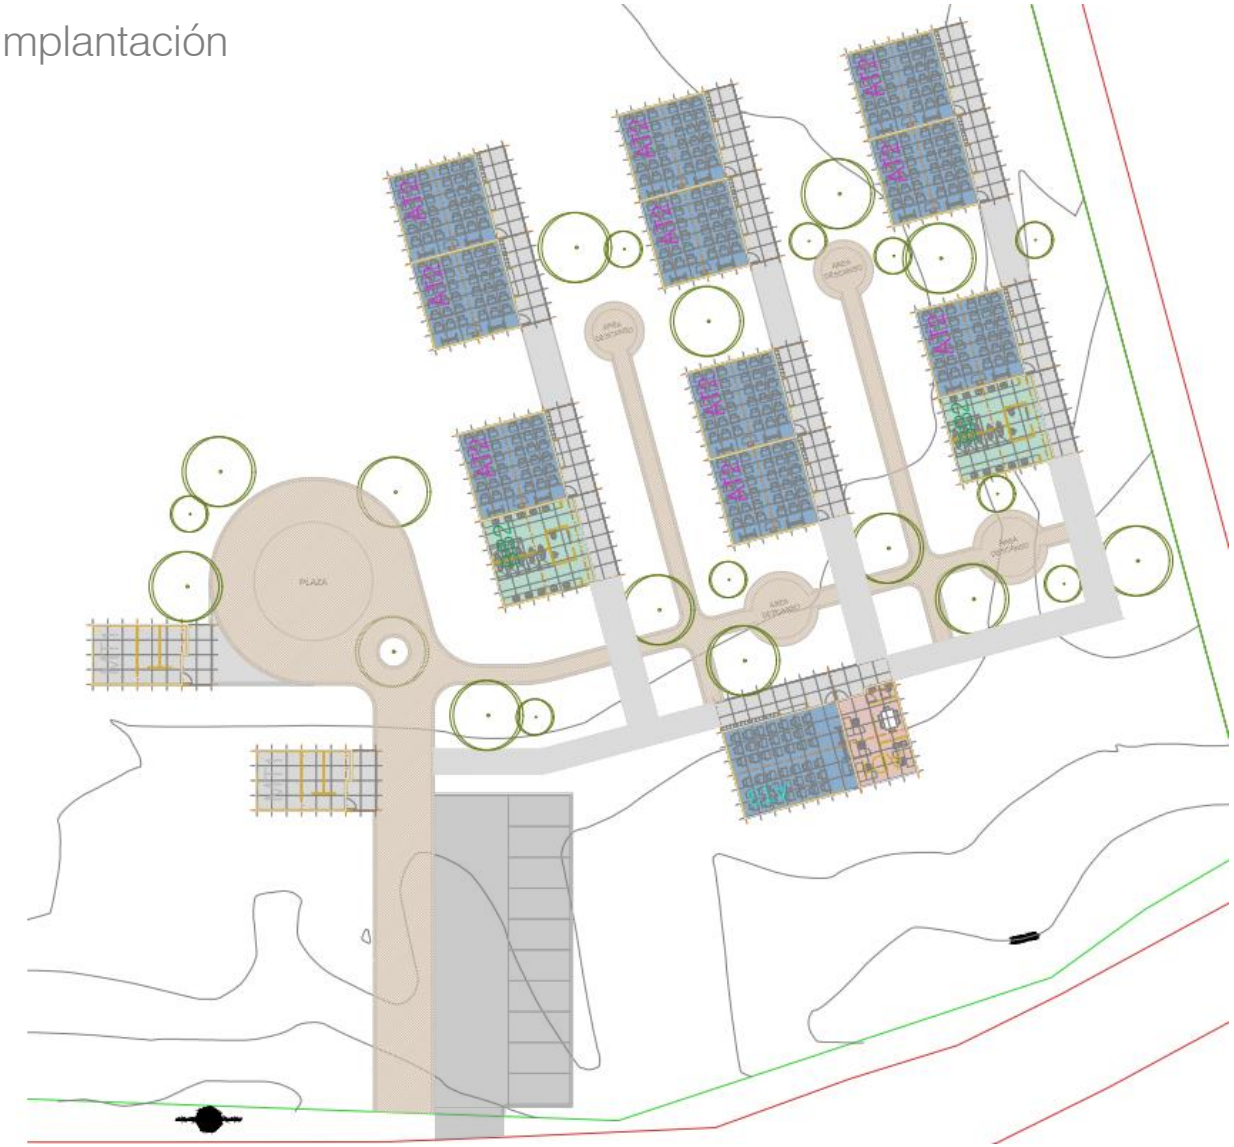

- Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

ID_165 Valle del Guamuez

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	10	704,4
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Tienda de Alimentos	47,53	1	47,53
	Zona Admin.	81,14	1	81,14
	Total			**1068,77**
Área Libre	Zona Dura	694	1	694
	Zona Blanda	425,19	1	2732
	Total			**3426**
	Lineal Bordillo			489,06 ml

Educación

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

5. Avance de proyectos – Sede Nueva.

ID_147 ETITC - Funza

Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	160 estudiantes
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo 16 de julio.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Predio por Declaratoria de utilidad publica para la expropiación temprana.


5. Avance de proyectos – Sede Nueva.

Ejemplos de implantaciones.
ID_147 ETITC - Funza

FASE 1

UNIVERSIDAD:
EITITC
ÁREA LOTE:
Presentan dos lotes
NECESIDAD:
Modular y convencional.



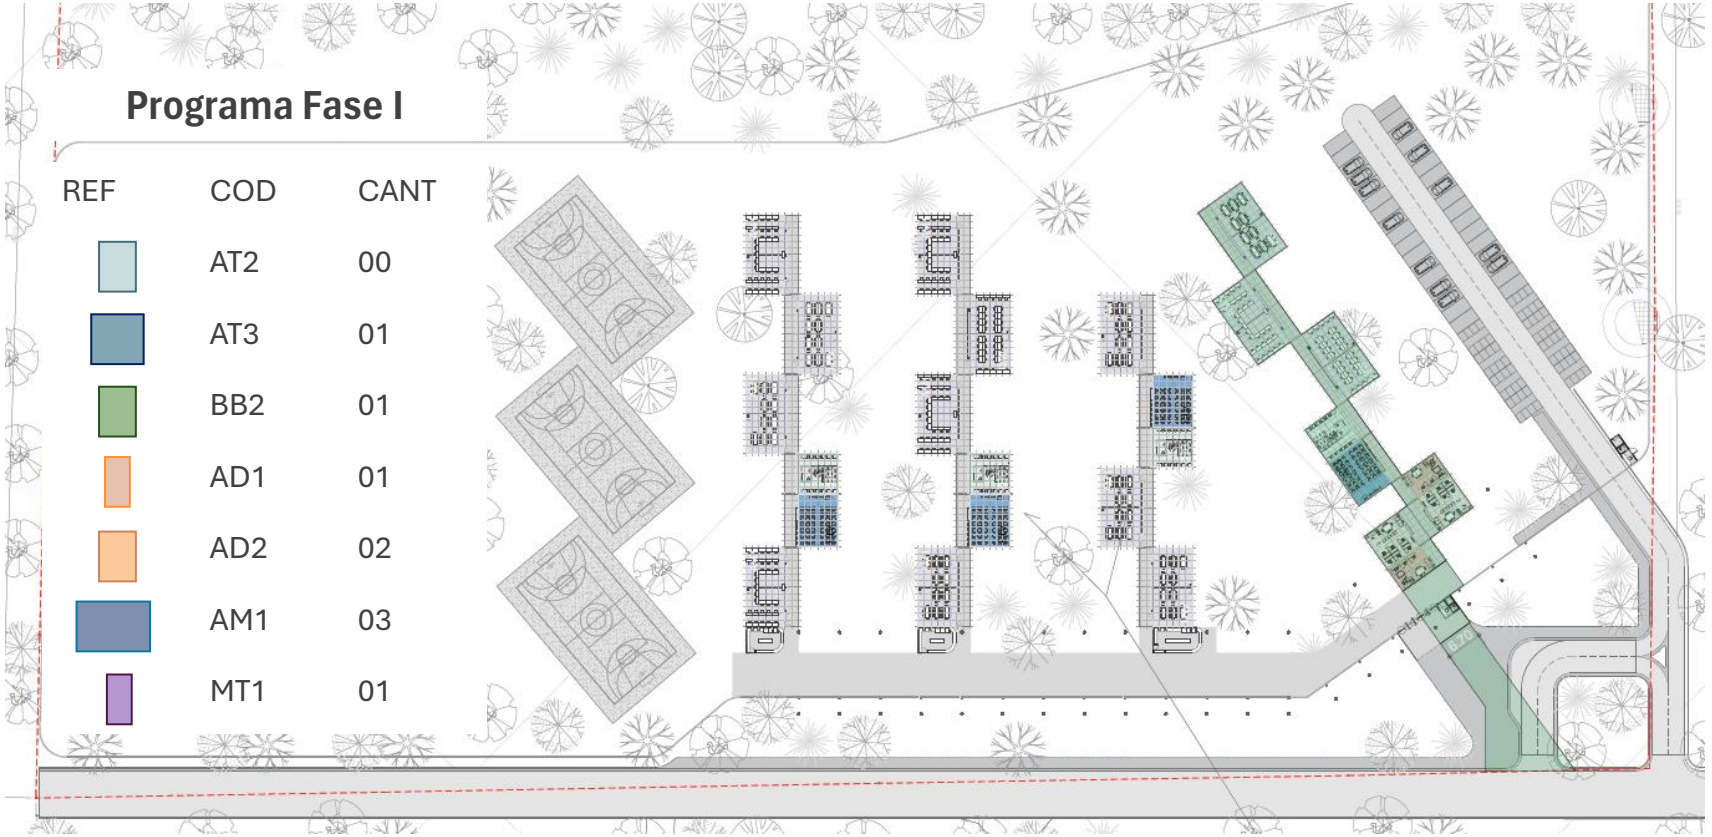

Plano de referencia implantación propuesta por ETITC, sigue en revisión.

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

5. Avance de proyectos – Sede Nueva.

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

Ficha




TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	1080 estudiantes (en revisión)
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo semana del 21 – 25 de julio o próxima.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	

6. Avance del proyecto.

Ejemplos de implantaciones.
ID_215 San Jose del Guaviare

UNIVERSIDAD:
Multi Campus (están en negociación con diferentes universidades)
ÁREA LOTE:
17.334 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular y convencional.



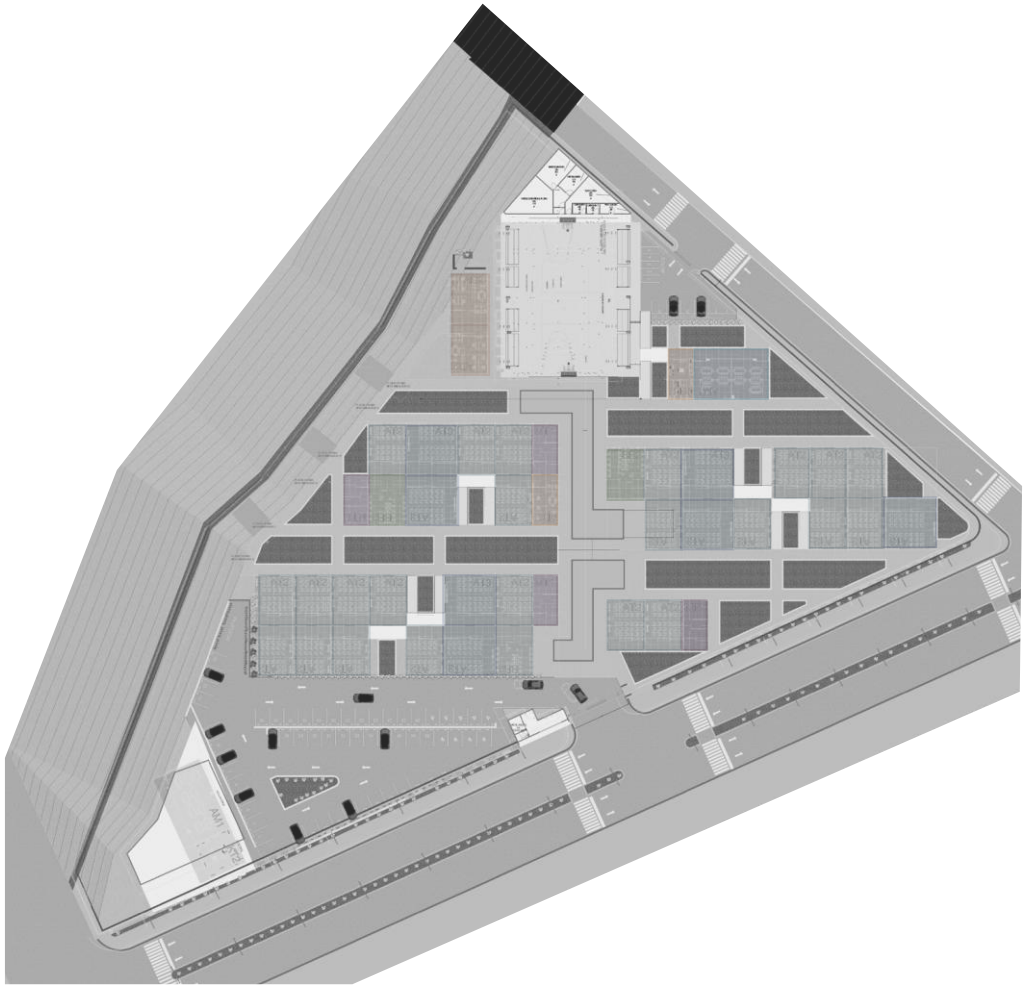

REF	COD	CANT
	AT2	24
	AT3	07
	BB2	02
	AD1	02
	AD2	01
	AM1	01
	MT1	04

Plano de referencia implantación propuesta por Municipio.

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

5. Avance de proyectos – Sede Nueva.

ID_128 Multicampus - Villeta

Ficha




TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	(en revisión)
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Coordinar mesa de trabajo con las IES para aterrizar la necesidad.
ALERTAS	Coordinación entre las IES.

5. Fichas de proyectos – Ampliación.

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

7. Programa - Ampliación.

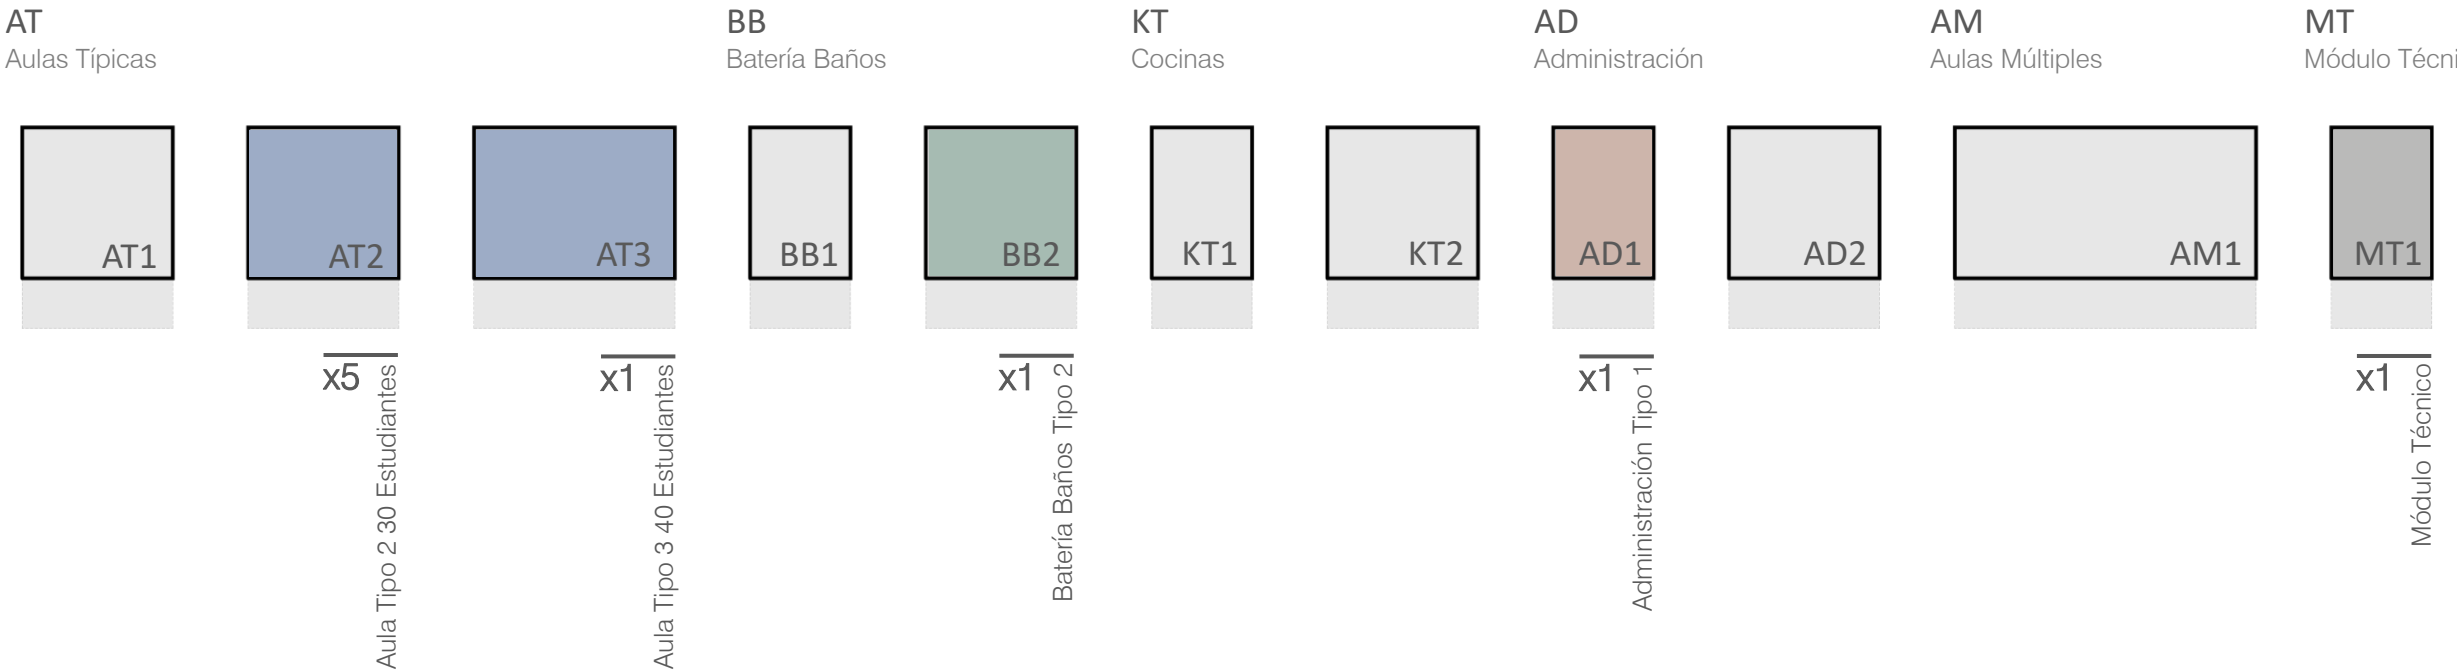

Programa Propuesta

Colegio 160 alumnos

- 1 Aula Tipo 3 40 Estudiantes
- 5 Aulas Tipo 2 30 Estudiantes


TOTAL ÁREA PROGRAMA	612,15 m²	
TOTAL ÁREA CIRCULACIONES	207,6 m²	
GRAN TOTAL ÁREA		819,75 m²
ÁREA POR ESTUDIANTE	5,12 m²	

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

8. Opciones implantación - Ampliación.


Posibles escenarios 600m2 - 5mil millones

1.Composición distribuida

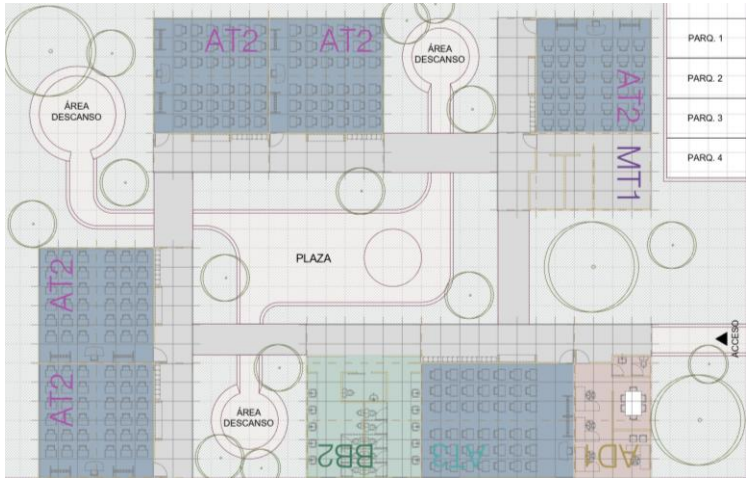


Composición Distribuida						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			26,25 ml		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	189.29		
	Zona Blanda	425.19	1	501.63		
	Total			**690.92**		
	Lineal Bordillo			141,11 ml		

2.Composición lineal

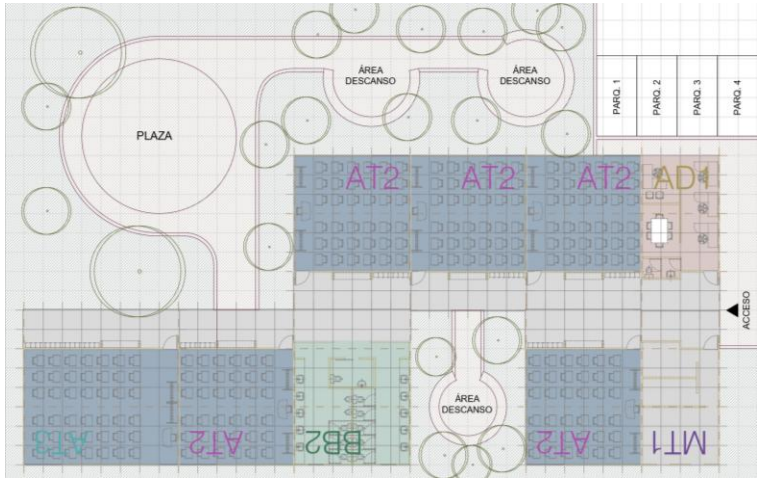

Composición Lineal						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			-		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	295.77		
	Zona Blanda	425.19	1	425.19		
	Total			**720.96**		
	Lineal Bordillo			138,40 ml		

3.Composición ramificada

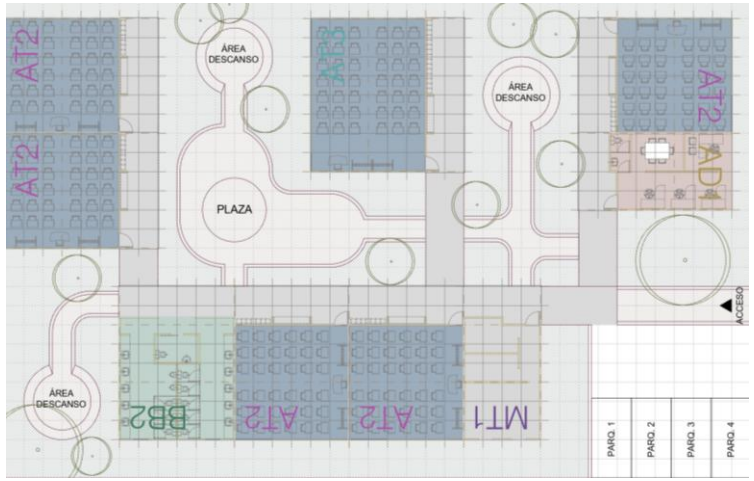

Composición Ramificada						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			19,2 ml		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	192.92		
	Zona Blanda	425.19	1	465.38		
	Total			**658.3**		
	Lineal Bordillo			141,38 ml		

5. Avance de proyectos – Ampliación.

ID_208 UPN - Valmaria

Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Diseño de implantación.
ALERTAS	Se debe realizar estudio de capacidad del transformador.

9. Avance de proyectos – Ampliación.

ID_208_Valmaria

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
Por confirmar
NECESIDAD:
Modular.










1. Aulas existentes.
2. Modulares existentes.
3. Carpa de uso como auditorio.
4. Cancha existente.
5. Huerta existente.
6. Lago existente.
7. Cancha y pista de atletismo.
8. Placa multi propósito.
9. Canchas de tenis.

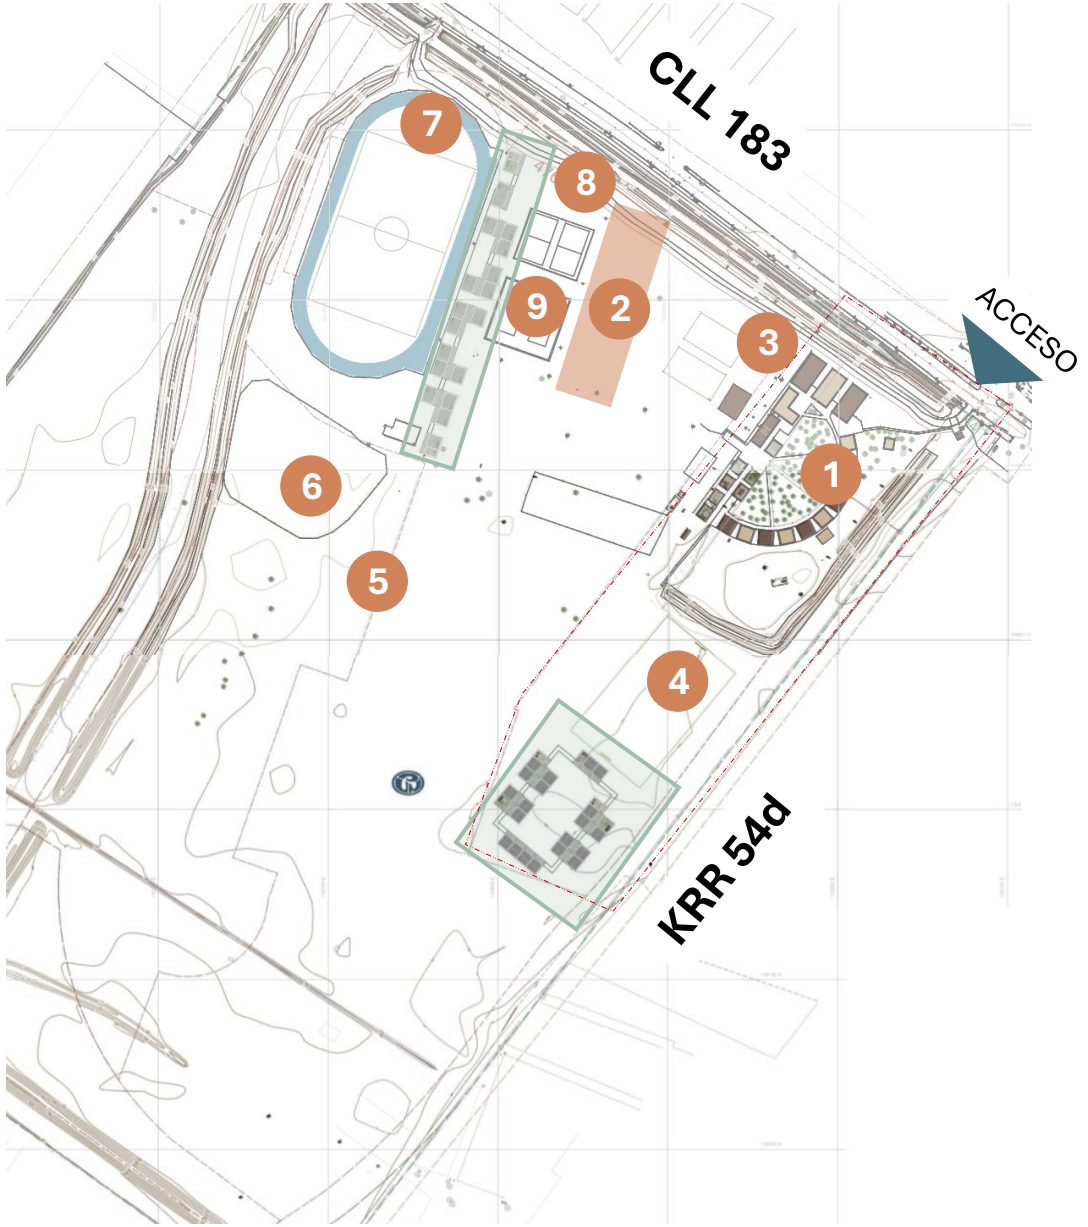


Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

10. Avance de proyectos – Ampliación.

ID_208_Valmaria

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
41.690 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular.



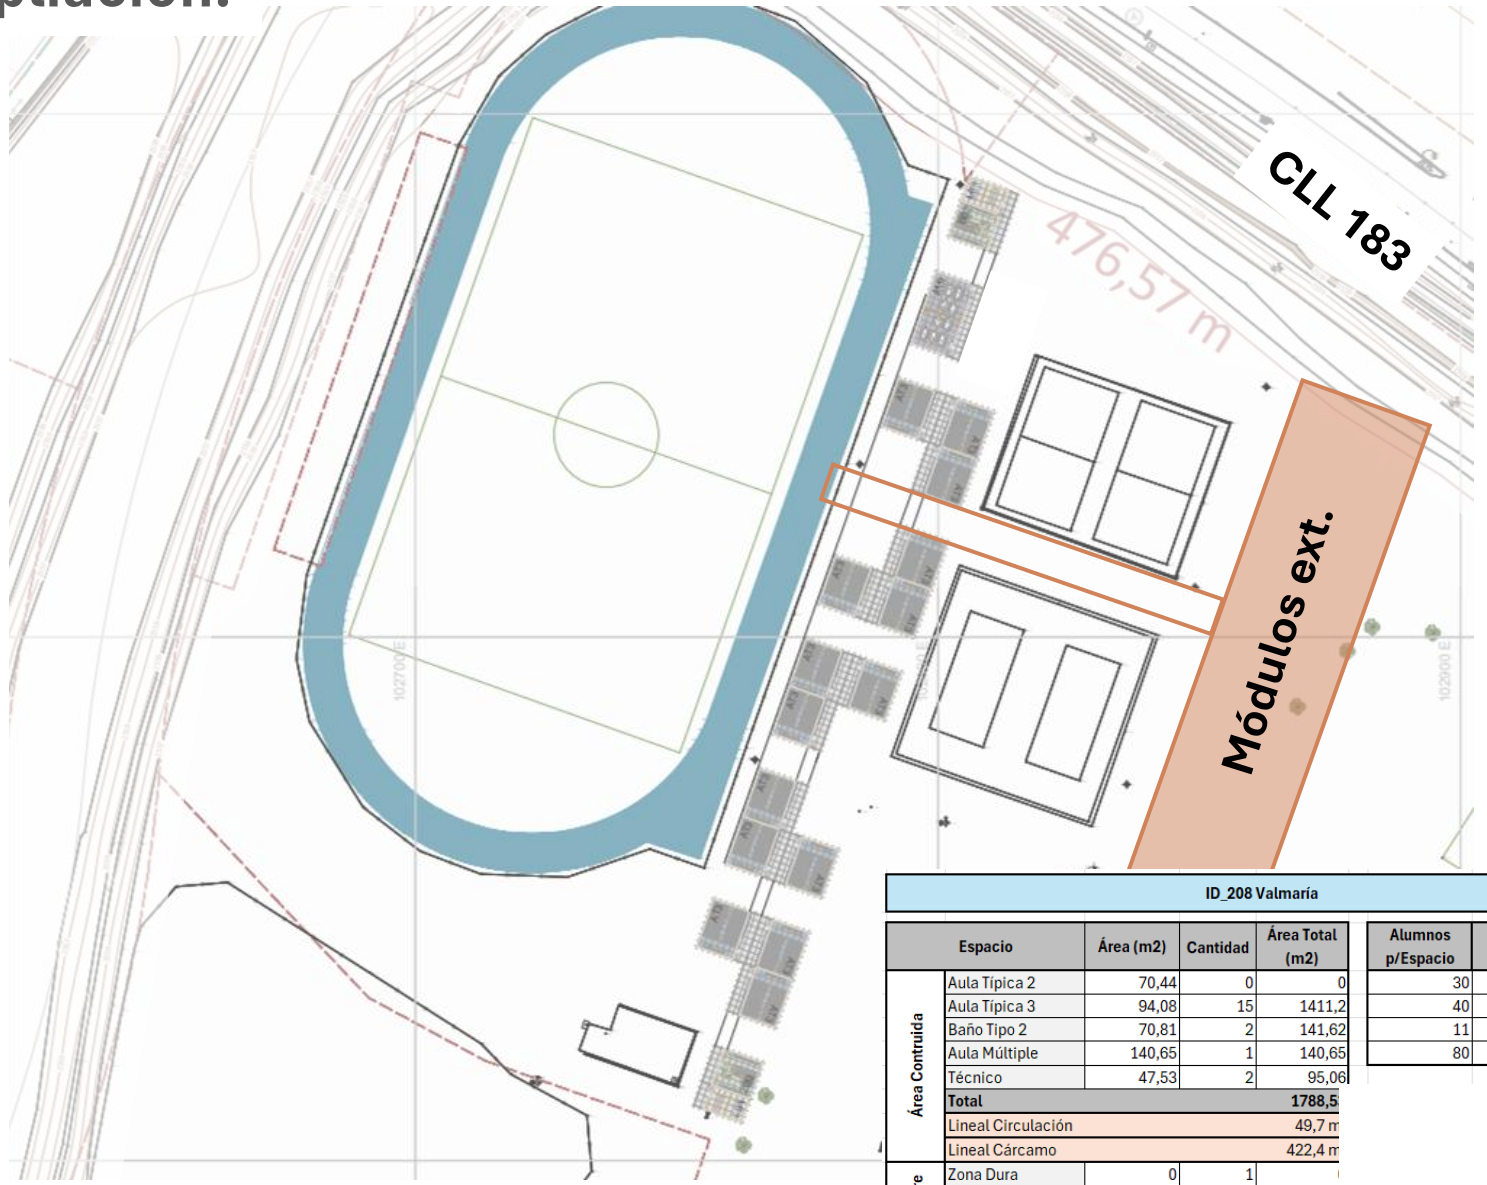

Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

ID_208 Valmaría							
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Alumnos p/Espacio	Docentes p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	0	0	30	1	0
	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2	40	1	600
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62	11		22
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	80		80
	Técnico	47,53	2	95,06			
	Total			**1788,5**			
	Lineal Circulación			49,7 m			
	Lineal Cárcamo			422,4 m			
Área Libre	Zona Dura	0	1				
	Zona Blanda	1070,82	1	1070,8			
	Total			**1070,8**			
	Lineal Bordillo			141,38 m			

3. Avance de proyectos - Ampliación.

ID_210_Fusagasuga

Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Fusagasugá, Cundinamarca
IES	Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE	22.570 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	7 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	200 estudiantes
ESTADO	Plan Piloto
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Se realizó visita de campo.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Predio afectado por falla geológica.

Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

3. Avance de proyectos - Ampliación.

ID_210_Fusagasuga

Visita de Campo













Educación

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

3. Avance de proyectos - Ampliación.

ID_210_Fusagasuga

Implantación



ID_210 Fusagasugá				
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	5	470,4
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65
	Técnico	47,53	0	0
	Zona Admin.	81,14	1	81,14
	Total			**763**
Área Libre	Zona Dura	420	1	192,92
	Lineal Bordillo			344 ml

1. Posible Sala de Profesores y Zona Administrativa


- Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.
- Curvas de elevación tomadas de Cadmapper.

Educación

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

6. **Posibles proyectos con energías renovables** (paneles solares).

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

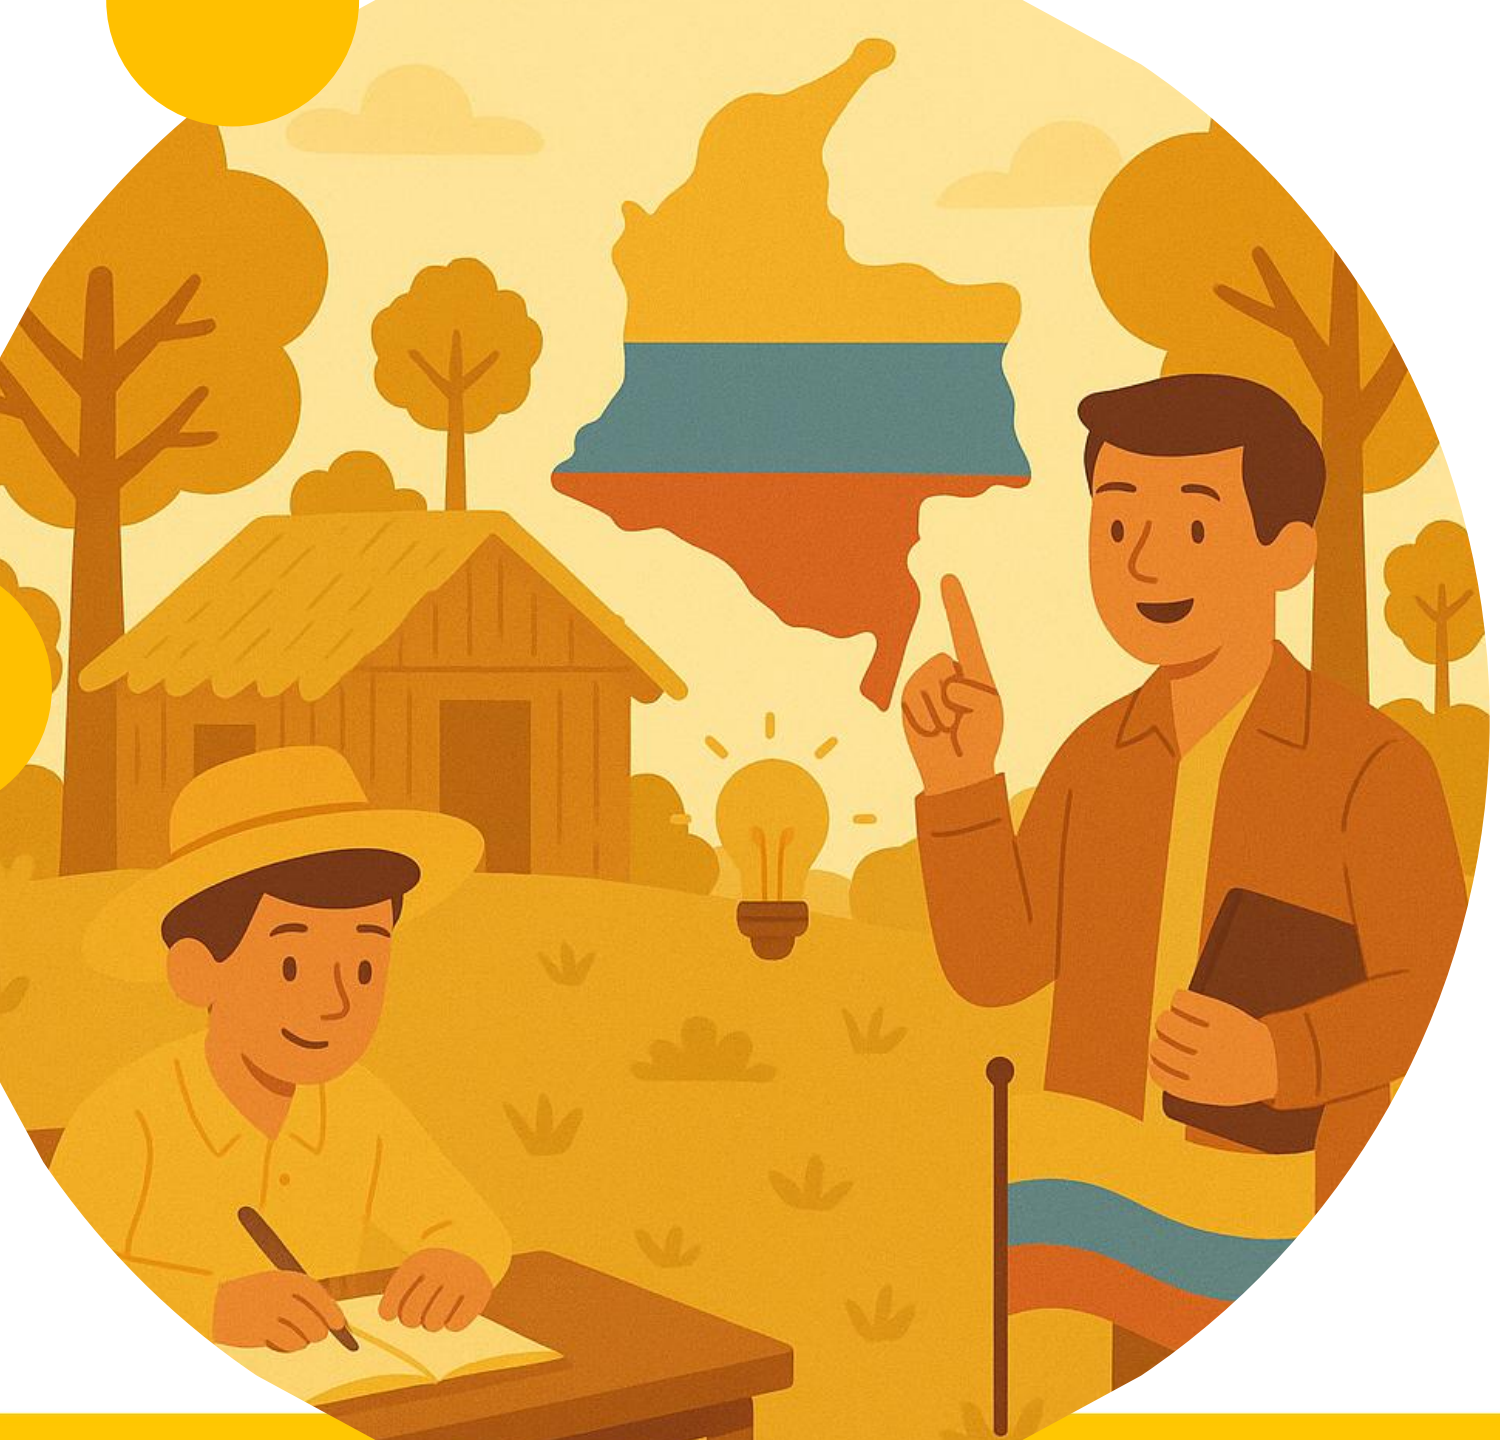

GRACIAS

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

Fecha:	07	17	2025	**Hora Inicio:**	8:00am	**Hora Fin:**	10:40m	**Lugar:**	MEN
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN								
Asistentes:	MEN: Carolina Sánchez, Carlos Amaya, Maurizio Toscano, Johnson Cansario. ANIM: Juan Camilo Ramírez, Johana Vega, Camilo Calderón, Pilar Quiroga.								
Agenda	1.Estado de los proyectos.								
	2. Fichas de los proyectos – Sede Nueva.								
	3. Fichas de los proyectos – Ampliación.								
	4. Temas administrativos: Manual Operativo, PAD, Contrato, Flujo de pago.								
	5. Compromisos								

- **Reuniones por coordinar:** Se identifican las siguientes reuniones pendientes por coordinar, necesarias para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto:
  - Transferencia de conocimiento.
  - Mesa de empalme de información del predio Soacha con Findeter.
  - Mesas de trabajo con los arquitectos del MEN, tema cartilla.
  - Reunión sobre Comunidades Energéticas Educativas: consultar posibilidad de financiación de proyectos. Debe participar el técnico eléctrico de ANIM.
  - Primer Comité Fiduciario: donde se aprobará el Manual Operativo.
  - Primer Comité Interadministrativo.
  - Reunión jurídica: orientada a resolver asuntos contractuales pendientes.
- **Cartillas – Estado actual y alertas**
  - Camilo Ramírez informa que las cartillas se encuentran en **ruta crítica** del proyecto debido a los retrasos significativos en las entregas. A la fecha, el estado es el siguiente:
  - No se ha recibido el entregable **MT1 (Módulos Técnicos).**
  - No se ha entregado el módulo **Aula Múltiple AM1.**
  - Se entregó un borrador **incompleto en Revit** correspondiente a aulas, baños y módulos administrativos, con múltiples errores.
  - Las memorias técnicas (hidrosanitarias, eléctricas y estructurales) solo se han recibido para aulas.
  - El avance del proyecto depende de estas entregas, y **no se están cumpliendo los tiempos acordados.**
  - **Carolina Sánchez** informa que los contratos de los seis arquitectos encargados de las cartillas ya finalizaron, lo que podría agravar aún más los retrasos.
- Avance en gestión de predios
  - **Fusagasugá:** Sale del listado por falla geológica. ANIM debe remitir documento de No Viabilidad.
  - **Funza:** MEN solicita incluir dos de las ramas de la implantación fase propuesta por la IES, ya que el programa arquitectónico actual resulta insuficiente. Se deberá ampliar el espacio público hasta las canchas. Carlos indica que la construcción del cerramiento está siendo solicitado a la IES.
  - **San José del Guaviare:** Se deberá coordinar mesa de trabajo con ART. Se solicita que para septiembre se haya realizado la demolición de las edificaciones existentes y que ART asuma el cerramiento. Fomento deberá aprobar la necesidad propuesta por esta IES, y de ser así, se deberá socializar con el ministro la posibilidad de construir el proyecto completo.
  - **Soacha:** Se incorpora oficialmente al listado del Anexo 1 de ANIM. Se debe realizar empalme de información con Findeter.
  - **IPN:** Pendiente de aprobación por parte del ministro para iniciar mesas de trabajo con la IES.

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

- **Villeta:** Se adelantarán mesas de trabajo para definir la necesidad de la IES, considerando el núcleo básico para sedes nuevas.
- **Valmaria:** Se requiere realizar estudio de calidad de energía para determinar si la capacidad del transformador es suficiente para la ampliación propuesta. El viernes 18 de julio se llevará a cabo mesa de trabajo con la IES para aprobación de la implantación.
- **Palacio de San Francisco:** Se recibió el certificado de Uso del Suelo que permite uso dotacional. Se deben continuar las mesas de trabajo con los entes involucrados.
- **Multicampus Suba:** Se debe avanzar en el análisis normativo del proyecto. Carolina solicita que este análisis sea presentado al ministro.

- Solicitudes y compromisos:
  - Las fichas técnicas de los proyectos deben indicar un plazo de ejecución del proyecto
  - MEN enviará en la próxima semana el listado de proyectos de IES en tu Colegio (entre 10 y 30 proyectos).
  - Natalia sugiere incluir algunos proyectos modulares dentro de este listado para lograr avances significativos.
  - Los proyectos incluidos en dicho listado deberán estar en la presentación al ministro.
  - MEN confirma que la próxima semana se realizará el pago de la primera cuenta de cobro.
  - Carolina solicita un cronograma de cómo se abordará el proyecto de IES en tu Colegio, el cual deberá presentarse en la mesa del 24 de julio. Se solicita incluir una diapositiva con un análisis cualitativo de los proyectos.
  - ANIM debe enviar las presentaciones proyectadas para las mesas de trabajo los miércoles antes del mediodía, con el fin de que MEN pueda revisarlas y realizar observaciones.

5. Compromisos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PLAZO
Definir reunión Transferencia del conocimiento	**ANIM - MEN**	**23/07/2025**
Mesa de empalme de información del predio Soacha con Findeter	**ANIM - MEN**	**23/07/2025**
Mesas de trabajo con los arquitectos del MEN, tema cartilla	**ANIM - MEN**	**18/07/2025**
Reunión sobre Comunidades Energéticas Educativas: consultar posibilidad de financiación de proyectos. Debe participar el técnico eléctrico de ANIM.	**ANIM - MEN**	**21/07/2025**
Agendar primer comité técnico de seguimiento interinstitucional.	**ANIM - MEN**	**julio/2025**
Primer Comité Fiduciario: donde se aprobará el Manual Operativo	**ANIM - MEN**	**julio/2025**
Reunión jurídica: orientada a resolver asuntos contractuales pendientes.	**ANIM - MEN**	**22/07/2025**

Firmas Participantes:

Se anexa Lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia OIE - MEN

Nombre del líder de la actividad Carlos Alino Amaya Naranjo

Tema Seguimiento control ANIM

Hora de inicio 8:00 am | Hora de fin

Fecha 17-07-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Nino Amaya Naranjo	OIE	13.720.203	Camayan@mineducacion.gov.co	
2	Johnson M. Cansario P.	OIE.	79.617.831	JCANSARIO@MINEDUCACION.GOV.CO	
3	Libar Quiroga Galindo	ANIM	51872 044.	lquiroga@anim.gov.co	
4	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462280	jramirez@anim.gov.co	
5	Johana Vega Cabra	ANIM	1015442756	jvega@anim.gov.co	
6	Camilo Calderón	ANIM	1019028657	Ccalderon	
7	Mauricio Toscano	V.S.	79.952.721		
8	Paulina Sanchez	Intra-MEN	52809328	Casanchezm	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

17 de julio de 2025

AGENDA

1. **Verificación de quorum.**
2. **Antecedentes.**
3. **Estado de proyectos.**
   (Cartilla, definir proyectos metálicos Grupo 1)
4. **Fichas de proyectos – Sede Nueva.**
5. **Fichas de proyectos – Ampliación.**
6. **Posibles proyectos con energías renovables**
   (paneles solares).
7. **Proposiciones y varios.**
   (conformar comités y fechas, temas CAF)
8. **Compromisos.**

1

Verificación de quorum

2

Antecedentes

2.Antecedentes del contrato

CONTRATO NÚMERO **CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025** SUSCRITO ENTRE EL **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** Y LA **AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.**

Firmado el 7 de junio del 2025
Pólizas 17 de junio del 2025

CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA.”.

POR UN VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO. **$271.315.944.244**


Estado de proyectos

Estado de proyectos

Ambientes Modulares

GRUPO 1

Proyectos	Preinversión	Estructuración del proceso	Inversión	Liquidación
6	20%	15%	40%	5%

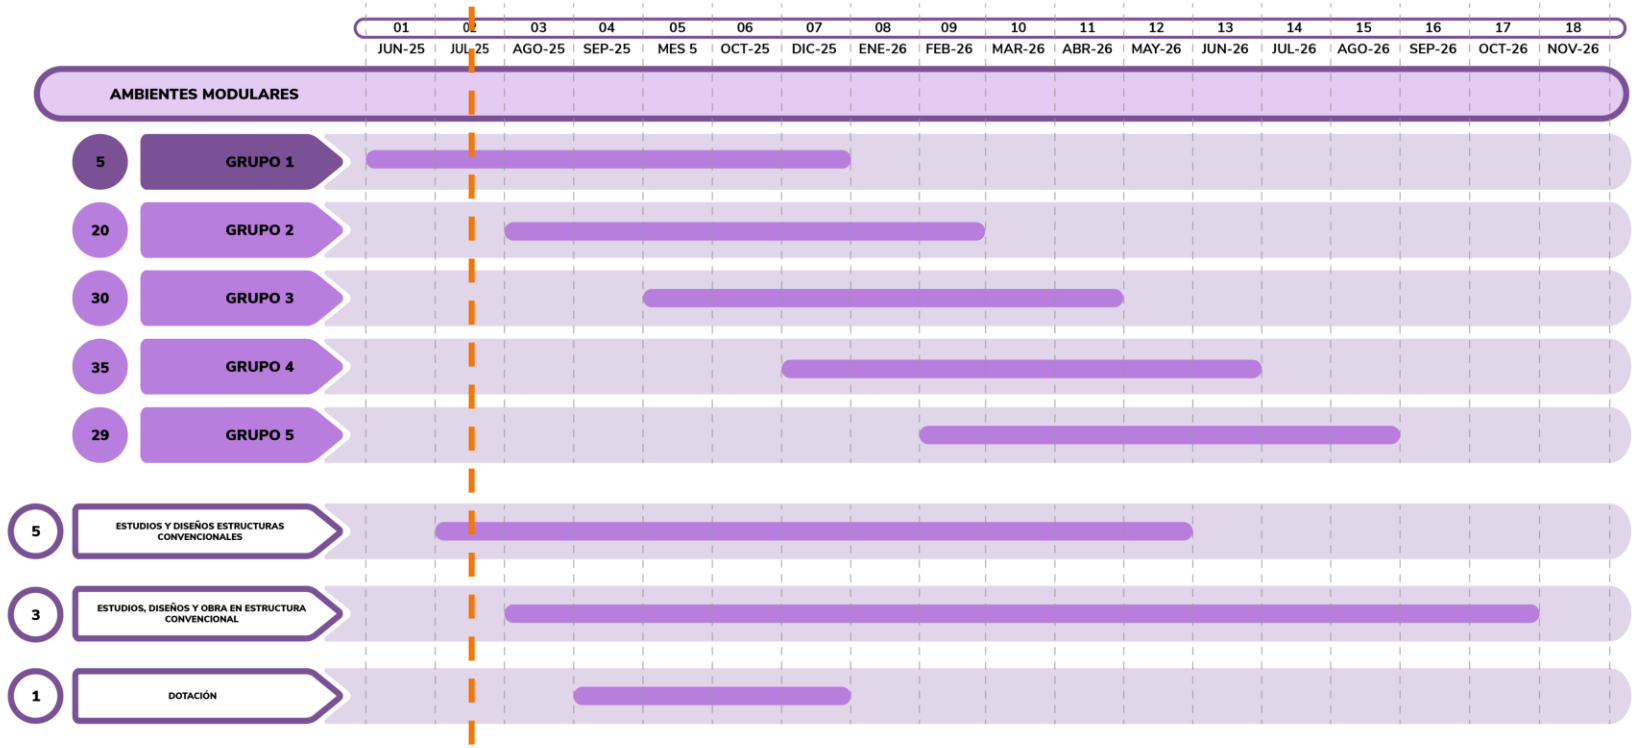

1.Estrategias de trabajo

VALOR DEL PROYECTO
$271.315.944.244

TIEMPO DE EJECUCIÓN
18 meses

Estrategias de intervención (Tipo de proyecto)

1. **Implementación de 119 Ambientes Modulares**

   Entre 23-30 hasta 700m2 c/u
   70-89 hasta 200m2 modulares o adecuación
   $ 239.161.800.340

2. **Estudios y diseños en estructuras convencionales**


   5 proyectos
   $17.904.143.904

3. **Estudios, diseños y obra o adecuación en estructura convencionales**

   1-3 proyectos entre 200m2-1.000m2 c/u
   $14.000.000.000

4. **Dotación**

   1 proyecto
   $250.000.000

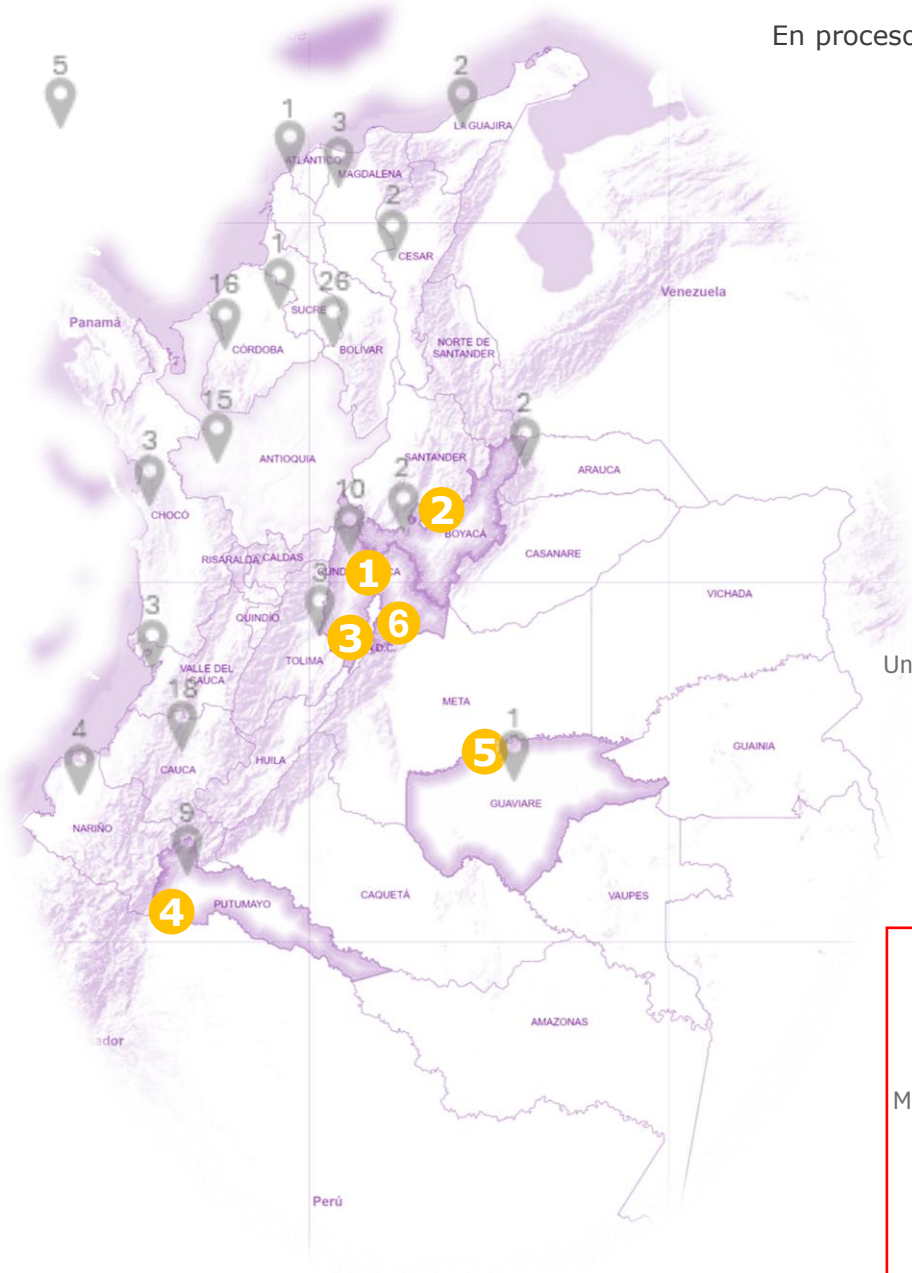

2.Proyectos piloto ambientes modulares

En proceso de validación con ME y Universidad de los proyectos piloto.

1 Funza
Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Miércoles,16 de junio

2 Villeta
Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Multi Campus
ÁREA LOTE:
65.866m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

3 Por definir
Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
22.571 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular

4 Valle del Guamuez - Hormiga
Putumayo

UNIVERSIDAD:
Instituto Tecnológica de Putumayo - Gobernación del Putumayo
ÁREA LOTE:
41.690 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

5 San José del Guaviare

UNIVERSIDAD:
Multi Campus (están en negociación con diferentes universidades)
ÁREA LOTE:
17.334 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular y convencional.
VISITA:
Por definir fecha

6 Bogotá (Valmaría)

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular y convencional.

Fichas de proyectos – Sede Nueva

4. Programa Núcleo Básico - Sede nueva

Institución nueva 300 alumnos

21 módulos
1 placa polideportiva



		ÁREA APROX.
TOTAL ÁREA PROGRAMA		1.540 m²
ÁREA CIRCULACIONES INTERNAS		230 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA		**1.770 m²**
ÁREA URBANISMO		550 m²
ÁREA PLACA POLIDEPORTIVA		660 m²
GRAN TOTAL ÁREA		**2..980 m²**
ÁREA POR ESTUDIANTE (Área Const.)	5,9 m²	
LINEAL CERRAMIENTO	250 ml	
PARQUEADEROS	10 unidades	
COSTO TOTAL		

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

Ficha




TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $8.664.423.576,19** Obra: $7.600.371.558,06 Interventoría: $608.029.724,64 GAT: $456.002.293,48
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	300 estudiantes
ESTADO	Grupo 1
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Se está coordinando visita de campo.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Se está a la espera de las cartillas para módulos en madera.

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

Implantación

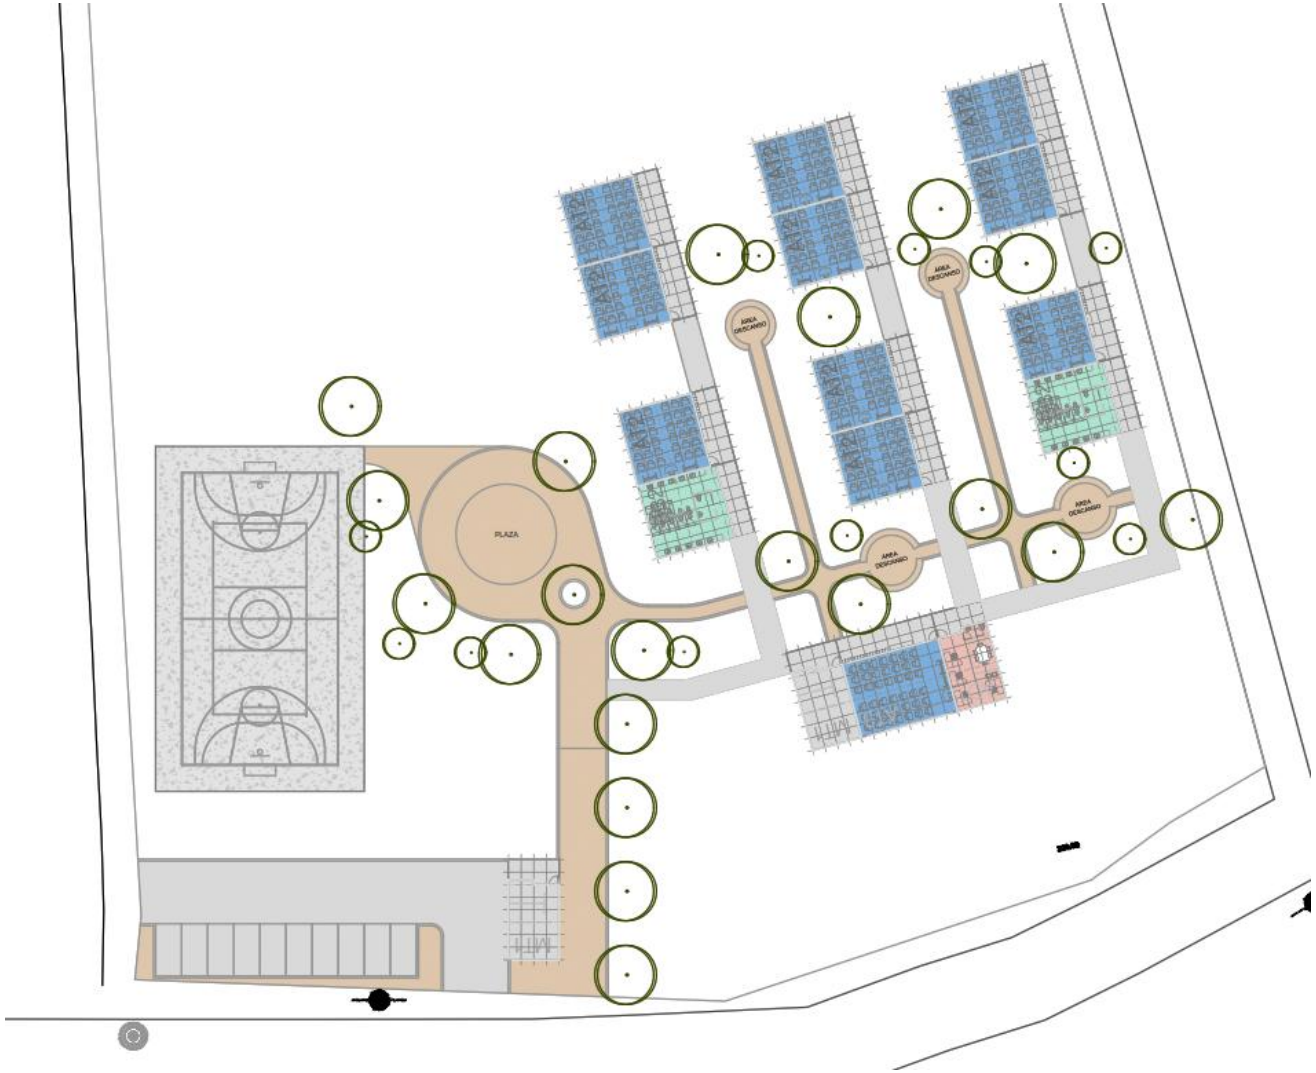

- Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

ID_165 Valle del Guamuez				
	Espacio	**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	10	704,4
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Tienda de Alimento	47,53	1	47,53
	Zona Admin.	81,14	1	81,14
	Portería	47,53	1	47,53
	Total			**1116,3**
	Lineal Circulación			19,2 ml
Área Libre	Zona Dura	694	1	694
	Zona Blanda	2732	1	2732
	Placa Polideport.	660	1	660
	Parqueaderos	12,5	10	125
	Total			**4211**
	Lineal Bordillo			489,06 ml

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza


Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $6.193.517.684,13** Obra: $5.432.910.249,24 Interventoría: $434.632.819,94 GAT: $325.974.614,95
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	160 estudiantes
ESTADO	Grupo 1
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo 16 de julio.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Predio por Declaratoria de utilidad pública para la expropiación temprana.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

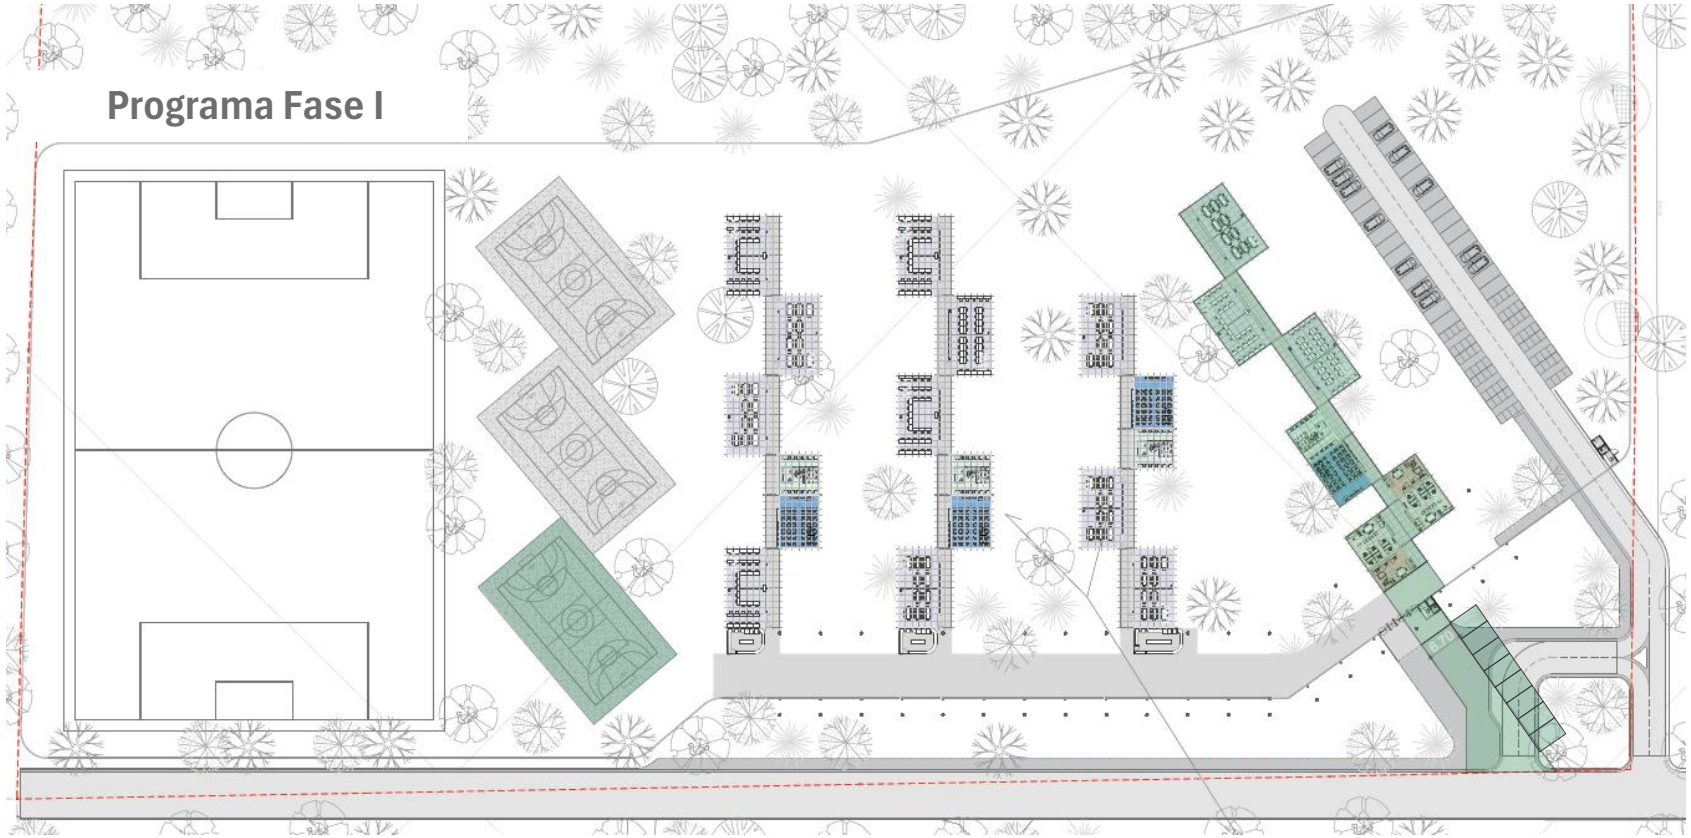

ID_147 Funza				
	Espacio	**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Aula Múltiple	140,65	3	421,95
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Zona Admin 1	47,53	1	47,53
	Zona Admin 2	70,81	2	141,62
	Portería	10,07	1	10,07
	Zona Técnica	47,53	1	47,53
	Total			**833,59**
Área Libre	Zona Dura	339,73	1	339,73
	Parqueaderos	12,5	10	125
	Placa Polideport.	660	1	660
	Total			**1124,73**
	Lineal Cerramiento			773 ml

Plano de referencia implantación propuesta por ETITC, sigue en revisión.

FASE 1

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare


Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $18.210.844.709,88** Obra: $15.974.425.184,11 Interventoría: $1.277.954.014,73 GAT: $958.465.511,05
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	1080 estudiantes (en revisión)
ESTADO	Grupo 1
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo semana del 21 – 25 de julio o próxima.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	ART: Demolición para septiembre, cerramiento y cubierta

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

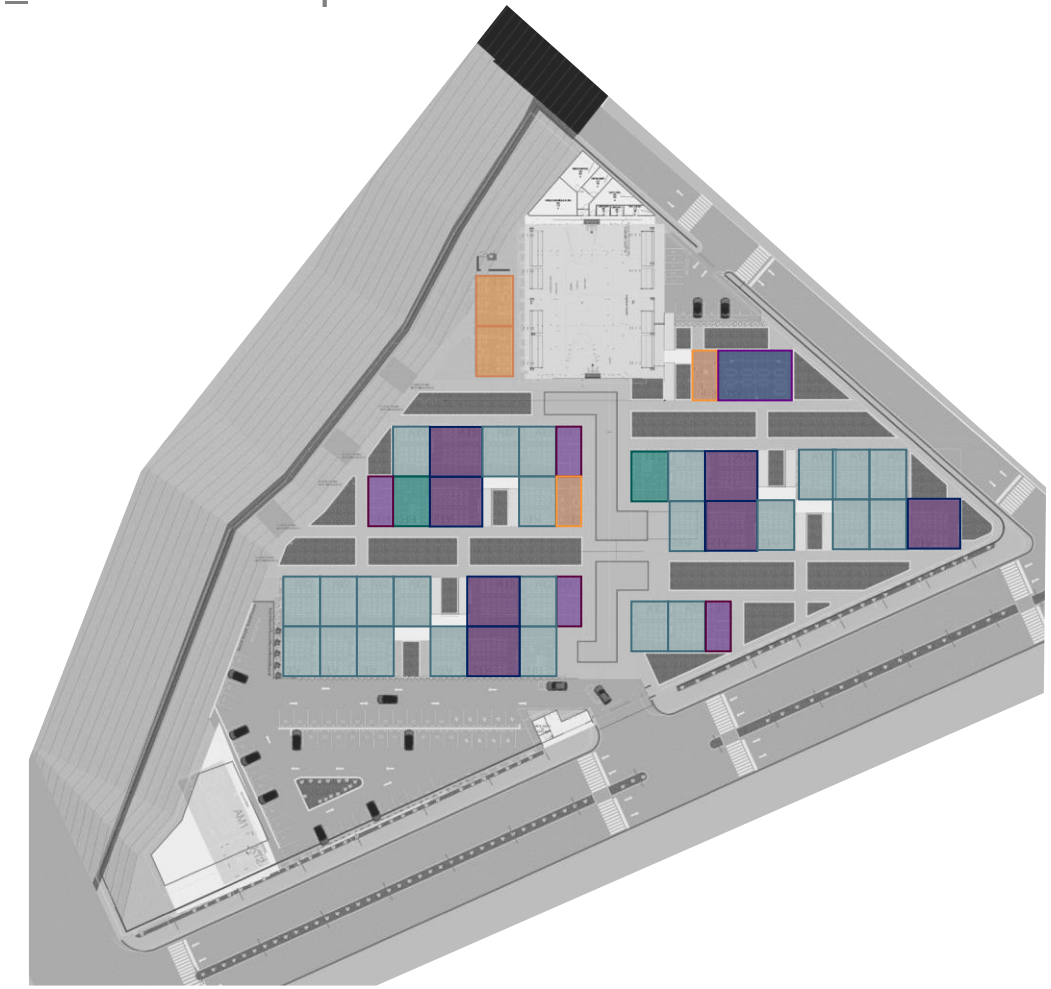

Plano de referencia implantación propuesta por Municipio.

ID_215 San Jose del Guaviare				
	Espacio	**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	24	1690,56
	Aula Típica 3	94,08	7	658,56
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Técnico	47,53	4	190,12
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53
	Zona Admin. 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65
	Total			**2917,54**

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta


Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	(en revisión)
ESTADO	Grupo 1
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Coordinar mesa de trabajo con las IES para aterrizar la necesidad.
ALERTAS	Coordinación entre las IES.

Fichas de proyectos – Ampliación

5. Programa - Ampliación

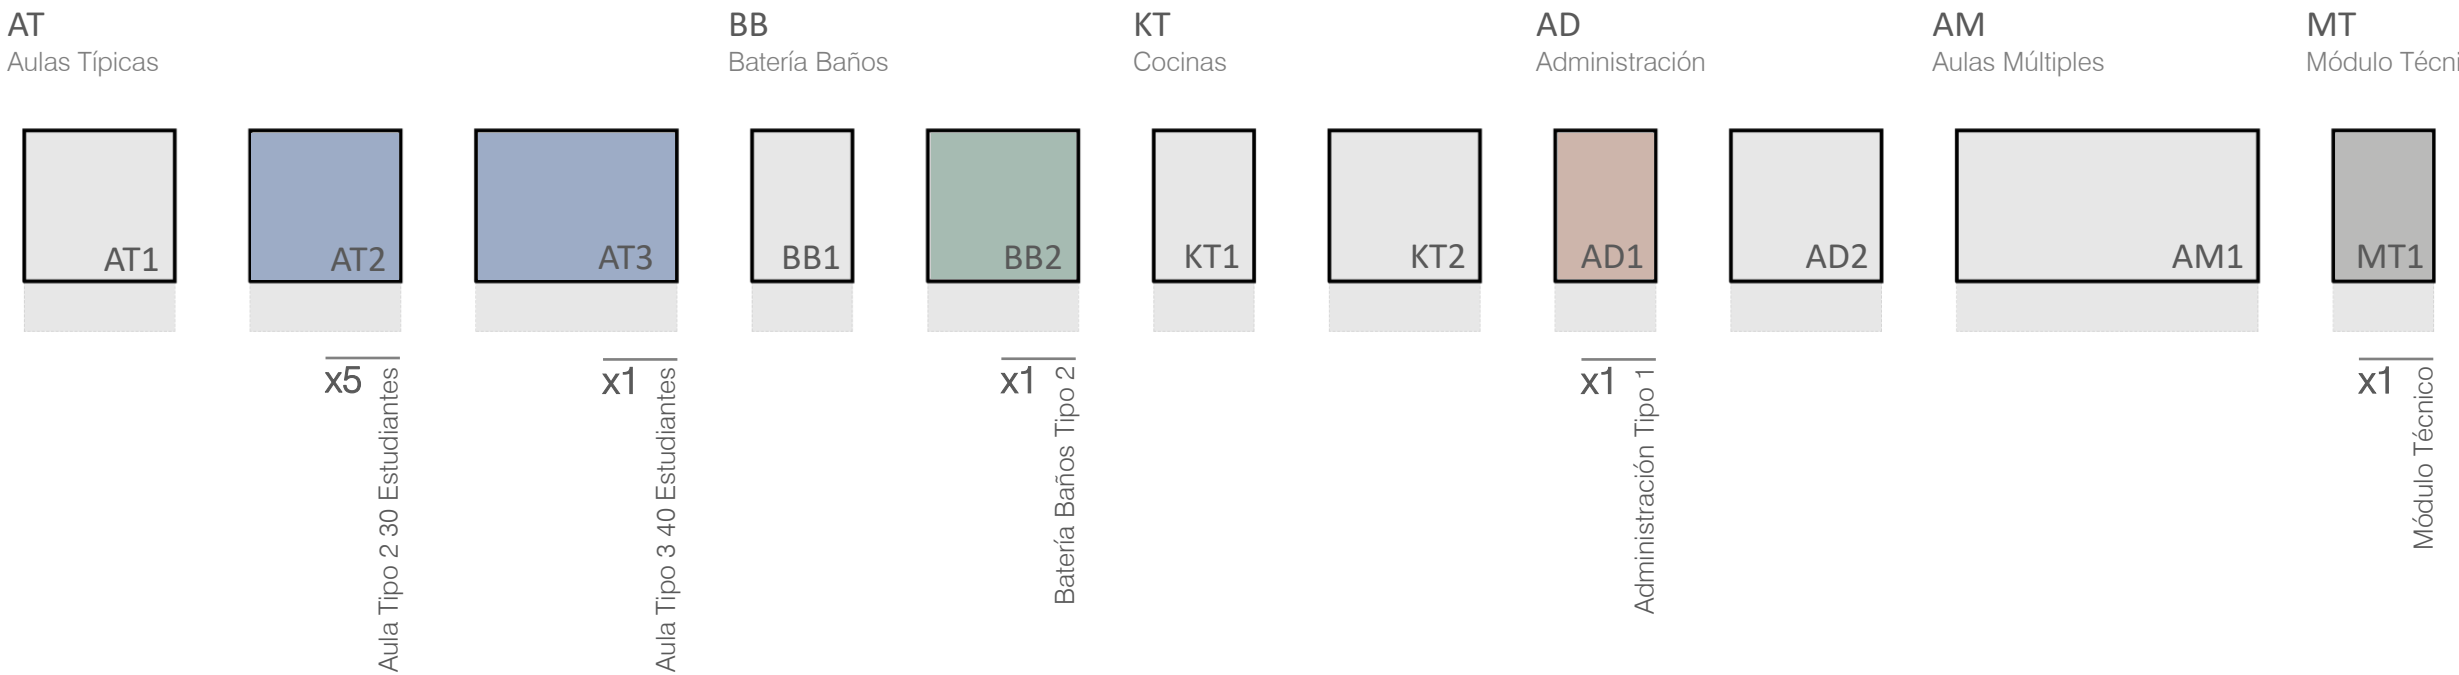

Programa Propuesta

Colegio 160 alumnos


- 1 Aula Tipo 3 40 Estudiantes
- 5 Aulas Tipo 2 30 Estudiantes

TOTAL ÁREA PROGRAMA	612,15 m²	
TOTAL ÁREA CIRCULACIONES	207,6 m²	
GRAN TOTAL ÁREA		819,75 m²
ÁREA POR ESTUDIANTE	5,12 m²	
COSTO TOTAL		

5. Opciones implantación - Ampliación


Posibles escenarios 600m2 - 5mil millones

1.Composición distribuida

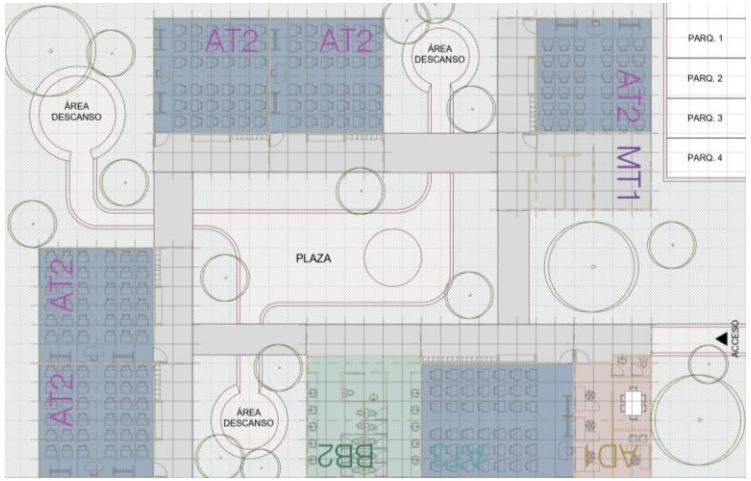


Composición Distribuida						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			26,25 ml		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	189.29		
	Zona Blanda	425.19	1	501.63		
	Total			**690.92**		
	Lineal Bordillo			141,11 ml		

2.Composición lineal

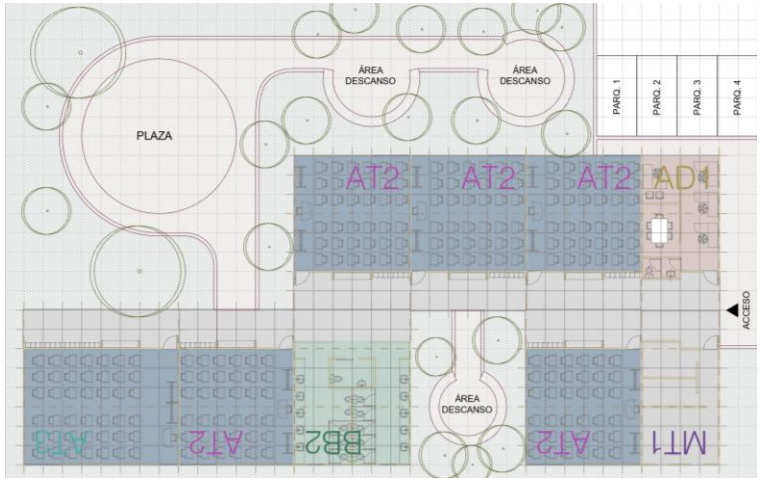

Composición Lineal						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			-		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	295.77		
	Zona Blanda	425.19	1	425.19		
	Total			**720.96**		
	Lineal Bordillo			138,40 ml		

3.Composición ramificada

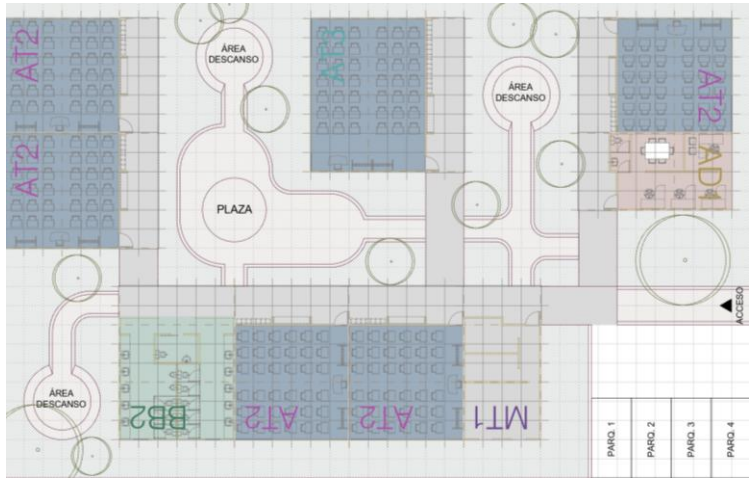

Composición Ramificada						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70.44	5	352.2	24	120
	Aula Típica 3	94.08	1	94.08	40	40
	Baño Tipo 2	70.81	1	70.81	11	11
	Admin Tipo 1	47.53	1	47.53	7	7
	Técnico	47.53	1	47.53		
	Total			**612.15**		
	Lineal Circulación			19,2 ml		
Área Libre	Zona Dura	295.77	1	192.92		
	Zona Blanda	425.19	1	465.38		
	Total			**658.3**		
	Lineal Bordillo			141,38 ml		

5. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

Ficha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $11.113.614.489,09** Obra: $9.748.784.639,55 Interventoría: $779.902.771,16 GAT: $584.927.078,37
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	Grupo 1
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Diseño de implantación.
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad de energía, dicho estudio se demora 15 días aprox., más los días necesarios para la contratación.

5. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria
Visita de Campo










1. Aulas existentes.
2. Modulares existentes.
3. Carpa de uso como auditorio.
4. Cancha existente.
5. Huerta existente.
6. Lago existente.
7. Cancha y pista de atletismo.
8. Placa multi propósito.
9. Canchas de tenis.

Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

5. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208_Valmaria

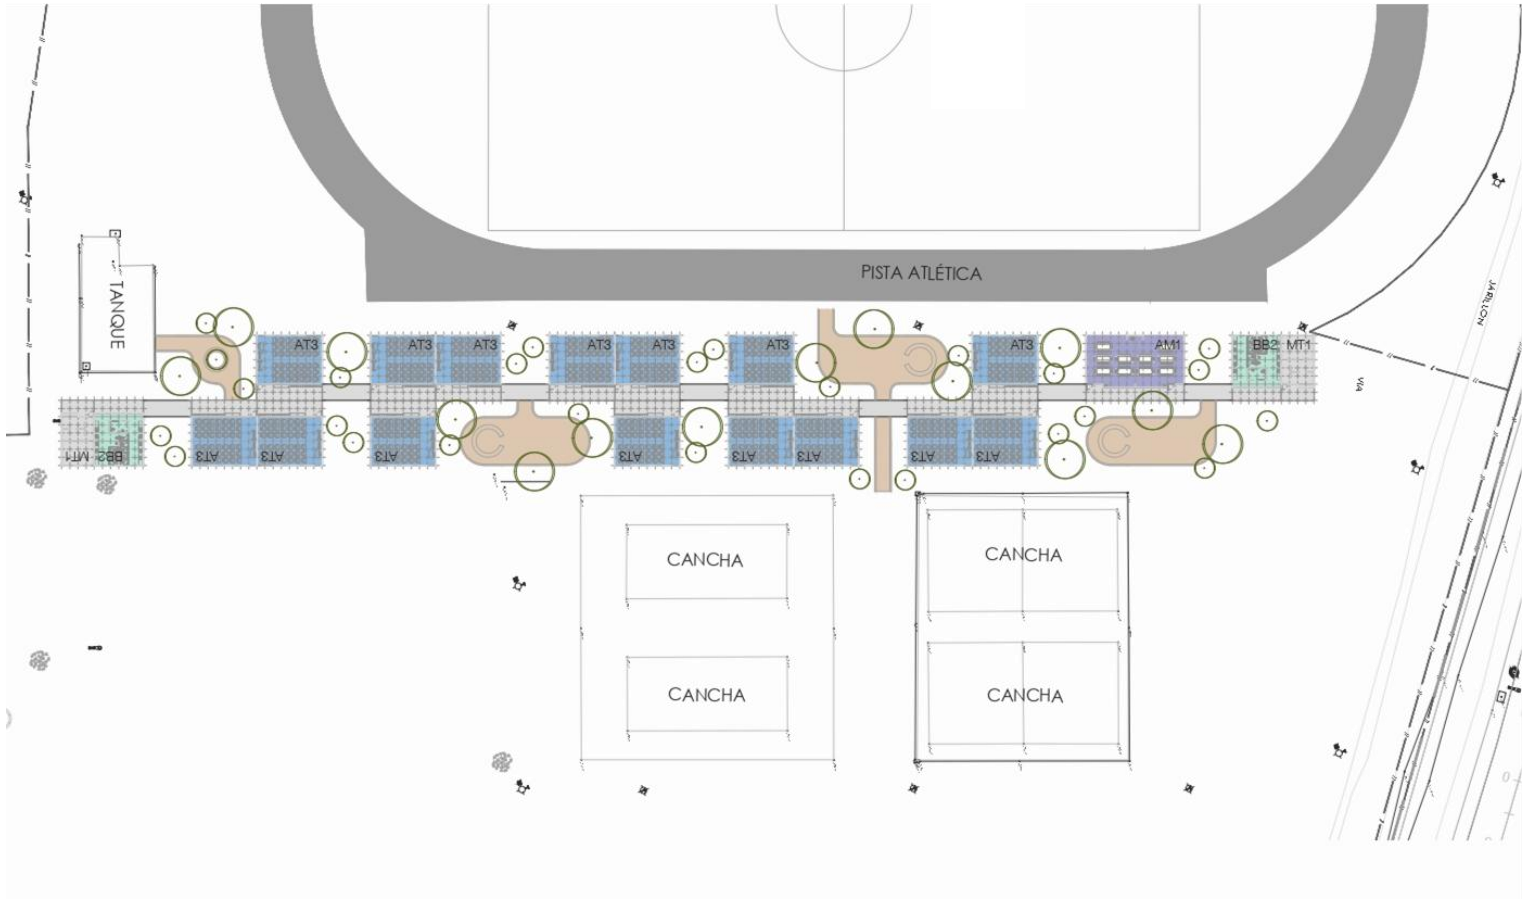

ID_208 Valmaría				
	Espacio	**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65
	Técnico	47,53	2	95,06
	Total			**1788,53**
	Lineal Cárcamo			422,4 ml
Área Libre	Zona Dura	621,68	1	621,68
	Zona Blanda	1070,82	1	1070,82
	Total			**1692,5**
	Lineal Bordillo			309 ml

Plano de referencia implantación propuesta en trabajo por la ANIM.

7

Proposiciones y varios.

(conformar comités y fechas, temas CAF)

En trabajo

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Fecha:	07	24	2025	**Hora Inicio:**	8:00am	**Hora Fin:**	11:00 am	**Lugar:**	MEN
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN								
Asistentes:	MEN: Carlos Amaya, Juan Sebastian Romero ANIM: Juan Camilo Ramírez, Natalia Valencia, Camilo Calderón.								
Agenda	Verificación de Quorum (aplica para comités)								
	Estado de los proyectos.								
	Fichas de los proyectos – Sede Nueva.								
	Fichas de los proyectos – Ampliación.								
	Temas administrativos								
	Compromisos								

- El MEN solicita que las futuras presentaciones inicien con el cronograma actualizado y el estado de avance de cada uno de los proyectos priorizados.
- Se deberá presentar una lista consolidada en la que se indique para cada proyecto la estrategia correspondiente (adecuación, construcción tradicional o modular). En el caso de estrategias modulares, se debe precisar si corresponde a una sede nueva o una ampliación.
- El MEN se encargará de coordinar una mesa de trabajo general con las instituciones educativas de bolsa. En esta reunión se deberá especificar claramente la actividad que se ejecutará en cada colegio (adecuación o instalación de módulos).
- Se solicita incluir en la presentación una diapositiva comparativa donde se muestren:
  - Los valores proyectados inicialmente de cada proyecto.
  - Los nuevos valores aproximados, resultantes del análisis presupuestal propuesto por ANIM. Se aclara que estos valores son preliminares y podrían variar, dado que aún se encuentra en curso la entrega completa de las cartillas técnicas necesarias para definir costos reales.
- Se acuerda que MEN deberá coordinar una reunión específica con José Alfredo (MEN**)** para abordar el componente de paneles solares en los proyectos.
- Se reitera que el convenio entre las IES en modalidad multicampus deberá celebrarse con la institución líder, quien será la responsable de la gestión y coordinación con las demás IES participantes.
- El MEN confirma que la IES Universidad de Cartagena será la responsable de liderar el proyecto en el municipio de Magangué.
- Cartillas: Se tiene como fecha límite el 29 de julio para la entrega completa de los módulos; sin embargo, aún faltan los correspondientes a cocinas y aulas múltiples.
  - En cuanto a los ajustes solicitados, no se han entregado los correspondientes a cuartos técnicos ni administrativos.
  - El equipo responsable de la revisión de esta información se encuentra en pausa, debido a que no han recibido nuevos insumos para continuar el trabajo.

1. Compromisos

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PLAZO
Coordinar mesa de trabajo IES estrategias Bolsa	**MEN**	30/07/2025
Realizar presentación para ministro	**ANIM**	25/07/2025
Enviar listado de ES en tu colegio (Bolsa)	**MEN**	24/07/2025

Firmas Participantes:
Se anexa Lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: OIE - MEN

Nombre del lider de la actividad: Carlos Alirio Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento contrato ANIM

Hora de inicio: 8:00 am | Hora de fin:

Fecha: 24-07-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Alirio Amaya N	OIE	13.720.203	camaya@mineducacion	
2	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462788	jramirez@anim.gov	
3	Camilo Calderon	ANIM	1019078651	ccalderon	
4	Natalia Valencia	ANIM	5284032	nvalencia@animgov.co	
5	Juan Sebastian Romero	OIE	1007635310	Jromero.p@extmin	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

24 de julio de 2025

AGENDA

1. Antecedentes.
2. Estrategias de intervención
3. Implantaciones tipo
4. Estado de los proyectos
5. Ajuste presupuestal
6. Aspectos a tener en cuenta
7. Conclusiones y recomendaciones

1

Antecedentes

2.Antecedentes del contrato

CONTRATO NÚMERO **CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025** SUSCRITO ENTRE EL **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** Y LA **AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.**

Firmado el 7 de junio del 2025
Pólizas 17 de junio del 2025


CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA.”.

POR UN VALOR DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO. **$271.315.944.244**


2

Estrategia de intervención

Ambientes Modulares priorizados

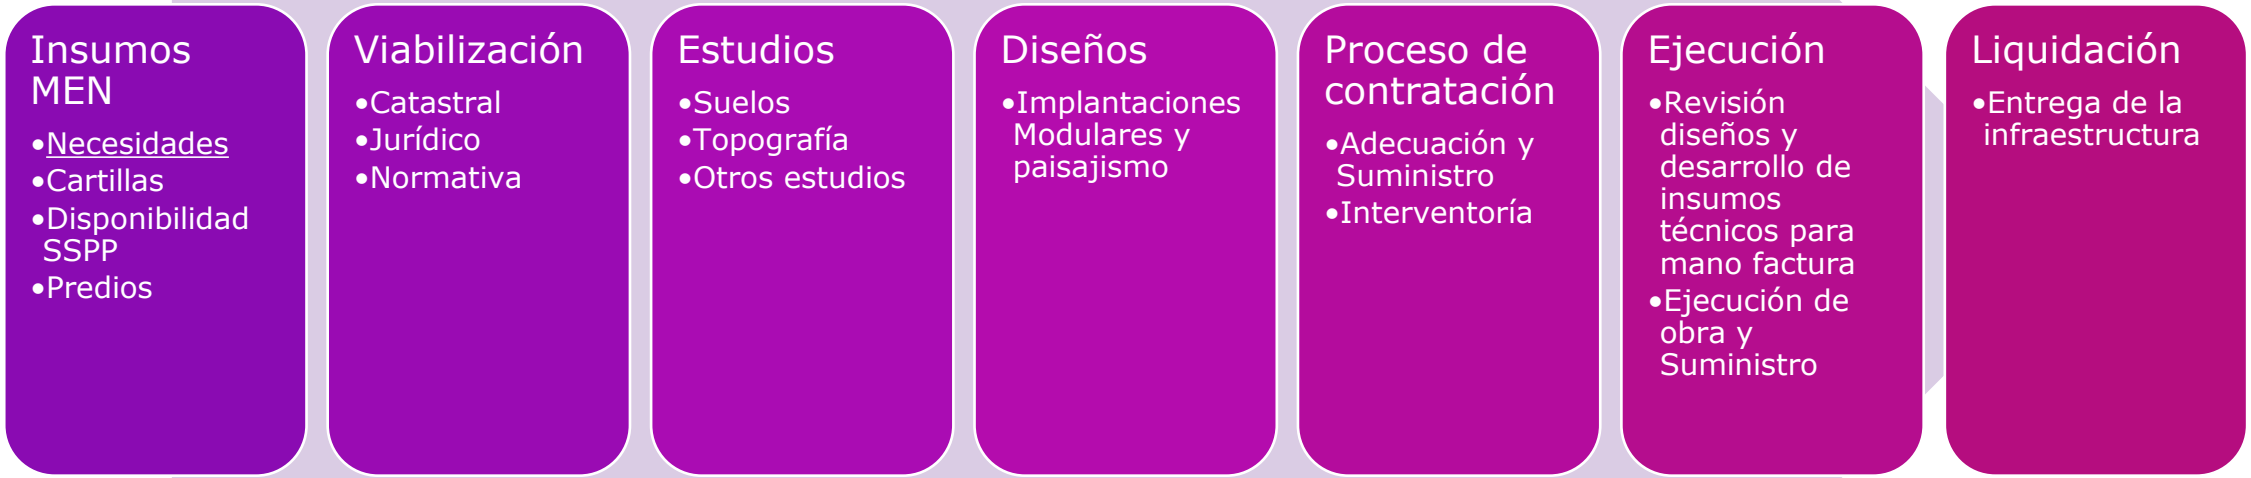

IES en tu Colegio

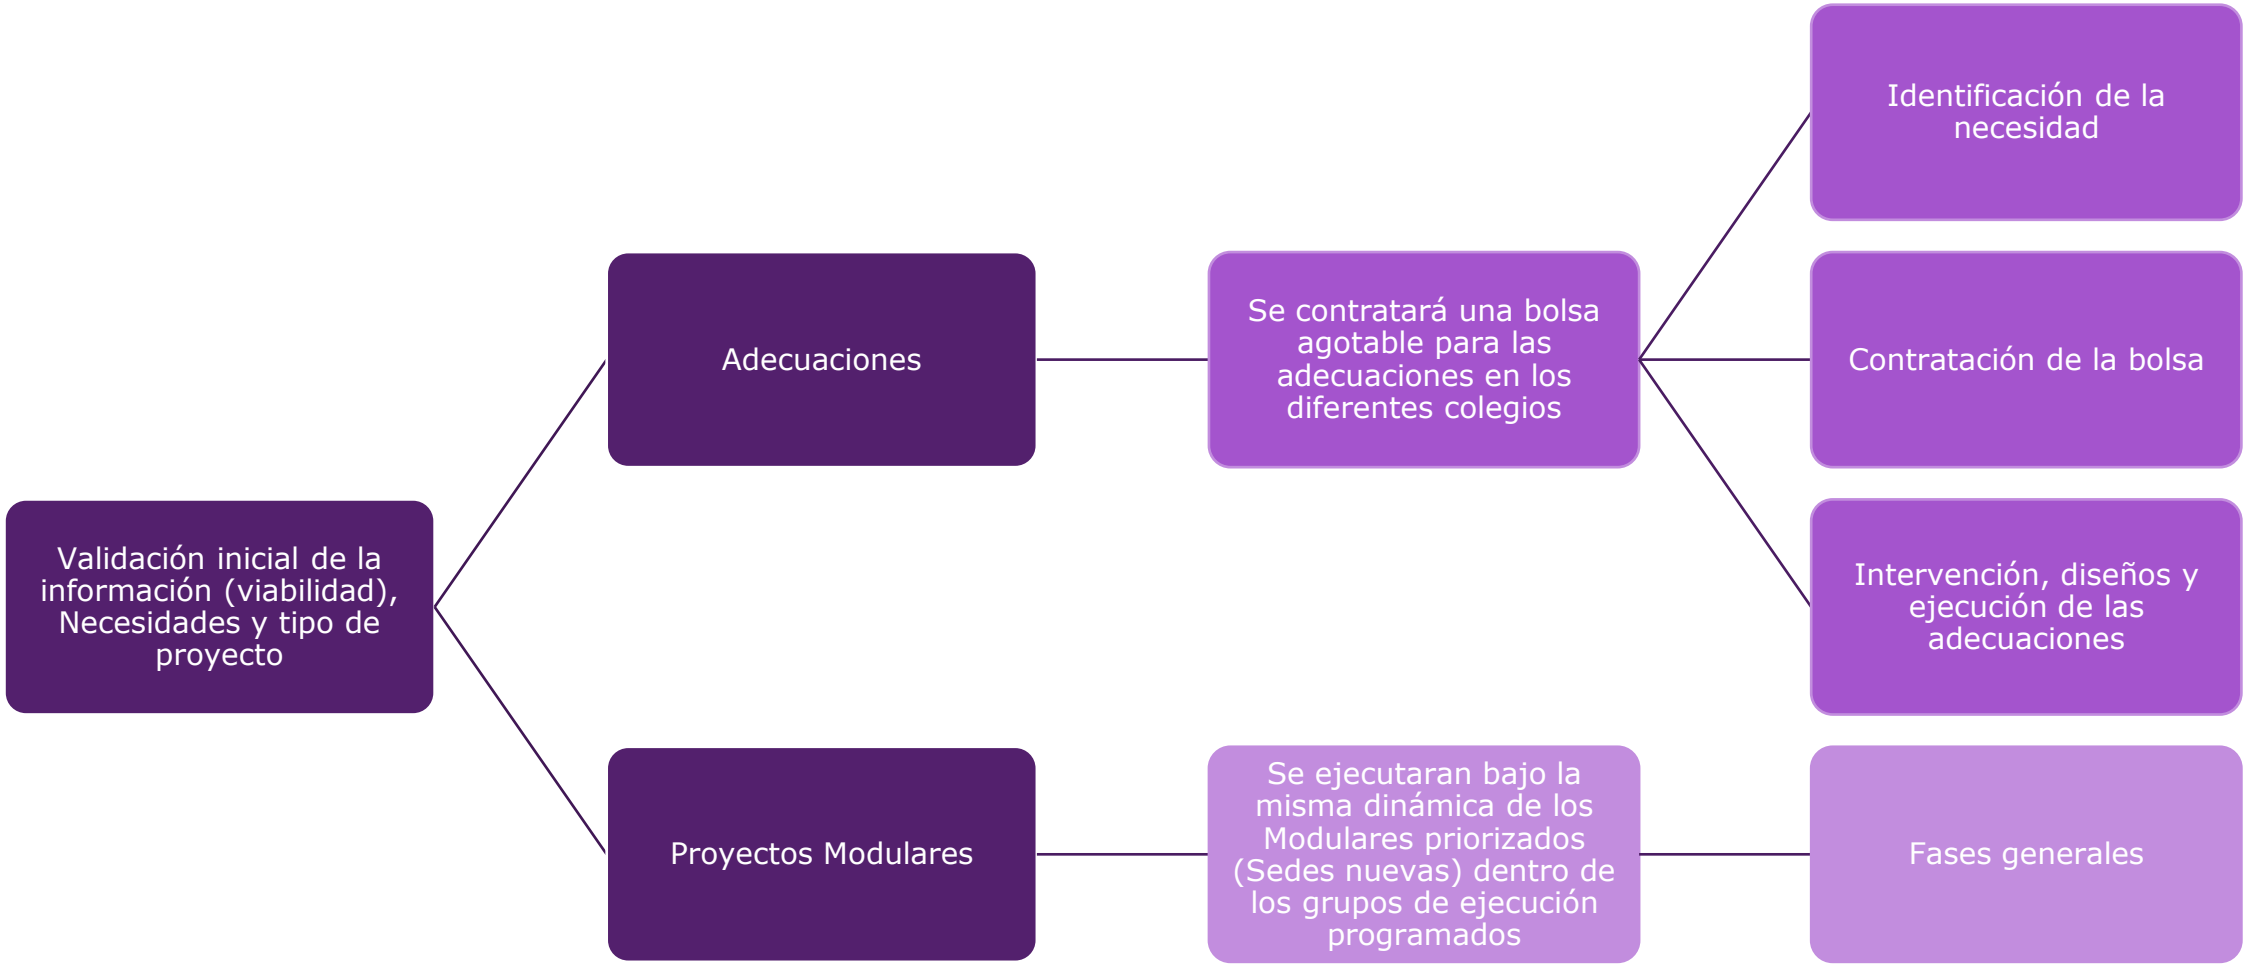

GESTIÓN SOCIAL

Plan de Gestión Social General

FASES 1	FASES 2	FASES 3	FASES 4	FASES 5
Diagnóstico	Socialización y concertación	Participación y corresponsabilidad social	Seguimiento	Entrega y evaluación participativa

CONSTRUCCIÓN – MEJORAMIENTO – DOTACIÓN – ADECUACIÓN

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

COMUNICACIONES

SALVAGUARDAS

1.Estrategias de trabajo

VALOR DEL PROYECTO
$271.315.944.244

TIEMPO DE EJECUCIÓN
18 meses

Estrategias de intervención (Tipo de proyecto)

1. **Implementación de 100 Ambientes Modulares aproximadamente**

   Entre 23 hasta 1750m2 c/u
   70-89 hasta 200m2 modulares o adecuación
   $ 239.161.800.340

2. **Estudios y diseños en estructuras convencionales**


   5 proyectos
   $17.904.143.904

3. **Estudios, diseños y obra o adecuación en estructura convencionales**

   1-3 proyectos entre 200m2-1.000m2 c/u
   $14.000.000.000

4. **Dotación**

   1 proyecto
   $250.000.000

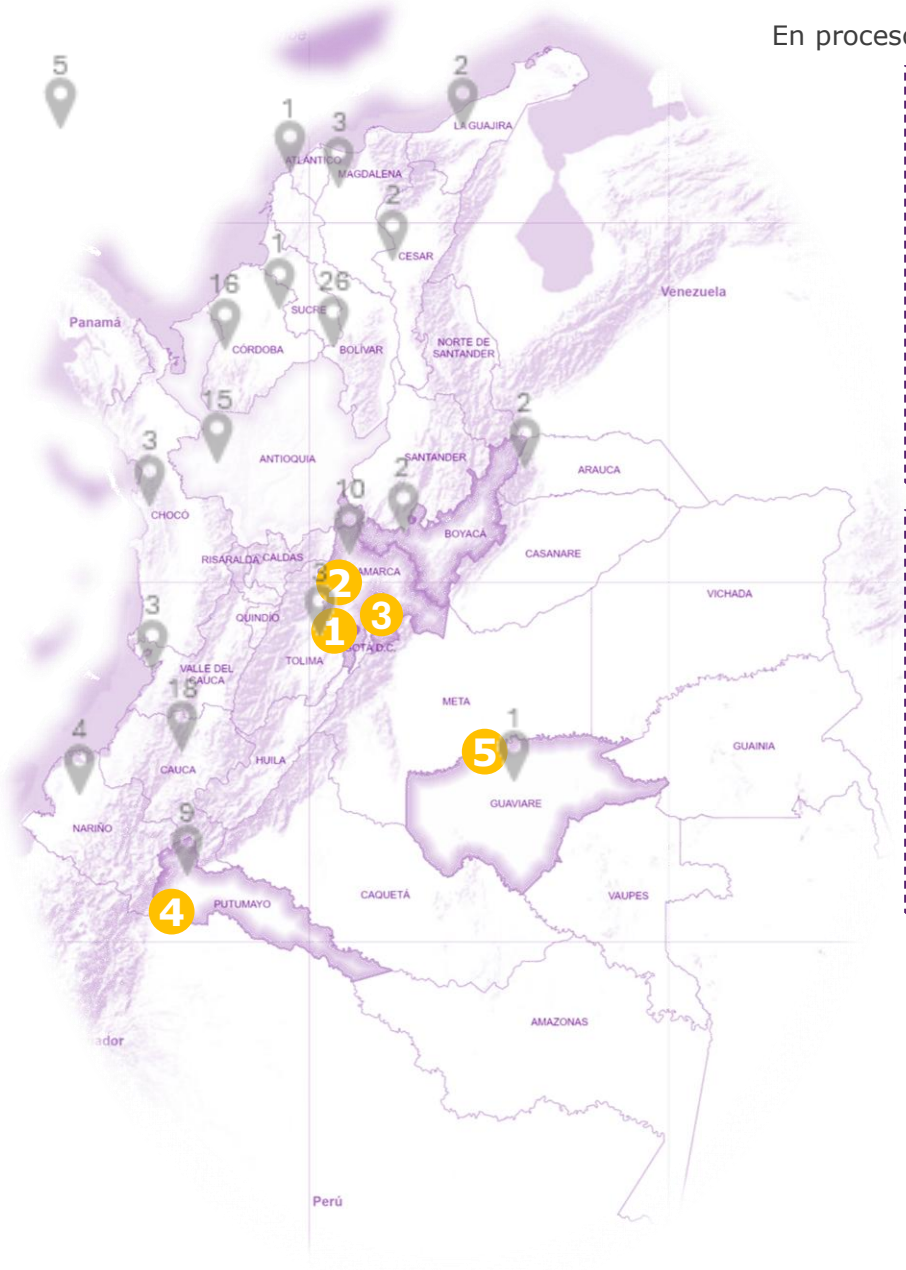

2.Proyectos piloto ambientes modulares

En proceso de validación con ME y Universidad de los proyectos piloto.

1 Funza Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular

2 Villeta Cundinamarca

UNIVERSIDAD:
Multi Campus
ÁREA LOTE:
65.866m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

3 Bogotá (Valmaría)

UNIVERSIDAD:
Universidad Pedagógica Nacional
ÁREA LOTE:
Por confirmar total de lotes
NECESIDAD:
Modular y convencional.

4 Valle del Guamuez - Hormiga Putumayo

UNIVERSIDAD:
Instituto Tecnológica de Putumayo - Gobernación del Putumayo
ÁREA LOTE:
41.690 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular
VISITA:
Por definir fecha

5 San José del Guaviare


UNIVERSIDAD:
Multi Campus (están en negociación con diferentes universidades)
ÁREA LOTE:
17.334 m2 (IGAC)
NECESIDAD:
Modular y convencional.
VISITA:
Por definir fecha

Estado de proyectos

Ambientes Modulares

GRUPO 1

Proyectos	Viabilidad	Diseño e implantación	Estructuración	Ejecución de obra
5	80%	80%	40%	0%

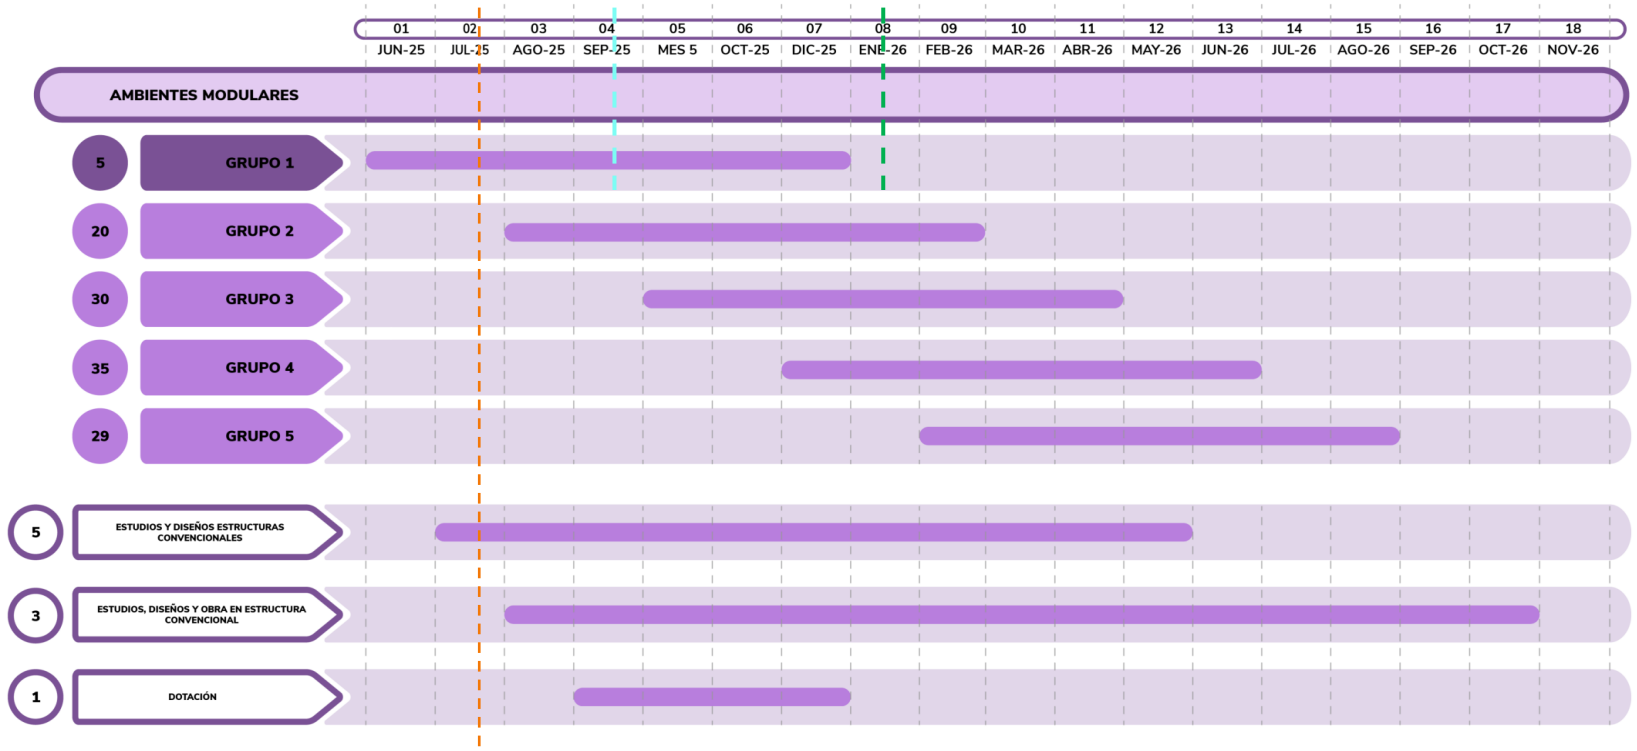


Semana actual

Fechas estimadas de inicio de obra

Fechas estimadas de entrega de obra

Estado de proyectos

Ambientes Modulares

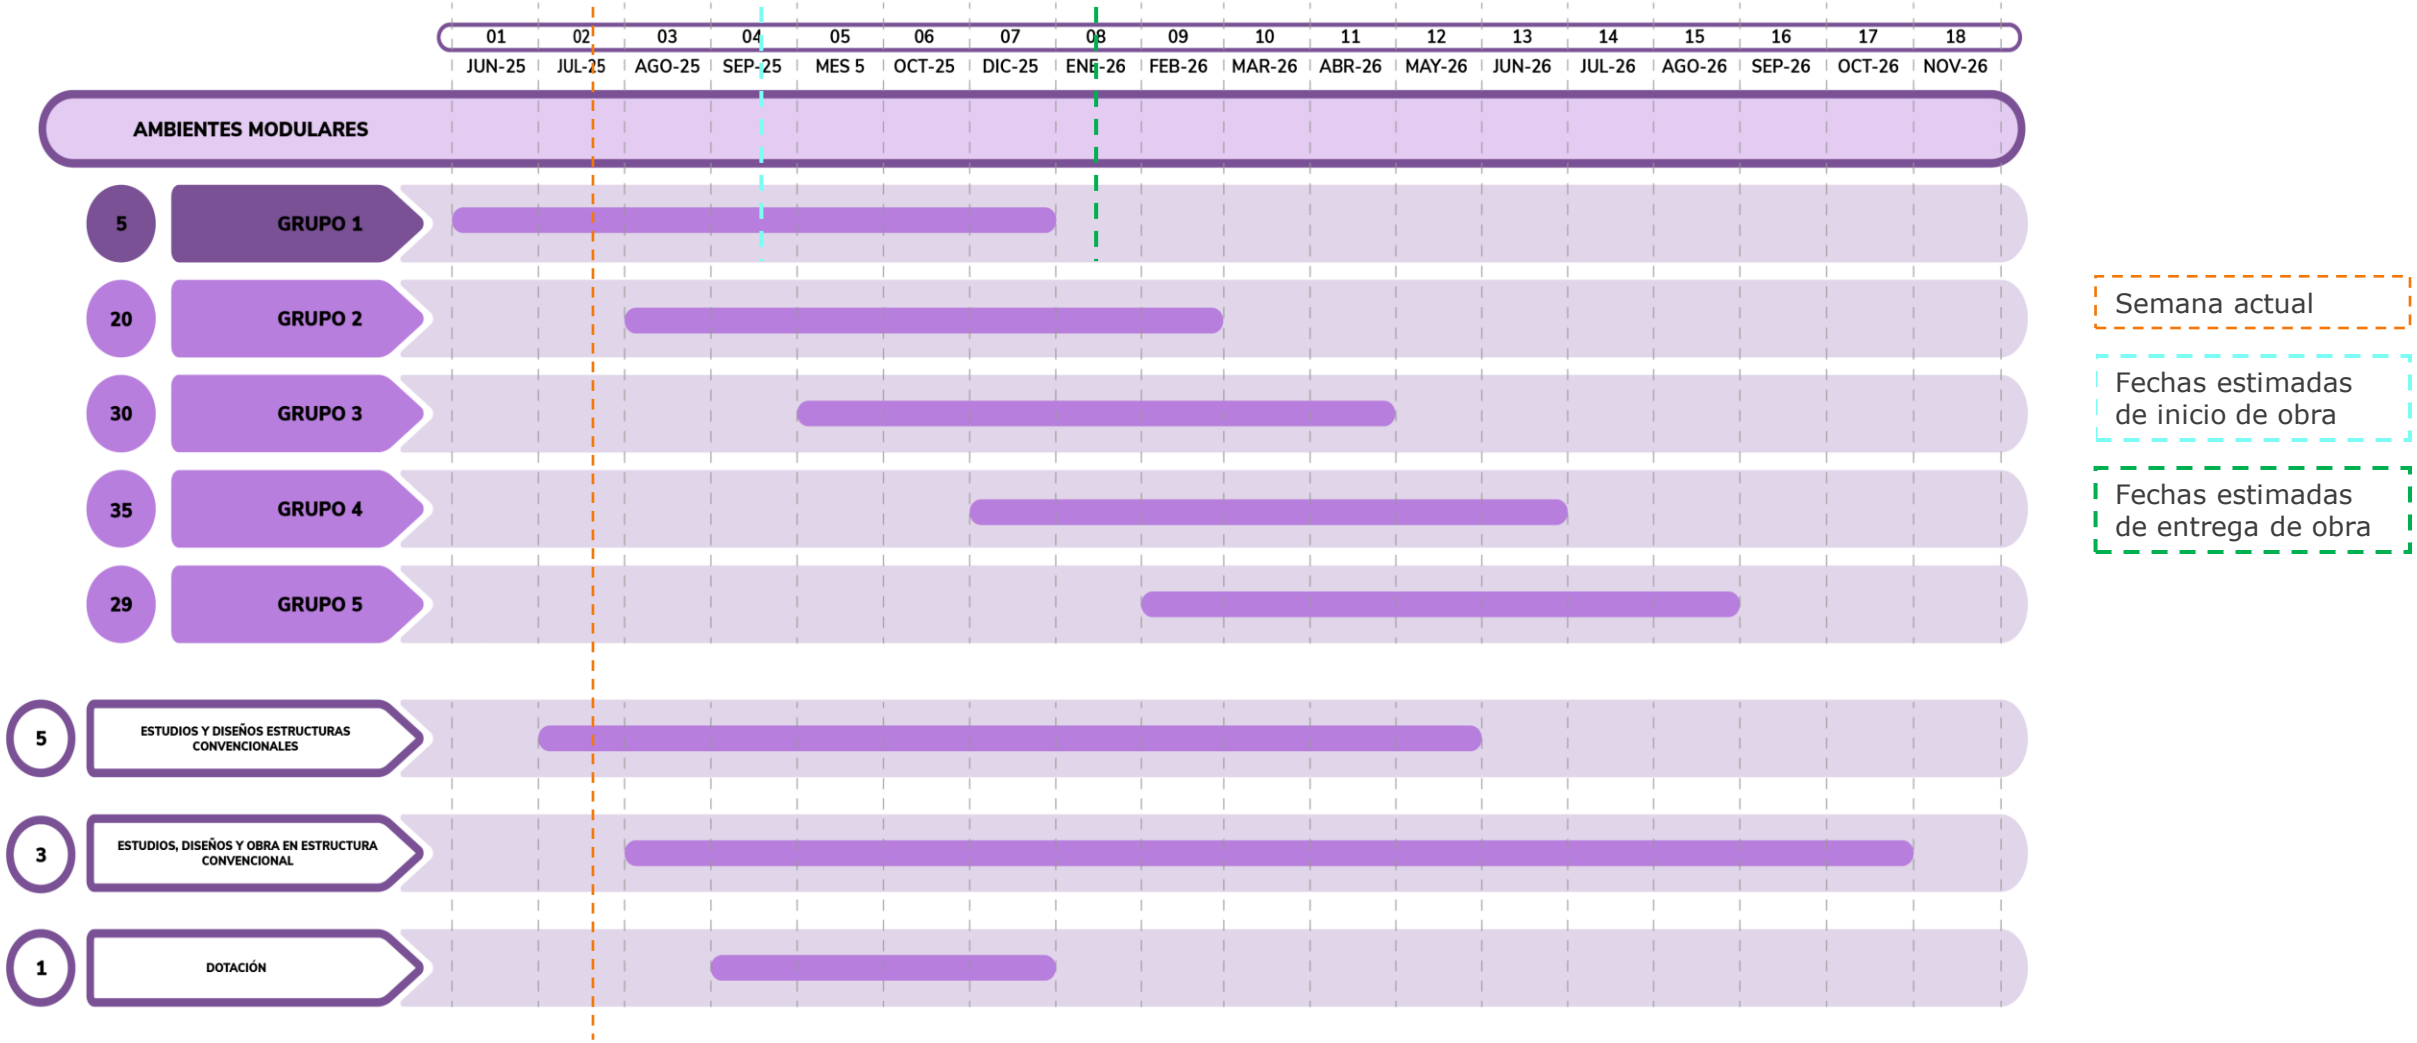

Implantaciones Tipo

4. Programa Núcleo Básico - Sede nueva

Institución nueva 300 alumnos


23 módulos
1 placa polideportiva



Ahora son 12 aulas para el núcleo básico, Actualizar áreas y presupuesto

	ÁREA APROX.	
TOTAL ÁREA PROGRAMA	1.540 m²	
ÁREA CIRCULACIONES INTERNAS	230 m²	
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA		1.770 m²
ÁREA URBANISMO	550 m²	
ÁREA PLACA POLIDEPORTIVA	660 m²	
GRAN TOTAL ÁREA		2..980 m²
ÁREA POR ESTUDIANTE (Área Const.)	5,9 m²	
LINEAL CERRAMIENTO	250 ml	
PARQUEADEROS	10 unidades	
COSTO TOTAL		$ 11.742.386.107,06

5. Programa - Ampliación

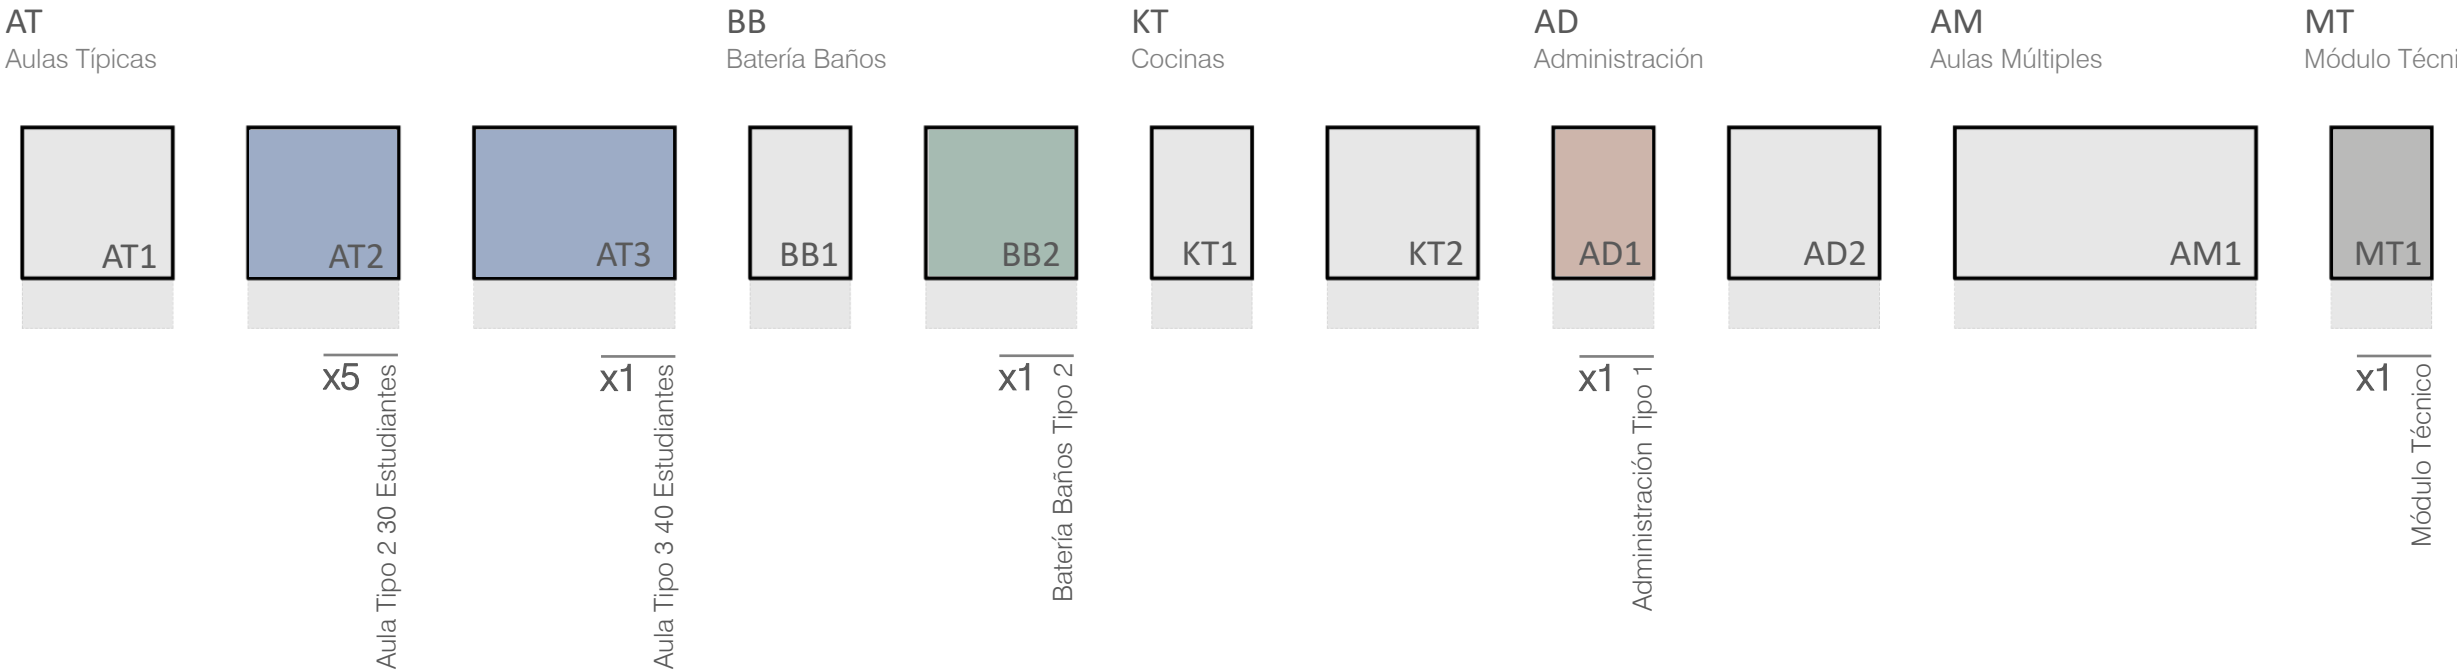

Programa Propuesta

Colegio 160 alumnos

- 1 Aula Tipo 3 40 Estudiantes
- 5 Aulas Tipo 2 30 Estudiantes


TOTAL ÁREA PROGRAMA	612,15 m²	
TOTAL ÁREA CIRCULACIONES	207,6 m²	
GRAN TOTAL ÁREA		819,75 m²
ÁREA POR ESTUDIANTE	5,12 m²	
COSTO TOTAL	$ 5.144.506.226	

4

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

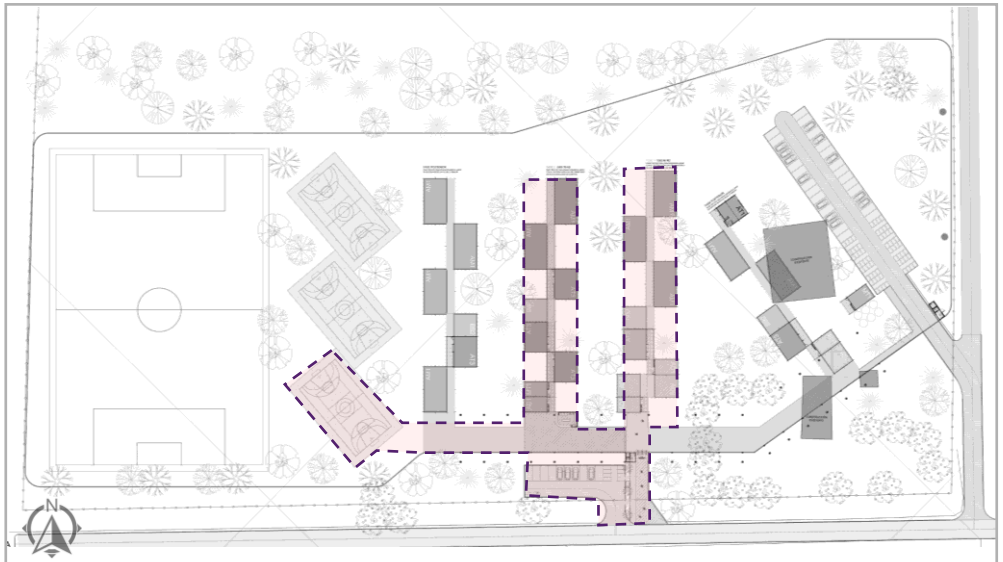

PLANO DE IMPLANTACIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $15.930.722.471** Obra: $13.974.317.957 Interventoría: $1.117.945.436 GAT: $838.459.077
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	160 estudiantes
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo 16 de julio.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Predio por Declaratoria de utilidad pública para la expropiación temprana.

ID_147 Funza - FASE 2

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	3	282,24
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Cafetería	47,53	1	47,53
	Almacén	47,53	1	47,53
	Zona Técnica	47,53	1	47,53
	Total			**776,94**
Área Libre	Zona Dura	1000	1	1000
	Total			**1000**
	Lineal Cerramiento			773 ml

ID_147 Funza - FASE 1

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Aula Múltiple	140,65	3	421,95
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Zona Admin 1	47,53	1	47,53
	Zona Admin 2	70,81	2	141,62
	Portería	47,53	1	47,53
	Zona Técnica	47,53	1	47,53
	Total			**871,05**
Área Libre	Zona Dura	1000	1	1000
	Parqueaderos	450	10	4500
	Placa Polidep	660	1	660
	Total			**6160**
	Lineal Cerramiento			773 ml

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

Ahora son 12 aulas para el núcleo básico, Actualizar áreas y presupuesto



PLANO DE IMPLANTACIÓN



PLANO DE LOCALIZACIÓN

ID_165 Valle del Guamuez

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	10	704,4
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Tienda de Alimento	47,53	1	47,53
	Zona Admin.	81,14	1	81,14
	Portería	47,53	1	47,53
	Total			**1116,3**
	Lineal Circulación			19,2 ml
Área Libre	Zona Dura	694	1	694
	Zona Blanda	2732	1	2732
	Placa Polideport.	660	1	660
	Parqueaderos	12,5	10	125
	Total			**4211**
	Lineal Bordillo			489,06 ml

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $8.664.423.576,19** Obra: $7.600.371.558,06 Interventoría: $608.029.724,64 GAT: $456.002.293,48
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	300 estudiantes
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Se está coordinando visita de campo.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	Se está a la espera de las cartillas para módulos en madera.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare




PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare						
Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	24	1690,56	24	576
	Aula Típica 3	94,08	7	658,56	40	280
	Baño Tipo 2	70,81	3	212,43	11	33
	Técnico	47,53	9	427,77		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53		
	Zona Admin. 2	70,81	2	141,62		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65		
	Total			**3319,12**		
Área Libre	Zona Dura	4042,31	1	4042,31		
	Zona Blanda	2862,85	1	2862,85		
	Parqueadero	1855	1	1855		
	Total			**8760,16**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $24.881.885.955** Obra: $21.834.917.504 Interventoría: $1.746.793.400 GAT: $1.310.095.050
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	1080 estudiantes (en revisión)
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo. Visita de campo semana del 21 – 25 de julio o próxima.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM.
ALERTAS	ART: Demolición para septiembre, cerramiento y cubierta

5. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

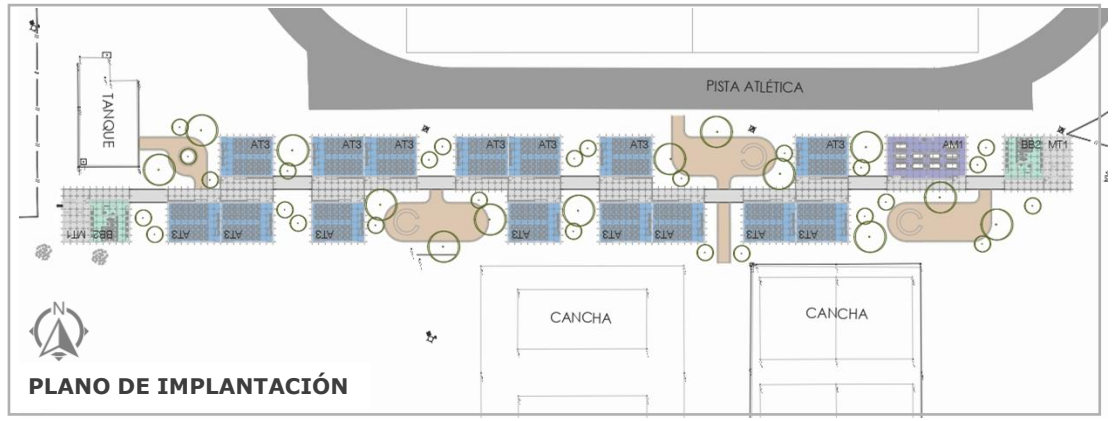

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_208 Valmaría

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65
	Técnico	47,53	2	95,06
	Total			**1788,53**
	Lineal Cárcamo			422,4 ml
Área Libre	Zona Dura	621,68	1	621,68
	Zona Blanda	1070,82	1	1070,82
	Total			**1692,5**
	Lineal Bordillo			309 ml

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $11.113.614.489,09** Obra: $9.748.784.639,55 Interventoría: $779.902.771,16 GAT: $584.927.078,37
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Diseño de implantación.
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad de energía, dicho estudio se demora 15 días aprox., más los días necesarios para la contratación.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: Obra: Interventoría:
PLAZO	4 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	(en revisión)
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se ha venido adelantando con la IES mesas de trabajo.
SIGUIENTE PASO	Mesa de trabajo 6 de agosto con las IES para aterrizar la necesidad.
ALERTAS	Definición de necesidad

Ajuste presupuestal

En trabajo

Proyectos excluidos		
Municipio	**Razón**	**Tipo**
Moniquirá	En reunión con la UPTC informaron que el proyecto está priorizado y financiado por la gobernación mediante decreto n 1053 del 19 de nov 2024	
Ciénaga de Oro	No está dentro del alcance del Anexo 1	
Saravena	La Universidad está revisando la propuesta realizada por el VES para que la IES ejecute el proyecto.	
Santander de Quilichao	La Universidad aprobó la propuesta realizada por el VES para que la IES ejecute el proyecto.	
Popayán	La Universidad aprobó la propuesta realizada por el VES para que la IES ejecute el proyecto.	
Santander de Quilichao	Esta obra la ejecutará la IES.	
Belén de Bajirá	Ejecutor: FINDETER En estructuración de los estudios previos	
Barranquilla	La Universidad está revisando la propuesta realizada por el VES para que la IES ejecute el proyecto.	
Fusagasugá	Riesgos Avenidas torrenciales y deslizamientos	
Arboletes	Riesgos por inundación	

Tipo de Intervención	Proyectos	Valor estimado anexo técnico	Proyectos ajustados	Valor ajustado	Diferencia
1. Estudios y diseños	5	$ 17.904.143.904	5	$ 17.904.143.904	$ 0
2. Instalación de Ambientes Modulares Priorizados	30	$ 146.290.594.850	23	$ 283.918.945.323	$ 137.628.350.473
3. Construcción convencional	3	$ 14.000.000.000	1	$ 14.000.000.000	$ 0
4. Dotación	1	$ 250.000.000	1	$ 250.000.000	$ 0
SUBTOTAL	**39**	**$ 178.444.738.754**	**30**	**$ 316.073.089.227**	**$ 137.628.350.473**
5. Instalación de Ambientes Modulares - Bolsa	89	$ 92.871.205.490	89	$ 401.632.503.667	$ 308.761.298.177
TOTAL		$ 271.315.944.244	119	$ 717.705.592.894	$ 446.389.648.650

7

Alertas

En trabajo

Aspectos a tener en cuenta

- Viabilidad de predios
- Ajuste de necesidades de las IES
- Estado de las cartillas
- Convenios y acuerdos con las IES
- Disponibilidad de predios (proyectos)

8

Recomendaciones y conclusiones

En trabajo

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co


mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**05**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**14**	**08**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00	**Hora Fin:**	11: 00 am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN						
Asistentes:	MEN: Carlos Amaya, Johnson Cansario, Maurizio Toscano, Enrique Luis Monroy, Juan Sebastian Romero ANIM: Natalia Valencia, Juan Camilo Ramirez						
Agenda	1. Manual Operativo 2. Ajuste Cronograma 3. Estado proyectos 4. ES en tu Colegio 5. Presupuesto 6. ES en tu Colegio 7. Dotación						

La ANIM informa que enviará hoy, 14 de agosto de 2025, el manual operativo al MEN, para revisión de las áreas o dependencias pertinentes, precisando que este debe ser aprobado por el comité fiduciario, el cual es requisito para el primer pago de Asistencia técnica.

Posteriormente, presenta el cronograma ajustado para cada uno de los tipos de intervención

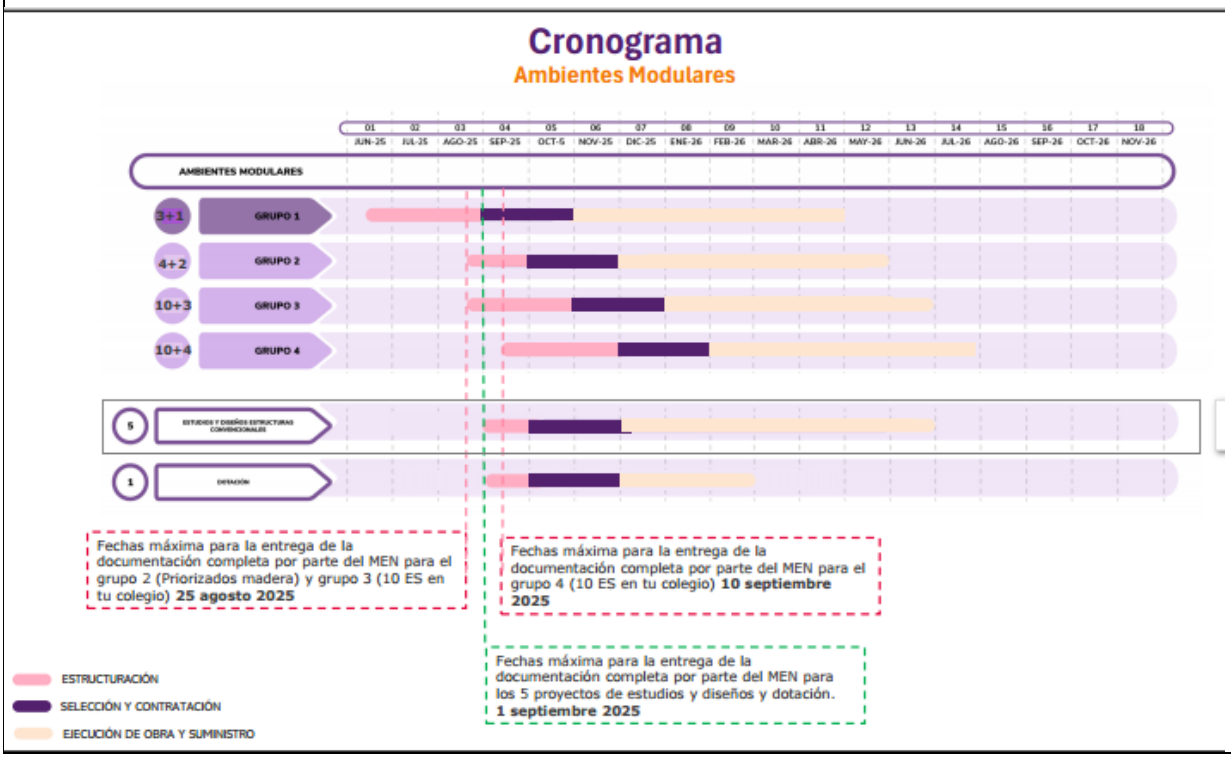

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Presupuesto

	Departamento	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Metálico	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 15.028.983.463	$ 15.930.722.471
	Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaría	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaría	$ 10.685.525.743	$ 11.326.657.288
	Valle del Cauca	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
				$ 46.431.017.068	$ 49.216.878.092

	Departamento	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Madera	Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Putumayo	Valle Guamuez	Gobernación del Putumayo	$ 8.173.984.506	$ 8.664.423.576
	Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 23.482.835.807	$ 24.891.805.955
				$ 52.373.328.174	$ 55.515.727.865

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 98.804.345.243	$ 104.732.605.957
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 39.205.649.899	$ 41.557.988.893

Posteriormente, realiza la presentación del estado de los proyectos donde menciona alertas y el paso a seguir y compromisos para cada uno de los proyectos.

Para la estrategia se debera definir cuales cuales proyectos van a entrar en el programa "ES en tu cole"

Compromisos	Responsable	Plazo	Estado
VALMARÍA ANIM hará seguimiento a la firma del convenio, que debe ser entregado por la universidad el 26 de agosto de 2025	ANIM	26/08/2025.	
FUNZA VES y OIE presentarán el proyecto en el Comité de Infraestructura para aprobación del alcance. Se hará seguimiento en el próximo comité.	VES y OIE		
SOACHA IES, VES, OIE y Fomento definirán las fases requeridas del proyecto, con inicio más tardío el 10 de septiembre de 2025. El MEN reunirá con la IES para resolver temas de titularidad y deuda de impuestos generada por la SAE. Se seguirá el avance en el siguiente comité.	ANIM, IES, VES, OIE	10/09/2025.	
CALI El MEN debe revisar el estado de compra del predio para acceso al multicampus. La IES deberá comunicar las necesidades a Fomento, con apoyo de OIE y VES, especialmente si se tramita vía CAF. Se hará seguimiento en el próximo comité.	MEN, IES		
VALLE DEL GUAMUEZ El MEN coordinará una reunión virtual con ANIM e IES el 19 o 20 de agosto de 2025 para presentar atributos de las aulas modulares. ANIM realizará una visita al territorio la semana del 25 de agosto de 2025.	MEN, ANIM	20 y 25 de Agosto	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE El MEN definirá el presupuesto final aprobado; la IES lo remitirá a ANIM.	MEN, ANIM	14, 19 y 25 de Agosto	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

MEN confirmará hoy, 14 de agosto de 2025, la reunión para definir el alcance de la fase I, a realizarse la semana del 19 de agosto de 2025. ANIM elaborará la propuesta de implantación con el número de beneficiarios actualizado, lista para la reunión de esa semana. ANIM gestionará visita al territorio durante la semana del 25 de agosto de 2025. El MEN coordinará con la ART el alcance y responsabilidades para informar a ANIM. Se hará seguimiento en el próximo comité.			
VILLETA El MEN entregará las necesidades claras y definición de la IES a ANIM. MEN y ANIM coordinarán reunión con la IES y el director de Fomento para la semana del 19 de agosto de 2025.	MEN, ANIM	19/08/2025	
JAGUA DE IBIRICO La ANIM tendrá reunión con la IES la semana del 25 de agosto de 2025 para discutir la viabilidad del proyecto.	ANIM	25/08/2025	
COMPROMISOS GENERALES			
El MEN evaluará alternativas de financiamiento con recurso CAF, teniendo en cuenta que el cronograma de ejecución del Grupo 4 podría impedir alcanzar las metas nacionales si los recursos no se transfieren antes de enero. Se hará seguimiento en el próximo comité.			
ANIM solicita al MEN la definición concreta de necesidades de cada universidad y/o proyecto de los Grupos 3 y 4 antes del 10 de septiembre de 2025, dado el limitado margen de tiempo.			
El MEN deberá determinar qué proyectos se financian con recurso CAF y cuáles se incluyen en la estrategia “Educación Superior en tu Colegio”, y presentarlo en el próximo comité.			
El MEN iniciará el proceso de exención del GMF. Se hará seguimiento en el próximo comité.			
ANIM enviará hoy, 14 de agosto de 2025, el manual operativo al MEN, que lo remitirá a las dependencias pertinentes.			
ANIM remitirá los términos de referencia tipo por vía oficial antes del 20 de agosto de 2025, para revisión por parte del personal correspondiente del MEN.			
Firmas Participantes:			
Se anexa lista de Asistencia			

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina Infraestructura Educativo MEN

Nombre del lider de la actividad: Carlos Alirio Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento Contrato ANIM-MEN

Hora de inicio: 8:00 | Hora de fin: 11:00

Fecha: 14-08-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462228	jramirez@anim.gov.co	
2	Carlos Alirio Amaya N	MEN-OIE	13.720203		
3	Juan Sebastian Ramos	MEN-OIE	1007635310	jromero@est.mineducacion.gov.co	
4	JOHNSON CANSARIO	MEN - OIE	79.617.831	JCANSARIO @MINEDUCACION.GOV.CO	
5	Mauricio Toscano	MEN- VCS	79.952.724	mtoscano @mineducacion.gov.co	
6	Natalia Valencia J	ANIM - Sub. Estruct	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
7	ENRIQUE LUIS MONROY.	MEN - OIE	1026264858	emonroym@ext.mineducacion.gov.co	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

13 de agosto de 2025

AGENDA

1. Manual Operativo
2. Ajuste Cronograma
3. Estado proyectos
4. Presupuesto
5. ES en tu Colegio
6. Dotación

Manual Operativo

Observaciones Manual


Primer pago

2

Ajuste Cronograma

Cronograma

Ambientes Modulares

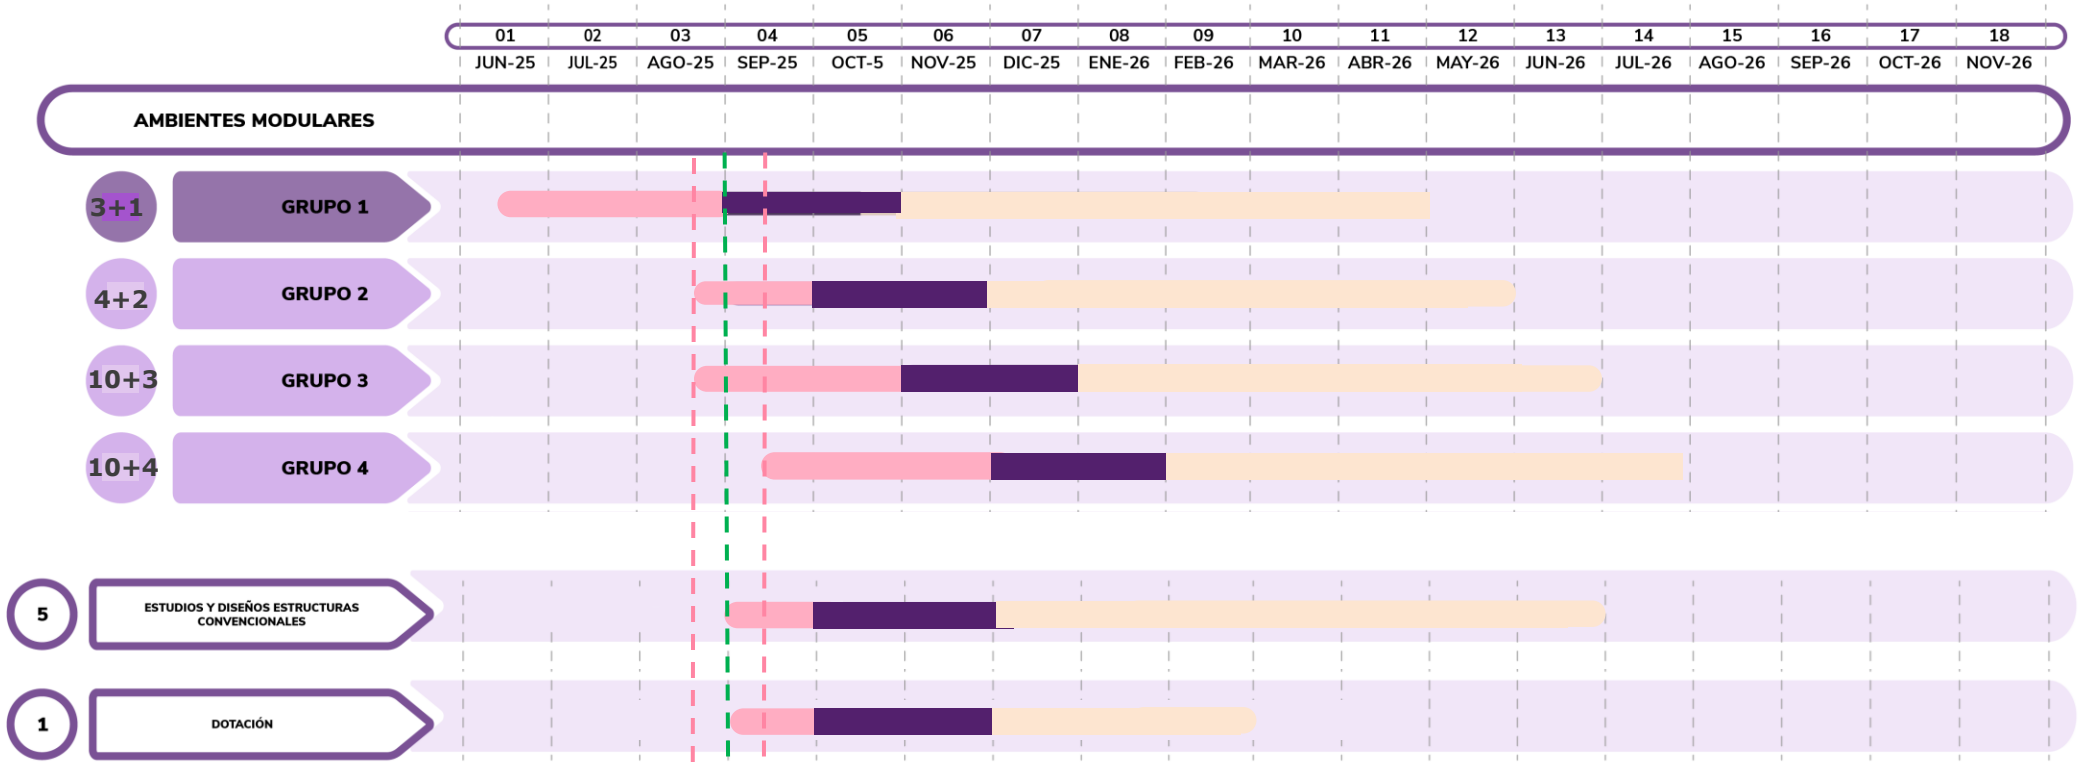

Fechas máxima para la entrega de la documentación completa por parte del MEN para el grupo 2 (Priorizados madera) y grupo 3 (10 ES en tu colegio) **25 agosto 2025**

Fechas máxima para la entrega de la documentación completa por parte del MEN para el grupo 4 (10 ES en tu colegio) **10 septiembre 2025**

Fechas máxima para la entrega de la documentación completa por parte del MEN para los 5 proyectos de estudios y diseños y dotación. **1 septiembre 2025**

ESTRUCTURACIÓN


SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN DE OBRA Y SUMINISTRO

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

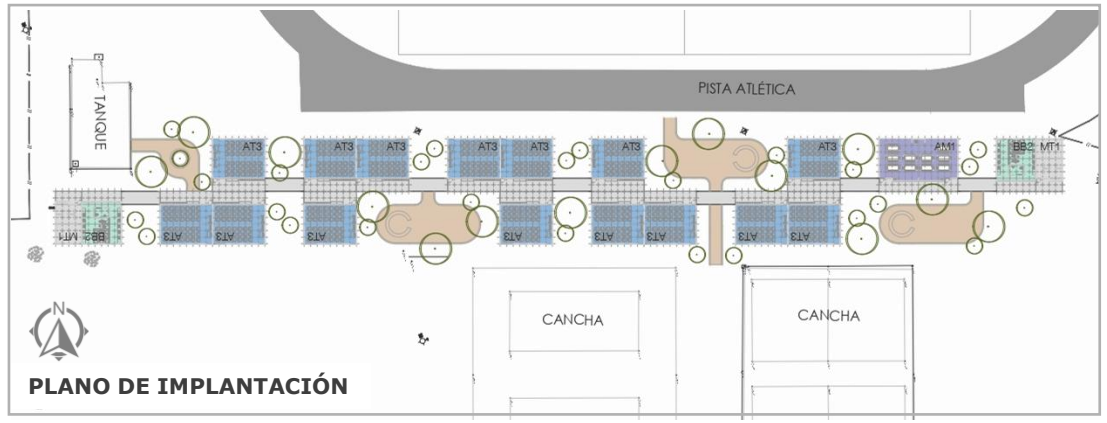

PLANO DE IMPLANTACIÓN


ID_208 Valmaría

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65
	Técnico	47,53	2	95,06
	Total			**1788,53**
	Lineal Cárcamo			422,4 ml
Área Libre	Zona Dura	621,68	1	621,68
	Zona Blanda	1070,82	1	1070,82
	Total			**1692,5**
	Lineal Bordillo			309 ml

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $11.113.614.489,09** Obra: $9.748.784.639,55 Interventoría: $779.902.771,16 GAT: $584.927.078,37
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	Diseño de implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad predial, acuerdo de implantación con la IES y primer acercamiento a Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT(ANIM – MEN)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad antes de la publicación del proceso de contratación (Agosto 29). (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

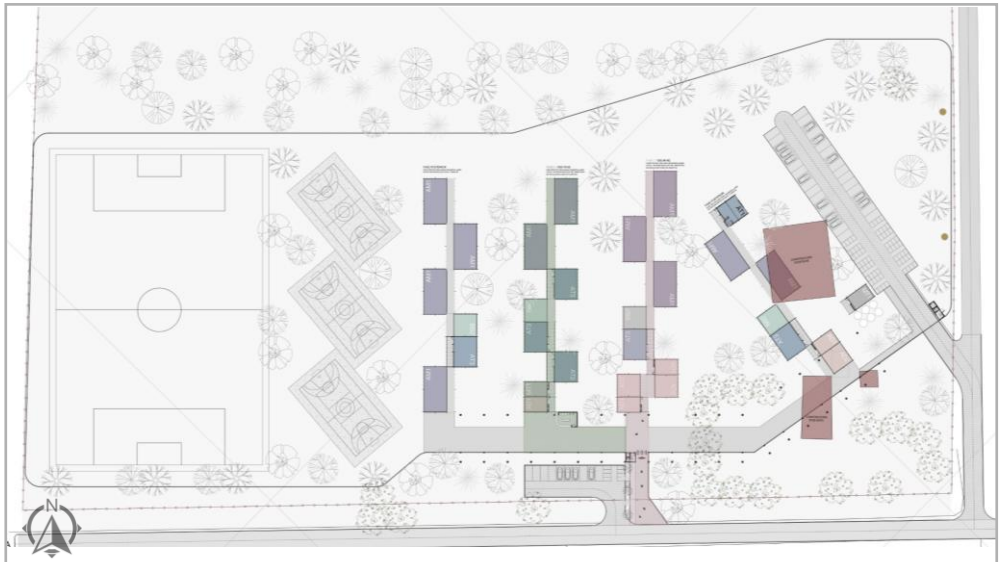

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_147 Funza - FASE 2

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	3	282,24
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Cafetería	47,53	1	47,53
	Almacén	47,53	1	47,53
	Zona Técnica	47,53	1	47,53
	Total			**776,94**
Área Libre	Zona Dura	1000	1	1000
	Total			**1000**
	Lineal Cerramiento			773 ml

ID_147 Funza - FASE 1

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Aula Múltiple	140,65	3	421,95
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81
	Zona Admin 1	47,53	1	47,53
	Zona Admin 2	70,81	2	141,62
	Portería	47,53	1	47,53
	Zona Técnica	47,53	1	47,53
	Total			**871,05**
Área Libre	Zona Dura	1000	1	1000
	Parqueaderos	450	10	4500
	Placa Polidep	660	1	660
	Total			**6160**
	Lineal Cerramiento			773 ml

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $15.930.722.471** Obra: $13.974.317.957 Interventoría: $1.117.945.436 GAT: $838.459.077
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	380 sillas
ESTADO	Diseño de implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad predial, acuerdo de implantación con la IES.
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Predio por Declaratoria de utilidad pública para la expropiación temprana. (MEN) Se deben definir las distribuciones básicas y dotación especializada para los laboratorios.(IES-ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: $ 10.979.749.166 Obra: $ 9.631.358.918 Interventoría: $770.508.713
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa.
SIGUIENTE PASO	Se deben definir las necesidades por parte de la IES, la ANIM presentará una propuesta de implantación base. (ANIM-MEN)
ALERTAS	No se ha podido consultar ni se tiene un folio de matricula. (IES-MEN) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (MEN)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_030 Cali




uente: Documento compartido por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: $ 10.979.749.166 Obra: $ 9.631.358.918 Interventoría: $770.508.713
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa. Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones.
SIGUIENTE PASO	Terminar la evaluación de viabilidad y fichas. (ANIM) Presentar el esquema básico a la IES (MEN-ANIM)
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (MEN - IES)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

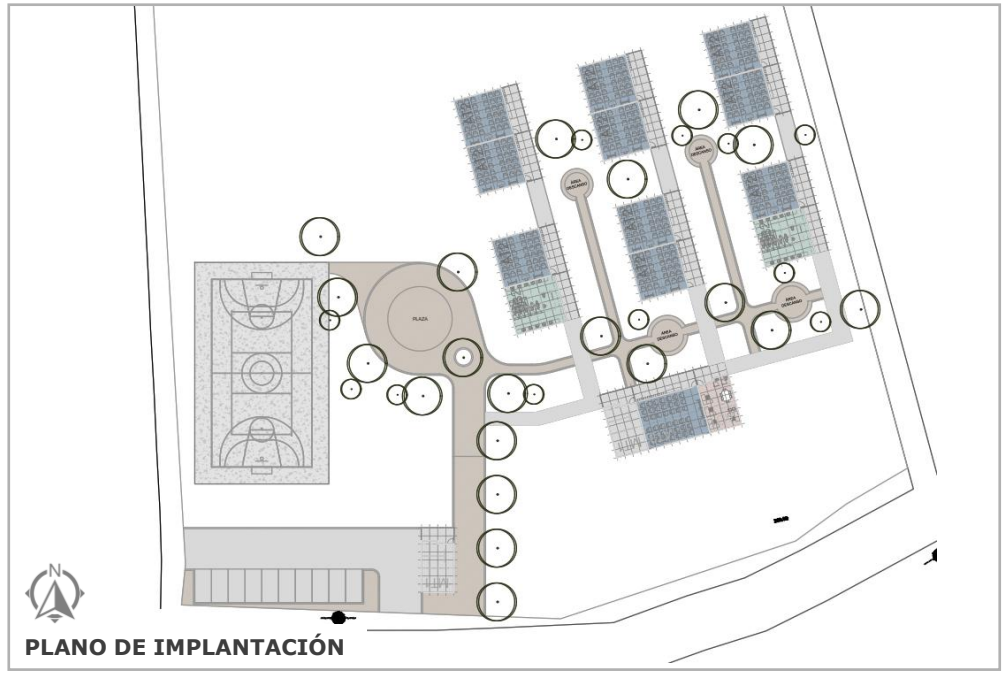

PLANO DE IMPLANTACIÓN



PLANO DE LOCALIZACIÓN

ID_165 Valle del Guamuez

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	10	704,4
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Tienda de Alimento	47,53	1	47,53
	Zona Admin.	81,14	1	81,14
	Portería	47,53	1	47,53
	Total			**1116,3**
	Lineal Circulación			19,2 ml
Área Libre	Zona Dura	694	1	694
	Zona Blanda	2732	1	2732
	Placa Polideport.	660	1	660
	Parqueaderos	12,5	10	125
	Total			**4211**
	Lineal Bordillo			489,06 ml

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $8.664.423.576,19** Obra: $7.600.371.558,06 Interventoría: $608.029.724,64 GAT: $456.002.293,48
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	300 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial y una aproximación a la implantación básica.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM. (ANIM-MEN) Visitas de campo y aproximación a la comunidad.(ANIM)
ALERTAS	Se está a la espera de las cartillas para módulos en madera. (MEN) Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare



PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	24	1690,56	24	576
	Aula Típica 3	94,08	7	658,56	40	280
	Baño Tipo 2	70,81	3	212,43	11	33
	Técnico	47,53	9	427,77		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53		
	Zona Admin. 2	70,81	2	141,62		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65		
	Total			**3319,12**		
Área Libre	Zona Dura	4042,31	1	4042,31		
	Zona Blanda	2862,85	1	2862,85		
	Parqueadero	1855	1	1855		
	Total			**8760,16**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**Total: $24.881.885.955** Obra: $21.834.917.504 Interventoría: $1.746.793.400 GAT: $1.310.095.050
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	1080 sillas – en revisión por Fomento
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad catastral y jurídica, la Gobernación ha venido adelantando los diseños.
SIGUIENTE PASO	Definición de los documentos mínimos, fechas y estructura de la información que debe entregar la gobernación. (ANIM)
ALERTAS	Se debe definir el presupuesto final aprobado (MEN) La gobernación manifiesta que se encargará de los diseños y términos de referencia de la contratación.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta




TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	Total: $ 10.979.749.166 Obra: $ 9.631.358.918 Interventoría: $770.508.713
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial y normativa. Se realizó la mesa técnica del 6 de agosto pero no se logró definición de necesidades.
SIGUIENTE PASO	Se deben definir las necesidades por parte de la IES al ser un multi-campus. (MEN-ANIM)
ALERTAS	No se evidencia un avance en la definición de necesidades, las IES no se ponen de acuerdo y no han presentado una necesidad general.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Jagua, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	Total: $ 10.979.749.166 Obra: $ 9.631.358.918 Interventoría: $770.508.713
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La información se encuentra en revisión. (ANIM)
SIGUIENTE PASO	Determinar la viabilidad del proyecto (ANIM)
ALERTAS	La IES no está de acuerdo con que los módulos de madera no tengan XX

Suba – Multicampus

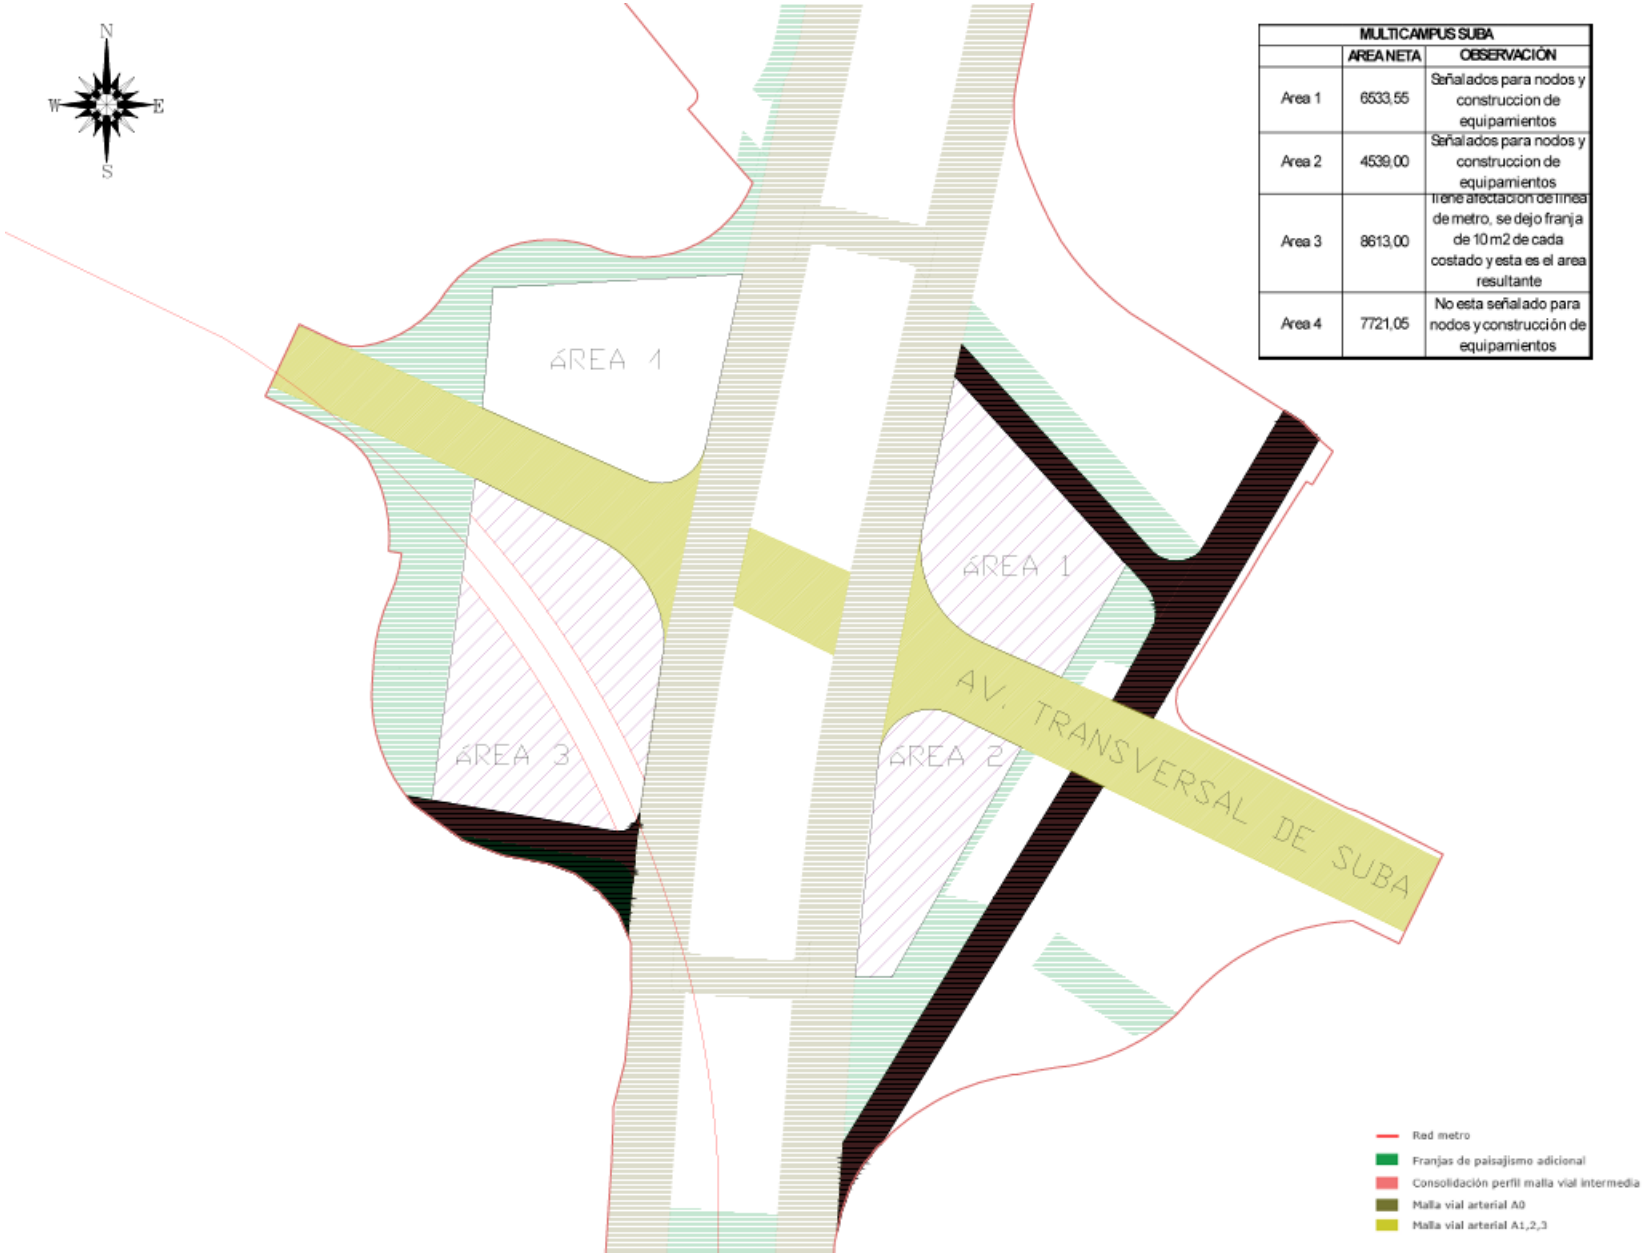

MULTICAMPUS SUBA		
	AREA NETA	OBSERVACIÓN
Area 1	6533,55	Señalados para nodos y construccion de equipamientos
Area 2	4539,00	Señalados para nodos y construccion de equipamientos
Area 3	8613,00	Tiene afectación de línea de metro, se dejo franja de 10 m2 de cada costado y esta es el area resultante
Area 4	7721,05	No esta señalado para nodos y construcción de equipamientos

4

Presupuesto

	Departamento	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Metálico	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 15.028.983.463	$ 15.930.722.471
	Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	$ 10.685.525.743	$ 11.326.657.288
	Valle del Cauca	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
				$ 46.431.017.068	$ 49.216.878.092

	Departamento	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Madera	Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 10.358.253.931	$ 10.979.749.167
	Putumayo	Valle Guamuez	Gobernación del Putumayo	$ 8.173.984.506	$ 8.664.423.576
	Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 23.482.835.807	$ 24.891.805.955
				$ 52.373.328.174	$ 55.515.727.865

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 98.804.345.243	$ 104.732.605.957
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 39.205.649.899	$ 41.557.988.893

ES en tu Colegio

Formulario ANIM

Mesa de trabajo

Priorización

Dotación

Dotación mínima módulos

Dotación especializada laboratorios

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**06**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**21**	**08**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00 am	**Hora Fin:**	11:00 am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN						
Asistentes:	MEN: Carlos Amaya, Enrique Luis Monroy, Johnson Cansario ANIM: Natalia Valencia, Lindsay Benites, Maira Alejandra Lozano, Juan Camilo Ramirez, Andres Navascues						
Agenda	1.Presentación PPT (Avances ANIM): - Núcleos Básicos - Presupuesto 2. Compromisos						

RESUMEN PRESENTACIÓN

La ANIM realiza la presentacion del programa del nucleo basico tanto para sede nueva como para la ampliacion de una sede existente,asi:
Sede Nueva: 23 mudulos, de los cuales 13 corresponden a aulas de clase con una capacidad de 400 sillas y los restante a modulos complementarios tales como: sala de sistemas baterias de baños, bienestar, Administracion y docentes, laboratorio, auditorio, cuarto tecnico, tienda alimentos, cuarto de aseo y basura. Asimismo, contempla una placa polideportiva y urbanismo.

Ampliaciacion de sede existente: 9 modulos, de los cuales 6 corresponden a aulas de clase con una capacidad 190 sillas, y los mosulos restantes a espacios como baños, administrativo y cuarto tecnico.

Se precisa que el nucleo basico presentado es de carácter indicativo para la estimacion de costos de los pryectos, toda vez que el tipo y cantidad de modulo debe corresponder a la necesidad planteada por las IES.

Seguidamente la ANIM explica la metodología empleada para la estimación de los presupuestos e indica los resultados del valor del metro cuadrado para los tres tipos de intervenciones previstas:
Sede Nueva: $ 6.576.395
Ampliación de sede: $ 6.748.837
ES en tu cole: $ 6.969.991

Compromisos			
Compromisos	**Responsable**	**Plazo**	**Estado**
VALMARÍA ANIM realizará seguimiento a la firma del convenio, el cual será entregado por la universidad el 26 de agosto de 2025.	ANIM	26/08/2025.	
FUNZA VES y la OIE llevarán el proyecto a comité de infraestructura para aprobar el alcance. Se hará seguimiento en el próximo comité. ANIM remitirá el modelo de convenio a la IES el 21 de agosto de 2025, con copia a la OIE.	VES y OIE	21/08/2025	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

ANIM deberá validar el número definitivo de sillas, conforme a las condiciones del proyecto, para el próximo comité			
SOACHA La IES deberá definir las necesidades del proyecto, considerando las fases requeridas, a más tardar el 10 de septiembre de 2025. ANIM hará seguimiento al estado de la titularidad del predio y al pago de impuestos por parte de la SAE, los cuales, según información suministrada, se resolverán durante la semana del 25 de agosto de 2025. ANIM revisará los linderos del predio para determinar el área efectiva disponible para el proyecto. Esta revisión se espera esté resuelta para el 25 de agosto de 2025. Se revisará en el próximo comité.	ANIM, IES, VES, OIE	25/08/2025 10/09/2025	
CALI El MEN deberá revisar el estado de compra del predio destinado al acceso del multicampus. Se hará seguimiento en el próximo comité. La IES deberá enviar a Fomento el documento con la necesidad para definir los requerimientos de cada fase. La OIE y el VES deberán apoyar la gestión, en caso de tratarse de recursos CAF.	MEN, IES		
VALLE DEL GUAMUEZ El MEN coordinará una reunión virtual con ANIM e IES para el 22 de agosto de 2025, con el objetivo de socializar los atributos de las aulas modulares. ANIM gestionará una visita al territorio durante la semana del 25 de agosto de 2025.	MEN, ANIM	22 y 25 de Agosto	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Se llevará a cabo una reunión con el gobernador del Guaviare el 22 de agosto de 2025 para definir la IES y el presupuesto aprobado. Se confirma una reunión entre ANIM y el MEN ese mismo día (22/08/2025) para acordar el alcance de la fase del proyecto. ANIM trabajará en una propuesta de implantación ajustada al número actualizado de beneficiarios, la cual deberá estar lista para la reunión del 22 de agosto de 2025. ANIM gestionará visita al territorio durante la semana del 25 de agosto de 2025. El MEN deberá coordinar con la ART el alcance y la responsabilidad correspondiente, y comunicarlo formalmente a ANIM. Se hará seguimiento en el próximo comité.	MEN, ANIM	22 y 25 de Agosto	
VILLETA El MEN deberá entregar a ANIM las necesidades del proyecto y la definición de la IES responsable. El MEN y ANIM gestionarán una reunión con las IES y el director de Fomento para la semana del 25 de agosto de 2025.	MEN, ANIM	25/08/2025	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

JAGUA DE IBIRICO ANIM sostendrá una reunión con la IES durante la semana del 25 de agosto de 2025 para socializar la viabilidad del proyecto.	ANIM	25/08/2025	
COMPROMISOS GENERALES			
El MEN deberá definir de manera urgente qué proyectos se ejecutarán con recursos de CAF y cuáles se gestionarán a través del programa “ES en tu cole”, teniendo como fecha límite el 10 de septiembre de 2025. Esta definición deberá presentarse en el próximo comité.	MEN	10/09/2025	
ANIM y el MEN trabajarán conjuntamente en un acercamiento de mercado con las IES para promover la estrategia de aulas modulares. Se hará seguimiento en el próximo comité.	MEN, ANIM		
El MEN adelantará el proceso para obtener la exención del GMF. La certificación deberá ser emitida por el banco, no por la fiduciaria. El MEN gestionará una reunión específica con Merlys (tesorera) y ANIM. Se hará seguimiento en el próximo comité.	MEN, ANIM		
El MEN solicitó a ANIM generar presupuestos discriminados por región o zona, con el objetivo de ajustar los costos de los módulos en función de las variaciones por transporte, mano de obra, materiales y equipos o maquinaria.	MEN, ANIM		
ANIM enviará el 21 de agosto de 2025 las solicitudes de información requeridas por la presentación del MEN para el seguimiento de infraestructura.	ANIM	21/08/2025	
ANIM solicita al MEN la realización de un comité técnico a más tardar el 27 de agosto de 2025.	MEN	27/08/2025	
Firmas Participantes:			
Se anexa lista de Asistencia			

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina Infraestructura Educativa.

Nombre del líder de la actividad: Carlos A. Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento contrato ANIM

Hora de inicio: 8:00 am | Hora de fin:

Fecha: 21-08-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Alirio Amaya Naranjo	OIE	13.720.203	camayan@mineducacion.	
2	ENRIQUE LUIS MONROY	OIE-MEN	1026264858	emonroym@ext.mined.	
3	Andrés Manrique	ANIM	80826042	amanrique@anim.gov.co	
4	Lindsay Benítez Barajas	ANIM	52.105.850	lbenitez@anim.gov.co	
5	Maira Alejandra Lozano Ruiz	ANIM	1018460233	mlozano@anim.gov.co	
6	Juan Camilo Ramirez C.	ANIM	1016962780	jramirez@anim.gov.co	
7	Natalia Valencia D	ANIM-Sub.Est	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
8	Jansen M. Cansero	OIE-MEN	79.617.831	jcansero@mineduc...	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

21 de Agosto de 2025

1


Núcleos básicos

Programa Núcleo Básico - Sede nueva

Institución nueva 400 sillas

13 módulos

1 placa polideportiva

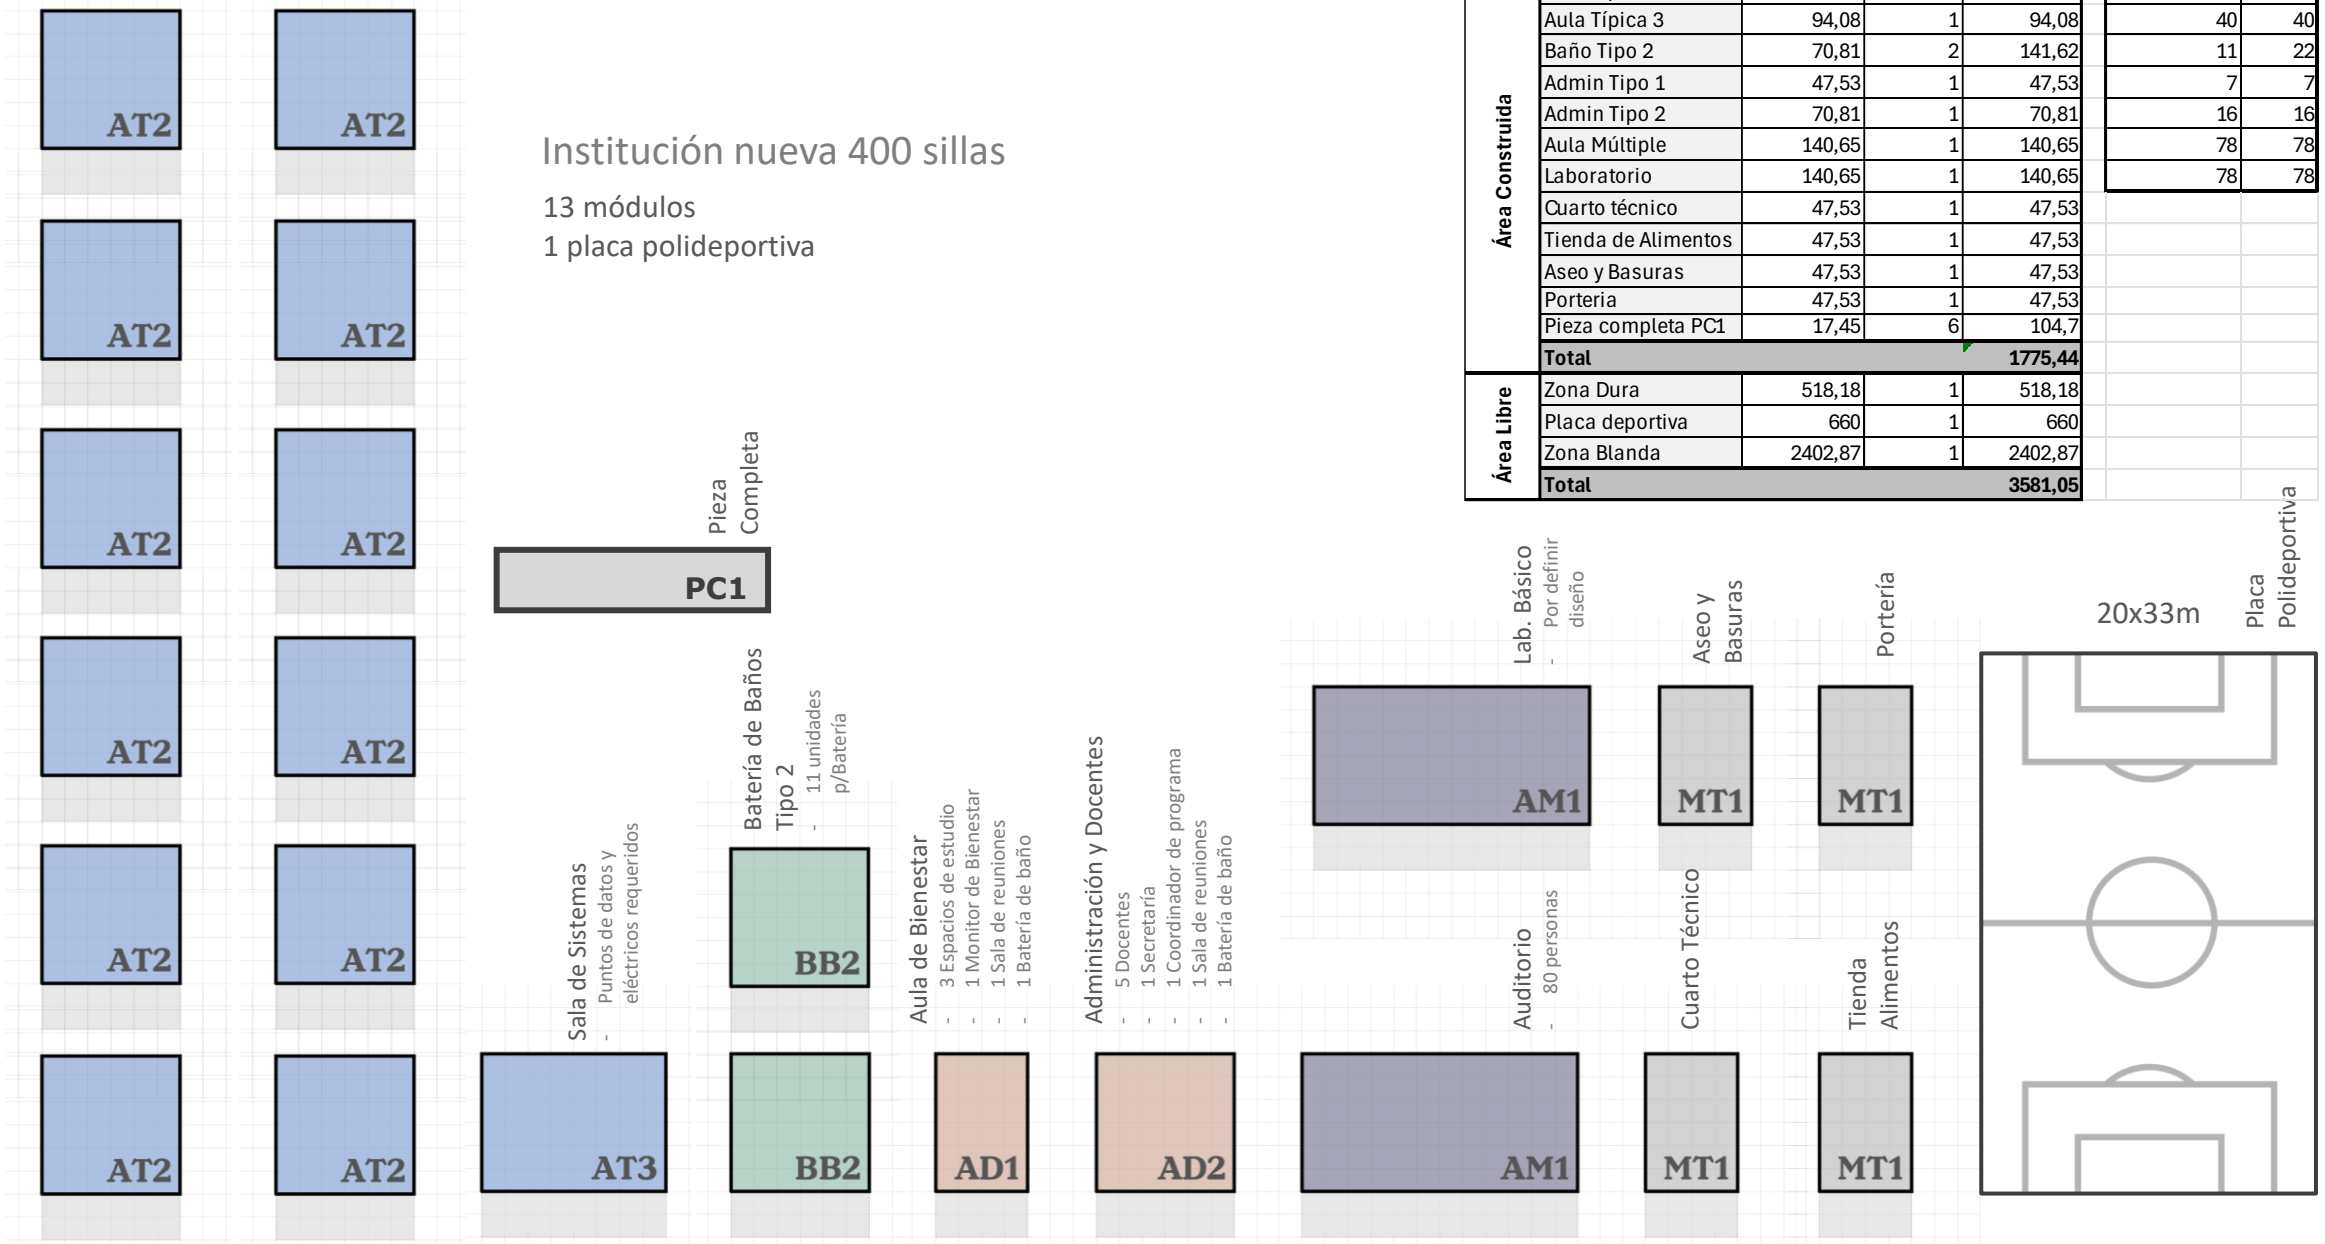

Núcleo Básico - Sede Nueva						
	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Construida	Aula Típica 2	70,44	12	845,28	30	360
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08	40	40
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62	11	22
	Admin Tipo 1	47,53	1	47,53	7	7
	Admin Tipo 2	70,81	1	70,81	16	16
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	78	78
	Laboratorio	140,65	1	140,65	78	78
	Cuarto técnico	47,53	1	47,53		
	Tienda de Alimentos	47,53	1	47,53		
	Aseo y Basuras	47,53	1	47,53		
	Porteria	47,53	1	47,53		
	Pieza completa PC1	17,45	6	104,7		
	Total			**1775,44**		
Área Libre	Zona Dura	518,18	1	518,18		
	Placa deportiva	660	1	660		
	Zona Blanda	2402,87	1	2402,87		
	Total			**3581,05**		

Programa - Ampliación

AT
Aulas Típicas


BB
Batería Baños

KT
Cocinas

AD
Administración

AM
Aulas Múltiples

MT
Módulo Técnico

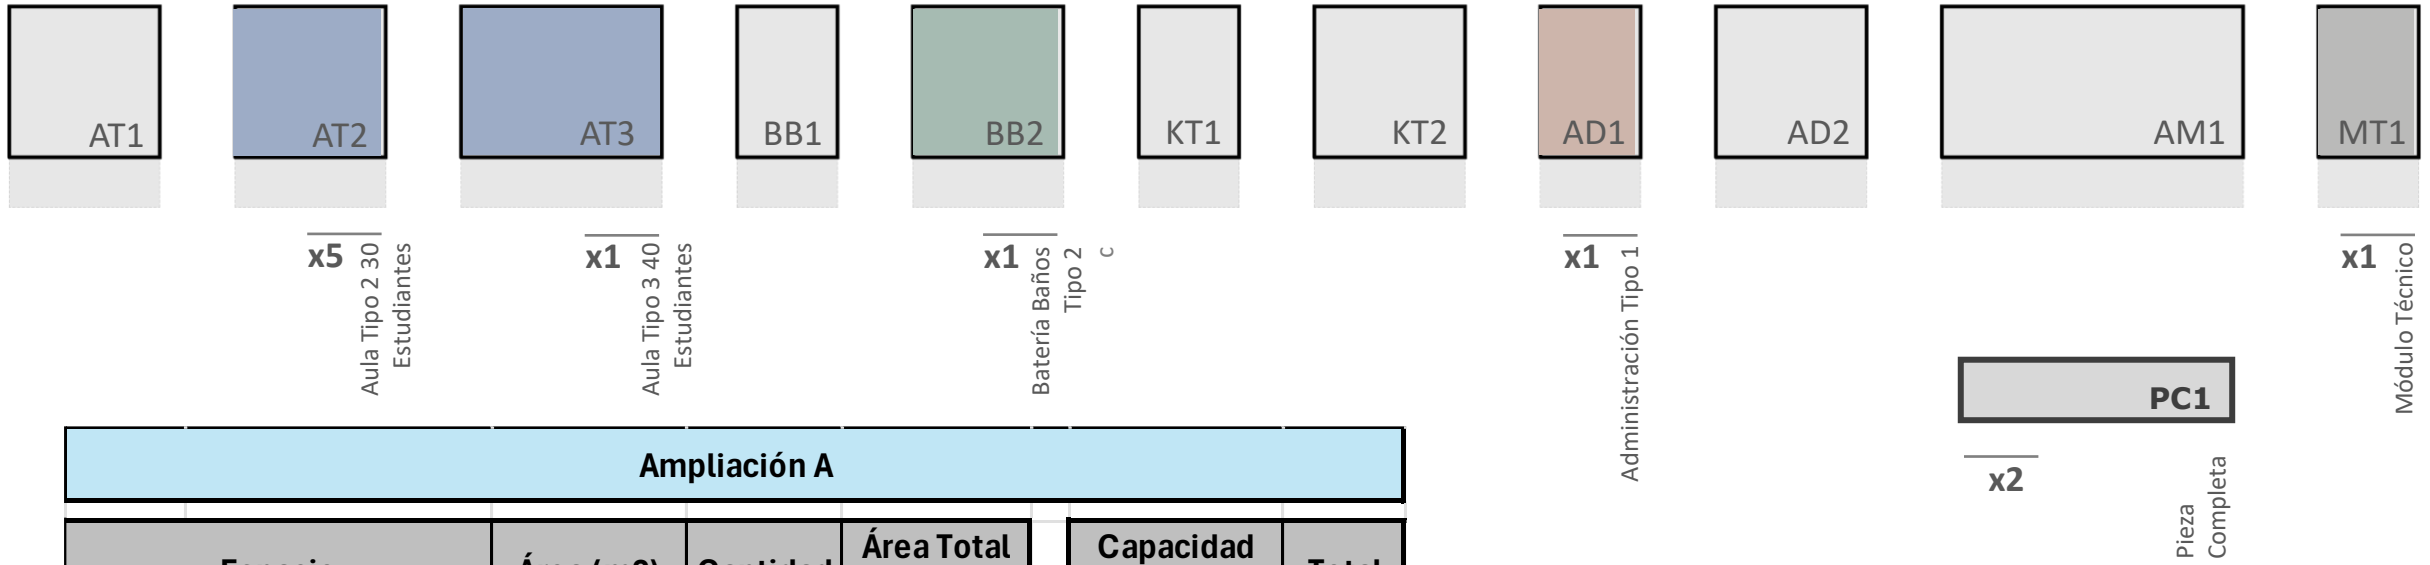

Ampliación A

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Construida	Aula Típica 2	70,44	5	352,2	30	150
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08	40	40
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81	11	11
	Admin Tipo 1	47,53	1	47,53	7	7
	Cuarto técnico	47,53	1	47,53		
	Pieza completa PC1	17,45	2	34,9		
	Total			**647,05**		
Área Libre	Zona Dura	304,5	1	304,5		
	Zona Blanda	1217,7	1	1217,7		
	Total			**1522,2**		

Programa Propuesta

190 sillas

- 1 Aula Tipo 3 - 40 sillas
- 5 Aulas Tipo 2 - 30 sillas

Programa - Ampliación

AT
Aulas Típicas


BB
Batería Baños

KT
Cocinas

AD
Administración

AM
Aulas Múltiples

MT
Módulo Técnico

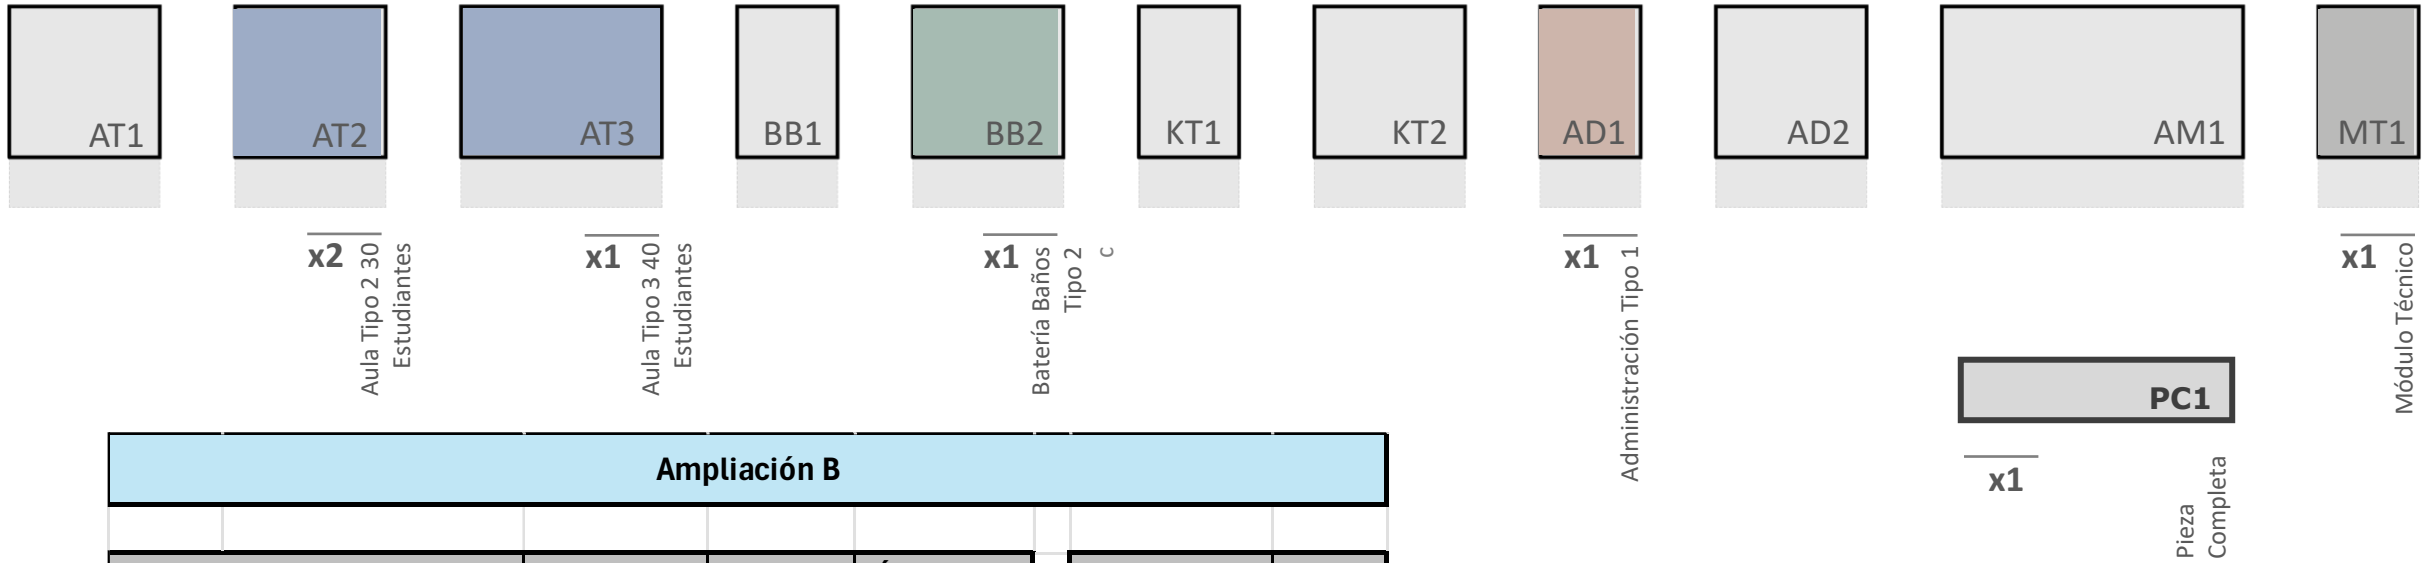

Ampliación B

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Construida	Aula Típica 2	70,44	2	140,88	30	60
	Aula Típica 3	94,08	1	94,08	40	40
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81	11	11
	Admin Tipo 1	47,53	1	47,53	7	7
	Cuarto técnico	47,53	1	47,53		
	Pieza completa PC1	17,45	1	17,45		
	Total			**418,28**		
Área Libre	Zona Dura	304,5	1	304,5		
	Zona Blanda	1217,7	1	1217,7		
	Total			**1522,2**		

Programa Propuesta

Colegio 100 sillas

- 1 Aula Tipo 3 - 40 sillas
- 2 Aulas Tipo 2 - 60 sillas

2

Presupuesto

3.1 Secuencia metodológica utilizada y matriz de presupuesto

Inicio a partir de las necesidades de cada sede	Cantidad y tipos de módulos Áreas Exteriores y características
Construcción de matriz de proyectos	Implantaciones Cálculo de Áreas a intervenir
Construcción de matriz de presupuesto	Valores unitarios y Totales Totalizadores y costos Indirectos

Activar Wi

3.2 Cálculo de los costos – Valores unitarios y Totales

Valores unitarios para actividades de cimentaciones y exteriores	Base de datos actividades Valores de referencia Costos de insumos y análisis de costos
Costos de construcción y suministro de módulos	Matriz de cantidades MEN Verificaciones con el modelo Costeo de Módulo

Activar Wind

3.3 Resultados – Presupuesto de los proyectos

Detalle	Área Módulos m2	Área Externa M2	Relación área módulos/área externa	Valor Total Estimado	Valor por m2
Sede Nueva	1.776	3.940	45%	$ 11.675.994.796	$ 6.576.395
Ampliación	648	1.675	39%	$ 4.366.835.135	$ 6.748.837
Es en tu Cole	419	1.675	25%	$ 2.915.408.079	$ 6.969.991

3.3 Resultados – Presupuesto de los proyectos

Detalle	Área Módulos m2	Área Externa M2	Valor Total Estimado	Valor por m2
Valmaría	2.055	3.212	$ 13.190.672.955	$ 6.271.566
Funza	1.647	3.532	$11.622.655.664	$ 7.052.625
Soacha	1.776	3.940	$ 11.675.994.796	$ 6.576.395
Cali	1.776	3.940	$ 12.250.994.796	$ 6.898.083

Resumen Primer grupo

3.4 Presupuesto general

Detalle	Proyecto	Interventoría	GAT	Total
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 15.639.538.700	$ 1.251.163.096	$ 1.013.442.108	**$ 17.904.143.904**
INSTALACIÓN DE AMBIENTES MODULARES PRIORIZADOS	$ 127.787.032.538	$ 10.222.962.603	$ 8.280.599.708	**$ 146.290.594.850**
CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL	$ 12.229.210.342	$ 978.336.827	$ 792.452.830	**$ 14.000.000.000**
DOTACIÓN	$ 218.378.756	$ 17.470.300	$ 14.150.943	**$ 250.000.000**
INSTALACIÓN DE AMBIENTES MODULARES - BOLSA	$ 81.124.393.335	$ 6.489.951.466	$ 5.256.860.688	**$ 92.871.205.490**
TOTALES	**$ 236.998.553.672**	**$ 18.959.884.293**	**$ 15.357.506.278**	**271.315.944.244**

Indicador de Transporte		
Hasta 100 km desde Bogotá	-	0%
Hasta 500 km desde Bogotá	0,08	8%
Hasta 1.200 km desde Bogotá	0,18	18%
Adicional por vía en mal estado	0,07	7%
Transporte fluvial	0,60	60%

Indicador de Seguridad o de Conflicto		
Sin Conflicto	-	0%
Conflicto Bajo	0,04	4%
Conflicto Medio	0,08	8%
Conflicto Medio Alto	0,12	12%
Conflicto Alto	0,20	20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

Análisis de Indicadores de Valores para alcance Sede Nueva

Área Módulos m2	Área Aulas m2	Aulas / Módulos %	Zonas Duras m2	Valor Total Estimado	Valor por m2 de Módulos	Valor por m2 de Aula
1.775	1.221	69 %	1.178	$12.330.814.991	$ 6.945.216	$ 10.101.761

Tabla de Indicadores de costos para Sede Nueva

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	07		Lugar:	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	28	08	2025	Hora Inicio:	8:00	Hora Fin:	11:00 am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento Proyectos ANIM-MEN						
Asistentes:	MEN: Carlos Amaya, Johnson Cansario, Enrique Luis Monroy, Juan Sebastian Romero ANIM: Juan Camilo Ramirez						
Agenda	Presentación PPT (Avances ANIM): Compromiso						

RESUMEN PRESENTACION

La ANIM realiza la presentación del estado de los proyectos donde menciona alertas y el paso a seguir y compromisos y presenta un cuadro con el estado de la información de cada proyecto

Por otra parte, la ANIM informa que para la estrategia ES en tu Colegio contacto al ETITC para la definición de las necesidades y documentación requerida para la estrategia.

Compromisos

Tema	Responsable	Plazo	Estado
VALMARÍA • El MEN deberá remitir formalmente a la ANIM el acta o documento en el que conste la priorización del proyecto Valmaría (y demás proyectos), incluyendo sus especificaciones. Este envío debe realizarse a más tardar el 29/08/2025. • La ANIM enviará el convenio con nuevas observaciones a la universidad el 01/09/2025, para avanzar en el proceso de firma.	ANIM	29/08/2025 01/09/2025	
FUNZA • El **VES y la OIE** presentarán el proyecto al Comité de Infraestructura con el fin de aprobar el alcance propuesto. Se realizará seguimiento en el próximo comité. • La ANIM remitirá el modelo de convenio a la IES el **28/08/2025**, con copia a la OIE.	VES y OIE	28/08/2025	
SOACHA • La ANIM coordinará una reunión con la IES durante la semana del 01/09/2025 para presentar la implantación funcional (módulos y edificio) y validar su conformidad. • La ANIM hará seguimiento al proceso de registro y titularidad del predio. Esta gestión también permitirá	ANIM	01/09/2025	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

confirmar el área real disponible y los requerimientos de servicios públicos. Se revisará el avance en el próximo comité.			
CALI • El MEN verificará el estado de adquisición del predio destinado al acceso del multicampus. Se realizará seguimiento en el próximo comité. • La IES deberá enviar la solicitud formal a la Subdirección de Fomento para definir los requerimientos por fase. La OIE y el VES apoyarán esta gestión, especialmente si el proyecto aplica a recursos CAF.	MEN, IES		
VALLE DEL GUAMUEZ • El MEN coordinará una reunión virtual con la ANIM y la IES para socializar los atributos de las aulas modulares. • La ANIM organizará una visita al territorio con la comunidad durante la semana del 15/09/2025.	MEN, ANIM	15/09/2025	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE • Se realizará reunión con el gobernador del Guaviare el 28/08/2025 para definir la IES seleccionada, los programas a implementar y el presupuesto aprobado. • La IES deberá entregar la propuesta final y el alcance del proyecto el 29/08/2025. • Se confirma reunión entre la ANIM y el MEN el 04/09/2025 para aclarar inquietudes planteadas por el gobernador. • La ANIM gestionará visita al territorio conforme a lo acordado en dicha reunión del 4 de septiembre.	MEN, ANIM, IES	28,29 de Agosto 04/09/2025	
VILLETA • La ANIM entregará al MEN una propuesta de implantación durante la semana del **01/09/2025**, con el objetivo de socializarla posteriormente con las IES y la Gobernación.	MEN, ANIM	01/09/2025	
JAGUA DE IBIRICO • La ANIM sostendrá reunión con la IES durante la semana del 01/09/2025 para socializar la viabilidad del proyecto.	ANIM	01/09/2025	
COMPROMISOS GENERALES			
• El MEN deberá definir con urgencia qué proyectos serán financiados a través de CAF y cuáles por medio de "Educación Superior en tu Colegio", teniendo como fecha límite el 10/09/2025. Esta definición será revisada en el próximo comité.	MEN	10/09/202	
• La ANIM y el MEN continuarán trabajando de manera conjunta en una estrategia de acercamiento de mercado con las IES para promocionar la estrategia ES en tu cole. Se dará seguimiento en el próximo comité.	MEN, ANIM		

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

• El MEN avanzará en la gestión de la exención del GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros). La profesional Ana Lucía (MEN-OIE) y el profesional Hernán (ANIM) coordinarán las acciones correspondientes. Se revisará avance en el próximo comité.	MEN, ANIM		
• El MEN solicitó a la ANIM presentar presupuestos desagregados por región o zona, con el fin de ajustar los valores de los módulos según condiciones logísticas, mano de obra, materiales, equipos y otros factores. Se espera avance de esta tarea en el próximo comité.	ANIM		
• La ANIM solicita al MEN la programación de un **comité técnico**, posterior a la modificación del contrato interadministrativo.	MEN		
• La ANIM solicitará formalmente al MEN una modificación en la forma de pago. Para ello, deberá remitir una comunicación con su justificación a más tardar el 29/08/2025.	MEN	29/08/2025	

Firmas Participantes:

Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa - MEN

Nombre del líder de la actividad: Carlos Alirio Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento Contrato ANIM

Hora de inicio: 8:00 | Hora de fin:

Fecha: 28/08/2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Alirio Amaya Naranjo	OIE	13.720.203	camayan@mineducacion.gov	
2	JOHNSON M. CANSECIO	OIE – MEN	79.687.831	JCANSECIO@MINEDUCAC...	
3	Juan Sebastian Romero	OIE-MEN	1007635310	jromerop@ext.mineduc...	
4	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462280	jramirez@anim.gov.co	
5	ENRIQUE LUIS MONROY	OIE-MEN	1026264858	emonroym@ext.mined...	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

28 de Agosto de 2025

AGENDA

1. Compromiso
2. Convenios IES
3. Estado de los proyectos
4. Presupuesto
5. ES en tu Colegio

1

Compromisos

Convenios IES

Que, bajo dicho contexto, el Ministerio de Educación Nacional indicó la priorización de proyectos por ejecutar en el marco del Contrato Interadministrativo a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM, mediante comité No. xxxx del xxxx de xxxx de 2025, especificando, la necesidad de construir en los puntos priorizados inicialmente de los municipios de xxxxxxxx, los ambientes modulares, con el fin de mejorar las condiciones de infraestructura física y de las IES públicas, que puedan fomentar la construcción de nuevas sedes, Multicampus o complejos de instituciones de educación superior públicas a fin de incrementar la cobertura de acceso inmediato a la educación superior en los municipios rurales.

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria




ID_208 Valmaría				
Espacio		**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Cubierta	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 1	47,53	1	47,53
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Técnico	47,53	2	95,06
	Pieza Comp. 1	17,45	6	104,7
	Total			**2081,41**
Área Libre	Zona Dura	605,08	1	605,08
	Zona Blanda	2756,29	1	2756,29
	Total			**3361,37**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.190.672.955**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	Diseño de implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad predial, acuerdo de implantación con la IES y primer acercamiento a Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Terminación del DRT(ANIM –MEN)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad antes de la publicación del proceso de contratación. (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

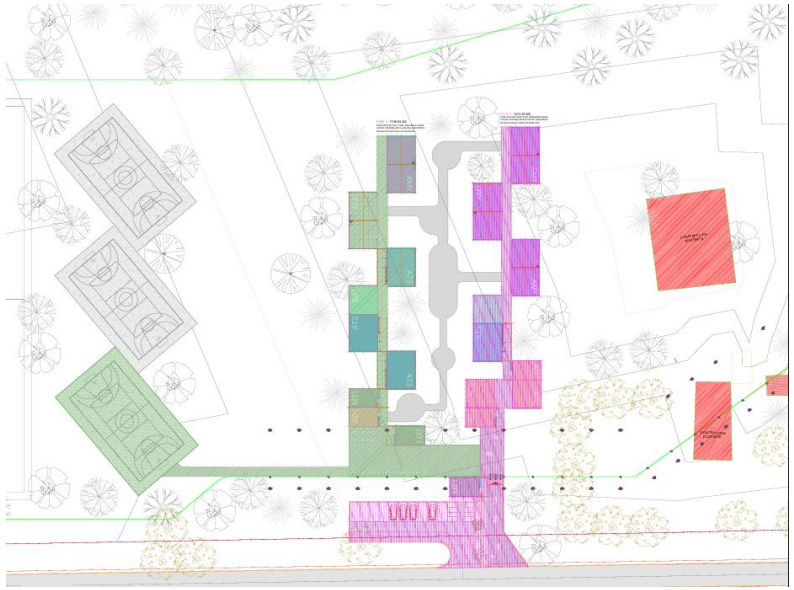


Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	4	376,32
	Aula Múltiple (AM1)	140,65	5	703,25
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	2	141,62
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Almacen / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cafetería (MT1)	47,53	1	47,53
	Total			**1647,99**
Área libre	Zona Dura (circulación exterior)	673,75	1	673,75
	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Parqueaderos motos	3,13	8	25,00
	Via parqueaderos	219,58	1	219,58
	Zona verde entrada	30,00	1	30,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanencia)	436,74	1	436,74
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2692,65
	Total			**4862,72**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 11.622.655.664**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Diseño de implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad predial Acuerdo de implantación con la IES.
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Falta: Constancia financiación, Acta Concejo Superior, Compromiso, Certificado no afectación

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha

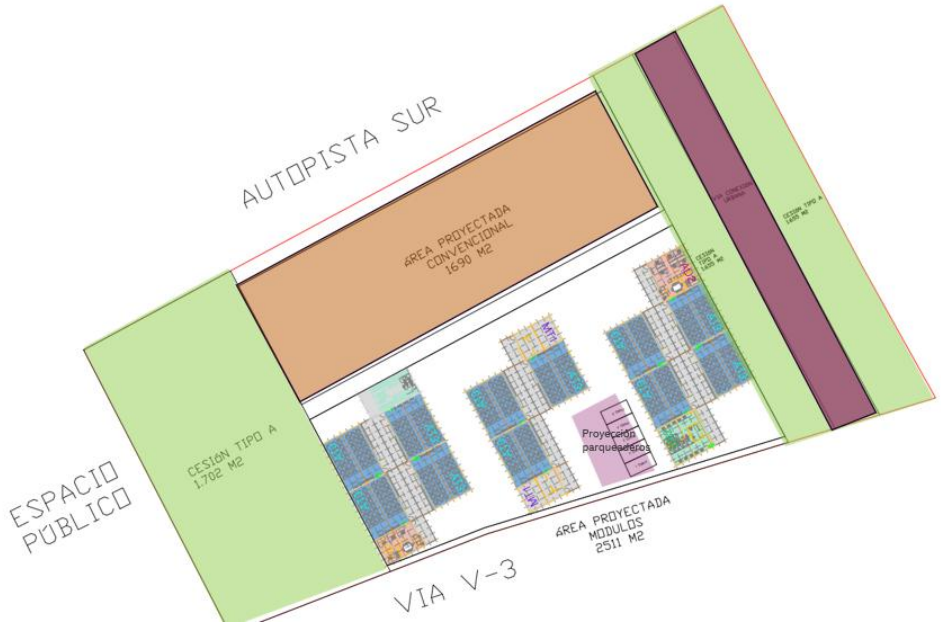

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
AREA CONSTRUIDA	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	11	1034,88	40	440
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	1	70,81		
	Baño Tipo 1 (BB1)	47,53	1	47,53		
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	1	47,53		
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	1	70,81		
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53		
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53		
	Total			**1366,62**		
	Parqueaderos carros 5	12,50	5	62,50		
	Via parqueaderos	89,00	1	89,00		
	Zona dura (elementos de urban	115,74	1	714,61		
	Zona verde paisaje	234,00	1	2064,00		
	Total			**2930,11**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 11.675.994.796**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	440 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa.
SIGUIENTE PASO	Adelantar el presupuesto y presentarle oficialmente a la IE la implantación. (ANIM-MEN)
ALERTAS	No se tienen las escrituras. (IES) La necesidad presentada en soluciones Modulares excede el área disponible. No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES).

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_030 Cali




uente: Documento compartido por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.250.994.796**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa. Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones.
SIGUIENTE PASO	Presentar el esquema básico a la IES (MEN-ANIM)
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES) Definir si el proyecto va por CAF o no (MEN)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

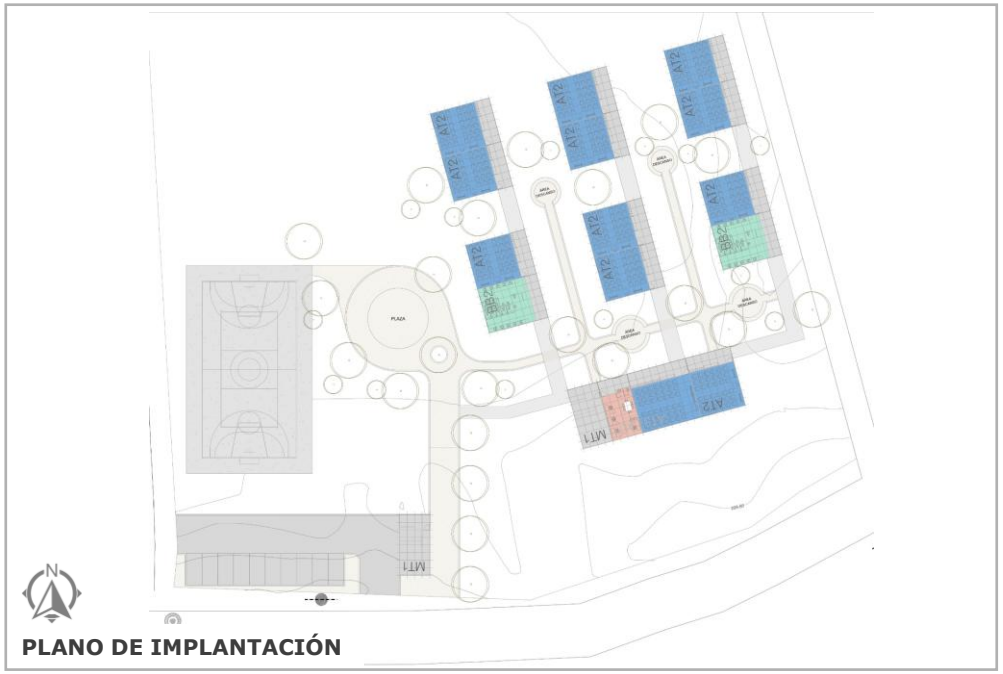


PLANO DE IMPLANTACIÓN

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 2 (AT2)	70,44	11	774,84
	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	194,76	1	194,76
	Total			**1442,95**
ÁREA LIBRE	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Via parqueaderos	253,00	1	253,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanenc	436,74	1	714,61
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2064,00
	Total			**3816,61**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 9.788.371.535**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	370 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial y una aproximación a la implantación básica.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM. (ANIM-MEN) Visitas de campo y aproximación a la comunidad.(ANIM)
ALERTAS	Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

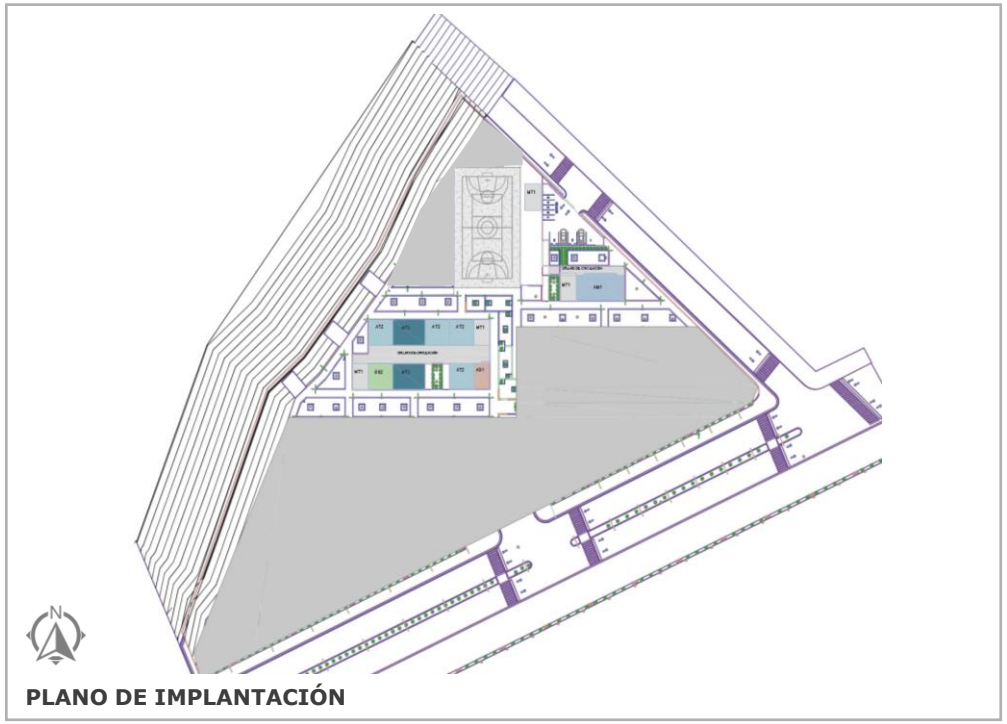

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare						
Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	4	281,76	30	120
	Aula Típica 3	94,08	2	188,16	40	80
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81		
	Técnico	47,53	8	380,24		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53	7	7
	Tecnico	47,53	4	190,12		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	80	80
	Total			**1299,27**		
Área Libre	Zona Dura	1080	1	1080		
	Zona Blanda	887	1	3137		
	Parqueadero	186,18	1	186,18		
	Placa Polideportiva	660	1	660		
	Total			**5063,18**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 9.019.129.709**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	200
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad catastral y jurídica, la Gobernación ha venido adelantando los diseños.
SIGUIENTE PASO	Definir las fases del proyecto Fase 1 (200 sillas). (ANIM)
ALERTAS	Disminuyó la capacidad aprobada La gobernación manifiesta que se encargará de los diseños y términos de referencia de la contratación.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.250.994.796**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial y normativa. La gobernación envío las necesidades ajustada al módulo básico. Ya se tiene la IES líder identificada UPN.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación (ANIM) Gestionar la coordinación de las IES (MEN)
ALERTAS	Está en un plan parcial.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	La Jagua de Ibirico, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	$ 12.250.994.796
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La ANIM revisó la información entregada por la IES.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación y presentarla oficialmente a la IES (ANIM)
ALERTAS	Falta el concepto de uso del suelo de la alcaldía. La IES presenta dudas respecto a que los módulos de madera no tengan Aire acondicionado.

4

Estado Información

ID	Región	Departamento	Municipio	Universidad	Estrategia	Intervención	Avance
ID_021	ANDINA	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	CONVENCIONAL	Estudios y Diseños	50,0%
	ANDINA	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca- UDEC	CONVENCIONAL	Obra Modulares	50,0%
ID_216	PACIFICA	Cauca	Plateado	Por Definir	DOTACIÓN	Dotación	12,5%
ID_009	CARIBE	Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	MODULARES	Obra Modulares	81,3%
ID_030	PACIFICA	Valle del Cauca	Cali	(Posiblemente Itenalco)	MODULARES	Obra Modulares	25,0%
ID_033	ANDINA	Antioquia	Arboletes	Universidad de Antioquia	MODULARES	Obra Modulares	87,5%
ID_079	CARIBE	Sucre	Majagual	Universidad de Sucre	MODULARES	Obra Modulares	56,3%
ID_128	ANDINA	Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	MODULARES	Obra Modulares	62,5%
ID_147	ANDINA	Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central	MODULARES	Obra Modulares	50,0%
ID_153	ANDINA	Bogotá D.C. *Corrección de Departamento.	Bogotá D. C. (BIC - Paiba)	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	MODULARES	Obra Modulares	62,5%
ID_165	AMAZONICA	Putumayo	Valle Guamuez	Gobernación del Putumayo	MODULARES	Obra Modulares	31,3%
ID_208	ANDINA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	MODULARES	Obra Modulares	87,5%
ID_209	ANDINA	Bogotá D.C. IPN	Bogotá D.C	Universidad Pedagógica Nacional	MODULARES	Obra Modulares	62,5%
ID_210	ANDINA	Cundinamarca	Fusagasugá	Universidad Pedagógica Nacional	MODULARES	Obra Modulares	87,5%
ID_215	AMAZONICA	Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	MODULARES	Obra Modulares	81,3%

ES en tu Colegio

Llamadas a las IES

ETITC

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**08**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**08**	**09**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00	**Hora Fin:**	10:00am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento de proyectos ANIM-MEN						
Elaboró:	Juan Camilo Ramírez						
Asistentes:	MEN: Carlos A Amaya ANIM: Juan amilo Ramírez, Natalia Valencia						
Agenda	a. Compromisos b. Administrativo c. Presupuesto d. Estado de los Proyectos e. ES en tu Colegio						
	2. Revisión nuevos compromisos						

TEMAS TRATADOS

Se inicia la reunión con la presentación de los compromisos de la mesa anterior, en donde desde el componente administrativo de la ANIM se manifiesta lo siguiente:

- Modificación del contrato
- Bolsa de recursos
- Citación de comité operativo para:
- Aprobación de manual operativo,
- Precios de selección 1 Para 4 proyectos,
- Estudio de suelos, estudio de carga
- Juan Guillermo

Se realiza la presentación del presupuesto

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Indicador de Transporte		
Hasta 100 km desde Bogotá	-	0%
Hasta 500 km desde Bogotá	0,08	8%
Hasta 1.200 km desde Bogotá	0,18	18%
Adicional por vía en mal estado	0,07	7%
Transporte fluvial	0,60	60%

Indicador de Seguridad o de Conflicto		
Sin Conflicto	-	0%
Conflicto Bajo	0,04	4%
Conflicto Medio	0,08	8%
Conflicto Medio Alto	0,12	12%
Conflicto Alto	0,20	20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

Se presenta el estado general de los proyectos de Valmaría, Funza, Soacha, Cali Valle del Guamuez, San Jose de Guaviare, Villeta y la Jagua.

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
CREM Tierralta	Tierralta	Revisión	CREM	-	-

Firmas Participantes:

Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina infraestructura educativa
Nombre del lider de la actividad: Carlos Diego Amaya Naranjo
Tema: Seguimiento Contrato ANIM
Hora de inicio: 8:00 AM Hora de fin: 10:00 AM
Fecha: 8 Septiembre 2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Amaya Naranjo	OIE-MEN	13.720.203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462280	jcramirez@anim.gov.co	
3	Natalia Valencia	ANIM	52849032	anvalencia@anim.gov.co	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

08 de Septiembre de 2025

AGENDA

1. Compromiso
2. Administrativo
3. Presupuesto
4. Estado de los proyectos
5. ES en tu Colegio

1

Compromisos

2

Administrativos

Modificación del contrato
Bolsa de recursos
Citación de comité operativo para:

- Aprobación de manual operativo,
- Precios de selección 1 Para 4 proyectos,
- Estudio de suelos, estudio de carga
- Juan Guillermo

Presupuesto

Indicador de Transporte		
Hasta 100 km desde Bogotá	-	0%
Hasta 500 km desde Bogotá	0,08	8%
Hasta 1.200 km desde Bogotá	0,18	18%
Adicional por vía en mal estado	0,07	7%
Transporte fluvial	0,60	60%

Indicador de Seguridad o de Conflicto		
Sin Conflicto	-	0%
Conflicto Bajo	0,04	4%
Conflicto Medio	0,08	8%
Conflicto Medio Alto	0,12	12%
Conflicto Alto	0,20	20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

Análisis de Indicadores de Valores para alcance Sede Nueva

Área Módulos m2	Área Aulas m2	Aulas / Módulos %	Zonas Duras m2	Valor Total Estimado	Valor por m2 de Módulos	Valor por m2 de Aula
1.775	1.221	69 %	1.178	$12.330.814.991	$ 6.945.216	$ 10.101.761

Tabla de Indicadores de costos para Sede Nueva

	Departamento	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Metálico	Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 12.243.261.875	$ 12.977.857.588
	Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 12.985.298.223	$ 13.764.416.117
	Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	$ 13.030.465.780	$ 13.812.293.727
	Valle del Cauca	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 12.808.173.600	$ 13.576.664.016
				$ 51.067.199.479	$ 54.131.231.447


	Departamento	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Madera	Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 9.511.342.152	$ 10.082.022.681
	Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 11.904.268.528	$ 12.618.524.640
	Putumayo	Valle Guamuez	Gobernación del Putumayo	$ 11.904.268.528	$ 12.618.524.640
	Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 23.482.835.807	$ 25.638.560.134
				$ 56.802.715.015	$ 60.957.632.095

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 107.869.914.494	$ 115.088.863.542
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 30.140.080.648	$ 31.201.731.308
Presupuesto proyectos convencionales	$ 13.207.547.170	$ 14.000.000.000
Restante + Presupuesto convencional	$ 43.347.627.817	$ 45.201.731.308
Número de proyectos adicionales		3,53

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

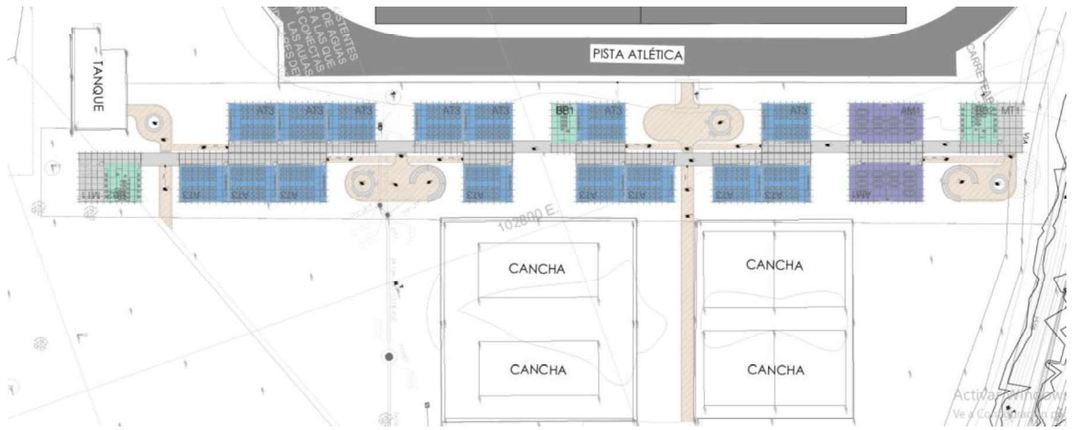


ID_208 Valmaría				
Espacio		**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Cubierta	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 1	47,53	1	47,53
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Técnico	47,53	2	95,06
	Pieza Comp. 1	17,45	6	104,7
	Total			**2081,41**
Área Libre	Zona Dura	605,08	1	605,08
	Zona Blanda	2756,29	1	2756,29
	Total			**3361,37**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.812.293.727**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	DRT Y TR.
COMENTARIOS	Se está adelantando la firma del Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Terminación del DRT(ANIM –MEN)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad antes de la publicación del proceso de contratación. (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

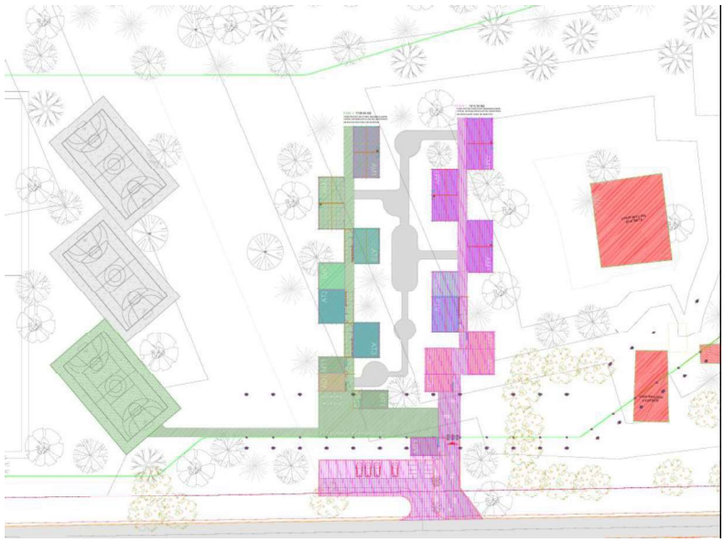


Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	4	376,32
	Aula Múltiple (AM1)	140,65	5	703,25
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	2	141,62
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Almacen / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cafetería (MT1)	47,53	1	47,53
	Total			**1647,99**
Área libre	Zona Dura (circulación exterior)	673,75	1	673,75
	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Parqueaderos motos	3,13	8	25,00
	Via parqueaderos	219,58	1	219,58
	Zona verde entrada	30,00	1	30,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanencia)	436,74	1	436,74
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2692,65
	Total			**4862,72**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.764.416.117**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Diseño de implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se están adelantando visitas y revisión de convenio.
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Falta: Constancia financiación, Acta Concejo Superior, Compromiso, Certificado no afectación. Se debe solicitar un aumento de carga.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha

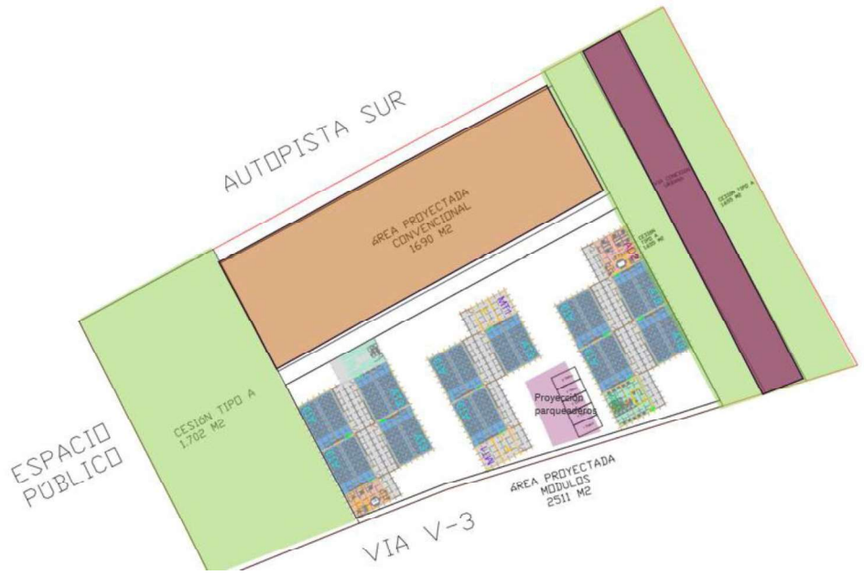


Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
AREA CONSTRUIDA	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	11	1034,88	40	440
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	1	70,81		
	Baño Tipo 1 (BB1)	47,53	1	47,53		
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	1	47,53		
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	1	70,81		
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53		
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53		
	Total			**1366,62**		
	Parqueaderos carros 5	12,50	5	62,50		
	Via parqueaderos	89,00	1	89,00		
	Zona dura (elementos de urban	115,74	1	714,61		
	Zona verde paisaje	234,00	1	2064,00		
	Total			**2930,11**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.977.857.588**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	440 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa.
SIGUIENTE PASO	Adelantar el presupuesto y convenio interadministrativo.
ALERTAS	Existen diferencia en áreas d ellos lotes, se deben esperar la escrituras y saneamiento No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES).

4. Avance de proyectos – Sede Nueva


ID_030 Cali

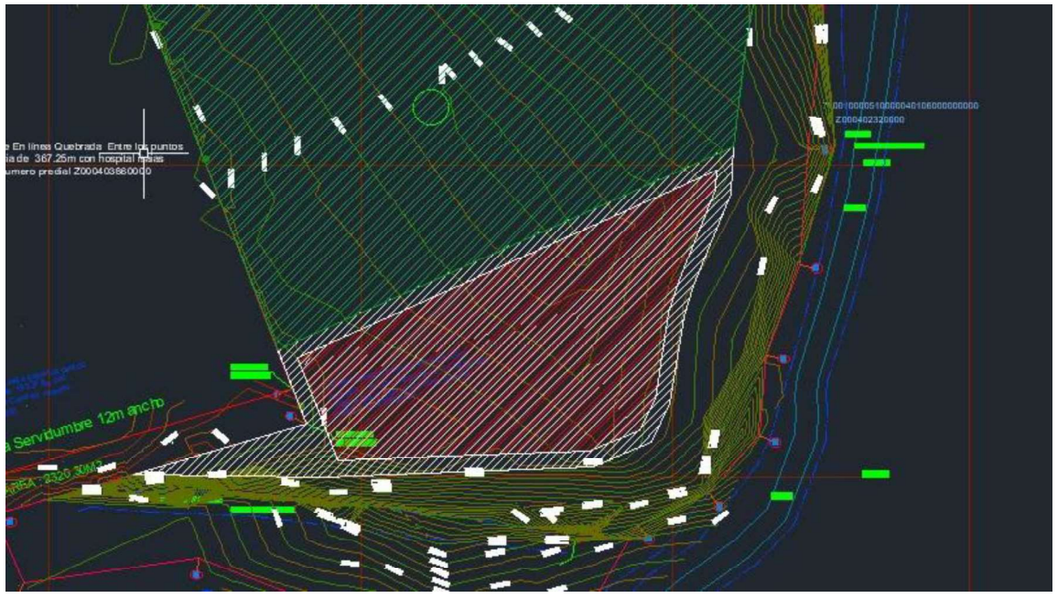

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.576.664.016**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial, normativa. Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones. 6.770 m2 área útil
SIGUIENTE PASO	Presentar el esquema básico a la IES (MEN-ANIM)
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES) Definir si el proyecto va por CAF o no (MEN)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

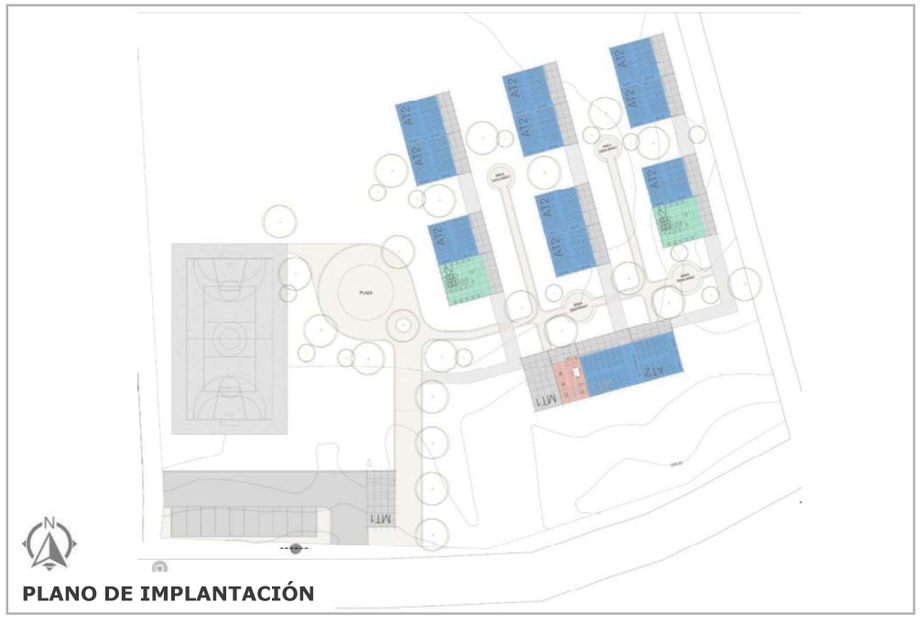


PLANO DE IMPLANTACIÓN

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 2 (AT2)	70,44	11	774,84
	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	194,76	1	194,76
	Total			**1442,95**
ÁREA LIBRE	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Via parqueaderos	253,00	1	253,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanenc	436,74	1	714,61
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2064,00
	Total			**3816,61**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 10.082.022.681**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	370 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene viabilidad predial y una aproximación a la implantación básica.
SIGUIENTE PASO	Revisión de la implantación propuesta por ANIM. (IES) Visitas de campo y aproximación a la comunidad.(ANIM)
ALERTAS	Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

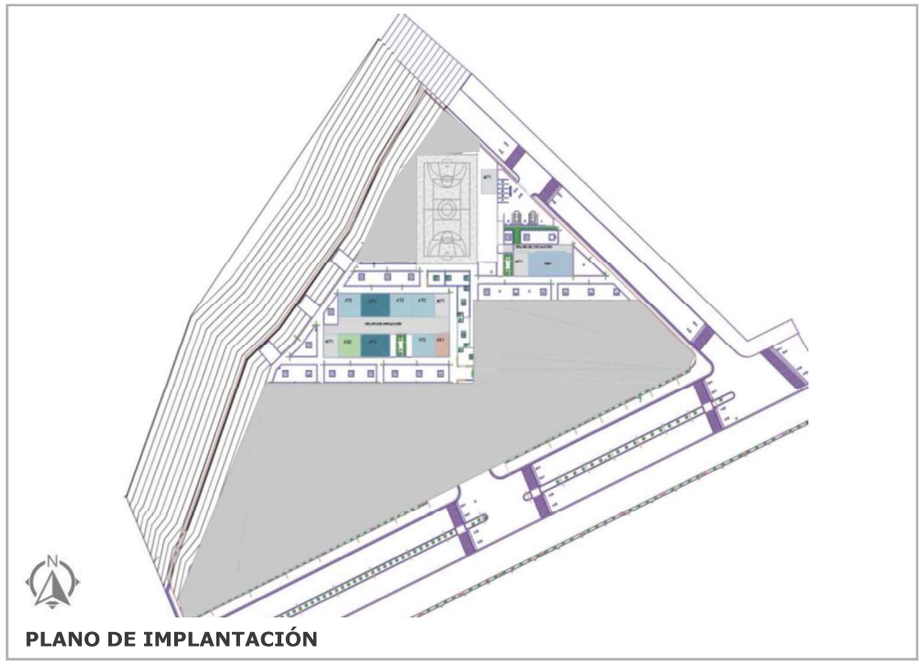

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare						
Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	4	281,76	30	120
	Aula Típica 3	94,08	2	188,16	40	80
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81		
	Técnico	47,53	8	380,24		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53	7	7
	Tecnico	47,53	4	190,12		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	80	80
	Total			**1299,27**		
Área Libre	Zona Dura	1080	1	1080		
	Zona Blanda	887	1	3137		
	Parqueadero	186,18	1	186,18		
	Placa Polideportiva	660	1	660		
	Total			**5063,18**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 9.568.394.708**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	200
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad catastral y jurídica, la Gobernación ha venido adelantando los diseños.
SIGUIENTE PASO	Definir la continuidad del proyecto
ALERTAS	Disminuyó la capacidad aprobada Se debe determinar la continuidad del proyecto.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.618.524.639**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	La gobernación envío las necesidades ajustada al módulo básico. Ya se tiene la IES líder identificada UPN.
SIGUIENTE PASO	Visitas de campo
ALERTAS	Está en un plan parcial. Diferencias entre el PP y el ultimo levantamiento

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	La Jagua de Ibirico, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	**$ 12.618.524.639**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La ANIM revisó la información entregada por la IES.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación y presentarla oficialmente a la IES (ANIM)
ALERTAS	Falta el concepto de uso del suelo de la alcaldía. La IES presenta dudas respecto a que los módulos de madera no tengan Aire acondicionado.



ES en tu Colegio

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
CREM Tierralta	Tierralta	Revisión	CREM	-	-

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**09**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**11**	**09**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00	**Hora Fin:**	10:00am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento de proyectos ANIM-MEN						
Elaboró:	Juan Camilo Ramírez						
Asistentes:	MEN: Carlos A. Amaya, Carolina Sánchez, Jorge A. Soto, Johnson Cansario, ANIM: Juan Camilo Ramírez, Natalia Valencia						
Agenda	1. Presentación PPT (Avances ANIM): a. Administrativo b. Presupuesto c. Estados de Proyectos d. ES en tu Colegio						
	2. Revisión nuevos compromisos						

Compromisos Mesa de seguimiento de proyectos 11 de Septiembre			
TEMA	**RESPONSABLE**	**PLAZO**	**ESTADO**
VALMARÍA • ANIM realizará seguimiento a la firma del convenio, el cual será enviado por la universidad en los próximos días.	ANIM		
FUNZA • La VES y la OIE presentarán el proyecto en comité de infraestructura para aprobación del alcance. Se hará seguimiento en el próximo comité.	VES y OIE		
SOACHA	ANIM		

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

• ANIM hará seguimiento al registro y titularidad del predio. Esta información permitirá conocer el área real y aspectos relacionados con los servicios públicos. Se dará seguimiento en el próximo comité. • ANIM enviará a la jefe de la OIE, Carolina Sánchez, la información sobre el área aferente del proyecto, con el fin de adelantar los trámites pertinentes ante la SAE, considerando que el área identificada es menor a la esperada.			
CALI • El MEN deberá revisar el estado de compra del predio destinado para el acceso al multicampus. Se hará seguimiento en el próximo comité. • La IES deberá remitir a la Dirección de Fomento la necesidad de infraestructura por fases. En caso de requerirse trámite ante el CAF, la OIE y la VES deberán apoyar dicha gestión.	MEN, IES		
VALLE DEL GUAMUEZ • Se continuará el proceso de socialización del diseño con estructura metálica con los diferentes actores institucionales. • Considerando que la gobernación no participó en la última socialización, se acordó incluirla en adelante en esta dinámica de concertación.			
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE • Se está a la espera de respuesta formal por parte de la Gobernación y la IES. Se hará seguimiento.	MEN, ANIM, IES		

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

VILLETA • ANIM enviará la propuesta de convenio para su revisión.	ANIM		
JAGUA DE IBIRICO • ANIM culminará el ejercicio de implantación del proyecto. • Se programará una visita de campo por parte de ANIM durante la semana del 15/09/2025. • ANIM iniciará la estructuración del contrato interadministrativo respectivo.	ANIM	15/09/2025	
COMPROMISOS GENERALES			
• ANIM y el MEN continuarán articulando esfuerzos para lograr un acercamiento con las IES, con el fin de promover la estrategia de implementación de aulas modulares. Se hará seguimiento en el próximo comité.	MEN, ANIM		
• El MEN adelantará el proceso de exención del GMF. La profesional **Ana Lucía (MEN – OIE)** y el profesional **Hernán (ANIM)** coordinarán las acciones necesarias para su gestión. Se verificará avance en el siguiente comité	MEN, ANIM		
• MEN solicita a ANIM la elaboración de presupuestos regionalizados, con el objetivo de aterrizar los costos de los módulos, considerando las variaciones asociadas a transporte, mano de obra, materiales, equipos, maquinaria y otros. ANIM presentará un avance de este ejercicio en el próximo comité.	MEN, ANIM		
• ANIM entregará presupuestos específicos correspondientes a las intervenciones priorizadas	ANIM		
• Se establecerá una mesa de trabajo para hacer seguimiento a la entrega oportuna de las necesidades por parte de las universidades.	MEN		
• ANIM solicita al MEN convocar un comité técnico una vez se formalice la modificación del contrato interadministrativo.	MEN		

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Firmas Participantes:
Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa.
Nombre del líder de la actividad: Carlos Amaya Naranjo
Tema: Seguimiento contrato 11-09-2025
Hora de inicio: 8:00 Hora de fin:
Fecha: 11-09-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Amaya Naranjo	OIE	13720203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Natalia Valencia	ANIM - Sub. Estruct	3164727328	nvalencia@animgov.co	
3	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462780	jramirez@anim.gov.co	
4	JOSE ALFREDO SOTO	MEN-CAF	88209480	jasoto@gmail.com	
5	JOHNSON M. CANSARIO	OIE-MEN	79.617.831	JCANSARIO@MINEDU...	
6	Caolina Sanchez.	OIE - MEN.	52809328	Casanchezm	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

u consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa.

Nombre del lider de la actividad: Carlos Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento contrato 11-09-2025

Hora de inicio: 8:00 | Hora de fin:

Fecha: 11-09-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Amaya Naranjo	OIE	13720203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Natalia Valencia	ANIM - Sub. Estruct	3164727328	nvalencia@anim.gov.co	
3	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018461280	jramirez@anim.gov	
4	JOSE ALFREDO SOTO	MGN - CAF	88209480	javadot@gmail.com	
5	JOHNSON M. CANSARIO	OIE - MEN	79.617.831	JCANSARIO@MINEDU...	
6	Paolina Sánchez.	OIE - MEN.	52809328	Casanchezm	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

11 de septiembre de 2025

AGENDA

1. Compromiso
2. Administrativo
3. Presupuesto
4. Estado de los proyectos
5. ES en tu Colegio

1

Compromisos

2

Administrativos

Modificación del contrato
Bolsa de recursos
Citación de comité operativo para:

- Aprobación de manual operativo,
- Precios de selección 1 Para 4 proyectos,
- Estudio de suelos, estudio de carga
- Juan Guillermo.

Presupuesto

Indicador de Transporte		
Hasta 100 km desde Bogotá	-	0%
Hasta 500 km desde Bogotá	0,08	8%
Hasta 1.200 km desde Bogotá	0,18	18%
Adicional por vía en mal estado	0,07	7%
Transporte fluvial	0,60	60%

Indicador de Seguridad o de Conflicto		
Sin Conflicto	-	0%
Conflicto Bajo	0,04	4%
Conflicto Medio	0,08	8%
Conflicto Medio Alto	0,12	12%
Conflicto Alto	0,20	20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

Análisis de Indicadores de Valores para alcance Sede Nueva


Área Módulos m2	Área Aulas m2	Aulas / Módulos %	Zonas Duras m2	Valor Total Estimado	Valor por m2 de Módulos	Valor por m2 de Aula
1.775	1.221	69 %	1.178	$12.330.814.991	$ 6.945.216	$ 10.101.761

Tabla de Indicadores de costos para Sede Nueva

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

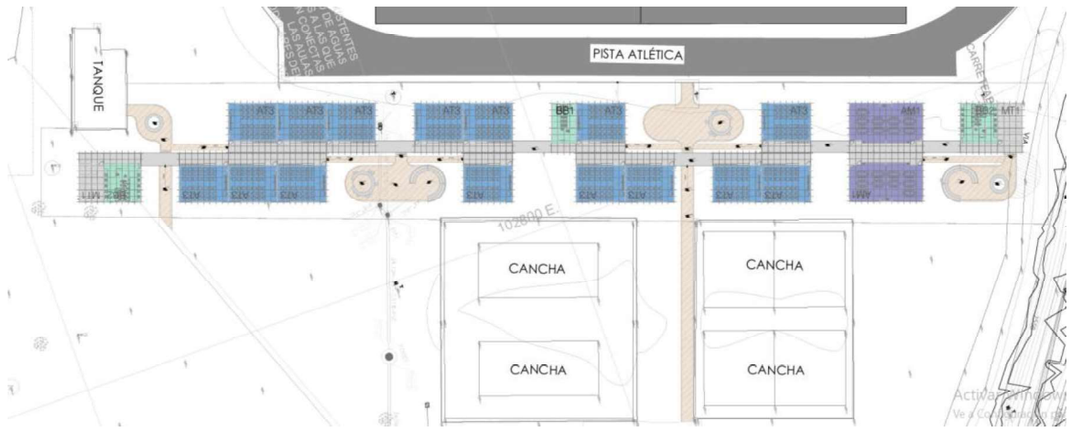


ID_208 Valmaría				
Espacio		**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Cubierta	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 1	47,53	1	47,53
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Técnico	47,53	2	95,06
	Pieza Comp. 1	17,45	6	104,7
	Total			**2081,41**
Área Libre	Zona Dura	605,08	1	605,08
	Zona Blanda	2756,29	1	2756,29
	Total			**3361,37**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.812.293.727**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	DRT Y TR.
COMENTARIOS	Se está adelantando la firma del Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Publicación (ANIM)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

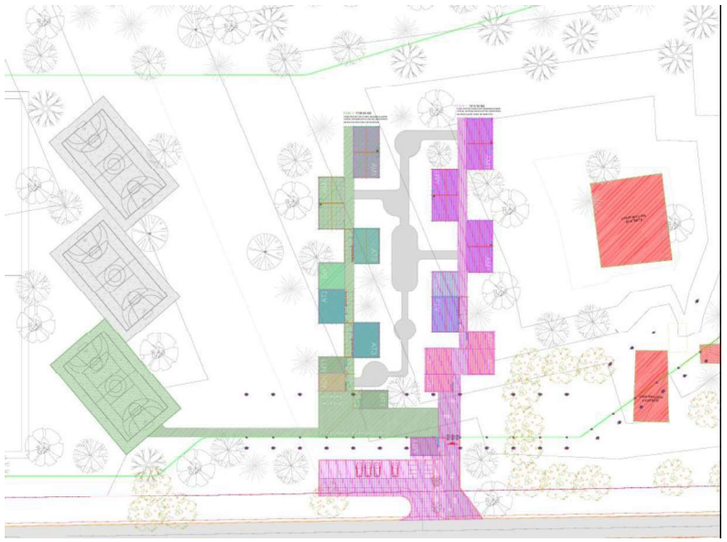

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	4	376,32
	Aula Múltiple (AM1)	140,65	5	703,25
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	2	141,62
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Almacen / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cafetería (MT1)	47,53	1	47,53
	Total			**1647,99**
Área libre	Zona Dura (circulación exterior)	673,75	1	673,75
	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Parqueaderos motos	3,13	8	25,00
	Via parqueaderos	219,58	1	219,58
	Zona verde entrada	30,00	1	30,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanencia)	436,74	1	436,74
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2692,65
	Total			**4862,72**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.764.416.117**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	TR y DRT.
COMENTARIOS	Se están adelantando visitas y revisión de convenio.
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Falta: Constancia financiación, Acta Concejo Superior, Compromiso, Certificado no afectación. Se debe solicitar un aumento de carga.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.977.857.588**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	440 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Se acordó la implantación con la IES.
SIGUIENTE PASO	Adelantar el presupuesto y convenio interadministrativo.
ALERTAS	Existen diferencia en áreas de los lotes, se deben esperar la escrituras y saneamiento. No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES).

4. Avance de proyectos – Ampliación PREDIO 2

Universidad de Cundinamarca – UDEC – OPCION A – 12 Módulos




PLANO DE IMPLANTACIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	3.724 m2
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	480 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES
COMENTARIOS	Se encuentra en viabilidad predial y aprobación de la implantación básica.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM. (ANIM-MEN)
ALERTAS	La IES esta pendiente de enviar documentos para revisión del predio.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva


ID_030 Cali

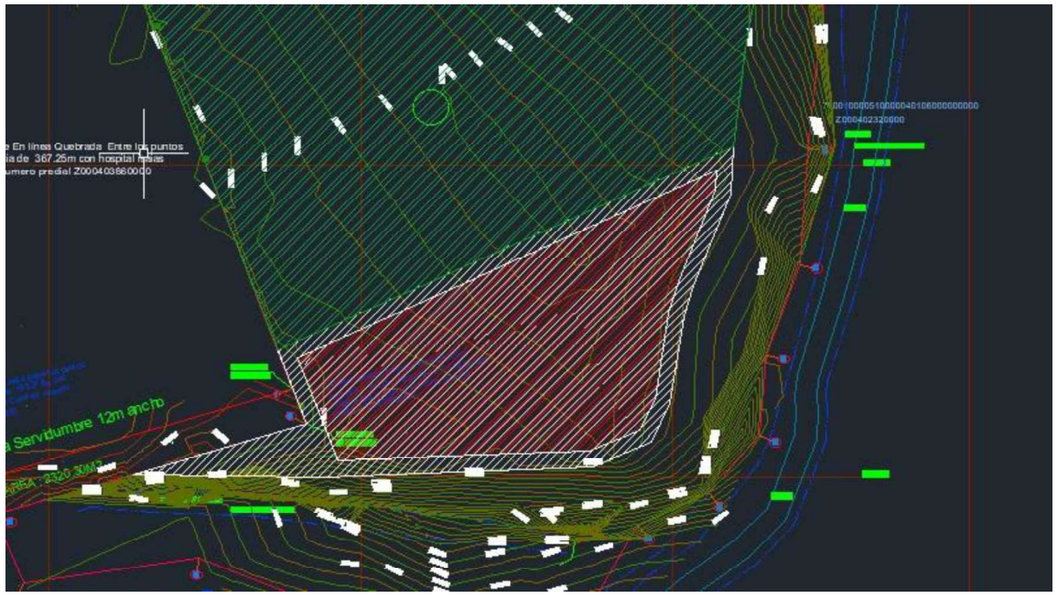

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.576.664.016**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Implantación.
COMENTARIOS	Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones. 6.770 m2 área útil
SIGUIENTE PASO	Presentar el esquema básico a la IES (MEN-ANIM)
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

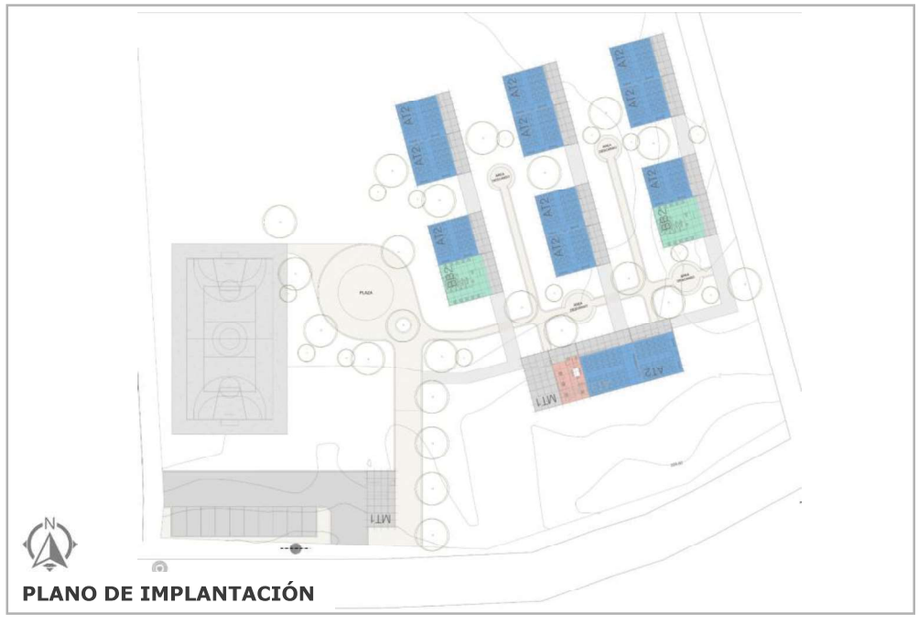


PLANO DE IMPLANTACIÓN

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 2 (AT2)	70,44	11	774,84
	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	194,76	1	194,76
	Total			**1442,95**
ÁREA LIBRE	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Via parqueaderos	253,00	1	253,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanenc	436,74	1	714,61
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2064,00
	Total			**3816,61**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 10.082.022.681**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	370 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se presentó la implantación a la IES y alcaldía.
SIGUIENTE PASO	Revisión de la implantación propuesta por ANIM. (IES) Visitas de campo (ANIM)
ALERTAS	Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

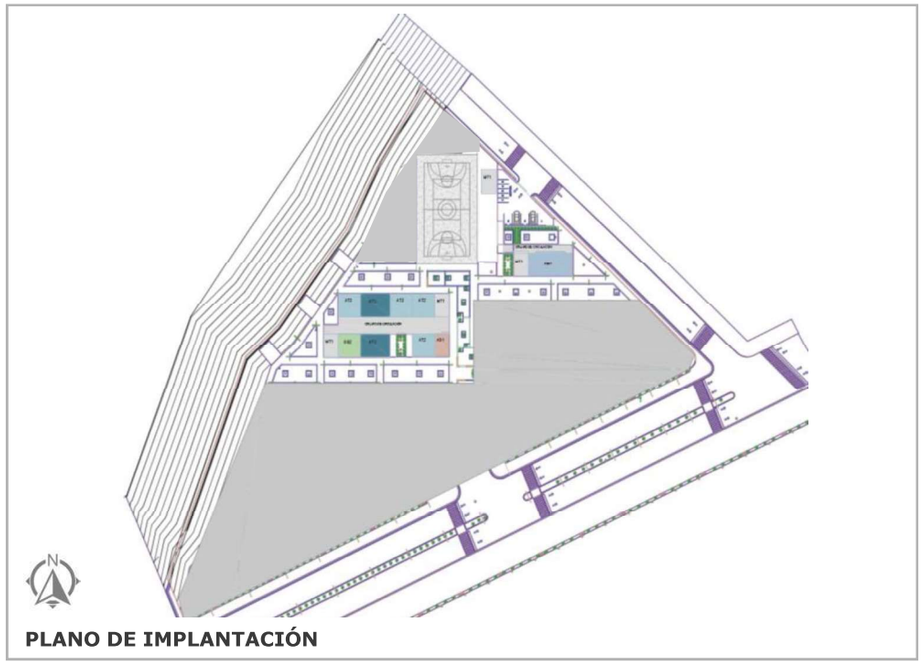

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare						
Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	4	281,76	30	120
	Aula Típica 3	94,08	2	188,16	40	80
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81		
	Técnico	47,53	8	380,24		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53	7	7
	Tecnico	47,53	4	190,12		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	80	80
	Total			**1299,27**		
Área Libre	Zona Dura	1080	1	1080		
	Zona Blanda	887	1	3137		
	Parqueadero	186,18	1	186,18		
	Placa Polideportiva	660	1	660		
	Total			**5063,18**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 9.568.394.708**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	200
ESTADO	Diseño e implantación
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad catastral y jurídica, la Gobernación ha venido adelantando los diseños.
SIGUIENTE PASO	Definir la continuidad del proyecto
ALERTAS	Disminuyó la capacidad aprobada Se debe determinar la continuidad del proyecto.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.618.524.639**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	La gobernación envío las necesidades ajustada al módulo básico. Ya se tiene la IES líder identificada UPN.
SIGUIENTE PASO	Visitas de campo
ALERTAS	Está en un plan parcial. Diferencias entre el PP y el ultimo levantamiento

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	La Jagua de Ibirico, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	**$ 12.618.524.639**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La ANIM revisó la información entregada por la IES.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación y presentarla oficialmente a la IES (ANIM)
ALERTAS	Falta el concepto de uso del suelo de la alcaldía. La IES presenta dudas respecto a que los módulos de madera no tengan Aire acondicionado.



ES en tu Colegio

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Estudio riesgo, Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
CREM Tierralta	Tierralta	Implantación	CREM	Solo caben 3 módulos.	Reunión con la IES, Visita.
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA	Santa Marta	Esperando entrega de la necesidad por parte de la IES	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de adecuación de aulas	Visita

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**10**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**18**	**09**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00	**Hora Fin:**	10:00am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento de proyectos ANIM-MEN						
Elaboró:	Juan Camilo Ramírez						
Asistentes:	MEN: Carlos A Amaya ANIM: Juan Camilo Ramírez, Natalia Valencia						
Agenda	a. Compromisos b. Administrativo c. Presupuesto d. Estado de los Proyectos e. ES en tu Colegio						
	2. Revisión nuevos compromisos						

RESUMEN PRESENTACIÓN

TEMAS TRATADOS

Se inicia la reunión con la presentación de los compromisos de la mesa anterior, en donde desde el componente administrativo de la ANIM se manifiesta lo siguiente:

- Se realiza presentacion de presupuestos
- Se presentan las propuestas de implantacion
- se presenta tabla de indicadores para nuevas sedes
- se presentan presupestos de proyectos
- se revisa estado de los proyectos para contrato

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

100 km	Bogotá		0%
Hasta 500 km	Bogotá		8%
km	Bogotá		18%
Adicional por vía en mal estado			7%
Transporte fluvial			60%

Seguridad o		
Sin Conflicto		0%
Conflicto Bajo		4%
Conflicto Medio		8%
Conflicto Medio Alto		12%
Conflicto Alto		20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Área Módulos m2	Área Aulas m2	Aulas / Módulos %	Zonas Duras m2	Valor Total Estimado	Valor por m2 de Módulos	Valor por m2 de Aula
1.775	1.221	69 %	1.178	$12.330.814.991	$ 6.945.216	$ 10.101.761

Tabla de Indicadores de costos para Sede Nueva

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Departamento	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 12.243.261.875	$ 12.977.857.588
Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 12.985.298.224	$ 13.764.416.117
Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	$ 13.030.465.780	$ 13.812.293.727
Valle del Cauca	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 12.808.173.600	$ 13.576.664.016
			$ 51.067.199.479	$ 54.131.231.448

Departamento	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 13.082.075.472	$ 13.867.000.000
Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 10.917.924.528	$ 11.573.000.000
Putumayo	Valle Guamuez	Instituto Tecnológico del Putumayo	$ 9.511.342.152	$ 10.082.022.681
Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 9.026.787.460	$ 9.568.394.708
			$ 42.538.129.612	$ 45.090.417.389

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 93.605.329.091	$ 99.221.648.837
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 44.404.666.050	$ 47.068.946.013
Presupuesto proyectos convencionales	$ 13.207.547.170	$ 14.000.000.000
Restante + Presupuesto convencional	$ 57.612.213.220	$ 61.068.946.013
Número de proyectos adicionales		4,77

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Estudio riesgo, Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA	Santa Marta	Esperando entrega de la necesidad por parte de la IES	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de adecuación de aulas	Visita
Institución Educativa El Bagre - Sede Escuela Urbana Portugal	El bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	7 aulas, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1 zona administrativa, 1 comedor	Reunión con la IES y visita.
INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ	El Bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	27 aulas.	Reunión con la IES y visita.

Firmas Participantes:

Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina de Infraestructura Educativa - MEN

Nombre del lider de la actividad: Carlos Alirio Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento proyectos ANIM

Hora de inicio: 8:00 | Hora de fin:

Fecha: 18-Sep-2025

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Alirio Amaya N.	OIE - MEN	13720203	camayar@mineducacion.gov.co	
2	JOHNSON M. CANSARIO	OIE - MEN	79.617.831	JCANSARIO@MINEDUCAC...	
3	Natalia Valencia	ANIM - Sub Estruct	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
4	Juan Camilo Ramirez	ANIM - SE	1018462780	jramirez@anim.g...	
5	Juan Romero Parra	ANIM - FFIE	1007635310	jromerop@ext.m...	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

18 de septiembre de 2025

AGENDA

1. Compromiso
2. Administrativo
3. Presupuesto
4. Estado de los proyectos
5. ES en tu Colegio

1

Compromisos

2

Administrativos

Modificación del contrato

Presupuesto

Indicador de Transporte		
Hasta 100 km desde Bogotá	-	0%
Hasta 500 km desde Bogotá	0,08	8%
Hasta 1.200 km desde Bogotá	0,18	18%
Adicional por vía en mal estado	0,07	7%
Transporte fluvial	0,60	60%

Indicador de Seguridad o de Conflicto		
Sin Conflicto	-	0%
Conflicto Bajo	0,04	4%
Conflicto Medio	0,08	8%
Conflicto Medio Alto	0,12	12%
Conflicto Alto	0,20	20%

Indicador de Mano de Obra		
Oferta Alta	-	0%
Oferta Media-Alta	0,07	7%
Oferta Media	0,14	14%
Oferta Baja	0,21	21%
Zona especial	0,28	28%

Tablas de Indicadores de Mayoración de costos

Análisis de Indicadores de Valores para alcance Sede Nueva

Área Módulos m2	Área Aulas m2	Aulas / Módulos %	Zonas Duras m2	Valor Total Estimado	Valor por m2 de Módulos	Valor por m2 de Aula
1.775	1.221	69 %	1.178	$12.330.814.991	$ 6.945.216	$ 10.101.761

Tabla de Indicadores de costos para Sede Nueva

Departamento	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 12.243.261.875	$ 12.977.857.588
Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 12.985.298.224	$ 13.764.416.117
Bogotá D.C.	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	$ 13.030.465.780	$ 13.812.293.727
Valle del Cauca	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 12.808.173.600	$ 13.576.664.016
			$ 51.067.199.479	$ 54.131.231.448


Departamento	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 13.082.075.472	$ 13.867.000.000
Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 10.917.924.528	$ 11.573.000.000
Putumayo	Valle Guamuez	Instituto Tecnológico del Putumayo	$ 9.511.342.152	$ 10.082.022.681
Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 9.026.787.460	$ 9.568.394.708
			$ 42.538.129.612	$ 45.090.417.389

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 93.605.329.091	$ 99.221.648.837
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 44.404.666.050	$ 47.068.946.013
Presupuesto proyectos convencionales	$ 13.207.547.170	$ 14.000.000.000
Restante + Presupuesto convencional	$ 57.612.213.220	$ 61.068.946.013
Número de proyectos adicionales		4,77

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

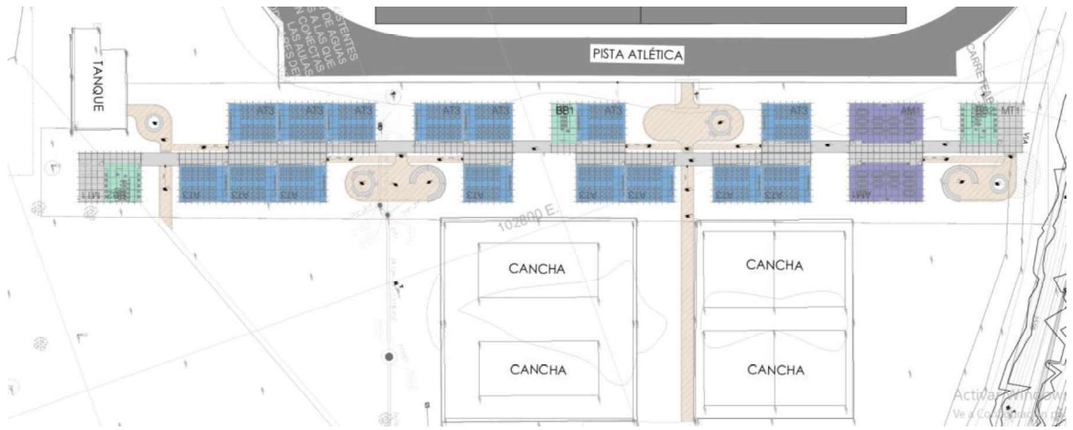


ID_208 Valmaría				
Espacio		**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Cubierta	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 1	47,53	1	47,53
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Técnico	47,53	2	95,06
	Pieza Comp. 1	17,45	6	104,7
	Total			**2081,41**
Área Libre	Zona Dura	605,08	1	605,08
	Zona Blanda	2756,29	1	2756,29
	Total			**3361,37**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.812.293.727**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	DRT Y TR.
COMENTARIOS	Se está adelantando la firma del Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Publicación (ANIM)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza

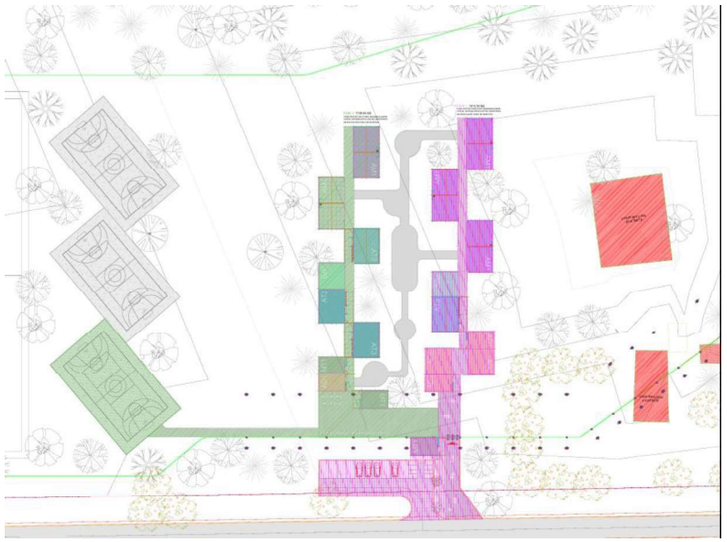

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	4	376,32
	Aula Múltiple (AM1)	140,65	5	703,25
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	2	141,62
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Almacen / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cafetería (MT1)	47,53	1	47,53
	Total			**1647,99**
Área libre	Zona Dura (circulación exterior)	673,75	1	673,75
	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Parqueaderos motos	3,13	8	25,00
	Via parqueaderos	219,58	1	219,58
	Zona verde entrada	30,00	1	30,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanencia)	436,74	1	436,74
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2692,65
	Total			**4862,72**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.764.416.117**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	TR y DRT.
COMENTARIOS	Se Debe adelantar la solicitud de ampliación de capacidad eléctrica.
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Falta: Constancia financiación, Acta Concejo Superior, Compromiso, Certificado no afectación. Se debe solicitar un aumento de carga.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.977.857.588**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	440 sillas
ESTADO	Ajuste de implantación.
COMENTARIOS	Se acordó la implantación con la IES.
SIGUIENTE PASO	Definir el proyecto final con la IES, se tiene mesa de trabajo el 22 de septiembre.
ALERTAS	Existen diferencia en áreas de los lotes, se deben esperar la escrituras y saneamiento. No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES).

4. Avance de proyectos – Ampliación PREDIO 2

Universidad de Cundinamarca – UDEC – OPCION A – 12 Módulos




PLANO DE IMPLANTACIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	3.724 m2
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	480 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES
COMENTARIOS	Se encuentra en viabilidad predial y aprobación de la implantación básica.
SIGUIENTE PASO	Aprobación por parte de IES y Ministerio de Educación de implantación propuesta por ANIM. (ANIM-MEN)
ALERTAS	La IES esta pendiente de enviar documentos para revisión del predio.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva


ID_030 Cali

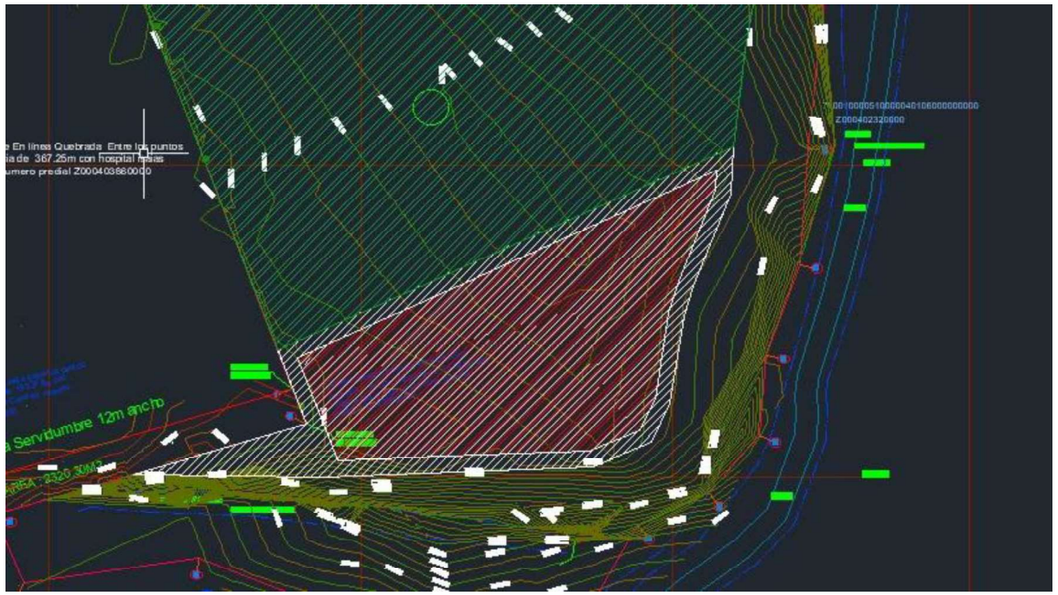

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.576.664.016**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Implantación.
COMENTARIOS	Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones. 6.770 m2 área útil
SIGUIENTE PASO	Definir el área aprovechable con la Alcaldía.
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

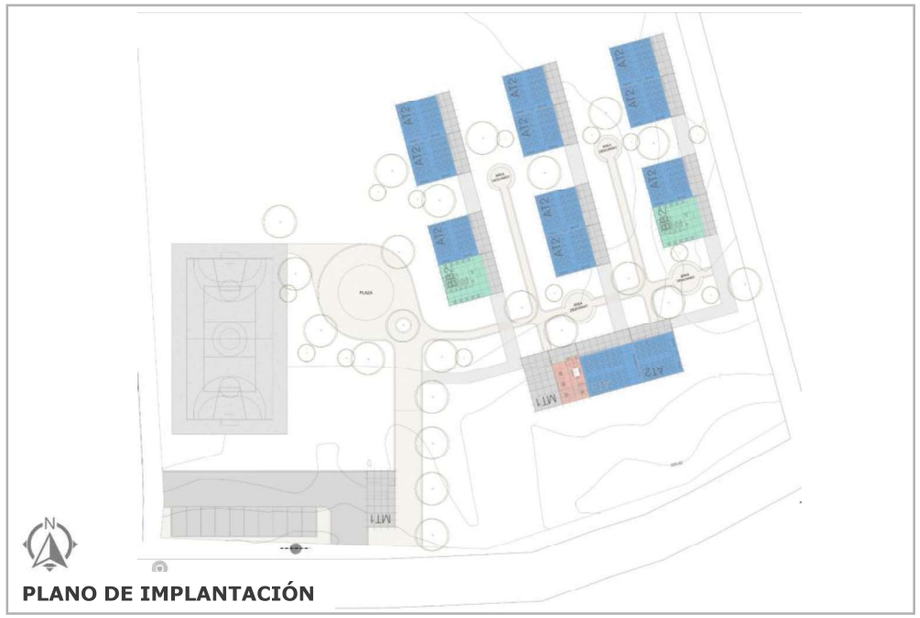


PLANO DE IMPLANTACIÓN

	Espacio	Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 2 (AT2)	70,44	11	774,84
	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	194,76	1	194,76
	Total			**1442,95**
ÁREA LIBRE	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Via parqueaderos	253,00	1	253,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanenc	436,74	1	714,61
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2064,00
	Total			**3816,61**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 10.082.022.681**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	370 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se presentó la implantación a la IES y alcaldía.
SIGUIENTE PASO	Diseños detallados y cantidades. Revisión de la implantación propuesta por ANIM. (IES)
ALERTAS	Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 Multicampus – San José del Guaviare

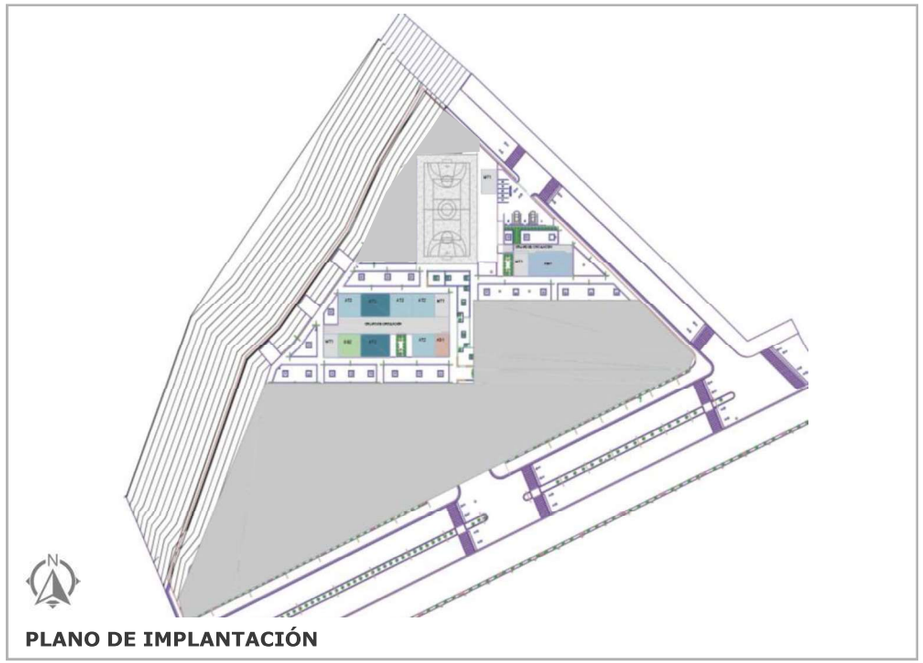

PLANO DE IMPLANTACIÓN

ID_215 San Jose del Guaviare						
Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)	Capacidad p/Espacio	Total
Área Contruida	Aula Típica 2	70,44	4	281,76	30	120
	Aula Típica 3	94,08	2	188,16	40	80
	Baño Tipo 2	70,81	1	70,81		
	Técnico	47,53	8	380,24		
	Zona Admin. 1	47,53	1	47,53	7	7
	Tecnico	47,53	4	190,12		
	Aula Múltiple	140,65	1	140,65	80	80
	Total			**1299,27**		
Área Libre	Zona Dura	1080	1	1080		
	Zona Blanda	887	1	3137		
	Parqueadero	186,18	1	186,18		
	Placa Polideportiva	660	1	660		
	Total			**5063,18**		

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	San José del Guaviare, Guaviare
IES	Multicampus
ÁREA LOTE	17.334 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 9.568.394.708**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	200
ESTADO	Diseño e implantación
COMENTARIOS	Se tiene la viabilidad catastral y jurídica, la Gobernación ha venido adelantando los diseños.
SIGUIENTE PASO	Definir la continuidad del proyecto
ALERTAS	Disminuyó la capacidad aprobada Se debe determinar la continuidad del proyecto.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 11.573.000.000**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES.
COMENTARIOS	Ya se tiene la IES líder identificada UPN.
SIGUIENTE PASO	Visitas de campo Definición del área útil.
ALERTAS	Está en un plan parcial. Diferencias entre el PP y el ultimo levantamiento

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	La Jagua de Ibirico, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	**$ 13.867.000.000**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La ANIM revisó la información entregada por la IES.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación y presentarla oficialmente a la IES (ANIM)
ALERTAS	Falta el concepto de uso del suelo de la alcaldía. No se ha logrado la mesa para la presentación de la implantación.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Majagual

2022



2025





ES en tu Colegio

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Estudio riesgo, Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA	Santa Marta	Esperando entrega de la necesidad por parte de la IES	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de adecuación de aulas	Visita
Institución Educativa El Bagre - Sede Escuela Urbana Portugal	El bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	7 aulas, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1 zona administrativa, 1 comedor	Reunión con la IES y visita.
INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ	El Bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	27 aulas.	Reunión con la IES y visita.

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol

Consecutivo:	**11**		**Lugar:**	Ministerio de Educación, Bogotá			
Fecha:	**24**	**09**	**2025**	**Hora Inicio:**	8:00	**Hora Fin:**	10:00am
Proceso:	Contrato CO1.PCCNTR.7957998 de 2005						
Asunto:	Mesa de seguimiento de proyectos ANIM-MEN						
Elaboró:	Juan Camilo Ramírez						
Asistentes:	MEN: Carlos A. Amaya, Carolina Sánchez, Juliana Orrego, Enrique L. Monrroy, Jorge Ramírez ANIM: Juan Camilo Ramírez, Natalia Valencia						
Agenda	1. Presentación PPT (Avances ANIM): a. Administrativo b. Presupuesto c. Estados de Proyectos d. ES en tu Colegio						
	2. Revisión nuevos compromisos						

Compromisos Mesa de seguimiento de proyectos 24 de Septiembre

TEMA	RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO
VALMARÍA • Seguimiento a la publicación del proceso durante la semana del 29/09/2025.	ANIM	29/09/2025	
FUNZA • Seguimiento a la publicación del proceso durante la semana del 29/09/2025. • Seguimiento a la firma del convenio durante la semana del 29/09/2025.	ANIM	29/09/2025	
SOACHA	ANIM, MEN	29/09/2025	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

• Seguimiento a la publicación del proceso durante la semana del 29/09/2025. • Seguimiento a la firma del convenio durante la semana del 29/09/2025. • Seguimiento a la entrega final de los componentes del documento técnico por parte de la ANIM durante la semana del 29/09/2025. • El MEN coordinará, a la mayor brevedad, el documento de fomento que valide la necesidad.			
CALI • Visita técnica el 26/09/2025 para revisar el predio y acordar, con los actores involucrados, lo relativo a la resolución de transferencia (bienes y servicios) y a la compra del predio. • La IES deberá entregar la ficha de necesidades.	MEN, IES	26/09/2025	
VALLE DEL GUAMUEZ • La ANIM hará seguimiento a los documentos faltantes y al convenio. • Se estima la publicación del proceso en la semana del 03/11/2025.	ANIM	03/11/2025	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE • Seguimiento a la definición de la Gobernación sobre la continuidad del proyecto. • La ANIM coordinará reunión entre MEN, Gobernación y ANIM para solicitar la respuesta mediante oficio.	MEN, ANIM, IES		
VILLETA • El MEN solicita a la ANIM enviar oficio conjunto (MEN–ANIM) a la Gobernación, con copia a la Secretaría de Educación, que contenga la trazabilidad de las gestiones, con advertencia sobre la Ley de Garantías y el riesgo de desfinanciación del proyecto.	ANIM		
JAGUA DE IBIRICO			

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

• Seguimiento al certificado de uso por parte de la Alcaldía. • Seguimiento a la firma del convenio durante la semana del 06/10/2025.	ANIM	06/10/2025	
COMPROMISOS GENERALES			
• El MEN solicita a la ANIM actualizar la información de las pólizas conforme al modificatorio, informar a la aseguradora y cargar en el SECOP lo pertinente.	MEN, ANIM		
• El MEN solicita a la ANIM actualizar los cronogramas de acuerdo con las nuevas condiciones contractuales.	MEN, ANIM		
• El MEN confirmará a la ANIM la conformación del comité fiduciario por parte del MEN.	MEN, ANIM		
• La ANIM citará comité técnico el 26/09/2025 para someter a votación y aprobación los asuntos requeridos y posibilitar la publicación del proceso (4 proyectos) el 30/09/2025; incluir contratación de personal y aprobación del listado de proyectos remitido por el VES y el Despacho del Ministro. El comité fiduciario será citado el 29/09/2025.	ANIM	30/09/2025	
• La ANIM solicita al MEN autorizar el primer pago de la asistencia técnica.	MEN		
• El MEN solicita a la ANIM articular de manera permanente a las áreas de comunicaciones de ANIM y MEN para gestionar hitos comunicacionales del contrato interadministrativo	MEN, ANIM		
• El equipo CAF, en conjunto con la ANIM, revisará los términos de referencia, el manual operativo y el plan sociocultural para su alineación a lineamientos CAF; los documentos resultantes serán enviados el 26/09/2025 a la ANIM, con copia al MEN.	CAF, ANIM	26/09/2025	

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

• Se desarrollará mesa de trabajo en la semana del 29/09/2025 entre ANIM, CAF y MEN para tratar temas jurídicos, ambientales y sociales	ANIM, CAF y MEN	29/09/2025	
• El MEN solicita a la ANIM elaborar comunicado para las IES informando que los convenios deben estar firmados antes del 07/11/2025, en atención a la Ley de Garantías.	ANIM	07/11/2025	
• La Jefatura de la OIE solicita a la ANIM priorizar los proyectos de El Bagre y Arboletes y coordinar visitas (en terreno y virtuales) para revisar el estado de la fase inicial.	ANIM		
• Todo proyecto con financiación deberá contar con certificación de aval del Secretario del Comité de Infraestructura; este documento será obligatorio en el repositorio de cada proyecto y para su ejecución.	ANIM		
• La ANIM, en coordinación con el MEN, realizará mesa de trabajo para revisar los procesos de estudios y diseños.	MEN, ANIM		
• La Jefatura de la OIE solicita al asesor Maurizio Toscano (VES) las gestiones necesarias para reactivar el Palacio San Francisco de la ETITC.			

Firmas Participantes:

Se anexa lista de Asistencia

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

Educación

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: TH-FT-17
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

Dependencia: Oficina Infraestructura Educativa

Nombre del lider de la actividad: Carlos Amaya Naranjo

Tema: Seguimiento contrato ANIM

Hora de inicio: 8:00 am | Hora de fin:

Fecha: 25 Septiembre 2015

No.	Participante	Dependencia	No. Identificación	Correo electrónico	Firma
1	Carlos Mario Amaya N.	OIE - MEN	13720203	camayan@mineducacion.gov.co	
2	Juliana Orrego Beinal	CAF - MEN	1017259430	jorrego@ext.mineducacion.gov.co	
3	Natalia Valencia Daik	ANIM - Subestruct	52849032	nvalencia@anim.gov.co	
4	ENRIQUE LUIS MONROY M.	OIE -MEN	1026264858	emonroym@ext.min...	
5	Juan Camilo Ramirez	ANIM	1018462780	jramirez@anim.gov.co	
6	[illegible]	MEN - CAF	3207964695	[illegible] EXT.MINEDUCACION.GOV.CO	
7	Carolina Sanchez	MEN - OIE.	52809328	Casanchezh.	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Proyectos de infraestructura y dotación de Instituciones de Educación Superior Públicas

que sean priorizados por el Ministerio de Educación Nacional en marco de la implementación del "Plan de Espacios Educativos como Centro de la Vida Comunitaria"

Educación

Somos la Revolución del Cambio

Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco

24 de septiembre de 2025

AGENDA

1. Compromiso
2. Administrativo
3. Presupuesto
4. Estado de los proyectos
5. ES en tu Colegio

1

Compromisos

2

Administrativos

Modificación del contrato

Presupuesto

o	Municipio	Universidad	Valor sin GAT	Presupuesto + GAT
Cundinamarca	Soacha	Universidad de Cundinamarca	$ 12.243.261.875	$ 12.977.857.588
Cundinamarca	Funza	Escuela Tecnologica Instituto Técnico Central	$ 12.985.298.224	$ 13.764.416.117
	Bogotá D.C Valmaria	Universidad Pedagógica Nacional - Predio Valmaria	$ 13.030.465.780	$ 13.812.293.727
a	Cali	Universidad del oriente de Cali	$ 12.808.173.600	$ 13.576.664.016
			$ 51.067.199.479	$ 54.131.231.448


o	Municipio	Universidad	Valor Sin GAT	Presupuesto + GAT
Cesar	La Jagua de Ibirico	Universidad Popular del Cesar	$ 13.082.075.472	$ 13.867.000.000
Cundinamarca	Villeta	Gobernación de Cundinamarca	$ 10.917.924.528	$ 11.573.000.000
Putumayo	Valle Guamuez	Instituto Tecnológico del Putumayo	$ 10.849.056.604	$ 11.500.000.000
Guaviare	San José Del Guaviare	Multicampus	$ 9.026.787.460	$ 9.568.394.708
			$ 43.875.844.064	$ 46.508.394.708

Ejecutado (Proyectos actuales)	$ 94.943.043.543	$ 100.639.626.156
Presupuesto Inicial	$ 138.009.995.142	$ 146.290.594.850
Restante	$ 43.066.951.598	$ 45.650.968.694
Presupuesto proyectos convencionales	$ 13.207.547.170	$ 14.000.000.000
Restante + Presupuesto convencional	$ 56.274.498.768	$ 59.650.968.694
Restante + Presupuesto convencional + Bolsa	$ 69.482.045.938	$ 102.522.174.184
Número de proyectos adicionales		8,82

Estado de los proyectos

4. Avance de proyectos – Ampliación

ID_208 UPN - Valmaria

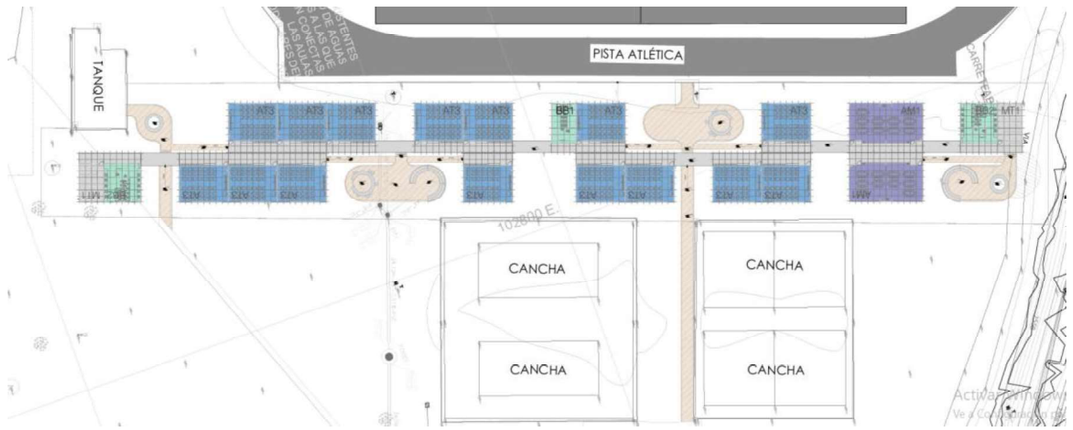

ID_208 Valmaría				
Espacio		**Área (m2)**	**Cantidad**	**Área Total (m2)**
Área Cubierta	Aula Típica 3	94,08	15	1411,2
	Baño Tipo 1	47,53	1	47,53
	Baño Tipo 2	70,81	2	141,62
	Aula Múltiple	140,65	2	281,3
	Técnico	47,53	2	95,06
	Pieza Comp. 1	17,45	6	104,7
	Total			**2081,41**
Área Libre	Zona Dura	605,08	1	605,08
	Zona Blanda	2756,29	1	2756,29
	Total			**3361,37**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Bogotá, Cundinamarca
IES	UPN
ÁREA LOTE	313.365 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.812.293.727**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	600 estudiantes
ESTADO	DRT Y TR.
COMENTARIOS	Se está adelantando la firma del Contrato Interadministrativo
SIGUIENTE PASO	Estudio de análisis de calidad de energía. Publicación (ANIM)
ALERTAS	Se debe realizar estudio de análisis de calidad (ANIM)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_147 ETITC - Funza




Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	4	376,32
	Aula Múltiple (AM1)	140,65	5	703,25
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	3	142,59
	Zona Admin 2 (AD2)	70,81	2	141,62
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Almacen / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cafetería (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	30,24	3	90,72
	Total			**1738,71**
Área libre	Pieza complementaria plazoleta + acceso placa p	152,00	1	152,00
	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Parqueaderos motos	3,13	8	25,00
	Via parqueaderos	219,58	1	219,58
	Placa de Ingreso	148,00	1	148,00
	Zona verde entrada	30,00	1	30,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanenc	436,74	1	436,74
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2692,65
	Total			**4488,97**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálico
MUNICIPIO	Funza, Cundinamarca
IES	ETITC
ÁREA LOTE	52.898 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.764.416.117**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	TR y DRT.
COMENTARIOS	Se Debe adelantar la solicitud de ampliación de capacidad eléctrica (en proceso).
SIGUIENTE PASO	Contrato Interadministrativo Terminación de diseños detallados Estructuración del DRT. (ANIM – MEN)
ALERTAS	Falta: Constancia financiación, Acta Concejo Superior, Compromiso, Certificado no afectación. Se debe solicitar un aumento de carga.

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_121 Soacha

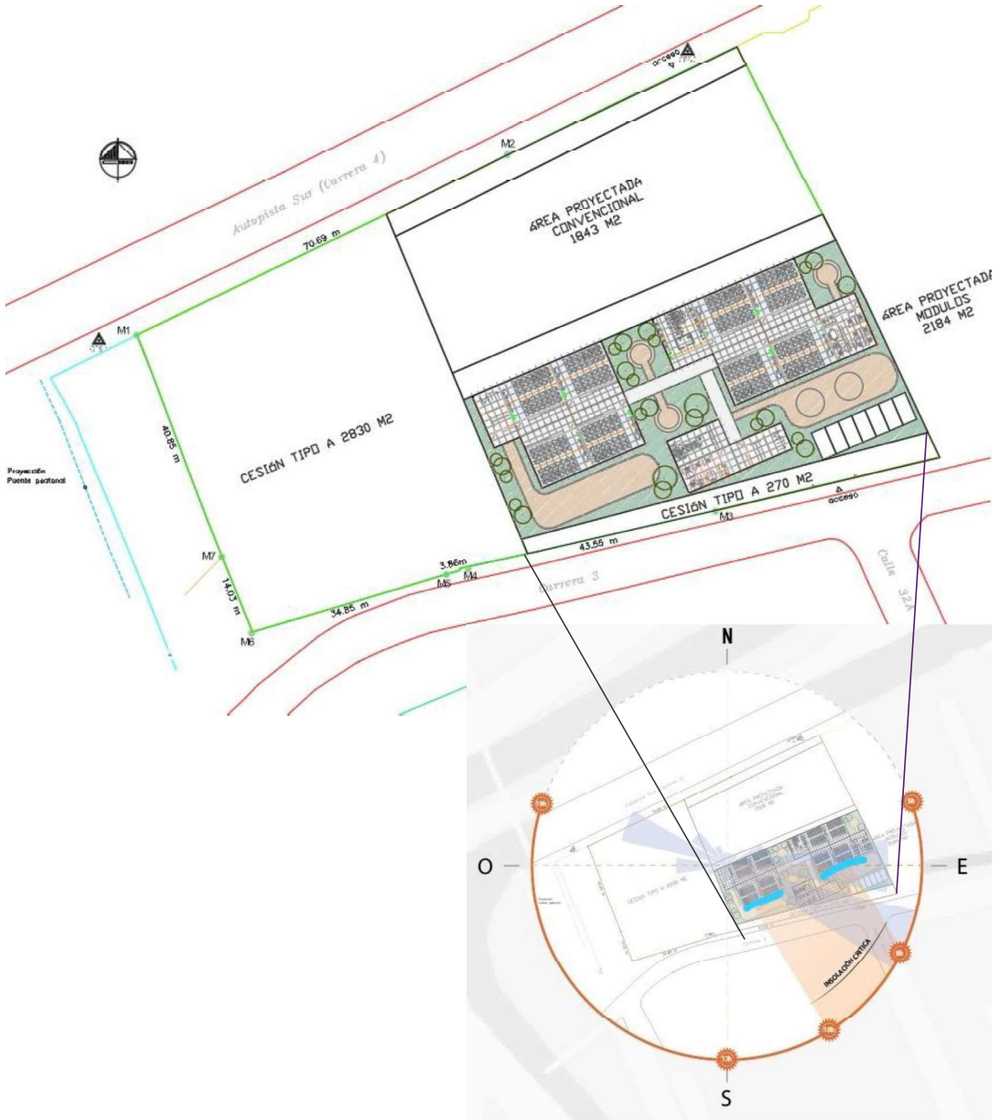


TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Socha, Cundinamarca
IES	Universidad de Cundinamarca - UDEC
ÁREA LOTE	8.367 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 12.977.857.588**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	320 sillas
ESTADO	Ajuste de implantación falta acordar ultima versión con la IES.
COMENTARIOS	Ajustado tanto el área modular como el convencional por aislamientos.
SIGUIENTE PASO	Definir el proyecto final con la IES, se tiene mesa de trabajo el 26 de septiembre.
ALERTAS	Existen diferencia en áreas de los lotes, se deben esperar la escrituras y saneamiento. No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES).

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_030 Cali






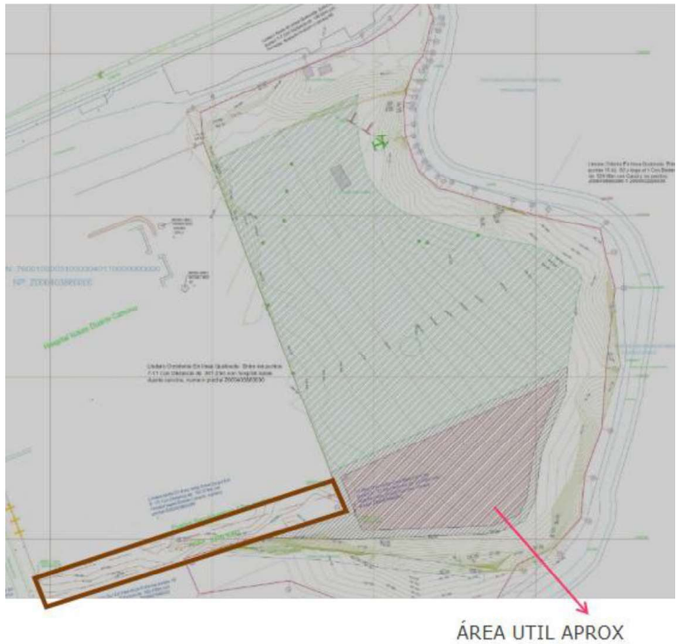

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Metálica
MUNICIPIO	Cali, Valle Del Cauca
IES	Universidad del oriente de Cali
ÁREA LOTE	202.449 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 13.576.664.016**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	400 sillas
ESTADO	Implantación.
COMENTARIOS	Se cuenta con las zonas de intervención, excluyendo las afectaciones. 6.770 m2 área útil
SIGUIENTE PASO	Definir el área aprovechable con la Alcaldía. (área sobre el calculo de ocupación)
ALERTAS	Aparece una persona natural como propietario. (IES) No se tiene necesidad (IES) No se tienen certificaciones de servicios públicos. (IES)

4. Avance de proyectos - Sede nueva

ID_165_Valle del Guamuez

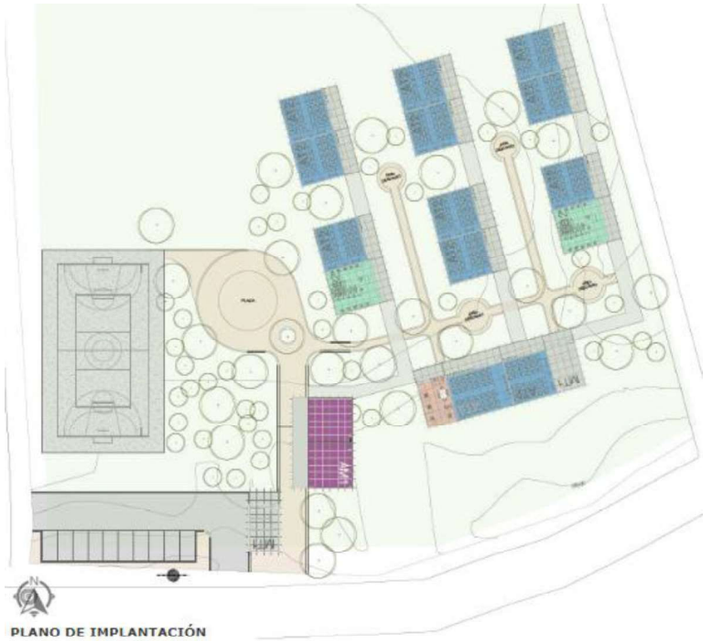


PLANO DE IMPLANTACIÓN

Espacio		Área (m2)	Cantidad	Área Total (m2)
Área Construida	Aula Típica 2 (AT2)	70,44	11	774,84
	Aula Típica 3 (AT3)	94,08	1	94,08
	Baño Tipo 2 (BB2)	70,81	2	141,62
	Zona Admin 1 (AD1)	47,53	1	47,53
	Aula Multiple (AM1)	140,65	1	140,65
	Portería / área técnica (MT1)	47,53	1	47,53
	Cuarto tecnico - Cafeteria (MT1)	47,53	1	47,53
	Pieza complementaria 1-A	194,76	1	194,76
	Total			**1488,54**
ÁREA LIBRE	Placa polideportiva	660,00	1	660,00
	Parqueaderos carros 8 priv - 2 vis	12,50	10	125,00
	Via parqueaderos	253,00	1	253,00
	Zona dura (elementos de urbanismo-permanencia)	436,74	1	714,61
	Zona verde paisaje	2692,65	1	2064,00
	Total			**3816,61**

TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Valle del Guamuez, Putumayo
IES	Instituto Tecnológico del Putumayo
ÁREA LOTE	41.690 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 10.082.022.681**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	370 sillas
ESTADO	Mesas de trabajo IES, Diseño e implantación y DRT.
COMENTARIOS	Se presentó la implantación a la IES y alcaldía.
SIGUIENTE PASO	Diseños detallados y cantidades. Revisión de la implantación propuesta por ANIM. (IES)
ALERTAS	Faltan disponibilidad de SSPP. (IES)

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID_128 Multicampus - Villeta

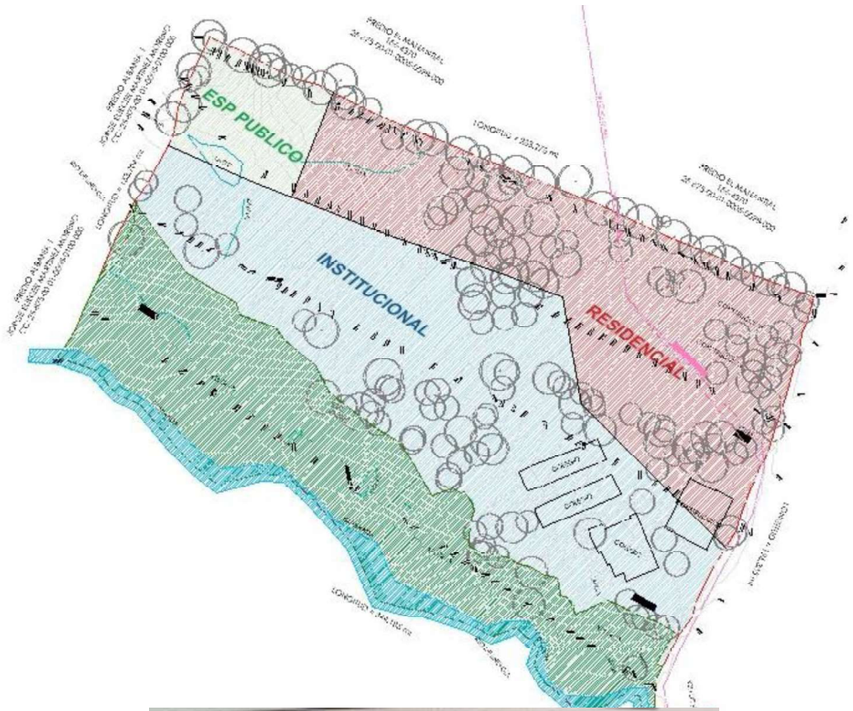



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	Villeta, Cundinamarca
IES	Multicampus (ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca)
ÁREA LOTE	65.674 m2 (IGAC)
VALOR ESTIMADO	**$ 11.573.000.000**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Se había solicitado plano de riesgos y en la visita se evidencio que el 90% esta en remoción en masa medio.
COMENTARIOS	Ya se tiene la IES líder identificada UPN.
SIGUIENTE PASO	Definición del área útil y de estudios detallado de riesgo.
ALERTAS	Está en un plan parcial. Diferencias entre el PP y el ultimo levantamiento y de estudios detallado de riesgo según PP

4. Avance de proyectos – Sede Nueva

ID Jagua



TIPO DE INTERVENCIÓN	Modulares
SISTEMA CONSTRUCTIVO	Madera
MUNICIPIO	La Jagua de Ibirico, Cesar
IES	Universidad Popular del Cesar
ÁREA LOTE	-
VALOR ESTIMADO	**$ 13.867.000.000**
PLAZO	6 meses
CAPACIDAD ESTUDIANTES	360 sillas
ESTADO	Revisión de la información.
COMENTARIOS	La Universidad en la primera mesa de acercamiento manifestó que le interesa acogerse al núcleo básico de sede nueva. La ANIM revisó la información entregada por la IES.
SIGUIENTE PASO	Realizar la implantación y presentarla oficialmente a la IES (ANIM)
ALERTAS	Falta el concepto de uso del suelo de la alcaldía. No se ha logrado la mesa para la presentación de la implantación.



ES en tu Colegio

Proyecto	Municipio	Estado	IES	Alertas	Siguiente paso
IED Julio José	Santa Marta	Implantación	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de 15 aulas	Estudio riesgo, Visita
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Viotá	Identificación necesidad	ETITC	Necesidad 20 aulas	Ajuste necesidad
La Union	La Union	Falta Documentos	Universidad de Nariño	-	-
Barbacoas	Barbacoas	Falta Documentos	Universidad de Nariño	-	-
El charco	El charco	Revisión	Universidad de Nariño	-	-
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA DE MINCA	Santa Marta	Esperando entrega de la necesidad por parte de la IES	Institución Universitaria de Santa Marta	Necesidad de adecuación de aulas	Visita
Institución Educativa El Bagre - Sede Escuela Urbana Portugal	El bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	7 aulas, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1 zona administrativa, 1 comedor	Reunión con la IES y visita.
INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL VICENTE GARRIDO ORTIZ	El Bagre	Revisión	Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid	27 aulas.	Reunión con la IES y visita.

Somos la Revolución del Cambio

GRACIAS

www.mineducacion.gov.co

mineducacion @mineducacion @mineducacion

Ministerio de Educación Nacional mineducacioncol
