INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

OBJETO: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 :
REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, **LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".**

CONTRATO INTERNO DE OBRA PÚBLICA No. IDPC-OB-510-2019



INFORME DE INTERVENTORIA No. 10

PERIODO 10: 12 NOVIEMBRE DE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Consorcio NVP - Tel. 2436384 - 3153578237. Carrera 6 No. 26 B - 51 Of. 801 - 802 Bogotá D.C., Colombia
E-MAIL: interventoria@nvparquitectos.com

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
1	**PRELIMINARES**				
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1.1	TANQUES PLASTICOS PROVISIONALES AGUA	0%	0%	Actividad llevada a 0	
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	100%	100%	Actividad terminada	
1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	100%	100%	Actividad terminada	
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES**				
1.2.1	RED TELEFONICA PROVISIONAL L=40m		0%	Actividad llevada a 0	
1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	100%	100%	Actividad terminada	
1.2.3	RED ELECTRICA PROVISIONAL.	100%	72%	Actividad en proceso	
1.2.4	SALIDA PROVISIONAL PARA LUMNARIAS	90%	68%	Actividad en proceso	
NP-1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA BAÑOS PROVISIONALES	100%	100%	Actividad terminada	
NP-1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA PARA BAÑOS PROVISIONALES	67%	100%	Actividad terminada	
1,3	**ARQUEOLOGIA PREVENTIVA**				
1.3.1	TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH	100%	100%	Actividad terminada	
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO. (incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	100%	100%	Actividad terminada	
NP-1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA PROTECCION DE CAÑUELAS	100%	48%	Actividad en proceso	
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				
2,1	**DESMONTE CARPINTERIAS**				
2.1.1	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS VENTANAS MADERA No 8,9,10 (E-114 levantamiento arquitectonico)	100%	100%	Actividad terminada	
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	100%	95%	Actividad en proceso	
2.1.3	DESMONTAR Y RETIRAR MARCO EN MADERA	100%	100%	Actividad terminada	
2.2	**DEMOLICIONES**				
2.2.1	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO "CICLOPEO"	100%	111%	Actividad terminada	
2.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100%	18%	Actividad en proceso	
2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	100%	103%	Actividad terminada	
2.2.4	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO	100%	73%	Actividad en proceso	
2.2.5	DEMOLICIÓN DE SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE DIMENSIONES VARIABLES	100%	72%	Actividad en proceso	
2,3	**DEMOLICION MAMPOSTERIA**				
2.3.1	DEMOLICIÓN MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	100%	85%	Actividad en proceso	
NP 2.3.2		100%			
2,4	**DESMONTES Y DEMOLICIONES CUBIERTAS**				

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
2.4.1	DESMONTE TEJA DE BARRO - LAVADO,	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.2	DEMOLICIÓN ALISTADO PARA TEJA DE BARRO - MANTO DE CUBIERTA, CHUSQUE Y TORTA DE BARRO	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.3	DESMONTAR ESTRUCTURA EN MADERA TEJA DE BARRO	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.4	DESMONTAR BAJANTES Y CANALES LAMINA	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.5	DESMONTE DE CERCHA EN REY MADERA ROLLIZA (Incluye trasiego)	100%	100%	Actividad terminada	
2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	100%	112%	Actividad terminada	
2,5	**DEMOLICION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
2.5.1	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	100%	100%	Actividad terminada	
2.5.2	DEMOLICION CONEXIONES DOMICILIARIAS	0%	0%		
2.5.3	DESMONTAR Y SELLAR REDES HIDRAULICAS	100%	100%	Actividad terminada	
2.5.4	DESMONTAR Y SELLAR REDES SANITARIAS	100%	100%	Actividad terminada	
2,6	**DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				
2.6.1	DESMONTAR Y RETIRAR LAMPARAS FLUORESCENTES, ROSETA, BALAS U OTROS APARATOS DE ILUMNACION	100%	100%	Actividad terminada	
2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	100%	100%	Actividad terminada	
2.6.3	DESMONTAR REDES ELECTRICAS (incluye rede de iluminacion, tomas, interruptores, cableado, aparatos, tuberia)	100%	100%	Actividad terminada	
2,7	**PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES**				
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	100%	103%	Actividad terminada	
2.7.2	PROTECCION PARA INTERIORES MUROS (Incluye estructura de soporte, lona verde)	100%	0%		
2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	100%	89%	Actividad en proceso	
2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	100%	93%	Actividad en proceso	
NP-2.7.5	PROTECCION EN GUADUA Y PLASTICO	100%	144%	Actividad terminada	
2,8	**VARIOS**				
2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y	100%	72%	Actividad en proceso	
2.8.2	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO	100%	59%	Actividad en proceso	
NP -	DESMONTE DE PISO LAMINADO	93%	75%	Actividad en proceso	
NP -	DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTENTE	100%	89%	Actividad en proceso	
NP -	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y	100%	0%		
3	**CIMENTACION**				
3,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**				
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	100%	95%	Actividad en proceso	
3.1.2	SUBBASE RECEBO COMPACTADO PARA CONTRAPISOS. ESPESOR 30 CMS	100%	100%	Actividad terminada	
3.1.3	RELLENOS CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	100%	0%		
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**				
3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACIÓN E=3 A 5CM	100%	62%	Actividad en proceso	
3.2.2	ZAPATAS. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	100%	100%	Actividad terminada	
3.2.3	PEDESTALES. CONCRETO 21 Mpa	100%	100%	Actividad terminada	
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS -	100%	93%	Actividad en proceso	
3.2.5	MUROS EN CONCRETO ASCENSOR	0%	0%		
3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10. CONCRETO	100%	79%	Actividad en proceso	
3.2.7	MORTERO NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	100%	89%	Actividad en proceso	
3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES Ø 5/8", acero	100%	100%	Actividad terminada	
NP. 3.2.9	CONCRETO CICLOPEO 60 - 40	100%	100%	Actividad terminada	
3,3	**ACERO DE REFUERZO**				
3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	99%	85%	Actividad en proceso	
3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	100%	86%	Actividad en proceso	
4	**ESTRUCTURA CONCRETO**				
4,1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**				
4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	91%	101%	Actividad terminada	
4,2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**				

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	91%	87%	Actividad en proceso	
4.2.2	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	0%	0%		
5	**ESTRUCTURA DE METAL**				
5,1	**ESTRUCTURA METALICA**				
5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180,200,220,240,270,300,PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	100%	95%	Actividad en proceso	
NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	100%	86%	Actividad en proceso	
6	**MAMPOSTERIA**				
6,1	**MUROS**				
6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	100%	97%	Actividad en proceso	
NP -6.1.3	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	100%	59%	Actividad en proceso	
NP -6.1.4	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	100%	56%	Actividad en proceso	
NP -6.1.5	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 5/8" PROFUNDIDAD 15 CMS	50%	4037%	Actividad terminada	
6,2	**MUROS LIVIANOS**				
6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	100%	100%	Actividad terminada	
6.2.2	MUROS (< a 50 cm) DOBLE CARA EN LAMINA FIBROCEMENTO	94%	94%	Actividad en proceso	
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MUROS**				
7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	92%	91%	Actividad en proceso	
7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	60%	200%	Actividad terminada	
7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	99%	104%	Actividad terminada	
7.1.4	PAÑETE EN ARENA, CAL Y FIBRA SINTÉTICA 1:3:1/3	0%	0%		
7,2	**CIELO RASOS**				
7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	100%	104%	Actividad terminada	
7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	100%	90%	Actividad en proceso	
7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	73%	135%	Actividad terminada	
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	100%	0%		
7,3	**ESTUCOS**				
7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	100%	45%	Actividad en proceso	
7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incluye cinta	33%	100%	Actividad terminada	
7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y Drywall)	100%	9%	Actividad en proceso	
7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	100%	96%	Actividad en proceso	
8	**PISOS Y CIELO RASOS**				
8,1	**ALISTADO DE PISOS**				
8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	100%	95%	Actividad en proceso	
8.1.2	PISO EN SUELO CEMENTO PARA BASE EN TABLÓN	0%	0%	Actividadd llevada a cero	
NP-8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	100%	100%	Actividad terminada	
8,2	**ACABADOS DE PISOS**				
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ARCILLA e=4cm	100%	80%	Actividad en proceso	
8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	100%	100%	Actividad terminada	
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	100%	94%	Actividad en proceso	
8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	100%	38%	Actividad en proceso	
8.2.5	PISO CERAMICA(Incluye pegacor y boquilla)	0%	0%		
NP-8.2.6	JUNTA DE DILTACIÓN FLEXIBLE COLA RATON Y SIKAPAVEMENT	100%	100%	Actividad terminada	
NP-8.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISO,INCLUYE RESANE DE SUPERFICIE	100%	89%	Actividad en proceso	

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
NP-8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20 M A=.30 CMS PARA ESCALERAS - INMUNIZADO SELLADO y LACADO	100%	100%	Actividad terminada	
NP-8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS- INMUNIZADO SELLADO y LACADO	100%	100%	Actividad terminada	
NP-8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA TABLON DE ARCILLA E=4CMS	92%	42%	Actividad en proceso	
NP-8.2.11	INSTALACIÓN DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LA EXCAVACIÓN DEL PASILLO PRIMER PISO	100%	83%	Actividad en proceso	
NP-8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	100%	80%	Actividad en proceso	
8,3	**GUARDAESCOBA**				
8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	100%	95%	Actividad en proceso	
8.3.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE 50 X 50	0%	0%		
8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	100%	102%	Actividad terminada	
9	**PARED ENCHAPES**				
9,1	**ENCHAPES PAREDES BAÑOS, COCINAS, DISCAPACITADOS**				
9.1.1	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	100%	96%	Actividad en proceso	
10	**CENEFAS Y PIRLANES**				
10,1	**CENEFAS**				
10.1.1	CENEFA PISO GRAVILA MONA No 1 y 2	100%	170%	Actividad terminada	
10,2	**PIRLANES EN MADERA**				
10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm	100%	115%	Actividad terminada	
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y**				
11,1	**ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE**				
11.1.1	TUBERIA PVC-P 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.1.2	ACCEROSIOS PVC-P 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.1.3	TUBERIA H.G. 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.1.4	ACCESORIO H.G. 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.1.5	UNIVERSAL H.G. 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.1.7	CHEQUE CORTINA 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.1.8	FLOTADOR MECANICO 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,2	**RED GENERAL AGUA FRIA PRESION**				
11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.2.2	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	100%	100%	Actividad terminada	
11.2.4	ACCEROSIOS PVC-P 1 1/4"	100%	100%	Actividad terminada	
11.2.5	REGISTRO P/D 11/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.2.6	REGISTRO P/D 11/4"	75%	0%	Actividad no iniciada	
11.2.7	REGISTRO BOLA 3/4"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.2.8	REGISTRO BOLA 1/2"	0%	0%	Actividad no iniciada	
11,3	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (SOLO PARAL)**				
11.3.1	LAVAMANOS	100%	100%	Actividad terminada	
11.3.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.3.3	LAVAPLATOS DOBLE	100%	100%	Actividad terminada	
11.3.4	ORINAL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.3.5	LLAVES MANGUERA 1/2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,4	**SALIDAS SANITARIAS (SOLO PARAL)**				
11.4.1	LAVAMANOS	100%	50%		
11.4.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.4.3	LAVAPLATOS DOBLE	100%	100%	Actividad terminada	
11.4.4	ORINAL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,5	**BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES , DESAGUES APARATOS Y REDES**				
11.5.1	TUBERIA PVCS 6"	100%	50%		
11.5.2	ACCESORIOS PVCS 6"	100%	100%	Actividad terminada	
11.5.3	TUBERIA PVCS 4"	100%	30%		
11.5.4	ACCESORIOS PVCS 4"	88%	72%		
11.5.5	TUBERIA PVCS 3"	100%	0%		
11.5.6	ACCESORIOS PVCS 3"	100%	0%		
11.5.7	TUBERIA PVCS 2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.5.8	ACCESORIOS PVCS 2"	100%	100%	Actividad terminada	
11,6	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES / SANITARIAS**				

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
11.6.1	TUBERIA PVCL 4"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.6.2	ACCESORIOS PVC-L 4"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.6.3	TUBERIA PVCL 2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.6.4	ACCESORIOS PVC-L 2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,7	**BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.**				
11.7.1	TUBERIA PVC 6" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.3	TUBERIA PVC 4" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.4	ACCESORIOS PVC 4" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.5	TUBERIA PVC 3" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.6	ACCESORIOS PVC 3" ALL	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.7	SIFÓN DE PISO 2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.8	SIFÓN DE PISO 4"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.7.9	SIFÓN DE PISO 3"	100%	0%	Actividad no iniciada	
NP-11.7.10	NUCLEOS DE 4" EN PLACA DE 10CMS PARA INSTALACIÓN DE SIFÓN RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	0%	0%	Actividad no iniciada	
NP-11.7.11	NUCLEOS PARA PASE DE TUBERIA 4" EN EN VIGAS DE 35 CMS	0%	0%	Actividad no iniciada	
11,8	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				
11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	100%	100%	Actividad terminada	
11,9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
11.9.1	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.9.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,10	**ABRAZADERAS**				
11.10.1	ABRAZADERAS BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11.10.2	ABRAZADERAS IPO U DE 1-1/4" A 2"	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,11	**DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**				
11.11.1	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES	100%	0%	Actividad no iniciada	
11,12	**LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE**				
11.12.1	LAVADO DE TANQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES	100%	54%	Actividad no iniciada	
11,13	**MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION**				
11.13.1	MANOMETRO 200 PSI	100%	100%	Actividad terminada	
11.13.2	TUBERIA H.G. 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.13.3	ACCESORIO H.G. 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.13.4	REGISTRO DE BOLA 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11.13.5	CHEQUE CORTINA 1/2"	100%	100%	Actividad terminada	
11,14	**BOMBAS**				
11.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUY 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	100%	100%	Actividad terminada	
NP 11.14.2	TUBERIA PVC-P 2" INCLUYE ACCESORIOS	100%	0%		
NP 11.14.3	TUBERIA PVC-P 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	100%	0%		
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y**				
12,1	**APARATOS**				
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS	100%			
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.3	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (Fluxometro)	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS CON GRIFERÍA BAJO PONER (Tramontina o similar)	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFERIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	100%	0%		

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS (Empotrar Eléctrica 4 Q Vitroceramica Fischer o similar)	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO o similar	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO.	100%	80%		
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	100%	100%	Actividad terminada	
12.1.11	ESPEJOS PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	100%	54%		
12.1.12	EXTINTORES ABC	100%	100%	Actividad terminada	
12,2	**MESONES**				
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	100%	74%		
12,3	**GRIFERIAS Y ACCESORIOS**				
12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado) + BARRA DOBLE DE SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado)	100%	100%	Actividad terminada	
12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	100%	100%	Actividad terminada	
12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	100%	100%	Actividad terminada	
12.3.4	LLAVE TERMINAL	100%	33%		
12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3 x 2". C/I	100%	100%	Actividad terminada	
12,4	**DIVISIONES DE BAÑOS**				
12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (segun diseño)	100%	89%		
13	**COCINAS**				
13,1	**COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA**				
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, ZONA DE CAFETERIA (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	100%	100%	Actividad terminada	
NP 13.1.2	MUEBLE PARA ÁREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1,50 MTS	100%	100%	Actividad terminada	
13,2	**COCINETA EDIFICIO ANTIGUO**				
13.2.1	COCINETA EDIFICIO ANTIGUO REST. (mueble alto, mueble bajo, con cajoneras de cierre lento, segun diseño)	0%	0%		
13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	100%	100%	Actividad terminada	
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**				
14,1	**SOBRE MAMPOSTERIA**				
14.1.1	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	100%	85%		
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	100%	103%	Actividad terminada	
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	100%	100%	Actividad terminada	
NP 14.1.4	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	100%	0%		
14,2	**PINTURA SOBRE METAL**	100%			
14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	100%	86%		
14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	100%	95%		
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**				
15,1	**CERRADURAS**				
15.1.1	CERRADURA OFICINAS INTERIORES	100%	100%	Actividad terminada	
15.1.2	CERRADURA OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	100%	100%	Actividad terminada	
15.1.3	CERRADURA CILINDRO	100%	83%		

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	100%	80%		
15,2	**HERRAJES**				
15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	100%	100%	Actividad terminada	
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**				
16,1	**TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES**				
16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.5	SALIDAS PARA CORRIENTE TRIFASICA 1 NEUTRO Y POLO A TIERRA ASCENSOR TIPO PLATAFORMA	0%			
16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3X30A	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES .	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	100%	100%	Actividad terminada	
16.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1” PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	67%	150%	Actividad terminada	
NP 16.1.15	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA	100%	100%	Actividad terminada	
NP	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA	100%	100%	Actividad terminada	
NP	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ESTUFA	100%			
NP	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA GRECA	100%	100%	Actividad terminada	
NP	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA MICRO-	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.20	TUBERIA CONDUIT EMT 1" CON ACCESORIOS	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.21	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS EMPOTRADA INCLUYE REGATA	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.22	CAJA METALICA DE PASO DE 15X15X10 CMS	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.23	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" CON ACCESORIOS	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.24	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" EMPOTRADA	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.25	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ALIMENTACION RACK DE	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.1.26	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS	100%	100%	Actividad terminada	
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**				
16.2.1	ACOMETIDA 3*8AWG THHN + 10 TIERRA	0%	0%		
16.2.2	TUBERÍA DE 1" PVC PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS	0%	0%		
16.2.3	TUBERÍA 1 1/4" PVC PARA ACOMETIDAS PARCIALES	0%	0%		
16.2.4	TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA CIRCUITOS PARCIALES	0%	0%		

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
16.2.5	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	0%	0%		
NP 16.2.6	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO ASCENSOR (TASC) (TIPO PLATAFORMA) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS CU 4#8+#10 THHN POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO. INCLUYE REGATA	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.7	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-2 (TDN-1) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR CANALETA METALICA PERIMETRAL	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.8	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES (T-1) HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.9	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL COCINA T-4 (TDN-3) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.10	PROLONGACION ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CAJA DE PASO EMPOTRADA HASTA TABLERO BOMBAS (TBOM) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.11	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO PRINCIPAL UPS (TPU) CUARTO DE COMUNICACIONES EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#10+1#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.12	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-1) CUARTO DE ELECTRICO EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR CANALETICA METALICA 12.5 CMS CON DIVISION	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.13	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA EN PISO	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA ENTRADA - SALIDA UPS DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS (T-5) HASTA UPS EN CABLE CU FLEXIBLE 3#10+1#8+1#10 TWK POR CORAZA METALICA PLASTIFICADA Ø 1 " CON CONECTORES EN CADA EXTREMO	100%	100%	Actividad terminada	
16,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES**				
16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	100%	100%	Actividad terminada	
16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	100%	100%	Actividad terminada	
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	100%	100%	Actividad terminada	
16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	100%	100%	Actividad terminada	
16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	100%		Actividad terminada	
16.3.7	TRAMITES PARA CAMBIO DE CARGA	83%	0%	Actividad terminada	
NP 16.3.8	Tablero elecrtrico trifasico tipo alumbrado con espacio para totalizador de 12 circuitos	100%	100%	Actividad terminada	

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
NP 16.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X20 A TDN-2	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X15 A TDN-3	100%	100%	Actividad terminada	
NP 16.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CERRADO METALICO (TPT) CERRADO DE 80X70X25 CMS (ALTO*ANCHO*PROF.); FABRICADO EN LAMINA CR CALIBRE 16, PUERTA FRONTAL , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, GRADO DE PROTECCION IP54 PARA USO INTERIOR; CUMPLIENDO NORMA RETIE	100%	100%	Actividad terminada	
16,4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**				
16.4.1	CAJA EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA SIMILAR A CS 274 DE CODENSA	100%	0%		
16,5	**VOZ Y DATOS**				
16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.2	GABINETE RAKC DE 210 METROS DE ALTURA X 60	100%	50%		
16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	75%	133%	Actividad terminada	
16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	100%	50%	Actividad terminada	
16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCION PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	100%	100%	Actividad terminada	
16.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONALDO 24.000 BTU	100%	0%		
NP - 16.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2 UR	100%	100%	Actividad terminada	
NP - 16.5.12	PDU HORIZONTAL CON 6 TOMAS NEMA 5-15R RACK 15 AMP 120 VAC SUPRESOR POWEST	100%	100%	Actividad terminada	
17	**ILUMINIACION**				
17,1	**LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED**				
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 8" 18W CIRCULAR	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 30 X 120 40 W	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 40 W	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	100%	0%	Actividad no iniciada	
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	100%	0%	Actividad no iniciada	
NP-17.1.8	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 3-22 W, IP40, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 85-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	100%	0%	Actividad no iniciada	
NP-17.1.9	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 22-45 W IP40; 120 MINUTOS DE AUTONOMIA 120-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	100%	0%	Actividad no iniciada	
NP-17.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 360º	100%	0%	Actividad no iniciada	

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES	
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**				
18,1	**IMPERMEABILIZACIONES**				
18.1.1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFILL O SIMILAR (tres manos)	0%	0%	Actividad no iniciada	
18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	45%	100%	Actividad terminada	
18.1.3	IMPERMEABILIZACION PISOS Z. HUMEDAS SELLOTOC	100%	94%		
18.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN PARED Z. HÚMEDAS	100%	96%		
NP - 18.1.5	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS MANTO ASFALTICO FIBERGLASS P3, IMPRIMACION con emulsión asfaltica	80%	68%		
18,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	100%	117%	Actividad terminada	
18.2.2	TUBERIA PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	100%	0%		
18.2.3	ACCESORIOS PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	100%	0%		
18.2.4	TRAGANTES 4"	100%	0%		
NP - 18.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO 6MM PARA ÁREAS DE PUNTO FIJO	100%	0%		
19,1	**REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE**				
19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUALDERAS, FALDONES Y BARANDA	77%	100%	Actividad terminada	
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	100%	100%	Actividad terminada	
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	100%	102%	Actividad terminada	
NP-19.1.4	RESTAURACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	100%	97%	Actividad terminada	
19,2	**CARPINTERIA MADERA NUEVA**				
19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	95%	75%		
19.2.2	VENTANAS MADERA	100%	75%		
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1.00 m	30%	75%		
19.2.4	PUERTA VENTANAS MADERA	0%	75%		
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**				
20,1	**CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA**				
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	100%	148%	Actividad terminada	
20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 cm x 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	100%	100%	Actividad terminada	
20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 cm x 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y visagras embebidas en hoja puerta)	100%	100%	Actividad terminada	
20.1.4	PUERTA Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CRISTAL INCOLORO	91%	40%	Activdad en procesp	
20,2	**BARANDAS EN ACERO INOX**	#¡DIV/0!			
20.2.1	BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS	100%	0%	Actividad no iniciada	
21	**EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL**				
21,1	**ASENSOR 2 PARADAS**				

ITEMS	NOMBRE ACTIVIDAD	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE PROGRAMADO	OBSERVACIONES			
				EXPLICACION DE LAS DIFERENCIAS	ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR		
21.1.1	SUB-CONTRATO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES CAPACIDAD DE 400 KG, 5 PERSONA, TRANSMISIÓN DE TORNILLO SIN FIN, SIN CUARTO DE MAQUINAS, PUETRTA BATIENTE DE ACERO	100%	0%	Actividad no iniciada			
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**						
22,1	**SEÑALIZACIONES Y AVISOS**						
22.1.1	AVISO EXTERIOR IDPC	100%	0%	Actividad no iniciada			
22.1.2	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Oficinas,servicios, orientadores, baños, aseo, basuras, cuarto técnico, seguridad industrial)	100%	0%	Actividad no iniciada			
22.1.3	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Rutas de evacuación)	100%	0%	Actividad no iniciada			
22.1.4	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	100%	0%	Actividad no iniciada			
22,2	**BICICLETERO**						
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	100%	0%	Actividad no iniciada			
23	**OBRAS EXTERIORES**						
23,1	**OBRA CIVIL**						
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4"	100%	0%	Actividad no iniciada			
23.1.2	BORDILLO CIRCULAR ÁRBOL Ø 1.00 MS	0%	0%	Actividad no iniciada			
23.1.3	CONTENEDOR DE RAÍCES h=1.2	100%	51%	Actividad en proceso			
23.1.4	CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12M	100%	0%				
23.1.5	FILTRO TUBERÍA CORRUGADA (Incluye geotextil , grava 1/2")	100%	76%	Actividad en proceso			
NP - 23.1.6	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	67%	0%				
23,2	**ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO**						
23.2.1	ARBOLES no mayores a 2 m	100%	0%	Actividad no iniciada			
23.2.2	ARBUSTOS de 0.30 a 0.50 cm	100%	0%	Actividad no iniciada			
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	100%	0%	Actividad no iniciada			
23.2.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE JARDINES, ALTURA DE 20 cm A 40 cm (4 plantas por cada metro cuadro aproximadamente)	100%	0%	Actividad no iniciada			
23.2.5	RELLENO TIERRA NEGRA (con cascarilla y abono)	100%	5%	Actividad en proceso			
23.2.6	PODA RADICULAR DE INDIVIDUOS ARBÓREOS	100%	80%				
NP - 23.2.7	TRASLADO DE ARBOL	100%	0%	Actividad no iniciada			
NP - 23.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA INDIVIDUOS ARBOREOS	100%	0%	Actividad no iniciada			
24	**ASEO Y LIMPIEZA**						
24,1	**ASEO**						
24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	100%	99%	Actividad en proceso			
24.1.2	ASEO FINAL	100%	0%	Actividad no iniciada			
25	**ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO TÉCNICO**						
25,1	**AJUSTE Y COMPLEMENTACION**						
25.1.1	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS y PAISAJISMO	100%	53%	Actividad en proceso			
25.1.2	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES	100%	37%	Actividad en proceso			
25.1.3	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ELECTRICOS (Incluye certificacion de Retie y Retilap)	87%	31%	Actividad en proceso			
25.1.4	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS HIDRO SANITARIOS	39%	0%	Actividad en proceso			
25.1.5	ELABORACIÓN DE FICHAS 1 Y 2 EN FORMATOS SDA, PLANO Y MEMORIA TÉCNICA PARA CONSOLIDACIÓN DE LISTA CHEQUEO NECESARIA PARA INICIO DE TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES ANTE LA SDA.	39%	273%	Actividad en proceso			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.1. LISTADO DE FOTOGRAFÍAS

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020


No.	DESCRIPCIÓN.
1	Fotografia N. 1 Cañuelas patio 2
2	Fotografia N. 2 Tuberia de aguas lluvias volumen 3
3	Fotografia N. 3 Izaje de estructura metálica de escalera 2
4	Fotografia N. 4 Pañete impermeabilizado culatas patio 2
5	Fotografía No.5. Instalación de piso Casa
6	Fotografía No.6 Antepechos pimer piso volumen 2
7	Fotografía No.7 Pañete impermeabilizado culatas
8	Fotografía No.8 Manto impermeabilizado volumen 3
9	Fotografía No. 9. Inicio de instalación de baldosa hidraúlica
10	Fotografía No.10. Alistado de piso baño primer piso casa
11	Fotografía No.11 Pañete impermeabilizado culatas
12	Fotografía No.12. Izaje estructura ascensor

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2 LOCALIZACION DE LAS TOMAS FOTOGRAFICAS

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

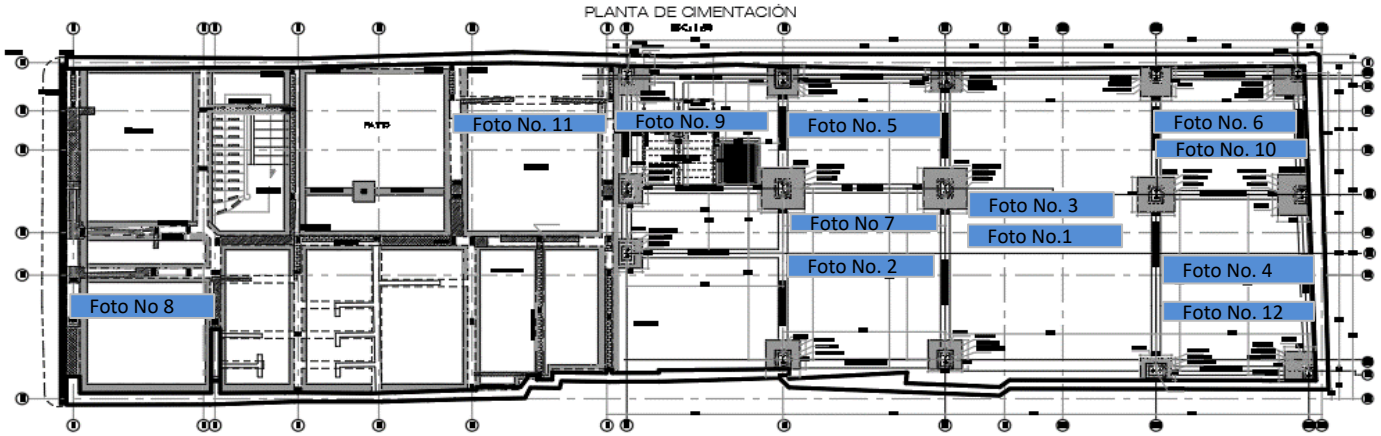

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2.1 FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020



Fotografía No.1. Cañuelas patio 2



Fotografía No.2 Tuberia de aguas lluvias volumen 3



Fotografía No.3 Izaje de estructura metálica de escalera 2



Fotografía No.4 Pañete impermeabilizado culatas patio 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020



Fotografía No. 5 Instalación de piso Casa



Fotografía No.6 Antepechos pimer piso volumen 2



Fotografía No. 7 Pañete impermeabilizado culatas



Fotografía No. 8 Manto impermeabilizado volumen 3

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

1.2.1 FICHA SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020




Fotografía No.9 Inicio de instalación de baldosa hidraúlica



Fotografía No.10 Alistado de piso baño primer piso casa



Fotografía No. 11 Fundida placa patio 1

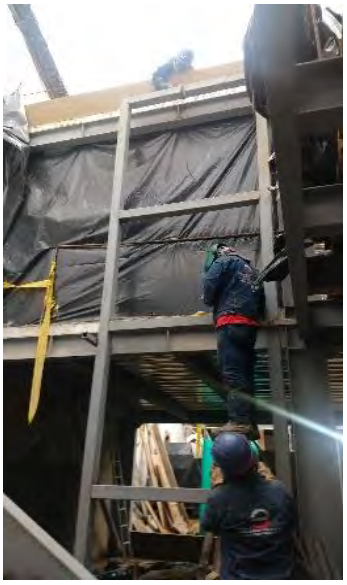

Fotografía No.12 Izaje estructura ascensor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2. INFORME ADMINISTRATIVO

PERIODO: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA.	IDPC-OB-510-2019
OBJETO.	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
MUNICIPIO.	BOGOTA D.C
CONTRATISTA.	CONSORCIO CASA TITO
VALOR DEL CONTRATO.	MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATRENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($1.739.048.042.oo)
ANTICIPO 50%.	OCHOCIENTOS SESETNA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE. ($869.524.021.oo)
PLAZO INICIAL.	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	Lunes 3 de febrero 2020
SUSPENSIÓN 01	miércoles, 26 de marzo de 2020
REINICIO 01 INCLUIDA PRORROGA	Martes 28 de abril 2020
PRORROGA 01	Ocho (8) días Calendario
PRORROGA 02	Cuarenta y cinco (45) días calendario
PLAZO TERMINACIÓN PRORROGA 1 FINAL	Jueves 26 de noviembre de 2020
PLAZO TERMINACIÓN PRORROGA 2 FINAL	Domingo 10 e enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	10 de enero 2021

2.1 CONTROL DEL PERSONAL

	Personal	Operativos	Técnicos Operativos		
2.1.1 PERSONAL OPERTAIVO	Maestro de Obra Civil	0	1		
	Obra Civil	5	0		
	Carpintería	2	0		
	Eléctricos	2	0		
	Estructura Metálica	4	2		
	Arqueología	0	5		
	Servicios Generales	3	3		
	Almacenista	1	1		
2.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	El personal profesional de obra cumple con los establecido en los términos de referencia y acorde a las necesidades de la obra.				
	Director de Obra	1	0,5	Arq. Oscar Rafael Guio Ruiz	
	Residente Técnico de Obra	1	1	Arq. Carlos Eduardo Arteaga Jaime	
	Residente Administrativo de obra	1	1	Arq. Brandon Sebastián Pinzón Rojas	
	Profesional SG-SST (HSEQ)	1	1	Ing. Erik Cardoso	
	Arqueólogo o Antropólogo	1	1	Felipe Gaitán Ammann	
	Asesor Estructural	1	0,25	Ing. Jose Gustavo Pinilla	
	Asesor Eléctrico	1	0,2	Ing. Luis Martin Osma Villamizar	
	Asesor Hidráulico	1	0,2	Ing. Andrés Galarza	

Se anexa cuadro detallado de control de personal.

2.2 REGISTRO Y CONTROL DE LLUVIAS Y SUSPENSIONES DE OBRA

Se adjunta registro de control de lluvias

2.3 DOCUMENTOS ANEXOS

2.3.1 Control de personal
2.3.2 Control de afiliaciones
2.3.3 Control de equipos
2.3.4 Cuadro de control de lluvias.

2.4. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

Durante este período se puede concluir lo siguiente:
Durante este período se puede concluir lo siguiente:
1.Se realizan comités semanales de obra para hacer seguimiento de avance de obra, temas financieros y administrativos los cuales quedan consignados en las actas semanales, así mismo se recibieron en obra visitas de los asesores según necesidades del proyecto.
2. Respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo se adelantan actividades conjuntas entre contratista e interventoría controlando los riesgos propios de cada actividad integrando el área técnica y operativa antes de la autorización de actividades de alto riesgo que comprometan la seguridad del grupo de trabajo.
3. Se realiza el seguimiento al suministro y uso adecuado de equipos y materiales necesarios para garantizar la calidad de los procesos de reforzamiento que se adelantaron durante el periodo.

Firma

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.1 CONTROL DE PERSONAL

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DCIEMBRE DE 2020

		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	TOTAL
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	DIAS.
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO		13	12	12	0	0	12	13	12	12	12	0	12	13	13	13	13	13	0	13	13	13	13	13	13	0	13	0	13	13	13	
NESTOR VARGAS PEDROZA	DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
LILIANA MARCELO	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CRISTIAN CAMILO CORRECHA	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
PATRICIA CASTRO	ARQUEOLOGO INTERVENTORIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
LILI JOHANNA VIDALES VIDALES	RESIDENTE HSST INTERVENTORIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	DIRECTOR DE PROYECTO	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CARLOS EDUARDO ARTEAGA JAIMES	RESIDENTE TECNICO DE OBRA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
SEBASTIAN PINZON ROJAS	RESIDENTE ADMON DE OBRA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
ERIC CARDOSO	RESIDENTE HSEQ	1						1						1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	17
FELIPE GAITAN AMMAN	ARQUEOLOGO	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
ALEXANDER SANTOFIMIO	ALMACENISTA DE OBRA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CARLOS LOPEZ	AUXILIAR OBRA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
MANYELYS DEL CARMEN PEREZ	SERVICIOS GENERALES	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
																																0
PERSONALOPERATIVO																																
LUIS FERNANDO ARTEAGA BERBESI	CONTRATISTA ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
MIGUEL HERNANDEZ AGILARTE	AYUDANTE ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
DIXON HERNANDEZ	AYUDANTE ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
PABLO ANTONIO TAPIAS	AYUDANTE ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CESAR URIEL FORERO ROA	AYUDANTE ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
ALEXANDER ROCHA	AYUDANTE ALMAROS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1				1	1	1	23
GERMAN MEJIA	OFICIAL ALMAROS	1					1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	22
ALVARO GARCIA ACEVEDO	MAESTRO CARPINTERIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
ANGELA SOSA	CARPINTERO JECSA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
ELSY LILIANA NAVARRO	PROFESIONAL SST ESTRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CESAR ORLANDO PRIETO	OFICIAL SOLDADOR	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CRISTIAN DANILO JIMENEZ ORTIZ	OFCICIAL SODADOR	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
NICOLAS BARRERA AGUILERA	RESIDENTE TECNICO ESTRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
RICHARD MALPACINGA	AYUDANTE STRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	23
JOSE SOCHA ASENCIO	CONDUCTOR STRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
GERMAN PRIETO	SOLDADOR ESTRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
JORGE LOPEZ	SOLDADOR ESTRUMET	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CARLOS ADRIAN RIANIO ROJAS	OFICIAL ELECTRICO	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
RUSSBEL PIRATOVA	OFICIAL ELECTRICO	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
TANIA LEON	AYUDANTE ARQUEOLOGIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
DANIELA TRUJILLO HASSAN	AYUDANTE ARQUEOLOGIA	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
PEDRO NEL ORTIZ	AYUDANTE TEJA CONSTRUC	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
CESAR VARGAS	USPERVISOR TEJA CONSTRUC	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
GIOVANI CAMELO	AYUDANTE TEJA CONSTRUC	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
JOSE MARIO BELLAIZAN	AYUDANTE TEJA CONSTRUC	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
JAVIER GOMEZ	INSTALADOR VICTOR GAMMA PISOS	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
EDWIN CAMILO PINEDA	INSTALADOR IMPERINCOL	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	24
		40	38	38	0	0	39	40	39	39	39	0	38	40	40	40	40	40	0	40	40	40	40	40	40	0	39	0	40	40	40	30,61
Horario de Labores: Mañana - AM	7:00 AM - 12:00 PM		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Horario de Labores: Tarde - PM	1:00 PM - 5:00 PM		X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	

Nota:

HORARIO DE TRABAJO POR : 48,00 HORAS
LUNES A VIERNES : 34,00 HORAS
SABADO : 5,00 HORAS

(Pv) Permiso de vacaciones
(Da) Permiso día adelantado
(S) Personal suspendido temporalmente
(AS) Actividades Suspendidas o personal
(T) Personal laborando en taller fuera de obra
(CR) Cambio Razón Social o Patrono

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

PERIODO 10 : 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.2. CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	E.P.S.	A.R.L.	A.F.P.	INGRESO	RETIRO
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO OBRA / INTERVENTORIA							
NESTOR VARGAS PEDROZA	79.378.301	DIRECTOR INTERVENTORIA	SANITAS	POSITIVA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
LILIANA MARCELO	1.032.364.417	RESIDENTE INTERVENTORIA	COMPENSAR	POSITIVA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
CRISTIAN CAMILO CORRECHA	80.165.254	RESIDENTE INTERVENTORIA	COMPENSAR	POSITIVA	PROTECCION	3/02/2020	VIGENTE
LILI JOHANNA VIDALES VIDALES	52.830.039	RESIDENTE HSEQ INTERVENTORIA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	3/02/2020	VIGENTE
OSCAR RAFAEL GUIO RUIZ	79.265.248	DIRECTOR DE PROYECTO	SANITAS	SURA	COLPENSIONES	3/02/2020	VIGENTE
CARLOS EDUARDO ARTEAGA JAIMES	88.032.164	RESIDENTE TECNICO DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	PROTECCION	2/01/2019	VIGENTE
SEBASTIAN PINZON ROJAS	1.019.083.914	RESIDENTE ADMON DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
EDITH MONCAYO CHAPID	27.091.665	HSEQ	ALIANSALUD	SURA	PROTECCION	5/02/2020	VIGENTE
ALEXANDER SANTOFIMIO	80.118.094	ALMACENISTA	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
CARLOS LOPEZ	1.007.940.078	SERVICIOS GENERALES	SANITAS	SURA	PORVENIR	5/02/2020	VIGENTE
FELIPE GAITAN AMMAN	79.946.612	ARQUEOLOGIA	ALIANSALUD	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
ERIC CARDOSO	1.013.592.291	HSEQ CONSORCIO CASA TITO					
PERSONAL OPERATIVO							
LUIS ARTEAGA BERBESI	13.350.163	CONTRATISTA	MEDIMAS EPS	SURA	PORVENIR	18/05/2020	VIGENTE
MIGUEL HERNANDEZ AGILARTE	959.163.517.011.988	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	18/05/2020	VIGENTE
DIXON HERNANDEZ	809.171.229.081.986	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA	821.236.826.041.991	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	18/05/2020	NO
PABLO ANTONIO TAPIAS	1.005.065.032	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	22/07/2020	VIGENTE
CESAR URIEL FOFERO ROA	80.118.094	AYUDANTE	SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR	13/07/2020	VIGENTE
UBER ANTONIO RIVAS	16.493.610	AYUDANTE	MEDIMAS EPS	SURA	COLPENSIONES	22/07/2020	NO
HENRY MALDONADO OTALORA	79.412.476	OFICIAL CARPINTERO	POLICIA	POSITIVA	POLICIA	8/06/2020	VIGENTE
ALVARO GARCIA ACEVEDO	345.986	MAESTRO CARPINTERO	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	8/06/2020	VIGENTE
JAVIER ARRECHEA VENTE	1.149.186.011	AYUDANTE CARPINTERO	FAMISANAR	POSITIVA	PROTECCION	8/06/2020	NO
ANGELA SOSA	57.748.953	OFICIAL CARPINTERO	CAPITAL SALUD	POSITIVA	COLPENSIONES	23/06/2020	NO
EDUAR MALDONADO	79.507.950	SUPERVISOR CARPINTERIA	POLICIA	POSITIVA	POLICIA	23/06/2020	NO
JAVIER JAIR SANTIAGO CUELLAR	80.747.012	CARPINTERO	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	9/06/2020	NO
ELSY LILIANA NAVARRO	1.122.813.939	PROFESIONAL SST ESTRUMET	SANITAS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	NO
CESAR ORLANDO PRIETO	3.312.896	OFICIAL SOLDADOR	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE
CRISTIAN DANILO JIMENEZ ORTIZ	1.073.511.154	OFCICIAL SODADOR	SANITAS	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE
NICOLAS BARRERA AGUILERA	1.013.645.804	RESIDENTE TECNICO ESTRUMET	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	24/06/2020	VIGENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

PERIODO 10 : 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.2. CONTROL DE AFILIACIONES Y PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA No.	CARGO	E.P.S.	A.R.L.	A.F.P.	INGRESO	RETIRO
CARLOS ADRIAN RIANIO ROJAS	79.977.480	OFICIAL ELECTRICO	COMPENSAR	EQUIDAD	PROTECCION	4/07/2020	VIGENTE
MAICOL ESTEBAN RUBIO VEGA	1.023.933.050	EFICIAL ELECTRICO	CONFACUNDI	EQUIDAD	PORVENIR	4/07/2020	VIGENTE
TANIA LEON VELANDIA	1.053.343.788	AUX. ARQUEOLOGIA	MEDIMAS EPS	SURA	PORVENIR	12/05/2020	VIGENTE
DANIELA TRUJILLO HASSAN	1.020.810.209	AUX. ARQUEOLOGIA	SANITAS EPS	SURA	COLPENSIONES	11/08/2020	VIGENTE
RICHARD MALPACINGA	12.109.708	AYUDANTE STRUMET	FAMISANAR	SURA	PORVENIR	16/08/2020	VIGENTE
JOSE SOCHA ASENCIO	10.112.331.822	CONDUCTOR STRUMET	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	26/08/2020	VIGENTE
GERMAN PRIETO	CE. 4116697	SOLDADOR STRUMET	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	26/08/2020	VIGENTE
LUIS ALBERTO PEDROZA	1.127.386.330	OFICIAL TEJA CONSTRUC.	NUEVA EPS	AXA COLPATTIA	PORVENIR	28/08/2020	VIGENTE
CESAR VARGAS	17.783.391	SUPERVISOR TEJA CONSTRUC.	FAMISANAR	AXA COLPATTIA	PORVENIR	28/08/2020	VIGENTE
PEDRO NEL ORTIZ	80.093.757	TEJA CONSTRUCCIONES	SALUD TOTAL	AXA COLPATTIA	PORVENIR	1/10/2020	VIGENTE
ALEXANDER ROCHA	1.020.760.158	AYUDANTE ALMAROS	SANITAS	SURA	PORVENIR	20/08/2020	VIGENTE
GIOVANI CAMELO	79.822.684	TEJA CONSTRUCCIONES	SALUD TOTAL	AXA COLPATTIA	PORVENIR	1/10/2020	VIGENTE
EDWIN CAMILO PINEDA	80.871.044	INSTALADOR IMPERICOL	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES	27/10/2020	VIGENTE
JAVIER GOMEZ	1.024.471.251	ISTALADOR VICTOR GAMMA PISOS	CAPITAL SALUD	SURA	PROTECCION	10/11/2020	VIGENTE
RUSSBEL PIRATOVA	86.049.321	ELECTRICO SERVICIOS DE SEGURIDAD	COMPENSAR	EQUIDAD	PROTECCION	3/11/2020	VIGENTE
ERIC CARDOSO	1.013.592.291	CONSORCIO CASA TITO	COMPENSAR	SURA	PROTECCION	23/10/2020	VIGENTE
GERMAN MEJIA	79.450.422	OFICIAL ALMAROS	SALUD TOTAL	SURA	PROTECCION	15/10/2020	VIGENTE

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.3. CONTROL EQUIPOS

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

DESCRIPCION DE EQUIPOS	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SECCIONES DE ANDAMIO TUBULAR (ARQUEOLOGIA)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
SECCIONES DE ANDAMIO CERTIFICADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
SIERRA ELECTRICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PLANEADORA CARPINTERIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ROTOMARTILLO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PISTOLA DE CALOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PULIDORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ACOLILLADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CALADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RUTEADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TALADRO INALAMBRICO DEWALT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TALADRO DEWALT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LIJADORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MEZCLADORA DE CONCRETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 09

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.3.4. CONTROL REGISTRO DE LLUVIAS EN HORAS LABORALES

PERIODO 9: 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2020

	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7:00 a 8:00																																0,00
8:00 a 9:00																																
9:00 a 10:00																																
10:00 a 11:00																																
11:00 a 12:00						2,0																									5,0	
12:00 a 13:00																1,0	1,0		2,0	1,0			1,0									
13:00 a 14:00			1,0							1,0							1,0													2,0		
14:00 a 15:00			1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0				1,0		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0					
15:00 a 16:00			1,0	1,0							1,0						1,0		1,0					1,0	1,0	1,0	1,0					
16:00 a 17:00			1,0														1,0															
17:00 a 18:00																																0,00
TOTAL LLUVIAS (H)	0,0	0,0	4,0	2,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	5,0	0,0	4,0	2,0	1,0	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0		5,0	43,00

CONVENCIONES:

A- LLUVIAS DEBILES: < 2 HORAS
B- LLUVIAS MODERADAS: >2 HASTA < 15 HORAS
C- LLUVIAS FUERTES: >15 HASTA< 30 HORAS
D- LLUVIAS MUY FUERTES: >30 HASTA < 60 HORAS
E- LLUVIAS TORRENCIALES: > 60 HORAS

- 1 hora = 60"
- 0,83 h = 50"
- 0,67 h = 40"
- 0,50 h = 30"
- 0,33 h = 20"
- 0,17 h = 10"

CONTROL DE TIEMPO:

(S) soleado
(LAS) lluvia suave
(ALF) lluvia fuerte
(N) nublado
(PN) parcialmente nublado

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO : 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ASUNTO	ENVIADA POR	ENVIADA A	COPIA A	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBO
CT-099-2020	13-nov.-20	Filtraciones de aguas lluvias 2 piso edificio patrimonial casa tito	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	13-nov.-20
CT-100-2020	13-nov.-20	Aprobacion impermeabilizacion terrazas con manto asfaltico fiberglass P3 Pro	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	13-nov.-20
CT-102-2020	17-nov.-20	Raadicacion APU pactados en reunion del dia lunes 9 de noviembre 2020	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	17-nov.-20
CT-110-2020	1-dic.-20	Actualizacion polizas de acuerdo a la prorroga No. 2 y Adicion No. 1 al contrato de obra No. 510 de 2019	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	11-nov.-20
CT-112-2020	3-dic.-20	Envios ensayos de laboratorio	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	1-dic.-20
CT-114-2020	7-dic.-20	Radicacion documentos factura y acta No. 8	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	7-dic.-20
CT-115-2020	11-dic.-20	Envio ensayos de laboratorio	CONSORCIO CCT	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	11-dic.-20
20203070051231	19-nov.-20	Porceso de Adicion prorroga y demas modificaciones que requiere el contrato de obra No. 510/19 e intreventoria No. 513/19	IDPC	INTERVENTORIA	NA	LILIANA MARCELO	19-nov.-20

ARQ. LILIANA MARCELO
RESIDENTE DE NTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

PERIODO : 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACION	ASUNTO	ENVIADA POR	ENVIADA A	COPIA A	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBO
058-20 NVP- TITO	12-nov.-20	Hoja de aporbacion corte 7 contratista	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	12-nov.-20
059-20 NVP- TITO	12-nov.-20	Entrega informe mensual 8 contrato interventoria	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	12-nov.-20
060-20 NVP- TITO	13-nov.-20	Alcance a oficio No. 059-20 NVP - Tito	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	13 nov. 2020
061-20 NVP- TITO	13-nov.-20	Solicitud Prorroga y Adicion de los Contratos IDPC-OB-510-2019 / IDPC-INT-513-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	13-nov.-20
062-20 NVP- TITO	13-nov.-20	Certificacion APU no contempaldos contrato IDPC-OB-510-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	13-nov.-20
063-20 NVP- TITO	17-nov.-20	Alcance oficio No. 061-20- NVP-TITO	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	17-nov.-20
064-20 NVP- TITO	18-nov.-20	Solicitud prorroga del contrato IDPC-OB-510-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	18-nov.-20
065-20 NVP- TITO	19-nov.-20	Revision a nuevos APUS Electricos Rev. 2	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. OSCAR GUIO	IDPC	CONSORCIO CASA TITO	19-nov.-20
065-20 NVP- TITO	26-nov.-20	Entrega documentacion para adicion y prorroga Contratos IDPC-OB-510-2019 / IDPC-INT-513-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	26-nov.-20
066-20 NVP- TITO	23-nov.-20	Alcance oficio adicion y prorroga Contratos IDPC-OB-510-2019 / IDPC-INT-513-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	23-nov.-20
067-20 NVP- TITO	26-nov.-20	Oficio radicacion documentos adicion y prorroga Contratos IDPC-OB-510-2019 / IDPC-INT-513-2019	ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	26-nov.-20
068-20 NVP- TITO	4-dic.-20	oficio Riesgos de Bioseguridad	ING. LILI JOHANNA VIDALES	ARQ. OSCAR GUIO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	Consorcio Casa Tito / IDPC - Correo Electronico	4-dic.-20
069-20 NVP- TITO	7-dic.-20	Hoja de aprobacion corte 8 contratista	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR		IDPC - Correo Electronico	7-dic.-20
070-20 NVP- TITO	7-dic.-20	Entrega de informe mensual No. 9 contrato interventoria IDPC-INT-513-2019	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	7-dic.-20
071-20 NVP- TITO	11-dic.-20	Alcance entrega de informe mensual No. 9 Contrato interventoria IDPC-INT-513-2019	ARQ. LILIANA MARCELO	ARQ. RICARDO ESCOBAR	N/A	IDPC - Correo Electronico	11-dic.-20

ARQ. LILIANA MARCELO
RESIDENTE DE NTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

2.5 INFORME HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO : 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

2.5.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL	Para este periodo se adelantan actividades de acabados, montaje de escalera en estructura metalica, pintura de estructura, inatalacion de pisos en madera y piso tipo fatto, divisiones en muro liviano, impermeabilizacion de cubiertas, enchape y estuco en baños. Para las atividades anteriormente mencionadas se verifican procedimientos y diligenciamiento de pre operacionales y permiso de trabajo de acuerdo a la complejidad de los risgos a los que se expone al personal tanto operativo como tecnico.
2.5.2 SALUD OCUPACIONAL	Inspección de botiquines de primeros auxilios Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto. Se verifica el suministro de dotacion y elementos de proteccion personal de cada uno de los grupos de acuerdo al riesgo que se expone. Se rraliza segumiento a condiciones de salud de los trabajadores segun lo establecido en los protocolos contra el COVID-19.
2.5.3 MANEJO AMBIENTAL	Se realizan jornadas de orden y aseo concientizando al grupo operativo de la importancia de mantener las condiciones adecuadas por seguridad y bioseguridad del grupo. Se realiza despeje de las bases de los arboles que se encontraban con RCD, se retroalimenta al personal opertaivo del mantenimiento de los mismos. Se evidencia retiro de RCD durante el periodo

2.5.4 ACCIDENTES E INCIDENTES

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Observaciones
Incidentes	0	0	0	0	
Accidente	0	0	0	0	
Días de incapacidad	0	0	0	0	

Para el periodo no se reportan incidentes ni accidentes, tampoco se identifican enfermedades laborales en el grupo de trabajo

2.6 SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO Y PMS

Objetivo: Seguimiento, verificación y aprobación de la documentación e inscripciones ante las entidades competentes para la reactivación de obra Casa Tito, bajo los lineamientos normativos nacionales y distritales expedidos referentes a PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD y PLAN DE MOVILIDAD SEGURO, propuestos por el COSORCIO CASA TITO.
Con el propósito de reducir el riesgo de exposición de los trabajadores, personal involucrado en la operación, y en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal como lo son el ingreso a la obra, espacios de trabajo en que concurren un número mayor a 10 trabajadores, campamentos, áreas de almacenamiento de maquinaria, herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas de unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de locker; área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras, áreas de descanso, zona de manejo de escombros, tanques de agua, pozos y demás áreas y/o actividades en los que se requiera proximidad entre personas y/o trabajadores.

2.6.1 DOCUMENTACION	Aplicación de Medidas Generales de Higiene Industrial para la prevención dentro y fuera del trabajo, orientadas a promocionar la salud de los colaboradores, contratistas del Consorcio Casa TITO, visitantes y partes interesadas para la reactivación de las actividades en obra. Se reciben los siguientes documentos - Plan de Atención de Protocolo Sanitario de Obra PAPSO - Plan de movilidad - Protocolos de Bioseguridad - Formatos de caracterización emitidos por la alcaldía mayor de Bogotá
2.6.2 CAPACITACIONES	Charlas condiciones de seguridad e importancia de orden y aseo. Inducciones y diligenciamiento de permisos de trabajo, uso de herramientas y pre operacionales.
2.6.3 ACTIVIDADES	Segumuento y supervision de activodades seguridad y salud en el trabajo Mantenimiento de señaliacion en obra, proteccion de areas con riesgo de caidas

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Observaciones
2.6.4 INDICADORES DE CONTAGIO	Caso Sospechoso	0	0	0	0	
	Positivo Sintomático	0	0	0	0	
	Positivo Asintomático	0	0	0	0	
	Contactos Directos	0	0	0	0	
	Contactos Indirectos	0	0	0	0	

2.6.5 VERIFICACIÓN HSE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA OBRA

La Interventoría realiza verificación de procedimientos propuestos por el Consorcio Casa Tito en el documento definido como Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), los cuales están acordes con las medidas generales dispuestas para la prevención del contagio por el nuevo coronavirus (2019-nConv), basados en los puntos listados a continuación y que abarcan los requerimientos legales dispuestos, posterior reactivación del contrato de obra se realizara el debido seguimiento a la implementación en obra y así autorizar el inicio de actividades.

ITEM	MODO DE VERIFICACIÒN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Definición de roles y responsabilidades	Socialización Registro de ingreso a obra	X		Cada uno de los jefes de área, residentes, contratistas conocen el documento y las directrices de las resoluciones emitidas, se dispone de capacitaciones virtuales ofrecidas por CAMACOL, en las que participaron activamente IDPC, Consorcio Casa Tito y Consorcio NVP
Medidas para supervisores	Socialización a cada una de las dependencias por parte del Líder de HSST, personal directo contratista, subcontratistas e interventoría	X		Los directores de proyecto del Consorcio Casa Tito y Consorcio NVP, firman y aceptan lo estipulado en los protocolos mediante ACTA DE RESPONSABILIDAD PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION PARA REDUCIR LA EXPOSICION Y CONTAGIO POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2(COBID-19), con fecha 12 de mayo de 2020
Medidas de control durante la jornada laboral	Tomas de Temperatura Encuesta estado de Salud Distanciamiento Lavado de manos Uso adecuado EPP	X		Al observar que algunas actividades por su naturaleza no permiten mantener el distanciamiento mínimo se implementa el uso de caretas y/o gafas que maximice la protección individual en las áreas de proceso.
Control de actividades durante el día	Inspecciones, recorridos y notificación verbal durante la jornada	X		El área de Seguridad y Salud en el Trabajo de Contratista e Interventoría realizan un trabajo conjunto, con el fin de afianzar la cultura de autocuidado y adherencia a los protocolos por parte del personal a todos los niveles en el proyecto; resultados que se ven reflejados en los indicadores de contagio para el cierre del periodo
Programación de actividades, personal y turnos	Se realiza programación en conjunto con el área técnica y operativa manteniendo los protocolos	X		
Uso de espacios comunes	Capacitaciones y socializaciones	X		Se definen horarios para cada grupo, horarios de alimentación
Control en baños y vestidores	Se asigna en obra una persona de servicios generales encargada de mantener L&D, cada grupo de trabajo se encargara de mantener el campamento en condiciones de higiene adecuadas	X		Cumple
Elementos de protección personal – EPP	Registros de entrega de EPP y dotación.	X		Cumple
Mantenimiento de los Elementos de protección personal – EPP	Capacitación uso adecuado y L&D	X		Cumple
Comunicación y señalización de Medidas de prevención	Instalación en obra ayudas visuales con recomendaciones y comunicados alusivos al cuidado personal	X		Constantemente se refuerza la señalización y se desarrollan charlas de sensibilización de medidas de prevención en el grupo
Entrega, carga y descarga de materiales	Se capacitara al grupo encargado de la actividad, con las técnicas de cuidado al manipular materiales y al tener contacto con personal externo a la obra	X		Se realiza inducción y seguimiento a las actividades cada vez que se ingresa o retira material
Campamentos con instalaciones temporales		X		En proceso de adecuación según actividades

Medidas de limpieza y desinfección	Uso de productos y cantidades Capacitación personal medidas L&D Técnica de L&D Asignación de responsabilidades individuales y grupales para el uso de los espacios	X		Cumple
Medidas de higiene en dotación		X		Se cumple de acuerdo a los protocolos de bioseguridad
Manipulación de equipos y herramientas		X		Se realiza retroalimentación y seguimiento en actividades
Limpieza y desinfección en baños y vestidores		X		Cumple
Medidas de contención y mitigación en obras	Se rigen a la norma vigente Resoluciones 666 y 682			Procedimientos ajustados según recomendación de la interventoría, y desarrollo de la obra

2.7 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se desarrollaron las actividades de obra bajo las condiciones de seguridad industrial obteniendo como resultado que clos indicadores cero accidentes e incdentes para el periodo.

Como resultado de la inspeccion al grupo operativo de la obra se evidencia que cuentan con los elementos de proteccion personal y dotacion correspondientes a cada actividad, asegurando desde el autocuidado el uso y mantenimiento adecuado de los mismos.

Se sigue cumpliendo el objetivo de reducir el riesgo de exposición de los trabajadores y personal involucrado en la operación, en los diferentes escenarios en los que se presenta mayor riesgo de contagio por contacto interpersonal, gracias a la implementacion de las medidas correspondientes, charlas y capacitaciones de concientizacion sobre las consecuencias del contagio por COVID -19.

Firma

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."


3. INFORME- TÉCNICO - ARQUEOLOGÍA

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020


ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL GRUPO DE ARQUEOLOGÍA

Durante el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 11 de diciembre se terminó la actividad de clasificación del material óseo, vidrio y cerámico recuperado en la Casa Tito según las especificaciones que se han mencionado en informes anteriores. Dicha actividad finalizó especificamente el 13 de noviembre. Posteriormente, se ejecutaron las actividades de digitalización y sistematización de las bases de datos, toma fotográficas de las muestras más representativas, digitalización de las fichas estratigráficas y dibujos. Adicionalmente, se realizó el inventariado del total de la muestra metálica, junto con la limpieza y fotografiado de algunos de estos elementos. Dicha limpieza se realizó con hisopos y alcohol etilico al 95 %.



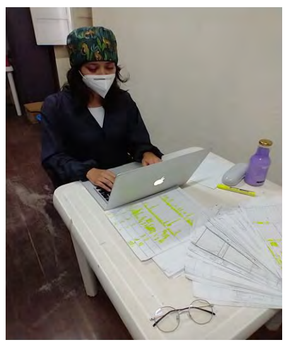


Digitalización y sistematizaciónde las bases de datos









Proceso de fotografíado del material cerámico y óseo representativo





Digitalización de fichas estratigráficas y dibujos









Inventariado y limpieza de piezas metálicas

OBSERVACIONES AL INFORME PRESENTADO POR EL EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA

El sexto informe de actividades realizado por los arqueológos en Casa Tito fue entregado a interventoría el día 23 de noviembre. En este documento se presentó la información de las actividades realizadas entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre. Como producto de la revisión se realizaron las siguientes comentarios para tener en cuenta para el documento que se entrará como informe final en el ICANH. Estas recomendaciones fueron enviadas vía correo electrónico el día 4 de diciembre.

1. Dar respuesta a los comentarios o preguntas planteadas para los informes 3 y 4 (correo reenviado abajo). Anteriormente, los comentarios realizados por mi a sus informes eran contestados en los informes posteriores, pero en esta oportunidad no se vieron las respuesta. Para mayor agilidad, pueden dar respuesta a través de un correo electrónico.

2. Todas las fotos que presenten objetos arqueológicos en los informes cuente con escala y fondo neutro, con el fin de visualizar mejor la pieza.

3. Incluir en el informe final del ICANH descripción detallada de las características de los tipos cerámicos detectados en la casa Tito.

4. Se enviaron los términos de referencia FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO emitidos por el ICANH, para que el documento de informe final (junto con anexos, bases de datos e información cartográfica) siga la estructura solicitada por esta institución.

5. Considero importante incluir en el documento de informe final medidas de manejo que deberían realizarse en el futuro en la casa si se llegan a intervenir nuevas zonas.

6. Adicionalmente, les recomiendo la realización de cajas en cartón plástico corrugado o polipropileno para que en ellas se guarden los elementos delicados como las suelas de las zapatos que recuperaron en campo.

7. No olvidar conseguir las refractarias de vidrio para poder sumergir lo más pronto que sea posible los metales que se han podido ir limpiando en estas últimas semanas.

OBSERVACIONES GENERALES REALIZADAS DESDE INTERVENTORÍA

El acompañamiento y apoyo desde interventoría arqueológica se realizó en el periodo referenciado con una dedicación del 25%, por lo que las visitas se realizan 2 a 3 veces por semana, se hizo el seguimiento a las labores, revisión de metodologías, generación de informe mensual y acompañamiento a los comités de obra. Adicionalmente, se dieron directrices y se dirigió el trabajo con los materiales arqueológicos.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

4. VARIACION DEL PRESUPUESTO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

	CAPITULOS	INICIAL PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 1 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 2 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 3 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 4 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 5 PROGRAMADO		COMPENSACIÓN N 6 PROGRAMADO	
		Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato
1	PRELIMINARES	$ 49.570.743,00	3,96%	$ 49.585.457	3,96%	$ 48.706.860	3,89%	$ 48.706.860	3,89%	$ 49.018.335	3,92%	$ 49.285.563	3,94%	$ 49.493.213	3,96%
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 65.332.683,00	5,22%	$ 65.317.969	5,22%	$ 66.196.566	5,29%	$ 69.202.483	5,53%	$ 69.202.483	5,53%	$ 69.542.028	5,56%	$ 69.419.736	5,55%
3	CIMENTACION	$ 76.365.219,00	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 76.365.219	6,11%	$ 74.759.597	5,98%	$ 74.152.825	5,93%	$ 74.938.959	5,99%
4	ESTRUCTURA CONCRETO	$ 25.807.725,00	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 25.807.725	2,06%	$ 27.076.800	2,16%
5	ESTRUCTURA DE METAL	$ 180.824.881,00	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 180.824.881	14,46%
6	MAMPOSTERIA	$ 10.410.590,00	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 10.410.590	0,83%
7	PAÑETES Y CIELO RASOS	$ 35.744.436,00	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 35.744.436	2,86%	$ 33.913.942	2,71%	$ 33.913.942	2,71%	$ 31.685.059	2,53%
8	PISOS Y CIELO RASOS	$ 112.873.613,00	9,02%	$ 112.873.613	9,02%	$ 112.873.613	9,02%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%	$ 109.822.602	8,78%
9	PARED ENCHAPES	$ 11.367.392,00	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%	$ 11.367.392	0,91%
10	CENEFAS Y PIRLANES	$ 2.237.815,00	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,18%
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	$ 30.542.856,00	2,44%	$ 30.542.856	2,44%	$ 30.542.856	2,44%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.587.950	2,45%	$ 30.676.265	2,45%
12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	$ 63.662.810,00	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 63.662.810	5,09%
13	COCINAS	$ 18.579.909,00	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 18.579.909	1,49%	$ 15.865.008	1,27%	$ 15.865.008	1,27%	$ 15.865.008	1,27%
14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	$ 34.210.834,00	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%	$ 34.210.834	2,74%
15	CERRADURAS Y MANIJAS	$ 9.399.958,00	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,75%
16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	$ 143.514.672,00	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 143.514.672	11,47%
17	ILUMINIACION	$ 12.489.189,00	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 12.489.189	1,00%
18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	$ 12.715.398,00	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 12.715.398	1,02%
19	CARPINTERIA DE MADERA	$ 135.655.608,00	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 135.655.608	10,85%	$ 141.495.150	11,31%	$ 141.495.150	11,31%	$ 141.495.150	11,31%
20	CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO	$ 70.269.590,00	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 70.269.590	5,62%
21	EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL	$ 110.000.000,00	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	8,79%
22	SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS	$ 7.438.123,00	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,59%
23	OBRAS EXTERIORES	$ 14.958.762,00	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%	$ 14.958.762	1,20%
24	ASEO Y LIMPIEZA	$ 16.868.736,00	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 16.868.736	1,35%
	COSTOS DIRECTOS	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%
	ADMINISTRACIÓN 31,37%	$ 392.388.991,73		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992		$ 392.388.992	
	IMPREVISTO 2%	$ 25.016.830,84		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831		$ 25.016.831	
	UTILIDAD 5%	$ 62.542.077,10		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077		$ 62.542.077	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU	$ 1.730.789.441,67		$ 1.730.789.442		$ 1.730.789.442		$ 1.730.789.442		$ 1.730.789.442		$ 1.730.789.442		$ 1.730.789.442	
	ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION PROYECTO TÉCNICO	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%
	COSTOS DIRECTOS	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%
	IVA 19%	$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00	
	TOTAL	$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00	

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CAPITULOS		INICIAL		COMPENSACIÓN N 7		ADICIÓN 1		ADICIÓN 8	
		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO		PROGRAMADO	
		Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato	Valor costo directo	Incidencia sobre el contrato
1	PRELIMINARES	$ 49.570.743,00	3,96%	$ 75.743.303	6,06%	$ 79.873.434	5,63%	$ 79.873.434	5,63%
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	$ 65.332.683,00	5,22%	$ 69.419.736	5,55%	$ 80.219.299	5,65%	$ 81.099.521	5,72%
3	CIMENTACION	$ 76.365.219,00	6,11%	$ 69.411.832	5,55%	$ 79.623.981	5,61%	$ 79.623.981	5,61%
4	ESTRUCTURA CONCRETO	$ 25.807.725,00	2,06%	$ 20.992.633	1,68%	$ 27.726.335	1,95%	$ 27.064.974	1,91%
5	ESTRUCTURA DE METAL	$ 180.824.881,00	14,46%	$ 180.824.881	14,46%	$ 215.704.488	15,20%	$ 215.704.488	15,20%
6	MAMPOSTERIA	$ 10.410.590,00	0,83%	$ 10.410.590	0,83%	$ 24.039.593	1,69%	$ 26.996.310	1,90%
7	PAÑETES Y CIELO RASOS	$ 35.744.436,00	2,86%	$ 26.749.737	2,14%	$ 32.804.990	2,31%	$ 33.313.732	2,35%
8	PISOS Y CIELO RASOS	$ 112.873.613,00	9,02%	$ 99.408.295	7,95%	$ 120.025.962	8,46%	$ 120.261.160	8,48%
9	PARED ENCHAPES	$ 11.367.392,00	0,91%	$ 8.063.218	0,64%	$ 9.299.197	0,66%	$ 9.299.197	0,66%
10	CENEFAS Y PIRLANES	$ 2.237.815,00	0,18%	$ 2.237.815	0,18%	$ 2.237.815	0,16%	$ 3.267.001	0,23%
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	$ 30.542.856,00	2,44%	$ 31.317.506	2,50%	$ 34.647.687	2,44%	$ 34.647.687	2,44%
12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	$ 63.662.810,00	5,09%	$ 63.662.810	5,09%	$ 53.696.211	3,78%	$ 53.696.211	3,78%
13	COCINAS	$ 18.579.909,00	1,49%	$ 15.865.008	1,27%	$ 14.585.975	1,03%	$ 14.585.975	1,03%
14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	$ 34.210.834,00	2,74%	$ 35.529.683	2,84%	$ 54.254.055	3,82%	$ 54.506.768	3,84%
15	CERRADURAS Y MANIJAS	$ 9.399.958,00	0,75%	$ 9.399.958	0,75%	$ 9.399.958	0,66%	$ 9.399.958	0,66%
16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	$ 143.514.672,00	11,47%	$ 143.514.672	11,47%	$ 177.254.959	12,49%	$ 164.397.935	11,59%
17	ILUMINIACION	$ 12.489.189,00	1,00%	$ 12.489.189	1,00%	$ 16.640.363	1,17%	$ 16.640.363	1,17%
18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	$ 12.715.398,00	1,02%	$ 12.715.398	1,02%	$ 22.128.863	1,56%	$ 22.464.328	1,58%
19	CARPINTERIA DE MADERA	$ 135.655.608,00	10,85%	$ 141.495.150	11,31%	$ 102.013.972	7,19%	$ 108.928.077	7,68%
20	CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO	$ 70.269.590,00	5,62%	$ 70.269.590	5,62%	$ 99.146.411	6,99%	$ 99.552.449	7,02%
21	EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL	$ 110.000.000,00	8,79%	$ 110.000.000	8,79%	$ 110.000.000	7,75%	$ 110.000.000	7,75%
22	SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS	$ 7.438.123,00	0,59%	$ 7.438.123	0,59%	$ 7.438.123	0,52%	$ 7.438.123	0,52%
23	OBRAS EXTERIORES	$ 14.958.762,00	1,20%	$ 17.013.680	1,36%	$ 26.874.673	1,89%	$ 26.874.673	1,89%
24	ASEO Y LIMPIEZA	$ 16.868.736,00	1,35%	$ 16.868.736	1,35%	$ 19.237.374	1,36%	$ 19.237.374	1,36%
	COSTOS DIRECTOS	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.250.841.542	100,00%	$ 1.418.873.717	100,00%	$ 1.418.873.718	100,00%
	ADMINISTRACIÓN 31,37%	$ 392.388.991,73		$ 392.388.992		$ 445.100.685		$ 445.100.685	
	IMPREVISTO 2%	$ 25.016.830,84		$ 25.016.831		$ 28.377.474		$ 28.377.474	
	UTILIDAD 5%	$ 62.542.077,10		$ 62.542.077		$ 70.943.686		$ 70.943.686	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU	$ 1.730.789.441,67		$ 1.730.789.442		$ 1.963.295.562		$ 1.963.295.564	
	ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%	$ 6.940.000,00	100,00%
	COSTOS DIRECTOS	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%	$ 6.940.000	100,00%
	IVA 19%	$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00		$ 1.318.600,00	
	TOTAL	$ 1.739.048.042,00		$ 1.739.048.042,00		$ 1.971.554.162,00		$ 1.971.554.164,00	

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

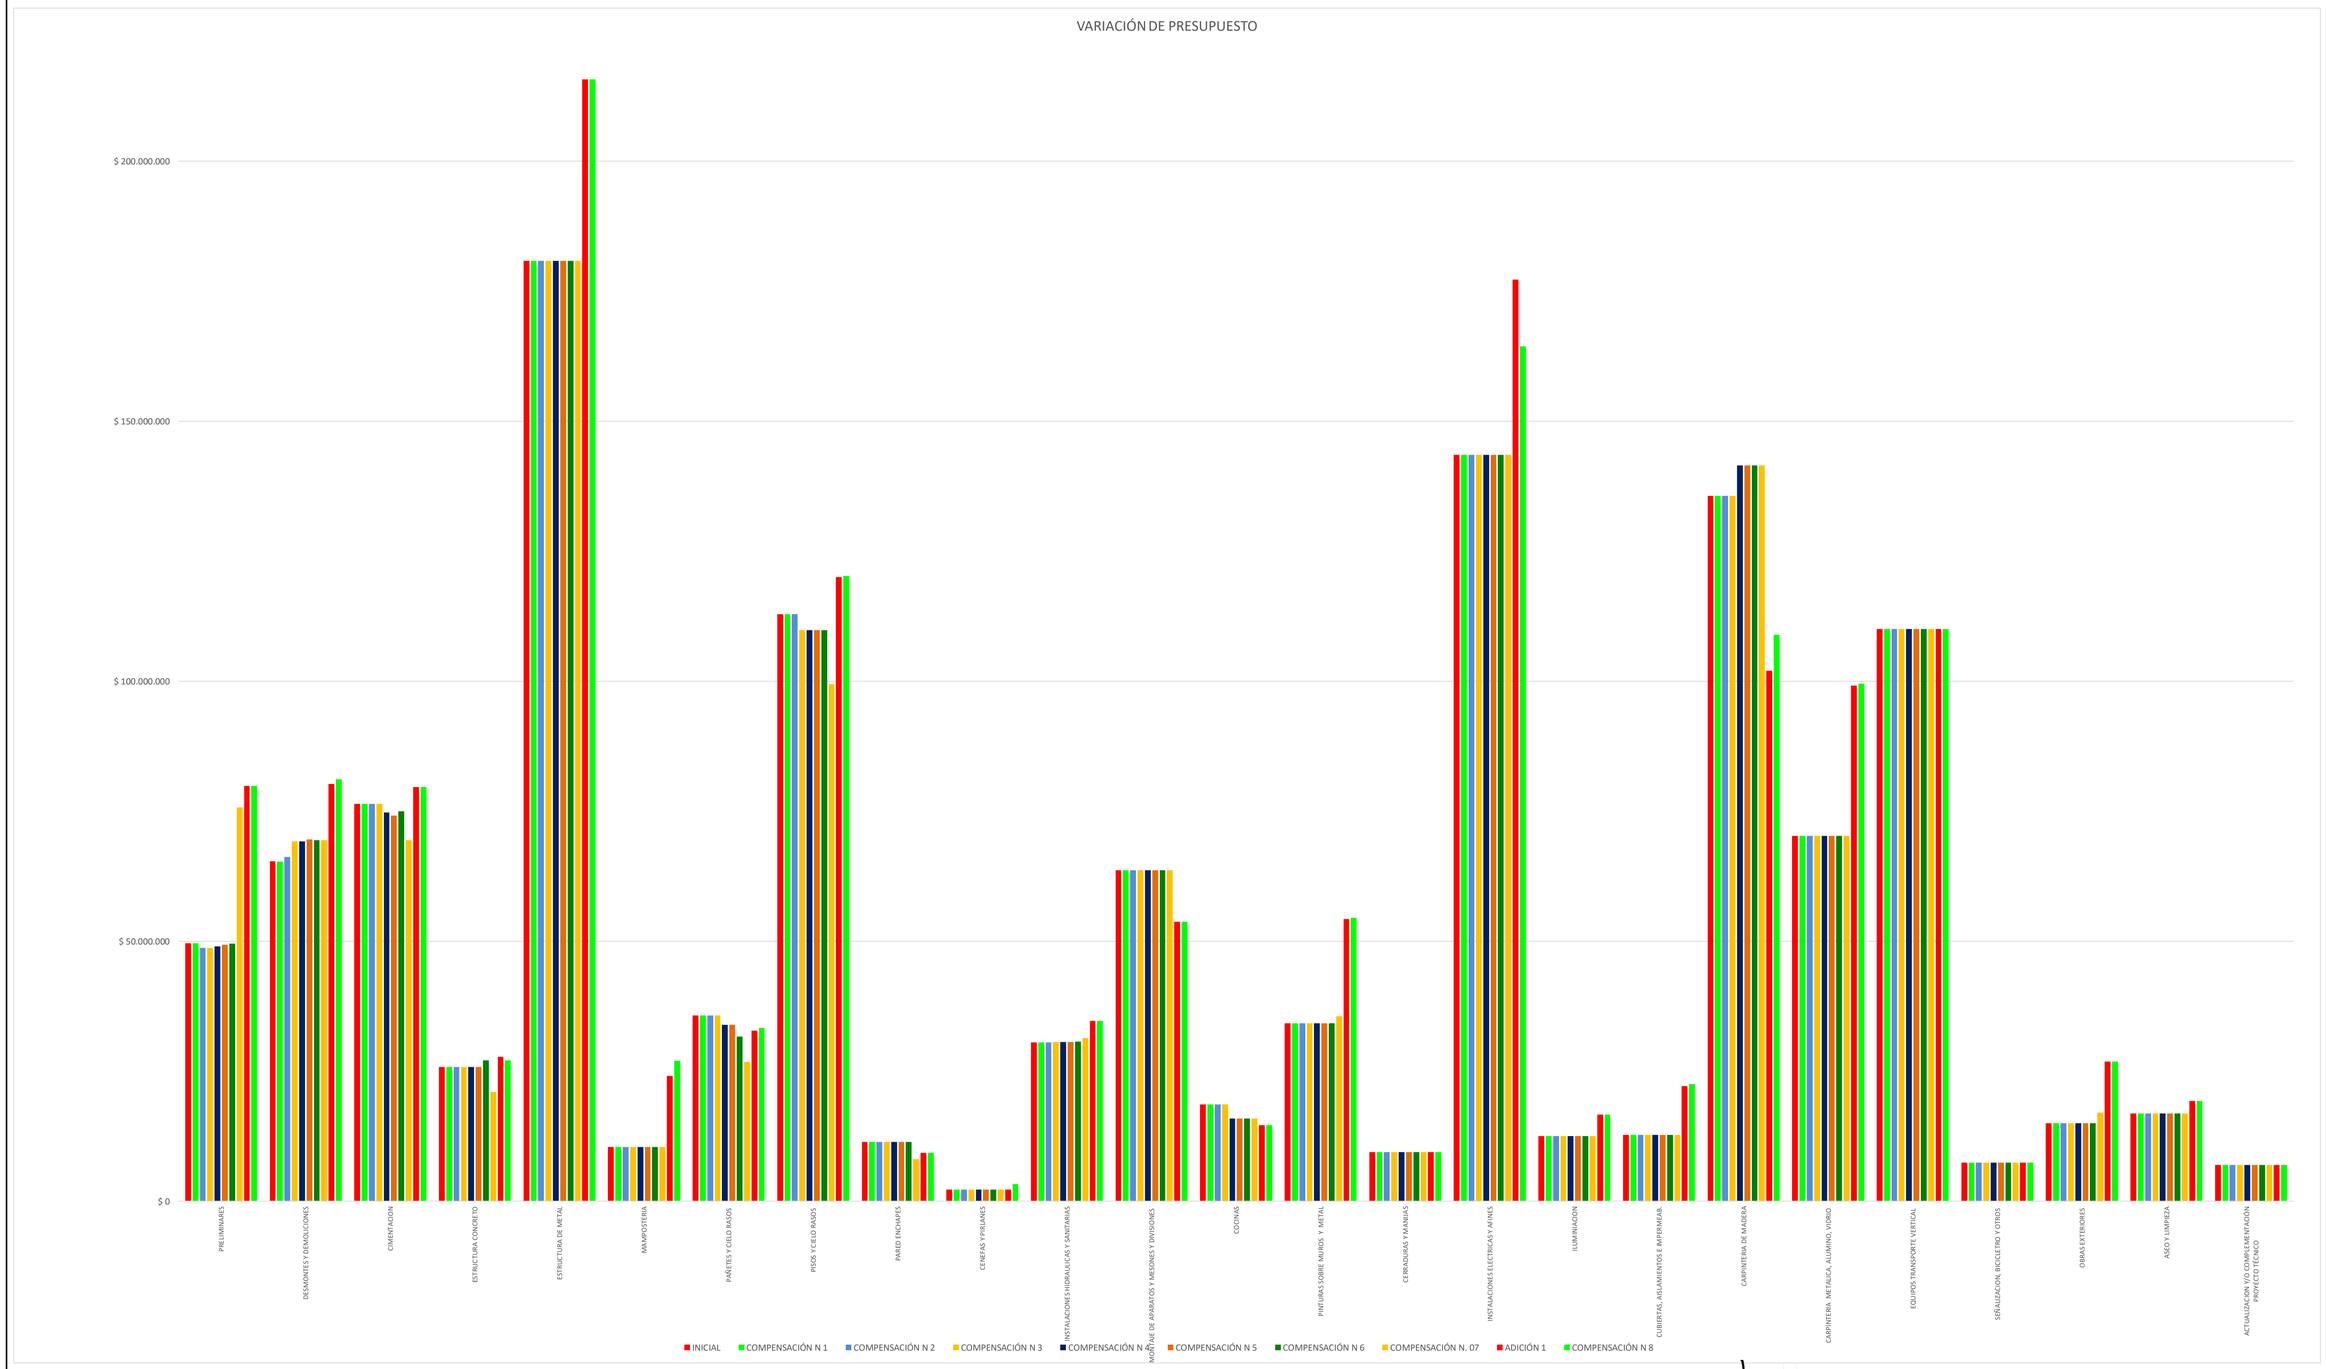

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoria Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

5. RESUMEN DE AVANCE DE INVERSION POR SEMANA

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROG	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,29%	0,22%
2	10 AL 16		$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%	$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,29%	0,45%
3	17 AL 23		$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%	$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,29%	0,67%
4	24 AL 01		$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%	$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,29%	0,89%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 8.074.145	$ 25.710.369	0,41%	1,30%	$ 8.174.105	$ 25.810.329	0,53%	1,31%
6	09 AL 15		$ 8.074.145	$ 33.784.514	0,41%	1,71%	$ 8.174.105	$ 33.984.434	0,53%	1,72%
7	16 AL 22		$ 8.074.145	$ 41.858.659	0,41%	2,12%	$ 8.174.105	$ 42.158.540	0,53%	2,14%
8	23 AL 29		$ 8.473.985	$ 50.332.644	0,43%	2,55%	$ 8.174.105	$ 50.332.645	0,53%	2,55%
9	11 AL 17	MAYO 2020	$ 19.566.396	$ 69.899.040	0,99%	3,55%	$ 13.044.264	$ 63.376.909	0,85%	3,21%
10	18 AL 24		$ 9.783.198	$ 79.682.238	0,50%	4,04%	$ 13.044.264	$ 76.421.172	0,85%	3,88%
11	25 AL 31		$ 9.783.198	$ 89.465.436	0,50%	4,54%	$ 13.044.264	$ 89.465.436	1,61%	4,54%
12	01 AL 07	JUNIO 2020	$ 18.477.693	$ 107.943.129	0,94%	5,48%	$ 18.308.000	$ 107.773.436	1,19%	5,47%
13	08 AL 14		$ 18.477.693	$ 126.420.822	0,94%	6,41%	$ 18.308.000	$ 126.081.436	1,62%	6,40%
14	15 AL 21		$ 18.477.693	$ 144.898.515	0,94%	7,35%	$ 18.308.000	$ 144.389.436	1,19%	7,32%
15	22 AL 28		$ 17.798.921	$ 162.697.436	0,90%	8,25%	$ 18.308.000	$ 162.697.436	1,19%	8,25%
16	29 AL 05	JULIO 2020	$ 32.550.081	$ 195.247.517	1,65%	9,90%	$ 32.550.081,00	$ 195.247.517	2,11%	9,90%
17	06 AL 12		$ 32.550.081	$ 227.797.598	1,65%	11,55%	$ 32.550.081,00	$ 227.797.598	2,11%	11,55%
18	13 AL 19		$ 32.550.083	$ 260.347.681	1,65%	13,21%	$ 32.550.081,00	$ 260.347.679	2,11%	13,21%
19	20 AL 26		$ 30.979.163	$ 291.326.844	1,57%	14,78%	$ 32.550.081,00	$ 292.897.760	2,11%	14,86%
20	27 AL 02	AGOSTO 2020	$ 21.455.255	$ 312.782.099	1,09%	15,86%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.015	1,39%	15,94%
21	03 AL 09		$ 21.455.255	$ 334.237.354	1,09%	16,95%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.270	1,39%	17,03%
22	10 AL 16		$ 21.455.255	$ 355.692.609	1,09%	18,04%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.526	1,39%	18,12%
23	17 AL 23		$ 21.455.256	$ 377.147.865	1,09%	19,13%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.781	1,39%	19,21%
24	24 AL 30		$ 21.455.254	$ 398.603.119	1,09%	20,22%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.036	1,39%	20,30%
25	31 AL 06	SEPTIEMBRE 2020	$ 57.149.734	$ 455.752.853	2,90%	23,12%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.898	3,70%	23,19%
26	07 AL 13		$ 57.149.734	$ 512.902.587	2,90%	26,02%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.760	3,70%	26,08%
27	14 AL 20		$ 57.149.734	$ 570.052.321	2,90%	28,91%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.622	3,70%	28,98%
28	21 AL 27		$ 56.738.427	$ 626.790.748	2,88%	31,79%	$ 57.046.864,00	$ 628.361.486	3,70%	31,87%
29	28 AL 04	OCTUBRE 2020	$ 22.328.950	$ 649.119.698	1,13%	32,92%	$ 40.382.187,40	$ 668.743.673	2,62%	33,92%
30	05 AL 11		$ 34.234.162	$ 683.353.860	1,74%	34,66%	$ 40.382.187,40	$ 709.125.861	2,62%	35,97%
31	12 AL 18		$ 53.820.064	$ 737.173.924	2,73%	37,39%	$ 40.382.187,40	$ 749.508.048	2,62%	38,02%
32	19 AL 25		$ 72.298.292	$ 809.472.216	3,67%	41,06%	$ 40.382.187,40	$ 789.890.236	2,62%	40,06%
33	26 AL 01		$ 142.540.148	$ 952.012.364	7,23%	48,29%	$ 40.382.187,40	$ 830.272.423	2,62%	42,11%


34	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 176.089.168	$ 1.128.101.532	8,93%	57,22%	$ 153.665.438,50	$ 983.937.861	9,96%	49,91%
35	09 AL 15		$ 194.087.141	$ 1.322.188.673	9,84%	67,06%	$ 153.665.438,50	$ 1.137.603.300	9,96%	57,70%
36	16 AL 22		$ 220.353.590	$ 1.542.542.263	11,18%	78,24%	$ 153.665.438,50	$ 1.291.268.738	9,96%	65,49%
37	23 AL 29		$ 176.415.826	$ 1.718.958.089	8,95%	87,19%	$ 153.665.438,50	$ 1.444.934.177	9,96%	73,29%
38	30 AL 6	DICIEMBRE 2020	$ 128.065.943	$ 1.847.024.032	6,50%	93,68%				
39	7 AL 13		$ 88.581.224	$ 1.935.605.256	4,49%	98,18%				
40	14 AL 20		$ 19.941.919	$ 1.955.547.175	1,01%	99,19%				
41	21 AL 27		$ 8.443.203	$ 1.963.990.378	0,43%	99,62%				
42	28 AL 03	ENERO 2021	$ 4.744.161	$ 1.968.734.539	0,24%	99,86%				
43	04 AL 10		$ 2.819.799	$ 1.971.554.338	0,14%	100,00%				

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CASA TITO

INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10

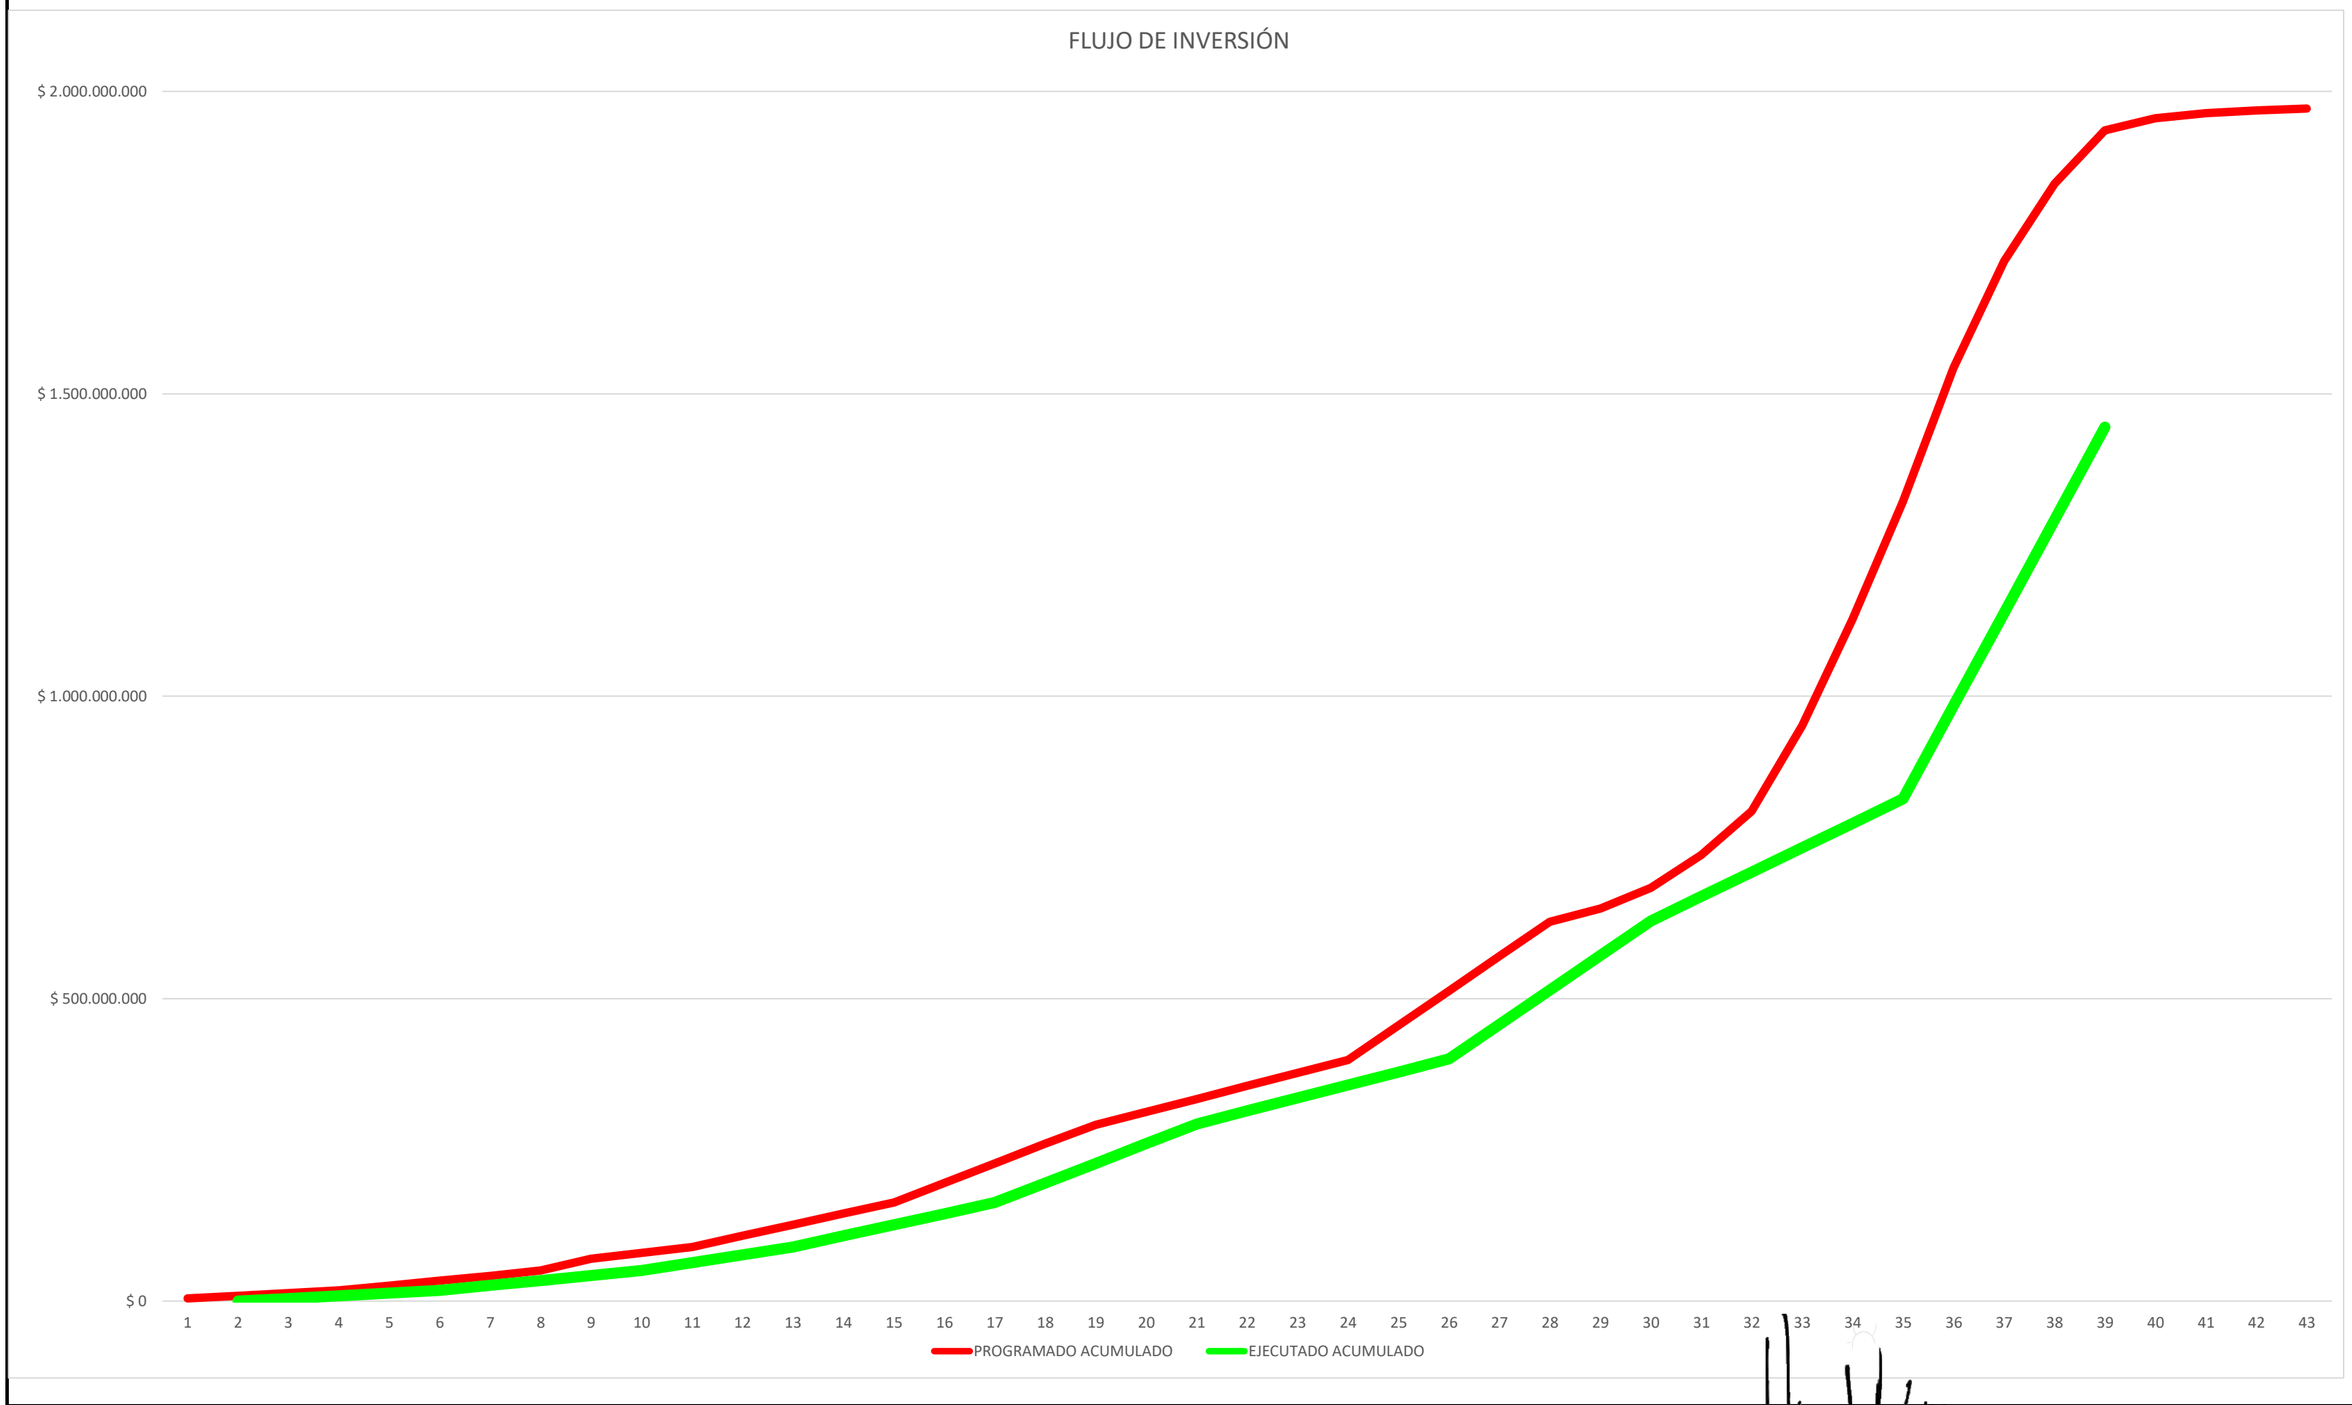

NOTA: El valor presentado es el consolidado del mes de acuerdo con el acta parcial de obra, por lo tanto este puede variar con relación a los informes semanales si no se presentan las memorias de la totalidad de las actividades ejecutadas.

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

6. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

Para el presnete periodo de noviembre la Fiducia no ha presentado el informe correspondiente a dicho mes,por lo tanto, se mantienen los datos del mes de octubre donde se realizaron ordenes de pago con cargo al anticipo, por valor de $36.120.504,82, para un acumulado de gasto por valor de $342.599.255,18 generando unos rendimientos para el presente periodo de $366.198,92 y un acumulado de $9.362.794,97, los cuales tambien han sido girados a la entidad mensualmente, se han generado gastos por notas debito y gastos bancarios por valor de $1.329.094,87. A la fecha se tienen un gasto con cargo al anticipo de $343.792.494,23 y queda un saldo en fiducia de $494.140.484,66.

Esta interventoría certifica que los gastos sobre le anticipo fueron invertidos en materiales, equipos, y mano de obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra

Valor del Anticipo	$ 869.524.021,00	
Descuentos 5% impuesto seguridad	$ 43.476.201	
Valor consignado de anticipo	$ 826.047.820,00	A
Ordenes de operación entre 01 de junio y el 30 de junio de 2020	$ 166.367.333,05	
Ordenes de operación entre 01 de julio y el 31 de julio de 2020	$ 45.862.375,98	
Ordenes de operación entre 01 de agosto y el 31 de agosto de 2020	$ 32.787.891,41	
Ordenes de operación entre 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2020	$ 61.461.119,92	
Ordenes de operación entre 01 de octubre y el 31 de octubre de 2020	$ 36.120.504,82	
Acumulado ordenes de operación giradas a 30 de septiembre de 2020	$ 342.599.225,18	C
Rendimientos junio/20	$ 2.792.804,06	
Rendimientos julio/20	$ 2.667.891,41	
Rendimientos agosto/20	$ 1.507.490,84	
Rendimientos septiembre/20	$ 2.028.409,74	
Rendimientos octubre/20	$ 366.198,92	
Acumulado de rendimientos.	$ 9.362.794,97	E
Rendimientos girados a IDPC junio/20	$ 1.962.686,75	
Rendimientos girados a IDPC julio/20	$ 1.986.085,12	
Rendimientos girados a IDPC agosto/20	$ 2.685.532,64	
Rendimientos girados a IDPC septiembre/20	$ 2.362.291,54	
Rendimientos girados a IDPC octubre/20	$ 271.143,55	
Acumulado rendimientos girados a IDPC	$ 9.267.739,60	
Rendimientos pendientes por girar	$ 95.055,37	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de junio de 2020	$ 662.818,05	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de julio de 2020	$ 171.591,92	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de agosto de 2020	$ 120.000,00	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de septiembre de 2020	$ 238.859,08	
Notas debito y Gastos bancarios (emergencia económica, chequeras, timbres, retenciones etc.) de octubre de 2020	$ 135.825,82	
Acumulado notas debito y gastos bancarios a 30 de septiembre de 2020	$ 1.329.094,87	F

6. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO		
PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020		
Relación gastos 1 al 30 de junio 2020	$ 167.030.151,10	
Relación gastos 1 al 31 de julio 2020	$ 46.033.967,90	
Relación gastos 1 al 31 de agosto 2021	$ 32.907.891,41	
Relación gastos 1 al 30 de septiembre 2020	$ 61.699.979,00	
Relación gastos 1 al 31 de octubre 2020	$ 36.120.505	
Relación de Gastos acumulada a 30 de septiembre de 2020	$ 343.792.494,23	B
Depositos para gastos financieros junio/20	$ 662.818,05	
Depositos para gastos financieros julio/20	$ 171.591,92	
Depositos para gastos financieros agosto/20	$ 120.000,00	
Depositos para gastos financieros septiembre/20	$ 238.859,08	
Depositos para gastos financieros octubre/20	$ 135.826	
Acumulado depositos para gastos financieros	$ 1.329.094,87	G
Diferencia trasferencias realizadas - relación de gastos obra	$ 135.825,82	C+F-B
Saldo en libros a 30 de septiembre de 2020.	$ 494.140.724,79	D
Saldo en fiduciaria (Verificación anticipos mas notas crédito menos cheques girados menos gastos bancarios	$ 494.140.484,66	A-C-F+G+E
Diferencia saldo en libros menos saldo fiduciaria (ordenes contabilizadas por girar)	$ -240,13	
8.1. DOCUMENTOS ANEXOS		
EXTRACTO FIDUCIA PARA ESTE PERIODO NO APLICA		

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

Director de Interventoría Consorcio NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

7. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

PERIODO 10: 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020

7.1. RESUMEN DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA	CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019	
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".	
MUNICIPIO	BOGOTÁ	
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	
VALOR INICIAL	$ 304.991.090	
VALOR ADICIONAL 01	$ 90.445.190	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 395.436.280	
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES	
PRORROGA 1	DOS (2) MESES	
PLAZO FINAL	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIO	lunes, 3 de febrero de 2020	
SUSPENSION 01	miercoles, 26 de marzo de 2020	
TERMINACIÓN SUSPENSION 01	lunes, 27 de abril de 2020	
REINICIO 01	martes, 28 de abril de 2020	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	lunes, 2 de noviembre de 2020	
FECHA DE TERMINACION FINAL	sábado, 6 de febrero de 2021	

7.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

REUNIONES DE OBRA	Acta de reunión N.30	14 de octubre de 2020
	Acta de reunión N.27	22 de octubre de 2020
	Acta de reunión N.28	28 de octubre de 2020
	Acta de reunión N.28	04 de noviembre de 2020
	Acta de reunión N.29	11 de noviembre de 2020
EVALUACIONES TECNICAS	Revision diaria de aplicación de los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD y PLAN DE MOVILIDAD SEGURO	
	Verificación de actividades de obra	
	Revisión y análisis de las especificaciones técnicas de materiales y técnicas a utilizar.	
	Revisión programación de obra.	
	Seguimiento de avance de obra y registro fotográfico	
	Elaboración de informes semanales	
	Evaluación y consulta de especificaciones de materiales a utilizar en la obra.	
FORMATOS DE CONTROL	Se realizaron y utilizaron los siguientes formatos:	
	• Plan de movilidad	
	• Protocolos de bioseguridad	
	• Formato 1 Información de personal.	
	• Formato 2 Caracterización de obra.	
	• Formato 3 Cronograma de capacitación	
	• Formato 4 Ingreso y salida de proveedores	
INFORME DE PERSONAL	Representante Legal de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Director de Interventoría	Arq. Rest. Néstor Vargas Pedroza
	Residente técnico de Interventoría	Arq. Rest. Sandra Liliana Marcelo T.
	Residente administrativo de Interventoría	Arq. Cristhian Correcha
	Profesional HSEQ	Ing. Lili Johanna Vidales Vidales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL CASA TITO INFORME DE INTERVENTORIA N°. 10	N V P CONSORCIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019 : "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO DE OBRA IDPC-OB-510-2019 : " EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

7. INFORME- TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

7.3 INFORME FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280
VALOR CESION DEL CONTRATO	$ 395.436.280
FORMA DE PAGO	Pago por avance de interventoría y de obra – (90%). El IDPC pagará actas de interventoría hasta completar el noventa por ciento (90%), del valor del contrato de interventoría, así: a) Un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, distribuido en pagos iguales, así: Pagos mensuales iguales previa aprobación y publicación en el SECOP II del informe mensual de interventoría. Se pagará mes vencido. Nota: El último pago se hará contra entrega, aprobación y publicación en el SECOP II del informe del periodo final de ejecución de interventoría. VCF = (20% x VC) / T VCF = Valor cargo fijo. VC = Valor del contrato de interventoría T= Tiempo de ejecución de contrato de interventoría b) Se pagara un setenta por ciento (70%) del valor total del contrato, distribuido en pagos iguales según los cortes de obra. Los pagos serán causados mes o periodo de corte vencido y se cancelarán de acuerdo con el avance físico de obra aprobado y registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría, hasta llegar al 100% del avance de obra. Lo anterior, de conformidad con la siguiente fórmula: VP = PAO x (70% x VC) VP = Valor a pagar por acta PAO = Porcentaje avance de obra mensual aprobado VC = Valor del contrato de interventoría Lo anterior dando como resultado que el valor total a pagar por corte de obra obedecerá a la sumatoria de los costos obtenidos en el numeral A) y B) anteriormente descritos, de acuerdo a la siguiente fórmula: VALOR TOTAL PAGAR POR PERIODO = VP + VCF II Pago del saldo del 10% contra firma del acta de entrega a satisfacción y liquidación del contrato. El saldo de diez por ciento (10%) del valor total, se pagará así: a) El diez por ciento (10%) del valor del valor total se cancelará una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción de las obras, la entrega del informe final de obra y de interventoría, la entrega de planos récord y demás documentación del contrato de obra al momento del pago. Adicionalmente, se deberá hacer entrega del borrador del acta de liquidación del contrato de obra.

VALOR TOTAL	$	395.436.280
VALOR PRIMER PAGO	$	8.942.620
VALOR SEGUNDO PAGO	$	9.210.041
VALOR TERCER PAGO	$	3.162.871
VALOR CUARTO PAGO	$	11.581.617
VALOR QUINTO PAGO	$	15.767.802
VALOR SEXTO PAGO	$	22.761.645
VALOR SEPTIMO PAGO	$	19.947.370
VALOR OCTAVO PAGO	$	34.790.951
VALOR NOVENO PAGO	$	31.565.060
VALOR DECIMO PAGO	$	126.793.447
VALOR FACTURADO ACUMULADO	$	157.729.977
PAGOS EN TRAMITE	$	126.793.447
VALOR POR PAGAR	$	237.706.303

Firmas

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
Director de Interventoría Consorcio NVP

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**					$ 3.888.391,00		$ -		$ 79.873.434,00		$ -		$ -		$ 79.873.434,00						$ 78.729.740,00		$ 1.143.694,00
1.1	**OBRAS PRELIMINARES**					$ 1.500.000,00				$ 12.274.966,00		$ -				$ 12.274.966,00						$ 12.274.966,00		$ -
1.1.1	TANQUES PLASTICOS PROVISIONALES AGUA	un	1,00	$ 639.763,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	242,00	$ 11.406,00		$ -		$ -	243,29	$ 2.774.966,00		$ -		$ -	243,29	$ 2.774.966,00	243,29	$ 2.774.965,74		$ -	243,29	$ 2.774.966,00	0,00	$ 0
1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	mes	8,00	$ 1.000.000,00	1,50	$ 1.500.000,00		$ -	9,50	$ 9.500.000,00		$ -		$ -	9,50	$ 9.500.000,00	8,00	$ 8.000.000,00	1,50	$ 1.500.000,00	9,50	$ 9.500.000,00	0,00	$ 0
1.2	**INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES**					$ 2.146.651,00		$ -		$ 5.364.778,00		$ -		$ -		$ 5.364.778,00						$ 4.300.858,00		$ 1.063.920,00
1.2.1	RED TELEFONICA PROVISIONAL L=40m	un	1,00	$ 238.834,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	un	2,00	$ 359.617,00		$ -		$ -	2,00	$ 719.234,00		$ -		$ -	2,00	$ 719.234,00	1,00	$ 359.617,00	1,00	$ 359.617,00	2,00	$ 719.234,00	0,00	$ 0
1.2.3	RED ELECTRICA PROVISIONAL.	ml	30,00	$ 29.398,00	15,00	$ 440.970,00		$ -	54,09	$ 1.590.138,00		$ -		$ -	54,09	$ 1.590.138,00	39,09	$ 1.149.167,82		$ -	39,09	$ 1.149.168,00	15,00	$ 440.970
1.2.4	SALIDA PROVISIONAL PARA LUMNARIAS	un	8,00	$ 103.825,00	6,00	$ 622.950,00		$ -	19,00	$ 1.972.675,00		$ -		$ -	19,00	$ 1.972.675,00	13,00	$ 1.349.725,00		$ -	13,00	$ 1.349.725,00	6,00	$ 622.950
NP-1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA BAÑOS PROVISIONALES	UN		$ 253.395,0	3,00	$ 760.185,00		$ -	3,00	$ 760.185,00		$ -		$ -	3,00	$ 760.185,00	-	$ -	3,00	$ 760.185,00	3,00	$ 760.185,00	0,00	$ 0
NP-1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA PARA BAÑOS PROVISIONALES	UN		$ 161.273,0	2,00	$ 322.546,00		$ -	2,00	$ 322.546,00		$ -		$ -	2,00	$ 322.546,00	-	$ -	2,00	$ 322.546,00	2,00	$ 322.546,00	0,00	$ 0
1,3	**ARQUEOLOGIA PREVENTIVA**					$ 483.480,00		$ -		$ 62.233.690,00		$ -		$ -		$ 62.233.690,00						$ 62.153.916,00		$ 79.774,00
1.3.1	TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH	gl	1,00	$ 500.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 500.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$ -	1,00	$ 500.000,00	0,00	$ 0
1.3.2	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO. (Incluye actividades de lavado, clasificación y análisis de los materiales recuperados e informe final aprobado por el ICANH)	mes	4,00	$ 8.750.030,00		$ -		$ -	7,00	$ 61.250.210,00		$ -		$ -	7,00	$ 61.250.210,00	6,00	$ 52.500.180,00	1,00	$ 8.750.030,00	7,00	$ 61.250.210,00	0,00	$ 0
NP-1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA PROTECCION DE CAÑUELAS	ML		$ 40.290,0	12,00	$ 483.480,00		$ -	12,00	$ 483.480,00		$ -		$ -	12,00	$ 483.480,00	-	$ -	10,02	$ 403.705,80	10,02	$ 403.706,00	1,98	$ 79.774
2	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**					$ 10.614.111,46		$ 440.871,07		$ 80.219.299,00		$ 932.382,56		$ 52.161,60		$ 81.099.521,00						$ 66.753.851,00		$ 14.345.671,00
2,1	**DESMONTE CARPINTERIAS**					$ 391.212,00		$ 21.320,82		$ 1.652.892,00		$ -		$ 52.161,60		$ 1.600.731,00						$ 1.600.731,00		$ -
2.1.1	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS VENTANAS MADERA No 8,9,10 (E-114 levantamiento arquitectonico)	m2	14,27	$ 28.072,00		$ -		$ -	16,91	$ 474.698,00		$ -		$ -	16,91	$ 474.698,00	16,91	$ 474.697,52		$ -	16,91	$ 474.698,00	0,00	$ 0
2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	m2	11,12	$ 32.601,00	12,00	$ 391.212,00		$ -	30,44	$ 992.374,00		$ -	1,60	$ 52.161,60	28,84	$ 940.213,00	18,44	$ 601.162,44	10,40	$ 339.050,40	28,84	$ 940.213,00	0,00	$ 0
2.1.3	DESMONTAR Y RETIRAR MARCO EN MADERA	ml	35,85	$ 5.778,00		$ -	3,69	$ 21.320,82	32,16	$ 185.820,00		$ -		$ -	32,16	$ 185.820,00	32,16	$ 185.820,48		$ -	32,16	$ 185.820,00	0,00	$ 0
2.2	**DEMOLICIONES**					$ 1.375.217,00		$ 419.550,25		$ 10.996.467,00		$ 271.755,93		$ -		$ 11.268.223,00						$ 9.969.308,00		$ 1.298.915,00
2.2.1	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO "CICLOPEO"	m3	7,91	$ 171.245,00		$ -	2,45	$ 419.550,25	5,46	$ 934.998,00	0,60	$ 102.747,00		$ -	6,06	$ 1.037.745,00	1,46	$ 250.017,70	4,60	$ 787.727,00	6,06	$ 1.037.745,00	0,00	$ 0
2.2.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m3	5,00	$ 203.530,00	2,00	$ 407.060,00		$ -	2,45	$ 498.649,00		$ -		$ -	2,45	$ 498.649,00	0,45	$ 91.588,50		$ -	0,45	$ 91.589,00	2,00	$ 407.060
2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	m2	88,00	$ 38.151,00	2,00	$ 76.302,00		$ -	166,08	$ 6.336.118,00	4,43	$ 169.008,93		$ -	170,51	$ 6.505.127,00	164,08	$ 6.259.816,08	6,43	$ 245.310,93	170,51	$ 6.505.127,00	0,00	$ 0
2.2.4	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO	m2	14,02	$ 38.151,00	10,00	$ 381.510,00		$ -	36,75	$ 1.402.049,00		$ -		$ -	36,75	$ 1.402.049,00	26,75	$ 1.020.539,25		$ -	26,75	$ 1.020.539,00	10,00	$ 381.510
2.2.5	DEMOLICIÓN DE SARDINELES, BORDILLOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE DIMENSIONES VARIABLES	ml	22,00	$ 34.023,00	15,00	$ 510.345,00		$ -	53,63	$ 1.824.653,00		$ -		$ -	53,63	$ 1.824.653,00	38,63	$ 1.314.308,49		$ -	38,63	$ 1.314.308,00	15,00	$ 510.345
2,3	**DEMOLICION MAMPOSTERIA**					$ 149.632,00		$ -		$ 4.311.355,00		$ -		$ -		$ 4.311.355,00						$ 3.671.969,00		$ 639.386,00
2.3.1	DEMOLICIÓN MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	m2	148,85	$ 37.408,00	4,00	$ 149.632,00		$ -	115,25	$ 4.311.355,00		$ -		$ -	115,25	$ 4.311.355,00	94,78	$ 3.545.530,24	3,38	$ 126.439,04	98,16	$ 3.671.969,00	17,09	$ 639.386
2,4	**DESMONTES Y DEMOLICIONES CUBIERTAS**					$ -		$ -		$ 12.435.788,00		$ 116.837,60		$ -		$ 12.552.626,00						$ 12.552.626,00		$ -
2.4.1	DESMONTE TEJA DE BARRO - LAVADO, ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO	m2	96,95	$ 18.682,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.083.977,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.083.977,00	111,55	$ 2.083.977,10		$ -	111,55	$ 2.083.977,00	0,00	$ 0
2.4.2	DEMOLICIÓN ALISTADO PARA TEJA DE BARRO - MANTO DE CUBIERTA, CHUSQUE Y TORTA DE BARRO	m2	96,95	$ 29.220,00		$ -		$ -	111,55	$ 3.259.491,00		$ -		$ -	111,55	$ 3.259.491,00	111,55	$ 3.259.491,00		$ -	111,55	$ 3.259.491,00	0,00	$ 0
2.4.3	DESMONTAR ESTRUCTURA EN MADERA TEJA DE BARRO	m2	96,95	$ 23.305,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.599.673,00		$ -		$ -	111,55	$ 2.599.673,00	111,55	$ 2.599.672,75		$ -	111,55	$ 2.599.673,00	0,00	$ 0
2.4.4	DESMONTAR BAJANTES Y CANALES LAMINA	ml	18,45	$ 10.818,00		$ -		$ -	20,27	$ 219.281,00		$ -		$ -	20,27	$ 219.281,00	20,27	$ 219.280,86		$ -	20,27	$ 219.281,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.4.5	DESMONTE DE CERCHA EN REY MADERA ROLLIZA (Incluye trasiego)	un	7,00	$ 365.534,00		$ -		$ -	9,00	$ 3.289.806,00		$ -		$ -	9,00	$ 3.289.806,00	9,00	$ 3.289.806,00		$ -	9,00	$ 3.289.806,00	0,00	$ 0
2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	ml	15,00	$ 53.108,00		$ -		$ -	18,52	$ 983.560,00	2,20	$ 116.837,60		$ -	20,72	$ 1.100.398,00	18,52	$ 983.560,16	2,20	$ 116.837,60	20,72	$ 1.100.398,00	0,00	$ 0
2,5	**DEMOLICION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 433.624,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 433.624,00**						**$ 433.624,00**		**$ -**
2.5.1	DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION	un	1,00	$ 26.626,00		$ -		$ -	3,00	$ 79.878,00		$ -		$ -	3,00	$ 79.878,00	3,00	$ 79.878,00		$ -	3,00	$ 79.878,00	0,00	$ 0
2.5.2	DEMOLICION CONEXIONES DOMICILIARIAS	un	2,00	$ 263.500,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
2.5.3	DESMONTAR Y SELLAR REDES HIDRAULICAS	un	1,00	$ 171.258,00		$ -		$ -	1,00	$ 171.258,00		$ -		$ -	1,00	$ 171.258,00	1,00	$ 171.258,00		$ -	1,00	$ 171.258,00	0,00	$ 0
2.5.4	DESMONTAR Y SELLAR REDES SANITARIAS	un	1,00	$ 182.488,00		$ -		$ -	1,00	$ 182.488,00		$ -		$ -	1,00	$ 182.488,00	1,00	$ 182.488,00		$ -	1,00	$ 182.488,00	0,00	$ 0
2,6	**DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.960.718,00**		**$ 203,16**		**$ -**		**$ 1.960.921,00**						**$ 1.960.921,00**		**$ -**
2.6.1	DESMONTAR Y RETIRAR LAMPARAS FLUORESCENTES, ROSETA, BALAS U OTROS APARATOS DE ILUMNACION	un	6,00	$ 10.871,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.097,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.097,00	7,00	$ 76.097,00		$ -	7,00	$ 76.097,00	0,00	$ 0
2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	ml	26,48	$ 3.386,00		$ -		$ -	26,48	$ 89.661,00	0,06	$ 203,16		$ -	26,54	$ 89.864,00	-	$ -	26,54	$ 89.864,44	26,54	$ 89.864,00	0,00	$ 0
2.6.3	DESMONTAR REDES ELECTRICAS (incluye rede de iluminacion, tomas, interruptores, cableado, aparatos, tuberia)	ml	180,00	$ 9.972,00		$ -		$ -	180,00	$ 1.794.960,00		$ -		$ -	180,00	$ 1.794.960,00	180,00	$ 1.794.960,00		$ -	180,00	$ 1.794.960,00	0,00	$ 0
2,7	**PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES**					**$ 6.529.727,46**		**$ -**		**$ 24.970.901,00**		**$ 543.585,87**		**$ -**		**$ 25.514.487,00**						**$ 21.289.468,00**		**$ 4.225.020,00**
2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	m2	107,34	$ 20.452,00		$ -		$ -	107,34	$ 2.195.318,00	2,89	$ 59.106,28		$ -	110,23	$ 2.254.424,00	-	$ -	110,23	$ 2.254.423,96	110,23	$ 2.254.424,00	0,00	$ 0
2.7.2	PROTECCION PARA INTERIORES MUROS (Incluye estructura de soporte, lona verde)	m2	84,00	$ 20.484,00		$ -		$ -	84,00	$ 1.720.656,00		$ -		$ -	84,00	$ 1.720.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 1.720.656
2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	m2	110,00	$ 8.070,00	276,23	$ 2.229.176,10		$ -	386,23	$ 3.116.876,00		$ -		$ -	386,23	$ 3.116.876,00	44,23	$ 356.936,10	299,46	$ 2.416.642,20	343,69	$ 2.773.578,00	42,54	$ 343.298
2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	kg/mes	12500,00	$ 1.091,00	2941,31	$ 3.208.971,36		$ -	15.441,31	$ 16.846.471,00		$ -		$ -	15.441,31	$ 16.846.471,00	11.729,92	$ 12.797.342,72	1.730,58	$ 1.888.062,78	13.460,50	$ 14.685.406,00	1980,81	$ 2.161.066
NP-2.7.5	PROTECCION EN GUADUA Y PLASTICO PARA AREAS DE EXCAVACION	M2		$ 18.193,0	60,00	$ 1.091.580,00		$ -	60,00	$ 1.091.580,00	26,63	$ 484.479,59		$ -	86,63	$ 1.576.060,00	-	$ -	86,63	$ 1.576.059,59	86,63	$ 1.576.060,00	0,00	$ 0
2,8	**VARIOS**					**$ 2.794.646,00**		**$ -**		**$ 23.457.554,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 23.457.554,00**						**$ 15.275.204,00**		**$ 8.182.350,00**
2.8.1	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	m3	420,00	$ 44.006,00		$ -		$ -	420,00	$ 18.482.520,00		$ -		$ -	420,00	$ 18.482.520,00	280,00	$ 12.321.680,00		$ -	280,00	$ 12.321.680,00	140,00	$ 6.160.840
2.8.2	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, electricos entre otros)	kg	1000,00	$ 1.542,00	1000,00	$ 1.542.000,00		$ -	2.414,00	$ 3.722.388,00		$ -		$ -	2.414,00	$ 3.722.388,00	1.414,00	$ 2.180.388,00		$ -	1.414,00	$ 2.180.388,00	1000,00	$ 1.542.000
NP - 2.8.3	DESMONTE DE PISO LAMINADO	M2		$ 5.842,0	88,00	$ 514.096,00		$ -	88,00	$ 514.096,00		$ -		$ -	88,00	$ 514.096,00	-	$ -	65,59	$ 383.176,78	65,59	$ 383.177,00	22,41	$ 130.919
NP - 2.8.4	DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTENTE EN MADERA Y TEJA DE ZINC	M2		$ 17.542,0	25,00	$ 438.550,00		$ -	25,00	$ 438.550,00		$ -		$ -	25,00	$ 438.550,00	-	$ -	22,23	$ 389.958,66	22,23	$ 389.959,00	2,77	$ 48.591
NP - 2.8.5	TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG		$ 3.000,0	100,00	$ 300.000,00		$ -	100,00	$ 300.000,00		$ -		$ -	100,00	$ 300.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 300.000
3	**CIMENTACION**					**$ 10.212.150,13**		**$ -**		**$ 79.623.981,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 79.623.981,00**						**$ 71.072.948,00**		**$ 8.551.036,00**
3,1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**					**$ 244.537,59**		**$ -**		**$ 7.770.868,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.770.868,00**						**$ 7.526.331,00**		**$ 244.538,00**
3.1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m3	59,96	$ 30.453,00	8,03	$ 244.537,59		$ -	152,10	$ 4.631.901,00		$ -		$ -	152,10	$ 4.631.901,00	144,07	$ 4.387.363,71		$ -	144,07	$ 4.387.364,00	8,03	$ 244.538
3.1.2	SUBBASE RECEBO COMPACTADO PARA CONTRAPISOS. ESPESOR 30 CMS	m3	48,52	$ 79.811,00		$ -		$ -	39,33	$ 3.138.967,00		$ -		$ -	39,33	$ 3.138.967,00	39,33	$ 3.138.966,63		$ -	39,33	$ 3.138.967,00	0,00	$ 0
3.1.3	RELLENOS CON MATERIAL COMUN PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	16,17	$ 18.932,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
3,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACION**					**$ 9.228.212,54**		**$ -**		**$ 51.464.208,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 51.464.208,00**						**$ 46.328.858,00**		**$ 5.135.350,00**
3.2.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA CIMENTACIÓN E=3 A 5CM	m2	32,10	$ 25.775,00	20,00	$ 515.500,00		$ -	51,97	$ 1.339.527,00		$ -		$ -	51,97	$ 1.339.527,00	31,97	$ 824.026,75		$ -	31,97	$ 824.027,00	20,00	$ 515.500
3.2.2	ZAPATAS. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	16,16	$ 654.407,00		$ -		$ -	6,96	$ 4.554.673,00		$ -		$ -	6,96	$ 4.554.673,00	6,96	$ 4.554.672,72		$ -	6,96	$ 4.554.673,00	0,00	$ 0
3.2.3	PEDESTALES. CONCRETO 21 Mpa	m3	4,00	$ 809.305,00		$ -		$ -	4,41	$ 3.569.035,00		$ -		$ -	4,41	$ 3.569.035,00	4,41	$ 3.569.035,05		$ -	4,41	$ 3.569.035,00	0,00	$ 0
3.2.4	VIGAS DE CIMENTACION. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m3	6,99	$ 664.539,00	0,81	$ 538.276,59		$ -	11,26	$ 7.482.709,00		$ -		$ -	11,26	$ 7.482.709,00	10,45	$ 6.944.432,55		$ -	10,45	$ 6.944.433,00	0,81	$ 538.277
3.2.5	MUROS EN CONCRETO ASCENSOR	m3	3,00	$ 582.714,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10. CONCRETO GRIS - 21 Mpa	m2	150,00	$ 94.598,00	49,20	$ 4.654.221,60		$ -	199,20	$ 18.843.922,00		$ -		$ -	199,20	$ 18.843.922,00	149,97	$ 14.186.862,06	6,43	$ 608.265,14	156,40	$ 14.795.127,00	42,80	$ 4.048.794
3.2.7	MORTERO NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	m3	2,50	$ 102.435,00	0,41	$ 41.998,35		$ -	2,91	$ 298.086,00		$ -		$ -	2,91	$ 298.086,00	1,91	$ 195.650,85	0,68	$ 69.655,80	2,59	$ 265.307,00	0,32	$ 32.779
3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES Ø 5/8", acero ASTM193 GRADO B7 L=600mm (Incluye tuercas y rosca)	un	110,00	$ 108.164,00	14,00	$ 1.514.296,00		$ -	124,00	$ 13.412.336,00		$ -		$ -	124,00	$ 13.412.336,00	110,00	$ 11.898.040,00	14,00	$ 1.514.296,00	124,00	$ 13.412.336,00	0,00	$ 0
NP. 3.2.9	CONCRETO CICLOPEO 60 - 40	M3		$ 327.320,0	6,00	$ 1.963.920,00		$ -	6,00	$ 1.963.920,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.963.920,00	-	$ -	6,00	$ 1.963.920,00	6,00	$ 1.963.920,00	0,00	$ 0
3,3	**ACERO DE REFUERZO**					**$ 739.400,00**		**$ -**		**$ 20.388.905,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 20.388.905,00**						**$ 17.217.759,00**		**$ 3.171.148,00**
3.3.1	REFUERZO CIMENTACION - 420 Mpa	kg	5000,00	$ 3.952,00		$ -		$ -	3.982,06	$ 15.737.118,00		$ -		$ -	3.982,06	$ 15.737.118,00	3.278,79	$ 12.957.778,08	66,84	$ 264.151,68	3.345,63	$ 13.221.930,00	636,43	$ 2.515.189
3.3.2	MALLAS ELECTROSOLDADAS	kg	872,00	$ 3.697,00	200,00	$ 739.400,00		$ -	1.258,26	$ 4.651.787,00		$ -		$ -	1.258,26	$ 4.651.787,00	1.058,26	$ 3.912.387,22	22,57	$ 83.441,29	1.080,83	$ 3.995.829,00	177,43	$ 655.959
4	**ESTRUCTURA CONCRETO**					**$ 6.733.702,02**		**$ -**		**$ 27.726.335,00**		**$ -**		**$ 661.360,69**		**$ 27.064.974,00**						**$ 24.597.657,00**		**$ 2.467.318,00**
4,1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**					**$ 4.400.400,00**				**$ 9.053.383,00**		**$ -**				**$ 9.053.383,00**						**$ 8.279.793,00**		**$ 773.590,00**
4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	ml	50,00	$ 44.004,00	100,00	$ 4.400.400,00		$ -	205,74	$ 9.053.383,00		$ -		$ -	205,74	$ 9.053.383,00	105,74	$ 4.652.982,96	82,42	$ 3.626.809,68	188,16	$ 8.279.793,00	17,58	$ 773.590
4,2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**					**$ 2.333.302,02**		**$ -**		**$ 18.672.952,00**		**$ -**		**$ 661.360,69**		**$ 18.011.591,00**						**$ 16.317.864,00**		**$ 1.693.728,00**
4.2.1	PLACA EN CONCRETO 10CM SOBRE LÁMINA METALDECK 2	m2	150,00	$ 108.931,00	21,42	$ 2.333.302,02		$ -	171,42	$ 18.672.952,00		$ -	6,07	$ 661.360,69	165,35	$ 18.011.591,00	149,80	$ 16.317.863,80		$ -	149,80	$ 16.317.864,00	15,55	$ 1.693.728
4.2.2	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECT.	m2	75,00	$ 96.905,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
5	**ESTRUCTURA DE METAL**					**$ 24.554.915,08**		**$ -**		**$ 215.704.488,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 215.704.488,00**						**$ 202.366.012,00**		**$ 13.338.476,00**
5,1	**ESTRUCTURA METALICA**					**$ 34.879.607,16**		**$ -**		**$ 215.704.488,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 215.704.488,00**						**$ 202.366.012,00**		**$ 13.338.476,00**
5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180,200,220,240,270,300,PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	kg	11296,61	$ 16.007,00	889,00	$ 14.230.223,00		$ -	12.185,61	$ 195.055.104,00		$ -		$ -	12.185,61	$ 195.055.104,00	11.061,36	$ 177.059.189,52	470,00	$ 7.523.290,00	11.531,36	$ 184.582.480,00	654,25	$ 10.472.624
NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	ML		$ 41.438,0	498,32	$ 20.649.384,16		$ -	498,32	$ 20.649.384,00		$ -		$ -	498,32	$ 20.649.384,00	-	$ -	429,16	$ 17.783.532,08	429,16	$ 17.783.532,00	69,16	$ 2.865.852
6	**MAMPOSTERIA**					**$ 13.629.003,00**		**$ -**		**$ 24.039.593,00**		**$ 2.956.716,70**		**$ -**		**$ 26.996.310,00**						**$ 14.493.658,00**		**$ 12.502.652,00**
6,1	**MUROS**					**$ 7.236.780,00**		**$ -**		**$ 12.305.580,00**		**$ 2.956.716,70**		**$ -**		**$ 15.262.297,00**						**$ 12.636.785,00**		**$ 2.625.512,00**
6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	m2	120,00	$ 42.240,00	33,00	$ 1.393.920,00		$ -	153,00	$ 6.462.720,00		$ -		$ -	153,00	$ 6.462.720,00	119,86	$ 5.062.886,40	28,89	$ 1.220.313,60	148,75	$ 6.283.200,00	4,25	$ 179.520
NP -6.1.3	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4	ml		$ 28.065,00	80,00	$ 2.245.200,00			80,00	$ 2.245.200,00		$ -		$ -	80,00	$ 2.245.200,00	-	$ -	47,26	$ 1.326.351,90	47,26	$ 1.326.352,00	32,74	$ 918.848
NP -6.1.4	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	UN		$ 14.972,00	230,00	$ 3.443.560,00			230,00	$ 3.443.560,00		$ -		$ -	230,00	$ 3.443.560,00	-	$ -	128,00	$ 1.916.416,00	128,00	$ 1.916.416,00	102,00	$ 1.527.144
NP -6.1.5	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 5/8" PROFUNDIDAD 15 CMS	UN		$ 15.410,00	10,00	$ 154.100,00			10,00	$ 154.100,00	191,87	$ 2.956.716,70		$ -	201,87	$ 3.110.817,00	-	$ -	201,87	$ 3.110.816,70	201,87	$ 3.110.817,00	0,00	$ 0
6,2	**MUROS LIVIANOS**					**$ 6.392.223,00**		**$ -**		**$ 11.734.013,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.734.013,00**						**$ 1.856.873,00**		**$ 9.877.140,00**
6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	m2	50,00	$ 95.371,00	53,00	$ 5.054.663,00		$ -	103,00	$ 9.823.213,00		$ -		$ -	103,00	$ 9.823.213,00	-	$ -	19,47	$ 1.856.873,37	19,47	$ 1.856.873,00	83,53	$ 7.966.340
6.2.2	MUROS (< a 50 cm) DOBLE CARA EN LAMINA FIBROCEMENTO	ml	15,00	$ 38.216,00	35,00	$ 1.337.560,00		$ -	50,00	$ 1.910.800,00		$ -		$ -	50,00	$ 1.910.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 1.910.800
7	**PAÑETES Y CIELO RASOS**					**$ 10.906.898,68**		**$ 4.851.645,00**		**$ 32.804.990,00**		**$ 508.741,13**		**$ -**		**$ 33.313.732,00**						**$ 25.736.763,00**		**$ 7.576.969,00**
7,1	**PAÑETES SOBRE MUROS**					**$ 2.421.574,20**		**$ 2.269.600,00**		**$ 7.273.004,00**		**$ 490.184,30**		**$ -**		**$ 7.763.189,00**						**$ 7.061.577,00**		**$ 701.612,00**
7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	m2	250,00	$ 19.786,00	50,00	$ 989.300,00		$ -	210,00	$ 4.155.060,00		$ -		$ -	210,00	$ 4.155.060,00	159,96	$ 3.164.968,56	14,58	$ 288.479,88	174,54	$ 3.453.448,00	35,46	$ 701.612
7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	ml	60,00	$ 12.754,00	112,30	$ 1.432.274,20		$ -	172,30	$ 2.197.514,00	36,20	$ 461.694,80		$ -	208,50	$ 2.659.209,00	59,82	$ 762.944,28	148,68	$ 1.896.264,72	208,50	$ 2.659.209,00	0,00	$ 0
7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	m2	42,00	$ 21.915,00		$ -		$ -	42,00	$ 920.430,00	1,30	$ 28.489,50		$ -	43,30	$ 948.920,00	24,47	$ 536.260,05	18,83	$ 412.659,45	43,30	$ 948.920,00	0,00	$ 0
7.1.4	PAÑETE EN ARENA, CAL Y FIBRA SINTÉTICA 1:3:1/3	m2	80,00	$ 28.370,00		$ -	80,00	$ 2.269.600,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
7,2	**CIELO RASOS**					**$ 7.325.844,48**		**$ -**		**$ 13.785.011,00**		**$ 18.556,83**		**$ -**		**$ 13.803.568,00**						**$ 12.127.671,00**		**$ 1.675.897,00**
7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	m2	20,00	$ 68.729,00	3,32	$ 228.180,28		$ -	7,32	$ 503.096,00	0,27	$ 18.556,83		$ -	7,59	$ 521.653,00	-	$ -	7,59	$ 521.653,11	7,59	$ 521.653,00	0,00	$ 0
7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	m2	152,25	$ 73.490,00	96,58	$ 7.097.664,20		$ -	165,63	$ 12.172.222,00		$ -		$ -	165,63	$ 12.172.222,00	-	$ -	148,64	$ 10.923.553,60	148,64	$ 10.923.554,00	16,99	$ 1.248.668
7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	ml	23,00	$ 30.091,00		$ -		$ -	23,00	$ 692.093,00		$ -		$ -	23,00	$ 692.093,00	-	$ -	22,68	$ 682.463,88	22,68	$ 682.464,00	0,32	$ 9.629
7.2.4	DILATACION Z CONTRA MUROS	ml	60,00	$ 6.960,00		$ -		$ -	60,00	$ 417.600,00		$ -		$ -	60,00	$ 417.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 417.600
7,3	**ESTUCOS**					**$ 1.159.480,00**		**$ 2.582.045,00**		**$ 11.746.975,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.746.975,00**						**$ 6.547.515,00**		**$ 5.199.460,00**
7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	m2	500,00	$ 13.957,00		$ -	185,00	$ 2.582.045,00	315,00	$ 4.396.455,00		$ -		$ -	315,00	$ 4.396.455,00	128,02	$ 1.786.775,14	14,67	$ 204.749,19	142,69	$ 1.991.524,00	172,31	$ 2.404.931
7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incluye cinta malla)	m2	200,00	$ 16.500,00		$ -		$ -	200,00	$ 3.300.000,00		$ -		$ -	200,00	$ 3.300.000,00	-	$ -	175,54	$ 2.896.410,00	175,54	$ 2.896.410,00	24,46	$ 403.590
7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y Drywall)	m2	100,00	$ 14.140,00	82,00	$ 1.159.480,00		$ -	182,00	$ 2.573.480,00		$ -		$ -	182,00	$ 2.573.480,00	-	$ -	16,67	$ 235.713,80	16,67	$ 235.714,00	165,33	$ 2.337.766
7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	ml	185,00	$ 7.984,00		$ -		$ -	185,00	$ 1.477.040,00		$ -		$ -	185,00	$ 1.477.040,00	74,11	$ 591.694,24	104,23	$ 832.172,32	178,34	$ 1.423.867,00	6,66	$ 53.173
8	**PISOS Y CIELO RASOS**					**$ 30.608.277,45**		**$ 9.990.611,30**		**$ 120.025.962,00**		**$ 235.198,52**		**$ -**		**$ 120.261.160,00**						**$ 109.776.743,00**		**$ 10.484.416,00**
8,1	**ALISTADO DE PISOS**					**$ 4.504.024,04**		**$ -**		**$ 10.061.784,00**		**$ 6.693,00**		**$ -**		**$ 10.068.477,00**						**$ 9.707.436,00**		**$ 361.041,00**
8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	m2	260,00	$ 21.376,00	86,00	$ 1.838.336,00		$ -	346,00	$ 7.396.096,00		$ -		$ -	346,00	$ 7.396.096,00	259,96	$ 5.556.904,96	69,15	$ 1.478.150,40	329,11	$ 7.035.055,00	16,89	$ 361.041
8.1.2	PISO EN SUELO CEMENTO PARA BASE EN TABLÓN	m3	12,00	$ 289.931,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	M2		$ 8.924,0	298,71	$ 2.665.688,04		$ -	298,71	$ 2.665.688,00	0,75	$ 6.693,00		$ -	299,46	$ 2.672.381,00	-	$ -	299,46	$ 2.672.381,04	299,46	$ 2.672.381,00	0,00	$ 0
8,2	**ACABADOS DE PISOS**					**$ 24.546.318,64**		**$ 9.650.171,30**		**$ 101.918.366,00**		**$ 111.513,51**		**$ -**		**$ 102.029.879,00**						**$ 92.018.042,00**		**$ 10.011.835,00**
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE ARCILLA e=4cm	m2	153,00	$ 82.087,00	62,30	$ 5.114.020,10		$ -	215,30	$ 17.673.331,00		$ -		$ -	215,30	$ 17.673.331,00	153,00	$ 12.559.311,00	18,66	$ 1.531.743,42	171,66	$ 14.091.054,00	43,64	$ 3.582.277
8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	m2	264,71	$ 145.507,00	34,00	$ 4.947.238,00		$ -	298,71	$ 43.464.396,00	0,75	$ 109.130,25		$ -	299,46	$ 43.573.526,00	175,00	$ 25.463.725,00	124,46	$ 18.109.801,22	299,46	$ 43.573.526,00	0,00	$ 0
8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	m2	180,00	$ 161.357,00		$ -	55,90	$ 9.019.856,30	124,10	$ 20.024.404,00		$ -		$ -	124,10	$ 20.024.404,00	105,00	$ 16.942.485,00	11,13	$ 1.795.903,41	116,13	$ 18.738.388,00	7,97	$ 1.286.015
8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	m2	82,00	$ 198.260,00	3,35	$ 664.171,00		$ -	34,98	$ 6.935.345,00		$ -		$ -	34,98	$ 6.935.345,00	-	$ -	13,29	$ 2.634.875,40	13,29	$ 2.634.875,00	21,69	$ 4.300.470
8.2.5	PISO CERAMICA(Incluye pegacor y boquilla)	m2	7,00	$ 90.045,00		$ -	7,00	$ 630.315,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP-8.2.6	JUNTA DE DILTACIÓN FLEXIBLE COLA RATON Y SIKAPAVEMENT	ML		$ 10.362,0	120,00	$ 1.243.440,00		$ -	120,00	$ 1.243.440,00	0,23	$ 2.383,26		$ -	120,23	$ 1.245.823,00	-	$ -	120,23	$ 1.245.823,26	120,23	$ 1.245.823,00	0,00	$ 0
NP-8.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISO,INCLUYE RESANE DE SUPERFICIE	M2		$ 78.964,0	15,00	$ 1.184.460,00		$ -	15,00	$ 1.184.460,00		$ -		$ -	15,00	$ 1.184.460,00	-	$ -	13,37	$ 1.055.748,68	13,37	$ 1.055.749,00	1,63	$ 128.711
NP-8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20 M A=.30 CMS PARA ESCALERAS - INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 226.100,0	28,00	$ 6.330.800,00		$ -	28,00	$ 6.330.800,00		$ -		$ -	28,00	$ 6.330.800,00	-	$ -	28,00	$ 6.330.800,00	28,00	$ 6.330.800,00	0,00	$ 0
NP-8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L=2.25 x 1.20 x 5 cms PARA ESCALERAS-INMUNIZADO SELLADO y LACADO	UN		$ 1.695.750,0	2,00	$ 3.391.500,00		$ -	2,00	$ 3.391.500,00		$ -		$ -	2,00	$ 3.391.500,00	-	$ -	2,00	$ 3.391.500,00	2,00	$ 3.391.500,00	0,00	$ 0
NP-8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA TABLON DE ARCILLA E=4CMS	ML		$ 11.742,0	78,00	$ 915.876,00		$ -	78,00	$ 915.876,00		$ -		$ -	78,00	$ 915.876,00	-	$ -	29,92	$ 351.320,64	29,92	$ 351.321,00	48,08	$ 564.555
NP-8.2.11	INSTALACIÓN DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LA EXCAVACIÓN DEL PASILLO PRIMER PISO	M2		$ 15.730,0	4,00	$ 62.920,00		$ -	4,00	$ 62.920,00		$ -		$ -	4,00	$ 62.920,00	-	$ -	3,30	$ 51.909,00	3,30	$ 51.909,00	0,70	$ 11.011
NP-8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	M2		$ 52.179,0	13,26	$ 691.893,54		$ -	13,26	$ 691.894,00		$ -		$ -	13,26	$ 691.894,00	-	$ -	10,60	$ 553.097,40	10,60	$ 553.097,00	2,66	$ 138.796
8,3	**GUARDAESCOBA**					**$ 1.557.934,77**		**$ 340.440,00**		**$ 8.045.812,00**		**$ 116.992,01**		**$ -**		**$ 8.162.804,00**						**$ 8.051.265,00**		**$ 111.540,00**
8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	ml	101,36	$ 20.354,00	14,00	$ 284.956,00		$ -	115,36	$ 2.348.037,00		$ -		$ -	115,36	$ 2.348.037,00	-	$ -	109,88	$ 2.236.497,52	109,88	$ 2.236.498,00	5,48	$ 111.540
8.3.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE 50 X 50	ml	30,00	$ 11.348,00		$ -	30,00	$ 340.440,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	ml	184,19	$ 24.023,00	52,99	$ 1.272.978,77		$ -	237,18	$ 5.697.775,00	4,87	$ 116.992,01		$ -	242,05	$ 5.814.767,00	-	$ -	242,05	$ 5.814.767,15	242,05	$ 5.814.767,00	0,00	$ 0
9	**PARED ENCHAPES**					**$ 1.235.978,38**		**$ -**		**$ 9.299.197,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.299.197,00**						**$ 8.936.939,00**		**$ 362.258,00**
9,1	**ENCHAPES PAREDES BAÑOS, COCINAS, DISCAPACITADOS**					**$ 1.235.978,38**		**$ -**		**$ 9.299.197,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.299.197,00**						**$ 8.936.939,00**		**$ 362.258,00**
9.1.1	ENCHAPE CERÁMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	m2	163,80	$ 69.398,00	17,81	$ 1.235.978,38		$ -	134,00	$ 9.299.197,00		$ -		$ -	134,00	$ 9.299.197,00	116,19	$ 8.063.218,19	12,59	$ 873.720,82	128,78	$ 8.936.939,00	5,22	$ 362.258
10	**CENEFAS Y PIRLANES**					**$ -**		**$ -**		**$ 2.237.815,00**		**$ 1.029.186,19**		**$ -**		**$ 3.267.001,00**						**$ 3.267.001,00**		**$ -**
10,1	**CENEFAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.275.255,00**		**$ 886.727,31**		**$ -**		**$ 2.161.982,00**						**$ 2.161.982,00**		**$ -**
10.1.1	CENEFA PISO GRAVILA MONA No 1 y 2	ml	45,00	$ 28.339,00		$ -		$ -	45,00	$ 1.275.255,00	31,29	$ 886.727,31		$ -	76,29	$ 2.161.982,00	-	$ -	76,29	$ 2.161.982,31	76,29	$ 2.161.982,00	0,00	$ 0
10,2	**PIRLANES EN MADERA**					**$ -**		**$ -**		**$ 962.560,00**		**$ 142.458,88**		**$ -**		**$ 1.105.019,00**						**$ 1.105.019,00**		**$ -**
10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15,20 Y 30 cm	ml	20,00	$ 48.128,00		$ -		$ -	20,00	$ 962.560,00	2,96	$ 142.458,88		$ -	22,96	$ 1.105.019,00	-	$ -	22,96	$ 1.105.018,88	22,96	$ 1.105.019,00	0,00	$ 0
11	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**					**$ 2.604.786,50**		**$ -**		**$ 34.647.687,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 34.647.687,00**						**$ 21.155.913,00**		**$ 13.491.774,00**
11,1	**ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE**					**$ -**		**$ -**		**$ 673.935,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 673.935,00**						**$ 475.830,00**		**$ 198.105,00**
11.1.1	TUBERIA PVC-P 1/2"	ml	46,17	$ 6.789,00		$ -		$ -	53,46	$ 362.940,00		$ -		$ -	53,46	$ 362.940,00	53,46	$ 362.939,94		$ -	53,46	$ 362.940,00	0,00	$ 0
11.1.2	ACCEROSIOS PVC-P 1/2"	un	24,00	$ 2.576,00		$ -		$ -	24,00	$ 61.824,00		$ -		$ -	24,00	$ 61.824,00	24,00	$ 61.824,00		$ -	24,00	$ 61.824,00	0,00	$ 0
11.1.3	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	2,00	$ 10.199,00		$ -		$ -	2,00	$ 20.398,00		$ -		$ -	2,00	$ 20.398,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 20.398
11.1.4	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	5,00	$ 2.341,00		$ -		$ -	5,00	$ 11.705,00		$ -		$ -	5,00	$ 11.705,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 11.705
11.1.5	UNIVERSAL H.G. 1/2"	un	2,00	$ 7.323,00		$ -		$ -	2,00	$ 14.646,00		$ -		$ -	2,00	$ 14.646,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.646
11.1.6	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	2,00	$ 25.533,00		$ -		$ -	2,00	$ 51.066,00		$ -		$ -	2,00	$ 51.066,00	2,00	$ 51.066,00		$ -	2,00	$ 51.066,00	0,00	$ 0
11.1.7	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	2,00	$ 40.554,00		$ -		$ -	2,00	$ 81.108,00		$ -		$ -	2,00	$ 81.108,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 81.108
11.1.8	FLOTADOR MECANICO 1/2"	un	1,00	$ 70.248,00		$ -		$ -	1,00	$ 70.248,00		$ -		$ -	1,00	$ 70.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 70.248
11,2	**RED GENERAL AGUA FRIA PRESION**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.220.146,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.220.146,00**						**$ 917.005,00**		**$ 303.141,00**
11.2.1	TUBERIA PVC-P 1 1/2"	ml	15,00	$ 17.234,00		$ -		$ -	15,00	$ 258.510,00		$ -		$ -	15,00	$ 258.510,00	15,00	$ 258.510,00		$ -	15,00	$ 258.510,00	0,00	$ 0
11.2.2	ACCESORIOS PVC-P 1 1/2"	un	8,00	$ 9.302,00		$ -		$ -	8,00	$ 74.416,00		$ -		$ -	8,00	$ 74.416,00	8,00	$ 74.416,00		$ -	8,00	$ 74.416,00	0,00	$ 0
11.2.3	TUBERIA PVC-P 1 1/4"	ml	15,00	$ 15.658,00		$ -		$ -	15,00	$ 234.870,00		$ -		$ -	15,00	$ 234.870,00	15,00	$ 234.870,00		$ -	15,00	$ 234.870,00	0,00	$ 0
11.2.4	ACCEROSIOS PVC-P 1 1/4"	un	9,00	$ 6.237,00		$ -		$ -	9,00	$ 56.133,00		$ -		$ -	9,00	$ 56.133,00	9,00	$ 56.133,00		$ -	9,00	$ 56.133,00	0,00	$ 0
11.2.5	REGISTRO P/D 11/2"	un	2,00	$ 146.538,00		$ -		$ -	2,00	$ 293.076,00		$ -		$ -	2,00	$ 293.076,00	2,00	$ 293.076,00		$ -	2,00	$ 293.076,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
11.2.6	REGISTRO P/D 11/4"	un	2,00	$ 111.838,00		$ -		$ -	2,00	$ 223.676,00		$ -		$ -	2,00	$ 223.676,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 223.676
11.2.7	REGISTRO BOLA 3/4"	un	1,00	$ 32.609,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.609,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.609,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.609
11.2.8	REGISTRO BOLA 1/2"	un	2,00	$ 23.428,00		$ -		$ -	2,00	$ 46.856,00		$ -		$ -	2,00	$ 46.856,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 46.856
11,3	**PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA (SOLO PARAL)**					**$ -**		**$ -**		**$ 270.146,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 270.146,00**						**$ 157.829,00**		**$ 112.317,00**
11.3.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 22.547,00		$ -		$ -	5,00	$ 112.735,00		$ -		$ -	5,00	$ 112.735,00	5,00	$ 112.735,00		$ -	5,00	$ 112.735,00	0,00	$ 0
11.3.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 21.963,00		$ -		$ -	2,00	$ 43.926,00		$ -		$ -	2,00	$ 43.926,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 43.926
11.3.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 22.547,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.094,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.094,00	2,00	$ 45.094,00		$ -	2,00	$ 45.094,00	0,00	$ 0
11.3.4	ORINAL	un	1,00	$ 22.797,00		$ -		$ -	1,00	$ 22.797,00		$ -		$ -	1,00	$ 22.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.797
11.3.5	LLAVES MANGUERA 1/2"	un	2,00	$ 22.797,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.594,00		$ -		$ -	2,00	$ 45.594,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 45.594
11,4	**SALIDAS SANITARIAS (SOLO PARAL)**					**$ -**		**$ -**		**$ 447.565,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 447.565,00**						**$ 147.612,00**		**$ 299.953,00**
11.4.1	LAVAMANOS	un	2,00	$ 61.170,00		$ -		$ -	2,00	$ 122.340,00		$ -		$ -	2,00	$ 122.340,00	1,00	$ 61.170,00		$ -	1,00	$ 61.170,00	1,00	$ 61.170
11.4.2	SANITARIO DE FLUXÓMETRO	un	2,00	$ 103.314,00		$ -		$ -	2,00	$ 206.628,00		$ -		$ -	2,00	$ 206.628,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 206.628
11.4.3	LAVAPLATOS DOBLE	un	1,00	$ 43.221,00		$ -		$ -	2,00	$ 86.442,00		$ -		$ -	2,00	$ 86.442,00	2,00	$ 86.442,00		$ -	2,00	$ 86.442,00	0,00	$ 0
11.4.4	ORINAL	un	1,00	$ 32.155,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.155,00		$ -		$ -	1,00	$ 32.155,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.155
11,5	**BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES , DESAGUES APARATOS Y REDES**					**$ -**		**$ -**		**$ 4.555.346,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.555.346,00**						**$ 2.355.554,00**		**$ 2.199.792,00**
11.5.1	TUBERIA PVCS 6"	ml	9,00	$ 64.162,00		$ -		$ -	9,00	$ 577.458,00		$ -		$ -	9,00	$ 577.458,00	4,50	$ 288.729,00		$ -	4,50	$ 288.729,00	4,50	$ 288.729
11.5.2	ACCESORIOS PVCS 6"	un	3,00	$ 102.841,00		$ -		$ -	3,00	$ 308.523,00		$ -		$ -	3,00	$ 308.523,00	3,00	$ 308.523,00		$ -	3,00	$ 308.523,00	0,00	$ 0
11.5.3	TUBERIA PVCS 4"	ml	53,00	$ 35.126,00		$ -		$ -	53,00	$ 1.861.678,00		$ -		$ -	53,00	$ 1.861.678,00	16,10	$ 565.528,60		$ -	16,10	$ 565.529,00	36,90	$ 1.296.149
11.5.4	ACCESORIOS PVCS 4"	un	22,00	$ 23.672,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00	14,00	$ 331.408,00		$ -	14,00	$ 331.408,00	8,00	$ 189.376
11.5.5	TUBERIA PVCS 3"	ml	12,00	$ 27.507,00		$ -		$ -	12,00	$ 330.084,00		$ -		$ -	12,00	$ 330.084,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 330.084
11.5.6	ACCESORIOS PVCS 3"	un	6,00	$ 15.909,00		$ -		$ -	6,00	$ 95.454,00		$ -		$ -	6,00	$ 95.454,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 95.454
11.5.7	TUBERIA PVCS 2"	ml	11,00	$ 27.911,00		$ -		$ -	25,00	$ 697.775,00		$ -		$ -	25,00	$ 697.775,00	25,00	$ 697.775,00		$ -	25,00	$ 697.775,00	0,00	$ 0
11.5.8	ACCESORIOS PVCS 2"	un	6,00	$ 10.906,00		$ -		$ -	15,00	$ 163.590,00		$ -		$ -	15,00	$ 163.590,00	15,00	$ 163.590,00		$ -	15,00	$ 163.590,00	0,00	$ 0
11,6	**VENTILACIONES Y REVENTILACIONES / SANITARIAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 783.866,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 783.866,00**						**$ -**		**$ 783.866,00**
11.6.1	TUBERIA PVCL 4"	ml	11,00	$ 32.600,00		$ -		$ -	11,00	$ 358.600,00		$ -		$ -	11,00	$ 358.600,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 358.600
11.6.2	ACCESORIOS PVC-L 4"	un	3,00	$ 23.672,00		$ -		$ -	3,00	$ 71.016,00		$ -		$ -	3,00	$ 71.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 71.016
11.6.3	TUBERIA PVCL 2"	ml	12,00	$ 23.159,00		$ -		$ -	12,00	$ 277.908,00		$ -		$ -	12,00	$ 277.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 277.908
11.6.4	ACCESORIOS PVC-L 2"	un	7,00	$ 10.906,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.342,00		$ -		$ -	7,00	$ 76.342,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 76.342
11,7	**BAJANTES Y DESAGUES AGUAS LLUVIAS Y REDES PISO 1O. Y CONEXIÓN ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN.**					**$ -**		**$ -**		**$ 7.522.399,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.522.399,00**						**$ 3.171.720,00**		**$ 4.350.679,00**
11.7.1	TUBERIA PVC 6" ALL	ml	33,00	$ 64.162,00		$ -		$ -	33,00	$ 2.117.346,00		$ -		$ -	33,00	$ 2.117.346,00	14,00	$ 898.268,00		$ -	14,00	$ 898.268,00	19,00	$ 1.219.078
11.7.2	ACCESORIOS PVC 6" ALL	un	3,00	$ 102.841,00		$ -		$ -	4,00	$ 411.364,00		$ -		$ -	4,00	$ 411.364,00	4,00	$ 411.364,00		$ -	4,00	$ 411.364,00	0,00	$ 0
11.7.3	TUBERIA PVC 4" ALL	ml	64,00	$ 35.126,00		$ -		$ -	64,00	$ 2.248.064,00		$ -		$ -	64,00	$ 2.248.064,00	26,00	$ 913.276,00		$ -	26,00	$ 913.276,00	38,00	$ 1.334.788
11.7.4	ACCESORIOS PVC 4" ALL	un	22,00	$ 23.672,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00		$ -		$ -	22,00	$ 520.784,00	16,00	$ 378.752,00		$ -	16,00	$ 378.752,00	6,00	$ 142.032
11.7.5	TUBERIA PVC 3" ALL	ml	29,00	$ 36.104,00		$ -		$ -	29,00	$ 1.047.016,00		$ -		$ -	29,00	$ 1.047.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 1.047.016
11.7.6	ACCESORIOS PVC 3" ALL	un	8,00	$ 15.909,00		$ -		$ -	8,00	$ 127.272,00		$ -		$ -	8,00	$ 127.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 127.272
11.7.7	SIFÓN DE PISO 2"	un	1,00	$ 52.531,00		$ -		$ -	1,00	$ 52.531,00		$ -		$ -	1,00	$ 52.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 52.531
11.7.8	SIFÓN DE PISO 4"	un	9,00	$ 95.010,00		$ -		$ -	9,00	$ 855.090,00		$ -		$ -	9,00	$ 855.090,00	6,00	$ 570.060,00		$ -	6,00	$ 570.060,00	3,00	$ 285.030
11.7.9	SIFÓN DE PISO 3"	un	2,00	$ 71.466,00		$ -		$ -	2,00	$ 142.932,00		$ -		$ -	2,00	$ 142.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 142.932
11,8	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**					**$ 1.879.392,00**		**$ -**		**$ 2.819.088,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.819.088,00**						**$ 1.879.392,00**		**$ 939.696,00**
11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80X0,80	un	2,00	$ 469.848,00	4,00	$ 1.879.392,00		$ -	6,00	$ 2.819.088,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.819.088,00	2,00	$ 939.696,00	2,00	$ 939.696,00	4,00	$ 1.879.392,00	2,00	$ 939.696
11,9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					**$ -**		**$ -**		**$ 2.490.189,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.490.189,00**						**$ -**		**$ 2.490.189,00**
11.9.1	EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN	m3	25,00	$ 30.453,00		$ -		$ -	25,00	$ 761.325,00		$ -		$ -	25,00	$ 761.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 761.325
11.9.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	m3	27,00	$ 64.032,00		$ -		$ -	27,00	$ 1.728.864,00		$ -		$ -	27,00	$ 1.728.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 1.728.864
11,10	**ABRAZADERAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 95.872,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 95.872,00**						**$ -**		**$ 95.872,00**
11.10.1	ABRAZADERAS BAJANTES AGUAS LLUVIAS 4"	un	3,00	$ 16.356,00		$ -		$ -	3,00	$ 49.068,00		$ -		$ -	3,00	$ 49.068,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 49.068
11.10.2	ABRAZADERAS IPO U DE 1-1/4" A 2"	un	4,00	$ 11.701,00		$ -		$ -	4,00	$ 46.804,00		$ -		$ -	4,00	$ 46.804,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 46.804
11,11	**DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**					**$ -**		**$ -**		**$ 188.572,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 188.572,00**						**$ -**		**$ 188.572,00**
11.11.1	DESINFECCION SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 188.572,00		$ -		$ -	1,00	$ 188.572,00		$ -		$ -	1,00	$ 188.572,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 188.572
11,12	**LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 78.803,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 78.803,00**						**$ -**		**$ 78.803,00**
11.12.1	LAVADO DE TANQUE SEGÚN ESPECIFICACIONES	un	1,00	$ 78.803,00		$ -		$ -	1,00	$ 78.803,00		$ -		$ -	1,00	$ 78.803,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 78.803
11,13	**MATERIALES PARA PRUEBAS PERMANENTES DE PRESION**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 138.555,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 138.555,00**						**$ 138.555,00**		**$ -**
11.13.1	MANOMETRO 200 PSI	un	1,00	$ 42.792,00		$ -		$ -	1,00	$ 42.792,00		$ -		$ -	1,00	$ 42.792,00	1,00	$ 42.792,00		$ -	1,00	$ 42.792,00	0,00	$ 0
11.13.2	TUBERIA H.G. 1/2"	ml	1,00	$ 10.199,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.199,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.199,00	1,00	$ 10.199,00		$ -	1,00	$ 10.199,00	0,00	$ 0
11.13.3	ACCESORIO H.G. 1/2"	un	3,00	$ 7.194,00		$ -		$ -	3,00	$ 21.582,00		$ -		$ -	3,00	$ 21.582,00	3,00	$ 21.582,00		$ -	3,00	$ 21.582,00	0,00	$ 0
11.13.4	REGISTRO DE BOLA 1/2"	un	1,00	$ 23.428,00		$ -		$ -	1,00	$ 23.428,00		$ -		$ -	1,00	$ 23.428,00	1,00	$ 23.428,00		$ -	1,00	$ 23.428,00	0,00	$ 0
11.13.5	CHEQUE CORTINA 1/2"	un	1,00	$ 40.554,00		$ -		$ -	1,00	$ 40.554,00		$ -		$ -	1,00	$ 40.554,00	1,00	$ 40.554,00		$ -	1,00	$ 40.554,00	0,00	$ 0
11,14	**BOMBAS**				**$ -**	**$ 1.450.789,00**	**$ -**	**$ -**		**$ 13.363.205,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.363.205,00**						**$ 11.912.416,00**		**$ 1.450.789,00**
11.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUY 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	un	1,00	$ 11.912.416,00		$ -		$ -	1,00	$ 11.912.416,00		$ -		$ -	1,00	$ 11.912.416,00	-	$ -	1,00	$ 11.912.416,00	1,00	$ 11.912.416,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Página 1 de 1
Código:
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 11.14.2	TUBERIA PVC-P 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 26.185,00	37,00	$ 968.845,00		$ -	37,00	$ 968.845,00		$ -		$ -	37,00	$ 968.845,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 968.845
NP 11.14.3	TUBERIA PVC-P 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 11.208,00	43,00	$ 481.944,00		$ -	43,00	$ 481.944,00		$ -		$ -	43,00	$ 481.944,00	-	$ -		$ -	-	$ -	43,00	$ 481.944
12	**MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES**					**$ 22.264,00**		**$ 9.988.863,00**		**$ 53.696.211,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 53.696.211,00**						**$ 47.156.626,00**		**$ 6.539.585,00**
12,1	**APARATOS**					**$ -**		**$ 2.293.327,00**		**$ 23.160.096,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 23.160.096,00**						**$ 22.005.749,00**		**$ 1.154.347,00**
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE SOBREPONER (Incluye griferia, conexión y acoples)	un	9,00	$ 401.184,00		$ -	3,00	$ 1.203.552,00	6,00	$ 2.407.104,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.407.104,00	-	$ -	6,00	$ 2.407.104,00	6,00	$ 2.407.104,00	0,00	$ 0
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADOS AQUAJET DE INCRUSTAR o similar (Incluye conexión y acoples)	un	1,00	$ 585.003,00		$ -		$ -	1,00	$ 585.003,00		$ -		$ -	1,00	$ 585.003,00	1,00	$ 585.003,00		$ -	1,00	$ 585.003,00	0,00	$ 0
12.1.3	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES (Fluxometro)	un	6,00	$ 1.174.647,00		$ -		$ -	6,00	$ 7.047.882,00		$ -		$ -	6,00	$ 7.047.882,00	6,00	$ 7.047.882,00		$ -	6,00	$ 7.047.882,00	0,00	$ 0
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO CORONA BALTICO Y/O SIMILAR FLUXÓMETRO DISCAPACITADOS CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA	un	1,00	$ 1.353.103,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.353.103,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.353.103,00	1,00	$ 1.353.103,00		$ -	1,00	$ 1.353.103,00	0,00	$ 0
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS CON GRIFERÍA BAJO PONER (Tramontina o similar)	un	1,00	$ 512.285,00		$ -		$ -	1,00	$ 512.285,00		$ -		$ -	1,00	$ 512.285,00	-	$ -	1,00	$ 512.285,00	1,00	$ 512.285,00	0,00	$ 0
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO CON GRIFERIA (tramontina o similar, bajo poner) cocineta	un	1,00	$ 426.501,00		$ -		$ -	1,00	$ 426.501,00		$ -		$ -	1,00	$ 426.501,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 426.501
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ELECTRICA 4 PUESTOS (Empotrar Eléctrica 4 Q Vitroceramica Fischer o similar)	un	1,00	$ 2.206.349,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.206.349,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.206.349,00	-	$ -	1,00	$ 2.206.349,00	1,00	$ 2.206.349,00	0,00	$ 0
12.1.8	ORINAL ALONGADO, CONEXIÓN POSTERIOR 0,125 GPD. IMPORTADO o similar	un	4,00	$ 1.089.775,00		$ -	1,00	$ 1.089.775,00	3,00	$ 3.269.325,00		$ -		$ -	3,00	$ 3.269.325,00	3,00	$ 3.269.325,00		$ -	3,00	$ 3.269.325,00	0,00	$ 0
12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO,	un	5,00	$ 429.262,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.146.310,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.146.310,00	-	$ -	4,00	$ 1.717.048,00	4,00	$ 1.717.048,00	1,00	$ 429.262
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	un	10,00	$ 209.977,00		$ -		$ -	10,00	$ 2.099.770,00		$ -		$ -	10,00	$ 2.099.770,00	-	$ -	10,00	$ 2.099.770,00	10,00	$ 2.099.770,00	0,00	$ 0
12.1.11	ESPEJOS PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	m2	8,00	$ 81.137,00		$ -		$ -	8,00	$ 649.096,00		$ -		$ -	8,00	$ 649.096,00	-	$ -	4,32	$ 350.511,00	4,32	$ 350.512,00	3,68	$ 298.584
12.1.12	EXTINTORES ABC	un	6,00	$ 76.228,00		$ -		$ -	6,00	$ 457.368,00		$ -		$ -	6,00	$ 457.368,00	-	$ -	6,00	$ 457.368,00	6,00	$ 457.368,00	0,00	$ 0
12,2	**MESONES**					**$ -**		**$ -**		**$ 14.377.500,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.377.500,00**						**$ 10.687.275,00**		**$ 3.690.225,00**
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESÓN CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL e.=20 mm a.mesón.=60 cm, CON FALDÓN Y SALPICADERO, EPÓXICO DE ADHESIÓN	ml	18,00	$ 798.750,00		$ -		$ -	18,00	$ 14.377.500,00		$ -		$ -	18,00	$ 14.377.500,00	-	$ -	13,38	$ 10.687.275,00	13,38	$ 10.687.275,00	4,62	$ 3.690.225
12,3	**GRIFERIAS Y ACCESORIOS**					**$ 22.264,00**		**$ 212.580,00**		**$ 1.768.315,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.768.315,00**						**$ 1.679.259,00**		**$ 89.056,00**
12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado) + BARRA DOBLE DE SOBREPONER (Acero ino. Satinado importado)	un	1,00	$ 587.833,00		$ -		$ -	1,00	$ 587.833,00		$ -		$ -	1,00	$ 587.833,00	-	$ -	1,00	$ 587.833,00	1,00	$ 587.833,00	0,00	$ 0
12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	un	6,00	$ 106.290,00		$ -	2,00	$ 212.580,00	4,00	$ 425.160,00		$ -		$ -	4,00	$ 425.160,00	-	$ -	4,00	$ 425.160,00	4,00	$ 425.160,00	0,00	$ 0
12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	un	6,00	$ 84.285,00		$ -		$ -	6,00	$ 505.710,00		$ -		$ -	6,00	$ 505.710,00	-	$ -	6,00	$ 505.710,00	6,00	$ 505.710,00	0,00	$ 0
12.3.4	LLAVE TERMINAL	un	5,00	$ 22.264,00	1,00	$ 22.264,00		$ -	6,00	$ 133.584,00		$ -		$ -	6,00	$ 133.584,00	-	$ -	2,00	$ 44.528,00	2,00	$ 44.528,00	4,00	$ 89.056
12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3 x 2". C/I	un	6,00	$ 19.338,00		$ -		$ -	6,00	$ 116.028,00		$ -		$ -	6,00	$ 116.028,00	-	$ -	6,00	$ 116.028,00	6,00	$ 116.028,00	0,00	$ 0
12,4	**DIVISIONES DE BAÑOS**					**$ -**		**$ 7.482.956,00**		**$ 14.390.300,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.390.300,00**						**$ 12.784.343,00**		**$ 1.605.957,00**
12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (segun diseño)	m2	38,00	$ 575.612,00		$ -	13,00	$ 7.482.956,00	25,00	$ 14.390.300,00		$ -		$ -	25,00	$ 14.390.300,00	-	$ -	22,21	$ 12.784.342,52	22,21	$ 12.784.343,00	2,79	$ 1.605.957
13	**COCINAS**					**$ 648.435,00**		**$ 1.927.468,00**		**$ 14.585.975,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.585.975,00**						**$ 14.585.975,00**		**$ -**
13,1	**COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA**					**$ 648.435,00**		**$ -**		**$ 13.622.241,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.622.241,00**						**$ 13.622.241,00**		**$ -**
13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTORA, **ZONA DE CAFETERIA** (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	un	1,00	$ 12.973.806,00		$ -		$ -	1,00	$ 12.973.806,00		$ -		$ -	1,00	$ 12.973.806,00	0,70	$ 9.081.664,20	0,30	$ 3.892.141,80	1,00	$ 12.973.806,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP 13.1.2	MUEBLE PARA ÁREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1,50 MTS	ML		$ 432.290,00	1,50	$ 648.435,00		$ -	1,50	$ 648.435,00		$ -		$ -	1,50	$ 648.435,00			1,50		1,50	$ 648.435,00	0,00	$ 0
13,2	**COCINETA EDIFICIO ANTIGUO**					**$ -**		**$ 1.927.468,00**		**$ 963.734,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 963.734,00**						**$ 963.734,00**		**$ -**
13.2.1	COCINETA EDIFICIO **ANTIGUO REST**. (mueble alto, mueble bajo, con cajoneras de cierre lento, segun diseño)	un	1,00	$ 2.714.901,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	un	3,00	$ 963.734,00		$ -	2,00	$ 1.927.468,00	1,00	$ 963.734,00		$ -		$ -	1,00	$ 963.734,00	-	$ -	1,00	$ 963.734,00	1,00	$ 963.734,00	0,00	$ 0
14	**PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL**					**$ 18.724.371,42**		**$ -**		**$ 54.254.055,00**		**$ 252.713,79**		**$ -**		**$ 54.506.768,00**						**$ 48.464.491,00**		**$ 6.042.278,00**
14,1	**SOBRE MAMPOSTERIA**					**$ 13.486.157,02**		**$ -**		**$ 36.923.392,00**		**$ 252.713,79**		**$ -**		**$ 37.176.105,00**						**$ 32.872.466,00**		**$ 4.303.639,00**
14.1.1	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	700,00	$ 16.040,00	187,22	$ 3.003.008,80		$ -	887,22	$ 14.231.009,00		$ -		$ -	887,22	$ 14.231.009,00	700,00	$ 11.228.000,00	54,38	$ 872.255,20	754,38	$ 12.100.255,00	132,84	$ 2.130.754
14.1.2	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPERBOARD	m2	133,00	$ 18.420,00	342,93	$ 6.316.770,60		$ -	475,93	$ 8.766.631,00	13,23	$ 243.696,60		$ -	489,16	$ 9.010.327,00	131,05	$ 2.413.941,00	358,11	$ 6.596.386,20	489,16	$ 9.010.327,00	0,00	$ 0
14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	m2	422,10	$ 23.121,00	86,22	$ 1.993.492,62		$ -	508,32	$ 11.752.867,00	0,39	$ 9.017,19		$ -	508,71	$ 11.761.884,00	-	$ -	508,71	$ 11.761.883,91	508,71	$ 11.761.884,00	0,00	$ 0
NP 14.1.4	SUMIINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MUROS CON PAÑETE O SUPERBOARD	ML		$ 11.143,00	195,00	$ 2.172.885,00		$ -	195,00	$ 2.172.885,00		$ -		$ -	195,00	$ 2.172.885,00				$ -	-	$ -	195,00	$ 2.172.885
14,2	**PINTURA SOBRE METAL**					**$ 5.238.214,40**	**$ -**	**$ -**		**$ 17.330.663,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 17.330.663,00**						**$ 15.592.025,00**		**$ 1.738.639,00**
14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	ml	300,00	$ 19.304,00	130,00	$ 2.509.520,00		$ -	498,32	$ 9.619.569,00		$ -		$ -	498,32	$ 9.619.569,00	368,32	$ 7.110.049,28	60,84	$ 1.174.455,36	429,16	$ 8.284.505,00	69,16	$ 1.335.065
14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	m2	150,00	$ 33.216,00	82,15	$ 2.728.694,40		$ -	232,15	$ 7.711.094,00		$ -		$ -	232,15	$ 7.711.094,00	-	$ -	220,00	$ 7.307.520,00	220,00	$ 7.307.520,00	12,15	$ 403.574
15	**CERRADURAS Y MANIJAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 9.399.958,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.399.958,00**						**$ 8.290.648,00**		**$ 1.109.310,00**
15,1	**CERRADURAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 9.183.735,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 9.183.735,00**						**$ 8.074.425,00**		**$ 1.109.310,00**
15.1.1	CERRADURA OFICINAS INTERIORES	un	18,00	$ 89.631,00		$ -		$ -	18,00	$ 1.613.358,00		$ -		$ -	18,00	$ 1.613.358,00	-	$ -	18,00	$ 1.613.358,00	18,00	$ 1.613.358,00	0,00	$ 0
15.1.2	CERRADURA OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	un	5,00	$ 364.965,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.824.825,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.824.825,00	-	$ -	5,00	$ 1.824.825,00	5,00	$ 1.824.825,00	0,00	$ 0
15.1.3	CERRADURA CILINDRO	un	12,00	$ 99.501,00		$ -		$ -	12,00	$ 1.194.012,00		$ -		$ -	12,00	$ 1.194.012,00	-	$ -	10,00	$ 995.010,00	10,00	$ 995.010,00	2,00	$ 199.002
15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	un	10,00	$ 455.154,00		$ -		$ -	10,00	$ 4.551.540,00		$ -		$ -	10,00	$ 4.551.540,00	-	$ -	8,00	$ 3.641.232,00	8,00	$ 3.641.232,00	2,00	$ 910.308
15,2	**HERRAJES**					**$ -**		**$ -**		**$ 216.223,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 216.223,00**						**$ 216.223,00**		**$ -**
15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	un	23,00	$ 9.401,00		$ -		$ -	23,00	$ 216.223,00		$ -		$ -	23,00	$ 216.223,00	-	$ -	23,00	$ 216.223,00	23,00	$ 216.223,00	0,00	$ 0
16	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES**					**$ 42.198.172,00**		**$ 8.926.893,00**		**$ 177.254.959,00**		**$ -**		**$ 12.857.024,00**		**$ 164.397.935,00**						**$ 139.131.672,00**		**$ 25.266.263,00**
16,1	**TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES**					**$ 21.211.853,00**		**$ 1.308.517,00**		**$ 43.474.212,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 43.474.212,00**						**$ 43.474.212,00**		**$ -**
16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 103.060,00	7,00	$ 721.420,00		$ -	13,00	$ 1.339.780,00		$ -		$ -	13,00	$ 1.339.780,00	-	$ -	13,00	$ 1.339.780,00	13,00	$ 1.339.780,00	0,00	$ 0
16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	un	5,00	$ 92.245,00	9,00	$ 830.205,00		$ -	14,00	$ 1.291.430,00		$ -		$ -	14,00	$ 1.291.430,00	-	$ -	14,00	$ 1.291.430,00	14,00	$ 1.291.430,00	0,00	$ 0
16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	un	5,00	$ 77.703,00	13,00	$ 1.010.139,00		$ -	18,00	$ 1.398.654,00		$ -		$ -	18,00	$ 1.398.654,00	-	$ -	18,00	$ 1.398.654,00	18,00	$ 1.398.654,00	0,00	$ 0
16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	un	10,00	$ 151.869,00	1,00	$ 151.869,00		$ -	11,00	$ 1.670.559,00		$ -		$ -	11,00	$ 1.670.559,00	-	$ -	11,00	$ 1.670.559,00	11,00	$ 1.670.559,00	0,00	$ 0
16.1.5	SALIDAS PARA CORRIENTE TRIFASICA 1 NEUTRO Y POLO A TIERRA ASCENSOR TIPO PLATAFORMA	un	1,00	$ 168.382,00		$ -	1,00	$ 168.382,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	un	70,00	$ 76.009,00		$ -	15,00	$ 1.140.135,00	55,00	$ 4.180.495,00		$ -		$ -	55,00	$ 4.180.495,00	-	$ -	55,00	$ 4.180.495,00	55,00	$ 4.180.495,00	0,00	$ 0
16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	un	70,00	$ 89.639,00	7,00	$ 627.473,00		$ -	77,00	$ 6.902.203,00		$ -		$ -	77,00	$ 6.902.203,00	-	$ -	77,00	$ 6.902.203,00	77,00	$ 6.902.203,00	0,00	$ 0
16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	un	1,00	$ 739.184,00		$ -		$ -	1,00	$ 739.184,00		$ -		$ -	1,00	$ 739.184,00	-	$ -	1,00	$ 739.184,00	1,00	$ 739.184,00	0,00	$ 0
16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	un	6,00	$ 90.281,00	37,00	$ 3.340.397,00		$ -	43,00	$ 3.882.083,00		$ -		$ -	43,00	$ 3.882.083,00	-	$ -	43,00	$ 3.882.083,00	43,00	$ 3.882.083,00	0,00	$ 0
16.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3X30A	un	1,00	$ 375.758,00		$ -		$ -	1,00	$ 375.758,00		$ -		$ -	1,00	$ 375.758,00	-	$ -	1,00	$ 375.758,00	1,00	$ 375.758,00	0,00	$ 0
16.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES .	un	30,00	$ 128.832,00	16,00	$ 2.061.312,00		$ -	46,00	$ 5.926.272,00		$ -		$ -	46,00	$ 5.926.272,00	-	$ -	46,00	$ 5.926.272,00	46,00	$ 5.926.272,00	0,00	$ 0
16.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	un	4,00	$ 29.091,00	35,00	$ 1.018.185,00		$ -	39,00	$ 1.134.549,00		$ -		$ -	39,00	$ 1.134.549,00	-	$ -	39,00	$ 1.134.549,00	39,00	$ 1.134.549,00	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Página 1 de 1
Código:
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	un	24,00	$ 102.008,00	21,00	$ 2.142.168,00		$ -	45,00	$ 4.590.360,00		$ -		$ -	45,00	$ 4.590.360,00	-	$ -	45,00	$ 4.590.360,00	45,00	$ 4.590.360,00	0,00	$ 0
16.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	ml	40,00	$ 18.355,00	2,00	$ 36.710,00		$ -	42,00	$ 770.910,00		$ -		$ -	42,00	$ 770.910,00	-	$ -	42,00	$ 770.910,00	42,00	$ 770.910,00	0,00	$ 0
NP 16.1.15	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA	ML		$ 10.640,0	66,00	$ 702.240,00		$ -	66,00	$ 702.240,00		$ -		$ -	66,00	$ 702.240,00	-	$ -	66,00	$ 702.240,00	66,00	$ 702.240,00	0,00	$ 0
NP 16.1.16	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION Y TUBERIA PVC EMPOTRADA POR PISO Y PARED EN CABLE CU TRENZADO AZUL 3#12 THHN LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA MARFIL (REF 5320-ICP) INSTALADA EN TROQUE METALICO TIPO PIRAMIDAL PROMEDIO 16 MTS	UN		$ 243.207,0	9,00	$ 2.188.863,00		$ -	9,00	$ 2.188.863,00		$ -		$ -	9,00	$ 2.188.863,00	-	$ -	9,00	$ 2.188.863,00	9,00	$ 2.188.863,00	0,00	$ 0
NP 16.1.17	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ESTUFA POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 4#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	UN		$ 86.848,0	1,00	$ 86.848,00		$ -	1,00	$ 86.848,00		$ -		$ -	1,00	$ 86.848,00	-	$ -	1,00	$ 86.848,00	1,00	$ 86.848,00	0,00	$ 0
NP 16.1.18	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA GRECA CON TUBERIA PVC 3/4 " EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	UN		$ 94.564,0	1,00	$ 94.564,00		$ -	1,00	$ 94.564,00		$ -		$ -	1,00	$ 94.564,00	-	$ -	1,00	$ 94.564,00	1,00	$ 94.564,00	0,00	$ 0
NP 16.1.19	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA MICRO-ONDAS POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 2400 CON TOMA CON POLO A TIERRA DE 20 AMP PROMEDIO 2 MTS	UN		$ 83.217,0	3,00	$ 249.651,00		$ -	3,00	$ 249.651,00		$ -		$ -	3,00	$ 249.651,00	-	$ -	3,00	$ 249.651,00	3,00	$ 249.651,00	0,00	$ 0
NP 16.1.20	TUBERIA CONDUIT EMT 1" CON ACCESORIOS	ML		$ 24.348,0	18,00	$ 438.264,00		$ -	18,00	$ 438.264,00		$ -		$ -	18,00	$ 438.264,00	-	$ -	18,00	$ 438.264,00	18,00	$ 438.264,00	0,00	$ 0
NP 16.1.21	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS EMPOTRADA INCLUYE REGATA	ML		$ 18.732,0	39,00	$ 730.548,00		$ -	39,00	$ 730.548,00		$ -		$ -	39,00	$ 730.548,00	-	$ -	39,00	$ 730.548,00	39,00	$ 730.548,00	0,00	$ 0
NP 16.1.22	CAJA METALICA DE PASO DE 15X15X10 CMS	UN		$ 56.952,0	16,00	$ 911.232,00		$ -	16,00	$ 911.232,00		$ -		$ -	16,00	$ 911.232,00	-	$ -	16,00	$ 911.232,00	16,00	$ 911.232,00	0,00	$ 0
NP 16.1.23	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" CON ACCESORIOS	ML		$ 26.829,0	90,00	$ 2.414.610,00		$ -	90,00	$ 2.414.610,00		$ -		$ -	90,00	$ 2.414.610,00	-	$ -	90,00	$ 2.414.610,00	90,00	$ 2.414.610,00	0,00	$ 0
NP 16.1.24	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" EMPOTRADA	ML		$ 14.742,0	36,00	$ 530.712,00		$ -	36,00	$ 530.712,00		$ -		$ -	36,00	$ 530.712,00	-	$ -	36,00	$ 530.712,00	36,00	$ 530.712,00	0,00	$ 0
NP 16.1.25	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ALIMENTACION RACK DE COMUNICACIONES POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION EN CABLE CU TRENZADO ROJO 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN DOS TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA AISLADA COLO NARANJA (REF 5262-IG) INSTALADA EN TROQUE METALICO TIPO PIRAMIDAL	UN		$ 136.803,0	1,00	$ 136.803,00		$ -	1,00	$ 136.803,00		$ -		$ -	1,00	$ 136.803,00	-	$ -	1,00	$ 136.803,00	1,00	$ 136.803,00	0,00	$ 0
NP 16.1.26	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS	UN		$ 78.764,0	10,00	$ 787.640,00		$ -	10,00	$ 787.640,00		$ -		$ -	10,00	$ 787.640,00	-	$ -	10,00	$ 787.640,00	10,00	$ 787.640,00	0,00	$ 0
16,2	**ACOMETIDAS ,SALIDA TOMA TRFÁSICA**					**$ 8.111.876,00**		**$ 5.315.849,00**		**$ 8.111.876,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 8.111.876,00**						**$ 8.111.876,00**		**$ -**
16.2.1	ACOMETIDA 3*8AWG THHN + 10 TIERRA	ml	53,00	$ 58.734,00		$ -	53,00	$ 3.112.902,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.2	TUBERÍA DE 1" PVC PARA ALIMENTADORES DE CIRCUITOS	ml	69,00	$ 9.941,00		$ -	69,00	$ 685.929,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.3	TUBERÍA 1 1/4" PVC PARA ACOMETIDAS PARCIALES	ml	63,00	$ 11.498,00		$ -	63,00	$ 724.374,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.2.4	TUBERÍA CONDUIT 3/4 PARA CIRCUITOS PARCIALES	ml	60,00	$ 7.598,00		$ -	60,00	$ 455.880,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
16.2.5	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	un	2,00	$ 168.382,00		$ -	2,00	$ 336.764,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.2.6	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO ASCENSOR (TASC) (TIPO PLATAFORMA) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS CU 4#8+#10 THHN POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO. INCLUYE REGATA	ML		$ 42.441,0	28,00	$ 1.188.348,00		$ -	28,00	$ 1.188.348,00		$ -		$ -	28,00	$ 1.188.348,00	-	$ -	28,00	$ 1.188.348,00	28,00	$ 1.188.348,00	0,00	$ 0
NP 16.2.7	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-2 (TDN-1) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR CANALETA METALICA PERIMETRAL	ML		$ 65.948,0	11,00	$ 725.428,00		$ -	11,00	$ 725.428,00		$ -		$ -	11,00	$ 725.428,00	-	$ -	11,00	$ 725.428,00	11,00	$ 725.428,00	0,00	$ 0
NP 16.2.8	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES (T-1) HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR TUBERIA PVC Ø 1 1/4" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 82.548,0	28,00	$ 2.311.344,00		$ -	28,00	$ 2.311.344,00		$ -		$ -	28,00	$ 2.311.344,00	-	$ -	28,00	$ 2.311.344,00	28,00	$ 2.311.344,00	0,00	$ 0
NP 16.2.9	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL COCINA T-4 (TDN-3) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 48.172,0	26,00	$ 1.252.472,00		$ -	26,00	$ 1.252.472,00		$ -		$ -	26,00	$ 1.252.472,00	-	$ -	26,00	$ 1.252.472,00	26,00	$ 1.252.472,00	0,00	$ 0
NP 16.2.10	PROLONGACION ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CAJA DE PASO EMPOTRADA HASTA TABLERO BOMBAS (TBOM) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 48.785,0	13,00	$ 634.205,00		$ -	13,00	$ 634.205,00		$ -		$ -	13,00	$ 634.205,00	-	$ -	13,00	$ 634.205,00	13,00	$ 634.205,00	0,00	$ 0
NP 16.2.11	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO PRINCIPAL UPS (TPU) CUARTO DE COMUNICACIONES EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#10+1#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	ML		$ 47.319,0	9,00	$ 425.871,00		$ -	9,00	$ 425.871,00		$ -		$ -	9,00	$ 425.871,00	-	$ -	9,00	$ 425.871,00	9,00	$ 425.871,00	0,00	$ 0
NP 16.2.12	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-1) CUARTO DE ELECTRICO EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR CANALETICA METALICA 12.5 CMS CON DIVISION	ML		$ 32.366,0	12,00	$ 388.392,00		$ -	12,00	$ 388.392,00		$ -		$ -	12,00	$ 388.392,00	-	$ -	12,00	$ 388.392,00	12,00	$ 388.392,00	0,00	$ 0
NP 16.2.13	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA EN PISO	ML		$ 42.472,0	25,00	$ 1.061.800,00		$ -	25,00	$ 1.061.800,00		$ -		$ -	25,00	$ 1.061.800,00	-	$ -	25,00	$ 1.061.800,00	25,00	$ 1.061.800,00	0,00	$ 0
NP 16.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA ENTRADA - SALIDA UPS DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS (T-5) HASTA UPS EN CABLE CU FLEXIBLE 3#10+1#8+1#10 TWK POR CORAZA METALICA PLASTIFICADA Ø 1 " CON CONECTORES EN CADA EXTREMO	ML		$ 62.008,0	2,00	$ 124.016,00		$ -	2,00	$ 124.016,00		$ -		$ -	2,00	$ 124.016,00	-	$ -	2,00	$ 124.016,00	2,00	$ 124.016,00	0,00	$ 0
16,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES Y TRAMITES**					**$ 8.061.589,00**		**$ -**		**$ 27.168.272,00**		**$ -**		**$ 10.000.000,00**		**$ 17.168.272,00**						**$ 17.168.272,00**		**$**

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	un	1,00	$ 575.188,00		$ -		$ -	1,00	$ 575.188,00		$ -		$ -	1,00	$ 575.188,00	-	$ -	1,00	$ 575.188,00	1,00	$ 575.188,00	0,00	$ 0
16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 250.310,00		$ -		$ -	1,00	$ 250.310,00		$ -		$ -	1,00	$ 250.310,00	-	$ -	1,00	$ 250.310,00	1,00	$ 250.310,00	0,00	$ 0
16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	un	1,00	$ 706.747,00	2,00	$ 1.413.494,00		$ -	3,00	$ 2.120.241,00		$ -		$ -	3,00	$ 2.120.241,00	-	$ -	3,00	$ 2.120.241,00	3,00	$ 2.120.241,00	0,00	$ 0
16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	un	1,00	$ 574.438,00	2,00	$ 1.148.876,00		$ -	3,00	$ 1.723.314,00		$ -		$ -	3,00	$ 1.723.314,00	-	$ -	3,00	$ 1.723.314,00	3,00	$ 1.723.314,00	0,00	$ 0
16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	un	1,00	$ 7.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	0,00	$ 0
16.3.7	TRAMITES PARA CAMBIO DE CARGA	un	1,00	$ 10.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.000.000,00		$ -	1,00	$ 10.000.000,00	0,00	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ 0
NP 16.3.8	Tablero elecrtrico trifasico tipo alumbrado con espacio para totalizador de 12 circuitos	UN		$ 501.317,0	1,00	$ 501.317,00		$ -	1,00	$ 501.317,00		$ -		$ -	1,00	$ 501.317,00	-	$ -	1,00	$ 501.317,00	1,00	$ 501.317,00	0,00	$ 0
NP 16.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X20 A TDN-2	UN		$ 40.288,0	1,00	$ 40.288,00		$ -	1,00	$ 40.288,00		$ -		$ -	1,00	$ 40.288,00	-	$ -	1,00	$ 40.288,00	1,00	$ 40.288,00	0,00	$ 0
NP 16.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X15 A TDN-3	UN		$ 38.291,0	1,00	$ 38.291,00		$ -	1,00	$ 38.291,00		$ -		$ -	1,00	$ 38.291,00	-	$ -	1,00	$ 38.291,00	1,00	$ 38.291,00	0,00	$ 0
NP 16.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CERRADO METALICO (TPT) CERRADO DE 80X70X25 CMS (ALTO*ANCHO*PROF.); FABRICADO EN LAMINA CR CALIBRE 16, PUERTA FRONTAL , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, GRADO DE PROTECCION IP54 PARA USO INTERIOR; CUMPLIENDO NORMA RETIE	UN		$ 4.919.323,0	1,00	$ 4.919.323,00		$ -	1,00	$ 4.919.323,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.919.323,00	-	$ -	1,00	$ 4.919.323,00	1,00	$ 4.919.323,00	0,00	$ 0
16,4	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**					**$ 1.229.376,00**		**$ -**		**$ 1.844.064,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.844.064,00**						**$ -**		**$ 1.844.064,00**
16.4.1	CAJA EN MAMPOSTERIA PARA ACOMETIDA SIMILAR A CS 274 DE CODENSA	un	1,00	$ 614.688,00	2,00	$ 1.229.376,00		$ -	3,00	$ 1.844.064,00		$ -		$ -	3,00	$ 1.844.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.844.064
16,5	**VOZ Y DATOS**					**$ 4.052.486,00**		**$ 2.302.527,00**		**$ 96.656.535,00**		**$ -**		**$ 2.857.024,00**		**$ 93.799.511,00**						**$ 70.377.312,00**		**$ 23.422.199,00**
16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	un	3,00	$ 2.596.218,00	1,00	$ 2.596.218,00		$ -	4,00	$ 10.384.872,00		$ -		$ -	4,00	$ 10.384.872,00	-	$ -	4,00	$ 10.384.872,00	4,00	$ 10.384.872,00	0,00	$ 0
16.5.2	GABINETE RAKC DE 210 METROS DE ALTURA X 60	un	2,00	$ 1.807.757,00		$ -		$ -	2,00	$ 3.615.514,00		$ -		$ -	2,00	$ 3.615.514,00	-	$ -	1,00	$ 1.807.757,00	1,00	$ 1.807.757,00	1,00	$ 1.807.757
16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	un	1,00	$ 2.071.047,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.071.047,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.071.047,00	-	$ -	1,00	$ 2.071.047,00	1,00	$ 2.071.047,00	0,00	$ 0
16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	un	1,00	$ 1.605.217,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.605.217,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.605.217,00	-	$ -	1,00	$ 1.605.217,00	1,00	$ 1.605.217,00	0,00	$ 0
16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	un	70,00	$ 74.036,00	7,00	$ 518.252,00		$ -	77,00	$ 5.700.772,00		$ -		$ -	77,00	$ 5.700.772,00	-	$ -	77,00	$ 5.700.772,00	77,00	$ 5.700.772,00	0,00	$ 0
16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	un	2,00	$ 18.757.418,00		$ -		$ -	2,00	$ 37.514.836,00		$ -		$ -	2,00	$ 37.514.836,00	-	$ -	1,00	$ 18.757.418,00	1,00	$ 18.757.418,00	1,00	$ 18.757.418
16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCIÓN PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE BARRAJES ,FASES NEUTRO Y TIERRA .	un	2,00	$ 2.302.527,00		$ -	1,00	$ 2.302.527,00	1,00	$ 2.302.527,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.302.527,00	-	$ -	1,00	$ 2.302.527,00	1,00	$ 2.302.527,00	0,00	$ 0
16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	ml	3600,00	$ 6.427,00		$ -		$ -	3.600,00	$ 23.137.200,00		$ -		$ -	3.600,00	$ 23.137.200,00	-	$ -	3.600,00	$ 23.137.200,00	3.600,00	$ 23.137.200,00	0,00	$ 0
16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	un	6,00	$ 612.081,00		$ -		$ -	6,00	$ 3.672.486,00		$ -		$ -	6,00	$ 3.672.486,00	-	$ -	6,00	$ 3.672.486,00	6,00	$ 3.672.486,00	0,00	$ 0
16.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONALDO 24.000 BTU	un	2,00	$ 2.857.024,00		$ -		$ -	2,00	$ 5.714.048,00		$ -	1,00	$ 2.857.024,00	1,00	$ 2.857.024,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.857.024
NP - 16.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2 UR	UN		$ 81.712,0	7,00	$ 571.984,00		$ -	7,00	$ 571.984,00		$ -		$ -	7,00	$ 571.984,00	-	$ -	7,00	$ 571.984,00	7,00	$ 571.984,00	0,00	$ 0
NP - 16.5.12	PDU HORIZONTAL CON 6 TOMAS NEMA 5-15R RACK 15 AMP 120 VAC SUPRESOR POWEST	UN		$ 183.016,0	2,00	$ 366.032,00		$ -	2,00	$ 366.032,00		$ -		$ -	2,00	$ 366.032,00	-	$ -	2,00	$ 366.032,00	2,00	$ 366.032,00	0,00	$ 0
17	**ILUMINIACION**					**$ 2.075.587,00**		**$ -**		**$ 16.640.363,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 16.640.363,00**						**$ -**		**$ 16.640.363,00**
17,1	**LAMPARAS Y APIQUES TIPO LED**					**$ 4.151.174,00**		**$ -**		**$ 16.640.363,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 16.640.363,00**						**$ -**		**$ 16.640.363,00**

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
17.1.1	PANEL LED PLANO 24 W 6500 K 30 X 30 BLANCO	un	50,00	$ 60.307,00		$ -		$ -	50,00	$ 3.015.350,00		$ -		$ -	50,00	$ 3.015.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 3.015.350
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 8" 18W CIRCULAR	un	37,00	$ 36.773,00		$ -		$ -	37,00	$ 1.360.601,00		$ -		$ -	37,00	$ 1.360.601,00	-	$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 1.360.601
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 30 X 120 40 W	un	24,00	$ 128.088,00		$ -		$ -	24,00	$ 3.074.112,00		$ -		$ -	24,00	$ 3.074.112,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 3.074.112
17.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 40 W	un	10,00	$ 92.543,00		$ -		$ -	10,00	$ 925.430,00		$ -		$ -	10,00	$ 925.430,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 925.430
17.1.5	REFLECTOR LED 50W PHILLIPS ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA F.R	un	6,00	$ 183.245,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.099.470,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.099.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.099.470
17.1.6	SPOT RIEL LED 100 DOBLE (Incluye riel)	un	6,00	$ 334.265,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.005.590,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.005.590,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.005.590
17.1.7	SPOT RIEL LED 100 SENCILLO (Incluye soporte)	un	6,00	$ 168.106,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.008.636,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.008.636,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.008.636
NP-17.1.8	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 3-22 W, IP40, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 85-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	UN		$ 204.127,0	4,00	$ 816.508,00		$ -	4,00	$ 816.508,00		$ -		$ -	4,00	$ 816.508,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 816.508
NP-17.1.9	BATERIA STIL LED DE EMERGENCIA 22-45 W IP40; 120 MINUTOS DE AUTONOMIA 120-277 V, GARANTIA 2 AÑOS	UN		$ 232.627,0	9,00	$ 2.093.643,00		$ -	9,00	$ 2.093.643,00		$ -		$ -	9,00	$ 2.093.643,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 2.093.643
NP-17.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 360º	UN		$ 177.289,0	7,00	$ 1.241.023,00		$ -	7,00	$ 1.241.023,00		$ -		$ -	7,00	$ 1.241.023,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 1.241.023
18	**CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.**					**$ 10.928.009,19**		**$ 3.586.252,60**		**$ 22.128.863,00**		**$ 335.464,95**		**$ -**		**$ 22.464.328,00**						**$ 10.423.387,00**		**$ 12.040.942,00**
18,1	**IMPERMEABILIZACIONES**					**$ 8.856.301,44**		**$ 3.586.252,60**		**$ 12.707.283,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 12.707.283,00**						**$ 8.071.715,00**		**$ 4.635.569,00**
18.1.1	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS SIKAFILL O SIMILAR (tres manos)	m2	52,00	$ 57.897,00		$ -	52,00	$ 3.010.644,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	ml	35,00	$ 19.941,00	42,00	$ 837.522,00		$ -	77,00	$ 1.535.457,00		$ -		$ -	77,00	$ 1.535.457,00	35,00	$ 697.935,00		$ -	35,00	$ 697.935,00	42,00	$ 837.522
18.1.3	IMPERMEABILIZACIÓN PISOS Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	44,10	$ 17.106,00		$ -		$ -	44,10	$ 754.375,00		$ -		$ -	44,10	$ 754.375,00	41,43	$ 708.701,58		$ -	41,43	$ 708.702,00	2,67	$ 45.673
18.1.4	IMPERMEABILIZACIÓN PARED Z. HÚMEDAS SELLOTOC	m2	163,80	$ 18.158,00		$ -	31,70	$ 575.608,60	132,10	$ 2.398.672,00		$ -		$ -	132,10	$ 2.398.672,00	127,13	$ 2.308.426,54		$ -	127,13	$ 2.308.427,00	4,97	$ 90.245
NP - 18.1.5	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS MANTO ASFALTICO FIBERGLASS P3, IMPRIMACION con emulsión asfaltica	m2		$ 56.742,00	141,32	$ 8.018.779,44		$ -	141,32	$ 8.018.779,00		$ -		$ -	141,32	$ 8.018.779,00	-	$ -	76,78	$ 4.356.650,76	76,78	$ 4.356.651,00	64,54	$ 3.662.129
18,2	**ACCESORIOS Y OTROS**					**$ 4.143.415,50**		**$ -**		**$ 9.421.580,00**		**$ 335.464,95**		**$ -**		**$ 9.757.045,00**						**$ 2.351.672,00**		**$ 7.405.373,00**
18.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y MONTAJE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 30cm a 60 cm cal. 20	ml	35,40	$ 56.955,00		$ -		$ -	35,40	$ 2.016.207,00	5,89	$ 335.464,95		$ -	41,29	$ 2.351.672,00	-	$ -	41,29	$ 2.351.671,95	41,29	$ 2.351.672,00	0,00	$ 0
18.2.2	TUBERÍA PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	ml	74,80	$ 35.126,00		$ -		$ -	74,80	$ 2.627.425,00		$ -		$ -	74,80	$ 2.627.425,00	-	$ -		$ -	-	$ -	74,80	$ 2.627.425
18.2.3	ACCESORIOS PVCS 4" - BAJANTES Y DESAGUES ALL. Y REDES PISOS, CONEXIONES ENTRE CAJAS DE INSPECCIÓN	un	10,00	$ 23.672,00		$ -		$ -	10,00	$ 236.720,00		$ -		$ -	10,00	$ 236.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 236.720
18.2.4	TRAGANTES 4"	un	12,00	$ 33.151,00		$ -		$ -	12,00	$ 397.812,00		$ -		$ -	12,00	$ 397.812,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 397.812
NP - 18.2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO 6MM PARA ÁREAS DE PUNTO FIJO	M2		$ 103.845,00	39,90	$ 4.143.415,50		$ -	39,90	$ 4.143.416,00		$ -		$ -	39,90	$ 4.143.416,00	-	$ -		$ -	-	$ -	39,90	$ 4.143.416
19	**CARPINTERIA DE MADERA**					**$ 56.505.652,47**		**$ 95.986.830,20**		**$ 102.013.972,00**		**$ 6.914.104,85**		**$ -**		**$ 108.928.077,00**						**$ 91.303.213,00**		**$ 17.624.864,00**
19,1	**REPARACION Y REINSTALACION CARPINTERIA DE MADERA EXISTENTE**					**$ 14.005.168,07**		**$ -**		**$ 35.708.979,00**		**$ 229.554,39**		**$ -**		**$ 35.938.534,00**						**$ 35.565.599,00**		**$ 372.935,00**
19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUALDERAS, FALDONES Y BARANDA	un	1,00	$ 9.165.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 9.165.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 9.165.500,00	0,60	$ 5.499.300,00	0,40	$ 3.666.200,00	1,00	$ 9.165.500,00	0,00	$ 0
19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	un	1,00	$ 1.785.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.785.500,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.785.500,00	-	$ -	1,00	$ 1.785.500,00	1,00	$ 1.785.500,00	0,00	$ 0
19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	m2	12,20	$ 402.727,00	6,01	$ 2.420.389,27		$ -	32,71	$ 13.173.200,00	0,57	$ 229.554,39		$ -	33,28	$ 13.402.755,00	26,70	$ 10.752.810,90	6,58	$ 2.649.943,66	33,28	$ 13.402.755,00	0,00	$ 0
NP-19.1.4	RESTAURACIÓN DE PUERTAS EN MADERA	M2		$ 396.739,0	29,20	$ 11.584.778,80		$ -	29,20	$ 11.584.779,00		$ -		$ -	29,20	$ 11.584.779,00	-	$ -	28,26	$ 11.211.844,14	28,26	$ 11.211.844,00	0,94	$ 372.935
19,2	**CARPINTERIA MADERA NUEVA**					**$ 42.500.484,40**		**$ 95.986.830,20**		**$ 66.304.993,00**		**$ 6.684.550,46**		**$ -**		**$ 72.989.543,00**						**$ 55.737.614,00**		**$ 17.251.929,00**
19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	m2	12,00	$ 1.219.148,00	34,30	$ 41.816.776,40		$ -	46,30	$ 56.446.552,00		$ -		$ -	46,30	$ 56.446.552,00	-	$ -	32,71	$ 39.878.331,08	32,71	$ 39.878.331,00	13,59	$ 16.568.221
19.2.2	VENTANAS MADERA	m2	64,50	$ 743.554,00		$ -	54,00	$ 40.151.916,00	10,50	$ 7.807.317,00	8,99	$ 6.684.550,46		$ -	19,49	$ 14.491.867,00	19,49	$ 14.491.867,46		$ -	19,49	$ 14.491.867,00	0,00	$ 0
19.2.3	VENTANA CIRCULAR Ø 1,00 m	un	2,00	$ 683.708,00	1,00	$ 683.708,00		$ -	3,00	$ 2.051.124,00		$ -		$ -	3,00	$ 2.051.124,00	-	$ -	2,00	$ 1.367.416,00	2,00	$ 1.367.416,00	1,00	$ 683.708
19.2.4	PUERTA VENTANAS MADERA	m2	61,90	$ 902.018,00		$ -	61,90	$ 55.834.914,20	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
20	**CARPINTERIA METALICA, ALUMINO, VIDRIO**					**$ 29.090.525,55**		**$ 213.704,00**		**$ 99.146.411,00**		**$ 406.037,60**		**$ -**		**$ 99.552.449,00**						**$ 34.085.604,00**		**$ 65.466.844,00**
20,1	**CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELECTROSTATICA**					**$ 29.090.525,55**		**$ 213.704,00**		**$ 75.386.203,00**		**$ 406.037,60**		**$ -**		**$ 75.792.241,00**						**$ 34.085.604,00**		**$ 41.706.637,00**

CONSORCIO CASA TITO

EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Página 1 de 1
Código:
Versión: 1
Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020		VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
20.1.1	PUERTA METÁLICA DEPÓSITOS DE 90 X 2.15 m	M2	5,00	$ 213.704,00		$ -	1,00	$ 213.704,00	4,00	$ 854.816,00	1,90	$ 406.037,60		$ -	5,90	$ 1.260.854,00	-	$ -	5,90	$ 1.260.853,60	5,90	$ 1.260.854,00	0,00	$ 0
20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 cm x 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 4.892.500,00		SS		$ -	1,00	$ 4.892.500,00		SS		$ -	1,00	$ 4.892.500,00	-	$ -	1,00	$ 4.892.500,00	1,00	$ 4.892.500,00	0,00	$ 0
20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 cm x 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm Sandblasting y visagras embebidas en hoja puerta)	un	1,00	$ 3.605.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.605.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.605.000,00	-	$ -	1,00	$ 3.605.000,00	1,00	$ 3.605.000,00	0,00	$ 0
20.1.4	PUERTA Y VENTANAS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CRISTAL INCOLORO	m2	75,93	$ 486.545,00	59,79	$ 29.090.525,55		$ -	135,72	$ 66.033.887,00		$ -		$ -	135,72	$ 66.033.887,00	50,00	$ 24.327.250,00		$ -	50,00	$ 24.327.250,00	85,72	$ 41.706.637
20,2	**BARANDAS EN ACERO INOX**					**$ -**		**$ -**		**$ 23.760.208,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 23.760.208,00**						**$ -**		**$ 23.760.208,00**
20.2.1	BARANDA h.=0.90 m CON PASAMANOS REDONDO 2" ACERO INOXIDABLE cal.20, PARALES DE PLATINAS DOBLES EN A.INOX, GÚIAS PARA CINCO LÍNEAS	ml	66,70	$ 356.225,00		$ -		$ -	66,70	$ 23.760.208,00		$ -		$ -	66,70	$ 23.760.208,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,70	$ 23.760.208
21	**EQUIPOS TRANSPORTE VERTICAL**					**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**						**$ -**		**$ 110.000.000,00**
21,1	**ASENSOR 2 PARADAS**					**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 110.000.000,00**						**$ -**		**$ 110.000.000,00**
21.1.1	SUB-CONTRATO A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR DE PLATAFORMA CIBES CAPACIDAD DE 400 KG, 5 PERSONA, TRANSMISIÓN DE TORNILLO SIN FIN, SIN CUARTO DE MAQUINAS, PUETRTA BATIENTE DE ACERO	un	1,00	$ 110.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 110.000.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 110.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 110.000.000
22	**SEÑALIZACION, BICICLETRO Y OTROS**					**$ -**		**$ -**		**$ 7.438.123,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 7.438.123,00**						**$ -**		**$ 7.438.123,00**
22,1	**SEÑALIZACIONES Y AVISOS**					**$ -**		**$ -**		**$ 6.170.089,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 6.170.089,00**						**$ -**		**$ 6.170.089,00**
22.1.1	AVISO EXTERIOR IDPC	un	1,00	$ 2.540.531,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.540.531,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.540.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.540.531
22.1.2	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Oficinas,servicios, orientadores, baños, aseo, basuras, cuarto técnico, seguridad industrial)	un	50,00	$ 53.439,00		$ -		$ -	50,00	$ 2.671.950,00		$ -		$ -	50,00	$ 2.671.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 2.671.950
22.1.3	AVISO EN ACRÍLICO SEÑALIZACIÓN (Rutas de evacuación)	un	8,00	$ 54.658,00		$ -		$ -	8,00	$ 437.264,00		$ -		$ -	8,00	$ 437.264,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 437.264
22.1.4	SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA	un	6,00	$ 86.724,00		$ -		$ -	6,00	$ 520.344,00		$ -		$ -	6,00	$ 520.344,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 520.344
22,2	**BICICLETERO**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.268.034,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.268.034,00**						**$ -**		**$ 1.268.034,00**
22.2.1	BICLICLETERO (Parqueadero de piso ref. B0154B de 4mtrs largo x 0.5m fondo x 0.3m alto. Elaborado en varilla cold rolled acabado en pintura electrostática tipo epoxi poliéster para exterior, para 10 bicicletas por un solo frente)	un	1,00	$ 1.268.034,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.268.034,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.268.034,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.268.034
23	**OBRAS EXTERIORES**					**$ 10.135.289,00**		**$ 274.296,00**		**$ 26.874.673,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 26.874.673,00**						**$ 6.956.064,00**		**$ 19.918.609,00**
23,1	**OBRA CIVIL**					**$ 5.172.345,00**		**$ 274.296,00**		**$ 11.073.251,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 11.073.251,00**						**$ 5.013.750,00**		**$ 6.059.501,00**
23.1.1	RELLENO EN GRAVA DE 3/4"	m3	6,00	$ 63.681,00		$ -		$ -	6,00	$ 382.086,00		$ -		$ -	6,00	$ 382.086,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 382.086
23.1.2	BORDILLO CIRCULAR ÁRBOL Ø 1.00 MS	ml	12,00	$ 22.858,00		$ -	12,00	$ 274.296,00	0,00	$ 0,00		$ -		$ -	0,00	$ 0,00	-	$ -		$ -	-	$ -	0,00	$ 0
23.1.3	CONTENEDOR DE RAÍCES h=1.2	ml	8,00	$ 230.372,00	16,00	$ 3.685.952,00		$ -	32,92	$ 7.583.846,00		$ -		$ -	32,92	$ 7.583.846,00	16,92	$ 3.897.894,24		$ -	16,92	$ 3.897.894,00	16,00	$ 3.685.952
23.1.4	CAÑUELA CONCRETO 0.20 X 0.12M	ml	21,25	$ 23.768,00	9,75	$ 231.738,00		$ -	31,00	$ 736.808,00		$ -		$ -	31,00	$ 736.808,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 736.808
23.1.5	FILTRO TUBERÍA CORRUGADA (Incluye geotextil , grava 1/2")	ml	16,00	$ 69.741,00	5,00	$ 348.705,00		$ -	21,00	$ 1.464.561,00		$ -		$ -	21,00	$ 1.464.561,00	16,00	$ 1.115.856,00		$ -	16,00	$ 1.115.856,00	5,00	$ 348.705
NP - 23.1.6	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ml		$ 36.238,0	25,00	$ 905.950,00		$ -	25,00	$ 905.950,00		$ -		$ -	25,00	$ 905.950,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 905.950

CONSORCIO CASA TITO	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LA OBRA DE INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Página 1 de 1 Código: Versión: 1 Fecha: 14/11/2018

CONTRATANTE - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CASA TITO				CONTRATO DE OBRA No.	510-2019
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO NVP				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	513-2019
CORTE DE OBRA No 8 - DEL 12 OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE DE 2020					VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 1.739.048.042,00

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES INICIALES			ADICIÓN 01						ACTA DE OBRA No 09 - OCTAVA COMPENSACIÓN-						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA 09		TOTAL EJECUTADO		OBRAS POR EJECUTAR	
					MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN ADICIÓN 01		MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		COMPENSACIÓN PRESUPUESTO A ACTA #09									
		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT.	MAYORES CANTIDADES	CANT.	MENORES CANTIDADES	CANT.	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
23,2	**ZONAS VERDES Y CERRAMIENTO**					**$ 4.962.944,00**		**$ -**		**$ 15.801.422,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 15.801.422,00**						**$ 1.942.314,00**		**$ 13.859.108,00**
23.2.1	ARBOLES no mayores a 2 m	un	6,00	$ 230.524,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.383.144,00		$ -		$ -	6,00	$ 1.383.144,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.383.144
23.2.2	ARBUSTOS de 0,30 a 0.50 cm	un	16,00	$ 93.396,00		$ -		$ -	16,00	$ 1.494.336,00		$ -		$ -	16,00	$ 1.494.336,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 1.494.336
23.2.3	PRADIZACIÓN - GRAMA	m2	57,75	$ 10.254,00		$ -		$ -	57,75	$ 592.169,00		$ -		$ -	57,75	$ 592.169,00	-	$ -		$ -	-	$ -	57,75	$ 592.169
23.2.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE JARDINES, ALTURA DE 20 cm A 40 cm (4 plantas por cada metro cuadro aproximadamente)	m2	30,00	$ 130.083,00		$ -		$ -	30,00	$ 3.902.490,00		$ -		$ -	30,00	$ 3.902.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 3.902.490
23.2.5	RELLENO TIERRA NEGRA (con cascarilla y abono)	m3	24,00	$ 46.411,00		$ -		$ -	24,00	$ 1.113.864,00		$ -		$ -	24,00	$ 1.113.864,00	1,30	$ 60.334,30		$ -	1,30	$ 60.334,00	22,70	$ 1.053.530
23.2.6	PODA RADICULAR DE INDIVIDUOS ARBÓREOS	un	5,00	$ 470.495,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.352.475,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.352.475,00	4,00	$ 1.881.980,00		$ -	4,00	$ 1.881.980,00	1,00	$ 470.495
NP - 23.2.7	TRASLADO DE ARBOL	UN		$ 2.525.824,0	1,00	$ 2.525.824,00		$ -	1,00	$ 2.525.824,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.525.824,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.525.824
NP - 23.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO PARA INDIVIDUOS ARBOREOS	UN		$ 487.424,0	5,00	$ 2.437.120,00		$ -	5,00	$ 2.437.120,00		$ -		$ -	5,00	$ 2.437.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.437.120
24	**ASEO Y LIMPIEZA**					**$ 2.368.638,00**		**$ -**		**$ 19.237.374,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.237.374,00**						**$ 14.211.828,00**		**$ 5.025.546,00**
24,1	**ASEO**					**$ 2.368.638,00**		**$ -**		**$ 19.237.374,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 19.237.374,00**						**$ 14.211.828,00**		**$ 5.025.546,00**
24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	mes	8,00	$ 1.579.092,00	1,50	$ 2.368.638,00		$ -	9,50	$ 15.001.374,00		$ -		$ -	9,50	$ 15.001.374,00	8,00	$ 12.632.736,00	1,00	$ 1.579.092,00	9,00	$ 14.211.828,00	0,50	$ 789.546
24.1.2	ASEO FINAL	m2	480,00	$ 8.825,00		$ -		$ -	480,00	$ 4.236.000,00		$ -		$ -	480,00	$ 4.236.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	480,00	$ 4.236.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS CD					**$ 287.685.156,33**		**$ 136.187.433,17**		**$ 1.418.873.717,00**		**$ 13.570.546,29**		**$ 13.570.546,29**		**$ 1.418.873.717,00**		**$ 596.632.236,71**		**$ 444.216.054,00**		**$ 1.041.496.733,00**		**$ 377.376.992,00**
	ADMINISTRACION	**31,37%**								$ 445.100.685,00						$ 445.100.685,00		$ 187.163.533,00		$ 139.350.576,00		$ 326.717.525,00		$ 118.383.162,00
	IMPREVISTOS	**2,00%**								$ 28.377.474,00						$ 28.377.474,00		$ 11.932.645,00		$ 8.884.321,00		$ 20.829.935,00		$ 7.547.540,00
	UTILIDAD	**5,00%**								$ 70.943.686,00						$ 70.943.686,00		$ 29.831.612,00		$ 22.210.803,00		$ 52.074.837,00		$ 18.868.850,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS CI	**38,37%**								**$ 544.421.845,00**						**$ 544.421.845,00**		**$ 228.927.790,00**		**$ 170.445.700,00**		**$ 399.622.297,00**		**$ 144.799.552,00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA CD +CI									**$ 1.963.295.562,00**						**$ 1.963.295.562,00**		**$ 825.560.026,71**		**$ 614.661.754,00**		**$ 1.441.119.030,00**		**$ 522.176.544,00**
25	**ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACIÓN PROYECTO TÉCNICO**									**$ 6.940.000,00**						**$ 6.940.000,00**						**$ 3.960.000,00**		**$ 2.980.000,00**
25,1	**AJUSTE Y COMPLEMENTACION**									**$ 6.940.000,00**						**$ 6.940.000,00**		$ 3.960.000,00		$ -		**$ 3.960.000,00**		**$ 2.980.000,00**
25.1.1	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS y PAISAJISMO	un	1,00	$ 2.400.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.400.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.400.000,00	0,70	$ 1.680.000,00		$ -	0,70	$ 1.680.000,00	0,30	$ 720.000
25.1.2	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES	un	1,00	$ 1.800.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.800.000,00	0,70	$ 1.260.000,00		$ -	0,70	$ 1.260.000,00	0,30	$ 540.000
25.1.3	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS ELECTRICOS (Incluye certificacion de Retie y Retilap)	un	1,00	$ 1.320.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.320.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.320.000,00	0,50	$ 660.000,00		$ -	0,50	$ 660.000,00	0,50	$ 660.000
25.1.4	AJUSTES COMPLEMENTARIOS A LOS DISEÑOS HIDRO SANITARIOS	un	1,00	$ 720.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 720.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 720.000,00	0,50	$ 360.000,00		$ -	0,50	$ 360.000,00	0,50	$ 360.000
25.1.5	ELABORACIÓN DE FICHAS 1 Y 2 EN FORMATOS SDA, PLANO Y MEMORIA TÉCNICA PARA CONSOLIDACIÓN DE LISTA CHEQUEO NECESARIA PARA INICIO DE TRÁMITE PARA AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS SILVICULTURALES ANTE LA SDA.	un	1,00	$ 700.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 700.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 700.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 700.000
	IVA			**19%**						**$ 1.318.600,00**						**$ 1.318.600,00**		**$ 752.400,00**		**$ -**		**$ 752.400,00**		**$ 566.200,00**
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)									**$ 1.971.554.162,00**						**$ 1.971.554.162,00**		**$ 830.272.426,71**		**$ 614.661.754,00**		**$ 1.445.831.430,00**		**$ 525.722.744,00**

OSCAR GUIO
DIRECTOR OBRA
CONSORCIO CASA TITO

NESTOR VARGAS PEDROZA
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSORCIO NVP

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	1.1	PRELIMINARES	**HOJA No.**	1 **de**	81
UNIDAD	MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



LOCALIZACION	LARGO	DESCRIPCION	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
CALLE 12 B N 3 - 28		MES DE OCTUBRE				1,00	1,00
CALLE 12 B N 3 - 29		MES DE NOVIEMBRE				0,50	0,50

Cantidad pagadas en los cortes	9,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,50
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	11,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**9,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,50**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	1.1	PRELIMINARES	**HOJA No.**	2	**de**	81
UNIDAD	MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	1.1.3	ALQUILER BODEGA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO

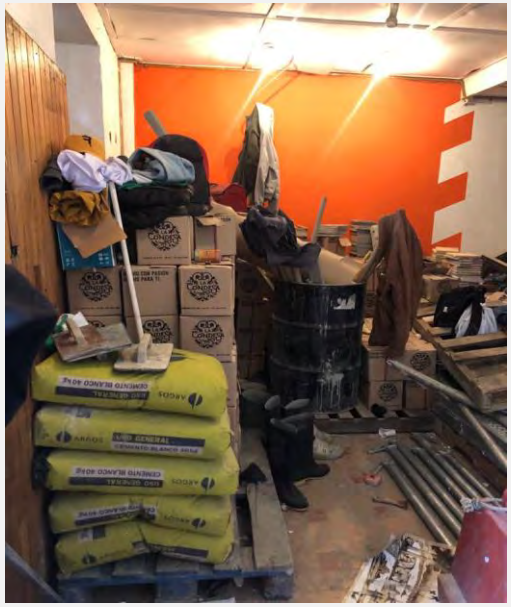

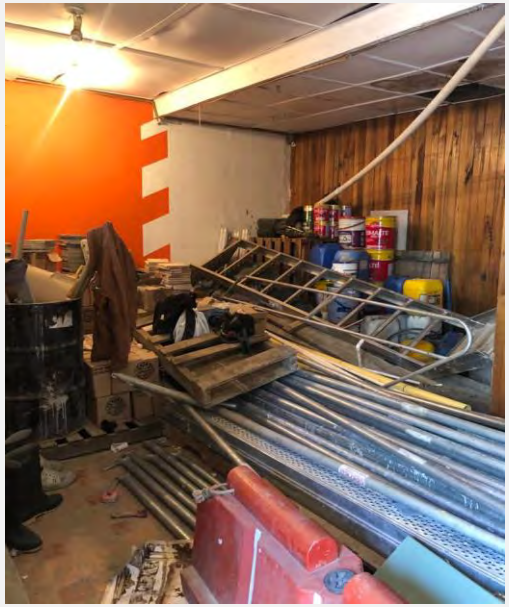



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES	**HOJA No.**	3	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	1.2.2	TABLEROS MOVILES DE OBRA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

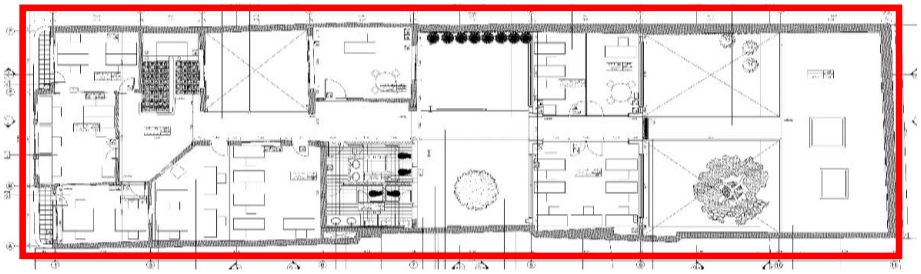

LOCALIZACION	LARGO	DESCRIPCION	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN 1, 2 Y 3		TABLERO MOVIL PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS				1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	1,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**1,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	1 PRELIMINARES	**HOJA No.** 4 **de** 81	
UNIDAD	UN **DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR
ITEM No.	NP 1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS PARA BAÑOS PROVISIONALES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20

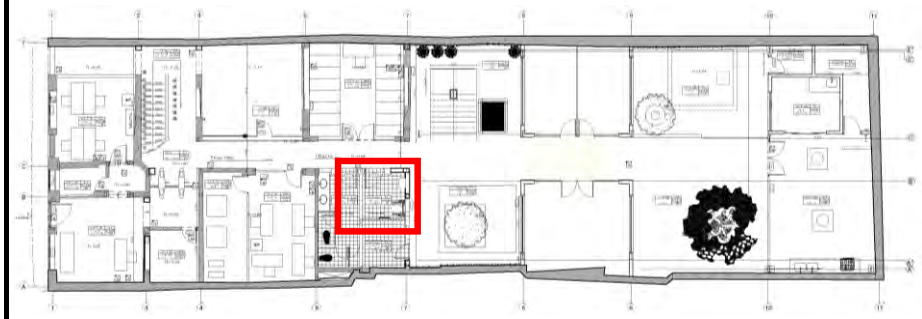

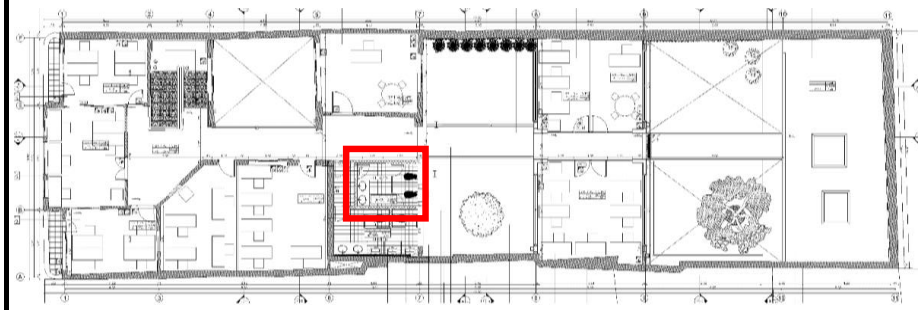

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS VOLUMEN 1 PRIMER PISO	SANITARIO PROVISIONAL PERSONAL TECNICO					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	1	PRELIMINARES	**HOJA No.**	5 **de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE GRIFERIA PARA BAÑOS PROVISIONALES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

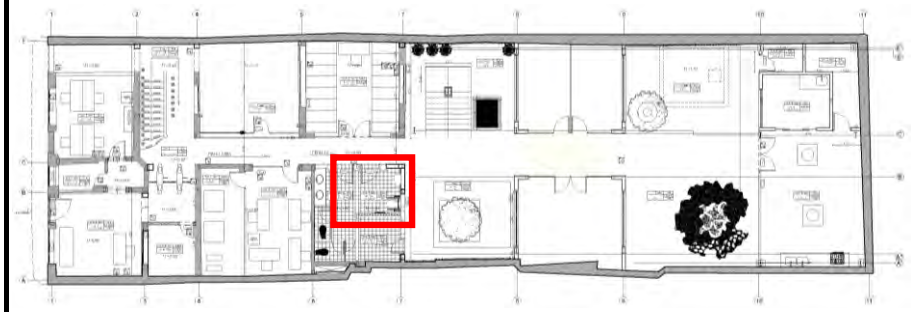

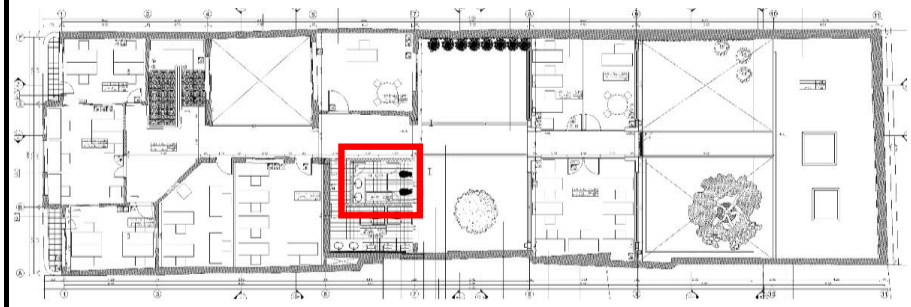

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑOS PRIMER PISO VOLUMEN UNO	LAVAMANOS PROVISIONAL BAÑO PERSONAL TECNICO					2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	1,3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	**HOJA No.**	6	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	1.3.2	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

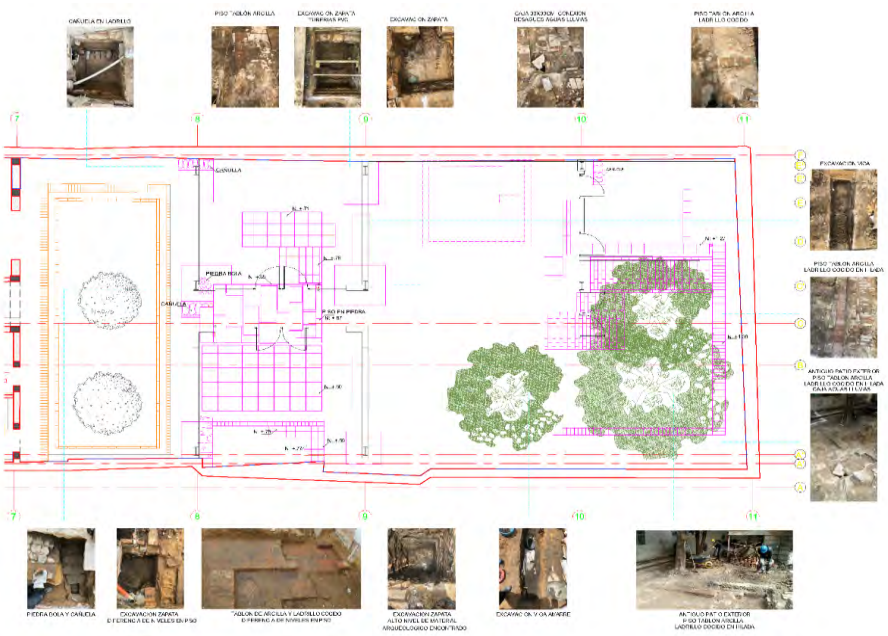

LOCALIZACION	DEXCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
LABORATORIO ARQUEOLOGICO CASA COLROADA	ANALISIS MATERIAL ARQUEOLOGICO Y ELABORACION DE INFORMES					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	7,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	1,00	Cantidad Contractual	7,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**7,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

77 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	1,3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	**HOJA No.**	7	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	1.3.2	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	1,3	ARQUEOLOGIA PREVENTIVA	**HOJA No.**	8 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS PARA PROTECCION DE CAÑUELAS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

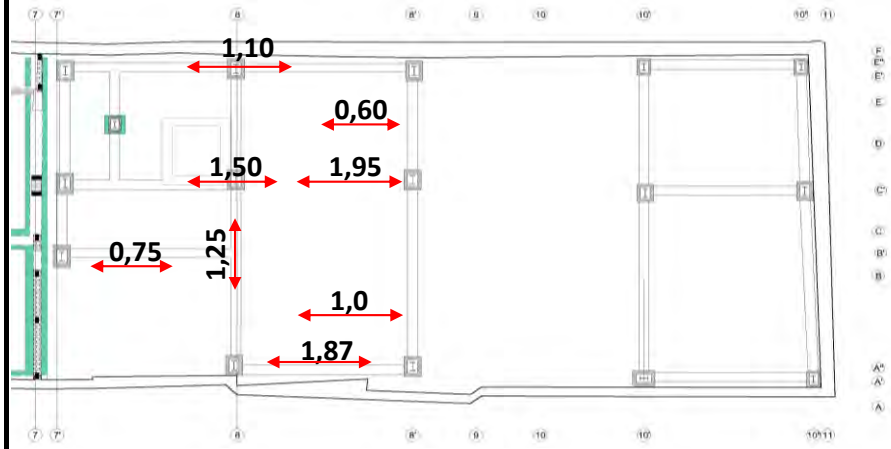

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
EJE 8 (E"- C`)	PROTECCION SOBRE CAÑUELA CON GEOTEXTIL	1,10	0,45	0,25		1,00	1,10
EJE 8 (C`-B`)	PROTECCION CAÑUELA	1,25	0,40	0,35		1,00	1,25
EJE 8 (B`-A`)	PROTECCION CAÑUELA	1,50	0,50	0,10		1,00	1,50
EJE B`(7-8)	PROTECCION CAÑUELA	0,75	0,60	0,10		1,00	0,75
EJE C`(8-8^)	PROTECCION CAÑUELA	1,95	0,55	0,20		1,00	1,95
EJE C`(8-8^)	PROTECCION CAÑUELA	0,60	0,50	0,20		1,00	0,60
EJE A`(8 - 8`)	PROTECCION CAÑUELA	1,00	1,00			1,00	1,00
EJE A`(8 - 8`)	PROTECCION CAÑUELA	1,87	1,12			1,00	1,87

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,02
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	12,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,02**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	9	**de**	39
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	Volumen 2		
ITEM No.	2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

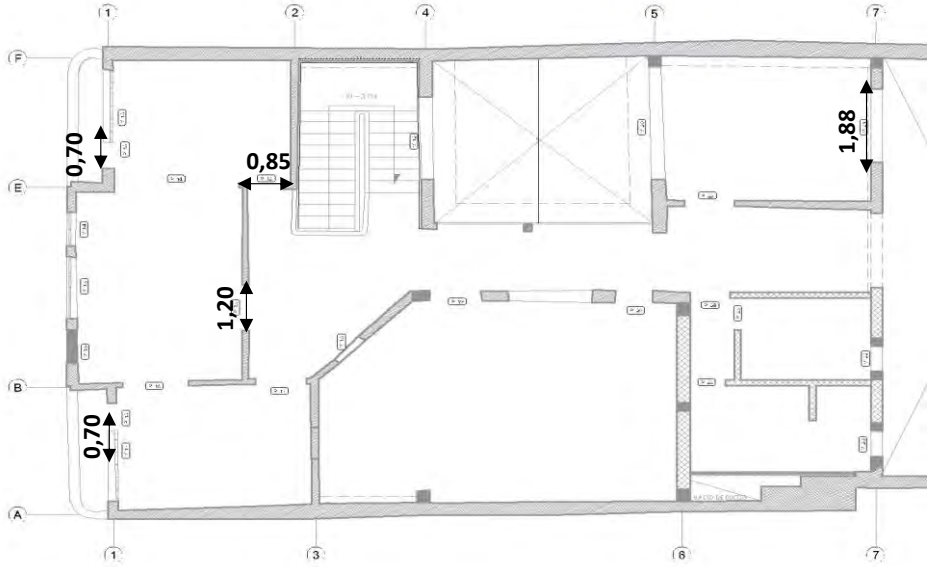

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	%	Cant.	SUB TOTAL
VENTANA SUB DIRECCION SUR		1,88	1,490			1,00	2,80
PUERTA FACHADA SEGUNDO PISO		0,70	2,220			1,00	1,55
PUERTA FACHADA SEGUNDO PISO		0,70	2,22			1,00	1,55
PUERTA SEGUNDO PISO		1,20	2,21			1,00	2,65
PUERTA SEGUNDO PISO		0,85	2,16			1,00	1,84

Cantidad pagadas en los cortes	18,44	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,40
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	11,12
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**18,44**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,40**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-2019		
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	10	**de**	39
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	Volumen 2		
ITEM No.	2.1.2	DESMONTAR Y RETIRAR VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



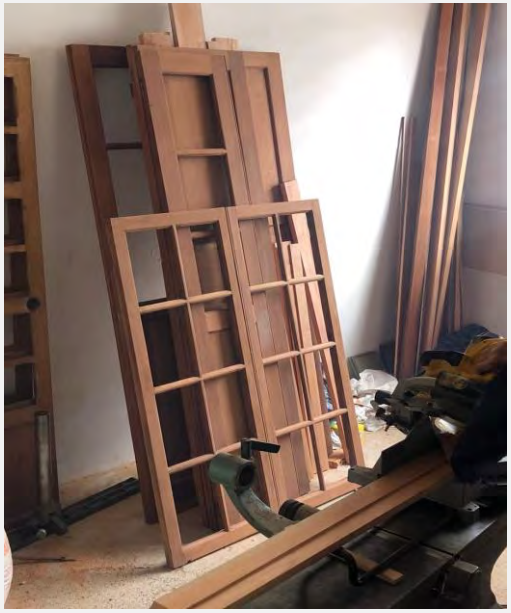





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2	DEMOLICIONES	**HOJA No.**	11 **de**	81
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.2.1	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO "CICLOPEO"	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

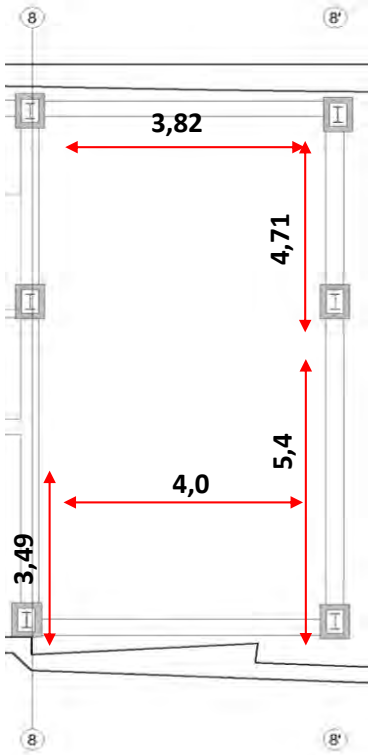

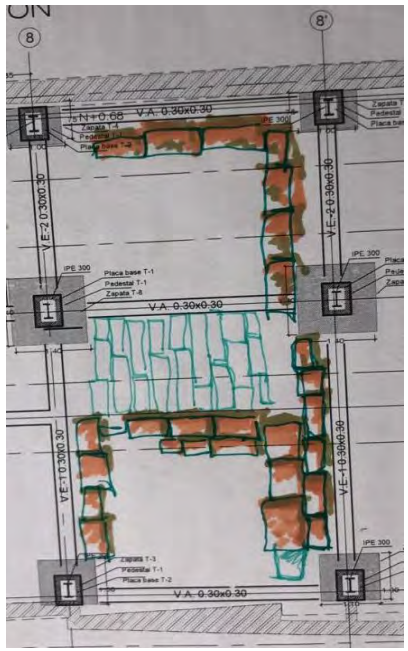

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALYO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO	8,53	0,50	0,40		1,00	1,71
VOLUMEN 2	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO	8,89	0,50	0,40		1,00	1,78
VOLUMEN 2	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO	4,00	0,70	0,40		1,00	1,12

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,60
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	5,46
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**4,60**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2	DEMOLICIONES	**HOJA No.**	12 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.2.3	DEMOLICION DE PLACAS EN CONCRETO DE CONTRAPISO (e=0.10m a 0.12m)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

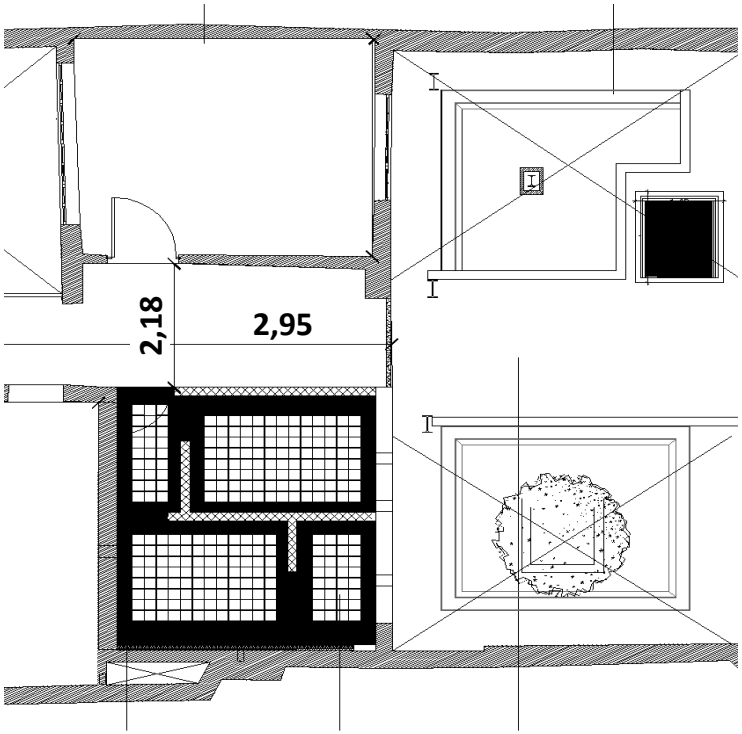

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	%	CANT	SUB TOTAL
BIC - ACCESO A PUENTE	DEMOLICION DE PLACA PARA INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA	2,95	2,18		1,0	6,431

Cantidad pagadas en los cortes	83,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,43
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	166,08
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**83,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,43**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	13	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	2.3.1	DEMOLICION MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

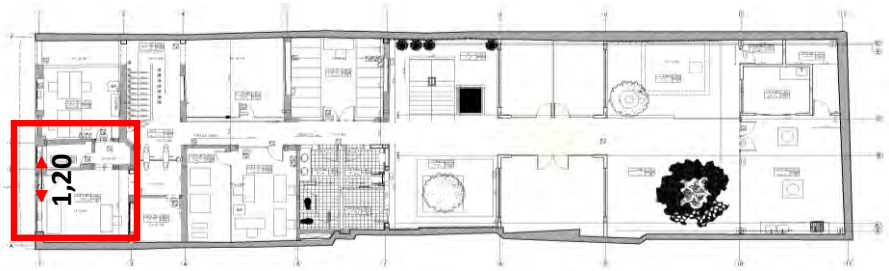

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
RECEPCION VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	DEMOLICION DE MURO PARA APERTURA DE VANO PUERTA ACCESO		1,20	2,82		1,00	3,38

Cantidad pagadas en los cortes	94,78	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	3,38
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	6,32	Cantidad Contractual	148,85
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**94,78**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,38**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2	DESMONTES Y DEMOLICIONES	**HOJA No.**	14	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	2.3.1	DEMOLICION MUROS DE (entre 0.30m a 0.48m)	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.4	DESMONTE Y DEMOLICIONES CUBIERTAS	**HOJA No.**	15 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

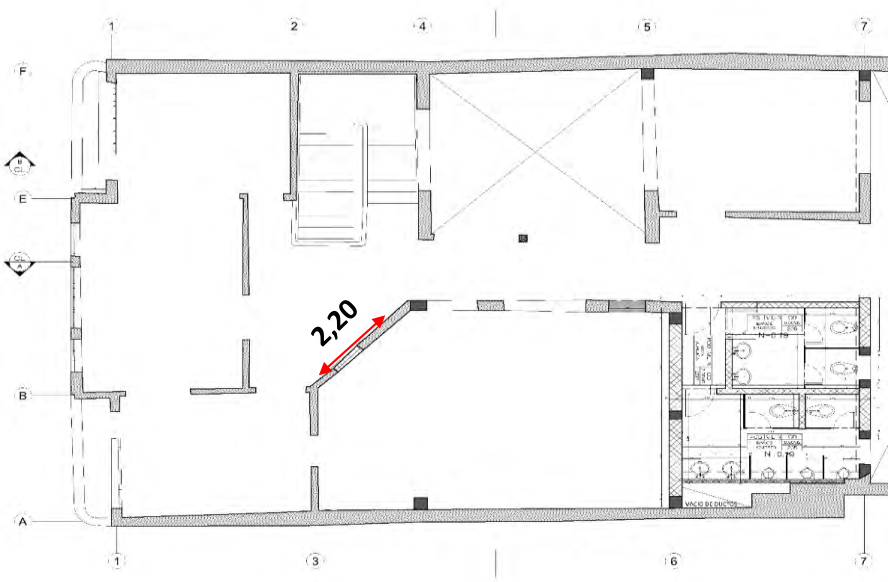

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO SEGUNDO PISO	DESMONTE DE DINTEL EN MADERA POR APERTURA DE VANO PARA VENTANA	2,20	0,20			1,00	2,20

Cantidad pagadas en los cortes	12,52	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,20
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	15,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**12,52**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,20**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.4	DESMONTE Y DEMOLICIONES CUBIERTAS	**HOJA No.**	16	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	2.4.6	DESMONTE DE DINTELES EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.6	DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	17 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

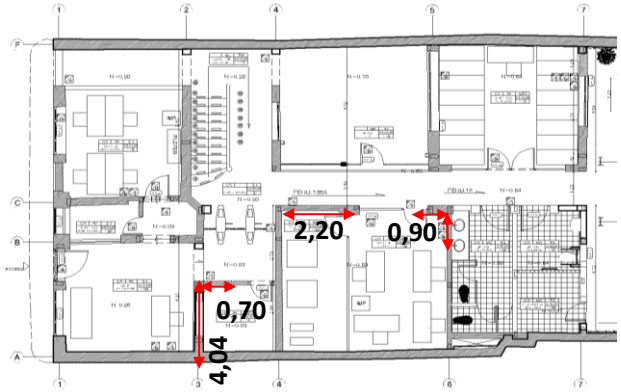

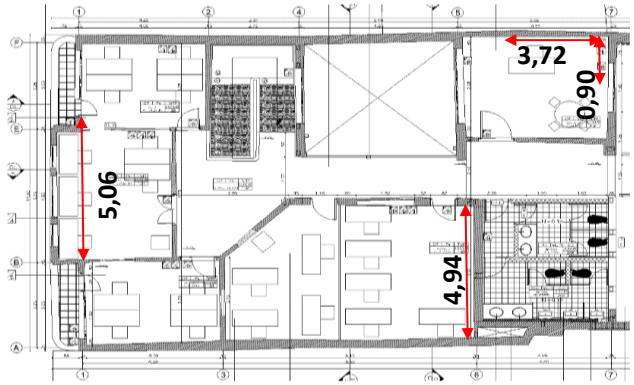

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA							
OFICINA SISTEMAS	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	5,06				1,0	5,06
OFICINA SISTEMAS	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	2,2				1,0	2,2
OFICINA SISTEMAS	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	0,90				1,00	0,9
CUARTO ELECTRICO	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	0,70				1,00	0,70
AREA JURIDICA	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	4,94				1,00	4,94
AREA JURIDICA	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	8,12				1,00	8,12
AREA JURIDICA	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	3,72				1,00	3,72
AREA JURIDICA	DESMONTE DE CANALETA PARA INSTALAR CABLEADO	0,90				1,00	0,90

Cantidad pagadas en los cortes	94,78	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	26,54
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	6,32	Cantidad Contractual	26,48
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**94,78**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**26,54**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.6	DESMONTES INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	18	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	2.6.2	DESMONTAR CANALETAS ELECTRICAS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO



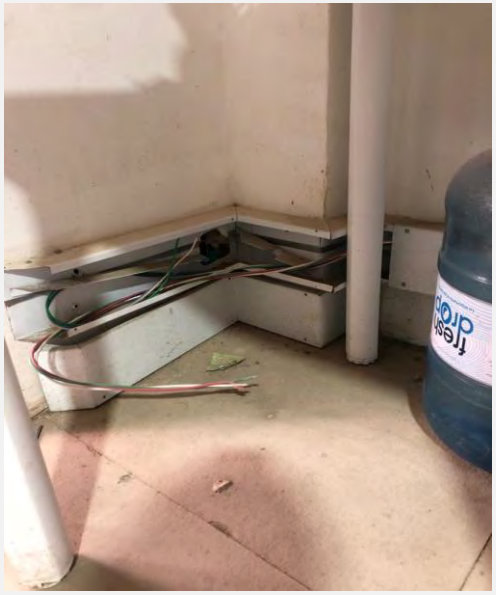



OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	19 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.1	PROTECCION PARA PISOS CON ESTERILLA DE GUADUA (Circulaciones)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

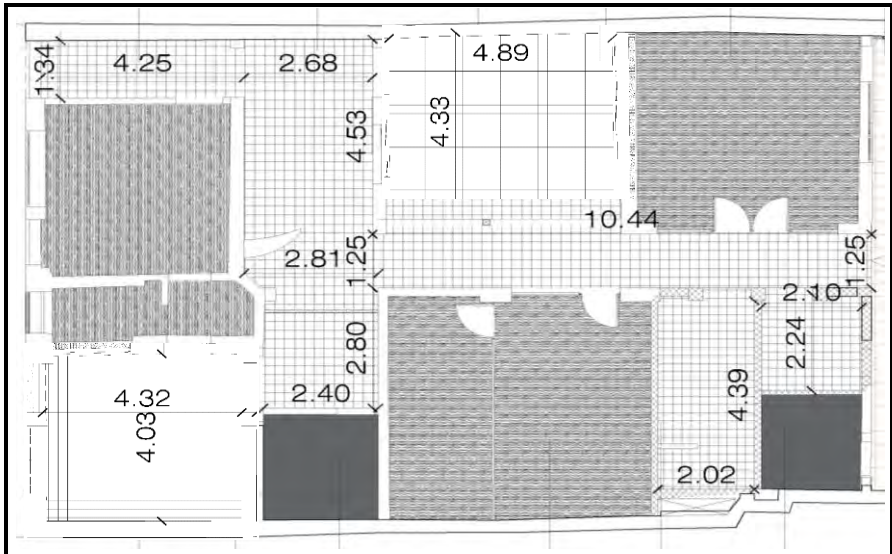

BAÑOS SEGUNDA PLANTA



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PASILLO ACCESO	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,25	1,34			1,00	5,70
PASILLO ESCALERAS	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,53	2,68			1,00	12,14
ACCESO ESCALERAS	PROTECCION BALDOSIN 20X20	1,25	2,81			1,00	3,51
ZONA TORNIQUETES	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,80	2,40			1,00	6,72
HALL CIRCULACION	PROTECCION BALDOSIN 20X20	10,44	1,25			1,00	13,05
BAÑO MUJERES	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,39	2,02			1,00	8,87
BAÑO HOMBRES	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,24	2,10			1,00	4,70
PATIO 1	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,89	4,33			1,00	21,17
RECEPCION	PROTECCION BALDOSIN 20X20	4,32	4,03			1,00	17,41
HALL BAÑOS PISO 2	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,36	1,00			1,00	2,36
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,95	2,06			1,00	6,08
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,70	2,15			1,00	5,81
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	PROTECCION BALDOSIN 20X20	2,17	1,25			1,00	2,71

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	110,23
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	107,34
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**110,23**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	20 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.3	PROTECCION DE PISOS PARA OFICINAS (Carton corrugado y plastico)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



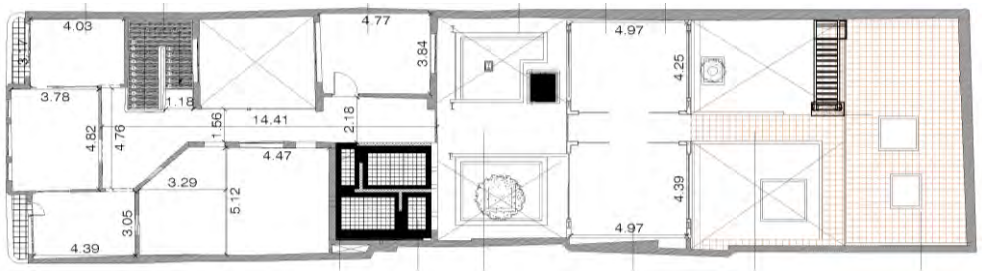

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
OFICINA RADICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,95	3,88			1,00	15,33
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	2,28	1,27			1,00	2,90
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	1,81	1,26			1,00	2,28
OFICINA SISTEMAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,49	5,19			1,00	28,49
ARCHIVO JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,58	4,61			1,00	21,11
ASESORES JURIDICOS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	4,97			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,27			1,00	21,22
SALA MATERNA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,31	2,54			1,00	8,41
SEGUNDA PLANTA							
SUB P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,03	3,17			1,00	12,78
EQUIPO P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,82	3,78			1,00	18,22
ASESOR JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	3,05			1,00	13,39
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	3,29			1,00	16,87
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	4,47			1,00	22,89
SALA DE JUNTAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,77	3,84			1,00	18,32
OFICINA PLANEACION	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,39			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,25			1,00	21,12
HALL	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	14,41	2,26			1,00	32,51

Cantidad pagadas en los cortes	44,23	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	299,46
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	386,23
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**44,23**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**299,46**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	21 **de**	81
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

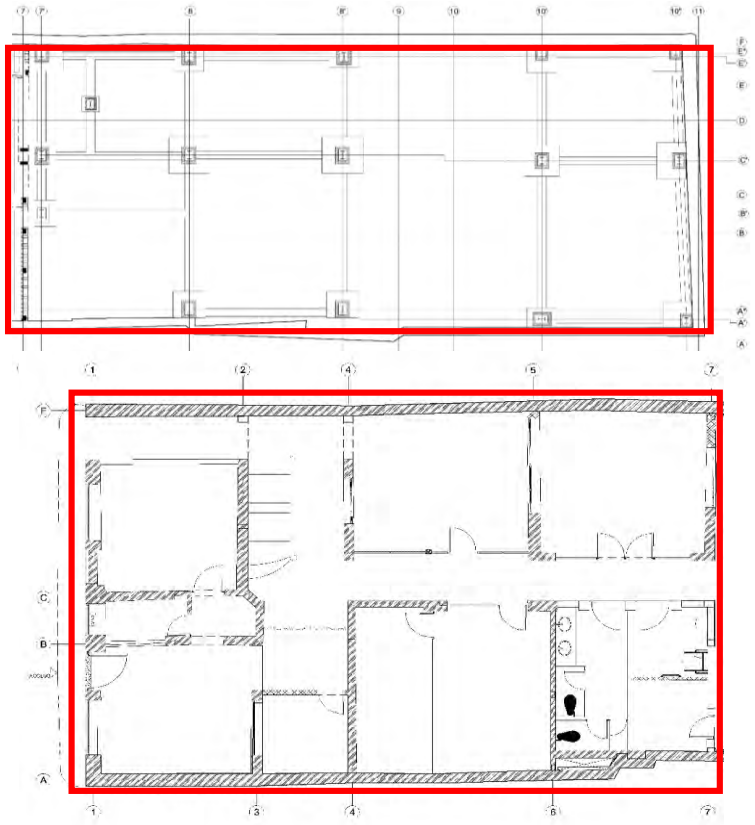

LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				6,00	66,00
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				5,00	19,25
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	PLATAFORMA DE 2,07*0,32 M	18,20				2,00	36,40
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	PLATAFORMA DE 2.07*0,62 CON PUERTA	35,39				1,00	35,39
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL DE 1 M SIN ESPIGO	4,84				6,00	29,04
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	HORIZONTAL DE 0,73 M	3,85				10,00	38,50
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	VERTICAL 2.0 MT CON ESPIGO	11,00				4,00	44,00
VOLUMEN 2, 3 Y BIC	RUEDAS	6,66				8,00	53,28

Cantidad pagadas en los cortes	10.976,04	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	321,86
		Pasan	321,86
Cantidad pagada Corte No. 08	3424,42	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**10.976,04**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	22	**de**	81	
UNIDAD	KG/MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

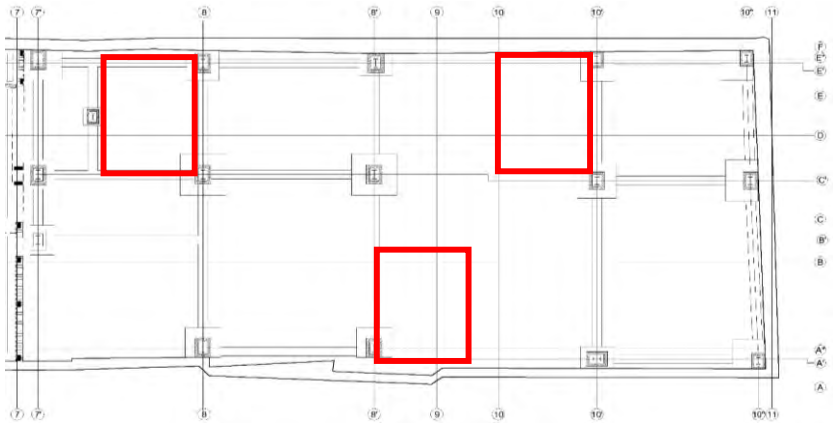

LOCALIZACION	DESCRIPCION	PESO UNITARIO	LARGO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ANDAMIO CON ESCALERA ACCESO NIVEL 2						
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 3,0 M	8,50	3,00			30,00	255,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	HORIZONTAL 1.40	6,00	1,40			60,00	360,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	DIAGONAL 3.0	11,50	3,00			8,00	92,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	ESCALERA 3 M	64,40				4,00	257,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	TORNILLO NIVELADOR	3,50				8,00	28,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 1.40 M	12,00	1,40			6,00	72,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 M SIN ESPIGO	4,84				8,00	38,72
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	BASE DE COLLAR	1,60	0,25			8,00	12,80
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASADOR VERTICAL	0,13	0,25			20,00	2,60
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	VERTICAL 1 MT CON ESPIGO	5,50				16,00	88,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS	2,50				4,00	10,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PASAMANOS EN Z	2,50				8,00	20,00
ACCESO NIVEL 2 Y 3 VOLUMEN 2 Y 3	PLATAFORMA 3 MT	21,50				8,00	172,00

Cantidad pagadas en los cortes	10.976,04	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	1.408,72
		Vienen	321,86
Cantidad pagada Corte No. 08	3424,42	Cantidad Contractual	12.500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**10.976,04**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1730,58**

OBSERVACIONES: SECCIONES DE ANDAMIO CERTIFICADO CON ESCALERA INTERNA PARA ACCEDER A SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE VOLUMEN DOS Y TRES.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	23	**de**	81
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	2.7.4	ALQUILER ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	24 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	2.7.5	PROTECCION EN GUADUA Y PLASTICO PARA AREAS DE EXCAVACION	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

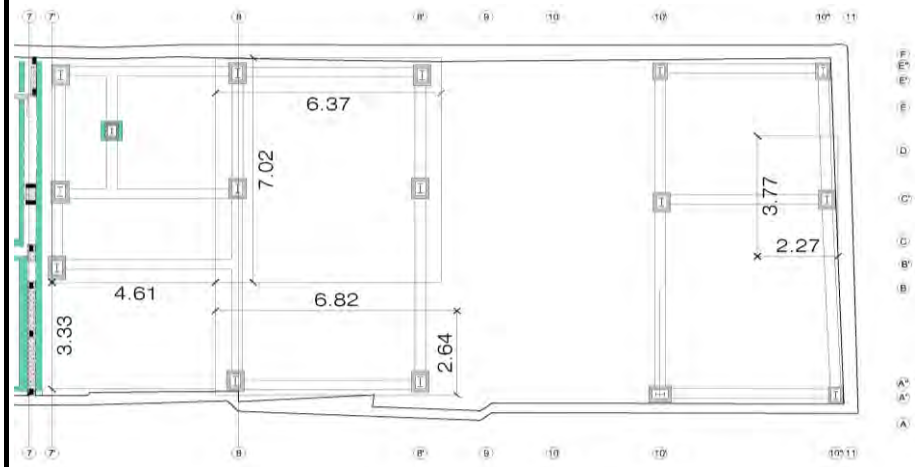

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
EJE 7-8 (B`,A)	PROTECCION DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS POR LLUVIAS	4,61	3,33			1,00	15,35
EJE 7-8 (E-B)	PROTECCION DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS POR LLUVIAS	6,37	7,02			1,00	44,72
EJE 7-8 (B`,A)	PROTECCION DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS POR LLUVIAS	6,82	2,64			1,00	18,00
EJE 10-10^ (E-B)	PROTECCION DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS POR LLUVIAS	3,77	2,27			1,00	8,56

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	86,63
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**86,63**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

95 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.7	PROTECCIONES Y OBRAS AUXILIARES	**HOJA No.**	25	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 2.7.5	PROTECCION EN GUADUA Y PLASTICO PARA AREAS DE EXCAVACION	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.8	VARIOS	**HOJA No.**	26	**de**	79	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	NP 2.8.3	DESMONTE DE PISO LAMINADO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

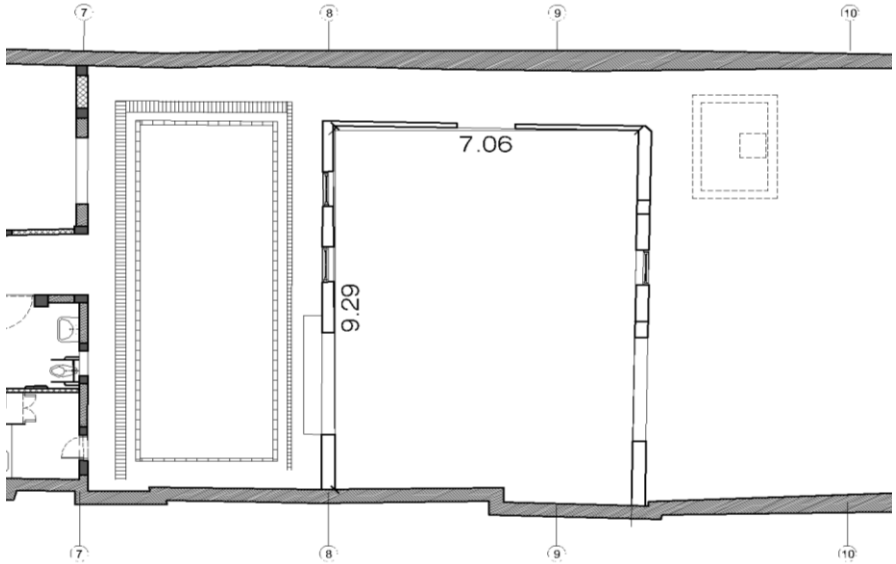

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
EJE 8 - 8`	DESMONTE DE PISO LAMINADO EN VOLUMEN PATIO DOS DEMOLIDO	9,29	7,06			1,00	65,59

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	65,59
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	88,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**65,59**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO
E-mail: consorciocasatito@gmail.com

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.8	VARIOS	**HOJA No.**	27	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 2.8.4	DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTE EN MADERA Y TEJA DE ZINC	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

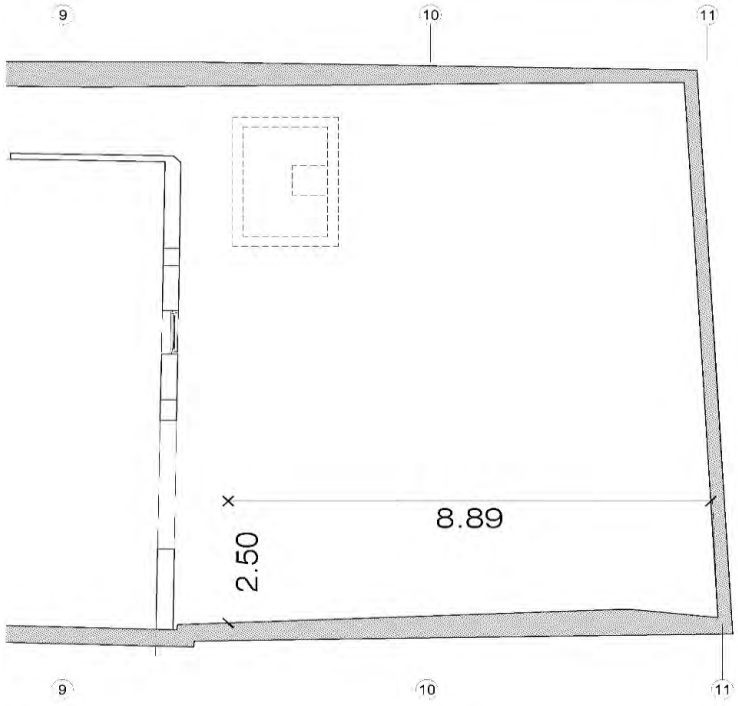

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
EJE 9 - 11	DEMOLICION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL EN MADERA Y TEJA DE ZINC	8,89	2,50	2,10		1,00	22,23

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	22,23
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	25,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,23**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	2.8	VARIOS	**HOJA No.**	28	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 2.8.4	DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTE EN MADERA Y TEJA DE ZINC	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	29	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.2.6	PLACA CONTRAPISO DE 0.10 CONCRETO GRIS - 21 Mpa	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

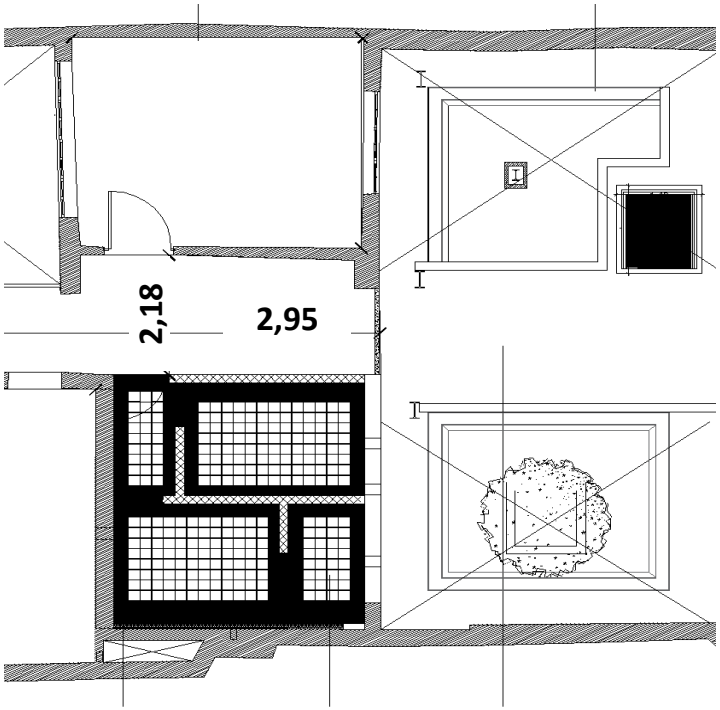

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BIC SEGUNDA PLANTA	PLACA DE CONTRAPISO ACCESOA PUENTE - TRANSICION VOLUMEN UNO A DOS	2,95	2,18	0,1		1	6,431

Cantidad pagadas en los cortes	149,97	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,43
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	31,26	Cantidad Contractual	175,71
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**149,97**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,43**


OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	30	**de**	79
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.2.7	MORTERO DE NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

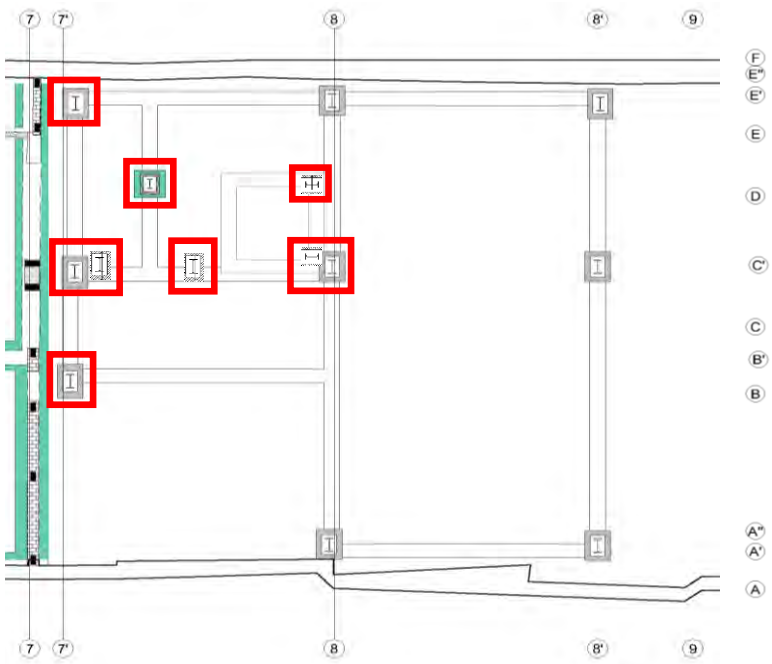

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA PATIO 2 ENTRE (7`-8) (C`-A`)	SIKAGROUT BAJO PLACA BASE COLUMNA ESCALERA	0,261	0,261	0,03		1,0	0,07
ESCALERA PATIO 2 ENTRE (7`-8) (C`-A`)	SIKAGROUT BAJO PLACA BASE GUALDERA ESCALERA	0,31	0,23	0,03		2,0	0,14
ESCALERA PATIO 2 ENTRE (7`-8) (C`-A`)	SIKAGROUT BAJO PLACA BASE ASCENSOR	0,23	0,23	0,03		2,0	0,11
EJE 7`-A`	SIKAGROUT BAJO PLATINA PLACA BASE	0,35	0,35	0,03		1,00	0,12
EJE 7`-C`	SIKAGROUT BAJO PLATINA PLACA BASE	0,35	0,35	0,03		1,00	0,12
EJE 7`-B	SIKAGROUT BAJO PLATINA PLACA BASE	0,35	0,35	0,03		1,00	0,12

Cantidad pagadas en los cortes	1,91	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	0,68
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,50
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**1,91**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**0,68**

OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


101 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	31	**de**	79
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.2.7	MORTERO DE NIVELACION SIKAGROUT - ESP 5 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO

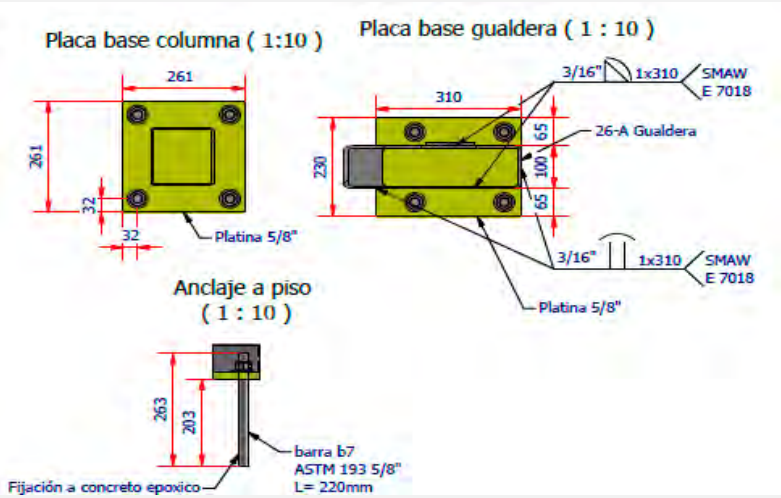

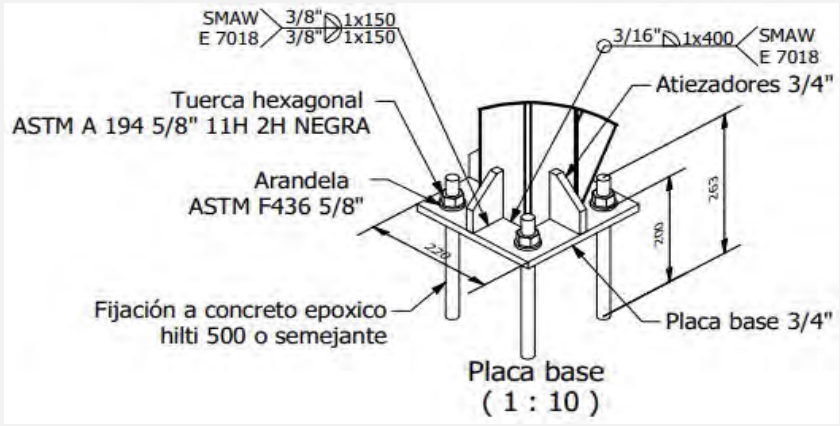

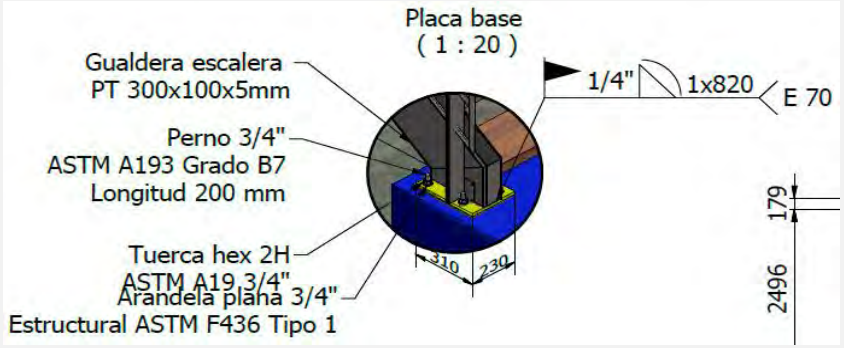

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	32	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES 5/8", ACERO ASTM193 GRADO B7 L=600MM (Incluye tuercas y rosca)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

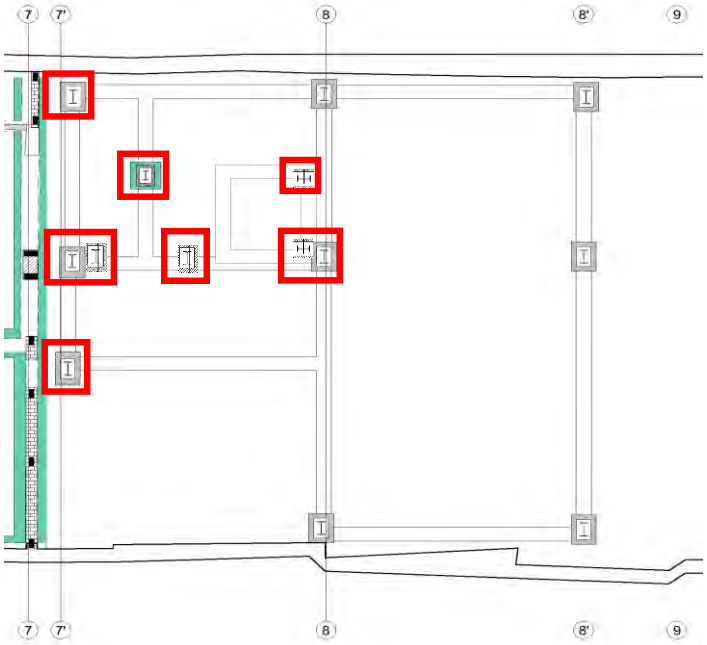

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PLACA BASE ASCENSOR	PERNOS ANCLADOS CON EPOXICO BASE ESTRUCTURA ASCENSOR	0,22				8,00	8,00
PLACA BASE ESCALERA PATIO 3	PERNOS ANCLADOS CON EPOXICO BASE ESCALERA PATIO 3	0,22				6,00	6,00

Cantidad pagadas en los cortes	110,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	14,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	14,00	Cantidad Contractual	110,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**110,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**14,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	33	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	3.2.8	PERNOS PARA PEDESTALES 5/8", ACERO ASTM193 GRADO B7 L=600MM (Incluye tuercas y rosca)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO

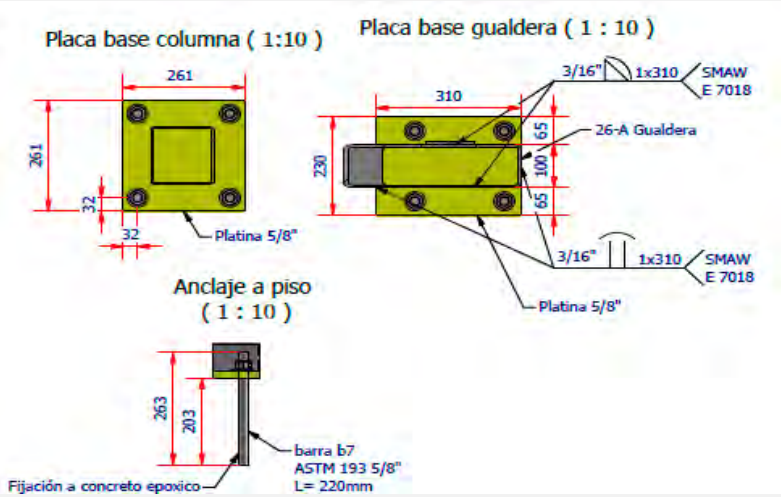

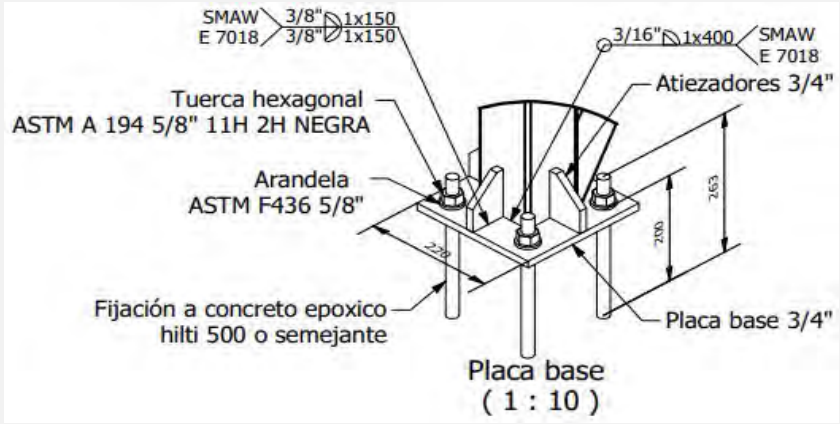

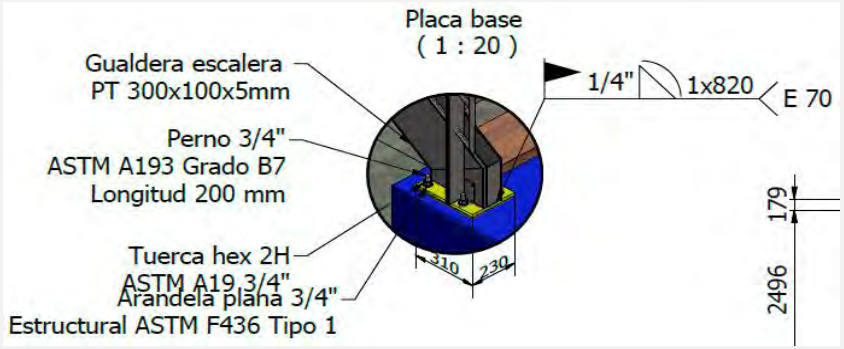

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	3.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION	**HOJA No.**	34	**de**	79
UNIDAD	M3	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 3.2.9	CONCRETO CICLOPEO 60 -40	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

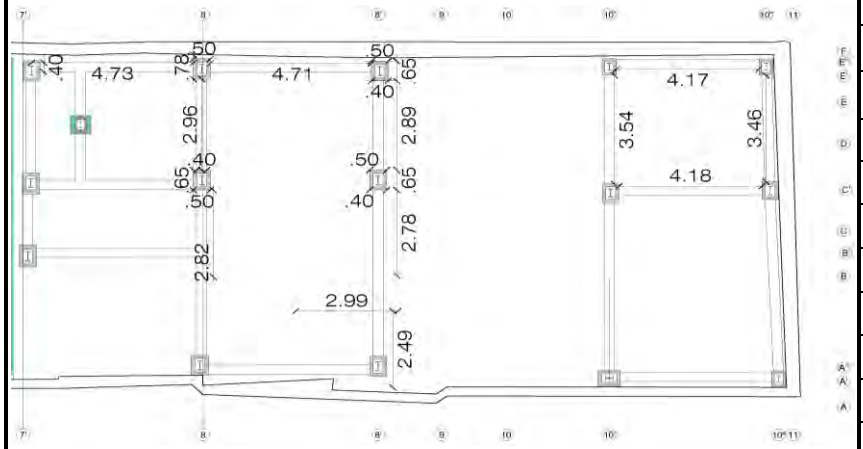

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
EJE E`(7-8)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	4,73	0,43	0,30		1,00	0,61
EJE 8`- E`	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	0,50	0,78	0,30		1,00	0,12
EJE 8`(E`-C`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	2,96	0,40	0,30		1,00	0,36
EJE 8 - E`	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	0,50	0,65	0,30		1,00	0,10
EJE 8 (E-C)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	2,82	0,40	0,30		1,00	0,34
EJE E`(8-8^)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	4,71	0,40	0,30		1,00	0,57
EJE E`-8`	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	0,65	0,50	0,30		1,00	0,10
EJE 8`(E`-C`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	2,89	0,40	0,30		1,00	0,35
EJE 8`(E`-C`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	0,65	0,50	0,30		1,00	0,10
EJE 8`(C`-B`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	2,78	0,40	0,30		1,00	0,33
EJE 8`(B`-A`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	2,29	2,09	0,30		1,00	1,44
EJE 10 (E`-C`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	3,54	0,40	0,30		1,00	0,42
EJE E`(10-10^)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	4,17	0,40	0,28		1,00	0,47
EJE 10`(E`C`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	3,46	0,40	0,28		1,00	0,39
EJE C` (10-10`)	CONCRETO SOBRE EXCAVACIONES ARQUEOLOGIA	4,16	0,39	0,20		1,00	0,32

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

105 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	3.3	ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.**	35 **de**	79
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	3.3.1	REFUERZO DE CIMENTACION - 420 Mpa	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

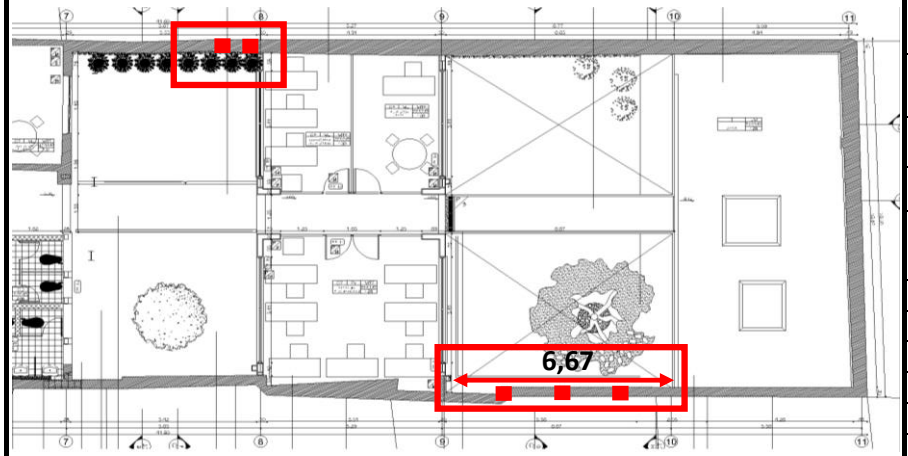

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	# HIERROS	PESO		CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	3,600	2,0	0,994		2,000	14,31
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	0,250	36,00	0,560		2,00	10,08
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" REFUERZO VERTICAL	1,700	2,0	0,994		3,000	10,14
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 3/8" REFUERZO Z	0,250	17,00	0,560		3,000	7,14
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 1/2" VIGA SUPERIOR HORIZONTAL	6,670	2,00	0,994		1,000	13,26
PATIO 3 MURO OCCIDENTAL	VARILLA 3/8 REFUERZO Z VIGA SUPERIOR	0,250	66,70	0,560		1,000	9,34
TOTAL KG ACERO							64,27
ALAMBRE NEGRO DE AMARRE X 0.04						0,04	2,57
TOTAL KG DE ACERO CON ALAMBRE NEGRO							66,84

Cantidad pagadas en los cortes	3.879,83	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	66,84
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	1246,71	Cantidad Contractual	5.000,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**3.879,83**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**66,84**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**	VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	3.3 ACERO DE REFUERZO	**HOJA No.** 36	**de** 81
UNIDAD	KG **DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR
ITEM No.	3.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20

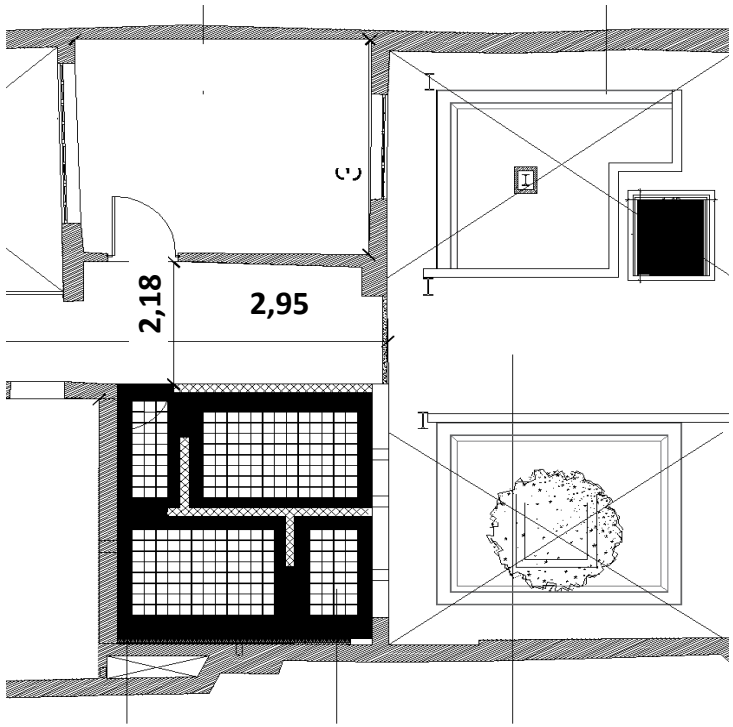

LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	PESO X M2	TRASLAPO 0,20	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO ENTRE VOLUMEN UNO Y DOS	2,95	2,18	3,51	0,00		1,00	22,57

Cantidad pagadas en los cortes	158,26	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	22,57
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 08		Cantidad Contractual	1.258,26
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**158,26**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,57**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	**HOJA No.**	37	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

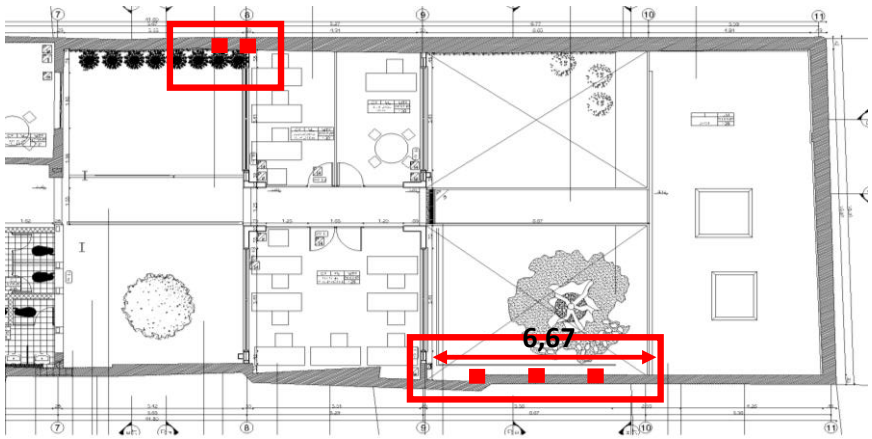

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	PROLONGACION DE MURO COLINDANTE		0,20	3,60		2,00	7,20
PATIO 3 MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	PROLONGACION DE MURO COLINDANTE		0,20	1,70		3,00	5,10
PATIO 3 MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	VIGA CORONA AMARRE MUROS		0,20	6,67		1,00	6,67

Cantidad pagadas en los cortes	169,19	Cantidad de la Ficha No. 1 / 3	18,97
		Pasan	18,97
Cantidad pagada Corte No. 07	63,45	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**169,19**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	**HOJA No.**	38 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

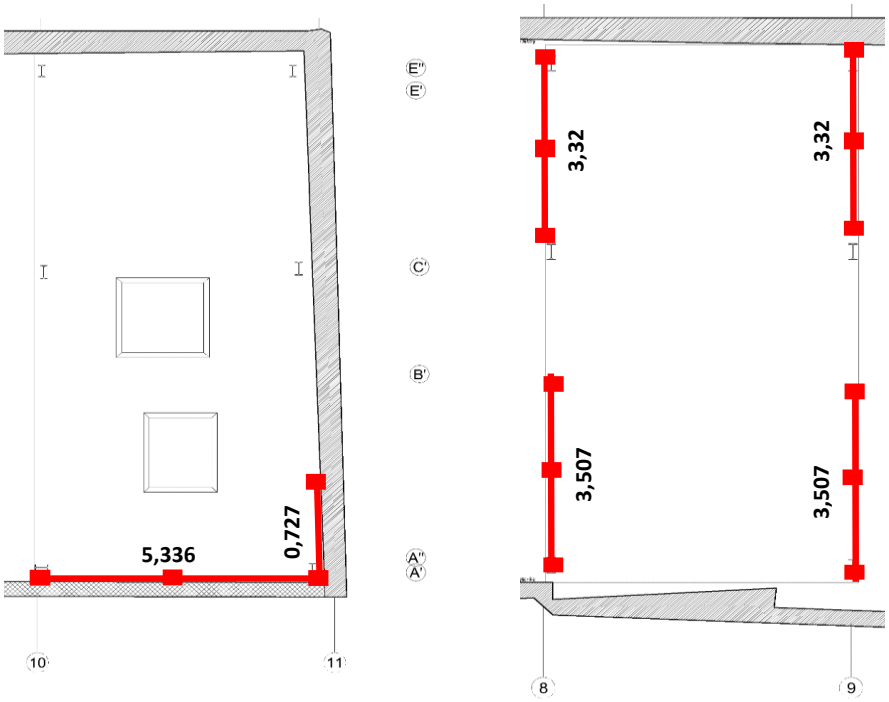

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	COLUMNETA VERTICAL	1,700				4,00	6,80
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	5,336				1,00	5,34
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	0,727				1,00	0,73
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	COLUMNETA VERTICAL	0,220				12,00	2,64
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	3,507				2,00	7,01
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	3,320				2,00	6,64

Cantidad pagadas en los cortes	169,19	Cantidad de la Ficha No. 2 / 3	29,16
		Vienen	18,97
Cantidad pagada Corte No. 07	63,45	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**169,19**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	**HOJA No.**	39 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

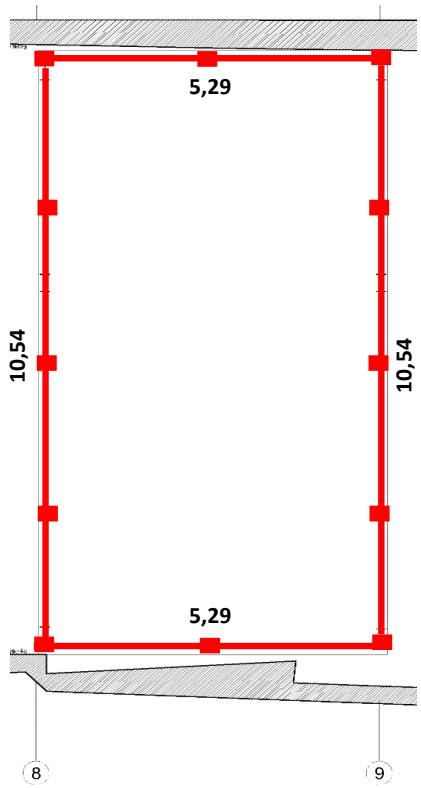

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 CUBIERTA	COLUMNETA VERTICAL	0,220				12,00	2,64
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	10,540				2,00	21,08
VOLUMEN 2 CUBIERTA	VIGA DE AMARRE SUPERIOR	5,29				2,00	10,57

Cantidad pagadas en los cortes	169,19	Cantidad de la Ficha No. 3 / 3	34,29
		Pasan / vienen	48,13
Cantidad pagada Corte No. 07	63,45	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**169,19**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**82,42**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

110 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	4	ESTRUCTURA CONCRETO	**HOJA No.**		40	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	4.1.1	COLUMNETAS REFUERZO MAMPOSTERIA DE 10 X 21 (Z. BASURAS, CUARTO TECNICO)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	41 **de**	81
UNIDAD	KG	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	5.1.1	ESTRUCTURA METALICA TIPO IPE 180, 200, 220, 240, 270, 300, PIPE4SCH40, PTS, C8 PLATINAS ENTRE OTROS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

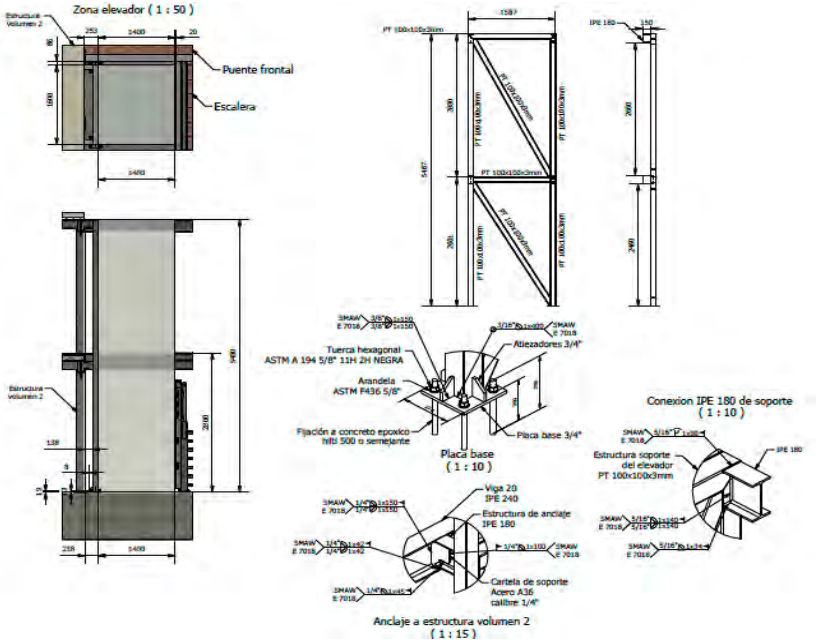

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
		ESTRUCTURA ASCENSOR					
Placa base estructura ascensor	Platina e= 3/4" L_220x220x19,05mm c/4 perforaciones 5/8"	0,048	0,048	149,20		2,00	14,32
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	5,437	5,437	8,96		2,00	97,43
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,600	1,60	8,96		1,00	14,34
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,400	1,40	8,96		3,00	37,63
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	0,150	0,15	8,96		4,00	5,38
		ESTRUCTURA ESCALERA PATIO 2					
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,324		30,88		1,00	40,89
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,465		30,88		1,00	14,36
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,939		30,88		1,00	59,88
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,506		30,88		2,00	31,25
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,03		30,88		1,00	62,69
GUALDERA	PT 50X50X2MM	1,04		16,13		1,00	16,81
PLATINA 1/4"	Refuerzo patin	0,04		49,85		2,00	3,89
		ESTRUCTURA ESCALERA PATIO 3					
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,90		16,13		2,00	29,00
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,59		16,13		2,00	19,03
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,08		16,13		2,00	2,52
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,25		16,13		2,00	8,19
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,13		16,13		1,00	2,06
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,641		16,13		1,00	10,34

Cantidad pagadas en los cortes	11.061,36	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	470,00
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 07	1126,33	Cantidad Contractual	150,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**11.061,36**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**470,00**

OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ 112 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	42	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		







DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	%	# CARAS	SUB TOTAL
IPE 240 columnas	2,70			4,00		1,00	10,80
IPE 270 columnas	2,70			2,00		1,00	5,40
IPE 300 columnas	5,90			6,00		1,00	35,40
IPE 300 COLUMNA EJE 7" (E"-B")	6,00			3,00		1,00	18,00
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 1	4,44			1,00		1,00	4,44
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 2	4,50			1,00		1,00	4,50
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 3	4,569			1,00		1,00	4,57
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 4	4,631			1,00		1,00	4,63
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 5	4,68			1,00		1,00	4,68
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 6	4,74			1,00		1,00	4,74
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 7	4,77			1,00		1,00	4,77
VIGA CIERRE 1 IPE 220	3,84			1,00		1,00	3,84
VIGA CIERRE 2 IPE 220	5,926			1,00		1,00	5,93
VIGA CIERRE 3 IPE 220	3,83			1,00		1,00	3,83
PERFIL CUADRADO 50X50 2MM	1,700			4,00		1,00	6,80
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Y 17	5,088			10,00		1,00	50,88
VIGA CIERRE 4 IPE 240	6,00			1,00		1,00	6,00
VIGA CIERRE 5 IPE 240	3,32			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 6 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 7 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 8 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 9 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 10 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 11 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 12 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 15 IPE 180	4,626			1,00		1,00	4,63
VIGE CIERRE 16 IPE 180	4,499			1,00		1,00	4,50
VIGA CIERRE 17 IPE 180	5,070			1,00		1,00	5,07
VIGA CIERRE 18 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 19 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 20 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 21 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 24 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	255,06
		Pasan	255,06
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	


OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ 113 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	43	**de**	79
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



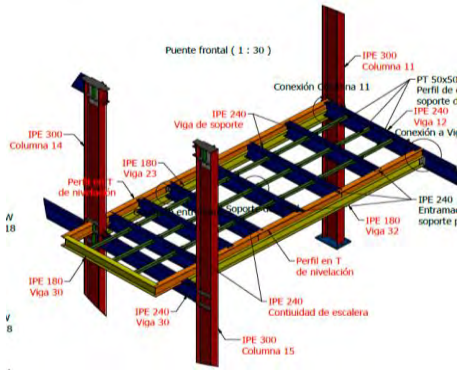

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	%	# CARAS	SUB TOTAL
VIGA CIERRE 25 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,680			2,00		1,00	7,36
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			1,00		1,00	3,51
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,730			1,00		1,00	3,73
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,590			2,00		1,00	7,18
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			1,00		1,00	3,51
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,740			1,00		1,00	3,74
VIGA CIERRE 27 IPE 220	4,624			1,00		1,00	4,62
VIGA CIERRE 14 IPE 240	3,329			1,00		1,00	3,33
VIGA CIERRE 30 IPE 240	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 30` IPE 180	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 23 IPE 180	4,860			1,00		1,00	4,86
VIGA CIERRE 32 IPE 180	4,800			1,00		1,00	4,80
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			1,00		1,00	4,82
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			1,00		1,00	4,82
ENTRAMADO PUENTE IPE 240	2,078			7,00		1,00	14,55
VIGA CIERRA 13 IPE 240	3,329			1,00		1,00	3,33
VIGA CIERRE 26 IPE 180	4,624			1,00		1,00	4,62
VIGA CIERRE 28 IPE 240	4,704			1,00		1,00	4,70
VIGA CIERRE 29 IPE 240	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 31 IPE 240	4,819			1,00		1,00	4,82
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,686			12,00		1,00	8,23
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,480			6,00		1,00	2,88
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,839			3,00		1,00	2,52

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	113,26
		Vienen	255,06
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	44 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

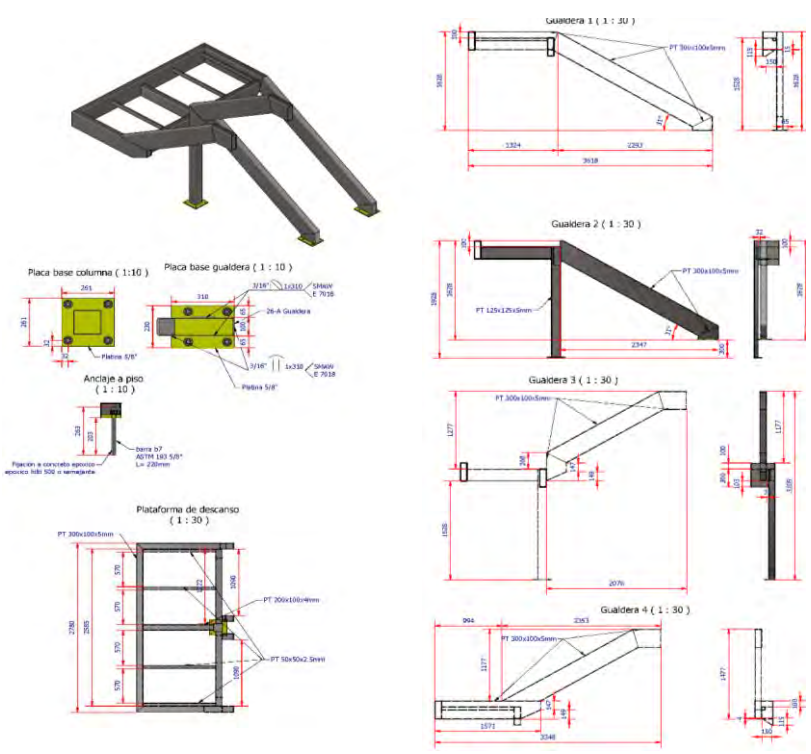

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	CANT	PESO X ML	%	CARAS	SUB TOTAL
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,071	2,00			1,00	0,14
SOPORTE COLUMNA CENTRAL	platina e= 1/2" L=276x276x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,076	1,00			1,00	0,08
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,217	2,00			1,00	0,43
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,684	1,00			1,00	2,68
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,723	1,00			1,00	2,72
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,779	1,00			1,00	2,78
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,481	2,00			1,00	0,96
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,571	1,00			1,00	1,57
COLUMNA	PT 135x135x6mm	1,760	1,00			1,00	1,76
	PT 50x50x2mm	1,059	4,00			1,00	4,24
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,04	30,00			1,00	1,20
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mmx2,44m)	0,01	4,00			1,00	0,06
	PT 200x100x4mm	1,04	1,00			1,00	1,04
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,324	1,00			1,00	1,32
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,465	1,00			1,00	0,47
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,939	1,00			1,00	1,94
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,506	2,00			1,00	1,01
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,03	1,00			1,00	2,03
GUALDERA	PT 50X50X2MM	1,04	1,00			1,00	1,04
PLATINA 1/4"	Refuerzo patin	0,04	2,00			1,00	0,08

Cantidad pagadas en los cortes	9.935,03	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	27,56
		vienen	368,32
Cantidad pagada Corte No. 07	5810,50	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**9.935,03**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	45	**de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

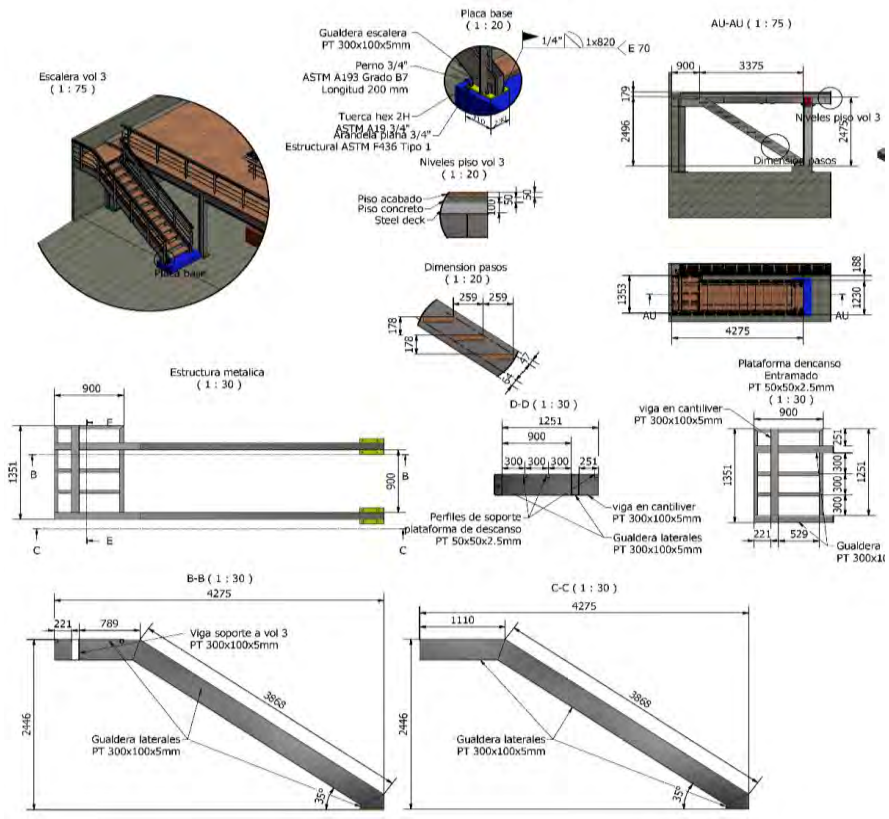

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	CANT.	PESO X ML	%	CARAS	SUB TOTAL
	ESCALERA VOLUMEN TRES						
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x16mm C/4 perforaciones 3/4"	0,071	2,00			1,00	0,142
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,204	2,00			1,00	0,408
GUALDERA	PT 300x100x5mm	3,868	2,00			1,00	7,736
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,789	1,00			1,00	0,789
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,211	1,00			1,00	0,211
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,110	1,00			1,00	1,110
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,040	26,00			1,00	1,040
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mx2,44m)	0,006	1,00			1,00	0,006
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,011	1,00			1,00	0,011
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,049	1,00			1,00	0,049
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,90	2,00			1,00	1,798
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,59	2,00			1,00	1,180
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,08	2,00			1,00	0,156
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,25	2,00			1,00	0,508
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,13	1,00			1,00	0,128
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,641	1,00			1,00	0,641

Cantidad pagadas en los cortes	114,42	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	15,91
		vienen	395,87
Cantidad pagada Corte No. 07	114,42	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**114,42**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	5	ESTRUCTURA DE METAL	**HOJA No.**	46	**de** 119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 5.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

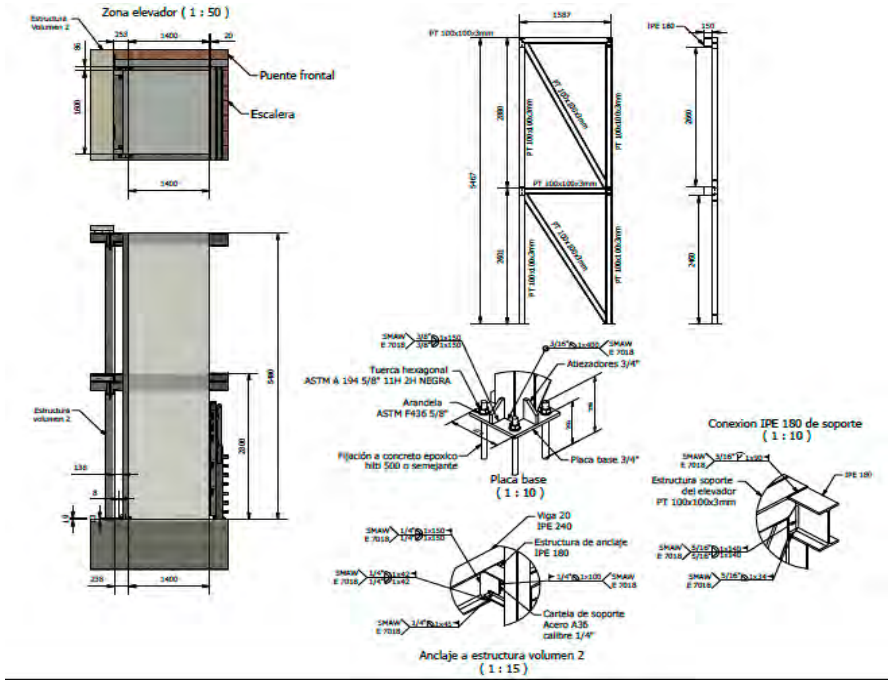

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	CANT	PESO X ML	%	CARAS	SUB TOTAL
	ESTRUCTURA ASCENSOR						
Placa base estructura ascensor	Platina e= 3/4" L_220x220x19,05mm c/4 perforaciones 5/8"	0,048	2,00			1,00	0,10
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	5,437	2,00			1,00	10,87
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,600	1,00			1,00	1,60
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,400	3,00			1,00	4,20
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	0,150	4,00			1,00	0,60

Cantidad pagadas en los cortes	114,42	Cantidad de la Ficha No. 2 / 2	17,37
		Vienen	411,79
Cantidad pagada Corte No. 07	114,42	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**114,42**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**429,16**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	47	**de** 81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº. 4	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

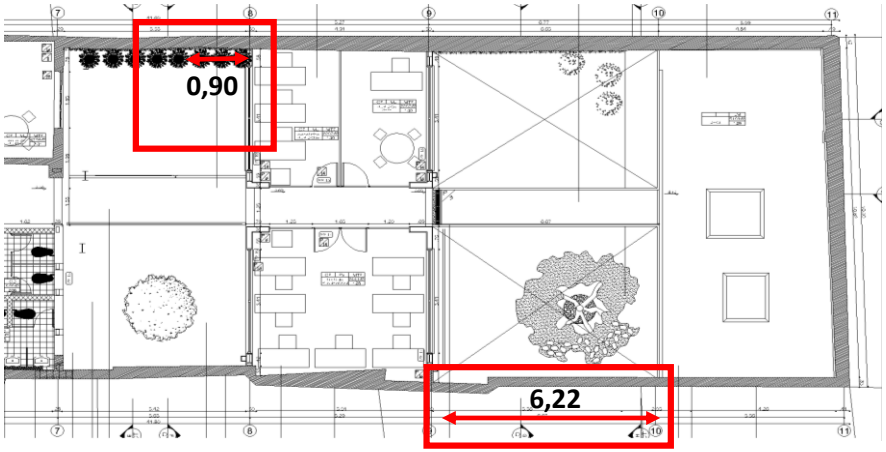

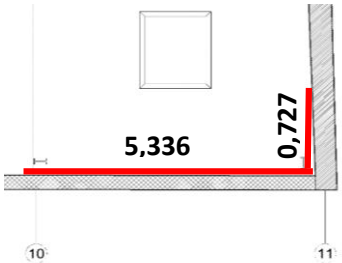

A A' VOLUMEN TRES SEGUNDA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2	PROLONGACION MURO COLINDANTE ORIENTAL	0,90		3,60		1,00	3,24
PATIO 3	PROLONGACION MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	6,22		1,70		1,00	10,57
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	5,34		1,70		1,00	9,07
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	0,73		1,70		1,00	1,24
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO DIVISORIO	1,88	0,12	2,537		1,00	4,77

Cantidad pagadas en los cortes	119,86	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	28,89
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	15,94	Cantidad Contractual	120,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**119,86**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**28,89**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	48	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	6.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº. 4	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO


PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	49 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 6.1.3	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº. 4	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

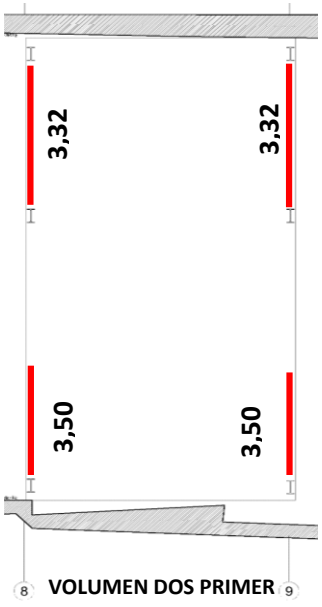

VOLUMEN DOS PRIMER

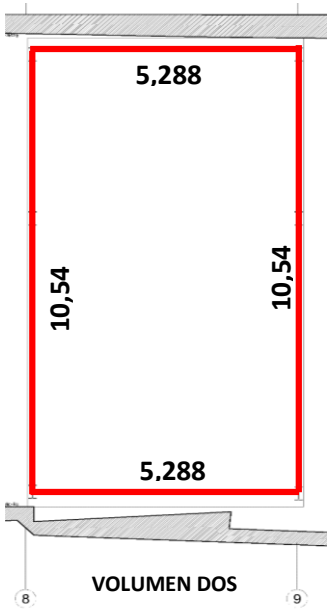

VOLUMEN DOS



VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
Volumen dos primer planta	ANTEPECHOS FACHADA EN BLOQUE ESTRIADO #4	3,32	0,15	0,44		2,00	6,64
Volumen dos primer planta	ANTEPECHOS FACHADA EN BLOQUE ESTRIADO #4	3,50	0,15	0,44		2,00	7,00
Volumen dos planta cubierta	ANTEPECHOS FACHADA EN BLOQUE ESTRIADO #4	10,54	0,15	0,44		2,00	21,08
Volumen dos planta cubierta	ANTEPECHOS FACHADA EN BLOQUE ESTRIADO #4	5,29	0,15	0,44		2,00	10,58
Volumen 3 fachada lactancia	ANTEPECHOS FACHADA EN BLOQUE ESTRIADO #4	1,96	0,15	0,50		1,00	1,96

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	47,26
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	80,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**47,26**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

120 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	50	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTIRADO Nº. 4	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	51 **de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 6.1.4	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

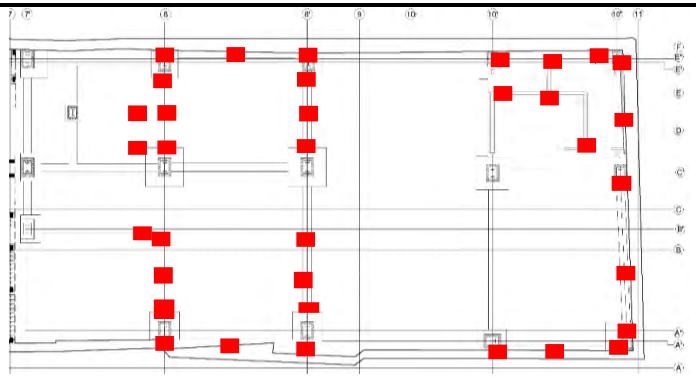


VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA

VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA

VOLUMEN DOS PLANTA CUBIERTA

VOLUMEN TRES PLANTA CUBIERTA

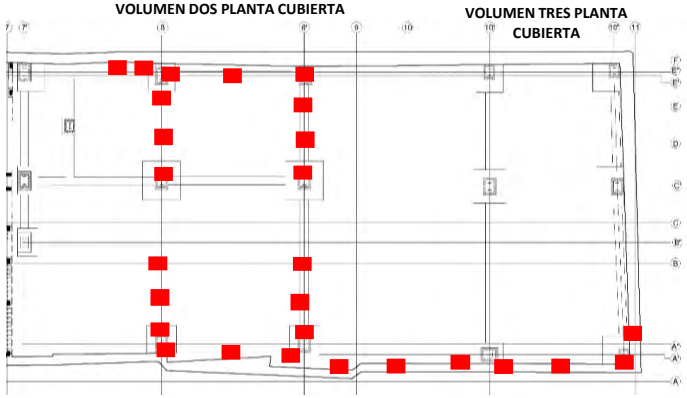

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	DIST ENTRE CU	CANT	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 2 PRIMER PLANTA	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		18,00	36,00
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		11,00	22,00
VOLUMEN 2 PLANTA CUBIERTA	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		18,00	36,00
PATIO 2 MURO COLINDANTE	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		2,00	4,00
PATIO 3 MURO COLINDANTE	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		3,00	6,00
VOLUMEN 3 PLANTA CUBIERTA	ANCLAJE VARILLA 1/2" EPOXICOCOLUMNETAS			2,00		4,00	8,00
PATIO 2 VIGAS ASCENSOR	ANCLAJE VARILLA 1/2" VIGAS ASCENSOR			4,00		2,00	8,00
PATIO 2 BORDILLOS	ANCLAJE VARILLA 1/2" BORDILLO RAMPA			2,00		1,00	2,00
VOLUMEN 3 MUROS INTERNOS	ANCLAJE VARILLA 1/2" COLUMNETAS			2,00		3,00	6,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	128,00
		Pasan	128,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	230,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**128,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

122 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	52	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.4	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	53 **de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 6.1.5	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 3/8" PROFUNDIDAD 15 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

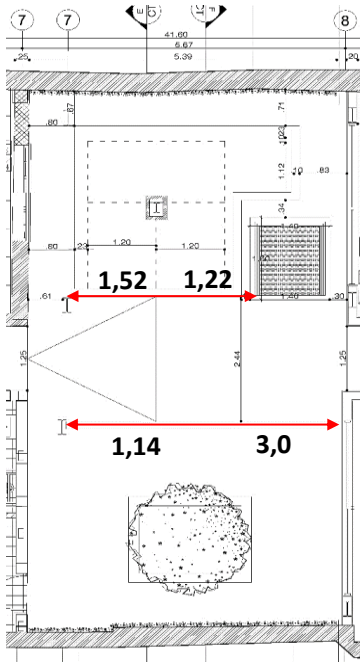

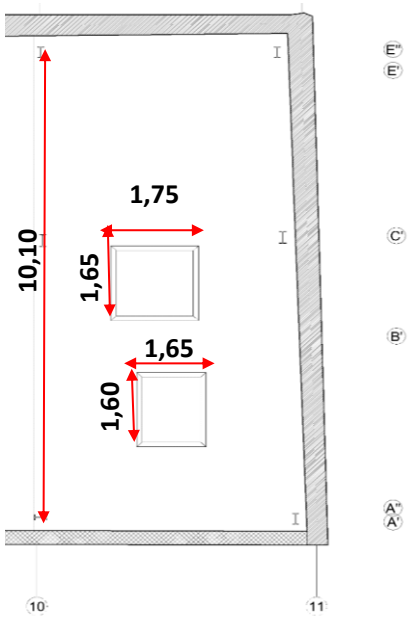

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	CADA	# ANCLAJES	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,52	0,15	10,15		1,00	10,15
PATIO 2	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,22	0,15	8,13		1,00	8,13
PATIO 2	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,14	0,15	7,60		1,00	7,60
PATIO 2	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	3,00	0,15	20,00		1,00	20,00
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	10,10	0,15	67,33		1,00	67,33
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,75	0,15	11,67		2,00	23,33
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,65	0,15	11,00		4,00	44,00
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	ANCLAJE EPOXICO ACERO DE BORDILLOS	1,60	0,15	10,67		2,00	21,33

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	201,87
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	230,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**201,87**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

124 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6	MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	54	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 6.1.5	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLA DE 3/8" PROFUNDIDAD 15 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

125 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	6.2	MUROS LIVIANOS	**HOJA No.**	55	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	6.2.1	MUROS DOBLE CARA EN LAMINA DE FIBROCEMENTO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

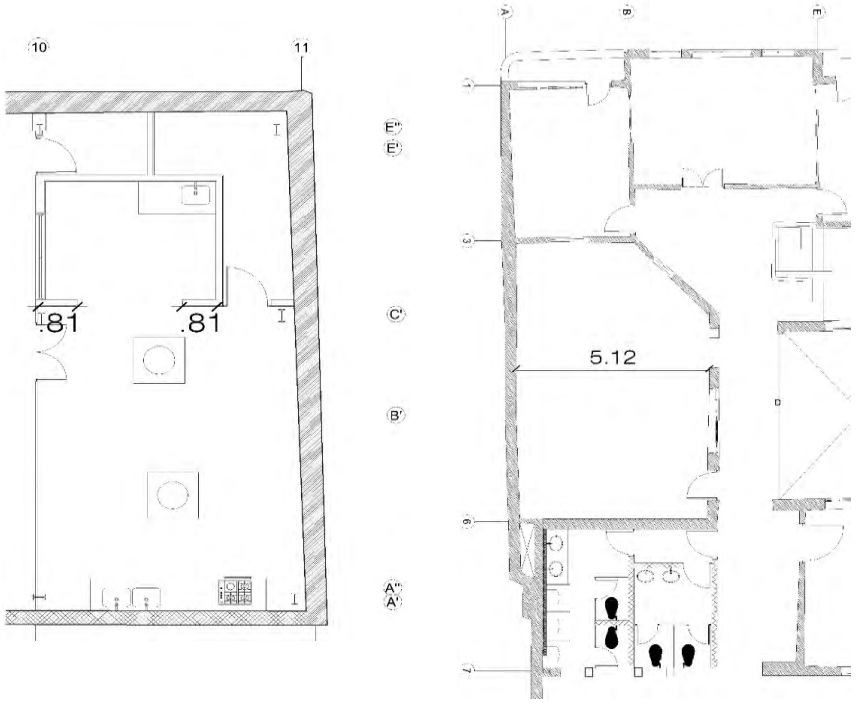

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS	0,81	0,20	2,537		2,00	4,11
VOLUMEN UNO SEGUNDA PLANTA	MURO SUPERBOARD DIVISORIO A DOS CARAS	5,12	0,20	3,00		1,00	15,36

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	19,47
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	50,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**19,47**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	56 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 MURO COLINDANTE ORIENTAL	PAÑETE SOBRE MUROS	0,900		3,600		1,00	3,24
PATIO 3 MURO COLINDANTE OCCIDENTAL	PAÑETE SOBRE MUROS	6,670		1,70		1,00	11,34

Cantidad pagadas en los cortes	159,96	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	14,58
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	49,53	Cantidad Contractual	210,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**159,96**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**14,58**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	57 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

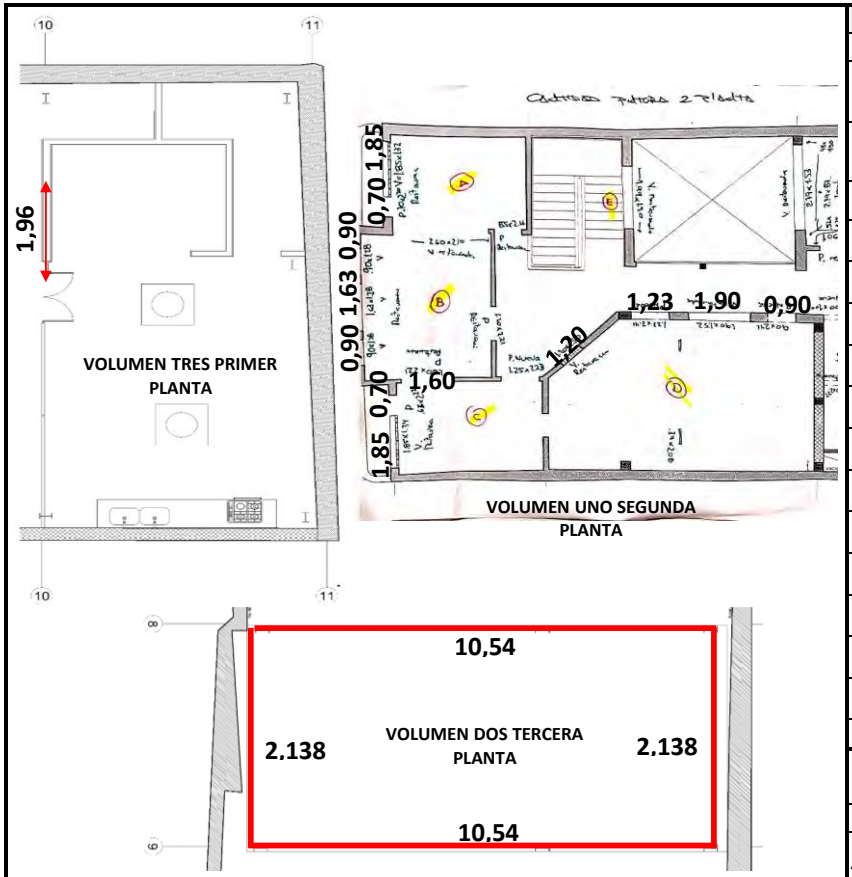

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS TERCER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	2,138		3,00		2,00	11,33
VOLUMEN DOS TERCER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	10,54		3,00		2,00	63,24
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	MURO BAJO FACHADA	1,96	0,44	3,00		1,00	5,88
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	1,60	4,42			1,00	6,02
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	1,23	4,42			1,00	5,65
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA	2,400	3,00			1,00	5,40
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO PUERTA	0,900	4,42			1,00	5,32
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA	3,800	3,04			1,00	6,84
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE DE FILO VANO VENTANA FACHADA	3,700	2,68			1,00	6,38
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO PUERTA FACHADA	0,700	4,44			1,00	5,14
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	1,800	3,06			1,00	4,86
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	3,260	3,06			1,00	6,32
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VANO VENTANA FACHADA	1,800	3,06			1,00	4,86
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO PUERTA FACHADA	0,700	4,40			1,00	5,10
BIC SEGUNDA PLANTA	REMATE FILO VENTANA FACHADA	3,70	2,64			1,00	6,34

Cantidad pagadas en los cortes	171,40	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	148,68
		Pasan / vienen	148,68
Cantidad pagada Corte No. 08	24,47	Cantidad Contractual	60,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**171,40**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**148,68**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

128 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	58	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.1.2	PAÑETE SOBRE MUROS (ml)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7	PAÑETES Y CIELOS RASOS	**HOJA No.**	59	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.1.3	PAÑETE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

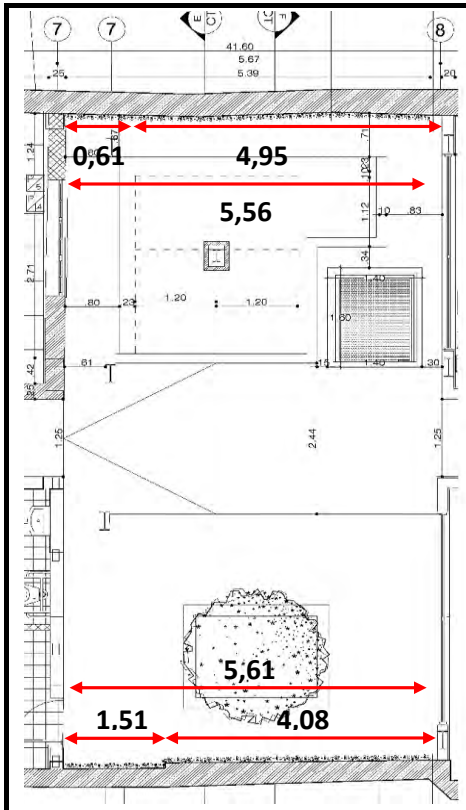

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2 MURO ORIENTAL	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS COLINDANTES	1,51		3,45		1,00	5,21
PATIO 2 MURO OCCIDENTAL	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS COLINDANTES	0,61		2,10		1,00	1,28
PATIO 2 MURO OCCIDENTAL	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MUROS COLINDANTES	5,61		2,20		1,00	12,34

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	18,83
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	23,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**18,83**

OBSERVACIONES: SE PAGARON EN ACTA #8 24,47M2 DE LOS CUALES SE COBRAN EN PRESENTE ACTA LOS RESTANTES M2 DE LA TOTALIDAD DE LA APLICACIÓN SOBRE LOS MUROS

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

130 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	**HOJA No.**	60	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.2.1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE (Zona humeda)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

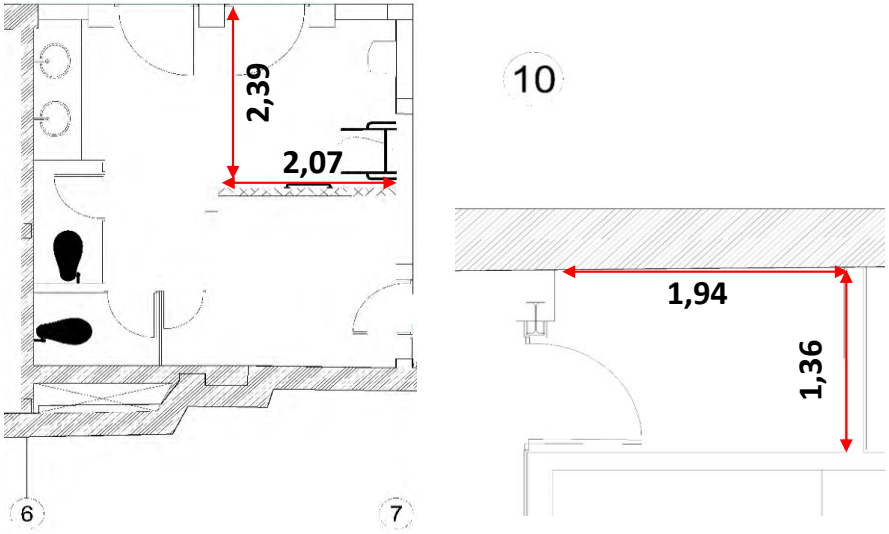

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA PISO 1	CIELO RASO EN DRYWALL VERDE AREA DE BAÑOS VOLUMEN UNO	2,39	2,07			1,00	4,95
CUARTO BASURAS VOLUMEN 3	CIELO RASO DRYWALL VERDE	1,94	1,36			1,00	2,64

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	7,59
		Pasan / vienen	7,59
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	7,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**7,59**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

131 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	**HOJA No.**	61 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.2.2	CIELO RASO EN FIBROCEMENTO (Superboard)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

VOLUMEN DOS PRIMER Y SEGUNDA PLANTA

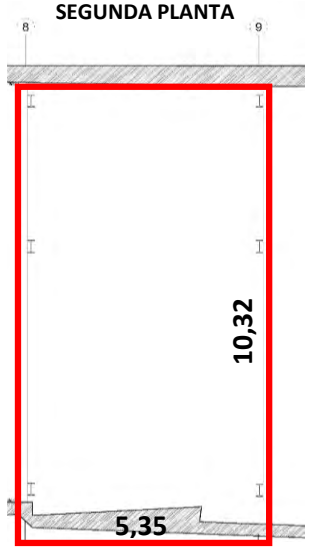

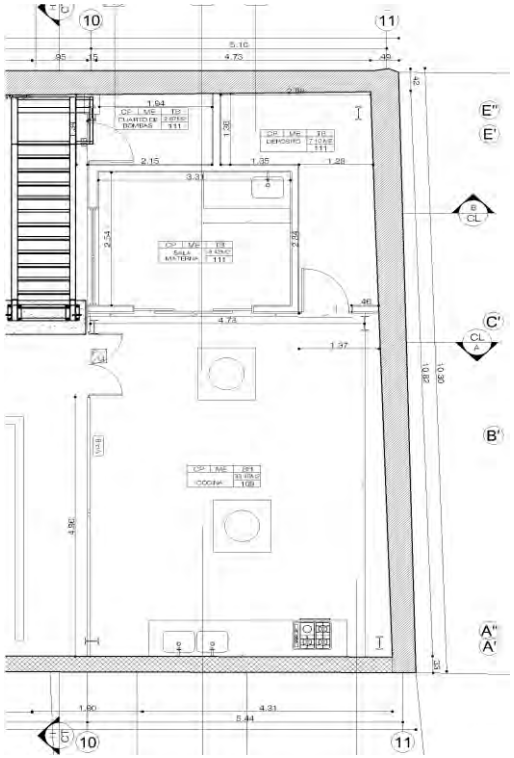

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO	10,32	5,35			1,00	55,21
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	CIELO RASO LAMINA FIBROCEMENTO	10,32	5,35			1,00	55,21
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	DEPOSITO	1,18	2,49			1,00	2,95
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	ENTRADA DEPOSITO	2,92	1,55			1,00	4,52
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	ZONA COMEDOR - COCINA (SIN ARBOLES)	6,54	5,00			1,00	30,75

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	148,64
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	152,25
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**148,64**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.2	CIELO RASOS	**HOJA No.**	62 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.2.3	DINTELES EN LAMINAS DE FIBROCEMENTO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

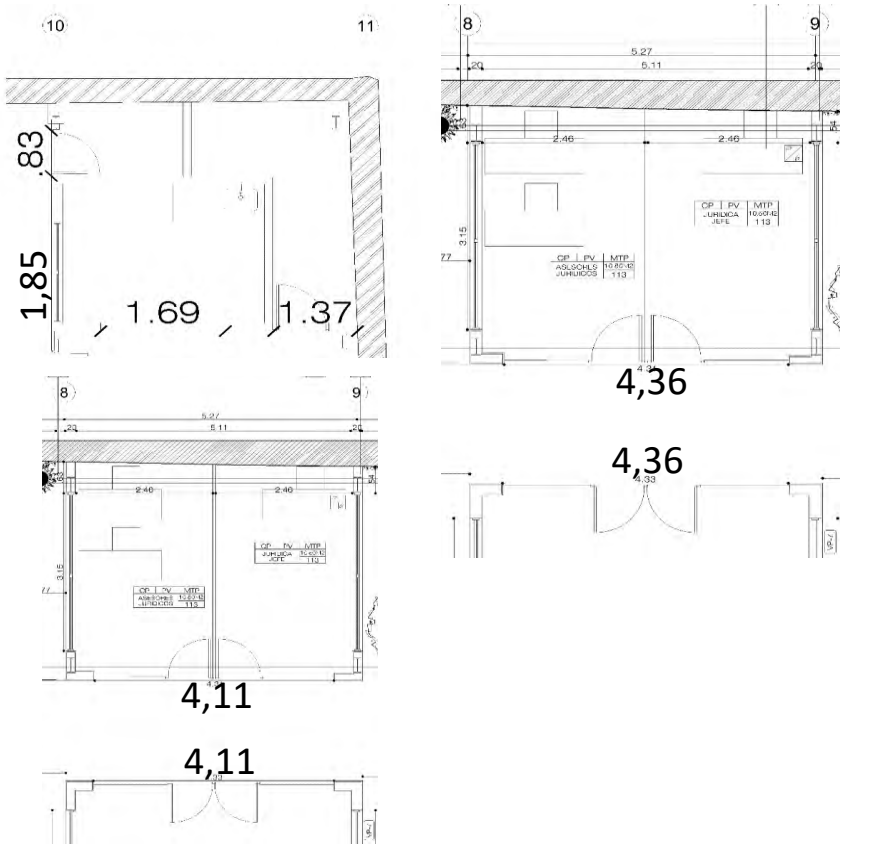

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO SALA LACTANCIA	1,69		0,30		1,00	1,69
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO CUARTO BOMBAS	0,83		0,30		1,00	0,83
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	DINTEL ACCESO DEPOSITO	1,37		0,30		1,00	1,37
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	DINTEL VENTANA FACHADA LACTANCIA	1,85		0,30		1,00	1,85
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL PUERTA ACCESO OFICINAS	4,360		0,30		1,00	4,36
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	DINTEL PUERTA ACCESO OFICINAS	4,360		0,30		1,00	4,36
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL PUERTA ACCESO OFICINAS	4,110		0,30		1,00	4,11
VOLUMEN DOS SEGUNDA PLANTA	DINTEL PUERTA ACCESO OFICINAS	4,110		0,30		1,00	4,11

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	22,68
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	20,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,68**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	63	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.1	ESTUCO SOBRE PAÑETE INTERIOR	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

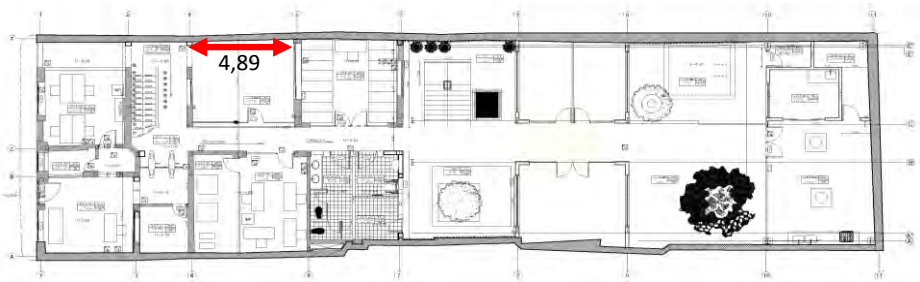

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 1	ESTUCO SOBRE MURO ORIENTAL	4,89		3,00		1,00	14,67

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	14,67
		Pasan / vienen	14,67
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	500,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**14,67**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

134 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	64 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incuye cinta malla)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

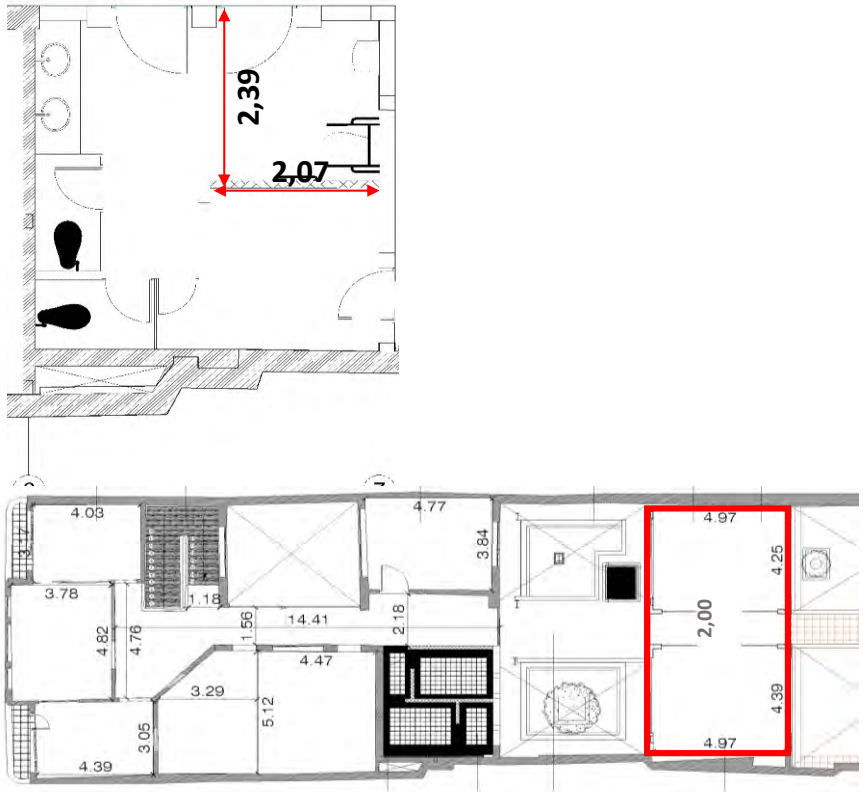

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
BIC BAÑO HOMBRES PRIMER PISO	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	2,39	2,07			1,00	4,95
EQUIPO P URBANO	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	4,82	3,78			1,00	18,22
OFICINA PLANEACION	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	4,97	4,39			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	4,97	4,25			1,00	21,12
HALL VOLUMEN 2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	4,97	2,00			1,00	9,94

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	76,05
		Pasan	76,05
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	200,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**76,05**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	65 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO (Incuye cinta malla)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

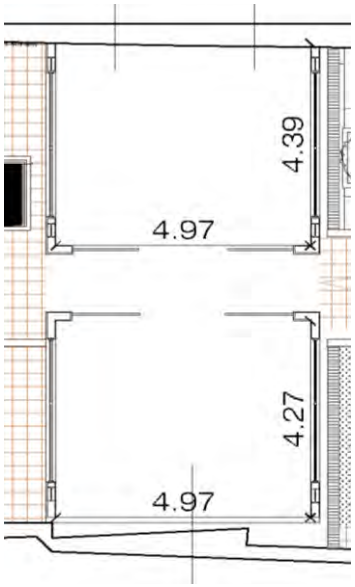

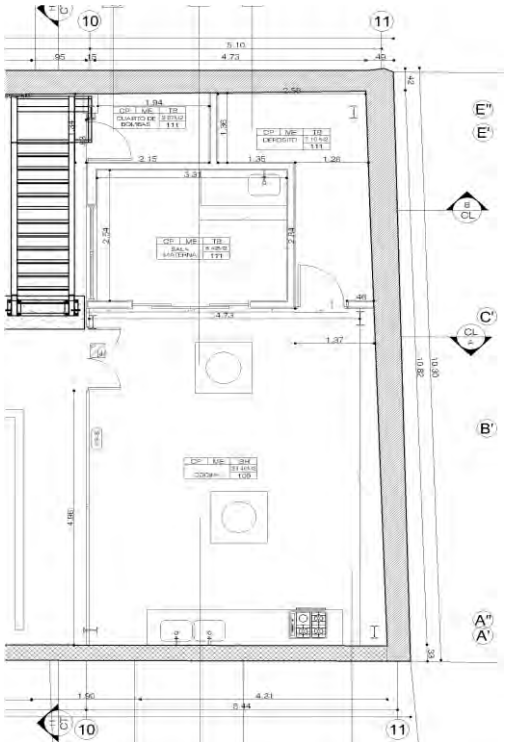

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
ARCHIVO JURIDICO	ESTUCO CIELO RASO	4,58	4,61			1,00	21,11
ASESORES JURIDICOS	ESTUCO CIELO RASO	4,39	4,97			1,00	21,82
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	ESTUCO CIELO RASO	1,18	2,49			1,00	2,95
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	ESTUCO CIELO RASO	2,92	1,55			1,00	4,52
VOLUMEN TRES PRIMER PLANTA	ESTUCO CIELO RASO DESCONTANDO ARBOLES	6,54	5,00			1,00	30,75
VOLUMEN TRES SALA MATERNA	ESTUCO CIELO RASO	3,310	2,54			1,00	8,41
HALL VOLUMEN 2	ESTUCO SOBRE CIELO RASO	4,97	2,00			1,00	9,94

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	99,49
		Vienen	76,05
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**175,54**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	66	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	7.3.3	ESTUCO SOBRE MUROS (Fibrocemento y drywall)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

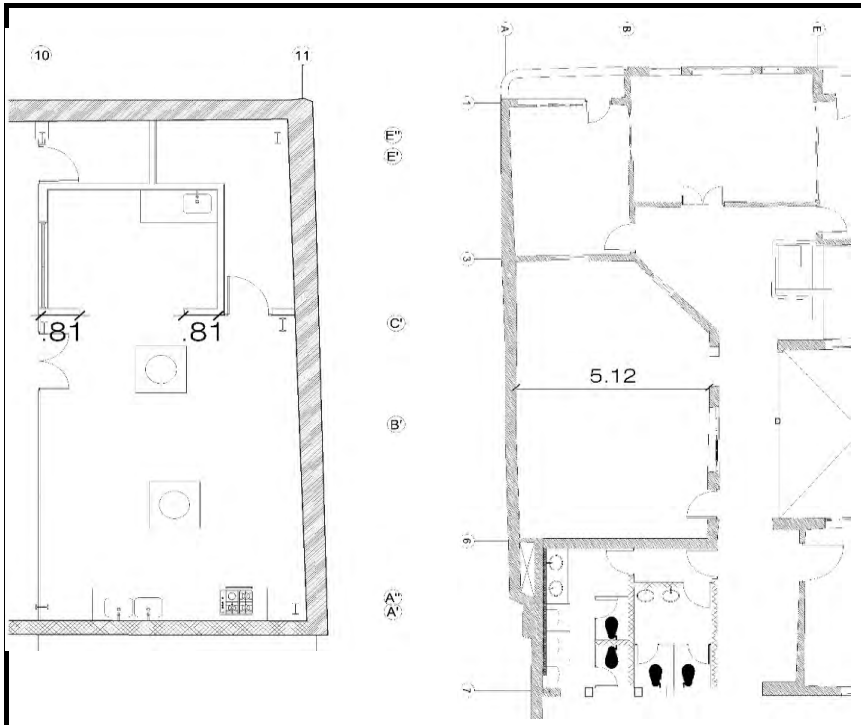

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PRIMER PLANTA	MURO SUPER BOARD A DOS CARAS		0,81	2,530		1,00	2,05
VOLUMEN UNO SEGUNDA PLANTA	MURO SUPERBOARD DIVISORIO A DOS CARAS		5,12	2,86		1,00	14,62

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	16,67
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	182,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**16,67**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	7.3	ESTUCOS	**HOJA No.**	67 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	7.3.4	ESTUCO SOBRE PAÑETE (ml)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

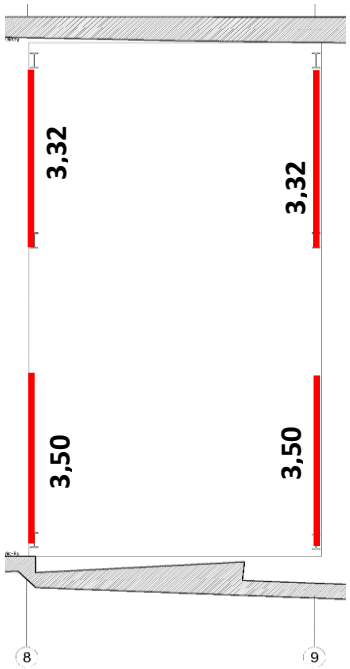

VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA

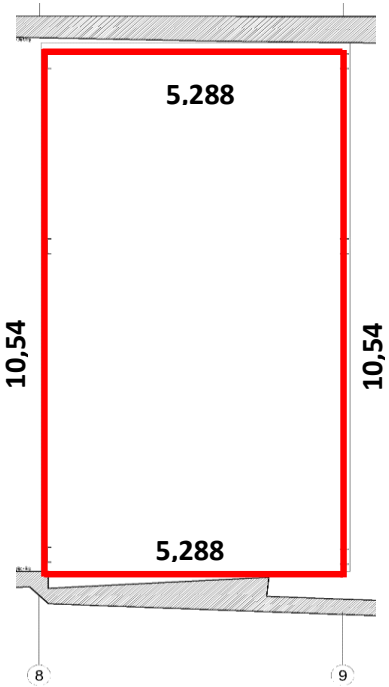

VOLUMEN DOS TERCERA PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	3,32		3,00		2,00	19,92
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	3,50		3,00		2,00	21,00
VOLUMEN DOS TERCER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	5,288		2,00		2,00	21,15
VOLUMEN DOS TERCER PLANTA	PAÑETE SOBRE MUROS ML	10,54		2,00		2,00	42,16

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	104,23
		Pasan	
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	185,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**104,23**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

138 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.1	ALISTADO DE PISOS	**HOJA No.**	68 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.1.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

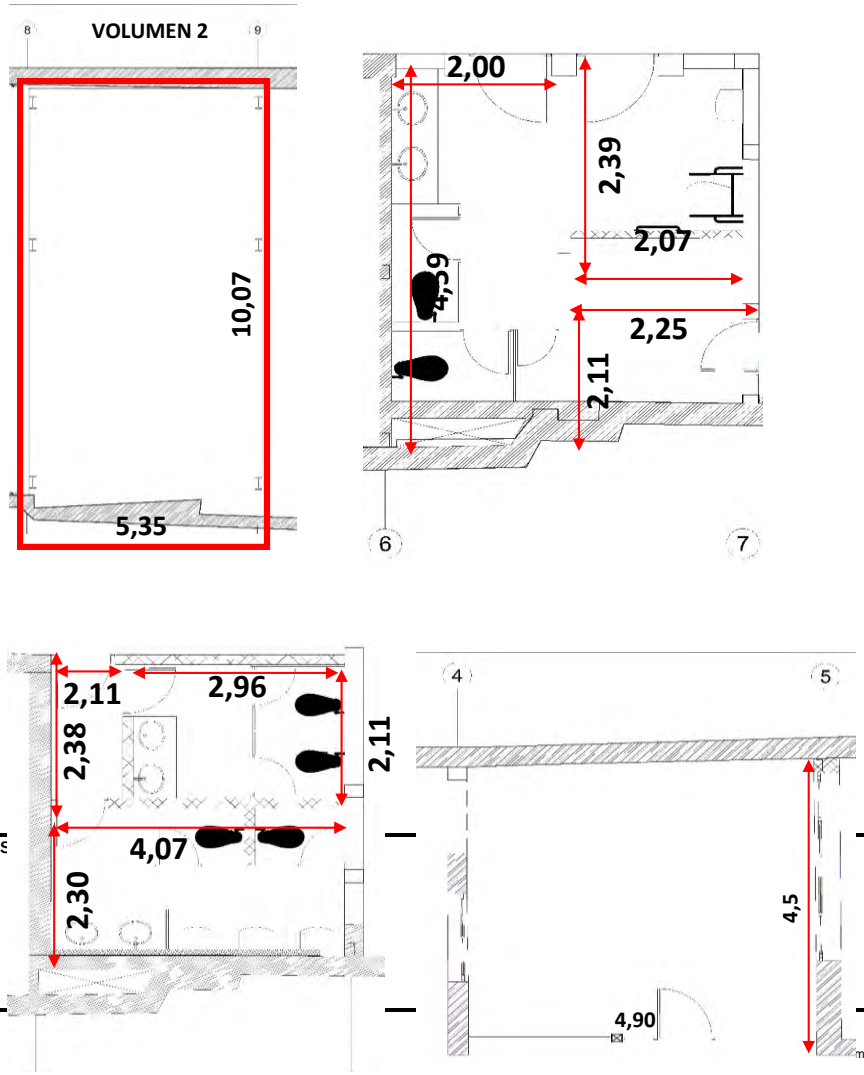

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS CUBIERTA	ALISTADO MORTERO 1:3 CON PENDIENTES	2,35	5,35			1,00	12,57
BIC BAÑO MUJERES PRIMER PISO	ALISTADO MORTERO 1:3	4,59	2,00			1,00	9,18
BIC BAÑO HOMBRES PRIMER PISO	ALISTADO MORTERO 1:3	2,39	2,07			1,00	4,95
BIC CUARTO BASURAS PRIMER PISO	ALISTADO MORTERO 1:3	2,11	2,25			1,00	4,75
BIC BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	ALISTADO MORTERO 1:3	4,07	2,30			1,00	9,36
BIC BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	ALISTADO MORTERO 1:3	2,96	2,11			1,00	6,25
PATIO 1	ALISTADO MORTERO 1:3	4,90	4,51			1,00	22,10

Cantidad pagadas en los cortes	259,96	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	69,15
		Pasan / vienen	69,15
Cantidad pagada Corte No. 08	41,29	Cantidad Contractual	346,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**259,96**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**69,15**

OBS

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.1	ALISTADO DE PISOS	**HOJA No.**	76	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE YUMBOLON SOBRE LAMINAS DE SUPER BOARD PARA INSTALACION DE PISO EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

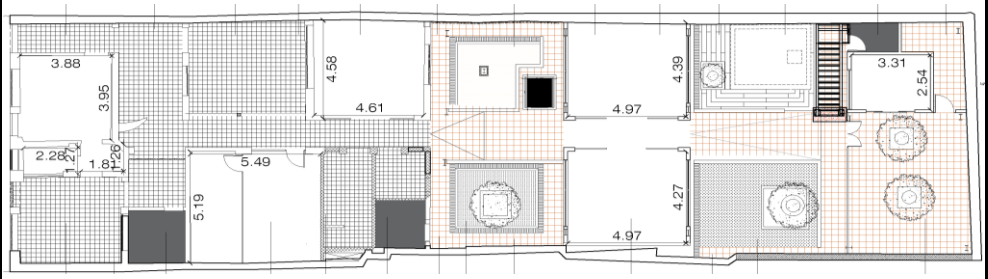

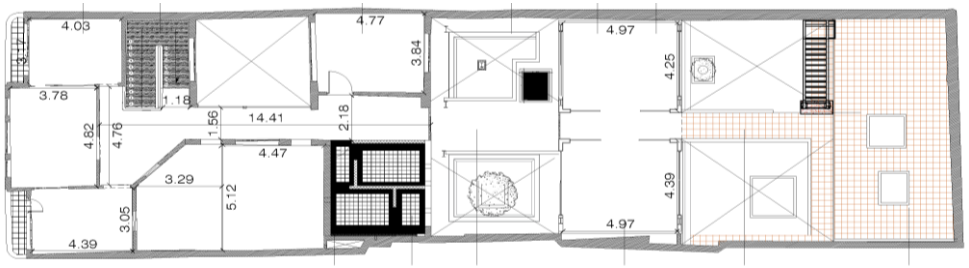

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
OFICINA RADICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,95	3,88			1,00	15,33
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	2,28	1,27			1,00	2,90
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	1,81	1,26			1,00	2,28
OFICINA SISTEMAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,49	5,19			1,00	28,49
ARCHIVO JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,58	4,61			1,00	21,11
ASESORES JURIDICOS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	4,97			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,27			1,00	21,22
SALA MATERNA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,31	2,54			1,00	8,41
SEGUNDA PLANTA							
SUB P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,03	3,17			1,00	12,78
EQUIPO P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,82	3,78			1,00	18,22
ASESOR JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	3,05			1,00	13,39
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	3,29			1,00	16,87
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	4,47			1,00	22,89
SALA DE JUNTAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,77	3,84			1,00	18,32
OFICINA PLANEACION	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,39			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,25			1,00	21,12
HALL	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	14,41	2,26			1,00	32,51

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	299,46
		Pasan / vienen	
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	298,71
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**299,46**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8	PISOS Y CIELO RASO	**HOJA No.**	70 **de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE ARCILLA e:4cm	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

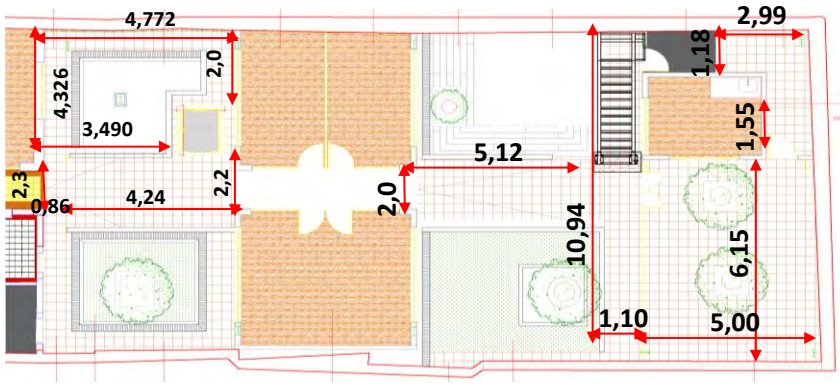

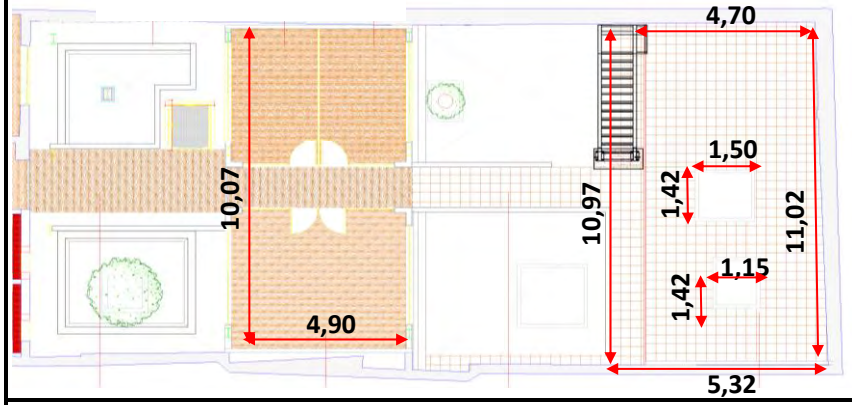

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	PISO FATO (DESCONTANDO VACIOS DE ARBOLES)	10,97	4,70			1,00	51,56
VOLUMEN 2 TERCER PLANTA	PISO FATO	10,07	4,90			1,00	49,34
VOLUMEN 3 DEPOSITO	PISO FATO	2,99	1,18			1,00	3,53
VOLUMEN 3 DEPOSITO	PISO FATO	2,92	1,55			1,00	4,52
VOLUMEN 3 AREA HALL	PISO FATO	10,94	1,10			1,00	12,03
VOLUMEN 3 AREA COCINA	PISO FATO (DESCONTANDO VACIOS DE ARBOLES)	6,15	5,00			1,00	30,75
PATIO 1	CONTRA PISO PATIO	4,66	3,84			1,00	17,89
ACCESO PATIO 2	CONTRA PISO	0,86	2,37			1,00	2,04
TOTAL MEMORIA							171,66
CANTIDADES PAGADAS CORTES ANTERIORES							153,00
TOTAL							18,66

Cantidad pagadas en los cortes	153,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	18,66
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	153,00	Cantidad Contractual	153,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**153,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**18,66**

OBSERVACIONES: SE PAGAN EN CORTES ANTERIORES 153.00 M2 DE 171,66 M2 / COBRANDO 18,66 M2 RESTANTES DE LA TOTALIDAD.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	71 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.2	PISO EN MADERA NATURAL TABLILLA DE 8CM X 18MM DE ZAPAN O SILIMAR. CON ACABADO EN LACA BONNA O SIMILAR	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

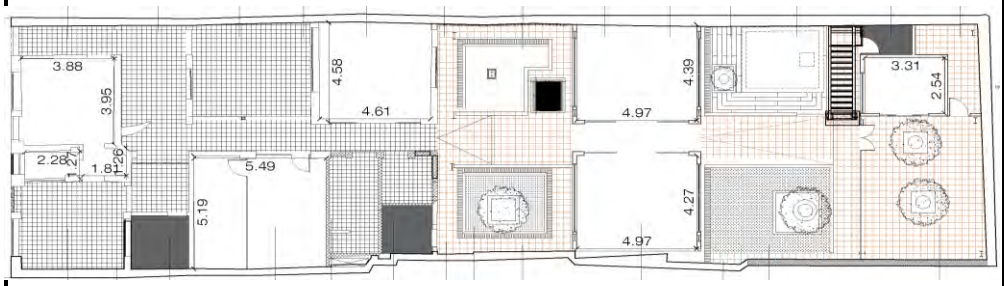

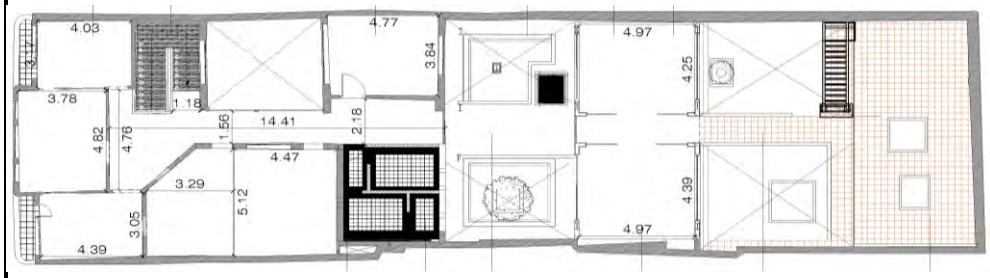

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
OFICINA RADICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,95	3,88			1,00	15,33
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	2,28	1,27			1,00	2,90
ARCHIVO PUBLICACIONES	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	1,81	1,26			1,00	2,28
OFICINA SISTEMAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,49	5,19			1,00	28,49
ARCHIVO JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,58	4,61			1,00	21,11
ASESORES JURIDICOS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	4,97			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,27			1,00	21,22
SALA MATERNA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	3,31	2,54			1,00	8,41
		SEGUNDA PLANTA					
SUB P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,03	3,17			1,00	12,78
EQUIPO P URBANO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,82	3,78			1,00	18,22
ASESOR JURIDICO	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,39	3,05			1,00	13,39
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	3,29			1,00	16,87
AREA JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	5,12	4,47			1,00	22,89
SALA DE JUNTAS	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,77	3,84			1,00	18,32
OFICINA PLANEACION	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,39			1,00	21,82
JEFE JURIDICA	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	4,97	4,25			1,00	21,12
HALL	PROTECCION PISO CON CARTON Y PLASTICO	14,41	2,26			1,00	32,51

Cantidad pagadas en los cortes	175,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	299,46
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	298,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**175,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**124,46**

OBSERVACIONES: TOTAL MEMORIA 299,46 M2 DE LOS CUALES SE COBRARON 175,00 M2

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	72 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO BALDOSA ARTESANAL EN CEMENTO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

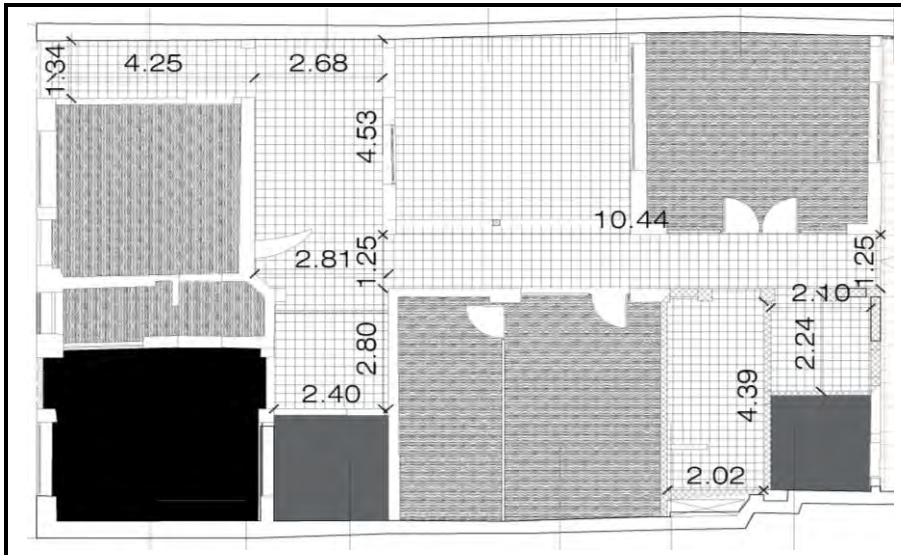

BAÑOS SEGUNDA PLANTA





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PASILLO ACCESO	BALDOSIN 20X20	4,25	1,34			1,00	5,70
PASILLO ESCALERAS	BALDOSIN 20X21	4,53	2,68			1,00	12,14
ACCESO ESCALERAS	BALDOSIN 20X22	1,25	2,81			1,00	3,51
ZONA TORNIQUETES	BALDOSIN 20X23	2,80	2,40			1,00	6,72
HALL CIRCULACION	BALDOSIN 20X24	10,44	1,25			1,00	13,05
BAÑO MUJERES	BALDOSIN 20X25	4,39	2,02			1,00	8,87
BAÑO HOMBRES	BALDOSIN 20X26	2,24	2,10			1,00	4,70
PATIO 1	BALDOSIN 20X27	4,90	4,63			1,00	22,69
RECEPCION	BALDOSIN 20X28	4,92	4,43			1,00	21,80
HALL BAÑOS PISO 2	BALDOSIN 20X29	2,36	1,00			1,00	2,36
BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X30	2,95	2,06			1,00	6,08
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X31	2,70	2,15			1,00	5,81
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO	BALDOSIN 20X32	2,17	1,25			1,00	2,71

Cantidad pagadas en los cortes	105,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	116,13
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	182,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**105,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**11,13**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	73 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.2.4	PISO DECK PARA TERRAZA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

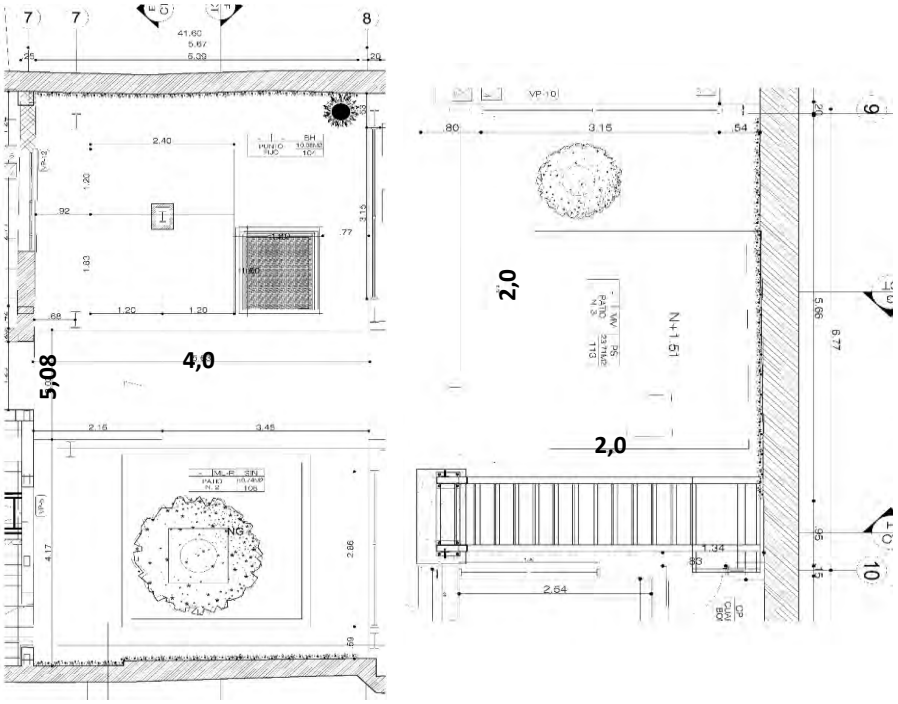

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
PUENTE METALICO VOLUMEN 1 - 2	PISO EN DECK PARA EXTERIOR	5,63	1,65			1,00	9,29
AREA SOBRE TANQUE	PISO EN DECK PARA EXTERIOR	2,00	2,00			1,00	4,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	13,29
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	34,98
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**13,29**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	74 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 8.2.6	JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE COLA RATON Y SIKAPAVEMENT	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

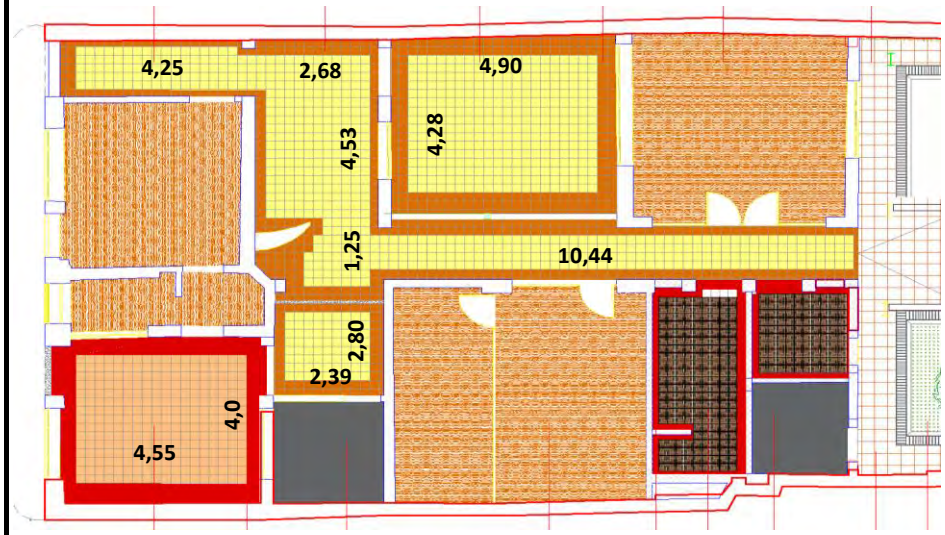

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	CARAS	%	CANT	SUB TOTAL
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE CADA 1.20M SOBRE BALDOSA CEMENTO	4,25				1,00	4,25
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	2,68				1,00	2,68
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	4,53				2,00	9,06
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	1,25				10,00	12,50
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	4,28				4,00	17,12
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	4,90				4,00	19,60
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	10,44				1,00	10,44
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	2,80				2,00	5,60
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	2,39				2,00	4,78
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	4,55				4,00	18,20
BIC PRIMER PLANTA	JUNTA FLEXIBLE C/1.20M	4,00				4,00	16,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	120,23
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	120,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**120,23**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

145 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	75	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA PISO, INCLUYE RESANE DE SUPERFICIE	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

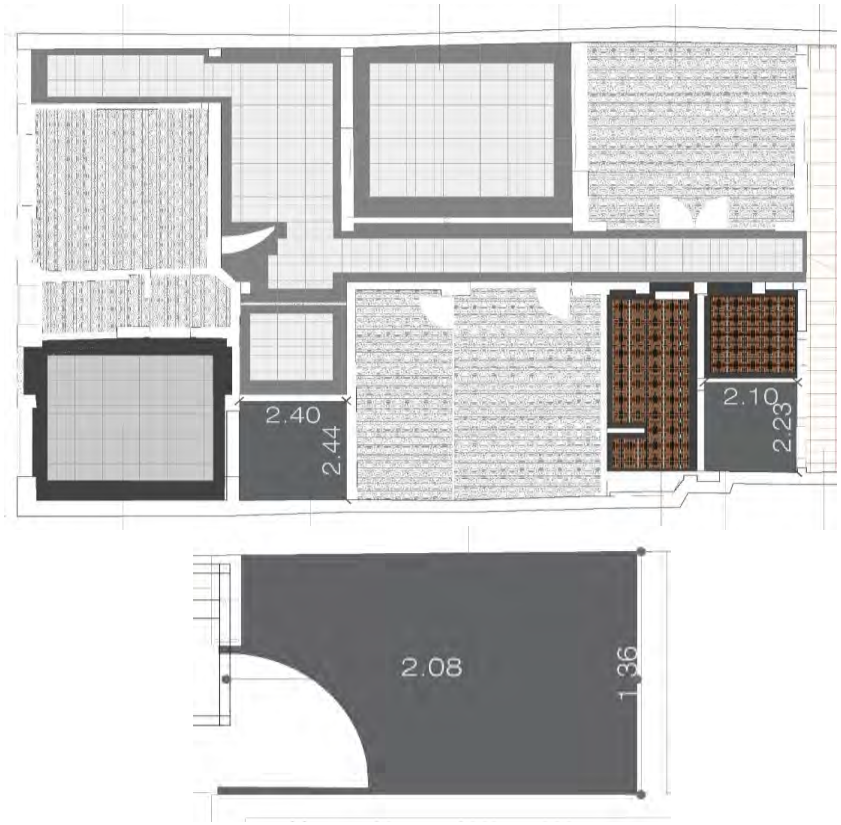

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
CUARTO ELECTRICO	PISO EPOXICO	2,40	2,44			1,00	5,86
CUARTO BASURAS	PISO EPOXICO	2,10	2,23			1,00	4,68
CUARTO BOMBAS	PISO EPOXICO	2,08	1,36			1,00	2,83

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	13,37
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	15,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**13,37**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**		76	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	NP 8.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASOS EN MADERA ZAPAN L=1.20M A:30CMS PARA ESCALERAS INMUNIZADO SELLADO Y LACADO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

Escalera vol 3
(1 : 75)

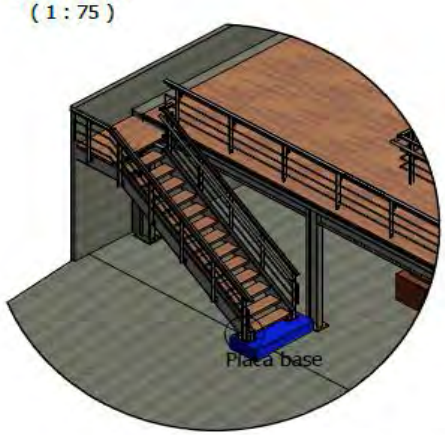

ESCALERA PATIO DOS

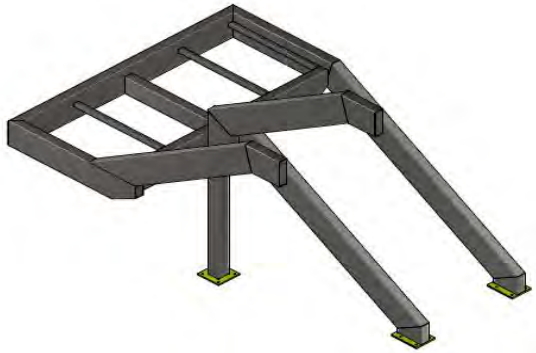

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3	PASOS PARA ESCALERA	1,20	0,30			13,00	13,00
PATIO 2	PASOS PARA ESCALERA	1,20	0,30			15,00	15,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	28,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	28,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**28,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	77	**de**	81
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCANSO EN MADERA ZAPAN L_2,25 X 1,20 X 5CMS PARA ESCALERAS-INMUNIZADO SELLADO Y LACADO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

Escalera vol 3
(1 : 75)

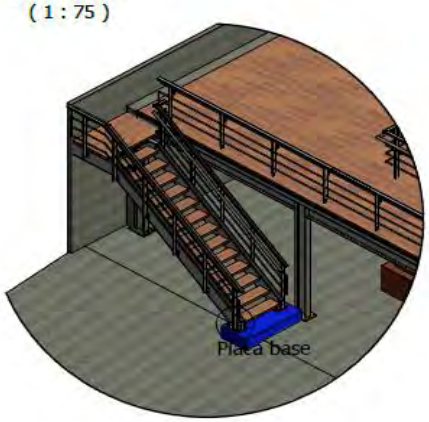

ESCALERA PATIO DOS

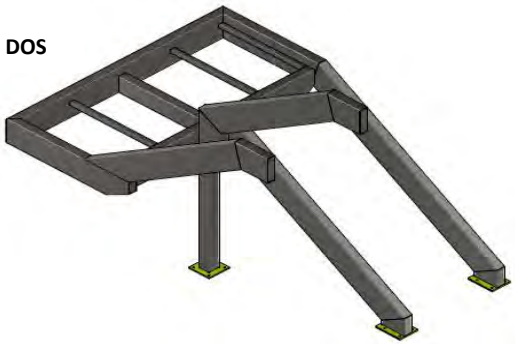

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3	DESCANSO ESCALERA	1,20	2,25	0,50		1,00	1,00
PATO 2	DESCANSO ESCALERA	1,20	2,25	0,50		1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**		78	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	NP 8.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS TABLON DE ARCILLA E:4CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

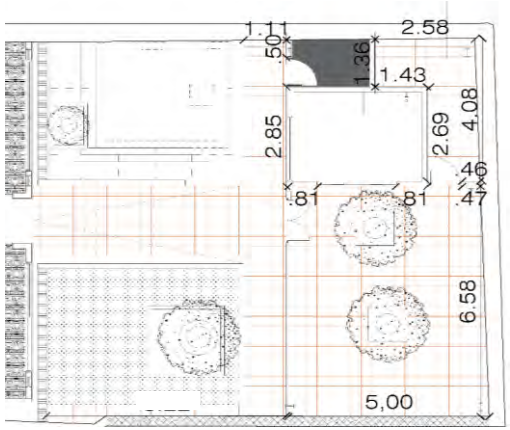

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,36				1,00	1,36
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,58				1,00	2,58
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	4,08				1,00	4,08
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,46				1,00	0,46
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,47				1,00	0,47
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	6,58				1,00	6,58
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	5,00				1,00	5,00
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,81				2,00	0,81
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,69				1,00	2,69
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,43				1,00	1,43
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	2,85				1,00	2,85
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	0,50				1,00	0,50
VOLUMEN 3 PLANTA 1	GUARDAESCOBAS FATO	1,11				1,00	1,11

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	29,92
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	78,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**29,92**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	79	**de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 8.2.11	INSTALACION DE LAJAS EN PIEDRA ENCONTRADAS EN LAS EXCAVACIONES DEL PASILLO PRIMER PISO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

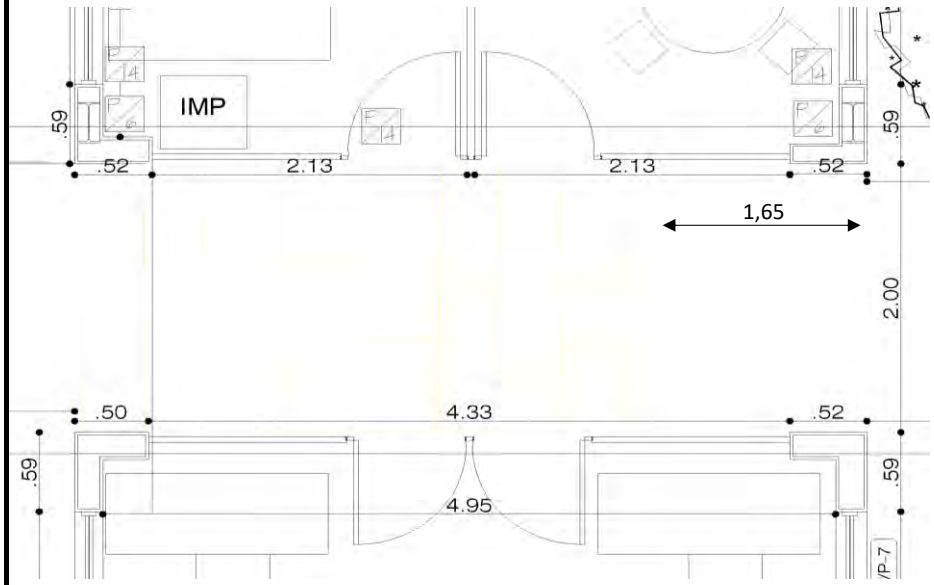

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS PRIMER PLANTA	INSTALACION PIEDRA	1,65	2,00			1,00	3,30

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,30
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,30**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

150 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.2	ACABADOS DE PISOS	**HOJA No.**	80 **de**	81
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	NP 8.2.12	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO DE PISO EN PIEDRA PASILLO PRIMER PISO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

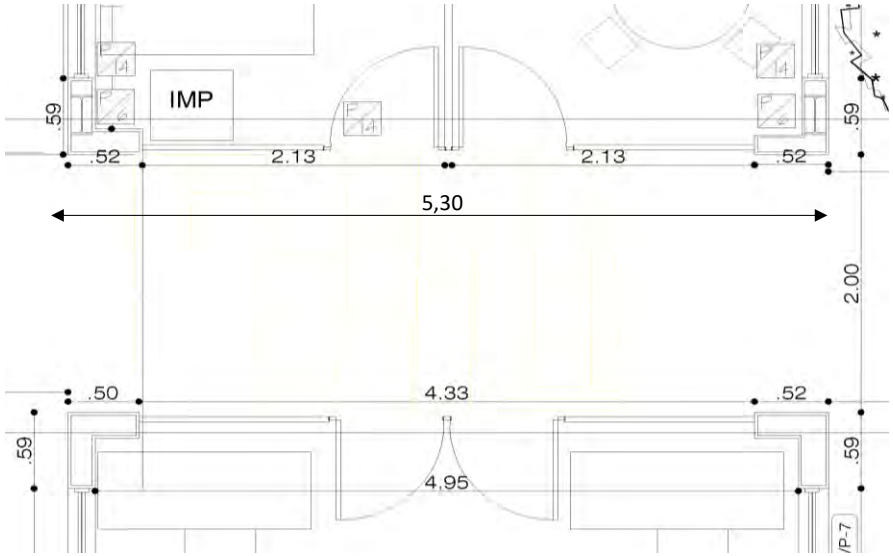

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS HALL	EMBOQUILLADO, LAVADO Y CONSOLIDADO PIEDRA	5,30	2,00			1,00	10,60

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,60
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	15,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,60**


OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


151 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	8.3	GUARDA ESCOBAS	**HOJA No.**	81	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	8.3.1	GUARDAESCOBA BALDOSA HIDRÁULICA DE 10 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

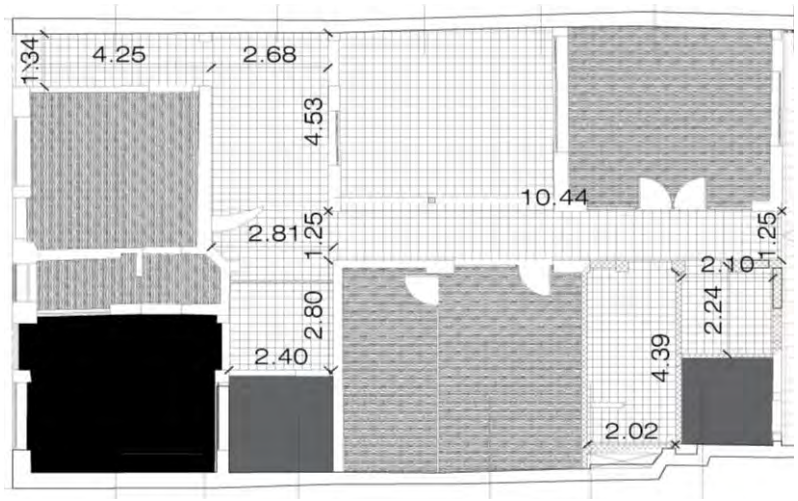

BAÑOS SEGUNDA PLANTA





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL ACCESO	3,04				1,00	3,04
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL ACCESO	13,23				1,00	13,23
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	BAJO ESCALERAS	4,11				1,00	4,11
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	TORNIQUETES	7,82				1,00	7,82
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	INICIO ESCALERA	1,43				1,00	1,43
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL PATIO 1	5,03				1,00	5,03
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL BAÑOS	1,96				1,00	1,96
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL BAÑOS	0,3				1,00	0,30
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL SALIDA	1,22				1,00	1,22
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL SALIDA	1,95				1,00	1,95
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	HALL BAÑOS	1,95				1,00	1,95
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	BAÑOS 1 PISO	14,05				1,00	14,05
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	BAÑOS 1 PISO	7,86				1,00	7,86
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	BAÑOS 2 PISO	29,96				1,00	29,96
VOLUMEN UNO PRIMER PLANTA	RECEPCION	15,97				1,00	15,97

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	109,88
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	115,37
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**109,88**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	8.3	GUARDA ESCOBAS	**HOJA No.**	82 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	8.3.3	GUARDAESCOBA TABLILLA DE MADERA (E= 0,12m)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

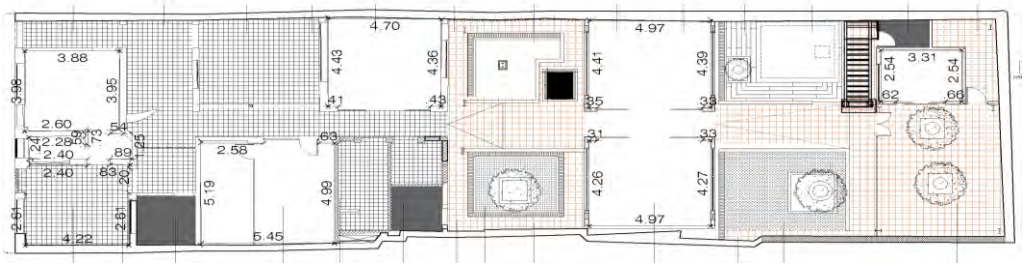



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
OFICINA RADICACIONES		14,95				1,00	14,95
ARCHIVO PUBLICACIONES		9,92				1,00	9,92
RECEPCION		12,87				1,00	12,87
OFICINA SISTEMAS / RACK		18,84				1,00	18,84
ARCHIVO JURIDICO		14,33				1,00	14,33
ASESORES JURIDICOS		14,14				1,00	14,14
ASESORES JURIDICOS		14,12				1,00	14,12
LACTANCIA		9,67				1,00	9,67
SEGUNDA PLANTA							
SUB P URBANO		10,46				1,00	10,46
EQUIPO P URBANO		11,53				1,00	11,53
ASESOR JURIDICO		10,98				1,00	10,98
AREA JURIDICA		14,76				1,00	14,76
AREA JURIDICA		18,01				1,00	18,01
HALL CIRCULACION		19,96				1,00	19,96
SALA JUNTAS		15,80				1,00	15,80
OFICINA PLANEACION		14,26				1,00	14,26
JEFE JURIDICA		14,05				1,00	14,05
HALL		3,40				1,00	3,40

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	242,05
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	237,18
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**242,05**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	**HOJA No.**	83 **de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

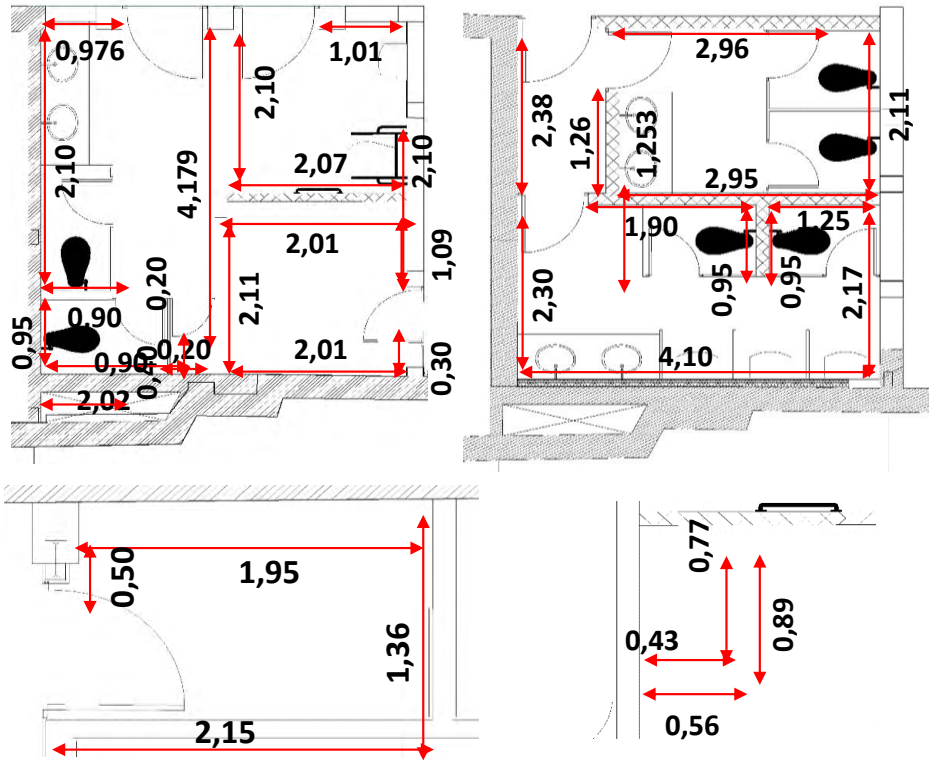

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ALTO	VOLUMEN	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA BIC							
BAÑO MUJERES	ENCHAPE BAÑO	12,800	2,00			1,00	25,60
SEGUNDA PLANTA BIC							
BAÑO HOMBRES	ENCHAPE MUROS	13,50	2,00			1,00	27,00
BAÑO MUJERES	ENCHAPE MUROS	9,273	2,00			1,00	18,55
HALL ACCESO	ENCHAPE MUROS	3,54	2,00			1,00	7,08
PRIMER PLANTA VOLUMEN TRES							
CUARTO BOMBAS	ENCHAPE MUROS	5,960		2,51		1,00	14,96
POCETA CUARTO DE BASURAS PRIMER PLANTA BIC							
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA INTERNA	0,43		0,36		1,00	0,15
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA INTERNA	0,77		0,36		1,00	0,28
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA EXTERIOR	0,56		0,36		1,00	0,20
POCETA ASEO	ENCHAPE CARA EXTERIOR	0,89		0,36		1,00	0,32

Cantidad pagadas en los cortes	116,19	Cantidad de la Ficha No. 1 / 2	94,14
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	34,29	Cantidad Contractual	163,80
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**116,19**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**12,59**

OBSERVACIONES: SE COBRAN EN ACTAS ANTERIORES 116,19 M2 DE 128.78 M2 EN TOTAL. COBRANDO EN PRESENTE ACTA 12,59 M2 RESTANTES DE LA CANTIDAD TOTAL.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

154 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	9	PARED Y ENCHAPES	**HOJA No.**		84	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	9.1.1	ENCHAPE CERAMICA BLANCA INSTITUCIONAL PARED 40 X 25 BAÑOS Y COCINA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	10	CENEFAS Y PIRLANES	**HOJA No.**	85 **de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	10.1.1	CENEFA PISO GRAVILLA MONA Nº 1 Y 2	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

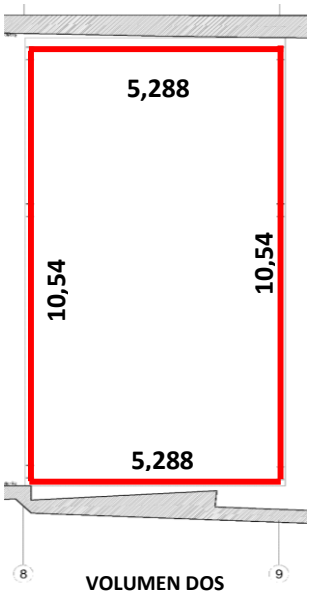

VOLUMEN DOS
TERCERA PLANTA

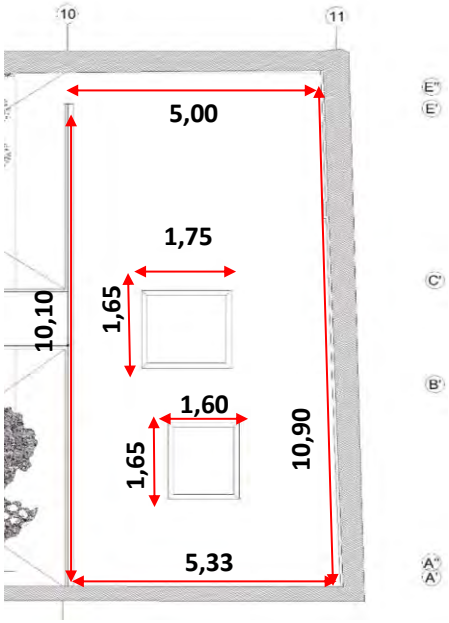

VOLUMEN TRES
PLANTA CUBIERTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,75				2,00	3,50
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,65				2,00	3,30
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,60				2,00	3,20
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO ARBOLES	1,65				2,00	3,30
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	BORDILLO FRONTAL	10,10				1,00	10,10
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL	5,00				1,00	5,00
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL	10,90				1,00	10,90
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MURO PERIMETRAL	5,33				1,00	5,33
VOLUMEN DOS CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	10,54				2,00	21,08
VOLUMEN DOS CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	5,29				2,00	10,58

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	76,29
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	45,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**76,29**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

156 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	10.2	PIRLANES EN MADERA	**HOJA No.**	86	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	10.2.1	PIRLAN EN MADERA ZAPAN PARA ACCESO A OFICINAS DE 15.20 Y 30CM	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
OFICINA RADICACION	PIRLAN MADERA ACCESO	0,89				1,00	0,89
ARCHIVO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,69				1,00	0,69
ARCHIVO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,92				1,00	0,92
CUARTO RACK	PIRLAN MADERA ACCESO	0,85				1,00	0,85
OFICINA SISTEMAS	PIRLAN MADERA ACCESO	0,86				1,00	0,86
ARCHIVO JURIDICO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,65				1,00	1,65
JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	1,65				1,00	1,65
ASESORES JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	1,65				1,00	1,65
LACTANCIA	PIRLAN MADERA ACCESO	2,03				1,00	2,03
SEGUNDA PLANTA							
SUB P URBANO	PIRLAN MADERA ACCESO	0,83				1,00	0,83
SUB P URBANO	PIRLAN MADERA ACCESO	2,41				1,00	2,41
EQUIPO P URBANO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,16				1,00	1,16
ASESOR JURIDICO	PIRLAN MADERA ACCESO	1,19				1,00	1,19
AREA JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	0,88				1,00	0,88
AREA JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	0,87				1,00	0,87
SALA JUNTAS	PIRLAN MADERA ACCESO	1,13				1,00	1,13
PLANEACION	PIRLAN MADERA ACCESO	1,65				1,00	1,65
JURIDICA	PIRLAN MADERA ACCESO	1,65				1,00	1,65

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	22,96
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	20,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,96**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	11.8	CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	87 **de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80 X 0.80	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

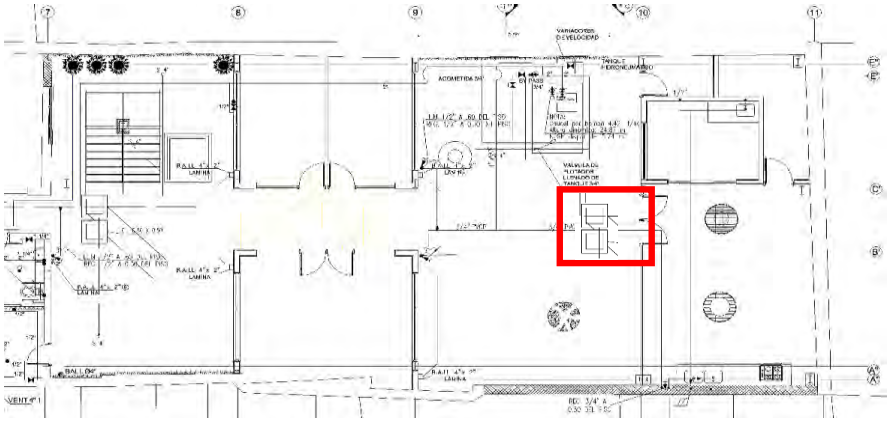

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 3	CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80	0,60		1,00	1,00
PATIO 3	CAJA DE INSPECCION	0,80	0,80	0,60		1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	2,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**2,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	11.8	CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA	**HOJA No.**	88	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	11.8.1	CAJAS DE INSPECCION 0,80 X 0.80	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	11.14	BOMBAS	**HOJA No.**	89	**de**	119	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	11.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE INCLUYE 2 BOMBAS LAPICERO SUMERGIBLES, TANQUE HIDRONEUMATICO DE 100 LTS, VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PRESION, VARIADORES DE VELOCIDAD	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20			

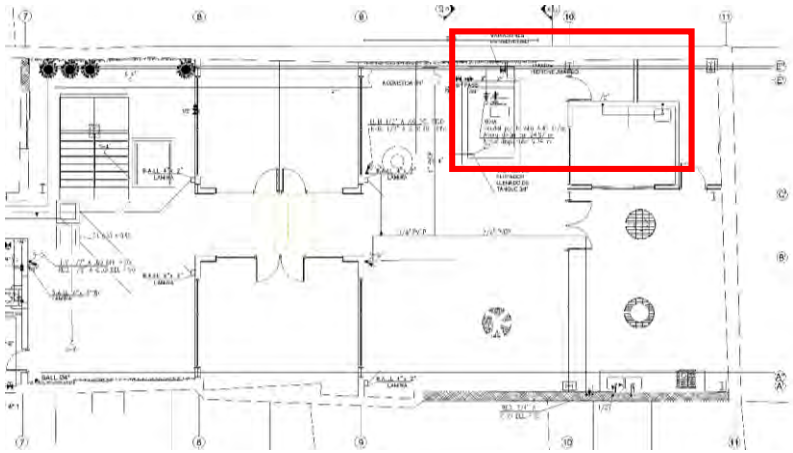

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN 3	ACCESORIOS UNIONES					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	8,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	8,00	Cantidad Contractual	24,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**8,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12	MONTAJE DE APARATOS Y MESONES Y DIVISIONES	**HOJA No.**	90 **de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER (Inlcuye griferia, conexión y acoples)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

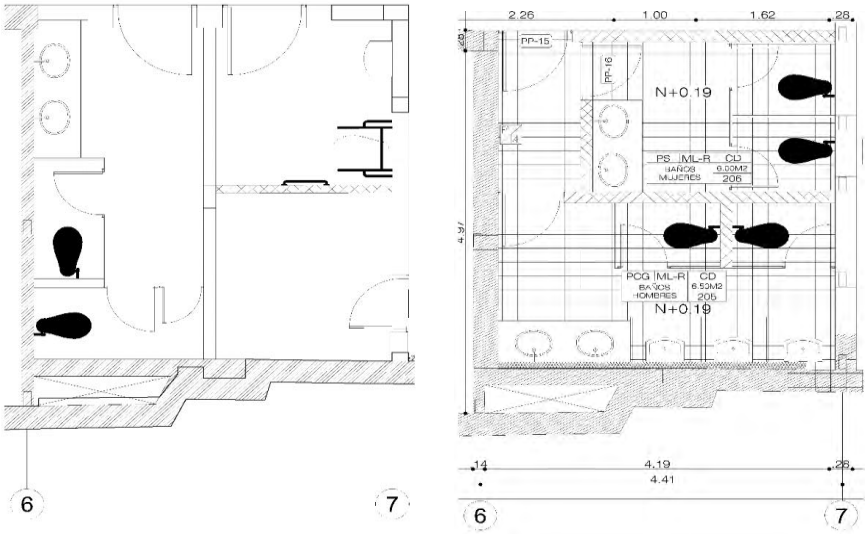

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MUJERES	LAVAMANOS DE SOBREPONER					2,00	2,00
		SEGUNDA PLANTA					
BAÑO HOMBRES	LAVAMANOS DE SOBREPONER					2,00	2,00
BAÑO MUJERES	LAVAMANOS DE SOBREPONER					2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	9,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

161 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.1	APARATOD	**HOJA No.**		91	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS CON GRIFERIA BAJO PONER (Tramontina o similar)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

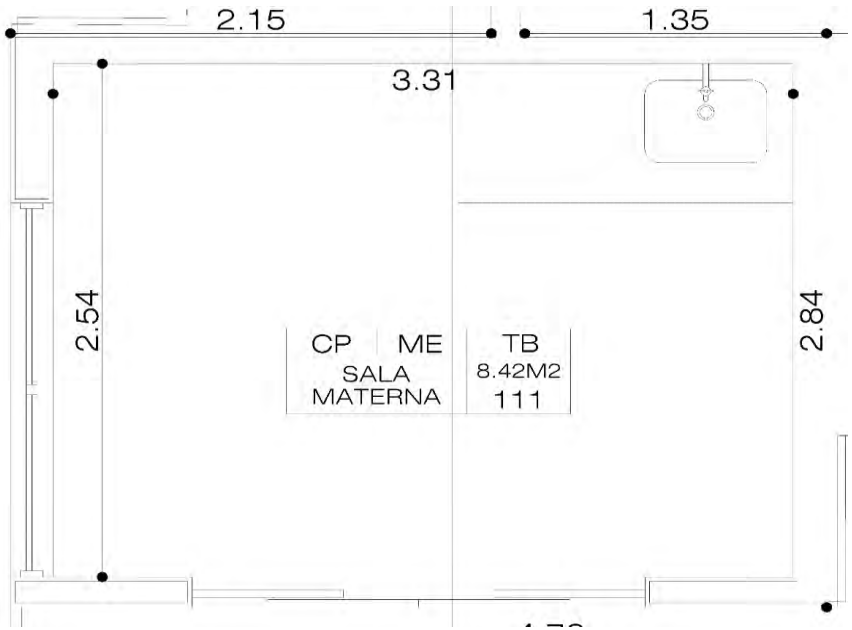

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
CUARTO LACTANCIA	LAVAPLATOS CON GRIFERIA SOBRE MESON					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.1	APARATOS	**HOJA No.**	92	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ELECTRICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

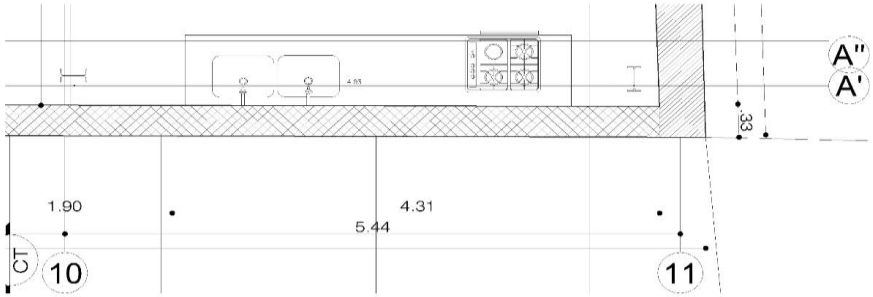

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
COCINA VOLUMEN TRES	ESTUFA ELECTRICA SOBRE MESON					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.1	APARATOD	**HOJA No.**		93	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.1.9	KIT DE DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABON LIQUIDO, TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOX. SATINADO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

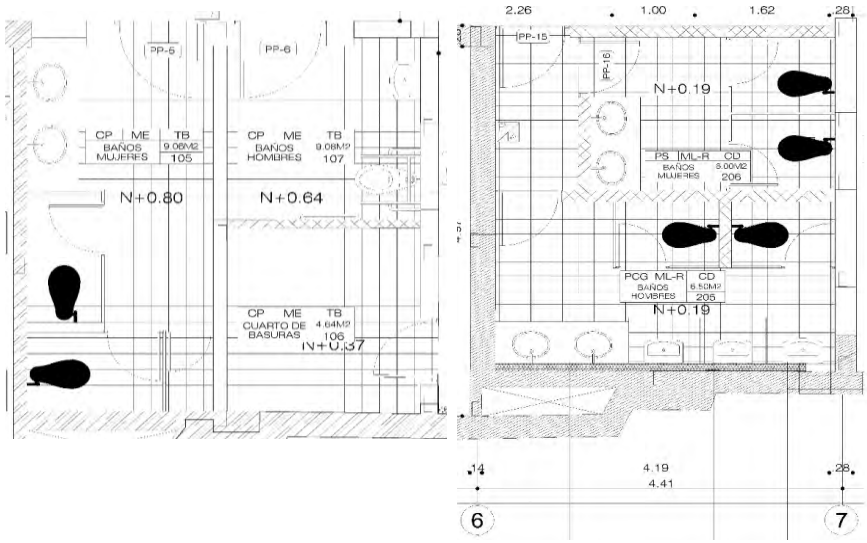

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
			PRIMER PLANTA				
BAÑO MUJERES	KIT JABON, TOALLAS Y PAPELERA					1,00	1,00
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	KIT JABON, TOALLAS Y PAPELERA					1,00	1,00
			SEGUNDA PLANTA				
BALO HOMBRES	KIT JABON, TOALLAS Y PAPELERA					1,00	1,00
BAÑO MUJERES	KIT JABON, TOALLAS Y PAPELERA					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	5,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**4,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.1	APARATOD	**HOJA No.**	94	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA RECTANGULAR DE PEDAL EN ACERO 12LT	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

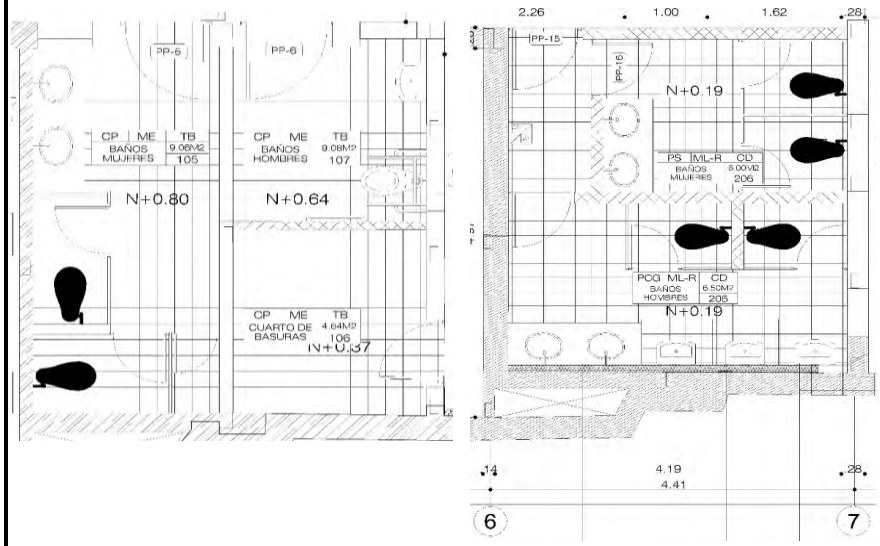

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
	PRIMER PLANTA						
BAÑOS MUJERES	CANECA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE					3,00	3,00
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	CANECA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE					1,00	1,00
	SEGUNDA PLANTA						
BAÑO HOMBRES	CANECA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE					3,00	3,00
BAÑO MUJERES	CANECA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	10,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.1	APARATOD	**HOJA No.**	95 **de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.11	ESPEJO PARA BAÑO 5mm DE SOBREPONER (Dilatado del muro)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

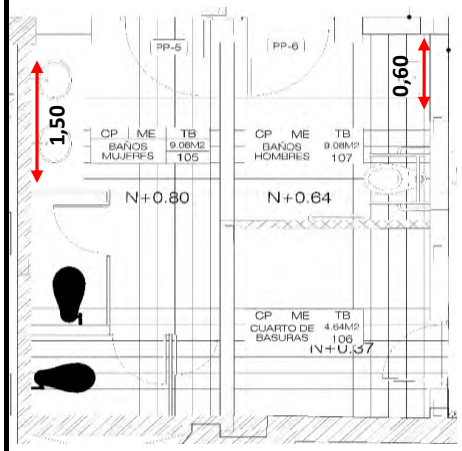

BAÑOS PRIMER PLANTA

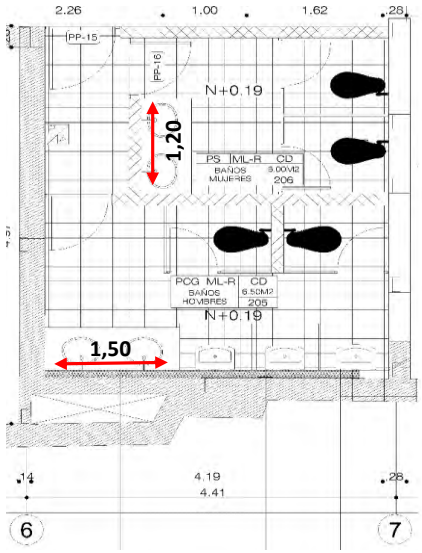

BAÑOS SEGUNDA PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MUJERES	ESPEJO SOBRE PONER	1,50		0,90		1,00	1,35
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	ESPEJO SOBRE PONER	0,60		0,90		1,00	0,54
		SEGUNDA PLANTA					
BAÑO HOMBRES	ESPEJO SOBRE PONER	1,500		0,90		1,00	1,35
BAÑO MUJERES	ESPEJO SOBRE PONER	1,200		0,90		1,00	1,08

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,32
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	8,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**4,32**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.1	APARATOD	**HOJA No.**	96 **de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.1.12	EXTINTORES ABC	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

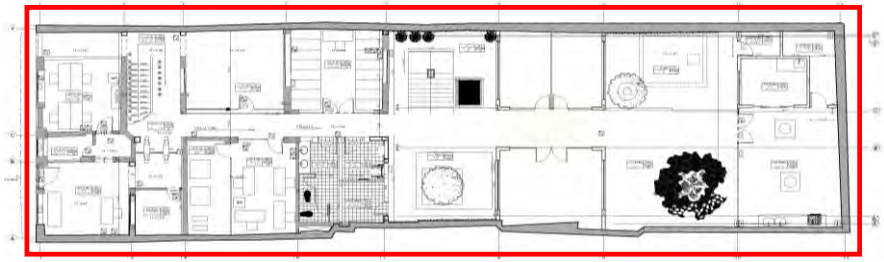

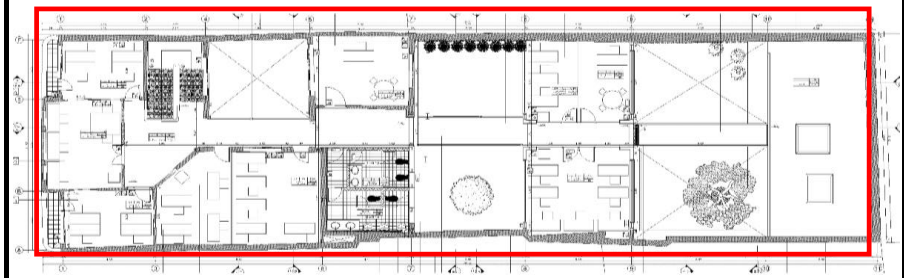

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PROYECTO CASA TITO	EXTINTORES ABC					6,00	6,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.2	MESONES	**HOJA No.**	97	**de**	79
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON CON PLACA MACIZA DE GRANITO MARMOL DE COLOR NEGRO SAN GABRIEL E_20MM A MESON =.60CM, CON FALDON Y SALPICADERO EPOXICO DE ADHESION	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

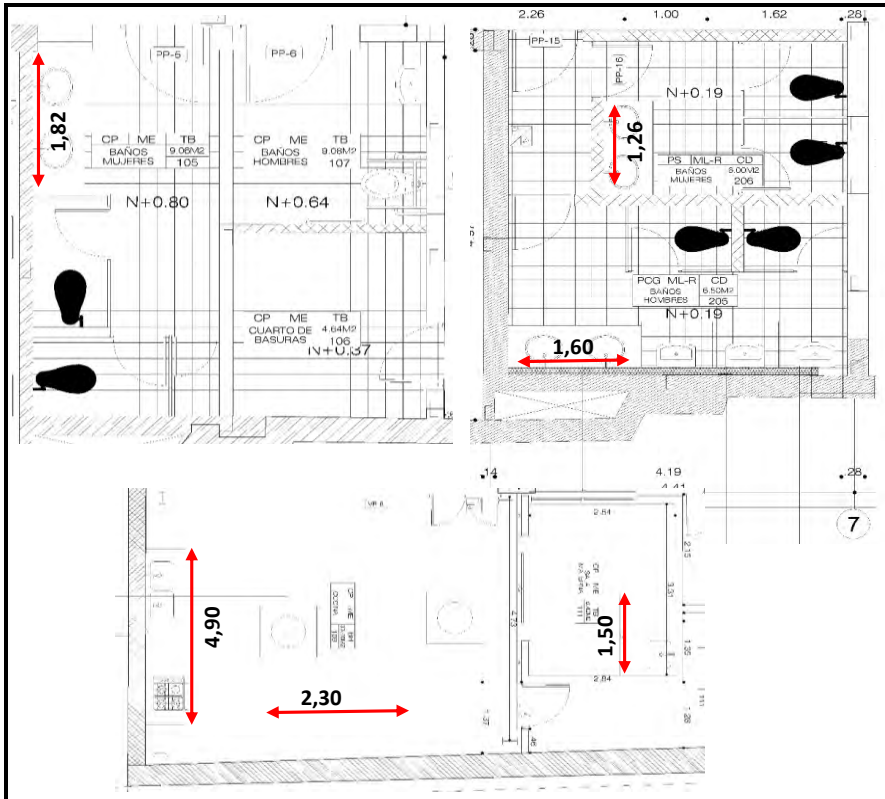

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
BAÑO MUJERES	MESON GRANITO	1,82				1,00	1,82
COCINETA	MESON GRANITO	4,9				1,00	4,90
HORNOS	MESON GRANITO	2,30				1,00	2,30
LACTANCIA	MESON GRANITO	1,50				1,00	1,50
SEGUNDA PLANTA							
BAÑO MUJERES	MESON GRANITO	1,260				1,00	1,26
BAÑO HOMBRES	MESON GRANITO	1,600				1,00	1,60

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	13,38
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**13,38**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

168 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**HOJA No.**		98	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.3.1	BARRAS DE SEGURIDAD SOBREPONER (Acero inox. Satinado importado) + BARRA DOBLE SOBREPONER (Acero inox. Satinado importado)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

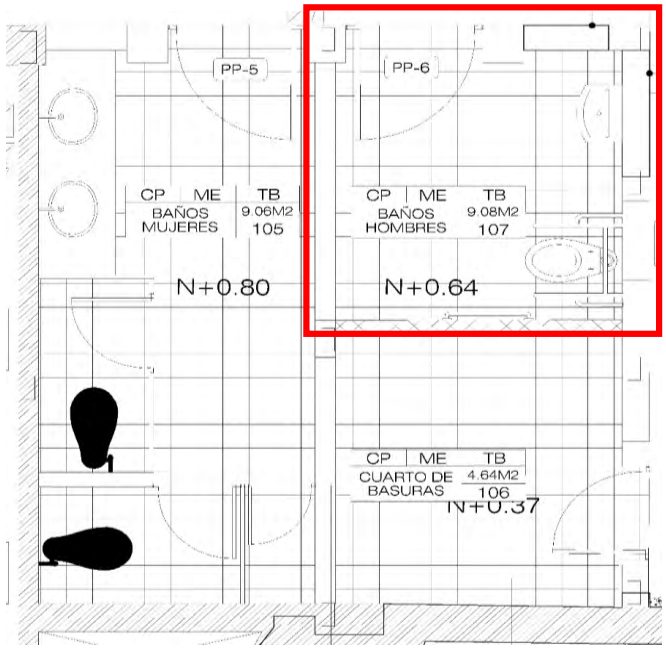

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	BARRAS DE SEGURIDAD + BARRA DOBLE					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.3.2	EXTRACTOR DE OLORES BAÑO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

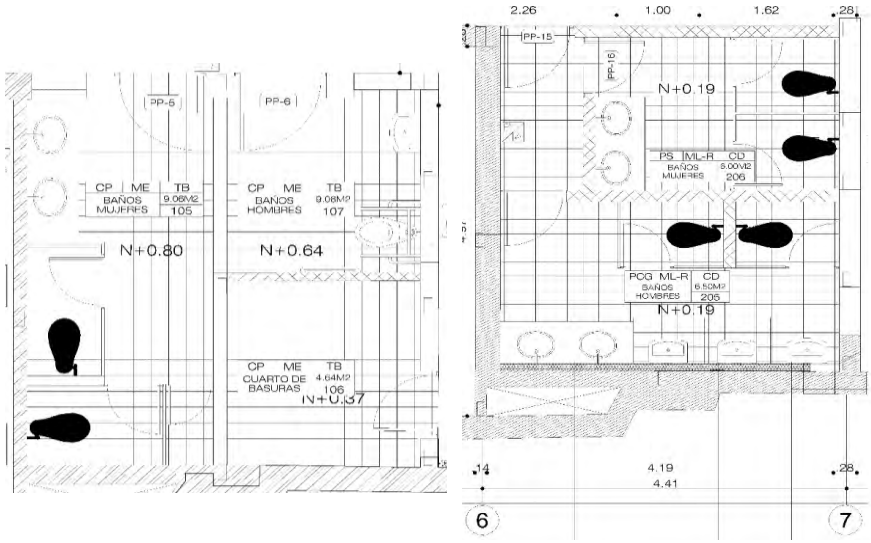

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
			PRIMER PLANTA				
BAÑO MUJERES	EXTRACTOR DE OLORES					1,00	1,00
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	EXTRACTOR DE OLORES					1,00	1,00
			SEGUNDA PLANTA				
BAÑO HOMBRES	EXTRACTOR DE OLORES					1,00	1,00
BAÑO MUJERES	EXTRACTOR DE OLORES					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**4,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

170 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.3.3	TAPA REGISTRO ACERO INOXIDABLE	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

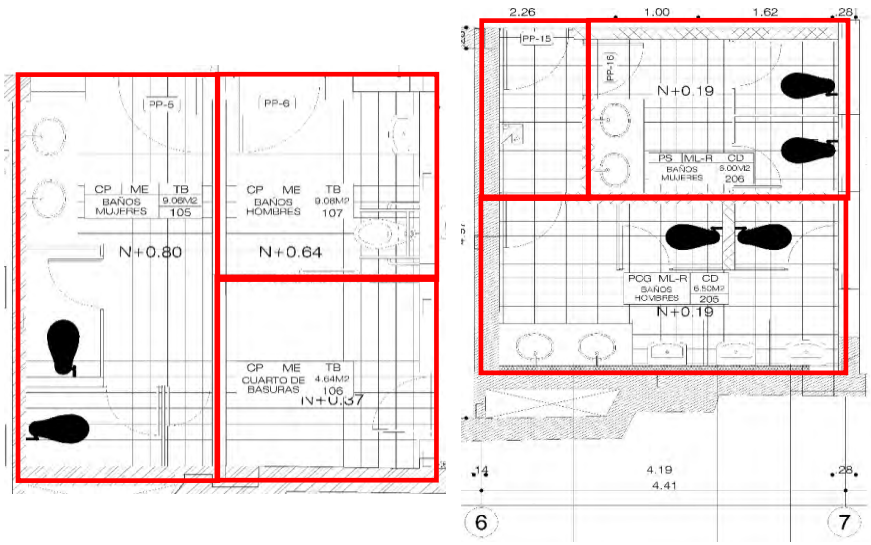

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
			PRIMER PLANTA				
BALO MUJERES	TAPA REGISTRO					1,00	1,00
BAÑO HOMBRES	TAPA REGISTRO					1,00	1,00
SHUT BASURAS	TAPA REGISTRO					1,00	1,00
			SEGUNDA PLANTA				
BAÑO MUJERES	TAPA REGISTRO					1,00	1,00
BAÑO HOMBRES	TAPA REGISTRO					1,00	1,00
HALL ACCESO	TAPA REGISTRO					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

171 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	12.3.4	LLAVE TERMINAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

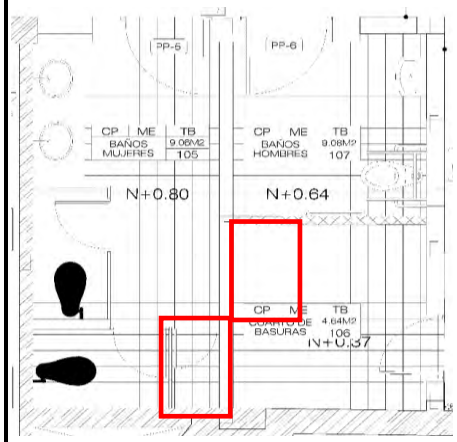

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MUJERES	LLAVE TERMINAL ASEO					1,00	1,00
SHUT BASURAS	LLAVE TERMINAL ASEO					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	12.3	GRIFERIAS Y ACCESORIOS	**HOJA No.**	39 **de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	12.3.5	REJILLA CON SOSCO 3X2" C/I	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

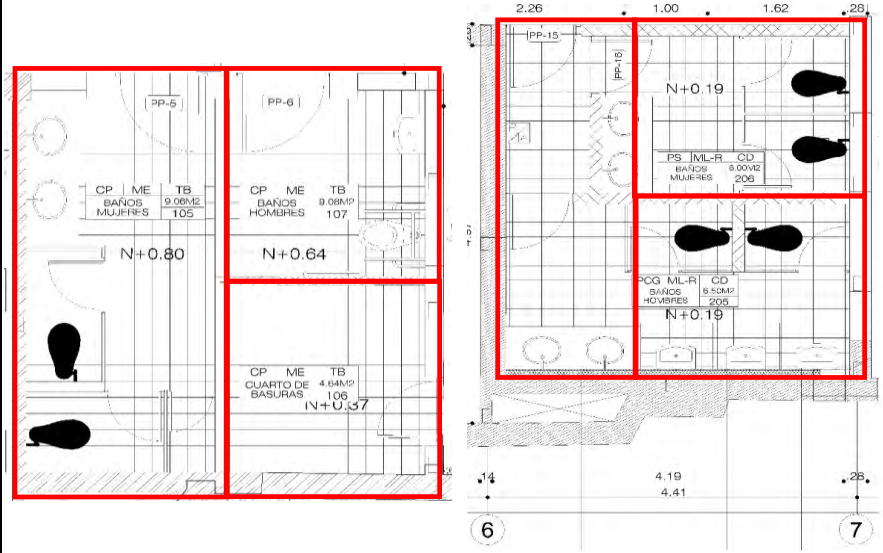

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
			PRIMER PLANTA				
BAÑO MUJERES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					2,00	2,00
SHUT BASURAS	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
MOVILIDAD REDUCIDA	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
			SEGUNDA PLANTA				
BAÑO HOMBRES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00
BAÑO MUJERES	REJILLA CON SOSCO 3X2"					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	12.4	DIVISIONES DE BAÑOS	**HOJA No.**	39	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	12.4.1	DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOX (Según diseño)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

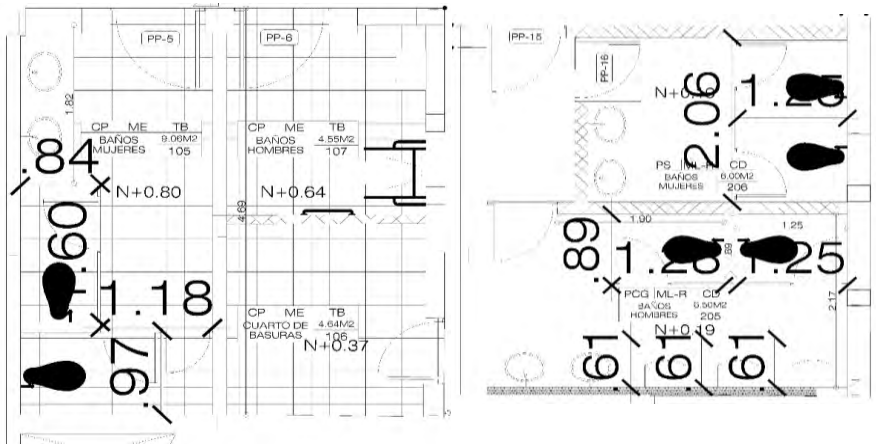

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
BAÑO MUJERES	DIVISION BAÑO ACERO INOX	4,590		1,80		1,00	8,26
		SEGUNDA PLANTA					
BAÑO HOMBRES	DIVISION ORINAL ACERO INOX	3,420		1,80		1,00	6,16
BAÑO HOMBRES	DIVISION BAÑO ACERO INOX	0,610		1,00		3,00	1,83
BAÑO MUJERES	DIVISION BAÑO ACERO INOX	3,310		1,80		1,00	5,96

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	22,21
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	25,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**22,21**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	13.1	COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA	**HOJA No.**	39	**de**	79	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	13.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE COCINA INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO, INCLUYE CAMPANA EXTRACTOA, ZONA DE CAFETERA (con cajoneras de cierre lento, según diseño)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

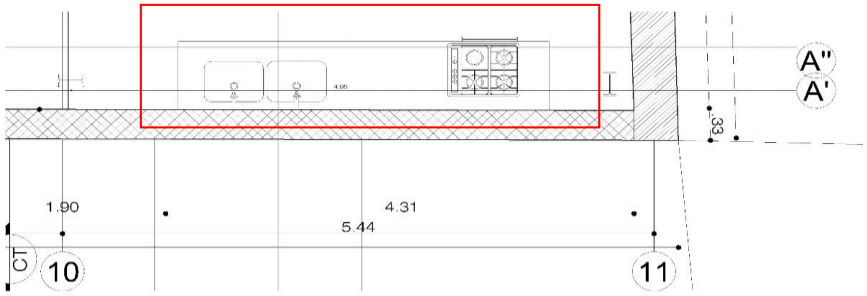

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA VOLUMEN TRES							
COCINETA	MUEBLE CARPINTERIA EN MADERA PARA COCINA				30,0	1,00	0,30

Cantidad pagadas en los cortes	0,70	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	0,30
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,70	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,70**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**0,30**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

175 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	13.1	COCINA INTEGRAL ZONA DE CAFETERIA	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	NP 13.1.2	MUEBLE PARA AREA DE LACTANCIA LONGITUD DE 1.50MTS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

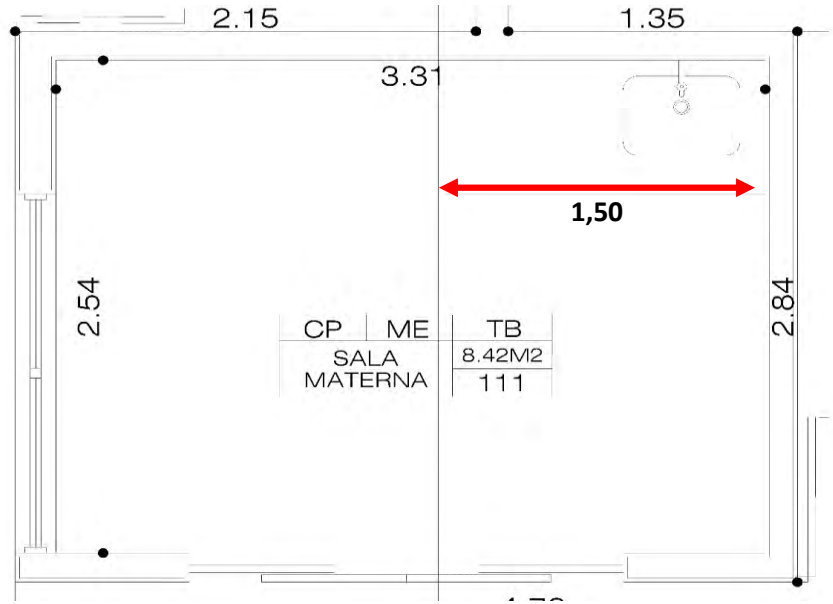

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
SALA LACTANCIA	MUEBLE EN MADERA BAJO MESON	1,500		0,90		1,00	1,50

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,50
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,50
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,50**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	13.2	COCINETA EDIFICIO ANTIGUO	**HOJA No.**	39 **de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	13.2.2	POCETA EN ACERO INOXIDABLE ASEO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

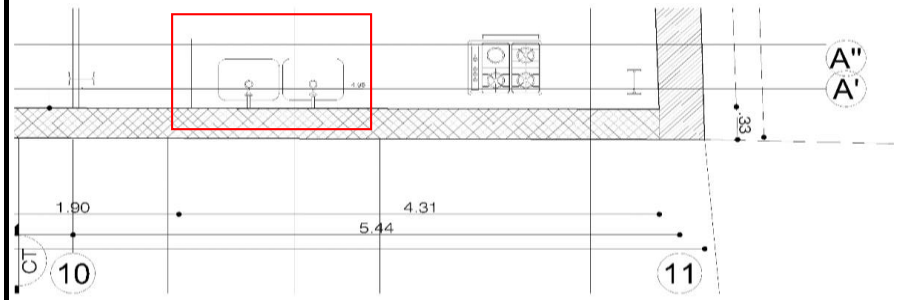

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
COCINETA VOLUMEN TRES	POCETA DE LAVADO DOBLE PARA LAVAPLATOS COCINETA					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	92 **de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

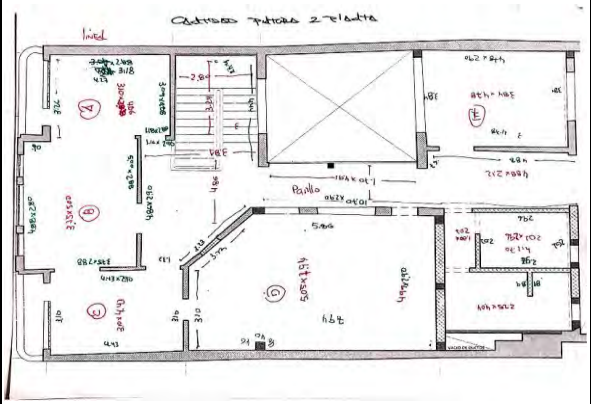

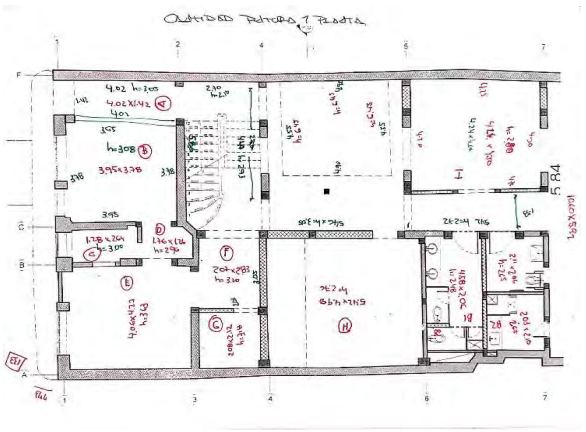

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO A	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	11,80		2,9			34,22
ESPACIO B	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	14,53		2,9			42,137
ESPACIO C	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,06		2,9			43,674
ESPACIO D	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	25,19		2,9			73,051
PASILLO	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,55		2,9			47,995
ESPACIO E	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	17,24		2,9			49,996
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	11,26		1,00			11,26
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,74		1,00			7,74
AREA DE BAÑOS	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	12,61		1,00			12,61
AREA DE HALL	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,58		1,00			10,58
ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,58		1,00			10,58
PRIMER PLANTA VOLUMEN PATRIMONIAL							
ESPACIO A	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	10,24		3,08			31,54
ESPACIO B	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	15,46		3,08			47,62
ESPACIO C	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,8		3,08			24,02
ESPACIO D	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	4,98		3,08			15,34
ESPACIO E	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,66		3,63			60,48
ESPACIO F	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	7,12		3,2			22,78
ESPACIO G	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	8,4		3,2			26,88
ESPACIO ESCALERA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	13,03		2,1			27,36
PASILLO 1	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	16,3		2,72			44,34
ESPACIO H	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	20,84		2,76			57,52
BAÑOS 1	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	14,88		1,0			14,88
BAÑOS 2	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	8,34		1,0			8,34
ESPACIO I	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	17,48		2,8			48,94
VOLUMEN 3 PISO PERIMETRAL	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	55,08		1,0			55,08
CUARTO DE LACTANCIA	PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS SOBRE MUROS	20,71		2,0			41,42
TOTAL PINTURA							870,38
CARPINTERIAS EN MADERA						(-)	116,00
TOTAL PINTURA RESTANDO CARPINTERIA EN MADERA							754,38

Cantidad pagadas en los cortes	700,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	754,38
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	700,00	Cantidad Contractual	700,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**700,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**54,38**

OBSERVACIONES: SE COBRARON EN ACTA #8 700M2 DE 754,38 M2 TOTALES. COBRANDO EN PRESENTE ACTA 54,38 M2 RESTANTES DE LA TOTALIDAD.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

178 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	40	**de**	79	
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	14.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE MURO CON PAÑETE O SUPERBOARD.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	39 **de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

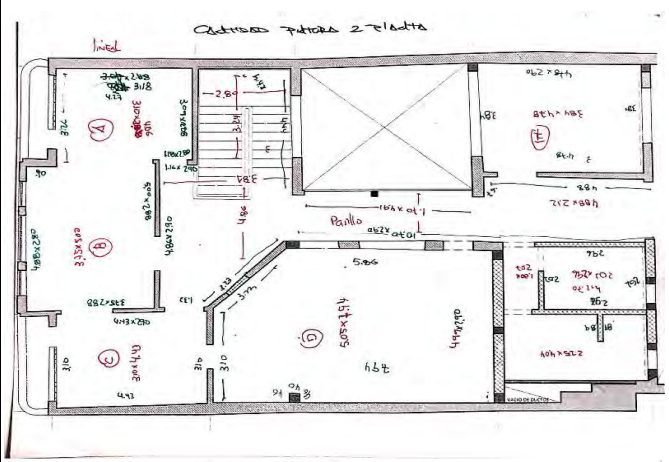

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
SEGUNDA PLANTA							
AREA DE BAÑOS	PINTURA VINILO CIELO RASO	1,8	2,07				3,73
AREA DE BAÑOS	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,25	4,04				9,09
AREA DE HALL	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,86	3,81				18,52
ESCALERA	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,24	2,8				9,07
PRIMER PLANTA							
ESPACIO A	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,02	1,42				5,71
ESPACIO B	PINTURA VINILO CIELO RASO	3,95	3,78				14,93
ESPACIO C	PINTURA VINILO CIELO RASO	1,28	2,64				3,38
ESPACIO D	PINTURA VINILO CIELO RASO	1,76	1,26				2,22
ESPACIO E	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,06	4,27				17,34
ESPACIO F	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,07	2,83				5,86
ESPACIO G	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,08	2,12				4,41
ESPACIO ESCALERA	PINTURA VINILO CIELO RASO	2	2,7				5,40
PASILLO 1	PINTURA VINILO CIELO RASO	10,9	1,8				19,62
ESPACIO H	PINTURA VINILO CIELO RASO	5,42	4,98				26,99
BAÑOS 1	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,58	2,06				9,43
BAÑOS 2	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,11	2,06				4,35
CUARTO DE BASURAS	PINTURA VINILO CIELO RASO	2,03	2,1				4,26
ESPACIO I	PINTURA VINILO CIELO RASO	4,24	4,5				19,08
CIELO RASO VOLUMEN 3	PINTURA VINILO CIELO RASO	62,13	1,0				62,13
CIELO RASO VOLUMEN 2 1 PISO	PINTURA VINILO CIELO RASO	56,3	1,0				56,30
CIELO RASO VOLUMEN 2 2 PISO	PINTURA VINILO CIELO RASO	56,3	1,0				56,30

Cantidad pagadas en los cortes	131,05	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	358,11
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	131,05	Cantidad Contractual	133,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**131,05**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**358,11**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

180 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	40	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	14.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1 A 2 MANOS DE CIELO RASO CON PAÑETE O SUPOERBOARD	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	14.1.3	KORAZA FACHADA TRES MANOS (PRINCIPAL, FACHADAS INTERIORES Y PATIOS)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 1	PINTURA KORAZA	14,020		6,50		1,00	91,13
CULATA LATERAL TERRAZA	PINTURA KORAZA	10,760		2,20		1,00	23,67
CULATA LATERAL TERRAZA	PINTURA KORAZA	10,6		5,99		1,0	63,49
FACHADA POSTERIOR	PINTURA KORAZA	11,810		8,89		1,00	104,99
FACHADA CULATA ORIENTAL	PINTURA KORAZA	5,400		7,00		1,00	37,80
FACHADA ENTRE VOLUMEN 1 Y 2	PINTURA KORAZA	5,700		7,00		1,00	39,9
FACHADA CULATA ORIENTAL	PINTURA KORAZA	5,600		7,00		1,00	39,20
FACHADA CULATA OCCIDENTAL	PINTURA KORAZA	5,600		7,00		1,00	39,20
MUROS FACHADA VOLUMEN 2	PINTURA KORAZA	84,000		1,00		1,00	84,00
TOTAL PINTURA CON CARPINTERIA							523,39
CARPINTERIA MADERA				(-)			14,68
TOTAL PINTURA KORAZA							**508,71**

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	508,71
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	488,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**508,71**


OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra


ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ 182 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	40	**de**	81
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

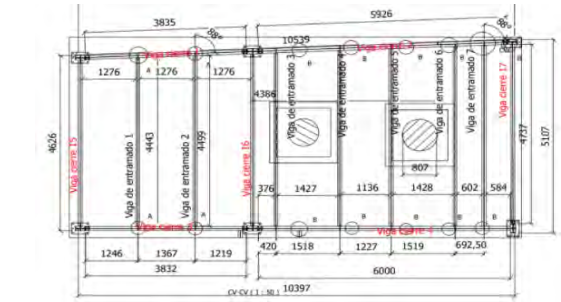





DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	%	# CARAS	SUB TOTAL
IPE 240 columnas	2,70			4,00		1,00	10,80
IPE 270 columnas	2,70			2,00		1,00	5,40
IPE 300 columnas	5,90			6,00		1,00	35,40
IPE 300 COLUMNA EJE 7" (E"-B")	6,00			3,00		1,00	18,00
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 1	4,44			1,00		1,00	4,44
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 2	4,50			1,00		1,00	4,50
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 3	4,569			1,00		1,00	4,57
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 4	4,631			1,00		1,00	4,63
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 5	4,68			1,00		1,00	4,68
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 6	4,74			1,00		1,00	4,74
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 7	4,77			1,00		1,00	4,77
VIGA CIERRE 1 IPE 220	3,84			1,00		1,00	3,84
VIGA CIERRE 2 IPE 220	5,926			1,00		1,00	5,93
VIGA CIERRE 3 IPE 220	3,83			1,00		1,00	3,83
PERFIL CUADRADO 50X50 2MM	1,700			4,00		1,00	6,80
IPE 180 VIGA ENTRAMADO 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Y 17	5,088			10,00		1,00	50,88
VIGA CIERRE 4 IPE 240	6,00			1,00		1,00	6,00
VIGA CIERRE 5 IPE 240	3,32			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 6 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 7 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 8 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 9 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 10 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 11 IPE 240	5,738			1,00		1,00	5,74
VIGA CIERRE 12 IPE 240	3,316			1,00		1,00	3,32
VIGA CIERRE 15 IPE 180	4,626			1,00		1,00	4,63
VIGE CIERRE 16 IPE 180	4,499			1,00		1,00	4,50
VIGA CIERRE 17 IPE 180	5,070			1,00		1,00	5,07
VIGA CIERRE 18 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 19 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 20 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 21 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
VIGA CIERRE 24 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09

Cantidad pagadas en los cortes	368,32	Cantidad de la Ficha No. 1 / 5	255,06
		Pasan	255,06
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**368,32**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	


OBSERVACIONES:


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ 183 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	76	**de**	79
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



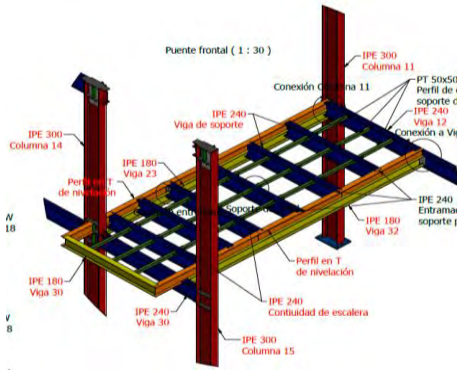

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANT	%	# CARAS	SUB TOTAL
VIGA CIERRE 25 IPE 180	5,088			1,00		1,00	5,09
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,680			2,00		1,00	7,36
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			1,00		1,00	3,51
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,730			1,00		1,00	3,73
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,590			2,00		1,00	7,18
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,510			1,00		1,00	3,51
DIAGONALES SCHEDULE 40	3,740			1,00		1,00	3,74
VIGA CIERRE 27 IPE 220	4,624			1,00		1,00	4,62
VIGA CIERRE 14 IPE 240	3,329			1,00		1,00	3,33
VIGA CIERRE 30 IPE 240	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 30` IPE 180	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 23 IPE 180	4,860			1,00		1,00	4,86
VIGA CIERRE 32 IPE 180	4,800			1,00		1,00	4,80
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			1,00		1,00	4,82
PERFIL EN T NIVELACION	4,822			1,00		1,00	4,82
ENTRAMADO PUENTE IPE 240	2,078			7,00		1,00	14,55
VIGA CIERRA 13 IPE 240	3,329			1,00		1,00	3,33
VIGA CIERRE 26 IPE 180	4,624			1,00		1,00	4,62
VIGA CIERRE 28 IPE 240	4,704			1,00		1,00	4,70
VIGA CIERRE 29 IPE 240	2,078			1,00		1,00	2,08
VIGA CIERRE 31 IPE 240	4,819			1,00		1,00	4,82
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,686			12,00		1,00	8,23
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,480			6,00		1,00	2,88
PERFIL CUADRADO 50 2MM	0,839			3,00		1,00	2,52

Cantidad pagadas en los cortes	368,32	Cantidad de la Ficha No. 2 / 5	113,26
		Vienen	255,06
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**368,32**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

184 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	39 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

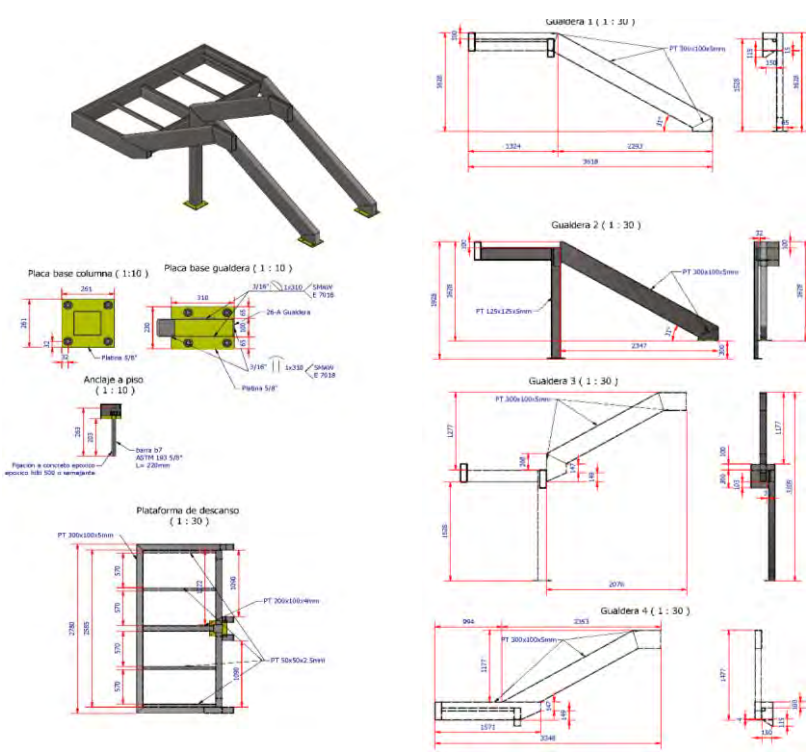

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,071				2,00	0,14
SOPORTE COLUMNA CENTRAL	platina e= 1/2" L=276x276x15,87mm C/4 perforaciones 5/8"	0,076				1,00	0,08
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,217				2,00	0,43
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,684				1,00	2,68
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,723				1,00	2,72
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,779				1,00	2,78
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,481				2,00	0,96
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,571				1,00	1,57
COLUMNA	PT 135x135x6mm	1,760				1,00	1,76
	PT 50x50x2mm	1,059				4,00	4,24
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,04				30,00	1,20
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mmx2,44m)	0,01				4,00	0,06
	PT 200x100x4mm	1,04				1,00	1,04
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,324				1,00	1,32
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,465				1,00	0,47
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,939				1,00	1,94
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,506				2,00	1,01
GUALDERA	PT 300x100x5mm	2,03				1,00	2,03
GUALDERA	PT 50X50X2MM	1,04				1,00	1,04
PLATINA 1/4"	Refuerzo patin	0,04				2,00	0,08

Cantidad pagadas en los cortes	368,32	Cantidad de la Ficha No. 3 / 5	27,56
		vienen	368,32
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**368,32**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	40 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

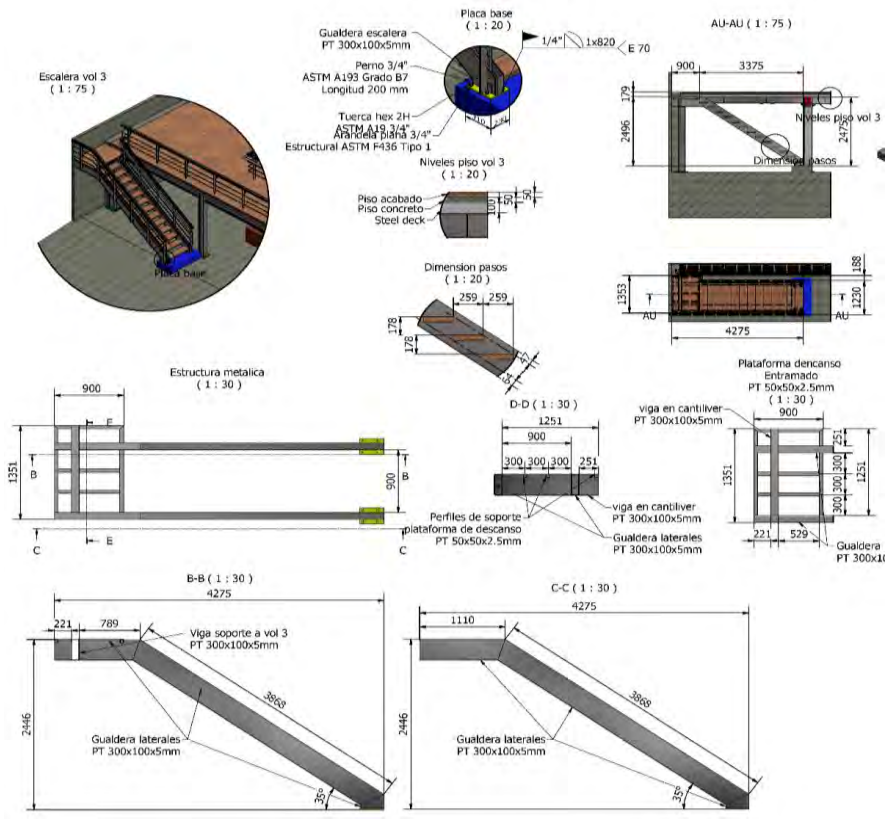

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
	ESCALERA VOLUMEN TRES						
SOPORTE GUALDERA	platina e= 1/2 " L=310x230x16mm C/4 perforaciones 3/4"	0,071				2,00	0,142
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,204				2,00	0,408
GUALDERA	PT 300x100x5mm	3,868				2,00	7,736
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,789				1,00	0,789
GUALDERA	PT 300x100x5mm	0,211				1,00	0,211
GUALDERA	PT 300x100x5mm	1,110				1,00	1,110
	Platina 3/8" (180mmx220mm)	0,040				26,00	1,040
REFUERZO PATIN	Platina 1/4" (1,22mx2,44m)	0,006				1,00	0,006
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,011				1,00	0,011
REFUERZO PATIN	Platina 3/8" (1,22mx2,44m)	0,049				1,00	0,049
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,90				2,00	1,798
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,59				2,00	1,180
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,08				2,00	0,156
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,25				2,00	0,508
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,13				1,00	0,128
GUALDERA	PT 50x50x2mm	0,641				1,00	0,641

Cantidad pagadas en los cortes	368,32	Cantidad de la Ficha No. 4 / 5	15,91
		Vienen	395,87
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**368,32**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	14	PINTURAS SOBRE MUROS Y METAL	**HOJA No.**	40 **de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	14.2.1	PINTURA ANTICORROSIVO METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

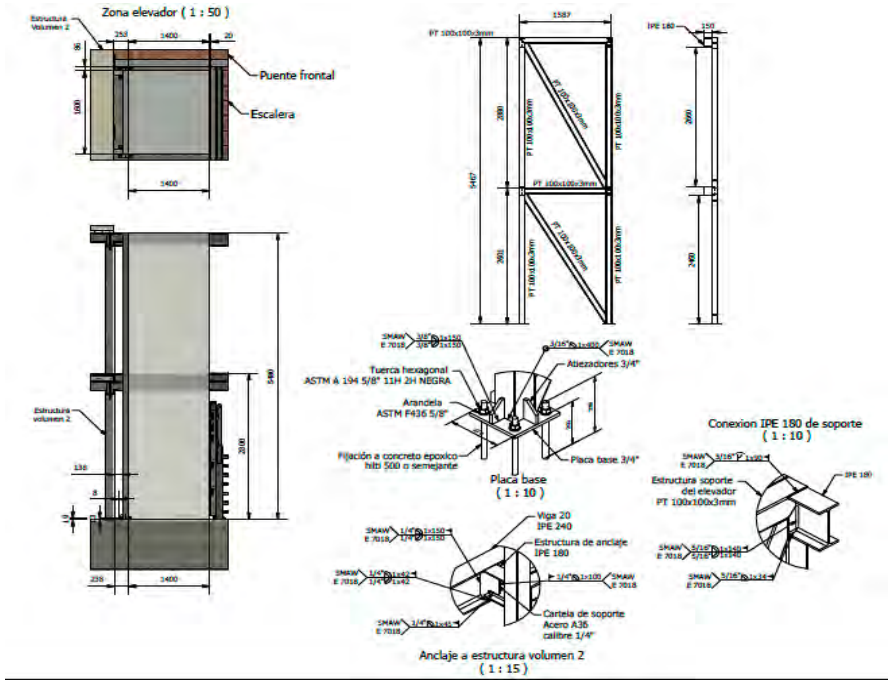

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSION MTS	ANCHO	PESO X ML	%	CANT	SUB TOTAL
	ESTRUCTURA ASCENSOR						
Placa base estructura ascensor	Platina e= 3/4" L_220x220x19,05mm c/4 perforaciones 5/8"	0,048				2,00	0,10
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	5,437				2,00	10,87
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,600				1,00	1,60
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	1,400				3,00	4,20
Area ascensor	PT 100x100mmx4mm / diagonales	0,150				4,00	0,60

Cantidad pagadas en los cortes	368,32	Cantidad de la Ficha No. 5 / 5	17,37
		Vienen	411,79
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	498,32
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**368,32**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**60,84**

OBSERVACIONES: TOTAL MEMORIA 14.2.1 = 429,16ML / FUERON COBRADOS EN ACTA #7 368,32ML Y SE COBRAN EN PRESENTE ACTA 60,84ML RESTANTES DEL TOTAL.

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

187 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	14.2	PINTURAS SOBR METAL	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	14.2.2	PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

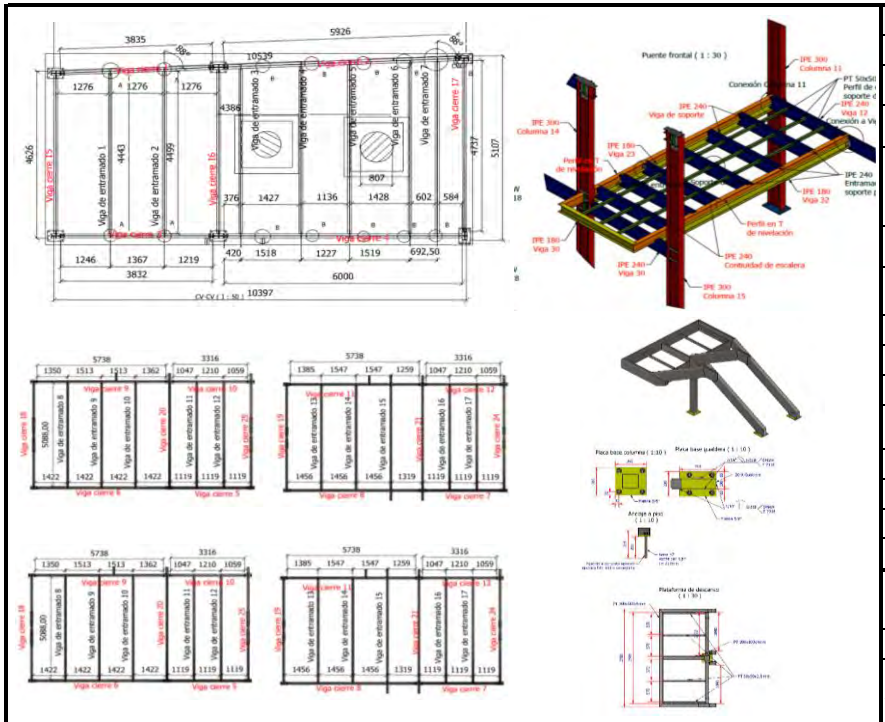

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PATIO 2, VOLUMEN 2, PATIO 3 Y VOLUMEN 3	PINTURA ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA	14,01	15,70			1,00	220,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	220,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	230,10
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**220,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

188 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	15	CERRADURAS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	15.1.1	CERRADURAS OFICINAS INTERIORES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

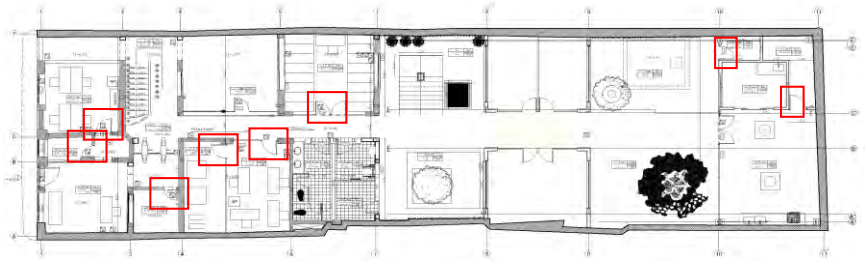

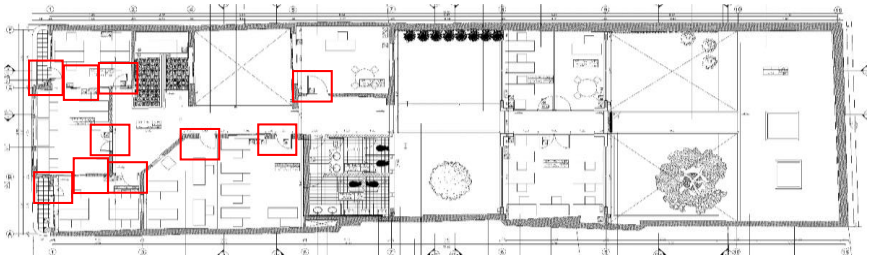

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA	CERRADURAS PUERTAS OFICINAS					8,00	8,00
SEGUNDA PLANTA	CERRADURAS PUERTAS OFICINAS					10,00	10,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	18,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**18,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO

E-mail: consorciocasatito@gmail.com

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	15	CERRADURAS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	15.1.2	CERRADURAS OFICINAS INTERIORES PARA PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE MANIJA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

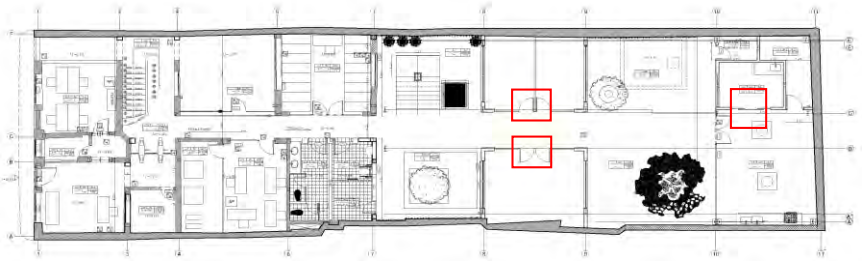

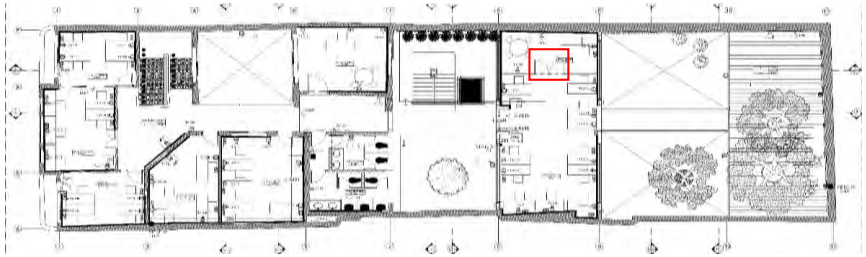

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA	CERRADURAS PUERTAS OFICINAS					4,00	4,00
SEGUNDA PLANTA	CERRADURAS PUERTAS OFICINAS					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	5,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**5,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO

E-mail: consorciocasatito@gmail.com

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	15	CERRADURAS	**HOJA No.**	39	**de**	79	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	15.1.3	CERRADURAS CILINDRO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

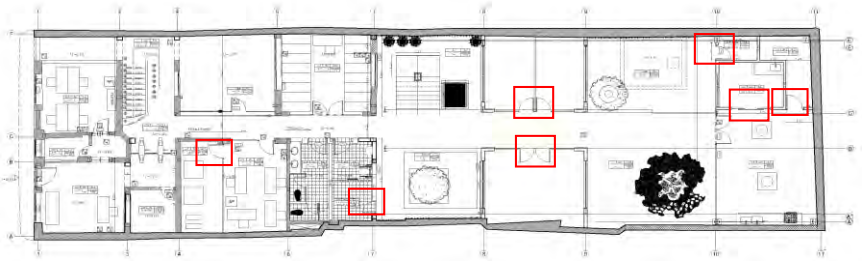

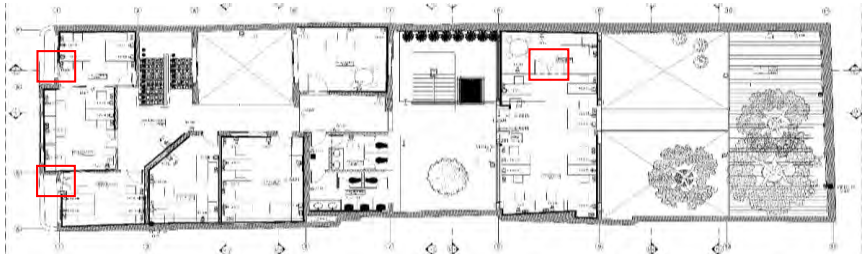

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA	CERRADURA CILINDRO					7,00	7,00
SEGUNDA PLANTA	CERRADURA CILINDRO					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	12,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	15	CERRADURAS	**HOJA No.**		39	**de**	79
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	15.1.4	CIERRA PUERTAS PISO Y90 PIVOT YALE O SIMILAR	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

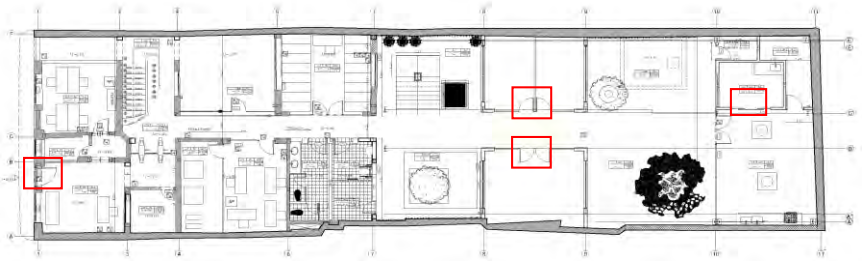

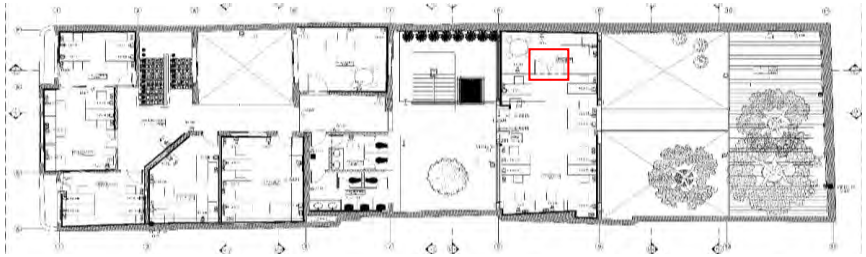

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA	CIERRA PUERTAS					6,00	6,00
SEGUNDA PLANTA	CIERRA PUERTAS					2,00	2,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	8,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	10,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**8,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO

E-mail: consorciocasatito@gmail.com

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	15,2	HERRAJES	**HOJA No.**	39	**de**	79	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	15.2.1	TOPES PARA PUERTAS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

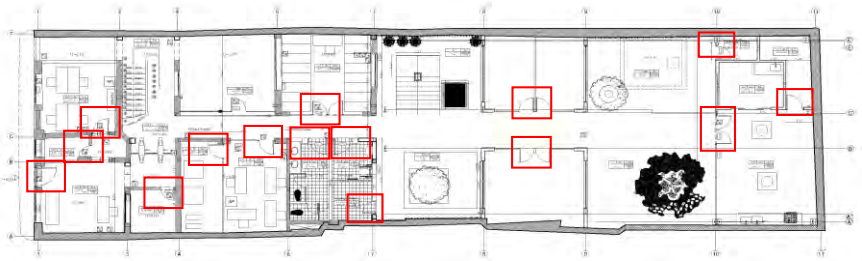

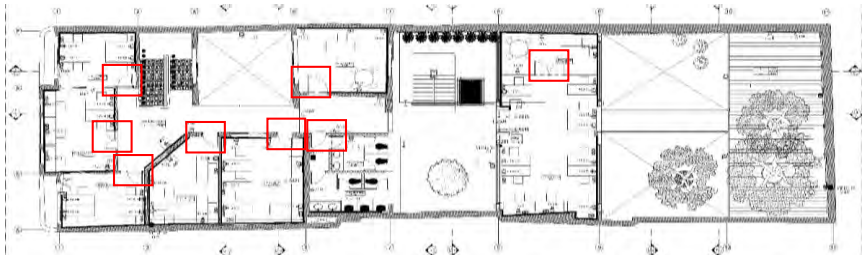

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA	TOPES PUERTAS					15,00	15,00
SEGUNDA PLANTA	CIERRA PUERTAS					8,00	8,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	23,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	23,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**23,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

CONSORCIO CASA TITO

E-mail: consorciocasatito@gmail.com

193 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.1	SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	LAMPARA DE EMERGENCIA					7,00	7,00
SEGUNDO PISO	LAMPARA DE EMERGENCIA					6,00	6,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	13,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	13,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**13,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.2	SALIDA LUMINARIA EN MURO PVC ½ . INCLUYE CAJAS CABLEADO Y CONECTORES.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDA LUMINARIA EN MURO					2,00	2,00
SEGUNDO PISO	SALIDA LUMINARIA EN MURO					12,00	12,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	14,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	14,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**14,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

195 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**	VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES	
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.** 1 **de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA** INTERNA
ITEM No.	16.1.3	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC Y EMT, INCLUYE REGATAS ,CABLEADO Y CONECTORES	**CORTE No. 09** Periodo del 12/11/20 al 11/12/20

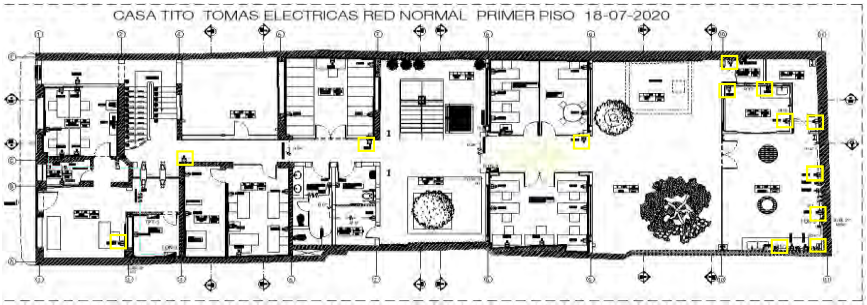

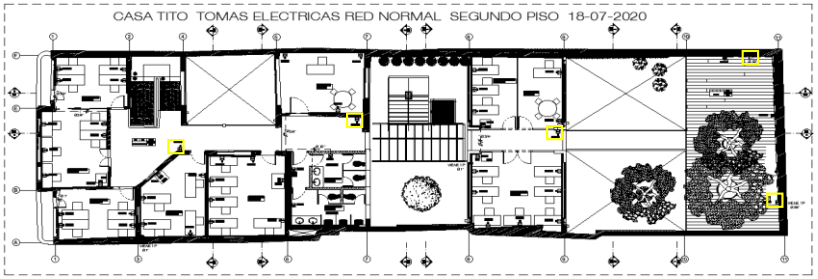

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO					13,00	13,00
SEGUNDO PISO	SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO					5,00	5,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	18,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**18,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

196 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.4	SALIDA PARA TOMA GFCI	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

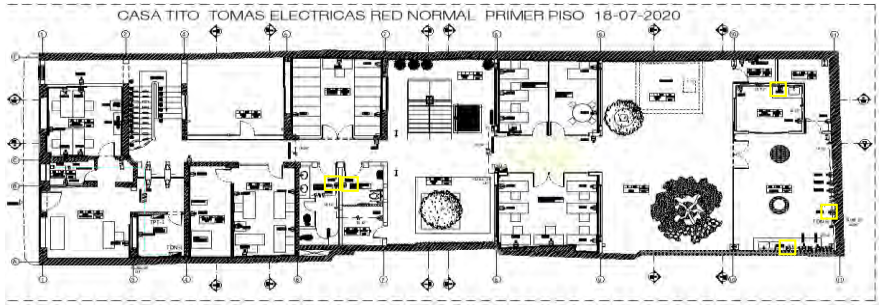

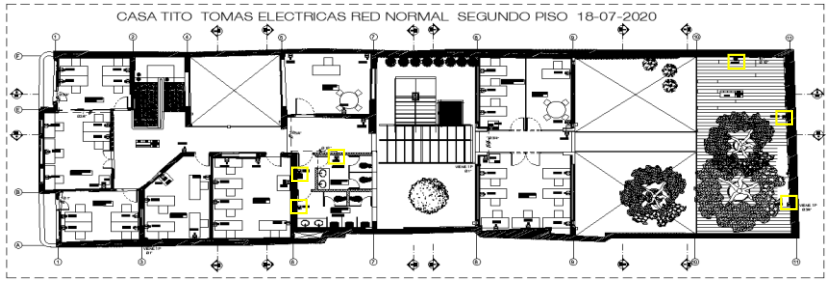

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDA PARA TOMA GFCI					5,00	5,00
SEGUNDO PISO	SALIDA PARA TOMA GFCI					6,00	6,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	11,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	11,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**11,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

197 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.6	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA ,INCLUYE TOMA Y TROQUEL.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

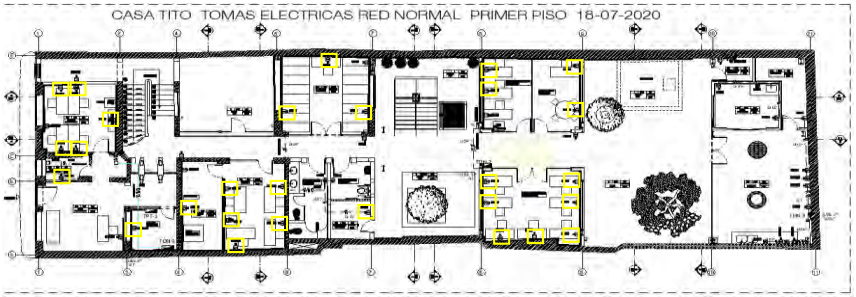

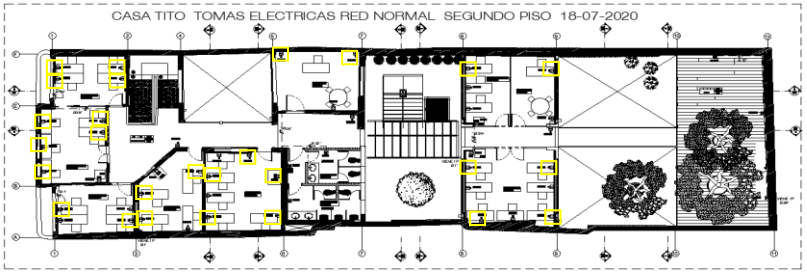

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA					28,00	28,00
SEGUNDO PISO	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA					27,00	27,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	55,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	55,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**55,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

198 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**		1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA			
ITEM No.	16.1.7	SALIDAS PARA CORRIENTE REGULADA ,INCLUYE TOMA NARANJA. CABLE #12 Y TROQUEL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

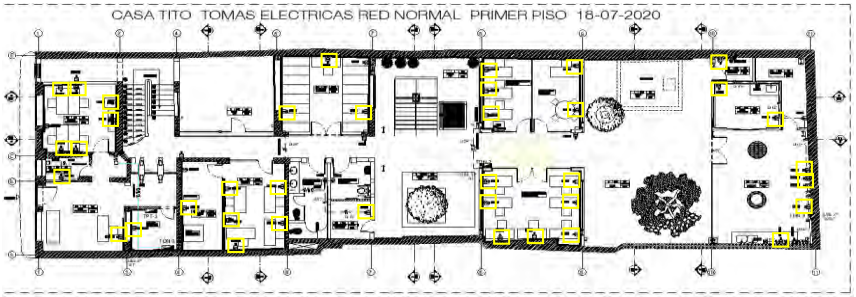

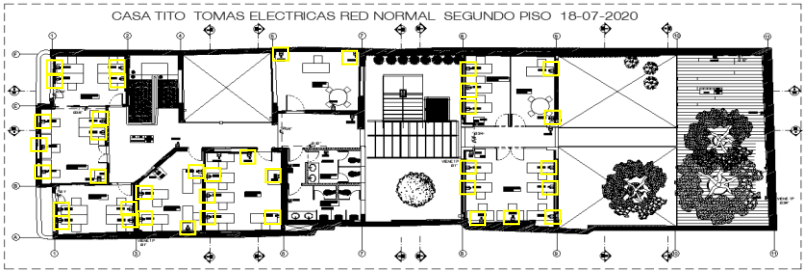

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA METÁLICA					39,00	39,00
SEGUNDO PISO	SALIDAS PARA CORRIENTE NORMAL EN CANALETA					38,00	38,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	77,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	77,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**77,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

199 BOGOTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.8	PUESTA A TIERRA PARA UPS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

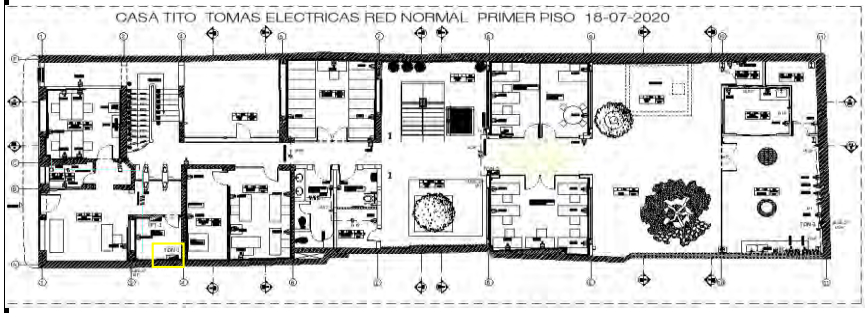

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PUESTA A TIERRA PARA UPS					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

200 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.9	BREAKER ENCHUFABLES DE 1X20	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

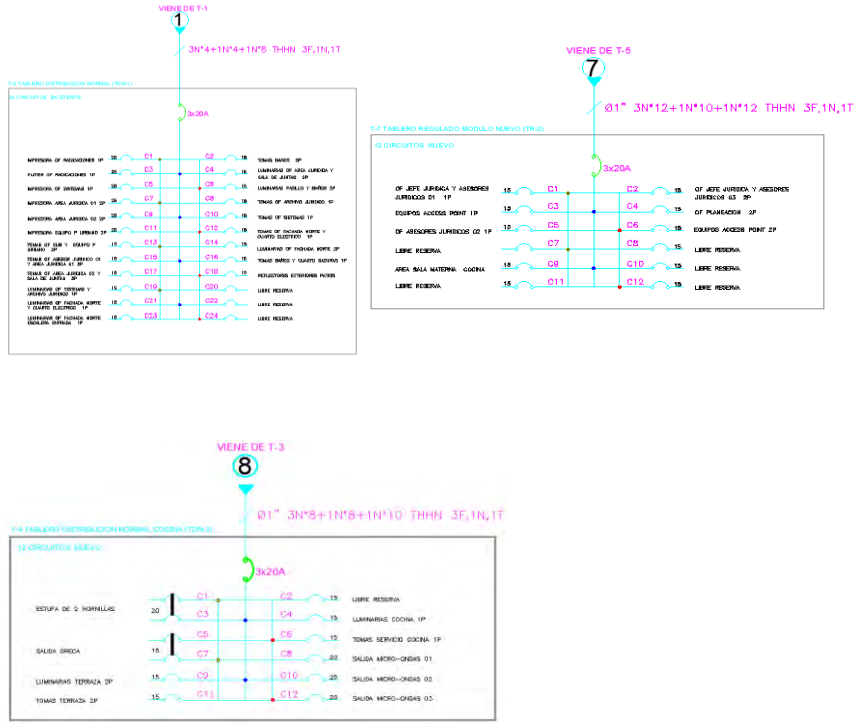

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	T- 1					21,00	21,00
	T- 2					12,00	12,00
	T- 5					10,00	10,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	43,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	43,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**43,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.10	BREAKER ENCHUFABLES DE 3x30A	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

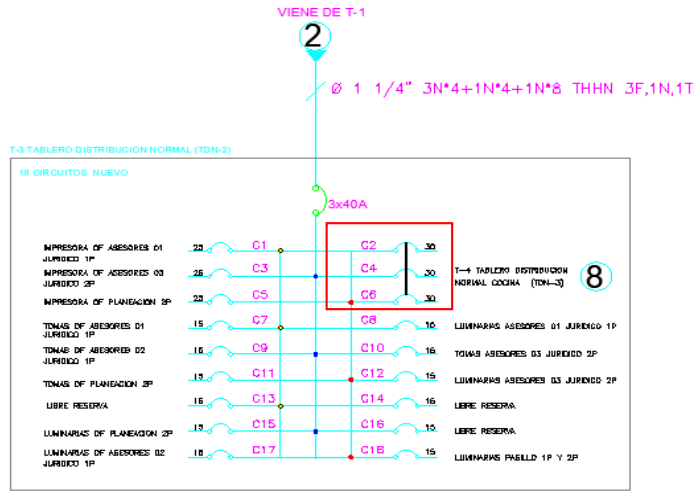

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	T- 1					1,00	1,00
							0,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

202 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.11	CANALETA METALICA DE 12.5 CM CON DIVISIÓN . INCLUYE TORNILLOS ,CHAZOS DE FIJACIÓN .RETOQUE DE CORTES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

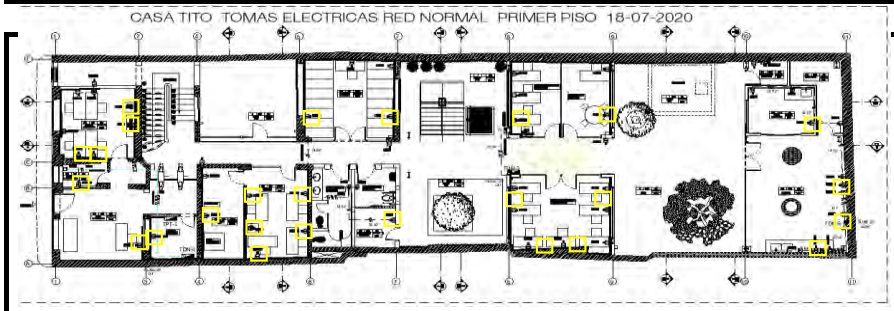

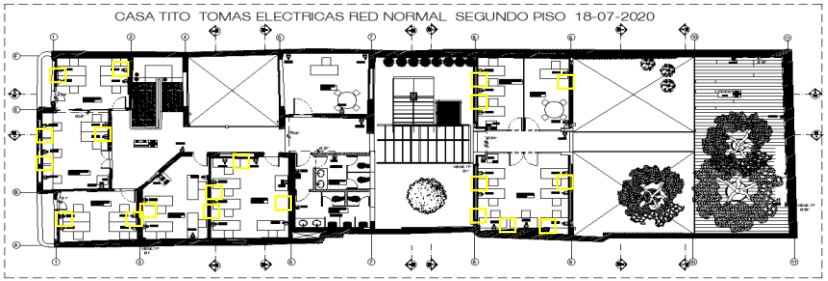

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CANALETA					26,00	26,00
SEGUNDO PISO	CANALETA					20,00	20,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	46,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	46,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**46,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

203 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.12	TUBERÍA PVC 1 ½ PARA PASES VOZ Y DATOS, INCLUYE REGATA Y RESANES	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

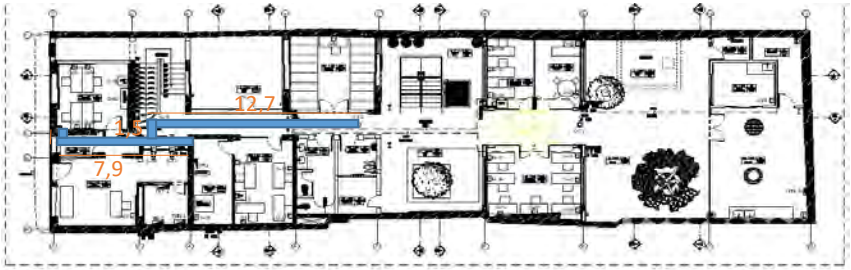



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	TUBERIA PVC					22,10	22,10
SEGUNDO PISO	TUBERIA PVC					16,90	16,90

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	39,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	39,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**39,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

204 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.13	SALIDA LUMINARIA PVC EN CIELO RASO DRYWALL Y/O SUPERBOARD (fibro-cemento) ¾, INCLUYE CAJAS TERMINALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN ,CABLEADO EN ALAMBRE #12,CONECTORES.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	SALIDAS LUMINARIA					36,00	36,00
SEGUNDO PISO	SALIDAS LUMINARIA					9,00	9,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	45,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	45,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**45,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

205 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**		1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA			
ITEM No.	16.1.14	TUBERÍA PVC CONDUIT 1" PARA BACBONE ENTRE SWICHES DE COMUNICACIONES. INCLUYE REGATAS Y RESANES.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	TUBERIA					27,00	27,00
SEGUNDO PISO	TUBERIA VERTICAL DE 2.5M					15,00	15,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	42,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	42,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**42,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

206 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.1.15	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

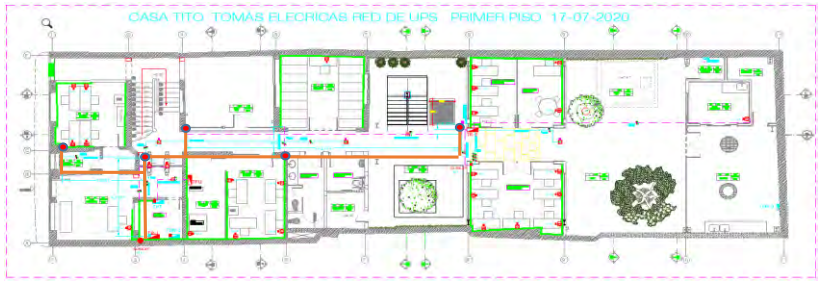

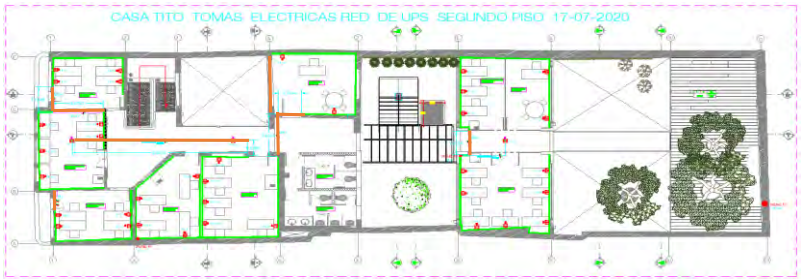

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	TUBERIA					28,60	28,60
SEGUNDO PISO	TUBERIA					24,90	24,90
	TUBERIA VERTICAL DE 2,5 M					12,50	12,50

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	66,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	66,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**66,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

207 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.16	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION Y TUBERIA PVC EMPOTRADA POR PISO Y PARED EN CABLE CU TRENZADO AZUL 3#12 THHN LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA MARFIL (REF 5320-ICP) INSTALADA EN TROQUE METALICO TIPO PIRAMIDAL PROMEDIO 16 MTS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

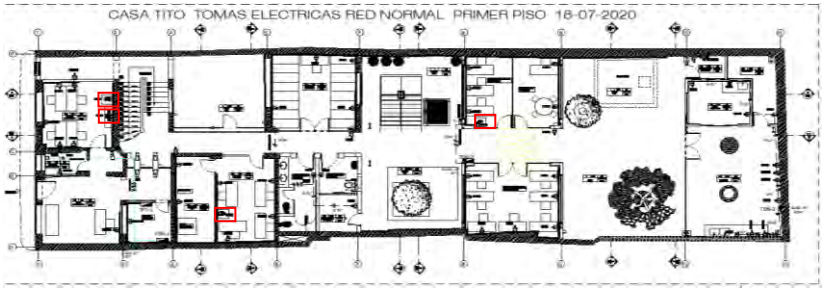

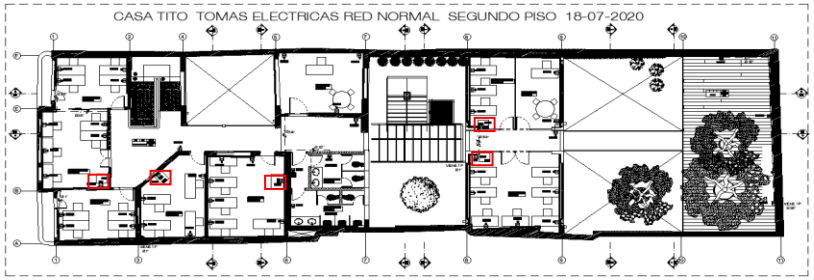

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CIRCUITO PRIMER PISO					4,00	4,00
SEGUNDO PISO	CIRCUITO SEGUNDO PISO					5,00	5,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	9,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	9,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**9,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

208 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.17	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ESTUFA POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 4#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

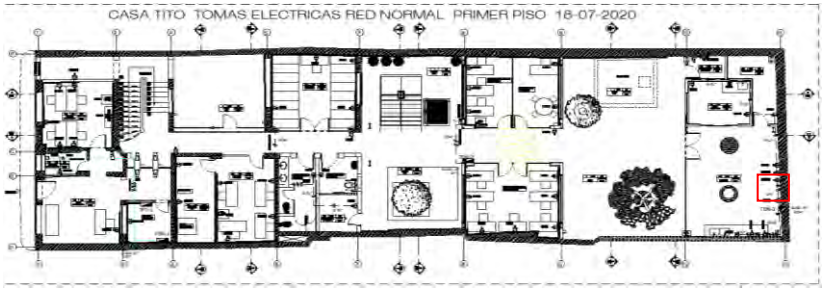

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CIRCUITO PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

209 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.18	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA GRECA CON TUBERIA PVC 3/4 " EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 10X10X10 CON TOMA TRIFILAR DE 20 A	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

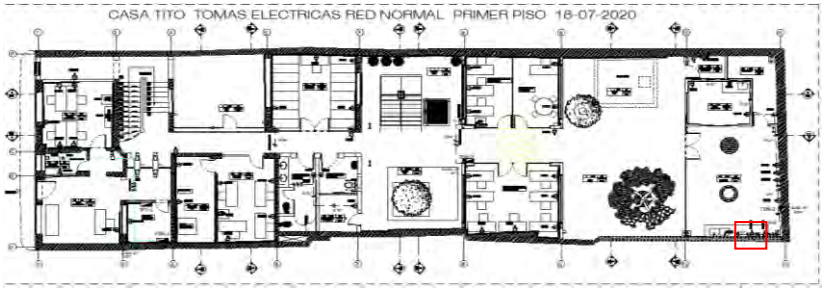

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CIRCUITO PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.1.19	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA MICRO-ONDAS POR TUBERIA PVC EMPOTRADA EN PARED EN CABLE CU 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN CAJA METALICA 2400 CON TOMA CON POLO A TIERRA DE 20 AMP PROMEDIO 2 MTS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

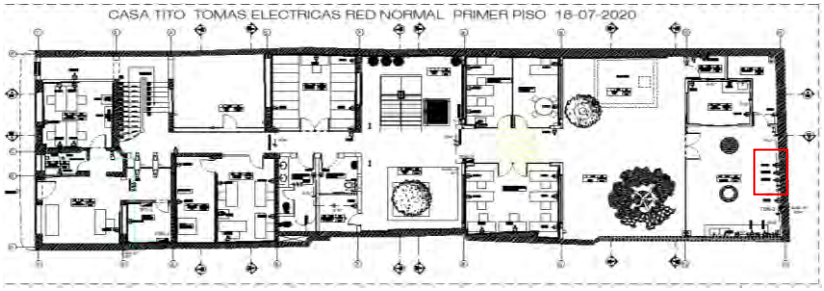

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CIRCUITO PRIMER PISO					3,00	3,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

211 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.20	TUBERIA CONDUIT EMT 1" CON ACCESORIOS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

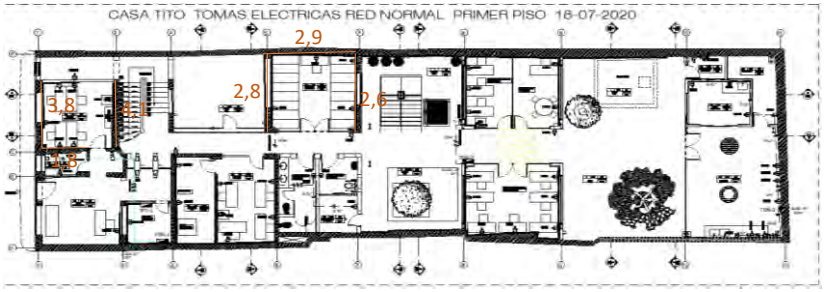

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					18,00	18,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	18,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	18,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**18,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

212 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.21	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" CON ACCESORIOS EMPOTRADA INCLUYE REGATA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

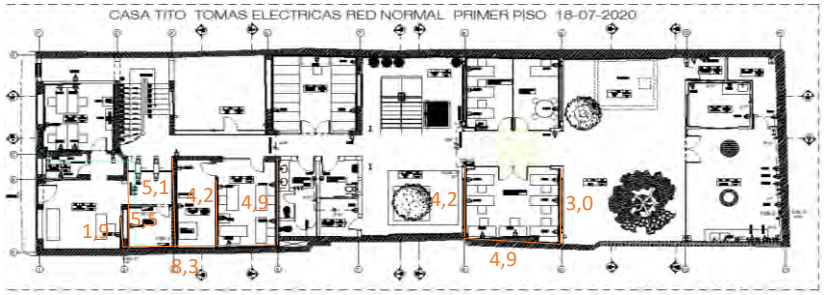

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					39,00	39,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	39,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	39,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**39,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

213 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.1.22	CAJA METALICA DE PASO DE 15X15X10 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CAJA METALICA 15X15X10					8,00	8,00
SEGUNDO PISO	CAJA METALICA 15X15X10					8,00	8,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	16,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	16,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**16,00**


OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

214 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**		
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA			
ITEM No.	NP 16.1.23	TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" CON ACCESORIOS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

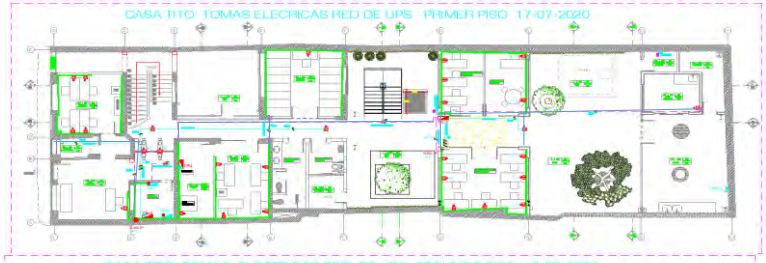





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					50,00	50,00
SEGUNDO PISO	SEGUNDO PISO					40,00	40,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	90,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	90,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**90,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

215 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.1.24	ACCESORIOS Y REGATAS DE 4 CMS PARA TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/4" EMPOTRADA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

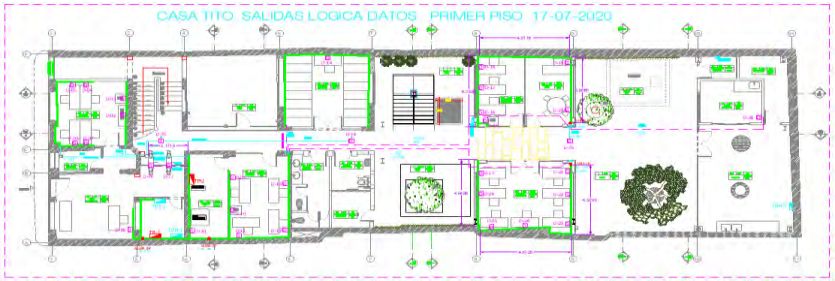



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					24,25	24,25
SEGUNDO PISO	SEGUNDO PISO					11,75	11,75

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	36,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	36,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**36,00**


OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

216 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL**	**CONSORCIO CASA TITO**
	OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."	
	MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA	

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.1.25	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA ALIMENTACION RACK DE COMUNICACIONES POR CANALETA METALICA 12X5 CMS CON DIVISION EN CABLE CU TRENZADO ROJO 3#12 LIBRE DE HALOGENOS TERMINANDO EN DOS TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA AISLADA COLO NARANJA (REF 5262-IG) INSTALADA EN TROQUE METALICO TIPO PIRAMIDAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

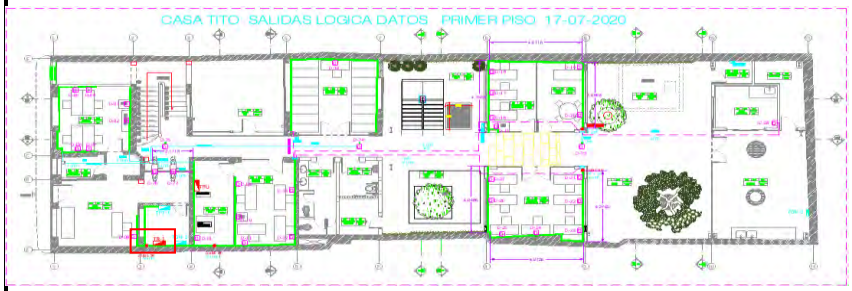

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.1.26	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS					6,00	6,00
SEGUNDO PISO	CAJA METALICA DE PASO DE 25X25X15 CMS					4,00	4,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	10,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	10,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**10,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

218 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.2,6	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO ASCENSOR (TASC) (TIPO PLATAFORMA) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS CU 4#8+#10 THHN POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO. INCLUYE REGATA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					28,00	28,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	28,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	28,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**28,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.2.7	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-2 (TDN-1) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR CANALETA METALICA PERIMETRAL	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

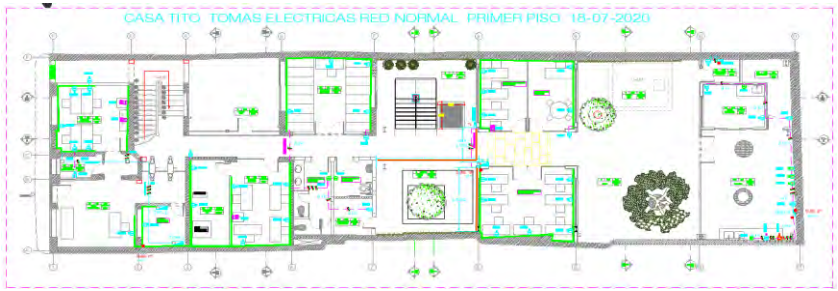

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					11,00	11,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	11,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	11,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**11,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1 **de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.2.8	ACOMETIDA ELECTRICA TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES (T-1) HASTA TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#4+1#8 POR TUBERIA PVC Ø 1 1/4" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

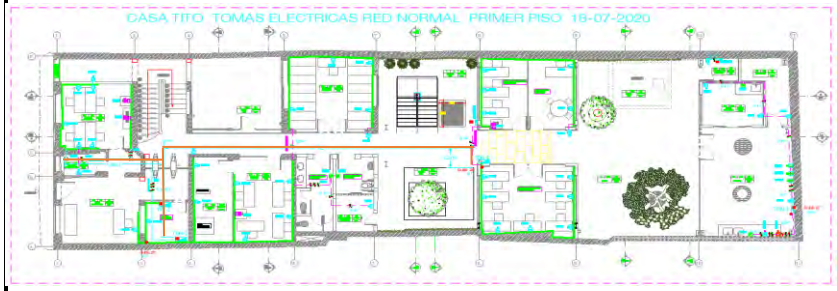

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					28,00	28,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	28,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	28,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**28,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

221 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.2.9	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO DISTRIBUCION NORMAL T-3 (TDN-2) HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL COCINA T-4 (TDN-3) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					26,00	26,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	26,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	26,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**26,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.2.10	PROLONGACION ACOMETIDA ELECTRICA DESDE CAJA DE PASO EMPOTRADA HASTA TABLERO BOMBAS (TBOM) EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 4#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

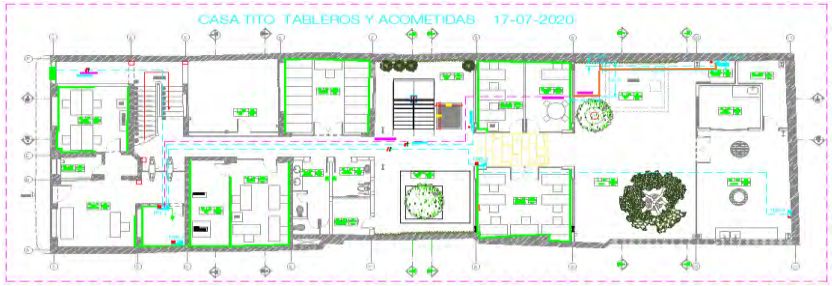

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					13,00	13,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	13,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	13,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**13,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

223 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.2.11	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL TOTALIZADORES HASTA TABLERO PRINCIPAL UPS (TPU) CUARTO DE COMUNICACIONES EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#10+1#8+1#10 POR TUBERIA PVC Ø 1" EMPOTRADA POR PISO (INCLUYE REGATA)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

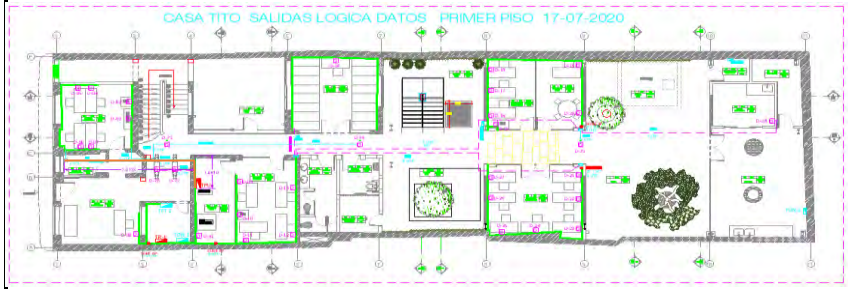

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					9,00	9,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	9,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	9,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**9,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

224 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.2.12	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-1) CUARTO DE ELECTRICO EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR CANALETICA METALICA 12.5 CMS CON DIVISION	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

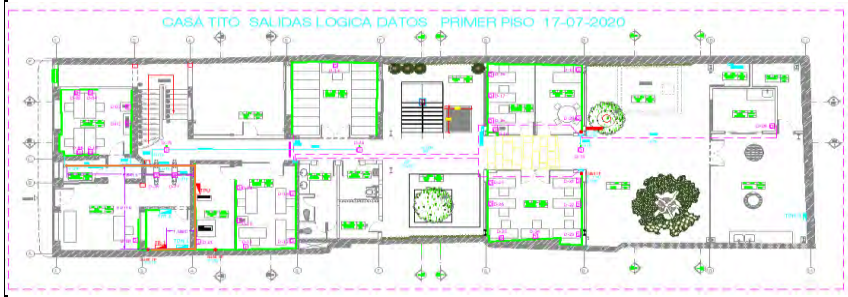

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					12,00	12,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	12,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	12,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**12,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.2.13	ACOMETIDA ELECTRICA DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS HASTA TABLERO REGULADO UPS (TR-2) EN CABLE CU LIBRE DE HALOGENOS 3#12+1#10+1#12 POR TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMPOTRADA EN PISO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

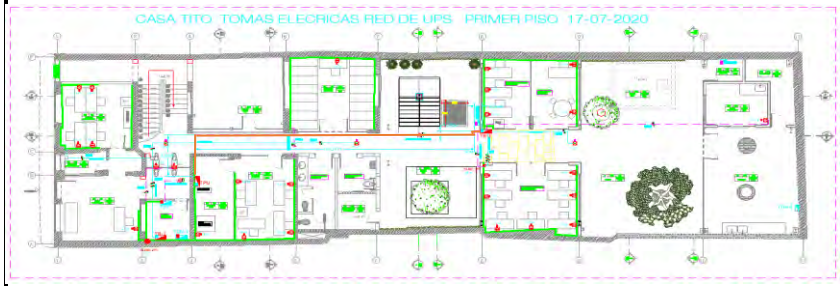

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					18,36	18,36
	CONEXIONES VERTICALES					6,64	6,64

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	25,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	25,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**25,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

226 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA PARA ENTRADA - SALIDA UPS DESDE TABLERO PRINCIPAL UPS (T-5) HASTA UPS EN CABLE CU FLEXIBLE 3#10+1#8+1#10 TWK POR CORAZA METALICA PLASTIFICADA Ø 1 " CON CONECTORES EN CADA EXTREMO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

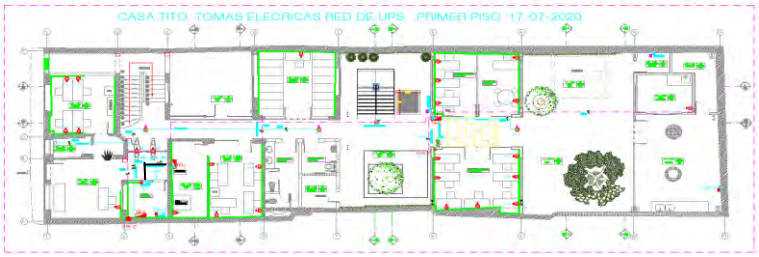

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					2,00	2,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

227 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.3.1	SUMINISTRO DE TABLERO 3 FASES 4 HILOS 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

228 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.3.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

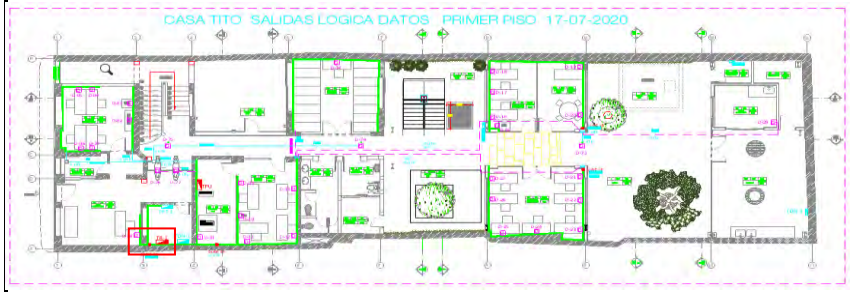

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

229 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.3.3	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X80A	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

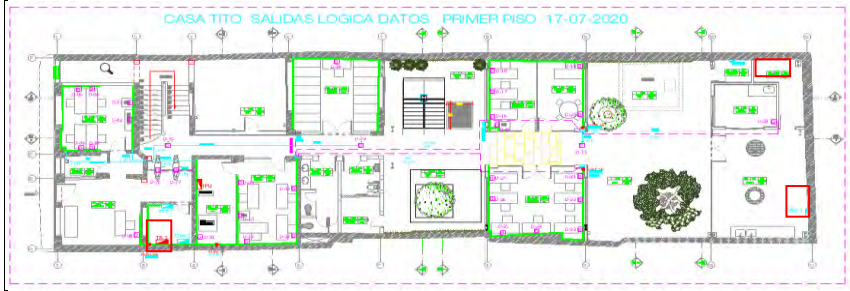

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	VOLUMEN 1					1,00	1,00
	VOLUMEN 3					2,00	2,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.3.4	SUMINISTRO DE TOTALIZADOR 3X40A	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

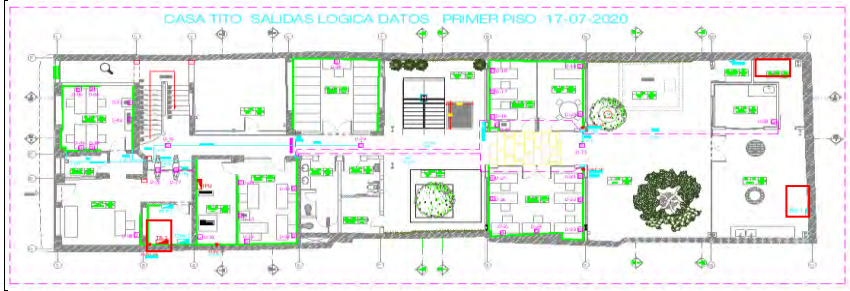

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	VOLUMEN 1					1,00	1,00
	VOLUMEN 3					2,00	2,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	3,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

231 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.3.6	CERTIFICACIÓN RETIE - RETILAP	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

CASA TITO TOMAS ELECTRICAS RED NORMAL PRIMER PISO 18-07-2020

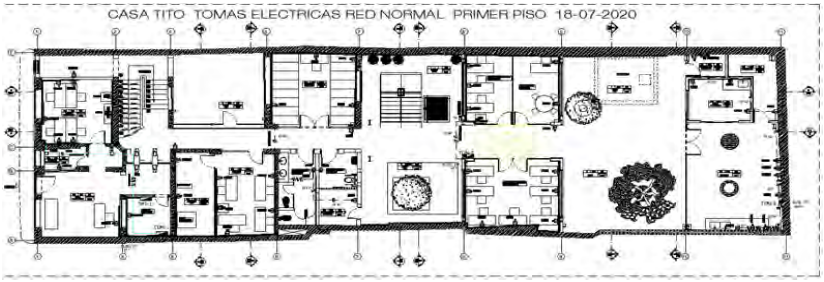

CASA TITO TOMAS ELECTRICAS RED NORMAL SEGUNDO PISO 18-07-2020

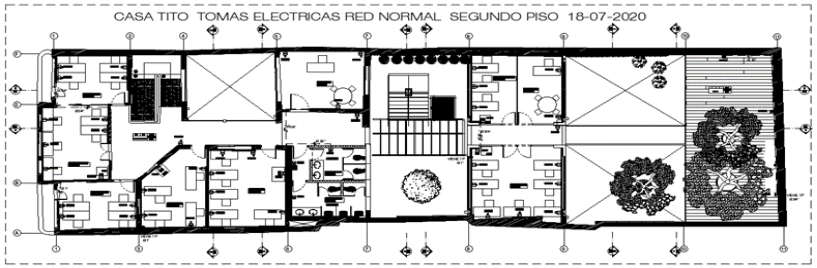

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
CASA TITO						1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

232 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.3.8	Tablero elecrtrico trifasico tipo alumbrado con espacio para totalizador de 12 circuitos	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

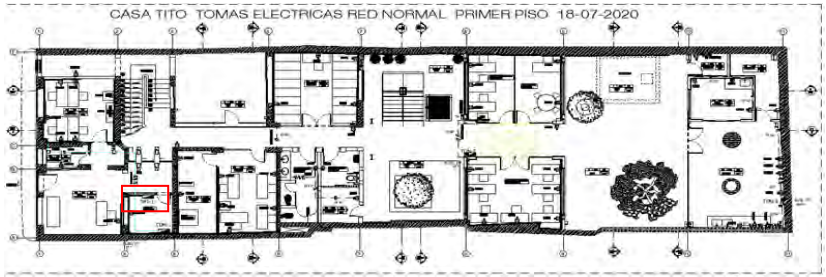

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

233 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X20 A TDN-2	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

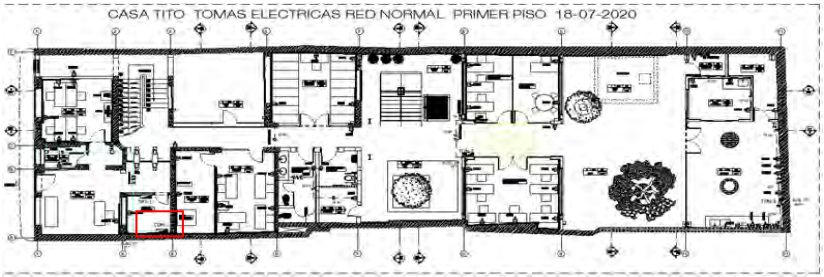

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

234 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 2X15 A TDN-3	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

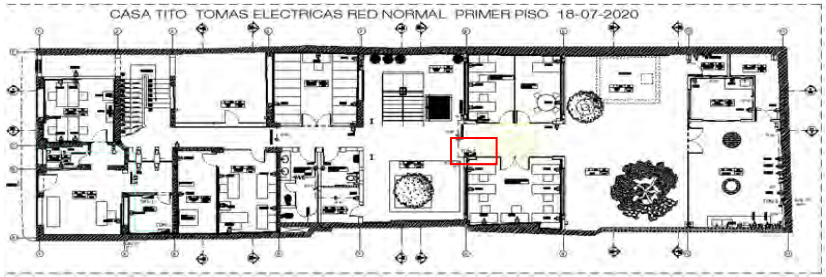

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

235 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CERRADO METALICO (TPT) CERRADO DE 80X70X25 CMS (ALTO*ANCHO*PROF.); FABRICADO EN LAMINA CR CALIBRE 16, PUERTA FRONTAL , ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032, GRADO DE PROTECCION IP54 PARA USO INTERIOR; CUMPLIENDO NORMA RETIE	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

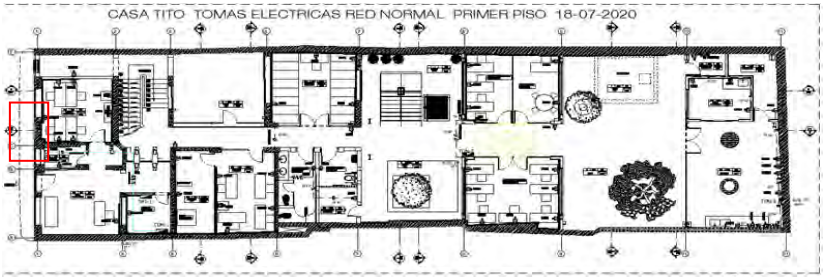

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

236 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PACH PANEL DE 24 PTOS CATEGORÍA 6 A.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

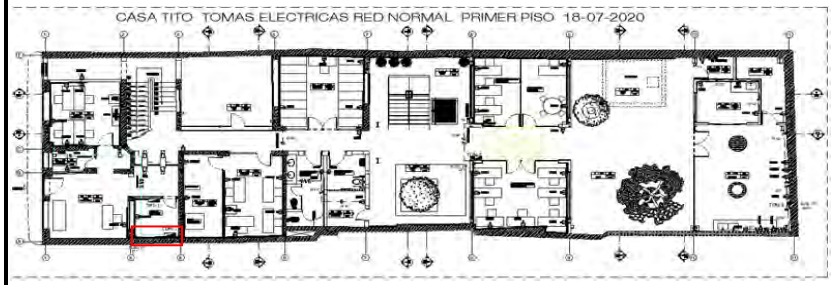

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	CUARTO DE MAQUINAS					4,00	4,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	4,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	4,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**4,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

237 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.5.2	GABINETE RAKC DE 210 METROS DE ALTURA X 60	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

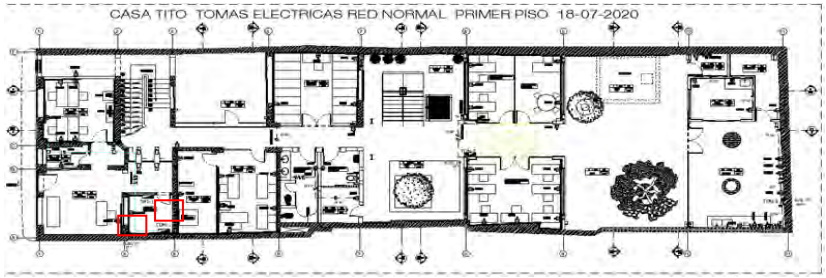

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

238 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 48 PUERTOS POE 100/100, MÁS UN PUERTO	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

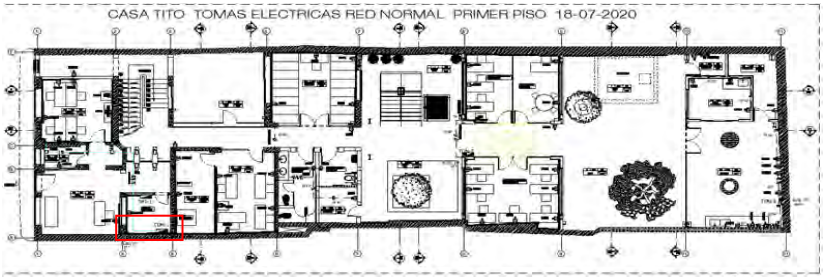

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

239 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH DE 24 PUERTOS POE 100/100 MAS UN PUERTO.	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

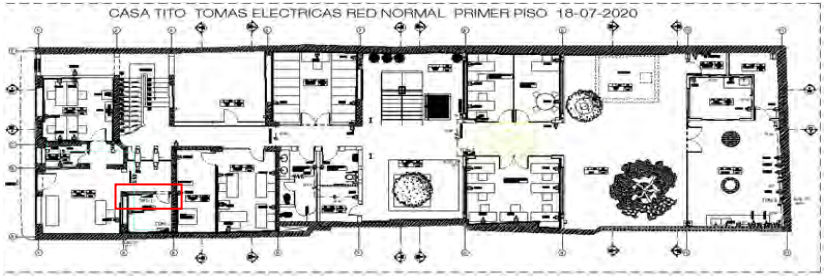

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

240 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.5.5	SALIDA LÓGICA PARA DATOS CAT 6ª. INCLUYE JACK FACEPLATE ,PONCHADA Y CERTIFICADA (incluye patch cord)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

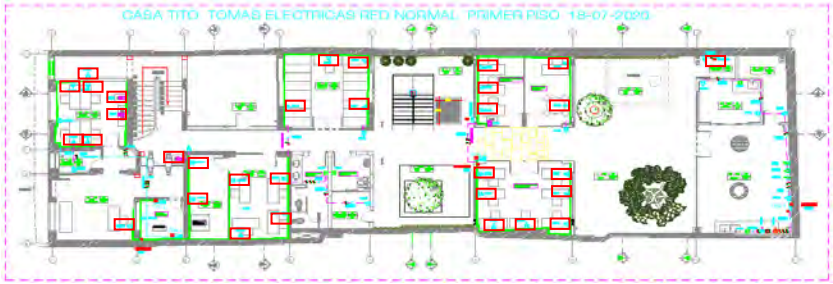

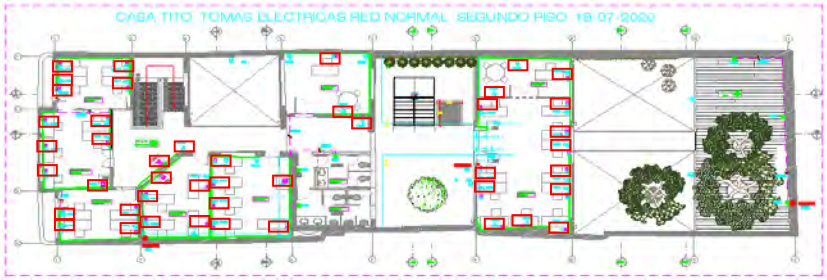

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					32,00	32,00
	SEGUNDO PISO					45,00	45,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	77,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	77,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**77,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

241 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA 120 V	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

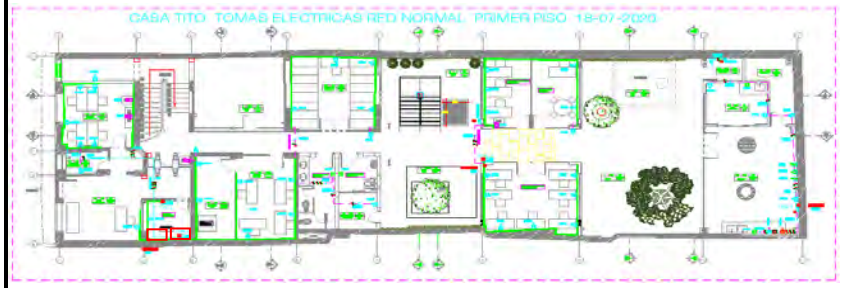

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

242 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	16.5.7	COFRE DE DISTRIBUCIÓN PARA CORRIENTE REGULADA (UPS), INCLUYE BREAKER DE PROTECCIÓN BOYPASE BARRAJES ,FASES NEUTRO Y TIERRA .	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

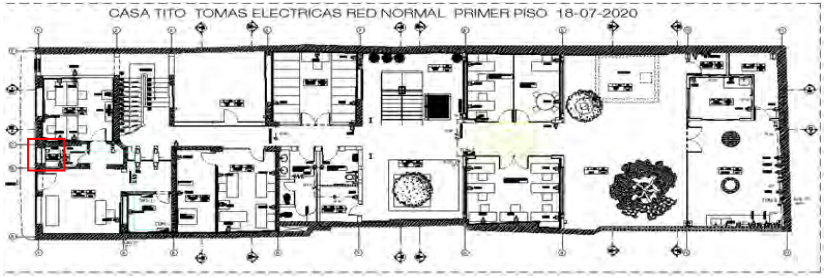

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					1,00	1,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1 **de**	
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE VOZ Y DATOS	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

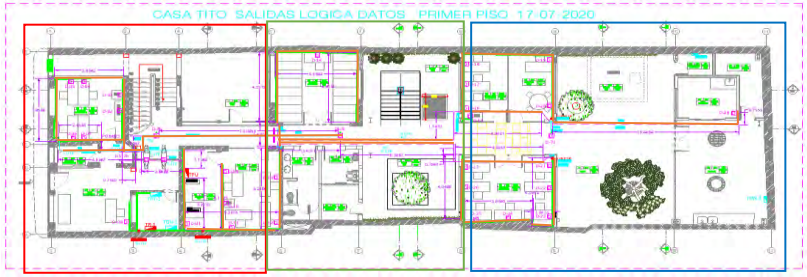

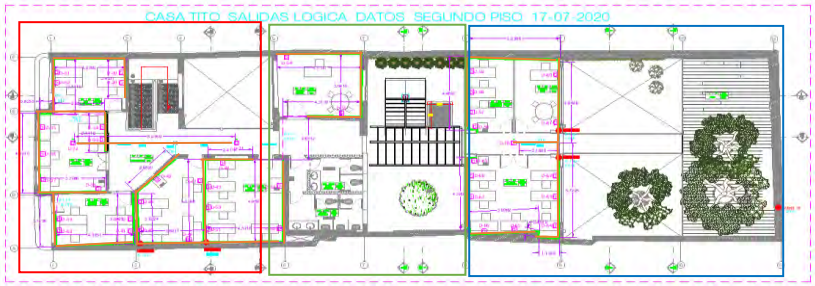

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	VOLUMEN 1	70,89				12,00	850,74
	VOLUMEN 2	38,62				12,00	463,44
	VOLUMEN 3	11,19				12,00	134,28
SEGUNDO PISO	VOLUMEN 1	67,57				12,00	810,88
	VOLUMEN 2	15,52				12,00	186,24
	VOLUMEN 3	32,13				12,00	385,56
	CONEXIONES HORIZONTALES	64,07				12,00	768,87

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	3.600,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	3.600,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**3600,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

244 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	16.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION ACCEESS POINT LARGO ALCANCE ,ALCANCE TECHO ROMPE MUROS, MARCA UNIFIT o similar	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	





LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					3,00	3,00
	SEGUNDO PISO					3,00	3,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	6,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	6,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA	
ITEM No.	NP 16.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2 UR	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					7,00	7,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	7,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	7,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**7,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

246 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : DOCE (12) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	16	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES	**HOJA No.**	1	**de**	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	INTERNA		
ITEM No.	NP 16.5.12	PDU HORIZONTAL CON 6 TOMAS NEMA 5-15R RACK 15 AMP 120 VAC SUPRESOR POWEST	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PISO	PRIMER PISO					2,00	2,00
							0,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES		**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

247 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	**HOJA No.**	99	**de**	119
UNIDAD	ML	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	18.1.2	MEDIAS CAÑAS CON MORTERO 1:3	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

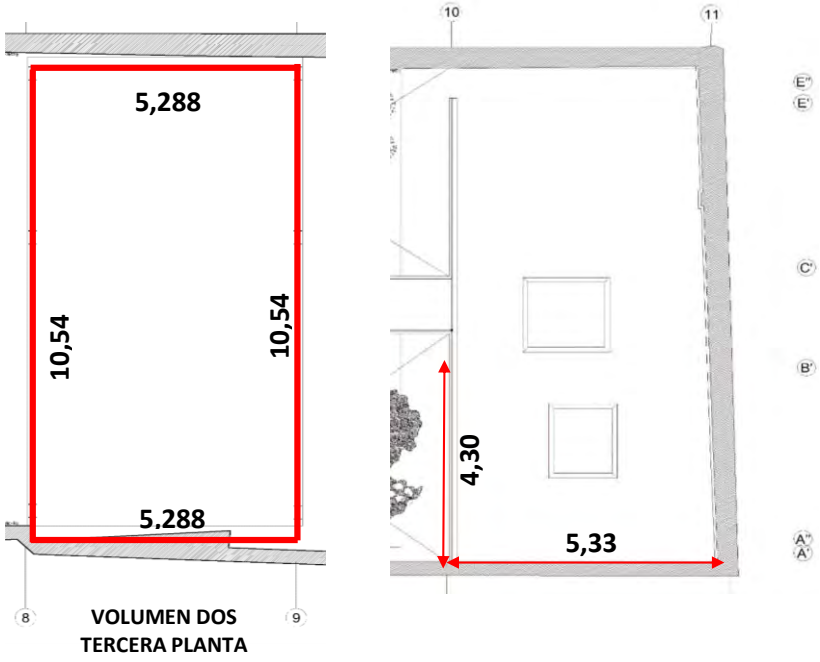

VOLUMEN DOS
TERCERA PLANTA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	4,30				1,00	4,30
VOLUMEN TRES - CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	5,33				1,00	5,33
VOLUMEN DOS CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	10,54				2,00	21,08
VOLUMEN DOS CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	5,29				2,00	10,58

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	41,29
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	35,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**41,29**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

248 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."


MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	18	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	**HOJA No.**	99	**de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 18.1.5	IMPERMEABILIZACION TERRAZAS MANTO ASFALTICO FIBERGLASS P3, IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

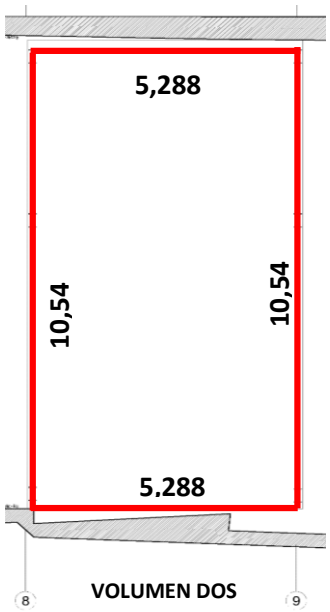

VOLUMEN DOS

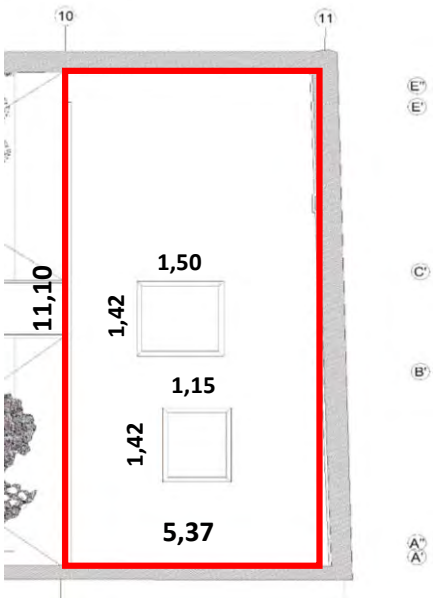

VOLUMEN TRES

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
VOLUMEN DOS CUBIERTA	MEDIA CAÑA PERIMETRAL	10,54	5,288			2,00	21,08
VOLUMEN 3 SEGUNDA PLANTA	ALISTADO DE PISO SOBRE PLACA CONCRETO (SIN VACIO ARBOLES)	10,75	5,18			1,00	55,70

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	76,78
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 07	0,00	Cantidad Contractual	141,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**76,78**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

249 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19	CARPINTERIA DE MADERA	**HOJA No.**	99	**de** 119
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	19.1.1	RESTAURACION PASOS ESCALERA, GUARLEDRAS, FALDONES Y BARANDA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

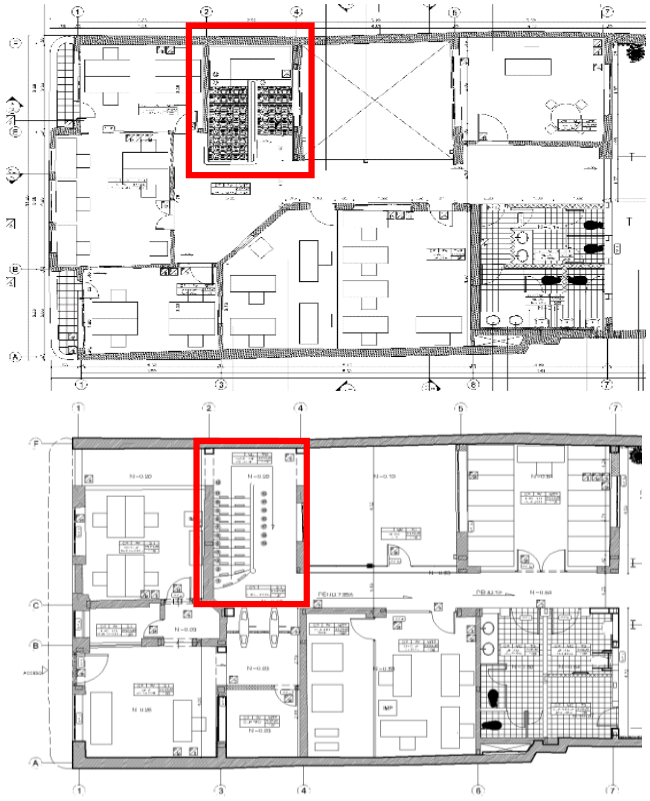

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA BIC	RESTAURACION DE ESCALERA				0,40		0,40

Cantidad pagadas en los cortes	0,60	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	0,40
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,60**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**0,40**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

250 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	19	CARPINTERIA DE MADERA	**HOJA No.**		99	**de**	119
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	19.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRIMER PASO DE ESCALERA EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

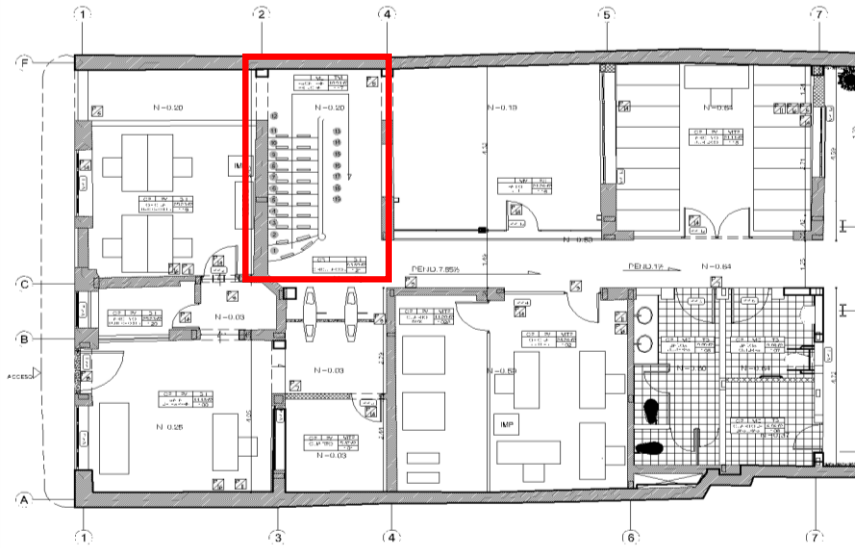

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ESCALERA BIC	PRIMER PASO ESCALERA	1,20	0,45			1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

251 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**	109 **de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20	

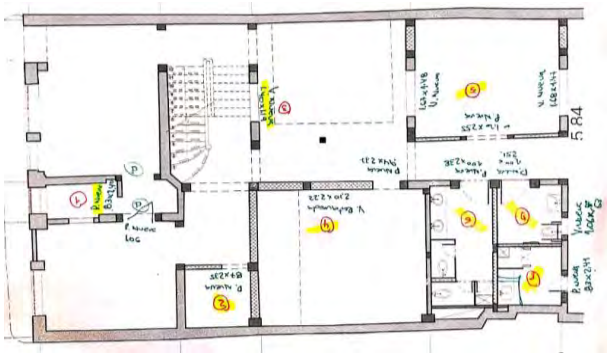

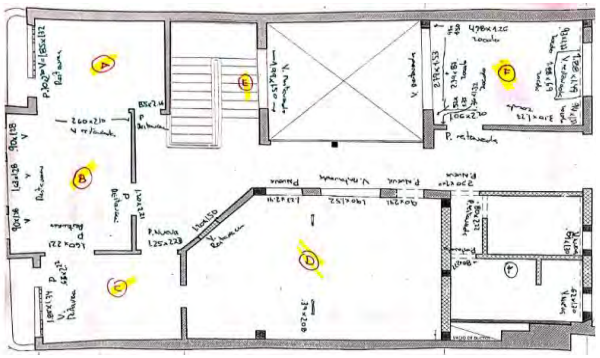

LOCALIZACION	DESCRIPCION	ANCHO	ALTO	VOLUME	%	CANT	SUB TOTAL
			PRIMER PLANTA BIC				
ESPACIO 4	RESTAURACION VENTANA	2,10	2,22			1,00	4,66
			SEGUNDA PLANTA BIC				
ESPACIO A	RESTAURACION VENTANA	1,85	1,32			1,00	2,44
ESPACIO B	RESTAURACION VENTANA	0,90	1,28			1,00	1,15
ESPACIO B	RESTAURACION VENTANA	1,63	1,28			1,00	2,09
ESPACIO B	RESTAURACION VENTANA	0,90	1,28			1,00	1,15
ESPACIO C	RESTAURACION VENTANA	1,85	1,34			1,00	2,48
ESPACIO D	RESTAURACION VENTANA	1,90	1,25			1,00	2,38
ESPACIO D	RESTAURACION VENTANA	1,20	1,50			1,00	1,80
ESPACIO E	RESTAURACION VENTANA	2,00	1,50			1,00	3,00
ESPACIO F	RESTAURACION VENTANA	2,85	1,60			1,00	4,56
ESPACIO F	RESTAURACION VENTANA	1,90	1,52			1,00	2,89
ESPACIO F	RESTAURACION ZOCALO	0,36	1,35			1,00	0,49
ESPACIO F	RESTAURACION ZOCALO	0,53	1,35			1,00	0,72
ESPACIO F	RESTAURACION ZOCALO	1,86	0,88			1,00	1,64
ESPACIO F	RESTAURACION ZOCALO	0,44	1,50			1,00	0,66
ESPACIO F	RESTAURACION ZOCALO	0,9	1,26			1,00	1,18

Cantidad pagadas en los cortes	26,70	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	33,28
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	12,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**26,70**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**6,58**

OBSERVACIONES: TOTAL MEMORIAS RESTAURACION VENTANAS EN MADERA: 33,28 M2. SE COBRARON EN CORTES ANTERIORES: 26.70 M2. SE COBRAN EN PRESENTE ACTA EL VALOR RESTANTE: 6,58 M2 DE LA TOTALIDAD.


ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

252 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO		CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019	**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	19	PAÑETES Y CIELO RASO	**HOJA No.**		110	**de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	19.1.3	RESTAURACION VENTANAS EN MADERA	**CORTE No. 08**	Periodo del 12/10/20 al 11/11/20			

REGISTRO FOTOGRAFICO

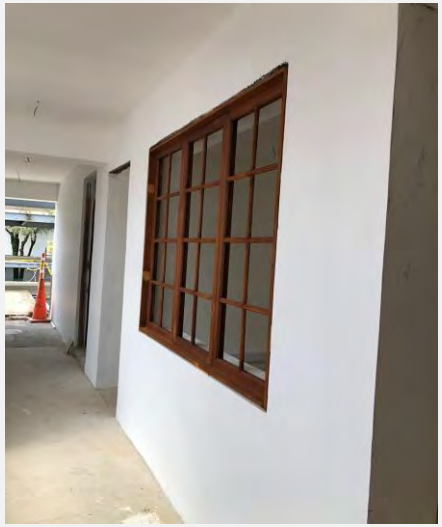







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

253 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL


OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**		CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19	CARPINBTERIA DE MADERA	**HOJA No.**	99	**de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	NP 19.1.4	RESTAURACION DE PUERTAS EN MADERA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

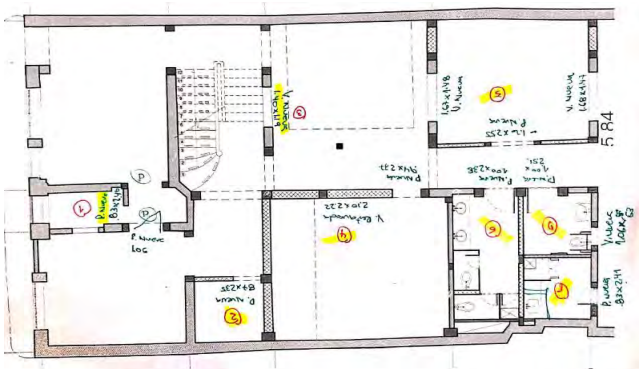

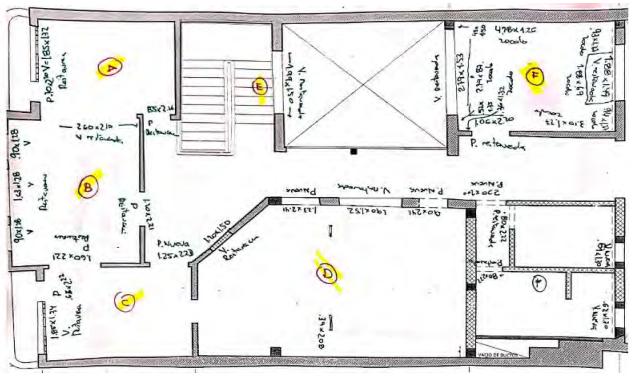

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
ESPACIO 4	RESTAURACION PUERTAS MADERA		1,20	2,20		1,00	2,64
		SEGUNDA PLANTA					
ESPACIO A	RESTAURACION PUERTAS MADERA		0,85	2,16		1,00	1,84
ESPACIO A	RESTAURACION PUERTAS MADERA		0,70	2,70		1,00	1,89
ESPACIO A	RESTAURACION PUERTAS MADERA		2,60	2,10		1,00	5,46
ESPACIO B	RESTAURACION PUERTAS MADERA		1,20	2,21		1,00	2,65
ESPACIO B	RESTAURACION PUERTAS MADERA		1,60	2,22		1,00	3,55
ESPACIO C	RESTAURACION PUERTAS MADERA		1,25	2,23		1,00	2,79
ESPACIO C	RESTAURACION PUERTAS MADERA		0,70	2,22		1,00	1,55
ESPACIO F	RESTAURACION PUERTAS MADERA		1,06	2,20		1,00	2,33
ESPACIO F	RESTAURACION PUERTAS MADERA		0,80	2,22		1,00	1,78
ESPACIO F	RESTAURACION PUERTAS MADERA		0,80	2,22		1,00	1,78

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	28,26
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	29,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**28,26**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19.2	CARPINTERIA MADERA NUEVA	**HOJA No.**	99 **de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	19.2.1	PUERTA MADERA DE 80 X 210, 85 X 210 Y 100 X 210 (Cedro o similar)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

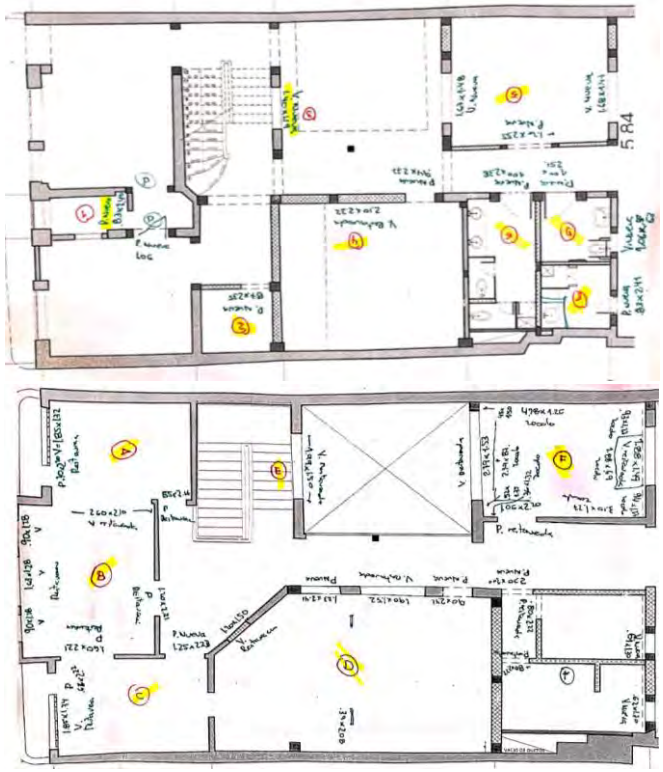

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
ESPACIO 1	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		0,83	2,40		1,00	1,99
ESPACIO 2	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		0,87	2,40		1,00	2,09
ESPACIO 4	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		0,94	2,37		1,00	2,23
ESPACIO 5	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		1,20	2,55		1,00	3,06
ESPACIO 6	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		1,00	2,38		1,00	2,38
ESPACIO 7	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		1,00	2,51		1,00	2,51
ESPACIO 8			0,83	2,42		1,00	2,01
		SEGUNDA PLANTA					
ESPACIO D	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		0,90	2,41		1,00	2,17
ESPACIO D	PUERTAS NUEVAS EN MADERA		1,23	2,41		1,00	2,96
ESPACIO F ZOCALO	CARPINTERIA MADERA NUEVA		0,52	1,39		1,00	0,72
ESPACIO F ZOCALO	CARPINTERIA MADERA NUEVA		0,36	1,32		1,00	0,48
ESPACIO F ZOCALO	CARPINTERIA MADERA NUEVA		2,79	1,52		1,00	4,24
ESPACIO F ZOCALO	CARPINTERIA MADERA NUEVA		0,45	1,50		1,00	0,68
ESPACIO F ZOCALO	CARPINTERIA MADERA NUEVA		2,60	2,00		1,00	5,20

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	32,71
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	29,20
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**32,71**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	19.2	CARPINTERIA MADERA NUEVA	**HOJA No.**	99 **de**	119
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	19.2.3	VENTANA CIRCULAS 1.00 M	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

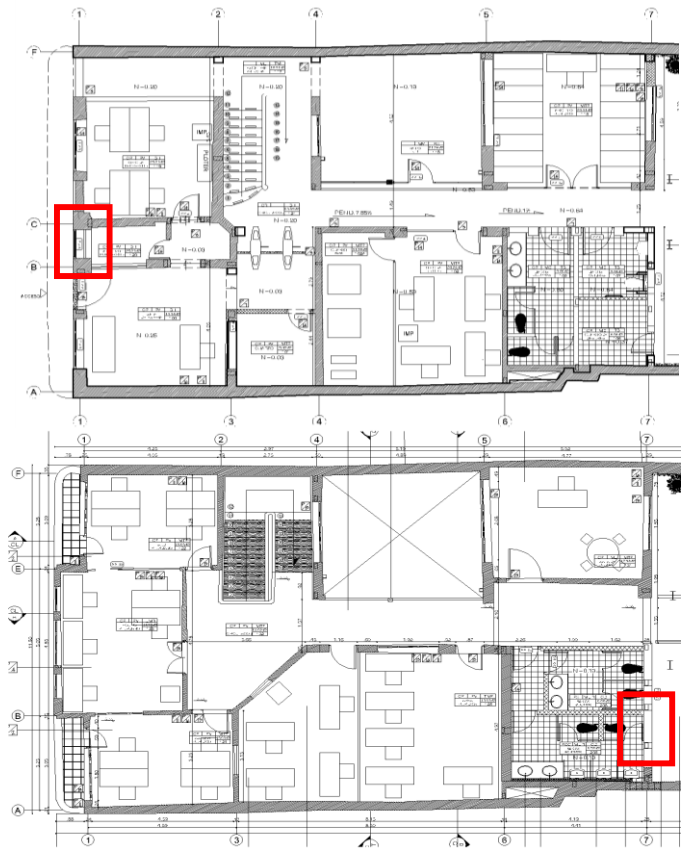

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
		PRIMER PLANTA					
FACHADA PRICIPAL	VENTANA CIRCULAS VANO FACHADA					1,00	1,00
FACHADA INTERNA PATIO 2	VENTANA CIRCULA VANO SHUT BASURAS					1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	2,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**2,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

256 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

CONSORCIO CASA TITO

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	20.1	CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELESTROSTATICA	**HOJA No.**	99	**de**	119
UNIDAD	M2	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	20.1.1	PUERTA METALICA DEPOSITOS DE 90 X 2.15 M	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

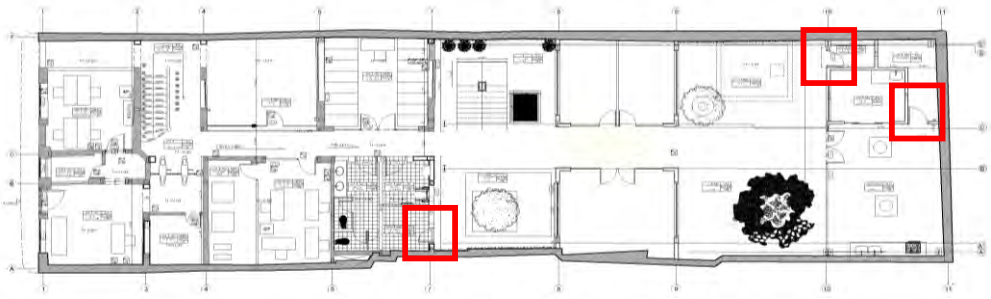

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PRIMER PLANTA							
SHUT BASURAS	PUERTA ACCESO METALICA	0,84		2,36		1,00	1,97
CUARTO ELECTRICO	PUERTA ACCESO METALICA	0,89		2,20		1,00	1,95
DEPOSITO	PUERTA ACCESO METALICA	0,90		2,20		1,00	1,98

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	5,90
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	2,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**5,90**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

257 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019			
CAPITULO	20.1	CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELESTROSTATICA	**HOJA No.**	99	**de**	119	
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR			
ITEM No.	20.1.2	PUERTA METALICA ACCESO (1,20 CM X 2,80 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20			

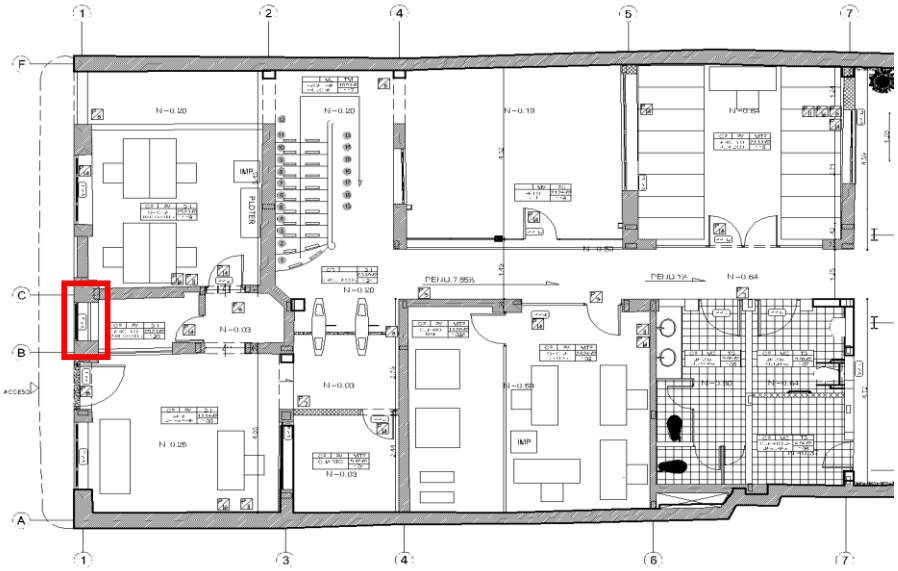

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO RECEPCION	PUERTA METALICA ACCESO		1,20	2,80		1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	20.1	CARPINTERIA METALICA CON PINTURA ELESTROSTATICA	**HOJA No.**	99 **de**	119
UNIDAD	UN	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	20.1.3	PUERTA METALICA ACCESO (1,34 CM X 2,30 cm con marco en lamina CR. CAL 16, hoja en perfil rectangular estructural 80x40x3mm; forma en 1", cerradura de seguridad, manija en forja, vidrio laminado crudo 4+4 mm sandblasting y bisagras embebidas en hoja puerta)	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

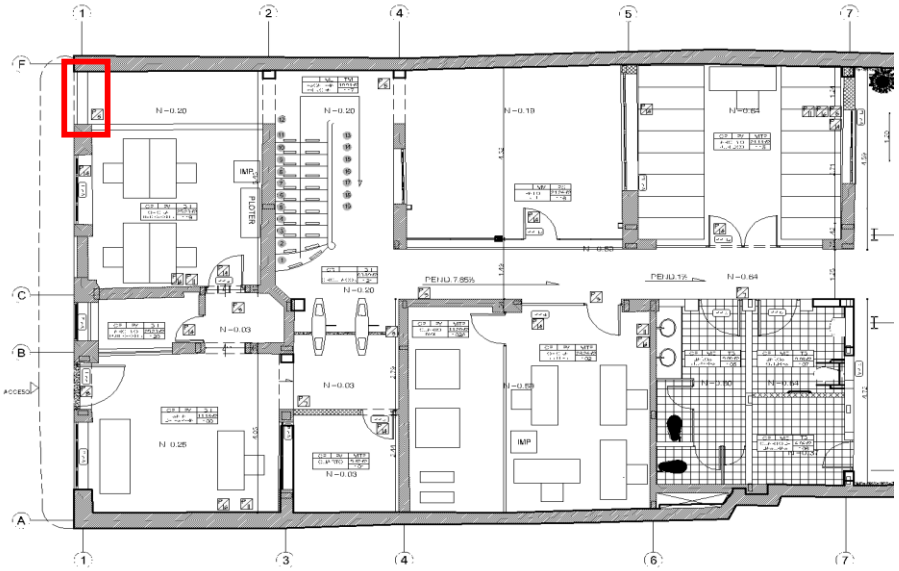

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
ACCESO RECEPCION	PUERTA METALICA ACCESO		1,34	2,30		1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	0,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	0,00	Cantidad Contractual	1,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**0,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

259 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC


INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."

MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO CASA TITO

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES		
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019	
CAPITULO	24	ASEO Y LIMPIEZA	**HOJA No.**	118 **de**	119
UNIDAD	MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR	
ITEM No.	24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20	

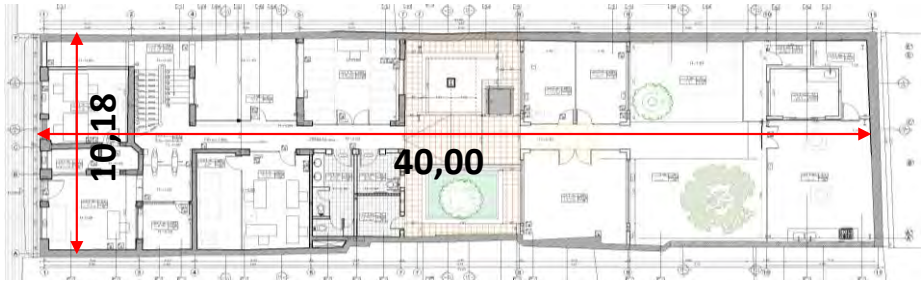



LOCALIZACION	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	%	CANT	SUB TOTAL
PROYECTO CASA TITO	ASEO GENERAL EN BIC Y OBRA NUEVA	40,00	10,80			1,00	1,00

Cantidad pagadas en los cortes	7,00	Cantidad de la Ficha No. 1 / 1	1,00
		Pasan / vienen	0,00
Cantidad pagada Corte No. 08	1,00	Cantidad Contractual	8,00
ACUMULADO EJECUTADO EN CORTES	**7,00**	**CANT. A PAGAR PRESENTE CORTE**	**1,00**

OBSERVACIONES:

ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES
Residente de obra

ARQ. LILIANA MARCELO
Residente de Interventoria.

260 BOGOTÁ INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**IDPC** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **OBJETO DEL CONTRATO:** Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C." **MEMORIAS GRAFICAS EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA**	**CONSORCIO CASA TITO**

PROYECTO:	**INTERVENCION TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE CASA TITO**		VIGENCIA DEL CONTRATO : OCHO (8) MESES			
CONTRATISTA: CONSORCIO CASA TITO	CONTRATO OBRA IDPC-OP-510-2019		**INTERVENTORIA : CONSORCIO NVP**	CONTRATO INTERVENTORIA No. 513-510-2019		
CAPITULO	24	ASEO Y LIMPIEZA	**HOJA No.**	119	**de**	119
UNIDAD	MES	**DESCRIPCIÓN**	**ZONA**	EXTERIOR		
ITEM No.	24.1.1	ASEO GENERAL DE OBRA	**CORTE No. 09**	Periodo del 12/11/20 al 11/12/20		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:		
	ARQ. CARLOS ARTEAGA JAIMES Residente de obra	**ARQ. LILIANA MARCELO** Residente de Interventoria.

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 510-2019 DE 2019

NUMERO DE INFORME	9	PERIODO	DEL	12	de	Noviembre	del	2020	AL	11	de	Diciembre	del	2020
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	510-2019	**Tipo de contrato**	Obra Pública			**Fecha de suscripción del contrato**	30	**de**	Diciembre	**del**	2019		
Modalidad de selección	Licitación Pública					**No. del proceso en el SECOP**	IDPC-LPO-07-2019						
Objeto del contrato	EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C												
Nombre / Razón social del Contratista	CONSORCIO CASA TITO			**ID.**	NIT.	901350110-1					**Naturaleza jurídica del contratista**	**Consorcio**	
Representante legal del contratista	SAMUEL EDUARDO CARRILLO ROJAS			**ID.**	C.C.	7717488							
				expedida en		Neiva							
Miembros del Consorcio o Unión Temporal (Para contratista Plural)	UNIVERSAL SEC S.A.S.			**ID.**	**NIT.**	900.460.588-6					**% Participación**	30%	
	GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S.			**ID.**	**NIT.**	830.110.735-8					**% Participación**	30%	
	VIGAR DESARROLLOS Y ASESORÍAS S.A.S			**ID.**	**NIT.**	900.057.731-6					**% Participación**	40%	
	Porcentaje de participación total										**100%**		
¿Contempla interventoría?	si	**¿Contempla anticipo?**			si			**¿Contempla retegarantía?**			si		
Nombre / Razón social Interventor	CONSOCIO NVP			**ID.**	**NIT.**	900850840-1					**Contrato asociado de la interventoría**	**513-2019**	
Represent. legal del interventor	NESTOR VARGAS PEDROZA			**ID.**	**C.C.**	79378301							
Supervisor designado	RICARDO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ			**Cargo**	Profesional Especializado								
Apoyo a la Supervisión													
Fecha de Inicio	3 de febrero de 2020	**Fecha inicial de terminación**		2 de octubre de 2020			**Fecha final de terminación**				10 de enero de 2021		
Plazo inicial del contrato	**Meses**	8	**Días**				**Plazo final del Contrato**		9 mes(es)		23 día(s)		
Valor inicial del contrato	$ 1.739.048.042,00		2100,01 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$ -				#¡DIV/0!		
Valor total del contrato	#¡DIV/0!		**Valor ejecutado por el contratista**		$ 722.467.091,00		**% de ejecución real del contrato**				faltan datos		
% Pactado de anticipo	50,00%	**Valor inicial del anticipo**	$ 869.524.021,00	**Valor anticipo por adiciones al contrato**		$ -	**Valor total anticipo**				$ 869.524.021,00		
Valor amortizado del anticipo	$ 415.136.213,50	**% amortiz.**	47,74%	**Valor de anticipo sin amortizar**		$ 454.387.807,50	**% falta x amortiz.**	52,26%					

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Suspensión	1	25 de marzo de 2020	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	16 día(s)	18 de noviembre de 2020
Prórroga	1	18 de noviembre de 2020	**Mes(es)**	0 mes(es)	**Día(s)**	8 día(s)	26 de noviembre de 2020
Prórroga	2	26 de noviembre de 2020	**Mes(es)**	1 mes(es)	**Día(s)**	15 día(s)	10 de enero de 2021
PLAZO ADICIONADO			**1 mes(es)**		**23 día(s)**		**10 de enero de 2021**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
Adición	1	26 de noviembre de 2020	$ 232.506.120,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ -**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	21-44-101315544	
Fecha de expedición	10 de enero de 2020		**Fecha de aprobación**	31 de enero de 2020	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	1	

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	9 de ene. de 2020	9/03/2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	9 de ene. de 2020	9/03/2020	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	9 de ene. de 2020	9/03/2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	9 de sep. de 2020	9/09/2025	$ 521.714.415,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	21-40-101146414			
Fecha de expedición	10 de enero de 2020		**Fecha de aprobación**	31 de enero de 2020	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la RCE inicial**				
Vigencia desde	9 de ene. de 2020	**Vigencia hasta**	9 de sep. de 2020	**Cuantía**	263340900,00 SMLMV	**Exigida en SMLMV**	300,00 SMLMV	**Exigida en %**	10,00 SMLMV

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	21-40-101146414	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Fecha de Expedición	6 de marzo de 2020
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de certificado**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento del contrato	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	3 de abr. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2023	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	2	6 de marzo de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00

Cumplimiento del contrato	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de may. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	25 de feb. de 2021	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	6	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	25 de oct. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	6	15 de mayo de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00
Cumplimiento del contrato	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de may. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de mar. de 2021	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Actualización	7	15 de mayo de 2020		3 de feb. de 2020	18 de nov. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Actualización	7	15 de mayo de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00
Cumplimiento del contrato	Prórroga	8	27 de noviembre de 2020		3 de feb. de 2020	26 de may. de 2021	$ 521.714.415,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Prórroga	8	27 de noviembre de 2020		3 de feb. de 2020	26 de mar. de 2021	$ 869.524.025,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Prórroga	8	27 de noviembre de 2020		3 de feb. de 2020	16 de nov. de 2023	$ 173.904.805,00
Estabilidad y calidad de la obra	Prórroga	8	27 de noviembre de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 521.714.415,00
Cumplimiento del contrato	Prórroga y Adición	9	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	26 de may. de 2021	$ 591.466.248,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Prórroga y Adición	9	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	26 de mar. de 2021	$ 985.777.081,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Prórroga y Adición	9	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	26 de nov. de 2023	$ 197.155.416,20
Estabilidad y calidad de la obra	Prórroga y Adición	9	1 de diciembre de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 591.466.248,60
Cumplimiento del contrato	Prórroga y Adición	10	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	10 de jul. de 2021	$ 591.466.248,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Prórroga y Adición	10	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	10 de may. de 2021	$ 985.777.081,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Prórroga y Adición	10	1 de diciembre de 2020		3 de feb. de 2020	10 de ene. de 2024	$ 197.155.416,20
Estabilidad y calidad de la obra	Prórroga y Adición	10	1 de diciembre de 2020		4 de oct. de 2020	4 de oct. de 2025	$ 591.466.248,60

A LA GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No. Póliza	21-40-101146414	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Fecha de Expedición	10 de enero de 2020
Razón de la modificación		**# de anexo modificatorio o**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Actualización		2	6 de mar. de 2020		3 de feb. de 2020	4 de oct. de 2020	263340900,00 SMLMV
Actualización		4	15 de may. de 2020		3 de feb. de 2020	18 de nov. de 2020	263340900,00 SMLMV
Prórroga		5	27 de nov. de 2020		3 de feb. de 2020	26 de nov. de 2020	263340900,00 SMLMV
Prórroga		6	1 de dic. de 2020		3 de feb. de 2020	10 de ene. de 2021	263340900,00 SMLMV

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
773	3-3-1-15-02-17-1114	140- Intervencion y conservacion de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interres cultural del Distrito Capital	25 de oct. de 2019	$ 1.780.009.078,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
1189	3-3-1-15-02-17-1114	140- Intervencion y conservacion de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interres cultural del Distrito Capital	27 de dic. de 2019	$ 1.739.048.042,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	% s./ orden	Valor Anticipo	Anotaciones	Giro Fiducia
Anticipo contrato inicial	4623	1/04/2020	0%	869.524.021		869.524.021

Concepto	Orden de pago No.	Orden de pago Fecha	Orden de pago Valor	CRP afectado	% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
PAGO #01	4639	21/04/2020	$ 8.818.113,00	1.189	0,00%	8.818.113	8.818.113		881.811	8.818.113
PAGO #02	4655	20/05/2020	$ 16.348.211,00	1.189	0,00%	16.348.211	16.348.211		1.634.821	16.348.211
PAGO #03	4691	19/08/2020	$ 19.566.396,00	1.189	0,00%	19.566.396	19.566.396		1.956.640	19.566.396
PAGO #04	4698	20/08/2020	$ 36.616.000,00	1.189	0,00%	36.616.000	36.616.000		3.661.600	36.616.000
PAGO #05	4704	17/09/2020	$ 65.100.163,00	1.189	0,00%	65.100.163	65.100.163		6.510.016	65.100.163
PAGO #06			$ 53.638.138,00		0,00%	53.638.138	53.638.138		5.363.814	48.274.324
PAGO #07			$ 114.093.724,00		0,00%	114.093.724	114.093.724		11.409.372	102.684.352
PAGO #08			$ 100.955.468,50		0,00%	100.955.469	100.955.469		10.095.547	90.859.922
TOTALES			**$ 415.136.213,50**		0,00%	**415.136.214**	**415.136.214**	**$ -**	**41.513.621**	**1.257.791.502**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 1.739.048.042	$ -	$ 1.739.048.042	$ 1.257.791.502	$ 722.467.091	41,54%	$ 307.330.878	1.016.580.951

AMORTIZACIONES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Valor total del anticipo	Valor amortizado del anticipo	% amortizado del anticipo	Valor del anticipo por amortizar	% por amortizar anticipo	Total saldo a favor del IDPC incluyendo saldo anticipo no amortizado (O173+I179)
$ 869.524.021	$ 415.136.214	47,74%	454.387.808	52,26%	1.470.968.759

Fideicomiso:		**Nombre Fiduciaria:**	Davivienda
Valor total rendimientos financieros del anticipo		**Detalle de los soportes de los rendimientos y consignación**	

INFORME DE INTERVENTORÍA DEL CONTRATO OBRA PÚBLICA No. 510-2019 DE 2019

RETENCIONES DE GARANTÍA

Porcentaje pactado de retención de garantía	Valor total retegarantía del contrato según porcentaje pactado	Valor acumulado de retegarantías realizadas	% retegarantía realizada / valor total del contrato
10,00%	$ 173.904.804,20	$ 41.513.621	2,39%

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para pago	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
				SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC	$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Si no hay multas incluir esta nota en esta celda: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Interventor / Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor / Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor/interventor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el interventor/supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; ocurridos, presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA _____

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: NESTOR VARGAS PEDROZA

CONSOCIO NVP

Revisión y Aprobación Técnica		Revisión y Aprobación Jurídica	
Proyectó:		Revisó:	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Aprobó:		Aprobó:	ASESOR (A) JURIDICO (A)
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 1 de 6

Acta de reunión – Semana 17				
Tipo de Reunión:	Comité de Obra IDPC-OB-510-2019, "cód. 607. Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."	**Ciudad**		
		Bogotá		
		Fecha		
		DD	**MM**	**AA**
		15	07	2020
Lugar:	Comité realizado de manera virtual.	**Hora Inicio**		
		2:30 pm		
		Hora finalización		
		4:30 pm		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	**Dependencia/ Entidad**	**Cargo**	**Asistencia**
*** Se anexa lista de asistencia formato GT-F03*			
Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.			
****En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 se informa que este comité de obra está siendo grabado en audio y video para control de lo informado, definido y decidido en este comité, y por lo tanto con la presente acta las personas que en esta aparecen quedan informados y aceptan que sean grabados en audio y video para el correcto desarrollo del comité de obra.*			

Orden del Día		
N°	**Temática**	**Responsable**
1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO REPORTE SST	Consorcio Casa Tito
2	REPORTE ARQUEOLOGIA	Consorcio Casa Tito
3	COMPONENTE TECNICO	Interventoría – Consorcio Casa Tito
4	COMPONENTE FINANCIERO	Interventoría

N°	Desarrollo
1	Se inicia el comité No. 17 con la asistencia de todos los participantes COMPONENTE ADMINISTRATIVO Reporte HSST Inicia con reporte de personal en obra durante la Semana:

AREA	OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	PROFESIONAL TECNICO	PERSONAL FRENTE DE OBRA	TOTAL
Consorcio Casa Tito	3	4	0	7
Arqueología	0	0	3	3
Almaros – obra civil	0	0	5	5
Jecsa Carpintería	0	0	6	6
Strumet	0	0	4	4
DPC- Eléctricos	0	0	2	2
Asesores	0	6	0	6
Interventoría Consorcio NVP	0	4	0	4
TOTAL PERSONAL EN OBRA	3	14	20	37

Reporte accidentes, incidentes y casos COVID -19
Ing. Edith Moncayo – Consorcio Casa Tito

ACCIDENTES LABORALES	0
INCIDENTES LABORALES	0
CONTACTOS DIRECTOS CASO COVID -19	0
CONTACTOS INDIRECTOS CASO COVID -19	0
CASOS SOSPECHOSO COVID -19	0
CASOS COVID -19	0

1. Charlas de Seguridad

Inducción sub contratista JECSA - maderas
Inducción sub contratista obra civil -Almaros
Charla uso y pre operacional planadora - sub contratista maderas

2. Actividades de Seguridad Industrial

Permiso alturas - monte y desmonte de andamios contratista maderas
Permiso alturas – restauración ventana patio central contratista maderas
Inspección y reposición de herramienta menor contratista obra civil
Implementación y reubicación de senderos seguros en área de excavación

3. Actividades PAPSO

Implementación protocolos de bioseguridad ingreso de contratistas, equipos y herramientas.
Seguimiento condiciones de salud

4. Actividades Ambiéntales

Jornadas de orden y aseo y limpieza y desinfección de áreas comunes diariamente.

REPORTE DE ARQUEOLOGÍA

Durante el comité de obra Felipe Gaitán dio un resumen de las intervenciones arqueológicas ejecutadas la última semana. Principalmente, el avance se centró en terminar el registro de las dos zapatas nuevas sobre el eje B en 8 y 8', la ejecución de la trinchera en el eje C' entre 7´ y 8 y el inicio de la excavación en el área noroccidental de la zona comprendida entre 8-8´ y C´-A´. En esta última zona se encontró un piso con adoquines y piedra bola el cual no se verá afectado por la excavación pues se encuentra bajo el nivel que requieren excavar.

Adicionalmente, puntualizó que no han podido trabajar en el área de los ascensores debido a que está lleno de gravilla y otro material que utilizan para fundir, razón por la que no se han iniciado las excavaciones de las zapatas ni las vigas de esta zona.

Teniendo en cuenta que aún falta excavar esa zona y el área completa del volumen dos, Felipe calcula que les debe faltar aproximadamente un mes de trabajo adicional.

Desde interventoría en arqueología se solicitó que:


1. Se garantizará que estuvieran los operarios que requiere el trabajo arqueológico según las necesidades de Felipe Gaitán, arqueólogo que dirige el trabajo. En momento de poco flujo se solicitó que mínimo hubiese un operario.


2. Se evitará la rotación de personal operario pues esto lleva a que tenga que volver a ser capacitado cada nuevo personal en el proceso arqueológico y se pierda tiempo ya ganado con el personal anterior.


   El Arq. Oscar aclara que las actividades de arqueología siempre han tenido el personal disponible, que hay que entender que, por la complejidad de los hallazgos, no siempre los obreros están en cada sitio, pero si se tienen dos arqueólogos de apoyo, adicionales a lo establecido que es uno solo.
   En cuanto a la rotación, esto se ha dado ocasionalmente por la ausencia de alguno de los operarios, adicionalmente el reemplazo no está solo siempre está bajo la supervisión de los arqueólogos.


COMPONENTE TÉCNICO

REPORTE AVANCE DE OBRA

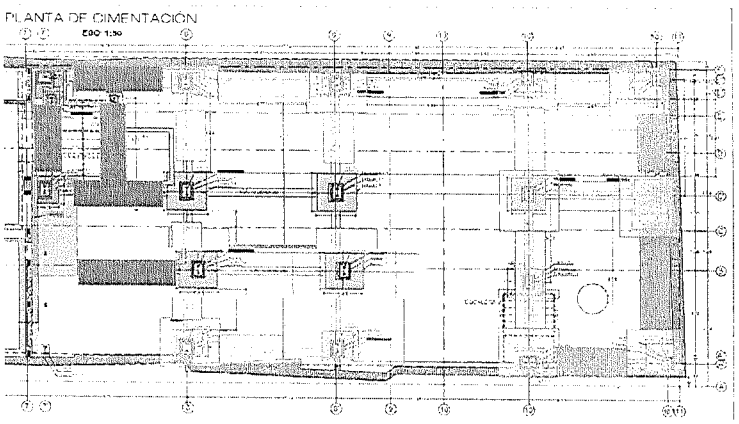


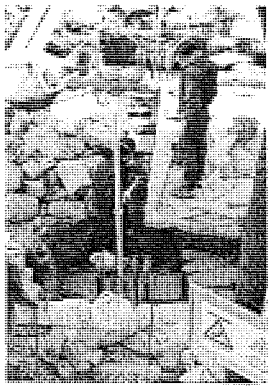

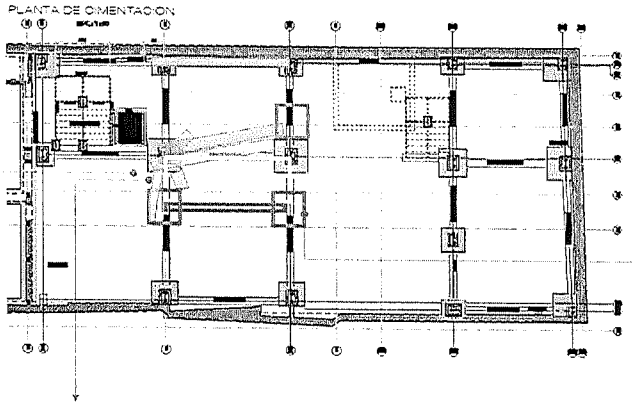







Arq. Carlos Arteaga informa las actividades ejecutadas durante este periodo fueron:

- Excavación y corte arqueológico viga y zapatas 8b-8´b´´ volumen 2 hallazgo cañuela.
- Retiro de material excavación.
- Figuración de acero
- Fundición zapatas volumen 3 toma de muestras slump cilindros
- Solado para vigas en volumen 3

- Retiro manual de pintura en aceite, proceso de restauración carpintería en madera (fachada principal).

AJUSTES ARQUITECTONICOS

Se informa que dentro de lo conversado con los directores durante la semana se decidió que ya no se haría la escalera del tercer volumen y se vuelven a conformar los espacios internos de ese volumen como antes. Arq Ricardo está haciendo ajustes a ese volumen y enviará el plano.

AJUSTES ESTRUCTURALES:

Teniendo en cuenta las solicitudes del comité anterior por definir estaban los detalles constructivos de las zapatas donde hay cañuela y ajustes pendientes de alturas de vigas y detalle de apoyo de la escalera. Ing Antonio Fuertes de interventoría comenta que viendo las fotos de las excavaciones es necesario también ver cómo se va a consolidar el suelo de la excavación amplia de arqueología, si se debe hacer con un recebo o con ciclópeo. Antonio Fuertes también considera que es importante si se van a hacer cambios importantes de ajuste al diseño se deba tener el aval del ingeniero diseñador pues es el responsable del diseño estructural de la casa, Arq. Oscar comenta que los cambios realizados no han sido mayores y sustanciales. Ing Antonio también solicita que los cambios que se hagan sean soportados también por cálculos pertinentes. Se decide conjuntamente hacer una visita de obra con directores y asesores estructurales donde se definan en campo las soluciones a los diferentes temas presentados en obra.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

Arq. Liliana Marcelo comenta que por parte de interventoría ya se entregaron observaciones a las memorias del corte 3 asimismo se revisó la reprogramación y se enviaron observaciones.
Programado 18% ejecutado 17% según ultima reprogramación

Conclusiones /Proposiciones /Varios
• Revisión de la información eléctrica por parte de interventoría • Presupuesto de cambios eléctricos • Se realizará visita de obra el viernes para solucionar detalles estructurales

Compromisos		
Actividades	**Responsable(s)**	**Fecha Limite de Realización**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 6 de 6

Ajuste de detalles estructurales	Consorcio Casa Tito	18 - 07- 2020
Visita de detalles estructurales	Consorcio Casa Tito	18 - 07- 2020
Anexos al Acta: Sí _X_ No ____	¿Cuáles? __Lista de asistencia	
Próxima Reunión: Por definir. VIRTUAL		

Leída y aprobada el acta, se firman por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	**Cargo/ Representa A**	**Firmas**
1	Ricardo Escobar	IDPC	
2	Oscar Guio	Consorcio Casa Tito	
3	Néstor Vargas Pedroza	Consorcio NVP arquitectos	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 1 de 9

Acta de reunión – Semana 18				
Tipo de Reunión:	Comité de Obra IDPC-OB-510-2019, "cód. 607. Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."	**Ciudad**		
		Bogotá		
		Fecha		
		DD	**MM**	**AA**
		22	07	2020
Lugar:	Comité realizado de manera virtual.	**Hora Inicio**		
		2:30 pm		
		Hora finalización		
		4:30 pm		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	**Dependencia/ Entidad**	**Cargo**	**Asistencia**
*** Se anexa lista de asistencia formato GT-F03*			
Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.			
****En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 se informa que este comité de obra está siendo grabado en audio y video para control de lo informado, definido y decidido en este comité, y por lo tanto con la presente acta las personas que en esta aparecen quedan informados y aceptan que sean grabados en audio y video para el correcto desarrollo del comité de obra.*			

Orden del Día		
N°	**Temática**	**Responsable**
1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO REPORTE SST	Consorcio Casa Tito
2	REPORTE ARQUEOLOGIA	Consorcio Casa Tito
3	COMPONENTE TECNICO	Interventoría – Consorcio Casa Tito
4	COMPONENTE FINANCIERO	Interventoría

N°	Desarrollo
1	Se inicia el comité No. 18 con la asistencia de todos los participantes COMPONENTE ADMINISTRATIVO Reporte HSST Inicia con reporte de personal en obra durante la Semana: 1. Inicia con reporte de personal en obra durante la Semana:

AREA	OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	PROFESIONAL TECNICO	PERSONAL FRENTE DE OBRA	TOTAL
Consorcio Casa Tito	3	4	0	**7**
Arqueología	0	0	3	**3**
Almaros – obra civil	0	0	4	**5**
Jecsa Carpintería	0	0	6	**3**
ESTRUMET	0	0	4	**4**
DPC - Eléctricos	0	0	2	**2**
Asesores	0	6	0	**6**
Interventoría Consorcio NVP	0	4	0	**4**
TOTAL PERSONAL EN OBRA	**3**	**14**	**19**	**36**

2. Reporte accidentes, incidentes y casos COVID -19

Ing. Edith Moncayo – Consorcio Casa Tito

ACCIDENTES LABORALES	0
INCIDENTES LABORALES	0
CONTACTO DIRECTOS (+) COVID -19	0
CONTACTO INDIRECTOS (+) COVID -19	0
CASOS SOSPECHOSO COVID -19	0
CASO (+) COVID -19	0

3. Charlas de Seguridad

Retro alimentación protocolos de bioseguridad
Charla uso y preoperacional de herramienta menor taladro y pulidora

4. Actividades de Seguridad Industrial

Implementación de señalización contratista de restauración maderas, para restricción de área de corte con exposición a ruido y riesgo mecánico, solo ingresa personal autorizado.
Aseguramiento zonas de excavación, reinstalación de senderos y caminos seguros, con el fin de minimizar exposición a caídas a distinto nivel, reforzado mantenimiento de orden y aseo a cargo de los grupos que adelantan actividades en el área.


5. Actividades PAPSO

Protocolo Bioseguridad PAPSO-lavado de manos-distanciamiento social-uso y limpieza de EPP-Ingreso a obra-ingreso a comedores.
Seguimiento aleatorio condiciones de salud grupo operativo, durante la jornada laboral.

6. Actividades de medio ambiente

Implementación protocolos de limpieza y desinfección contratista de escombros y proveedor de agregados en obra.

REPORTE DE ARQUEOLOGÍA

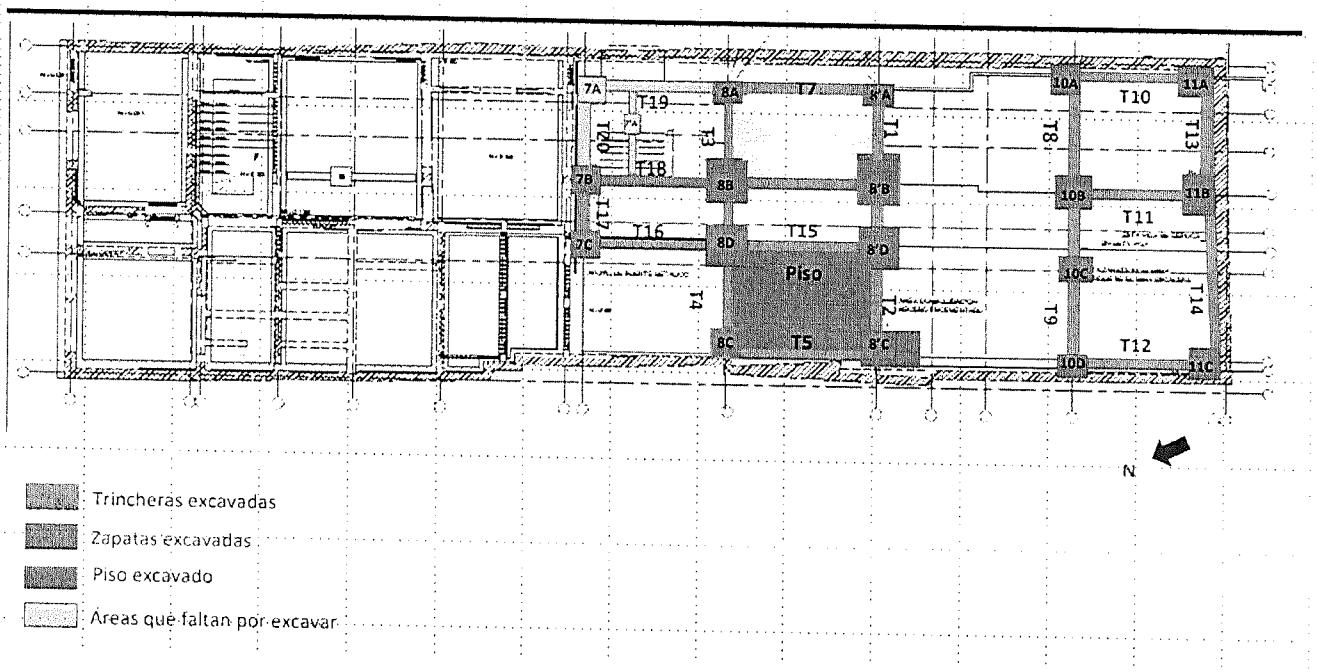

Durante el día de hoy en el comité Felipe Gaitán habló sobre los avances realizados la última semana, los cuales se centraron en:

1. Excavación del área del volumen dos entre C´-A" y 8-8", con lo cual se logró la excavación hasta los 40 cm de profundidad que requiere la nivelación de suelos y queda pendiente sólo el retiro de los bordes de dicha área, en la cual se encuentran cimientos ciclópeos que pueden ser retirados por un operario con la supervisión/monitoreo de los arqueólogos.
2. Excavación de las vigas de cimentación en el área del ascensor: a) viga en B entre 7 y 8 se excavó completamente, se registró la presencia de una cañuela que no se afecta y un tubo de gres; b) viga en C entre 7 y 8, se inició su excavación, falta demoler una caja, labor que realizará un operario.
3. Excavación de las dos zapatas en el área del ascensor. Quedan pendiente las labores que deben realizar con ayuda de operarios.

Adicionalmente, Felipe solicitó la colaboración del consorcio para que se despeje las áreas que aún


falta por excavar: otras zapatas y vigas del área del ascensor y zona del volumen 2 entre 8-8´ y E"-C´.


Carlos Arteaga mencionó que los 3 arqueólogos han estado apoyados en obra por un operario (como se mencionó en comités anteriores esto no se da constantemente, pues el apoyo del operario es intermitente cuando lo asignan a otras labores).

Liliana Marcelo también mencionó sobre la importancia de que el contratista y Felipe Gaitán encuentren un espacio para hacer el laboratorio. Quedo la tarea de que en el próximo comité deberán dar una respuesta de dónde realizarán este proceso. Sobre este laboratorio, Sandra Mendoza mencionó que será un proceso largo dado que se tiene mucho material.

ASPECTOS TÉCNICOS

REPORTE AVANCE DE OBRA

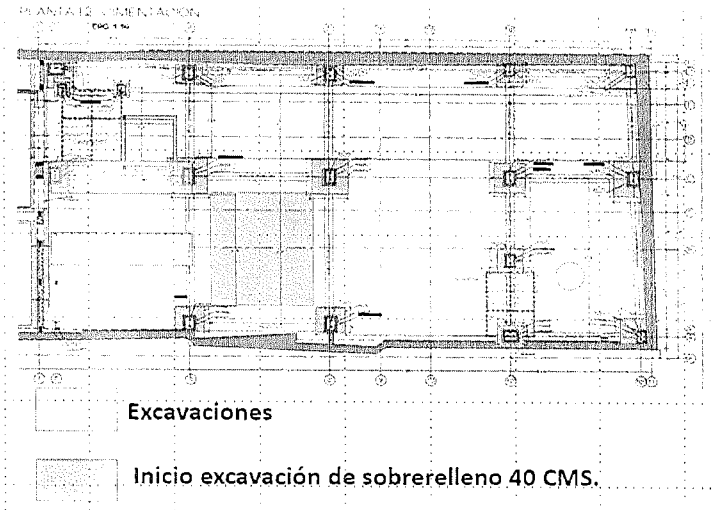

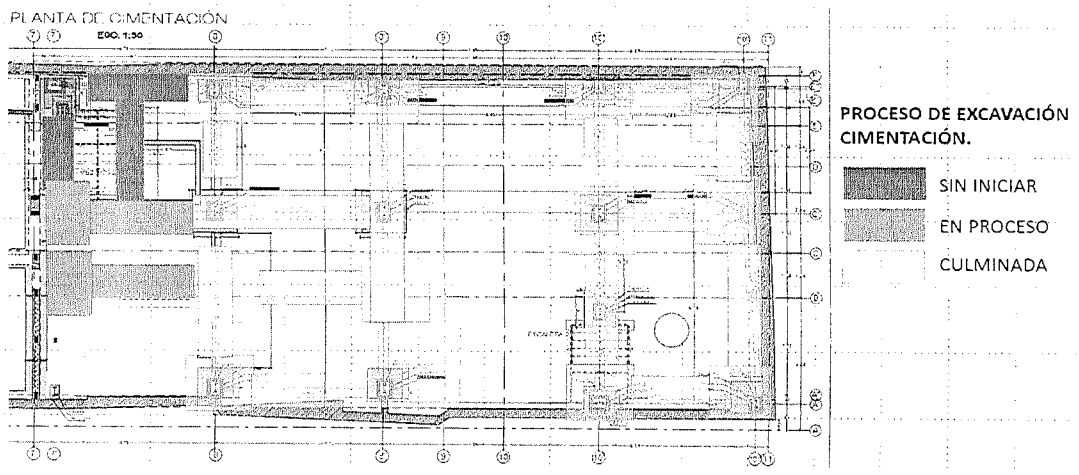

Arq. Carlos: Complementando la información que entregó Felipe por parte de arqueología, en este momento estamos en la excavación de las vigas e inicio de las zapatas del área de la escalera y del ascensor faltaría la zapata del extremo de la escalera y la viga que amarra el volumen 2. En la gráfica mostró lo que llevan en la excavación y el color rosado es el área en la que Felipe inicio con el retiro de 40cm para llegar a nivel del empedrado que se va a conservar.
Estamos armando las vigas del volumen 2 entre sobre el eje 8 y armamos zapatas y pedestal del 8-E´que fue el diseño ajustado en obra junto con asesores estructurales de interventoría y obra, a la fecha llevamos 62 días de excavaciones, con 63.20m3, personal empleado: 3 arqueólogos y 1 operario, la excavación de piso ya se inició.

Las actividades ejecutadas en la semana fueron

Instalación de toldillos en guadua y plástico para volumen 2
Eexcavación y corte arqueológico sobre relleno área occidente volumen 2 hallazgo cimientos y jardineras.
Retiro de material excavación.
Solado para vigas en volumen 2.
Figuración de acero vigas volumen 2
Rretiro manual de pintura en aceite, proceso de restauración carpintería en madera (fachada principal). elaboración de marcos e intervención de escalera principal.

Muestra fotografías de lo implementado por las lluvias para garantizar trabajos de cimentación y arqueología, procesos de limpieza de los marcos de ventanas, adicionalmente muestra las fotografías de las otras actividades realizadas en la semana.

AJUSTES TÉCNICOS:

ESTRUCTURAL:

Arq. Liliana informa, en cuanto a la cimentación para el punto fijo, zona de patio 2, en este momento se debe resolver esta cimentación con respecto a la cimentación que se hizo en la etapa anterior, se muestran en el comité dos imágenes una en planta y otra en alzado, en la etapa anterior se hizo una viga de estructuración del ciclópeo existente, en los ejes C al E, hacia el lado de ejes B al A se dejaron unas lajas de piedra que consolidaban la cimentación ciclópea.
Es importante tener en cuenta que tal y como está el diseño, la columna IPE del puente va a quedar separada del muro del BIC por 37 cms. Nuestra idea por diseño arquitectónico es que quedara más justa al muro, pero con el desarrollo de la viga, más el pedestal, más la columna va a quedar a esta distancia. Es importante plantear que como se manejará la dilatación de las dos cimentaciones. por eso es importante resolver cómo se va a hacer porque está la viga y encima está la placa actual de la casa. Se había pensado en un detalle parecido al utilizado en la zapata anterior, pero no funciona porque en el otro caso la zapata estaba muy profunda y se podía hacer, pero en este caso si se llegara a hacer lo mismo, se quedaría notando en el pedestal.

Ricardo pregunta que como afecta en relación con la escalera, Néstor: Los soportes del fuerte van a quedar separados de la casa. Ricardo: Ósea que va a quedar desplazado el eje 7´, entonces en la superior, también vamos a tener que desplazar la columna, reitera la pregunta que, si afecta la

escalera, a lo cual afirma Néstor, que no se vería afectada.
Ricardo concluye que si la columna va a quedar separada 37 cm de la fachada no es ningún problema. Liliana comenta que en el caso del costado donde está la piedra, esta tiene un ancho de 60cm, sería bueno que fuera a hilo, con el pedestal del eje C, a lo cual el Arq. Oscar comenta que tocaría partirla, porque no sabemos si está por debajo del muro, es importante partirla a la distancia de la otra, para que el pórtico quede alineado.

Ricardo recomienda hacer el trabajo cuidadosamente, para mantenernos alineados con la viga.
Néstor: recomienda hacer unas guías de corte para que sea más preciso. Oscar puntualiza que la carga que le estamos quitando a la piedra, la estamos reemplazando con el pedestal y la viga que llega ahí. Se concluye conjuntamente hacer el corte de la piedra.

Liliana comenta que falta confinar las excavaciones amplias que se hicieron para arqueología.
Oscar: El sábado vamos a rellenar con recebo común mejorado con cemento. ya que el material de excavación no es muy bueno para evitar problemas más adelante.

Sobre los planos de taller de la estructura metálica, Oscar comenta que se enviará un oficio sobre los empalmes y cortes para que Enrique Castrillón revise la propuesta. En el costado sur en el volumen 3, la estructura está soportada con amarres de platinas y con pernos, él contratista de la estructura metálica propone que por el sistema de ubicación de los pedestales no se alcanza apernar y por eso propone hacerlo soldado. También se plantean algunas soluciones para los arriostramientos en la llegada a las vigas, para ver si él lo avala.

Ricardo pregunta si ¿Es necesario solicitar la aprobación de Enrique?, pues me tocaría hacerlo por un conducto más regular lo que nos podría demorar más la respuesta. Oscar: Se puede que él dé el visto bueno o que el ing. José Gustavo haga el recalculo de la estructura a ver si cumple.
Néstor: Es mejor preguntarle al diseñador original, y seguir el conducto regular, pero cuando se revisa por parte de otro diseñador, debe basarse en un rediseño numérico, para lo cual debería hacer cálculos, pero si se hace el cambio en la obra, se debe correr el modelo para demostrar que el cambio funciona, pero si Castrillón lo avala es más rápido y podemos avanzar más rápidamente, por eso la recomendación es esa.
Ricardo solicita hacer un barrido rápido para ver si hay alguna otra inquietud, para preguntar de una vez todo. Oscar: Esa sería la última porque ya salimos de cimentación y el nivel de entrepiso ya se revisó y la revisión ya voto los resultados que tenemos. Ricardo: Si hay alguna duda por parte del interventor que sea adicional por favor pasarla para hacer la consulta.
OSCAR comenta que tendríamos como máximo una semana de tiempo de gabela para conocer la respuesta del diseñador, porque ahora estamos preparando el fundido general de la cimentación faltante, para el corte de estructura no tenemos problema, por eso tenemos alrededor de una semana larga para tener esa respuesta. En la parte posterior no hemos podido fundir porque la concretara nos ha parado el envío dos veces, por esta razón vamos a seguir adelantando actividades para fundir lo que falta de volumen dos, debemos armar el anillo, dejar los arranques para la viga del puente, pero estamos trabajando para ver si el viernes y sábado podemos fundir la cimentación completa de los dos volúmenes.

En cuanto al tema eléctrico, Liliana informa que el constructor envió los planos el sábado, nuestro asesor los está revisando y solicitó unos planos en AutoCAD que enviaron el día de hoy, ya los

reenviamos al Ing. William y ya está en proceso de revisión.

Sobre la revisión del inventario de maderas se concluye que Ricardo pasará a revisar el inventario realizado por los residentes el día de mañana.

Otro tema a solicitar y el cual actualmente está representando atraso es la actualización de los diseños hidrosanitarios, por lo cual solicitamos nos lo hagan llegar a la mayor brevedad.
Oscar: Estuvimos trabajando toda la mañana en eso y se están haciendo los ajustes para enviarlos.

ASPECTOS FINANCIEROS

PROGRAMACIÓN:

Liliana informa que en lo revisado para la semana se presenta un atraso en la programación: Programado 25.8% y ejecutado 17.1%, las actividades que en este momento generan atraso son: estructura metálica, concreto de zapatas, concreto de pedestales, pañetes, cielo raso, estucos, guarda escobas, instalaciones eléctricas, carpintería madera, acometidas, carpintería metálica y ajustes de diseños. Algunas de estas actividades son observaciones a la reprogramación, algunas estaban mal programadas, por eso lo menciono. Es importante revisar lo del concreto que ya está retrasado. ¿Más o menos ustedes dicen cuando pasan la reprogramación?

OSCAR: Ese tema ya lo estamos tratando, estamos elaborando una nueva reprogramación, teniendo en cuenta las decisiones principalmente en cuanto a los tiempos de arqueología, incluir también lo que se decida este viernes podemos tener la reprogramación con todos los ajustes, esperamos que no tengamos más imprevistos para poder cumplir con la nueva programación que estamos haciendo.

En cuanto a la revisión de los APUS contractuales, Néstor informa: Nos enviaron los apus que está revisando Cristian, ya él nos dice qué revisando los APUS de la entidad versus apus manejados en diversos proyectos, no hay tanta diferencia entre cuadrillas y mano de obra. En cuanto al análisis de cuadrilla, Ricardo nos envió un análisis de cuadrilla en el que se basaron para la estructuración, allí la hora da a $19.135, a nosotros nos había dado $19.286, o sea como 150 pesos de diferencia que no es mucho, está muy parecido. Por lo cual solicitamos al contratista se ajusten los APUS más aterrizado al mercado y a la base que tiene la entidad. Oscar menciona que nuevamente comentará con el personal administrativo para que se hagan los ajustes pertinentes y comenta además que están haciendo la revisión de la parte eléctrica y que hay un aumento considerable en las cantidades de la parte eléctrica. Néstor: Solicita que lo envíen lo más pronto posible para avanzar con los APUS.

Estamos a la espera del último balance para hacer la revisión eléctrica.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMES DE OBRA:

Liliana: En cuanto a los informes, nosotros solicitamos al contratista que nos lo enviaran a más tardar el 25 de cada mes para poderlo revisar y enviarlo a Jair a tiempo para que tanto él, como nosotros

tengamos el tiempo suficiente para revisar.
Carlos solicita que se puedan entregar memorias parciales para ir revisando e ir avanzando.
A lo cual Liliana indica que es mejor que nos entreguen la última versión para no hacer reprocesos de revisión en caso de haber nuevos cambios, por eso si entregan el 25 sería un tiempo prudente para revisar. Néstor agrega que se deben tener en cuenta que tenemos más labores y hay que preparar los informes de interventoría con esa información actualizada, por eso es mejor que lleguen en una sola entrega. Oscar solicita que en lo posible hacer las mediciones conciliadas para no presentar errores en las memorias, por eso no debería haber problemas con las cantidades. Liliana agrega que el problema no son las mediciones sino en sí la entrega de las memorias.

VARIOS

He estado hablando con la Arqueóloga Patricia y ella me comenta que hay un problema con el lugar donde vayan los arqueólogos a tratar lo del laboratorio, Felipe tenía algunas opciones pero no las ha podido concretar porque tienen mucho material arqueológico, por eso sería bueno que el contratista destinara un lugar para hacer todo el lavado y lo del laboratorio, en teoría excavaciones faltaría menos de un mes y por eso es importante tenerlo listo para que más adelante no vaya a ser un tema que genere retrasos. Ricardo: Ese sería un tema a resolver por el contratista. Liliana: Por eso solicitamos al contratista que vaya pensando donde va a ser el proceso para ese laboratorio.
Néstor: Pregunta para cuándo pueden definir ese lugar. Carlos: Para el próximo comité ya debemos tenerlo definido.

ACTAS DE COMITÉ
Liliana: Solicita el favor a los directores para la firma digital de las actas de comité. Oscar: Nosotros estamos haciendo unas pequeñas observaciones, las imprimimos y las firmamos, para que en cualquier momento que pasen los directores o Ricardo, puedan firmarlas.

Conclusiones /Proposiciones /Varios
• Revisión de lugar de laboratorio para arqueólogos • Entrega de oficio con propuesta de ajuste a conexiones metálicas • Se realizará visita de obra el viernes para solucionar detalles estructurales

Compromisos		
Actividades	**Responsable(s)**	**Fecha Limite de Realización**
Entrega de informes y corte 25 de c/mes	Consorcio Casa Tito	25 - 07- 2020
Ajustes de APUS	Consorcio Casa Tito	25 - 07- 2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 9 de 9

Entrega de oficio de ajustes estr. metálica	Consorcio Casa Tito	25 - 07- 2020
Anexos al Acta: Sí __ No __X___	¿Cuáles? __Lista de asistencia	
Próxima Reunión: Por definir. VIRTUAL		

Leída y aprobada el acta, se firman por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	**Cargo/ Representa A**	**Firmas**
1	Ricardo Escobar	IDPC	
2	Oscar Guio	Consorcio Casa Tito	
3	Néstor Vargas Pedroza	Consorcio NVP arquitectos	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 1 de 9

Acta de reunión – Semana 19				
Tipo de Reunión:	Comité de Obra IDPC-OB-510-2019, "cód. 607. Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 b n° 2-91 denominado Casa Tito, localizada en la ciudad de Bogotá D.C."	**Ciudad**		
		Bogotá		
		Fecha		
		DD	**MM**	**AA**
		29	07	2020
Lugar:	Comité realizado de manera virtual.	**Hora Inicio**		
		2:30 pm		
		Hora finalización		
		4:30 pm		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	**Dependencia/ Entidad**	**Cargo**	**Asistencia**
*** Se anexa lista de asistencia formato GT-F03*			
Nota si se requiere, anexar lista de asistencia o inserte las filas que considere.			
****En cumplimiento de la ley 1581 de 2012 se informa que este comité de obra está siendo grabado en audio y video para control de lo informado, definido y decidido en este comité, y por lo tanto con la presente acta las personas que en esta aparecen quedan informados y aceptan que sean grabados en audio y video para el correcto desarrollo del comité de obra.*			

Orden del Día		
N°	**Temática**	**Responsable**
1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO REPORTE SST	Consorcio Casa Tito
2	REPORTE ARQUEOLOGIA	Consorcio Casa Tito
3	COMPONENTE TECNICO	Interventoría – Consorcio Casa Tito
4	COMPONENTE FINANCIERO	Interventoría

N°	Desarrollo
1	Se inicia el comité No. 19 con la asistencia de todos los participantes COMPONENTE ADMINISTRATIVO Reporte HSST Inicia con reporte de personal en obra durante la Semana:

AREA	OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	PROFESIONAL TECNICO	PERSONAL FRENTE DE OBRA	TOTAL
Consorcio Casa Tito	3	4	0	**7**
Arqueología	0	0	3	**3**
Almaros – obra civil	0	0	6	**6**
Jecsa Carpintería	0	0	6	**6**
ESTRUMET	0	0	4	**4**
DPC – Eléctricos	0	0	2	**2**
Asesores	0	6	0	**6**
Interventoría Consorcio NVP	0	4	0	**4**
TOTAL PERSONAL EN OBRA	**3**	**14**	**21**	**38**

1. Reporte accidentes, incidentes y casos COVID -19

Ing. Edith Moncayo – Consorcio Casa Tito
Informa que a dados los incidentes recurrentes por parte del sub contratista de Arqueología, y los resultados de las investigaciones de los mismos, entran en un periodo de seguimiento a solicitud de la Residente de HSST de la Interventoría Ing. Lili Johanna Vidales Vidales, ya que se considera personal con alto riesgo de accidentalidad para el proyecto, dados los continuos desacatos en temas de seguridad frente a lo dispuesto por la ley en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a la implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que Implementa el Consorcio Casa Tito y al cual se vinculan los subcontratistas según la los términos contractuales.

ACCIDENTES LABORALES	0
INCIDENTES LABORALES	3
CONTACTOS DIRECTOS CASO COVID -19	0
CONTACTOS INDIRECTOS CASO COVID -19	0
CASOS SOSPECHOSO COVID -19	0
CASOS COVID -19	0

Durante esta semana se presentaron 3 incidentes con el personal de arqueología, en temas de señalización y manejo de herramientas.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Se realiza reunión con el contratista Felipe Gaitán, su asistente Daniela Trujillo, la residente SST De interventoría, el director de obra, residente de obra y la residente SST de Consorcio Casa TITO, se socializan actos y agravantes de seguridad al manipular herramientas sin autorización, se hace llamado de atención al sub contratista al respecto.

2. **Charlas de Seguridad**

Inducción y protocolos de bioseguridad contratista obra civil
Charla de seguridad de reporte accidentes, incidentes, actos y condiciones inseguras
Charla de seguridad de riesgo mecánico, re inducción de pre-operacionales e inspecciones de herramientas

3. Actividades de Seguridad Industrial

Implementación de señalización contratista de restauración de maderas, para restricción de personal autorizado y zona de exposición a ruido
Jornadas de orden y aseo contratistas de obra civil y restauración de maderas


4. Actividades PAPSO

Implementación protocolo bioseguridad ingreso de contratistas de escombros
Seguimiento a condiciones de salud

5. Actividades de medio ambiente

Actividades de orden y aseo

REPORTE DE ARQUEOLOGÍA

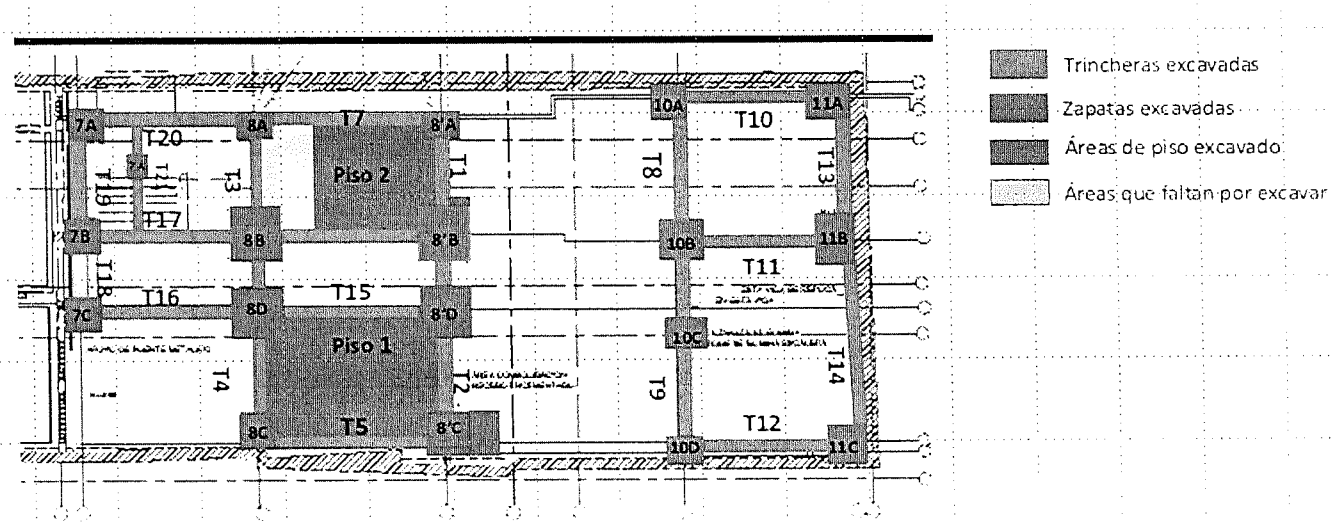

Felipe Gaitán menciona que prácticamente las excavaciones de arqueología están en un 100%. Falta la trinchera del vano ubicada en la entrada del área de excavación (eje 7´entre E" y C´, demarcada en arqueología como T180) y una zona de los pisos entre los ejes 8-8´ y E"-C´.
Felipe Gaitán solicita a Néstor Vargas y a Ricardo Escobar si se puede realizar el levantamiento de las estructuras en:


- Zapata 7´- E". Se acuerda que se puede demoler, levantar y recuperar los materiales.

- Trinchera en eje 7" - D´. En la zona del ascensor. Acá se encuentra una caja de aguas que está tapada con basura resiente. Se acuerda verificar cómo se puede evitar la demolición de esa caja de agua.

Felipe especifico que el espacio que necesitan para realizar el laboratorio debe tener las siguientes características:

- Un espacio amplio con una mesa y sillas más o menos de la dimensión de la del comedor de Tito.
- Luz natural y artificial suficiente.
- Ventilación natural, es decir, ventanas que se puedan abrir para que el flujo de aire ayude en el proceso de secado lento del material.
- Acceso a agua corriente abundante.
- Sifón amplio para que no se tape con el barro.

Ricardo Escobar hace mención de que es responsabilidad del contratista buscar un espacio para realizar el laboratorio. Oscar Guio menciona que el Consorcio Casa Tito está adecuando la bodega de materiales que tienen cerca de la Casa Tito para realizar dicho laboratorio.

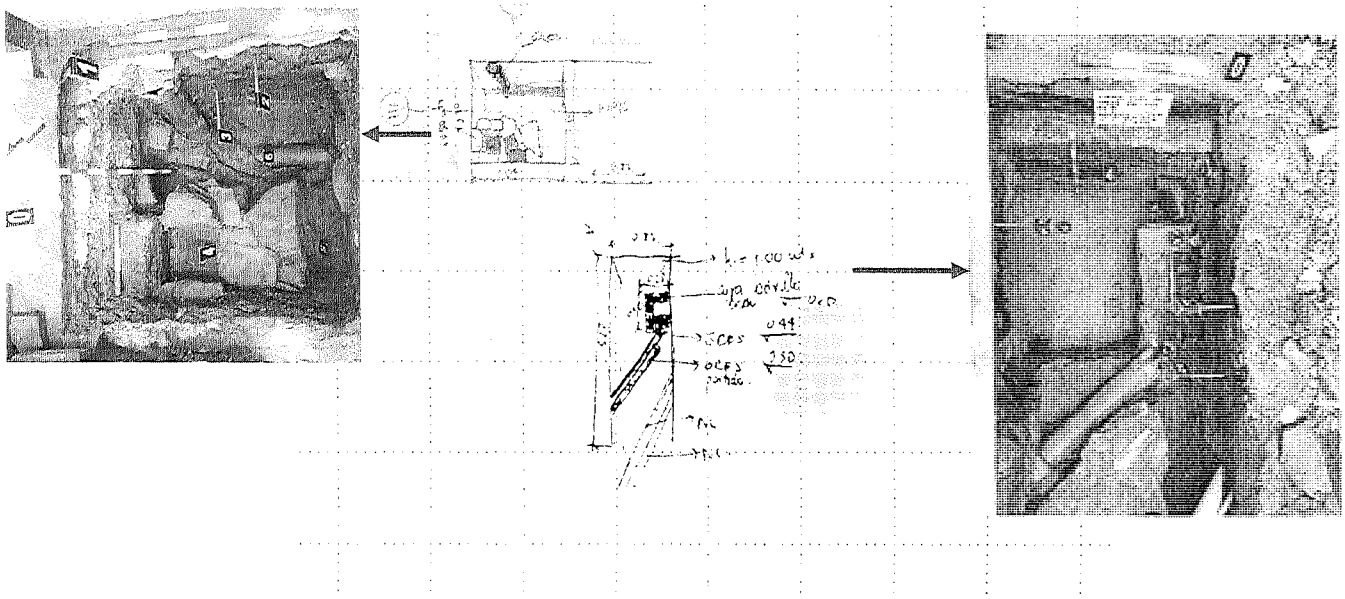


Sobre la definición de la cañuela encontrada en el área del punto fijo, Ricardo comenta que evaluó los esquemas que le presentaron los residentes de obra y que en este caso hay que sacrificar algo teniendo en cuenta que no hay par donde correrse, si se pueden conservar sería muy bueno, pero

sino toca sacrificar. Néstor comenta que la zapata del eje 7´-E´ que está a la izquierda se va a dejar prevista para una cubierta eventual de ese patio, tiene inquietud sobre el tubo marcado con el número 6, de que no pasa agua por ahí, el resto parece que no hay inconveniente, pero le preocupa ese tubo. Oscar: Comenta que ya se verificó y no tiene flujos de agua ni de corriente, de pronto puede haber uno por el tubo que está en la esquina que parece ser el desagüe de la matera que hay en el muro, y se puede manejar con una tubería, encausarlo y llevarlo a la tubería prevista.

Néstor: En cuanto a la tubería de la derecha es relativamente sencillo desplazarla hacia el norte unos 20cm. Oscar: Se podría trabajar, teniendo en cuenta que como esa es la zapata del eje central de la escalera, la zapata es centrada y la podríamos correr para que funcione excéntrica.
Néstor: Se podría correr la zapata entera con escalera y todo. Óscar: Queda muy pegada la escalera al volumen, o sino aplicar la solución de excentricidad ya que se ha aplicado en otros lados y ha funcionado bien. Liliana: La idea es moverla al lado izquierdo, pero actualmente hay 60cm del muro del BIC, se podría correr 0.25m.Óscar: Lo mejor sería hacer la zapata excéntrica, para que no quede muy encima del resto de elementos.

Ricardo: pregunta cómo quedaría la columna. Óscar: La columna quedaría en el mismo sitio, no la cambiamos. Finalmente se decide que Ricardo visitará la obra y con los residentes se tomará una decisión.

ASPECTOS TÉCNICOS

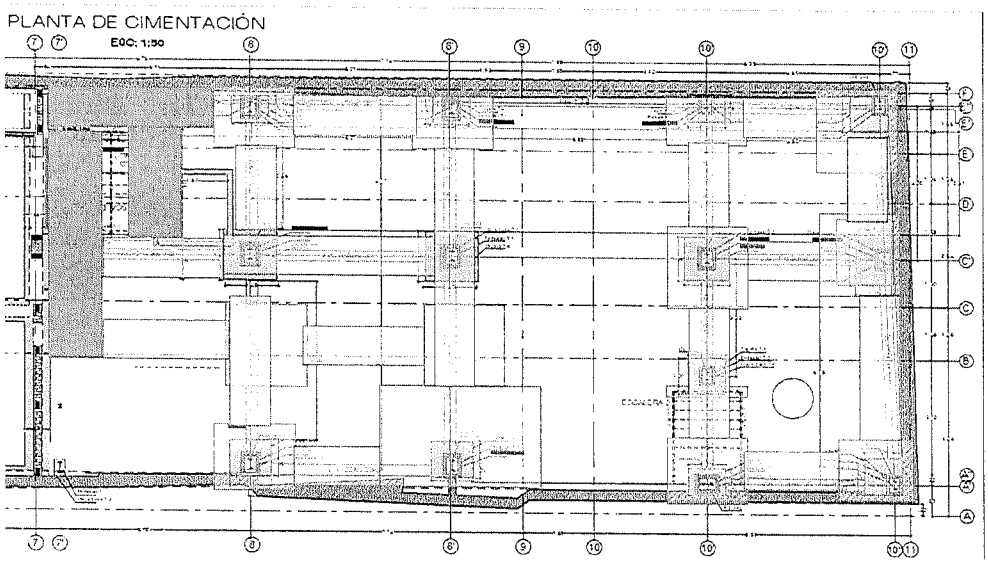

REPORTE AVANCE DE OBRA

Arq. Carlos Arteaga informa que las actividades realizadas durante la semana fueron:

- Figuración y armado de vigas de cimentación volumen 2
- Excavación y corte arqueológico área de escaleras y ascensor hallazgo de caja de inspección y tubería.
- Concreto de zapatas 8e´y 8´a´
- Retiro de material excavación.
- Solado para vigas en volumen 2.
- Instalación de platinas guías y pernos en pedestales volumen 2
- Fabricación e instalación formaleta pedestales y vigas volumen 2
- Retiro manual de pintura en aceite, proceso de restauración carpintería en madera (fachada principal). Elaboración de marcos en puertas y ventanas e intervención de escalera principal. Protección de barandas y pasos en cartón.
- Concreto de cimentación volumen 2 y 3 (pedestales y vigas) 15,30 m3 12pedestales 13 vigas

Se exponen fotografías de los procesos mencionados durante esta semana.

Estamos en el proceso de cimentación del área de punto fijo y ascensor, en esta semana se hizo la excavación del punto fijo y arriba la excavación del relleno que había que retirar para compensar con recebo y placa de contrapiso, el sábado pasado se fundieron las zapatas del volumen 2 (8E´y 8´A ´), que eran las únicas que faltaban del volumen 2.
Esta semana se realizó armado vigas y pedestales en formaleta.
Al día de hoy llevamos 69 días de excavación, ejecutados 73.20m3, personal: 2 arqueólogos y 2 operarios.

Arq.Oscar comenta: Con esto damos por terminada la etapa de cimentación del volumen 2, quedan pendientes las vigas del punto fijo, mañana comenzamos con el retiro de escombros y comenzar a hacer los llenos con el recebo común, para aprovechar la próxima semana para empezar la etapa de estructura metálica.

AJUSTES TÉCNICOS:

ELECTRICO:

Arq. Liliana informa que el ing. Luis y el ing. William se reunieron para revisar el estado del proyecto eléctrico.
Ing. William comenta: Se le hicieron unas sugerencias para que el ing. Luis, las asumiera en el diseño, sobre cableado estructurado, canaleta y diagrama unifilar, para entregarlo totalmente terminado como lo requiere el RETIE y RETILAP, nosotros debemos confirmarle donde son los puestos definitivos y él entregaría el diseño como está en este momento, es importante desde el punto de vista de arquitectura para que pueda terminarlo como se requiere.
Arq. Liliana manifiesta que ya se revisó con él Arq. Ricardo sobre la definición de puestos de trabajo, donde van a quedar ubicados, y ya el contratista está trabajando sobre esos diseños, sin embargo, está pendiente que se ajuste a los planos de iluminación de acuerdo a los últimos puestos de trabajo.

Ing. William: el ingeniero Luis, ajustó a la acometida que tenemos hoy, creo que queda ok, el Ing. igual está tramitando la factibilidad de servicios desde hace tiempo, para el aumento de carga pequeño a 30Kva. Ing. Luis comenta que aún no ha habido respuesta de eso por parte de la Entidad.

Ing. Samuel: pregunta a Ing. Luis Osma, sobre cuando entregaría la respuesta a esas ultimas observaciones, Ing, Luis: Manifiesta que si los puntos de los puestos de trabajo, no cambian ya entregaría todo para el próximo comité, las observaciones que me realizaron sobre la iluminación, las entregaría el próximo miércoles, completo con todas las memorias y todo.

Ing. Luis: comenta que dentro de las observaciones hay un tema sobre red contra incendios y CCTV, que no aplica porque no está dentro del alcance del Consorcio. A lo cual el Arq. Ricardo: Nosotros dejamos puntos en la obra anterior, prevista todas las cámaras de la casa original, la idea es que en los volúmenes dos y 3 se haga el diseño de esas zonas para poderlo ejecutar, por lo menos dejar la ductería, si es que no hay cámaras en el contrato y se puede dejar cableado con UTP, pregunta si es posible dejarlo con lo que está en el contrato, igual hay que revisarlo en el presupuesto. La idea es que si dejan la tubería queden guías para que pasen los cables.
Ing. Luis: Para eso el de seguridad debe dejar los puntos para saber dónde van a quedar las cajas de salida.
Arq. Ricardo comenta que ser mirará con Liliana el plano para definir donde van las cajas, que van a RACK, pero debe haber un punto a la recepción.

Arq. Ricardo pregunta sobre la señalización de las rutas de evacuación que deben ir con unos display iluminados e iluminación emergente. Ing. William: Aclara que hay de emergencia y de señalización, ya que la diferencia es que los de emergencia ilumina los recorridos de las evacuaciones y las de señalización son el aviso de salida que muestra hacia donde va.
Arq. Ricardo comenta que no se ha revisado, debemos mirarlo en un pleno con Liliana y con Carlos para definir la ubicación.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Arq. Liliana: Esta semana pasamos a revisión de Jair los informes, ya Jair hizo unas observaciones, que se están subsanando. Arq. Ricardo: Jair me dice que se están cometiendo algunos errores en la forma de presentar los documentos que hay que presentar, todos ya hemos tenido obras en común anteriormente y no entiendo porque se están generando esos reprocesos.

Arq. Liliana concluye que se van a mejorar los procesos de revisión para no cometer errores en las entregas también comenta que el sábado pasado el contratista envió las memorias del corte 4, estamos revisando y ambos estamos adelantando nuestros informes para el informe 4.

Arq. Ricardo le pregunta a Jair el estado de los informes y con cortes de obra para pagos. Jair responde: el consorcio informó el PAC de este mes y hoy pasé los datos para que radicaran el tercer pago de obra, ahora voy a empezar a revisar el cuarto de interventoría y en estos días me deben empezar a enviar el pago 4 de obra y el 5 de interventoría para poderlo radicar que está programado para principio del mes de agosto.

	Ricardo pregunta cuáles son las fechas pactadas con interventoría y con obra. Jair: Yo reviso lo que tengo y envío mañana las observaciones. Ricardo: comenta que hay unos informes semanales de obra y de interventoría asociados a las actas, solicito que se pongan de acuerdo porque creo que estamos atrasados en los informes semanales. A lo cual Liliana comenta: Nosotros tenemos el seguimiento semanal, faltaban los semanales de obra y ellos se están poniendo al día con estos informes. **PROGRAMACIÓN:** Arq. Liliana: Hoy nos hicieron llegar la reprogramación al final de la mañana y la revisaremos, respecto a la anterior, tenemos programado un 29.7% y estamos en el 18.6%, con un atraso de 11.6%, esto con la que hemos venido manejando, no con la reprogramación nueva. El Arq. Oscar aclara que estos porcentajes se deben ajustar es con la reprogramación, entendiendo la incidencia que ha tenido el tema arqueológico, que motivo esta reprogramación.



Conclusiones /Proposiciones /Varios
SST: Se hará un comité entre interventoría y obra para tratar los temas minuciosos y en el comité general solo hablaran las conclusiones. OBRA CIVIL: Verificación de algunas tuberías encontradas y proceder al desmonte de los elementos descritos en comité. Iniciamos la poda de los árboles de la parte posterior. ELECTRICA: Subsanar las observaciones de la parte eléctrica y entregarlas el próximo lunes. ADMINISTRATIVO: Terminar de trabajar en el informe 4 para poderlo radicar la otra semana y revisar la reprogramación.

Compromisos		
Actividades	**Responsable(s)**	**Fecha Limite de Realización**
Entrega de informes y corte 25 de c/mes	Consorcio Casa Tito	25 - 08- 2020
Entrega de subsanación de observaciones eléctricas	Consorcio Casa Tito	03 - 08- 2020
Informe 4 de obra y 5 de interventoría	Consorcio Casa Tito - Interventoría	05 - 08- 2020
Anexos al Acta: Sí __ No __X__	¿Cuáles? __Lista de asistencia	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	ACTA	Código: GD-F01
		Versión: 4
		Pág. 9 de 9

Próxima Reunión: Por definir. VIRTUAL

Leída y aprobada el acta, se firman por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	**Cargo/ Representa A**	**Firmas**
1	Ricardo Escobar	IDPC	
2	Oscar Guio	Consorcio Casa Tito	
3	Néstor Vargas Pedroza	Consorcio NVP arquitectos	

CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
NIT	860.506.170-776
ORDENADOR(A) DEL GASTO DESIGNADO	MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ- Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio- Nombrado mediante Resolución N° 134 del 30 de marzo de 2020 y posesionado con Acta Nº 005 del 1º de abril de 2020.
FACULTAD PARA CONTRATAR	Resolución Nº 285 del 6 de julio de 2020
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP
NIT	900850840-1
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA
C.C. Nº	79'378.301 de Bogotá D.C.
VALOR INICIAL :	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($304.991.090 M/L)
FECHA DE INICIO:	TRES (3) DE FEBRERO DE 2020
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSION Nº 1	DESDE EL VEINTISEIS (26) DE MARZO DE 2020 HASTA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2020
REINICIO Nº 1	DEICISEIS (16) DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA REINICIO Nº 1	VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2020
AMPLIACION DE LA SUSPENSION Nº 1	HASTA EL VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE 2020
REINICIO Nº 2	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA REINICIO Nº 2	SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2020
ADICION Nº 1:	NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL (90'445.190 M/L)
PRORROGA Nº 1:	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA PRORROGA Nº 1	SEIS (6) DE FEBRERO DE 2021
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
VALOR TOTAL INCLUIDA ADICION Nº 1	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL ($395'436.280 M/L)
SUPERVISIÓN:	RICARDO ESCOBAR ALVAREZ

CONSIDERACIONES:

Entre los suscritos **MARIA CLAUDIA VARGAS MARTINEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía Nº 39'791.978 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL —IDPC- con NIT 860.506.170.7**,** con nombramiento a través Resolución N° 134 del 30 de marzo de 2020 y posesionado con Acta Nº 005 del 1º de abril de 2020, y, Resolución para contratar Nº 285 de fecha seis (6) de julio de 2020, quien en adelante se denominara **EL INSTITUTO O CONTRATANTE** y, par otra parte **NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 79'378.301 de Bogotá D.C., quien actúa como Representante Legal del **CONSORCIO NVP,** identificado con NIT 900850840-1 y conformado por NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 79'378.301 de Bogotá D.C., con una participación del cincuenta por ciento (50%), y NESTOR ADEL VARGAS PEDROZA, ya identificado, actuando como Representante Legal de la Empresa NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S.A.S., identificada con NIT 900805973-1, con una participación del cincuenta por ciento (50%), quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente Adición Nº 1 y Prorroga N° 1 al Contrato de Interventoría N° 513 de 2019, previa las siguientes consideraciones: **1** El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, y el CONSORCIO NVP, celebraron el Contrato de Interventoría Nº 513-2019 que tiene como objeto: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.",* lo anterior, de conformidad con la Resolución Nº 0915 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019 correspondiente al proceso IDPC-CMA-010-2019, y atendiendo la oferta presentada por el Contratista, se estipulo como valor del contrato la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($304.991.090 M/L). **2** El plazo de ejecución inicial del contrato fue por nueve (9) meses a partir de la firma del Acta de Inicio, la cual se suscribió el tres (3) de febrero de 2020. **3** El día veintiséis (26) de marzo de 2020 se suscribe Acta de Suspensión Nº 1 a través de cual se establece: *"Suspender la ejecución del Contrato de Interventoría Nº IDPC-INT-513-2019, desde el 26 de marzo de 2020 hasta el 16 de abril de 2020".* **4** El día dieciséis (16) de abril de 2020 se suscribe a través de la Plataforma SECOP II el reinicio del Contrato. **5** El día dieciséis (16) de abril de 2020 se suscribe Acta de Ampliación de la Suspensión Nº 1 estableciendo sobre el particular lo siguiente: *"Prorrogar la suspensión N°1 del Contrato de Interventoría N° IDPC-INT-513-2019 hasta el 29 de abril de 2020".* **6** El día veintiocho (28) de abril de 2020 se suscribe la correspondiente Acta de Reinicio. **7** Mediante Oficio Nº 067-20-NVP-TITO de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020 con radicado interno Orfeo Nº 20205110071542 de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020 el CONSORCIO NVP eleva solicitud de adición y prórroga al Contrato de Interventoría Nº IDPC-INT-513-2019, y, presenta como soportes los documentos que se relacionan en el citado documento, los cuales hacen parte integral del presente documento. **8** Mediante memorando Nº 20203070058643 de fecha treinta (30) de noviembre de 2020 la Supervisión del Contrato de Interventoría Nº IDPC-INT-513-2020 eleva solicitud de Adición y Prórroga a la Doctora María Claudia Vargas Martínez, quien actúa en su condición de Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, lo anterior, en los siguientes términos: *"De manera atenta recomiendo surtir las modificaciones solicitadas por la Interventoría, Contrato No. IDPC-INT-513-2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1** El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, y el CONSORCIO NVP, celebraron el contrato de Interventoría No. **IDPC-INT-513-2019,** que tiene como objeto "**Realizar la Interventoría integral de la obra que tiene por objeto Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12 B No 2 - 91 denominada Casa Tito, localizada en la Ciudad de Bogotá D.C**". **2** De conformidad con la Cláusula segunda del Contrato **IDPC-INT-513-2019,** y atendiendo la oferta presentada por el Contratista, se estipulo como valor del contrato la suma de **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS***

NOVENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($304.991.090 M/CTE). 3 *Que de conformidad con la comunicación con radicado Orfeo N° **20205110071542** del 26 de noviembre del presente año, solicita la adición del contrato de interventoría por la suma de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE** I.V.A INCLUIDO (**$90.445.190)** y la prórroga por el término de dos (2) meses calendario a partir del seis (6) de diciembre de 2020 y con fecha de finalización del seis (6) de febrero de 2021. Por mayor permanencia del personal de Interventoría en obra, modificaciones que son necesarias para cumplir con el objeto contractual en términos de funcionalidad, eficiencia y eficacia buscando la conservación, restauración y mantenimiento del Patrimonio Cultural, además teniendo en cuenta lo establecido en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993. **4** Que el contrato de obra No. IDPC-OB-510-2019, el día 27 de noviembre de 2020, se le realizo adición, mayores y menores cantidades de obras, ítems no previstos y prorroga hasta el 10 de enero de 2021, por lo cual para esta supervisión es de vital importancia continuar con el contrato de interventoría con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. **5** Que frente a la facultad de prorrogar los contratos de Interventoría el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, ha establecido: "Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las Obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993". **6** De igual manera el Consejo de Estado por medio de la sentencia con Radico No. 11001- 03-26-000-2008-00101-00(36054)B de la Sección Tercera con Magistrado Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, ha manifestado: "En este evento, se trata de obras nuevas o distintas indispensables para alcanzar la finalidad perseguida con el acuerdo de voluntades. No obstante lo anterior, la legislación vigente contempla una limitante: el valor de lo adicionado no puede sobrepasar la mitad de lo inicialmente pactado, asegurándose su actualización mediante las variaciones que presenta el salario mínimo legal mensual. La prohibición expresada por el legislador en el artículo 40 del Estatuto de contratación estatal, es una medida que no sólo busca que no se burlen los procedimientos de selección, sino que además asegura principios como la transparencia, la selección objetiva y la planeación. Llegados a este punto, se encuentra que la norma demandada tiene el alcance que el demandante le endilga, en ella se señala la posibilidad de adicionar el contrato de interventoría sin atender a ningún límite de valor, el único criterio que se tiene presente es la prórroga del contrato sobre el cual se realiza la inspección y vigilancia. En otras palabras, se permite una adición que no tiene en cuenta la prohibición establecida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y que podría sobrepasar en más de 'un 50% el valor de lo inicialmente pactado". **7** Así las cosas, el Contrato de Interventoría se puede adicionar hasta una suma mayor del 50% del valor inicial del contrato, para el caso que nos ocupa la solicitud de adición es por la suma de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE** I.V.A INCLUIDO (**$90.445.190)** no obstante aunque la prohibición contemplada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no aplica para este caso, la suma adicional no supera el 50% del valor inicial del contrato. **8** Que de conformidad con la solicitud de prórroga y adición de la Interventoría, por la mayor permanencia de su personal obra, se justifica la modificación del contrato conforme al siguiente cuadro:*

ROPONENTE:	CONSORCIO NVP				
PLAZOS CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA					
1	PLAZO DE EJECUCION ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCION Y EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA.				
2	PLAZO DE EJECUCION LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO			MES	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				MESES	
GASTOS PERSONAL INTERVENTORÍA					
A. PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA					
CANTIDAD	CARGO O FUNCIÓN	SALARIO MENSUAL ($) [1]	DEDICACION MENSUAL Hombre/mes [2]	CANTIDAD TIEMPO No meses [3]	TOTAL PARCIAL ($) [4]=[1]X[2]X[3]
1	Director de Interventoria	$ 7.949.000	50,00%	2,00	$ 7.949.000
1	Residente de interventoria	$ 3.950.000	100,00%	2,00	$ 7.900.000
1	Residente administrativo	$ 3.000.000	50,00%	2,00	$ 3.000.000
1	Residente de Arqueologia	$ 3.000.000	100,00%	2,00	$ 6.000.000
1	Profesional SG-SST/ licencia en salud ocupacional	$ 1.900.000	100,00%	2,00	$ 3.800.000
1	Asesor Estructural	$ 5.000.000	25,00%	2,00	$ 2.500.000
1	Asesor Eléctrico	$ 5.000.000	20,00%	2,00	$ 2.000.000
1	Asesor Hidráulico	$ 5.000.000	20,00%	2,00	$ 2.000.000
1	CONTADOR	$ 2.000.000	25,00%	2,00	$ 1.000.000
1	ABOGADO	$ 2.000.000	25,00%	2,00	$ 1.000.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B):					$ 37.149.000
C. FACTOR MULTIPLICADOR					204,59%
SUMA (A) - GASTOS PERSONAL DE INTERVENTORÍA:					$ 37.149.000
FACTOR MULTIPLICADOR (F.M):					204,59%
TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR D = (A) X (F.M):					$ 76.004.359
IVA:				19,00%	$ 14.440.828
PERSONAL PROFESIONAL FIJO (A) + PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B) + F.M. + IVA:					$ 90.445.190
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA					$ 90.445.190
NOTA: Recuerde que el porcentaje máximo de factor multiplicador definido será del 223.75 %.					

9 *Que atendiendo la modificación del contrato de interventoría, el balance actualizado del mismo seria :*

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. IDPC-INT-513-2019	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$304.991.090,00*
VALOR ADICIÓN N° 1	*$90.445.190,00*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN	*$395.436.280,00*

10 *Que de conformidad con lo estipulado en la cláusula 5. Obligaciones generales del contratista establece lo siguiente: "12) Solicitar al supervisor del contrato con mínimo quince (15) días hábiles de antelación, las modificaciones contractuales que llegare a requerir para la adecuada ejecución del contrato.* ***11*** *Que el Estatuto de Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, ha establecido en los artículo 13 y 14, lo siguiente:* ***"ARTÍCULO 13. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES.*** *Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia".* ***ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO***

***DEL OBJETO CONTRACTUAL**. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.(subrayado propio). **7** Respecto a los fines del estado la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado Radicación No. 25000-23-26-000-1997-04390-01(18080) del 31 de agosto de 2011 resalta que: "El objeto de los contratos que celebran las entidades públicas, persigue el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado. De acuerdo con esta orientación, los contratos estatales están poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cual es el interés público, lo que determina, por una parte, que no le es permitido a la administración desligarse de la forma como los particulares contratistas realizan la labor encomendada a través del contrato; y de otra, que el contratista ostente la posición de colaborador de la entidad. Es decir, con el contrato se pretende la realización de un fin de interés general, pues es un medio que utiliza la administración pública para la consecución de los objetivos Estatales, el desarrollo de sus funciones y la misión que le ha sido confiada, con la colaboración o contribución de los particulares contratistas, los cuales concurren a su formación persiguiendo un interés particular, que consiste en un provecho económico o lucro que los mueve a contratar y que se traduce en un derecho a una remuneración previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución por el cumplimiento del objeto contractual. Es, entonces, la razonable contraprestación económica la que permite que exista un adecuado balance entre el interés público que anima al Estado a contratar y el interés individual que estimula a los particulares colaboradores a obligarse a suministrar los bienes y servicios objeto del contrato para contribuir con el cumplimiento de los fines de la contratación, el cual debe ser calculado y previsto al tiempo de proponer y contraer el vínculo contractual.". **8** El Consejo de Estado Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2004. Exp. 10779, ha señalado: "Sin embargo, es posible que, con posterioridad a la adjudicación del contrato se presenten situaciones sobrevinientes, que hagan necesaria la modificación de las cláusulas del contrato definidas en el pliego. En estos eventos las partes podrían modificar el contenido del contrato, predeterminado en el pliego, siempre que se utilice la existencia del hecho o acto sobreviniente, que el mismo no sea imputable a las partes y que la modificación no resulte violatoria de los principios que rigen la licitación, ni los derechos generados a favor de la entidad y el adjudicatario ". La prórroga de un contrato ha sido concebida por la Sala como (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 2 de diciembre de 2015. Radicación número: 11001-03-06-000-2015-00059-00 (2252)): "la modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron antes de celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo". Por lo tanto, es deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los contratos y el logro del fin perseguido con la contratación, en este caso permitir la ejecución de la misionalidad del IDPC, buscando la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio cultural, además de entregar un bien para ser usado como equipamiento institucional. **9** De igual manera el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ha establecido que con base al principio de la autonomía de la voluntad entre las partes permite realizar las modificaciones a los contratos, siempre que estas no sean contrarias a la ley, a saber: "**ARTÍCULO 40.-** Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean*

*contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración". Que de igual manera el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala: "**PARÁGRAFO.** En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Que dando cumplimiento al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato. **12** La presente solicitud se realiza dando estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del IDPC, especialmente lo establecido en el numeral. 9.1.2 literal A. "Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de ejecución. El seguimiento del cronograma de ejecución permite verificar que el contrato se ejecute dentro de los términos previstos, así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, modificaciones ó suspensión del Contrato". "Estudiar y emitir su concepto sobre las solicitudes del contratista sobre adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc. Y presentarlas al Ordenador del Gasto por escrito con una antelación suficiente al vencimiento del contrato.", en el numeral. 9.1.4 "Emitir concepto sobre la viabilidad de las suspensiones, prórrogas, adiciones y modificaciones que requiera el contrato objeto de interventoría o supervisión de conformidad con las normas legales vigentes y suscribir las actas de suspensión y reinicio y demás actas que se requieran en la ejecución del contrato" y en el numeral 9.2.2 "Mayor cantidad de obra y obras adicionales: Presentar al ordenador del gasto, para el trámite de aprobación y con la anticipación suficiente los estudios que indiquen la realización de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas. Estos informes corresponden a modificaciones del valor o plazo de los contratos. Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el contratista, actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presenten para la aprobación al ordenador del gasto, quien anexará a estos estudios el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que amparará dicha adición. Legalizada la adición del contrato, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. A su vez, deberá ejercer un control de calidad de materiales, de mano de obra y de los elementos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra adicional. Siempre deberá presentarse los documentos suficientes y necesarios que permitan demostrar la solicitud y aprobación de obra extra o adicional". **13** Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, es obligación de los servidores públicos tener en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. **14** Que para el IDPC, es de suma importancia que el objeto del contrato de interventoría denominado: **Realizar la Interventoría integral de la obra que tiene por objeto "Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios las obras para la intervención de la tercera etapa del inmueble ubicado en la calle 12B No 2 - 91 denominado Casa Tito, localizada en la Ciudad de Bogotá D.C**", se siga ejecutando con el único fin que las obras que ellos les realizan seguimiento minucioso sean entregada a total satisfacción con todas las actividades propuestas, que permitan que el inmueble sea utilizado para uso institucional, además que se mantengan los criterios de conservación establecidos en la normatividad vigente y con los criterios de protección a los Bienes de Interés Cultural - BIC. De acuerdo a los anterior, esta supervisión considera que es necesario realizar la adición y prorroga al contrato de interventoría del asunto, para cumplir con el con el objeto contractual y seguir contando con un seguimiento detallado a la ejecución del contrato de obra No. IDPC-OB-510-2019; por lo tanto se requiere de manera atenta, que se solicite a la Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento del Acuerdo No. 002 de 2019 y en el marco de las funciones asignadas, se adelante los siguientes trámites: * Adicionar el contrato de Interventoría No. IDPC-INT-513-2019, por la suma de de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE** I.V.A INCLUIDO (**$90.445.190)** y la entidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.**1079** por valor de **NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE**. * Prorrogar el contrato de Interventoría No. IDPC-INT-513-2019, por el plazo de dos (2) meses calendario.* Que se solicite al contratista la actualización de los valores y tiempos asegurados establecidos en el Contrato de Interventoría No. **IDPC-INT-513-2019.** Para el surtimiento del mencionado modificatorio se adjuntan la siguiente documentación soporte: 1*

Comunicación No. 20205110071542. 2. CDP". **9** Mediante memorando Nº 20203000058663 de fecha treinta (30) de noviembre de 2020 la Doctora María Claudia Vargas Martínez, quien actúa en su condición de Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio solicita a la Doctora Gladys Sierra Linares en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural presenta solicitud de Prórroga y Adición al Contrato de Interventoría IDPC-INT-513-2019. **10** Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, es obligación de los servidores públicos tener en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. **11** Que el responsable de Presupuesto expide para respaldar la presente Adición el Certificado de Disponibilidad Nº 1079 de fecha veinte (20) de noviembre de 2020, Rubro Nº 133011601210000007611, Descripción del Rubro: *"DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE VALORACION Y RECUPERACION DE BIENES Y SECTORES DE INTERES CULTURAL DE BOGOTA",* Concepto del Gasto: *"10105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural",* Fondo: *"1-100-F001 VA-Recurso Distrito",* lo anterior, por valor de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL (90'445.190 M/L). **12** Que frente a la facultad de prorrogar los Contratos de Interventoría el Consejo de Estado por medio de la sentencia C-300/2012, con Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló sobre el particular lo siguiente: *"Por regla general, **los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato.*[1] *Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la **sentencia C-949 de 2001***[2]*, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.*[3] *Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en **concepto del 13 de agosto de 2009**: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que **la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo**. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."*[4] Y concluye: *"Por último, es preciso resaltar que **la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico**, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.*[5]

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[2] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

[3] Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo**,** sobre la constitucional de la posibilidad de prorrogar los contratos de concesión portuaria (artículo 8º de la ley 1º de 1991).

[4] *Cfr.* Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: "1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios públicos?"

[5] Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Dávila Vinueza define la modificación del contrato estatal así: "Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades

En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.[6] *El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el* ***plazo*** *es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en* ***sentencia del 24 de agosto de 2005****, afirmó: "Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.".*[7] **13** La presente solicitud se realiza dando estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del IDPC, especialmente lo establecido en el numeral. 9.1.2 literal A. *"Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de ejecución. El seguimiento del cronograma de ejecución permite verificar que el contrato se ejecute dentro de los términos previstos, así como determinar la necesidad de solicitar prórrogas, modificaciones ó suspensión del Contrato". "Estudiar y emitir su concepto sobre las solicitudes del contratista sobre adiciones, prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc. Y presentarlas al Ordenador del Gasto por escrito con una antelación suficiente al vencimiento del contrato."*, en el numeral. 9.1.4 *"Emitir concepto sobre la viabilidad de las suspensiones, prórrogas, adiciones y modificaciones que requiera el contrato objeto de interventoría o supervisión de conformidad con las normas legales vigentes y suscribir las actas de suspensión y reinicio y demás actas que se requieran en la ejecución del contrato"*. **14** Que para el IDPC, es de suma importancia que el objeto del Contrato de Interventoría denominado: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*, sea ejecutado a total satisfacción con la todas las actividades propuestas que permitan culminar el objeto y alcance contractualmente propuesto. **15** Que analizadas las razones expuestas en las consideraciones anteriores, el concepto favorable emitido por la supervisión, y, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, así como, atendiendo el cumplimiento de los fines estatales definidos en el objeto y alcance contractualmente previsto, resulta procedente celebrar la Prórroga Nº 1 y Adición Nº 1 solicitada al Contrato de Interventoría Nº IDPC-INT-513-2019. **21** Que por lo antes expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regirá por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y el siguiente clausulado: **CLAUSUAL PRIMERA:** ADICIONAR el valor del Contrato de Interventoría por la suma

sobrevivientes o a errores en la fase previa". *Cfr.* DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.

[6] Esta disposición señala: "ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

[7] *Cfr.* Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01(3171) A, C.P. Darío Quiñones Pinilla.

de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL (90'445.190 M/L). **CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría en dos (2) meses más. **CLAUSULA TERCERA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** La presente adición tiene respaldo de recursos conforme a lo establecido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 1079 de fecha veinte (20) de noviembre de 2020, Rubro Nº 133011601210000007611, Descripción del Rubro: *"DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE VALORACION Y RECUPERACION DE BIENES Y SECTORES DE INTERES CULTURAL DE BOGOTA",* Concepto del Gasto: *"10105250 Recuperación y aprovechamiento de bienes de interés cultural",* Fondo: *"1-100-F001 VA-Recurso Distrito",* lo anterior, por valor de NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL (90'445.190 M/L). **CLAUSULA CUARTA: ACTUALIZAR** las vigencias y el monto asegurable en la Póliza, tal como se contempla en la Cláusula 16- Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente acto contractual: **1** Comunicación Nº 067-20-NVP-TITO de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020 con radicado interno Orfeo Nº 20205110071542 de fecha veintiséis (26) de noviembre de 2020, y los soportes que a él se acompañan. **2** Memorando Nº 20203070058643 de fecha treinta (30) de noviembre de 2020. **3** Memorando Nº 20203000058663 de fecha treinta (30) de noviembre de 2020. **CLAUSULA SEXTA: PUBLICACION.-** El presente documento se publicara en el SECOP II, conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. **CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.-** El presente documento requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes a través de la Plataforma SECOP II, y, para su ejecución la ampliación de las garantías del contrato, conforme al nuevo plazo y valor definido. **CLAUSULA OCTAVA:** Las demás clausulas del Contrato de Interventoría N° IDPC-INT-513-2019, que no hayan sido modificadas permanecerán incólumes.

Revisó: Guillermo Andrés Londoño Ruiz – Abogado Contratista – Oficina Asesora Jurídica 
Aprobó: Gladys Sierra Linares— Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101196250**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**12**	**2020**	**03**	**02**	**2020**	**00:00**	**03**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO NVP	**NIT: 900.850.840-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**NIT: 860.506.170-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 12 B # 2 - 58	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3550800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCION DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B No. 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/02/2020**	**05/04/2021**	**$79,087,316.00**	**$60,998,218.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/02/2020**	**05/12/2023**	**$39,543,658.00**	**$30,499,109.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/02/2020**	**03/02/2025**	**$79,087,316.00**	**$60,998,218.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 513 DE 2019, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****270,655.00	$ **********0.00	$ ******51,424.00	$ **********322,079.00	$ ******197,718,290.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	164105	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101196250	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2020	03	02	2020	00:00	03	02	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NVP		**NIT: 900.850.840-1**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC		**NIT: 860.506.170-7**
DIRECCIÓN: CALLE 12 B # 2 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3550800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS PEDROZA NESTOR ADEL	79378301	50.00
NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S A S	900805973-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF164105A

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101196250, anexo 6, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2020

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

300

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101196250**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**12**	**2020**	**03**	**02**	**2020**	**00:00**	**06**	**02**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO NVP	**NIT: 900.850.840-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**NIT: 860.506.170-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 12 B # 2 - 58	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3550800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCION DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B No. 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/02/2020**	**06/06/2021**	**$79,087,316.00**	**$79,087,316.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/02/2020**	**06/02/2024**	**$39,543,658.00**	**$39,543,658.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/02/2020**	**03/02/2025**	**$79,087,316.00**	**$79,087,316.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 513 DE 2019, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******50,648.00	$ *******8,000.00	$ ******11,143.00	$ **********69,791.00	$ ******197,718,290.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	164105	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101196250	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2020	03	02	2020	00:00	06	02	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NVP		**NIT: 900.850.840-1**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC		**NIT: 860.506.170-7**
DIRECCIÓN: CALLE 12 B # 2 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3550800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS PEDROZA NESTOR ADEL	79378301	50.00
NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S A S	900805973-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108411 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101196250, anexo 7, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 07 días del mes de DICIEMBRE de 2020

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101196250**	**9**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	**12**	**2020**	**03**	**02**	**2020**	**00:00**	**03**	**02**	**2025**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO NVP	**NIT: 900.850.840-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**NIT: 860.506.170-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 12 B # 2 - 58	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3550800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCION DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B No. 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**03/02/2020**	**06/06/2021**	**$79,087,256.00**	**$79,087,256.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**03/02/2020**	**06/02/2024**	**$39,543,628.00**	**$39,543,658.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**03/02/2020**	**03/02/2025**	**$79,087,256.00**	**$79,087,256.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SE ACLARAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUN AIDICON No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 513 DE 2019.
LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********(0.00)	$ **********0.00	$ ********(0.00)	$ **********(0.00)	$ ******197,718,140.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	164105	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101196250	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	12	2020	03	02	2020	00:00	03	02	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO NVP	**NIT: 900.850.840-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	**NIT: 860.506.170-7**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 12 B # 2 - 58	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3550800

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS PEDROZA NESTOR ADEL	79378301	50.00
NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S A S	900805973-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101196250

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-40-101057592**	**5**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**12**	**2020**	**03**	**02**	**2020**	**00:00**	**06**	**02**	**2021**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NVP		**NIT: 900.850.840-1**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC		**NIT: 860.506.170-7**
DIRECCIÓN: CALLE 12 B # 2 - 58	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3550800
BENEFICIARIO: 860506170 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA IDPC-INT-513-2019, REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCION DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B No. 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$175,560,600.00**	**$175,560,600.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$35,112,120.00**	**$35,112,120.00**
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$175,560,600.00**	**$175,560,600.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 513 DE 2019, SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.
LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****137,876.00	$ *******3,000.00	$ ******26,766.00	$ **********167,643.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
H&B CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	164105	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101057592

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101057592	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2020	03	02	2020	00:00	06	02	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NVP		**NIT: 900.850.840-1**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 860.506.170-7**
DIRECCIÓN: CALLE 12 B # 2 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3550800

BENEFICIARIO: 860506170 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$35,112,120.00**	**$35,112,120.00**
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$35,112,120.00**	**$35,112,120.00**
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$35,112,120.00**	**$35,112,120.00**
GASTOS MEDICOS		**03/02/2020**	**06/02/2021**	**$35,112,120.00**	**$35,112,120.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

33-40-101057592

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-40-101057592	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	12	2020	03	02	2020	00:00	06	02	2021	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO NVP		**NIT: 900.850.840-1**
DIRECCIÓN: CR 6 BIS NRO. 26 - 51 OF. 802	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2436384

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC	IDENTIFICACIÓN	**NIT: 860.506.170-7**
DIRECCIÓN: CALLE 12 B # 2 - 58	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3550800

BENEFICIARIO: 860506170 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS PEDROZA NESTOR ADEL	79378301	50.00
NESTOR VARGAS PEDROZA ARQUITECTOS S A S	900805973-1	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-40-101057592

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 38 DEL 16/11/2020 a 22/11/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró:	Residente técnica	Arq. Liliana Marcelo	
No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Pañetes impermeabilizados culata oriental y occidental en patio 2	9	
2	Formaleteado de cañuelas de patio 2	10	
3	Instalación de tuberia de aguas lluvias volumen 3	11	
4	instalación para platinas de escalera y ascensor patio 2	12	
5	Restauración carpintería casa, segundo piso	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO


Elaboró:	Residente administrativa	Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	
1	En esta semana se hizo comité #33 el día 04 de diciembre de 2020	
2		


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!

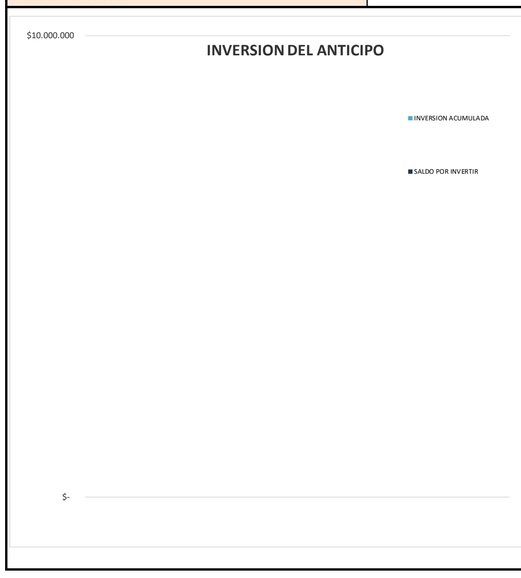

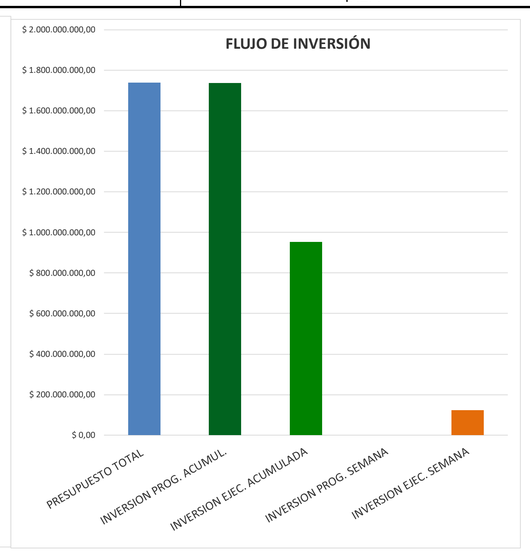

5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró:	Residente HSEQ	Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto.	
3	Verificación actividades de trasiego de materiales, levantamiento adecuado de cargas, orden y aseo de áreas comunes al finalizar la actividad.	
4		
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Se realizan por parte de la interventoría las inspecciones y recomendaciones correspondientes al contratista verificando el cumplimiento de condiciones de SST	Respecto al tema ambiental se esta a la espera de observaciones por parte del PIGA
2	Se cuenta con PMT vigente para los retiros necesarios	
3	Respecto a los temas ambientales se remiten al profesional PIGA del IDPC los soportes correspondientes al periodo de febrero a octubre de 2020 para el cargue de información RCD del PIN 18363	
4		

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Para esta semana no se presentan casos sospechosos de covid-19 manteniendo los indicadores en ceros	
3	En la semana ingresan 3 personas para instalación de pisos en madera verificación de cumplimiento documental, afiliaciones y aportes a seguridad social.	


	CONTROL PERSONAL OPERATIVO				OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
		PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	17	17	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	31	31	0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGAS	-	PRORROGAS	-
ADICIONES	-	ADICIONES	-
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINIACION ACTUAL	05 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION ACTUAL	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR	$1.739.048.042,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$304.991.090,00	VALOR POR PAGAR	$1.739.048.042,00

INFORME SEMANA No. 38 DEL 16/11/2020 a 22/11/2020

% AVANCE	-45,08%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.739.048.042,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.737.048.843,62	99,885%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 953.071.596,35	54,804%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 0,00	0,000%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 122.800.000,00	7,061%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se presenta un atraso de 45,08% debido a la gran cantidad de material hallado en las excavaciones el monitoreo arqueológico ha sido mas lento y ha retrasado las excavaciones y por ende todas las actividades precedentes, otro causal de demoras es la temporada de lluvias. El contratista enviará reprogramación teniendo en cuenta los tiempos extendidos de excavaciones arqueológicas. Las excavaciones de cimentación al ser ruta critica para toda las actividades civiles nuevas han retrasado las actividades consecuentes. El contratista solicitó adición y prorroga con el oficio 076/2020 del 19 de septiembre 2020.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
8	Octubre 2020	$ 260.000.000	$31.565.060			
9	Noviembre 2020	$ 9.000.000.000	$126.793.447			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36	14	7	21
SEM 37	14	7	21
SEM 38	17	7	24

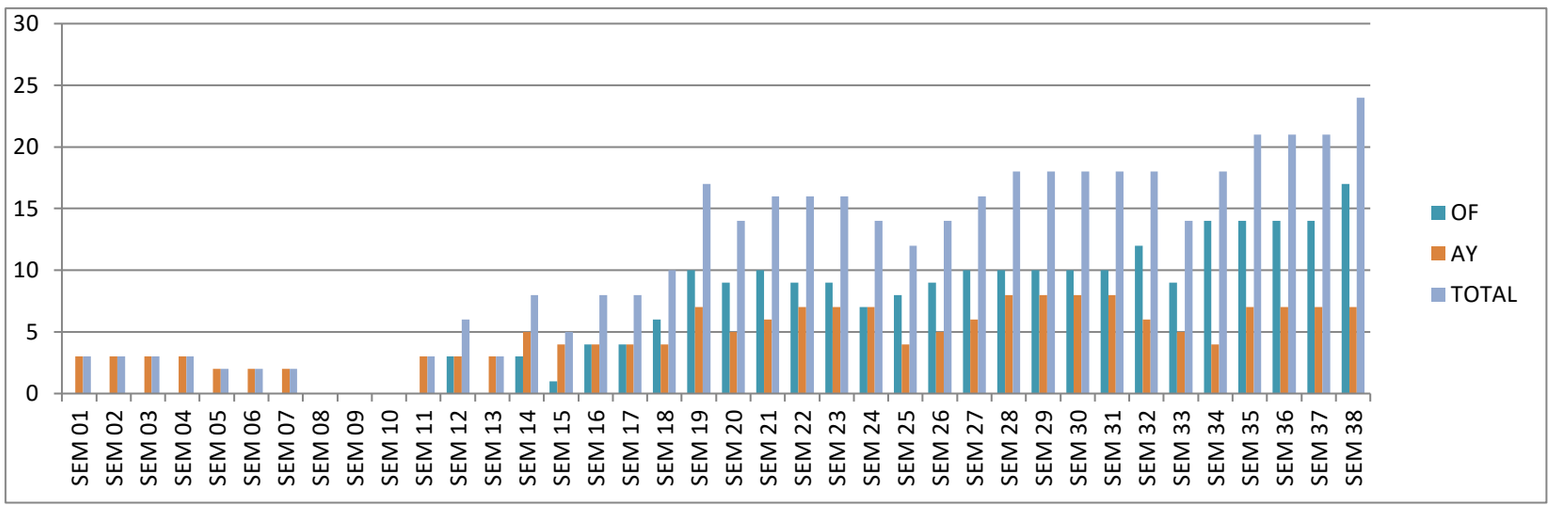

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMAD	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.057,00	$ 4.409.057	0,25%	0,25%	$ 4.409.057,00	$ 4.409.057	0,25%	0,25%
2	10 AL 16		$ 4.409.057,00	$ 8.818.114	0,25%	0,51%	$ 4.409.057,00	$ 8.818.114	0,25%	0,51%
3	17 AL 23		$ 4.409.057,00	$ 13.227.171	0,25%	0,76%	$ 4.409.057,00	$ 13.227.171	0,25%	0,76%
4	24 AL 01		$ 4.409.056,62	$ 17.636.228	0,25%	1,02%	$ 4.409.056,62	$ 17.636.228	0,25%	1,02%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 7.674.305,00	$ 25.310.533	0,44%	1,46%	$ 8.174.105,22	$ 25.810.333	0,47%	1,49%
6	09 AL 15		$ 7.674.305,00	$ 32.984.838	0,44%	1,90%	$ 8.174.105,22	$ 33.984.438	0,47%	1,96%
7	16 AL 22		$ 7.674.304,00	$ 40.659.142	0,44%	2,34%	$ 8.174.105,22	$ 42.158.543	0,47%	2,43%
8	23 AL 29		$ 7.674.305,00	$ 48.333.447	0,44%	2,78%	$ 8.174.105,22	$ 50.332.648	0,47%	2,90%
	30 AL 05			$ 48.333.447	0,00%	2,78%				
	06 AL 12	ABRIL 2020		$ 48.333.447	0,00%	2,78%				
	13 AL 19			$ 48.333.447	0,00%	2,78%				
	20 AL 26			$ 48.333.447	0,00%	2,78%				
9	27 AL 03			$ 48.333.447	0,00%	2,78%				
10	04 AL 10	MAYO 2020	$ 4.141.520,00	$ 52.474.967	0,24%	3,02%				
11	11 AL 17		$ 13.941.544,00	$ 66.416.511	0,80%	3,82%	$ 7.826.558	$ 58.159.206	0,45%	3,35%
12	18 AL 24		$ 13.343.820,00	$ 79.760.331	0,77%	4,59%	$ 7.826.558	$ 65.985.764	0,45%	3,80%
13	25 AL 31		$ 16.699.997,00	$ 96.460.328	0,96%	5,55%	$ 7.826.558	$ 73.812.322	0,45%	4,25%
14	01 AL 07		$ 15.037.104,00	$ 111.497.432	0,87%	6,42%	$ 7.826.558	$ 81.638.880	0,45%	4,70%
15	08 AL 14	JUNIO 2020	$ 8.952.518,00	$ 120.449.950	0,52%	6,93%	$ 7.826.558	$ 89.465.438	0,45%	5,15%
16	15 AL 21		$ 38.640.201,00	$ 159.090.151	2,22%	9,16%	$ 18.308.000	$ 107.773.438	1,05%	6,20%
17	22 AL 28		$ 44.615.216,00	$ 203.705.367	2,57%	11,73%	$ 18.308.000	$ 126.081.438	1,05%	7,26%
18	29 AL 05		$ 58.517.867,00	$ 262.223.234	3,37%	15,10%	$ 18.308.000	$ 144.389.438	1,05%	8,31%
19	06 AL 12	JULIO 2020	$ 78.678.784,00	$ 340.902.018	4,53%	19,63%	$ 18.308.000	$ 162.697.438	1,05%	9,37%
20	13 AL 19		$ 106.868.706,00	$ 447.770.724	6,15%	25,78%	$ 32.550.081,50	$ 195.247.519	1,87%	11,24%
21	20 AL 26		$ 68.714.420,00	$ 516.485.144	3,96%	29,73%	$ 32.550.081,50	$ 227.797.600	1,87%	13,11%
22	27 AL 02		$ 108.682.901,00	$ 625.168.045	6,26%	35,99%	$ 32.550.081,50	$ 260.347.682	1,87%	14,99%
23	03 AL 09	AGOSTO 2020	$ 109.649.711,00	$ 734.817.756	6,312%	42,30%	$ 32.550.081,50	$ 292.897.763	1,87%	16,86%
24	10 AL 16		$ 118.912.198,00	$ 853.729.954	6,846%	49,15%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.019	1,24%	18,10%
25	17 AL 23		$ 85.439.551,00	$ 939.169.505	4,919%	54,07%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.274	1,24%	19,33%
26	24 AL 30		$ 94.193.422,00	$ 1.033.362.927	5,423%	59,49%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.529	1,24%	20,57%
27	31 AL 06		$ 102.945.433	$ 1.136.308.360	5,926%	65,42%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.784	1,24%	21,80%
28	07 AL 13	SEPTIEMBRE 2020	$ 81.481.530,00	$ 1.217.789.890	4,691%	70,11%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.039	1,24%	23,04%
29	14 AL 20		$ 102.535.729,00	$ 1.320.325.619	5,903%	76,01%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.901	3,28%	26,32%
30	21 AL 27		$ 77.616.046,00	$ 1.397.941.665	4,468%	80,48%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.763	3,28%	29,61%
31	28 AL 04		$ 53.169.824,00	$ 1.451.111.489	3,061%	83,54%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.625	3,28%	32,89%
32	05 AL 11	OCTUBRE 2020	$ 43.458.461,00	$ 1.494.569.950	2,502%	86,04%	$ 57.046.862,00	$ 628.361.487	3,28%	36,17%
33	12 AL 18		$ 35.146.776,00	$ 1.529.716.726	2,023%	88,06%	$ 40.382.021,80	$ 668.743.509	2,32%	38,50%
34	19 AL 25		$ 22.007.217,00	$ 1.551.723.943	1,267%	89,33%	$ 40.382.021,80	$ 709.125.531	2,32%	40,82%
35	26 AL 01		$ 168.772.201,00	$ 1.720.496.144	9,716%	99,05%	$ 40.382.021,80	$ 749.507.553	2,32%	43,15%
36	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 6.181.597,00	$ 1.726.677.741	0,356%	99,40%	$ 40.382.021,80	$ 789.889.575	2,32%	45,47%
37	09 AL 12		$ 10.371.103,00	$ 1.737.048.844	0,597%	100,00%	$ 40.382.021,80	$ 830.271.596	2,32%	47,80%
38	13 al 18		$ 0,00	$ 1.737.048.844	0,000%	100,00%	$ 122.800.000,00	$ 953.071.596	7,07%	54,87%

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

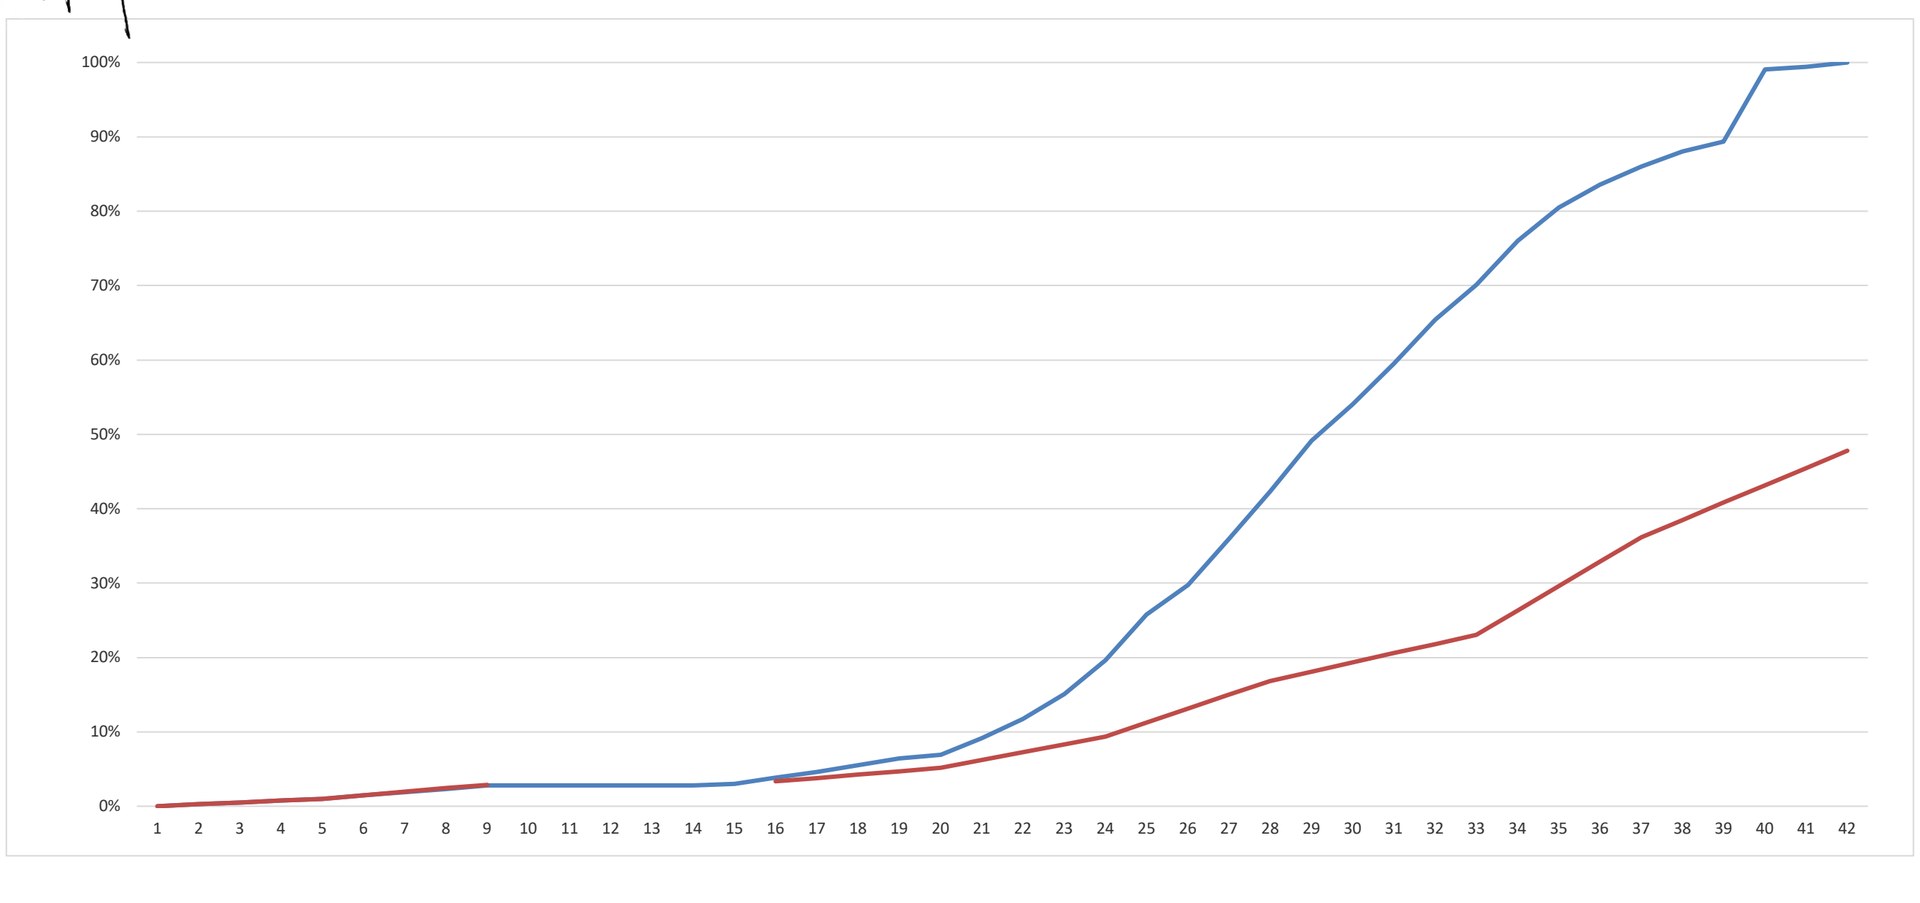

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 39 DEL 23/11/2020 a 29/11/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró:	Residente técnica	Arq. Liliana Marcelo	
No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Instalación de pisos en madera segundo piso	9	
2	Instalación de platinas de estructura metálica para escalera 2	10	
3	Soldadura de platinas para escalera 2	11	
4	Pañete de antepechos en primer piso volumen 2	12	
5	Restauración carpintería casa, segundo piso	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8	Instalación de pisos en madera segundo piso	16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró:	Residente administrativa	Arq. Liliana Marcelo
No.	ACTIVIDAD	
1	En esta semana se hizo comité #34 el día 11 de noviembre de 2020	
2		


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!



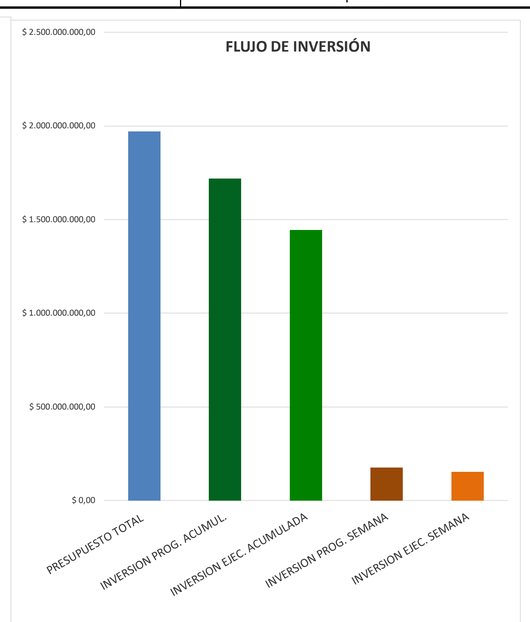

5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró:	Residente HSEQ	Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Aplicación adecuada de los protocolos de bioseguridad para personal operativo y técnico del proyecto.	
2	Verificación de condiciones de seguridad, elementos de protección personal, barandas y señalización en tercer nivel para el vaciado de concreto.	
3	Verificación actividades de trasiego de materiales, levantamiento adecuado de cargas, orden y aseo de áreas comunes al finalizar la actividad.	
4		
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Se realizan por parte de la interventoría las inspecciones y recomendaciones correspondientes al contratista verificando el cumplimiento de condiciones de SST	Respecto al tema ambiental se esta a la espera de observaciones por parte del PIGA
2	Se cuenta con PMT vigente para los retiros necesarios	
3	Se verifican actividades según los establecido en el protocolo de bioseguridad para COVID-19, garantizando condiciones de areas, distanciamiento y cuidado individual.	
4	Se informa en comité semanal la entrega de documentos ambientales: anexo 2, 3 y 4, certificados RCD escombrera, certificados RCD Consorcio y certificados de no aprovechamiento de los periodos de febrero a octubre de 2020.	

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad.	
2	Se envia un trabajador incapacidad enfermedad general y como resultado de la prueba PCR se obtiene un resultado negativo, manteniendo los indicadores en ceros	
3	Se realizan las respectivas inducciones, ingreso de herramientas y preoperacionales del personal de instalacion y acabados	


	CONTROL PERSONAL OPERATIVO			OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
		PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	3	3	0	
3	OFICIALES	17	17	0	
4	AYUDANTES	4	4	0	
	TOTAL	31	31	0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 39 DEL 23/11/2020 a 29/11/2020

% AVANCE	-13,90%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.971.554.162,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.718.958.089,00	87,188%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 1.444.934.176,92	73,289%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 176.415.826,00	8,948%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 153.665.438,50	7,794%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS


Para este periodo se realizo una prorroga y adición al contrato de obra, por lo tanto, se hace un ajuste en la programación y flujo de inversión, esta semana se presenta un atraso de 13,90% debido al porcentaje de lluvias alto en la ciudad, que ha retrasado tambien la llegada de material a la obra, asi como algunos errores en la fabricación de estructura de escalera metálica, han retrasado las actividades. Otra demora ha sido la definición de la pintura intumescente, analizando las mejores opciones tanto de calidad como económica.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
8	Octubre 2020	$ 260.000.000	$31.565.060			
9	Noviembre 2020	$ 616.000.000	$126.793.447			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



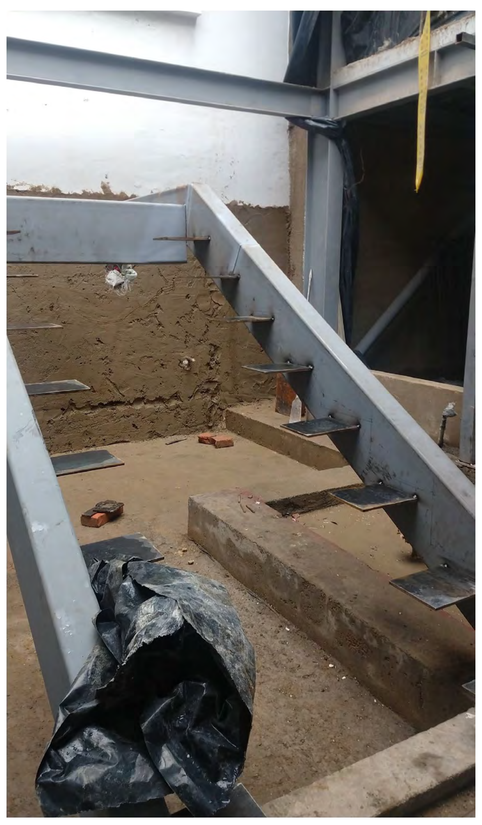






Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36	14	7	21
SEM 37	14	7	21
SEM 38	17	7	24
SEM 39	17	7	24

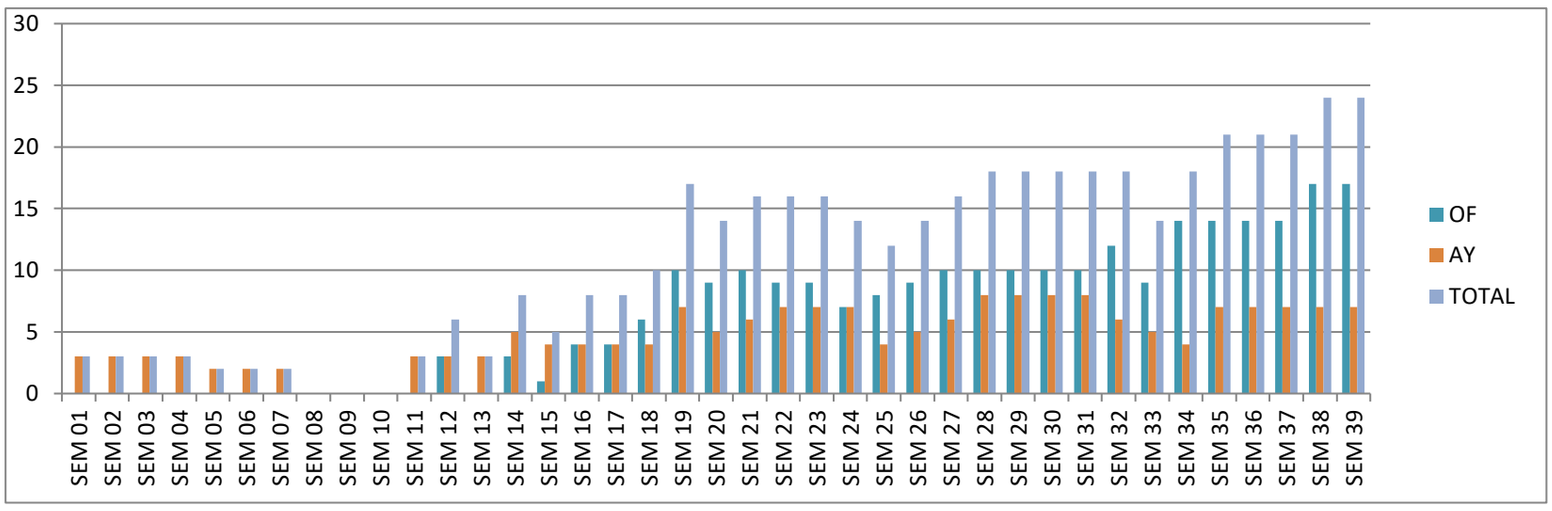

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROG	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%
2	10 AL 16		$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%	$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%
3	17 AL 23		$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%	$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%
4	24 AL 01		$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%	$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 8.074.145	$ 25.710.369	0,41%	1,30%	$ 8.174.105	$ 25.810.329	0,41%	1,31%
6	09 AL 15		$ 8.074.145	$ 33.784.514	0,41%	1,71%	$ 8.174.105	$ 33.984.434	0,41%	1,72%
7	16 AL 22		$ 8.074.145	$ 41.858.659	0,41%	2,12%	$ 8.174.105	$ 42.158.540	0,41%	2,14%
8	23 AL 29		$ 8.473.985	$ 50.332.644	0,43%	2,55%	$ 8.174.105	$ 50.332.645	0,41%	2,55%
9	11 AL 17	MAYO 2020	$ 19.566.396	$ 69.899.040	0,99%	3,55%	$ 13.044.264	$ 63.376.909	0,66%	3,21%
10	18 AL 24		$ 9.783.198	$ 79.682.238	0,50%	4,04%	$ 13.044.264	$ 76.421.172	0,66%	3,88%
11	25 AL 31		$ 9.783.198	$ 89.465.436	0,50%	4,54%	$ 13.044.264	$ 89.465.436	0,66%	4,54%
12	01 AL 07	JUNIO 2020	$ 18.477.693	$ 107.943.129	0,94%	5,48%	$ 18.308.000	$ 107.773.436	0,93%	5,47%
13	08 AL 14		$ 18.477.693	$ 126.420.822	0,94%	6,41%	$ 18.308.000	$ 126.081.436	0,93%	6,40%
14	15 AL 21		$ 18.477.693	$ 144.898.515	0,94%	7,35%	$ 18.308.000	$ 144.389.436	0,93%	7,32%
15	22 AL 28		$ 17.798.921	$ 162.697.436	0,90%	8,25%	$ 18.308.000	$ 162.697.436	0,93%	8,25%
16	29 AL 05	JULIO 2020	$ 32.550.081	$ 195.247.517	1,65%	9,90%	$ 32.550.081,00	$ 195.247.517	1,65%	9,90%
17	06 AL 12		$ 32.550.081	$ 227.797.598	1,65%	11,55%	$ 32.550.081,00	$ 227.797.598	1,65%	11,55%
18	13 AL 19		$ 32.550.083	$ 260.347.681	1,65%	13,21%	$ 32.550.081,00	$ 260.347.679	1,65%	13,21%
19	20 AL 26		$ 30.979.163	$ 291.326.844	1,57%	14,78%	$ 32.550.081,00	$ 292.897.760	1,65%	14,86%
20	27 AL 02	AGOSTO 2020	$ 21.455.255	$ 312.782.099	1,09%	15,86%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.015	1,09%	15,94%
21	03 AL 09		$ 21.455.255	$ 334.237.354	1,09%	16,95%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.270	1,09%	17,03%
22	10 AL 16		$ 21.455.255	$ 355.692.609	1,09%	18,04%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.526	1,09%	18,12%
23	17 AL 23		$ 21.455.256	$ 377.147.865	1,09%	19,13%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.781	1,09%	19,21%
24	24 AL 30		$ 21.455.254	$ 398.603.119	1,09%	20,22%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.036	1,09%	20,30%
25	31 AL 06	SEPTIEMBRE 2020	$ 57.149.734	$ 455.752.853	2,90%	23,12%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.898	2,89%	23,19%
26	07 AL 13		$ 57.149.734	$ 512.902.587	2,90%	26,02%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.760	2,89%	26,08%
27	14 AL 20		$ 57.149.734	$ 570.052.321	2,90%	28,91%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.622	2,89%	28,98%
28	21 AL 27		$ 56.738.427	$ 626.790.748	2,88%	31,79%	$ 57.046.864,00	$ 628.361.486	2,89%	31,87%
29	28 AL 04	OCTUBRE 2020	$ 22.328.950	$ 649.119.698	1,13%	32,92%	$ 40.382.187,40	$ 668.743.673	2,05%	33,92%
30	05 AL 11		$ 34.234.162	$ 683.353.860	1,74%	34,66%	$ 40.382.187,40	$ 709.125.861	2,05%	35,97%
31	12 AL 18		$ 53.820.064	$ 737.173.924	2,73%	37,39%	$ 40.382.187,40	$ 749.508.048	2,05%	38,02%
32	19 AL 25		$ 72.298.292	$ 809.472.216	3,67%	41,06%	$ 40.382.187,40	$ 789.890.236	2,05%	40,06%
33	26 AL 01		$ 142.540.148	$ 952.012.364	7,23%	48,29%	$ 40.382.187,40	$ 830.272.423	2,05%	42,11%
34	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 176.089.168	$ 1.128.101.532	8,93%	57,22%	$ 153.665.438,50	$ 983.937.861	7,79%	49,91%
35	09 AL 15		$ 194.087.141	$ 1.322.188.673	9,84%	67,06%	$ 153.665.438,50	$ 1.137.603.300	7,79%	57,70%
36	16 AL 22		$ 220.353.590	$ 1.542.542.263	11,18%	78,24%	$ 153.665.438,50	$ 1.291.268.738	7,79%	65,49%
37	23 AL 29		$ 176.415.826	$ 1.718.958.089	8,95%	87,19%	$ 153.665.438,50	$ 1.444.934.177	7,79%	73,29%
38	30 AL 6	DICIEMBRE 2020	$ 128.065.943	$ 1.847.024.032	6,50%	93,68%				
39	7 AL 13		$ 88.581.224	$ 1.935.605.256	4,49%	98,18%				
40	14 AL 20		$ 19.941.919	$ 1.955.547.175	1,01%	99,19%				
41	21 AL 27		$ 8.443.203	$ 1.963.990.378	0,43%	99,62%				
42	28 AL 03	ENERO 2021	$ 4.744.161	$ 1.968.734.539	0,24%	99,86%				
43	04 AL 10		$ 2.819.799	$ 1.971.554.338	0,14%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

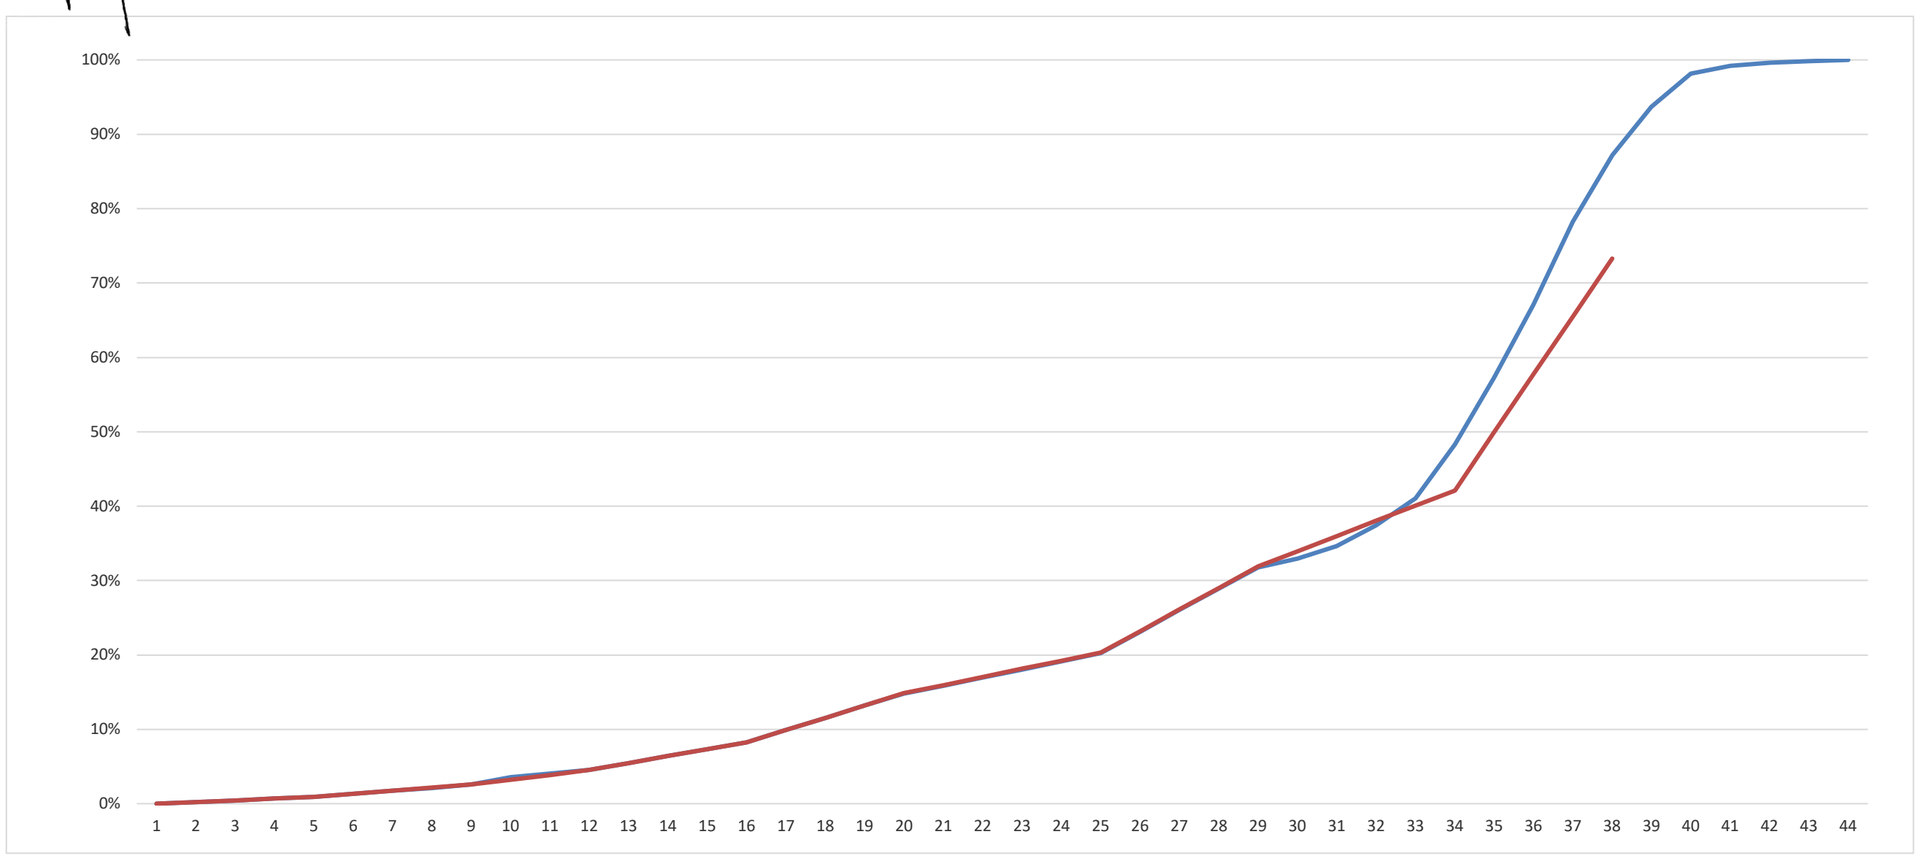

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 40 DEL 30/11/2020 a 06/12/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró: Residente técnica — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Impermeabilización terraza volumen 3	9	
2	Mamposteria de cerramiento de culata occidental	10	
3	Columnetas de mamposteria de cerramiento de culata occidental	11	
4	Fundida de placa de patio 1	12	
5	Instalación de piso hidraúlico	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8		16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — Arq. Liliana Marcelo


No.	ACTIVIDAD
1	En esta semana se hizo comité #29 el día 07 de octubre de 2020
2	


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!

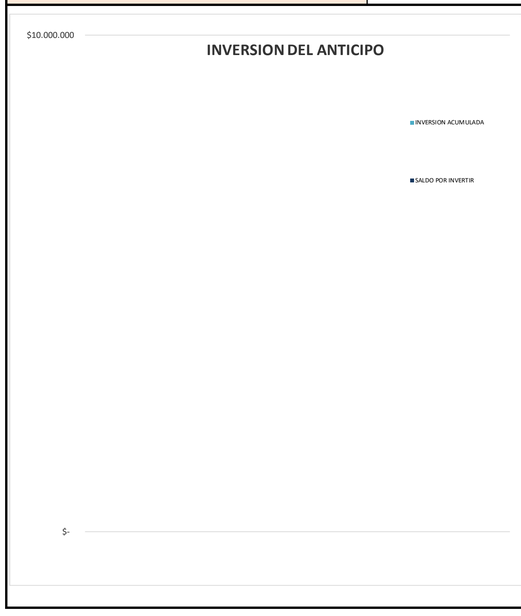

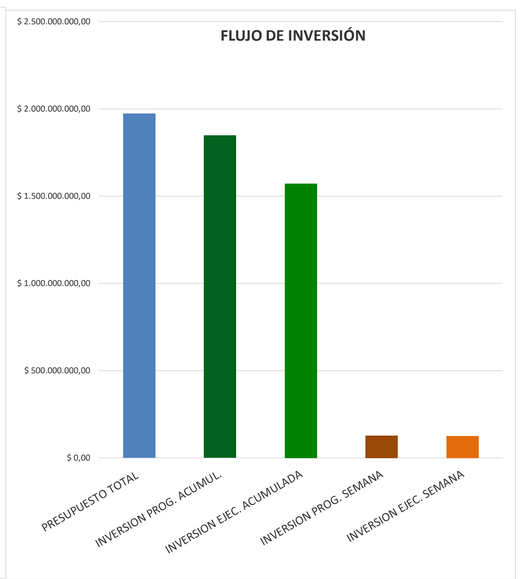

5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inpeccion elementos de proteccion personal al grupo de estructura metalica en la actividad de pintura, proteccion respiratoria, visual y caretas.	
2	Inpeccion de uso adecuado de equipo de proteccion individual contra caidas, arnes, eslimgas, punto de anclaje seguro.	
3	Se verifican condiciones de seguridad y bioseguridad a los grupos operativos que interviennen en las actidades.	
4	Se realiza visita a casa colorada verificando condiciones de seguridad y se dan las recomendaciones para el area de trabajo al grupo de arqueologia	
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Jornadas de orden y aseo	
2	Se cuenta con PMT vigente para los retiros necesarios	
3	Se verifican actividades según los establecido en el protocolo de bioseguridad para COVID-19, garantizando condiciones de areas, distanciamiento y cuidado individual.	
4	Se realiza remocion de escombros acopiados en la base del arbol para su disposicion final	

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad industrial y salud en el trabajo	
2	Verificacion documental de aportes a seguridad social de subcontratistas	
3	Se realizan las respectivas inducciones, ingreso de herramientas y preoperacionales del personal de instalacion y acabados	


	CONTROL PERSONAL OPERATIVO				OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
		PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	5	5	0	
3	OFICIALES	17	17	0	
4	AYUDANTES	9	9	0	
	TOTAL	38	38	0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 40 DEL 30/11/2020 a 06/12/2020

% AVANCE	-14,00%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.971.554.162,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.847.024.032,00	93,684%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 1.570.999.176,92	79,683%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 128.065.943,00	6,496%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 126.065.000,00	6,394%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se realizo una prorroga y adición al contrato de obra, por lo tanto, se hace un ajuste en la programación y flujo de inversión, esta semana se presenta un atraso de 14,00% debido al porcentaje de lluvias alto en la ciudad, que ha retrasado tambien la llegada de material a la obra, asi como algunos errores en la fabricación de estructura de escalera metálica, han retrasado las actividades. Otra demora ha sido la definición de la pintura intumescente, analizando las mejores opciones tanto de calidad como económica.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
8	Octubre 2020	$ 260.000.000	$31.565.060			
9	Noviembre 2020	$ 616.000.000	$126.793.447			
10	Diciembre 2020	$ 33.000.000				
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA


SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36	14	7	21
SEM 37	14	7	21
SEM 38	17	7	24
SEM 39	17	7	24
SEM 40	17	9	26

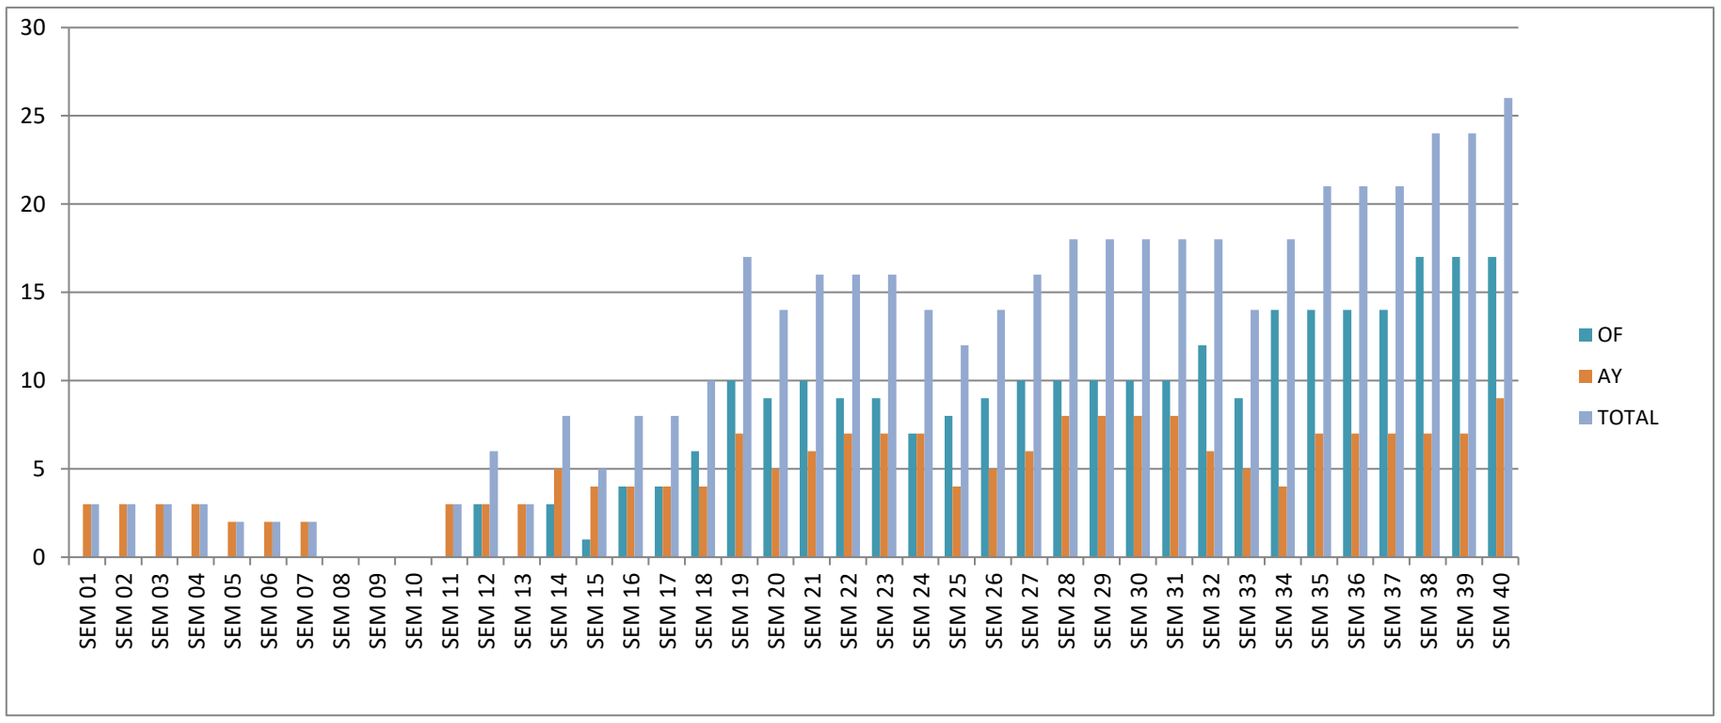

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROG	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%
2	10 AL 16		$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%	$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%
3	17 AL 23		$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%	$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%
4	24 AL 01		$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%	$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 8.074.145	$ 25.710.369	0,41%	1,30%	$ 8.174.105	$ 25.810.329	0,41%	1,31%
6	09 AL 15		$ 8.074.145	$ 33.784.514	0,41%	1,71%	$ 8.174.105	$ 33.984.434	0,41%	1,72%
7	16 AL 22		$ 8.074.145	$ 41.858.659	0,41%	2,12%	$ 8.174.105	$ 42.158.540	0,41%	2,14%
8	23 AL 29		$ 8.473.985	$ 50.332.644	0,43%	2,55%	$ 8.174.105	$ 50.332.645	0,41%	2,55%
9	11 AL 17	MAYO 2020	$ 19.566.396	$ 69.899.040	0,99%	3,55%	$ 13.044.264	$ 63.376.909	0,66%	3,21%
10	18 AL 24		$ 9.783.198	$ 79.682.238	0,50%	4,04%	$ 13.044.264	$ 76.421.172	0,66%	3,88%
11	25 AL 31		$ 9.783.198	$ 89.465.436	0,50%	4,54%	$ 13.044.264	$ 89.465.436	0,66%	4,54%
12	01 AL 07	JUNIO 2020	$ 18.477.693	$ 107.943.129	0,94%	5,48%	$ 18.308.000	$ 107.773.436	0,93%	5,47%
13	08 AL 14		$ 18.477.693	$ 126.420.822	0,94%	6,41%	$ 18.308.000	$ 126.081.436	0,93%	6,40%
14	15 AL 21		$ 18.477.693	$ 144.898.515	0,94%	7,35%	$ 18.308.000	$ 144.389.436	0,93%	7,32%
15	22 AL 28		$ 17.798.921	$ 162.697.436	0,90%	8,25%	$ 18.308.000	$ 162.697.436	0,93%	8,25%
16	29 AL 05	JULIO 2020	$ 32.550.081	$ 195.247.517	1,65%	9,90%	$ 32.550.081,00	$ 195.247.517	1,65%	9,90%
17	06 AL 12		$ 32.550.081	$ 227.797.598	1,65%	11,55%	$ 32.550.081,00	$ 227.797.598	1,65%	11,55%
18	13 AL 19		$ 32.550.083	$ 260.347.681	1,65%	13,21%	$ 32.550.081,00	$ 260.347.679	1,65%	13,21%
19	20 AL 26		$ 30.979.163	$ 291.326.844	1,57%	14,78%	$ 32.550.081,00	$ 292.897.760	1,65%	14,86%
20	27 AL 02	AGOSTO 2020	$ 21.455.255	$ 312.782.099	1,09%	15,86%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.015	1,09%	15,94%
21	03 AL 09		$ 21.455.255	$ 334.237.354	1,09%	16,95%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.270	1,09%	17,03%
22	10 AL 16		$ 21.455.255	$ 355.692.609	1,09%	18,04%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.526	1,09%	18,12%
23	17 AL 23		$ 21.455.256	$ 377.147.865	1,09%	19,13%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.781	1,09%	19,21%
24	24 AL 30		$ 21.455.254	$ 398.603.119	1,09%	20,22%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.036	1,09%	20,30%
25	31 AL 06	SEPTIEMBRE 2020	$ 57.149.734	$ 455.752.853	2,90%	23,12%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.898	2,89%	23,19%
26	07 AL 13		$ 57.149.734	$ 512.902.587	2,90%	26,02%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.760	2,89%	26,08%
27	14 AL 20		$ 57.149.734	$ 570.052.321	2,90%	28,91%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.622	2,89%	28,98%
28	21 AL 27		$ 56.738.427	$ 626.790.748	2,88%	31,79%	$ 57.046.864,00	$ 628.361.486	2,89%	31,87%
29	28 AL 04	OCTUBRE 2020	$ 22.328.950	$ 649.119.698	1,13%	32,92%	$ 40.382.187,40	$ 668.743.673	2,05%	33,92%
30	05 AL 11		$ 34.234.162	$ 683.353.860	1,74%	34,66%	$ 40.382.187,40	$ 709.125.861	2,05%	35,97%
31	12 AL 18		$ 53.820.064	$ 737.173.924	2,73%	37,39%	$ 40.382.187,40	$ 749.508.048	2,05%	38,02%
32	19 AL 25		$ 72.298.292	$ 809.472.216	3,67%	41,06%	$ 40.382.187,40	$ 789.890.236	2,05%	40,06%
33	26 AL 01		$ 142.540.148	$ 952.012.364	7,23%	48,29%	$ 40.382.187,40	$ 830.272.423	2,05%	42,11%
34	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 176.089.168	$ 1.128.101.532	8,93%	57,22%	$ 153.665.438,50	$ 983.937.861	7,79%	49,91%
35	09 AL 15		$ 194.087.141	$ 1.322.188.673	9,84%	67,06%	$ 153.665.438,50	$ 1.137.603.300	7,79%	57,70%
36	16 AL 22		$ 220.353.590	$ 1.542.542.263	11,18%	78,24%	$ 153.665.438,50	$ 1.291.268.738	7,79%	65,49%
37	23 AL 29		$ 176.415.826	$ 1.718.958.089	8,95%	87,19%	$ 153.665.438,50	$ 1.444.934.177	7,79%	73,29%
38	30 AL 6	DICIEMBRE 2020	$ 128.065.943	$ 1.847.024.032	6,50%	93,68%	$ 126.065.000,00	$ 1.570.999.177	6,394%	79,68%
39	7 AL 13		$ 88.581.224	$ 1.935.605.256	4,49%	98,18%				
40	14 AL 20		$ 19.941.919	$ 1.955.547.175	1,01%	99,19%				
41	21 AL 27		$ 8.443.203	$ 1.963.990.378	0,43%	99,62%				
42	28 AL 03	ENERO 2021	$ 4.744.161	$ 1.968.734.539	0,24%	99,86%				
43	04 AL 10		$ 2.819.799	$ 1.971.554.338	0,14%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

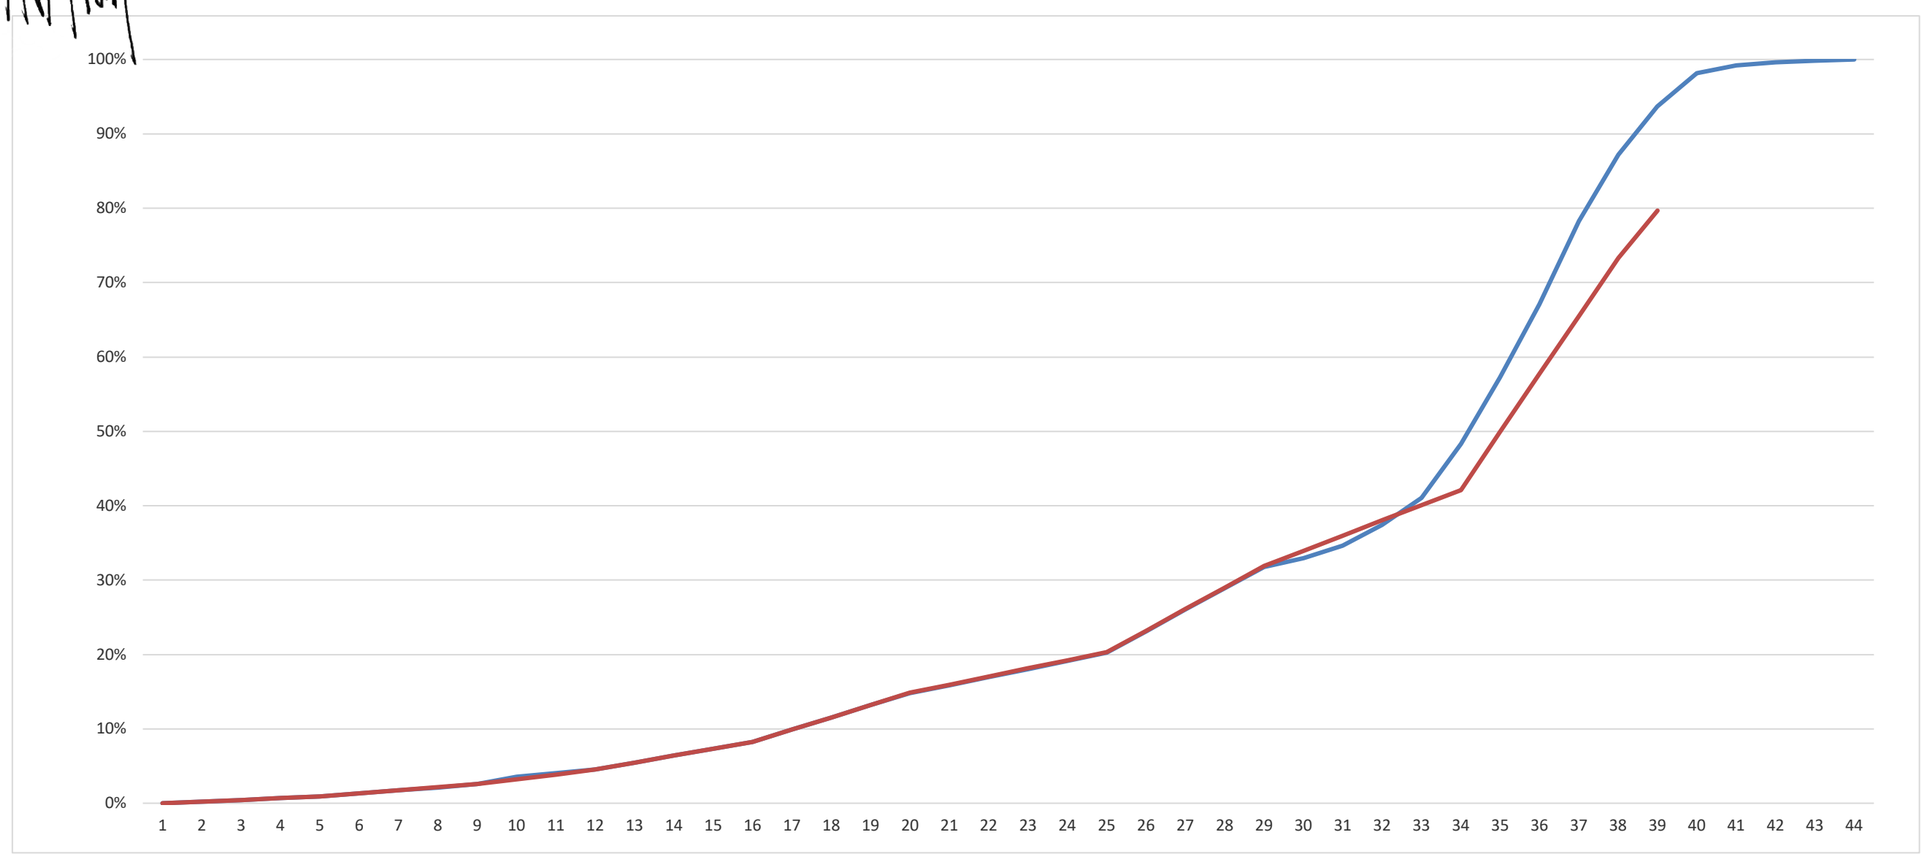

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

N V P CONSORCIO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 41 DEL 07/12/2020 a 13/12/2020

1. CONTROL TECNICO

Elaboró: Residente técnica — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD	No.	ACTIVIDAD
1	Instalacion de piso en arcilla volumen 3	9	
2	Izaje de estructura de ascensor	10	
3	Instalación de tuberia EMT en volumen 3	11	
4	instalación para platinas de escalera y ascensor patio 2	12	
5	Instalación de puntos tipo push baños segundo piso Casa	13	
6	Laboratorio de Arqueología	14	
7	Aseo General obra	15	
8	Instalación estructura muros superboard volumen 3	16	

OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

2. CONTROL ADMINISTRATIVO

Elaboró: Residente administrativa — Arq. Liliana Marcelo

No.	ACTIVIDAD
1	En esta semana se hizo comité #29 el día 07 de octubre de 2020
2	


OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

1	

3. CONTROL FINANCIERO.

INVERSION ACUMULADA		#¡REF!
SALDO POR INVERTIR		#¡REF!



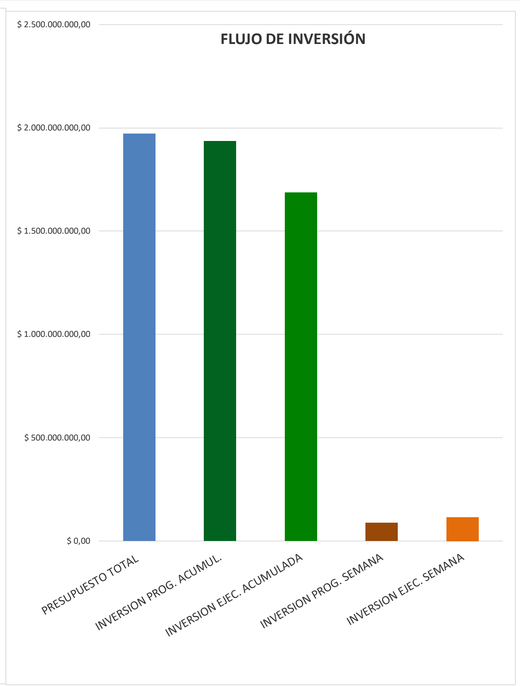

5. CONTROL H.S.E.Q.

Elaboró: Residente HSEQ — Ing. Lili Vidales

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspeccion de seguridad actividades diaria grupo electrico, instalacion de pisos, instalaciones en piso en madera y actividades de obra civil en acabados.	
2	Se realizan las pruebas al personal en obra el día jueves 30 de Noviembre Según revisión de los mismos los indicadres se mantienen en ceros.	
3	Participacion en jornada de toma de TEST PCR al personal de obra administrativo, interventoria, operativo y tecnico.	
4	Se realiza verificación de condiciones de salud diarias uso de EPP y uso de tapabocas según lo establecido en Protocolo COVID-19.	
5		

	INFORMACION AMBIENTAL REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Retiro de material RCD	
2	Se realiza remoción de escombros y limpieza en zonas.	
3	Se verifican actividades según los establecido en el protocolo de bioseguridad para COVID-19, garantizando condiciones de areas, distanciamiento y cuidado individual.	
4		

	INFORMACION SISO REQUERIDA	OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
1	Inspecciones de seguridad industrial y salud en el trabajo	
2	Verificacion de cumplimiento aportes a seguridad social y afiliaciones	
3	Se realizan las respectivas inducciones, ingreso de herramientas y preoperacionales del personal de instalacion y acabados	
4	A la fecha no se ha notificado ningún ningun accidente o incidente, se realiza antes de icniciar actividades un analisis de trabajo seguro enlas diferentes areas de acuerdo a la naturaleza de los riesgos .	


	CONTROL PERSONAL OPERATIVO				OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES
		PROPUESTOS	EN OBRA	DIFERENCIA	
1	ADMINISTRATIVOS	7	7	0	
2	TECNICOS OPERATIVOS	5	5	0	
3	OFICIALES	17	17	0	
4	AYUDANTES	8	8	0	
	TOTAL	37	37	0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	N V P CONSORCIO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 B N° 2-91 DENOMINADO CASA TITO, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.".

CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATO OBRA	
CONTRATO No.	513 de 2019	CONTRATO No.	510 DE 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO NVP	CONTRATISTA	CONSORCIO CASA TITO
PLAZO INICIAL	9 MESES	PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020	FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2020
FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2020	FECHA TERMINACION INICIAL	02 DE OCTUBRE DE 2020
PRORROGA 01	2 MESES	PRORROGA 01	8 DIAS CALENDARIO
	-	PRORROGA 02	45 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN 01	$ 90.445.190,00	ADICIÓN 01	$232.506.120,00
SUSPENSÓN 1	25 de marzo al 16 de abril	SUSPENSION 1	25 de marzo al 16 de abril
SUSPENSÓN 2	17 de abril al 28 abril	SUSPENSION 2	17 de abril al 11 de mayo
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	05 DE FEBRERO DE 2021	FECHA TERMINACION ACTUAL	10 DE ENERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 304.991.090,00	VALOR INICIAL	$1.739.048.042,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 395.436.280,00	VALOR FINAL	$1.971.554.162,00
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
VALOR POR PAGAR	$395.436.280,00	VALOR POR PAGAR	$1.971.554.162,00

INFORME SEMANA No. 41 DEL 07/12/2020 a 13/12/2020

% AVANCE	-12,66%	
PRESUPUESTO TOTAL	$ 1.971.554.162,00	100,00%
INVERSION PROG. ACUMUL.	$ 1.935.605.256,00	98,177%
INVERSION EJEC. ACUMULADA	$ 1.686.081.276,92	85,520%
INVERSION PROG. SEMANA	$ 88.581.224,00	4,493%
INVERSION EJEC. SEMANA	$ 115.082.100,00	5,837%



OBSERVACIONES / COMENTARIOS / NOTAS

Para este periodo se realizo una prorroga y adición al contrato de obra, por lo tanto, se hace un ajuste en la programación y flujo de inversión, esta semana se presenta un atraso de 12,66% debido al porcentaje de lluvias alto en la ciudad, que ha retrasado tambien la llegada de material a la obra, asi como algunos errores en la fabricación de estructura de escalera metálica, han retrasado las actividades. Otra demora ha sido la definición de la pintura intumescente, analizando las mejores opciones tanto de calidad como económica.

7. PAC

CORTE No.	FECHA PRESENTACIÓN PROYECCIÓN PAC	Vr. PAC PROYECTADO OBRA	Vr. PAC PROYECTADO INTERVENTORÍA	TOTAL PROYECCIÓN	Vr. PAGADO	OBSERVACIONES
1	Febrero 2020	$ 17.636.226	$8.987.240			
2	Marzo 2020	$ 32.696.421	$9.210.041			
3	Abril 2020		$3.162.871			
4	Mayo 2020	$ 39.132.791	$11.581.617			
5	Junio 2020	$ 73.232.000	$8.990.222			
6	Agosto 2020	$ 106.500.000	$19.851.938			
7	Septiembre 2020	$ 281.450.000	$41.329.624			
8	Octubre 2020	$ 260.000.000	$31.565.060			
9	Noviembre 2020	$ 616.000.000				
10	Diciembre 2021	$ 330.000.000	$126.793.448			
	TOTAL ACUMULADO	$162.697.438	$41.931.991	$0	$0	

6. REGISTRO FOTOGRAFICO










Proyectó:	Arq. Cristian Correcha	Arq. Néstor Vargas Pedroza		Arq. Ricardo Escobar	
Revisó:	Arq. Liliana Marcelo	Director de interventoría		Supervisor del contrato	
Aprobó:	Arq. . Néstor Vargas	Consorcio NVP		IDPC	

CONSORCIO CASA TITO
510 DE 2019
REPROGRAMACIÓN DE HISTOGRAMA

SEMANA	OF	AY	TOTAL
SEM 01	0	3	3
SEM 02	0	3	3
SEM 03	0	3	3
SEM 04	0	3	3
SEM 05	0	2	2
SEM 06	0	2	2
SEM 07	0	2	2
SEM 08	0	0	0
SEM 09	0	0	0
SEM 10	0	0	0
SEM 11	0	3	3
SEM 12	3	3	6
SEM 13	0	3	3
SEM 14	3	5	8
SEM 15	1	4	5
SEM 16	4	4	8
SEM 17	4	4	8
SEM 18	6	4	10
SEM 19	10	7	17
SEM 20	9	5	14
SEM 21	10	6	16
SEM 22	9	7	16
SEM 23	9	7	16
SEM 24	7	7	14
SEM 25	8	4	12
SEM 26	9	5	14
SEM 27	10	6	16
SEM 28	10	8	18
SEM 29	10	8	18
SEM 30	10	8	18
SEM 31	10	8	18
SEM 32	12	6	18
SEM 33	9	5	14
SEM 34	14	4	18
SEM 35	14	7	21
SEM 36	14	7	21
SEM 37	14	7	21
SEM 38	17	7	24
SEM 39	17	7	24
SEM 40	17	9	26
SEM 41	17	8	25

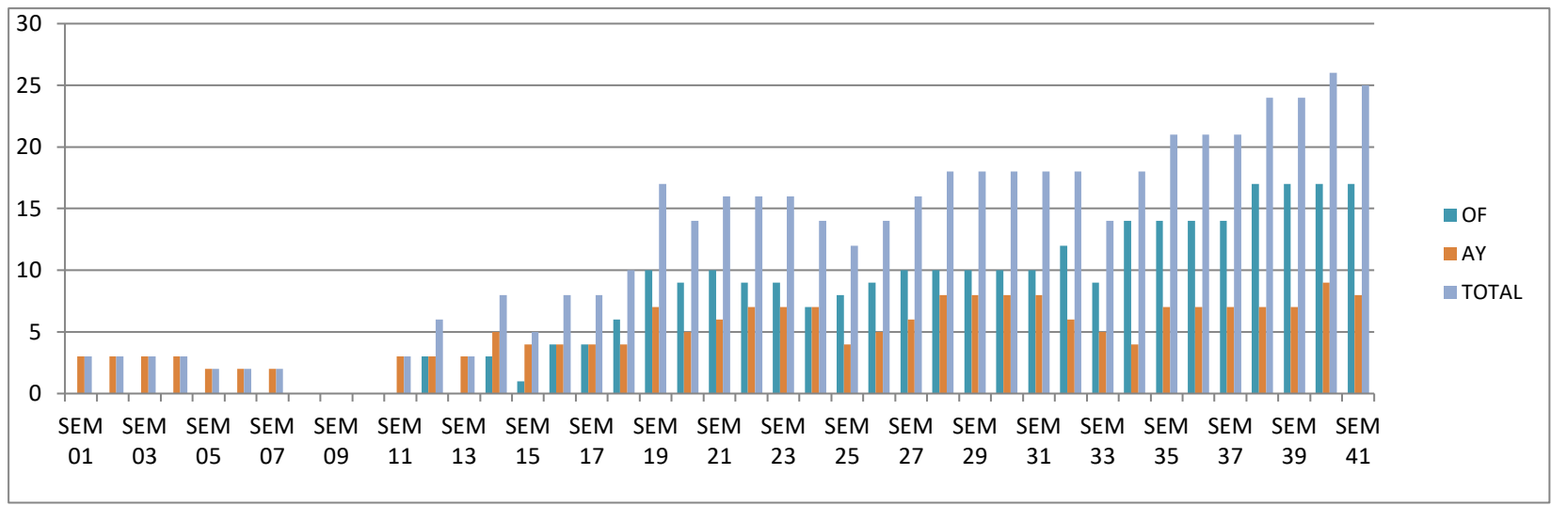

SEMANA No.	SEMANA	MES	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROG	% PROGR ACUM	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJEC	% EJEC ACUM
0	0		$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0,00	$ 0	0,00%	0,00%
1	03 AL 09	FEBRERO 2020	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%	$ 4.409.056	$ 4.409.056	0,22%	0,22%
2	10 AL 16		$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%	$ 4.409.056	$ 8.818.112	0,22%	0,45%
3	17 AL 23		$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%	$ 4.409.056	$ 13.227.168	0,22%	0,67%
4	24 AL 01		$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%	$ 4.409.056	$ 17.636.224	0,22%	0,89%
5	02 AL 08	MARZO 2020	$ 8.074.145	$ 25.710.369	0,41%	1,30%	$ 8.174.105	$ 25.810.329	0,41%	1,31%
6	09 AL 15		$ 8.074.145	$ 33.784.514	0,41%	1,71%	$ 8.174.105	$ 33.984.434	0,41%	1,72%
7	16 AL 22		$ 8.074.145	$ 41.858.659	0,41%	2,12%	$ 8.174.105	$ 42.158.540	0,41%	2,14%
8	23 AL 29		$ 8.473.985	$ 50.332.644	0,43%	2,55%	$ 8.174.105	$ 50.332.645	0,41%	2,55%
9	11 AL 17	MAYO 2020	$ 19.566.396	$ 69.899.040	0,99%	3,55%	$ 13.044.264	$ 63.376.909	0,66%	3,21%
10	18 AL 24		$ 9.783.198	$ 79.682.238	0,50%	4,04%	$ 13.044.264	$ 76.421.172	0,66%	3,88%
11	25 AL 31		$ 9.783.198	$ 89.465.436	0,50%	4,54%	$ 13.044.264	$ 89.465.436	0,66%	4,54%
12	01 AL 07	JUNIO 2020	$ 18.477.693	$ 107.943.129	0,94%	5,48%	$ 18.308.000	$ 107.773.436	0,93%	5,47%
13	08 AL 14		$ 18.477.693	$ 126.420.822	0,94%	6,41%	$ 18.308.000	$ 126.081.436	0,93%	6,40%
14	15 AL 21		$ 18.477.693	$ 144.898.515	0,94%	7,35%	$ 18.308.000	$ 144.389.436	0,93%	7,32%
15	22 AL 28		$ 17.798.921	$ 162.697.436	0,90%	8,25%	$ 18.308.000	$ 162.697.436	0,93%	8,25%
16	29 AL 05	JULIO 2020	$ 32.550.081	$ 195.247.517	1,65%	9,90%	$ 32.550.081,00	$ 195.247.517	1,65%	9,90%
17	06 AL 12		$ 32.550.081	$ 227.797.598	1,65%	11,55%	$ 32.550.081,00	$ 227.797.598	1,65%	11,55%
18	13 AL 19		$ 32.550.083	$ 260.347.681	1,65%	13,21%	$ 32.550.081,00	$ 260.347.679	1,65%	13,21%
19	20 AL 26		$ 30.979.163	$ 291.326.844	1,57%	14,78%	$ 32.550.081,00	$ 292.897.760	1,65%	14,86%
20	27 AL 02	AGOSTO 2020	$ 21.455.255	$ 312.782.099	1,09%	15,86%	$ 21.455.255,20	$ 314.353.015	1,09%	15,94%
21	03 AL 09		$ 21.455.255	$ 334.237.354	1,09%	16,95%	$ 21.455.255,20	$ 335.808.270	1,09%	17,03%
22	10 AL 16		$ 21.455.255	$ 355.692.609	1,09%	18,04%	$ 21.455.255,20	$ 357.263.526	1,09%	18,12%
23	17 AL 23		$ 21.455.256	$ 377.147.865	1,09%	19,13%	$ 21.455.255,20	$ 378.718.781	1,09%	19,21%
24	24 AL 30		$ 21.455.254	$ 398.603.119	1,09%	20,22%	$ 21.455.255,20	$ 400.174.036	1,09%	20,30%
25	31 AL 06	SEPTIEMBRE 2020	$ 57.149.734	$ 455.752.853	2,90%	23,12%	$ 57.046.862,00	$ 457.220.898	2,89%	23,19%
26	07 AL 13		$ 57.149.734	$ 512.902.587	2,90%	26,02%	$ 57.046.862,00	$ 514.267.760	2,89%	26,08%
27	14 AL 20		$ 57.149.734	$ 570.052.321	2,90%	28,91%	$ 57.046.862,00	$ 571.314.622	2,89%	28,98%
28	21 AL 27		$ 56.738.427	$ 626.790.748	2,88%	31,79%	$ 57.046.864,00	$ 628.361.486	2,89%	31,87%
29	28 AL 04	OCTUBRE 2020	$ 22.328.950	$ 649.119.698	1,13%	32,92%	$ 40.382.187,40	$ 668.743.673	2,05%	33,92%
30	05 AL 11		$ 34.234.162	$ 683.353.860	1,74%	34,66%	$ 40.382.187,40	$ 709.125.861	2,05%	35,97%
31	12 AL 18		$ 53.820.064	$ 737.173.924	2,73%	37,39%	$ 40.382.187,40	$ 749.508.048	2,05%	38,02%
32	19 AL 25		$ 72.298.292	$ 809.472.216	3,67%	41,06%	$ 40.382.187,40	$ 789.890.236	2,05%	40,06%
33	26 AL 01		$ 142.540.148	$ 952.012.364	7,23%	48,29%	$ 40.382.187,40	$ 830.272.423	2,05%	42,11%
34	02 AL 08	NOVIEMBRE 2020	$ 176.089.168	$ 1.128.101.532	8,93%	57,22%	$ 153.665.438,50	$ 983.937.861	7,79%	49,91%
35	09 AL 15		$ 194.087.141	$ 1.322.188.673	9,84%	67,06%	$ 153.665.438,50	$ 1.137.603.300	7,79%	57,70%
36	16 AL 22		$ 220.353.590	$ 1.542.542.263	11,18%	78,24%	$ 153.665.438,50	$ 1.291.268.738	7,79%	65,49%
37	23 AL 29		$ 176.415.826	$ 1.718.958.089	8,95%	87,19%	$ 153.665.438,50	$ 1.444.934.177	7,79%	73,29%
38	30 AL 6	DICIEMBRE 2020	$ 128.065.943	$ 1.847.024.032	6,50%	93,68%	$ 126.065.000,00	$ 1.570.999.177	6,394%	79,68%
39	7 AL 13		$ 88.581.224	$ 1.935.605.256	4,49%	98,18%	$ 115.082.100,00	$ 1.686.081.277	5,837%	85,52%
40	14 AL 20		$ 19.941.919	$ 1.955.547.175	1,01%	99,19%				
41	21 AL 27		$ 8.443.203	$ 1.963.990.378	0,43%	99,62%				
42	28 AL 03	ENERO 2021	$ 4.744.161	$ 1.968.734.539	0,24%	99,86%				
43	04 AL 10		$ 2.819.799	$ 1.971.554.338	0,14%	100,00%				

Representante Legal de Interventoría

ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

