
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**PROYECTO PARQUES TEUSAQUILLO**	**129 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 960.000.000,02**
2		**INICIO**	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00
3		**I. ETAPA ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO**	**18 días**	**jue 22/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 0,00**
12		**II. ETAPA PROGRAMA DE INTERVENCIONES**	**14 días**	**sáb 7/02/26**	**lun 23/02/26**		**$ 0,00**
14		**III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN**	**89 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 960.000.000,02**
15		**URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003**	**56 días**	**mar 31/03/26**	**mié 3/06/26**		**$ 131.307.086,70**
16		**PRELIMINARES**	**13 días**	**mar 31/03/26**	**mar 14/04/26**		**$ 16.918.274,64**
17		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	5 días	mar 31/03/26	sáb 4/04/26	13FC+30 dí	$ 12.383.549,21
18		Localización y Replanteo	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	17	$ 3.176.077,65
19		Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	18	$ 423.240,73
20		Excavación manual con retiro suelo blando**	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	19	$ 935.407,05
21		**PISOS**	**27 días**	**jue 16/04/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 18.956.458,18**
22		Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD	5 días	jue 16/04/26	mar 21/04/26	43	$ 2.195.676,17
23		Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mié 6/05/26	sáb 16/05/26	26FC+7 día	$ 12.998.919,86
24		Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	3 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	22	$ 3.761.862,15
25		**ESTRUCTURA**	**5 días**	**mié 22/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 4.108.974,16**
26		Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	5 días	mié 22/04/26	lun 27/04/26	22	$ 4.108.974,16
27		**MOBILIARIO**	**20 días**	**mar 28/04/26**	**mié 20/05/26**		**$ 22.724.215,34**
28		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	7 días	mar 28/04/26	mar 5/05/26	26	$ 20.043.605,80
29		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	23	$ 2.680.609,54
30		**NO PREVISTOS**	**45 días**	**lun 13/04/26**	**mié 3/06/26**		**$ 68.599.164,38**
31		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	mié 6/05/26	mié 13/05/26	28	$ 2.419.009,43
32		PINTURA MODULO M-3A	7 días	mié 6/05/26	mié 13/05/26	31CC	$ 1.127.648,68
33		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	5 días	mié 6/05/26	lun 11/05/26	32CC	$ 1.293.753,01
34		CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	33	$ 76.215,36
35		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	vie 15/05/26	mar 26/05/26	34	$ 4.005.491,04
36		Desmonte juegos infantiles **	2 días	lun 13/04/26	mar 14/04/26	19	$ 44.892.944,60
37		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	32CF	$ 184.070,73
38		Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	5 días	sáb 25/04/26	jue 30/04/26	24	$ 1.880.524,01
39		Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	3 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	33CC	$ 212.691,33
40		AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST)	3 días	mié 6/05/26	vie 8/05/26	32CC	$ 357.898,47
41		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICI]ON PIEZAS BIOSALUDABLES	3 días	sáb 9/05/26	mar 12/05/26	40	$ 376.120,05
42		JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	15 días	lun 18/05/26	mié 3/06/26	23	$ 11.385.524,92
43		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	20	$ 387.272,75
44		**PARQUE ALFONSO LOPEZ COD: 13-013**	**65 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 78.291.728,60**
45		**TRAMITES ANTE IDPC**	**45 días**	**mar 3/03/26**	**jue 23/04/26**		**$ 0,00**
46		ELABORACION Y PRESENTACION DOCUMENTOS	15 días	mar 3/03/26	jue 19/03/26	6FC+20 día	$ 0,00
47		REVISION Y APROBACION PERMISOS IDPC	30 días	vie 20/03/26	jue 23/04/26	46	$ 0,00
48		**PRELIMINARES**	**3 días**	**vie 24/04/26**	**lun 27/04/26**		**$ 7.206.932,59**
49		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	vie 24/04/26	sáb 25/04/26	47	$ 4.658.193,79
50		Localización y Replanteo	1 día	lun 27/04/26	lun 27/04/26	49	$ 2.548.738,80
51		**MOBILIARIO**	**15 días**	**mié 29/04/26**	**vie 15/05/26**		**$ 9.641.475,90**
52		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	10 días	mar 5/05/26	vie 15/05/26	57	$ 4.509.811,30
53		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	52FF	$ 1.787.073,03
54		Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	60CC	$ 3.344.591,57
55		**ITEMS NO PREVISTOS**	**17 días**	**mar 28/04/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 61.443.320,11**
56		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	10 días	mié 6/05/26	sáb 16/05/26	62	$ 28.624.944,93
57		Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	3 días	vie 1/05/26	mar 5/05/26	66CF	$ 2.079.315,38
58		DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	3 días	mié 29/04/26	vie 1/05/26	63	$ 1.388.298,39
59		Pintura Modulo M-5 Columpio **	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	63	$ 965.695,63
60		PINTURA MODULO M-3A	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	59CC	$ 1.127.648,68
61		RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	5 días	mar 5/05/26	sáb 9/05/26	60	$ 3.455.043,47
62		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	1 día	mar 5/05/26	mar 5/05/26	54	$ 142.170,66
63		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	1 día	mar 28/04/26	mar 28/04/26	50	$ 7.129.475,59
64		Pintura Baranda M-80 (2 manos)	5 días	mar 5/05/26	sáb 9/05/26	60	$ 405.730,22
65		ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	2 días	vie 8/05/26	sáb 9/05/26	61FF	$ 2.718.488,78
66		Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	10 días	mar 5/05/26	vie 15/05/26	67	$ 601.623,54
67		Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	5 días	mié 29/04/26	lun 4/05/26	63	$ 12.804.884,84
68		**PARQUE SANTA CLARA COD.13-015**	**67 días**	**mié 25/03/26**	**mié 10/06/26**		**$ 167.110.749,37**
69		**PRELIMINARES**	**17 días**	**mié 25/03/26**	**lun 13/04/26**		**$ 15.351.268,15**
70		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	5 días	mié 25/03/26	lun 30/03/26	**13FC+25 dí**	$ 9.792.853,52
71		Localización y Replanteo	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	70CC	$ 383.162,01
72		Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	3 días	jue 2/04/26	sáb 4/04/26	71FC+5 día	$ 2.918.302,50
73		Excavación manual con retiro suelo blando**	7 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	72	$ 2.256.950,12
74		**PISOS**	**7 días**	**jue 16/04/26**	**jue 23/04/26**		**$ 9.850.442,96**
75		Relleno compactado Base granular tipo IDRD	7 días	jue 16/04/26	jue 23/04/26	97	$ 5.021.152,43
76		Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	6 días	vie 17/04/26	jue 23/04/26	75FF	$ 4.829.290,53
77		**MOBILIARIO**	**30 días**	**vie 17/04/26**	**jue 21/05/26**		**$ 27.518.051,97**
78		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	30 días	vie 17/04/26	jue 21/05/26	76CC	$ 25.730.978,95
79		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	5 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26	78FF	$ 1.787.073,02
80		**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**sáb 16/05/26**	**jue 21/05/26**		**$ 2.407.438,87**
81		Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	5 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26	79FF	$ 2.407.438,87
82		**NO PREVISTOS**	**60 días**	**jue 2/04/26**	**mié 10/06/26**		**$ 111.983.547,42**
83		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	6 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	78FF	$ 403.168,24
84		Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	10 días	sáb 30/05/26	mié 10/06/26	96	$ 38.821.382,34
85		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	83CC	$ 142.170,66
86		Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	mar 14/04/26	mar 14/04/26	73	$ 129.620,83
87		CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	85CC	$ 112.700,55
88		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	5 días	vie 22/05/26	mié 27/05/26	83	$ 2.127.695,68
89		Desmonte juegos infantiles **	3 días	jue 2/04/26	sáb 4/04/26	72FF	$ 552.212,20
90		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	1 día	jue 14/05/26	vie 15/05/26	83CF	$ 57.485.758,40
91		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	5 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26	83FF	$ 735.963,40
92		Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	2 días	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	85FF	$ 806.370,61
93		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	4 días	vie 24/04/26	mar 28/04/26	75	$ 51.128,35
94		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	7 días	jue 14/05/26	jue 21/05/26	79FF	$ 8.889.057,69
95		Desmonte y reinstalacion canecas **	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	94CC	$ 795.916,26
96		JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	20 días	jue 7/05/26	vie 29/05/26	93FC+7 día	$ 778.676,42
97		Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	1 día	mié 15/04/26	mié 15/04/26	86	$ 151.725,79
98		**URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-018**	**38 días**	**lun 16/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 191.585.603,81**
99		**PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 16/03/26**	**mar 24/03/26**		**$ 8.260.238,94**
100		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	4 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	13FC+17 dí	$ 2.538.979,71
101		Localización y Replanteo	4 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	100	$ 5.721.259,23
102		**PISOS**	**15 días**	**sáb 11/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 23.688.925,39**
103		Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	15 días	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	111CC	$ 23.688.925,39
104		**MOBILIARIO**	**20 días**	**lun 6/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 25.373.785,40**
105		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	12 días	sáb 11/04/26	vie 24/04/26	114	$ 22.807.953,10
106		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	7 días	mar 21/04/26	mar 28/04/26	111FF	$ 893.536,51
107		Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26	110	$ 1.672.295,79
108		**NO PREVISTOS**	**30 días**	**mié 25/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 134.262.654,08**
109		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	15 días	lun 6/04/26	mié 22/04/26	114CC	$ 11.691.878,91
110		Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	10 días	mié 25/03/26	sáb 4/04/26	101	$ 1.601.950,29
111		Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	15 días	sáb 11/04/26	mar 28/04/26	117CC+5 dí	$ 53.405.144,34
112		PINTURA MODULO M-3A	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26	107	$ 1.127.648,68
113		RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	112	$ 3.455.043,47
114		Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	110	$ 57.485.758,40
115		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	7 días	jue 9/04/26	jue 16/04/26	107	$ 4.228.738,34
116		Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	1 día	mié 25/03/26	mié 25/03/26	101	$ 806.370,61
117		JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	15 días	lun 6/04/26	mié 22/04/26	110	$ 460.121,04
118		**URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD. 13-034**	**84 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 51.416.368,53**
119		**TRAMITES ANTE IDPC**	**45 días**	**lun 9/03/26**	**mié 29/04/26**		**$ 0,00**
120		ELABORACION Y PRESENTACION DOCUMENTOS	15 días	lun 9/03/26	mié 25/03/26	46CC+5 día	$ 0,00
121		REVISION Y APROBACION PERMISOS IDPC	30 días	jue 26/03/26	mié 29/04/26	120	$ 0,00
122		**PRELIMINARES**	**3 días**	**mié 6/05/26**	**vie 8/05/26**		**$ 3.339.932,39**
123		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	mié 6/05/26	jue 7/05/26	121FC+5 dí	$ 2.376.818,60
124		Localización y Replanteo	1 día	vie 8/05/26	vie 8/05/26	123	$ 963.113,79
125		**PISOS**	**10 días**	**sáb 30/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 10.201.249,00**
126		Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	sáb 30/05/26	mié 10/06/26	135FF	$ 10.201.249,00
127		**MOBILIARIO**	**3 días**	**jue 11/06/26**	**sáb 13/06/26**		**$ 893.536,51**
128		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	3 días	jue 11/06/26	sáb 13/06/26	126	$ 893.536,51
129		**ITEMS NO PREVISTOS**	**28 días**	**sáb 9/05/26**	**mié 10/06/26**		**$ 36.981.650,63**
130		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	4 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26	133CC	$ 403.168,24
131		Mantenimiento y pintura de juego,incluye libelula	3 días	mar 12/05/26	jue 14/05/26	134	$ 1.638.249,60
132		CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	4 días	mar 12/05/26	vie 15/05/26	134	$ 38.107,68
133		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	4 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26	131	$ 2.012.429,75
134		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2 días	sáb 9/05/26	lun 11/05/26	124	$ 31.419.148,95
135		JUEGO CASA GNOMOS CON DESLIZADERO	21 días	lun 18/05/26	mié 10/06/26	134FC+5 dí	$ 1.470.546,41
136		**URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066**	**64 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 165.119.788,30**
137		**PRELIMINARES**	**17 días**	**mié 4/03/26**	**lun 23/03/26**		**$ 30.067.958,68**
138		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	13FC+7 día	$ 13.964.959,61
139		Localización y Replanteo	3 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	138	$ 2.445.579,79
140		Descapote Manual y Retiro (e=10-15 cm)	2 días	mar 10/03/26	mié 11/03/26	139	$ 1.669.470,58
141		Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	140	$ 1.697.618,58
142		Excavación manual con retiro suelo blando**	7 días	lun 16/03/26	lun 23/03/26	141;143	$ 4.477.125,39
143		Demolicion Manual graderia Ladrillo y Placa Conc.	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	140CC	$ 5.813.204,73
144		**PISOS**	**17 días**	**mar 24/03/26**	**sáb 11/04/26**		**$ 10.314.503,19**
145		Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 24/03/26	jue 9/04/26	142	$ 8.747.060,63
146		Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	2 días	vie 10/04/26	sáb 11/04/26	145	$ 1.567.442,56
147		**ESTRUCTURA**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**mié 15/04/26**		**$ 7.357.529,13**
148		Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	15 días	lun 30/03/26	mié 15/04/26	159FF	$ 7.357.529,13
149		**MOBILIARIO**	**10 días**	**sáb 2/05/26**	**mié 13/05/26**		**$ 33.294.461,67**
150		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	7 días	sáb 2/05/26	sáb 9/05/26	151CC	$ 893.536,51
151		BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	10 días	sáb 2/05/26	mié 13/05/26	148FC+14 días	$ 32.400.925,16
152		**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**vie 8/05/26**	**mié 13/05/26**		**$ 1.985.069,56**
153		Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	5 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	151FF	$ 1.985.069,56
154		**NO PREVISTOS**	**59 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 16/05/26**		**$ 82.100.266,07**
155		ESCALERA EN CONCRETO	3 días	vie 10/04/26	lun 13/04/26	159CC	$ 4.126.080,01
156		Desmonte adoquin (Cragues y retiro)	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	143CC	$ 559.689,86
157		DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	156CC	$ 1.328.574,43
158		Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	10 días	lun 30/03/26	jue 9/04/26	145CC+5 dí	$ 515.039,91
159		Adoquin Ecológico Gramoquin e=8cm+Estructura	5 días	vie 10/04/26	mié 15/04/26	145	$ 25.682.456,98
160		Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	2 días	mar 12/05/26	mié 13/05/26	151FF	$ 48.215.456,97
161		Protector de Arbol M-91**	5 días	mar 12/05/26	sáb 16/05/26	160CC	$ 538.057,35
162		Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU.	4 días	mié 13/05/26	sáb 16/05/26	161FF	$ 1.134.910,56
163		**FUTURA COD. 13-149**	**37 días**	**mar 17/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 175.168.674,71**
164		**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 21/03/26**		**$ 5.436.332,57**
165		Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	3 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	13FC+18 dí	$ 3.987.405,95
166		Localización y Replanteo	2 días	vie 20/03/26	sáb 21/03/26	165	$ 1.448.926,62
167		**PISOS**	**12 días**	**mié 15/04/26**	**mar 28/04/26**		**$ 37.350.550,27**
168		Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mié 15/04/26	sáb 25/04/26	183	$ 11.430.383,53
169		Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	vie 17/04/26	mar 28/04/26	168CC+2 dí	$ 25.920.166,74
170		**MOBILIARIO**	**27 días**	**sáb 28/03/26**	**mar 28/04/26**		**$ 28.445.068,74**
171		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	20 días	sáb 28/03/26	lun 20/04/26	175	$ 26.657.995,72
172		Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	3 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	169FF	$ 1.787.073,02
173		**ITEMS NO PREVISTOS**	**23 días**	**sáb 21/03/26**	**jue 16/04/26**		**$ 103.936.723,13**
174		DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	5 días	vie 27/03/26	mié 1/04/26	179CC-3 dí	$ 6.539.996,07
175		CURADO FISURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX**	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	166	$ 4.270.365,79
176		Desmonte juegos infantiles **	3 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	175CC+2 dí	$ 184.070,73
177		DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	15 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	171CC+2 dí	$ 3.339.974,81
178		Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	181CC	$ 3.395.880,08
179		DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID	15 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	177CC	$ 4.642.569,64
180		DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	15 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	179CC	$ 5.070.298,50
181		DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	15 días	mar 31/03/26	jue 16/04/26	180CC	$ 3.882.147,48
182		Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	175CC	$ 3.648.144,00
183		TORRE PUENTE Y DESLIZADERO	15 días	sáb 28/03/26	mar 14/04/26	175	$ 67.680.597,48
184		DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	2 días	sáb 21/03/26	mar 24/03/26	174CF-3 día	$ 1.282.678,55
185		**FIN PROYECTO**	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		$ 0,00

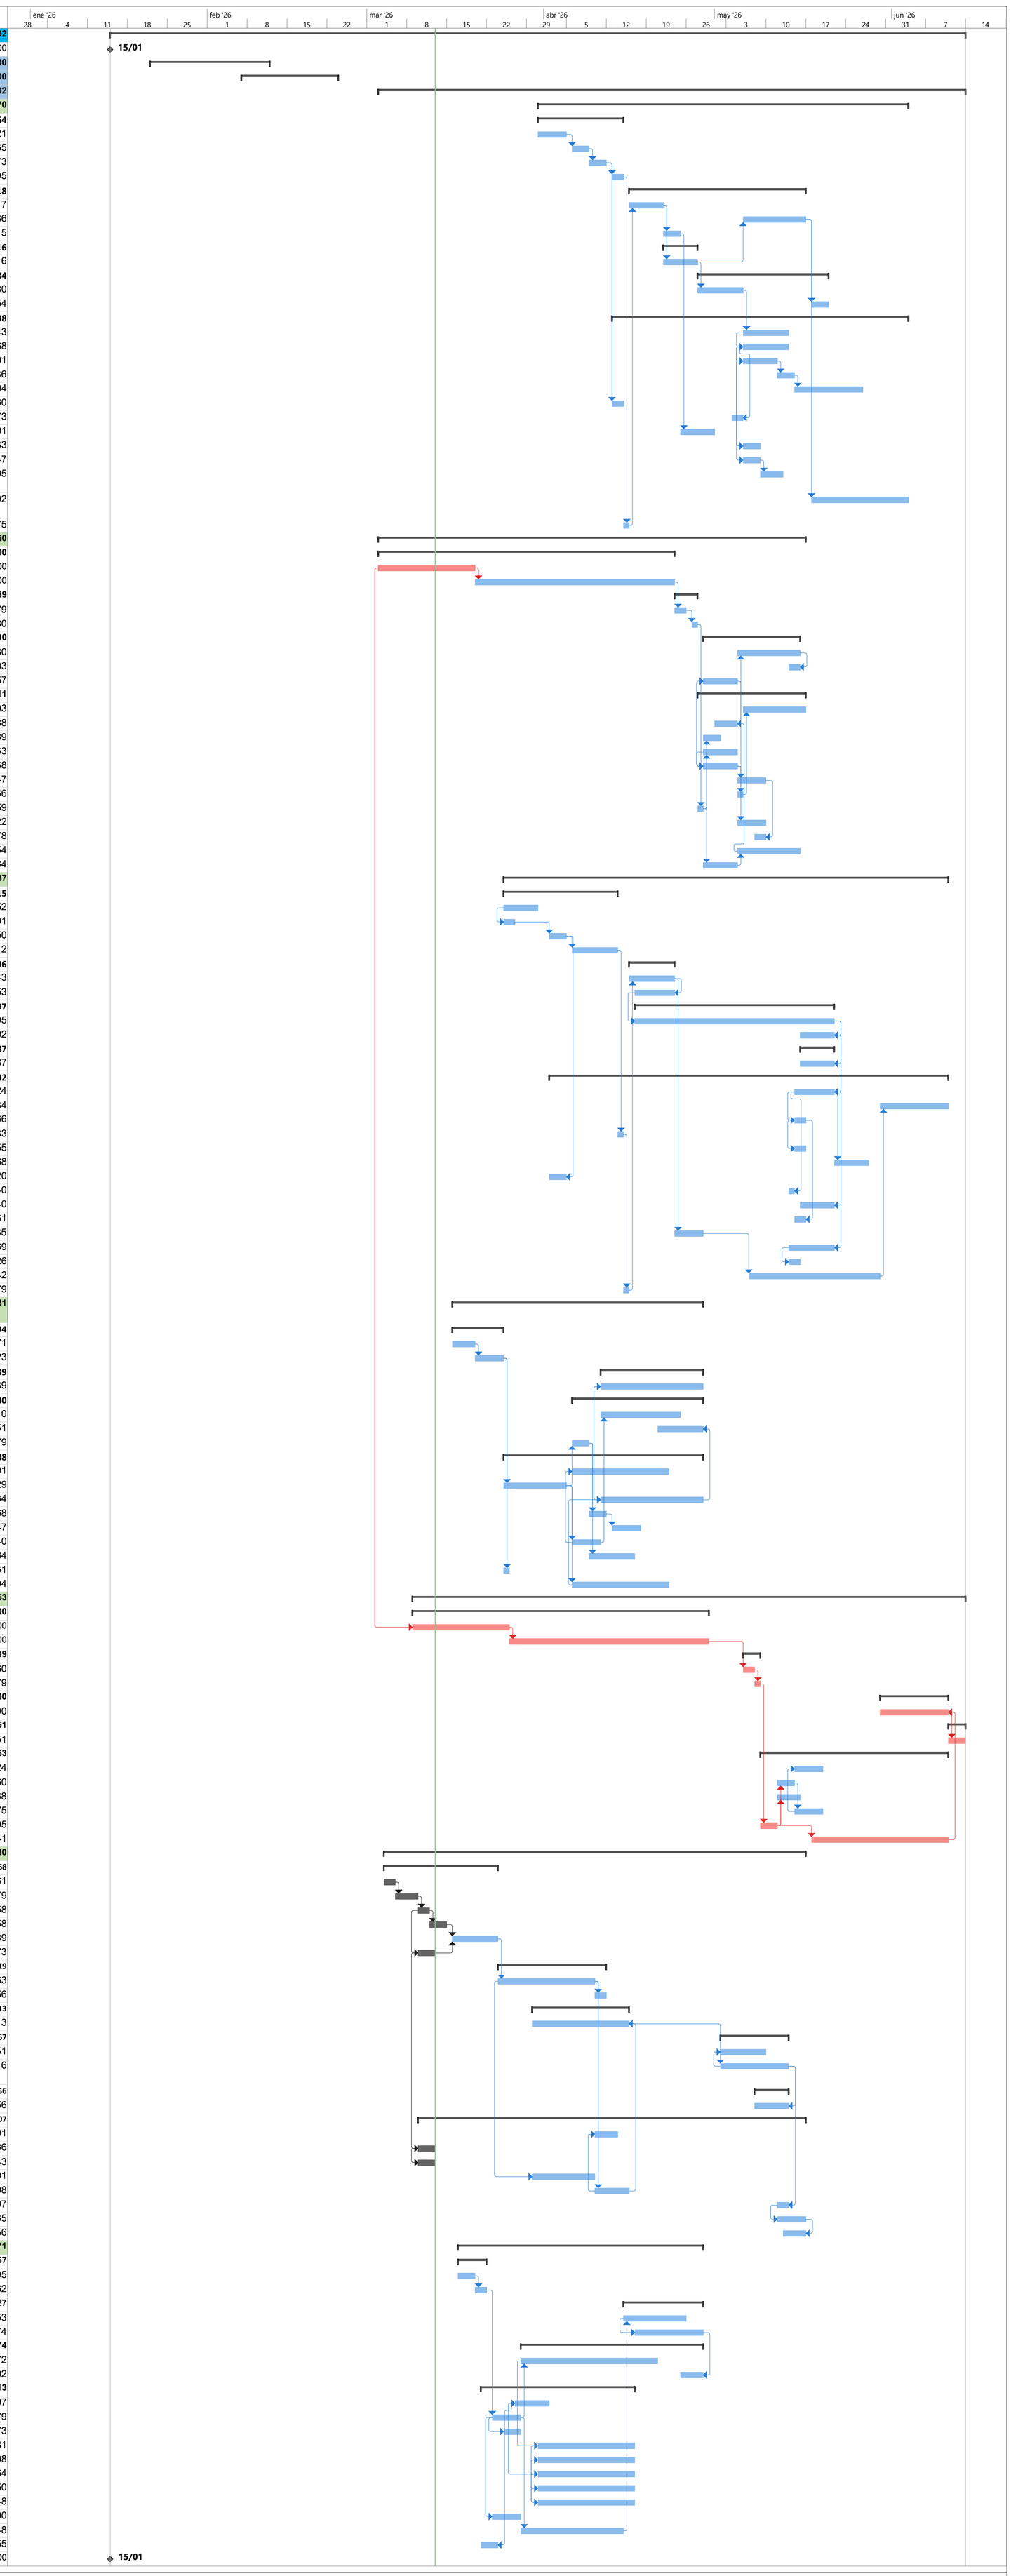

Proyecto: Programación CTO 54
Fecha: vie 13/03/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Tareas críticas · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · División crítica
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Retrasada · Progreso
