ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 180 DE 2025

CONTRATISTA	MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.
NIT	901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.	1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	327 (07/05/2025) 164 (18/02/2026)
REGISTRO PRESUPUESTAL	1339 (21/08/2025) 255 (24/02/2026)
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	UN (01) MES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($475.281.859,27)
VALOR ADICIONAL No.1	DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($206.914.441,76 M/CTE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($682.196.301,03)
FECHA DEL CONTRATO	21 DE AGOSTO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No.1	19 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSION	30 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN N°02	09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO No.2	18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	19 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	19 DE MARZO DE 2026

En el municipio de Miraflores, el día 19 de marzo de 2026, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor por parte del Municipio, **GONZALO RIVERA BALLESTEROS** R/L de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., en su calidad de contratista de obra y **JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS** R/L de PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ

S.A.S., en su calidad de interventoría de obra, con el fin de recibir el contrato de obra totalmente ejecutado, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$475.281.859,27
VALOR ADICIONAL		$206.914.441,76
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$682.196.301,03
VALOR ACTA PARCIAL 1	13/11/2025	$272.547.638,91
VALOR ACTA PARCIAL 2	04/03/2026	$333.949.803,68
VALOR ACTA PRESENTE	19/03/2026	$75.669.131,73
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$29.726,71

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social con planilla No.**6012512090** correspondiente al mes de **marzo – abril de 2026**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
R/L GONZALO RIVERA BALLESTEROS
Contratista de Obra

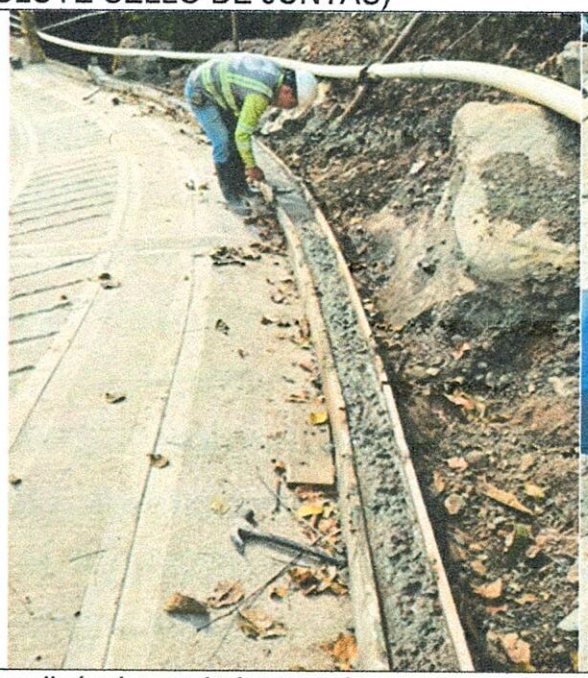
PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES LENGUPÁ S.A.S
R/L JUDITH DANITZA LÓPEZ SALINAS
Interventor

Elaboró: Sergio Morales / Profesional de apoyo secretaría de planeación e infraestructura
Revisó y aprobó: Alex Páez / Secretario de planeación e infraestructura

CONTRATO DE SUMINISTRO		ACTA DE SUPERVISIÓN No:		3	FECHA DE EXPEDICIÓN		
Numero	Año	Parcial	Final	Total	Día	Mes	Año
180	2025		X		19	03	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
TIPO DE PERSONA **NATURAL** **JURÍDICA X**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIIT ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 901.823.002-5
REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO RIVERA BALLESTEROS
C.C.: 1.049.615.222 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P: 327 (07/05/2025) 164 (18/02/2026)
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1339 (21/08/2025) 255 (24/02/2026)
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($475.281.859,27)
VALOR ADICIÓN N°1: DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($206.914.441,76 M/CTE)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($682.196.301,03)
FECHA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 19 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No.1: 19 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSION No.2: 30 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA PRÓRROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN N°02: 09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE REINICIO No.2: 18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 19 DE MARZO DE 2026
PERIODO REPORTADO: DEL 27 DE FEBRERO DE 2026 AL 19 DE MARZO 2026

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	
ÍTEM	**ACTIVIDAD**
2.00	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA (100 METROS)**
2.01	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)
	
	Se realizó el seguimiento a las actividades de suministro e instalación de aceros de refuerzo, correspondientes a cunetas, huellas, bordillos y rampas, tanto en sentido longitudinal como transversal, verificando el cumplimiento de las especificaciones del diseño estructural.
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
	
	Se realizó el seguimiento y verificación de las actividades de instalación y fundida de concreto en huellas y riostras, comprobando la correcta dosificación, nivelación y acabado según las especificaciones del proyecto.

2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA (3000 PSI), 60% RAJÓN PARA PLACA HUELLAS INCLUYE SELLO DE JUNTAS
	 
	Se realizó la supervisión a las actividades de instalación de concreto ciclópeo, verificando los espesores y dimensiones para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
2.04	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)
	 
	Se realizó el seguimiento a la construcción de cunetas revestidas en concreto de 21 MPa (3000 PSI) y bordillos, verificando la adecuada conformación de la sección, nivelación, pendientes y acabado superficial, así como la correcta ejecución del sello de juntas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

2.06	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)
	
	Se realizó el seguimiento a la ejecución de concreto estriado para rampas de 17.5 MPa (2500 PSI), verificando la adecuada dosificación, colocación y acabado superficial estriado para garantizar condiciones óptimas de adherencia, así como la correcta conformación de pendientes y niveles, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.
7.00	**ITEMS NO PREVISTOS**
7.08	CONCRETO CICLÓPEO DE 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P
	
	Se realizó el seguimiento a la ejecución de concreto ciclópeo de 17.5 MPa (2500 PSI), en proporción 60% concreto y 40% piedra, para la construcción de una cuneta destinada a canalizar el flujo de agua hacia la cuneta de la placa huella, verificando su adecuada conformación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social con planilla No.**6012512090** correspondiente al mes de **marzo – abril de 2026**

REPORTE DE PAGOS DE PARAFISCALES		
	NR	**x**

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NUMERO	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PAGO PRESENTE	SALDO POR EJECUTAR
01	$682.196.301,03	$ 0,00	$272.547.638,91	$409.648.662,12
02	$682.196.301,03	$272.547.638,91	$333.949.803,68	$75.698.858,44
03	$682.196.301,03	$606.497.442,59	$75.669.131,73	$29.726,71

SUPERVISOR

NOMBRE: ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ

CARGO: Secretario de Planeación e Infraestructura

FIRMA

Elaboró: Sergio Morales / Profesional de apoyo secretaria de planeación e infraestructura
Reviso y aprobó: Alex Páez / Secretario de planeación e infraestructura.
