CONTRATO [X] CONVENIO [ ]

Proyecto relacionado e el POAI (S) Contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026, cuyo objeto es realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

LOCALIZACIÓN: Municipio: Chinú (Microcuencas Arroyos Canoas y Sabanas), San Carlos (Arroyos La Burra, El Recreo, Cunucuna, Lamedero, La Palma y Grande) y Pueblo Nuevo (Arroyos Arena, Las Pinturas) en el departamento de Córdoba.
Vereda: Varias

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: MARZO 1 AL 31 DE MARZO DEL 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026, presentado a esta Corporación, para el periodo de 1 de marzo al 31 de marzo del presente año.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

(*En el siguiente cuadro se deberá relacionar la información básica del contrato (convenio; obra, interventoría, consultoría, suministro etc)*

CONTRATO N°:	No. 001
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	ENERO 6 DEL 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERBOSQUE
REPRESENTANTE LEGAL:	YENIFER CASTRO MARTINEZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA EN ÁREAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL VALOR: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.405.347.243) IVA INCLUIDO
ANTICIPO (40%):	Si__ No. X

	Valor: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($421.604.172)
PLAZO:	QUINCE (15) MESES
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 18 DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	MAYO 18 DEL 2027

(*En este cuadro se consignarán las novedades suscritas en el contrato, que apliquen ya sean actas de suspensión, reinicio, otrosí de prórroga, otrosí de adiciones, etc se podrán adicionar otras actuaciones que modifiquen el contrato inicial)*

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	NA		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NA		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

(En el cuadro siguiente se relacionará la Póliza inicial y los diferentes anexos modificatorios que se vayan dando en el transcurso de ejecución del contrato o convenio)

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			
NIT ASEGURADORA	**860009578 - 6**			
E-MAIL ASEGURADORA	**juridico@segurosdelestado.com**			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101274055**			**ANEXO No. 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	06/01/2026	06/10/2027	$140.534.724,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	SI	06/01/2026	06/10/2027	$421.604.172,90
Calidad del servicio	SI	06/01/2027	06/04/2028	$281.069.448,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	06/01/2026	06/04/2030	$140.534.724,30
POLIZA RCE No		**NA**		
Pago de responsabilidad civil extracontractual	NO	NA	NA	NA

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

(En *este espacio de relacionaran los diferentes oficios enviados por parte del supervisor al contratista o conveniente y los reportes de incumplimiento en el caso de que aplique, durante el periodo)*

DESTINATARIO	ASUNTO	No. RADICADO DE ENVIO CVS	FECHA/HORA
Consorcio Interbosque	Recordatorio cumplimento de obligaciones y de actualización de pólizas acorde con la fecha del acta de inicio, del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101156	29/01/2026 15:42
Consorcio Interbosque	Envió de requisitos de material audio visual (video) del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101157	29/01/2026 15:47
Consorcio Interbosque	Requisitos para presentación de informe final del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101158	29/01/2026 15:50
Consorcio Interbosque	Requisito tramite pago de cuentas del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101159	29/01/2026 15:53
Consorcio Interbosque	Citación a comité técnico contrato de del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262100768	22/01/2026 10:03
Consorcio Interbosque	Requisitos del registro fotográfico de los informes a presentar del contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101160	29/01/2026 16:00
Consorcio Interbosque	Solicitud de cumplimiento y presentación de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para el contrato de interventoría No. 001 del 6 de enero del 2026.	20262101161	29/01/2026 16:06
Consorcio Interbosque	Envió de requisitos de valla informativa cumplimiento y presentación de lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.	20262101162	29/01/2026 16:10
Consorcio Interbosque	Respuesta al radicado 20261101968: contrato 068 de 2025- Propuesta a especies frutales sistema agroforestal	20262103433	23/02/2026 16:28
Consorcio Interbosque	Respuesta al radicado 20261101989: contrato No. 068 de 2025	20262103434	23/02/2026 16:38
Consorcio Interbosque	Solicitud de programación actualizada, actualización pólizas y matriz cadena de valor contrato de obra No. 068 del 18 de diciembre del 2025.	20262103598	25/02/2026 17:05
Consorcio Interbosque	Respuesta al radicado 20261102438: INTV-006-2026- Diseño Valla Informativa	20262104109	03/03/2026 18:03
	Respuesta al radicado 20261102667: entrega de invitación a jornada de socialización del contrato de obra No. 068	20262104373	06/03/2026 14:01
	Respuesta al radicado 20261102557: Respuesta a Documento No. 20262103598	20262104378	06/03/2026 14:33
	Respuesta al radicado 20261102611: reporte de avances contrato de obra No. 068 del 18 de dic/2025	20262104413	06/03/2026 14:50

	Respuesta al radicado 20261102348: Comunicado INTV-004-2026- Contrato 001-2026 Interventoría	20262104521	09/03/2026 14:55
	Respuesta al radicado 20261102737: entrega de informes mensual No. 1	20262104540	09/03/2026 16:56
	Respuesta al radicado 20261102999: INTV-015-2026 Solicitud comité técnico Operativo	20262105004	16/03/2026 10:12
	Respuesta al radicado 20261102918: Respuesta a comunicado 20262104373. INTV-014-2026- Ajuste a Cronograma del Proyecto e Informes	20262105007	16/03/2026 11:20
	Respuesta al radicado 20261102802: INTV-011-2026- Revisión Plan de Inversión del Anticipo	20262105009	16/03/2026 11:36
	Respuesta al radicado 20261103160: INTV-016-2026- Desistimiento Anticipo Interventoría	20262105010	16/03/2026 11:49

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

(En *este espacio se debe informar de manera general y conforme a la información entregada por la Interventoría, del avance de las actividades contratadas, expresados cuantitativamente, en porcentaje o cualitativamente según sea el caso. podrá apoyarse con el uso de cuadros o graficas) ejemplo: Para el caso de obras*:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓNACTIVIDAD
1	Realizar informes de interventoría	Número/ informes	15	0.4	1.4	6.67

(*El Supervisor si así lo considera, generará comentarios referentes a su concepto sobre el avance de ejecución del contrato, modificaciones, o inconvenientes presentados en el desarrollo del mismo*)

En el caso de contrato de Interventoría, o consultoría, el supervisor deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista, haciendo una lista de chequeo como se muestra a continuación y deberá expresar en un párrafo su satisfacción con las actividades generales desarrolladas por la Interventoría:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES INTERVENTORIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INTERVENTORIA				
Obligaciones	Clausula		Cumplimiento	Actividades efectuadas por el contratista
	No.	Detalle	Clausula	
Especifica	1	Velar por que el contrato objeto de interventoría cumpla con las condiciones de calidad que deberá ajustarse a los requisitos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias y a las especificaciones técnicas suministradas por la CVS.	Cumple	Reporta visitas de seguimiento a las labores y actividades que viene ejecutan el contrista de obra en campo y anotaciones en Bitácora.
Especifica	2	Supervisar el cumplimiento del	Cumple	Certifico que le contratista de

		contrato en cuanto a su aspecto técnico, administrativo, financiero, social y ambiental.		obra viene cumpliendo a satisfacción con las labores y actividades para las que se le contrato actividades contratadas
Especifica	3	Velar que se acreditar durante toda la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y otros de Ley.	Cumple	Certifico que le contratista de obra viene cumpliendo las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales y otros.
Especifica	4	Rendir, durante el término de ejecución de las obras los informes sobre su avance.	Cumple	Presento el informe de interventoría del avance de ejecución de las labores y actividades que el contrista de obra ejecuto.
Especifica	5	Promover la participación de la ciudadanía a través de la socialización ante la comunidad de las obras a efectuar, informando con suficiente antelación sobre la realización de dicha socialización a la supervisión de la CVS	Cumple	Ha avalado y participado en socialización y mecanismos de participación ciudadana implementadas (veedurías, auditorias visibles, atención de solicitudes, instalación de valla divulgativa), durante la ejecución del contrato de obra


(*En el caso de convenios, contratos de suministro, se verificará el cumplimiento del plan operativo o presupuesto relacionando actividades con sus productos entregados)*

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Informes de interventoría	Número/ informes	NA
2	NA	NA	NA

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

(El supervisor debe verificar de acuerdo con la información entregada por la Interventoría, el cumplimiento de los plazos y cronogramas de actividades planteado por el contratista, para lo cual podrá hacer uso de gráficos como curvas o diagramas de Gantt)

Gráfica del avance actividades

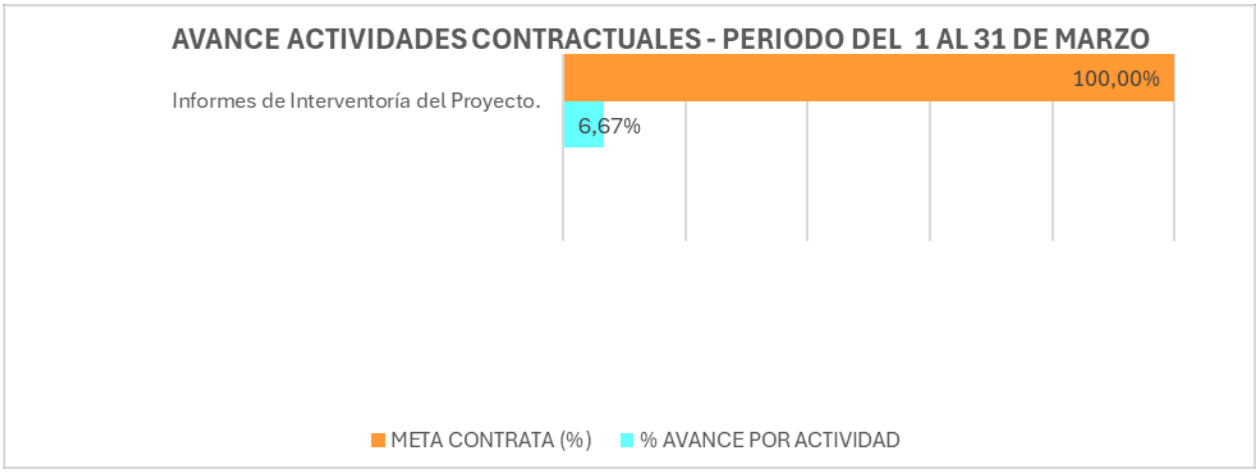

En atención a la revisión documental del informe de interventoría correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo del 2026, la interventoría ha determinado que presenta un avance acumulado del 6.67 % hasta la fecha de corte de dicho periodo, correspondiente a la revisión de informes, documentos legales y reuniones de acompañamiento.

ASPECTOS FINANCIEROS

(En este punto el supervisor deberá llevar un control de las actas pagadas o presentadas por el contratista)

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $1.405.347.243
VALOR ANTICIPO $421.604.172
% AVANCE FINANCIERO 0.0

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	No se ha efectuado	421.604.172	421.604.172	421.604.172	421.604.172	NA	421.604.172	NA
ACTA 01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACTA 02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ACTA 03	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

(En *este punto el supervisor deberá verificar (con base en el informe de interventoría, si aplica), el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los sistemas y presentará las observaciones a que dé lugar)*

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2)Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3)Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4)Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5)Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	Durante el presente periodo evaluado el CONSORCIO INTERBOSQUE contó con un equipo de trabajo conformado por personal profesional el cuál se encuentra vinculado directamente con la institución. Así mismo para el periodo evaluado presentó los registros de afiliaciones al Sistema General de Seguridad, de su personal, teniendo en cuenta sus responsabilidades y nivel de riesgo asociado a la labor contratada; conforme a lo anterior, se presenta como anexo soportes de afiliación a SGSS del personal que se laboró en la obra para el periodo evaluado y la asistencia diaria a la obra	Durante este periodo, según lo reportado por la interventoría, se evidencia en su mayoría el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos.

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2)Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3)Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4)Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5)Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal. 6)Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. 7)Tener un plan de prevención y respuesta ante	El contratista de interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento de lo programado versus lo ejecutado en el periodo del	Por presentar información complementaria y soportes.

emergencias. 8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.		

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2)Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3)Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	El CONSORCIO INTERBOSQUE con el objetivo de fomentar una cultura al cuidado del medio ambiente, mitigación de impacto, de autocuidado, estilos de vida saludables y que todo el personal conozca los riesgos, realizó la inducciones y capacitaciones.	Durante este periodo, se indica se presentará la información complementaria y evidencias para tal fin.

REGISTRO FOTOGRAFICO

(En este punto el supervisor deberá anexar una foto de cada actividad desarrollada en el contrato objeto de supervisión)

De acuerdo con el informe de interventoría correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del 2026, se ha registrado un avance dos punto nueve por ciento 2.9%, para la obra y de 6.67% para la interventoría.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(En *este espacio el Supervisor deberá manifestar de manera general su concepto sobre el avance de ejecución del proyecto, y emitir las recomendaciones o sugerencias a que haya lugar*)

En atención a la revisión documental del informe de interventoría para el periodo el 1 de marzo al 31 de marzo del 2026 y a certificación expedida por esta, mediante la cual avalo y aprobó, el informe de avance del contrato de obra No. 068 del 2025, para el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del 2026, se puede afirmar que el CONSORCIO REFORESTACIÓN 2025 presenta los adelantos administrativos, técnicos y financieros, de dos punto nueve por ciento 2.9%, para el contrato de obra en comento.

Acorde con lo explicitado, la Interventoría manifestó y certificó en su informe que, en conformidad con sus competencias y responsabilidades contractuales, realizó un seguimiento exhaustivo de las labores y actividades ejecutadas en campo por el contratista CONSORCIO REFORESTACIÓN 2025. Para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo del 2026, se determinó un avance acumulado del 2.9% al corte de dicho periodo, mientras que la interventoría presenta un avance acumulado del 9.33% hasta la fecha de corte de dicho periodo, correspondiente a la revisión de informes, documentos legales y reuniones de acompañamiento.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de marzo del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado en la documentación presentada por la interventoría.

MANUEL HORACIO CONEO TAPIA
Supervisor CVS

JUAN ESTEBAN LOPEZ ATILANO
Apoyo a la Supervisión CVS

JOSE FERNANDO LEON TIRADO
Apoyo a la Supervisión CVS

LAURA ANDREA BEDOYA CAMACHO
Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe 1 de marzo al 31 de marzo
