Lista de anexos

Presupuesto de Obra 1

Memorias de Cálculo 2

Planillas de seguridad social 3

Cronograma de obra 4

Informe SST 5

Informe de Calidad 6

Informe Gerencia 7

Informe Ambiental 8

Planos 9

Reporte Climático 10

Bitácora de Obra 11

Presupuesto de Obra

Anexo Acta de recibo parcial No. 02

Contrato de Obra No. CO1. PCCNTR.8300708 del 26 de Septiembre de 2025

Objeto: Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander.

		Condiciones Contractuales					Acta de Recibo Parcial No. 1					Acta de Recibo Parcial No. 2				
Nº	Ítem de pago	Descripción	Und.	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	Cant	Vr. Total	Acum.	Vr. Total	% Ejecutado	Cant	Vr. Total	Acum.	Vr. Total	% Ejecutado
1.0	**PRELIMINARES**															
1	1.01	Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles	ML	101,38	$ 41.686,00	$ 4.226.127,00	81,45	$ 3.395.325,00	81,45	$ 3.395.325,00	80,34%	0,00	$ 0,00	81,45	$ 3.395.325,00	80,34%
2	1.02	Campamento provisional de obra.	UND	1,00	$ 3.801.952,00	$ 3.801.952,00	1,00	$ 3.801.952,00	1,00	$ 3.801.952,00	100,00%	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.801.952,00	100,00%
3	1.03	Desmonte manual de cubierta de zinc y/o termoacústica (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	226,31	$ 41.931,00	$ 9.489.405,00	225,63	$ 9.460.892,00	225,63	$ 9.460.892,00	99,70%	0,00	$ 0,00	225,63	$ 9.460.892,00	99,70%
4	1.04	Desmonte con medios mecánicos de cubierta tipo asbesto cemento y/o fibrocemento (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	427,81	$ 60.313,00	$ 25.802.505,00	426,90	$ 25.747.620,00	426,90	$ 25.747.620,00	99,79%	0,00	$ 0,00	426,90	$ 25.747.620,00	99,79%
5	1.05	Demolición de muro de cerramiento existente (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	71,30	$ 99.713,00	$ 7.109.537,00	9,30	$ 927.331,00	9,30	$ 927.331,00	13,04%	0,00	$ 0,00	9,30	$ 927.331,00	13,04%
6	1.06	Desmonte de juegos infantiles (incluye transporte hasta el lugar de entrega)	UND	4,00	$ 735.293,00	$ 2.941.172,00	4,00	$ 2.941.172,00	4,00	$ 2.941.172,00	100,00%	0,00	$ 0,00	4,00	$ 2.941.172,00	100,00%
7	1.07	Desmonte de arcos de cancha múltiple (micro-baloncesto) (incluye retiro y disposición de residuos)	UND	2,00	$ 514.547,00	$ 1.029.094,00	2,00	$ 1.029.094,00	2,00	$ 1.029.094,00	100,00%	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.029.094,00	100,00%
8	1.08	Desmonte manual de estructura metálica de soporte de cubierta (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	652,83	$ 17.005,00	$ 11.101.374,00	399,23	$ 6.788.906,00	399,23	$ 6.788.906,00	61,15%	0,00	$ 0,00	399,23	$ 6.788.906,00	61,15%
9	1.09	Poda arboles incluye equipos de alturas (Retiro y disposición de residuos)	UND	3,00	$ 775.515,00	$ 2.326.545,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
10	1.10	Demolición de placa en concreto de cancha actual (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	543,08	$ 51.493,00	$ 27.964.818,00	543,08	$ 27.964.818,00	543,08	$ 27.964.818,00	100,00%	0,00	$ 0,00	543,08	$ 27.964.818,00	100,00%
11	1.11	Demolición de enchape de piso y pared (incluye retiro y disposición de residuos)	M2	21,09	$ 31.148,00	$ 656.911,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
12	1.12	Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y disposición de residuos)	UND	4,00	$ 54.484,00	$ 217.936,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00%
					Subtotal Preliminares	**$ 96.667.376,00**		**$ 82.057.110,00**		**$ 82.057.110,00**			**$ -**		**$ 82.057.110,00**	
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**															
13	2.01	Excavación manual en material común	M3	70,09	$ 75.942,00	$ 5.322.775,00	64,04	$ 4.863.326,00	64,04	$ 4.863.326,00	91,37%	0,00	$ 0,00	64,04	$ 4.863.326,00	91,37%
14	2.02	Relleno con material seleccionado (incluye suministro y transporte en obra)	M3	21,20	$ 202.460,00	$ 4.292.152,00	21,20	$ 4.292.152,00	21,20	$ 4.292.152,00	100,00%	0,00	$ 0,00	21,20	$ 4.292.152,00	100,00%
15	2.03	Suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y compactación de material base granular.	M3	65,17	$ 314.239,00	$ 20.478.956,00	65,17	$ 20.478.956,00	65,17	$ 20.478.956,00	100,00%	0,00	$ 0,00	65,17	$ 20.478.956,00	100,00%
16	2.04	Cargue, retiro y disposición de material sobrante de excavación	M3	91,12	$ 90.556,00	$ 8.251.463,00	64,04	$ 5.799.206,00	64,04	$ 5.799.206,00	70,28%	0,00	$ 0,00	64,04	$ 5.799.206,00	70,28%
					Subtotal Movimiento de Tierras	**$ 38.345.346,00**		**$ 35.433.640,00**		**$ 35.433.640,00**			**$ -**		**$ 35.433.640,00**	
3.0	**CUBIERTA**															
17	3.01	Suministro, fabricación y montaje de Perlin 220X80X3,0 tipo C A 500 gr c para correas de cubierta como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 6 metros.	KG	7.945,00	$ 45.636,00	$ 362.578.020,00	5154,69	$ 235.239.433,00	5154,69	$ 235.239.433,00	64,88%	2788,64	$ 127.262.375,00	7943,33	$ 362.501.808,00	99,98%
18	3.02	Suministro y construcción de conexiones según planos estructurales en platinas de diferentes espesores A 572 gr 50, con perforaciones en diversos diámetros, pernos a325+ tuerca 2h + arandela, soldaduras según planos estructurales preparación de superficie método chorro de arena grado comercial sspc-sp6 o como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp6, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3,0 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 15 metros. y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este ítem	KG	832,00	$ 57.456,00	$ 47.803.392,00	832,00	$ 47.803.392,00	832,00	$ 47.803.392,00	100,00%	0,00	$ -	832,00	$ 47.803.392,00	100,00%
19	3.03	Panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poli - isocianato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa terminado nervado y cara interna terminado liso en lámina de acero galvanizado precintado y acabado uretano. espesor 40mm. suministro e instalación del panel, incluye tornillos de fijación y remates.	M2	664,64	$ 503.997,00	$ 334.976.566,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	622,04	$ 313.506.294,00	622,04	$ 313.506.294,00	93,59%
20	3.04	Remate para teja en lamina galvanizada cal 26	ML	284,12	$ 91.187,00	$ 25.908.050,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	115,34	$ 10.517.509,00	115,34	$ 10.517.509,00	40,60%
21	3.05	Fabricación y montaje de canal galvanizado en lamina calibre 24 de dimensiones ancho 0,40 por alto 0,30 metros incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros color especificado en los planos arquitectónicos, impermeabilización interna y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este ítem	ML	147,00	$ 244.794,00	$ 35.984.718,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
22	3.06	Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en tubería pvc alcantarillado de 4" incluye accesorios, consumibles, equipos de soporte de fijación, equipo de acceso y trabajo en alturas, mano de obra calificada y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este ítem	ML	46,40	$ 104.970,00	$ 4.870.608,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
					Subtotal Cubierta	**$ 812.121.354,00**		**$ 283.042.825,00**		**$ 283.042.825,00**			**$ 451.286.178,00**		**$ 734.329.003,00**	
4.0	**ESPACIOS LÚDICOS**															
23	4.01	Alcorque perimetral	ML	24,00	$ 110.520,00	$ 2.652.480,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 2.652.480,00	24,00	$ 2.652.480,00	100,00%
24	4.02	Suministro e instalación de grama sintética (incluye arena sílice y granos de caucho)	M2	211,97	$ 201.815,00	$ 42.778.726,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	184,82	$ 37.299.448,00	184,82	$ 37.299.448,00	87,19%
25	4.03	Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles	UND	1,00	$ 269.765.964,00	$ 269.765.964,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 269.765.964,00	1,00	$ 269.765.964,00	100,00%
26	4.04	Cesta para basura metálica	UND	2,00	$ 1.722.205,00	$ 3.444.410,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	2,00	$ 3.444.410,00	2,00	$ 3.444.410,00	100,00%
27	4.05	Banca modular en concreto reforzado, acabado liso con hidrófugo traslúcido mate	ML	5,00	$ 903.078,00	$ 4.515.390,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
28	4.06	Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e=0,10m. Incluye malla eléctrosoldada	M2	211,97	$ 235.510,00	$ 49.921.055,00	211,97	$ 49.921.055,00	211,97	$ 49.921.055,00	100,00%	0,00	$ -	211,97	$ 49.921.055,00	100,00%
					Subtotal Espacios Lúdicos	**$ 373.078.025,00**		**$ 49.921.055,00**		**$ 49.921.055,00**			**$ 313.162.302,00**		**$ 363.083.357,00**	

5.0	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERÍA Y ACABADOS**																		
29	5.01	Vigueta en concreto de 3.000 psi sección (0,2X0,20) m, no incluye refuerzo	M3	1,64	$ 2.146.612,00	$ 3.520.444,00	0,84	$ 1.803.154,00	0,84	$ 1.803.154,00	51,22%	0,00	$ -	0,84	$ 1.803.154,00	51,22%		
30	5.02	Viga en concreto de 3.000 psi sección (0,40X0,40) m, no incluye refuerzo	M3	6,56	$ 1.825.937,00	$ 11.978.147,00		$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
31	5.03	Columna en concreto de 3.000 psi sección (0,20X0,20) m, no incluye refuerzo	M3	1,57	$ 1.852.977,00	$ 2.909.174,00		$ -		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
32	5.04	Concreto ciclópeo 60% concreto 3000 PSI y 40% piedra rajón para mejoramiento de suelo de cimentación	M3	6,56	$ 992.048,00	$ 6.507.835,00	0,22	$ 218.251,00	0,22	$ 218.251,00	3,35%	0,00	$ -	0,22	$ 218.251,00	3,35%		
33	5.05	Suministro e instalación de acero de refuerzo fy 420 Mpa	KG	1.273,03	$ 15.032,00	$ 19.136.234,00	396,37	$ 5.958.234,00	396,37	$ 5.958.234,00	31,14%	0,00	$ -	396,37	$ 5.958.234,00	31,14%		
34	5.06	Cárcamo en concreto, incluye rejilla	ML	42,19	$ 411.255,00	$ 17.350.848,00	27,20	$ 11.186.136,00	27,20	$ 11.186.136,00	64,47%	0,00	$ -	27,20	$ 11.186.136,00	64,47%		
35	5.07	Suministro e instalación de filtro francés, incluye tubería, geotextil y gravilla	ML	42,19	$ 119.568,00	$ 5.044.574,00	42,19	$ 5.044.574,00	42,19	$ 5.044.574,00	100,00%	0,00	$ -	42,19	$ 5.044.574,00	100,00%		
36	5.08	Realce de muro para cubierta en mamposteria a la vista	M2	62,77	$ 263.224,00	$ 16.522.570,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
37	5.09	Mampostería a la vista en ladrillo H15	M2	114,60	$ 164.616,00	$ 18.864.994,00	57,62	$ 9.485.174,00	57,62	$ 9.485.174,00	50,28%	0,00	$ -	57,62	$ 9.485.174,00	50,28%		
38	5.10	Friso para muro	M2	125,54	$ 68.249,00	$ 8.567.979,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	83,64	$ 5.708.346,00	83,64	$ 5.708.346,00	66,62%		
39	5.11	Estuco y pintura para muros	M2	125,54	$ 84.163,00	$ 10.565.823,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	83,64	$ 7.039.393,00	83,64	$ 7.039.393,00	66,62%		
40	5.12	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	M2	571,36	$ 97.573,00	$ 55.749.309,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	474,36	$ 46.284.728,00	474,36	$ 46.284.728,00	83,02%		
41	5.13	Pintura tipo 1 para muros	M2	306,55	$ 47.914,00	$ 14.688.037,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	135,02	$ 6.469.348,00	135,02	$ 6.469.348,00	44,05%		
42	5.14	Pintura en aceite exterior	M2	131,16	$ 87.367,00	$ 11.459.056,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	97,83	$ 8.547.114,00	97,83	$ 8.547.114,00	74,59%		
43	5.15	Mortero de nivelación e=4cm	M2	21,09	$ 60.211,00	$ 1.269.850,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
44	5.16	Enchape de piso baño	M2	21,09	$ 153.998,00	$ 3.247.818,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
45	5.17	Suministro e instalación de aparatos sanitarios	UND	4,00	$ 1.199.302,00	$ 4.797.208,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
46	5.18	Suministro e instalacion de lavamanos (incluye semipedestal y grifería)	UND	1,00	$ 1.055.160,00	$ 1.055.160,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
		Subtotal Estructuras de Concreto, Mamposteria y Acabados				**$ 213.235.060,00**		**$ 33.695.523,00**		**$ 33.695.523,00**			**$ 74.048.929,00**		**$ 107.744.452,00**			
6.0	**ADECUACIÓN CANCHA**																		
47	6.01	Suministro, transporte, calentamiento y aplicación de riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	543,08	$ 13.639,00	$ 7.407.068,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
48	6.02	Suministro, transporte e instalación manual de mezcla asfáltica densa caliente MDC-10	M3	43,45	$ 1.998.252,00	$ 86.824.049,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
49	6.03	Alistamiento de superficie con 2 capas de imprimante	M2	543,08	$ 73.917,00	$ 40.142.844,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
50	6.04	Suministro y aplicación de una capa base compuesta por material acrílico, arena de cuarzo y látex	M2	543,08	$ 51.493,00	$ 27.964.818,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
51	6.05	Recubrimiento de resina acrílica (aplicación de 2 capas). Incluye demarcación.	M2	543,08	$ 73.738,00	$ 40.045.633,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
52	6.06	Suministro e Instalación de Juego De Estructura Múltiple, (Micro - Baloncesto) Fija, Elaborada En Tubería Agua Negra De Primera Calidad, color Cristal De Medidas 1.20 X 1.80 Mts. Demarcados Con Aros Y Malla De Baloncesto, Juego de mallas Nylon para microfutbol # 3	UND	2,00	$ 7.462.579,00	$ 14.925.158,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
		Subtotal Adecuación Cancha				**$ 217.309.570,00**		$ -		$ -			$ -		$ -			
7.0	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																		
53	7.01	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	69,00	$ 336.193,00	$ 23.197.317,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	69,00	$ 23.197.317,00	69,00	$ 23.197.317,00	100,00%		
54	7.02	Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt rectangular, caja Rawelt cuadrada. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	UND	24,00	$ 294.680,00	$ 7.072.320,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	24,00	$ 7.072.320,00	24,00	$ 7.072.320,00	100,00%		
55	7.03	Suministro, transporte e instalación de panel led para descolgar 60x60 con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación.	UND	67,00	$ 349.760,00	$ 23.433.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	67,00	$ 23.433.920,00	67,00	$ 23.433.920,00	100,00%		
56	7.04	Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 12 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura, espacio para totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación.	UND	1,00	$ 589.747,00	$ 589.747,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 589.747,00	1,00	$ 589.747,00	100,00%		
57	7.05	Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable No 3x14 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación.	ML	130,00	$ 24.849,00	$ 3.230.370,00		$ -	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%		
		Subtotal Instalaciones Eléctricas				**$ 57.523.674,00**		$ -		$ -			**$ 54.293.304,00**		**$ 54.293.304,00**			
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 1.808.280.405,00**		**$ 484.150.153,00**		**$ 484.150.153,00**			**$ 892.790.713,00**		**$ 1.376.940.866,00**			
		VALOR TOTAL				**$ 1.808.280.405,00**		**$ 484.150.153,00**	**26,77%**	**$ 484.150.153,00**	**26,77%**		**$ 892.790.713,00**	**49,37%**	**$ 1.376.940.866,00**	**76,15%**		
		VALOR ADICIONAL																

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%

ING. RAFAEL ANDRES PEÑARANDA FORERO
R/L CESA SAS
Contratista

ING. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
R/L Coedco SAS
Interventoría

ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Secretario de Infraestructura Municipal de Piedecuesta
Supervisor

Memorias de Cálculo

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	3.01	Actividad	Suministro, fabricación y montaje de Perlin 220X80X3,0 tipo C A 500 gr c para correas de cubierta como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 mils, acabado en pintura en esmalte poliuretano + catalizador dos capas 3.0 mils. incluye transporte a obra, colocación e instalación en sitio izaje altura máxima 6 metros.	Und	KG

Registro Fotográfico/Esquema









Descripción	Tipo de Barra	Area	Long (m)	Cant (m)	kg/ml	Kg/m2	Medida Tottal
Salones Casona 1							
Tapas 200x70x3.00 mm	Tapas	0,01		16,00		23,55	5,28
Salones Casona 2							
Tapas 200x70x3.00 mm	Tapas	0,01		16,00		23,55	5,28
Baño Infantil							
Tubo Estructural 120x60x2.5 mm	Tensores		3,87	2,00	6,93		53,64
Tubo Estructural 50x50x2.00 mm	Tensores		2,08	1,00	3,08		6,41
Salones Casona 3							
Tubo Estrultural 200x70x3,0	Correas		15,00	6,00	12,60		1134,00
Tubo Estructural 50x50x2.00 mm	Tensores		7,04	4,00	3,08		86,73
Tubo Estructural 200x70x3.00 mm	Tensores		7,04	6,00	12,60		532,22
Tubo Estructural 120x60x2.5mm	Correas		15,00	3,00	6,93		311,85
Tubo Estructural 50x50x2.00 mm	Tensores		7,04	4,00	3,08		86,73
Tapas 200x70x3.00 mm	Tapas	0,01		18,00		23,55	5,93
Cafeteria							
Tubo Estructural 200x70x3.00 mm	Bases		5,00	3,00	12,60		189,00
Tapas 200x70x3.00 mm	Tapas	0,01		6,00		23,55	1,98
Portería-Entrada Principal							
Tubo Estructural 120x60x2.5mm	Correas		6,00	4,00	6,93		166,32
Tubo Estructural 50x50x2.00 mm	Tensores		11,00	6,00	3,08		203,28
						Subtotal	2788,64
						Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
						Total Memoria de cálculo KG	2.788,64

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-036

Residente de Obra:	Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	3.03	Actividad	Panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poli - isocianato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa terminado nervado y cara interna terminado liso en lámina de acero galvanizado precintado y acabado uretano. espesor 40mm. suministro e instalación del panel, incluye tornillos de fijación y remates.	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema





Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Salones Casona 1	29,00	9,08				263,32
Salones Casona 2	16,00	9,22				147,52
Salones Casona 3	15,00	11,10				166,50
Baños infantiles	3,87	5,00				19,35
Cafeteria	5,00	5,07				25,35
					Subtotal	622,04
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	622,04

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-037

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS | **Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta** | **Interventoría: Coedco SAS**

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoria	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	3.04	Actividad	Remate para teja en lamina galvanizada cal 26	Und	ML

Registro Fotográfico/Esquema







Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Salones Casona 1	47,16					47,16
Salones Casona 2	34,44					34,44
Cafetería	10,14					10,14
Baños Infantiles	8,60					8,60
Salones Casona 3	15,00					15,00

Subtotal		115,34
Vienen (memorias de cálculos anteriores)		
Total Memoria de cálculo	ML	115,34

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-038

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	4,01	Actividad	Alcorque perimetral	Und	ML

Registro Fotográfico/Esquema







Descripción	DIAMETRO	PERIMETRO	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
ALCORQUE PERIMETRAL ÁRBOLES						
Árbol [1]	2,04	6,41				6,41
Árbol [2]	2,80	8,79				8,79
Árbol [3]	2,80	8,79				8,79

Subtotal		24,00
Vienen (memorias de cálculos anteriores)		
Total Memoria de cálculo	ML	24,00

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-013

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA		Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoria	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	4.02	Actividad	Suministro e instalación de grama sintética (incluye arena sílice y granos de caucho)	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema






Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Parque Infantil						
Área topográfica de Grama-Placa de Concreto	14,70	14,77			217,119	217,12
Descuentos Alcorque Árboles						
Árbol [1]					3,27	-3,27
Árbol [2]					6,16	-6,16
Árbol [3]					6,16	-6,16
Rampa de acceso al Parque	3,80	1,90			7,22	-7,22
Esquina baños infantiles	4,30	2,21			9,49	-9,49
					Subtotal	184,82
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	184,82

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-013

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	4.03	Actividad	Suministro e instalación de módulo de juegos infantiles	Und	UND

Registro Fotográfico/Esquema









Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Parque Infantil Existente						
Set Juego a instalar				1,00		1,00

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Espacios Lúdicos	Ítem	4,04	Actividad	Cesta para basura metálica	Und	UND

Registro Fotográfico/Esquema





Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Parque Infantil Existente						
Cesta para basura metálica				2,00		2,00
					Subtotal	2,00
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo	UND 2,00

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-046

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:


Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS


FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.10	Actividad	Friso para muro	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema

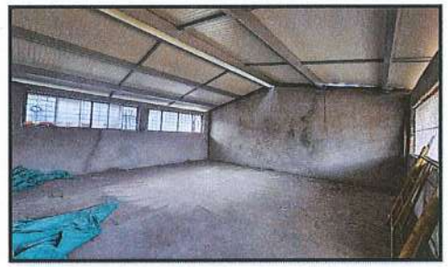

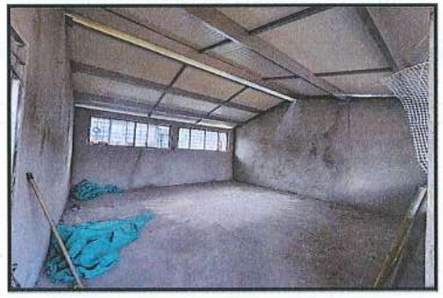

Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
UBICACIÓN SALONES CASONA 1						
SALÓN 7						
Muro 1- Salón 7	5,96	2,92				17,40
Muro 2- Salón 7	6,36	3,36				21,37
Muro 3-Salón 7	6,36	3,36				21,37
Muro 4- Salón 7	5,96	2,92				17,40
Descuentos Salón 7						
Muro 1- Puerta de acceso salón 7	1,19	2,03				-2,42
Muro 1- Ventana 1 Salón 7	1,30	1,19				-1,55
Muro 1- Ventana 2 Salón 7	2,58	1,21				-3,12
Muro 4- Venatana 1 Salón 7	2,52	1,04				-2,62
Muro 4- Venatana 2 Salón 8	2,49	1,02				-2,54
MURO PARQUE INFANTIL						
MURO 1 PARQUE INFANTIL	2,64	3,00				7,92
MURO 2 PARQUE INFANTIL	4,01	2,60				10,43
					Subtotal	83,64
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	83,64

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-020

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoria: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.11	Actividad	Estuco y pintura para muros	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema







Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Salones Casona 1						
Muro 1- Salón 7	5,96	2,92				17,40
Muro 2- Salón 7	6,36	3,36				21,37
Muro 3-Salón 7	6,36	3,36				21,37
Muro 4- Salón 7	5,96	2,92				17,40
Descuentos Salón 7						
Muro 1- Puerta de acceso salón 7	1,19	2,03				-2,42
Muro 1- Ventana 1 Salón 7	1,30	1,19				-1,55
Muro 1- Ventana 2 Salón 7	2,58	1,21				-3,12
Muro 4- Venatana 1 Salón 7	2,52	1,04				-2,62
Muro 4- Venatana 2 Salón 8	2,49	1,02				-2,54
MURO PARQUE INFANTIL						
MURO 1 PARQUE INFANTIL	2,64	3,00				7,92
MURO 2 PARQUE INFANTIL	4,01	2,60				10,43
					Subtotal	83,64
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	83,64

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-021

Residente de Obra:

Residente de Interventoria:


Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander				Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit 901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6			

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.12	Actividad	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema

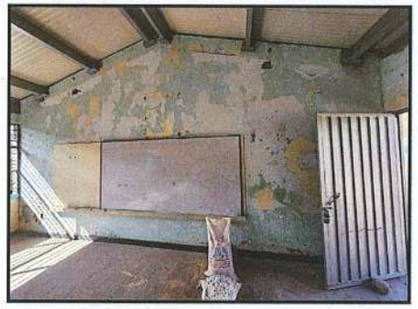



Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
UBICACIÓN CASONA 1-SALÓN 6						
Muro 1- Salón 6	7,38	2,90				21,40
Muro 2 Salon 6	6,36	3,32				21,12
Muro 3 Salon 6	6,36	3,32				21,12
Muro 4- Salón 6	7,38	2,90				21,40
Descuentos Salón 6						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 6	1,17	2,08				-2,43
Muro 1- Ventana 1 Salón 6	2,10	1,00				-2,10
Muro 1- Ventana 2 Salón 6	3,31	1,00				-3,31
Muro 4- Ventana 1 Salón 6	3,62	1,48				-5,36
Muro 4- Ventana 2 Salón 6	3,59	1,50				-5,39
SALÓN 5						
Muro 1-Salón 5	7,34	2,88				21,14
Muro 2-Salón 5	6,34	3,32				21,05
Muro 3-Salón 5	6,34	3,32				21,05
Muro 4-Salón 5	7,34	2,88				21,14
Descuentos Salón 5						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 5	1,17	2,07				-2,42
Muro 1- Ventana 1 Salón 5	2,08	0,98				-2,04
Muro 1- Ventana 2 Salón 5	3,35	0,98				-3,28
Muro 4- Ventana 1 Salón 5	3,58	1,48				-5,30
Muro 4- Ventana 2 Salón 5	3,59	1,48				-5,31
Salón de Informática						
Muro 1- Salón Informática	7,24	2,76				19,98
Muro 2- Salón Informática	6,25	2,88				18,00
Muro 3- Salón Informática	6,25	2,88				18,00
Muro 4- Salón Informática	7,24	2,76				19,98
Descuentos Salón de Informática						
Muro 1-Puerta de Acceso Salón de Informática	1,17	2,07				-2,42
Muro 1-Ventana 1 Salón Informática	1,45	1,00				-1,45
Muro 1-Ventana2 Salón Informática	2,00	1,00				-2,00
					Subtotal	202,57
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
a de cálculo					M2	202,57

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-022

e de Obra:

Residente de Interventoría:


Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander				Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit 901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6			

Capitulo	Estructuras de Concreto, Mamposteria y acabados	Ítem	5.12	Actividad	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema

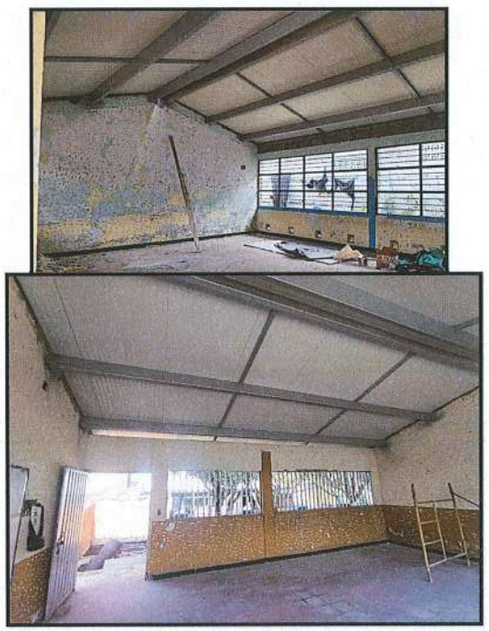

Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Salones Casona 1						
Descuentos Salón Informatica						
Muro 4- Ventana 1 Salón de Informática	3,58	0,80				-2,86
Muro 4- Mampostería 1 Salón de Informática	3,58	0,80				-2,86
Muro 4- Mampostería 2 Salón de Informática	3,50	0,80				-2,80
Muro 3- Cajones de Informática	6,25	1,29				-8,06
Salones Casona 2 SALON 4						
Descripción	**Largo (m)**	**Alto (m)**				
Muro 1-Salón 4	7,38	2,76				20,37
Muro 2-Salón 4	6,30	3,23				20,35
Muro 3- Salón 4	6,30	3,23				20,35
Muro 4- Salón 4	7,38	2,76				20,37
Descuentos Salón 4						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 4	1,20	2,05				-2,46
Muro 1- Ventana 1 Salón 4	2,10	1,00				-2,10
Muro 1- Ventana 2 Salón 4	3,35	1,00				-3,35
Muro 4- Ventana 1 Salón 4	3,60	1,50				-5,40
Muro 4- Ventana 2 Salón 4	3,60	1,50				-5,40
Salones Casona 2 Salon 3						
Muro 1- Salón 3	7,39	2,74				20,25
Muro 2- Salón 3	6,30	3,21				20,19
Muro 3- Salón 3	6,30	3,21				20,19
Muro 4- Salón 3	7,39	2,74				20,25
Descuentos Salón 3						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 3	1,20	2,10				-2,52
Muro 1- Ventana 1 Salón 3	2,10	0,98				-2,06
Muro 1- Ventana 2 Salón 3	3,35	1,05				-3,52
Muro 4- Ventana 1 Salón 3	3,60	1,50				-5,40
Muro 4- Ventana 2 Salón 3	3,60	1,50				-5,40
					Subtotal	**105,33**
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	**202,57**
					Total Memoria de cálculo M2	**307,90**

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-022

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:


Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander			Contrato No		CO1.PCCNTRR.8300708	
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoria	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.12	Actividad	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema

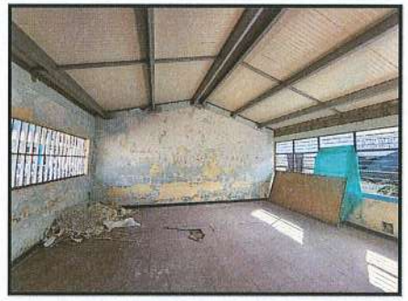



Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Salones Casona 3						
Descripción	Largo (m)	Alto (m)				
Muro 1-Salón 2	7,07	3,62				25,59
Muro 2-Salón 2	5,84	3,91				22,83
Muro 3-Salón 2	7,07	4,20				29,69
Muro 4-Salón 2	5,84	3,91				22,83
Descuentos Salón 2						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 2	0,96	2,02				-1,94
Muro 1- Ventana 1 Salón 2	0,96	1,13				-1,08
Muro 1- Ventana 2 Salón 2	0,96	1,12				-1,08
Muro 1- Ventana 3 Salón 2	0,95	1,12				-1,06
Muro 1- Ventana 4 Salón 2	0,96	1,13				-1,08
Muro 1- Ventana 5 Salón 2	2,15	0,47				-1,01
Muro 1- Ventana 6 Salón 2	2,04	0,46				-0,94
Muro 1- Ventana 7 Salón 2	1,06	0,47				-0,50
Muro 3- Puerta de Acceso Salón 2	0,95	2,14				-2,03
Muro 3- Ventana 1 Salón 2	1,20	0,94				-1,13
Muro 3- Ventana 2 Salón 2	1,20	0,94				-1,13
SALON 1						
Muro 1- Salón 1	7,03	3,01				21,16
Muro 2- Salón 1	5,83	3,52				20,52
Muro 3- Salón 1	7,03	4,03				28,33
Muro 4- Salón 1	5,83	3,52				20,52
					Subtotal	178,49
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	307,90
					Total Memoria de cálculo M2	486,39

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-022

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldia municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mamposteria y acabados	Ítem	5.12	Actividad	Estuco y pintura para muros (incluye remocion y/o picada de estuco deteriorado)	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema





Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Descuentos Salón 1						
Muro 1- Puerta de Acceso Salón 1	0,95	2,00				-1,90
Muro 1- Ventana 1 Salón 1	0,96	1,12				-1,08
Muro 1- Ventana 2 Salón 1	0,96	1,12				-1,08
Muro 1- Ventana 3 Salón 1	0,96	1,12				-1,08
Muro 1- Ventana 4 Salón 1	0,96	1,12				-1,08
Muro 1- Ventana 5 Salón 1	2,15	0,49				-1,05
Muro 1- Ventana 6 Salón 1	2,05	0,47				-0,96
Muro 1- Ventana 7 Salón 1	1,07	0,47				-0,50
Muro 3- Puerta de Acceso Salón 1	0,98	2,16				-2,12
Muro 3- Ventana 1 Salón 1	1,20	0,98				-1,18
					Subtotal	-12,03
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	486,39
					Total Memoria de cálculo M2	474,36

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-022

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander				Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit 901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6			

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.13	Actividad	Pintura tipo 1 para muros	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema









Descripción	Largo (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
MURO PARQUE INFANTIL						
MURO 3 PARQUE INFANTIL	4,00	2,85				11,40
MURO 4 PARQUE INFANTIL	3,62	2,64				9,56
MURO 5 PARQUE INFANTIL	0,36	2,64				0,95
Pasillo Coordinación						
Muro Existente-Coordinación y Cafetería Antigua	7,77	4,22				32,79
Descuentos Pasillo Coordinación						
Muro- Puerta Acceso Coordinación	0,80	2,01				-1,61
Muro- Puerta Acceso Cafetería Antigua	1,00	2,15				-2,15
Muro-Ventana Coordinación	0,98	1,00				-0,98
Pasillo Ingreso Principal						
Muro 1-Área de Distribución de Alimentos	3,72	2,70				10,04
Muro 2-Cara Posterior Área de Distribución de Alimentos	4,18	3,00				12,54
Muro 3-Ingreso 2 Reja Existente	3,02	2,70				8,15
Muro 4- Acceso Principal 1	3,04	2,70				8,21
Muro 5-Acceso Principal 2	1,40	2,70				3,78
Muro 6-Acceso Principal 3	1,40	2,70				3,78
Muro 7- Ingreso 2 Coordinación	1,39	2,70				3,75
Descuentos Pasillo Ingreso Principal						
Muro 1- Puerta de Acceso Área de Distribución de Alimentos	0,95	2,14				-2,03
Muro 2-Cara posterior Área de Distribución de Alimentos-Ventana	1,20	1,00				-1,20
Muro 3- Ingreso 2 Reja Existente	2,66	2,50				-6,65
Muro 4- Puerta Acceso Principal 1	0,94	1,90				-1,79
Muro 5-Ventana Acceso Principal 2	1,20	1,20				-1,44
Muro Cancha Existente						
Muro Cancha Existente	14,52	3,30				47,92
					Subtotal	135,02
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	135,02

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-0

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander			Contrato No			CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.14	Actividad	Pintura en aceite exterior	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema





Descripción	Ancho (m)	Alto (m)	Long (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Parque Infantil						
Pedestales Existentes Parque Infantil	1,52	1,40		20,00		42,56
Descripción	**Long (m)**	**Alto (m)**				
Muro 1 Cerramiento inferior	1,73	0,53				0,92
Muro 2 Cerramiento inferior	1,76	0,50				0,88
Muro 3 Cerramiento inferior	1,78	0,54				0,96
Muro 4 Cerramiento inferior	1,74	0,78				1,36
Muro 5 Cerramiento inferior	1,77	0,74				1,31
Muro 6 Cerramiento inferior	1,76	0,79				1,39
Muro 7 Cerramiento inferior	1,70	0,51				0,87
Muro 8 Cerramiento inferior	1,73	0,62				1,07
Muro 9 Cerramiento inferior	1,74	0,40				0,70
Muro 10 Cerramiento inferior	1,77	0,43				0,76
Muro 11 Cerramiento inferior	1,78	0,47				0,84
Muro 12 Cerramiento inferior	1,77	0,46				0,81
Muro 13 Cerramiento inferior	1,60	0,51		2,00		1,63
Muro 14 Cerramiento inferior	1,72	0,50		2,00		1,72
Muro 15 Cerramiento inferior	1,79	0,47		2,00		1,68
Muro 16 Cerramiento inferior-Acceso Salones	1,74	0,20				0,35
Muro 17 Cerramiento inferior	1,75	0,46		2,00		1,61
Muro 18 Cerramiento inferior	0,47	0,46		2,00		0,43
					Subtotal	61,85
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo M2	61,85

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-023

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander			Contrato No			CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	Estructuras de Concreto, Mampostería y acabados	Ítem	5.14	Actividad	Pintura en aceite exterior	Und	M2

Registro Fotográfico/Esquema





Descripción	Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
Parque Infantil						
Muro 1-Rejilla 1-Puerta de Acceso Salones Casona 1	1,55	0,80		2,00		2,48
Muro 2-Rejilla 2	1,73	0,80		2,00		1,38
Muro 3-Rejilla 3	1,76	0,80		2,00		1,41
Muro 4-Rejilla 4	1,78	0,80		2,00		1,42
Muro 5-Rejilla 5	1,74	0,80		2,00		1,39
Muro 6-Rejilla 6	1,77	0,80		2,00		1,42
Muro 7-Rejilla 7	1,76	0,80		2,00		1,41
Muro 8-Rejilla 8	1,70	0,80		2,00		1,36
Muro 9-Rejilla 9	1,73	0,80		2,00		1,38
Muro 10-Rejilla 10	1,74	0,80		2,00		1,39
Muro 11-Rejilla 11	1,77	0,80		2,00		1,42
Muro 12-Rejilla 12	1,78	0,80		2,00		1,42
Muro 13-Rejilla 13	1,77	0,80		2,00		1,42
Rejilla 14- Puerta de Acceso- Rampa Existente	1,50	1,29		2,00		1,94
Muro 15-Rejilla 15	1,60	0,80		2,00		1,28
Muro 16-Rejilla 16	1,72	0,80		2,00		1,38
Muro 17-Rejilla 17	1,79	0,80		2,00		1,43
Muro 18-Rejilla 18	1,73	0,80		2,00		1,38
Baños Infantiles						
Muro 1-Rejilla Ingreso 1 (Puerta de Acceso)	1,08	2,00				2,16
Rejilla Intermedia 1	1,83	0,80				1,46
Rejilla Intermedia 2	1,83	0,80				1,46
Rejilla Ingreso 2 (Puerta de Acceso)	1,19	2,00				2,38
Muro 1-Rejilla Parque Infantil	0,97	1,87				1,81
					Subtotal	35,98
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	61,85
					Total Memoria de cálculo M2	97,83

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-023

Residente de Obra

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				


Capítulo	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ítem	7.01	Actividad	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	Und	UND

Registro Fotográfico/Esquema










Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
UBICACIÓN						
SALÓN 1				6,00		6,00
SALÓN 2				6,00		6,00
SALÓN 3				9,00		9,00
SALÓN 4				9,00		9,00
SALÓN 5				9,00		9,00
SALÓN 6				9,00		9,00
SALÓN 7				9,00		9,00
SALÓN DE INFORMATICA				9,00		9,00
BAÑOS INFANTILES				2,00		2,00
CAFETERIA				1,00		1,00
					Subtotal	69,00
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo	UND 69,00

Observaciones

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ítem	7.02	Actividad	Suministro, transporte e instalación de salida tomacorriente de pared. Incluye cableado 3 Cu No 12 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt rectangular, caja Rawelt cuadrada. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	Und	UND








UBICACIÓN						
SALÓN 1				4,00		4,00
SALÓN 2				4,00		4,00
SALÓN 3				4,00		4,00
SALÓN 4				3,00		3,00
SALÓN 5				3,00		3,00
SALÓN 6				3,00		3,00
SALÓN 7				3,00		3,00
					Subtotal	24,00
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo	UND 24,00

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-0

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander			Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6		
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1

Capítulo	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ítem	7.03	Actividad	Suministro, transporte e instalación de panel led para descolgar 60x60 con marco, 40 W luz blanca 6500k 120/277v y IP20, incluye todos los accesorios para su instalación.	Und	UND

Registro Fotográfico/Esquema








Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
UBICACIÓN						
SALÓN 1				6,00		6,00
SALÓN 2				6,00		6,00
SALÓN 3				9,00		9,00
SALÓN 4				9,00		9,00
SALÓN 5				9,00		9,00
SALÓN 6				9,00		9,00
SALÓN 7				9,00		9,00
SALÓN DE INFORMATICA				9,00		9,00
CAFETERIA				1,00		1,00
					Subtotal	67,00
					Vienen (memorias de cálculos anteriores)	
					Total Memoria de cálculo	UND	67,00

Observaciones:

Plano Anexo: TOP-0

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:





Contratista: Icssa SAS	Contratante: Alcaldía municipal de Piedeuesta	Interventoría: Coedco SAS

FECHA:	DD		MM		AAAA	2026	Acta No	2

Objeto del Contrato	Mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa Balbino García Sede B del municipio de Piedecuesta, Santander					Contrato No	CO1.PCCNTRR.8300708
Contratante	Alcaldía municipal de Piedecuesta	Nit	890205383-6	Interventoría	Coedco SAS	Nit	901109221-1
Contratista	Icssa SAS	Nit	901450894-6				

Capítulo	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ítem	7.04	Actividad	Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 12 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura, espacio para totalizador y barraje independiente de tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación.	Und	UND

Registro Fotográfico/Esquema

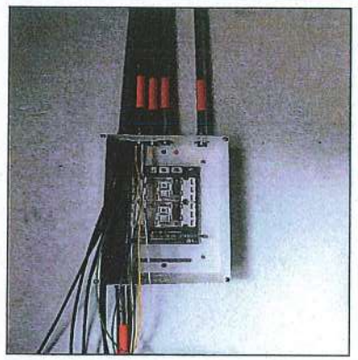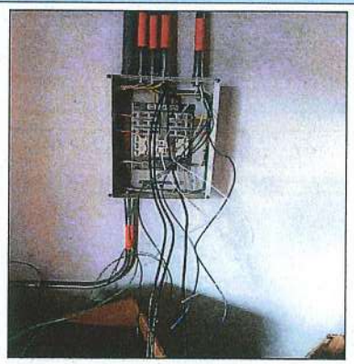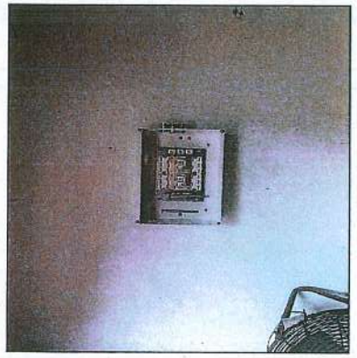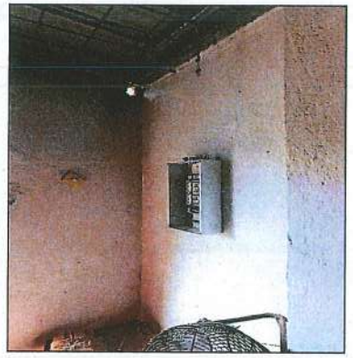Descripción	Largo (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Cantidad (Und)	Área (m2)	Medida Total
UBICACIÓN						
SALÓN DE MATERIALES				1,00		1,00

Subtotal		1,00
Vienen (memorias de cálculos anteriores)		
Total Memoria de cálculo	UND	1,00

Observaciones

Residente de Obra:

Residente de Interventoría:

Planillas de seguridad social

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	19/12/2025	92376017	$191.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	24.700	0		0		0	0	0	0	24.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	98.700	0	0	0	0	0	0		98.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	43.000				43.000	0	0	43.000			430	43.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	24.700	0	0	24.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	24.700	24.700
Pensión	1	98.700	98.700
Riesgos Laborales	1	43.000	43.000
CCF	1	24.700	24.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	191.100	191.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901450894-6	ICSSA SAS		Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	19/12/2025	92376017	$191.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS010	616.850	24.700	14-4	616.850	5	43.000	CCF39	616.850	24.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/12/2025	92376305	$440.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	440.900	440.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901450894-6	ICSSA SAS		Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/12/2025	92376305	$440.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098756647	SANCHEZ JEREZ OSCAR ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF39	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098682166	0	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 36 27 71		6826902			AUXADMINISTRATIVA2@INFRAESTRUCTURAVIAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35615153	I	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35615153	2026-01-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1098682166	SANCHEZ MANTILLA SANTIAGO ANDRES	1.423.500																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	504.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098682166	0	SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 36 27 71		6826902			AUXADMINISTRATIVA2@INFRAESTRUCTURAVIAS.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	35615153	I	2026-01-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35615153	2026-01-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	99.100	0	0	0	99.100
Gran Total					504.900	0	0	0	504.900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66457992	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	$0	$102.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	99.100				99.100	45	2.900	102.000			991	102.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	45	0	0	0
ICBF				
0	45	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	99.100	102.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	99.100	102.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450894-6	ICSSA SAS	Calle 36 #27-71	3112282381	auxadministrativa2@infraestructuravias.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66457992	12/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	$0	$102.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098720357	ORELLANO MERCADO INGRID JOHANA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-4	1.423.500	30	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768348	2	CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 202 21 A 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6759660	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2071613931	9497769456	E	2026/01/14	2026/01/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$13,637,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																								$43,186,600	$6,911,500			$43,186,600	$1,729,200			$52,374,108	$2,091,400			$43,186,600		$2,905,600		$0	$0		$13,637,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1095804910	SIERRA SANTOS YURLEY																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (35 Afiliados)																								$41,763,100	$6,683,700			$41,763,100	$1,672,200			$50,950,608	$2,034,400			$41,763,100		$2,898,100		$0	$0		$13,288,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (35 Afiliados)																								$41,763,100	$6,683,700			$41,763,100	$1,672,200			$50,950,608	$2,034,400			$41,763,100		$2,898,100		$0	$0		$13,288,400
2	CC	1102370375	ACEVEDO MANTILLA CARLOS ARTURO		X															X		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,162,525	$46,600	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$341,000
3	CC	1097097968	CASTELLANOS PLATA JUAN SEBASTIAN		X															X		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,162,525	$46,600	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$341,000
4	CC	1095302639	CRUZ MEDINA JUAN DAVID		X															X		25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,172,410	$46,900	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	SI	$341,300
5	CC	1005234391	DUARTE ORDOÑEZ DANIEL MARTIN		X															X		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,097,685	$84,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$467,900
6	CC	1127948921	FONSECA SILVA JOSE FERNANDO		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,767,513	$70,800	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$454,700
7	CC	1002362634	GERES GALIANO YORMAN ALEXIS	X																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF40	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	SI	$396,800
8	CC	91458799	GOMEZ EDUARDO	X																		23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF40	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$279,300
9	CC	1000122562	GRAJALES JEREZ JOHAN SEBASTIAN		X															X		23100 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$257,021	$10,300	14-4	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$36,000
10	CC	1005370753	INFANTE ARDILA LAUREN ANDREA ZULEY		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,058,144	$82,400	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$466,300
11	CC	88258470	JACOME JACOME EZEQUIEL		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,121,410	$84,900	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$468,800
12	CC	91354783	LIZARAZO CALDERON SERGIO		X															X		23020 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF40	22	$1,198,113	$48,000	14-4	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$329,600
13	CC	91354783	LIZARAZO CALDERON SERGIO											X								23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF40	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
14	CC	1005540877	LOZANO ALMEYDA JESUS MANUEL		X															X		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,550,033	$62,100	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$446,000
15	CC	91156019	LUNA ACOSTA JOSE ANTONIO		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,121,410	$84,900	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$468,800
16	CC	91531179	MANTILLA RIOS JAIME JOAN		X															X		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,767,513	$70,800	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$454,700
17	CC	13544320	MARIÑO SOTO DANIEL EDUARDO		X															X		25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,587,598	$63,600	14-4	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$421,900
18	CC	13544320	MARIÑO SOTO DANIEL EDUARDO											X								25-14	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
19	CC	5697988	MARTINEZ SILVA MARIO		X															X		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,028,488	$81,200	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$465,100
20	CC	1102383081	MEDINA ESPARZA YORDAN ORLANDO		X															X		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,506,538	$60,300	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$444,200
21	CC	1049643955	MEDRANO ALVAREZ EDGAR FERNEY		X															X		23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$124,556	$5,000	14-4	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$30,700
22	CC	91275501	MORA JOSE WILLIAN		X															X		23020 1	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF40	21	$1,585,621	$63,500	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	SI	$332,300
23	CC	91133913	NIEVES NELSON		X															X		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$2,044,304	$81,800	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$465,700
24	CC	1050548195	ORTEGA GONZALEZ ALBEIRO	X	X															X		23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF40	19	$939,115	$37,600	14-4	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$0	$0	SI	$280,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$6,911,500	$0	$0	$6,911,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$243,000	$0	$0	$243,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,716,300	$0	$0	$1,716,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,614,600	$0	$0	$3,614,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,337,600	$0	$0	$1,337,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,905,600	$0	$0	$2,905,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	36	$2,905,600	$0	$0	$2,905,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,091,400	$0	$0	$2,091,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	36	$2,091,400	$0	$0	$2,091,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				36	$1,729,200	$0	$0	$1,729,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$13,300	$0	$0	$13,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$70,300	$0	$0	$70,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$564,300	$0	$0	$564,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$197,600	$0	$0	$197,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$292,800	$0	$0	$292,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$258,400	$0	$0	$258,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$161,500	$0	$0	$161,500
TOTAL				36	$13,637,700	$0	$0	$13,637,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901072144	9	INDUMETALICAS VANEGAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 19A 13-30	BUCARAMANGA-SANTANDER	6879288	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2080485368	9497871511	E	2026/01/14	2026/01/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,768,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (16 Afiliados)																						$26,197,937	$4,192,400			$34,997,937	$1,398,300			$39,853,100	$1,531,800			$34,997,937		$2,327,000		$0	$0		$9,449,500
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (16 Afiliados)																						$26,197,937	$4,192,400			$34,997,937	$1,398,300			$39,853,100	$1,531,800			$34,997,937		$2,327,000		$0	$0		$9,449,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																						$26,197,937	$4,192,400			$34,997,937	$1,398,300			$39,853,100	$1,531,800			$34,997,937		$2,327,000		$0	$0		$9,449,500
1	CC	1050549339	AMAYA DAVID										X								25-14	29	$1,904,001	$304,700	EPS002	29	$1,904,001	$76,200	CCF40	29	$1,904,001	$76,200	14-4	29	$1,904,001	6.960%	$132,600	29	$0	$0	SI	$589,700
2	CC	1050549339	AMAYA DAVID											X							25-14	1	$56,667	$9,100	EPS002	1	$56,667	$0	CCF40	1	$56,667	$0	14-4	1	$56,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,100
3	CC	1098620733	BARAJAS SERGIO												X						230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
4	CC	1098620733	BARAJAS SERGIO																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF40	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	SI	$411,500
5	CC	18957068	BASTIDAS EZEQUIEL										X								231001	30	$1,533,300	$245,400	EPS005	30	$1,533,300	$61,400	CCF40	30	$1,533,300	$61,400	14-4	30	$1,533,300	6.960%	$106,800	30	$0	$0	SI	$475,000
6	CC	37729280	CALDERON YAZMIN												X						25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$0	14-4	30	$1,423,500	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$284,800
7	CC	1232889978	CAMPOS BREINER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	91534432	GOMEZ GONZALO		X								X							X	25-14	23	$1,474,480	$236,000	EPS002	23	$1,474,480	$59,000	CCF40	23	$2,292,322	$91,700	14-4	23	$1,474,480	6.960%	$102,700	23	$0	$0	SI	$489,400
9	CC	91488361	HERNANDEZ ANDRES		X																25-14	20	$1,422,624	$227,700	EPS037	20	$1,422,624	$57,000	CCF40	20	$1,422,624	$57,000	14-4	20	$1,422,624	6.960%	$99,100	20	$0	$0	SI	$440,800
10	CC	91016762	HERNANDEZ FERNEY		X								X							X	230301	20	$2,332,313	$373,200	EPS002	20	$2,332,313	$93,300	CCF40	20	$3,459,176	$138,400	14-4	20	$2,332,313	6.960%	$162,400	20	$0	$0	SI	$767,300
11	CC	1098765939	HERNANDEZ JUAN										X								230301	30	$1,539,755	$246,400	EPS037	30	$1,539,755	$61,600	CCF40	30	$1,539,755	$61,600	14-4	30	$1,539,755	6.960%	$107,200	30	$0	$0	SI	$476,800
12	CC	1005330615	LOPEZ LUISA																		230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF40	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	SI	$526,400
13	CC	1232889161	LOZANO LAURA		X								X							X	230301	23	$1,532,695	$245,300	EPS002	23	$1,532,695	$61,400	CCF40	23	$1,861,045	$74,500	14-4	23	$1,532,695	6.960%	$106,700	23	$0	$0	SI	$487,900
14	CC	1097991534	MURCIA BALTASAR		X								X							X	230301	20	$1,531,993	$245,200	EPS005	20	$1,531,993	$61,300	CCF40	20	$2,229,286	$89,200	14-4	20	$1,531,993	6.960%	$106,700	20	$0	$0	SI	$502,400
15	CC	1005303672	RUIZ EVER										X								230301	30	$2,035,349	$325,700	EPS002	30	$2,035,349	$81,500	CCF40	30	$2,035,349	$81,500	14-4	30	$2,035,349	6.960%	$141,700	30	$0	$0	SI	$630,400
16	CC	91266483	VALDERRAMA NELSO		X								X							X	25-14	20	$2,864,260	$458,300	EPS005	20	$2,864,260	$114,600	CCF40	20	$3,390,742	$135,700	14-4	20	$2,864,260	6.960%	$199,400	20	$0	$0	SI	$908,000
17	CC	1097780250	VANEGAS JUAN		X															X	25-14	20	$2,000,000	$320,000	EPS002	20	$2,000,000	$80,000	CCF40	20	$3,358,333	$134,400	14-4	20	$2,000,000	6.960%	$139,200	20	$0	$0	SI	$673,600
18	CC	18938448	VANEGAS RODRIGO																			0	$0	$0	EPS002	30	$8,800,000	$352,000	CCF40	30	$8,800,000	$352,000	14-4	30	$8,800,000	6.960%	$612,500	30	$0	$0	SI	$1,316,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA (1 Afiliados)																						$949,000	$151,900			$949,000	$38,000			$1,563,873	$62,600			$949,000		$66,100		$0	$0		$318,600
Centro de Trabajo: BUCARAMANGA (1 Afiliados)																						$949,000	$151,900			$949,000	$38,000			$1,563,873	$62,600			$949,000		$66,100		$0	$0		$318,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$949,000	$151,900			$949,000	$38,000			$1,563,873	$62,600			$949,000		$66,100		$0	$0		$318,600
19	PT	6356060	MUÑOZ ALFREDO		X															X	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$38,000	CCF40	20	$1,563,873	$62,600	14-4	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$318,600
Total			**Afiliados(17)**																			$27,146,937	$4,344,300			$35,946,937	$1,436,300			$41,416,973	$1,594,400			$35,946,937		$2,393,100		$0	$0		$9,768,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,344,300	$0	$0	$4,344,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$245,400	$0	$0	$245,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,783,600	$0	$0	$1,783,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,043,300	$0	$0	$2,043,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,393,100	$0	$0	$2,393,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$2,393,100	$0	$0	$2,393,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,594,400	$0	$0	$1,594,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	17	$1,594,400	$0	$0	$1,594,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	$1,436,300	$0	$0	$1,436,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$95,000	$0	$0	$95,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$118,600	$0	$0	$118,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$860,400	$0	$0	$860,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$237,300	$0	$0	$237,300
TOTAL				17	$9,768,100	$0	$0	$9,768,100
