ANEXO No.2 CRONOGRAMA						
CONTRATO FAZNI GGC 1862 - 2025						
PROYECTO	INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE BOCHALEMA,					
OPERADOR DE RED:	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P.					
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN						
FECHA ACTA DE INICIO	24/2/2026					
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN				9 MESES		
EN RIESGO	NOMBRE DE LA TAREA	NOMBRE DE LA SUBTAREA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN (días)
	ETAPA I - Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación		EN EJECUCION	2/24/2026	6/1/2026	97
☐	Subtarea 1.1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	TERMINADO	2/24/2026	3/2/2026	7
☐	Subtarea 1.2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	TERMINADO	2/24/2026	3/2/2026	7
☐	Subtarea 1.3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	NO INICIADO	3/3/2026	3/25/2026	23
☐	Subtarea 1.4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	NO INICIADO	3/25/2026	4/6/2026	13
☐	Subtarea 1.5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	NO INICIADO	4/7/2026	5/2/2026	26
☐	Subtarea 1.6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	NO INICIADO	5/2/2026	5/7/2026	6
☐	Subtarea 1.7	Revisar y aceptar diseños especificaciones y presupuesto.	EN EJECUCION	2/24/2026	3/18/2026	23
☐	Subtarea 1.8	Elaboración de pliegos de contratación de obra	NO INICIADO	3/27/2026	4/6/2026	11
☐	Subtarea 1.9	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	NO INICIADO	4/7/2026	5/7/2026	31
☐	Subtarea 1.10	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	NO INICIADO	5/7/2026	5/12/2026	6
☐	Subtarea 1.11	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	NO INICIADO	5/12/2026	5/17/2026	6
☐	Subtarea 1.12	Realización de socialización del proyecto con la comunidad.	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.13	Realizar verificación de los usuarios según la localización prevista del proyecto en el campo	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.14	Verificar concepto de pertinencia y oportunidad de consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.15	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11

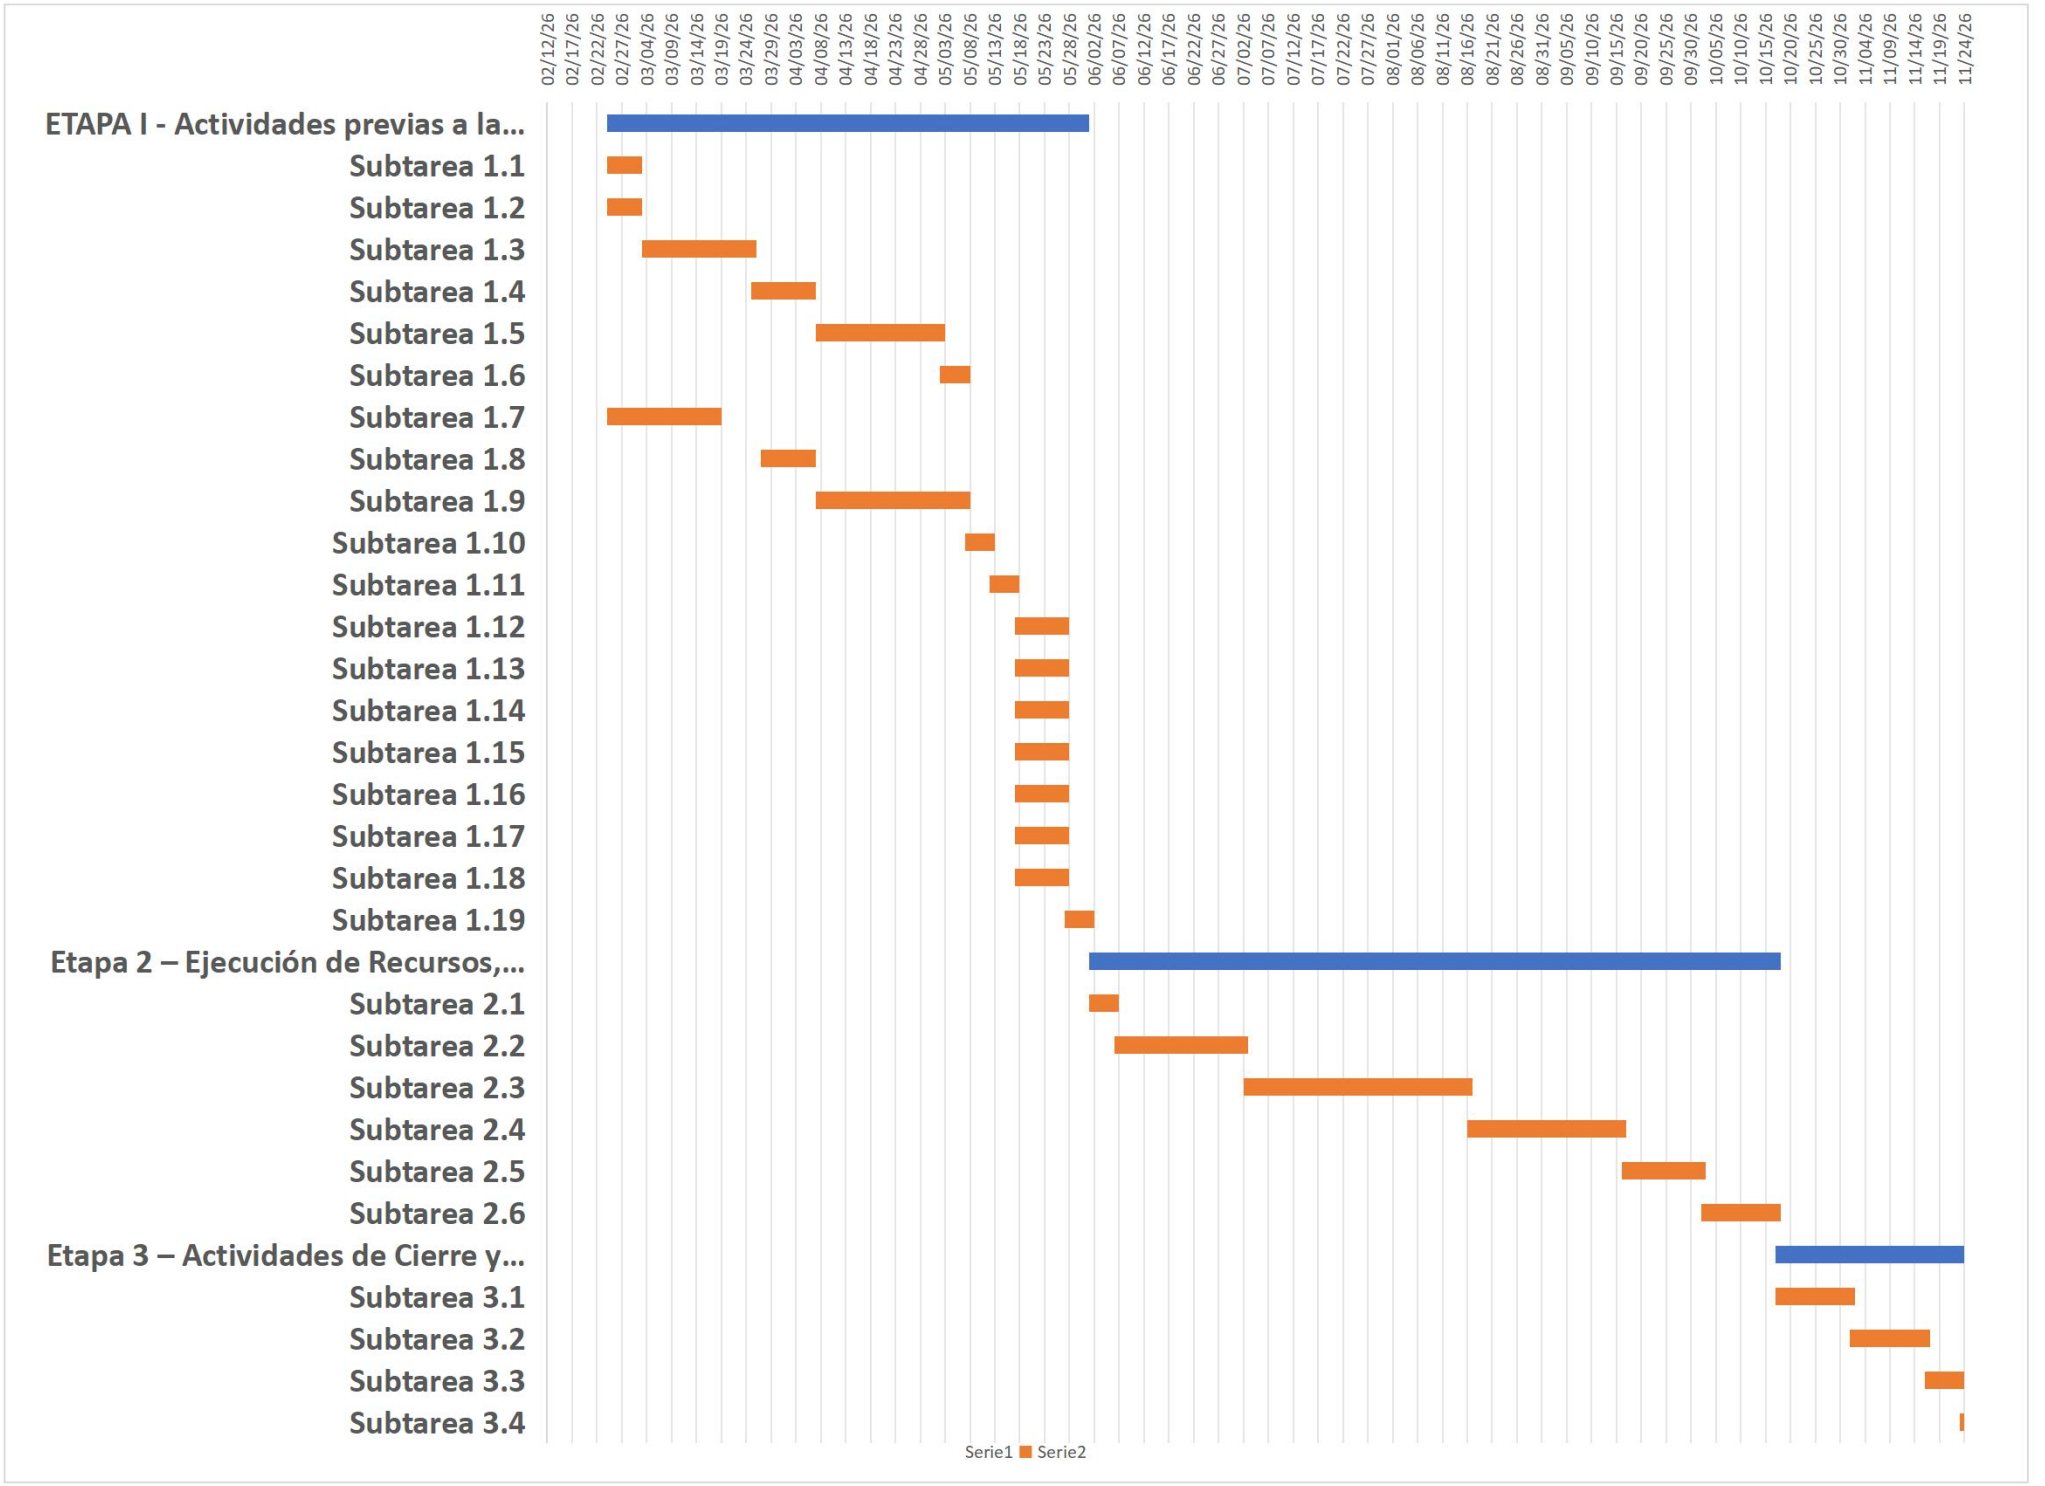
☐	Subtarea 1.16	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.17	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de protección.	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.18	Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales	NO INICIADO	5/17/2026	5/27/2026	11
☐	Subtarea 1.19	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	NO INICIADO	5/27/2026	6/1/2026	6
☐	**Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la Infraestructura**		**NO INICIADO**	6/1/2026	10/17/2026	**139**
☐	Subtarea 2.1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	NO INICIADO	6/1/2026	6/6/2026	6
☐	Subtarea 2.2	Avance de obra del 35%	NO INICIADO	6/6/2026	7/2/2026	27
☐	Subtarea 2.3	Avance de obra del 60%	NO INICIADO	7/2/2026	8/16/2026	46
☐	Subtarea 2.4	Avance de obra del 80%	NO INICIADO	8/16/2026	9/16/2026	32
☐	Subtarea 2.5	Acta de recibo de obras	NO INICIADO	9/16/2026	10/2/2026	17
☐	Subtarea 2.6	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR, PRESTADOR DEL SERVICIO y el interventor e Inicio del plazo de la Fase II AOM.	NO INICIADO	10/2/2026	10/17/2026	16
☐	**Etapa 3 – Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I**		**NO INICIADO**	10/17/2026	11/23/2026	**38**
☐	Subtarea 3.1	Acta de liquidación de contratos de obra e interventoría	NO INICIADO	10/17/2026	11/1/2026	16
☐	Subtarea 3.2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	NO INICIADO	11/1/2026	11/16/2026	16

☐	Subtarea 3.3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de la liquidación de la Fase I del presente Contrato.	NO INICIADO	11/16/2026	11/23/2026	8
☐	Subtarea 3.4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	NO INICIADO	11/23/2026	11/23/2026	1

SERGIO HERNANDO BEDOYA ANAVE
Supervisor

Mayra Lorena Pastrana Calderon
Subdireccion Proyectos

Gantt Chart


02/12/26
02/17/26
02/22/26
02/27/26
03/04/26
03/09/26
03/14/26
03/19/26
03/24/26
03/29/26
04/03/26
04/08/26
04/13/26
04/18/26
04/23/26
04/28/26
05/03/26
05/08/26
05/13/26
05/18/26
05/23/26
05/28/26
06/02/26
06/07/26
06/12/26
06/17/26
06/22/26
06/27/26
07/02/26
07/07/26
07/12/26
07/17/26
07/22/26
07/27/26
08/01/26
08/06/26
08/11/26
08/16/26
08/21/26
08/26/26
08/31/26
09/05/26
09/10/26
09/15/26
09/20/26
09/25/26
09/30/26
10/05/26
10/10/26
10/15/26
10/20/26
10/25/26
10/30/26
11/04/26
11/09/26
11/14/26
11/19/26
11/24/26
ETAPA I - Actividades previas a la...
Subtarea 1.1
Subtarea 1.2
Subtarea 1.3
Subtarea 1.4
Subtarea 1.5
Subtarea 1.6
Subtarea 1.7
Subtarea 1.8
Subtarea 1.9
Subtarea 1.10
Subtarea 1.11
Subtarea 1.12
Subtarea 1.13
Subtarea 1.14
Subtarea 1.15
Subtarea 1.16
Subtarea 1.17
Subtarea 1.18
Subtarea 1.19
Etapa 2 – Ejecución de Recursos,...
Subtarea 2.1
Subtarea 2.2
Subtarea 2.3
Subtarea 2.4
Subtarea 2.5
Subtarea 2.6
Etapa 3 – Actividades de Cierre y...
Subtarea 3.1
Subtarea 3.2
Subtarea 3.3
Subtarea 3.4
Serie1
Serie2
