INFORME N° : 11	**PERÍODO DEL INFORME**
FECHA: Noviembre 2025	**DESDE: 01 / 10 / 2025 HASTA 31 / 10 / 2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	**2024002200075**
Nombre del proyecto	**CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR**
Valor total del proyecto	**$46.952.217.242,38**
Valor del proyecto antes de Interventoría	**$44.663.876.131,22**
Valor de la Interventoría	**$2.288.341.111,56**
Fuente de financiación	**SGPR-RECURSOS PROPIOS**
Objetivo general del proyecto	**Mejorar la intercomunicación terrestre de diferentes centros poblados en diferentes sectores del Departamento del Cesar**
Producto (s) por entregar con el proyecto	**El proyecto contempla la construcción de un total de 10 puentes vehiculares repartidos en 4 tramos viales que sirven de conexión a diferentes centros poblados del Departamento del Cesar.**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACION DE OBRA PUBLICA
No. de proceso de selección	LOP-SIN-0001-2024
No. de contrato	2024 04 0001
Objeto	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratante	GOBERNACIÓN DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO CONEXIONES ELEVADAS
NIT	901.880.443-2
Representante legal	FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
Valor inicial del contrato	$31.938.798.947,00
Valor anticipo del contrato	$9.581.639.684,10
Valor adicional 01 del contrato	$15.013.418.295,38
Valor adicional 02 del contrato	
Valor actualizado del contrato	$46.952.217.242,38
Fecha de inicio	09 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	

Fecha de terminación inicial	08 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación actualizada	
Plazo inicial del contrato	
Prorroga 1	
Prorroga 2	
Plazo del actualizado del contrato	
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	JORGE MARIO BLANCO PEREZ
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO SUPERVISION ENLACES 0003
NIT	901891689-4
Representante legal	MERY YEN CAROLINA OSPINO
Cedula representante legal	1044908415
Supervisor técnico	JORGE MARIO BALNCO PEREZ
	SAID ANTONIO LOZANO LOZANO
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor financiero	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

4. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

ACTUALIZACION DE GARANTIAS – Actualización de póliza Adición 1 -OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIA DE GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1058972	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 14.085.665.172,90	26/06/2025	11/04/2026
	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	$ 14.085.665.172,90	26/06/2025	11/04/2026
	PAGO DE SALARIOS	$ 2.347.610.862,15	26/06/2025	9/12/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 14.085.665.172,90	9/12/2025	9/12/2030

ACTUALIZACION DE GARANTIAS – Actualización de póliza Adición 1 - RCE – OBRA

INFORMACION RIESGO ASEGURADO		**VIGENCIA DE GARANTIAS**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
CG-1013895	AMPARO BÁSICO, PREDIOS Y LABORES	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	PATRONAL	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 2.347.610.862,00	9/12/2025	9/12/2025
	GASTOS MÉDICOS	$ 1.596.939.947,00	9/12/2025	9/12/2025

ACTUALIZACIONDE GARANTIAS – ACTA DE INICIO- INTERVENTORIA

Casa aseguradora		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
NÚMERO DE POLIZAS	**AMPARO**	**VALOR ($)**	**DESDE**	**HASTA**
75-44-101141307	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$228.834.111,16	9/12/2024	8/04/2026
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$915.336.444,62	9/12/2024	8/04/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$686.502.333,47	9/12/2025	9/12/2030
	PAGO DE SALRIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$228.834.111,16	9/12/2025	9/12/2028

5. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP REGALIAS					
# CDP	**1624**	**VALOR**	**$32.690.587.313,82**	**FECHA**	**03/09/2024**
# CDP	**18425**	**VALOR**	**$14.261.629.928,55**	**FECHA**	**07/02/2025**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**20024**	**VALOR**	**$36.618.789.191,55**	**FECHA**	**06/11/2024**
N° RP	**17725**	**VALOR**	**$22.357.159.263,00**	**FECHA**	**07/02/2025**

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	**1724**	**VALOR**	**$2.228.341.111,97**	**FECHA**	**3/09/2024**

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	**21324**	**VALOR**	**$2.228.341.111,56**	**FECHA**	**2/12/2024**

6. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO


OBRA


	Obra				No orden de pago	Comprobante de egreso	
	Valor ($) Acta Pago	Porcentaje(%) Acta de Pago	Valor Amortizado	Valor ($) por cobrar		N°	Fecha
Anticipo	$ 9.581.639.684,00	30,00%		$ 22.357.159.263,00			
Anticipo Adición	$ 4.504.025.488,61	30,00%		$ 4.504.025.488,61			
Acta 1	$ 8.107.005.596,00	17,27%	$ 2.432.101.378,80	$ 5.674.903.917,00	1,92	43	13/03/2025
Acta 2	$ 4.370.560.680,10	9,31%	$ 1.311.168.204,03	$ 3.059.392.476,00	6,792	172,00	28/05/2025
Acta 3	$ 11.532.304.934,00	24,56%	$ 3.459.691.480,20	$ 8.072.613.453,00	9905	238	9/07/2025
Acta 4	$ 7.984.911.894,73	17,01%	$ 2.395.473.568,42	$ 5.589.438.326,31	16371	975	25/09/2025

INTERVENTORIA

	Interventoría				No orden de pago	Comprobante de egreso	
	Valor ($) Acta Pago	Porcentaje(%) Acta de Pago	Valor Amortizado	Valor ($) por cobrar		N°	Fecha
Anticipo	$ 915.336.444,62	40%		$ 1.373.004.666,94			
Anticipo adición	$ 1.345.607.130,18	40%					
Acta 1	$ 580.848.209,97	17,27	$ 232.339.283,99	$ 348.508.925,98	6492	179	21/05/2025
Acta 2	$ 313.140.569,29	9,31	$ 125.256.227,71	$ 187.884.341,58	8402	221	20/06/2025
Acta 3	$ 342.215.054,80	10,17	$ 136.886.021,92	$ 205.329.032,88	10794	610	22/07/2025
Acta 4	$ 400.763.578,54	11,91	$ 160.305.431,42	$ 240.458.147,12	16581	1003	1/10/2025

7. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS

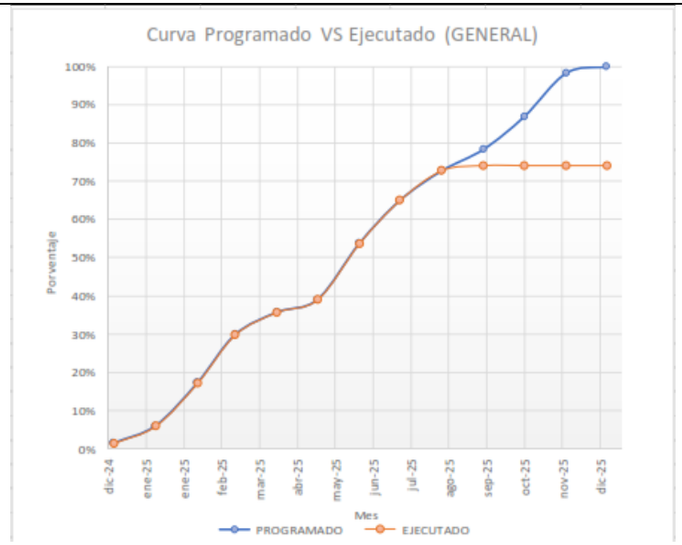

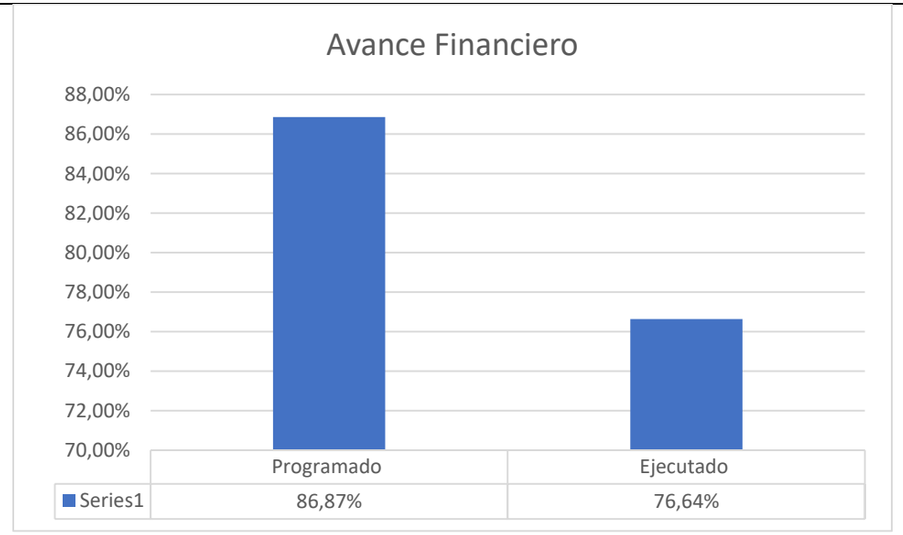

PUENTES										
INFORME	MES	INVERSION				EJECUTADO		PROGRAMADO		ESTADO:
		PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUM	EJECUTADO EN EL MES	EJECUTADO ACUMULADO	% MES	% ACUMULADO	% MES	% ACUMULADO	
1	dic-24	$ 690.463.641,26	$ 690.463.641,26	$ 690.463.641,26	$ 690.463.641,26	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	SIN RETRASO
1	ene-25	$ 2.125.571.464,36	$ 2.816.035.105,62	$ 2.125.571.464,36	$ 2.816.035.105,62	4,53%	6,00%	4,53%	6,00%	SIN RETRASO
2	feb-25	$ 5.263.285.415,05	$ 8.079.320.520,67	$ 5.263.285.415,05	$ 8.079.320.520,67	11,21%	17,21%	11,21%	17,21%	SIN RETRASO
3	mar-25	$ 5.932.539.186,26	$ 14.011.859.706,93	$ 5.932.539.186,26	$ 14.011.859.706,93	12,64%	29,84%	12,64%	29,84%	SIN RETRASO
4	abr-25	$ 2.753.735.073,03	$ 16.765.594.779,96	$ 2.753.735.073,03	$ 16.765.594.779,96	5,86%	35,71%	5,86%	35,71%	SIN RETRASO
5	may-25	$ 1.564.381.728,78	$ 18.329.976.508,73	$ 1.564.381.728,78	$ 18.329.976.508,73	3,33%	39,04%	3,33%	39,04%	SIN RETRASO
6	jun-25	$ 6.896.281.446,00	$ 25.226.257.954,74	$ 6.896.281.446,00	$ 25.226.257.954,74	14,69%	53,73%	14,69%	53,73%	SIN RETRASO
7	jul-25	$ 5.273.704.516,03	$ 30.499.962.470,77	$ 5.273.704.516,03	$ 30.499.962.470,77	11,23%	64,96%	11,23%	64,96%	SIN RETRASO
8	ago-25	$ 3.639.746.132,22	$ 34.139.708.602,99	$ 3.639.746.132,22	$ 34.139.708.602,99	7,75%	72,71%	7,75%	72,71%	SIN RETRASO
9	sep-25	$ 2.640.682.076,98	$ 36.780.390.679,97	$ 611.061.714,57	$ 34.750.770.317,55	1,30%	74,01%	5,64%	78,35%	RETRASO
10	oct-25	$ 4.001.000.438,48	$ 40.787.391.118,45	$ 1.231.118.419,00	$ 35.981.888.736,55	2,62%	76,64%	8,52%	86,87%	RETRASO
11	nov-25	$ 5.338.497.100,48	$ 46.125.888.218,93	$ -	$ 35.981.888.736,55	0,00%	76,64%	11,37%	98,24%	RETRASO

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES




Ubicación: Puente tres esquinas, puente 1 Abscisa K2+670 , Fuente interventoría




Ubicación: Puente Morrison-Pitalimon, Abscisa K4+120, Fuente interventoría




Ubicación: Puente Morrison-Pitalimon, Abscisa K3+640, Fuente interventoría




Ubicación: Puente Dios me ve, Abscisa K4+400,Fuente interventoría




Ubicación: Puente Morrison-Pitalimon, Abscisa K9+090, Fuente interventoría

9. RELACIÓN DE AVANCES GENERALES

La ejecución mensual nos relaciona las actividades ejecutadas durante este periodo donde se evidencia la instalación de estructuras metálicas (A-709 GR50WT1) para vigas y riostras, adicional se realiza la zona de unión en asfalto en el puente tres esquinas, Dios me ve y puente Morrison – Pitalimon. También, la instalación de componentes secundarios y de soporte, así como la colocación de apoyos elastoméricos reforzados en almohadillas de 300 mm × 300 mm × 74 mm realizados en el puente Dios me ve.

La interventoría Consorcio Supervisión Enlaces en el informe de interventoría relaciona que los laboratorios realizados fueron resistencia a la compresión de cilindros de concreto en vigas, cabezales, aletas, losas tableros y caracterización en materiales de relleno.

10. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Según a la información suministrada por la interventoría se puede determinar que en el mes de octubre se presentó un porcentaje ejecutado correspondiente al 76.64% respecto al porcentaje programado que fue del 86.87% lo que evidencia que hay atraso durante el mes ejecutado.

- **Se recomienda al contratista y a la interventoría externa tener estricto control en la programación debido a que se evidencian altos porcentajes de atrasos.**
- **Se solicita a la interventoría y al contratista tomar las medidas de plan de contingencia en los puentes de Morrison – Pitalimon por bajos porcentajes de ejecución.**
- **Garantizar el cumplimiento en la entrega de los informes semanales y mensuales por parte de la interventoría externa.**

- **Se solicitará a la interventoría informe sobre el posible incumplimientos parciales o totales sobre el desarrollo de las obras, conforme a las obligaciones de la misma.**

Supervisor

Jorge Mario Pérez Blanco
Profesional Especialista

Elaboró:	Miller González Zuleta - Profesional Universitario, Secretaría de Infraestructura
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	
