OBJETO:MEJORAMIENTOACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACION QUEBRADA LA SUIZA,VEREDA LA TEBAIDA MUNICIPIO DE MOCOA,DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	H	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ÁREA	Ø	VOL	CANTIDAD DE VARILLAS	PESO ACERO	TOTAL
			hpro(m)			M2		(M3)			
1.0	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO										
UND	ML										
Excavaciones linea de conduccion Paso elevado 1		1.00	0.25	15.00	0.20			0.75			0.75
excavaciones para macizos de anclaje Paso elevado 1		2.00	1.10	0.80	0.80			1.41			1.41
excavaciones para macizos de anclaje Paso elevado 2		1.00	0.45	0.60	0.60			0.16			0.16
excavaciones para macizos de anclaje Paso elevado 3		1.00	0.90	0.80	0.80			0.58			0.58
excavaciones para macizos de anclaje Paso elevado 4		2.00	1.10	0.80	0.80			1.41			1.41
excavaciones para macizos de anclaje Paso elevado 5		2.00	1.10	0.80	0.80			1.41			1.41
excavaciones zapatas para columnetas Paso elevado 1		2.00	1.10	0.80	0.80			1.41			1.41
excavaciones zapatas para columnetas Paso elevado 3		1.00	0.90	0.80	0.80			0.58			0.58
excavaciones zapatas para columnetas Paso elevado 4		2.00	1.00	0.80	0.80			1.28			1.28
excavaciones zapatas para columnetas Paso elevado 5		2.00	1.10	0.80	0.80			1.41			1.41
	TOTAL										**10.38**
2.0	DEMOLICION DE CONCRETO										
UND	M3										
Demolicion recubrimiento tubería bocatoma			1.25	0.30	0.30			0.11			0.11
Demolicion muro rejilla bocatoma			0.36	0.30	0.30			0.03			0.03
	TOTAL										**0.14**
3.0	CONCRETO DE 3000 PSI										
UND	M3										
Zapatas		8.00	0.20	1.10	1.00			1.76			1.76
Columnetas		8.00	1.70	0.20	0.20			0.54			0.54
Recubrimiento tuberia		1.00	0.20	55.60	0.20			2.22			2.22
Vigas de protección bastones cable pasos elevados		8.00	0.11	1.00	0.11			0.10			0.10
	TOTAL										**4.62**
4.0	ACERODE REFUERZO PDR-60										
UND	KGS										
Zapatas		8.00		0.90			1/2		6.00	1.00	43.20
		8.00		1.10			1/2		5.00	1.00	44.00
Columnetas		8.00		1.80			1/2		4.00	1.00	57.60
Bastones de anclaje de los cables		8.00		2.00			5/8		1.00	1.56	24.96
Blindaje de tubo de 3" en bocatoma		1.00		5.90			3/8		4.00	0.56	13.22
Flejes en Blindaje de tubo de 3" en bocatoma		1		0.50			1/4		30.00	0.26	3.84
Blindaje tuberia(Malla electrosoldada No 4)							23.80		2.23		53.01
Flejes para columnetas		8		0.70			1/4		10.00	0.26	14.34
acero pontón peatonal para protección de				0.85			3/8		9.00	0.56	4.28
tubería (paso peatonal sobre tubería)				1.75			3/8		4.00	0.56	3.92
tapa en concreto tanque de				0.55			3/8		3.00	0.56	0.92
almacenamiento				0.55			3/8		3.00	0.56	0.92
	TOTAL										**264.22**
5.0	REJILLA EN HIERRO DE 1/2"										
UND	UND										
Rejilla											0.00
	TOTAL										**0.00**
6.0	TUBERIA APRESION DE 2" RDE-21										
UND	MI										
Tuberia de 2"				48.00							48.00
	TOTAL										**48.00**
7.0	TUBERIA APRESION DE 2 1/2" RDE-21										
UND	MI										
Tuberia de 2 y 1/2"				111.00							111.00
	TOTAL										**111.00**
8.0	TUBERIA APRESION DE 3" RDE-21										

UND	Mi										
Tuberia de 3"				30.00							30.00
	TOTAL										30.00
9.0	SUMINISTRO EINSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 4"										
UND	ML										
Llave de paso de 4"		1.00									1.00
GRAN TOTAL											1.00
10.0	SUMINISTRO EINSTALACION DE VALBULA VENTOSA DE 3"										
UND	MI										
llave ventosa de 3"											0.00
	TOTAL										0.00
11.0	SUMINISTRO EINSTALACION DE CABLE DE ACERO PARA PASOS ELEVADOS										
UND	ML										
Cable de 3/8" Paso elevado 1				21.00							21.00
Cable de 3/8" Paso elevado 2				10.00							10.00
Cable de 3/8" Paso elevado 3				29.00							29.00
Cable de 3/8" Paso elevado 4				52.00							52.00
Cable de 3/8" Paso elevado 5				18.00							18.00
Cable de 3/8" Paso elevado 6				20.00							20.00
NOTA: En los pasos elevados No. 1, 2, 3 y 4 se instalaron cables de acero de 1/2" de diámetro, por decisión técnica durante la ejecución de la obra con el fin de mejorar las condiciones de estabilidad. No obstante, para efectos de pago el ítem se reconoce conforme a lo establecido contractualmente para cable de 3/8", dejando constancia que el mayor valor derivado del suministro e instalación del cable de mayor diámetro es asumido por el contratista, sin generar costos adicionales ni modificación del valor del contrato.											
	TOTAL										150.00
12.0	CONCRETO CICLOPEO PARA MACIZOS DE ANCLAJE										
UND	M3										
CCTO Ciclopeo pasos elevados del 1,3,4, 5 y 6		9.00	1.00	1.30	1.00			11.70			11.70
CCTO Ciclopeo paso elevado 2		1.00	0.75	1.30	0.80			0.78			0.78
	TOTAL										12.48
13.0	PINTURA BITUMINOSA PARA PROTECCION DE TUBERIAS										
UND	M2										
Perimetro tubería 2" x 6m		0.05084	3.141516	36.00		5.75					5.75
Perimetro tubería 2 1/2" x 6m		0.06355	3.141516	108.00		21.56					21.56
Perimetro tubería 3" x 6m		0.07625	3.141516	30.00		7.19					7.19
	TOTAL										34.50

Ing.ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Contratista

AYLEEN MILENA JACANAMEJOY JAJOY
Secretaria de Obras e infraestructura Mpal
Supervisora

INFORME TÉCNICO CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA No. 417 DE DICIEMBRE 22 DE 2025

Carrera 2 No. 2A – 50 Barrio Las Acacias. Tel: 4200787 Cel: 322-9480278
Email: tebaida2002@yahoo.com: Mocoa Putumayo – Colombia

INFORME CONTRATISTA

PROYECTO ; MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

PRESENTADO POR:
ING. ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ

PRESENTADO A:
ING. AYLEEN MILENA JACANAMEJOY JAJOY

MOCOA PUTUMAYO
FEBRERO DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Municipio de Mocoa es una entidad pública de nivel territorial cuya misión se desarrolla de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política en la que se manifiesta que "Son fines del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política y cultural de la Nación.

Que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que, el Municipio de Mocoa es un ente territorial con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señala la constitución y la Ley, tiene como finalidad velar por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, esto mediante el correcto y oportuno acceso a los servicios básicos que para el caso concreto corresponde al saneamiento básico de calidad, Por esta razón es necesario realizar los estudios técnicos para determinar el estado actual de la infraestructura y aplicar acciones de ser necesarias que cumplan con la garantía de calidad y su disposición final, asegurando el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios, de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 142 de 1994 en el Art.2

En el municipio de Mocoa según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT-., discrimina las delimitaciones y perímetros como se organizan las zonificaciones de los corregimientos, veredas, centros poblados, barrios e inspecciones las cuales según el área, las empresas de servicios públicos facilitan la cobertura teniendo en cuenta la factibilidad y rentabilidad de cada vivienda que lo solicite, además por la geomorfología del terreno del municipio dificulta en algunas zonas la prestación del servicio de saneamiento básico, por ende algunas veredas y centro poblados alejados del casco urbano cuenta con su propio abastecimiento del servicio de acueducto comunitario.

Para el caso que nos atañe, se tiene que La vereda "la Tebaida", lugar en el que se busca mejorar el servicio el acueducto, se encuentra ubicada a 14,00 kilómetros del casco urbano, por la ruta nacional 10 en la vía que conecta Mocoa con el municipio de San Francisco, la cual tiene un total de 250 personas según el SISBEN

Actualmente el sistema de acueducto de la vereda La Tebaida presenta problemas de insuficiencia hidráulica, no posee suministro de agua permanente en sus hogares, dado lo anterior la solución definitiva es el suministro de tubería de presión, accesorios, adecuación de la bocatoma y materiales como Cable de acero de 3/8"para paso elevado de longitud 150 ml,dadas las condiciones topográficas del terreno de hondonada y Concreto ciclópeo macizos de anclaje pasos elevados para optimizar la red de distribución de acueducto, como también la aplicación de pintura bituminosa para protección de tuberías expuestas a la intemperie y así brindar un servicio acorde a las necesidades de la población.

Teniendo en cuenta la situación expuesta anteriormente se presenta como alternativa el mejoramiento de acueducto para la vereda la Tebaida, mejorando algunas estructuras de sus sistemas de acueducto existente.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Ilustración 4Ubicación Proyecto

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el **MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO**

3.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOCOA
NÚMERO DE CONTRATO:	417 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO**
CONTRATISTA:	ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$45.232.392,00
VALOR TOTAL	$45.232.392,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES y DOS DIAS CALENDARIO
FECHA DE ACTA DE INICIO:	24 DE DICIEMBBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN :	28 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR	ING. AYLEEN MILENA JACANAMEJOY JAJOY
LOCALIZACIÓN	VEREDA LA TEBAIDA,MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Tabla 1 Información contrato de Obra

3.2 TIEMPO TRANSCURRIDO

EL tiempo transcurrido desde el acta de inicio de obras hasta el corte de actividades para la cuantificación son Cuarenta y Cinco (45) días calendario

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.3.1.ACTA DE INICIO

El día 24 de Diciembre de 2025, se firmó el acta de inicio del contrato de obra , siendo el plazo inicial de ejecución de obra de DOS (02) mes calendario, más DOS días

3.3.2. MANEJO DE ANTICIPO

No Aplica

3.3.3. COMITÉS DE OBRA Y REUNIONES

Se realiza la socialización del contrato con la comunidad beneficiada del proyecto, con participación de la comunidad beneficiaria de la vereda La Tebaida;ing.ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ, contratista de obra ing. GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIRES ,por parte de la supervisión de la Secretaria Obras e infraestructura del Municipio de Mocoa

4 INFORMACIÓN CONTRATISTA

4.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA	
Nombre	ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Tipo de identificación del contratista. (Nit o cc)	NIT

Número de identificación del contratista.	18.123.992-5
Naturaleza del contratista	Persona Natural
Dirección de oficina	CL 2 No. 2a -50 Barrio Las Acacias
Departamento	Putumayo
Municipio	Mocoa

Tabla 2 Contratista del proyecto

5 RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

7.1. GENERALIDADES.

En el municipio de Mocoa, a los 24 días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron: La Ingeniera GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ, Secretaria de Obras € Municipal y el Ing. ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ, Contratista de obra, con el fin de dar inicio a las obligaciones contempladas en el Contrato No. 417 del 22 de diciembre de 2025.
La población beneficiada en el desarrollo del proyecto cuyo objeto **MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO** es la comunidad de la vereda La Tebaida del municipio de Mocoa

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el Periodo del 24 de diciembre de 2025 al 13 de Febrero de 2026,fecha en la cual se realiza un corte de Obra; las actividades correspondientes al objeto contractual presentan el siguiente porcentaje de Avance asi:

1,0 PREELIMINARES

1,01EXCAVACIONES EN MATERIAL COMUN

Previo en los sitios de construcción de, los macizos de anclaje para los pasos elevados, así como en el sito donde se blindo la tubería pvc de 3"



2.0 DEMOLICION DE CONCRETO



3.0 CONCRETO DE 3.000 PSI

Se realiza construcción de columnetas parea soportes del cable en los pasos elevados, así como el blindaje de un tramo de tubería pvc de 3"



4,0 ACERO DE REFUERZO PDR-60

Se realiza el suministro y figuración de acero de refuerzo PDR-60,para columnas, en blindaje de tubos





6.0 SUMINSITRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" rde-21





7.0 SUMINSITRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2x1/2" RDE-21

Carrera 2 No. 2A – 50 Barrio Las Acacias. Tel: 4200787 Cel: 322-9480278
Email: tebaida2002@yahoo.com: Mocoa Putumayo – Colombia





8.0 SUMINSITRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3" RDE-21





9.0 SUMINSITRO DE LLAVE DE PASO DE 4"

Carrera 2 No. 2A – 50 Barrio Las Acacias. Tel: 4200787 Cel: 322-9480278
Email: tebaida2002@yahoo.com: Mocoa Putumayo – Colombia



11.0 SUMINSTRO EINSTALACION DE CABLE DE ACERO DE 3/8"

En los sitios de hondonadas donde la tubería estaba soportada en horquetas de madera, o soportada con alambres en mal estado donde se presentaban desconexiones de tubos frecuentemente, interrumpiendo la normal prestación del servicio de agua.



12.0 CONCRETO CICLOPEO MACIZOS DE ANCLAJE





13.0 PINTURA BITUMINOSA PARA PROTECCION DE TUBERIAS

Se procede al enchape color blanco de los mesones de la cocina tanto el existente con la nueva repisa que se construyó como el mesón nuevo de L=2,50 m;la cantidad ejecutada es de 11,30 m2





PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

		% Acumulado
AVANCE FÍSICO EJECUTADO	88,86%	88,86%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO	88,86%	

Tabla 3 Avance físico de forma periódica

AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES mas 2 DIAS
TIEMPO CONTRACTUAL TRANSCURRIDO	49 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2026

Tabla 4 Avance en Tiempo

CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS HASTA LA FECHA

1,10	Excavaciones en material común	M3	10,38
1,2	Demolición de concreto	M3	0,14
1,3	Concreto de 3000 psi	M3	4,62
2,0	Acero de refuerzo PDR-60	KG	264,22
2,1	Suministro e instalación de rejilla en hierro de 1/"2	GLB	1,00
2,2	Suministro de tubería a presión de 2" RDE-21	MI	48,00
2,3	Suministro de tubería a presión de 2x1/2" RDE-21	MI	111,00
2,4	Suministro de tubería a presión de 3" RDE-21	MI	30,00
3,0	Suministro de llave de paso de 4"	UND	1,00
3,1	Suministro de válvula ventosa de 3"	UND	2,00
4,0	Suministro e instalación de cable de acero de 3/8"para viaducto	M	150,00
3,0	Concreto ciclópeo macizos de anclaje	M3	12,48
3,1	Pintura bituminosa para protección de tubería	M2	34,50

AVANCE FINANCIERO

El avance financiero del proyecto se ve reflejado directamente en el avance de la obra, para el mes de mayo el valor de este se presenta en la siguiente tabla:

		Acumulado
INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA	$ 45.232.392,00	88,86%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA INFORME PARCIAL	$ 40.195.206,06	
PORCENTAJE	88,86%	

Tabla 5 Inversión Periódica

AVANCE EN PROGRAMACIÓN DE OBRA

A fecha 13 de febrero de 2026 del presente informe, la obra se encuentra en un 88,86% de ejecución correspondiente al informe mensual No.001 ;las actividades se desarrollaron de acuerdo a las especificaciones técnicas.

CONTROL PRESUPUESTAL

El control presupuestario se realizó a corte del mes de febrero 13 de 2026, enfocado a proporcionar información detallada para el control de ingresos, costos y resultados de los diferentes ítems presentes en el proyecto, con el objetivo de obtener las necesidades financieras en corto y largo plazo

Fue indispensable afinar la proyección de las necesidades, con el fin de priorizar los gastos y los recursos tengan la mejor inversión en el desarrollo de las metas propuestas.

Los objetivos principales son los siguientes:

1. Comparar el gasto teórico programado para el mes con el real, en la totalidad de los ítems de Control Presupuestario, obteniendo las diferencias desglosadas.
   Al realizar la comparación del gasto teórico programado por la entidad, se encuentra al día y no se han presentado inconvenientes en el desarrollo de las obras.

2. Analizar las diferencias mencionadas en el punto 1 para determinar las causas

- Atrasos o adelantos en cumplimiento de programa de trabajo;

Las actividades ejecutadas se realizaron teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de diseño previstas, cumpliendo los estándares de calidad requeridos según la normatividad vigente.

- **Suministro de materiales**

El suministro de materiales, está acorde a los requerimientos del proyecto.
Utilizando el tipo de materiales de acuerdo a las especificaciones requeridas

- **Equipos**

En la obra se encuentra con la disposición de equipos necesarios para realizar las actividades programadas de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y el proceso constructivo, con el fin de ejecutar la obra de acuerdo a lo proyectado

3. Obtener una mejor aproximación de los gastos mensuales por ítem, lo que nos permite ir mejorando a medida que se desarrolla el proyecto, la precisión en nuestro pedido de fondo a través del control presupuestario.

6 INFORME CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

- **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El Proyecto consiste en el **MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras se ejecutan en el sector rural del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

- **DESARROLLO DEL PROYECTO**

ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO

El impacto ambiental es bajo, ya que la envergadura del proyecto, no es muy grande la demanda de recursos y afectación de los recursos naturales, además el Contratista de Obra, obtiene los recursos de empresas certificadas y que cumplen con los requerimientos de la ley en cuanto a la explotación de los mismos.

En cuanto al impacto social, se pretende generar un impacto social positivo, ligado al mejoramiento de La calidad de vida de los habitantes del municipio de Puerto Caicedo.

i. MITIGACIÓN IMPACTO URBANO

Para la ejecución del proyecto, el contratista hizo la socialización con la comunidad y de igual manera desarrollo el acta de socialización, con el fin de no afectar la calidad de vida de las personas que habitan cerca al proyecto.

Las actividades realizadas al respecto se pueden resumir en lo siguiente:

- ✓ Orden y aseo al inicio, durante y al finalizar la jornada laboral
- ✓ Mantenimiento y conservación de los cerramientos de obra
- ✓ Los vehículos que cargan y descargan material utilizan carpa para tapar el material
- ✓ Los trabajadores usan tapa oídos cuando se encuentran expuestos a ruidos fuertes
- ✓ Se evita cualquier ruido que afecte la comunidad según lo estipulado por la ley, no sobrepasando los decibeles permitidos en horas de trabajos diurnos y nocturnos

ii. USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El contratista adecuó un sitio para el almacenamiento de materiales y herramienta menor.

El material de trabajo se mantiene cubierto en el sito de obra para facilitar su acarreo y uso inmediato, con lo se puede llevar un control y agilidad en el desarrollo de los trabajos cotidianos, además se evita el deterioro y desperdicio de los mismos. Se lleva un control del material que se encuentra en obra, el que llega, el que sale y el que se utiliza.

iii. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

El contratista cuenta con todos los soportes sobre el pago de la Seguridad Social y Parafiscales de los trabajadores que hacen parte del proyecto, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes (requisitos de la ley 100). En referente a la Afiliación a EPS, ARP y PENSIONES de personal de obra

.

iv. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


A todo personal que se ingresa a la obra se le suministran los elementos de protección personal, requeridos con la labor que estén desempeñando, haciendo entrega de cascos, guantes mono gafas ,tapabocas alcohol disponible en punto de desinfección.

ASPECTOS LOGÍSTICOS

El contratista cuenta con todos los equipos, maquinaria y recursos humanos necesarios para la ejecución de proyecto sin ningún tipo de incidente, En obra se evidencia la buena organización y preparación de todo el equipo profesional.

v. ORGANIGRAMA DE LA RAZÓN SOCIAL (CONTRATISTA)

Los aspectos administrativos se encuentran a cargo del contratista. En la parte de logística y coordinación de las diferentes actividades, están a cargo del residente y contratista de la obra;La participación directa en la ejecución de actividades no administrativas, se realizan mediante mano de obra no calificada, bajo la supervisión directa del maestro de obra, el ingeniero residente y el contratista

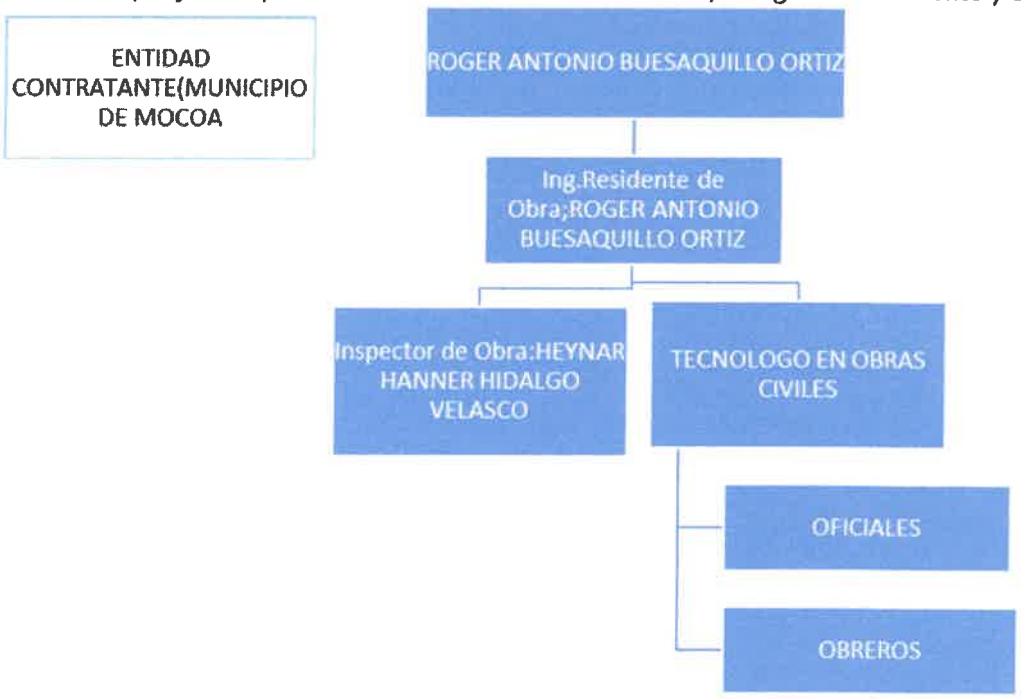

vi. EQUIPO DEL CONTRATISTA

El equipo que el Contratista empleo en la ejecución de las actividades, consistió en herramienta menor, por la naturaleza de las actividades a realizar.

vii. CONTROL DE TIEMPO

El contratista mantiene un registro preciso del tiempo en obra, la cual contiene el registro de cada uno de los días de actividad del proyecto y en la cual se registra cualquier novedad de acuerdo con el avance del proyecto

viii. CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad es ejecutado por el Contratista, de acuerdo a los diseños presentados, las especificaciones y normas vigentes, y es a su vez inspeccionado y verificado por el equipo de profesionales.

ix. ASPECTOS SOCIALES

Se realizó una socialización y se hizo la presentación de las obras a realizar, por parte del contratista, con acompañamiento de la supervisión de la Secretaria de Planeación . La mano de obra no calificada es contratada con personas del sector de influencia del proyecto.

7.0 CONCLUSIONES

- ✓ En el informe técnico del contratista, se registran las actividades ejecutadas correspondientes al periodo de de tiempo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026; fecha en la cual se hace un corte para el tramite de cobro de una acta parcial de Obra
- ✓ El análisis del balance de ejecución del proyecto, permite concluir que el avance físico y financiero de obra es del 88,86%, que representa una inversión ejecutada acumulada de $40.195.206,06 frente al programado de $ 40.166.364,10 acumulado de 88,80%.

- ✓ Las actividades se desarrollan de acuerdo a lo programado y cumpliendo con las especificaciones técnicas normatividad vigente.

- ✓ A pesar de fiestas de fin de año y carnales de enero de 2026,se dificulto en un inicio la consecución d emano de obra. Pero se optimizo al máximo los ratos buenos para no interrumpir las de actividades y poder así de esta forma entregar en el plazo previsto

- ✓ Cabe mencionar que por fin de año, inventarios y cierres de ferreterías se ha dificultado la consecución de algunos materiales sobre todo la tubería PVC de 2x1/2" que definitivamente parece que sale del mercado.

Ing. ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Contratista

ANEXOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No. 417 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025			
Objeto del Contrato	**MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO**		
Contratista	Ing. ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ	NIT C.C.	18.123.992-5 18.123.992 de Mocoa (P)
Supervisor del Contrato:	GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ		
Valor total del contrato :	CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MDA CTE ($45.232.392,00) MDA CTE		
Plazo Inicial del Contrato:	DOS (02) MESES		
Fecha Inicio del Contrato:	26	DICIEMBRE	2025
Fecha Terminación del Contrato:	28	FEBRERO	2026
Fecha de la presente Acta :	18	ENERO	2026

En las Instalaciones del salón múltiple comunal de la vereda la Tebaida del municipio de Mocoa (P), a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2026, se reunieron el señor ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 18.123.992 de Mocoa(P),, en calidad de contratista de obra ,ingeniera GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ, en calidad de supervisora del contrato con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SOCIALIACION DE OBRA CON LA COMUNIDAD**, del contrato de obra No. 417 del 22 de diciembre de 2025 cuyo objeto es **MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO**
Inicialmente se da ha conocer los alcances del proyecto por parte del contratista así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Excavaciones en material común	M3	10,38
2	Demolición de concreto	M3	0,14
3	Concreto de 3000 psi	M3	4,62
4	Acero de refuerzo PDR-60	KGS	264,22
5	Suministro e instalación de rejilla en hierro de 1/"2	UND	1,00
6	Sumin.einstalacion de tubería a presión de 2" RDE-21	ML	48,00
	Sumin.einstalacion de tubería a presión de 2x1/2" RDE-21	ML	111,00
7	Sumin.einstalacion de tubería a presión de 3" RDE-21	ML	30,00
9	Suministro e instalación de llave de paso de 4"	UND	1,00
10	Suministro e instalación de válvula ventosa de 3"	UND	2,00
11	Suministro e instalación de cable de acero de 1/2"para viaducto	MI	150,00
12	Concreto ciclópeo macizos de anclaje	M3	12,48
13	Pintura bituminosa para protección de tubería	M2	34,50

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

Para constancia de la presente **ACTA DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD,** se firma por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2026

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Wilson Gelpud	18192102	Usuario	
Rosalbina Garzón	39825090	Usuario	Rosalbina Garzón
Isabel Villareal	80740828	Usuario	
Liz Dorado	1130144598	Usuario	Liz Dorado
Yasmira Perez	234	Usuario	
Richar Bastidas	97420729	Fiscal JA	
Luis Bayardo Erazo	18124300	Usuario	
Roberto Burbano	18123916	Usuario	
Flor Benavides	27356258	Usuario	
Oscar Escobar	5.349.498	Usuario	
Carmen Gomez	27362126	Usuario	Carmen Gomez
Luz mary torres lopez	1125179079	Amadecasa	Luz mary
Yoo. gracia Yepez	18192356	Usuario	
Melba Betancur	69015118	Usuario	Melba Betancur
Alina Buesaquillo	27355308	Usuario	Alina
Edi Mabil Beto	69005173	Usuario	Edi Mabil
Yanira Andrea Muñoz	69.009570	Ama de casa	Yanira Muñoz
Fenner Muñoz	16191274	Usuario	
Tranquilo Erazo	27353409	Usuario	
Martha L. Acosta P.	27356127	Usuario	Martha Acosta P.
Brenda Yagueno Narvaez	1.085307043	Usuario	Brenda Yagueno N.
Elizabeth Diaz	27361694	Usuario	
Carlos Enrico P.	18123639	Usuario	

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

Monica Yasmin Cusi	1124852718	Tesorera J.A.C	
Stephanny Fajardo B	1124864025	Comite Vereda.	
Yeraldin Erazo	1006548811	Usuario	Yeraldin E.
Rosalba Narváez	69006937	usuario	Rosalba Narváez
Lucy Erazo	97420111	Usuario	
Luis Carlos Diaz	97420128	Usuario	
Ruben Dario Diaz	18.181.580	Usuario	
Miriam Gelpud Narvaez	69.015.109	Usuario	Miriam Gelpud
Robert Bucheli	18.123.552	Contratista	

infraestructura@mocoa-putumayo.gov.co
Código Postal: 860001

Calle 7 No. 6 - 42 - Barrio Centro
Edificio Palacio Municipal - Mocoa Putumayo

AlcaldiaDeMocoaCiudadCapital
www.mocoa-putumayo.gov.co

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$600	$0	$122,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900	$600	$0	$122,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$400	$0	$70,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$70,100	$400	$0	$70,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				**1**	**$542,300**	**$2,700**	**$0**	**$545,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	172368954	9502249305	E	2026/03/20	2026/03/27	BANCOLOMBIA	7	$545,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL2 (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	**$70,100**			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: PUERTO GUZMAN Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	18124967	HIDALGO VELASCO HEYNAR HANNER					X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300

en línea

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
TOTAL				1	$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	93027230	9500518457	E	2026/02/20	2026/02/26	BANCOLOMBIA		$5,422,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL2 (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: PUERTO GUZMAN Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	18124963	HIDALGO VELASCO HEYNAR HANNER		X															25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300

P - 01
S - 02

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$121,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$30,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$30,400
TOTAL				1	$235,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	93028499	9500518257	E	2026/01/23	2026/02/26	BANCOLOMBIA		$2,559,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL2 (1 Afiliados)																						$758,726	$121,400			$758,726	$30,400			$758,726	$30,400			$758,726		$52,900		$0	$0		$235,100
Centro de Trabajo: OBRERO (1 Afiliados)																						$758,726	$121,400			$758,726	$30,400			$758,726	$30,400			$758,726		$52,900		$0	$0		$235,100
Ciudad: PUERTO GUZMAN Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																						$758,726	$121,400			$758,726	$30,400			$758,726	$30,400			$758,726		$52,900		$0	$0		$235,100
1	CC	18124963	HIDALGO VELASCO HEYNAR HANNER	X																25-14	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF63	13	$758,726	$30,400	14-23	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	SI	$235,100
Total Afiliados(1)																						$758,726	$121,400			$758,726	$30,400			$758,726	$30,400			$758,726		$52,900		$0	$0		$235,100

P - 12
S - 01

8 días Salud. (12).
Falta.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	150744186	9501566526	I	2026/03/20	2026/03/18	BANCOLOMBIA	0	$1,016,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,300	$0	$0	$560,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,300	$0	$0	$560,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,800	$0	$0	$437,800
TOTAL				1	$1,016,400	$0	$0	$1,016,400

2026/03/18 09:51 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		**BUESAQUILLO ORTIZ** ROGER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	150744186	9501566526	1	2026/03/20	2026/03/18	BANCOLOMBIA	0	$1,016,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO									X									25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS037	30	$3,501,810	$437,800		0	$0	$0	14-23	30	$3,501,810	$18,300	0	$0	$0	No	$1,016,400
Total	**Afiliados(1)**																						$3,501,810	$560,300			$3,501,810	$437,800			$0	$0			$3,501,810	$18,300		$0	$0		$1,016,400

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	49644430	9499035117	I	2026/02/20	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

P-01
S-01

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18123992		BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LAS ACACIAS	MOCOA-PUTUMAYO	4200787	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	489709	9497447947	I	2026/01/23	2026/01/22	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	15-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

S- 12
P- 12

EDGAR IVÁN
CELIS IMBAJOA
Ingeniero Civil, Especialista y
Magister en Ingeniería Estructural

DISEÑO CONTRAPESO PARA PASO ESPECIAL DE TUBERÍA

Diseño de Contrapeso



Tracción en los cables	
Capacidad Cable, kN	
$T_{vertical}$ (kN)	6.1
$T_{horizontal}$ (kN)	20.5

Facto de Seguridad al levantamiento	Ok
Peso concreto ciclopeo (kN):	21.6
Factor de seguridad al levantamiento:	**3.54**

Facto de Seguridad al deslizamiento	Ok
Coeficiente Kp:	2.6
Coeficiente de fricción suelo-estructura:	0.55
Altura (m):	1.00
Longitud (m):	1.20
Densidad del suelo (kN/m^3):	17.0
Empueje pasivo en el dentellon, Ep (kN):	34.31
Factor de seguridad al deslizamiento:	**1.67**

El diseño del contrapeso se realiza con las cargas indicadas por el constructor. El diseño no compromete la estructura principal del paso especial, solo lo que se presenta en este documento.

Se firma a los doce (12) días del mes de enero de 2026,

EDGAR IVÁN CELIS IMBAJOA, MSc.
Ing. Civil. Especialista y Magister en Ingeniería - Estructuras.
M.P. 19202-286274 CAU

Calle 11 No. 17 – 323 Barrio La Esmeralda
Número de contacto (Cel): 3118200283
E-mail: ecelisimbajoa@gmail.com
Mocoa – Putumayo

MEJORMIENTO DEL ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACION QUEBRADDA LA SUIZA,VEREDA LA TEBAIDA,MUNICIPIO DE MOCOA,DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Item	Descripción	Unidad	Cantida	Valor unitario	Valor total	Peso actividad	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	V/TOTAL
1	Excavaciones en material común	M3	10,38	79.016,95	820.195,93	2,45%	205.048,98	205.048,98	205.048,98	205.048,98					820.195,93
2	Demolicion de concreto	M3	0,14	152.085,66	21.900,33	0,07%								21.900,33	
3	Concreto de 3000 psi	M3	4,62	1.048.068,41	4.839.036,84	14,44%	1.209.759,16	1.209.759,16	1.209.759,16	1.209.759,16					
4	Acero de refuerzo PDR-60	KG	264,22	7.808,81	2.063.221,79	6,16%	515.805,45	515.805,45	515.805,45	515.805,45					2.063.221,79
5	Suministro e instalacion de rejilla en hierro de 1/"2	GLB	1,00	739.177,87	739.177,87	7,88%								739.177,87	
6	Suministro de tuberia a presion de 2" RDE-21	MI	48,00	35.697,97	1.713.502,34	5,11%					856.751,17	856.751,17			1.713.502,34
7	Sumininistro de tuberia a presion de 2x1/2" RDE-21	MI	111,00	45.930,69	5.098.306,10	15,22%					2.549.153,05	2.549.153,05			
8	Sumininstro de tuberia a presion de 3" RDE-21	MI	30,00	52.520,30	1.575.608,94	4,70%					787.804,47	787.804,47			1.575.608,94
9	Suministro de llave de paso de 4"	UND	1,00	962.031,87	962.031,87	2,87%						962.031,87			962.031,87
10	Suministro de valbula ventosa de 3"	UND	2,00	1.495.163,17	2.990.326,35	8,93%							1.495.163,18	1.495.163,18	2.990.326,35
11	Suministro einstalacion de cable de acero de 3/8"para viaducto	M	150,00	34.573,07	5.185.960,19	15,48%	1.296.490,05	1.296.490,05	1.296.490,05	1.296.490,05					
12	Concreto ciclopeo macizos de anclaje	M3	12,48	569.723,01	7.110.143,17	21,22%	1.777.535,79	1.777.535,79	1.777.535,79	1.777.535,79					7.110.143,17
13	Pintura bituminosa para proteccion de tuberia	M2	34,50	$ 11.070,09	$ 381.917,97	1,14%					190.958,99	190.958,99			
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO (A)				33.601.329,50	100,00%	5.004.639,43	5.004.639,43	5.004.639,43	5.004.639,43	4.384.667,68	5.348.699,55	1.495.163,18	2.256.241,38	33.501.329,50
	ADMINISTRACION			28%	$ 9.385.969,03		1.401.299,04	1.401.299,04	1.401.299,04	1.401.299,04	1.227.706,95	1.497.075,87	418.645,69	631.747,59	
	IMPREVISTOS			2%	$ 670.026,59		100.092,79	100.092,79	100.092,79	100.092,79	87.693,35	106.933,99	29.903,26	45.124,83	
	UTILIDAD			5%	$ 1.675.066,47		250.231,97	250.231,97	250.231,97	250.231,97	219.233,38	267.334,98	74.758,16	112.812,07	
	SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (B)				$ 45.232.392,00		1.751.623,80	1.751.623,80	1.751.623,80	1.751.623,80	8.769.335,35	1.871.344,84	523.307,11	789.684,48	
	COSTO TOTAL INCLUIDO AIU (A) + (B)				$ 45.232.392,00		6.756.263,23	6.756.263,23	6.756.263,23	6.756.263,23	13.154.003,03	7.218.044,39	2.018.470,29	3.045.925,86	
	PORCENTAJE SEMANAL EJECUTADO						14,94	14,94	14,94	14,94	13,09	15,96	4,46	6,73	
	PORCENTAJE SEMANAL ACUMULADO EJECUTADO						14,94	29,88	44,82	59,75	72,84	88,80	93,27	100,00	

Ing.ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Contratista

WALTER H CORTES
TEL:3118060140
wahcor1@gmail.com

CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

CLIENTE ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ — FECHA ENERO---2026 — **HOJA** 1

PROYECTO MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPATACIÓN QUEBARDA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO — RESISTENCIA f'c=3000 PSI ó 21,0 Mpa — **ENTIDA** ALCALDIA DE MOCOA

FECHA DE FUNDICIÓN	CILINDRO No	DIAS DE CURADO	FECHA ROTURA	CARGA KN	RESISTENCIA CILINDRO PSI	RESISTENCIA CILINDRO Mpa	RESISTENCIA fi Mpa	a (Mpa) fi ≥ (f'c – k1) fi ≥18,4 Mpa	b (Mpa) fm ≥ f'c fm ≥ 21,0 Mpa	% RESISTENCIA	OBRA	ESTRUCTURA	DOSIFI	MATERIALES	OBSERVACIÓN
20 de enero de 2026	1	28	17 de febrero de 2026	399,6	3220	22,1	22,1	CUMPLE	22,5	107	PASO ELEVADO	MACIZO ANCLAJE			
31 de enero de 2026	2	28	28 de febrero de 2026	414,1	3337	22,9	22,9	CUMPLE		111	PASO ELEVADO	COLUMNETA			

Artículo 630-22

a) fi ≥ (f'c – k1)
b) fm ≥ f'c
fm : Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de tres (3) ensayos
fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa.
f'c : Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días

k1 : Constante de evaluación.
para concretos con f'c menor o igual a 20,6 Mpa= 2,6 Mpa
Para concretos f'c≥ 20,6 Mpa= 3,5 Mpa

NOTA: LOS CILINDROS SON TOMADOS Y TRANSPORTADOS POR EL CLIENTE

GEOTEC.
WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
C.P No 19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

REVISO

NIT. 800.102.891-6	ALCALDIA DE MOCOA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	
		FECHA	13	2	26

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR: Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: dic-25 CONTRATO No.: 417 DE 2025 MUNICIPIO: MOCOA

CONTRATISTA: ROGER BUESAQUILLO ORTIZ

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ing.Residente																										X	X		X	X	X
Inspector de Obra																										X	X		X	X	X

Firma

Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ

Residente de Obra

Matricula No.:19202-62717 CPC

NIT. 800.102.891-6

ALCALDIA DE MOCOA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL

ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PAGINA		DE	
FECHA			

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR: Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: ene-26 CONTRATO No.: 417 DE 2025 MUNICIPIO: MOCOA

CONTRATISTA: ROGER BUESAQUILLO ORTIZ

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ing.Residente		X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Inspector de Obra		X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

Firma

Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ

Residente de Obra

Matricula No.:19202-62717 CPC

NIT. 800.102.891-6	ALCALDIA DE MOCOA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE
		FECHA	28	2	26

OBJETO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: feb-26 CONTRATO No. 417 DE 2025 MUNICIPIO MOCOA

CONTRATISTA: ROGER BUESAQUILLO ORTIZ

DIA / PROFESIONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ing.Residente		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			
Inspector de Obra		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			

Firma

Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ

Residente de Obra

Matricula No.:19202-62717 CPC

NIT. 800.102.891-6

ALCALDÍA DE MOCOA 2024 - 2027

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

Alcaldía De Mocoa
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
FECHA		DE	
FECHA	13	2	26

OBJETO

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal MES dic-25

CONTRATO No:417 DE 2025 CONTRATISTA ROGER ANTONIO BUESSAQUILLO ORTIZ MUNICIPIO MOCOA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco																										X	X	X	X	X	X
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															

Firma
Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Residente de Obra
Matricula No.:19202-62717 CPC

NIT. 800.102.891-6

ALCALDÍA DE MOCOA 2024 - 2027

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

Alcaldía De Mocoa SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
FECHA		DE	
FECHA	13	2	26

OBJETO

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal MES ene-26

CONTRATO No:417 DE 2025 CONTRATISTA ROGER ANTONIO BUESSAQUILLO ORTIZ MUNICIPIO MOCOA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco		X			X	X	X	X	X				X	X	X	X				X	X		X							X
Lluvias moderadas																	X					X					X		X	
Lluvias intensas																			X					X		X		X			

Firma

Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Residente de Obra
Matricula No.:19202-62717 CPC

NIT. 800.102.891-6

ALCALDÍA DE MOCOA 2024 - 2027

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

Alcaldía De Mocoa
SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
FECHA		DE	

FECHA 28 2 26

OBJETO

MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

SUPERVISOR Secretaria de Obras e Infraestructura Municipal MES feb-26

CONTRATO No:417 DE 2025 CONTRATISTA ROGER ANTONIO BUESSAQUILLO ORTIZ MUNICIPIO MOCOA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco		X									X	X	X																		
Lluvias moderadas			X		X		X	X							X																
Lluvias intensas				X		X								X																	

Firma
Nombre: ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ
Residente de Obra
Matricula No.:19202-62717 CPC

Bitacora de Obra

Contrato N° 417 del 2025

"Mejoramiento del acueducto de fuente de captación Quebrada la Suiza, vereda la Tebaida, municipio de Macaa, Departamento del Putumayo"

MOCOA FEBRERO DE 2026

Ing Roger Buesaquillo Ortiz
Contratista

Jueves 26/12/2025

Estado del tiempo: Seco

Personal: - Residente de obra
- Inspector de obra
- Maestro

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza la visita técnica de reconocimiento al sitio de la obra que se llevará a cabo ubicado en la localidad de Suba en la vereda La Tabaida

- Se realiza una localización y replanteo previo a la obra

Residente de obra

Residente de Interventoría

Viernes 27/12/2025

Estado del tiempo. Seco

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- Maestro
- 2 obreros

Equipo: Herramienta menor

Equipo Herramienta menor

Actividades - Se llevó a cabo excavación en material común para cimientos de pozo elevado

- Se realizó el colado concreto de 3000 psi para cimentación de pozo elevado

- Instalación de acero de refuerzo
- Junto con ello se realizó instalación de concreto ciclopeo para cimientos.

Residente de Obra

Revisó: Ing. [illegible]
Jefe de Obra

Lunes 29/12/2025

Estado del tiempo: Nubes sueltas - mañana
Seco - Tarde

Personal: - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: - Se continuan con las excavaciones para cimientos de pozos elevados

- Se continua con la instalacion de acero de refuerzo

- Se realiza fundicion de cimientos para pozos elevados en concreto de 3000psi

- Se lleva a cabo instalacion de cable de acero para pozos elevados de igual manera se instalan.

- Se continua con la instalacion de concreto ciclopeo en cimientos para pozos elevados

Residente de Obra

Martes 30/12/2025

Estado del tiempo: Nublado Soleado - mañana

Personal: - Residente de Obra
- Residente - Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: - Se realizó excavación para zapatas
- fundición de zapata en concreto de 3000psi para
instalación de acero de refuerzo para
zapatas confinadas de castillos para
columnetas.

- Se continua con la instalación de cable de
acero para pozos elevados
- Se continua con la instalación de
ciclopeo para muertos de anclaje.

Residente de Obra

Residente de Inspección

Miercoles 31/12/2025

Estado del tiempo: seco

Personal: Residente de obra
- Inspector de obra
- Maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua con la instalacion de ciclopeo para muros de anclaje, excavacion en material comun.
- Se continua con concreto para zapatas e instalacion de acero de refuerzo, de igual forma se continua de cable para postes electricos.

Residente de Obra

Viernes 2/01/2026

Estado del tiempo Seco

Personal: - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua con la inspección de concreto ciclopeo para muertos de anclaje.
- Se realiza instalación de cable de acero en pozos elevados, continuando con excavaciones en material común fundación de columnetas.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para columnetas
- Se continua con fundación de zapatas.

Residente de Obra

09

Sábado 3/01/2026

Estado del tiempo: seco

Personal: - Residente de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continúan excavaciones en material común, de igual forma se continúan instalación de concreto ciclopeo para muertos de anclaje

- Se continúa con fundición de zapatas y se tiene: zapata 1
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para zapatas columnetas tapas y muertos de anclaje
- Se continúa con instalación del cable de acero para postes elevados.

Residente de obra

Inspector de obra

Lunes 5/01/2026


Estado del tiempo: lluvias moderadas. + nublado

Personal: - Residente de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continuan con excavaciones en material común

- Se continua instalación de cable para pozos elevados
- Se realiza fundición de zapata en concreto de 3000 psi



Residente de obra

Capataz

Martes 6/01/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal
- Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Herramienta menor: Varios

Actividades: Se realizo fundicion de columnas y con ello instalacion de acero de refuerzo

- Se realizo instalacion de concreto ciclopeo para muertos de anclaje

Residente de Obra

Revisado de forma digital

Miercoles 7/01/2026

Estado del tiempo. Nublado.

Personal - Residente de Obra
- Inspector de obra
- 1 maestro de obra
- 2 Ayudantes.

Equipo. Herramienta menor.

Actividades: Se realiza excavaciones para columnetas correspondientes a estructura.

-Se continua con fundiendo de zapatas y se funde tapa 2

Residente de Obra

Residente de Obra

Jueves 8/01/2026

Estado del tiempo: Lluvia moderada + frío

Personal: - Residente de Obra
- 1 Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo:
Herramienta menor.

Actividades: Se realizo excavaciones para tuberia. Se continua con fundición de zapata y columnas

- Se realizo instalación de cable de acero para pasos elevados.

Residente de Obra

Residente de Fiscalización

Viernes 9/01/2026

Estado del tiempo: Nublado - Seco

Personal - Residente de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramientas menor

Persisten las actividades correspondientes a excavaciones, concreto para zapatas y columnetas.

- Se realiza instalación de acero para elementos estructurales



Residente de obra

Residente de [illegible]

Sabado 10/01/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal: - Residente de Obra
- 1 Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: - Se realiza conformación de castillos para columnetas con acero estructural

- Se continua con instalación de caudal para pozos elevados.

Residente de Obra

Residente de Obra

Martes 13/01/2026


Estado del tiempo: Seco

Personal: - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continuo con excavación en material común, de columna tendida de zapatas y concreto ciclopeo.

- Se realizo fundación de columnetas.
- Se inicio excavación manual para instalación de tuberías.



Residente de Obra

Miercoles 14/01/2026.

Estado del tiempo: Seco

Personal: - Residente de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: - Se continua con fundición de columnetas e instalación de acero de refuerzo
- Se realizo fundición de concreto ciclopeo para muertos de anclajes.

Residente de obra

Practicante de Residencia

Jueves 15/01/2026

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Estado del tiempo: Seco

Herramienta menor: Equipo

Actividades:
- Se termino fundicion de concreto Cabezas en muertos.
- Se continua instalacion de acero de refuerzo y se continua fundicion columnetas.
- Se realizo excavacion para linea de conduccion en material comun

Residente de Obra

Inspector de Obra

Viernes 16/01/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramientas menor

Actividades: - Se culmina fundación de columnetas y se realiza fundación para piso de bocatoma

- Se culmina instalación de acero de refuerzo

- Se realiza excavación para líneas de conducción

- Se realiza culminación de acero instalado para pilas elevadas

Residente de Obra

Revisado en 1.0 de 1

Sabado 17/01/2026

Estado del tiempo: lluvias moderadas - mañana

Personal: - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipos: Herramientas menor.

Actividades - Se realiza blindaje en tubería con concreto de 3000psi

- Se culminan excavaciones en material común para linea de conducción.

Residente de Obra

Residente de Obra

Lunes 19/01/2026

Estado del clima: Nublado - manana

Personal:
- Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Equipo, Herramienta menor:

Actividades: Se inician actividades de instalación de tubería a presión correspondientes a los diametros 2" - 2 1/2" y 3" con PDE segun especificaciones

Residente de Obra

Residente de Supervisión

Martes 20/01/2026

Estado del Clima: Seco

Personal: - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: Se continuan actividades correspondientes a instalación de tubería de 2".



Residente de Obra

Miercoles 21/01/2026

Estado del Clima: Seco

Personal - Residente de obra
- Inspector de obra
- Maestro de obra
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: Se continua con actividades correspondientes a la instalacion de tuberia a presion de 2" - 1/2" con PVC segun especificaciones.

Residente de Obra

Residente de Fiscalia

Jueves 22/01/2026

Estado del tiempo: Nublado - mañana
Lluvias moderadas - tarde

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: Se culminan actividades correspondientes a la instalación de tubería a presión con diametro de 2"

- Se continua instalación de tubería con diametro de 2"-1/2" y PVC según especificaciones técnicas.

Residente de Obra

Residente de Inspector

Viernes 23/01/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal. - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se culmina la instalación de tubería a presión correspondiente al diámetro de 2" + 1/2" con RDE según especificaciones técnicas.

- Se continua con instalación de tubería de 3"

Residente de Obra

Revisado: [illegible]


Sabado 24/01/2026

Estado del tiempo: Nublado

Personal - Residente de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua con instalacion de tuberia de 3" con PVC segun especificaciones tecnicas



Residente de Obra


Inspector de Obra

Lunes 26/01/2026

Estado del tiempo: lluvias fuertes - mañana y tarde.

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Actividades: Se realizo instalacion de tuberia de 3" en tramos paralelos por mal tiempo.



Residente de Obra = 1


Martes 27/01/2026

Estado del tiempo: Nublado

Personal: -Residente de Obra
-Inspector de Obra
-1 maestro
-2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Instalación final correspondiente a tubería a presión de 2" y 2" 1/2" con PVC según especificaciones técnicas.



Residente de Obra

Miercoles 28/01/2026

Estado del tiempo: Lluvias fuertes - mañana y tarde.

Personal - Residente de Obra
- 1 Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: Se continua con la instalación colocando frente al tubería de Presión de 3" según APU detallado en las especificaciones técnicas, debido al mal tiempo de trabajo 4 Horas menos

Residente de Obra

Inspector de Obra


Jueves 29/01/2026

Estado del tiempo: Nublado.

Personal - Residente de Obra
- Arquitecto de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se continuo con instalacion de tuberia a presion con diametro de 3" y reajuste a tuberia instalada el dia anterior en mal tiempo.



Residente de Obra

Residente de

Viernes 30/01/2026

Estado del tiempo: Nublado

Personal:- Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se continua con la instalacion de tuberia a presion con diametro de 3" y RDE segun especificaciones.




Sabado 31/01/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal: Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizo instalacion final de tuberia a presion con diametro de 3" con RDE segun especificaciones
- Se instalo llave de paso de 4"



Residente de Obra

Residente de Supervision

Lunes 2/02/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 Maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realiza la recepción del material correspondiente para la instalación de la llave válvula ventosa de diámetro de 3"

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 3/02/2026

Estado del tiempo: lluvia fuerte - mal tiempo

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se suspenden actividades de la obra por mal tiempo.

Residente de Obra

Firma de la Interventoría

Miercoles 4/02/2026

Estado del tiempo: Lluvias fuertes -mañana y tarde.

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se suspenden actividades de la Obra por mal tiempo.

Residente de Obra

Jueves 5/03/2026

Estado del tiempo: Nublado - mañana
Lluvias moderadas tarde

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro de Obra
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizó instalación de válvula ventosa de 3" en sector de tubería

Residente de Obra

Ingeniero Inspector de Obra

Viernes 6/02/2026

Estado del tiempo: lluvias fuertes - mañana y tarde

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: Se suspenden actividades por mal tiempo

Residente de Obra

Inspector de Obra


Sabado 7/02/2026

Estado del tiempo: Nublado

Personal: Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realizo instalacion de valvula ventosa de 3" y de cajilla un instalador.



Lunes 9/02/2026

Estado del tiempo: Nublado

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 Maestro de Obra
- 2 Ayudante

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realizó demolición de muro en concreto existente

Residente de Obra

Revisó: Inspector

Martes 11/02/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se culmina demolición de muro en concreto existente y de retiro, descalojo y limpieza del área intervenida.



Residente de Obra

Inspector de Obra


Miercoles 12/02/2026

Estado del tiempo Seco

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realizo recepcion de material correspondiente a regilla en interna de 1/2"



Jueves 13/02/2026

Estado del tiempo: Seco

Personal - Responsable de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes

Equipo: Herramienta menor

Actividades: Se realizó mantenimiento correspondiente a reja en interior de 1/2h

Responsable de Obra

Inspector de Obra

Viernes. 14/02/2026

Estado del tiempo: lluvias fuertes

Personal - Responsable de obra
- Inspector de obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramientas menor.

Actividades: - Se suspenden actividades por estado del clima.

- Se realiza recepción de material correspondiente al pedido viernes de 3".

Responsable de obra

Sabado 15/02/2026

Estado del Clima: Nublado

Personal - Residente de Obra
- Inspector de Obra
- 1 maestro
- 2 Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor.

Actividades: Se realiza instalación de valvula ventosa de 3" finalizando con su respectiva instalación.

Residente de Obra

Practicante de Ingeniería.



REPORTE DE CALIDAD

CEMEX Uso General

Fecha de Emisión: 16-ene-26
Número de Reporte: IBG-UG-53 a 1-2025
Km 5 Vía Buenos Aires-Payandé, Tolima, Colombia
Planta Caracolito

Cemento Hidráulico Tipo UG

Fecha inicial* 28-dic-25 ..... Fecha final* 3-ene-26

Resistencia a la compresión	Método de ensayo	Resultados	Requisitos norma
1 día	NTC 220	**12.3 MPa**	No especificado
3 días	NTC 220	**20.6 MPa**	Mínimo 8.0
7 días	NTC 220	**23.1 MPa**	Mínimo 15.0
28 días**	NTC 220	**25.4 MPa**	Mínimo 24.0

Otros parámetros físicos	Método de ensayo	Resultados
Retenido en Tamiz 45 µm	NTC 294	3.52 %
Superficie Específica Blaine	NTC 33	451 m²/kg
Tiempo de Fraguado Final	NTC 118	292 min

Otros parámetros físicos

Tiempo de Fraguado Inicial (min)




Resultado: 155 min
Método de ensayo: NTC 118

Contenido de Aire en Mortero (%)



Resultado: 9.9%
Método de ensayo: NTC 224

Expansión de Barra de Mortero a 14 días (%) (+)



Resultado: 0.001%
Método de ensayo: NTC 4927

Nuestros productos cumplen con la **Norma Técnica Colombiana NTC 121:2023 "ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO PARA CEMENTO HIDRÁULICO"**. Adicionalmente contamos con la certificación **ISO 9001 versión 2015** para "Producción de Cemento Hidráulico" emitida por el **ICONTEC**, el cual ejecuta auditorías periódicas de seguimiento a nuestro Sistema de Gestión de Calidad para verificar el cumplimiento de nuestros procesos y garantizar la calidad de nuestros productos.

* Este Reporte de Calidad corresponde a valores promedio de los análisis del producto entre las fechas del periodo indicado.
** El muestreo y análisis fueron realizados de acuerdo al procedimiento CGC-VIP-PT-05.
*** Este Reporte de Calidad no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de Cemex Colombia S.A.
(+) Valores reportados del periodo mensual anterior

Carlos Andrés Parra Bermúdez
Coordinador de Aseguramiento de Calidad

CEMEX COLOMBIA S.A. | Calle 99 # 9A - 54 Piso 7 | (571) 6039000 | (571) 6469000 | Bogotá, D.C. Colombia

SAPOLIN ¡La Pintura!

Invesa La Compañía Amiga

CREAMOS **ENLACES** CON EL PLANETA Y LA HUMANIDAD

CARTA DE GARANTÍA DE PRODUCTO
TRIPLE DUTY

En la división de PINTURAS SAPOLIN, INVESA S.A., garantizamos que los esmaltes TRIPLE DUTY cumplen con las características de viscosidad, cubrimiento, adherencia, brillo, resistencia al agua, resistencia a la intemperie, % sólidos por volumen y secado, establecidos para una pintura de este tipo y clasificándose como tipo 1.

Se recomienda seguir las instrucciones de preparación de superficie y aplicación consignada en la ficha técnica, con esto se garantiza el correcto funcionamiento y apariencia del producto, además se previenen fallas de adherencia y desprendimiento prematuro del recubrimiento.

Nota: Las pinturas de aluminio entizan aún recién aplicadas y tienen baja resistencia al rayado por ser leafing.

Nuestra compañía cuenta con un Sistema de Gestión Integral que garantiza que nuestros procesos, productos y servicios cumplan con los altos estándares de calidad, ambientales y de seguridad. Contamos con certificaciones que demuestran la solidez de la Organización y la capacidad humana y tecnológica que poseemos para proporcionar productos diferenciadores y confiables.

Esta certificación se expide el mes de marzo del año 2025 en la ciudad de Envigado, Colombia.

CENTRO TECNOLÓGICO/DIVISIÓN PINTURAS
Invesa S.A.

Oficina principal: Conmutador: (604) 334 27 27 · Fax: (604) 334 25 97
Carrera 48 # 26 Sur 181 · Envigado, Antioquia
Planta de producción: Conmutador: (604) 289 08 11
Autopista Norte Km 24, Vereda La Palma · Girardota, Antioquia
E-mail: info@invesa.com · **www.invesa.com**

Certificación Bancaria

Miércoles, 18 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ identificado(a) con CC 18123992, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	92799913251	2026-03-17	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

NIT: 18123992-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 2 A 50 BRR LAS ACACIAS, Mocoa, Putumayo, Colombia
Tel. 3229480278
Email. tebaida2002@yahoo.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764103289584 válida desde 2025-12-17 hasta 2026-06-17 rango desde FE277 hasta FE300.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MOCOA
NIT : 800102891
Dirección: CL 7 6 42 BRR CENTRO PALACIO MUNICIPAL, Mocoa, Putumayo, Colombia
Teléfono: 3219686353
Email: despachoalcalde@mocoa-putumayo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE279
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:59:47
FECHA FIRMADO: 17/03/2026 18:59:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CCTO OC	CONTRATO CIVIL DE OBRA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE FUENTE DE CAPTACIÓN QUEBRADA LA SUIZA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	94	1,00	$29.774.226,71				0,00	$29.774.226,71
2	S-01	ADMINISTRACION 28%	94	1,00	$8.336.783,48				0,00	$8.336.783,48
3	S-02	IMPREVISTOS 2%	94	1,00	$595.484,53				0,00	$595.484,53
4	102	UTILIDAD 5%	94	1,00	$1.488.711,34				0,00	$1.488.711,34

Notas:
CONTRATO No.417 del 22 de Diciembre de 2025 - ACTA PARCIAL DEL 88.86%

SON: (cuarenta millones ciento noventa y cinco mil doscientos seis pesos seis centavos)
CUFE: cae09cfa86156e879e55dbd4dcf3c605551b485dec3a14628f52032a4b482505357cc6080f291bede16693f8a4257dbd

Subtotal:	$40.195.206,06
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$40.195.206,06

Firma Digital: l75SVur1asQXNsapxt7RrrEZWk1uLT1DM5htMA2zUO9uAlNJEdcKhLykV69q6Q7u
49AhuWulZX61G4dcHPEwNYHZ3DChpU64jNmkmBcXBmCgkPvDKg
3X16Fwbd/8R69F 2qp82YWbHyDDlXzPEvz1UC0e456EfOZdf/L370aKlSxIW0VS3xGlH8zC21zDEhwD p9l6SfxE2pTjlx2ckOpeoJFla/hpb/qilla
b35AWs/vUEx4b0OM047BQ05DROPHK reTgU0l0H8aT/gVTtcOklJpjV6GhXIE6H/rm+JlAM7NXqOvEIXG86wiXtQMhl62k 0llAc69ilCEOl+aPdocq
Og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226105041

(415)7707212489984(8020) 000014122610504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 1 2 3 9 9 2	5	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 1 2 3 9 9 2

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUESAQUILLO	ORTIZ	ROGER	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Caicedo 5 6 9

41. Dirección principal: CR 47 15 CL 17 A BRR MIRAFLORES

42. Correo electrónico: tebaida2002@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 9 4 8 0 2 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 5 0 3 2 0	7 1 1 2	2 0 1 5 0 3 2 0		4 2 1 0	4 9 2 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CELTA S.A.S.

Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 45001:2018

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Producción, venta y servicio técnico de tubos y unión mecánica de PVC. Venta y servicio técnico de accesorios, cemento solvente y acondicionador de PVC y CPVC, y de tubos de CPVC

Production, sales and technical service of PVC pipes and mechanical joint. Sales and technical service of PVC and CPVC fittings, solvent cement and PVC and CPVC surface conditioner, and CPVC pipes

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: OS010-1
Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	**2003-12-19**
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	**2022-04-17**
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	**2022-09-23**
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	**2025-04-17**
Fecha de Auditoria de Recertificación:	**2022-07-19**
Fecha de Revisión:	**2022-09-23**

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Contanet.JD
...Su respaldo contable...!

James Duván Garnica Fajardo
Contador Público Titulado
Esp. en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa
Universidad Autónoma de Bucaramanga

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES:

El Suscrito Contador Público, certifica que el Señor **ROGER ANTONIO BUESAQUILLO ORTIZ,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 18.123.992 de Mocoa (P), se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje se encuentra al día durante los últimos seis meses y hasta la fecha

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los cuatro (04) días del mes de marzo del 2026, en Mocoa (P).


JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO
Tarjeta No. 123697-T

SECCIONAL MOCOA

Cra. 4 # 7 - 09 - B/ José María Hernández - Frente a Expovisión – Diagonal a Cootep
Telefax: (098) 420 44 58 - Cel: 312 523 10 06 - Email – contanetjd@hotmail.com.
Mocoa – Putumayo

James Duván Garnica Fajardo
Contador Público Titulado
Esp. en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa
Universidad Autónoma de Bucaramanga



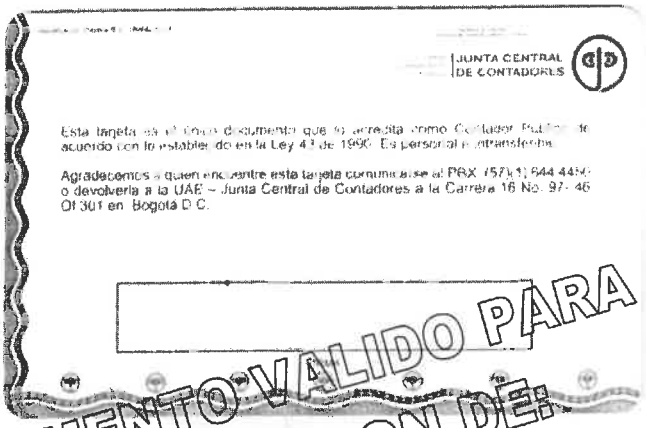

DOCUMENTO VALIDO PARA CERTIFICACION DEL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

ROGER BUESAQUILLO ORTIZ

Certificado No:

B 9 7 1 9 D E A 4 F F B 4 A 9 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127086 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 123697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

James Duván Garnica Fajardo
Contador Público Titulado
Esp. en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa
Universidad Autónoma de Bucaramanga

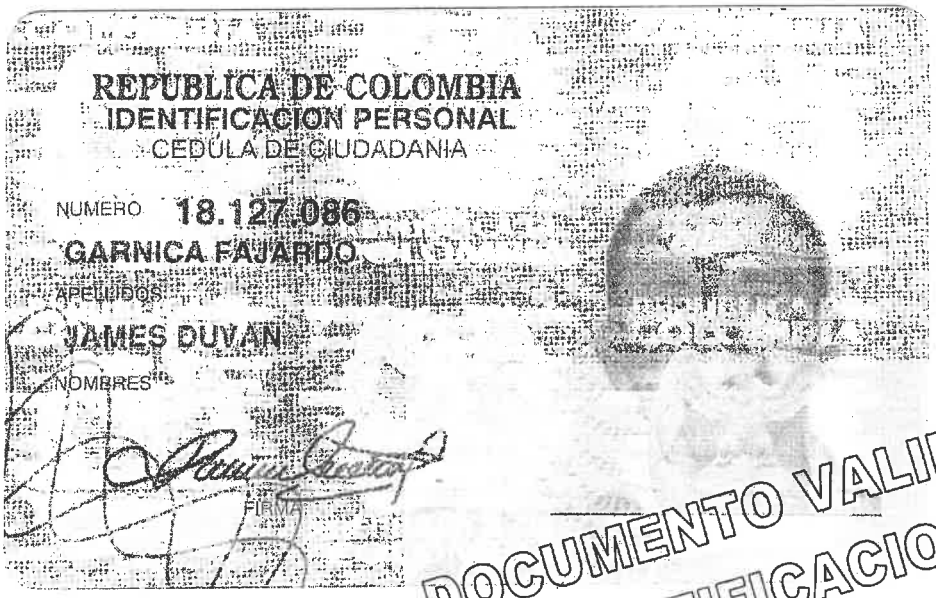

DOCUMENTO VALIDO PARA CERTIFICACION DE:

ROGER BUESAQUILLO ORTIZ




FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1976
MOCOA
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-OCT-1994 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-6400100-00164350-M-0018127086-20090725 0013941848A 1 8180100819

	ALCALDÍA DE MOCOA		CÓDIGO	FT-GEF-TES-001
	PROCESO MICRO - PROCESO	Gestión Financiera Tesorería	VERSIÓN FECHA	01 04/11/2025
	FORMATO	Certificación Ingreso Pago de Estampillas	TIPO DE PROCESO	APOYO

SFA – CER – IMTP – TES – 2025 – 00039

LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO, identificado(a) con C.C.-NIT No. **18123992-5**, realizó el pago de las estampillas, derivado del contrato No. **417 DEL 2025,** celebrado con **EL MUNICIPIO DE MOCOA**, valores que ingresaron a las cuentas bancarias del Municipio de Mocoa así:

No. RECIBO OFICIAL DE CAJA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	CUENTA BANCARIA	VALOR
2025012685	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	23-12-2025	598-340859	$ 1.809.000
2025012684	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	23-12-2025	598-340826	$ 905.000
2025012686	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	23-12-2025	598-433662	$ 452.000

La presente certificación se emite en concordancia escrita con el Acuerdo Municipal No.012 de diciembre 27 De 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO", respectivamente en sus Artículo 332 Y 347 Parágrafo 3.

Se expide la presente, en San Miguel de Ágreda de Mocoa, los veintitrés (23) día del mes de diciembre del año 2025.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

Elaboró:	Jhony Javier Solarte Pérez	Profesional de apoyo	Tesorería Municipal	
Revisó:	Leodan Linares	Tec. Administrativo	Tesorería Municipal	
