INFORME MENSUAL AMBIENTAL 10

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. FDLS-1013 2024-LP (119224)

CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA MT

INTERVENTORÍA: CONSORCIO MALLA VIAL SUBA

BOGOTÁ D.C,

VERSIÓN 02

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No FDLS-1013-2024-LP (119224)	
	INFORME AMBIENTAL No. 10 **1 AL 26 DE ENERO DEL 2026**	

CONTROL DE DOCUMENTOS

ESTADO REVISIÓN Y APROBACIÓN	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**	**FECHA**
ELABORÓ	ING. ALONSO BUSTOS	RESIDENTE AMBIENTAL CONSORCIO SUBA MT		FEBRERO 2026
Vo. Bo. INTERVENTORÍA	ING. TONYA OSORIO	RESIDENTE AMBIENTAL CONSORCIO MALLA VIAL SUBA		MARZO 2026

MODIFICACIONES		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN**
02/02/2026	01	VERSIÓN INICIAL
6/03/2026	02	Se atienden observaciones de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1. Objetivo General 4
2.2. Objetivos específicos 4
3. ALCANCE 4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
4.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO – CONTRATISTA CONSORCIO SUBA MT 5
4.2. DATOS DE INTERVENTORIA 7
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
5.1. Área de influencia directa 8
5.2. Área de influencia directa e indirecta 11
5.3. Área de influencia directa (AID) 11
5.4. Área de Influencia Indirecta (AII) 12
6. ACTIVIDADES TECNICAS 13
7. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL 15
7.1. Componente A: cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales 15
7.2. Componente B: manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas 15
7.2.1. B1. Manejo ambiental campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 16
7.2.2. B2. Manejo De Materiales De Construcción 19
7.2.3. B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos 20
7.2.4. B4. Control de emisiones atmosféricas 23
7.2.5. B5 Manejo Cuerpo De Aguas Y Sumideros 23
7.3. Componente C: manejo de vegetación y paisaje 24

7.4. Componente E: Señalización frentes de obra y sitios temporales 24

7.5. Manejo de maquinaria y volquetas 25

8. CONCLUSIONES 26

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Programas de gestión Ambiental
Anexo 2. Registro Fotográfico
Anexo 3. Relación Uso RCD
Anexo 4. Inventario Sumideros
Anexo 5. Proveedores
Anexo 6. Constancia Gestión (Anexo V) Pendiente
Anexo 7. Informe de aprovechamiento In Situ (Anexo IV)
Anexo 8. Certificado de disposición (Pendientes)
Anexo 9. Capacitaciones

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene la evidencia de la gestión realizada en el componente Ambiental, adelantada por CONSORCIO MALLA VIAL SUBA correspondiente al periodo comprendido del 01 al 26 de ENERO del 2026 durante la etapa de construcción.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el contrato FDLS-1013- 2024-LP (119224**)** y dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico del mencionado contrato cuyo objeto es ***EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO***

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar el reporte del cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales del contrato de obra FDLS-1013-2024-LP (119224) para la etapa de construcción, con la implementación y seguimiento a las medidas ambientales en obra-MAO propuestas por el contratista.

2.2. Objetivos específicos

- Presentar el estado de cumplimiento ambiental del contrato de obra FDLS-1013-2024-LP (119224), en el marco de las gestiones y actividades realizadas por el contratista de obra para el presente periodo en la etapa de construcción.
- Implementar y hacer seguimiento a las medidas de manejo ambiental propuestas en el MAO.
- Presentar el cumplimiento de la entrega de productos ambientales terminada durante la etapa de construcción.
- Reportar el estado de los permisos ambientales solicitados para la ejecución de las obras objeto del contrato FDLS-1013-2024-LP (119224)

3. ALCANCE

El presente documento corresponde al informe mensual número DIEZ, el cual comprende todas las actividades realizadas durante la Etapa de construcción con relación al componente Ambiental durante la ejecución del Contrato de obra pública No FDLS - 1013-2024-LP (119224).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO – CONTRATISTA CONSORCIO SUBA MT

Tabla 1. Información del Proyecto

Nombre del contratista:	CONSORCIO SUBA MT
Contrato No:	FDLS-1013-2024-LP (119224)
Representante Legal:	Oscar Julián Moreno Carrazco
Objeto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO."
Plazo de ejecución:	(10) DIEZ MESES
Fecha de iniciación:	1/04/2025
Fecha de terminación:	31/01/2026
Valor del Contrato:	$9.518.779.563
Preliminares, Pre-construcción	Hojas de vida del personal profesional. Relación del equipo mínimo obligatorio. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. Programa de obra. Plan de manejo de tránsito- PMT. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones.
Construcción Ejecución Recibo	Mantenimiento periódico Mantenimiento rutinario. Mejoramiento Rehabilitación Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes: Intervención en el espacio público a. Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contención y pavimento, existentes.

	b. Excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad, de acuerdo con E&D. c. De ser eminentemente necesario, Construcción de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de las mismas), de acuerdo con la Norma EAAB. d. Fresado mecánico de superficies existentes, cargando material para disponer en patios de la UMV, según norma e. Re-Construcción de sub-bases granulares y/o bases granulares, extendidas y compactadas de acuerdo con la norma IDU, en fallos localizados y que presenten un deterioro máximo poniendo en riesgo la estabilidad de la vía. f. Reconstrucción de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona de intervención. g. Construcción de filtros y obras de sub-drenajes y drenajes. h. Re-Construcción de andenes, espacio público y obras complementarias. i. Instalación de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc., en sitios de mínimo impacto por vandalismo y eminentemente necesarios para preservar la salud. j. Actividades de señalización horizontal y vertical; demarcación. k. Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, sociales y manejo de tránsito.

Fuente: CONSORCIO SUBA MT, 2024

Tabla 2. Información Contratista

CONTRATISTA	**CONSORCIO SUBA MT**
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR JULIAN MORENO
DIRECTOR DE OBRA	OSCAR JULIAN MORENO
RESIDENTE TÉCNICO	DANIEL FAJARDO CASTAÑEDA
RESIDENTE SST	YASMIN CATERINE BURBANO
RESIDENTE AMBIENTAL	ALONSO BUSTOS BUSTOS
RESIDENTE SOCIAL	PAOLA ANDREA COPABAN RICO

4.2. DATOS DE INTERVENTORIA

CONTRATO	FDLS-085-2025-INT (119250)
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA
CONTRATISTA	**CONSORCIO MALLA VIAL SUBA**
PLAZO INICIAL	11 (Once) Meses
FECHA DE INICIO	1/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
CIUDAD	Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL	Omar García Cubillos

Fuente: CONSORCIO SUBA MT, 2024

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

5.1. Área de influencia directa

El contrato comprende la ejecución de los trabajos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"".

Ilustración 1. Localización general de vías a intervenir



Fuente: Anexo técnico

El contrato contempla la intervención de un total de treinta y seis (36) corredores viales y las obras a ejecutar se encuentran en una (02) localidad de la ciudad de Bogotá D.C. la cual es Suba, a los cuales se realizarán actividades de construcción de la malla vial local e Local. A continuación, se presenta la Tabla la cual se relacionan las vías a intervenir por la localidad.

A continuación, el listado de CIV a intervenir:

Tabla 3. Lista de vías priorizadas

No.	MVICIV	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	SECTOR_BARRIO
1	11002883	11002883	CRA 149 C	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO
2	11002907	11002907	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO
3	11003276	11003276	CRA 154 B	CLL 138 C	CLL 138 D	SAN PEDRO
4	11003330	11003330	CRA 148 A	CLL 134 A	CLL 137	SAN PEDRO
5	11003331	11003331	CRA 150B	CL 136A	CL 137	SAN PEDRO
6	11003363	11003363	CLL 138 B	CRA 159 B	CRA 159 A	SAN PEDRO
7	11003377	11003377	CLL 136 A	CRA 150 B	CRA 150C	SAN PEDRO
8	11003393	11003393	CRA 154 B	CLL 138 B	CLL 138 C	SAN PEDRO
9	11003400	11003400	CLL 138 B	CRA 159 A	CRA 159	SAN PEDRO
10	11003432	11003432	CLL 138 B	CRA 159	CRA 158 B	SAN PEDRO
11	11003453	11003453	CRA 155	CLL 138 C	CLL 138 B	SAN PEDRO
12	11003461	11003461	CRA 159 A	CLL 138 A	CLL 138 B	SAN PEDRO
13	11003471	11003471	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138 B	SAN PEDRO
14	11003507	11003507	CLL 135 A	CRA 150 B	CRA 151	SAN PEDRO
15	11003529	11003529	CLL 138 B	CRA 157	CRA 155	SAN PEDRO
16	11003530	11003530	CLL 138 B	CRA 157	CRA 18b	SAN PEDRO
17	11003541	11003541	CRA 155	CLL 138 B	CLL 138 A	LISBOA
18	11003572	11003572	CRA 159 A	CLL 138	CLL 138 A	LISBOA
19	11003575	11003575	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138	LISBOA
20	11003577	11003577	CRA 148 B	CLL 132 D	CLL 133	LISBOA

No.	MVICIV	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	SECTOR_BARRIO
21	11003637	11003637	CRA 150 D	CLL 134	CLL 134 A	LISBOA
22	11003639	11003639	CRA 155	CLL 138 A	CLL 138	LISBOA
23	11003641	11003641	CLL 138 A	CRA 155	CRA 157	SANTA RITA
24	11003796	11003796	CRA 150 D	CLL 132 D	CLL 133	LISBOA
25	11003902	11003902	CRA 150 D	CLL 132 A	CLL 132 D	LISBOA
26	11003951	11003951	CRA 159 A	CLL 136 F	CLL 138	VILLA CINDY
27	11004038	11004038	CLL 137	CRA 157	CRA 158 B	VILLA CINDY
28	11004208	11004208	CLL 136 A	CRA 157	CRA 157 A	VILLA CINDY
29	11004209	11004209	CLL 136 D	CRA 157 A	CRA 158 B	VILLA CINDY
30	11004245	11004245	CLL 136 A	CRA 157 A	CRA 157 B	VILLA CINDY
31	11004273	11004273	CLL 136 A	CRA 157 B	CRA 158	VILLA CINDY
32	11004274	11004274	CLL 136 C	CRA 158	CRA 158 B	VILLA CINDY
33	11004313	11004313	CLL 136 A	CRA 158	CRA 158 A	VILLA CINDY
34	11004333	11004333	CLL 136 A	CRA 158 A	CRA 158 B	VILLA CINDY
35	11004592	11004592	CRA 159 A	CLL 136	CLL 136 A	SANTA CECILIA
36	11005556	11005556	CLL 129 D	CRA 158 A	CRA 159 A	SANTA CECILIA
37	11006787	11006787	CLL 131 B	CRA 95 A BIS	CRA 95 B	VILLA ELISA

Fuente: CONSORCIO SUBA MT, 2024

5.2. Área de influencia directa e indirecta

Suba es una de las 20 localidades de Bogotá y se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad, entre los 2.560 m.s.n.m en el río Bogotá y 2.700 m.s.n.m. en los cerros de Suba. Limita por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. Tiene una extensión de 10.056 hectáreas.

Ilustración 2: Localización general de vías a intervenir



Fuente: Adaptado de la plataforma Mapas Bogotá.

5.3. Área de influencia directa (AID)

El proyecto contempla la intervención de un total de treinta y seis (36) corredores viales y las obras a ejecutar se encuentran en una (02) localidad de la ciudad de Bogotá D.C. la cual es Suba, a los cuales se realizarán actividades de construcción de la malla vial local e Local. *Ver Tabla 4. Lista de vías priorizadas.*

En el periodo se cuenta con oficinas y campamento en la ubicada en la Cll 133 No. 92 - 41, donde se han desarrollado las actividades administrativas y operativas del contrato, estas instalaciones cuentan con los servicios de aseo básicos como son: agua, energía, baños y elementos necesarios para el bienestar de los colaboradores

Se dispondrá de un campamento que estará dotado con los siguientes elementos:

- **Hidratación:** Se garantiza al personal operativo y administrativo, agua potable para suministro durante el desarrollo de las actividades.
- **Sanitarios:** Se contará con dos (2) sanitarios en el campamento.
- **Dotaciones:** El campamento se encontrará dotado con señalización preventiva, elementos de emergencia como son: camilla, botiquín tipo A y extintor multipropósito de 15 libras.

Tabla 4. CIV En Intervención

GRUPO	MVICIV	CIV	ESTADO	TRAMO	DESDE	HASTA	SEC_BAR
1	11002883	11002883	FINALIZADO	CRA 149 C	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO
2	11003330	11003330	FINALIZADO	CRA 148 A	CLL 134 A	CLL 137	SAN PEDRO
3	11003377	11003377	FINALIZADO	CLL 136 A	CRA 150 B	CRA 150C	SAN PEDRO
4	11004038	11004038	FINALIZADO	CLL 137	CRA 157	CRA 158 B	VILLA CINDY
5	11004209	11004209	FINALIZADO	CLL 136 D	CRA 157 A	CRA 158 B	VILLA CINDY
6	11004274	11004274	FINALIZADO	CLL 136 C	CRA 158	CRA 158 B	VILLA CINDY
7	11003393	11003393	FINALIZADO	CRA 154 B	CLL 138 B	CLL 138 C	SANTA RITA
8	11003575	11003575	FINALIZADO	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138	SANTA RITA
9	11003471	11003471	FINALIZADO	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138 B	SANTA RITA
10	11002907	11002907	ANDENES	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO
11	11003331	11003331	FINALIZADO	CRA 150B	CL 136A	CL 137	SAN PEDRO
12	11003507	11003507	FINALIZADO	CLL 135 A	CRA 150 B	CRA 151	SAN PEDRO
13	11003641	11003641	FINALIZADO	CLL 138 A	CRA 155	CRA 157	SANTA RITA
14	11003637	11003637	ANDENES	CLL 138 A	CRA 155	CRA 157	LISBOA
15	11003796	11003796	ANDENES	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	LISBOA
16	11003901	11003901	FINALIZADO	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	LISBOA
17	11003577	11003577	ANDENES	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	LISBOA
18	11005556	11005556	ANDENES	CLL 129D	CRA 158A	CRA 159A	STA CECILIA

19	11006787	11006787	VÍA	CLL 131A	CRA95A BIS	CRA 95B	VILLA ELISA
20	11003712	11003712	ANDENES	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	LISBOA

5.4. Área de Influencia Indirecta (AII)

El área de influencia indirecta a la localidad de Suba, dado que la construcción de la infraestructura vial puede afectar la calidad de vida de los habitantes no solo de esta, sino también de localidades vecinas.

Durante la fase de ejecución del contrato, se prevé la generación de impactos en los barrios colindantes, principalmente debido al incremento en el tránsito de vehículos y maquinaria pesada. Esto podría traducirse en un aumento de los niveles de ruido, emisiones atmosféricas (gases contaminantes) y material particulado.

Sin embargo, una vez finalizada la obra, se contempla la implementación de medidas de recuperación paisajística y mejoramiento del entorno urbano. Estas acciones contribuirán a fortalecer la percepción de seguridad en las zonas intervenidas y a promover un ambiente sano y más habitable para la comunidad.

6. ACTIVIDADES TECNICAS

El contrato consta de la realización de dos fases principales las cuales son las siguientes:

1. Construcción
   1.1 Ejecución
   1.2 Recibo

1. Etapa Construcción

Para el presente periodo de construcción reportado del 01 al 26 de ENERO del 2026 se continua con la intervención de VEINTE segmentos viales, localizados en los Barrios Villa Cindy, San Santa Rita, San Pedro, Lisboa, Santa Cecilia y Gloria Lara, de la localidad de Suba. Las actividades constructivas se ejecutan de manera simultánea en los frentes de obra.
Para el mes de ENERO se continúa la intervención del CIV´s 11006787 ubicado en Gloria Lara, y los demás CIV´s se encuentran en etapa de finalización. De la totalidad de CIV´s intervenidos, 19 se encuentran finalizados, UNO en etapa constructiva.

La totalidad de los segmentos intervenidos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 5. CIV intervenidos en el presente periodo

ETAPA	CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	SEC_BAR
FINALIZADO	11002883	CRA 149 C	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO

FINALIZADO	11003330	CRA 148 A	CLL 134 A	CLL 137	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003377	CLL 136 A	CRA 150 B	CRA 150C	SAN PEDRO
FINALIZADO	11004038	CLL 137	CRA 157	CRA 158 B	VILLA CINDY
FINALIZADO	11004209	CLL 136 D	CRA 157 A	CRA 158 B	VILLA CINDY
FINALIZADO	11004274	CLL 136 C	CRA 158	CRA 158 B	VILLA CINDY
FINALIZADO	11003393	CRA 154 B	CLL 138 B	CLL 138 C	SANTA RITA
FINALIZADO	11003575	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138	SANTA RITA
FINALIZADO	11003471	CRA 154 B	CLL 138 A	CLL 138 B	SANTA RITA
FINALIZADO	11002907	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003331	CRA 150B	CL 136A	CL 137	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003507	CLL 135 A	CRA 150 B	CRA 151	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003641	CLL 138 A	CRA 155	CRA 157	SANTA RITA
FINALIZADO	11003577	CRA 148 B	CLL 132D	CLL 133	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003796	CRA 150 D	CLL 132D	CLL 133	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003901	CRA 150 D	CLL 132D	CLL 132D	SAN PEDRO
FINALIZADO	11003637	CRA 150 D	CLL 134	CLL 134A	SAN PEDRO
FINALIZADO	11005556	CLL 129D	CRA 158A	CRA 159A	STA CECILIA
CONSTRUCTIVA	11006787	CLL 131A	CRA95A BIS	CRA 95B	VILLA ELISA
FINALIZADO	11003712	CRA 150 A	CLL 138	DG 138 F	LISBOA

El estado actual de los corredores viales intervenidos al cierre del presente es el siguiente:

CIV VILLA CINDY INTERVENIDOS

CIV 11004274 Ubicado en el barrio Villa Cindy Tramo Calle 136C desde Cra 158 hasta Cra 158B. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento al igual que terminado la construcción de andenes por los dos costados. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11004209 Ubicado en el barrio Villa Cindy Tramo Calle 136D desde Cra 157A hasta Cra 158B. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento al igual que terminado la construcción de andenes por los dos costados. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11004038 Ubicado en el barrio Villa Cindy Tramo Calle 137 desde Cra 157A hasta Cra 158B. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento al igual que terminado la construcción de andenes por los dos costados. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV SANTA RITA INTERVENIDOS

CIV 11003471 Ubicado en el barrio Santa Rita Tramo Cra 154B desde Calle 138A hasta Calle 138B. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11003393 Ubicado en el barrio Santa Rita Tramo Cra 154 desde Calle 138B hasta Calle 138C. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11003575 Ubicado en el barrio Santa Rita Tramo Cra 154B desde Calle 138A hasta calle 138. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11003641 Ubicado en el barrio Santa Rita Tramo Cra 150A desde Calle 138 hasta Calle 138F. Se finalizó la instalación de concreto de la vía y andenes por los dos costados. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV SAN PEDRO INTERVENIDOS

CIV 11003377 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo Calle 136A desde Cra 150B hasta Cra 150C. Se finalizó la construcción de andenes por los dos costados. Actualmente se encuentra finalizado. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11003330 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo Cra 148A desde Calle 134A hasta Calle 137. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11002883 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo Cra 149C desde Calle 138 hasta Dg 138F. Se finalizó la instalación de concreto de la vía y construcción de andenes por los dos costados. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

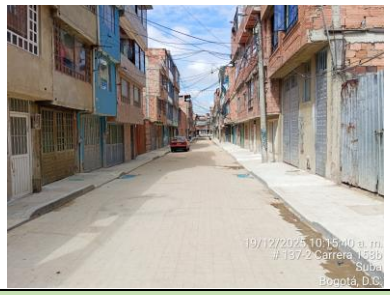
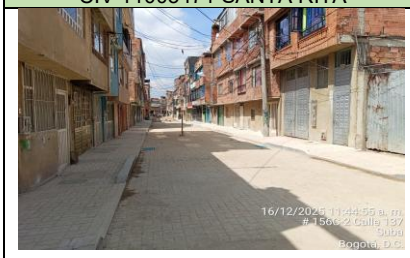
CIV 11002907 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo Cra 150A desde Calle 138 hasta Calle 138F. Está terminado el concreto de vía, finalizó la construcción de andenes. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 11003507 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo CLL 135A desde CRA 150 hasta CRA 151. Se encuentra finalizada la construcción e instalación del nuevo pavimento. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

CIV 1100331 Ubicado en el barrio San Pedro Tramo Calle 136A desde Cra 150B hasta Cra 150C. Está terminado el concreto de vía y construcción de andenes. Se prepara para pre entrega a Interventoría.

Al cierre del presente informe el CIV **6887**, ubicado en el barrio Gloria Lara se encuentran en etapa constructiva, sin embargo, se continúa con la implementación de Plan de Manejo Ambiental en Obra en este CIV y los ya terminados.

Ilustración 3. Registro Fotográfico Tramos Intervenidos en el Presente Periodo

		
CIV 11004274 V/CINDY	CIV 11004209 V/CINDY	CIV 11004038 V/CINDY
		
CIV 11003471 SANTA RITA	CIV 11003575 SANTA RITA	CIV 11003393 SANTA RITA
		
CIV 11003641 SANTA RITA	CIV 11002883 SAN PEDRO	CIV 11002907 SAN PEDRO
		
CIV 11003330 SAN PEDRO	CIV 11003377 SAN PEDRO	CIV 11003507 SAN PEDRO

		
CIV 11003637 LISBOA	CIV 11003796 LISBOA	CIV 11003901 LISBOA
		
CIV 11003577 LISBOA	CIV 11005556 SANTA CECILIA	CIV 11006787 VILLA ELISA

El presente informe contiene la evidencia de la gestión realizada en el componente Ambiental, adelantada por CONSORCIO MALLA VIAL SUBA, durante el periodo comprendido del 01 al 26 de ENERO del 2026 periodo donde se realizaron actividades de la etapa construcción, una vez cumplidos los requisitos establecidos para dar inicio a la fase de ejecución, con las siguientes actividades planteadas:

a. Demoliciones de andenes, sardineles, muros a. de contención y pavimento, existentes.
b. Excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad, de acuerdo con E&D.
c. De ser eminentemente necesario, Construcción de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de estas), de acuerdo con la Norma EAAB.
d. Re-Construcción de sub-bases granulares y/o bases granulares, extendidas y compactadas de acuerdo con la norma IDU, en fallos localizados y que presenten un deterioro máximo poniendo en riesgo la estabilidad de la vía.
e. Construcción de filtros y obras de sub-drenajes y drenajes.
f. Re-Construcción de andenes, espacio público y obras complementarias.
g.Instalación de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc., en sitios de mínimo impacto por vandalismo y eminentemente necesarios para preservar la salud.
h. Reconstrucción de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona de intervención.
i. Actividades de señalización horizontal y vertical; demarcación.
j. Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, sociales y manejo de tránsito.

7. COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

7.1. Componente A: cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

Personal Ambiental para la Ejecución del Contrato

Para dar cumplimiento a la ejecución del contrato FDLS-1013- 2024-LP (119224) el Consorcio Suba MT cuenta con dos profesionales SST y Un Profesional Ambiental.

Tabla 6. Personal del Componente Ambiental y SST

No.	CARGO	NOMBRE
1	RESIDENTE SST	Ing. YASMIN CATERINE BURBANO
2	RESIDENTE AMBIENTAL	Ing. ALONSO BUSTOS BUSTOS
3	INSPECTOR SSTMA	Prof. LUISA MORENO
4	CUADRILLA AMBIENTAL (BOAL)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Permisos Ambientales

De acuerdo al alcance contractual del contrato de obra No. FDLS-1013-2024-LP (119224), los permisos ambientales requeridos se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 7. Permisos Ambientales

PERMISO REQUERIDO	TRAMITADO POR	ENTIDAD OTORGANTE	ESTADO DEL TRÁMITE
Plan de manejo de tráfico	Consorcio Suba MT	Secretaria de Movilidad	Aprobación de COI
Gestión de RCD	Alcaldía Local de Suba	Secretaría Distrital de Ambiente	Aprobado mediante radicado 2025R99346 se asignó PIN 27177

Capacitaciones

Para el reporte del presente informe, del 01 al 26 de ENERO de 2026 el Consorcio Suba MT realizó inducción, capacitación y charlas en temas de conciencia ambiental al personal que interviene en la obra.

Tabla 8. Capacitaciones

FECHA	TEMA	NÚMERO DE PARTICIAPANTES
ENERO 07/2026	RESTAURACIÓN	15
ENERO 14/2026	CAMBIO CLIMÁTICO	15
ENERO 19/2026	SEGURIDAD ALIMENTARIA	17
ENERO 23/2026	ENERGÍA	11

Importante mencionar que, para el presente periodo de construcción reportado del 01 al 26 de ENERO se continua con la intervención de VEINTE segmentos viales, localizados en el Barrio Villa Cindy, San Santa Rita, San Pedro, Lisboa, Gloria Lara y Santa Cecilia de la localidad de Suba. Las actividades constructivas se ejecutan de manera simultánea en los frentes de obra. Para el cierre del presente informe se encuentra implementado el Plan de Manejo Ambiental en Obra (MAO).

- Se desarrollan las actividades plasmadas en cronograma de actividades del componente
- Con acompañamiento de interventoría se realizan recorridos de seguimiento periódicos
- Se realiza acompañamiento y participación en comités de obra, con el fin de realizar seguimientos a los requerimientos técnicos de los componentes técnico, social, ambiental y SST.
- De acuerdo con las visitas e inspecciones realizadas en campo no se requieren la solicitud de permisos ambientales ante la Secretaria Distrital de Ambiente SDA.

7.2. Componente B: manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas

Importante mencionar que, para el periodo del 1 al 26 de ENERO del 2026, el contrato se encuentra en etapa de construcción en veinte segmentos viales. Durante el presente periodo, el CONSORCIO SUBA MT, en calidad de contratista encargado de la ejecución del contrato, llevó a cabo actividades de excavación, movimiento de tierra, conformación de la estructura de la vía con rajón, base granular e instalación de concreto. En el marco de estas actividades, se realizó un análisis con el fin de establecer consideraciones técnicas y operativas relevantes para el desarrollo de las intervenciones previstas.

Dicho proceso contempló la observación in situ de variables ambientales como posibles fuentes de contaminación, entre otros aspectos que podrían influir directa o indirectamente en la planificación, ejecución y sostenibilidad de las obras de infraestructura vial. La identificación de estos factores resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y para minimizar el impacto de las intervenciones sobre el entorno natural y social.

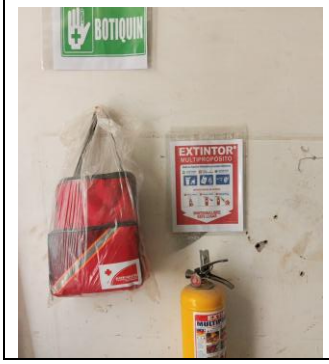
7.2.1. <u>Ficha B1. Manejo ambiental campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio</u>

Para el periodo de reporte del 1 al 26 de enero de 2026 el CONSORCIO SUBA MT, instaló un campamento fijo en el frente de obra del CIV 11004274 ubicado en el Barrio Villa Cindy. En el CIV 11002888 se instaló una bodega temporal, los dos sitios cuentan con un baño, kit de emergencia, punto de hidratación, punto ecológico.

Tabla 9. Campamento

Área de Influencia	Tipo de Campamento	Ubicación	Dirección
Directa	Temporal	Barrio Villa Cindy	Cll 136D No. 157 A - 67

Registro Fotográfico







7.2.2. B2. Manejo De Materiales De Construcción

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT adquirió materiales de construcción relacionados con agregados. Los cuales se detallan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 10. Relación de materiales usados

Mes	Material	Volumen (M3)	Volumen (Ton)	Proveedor autorizado	CERTIFICADO S/N CERTIFICACIÓN No.
MAYO 2025	0	0	0	N/A	N/A
	TOTAL PERIODO	0	0	N/A	N/A
	TOTAL ACUMULADO	0	0	N/A	N/A
JUNIO 2025	B-200	188.0	300.8	Constriturar	4423-3419-25
	Piedra 30-40cm	201.0	542.7	Constriturar	4423-3419-25

	Subbase TIPO C SBG-C	103.0	164.8	Constriturar	4423-3419-25
	TOTAL PERIODO	492.0	1008.3	N/A	N/A
	TOTAL ACUMULADO	492.0	1008.3	N/A	N/A
JULIO 2025	B-200	141	225.6	Constriturar	2347-1569-1044-25 4464-3461-25 41
	Rajón	205	553.5	Constriturar	2347-1569-1044-25 4464-3461-25 41
	Triturado	58	81.2	Constriturar	2347-1569-1044-25 4464-3461-25 41
	Total Periodo	404	860.3	N/A	N/A
	Total Acumulado	896	1868.6	N/A	N/A
AGOSTO 2025	B-200	420	672	Constriturar	SI CERT. No. 113 de octubre 08 del 2025
	Rajón	165	445.5	Constriturar	SI CERT. No. 113 de octubre 08 del 2025
	SUB-BSAE C	165	264	Constriturar	SI

					CERT. No. 113 de octubre 08 del 2025
	B-600	60	96	Construrar	SI CERT. No. 113 de octubre 08 del 2025
	Triturado	30	42	Construrar	SI CERT. No. 113 de octubre 08 del 2025
	Total Periodo	840	1519.5	N/A	N/A
	Total Acumulado	1736	3388,10	N/A	N/A
SEPTIMBRE 2025	**B-200**	435	696	Construrar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025/
	SUBBASE C	590	944	Construrar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025/ CERT. No. 2367-1589-1064-25 de 17/10/2025
	B-600	10	16	Construrar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025
	BASE TIPO C	15	24	Construrar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025
	TRITURADO	142	198.8	Construrar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025

					CERT. No. 2367-1589-1064-25 de 17/10/2025
	RAJÓN	1017	2745.9	Constriturar	SI CERT. No. 114 de octubre 08 del 2025 CERT. No. 2367-1589-1064-25 de 17/10/2025
	Total Periodo	2209	4624.7	N/A	N/A
	Total Acumulado	3945	8012.8	N/A	N/A
OCTUBRE	**Subbase CSB**	165	264	CONSTRITURAR	SI CERT. 214 NOV
	Piedra 30/40	30	81		
	Piedra 20/25	15	40.5		
	Triturado	15	21		
	B-600	15	24		
	B-200	375	600		
	Total Periodo	615	1030.5	N/A	N/A
	Total Acumulado	4560	9043,3	N/A	N/A
NOVIEMBRE	**SUB BASE C**	135	216	Constriturar	SI CERT. 269 DEL 15/12/2025 CERT. 271 DEL 18/12/2025
	RAJÓN	90	243		
	TRITURADO	45	63		
	B-200	300	480		
	Total Periodo	570	1002	N/A	N/A

	Total Acumulado	5130	10120.3	N/A	N/A
DICIEMBRE	**RAJÓN**	105	283.5	CONSTRITURAR	SI CERT. 329 DEL 14/01/2026
	TRITURADO	15	25.5		
	B-200	300	480.0		
	Total Periodo	420	789.0	N/A	N/A
	Total Acumulado	5550	10834.30	N/A	N/A
ENERO	**RAJÓN**	15	40.5	CONSTRITURAR	NO
	TRITURADO	15	21		
	B-200	15	38.4		
	Total Periodo	45	99.9	N/A	N/A
	Total Acumulado	5595	10934,2	N/A	N/A

- Se garantiza que los materiales de construcción son suministrados por proveedores que se encuentren en el directorio de proveedores del IDU o que cumplan con la legislación Minera Ambiental Vigente.
- Se valida el estado legal de los permisos ambientales de los proveedores de materiales pétreos, con el fin de establecer que no se incurra en incumplimientos de los permisos ambientales otorgados por autoridades ambientales competentes. Se relacionan documentos de proveedor en el anexo 7. Proveedores

Tabla 11. Relación proveedores materiales granulares

NOMBRE	TIPO DE MATERIALES	VIGENCIA
CONSTRITURAR	PROVEEDORMATERIALES GRANULARES	24/09/2025
Dromos	PROVEEDOR DE ASFALTO	Resolución CAR 50207100864 del 16 de AGOSTO 2020. Resolución CAR 0372 del 12 de febrero del 2029
ASFALTOS GR	PROVEEDOR DE ASFALTO	Res 423del 27 de febrero 2028

Fuente: CONSORCIO SUBA MT, 2024

7.2.3. Ficha B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos

Manejo de Residuos Sólidos Convencionales

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT cuenta con un punto ecológico el cual está ubicado en el frente de obra del CIV 11004274 ubicado en el Barrio Villa Cindy. El punto ecológico cuenta con bolsas para la separación de los residuos orgánicos aprovechables (bolsa verde), Residuos No Aprovechables (bolsa negra), Residuos Reciclables (Bolsa Blanca).





Manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD

Para el periodo del presente reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT genera un volumen total de 225 m3 equivalentes a 370.80 Toneladas de material de excavación.

- **Traslado y Transportes de RCD**

Para el periodo del presente reporte correspondiente del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT traslada los RCD generados en las siguientes volquetas.

Tabla 12. Volquetas usadas en el periodo

PLACA VOLQUETA	PIN
SNW 254	16243
THS 148	19083
TOQ 723	18875
FSU 497	22204
WEQ 751	6858
SOS 175	19863
SRN 254	16243
SRN 244	4549

- **Generación y Disposición de RCD**

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT genera un volumen de 225 m3 equivalentes a 370.80 toneladas de material de excavación, distribuidos y dispuestos de la siguiente manera.

Tabla 13. RCD Generados para el periodo

GESTOR	RCD	No. Registro IDU/ vigencia	MAYO 202527 - 31	JUNIO 2025 01 – 30	JULIO 2025 01 – 31	AGOSTO 2025 01 – 31	SEPTIEMBRE 2025 01 – 30	OCTUBRE 2025 01 – 31	NOVIEMBRE 2025 01 – 30	DICIEMBRE 2025 01 – 31	ENERO 2026 01 – 26	TOTAL (M3)	TOTAL (TONELAD)
MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	Excavación de tierras arcillas y recebos	No.IDU 421 Vigencia25 /08/2025	180	0	0	0	45	75	0	45	0	345	552.12
INGEOMINERIA (San Antonio)	Excavación de tierras	No. IDU 654 Vigencia 12/11/2025	30	0	0	0	0	0	0	30	0	60	138
CEMEX	Disposición Final de RCD, Escombros, Excavación y Materiales estériles	Res. ANLA – 1506 28 AGOSTO 2006/ 1480 04 diciembre de 2014	0	1350	1425	0	1320	0	0	0	0	4095	6000.50
TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinama	0	0	0	645	570	225	420	720	225	2805	4622.64
		Total	**210**	**1350**	**1425**	**645**	**1935**	**300**	**420**	**795**	**225**	**7305**	**11313.26**

Nota: Densidad 1.648 kg/m3

Tabla 13. **Estado De Certificaciones**

INFORME	GESTOR	RCD	No REGISTRO IDU/VIGENCIA	VOLUMEN CERTIFICADO	CERTIFICADO
PERIODO 1 27 - 31 DE MAYO 2025	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	Excavación de tierras Arcillas y Recebos	No. IDU 421 Vigencia 25/08/2025	180 m^3 230.89 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No.CERT-1057-2025 del 16 de JUNIO de 2025
	INGEOMINERIA (San Antonio)	Excavación de tierras	No. IDU 654 Vigencia	30 m3 69 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN

			12/11/2025		No.CERT-2505084 del 16 de JULIO de 2025
PERIODO 2 1 - 30 DE JUNIO 2025	CEMEX	Disposición Final de RCD, Escombros, Excavación y Materiales estériles	Res. ANLA – 1506 28 AGOSTO 2006/ 1480 04 diciembre de 2014	1.350 m3 1978.1 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No. 101956 del 11 de JULIO de 2025 No.CERT-101845 del 11 de JULIO de 2025
PERIODO 3 1 - 31 DE JULIO 2025	CEMEX	Disposición Final de RCD, Escombros, Excavación y Materiales estériles	Res. ANLA – 1506 28 AGOSTO 2006/ 1480 04 diciembre de 2014	1425 m3 2088.1 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No. 91285 del 10 de AGOSTO de 2025
PERIODO 4 1 - 31 DE AGOSTO 2025	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	645 m3 1062 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No. TM-0160-2025 del 27 de SEPTIEMBRE del 2025
PERIODO 5 1 - 30 DE SEPTIEMBRE 2025	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	570 m3 939 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No. TM-0172-2025 del 07 de OCTUBRE del 2025
	CEMEX	Disposición Final de RCD, Escombros, Excavación y Materiales estériles	Res. ANLA – 1506 28 AGOSTO 2006/ 1480 04 diciembre de 2014	1320 m3 1934.3 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No. 42832 del 27 de octubre de 2025
	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	Excavación de tierras Arcillas y Recebos	No. IDU 421 Vigencia 25/08/2025	45 m^3 5772 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No.CERT-2124-2025 del 10 de octubre de 2025
PERIODO 6 1 - 31 DE OCTUBRE 2025	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	225 m3 370.8 Ton	**SI** CERT-TM-0202-2025 del 07 de | de 2025
	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	Excavación de tierras Arcillas y Recebos	No. IDU 421 Vigencia 25/08/2025	75 m^3 96.20 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No.CERT-2339-2025 del 10 de NOVIEMBRE de

					2025
PERIODO 7 1 - 30 DE NOVIEMBRE 2025	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	420 m3 692.16 Ton	**SI** CERT-TM-0221-2025 del 15 DICIEMBRE 2025
PERIODO 8 1 - 31 DE DICEIMBRE 2025	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	720 m3 1186.56 Ton	**SI** CERT-TM-001-2026 del 03/01/2026
	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S	Excavación de tierras Arcillas y Recebos	No. IDU 421 Vigencia 25/08/2025	45 m^3 57.72 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No.CERT-33-2026 del 08/01/2026
	INGEOMINERIA (San Antonio)	Excavación de tierras	No. IDU 654 Vigencia 12/11/2025	30 m3 69 Ton	**SI** CERTIFICACIÒN No.CERT-260004 del 09/01/2026
PERIODO 9 1 - 26 DE ENERO 2026	TECNOMINERALES ARENAS Y GRAVAS S.A.S	Recibo, acopio y aprovechamiento de RCD.	Registro No. 59 Corporación Autónoma de Cundinamarca	225 m3 370.80 Ton	**PENDIENTE**

En la siguiente tabla se presenta los posibles proveedores de disposición final de escombro y aprovechamiento aprobados por el IDU y la SDA.

Las validaciones de la vigencia y legalidad de los sitios se pueden realizar mediante los siguientes enlaces:

https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10284/1032703/DIRECTORIO+AMBIENTAL+RCD_ene.pdf/3f845a1d-8ab4-4ee2-ab11-5cf70f1779f0

A continuación, se relacionan las densidades a tener en cuenta para la conversión de los volúmenes a toneladas:

Tabla 14. Densidades para RCD y materiales

MANEJO DE RCD - GUIA SDA	
DENSIDAD DE LOS MATERIALES POR GRUPOS	
GRUPO	**DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m3)**
I-Residuos comunes mezclados	**1648,85**
II-Residuos de material fino	**1700**
III-Residuos comunes no inertes	**698,88**
IV-Residuos metálicos	**7307,67**
V-Residuos Orgánicos	**1282,71**
VI-Residuos contaminantes	**1891,28**

MATERIALES DE CONSTRUCCION	
TIPO DE MATERIAL	**DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m3)**
B:400	**1600**
SBG-B	**1600**
PIEDRA 30/40	**2700**
RAJON	**2700**
Triturado	**1400**
Mixto	**1500**
GCR	**1891,28**
ASFALTO	**1400**

- **Seguimiento a la Reutilización de RCD**

En el marco del Decreto 507 de 2023 la meta de aprovechamiento se calculará para el año de terminación del proyecto, sin tener en cuenta los productos de excavación y sobrantes de adecuación de terreno. De acuerdo a lo anterior el CONSORCIO SUBA MT en el marco de la ejecución del contrato de obra No FDLS-1013-2024-LP (119224) debe cumplir una meta de aprovechamiento de RCD del cincuenta por ciento (50%) de los RCD generados. Acorde al Programa de Manejo Ambiental de RCD entregado a la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la siguiente proyección de generación de RCD:

Tabla 15. Proyección de Genración de RCD

MATERIAL	Vol(M3)	TON
COBERTURAS VEGETALES	87	148
EXCAVACIÒN	6.400	10.880
DEMOLICIÓN	150	255
TOTAL	6.637	11.283
Meta de aprovechamiento 50% (demolición)		**127,5**

Fuente: CONSORCIO SUBA MT

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, teniendo en cuenta que el CONSORCIO SUBA MT genera un volumen de 225 m3 equivalentes a 370.80 toneladas de material de excavación, se informa que para este periodo no se reporta aprovechamiento in situ ya que el material de excavación corresponde a tierra arcillosa la cual es traslada a los sitios de disposición autorizados.

- **Control a la Reutilización de RCD**

Para el control de los RCD generados se anexan los siguientes formatos los cuales corresponden al reporte mensual que se debe entregar a la Secretaría Distrital de Ambiente:

1. Cantidad de materiales de construcción valorizados de RCD USADOS en obra

2. Anexo IV Constancia de Gestión. Gestor TECNOMINERALES ARENAS & GRAVAS SAS, identificada con NIT 901.674.891-6, prestador del servicio de recibo, acopio y aprovechamiento de RCD, en el predio LOTE 1, ubicado en la Vereda Siberia – Sector Parcelas, en el Municipio de Cota, departamento de Cundinamarca; inscrito como Gestor con el número de Registro 59, ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en el marco de las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021.

3. Anexos V Informe de Aprovechamiento IN SITU. Si bien no se ha realizado aprovechamiento In Situ, sin embargo, hasta la fecha del presente informe se han adquirido Subbase reciclada TIPO C, Subbase reciclada Peatonal, Rajón reciclado y triturado reciclado. Los volúmenes adquiridos se detallan en la **Tabla No.16**

   Los materiales reciclados son adquiridos en plantas de Reciclados Industriales de Colombia SAS y GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S. NIT. 900767473-7 Planta De Aprovechamiento De Residuos De Construcción Y Demolición Rcd Mediante Oficio Emitido Por La Corporación Autónoma Regional CAR No 9162109219 Del 31 De Oct De 2016 Y La Secretaría Agropecuaria De Medio Ambiente Y Desarrollo Económico (SAMADE) Del Municipio De Cota RI NO C015712 DEL 12 DE JUNIO 2017. Se anexa certificación correspondiente al mes de octubre de 2025.

Reciclados Industriales de Colombia SAS. Nit: 900.360.954-1. Con registro IDU 648-2022 y registro gestor CAR 015 dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Sostenible.

El volumen de demolición proyectado para el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No FDLS-1013- 2024-LP (119224) – Consorcio Suba MT es 150 M3, cuya meta de aprovechamiento proyectada es del cincuenta por ciento; equivalente a 75M3. Al cierre del presente informe, el Consorcio Suba MT está cumpliendo con la meta de aprovechamiento proyectada. Los volúmenes adquiridos se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 16. Aprovechamiento y Reutilización de RCD

Mes	Material	Volumen (M3)	Volumen (Ton)	Proveedor autorizado	CERTIFICADO S/N CERTIFICACIÓN No.
MAYO 2025	SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL	0	0	N/A	N/A
	TOTAL PERIODO	0	0		
	TOTAL ACUMULADO	0	0		
JUNIO 2025	SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL	0	0	N/A	N/A
	TOTAL PERIODO	0	0		
	TOTAL ACUMULADO	0	0		
JULIO 2025	N/A	0	0	N/A	N/A
	SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL	0	0		
	Total Periodo	0	0		
	Total Acumulado	0	0		
AGOSTO 2025	SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL	0	0	N/A	N/A
	Total Periodo	0	0		
	Total Acumulado	0	0		

SEPTIMBRE 2025	**SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL**	0	0	**N/A**	**N/A**
	Total Periodo	0	0		
	Total Acumulado	0	0		
OCTUBRE	**SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL**	45	65.25	GRECO S.A.S	SI CERT. GRE-2025-VA-01976 24/11/2025
	Total Periodo	45	65.25		
	Total Acumulado	45	65.25		
NOVIEMBRE	**SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL**	90	130.50	GRECO S.A.S	SI CERT-GRE-2025 -02005 15/12/2025
	Total Periodo	90	130.50		
	Total Acumulado	135	195.75		
DICIEMBRE	**RAJONCILLO DE ESCOMBRO**	45	54.00	RECICLADOS IND. DE COLOMBIA S.A.S	SI CERT-187-2026 27/01/2026
	AGREGADO TM 25 HT RCL	15	19.50	GRECO S.A.S	SI CERT-GRE-2026-VA -02045 22/01/2026
	SUB BASE RECICLADA TIPO C	105	152.25		CERT-GRE-2026-VA -01886 22/01/2026
	SUB BASE RECICLADA TIPO PEATONAL	210	304,5		
	AGREGADO 4”-6” HT	135	175,5		
	Total Periodo	510	705.75		
	Total Acumulado	645	904.50		

Tabla 16.1 Meta de Aprovechamiento

MATERIAL	VOLUMEN EXC. PROY. M3	TN	META DE APROV. 50%	TN	CUMPLIMIENTO OCTUBRE	TN	CUMPLIMIENTO NOVIEMBRE	TN	TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DEMOLICIÓN	150	247.2	75M3	123.6	45M3	74.16	30M3	49.44	50%

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 507 DE 2023 USO DE MATERIAL RECICLADO TIPO RCD PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS DE CIRCULARIDAD

Para dar cumplimiento al artículo 46 del Decreto 507 de 2023, relacionada con la Meta de Circularidad para grandes generadores de RCD en proyectos de obras públicas o privadas de infraestructura vial, urbanismo, espacio público, transporte o servicios públicos. el CONSORCIO SUBA MT ha optado por utilizar rajón y subbase reciclada dentro de las actividades de obra a realizar en el marco del contrato No. CTO-FDLS-1013-2024 (119224),

Es así que el CONSORCIO SUBA MT en cumplimiento a este Decreto incorpora el 23% en peso de los materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos.

META DE CIRCUALARIDAD 23%

Al cierre del presente informe y de acuerdo con la consolidación de cantidades el volumen total de material instalado en el proyecto corresponde a 6.195 M3, cuyo volumen exigido por meta de circularidad del 23% equivale a 1.424,85 m3

Tabla 16.2 Porcentaje meta de Circularidad

FECHA DE REPORTE	MATERIAL INSTALADO M3	MATERIAL INSTALADO TON.	MATERIAL RECICLADO M3	MATERIAL RECICLADO TON	PORCENTAJE ALCANZADO
26/01/2026	6.195	11.735,80	645	901.50	7,68%

7.2.4. Ficha B4. Control de emisiones atmosféricas

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT realizan acciones como la inspección de la maquinaria y volquetas con el fin de verificar que los mantenimientos y revisiones técnico mecánicas estén al día. Las volquetas de los frentes de obra salen carpadas para evitar la dispersión de material particulado, se procura mantener las vías de acceso limpias, evitando la generación de material particulado.

- Se hace implementación de actividades encaminadas al cumplimiento normativo del decreto 507 del 2023, en lo referente a gestión integral de los residuos de construcción y demolición RCD provenientes de este tipo de obra, sincronización de vehículos y equipos utilizados para el transporte

de materiales.

- Se hace la instalación de cerramiento perimetral de obra, lo cual minimizará la generación de material particulado a las zonas aledañas.

- Se garantiza el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria.

- Los RCD se protegen con polipropileno negro, con el fin de evitar dispersión de material particulado y arrastre de este.

- Se garantiza que la carga transportada este siempre cubierta, con el fin de evitar la dispersión de la misma o emisiones fugitivas

Indicadores

(actividades ejecutadas / actividades programadas) x 100

10/10*100=100%

(No de reportes por incumplimiento a medidas de control de emisiones atmosféricas/No reportes por incumplimiento de medidas ambientales del contrato) x 100

0/0*100=0%

Ver anexo 1. Programas de Gestión Ambiental

7.2.5. Ficha B5 Manejo Integral de Cuerpos De Agua y Sumideros

Cuerpos de Agua

Para el periodo reportado del 01 al 26 de ENERO del 2026, en los segmentos viales intervenidos, no hay presencia de cuerpos de agua, los cuales requieran permisos de ocupación de cauce. En las áreas de intervención del contrato no se han evidenciado cuerpos de agua existentes que requieran tramite o permiso ambiental ante las entidades competentes.

Protección de Sumideros

En la siguente tabla se relaciona los sumideros identificados

Tabla 16. Sumideros Identifiacados

CONTRATO: No. FDLS-1013-2024-LP (119224)								
No.	UBICACIÓN	DIRECCIÓN	ESTADO DEL SUMIDERO			MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			B	R	M	S	N	
1	Villa Cindy	Cll 136D Cra 157A -03	X					Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla
		Cll 136D Cra 157A -08		X				
3	Villa Cindy	Cll 136D Cra 157A -23	X					Se identifiacan dos sumideros colapsados por material de arrastre
		Cll 136D Cra 157A -14	X					
4	Villa Cindy	Cll 158B CLL 136 -04		X				Se identifiacan dos sumideros colapsados por material de arrastre
				X				
5	San Pedro	CRA 149B CLL 138 -20	X					Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. Está saturado de material sólido
		CRA 149B CLL 138 - 19	X					
7	San Pedro	CRA 138 CLL 149-08	X					Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. Está saturado de material sólido
		CRA 138 CLL 149-05	X					
8	San Pedro	CRA 138 CLL 149C-04		X				Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. Está saturado de material sólido
				X				
9	San Pedro	CLL 134A CRA 148A-12		X				Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. Está saturado de material sólido
		CLL 134A CRA 147C-18		X				
10	Santa Rita	TV 150A CLL 136A-08	X					Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. Está saturado de material sólido
		TV 150A CLL 136A-08		X				
11	Santa Rita		X					Se identifiacan dos sumideros y se protegen con geomalla. La rejilla está incompleta
		CRA 150C CLL 136A-04		X				

Las acciones encaminadas a proteger os sumideros durante el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, se relacionan a continuación:

Calle 137 con carrera158B villa Cindy no se identificaron sumideros

- Calle136Dcon cra 157ª Villa Cindy se identificaron 2 sumidero





- Se identificaron dos sumideros a los cuales se les realiza la protección y se cambia según el deterioro que presente.





- Se identificaron dos sumideros en la dirección cra 158 B con calle 136C



Para el desarrollo del contrato, a la fecha se cuenta con una oficina ubicada en la calle 133#92ª- 47, donde se desarrollaron las actividades administrativas, adicionalmente cuenta con las condiciones mínimas de higiene y seguridad establecidas en el componente manejo ambiental, como el punto ecológico, punto de hidratación, extintor, botiquín, área de herramientas, sala de máquinas, kit antiderrames y baños.

Indicadores

(Nº de Campamentos Instalados / Nº de Campamentos Programados) x 100

1/1*100=100%

(No. de campamentos retirados/No de Campamentos instalados) x 100

0/0*100=0%

Ver anexo 1. Programas de gestión ambiental
Ver anexo 2. Registro fotográfico

Suministro de agua

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, el CONSORCIO SUBA MT no hizo compra de agua industrial para la ejecución de las obras.

7.3. Componente C: manejo de vegetación y paisaje

A la fecha, se determina que para la ejecución del contrato no se proyecta ningún tratamiento silvicultural, en las áreas de intervención del periodo no se evidenciaron individuos arbóreos que requieran de aislamiento y/o protección.

FICHA C1 – Manejo De Vegetación

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, la interventoría informa que de acuerdo a las inspecciones realizadas por el CONSORCIO SUBA MT, en los tramos de intervención no hay individuos arbóreos ni zonas verdes.

FICHA C2 – Manejo Fauna Silvestre

Para el periodo de reporte del 01 al 26 de ENERO del 2026, de acuerdo a las inspecciones realizadas y por el CONSORCIO SUBA MT, en los tramos en intervención, no hubo presencia de fauna silvestre y no se hicieron rescates de fauna.

Indicadores

(actividades ejecutadas / actividades programadas) x 100 0/0*100=0%

(No de reportes por incumplimiento a medidas de manejo de vegetación/No reportes por incumplimiento de medidas ambientales del contrato) x 100

0/0*100=0%

7.4. Componente E: Señalización frentes de obra y sitios temporales

Los espacios de la obra se señalizaron como medida preventiva, informando a la comunidad que es un espacio de obra, que por seguridad no se permite el paso de personal ajeno, señalando el sendero peatonal; indicación al personal de obra el uso de elementos de protección personal, la prohibición de consumo de cigarrillo dentro del área, advertencia sobre la presencia de excavaciones y trabajos sobre la vía, ubicación campamento, punto ecológico, salidas de emergencia, rutas de evacuación, señalización, lo cual será evidenciado mediante registro fotográfico.

Para el desarrollo constructivo en cada CIV se implementará Plan de Manejo de Tránsito - PMT, los cuales se registran en el informe técnico con sus respectivas vigencias y registros fotográficos.



Indicadores

(actividades ejecutadas / actividades programadas) x 100

9/9*100=100%

(No de reportes por incumplimiento medidas de señalización /No reportes por incumplimiento de medidas ambientales del contrato) x 100

0/0*100=0%

Ver anexo 1. Programas de Gestión Ambiental
Ver anexo 2. Registro fotográfico

7.5. Manejo de maquinaria y volquetas

Los vehículos a emplear durante el periodo para retiro de RCD, cuentan con registro ante secretaría de ambiente y cuentan con su respetivo PIN:

Tabla 17. Vehículos usados durante el periodo

PLACA	PIN
TAY136	16615
SKZ123	18051
SOS175	19863
USD821	17
WEQ751	6858
SOP235	4078
SSZ090	23278
TDS945	8341
THY036	4720
SXS787	25595

Fuente: CONSORCIO SUBA MT, 2024

Las validaciones de los respectivos pines de cada vehículo se pueden validar mediante el siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/documents/10284/841315/TRANSPORTADORES+INSCRITOS+ESCOMBROS_+%2821%29.pdf/152c6f11-6626-4e62-b671-e7df18817c2d

8. CONCLUSIONES

- Para el periodo del presente informe se continua con las actividades de construcción en veinte frentes de obra implementando las actividades del MAO.
- Diez y nueve CIV´s se encuentran terminados en etapa de remates y acabados para pre entrega.
- Se retiró el PMT que se había instalado en los CIV´s ubicados en Villa Cindy, Santa Cecilia, Santa Rita, San Pedro y Lisboa.
- Durante el periodo reportado del 01 al 26 de ENERO del 2026 no se generó accidentes ni incidentes ambientales.
- En los sitios de intervención de los corredores viales no se requieren permisos ambientales como ocupación de cauce y/o aprovechamiento forestal, toda vez que no hay individuos arbóreos ni cuerpos de agua.
- Para la ejecutar las actividades de construcción durante el periodo 01 al 26 de ENERO el Consorcio Suba MT no requiere hacer compra de agua para uso industrial.
- Para el periodo reportado no se hace aprovechamiento de RCD en cuanto el material extraído presenta mezcla de tierra con pedazos de ladrillo, piedra y concreto no apto para su reutilización en obra.
- Se hace la correcta separación de residuos solidos ordinarios en el campamento y se entregan en la ruta de recolección del Gestor zonal.
- Al cierre del presente informe se cumple con la meta de aprovechamiento, con la reutilización de 75 M3 de subbase granular reciclada tipo peatonal, adquirida en la planta de Greco S.A.S.
- El porcentaje para alcance de la meta de circularidad del Decreto 507 de 2023, a 31 de diciembre del 2025 es del 7.68%
