CONSTRUFUTURO

HUMEDALES URBANOS

Nit. 805021814-9

Santiago de Cali, Diciembre 11 de 2025

CF-015-2025

Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Atn: ORLANDO BARRETO
Ciudad

Asunto: Radicación Acta Parcial de Obra No. 1 – Contrato de Obra CVC No. 0741 de 2025

Cordial saludo,

Por parte de la Fundación Construyamos Futuro – CONSTRUFUTURO, me permito radicar ante usted la Acta de Cobro Parcial No. 1 correspondiente a las actividades ejecutadas dentro del marco del Contrato de Obra Pública CVC No. 0741 de 2025, cuyo objeto es "Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario".

Para efectos de su revisión, validación y trámite ante las áreas correspondientes de la CVC, adjunto la siguiente documentación obligatoria y complementaria:

Documentos anexos

-Factura electrónica correspondiente al Acta Parcial No. 1.
-Tres (3) copias del Acta Parcial de Obra No. 1 debidamente firmadas por el contratista.
-Memoria de cantidades ejecutadas correspondientes al Acta Parcial No. 1.
-Informe Técnico Mensual No. 1, con sus respectivos anexos fotográficos, sociales, ambientales y de soporte.
-Registro Único Tributario – RUT actualizado.
-Certificación bancaria de la cuenta destinada para pagos del contrato.
-Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, correspondiente al periodo exigido.

Quedo atento a cualquier requerimiento, ajuste o información adicional que considere pertinente para la continuidad del proceso administrativo

Atentamente,

SebastianC.

Juan Sebastian Castrillon
C.C. 1.144.089.580 de Cali

CVC CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
11/12/2025 14:18:52
Remitente: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Asunto: RADICACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1- CONTRATO DE OBRA CVC NO. 0741 DE 2025
Destinatario: ORLANDO BARRETO AGUDELO
Radicado: *1224752025* Folios: 383

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN				$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000		$ 45.000.000
1.1	PRELIMINARES										
1.1.1	SOCIALIZACIÓN	UND	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000	$ -	$ -	6	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000
1.1.2	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS	UND	6	$ 5.800.000,00	$ 34.800.000	$ -	$ -	6	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000
	SUBTOTAL CAP 1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN:				$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000		$ 45.000.000
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS				$ 899.561.768		$ -		$ 317.752.511		$ 317.752.511
2.1	PRELIMINARES										
2.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1986	$ 4.142,00	$ 8.226.012	$ -	$ -	1986,00	$ 8.226.012	1986	$ 8.226.012
2.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	1986	$ 3.683,00	$ 7.314.438	$ -	$ -	1986,00	$ 7.314.438	1986	$ 7.314.438
2.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA					$ -					
2.2.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	12000	$ 6.073,00	$ 72.876.000	$ -	$ -	7521,40	$ 45.677.462	7521,4	$ 45.677.462
2.2.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	18000	$ 3.541,00	$ 63.738.000	$ -	$ -	2500,00	$ 8.852.500	2500	$ 8.852.500
2.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	100	$ 798.820,00	$ 79.882.000	$ -	$ -	100	$ 79.882.000	100	$ 79.882.000
2.2.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	100	$ 449.273,00	$ 44.927.300	$ -	$ -	100	$ 44.927.300	100	$ 44.927.300
2.3	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES										
2.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	377	$ 37.878,00	$ 14.280.383	$ -	$ -	377,00	$ 14.280.383	377	$ 14.280.383
2.3.2	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	507,6	$ 10.540,00	$ 5.350.104	$ -	$ -	507,6	$ 5.350.104	507,6	$ 5.350.104
2.3.3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	507,6	$ 51.500,00	$ 26.141.400	$ -	$ -	507,6	$ 26.141.400	507,6	$ 26.141.400
2.3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	139	$ 140.297,00	$ 19.501.283	$ -	$ -	139	$ 19.501.283	139	$ 19.501.283
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	3122	$ 57.490,00	$ 179.483.780	$ -	$ -	544,00	$ 31.274.560	544	$ 31.274.560
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	1786	$ 123.941,00	$ 221.358.626	$ -	$ -	212,4	$ 26.325.068	212,4	$ 26.325.068
2.4	PASOS ELEVADOS										
2.4.1	FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI	KLS	2997,3	$ 20.675,00	$ 61.969.178	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.4.2	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	5,13	$ 1.085.280,00	$ 5.567.486	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	909,21	$ 7.319,00	$ 6.654.508	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	22	$ 65.621,00	$ 1.443.662	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5	PERGOLA DE RECIBIMIENTO PARA VISITANTES										
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	28,51	$ 78.746,00	$ 2.245.048	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	81,2	$ 148.794,00	$ 12.082.073	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8,6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	58,92	$ 53.510,00	$ 3.152.809	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)	ML	22,8	$ 106.158,00	$ 2.420.402	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL	UND	96	$ 122.585,00	$ 11.768.160	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)	UND	6	$ 331.621,00	$ 1.989.726	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.7	CABALLETE PARA CUBIERTA	ML	5,8	$ 55.091,00	$ 319.528	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)	M2	39,8	$ 114.095,00	$ 4.540.981	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.9	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	1	$ 1.085.280,00	$ 1.085.280	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	22	$ 57.490,00	$ 1.264.780	$ -	$ -		$ -	0	$ -



COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

		UND									
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	20	$ 123.941,00	$ 2.478.820	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.6	**BATERIAS SANITARIAS**										
2.6.1	BATERIA SANITARIA DOTADA Y AOTA PARA USO (INC, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)	UND	2	$ 12.700.000,00	$ 25.400.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.6.2	CONEXIÓN A REDES EXISTENTES	GLB	1	$ 12.100.000,00	$ 12.100.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
				SUBTOTAL CAP. 2 HUMEDAL CAÑASGORDAS:	$ 899.561.768		$ -		$ 317.752.511		$ 317.752.511
3	**HUMEDAL PANAMERICANO**				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -
3.1	**PRELIMINARES**										
3.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	886,8	$ 4.142,00	$ 3.673.126	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	130	$ 3.683,00	$ 478.790	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	98	$ 21.165,00	$ 2.074.170	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**										
3.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	3500	$ 3.541,00	$ 12.393.500	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	45	$ 798.820,00	$ 35.946.900	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	120	$ 449.273,00	$ 53.912.760	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3	**ADECUACIÓN DE SENDERO PEATONAL**										
3.3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)	M2	887	$ 28.208,00	$ 25.020.496	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	941	$ 68.508,00	$ 64.466.028	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.3	RETIRO DE ADOQUÍN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M2	591	$ 11.622,00	$ 6.868.602	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	591	$ 123.941,00	$ 73.249.131	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.5	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	106	$ 51.500,00	$ 5.459.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1534	$ 7.319,00	$ 11.227.346	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4	**ESTRUCTURA DE REBOSE-SALIDA**										
3.4.1	**PRELIMINARES**										
3.4.1.1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN	MES	1	$ 9.459.195,00	$ 9.459.195	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2		$ 3.683,00	$ -	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
3.4.2.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	36,75	$ 22.629,00	$ 831.616	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0.05M (NO INC.ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	8,4	$ 21.516,00	$ 180.734	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	248,99	$ 37.879,00	$ 9.431.492	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	134,568	$ 140.297,00	$ 18.879.487	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	58,569	$ 36.237,00	$ 2.122.365	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.6	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	199,946	$ 10.540,00	$ 2.107.431	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.7	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	199,946	$ 51.500,00	$ 10.297.219	$ -	$ -		$ -	0	$ -

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

HUMEDALES URBANOS

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.4.3	**OBRAS DE ARTE**										
3.4.3.1	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05-0.07M	M2	8,925	$ 40.434,57	$ 360.879	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.3.2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)	M3	6,4365	$ 1.098.197,07	$ 7.068.545	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1319,85	$ 7.319,00	$ 9.659.882	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.4	**TUBERÍA DE REBOSE**					$ -					
3.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO ø=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)	ML	114,66	$ 993.960,61	$ 113.967.524	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)	UND	2,1	$ 13.413.978,60	$ 28.169.355	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.4.3	REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA (INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)	M2	8,4	$ 975.800,00	$ 8.196.720	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.4.4	REPOSICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0,1M (INC. ACERO DE REFUERZO)	M2	36,75	$ 206.007,56	$ 7.570.778	$ -	$ -		$ -	0	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -
4	**HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS**				$ 157.304.931		$ -		$ 124.025.237		$ 124.025.237
4.1	**PRELIMINARES**										
4.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	413	$ 4.142,00	$ 1.710.646	$ -	$ -	120	$ 497.040	120	$ 497.040
4.2	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**					$ -					
4.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	$ -	$ -	4000	$ 14.164.000	4000	$ 14.164.000
4.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	90	$ 798.820,00	$ 71.893.800	$ -	$ -	90	$ 71.893.800	90	$ 71.893.800
4.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	60	$ 449.273,00	$ 26.956.380	$ -	$ -	60	$ 26.956.380	60	$ 26.956.380
4.3	**ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL**										
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	24	$ 37.879,00	$ 909.096	$ -	$ -	24	$ 909.096	24	$ 909.096
4.3.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	15,6	$ 140.297,00	$ 2.188.633	$ -	$ -	15,6	$ 2.188.633	15,6	$ 2.188.633
4.3.3	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	92	$ 68.508,00	$ 6.302.736	$ -	$ -	80	$ 5.480.640	80	$ 5.480.640
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	120	$ 250.120,00	$ 30.014.400	$ -	$ -		$ -	0	$ -
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	168	$ 7.319,00	$ 1.229.592	$ -	$ -		$ -	0	$ -
4.3.6	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	31,2	$ 51.500,00	$ 1.606.800	$ -	$ -	31,2	$ 1.606.800	31,2	$ 1.606.800
4.3.7	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	31,2	$ 10.540,00	$ 328.848	$ -	$ -	31,2	$ 328.848	31,2	$ 328.848
	SUBTOTAL CAP. 4 HUMEDAL PARQUEDE LAS GARZAS:				$ 157.304.931		$ -		$ 124.025.237		$ 124.025.237
5	**HUMEDAL LA BABILLA**				$ 90.440.640		$ -		$ 60.817.063		$ 60.817.063
5.1	**RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA**										
5.1.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	800	$ 6.073,00	$ 4.858.400	$ -	$ -	800	$ 4.858.400	800	$ 4.858.400
5.1.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	$ -	$ -	1141,04	$ 4.040.423	1141,04	$ 4.040.423
5.1.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	20	$ 798.820,00	$ 15.976.400	$ -	$ -	20	$ 15.976.400	20	$ 15.976.400
5.1.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	80	$ 449.273,00	$ 35.941.840	$ -	$ -	80	$ 35.941.840	80	$ 35.941.840
5.2	**AIREADORES**										
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA	UND	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
	SUBTOTAL CAP. 5 HUMEDAL LA BABILLA:				$ 90.440.640		$ -		$ 60.817.063		$ 60.817.063

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

		UND									
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO				$ 255.627.551		$ -		$ 255.627.598		$ 255.627.598
6.1	PRELIMINARES										
6.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1443,75	$ 4.142,00	$ 5.980.013	$ -	$ -	1443,75	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013
6.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA										
6.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	3002,71	$ 6.973,00	$ 20.937.897	$ -	$ -	3002,71	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	755,18	$ 84.878,00	$ 64.098.168	$ -	$ -	755,18	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168
6.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1316,078	$ 23.596,00	$ 31.054.176	$ -	$ -	1316,08	$ 31.054.224	1316,08	$ 31.054.224
6.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	2071,258	$ 51.500,00	$ 106.669.787	$ -	$ -	2071,258	$ 106.669.787	2071,258	$ 106.669.787
6.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL										
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	2068,27	$ 13.000,00	$ 26.887.510	$ -	$ -	2068,27	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510
	SUBTOTAL CAP. 6 HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO:				$ 255.627.551		$ -		$ 255.627.598		$ 255.627.598

7	HUMEDAL IBIS				$ 303.409.176		$ -		$ -		$ -
7.1	PRELIMINARES										
7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1339	$ 4.142,00	$ 5.546.138	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.1.2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	M2	325	$ 24.314,00	$ 7.902.050	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA										
7.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	15684,9	$ 6.973,00	$ 109.370.808	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	568	$ 84.878,00	$ 48.210.704	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1371,40	$ 23.596,21	$ 32.359.847	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	1121,7	$ 51.500,00	$ 57.767.550	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL										
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	3250,16	$ 13.000,00	$ 42.252.080	$ -	$ -		$ -	0	$ -
	SUBTOTAL CAP. 7 HUMEDAL IBIS:				$ 303.409.176		$ -		$ -		$ -

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

		UNI									
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO				$ 230.000.000		$ -		$ 172.500.000		$ 172.500.000
8.1	ESTRATEGIA										
8.1.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS	UND	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000	$ -	$ -	1,5	$ 172.500.000	1,5	$ 172.500.000
	SUBTOTAL CAP. 8 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO:				$ 230.000.000		$ -		$ 172.500.000		$ 172.500.000
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES				$ 111.100.000		$ -		$ 50.500.000		$ 50.500.000
9.1	DIAGNÓSTICO										
9.1.1	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	UND	11	$ 10.100.000,00	$ 111.100.000	$ -	$ -	5	$ 50.500.000	5	$ 50.500.000
	SUBTOTAL CAP. 9 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES:				$ 111.100.000		$ -		$ 50.500.000		$ 50.500.000
	VALOR COSTOS TOTALES				$ 2.615.517.236		$ -		$ 1.026.222.408		$ 1.026.222.408

COSTOS INDIRECTOS					
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)		$ 150.000.000		$ 58.853.889,07	$ 58.853.889,07
PLAN DE EMANEJO DE TRÁNSITO (PMT)		$ 29.950.045		$ -	$ -
VALOR COSTOS DIRECTOS		$ 2.615.517.236	$ -	$ 1.026.222.408,49	$ 1.026.222.408,49
ADMINISTRACION	25,75%	$ 673.495.688	$ -	$ 264.252.270	$ 264.252.270
IMPREVISTOS	0,25%	$ 6.538.793	$ -	$ 2.565.556	$ 2.565.556
UTILIDAD	4%	$ 104.620.689	$ -	$ 41.048.896	$ 41.048.896
TOTAL AIU	30,00%	$ 784.655.171	$ -	$ 307.866.723	$ 307.866.723
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 19.877.930	$ -	$ 7.799.290	$ 7.799.290
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		$ 3.600.000.382	$ -	$ 1.400.742.310	$ 1.400.742.310
COSTO TOTAL OBRA		$ 3.600.000.382	$ -	$ 1.400.742.310	$ 1.400.742.310

ESTADO DE CUENTAS	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 1.080.000.114,60
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 420.222.693,03
SALDO AMORTIZADO	$ 420.222.693,03
SALDO POR AMORTIZAR	$ 659.777.421,57

EJECUCIÓN	
OBRA CONTRATADA	$ 3.600.000.382,00
OBRA EJECUTADA A LA FECHA	$ 1.400.742.310,11
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 1.400.742.310,11
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:	$ 420.222.693,03
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.1:	$ 980.519.617,08
% EJECUTADO ACTA	38,91%
% EJECUTADO A LA FECHA	38,91%

V° B° Interventoría
Arq. Jeannete Nieto López
Representante legal
Consorcio Interventoría Humedales 2025

V° B° Contratista
Guillermo Paz Muñoz
Representante Legal
Fundacion Construyamos Futuro Construfuturo

HUMEDALES URBANOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN				$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000			$ 45.000.000
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	SOCIALIZACIÓN	UND	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000	$ -	$ -	6	$ 10.200.000	6		$ 10.200.000
1.1.2	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS	UND	6	$ 5.800.000,00	$ 34.800.000	$ -	$ -	6	$ 34.800.000	6		$ 34.800.000
	SUBTOTAL CAP 1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN:				$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000			$ 45.000.000
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS				$ 899.561.768		$ -		$ 317.752.511			$ 317.752.511
2.1	PRELIMINARES											
2.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1986	$ 4.142,00	$ 8.226.012	$ -	$ -	1986,00	$ 8.226.012	1986		$ 8.226.012
2.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	1986	$ 3.683,00	$ 7.314.438	$ -	$ -	1986,00	$ 7.314.438	1986		$ 7.314.438
2.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA					$ -						
2.2.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	12000	$ 6.073,00	$ 72.876.000	$ -	$ -	7521,40	$ 45.677.462	7521,4		$ 45.677.462
2.2.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	18000	$ 3.541,00	$ 63.738.000	$ -	$ -	2500,00	$ 8.852.500	2500		$ 8.852.500
2.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	100	$ 798.820,00	$ 79.882.000	$ -	$ -	100	$ 79.882.000	100		$ 79.882.000
2.2.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	100	$ 449.273,00	$ 44.927.300	$ -	$ -	100	$ 44.927.300	100		$ 44.927.300
2.3	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES											
2.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	377	$ 37.879,00	$ 14.280.383	$ -	$ -	377,00	$ 14.280.383	377		$ 14.280.383
2.3.2	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	507,6	$ 10.540,00	$ 5.350.104	$ -	$ -	507,6	$ 5.350.104	507,6		$ 5.350.104
2.3.3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	507,6	$ 51.500,00	$ 26.141.400	$ -	$ -	507,6	$ 26.141.400	507,6		$ 26.141.400
2.3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	139	$ 140.297,00	$ 19.501.283	$ -	$ -	139	$ 19.501.283	139		$ 19.501.283
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	3122	$ 57.490,00	$ 179.483.780	$ -	$ -	544,00	$ 31.274.560	544		$ 31.274.560
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	1786	$ 123.941,00	$ 221.358.626	$ -	$ -	212,4	$ 26.325.068	212,4		$ 26.325.068
2.4	PASOS ELEVADOS											
2.4.1	FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI	KLS	2997,3	$ 20.675,00	$ 61.969.178	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.4.2	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	5,13	$ 1.085.280,00	$ 5.567.486	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	909,21	$ 7.319,00	$ 6.654.508	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	22	$ 65.621,00	$ 1.443.662	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5	PERGOLA DE RECIBIMIENTO PARA VISITANTES											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	28,51	$ 78.746,00	$ 2.245.048	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	81,2	$ 148.794,00	$ 12.082.073	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8.6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	58,92	$ 53.510,00	$ 3.152.809	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)	ML	22,8	$ 106.158,00	$ 2.420.402	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL	UND	96	$ 122.585,00	$ 11.768.160	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)	UND	6	$ 331.621,00	$ 1.989.726	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.7	CABALLETE PARA CUBIERTA	ML	5,8	$ 55.091,00	$ 319.528	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)	M2	39,8	$ 114.095,00	$ 4.540.981	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.9	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	1	$ 1.085.280,00	$ 1.085.280	$ -	$ -		$ -	0		$ -
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	22	$ 57.490,00	$ 1.264.780	$ -	$ -		$ -	0		$ -

HUMEDALES URBANOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	20	$ 123.941,00	$ 2.478.820	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.6	BATERIAS SANITARIAS										
2.6.1	BATERIA SANITARIA DOTADA Y AOTA PARA USO (INC, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)	UND	2	$ 12.700.000,00	$ 25.400.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
2.6.2	CONEXIÓN A REDES EXISTENTES	GLB	1	$ 12.100.000,00	$ 12.100.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
	SUBTOTAL CAP. 2 HUMEDAL CAÑASGORDAS:				$ 899.561.768		$ -		$ 317.752.511		$ 317.752.511
3	HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -
3.1	PRELIMINARES										
3.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	888,8	$ 4.142,00	$ 3.679.126	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0,1M	M2	130	$ 3.683,00	$ 478.790	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	98	$ 21.165,00	$ 2.074.170	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA										
3.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	3500	$ 3.541,00	$ 12.393.500	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	45	$ 798.820,00	$ 35.946.900	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	120	$ 449.273,00	$ 53.912.760	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3	ADECUACIÓN DE SENDERO PEATONAL										
3.3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)	M2	887	$ 28.208,00	$ 25.020.496	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	941	$ 68.508,00	$ 64.466.028	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.3	RETIRO DE ADOQUÍN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M2	591	$ 11.622,00	$ 6.868.602	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20108 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	591	$ 123.941,00	$ 73.249.131	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.5	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	106	$ 51.500,00	$ 5.459.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1534	$ 7.319,00	$ 11.227.346	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4	ESTRUCTURA DE REBOSE-SALIDA										
3.4.1	PRELIMINARES										
3.4.1.1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN	MES	1	$ 9.459.195,00	$ 9.459.195	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0,1M	M2		$ 3.683,00	$ -	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA										
3.4.2.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	36,75	$ 22.629,00	$ 831.618	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0.05M (NO INC.ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	8,4	$ 21.516,00	$ 180.734	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	248,99	$ 37.879,00	$ 9.431.492	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	134,568	$ 140.297,00	$ 18.879.487	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	58,569	$ 36.237,00	$ 2.122.365	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.6	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	199,946	$ 10.540,00	$ 2.107.431	$ -	$ -		$ -	0	$ -
3.4.2.7	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	199,946	$ 51.500,00	$ 10.297.219	$ -	$ -		$ -	0	$ -

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

3.4.3	OBRAS DE ARTE											
3.4.3.1	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05-0.07M	M2	8,925	$ 40.434,57	$ 360.879	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.3.2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)	M3	6,4365	$ 1.098.197,07	$ 7.068.545	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1319,85	$ 7.319,00	$ 9.659.882	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.4	TUBERÍA DE REBOSE					$ -						
3.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO o=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)	ML	114,66	$ 993.960,61	$ 113.967.524	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)	UND	2,1	$ 13.413.978,60	$ 28.169.355	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.4.3	REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA (INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)	M2	8,4	$ 975.800,00	$ 8.196.720	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
3.4.4.4	REPOSICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0.1M (INC. ACERO DE REFUERZO)	M2	36,75	$ 206.007,56	$ 7.570.778	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 3 HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -	
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS				$ 157.304.931		$ -		$ 124.025.237		$ 124.025.237	
4.1	PRELIMINARES											
4.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	413	$ 4.142,00	$ 1.710.646	$ -	$ -	120	$ 497.040	120	$ 497.040	
4.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA					$ -						
4.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	$ -	$ -	4000	$ 14.164.000	4000	$ 14.164.000	
4.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	90	$ 798.820,00	$ 71.893.800	$ -	$ -	90	$ 71.893.800	90	$ 71.893.800	
4.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	60	$ 449.273,00	$ 26.956.380	$ -	$ -	60	$ 26.956.380	60	$ 26.956.380	
4.3	ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL											
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	24	$ 37.879,00	$ 909.096	$ -	$ -	24	$ 909.096	24	$ 909.096	
4.3.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	15,6	$ 140.297,00	$ 2.188.633	$ -	$ -	15,6	$ 2.188.633	15,6	$ 2.188.633	
4.3.3	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	92	$ 68.508,00	$ 6.302.736	$ -	$ -	80	$ 5.480.640	80	$ 5.480.640	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	120	$ 250.120,00	$ 30.014.400	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	168	$ 7.319,00	$ 1.229.592	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
4.3.6	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	31,2	$ 51.500,00	$ 1.606.800	$ -	$ -	31,2	$ 1.606.800	31,2	$ 1.606.800	
4.3.7	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	31,2	$ 10.540,00	$ 328.848	$ -	$ -	31,2	$ 328.848	31,2	$ 328.848	
	SUBTOTAL CAP. 4 HUMEDAL PARQUEDE LAS GARZAS:				$ 157.304.931		$ -		$ 124.025.237		$ 124.025.237	
5	HUMEDAL LA BABILLA				$ 90.440.640		$ -		$ 60.817.063		$ 60.817.063	
5.1	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA											
5.1.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	800	$ 6.073,00	$ 4.858.400	$ -	$ -	800	$ 4.858.400	800	$ 4.858.400	
5.1.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	$ -	$ -	1141,04	$ 4.040.423	1141,04	$ 4.040.423	
5.1.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	20	$ 798.820,00	$ 15.976.400	$ -	$ -	20	$ 15.976.400	20	$ 15.976.400	
5.1.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	80	$ 449.273,00	$ 35.941.840	$ -	$ -	80	$ 35.941.840	80	$ 35.941.840	
5.2	AIREADORES											
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA	UND	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000	$ -	$ -		$ -	0	$ -	
	SUBTOTAL CAP. 5 HUMEDAL LA BABILLA:				$ 90.440.640		$ -		$ 60.817.063		$ 60.817.063	

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

		UND									
6	**HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO**				$ 255.627.551		$ -		$ 255.627.598		$ 255.627.598
6.1	**PRELIMINARES**										
6.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1443,75	$ 4.142,00	$ 5.980.013	$ -	$ -	1443,75	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013
6.2	**LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA**										
6.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	3002,71	$ 6.973,00	$ 20.937.897	$ -	$ -	3002,71	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	755,18	$ 84.878,00	$ 64.098.168	$ -	$ -	755,18	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168
6.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1316,078	$ 23.596,00	$ 31.054.176	$ -	$ -	1316,08	$ 31.054.224	1316,08	$ 31.054.224
6.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	2071,258	$ 51.500,00	$ 106.669.787	$ -	$ -	2071,258	$ 106.669.787	2071,258	$ 106.669.787
6.3	**RECUPERACIÓN AMBIENTAL**										
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	2068,27	$ 13.000,00	$ 26.887.510	$ -	$ -	2068,27	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510
	SUBTOTAL CAP. 6 HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO:				$ 255.627.551		$ -		$ 255.627.598		$ 255.627.598

7	**HUMEDAL IBIS**				$ 303.409.176		$ -		$ -		$ -
7.1	**PRELIMINARES**										
7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1339	$ 4.142,00	$ 5.546.138	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.1.2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	M2	325	$ 24.314,00	$ 7.902.050	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2	**LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA**										
7.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	15684,9	$ 6.973,00	$ 109.370.808	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	568	$ 84.878,00	$ 48.210.704	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1371,40	$ 23.596,21	$ 32.359.847	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	1121,7	$ 51.500,00	$ 57.767.550	$ -	$ -		$ -	0	$ -
7.3	**RECUPERACIÓN AMBIENTAL**										
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	3250,16	$ 13.000,00	$ 42.252.080	$ -	$ -		$ -	0	$ -
	SUBTOTAL CAP. 7 HUMEDAL IBIS:				$ 303.409.176		$ -		$ -		$ -

16

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC

ACTA PARCIAL No.1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	PERIODO	07/10/2025 a 05/12/2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025
VALOR CONTRATO INT.			

	DESCRIPCIÓN	UND										
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO				$ 230.000.000		$ -		$ 172.500.000		$ 172.500.000
8.1	ESTRATEGIA										
8.1.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS	UND	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000	$ -	$ -	1,5	$ 172.500.000	1,5	$ 172.500.000
	SUBTOTAL CAP. 8 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO:				$ 230.000.000		$ -		$ 172.500.000		$ 172.500.000
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES				$ 111.100.000		$ -		$ 50.500.000		$ 50.500.000
9.1	DIAGNÓSTICO										
9.1.1	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	UND	11	$ 10.100.000,00	$ 111.100.000	$ -	$ -	5	$ 50.500.000	5	$ 50.500.000
	SUBTOTAL CAP. 9 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES:				$ 111.100.000		$ -		$ 50.500.000		$ 50.500.000
	VALOR COSTOS TOTALES				$ 2.615.517.236		$ -		$ 1.026.222.408		$ 1.026.222.408
	COSTOS INDIRECTOS										
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)				$ 150.000.000				$ 58.853.889,07		$ 58.853.889,07
	PLAN DE EMANEJO DE TRÁNSITO (PMT)				$ 29.950.045				$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 2.615.517.236		$ -		$ 1.026.222.408,49		$ 1.026.222.408,49
	ADMINISTRACION	25,75%			$ 673.495.688		$ -		$ 264.252.270		$ 264.252.270
	IMPREVISTOS	0,25%			$ 6.538.793		$ -		$ 2.565.556		$ 2.565.556
	UTILIDAD	4%			$ 104.620.689		$ -		$ 41.048.896		$ 41.048.896
	TOTAL AIU	30,00%			$ 784.655.171		$ -		$ 307.866.723		$ 307.866.723
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 19.877.930		$ -		$ 7.799.290		$ 7.799.290
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 3.600.000.382		$ -		$ 1.400.742.310		$ 1.400.742.310
	COSTO TOTAL OBRA				$ 3.600.000.382		$ -		$ 1.400.742.310		$ 1.400.742.310

ESTADO DE CUENTAS	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 1.080.000.114,60
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 420.222.693,03
SALDO AMORTIZADO	$ 420.222.693,03
SALDO POR AMORTIZAR	$ 659.777.421,57

EJECUCIÓN	
OBRA CONTRATADA	$ 3.600.000.382,00
OBRA EJECUTADA A LA FECHA	$ 1.400.742.310,11
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 1.400.742.310,11
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:	$ 420.222.693,03
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.1:	$ 980.519.617,08
% EJECUTADO ACTA	38,91%
% EJECUTADO A LA FECHA	38,91%

V° B° Interventoría
Arq. Jeannete Nieto López
Representante legal
Consorcio Interventoría Humedales 2025

V° B° Contratista
Guillermo Paz Muñoz
Representante legal
Fundacion Construyamos Futuro Construfuturo

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	'Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario'
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1.1.2	und	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	1				1
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL CAÑASGORDAS	1				1
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL PANAMERICANO	1				1
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL IBIS	1				1
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	1				1
REVISION Y AJUSTE HUMEDAL BABILLA	1				1
		TOTAL			6
		CONTRACTUAL			6

PLANO

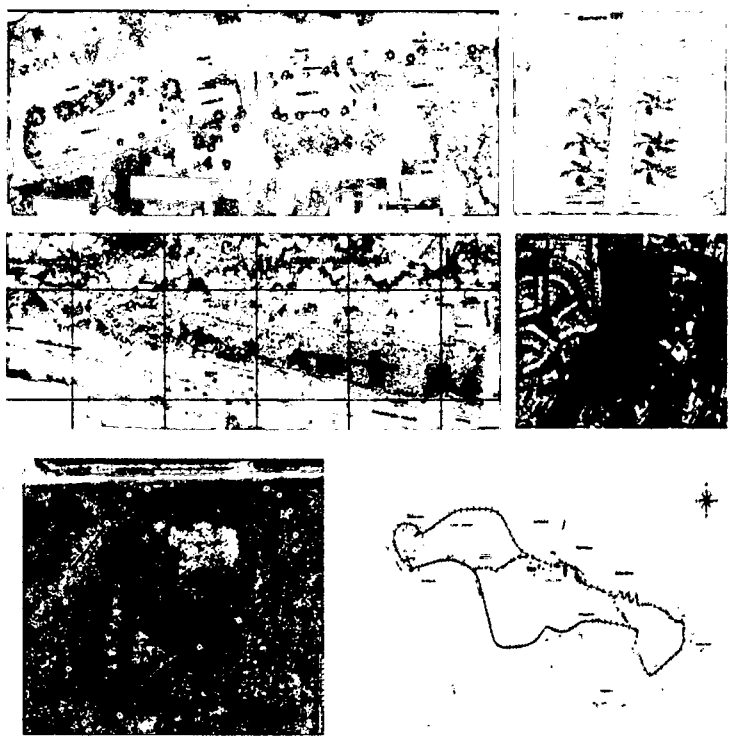

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1.1.1	UND	SOCIALIZACIÓN

UBICACIÓN	DIMENSIONES	
	CANTIDAD	TOTAL
Humedal Cañasgordas	1	1
Humedal Panamericano	1	1
Humedal Parque de las Garzas	1	1
Humedal Babilla	1	1
Humedal Ibis	1	1
Humedal Isaias Duarte Cancino	1	1
TOTAL		6
CONTRACTUAL		6

PLANO

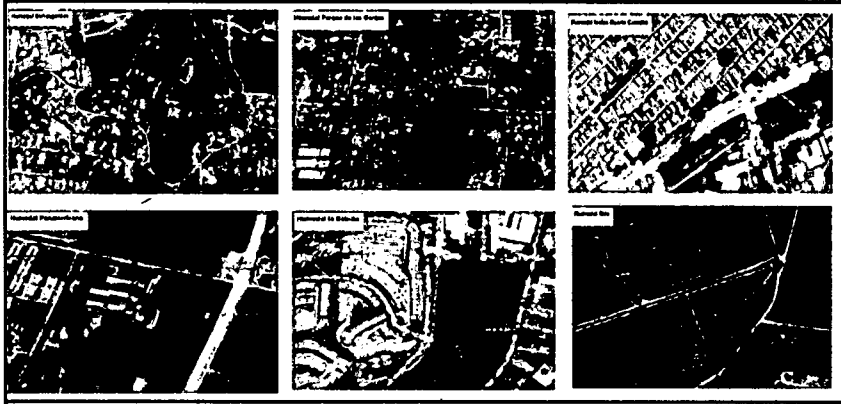

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.1.1	m2	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Tramo 1		207	1,8		372,6
Tramo 2		95	1,8		171
Tramo 3		366	1,8		658,8
Tramo 4		275	1,8		495
Tramo 5		88	1,8		158,4
Tramo 6		101	1,3		130,202
		TOTAL			1986
		CONTRACTUAL			1986

PLANO

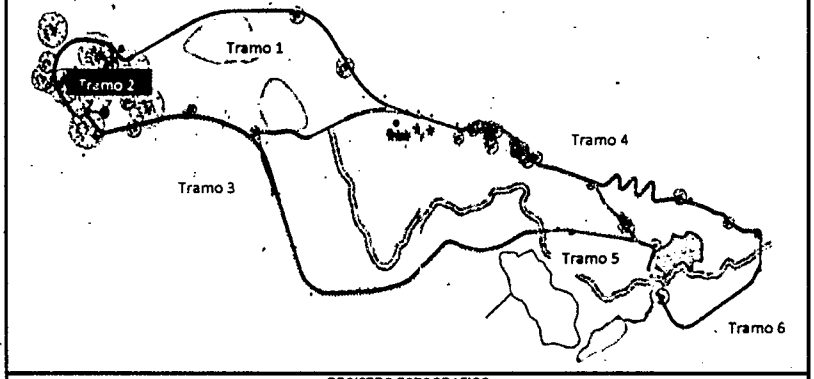

REGISTRO FOTOGRAFICO

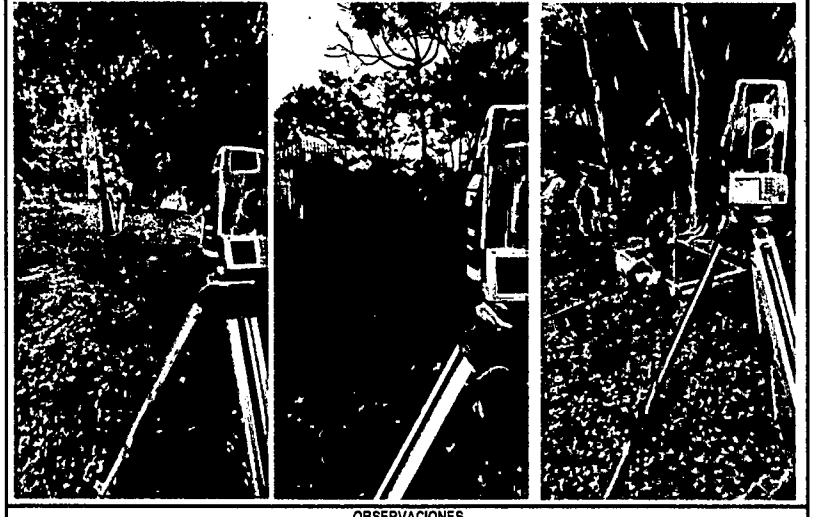

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.1.2	m2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Tramo 1		207	1,8		372,6
Tramo 2		95	1,8		171
Tramo 3		366	1,8		658,8
Tramo 4		275	1,8		495
Tramo 5		88	1,8		158,4
Tramo 6		101	1,3		130,20
		TOTAL			1986
		CONTRACTUAL			1986

PLANO

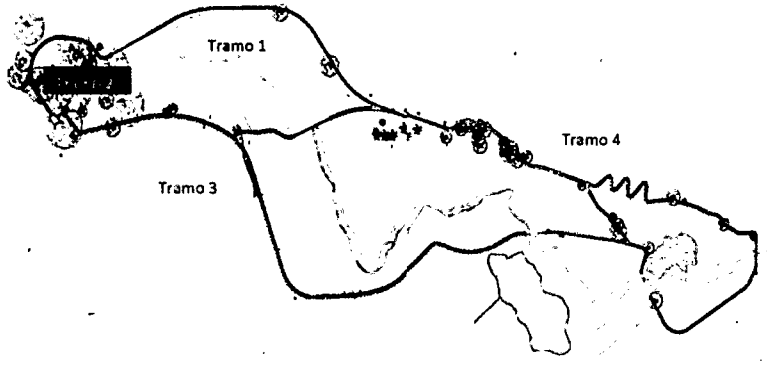

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.2.1	m2	CONTROL DE GUADUALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
GUADUAL 1				2059,24	2059,24
GUADUAL 2				739,29	739,29
GUADUAL 3				2019,42	2019,42
GUADUAL 4				473,14	473,14
GUADUAL 5				1705,31	1705,31
GUADUAL 6				525	525
		TOTAL			7521,4
		CONTRACTUAL			12000

PLANO

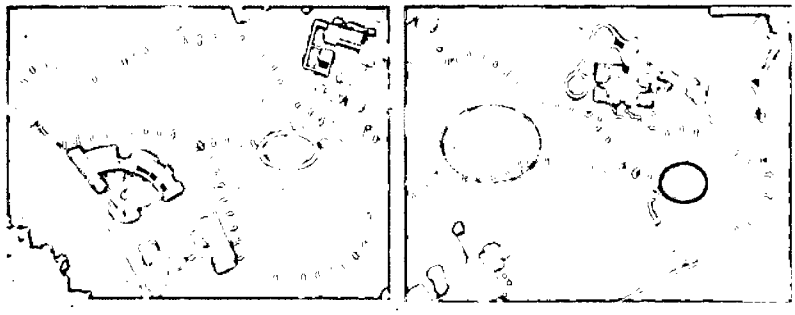

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2		HUMEDAL CAÑASGORDAS
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.2.2	m2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Control hormiga arriera				2500	2500
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			2500
		CONTRACTUAL			18000

PLANO

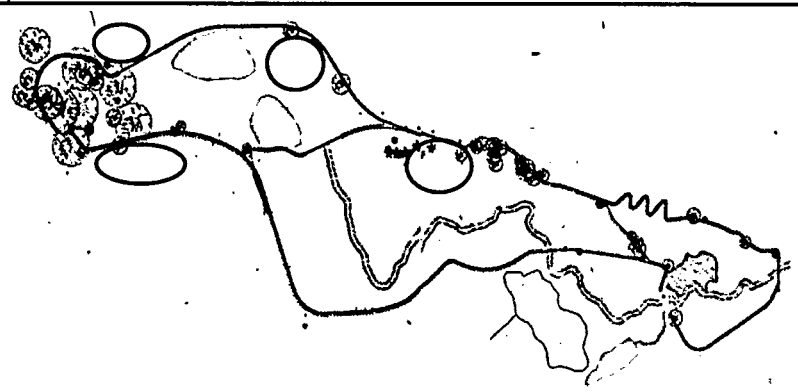

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.2.3	und	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Mantenimiento arboreo mayores a 12 m	100				100
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			100
		CONTRACTUAL			100

PLANO

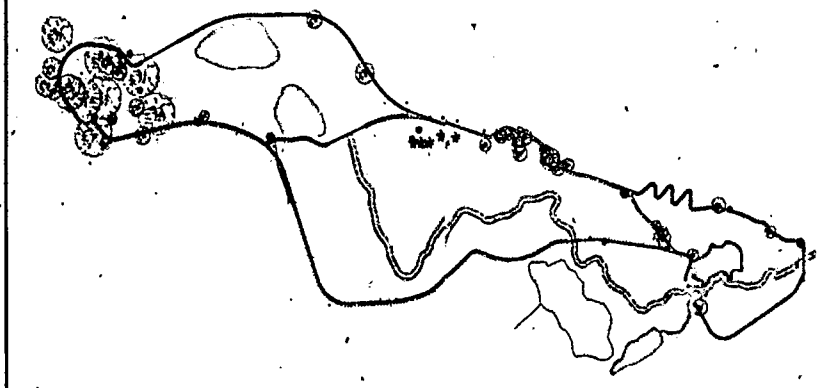

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.2.4	und	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Mantenimiento arboreo menores a 12 m	100				100
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			100
		CONTRACTUAL			100

PLANO

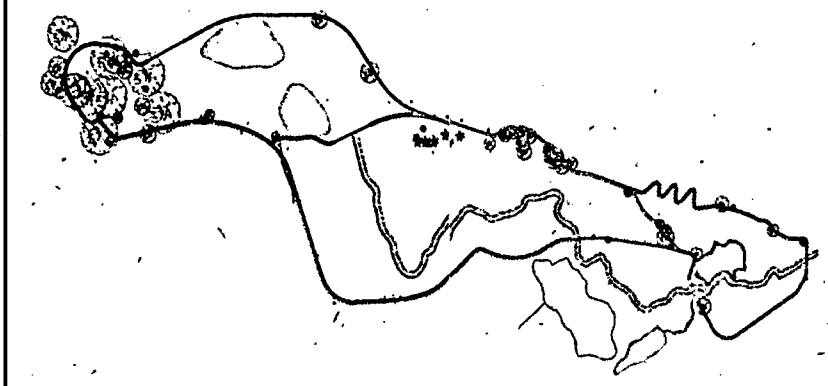

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.1	M3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	1,8	0,25	93,15
Tramo 2		95	1,8	0,3	51,30
Tramo 3		366	1,8	0,3	197,64
Tramo 4		64,64	1,8	0,3	34,91
					0,00
		TOTAL			377,0
		CONTRACTUAL			377,0

PLANO

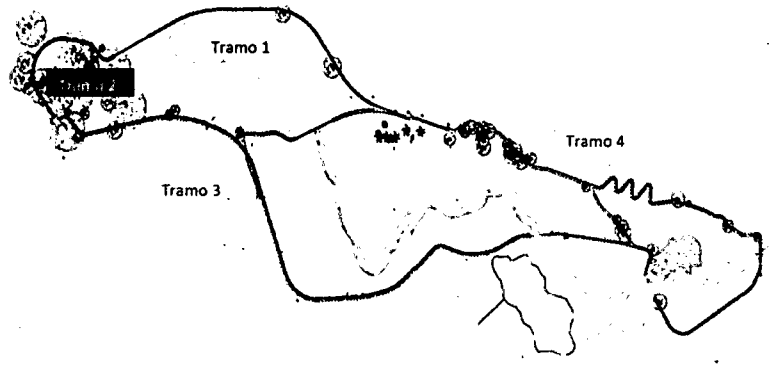

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.2	M3	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO


UBICACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	1,8	0,25	93,15
Tramo 2		95	1,8	0,3	51,3
Tramo 3		366	1,8	0,3	197,64
Tramo 4		262,05	1,8	0,3	141,51
Viajes de guadua	24				24
		TOTAL			507,6
		CONTRACTUAL			507,6

PLANO

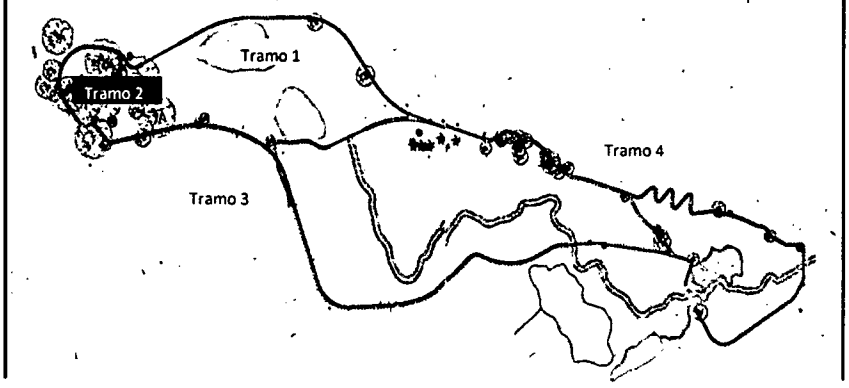

REGISTRO FOTOGRAFICO



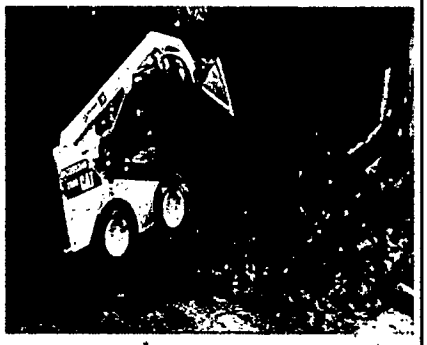

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.3	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

UBICACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	1,8	0,25	93,15
Tramo 2		95	1,8	0,3	51,3
Tramo 3		366	1,8	0,3	197,64
Tramo 4		262,05	1,8	0,3	141,51
Viajes de guadua	24				24
		TOTAL			507,6
		CONTRACTUAL			507,6

PLANO

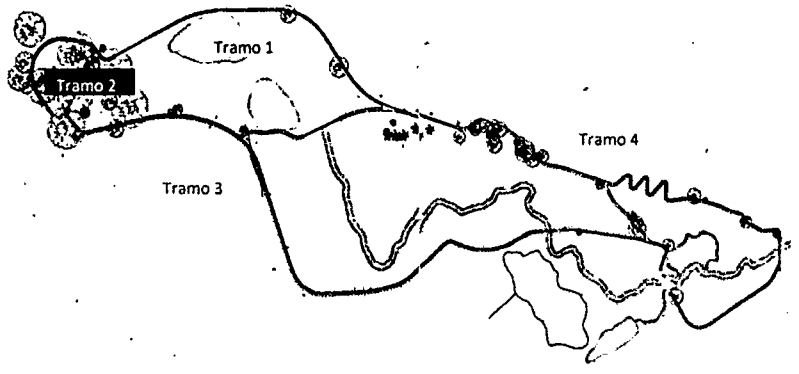

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.4	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO

UBICACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	1,6	0,12	39,744
Tramo 2		95	1,6	0,12	18,24
Tramo 3		366	1,6	0,12	70,27
Tramo 4		55,94	1,6	0,12	10,74
					0
		TOTAL			139
		CONTRACTUAL			139,0

PLANO

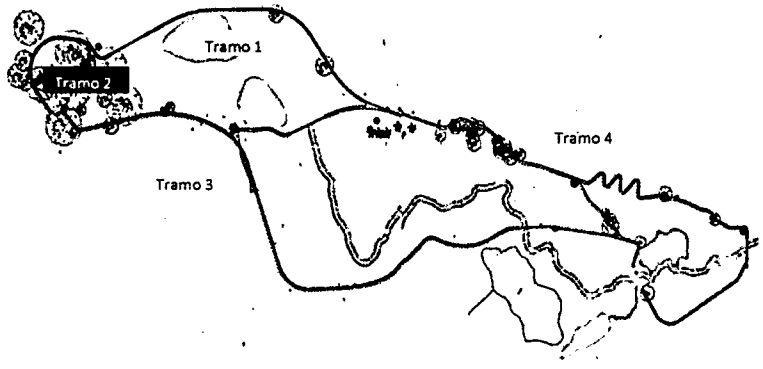

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1	2	177			354
Tramo 2	2	95			190
					0
					0
					0
		TOTAL			544
		CONTRACTUAL			3122,0

PLANO

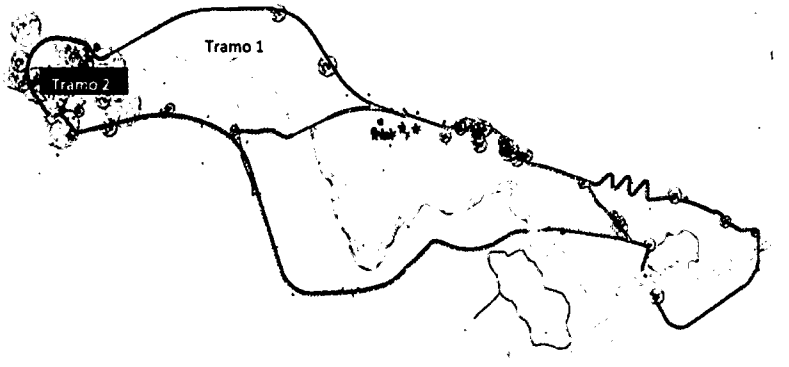

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.6	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1 - K0+030 - K0+207		177	1,2		212,4
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			212,4
		CONTRACTUAL			1786,0

PLANO

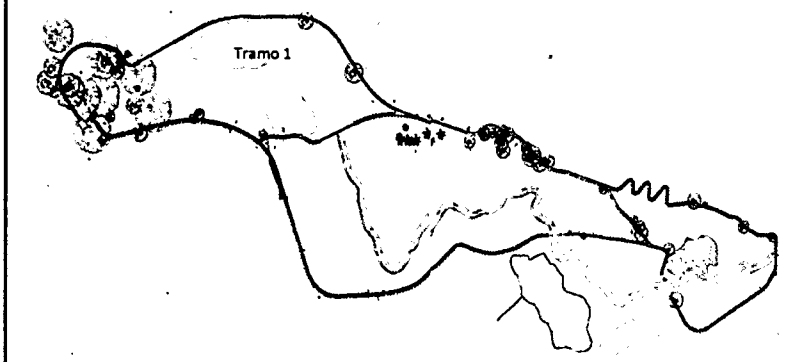

REGISTRO FOTOGRAFICO

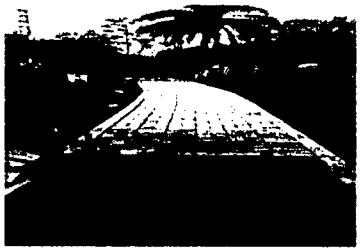

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025


CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.1.1	M2	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Localizacion Sendero Peatonal		40	3		120
					0
					0
					0
					0
	TOTAL				120
	CONTRACTUAL				413,0

PLANO

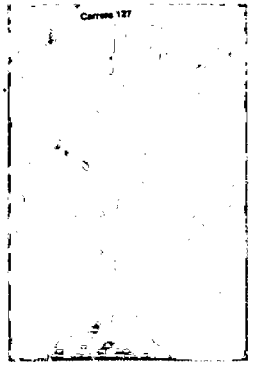

REGISTRO FOTOGRAFICO

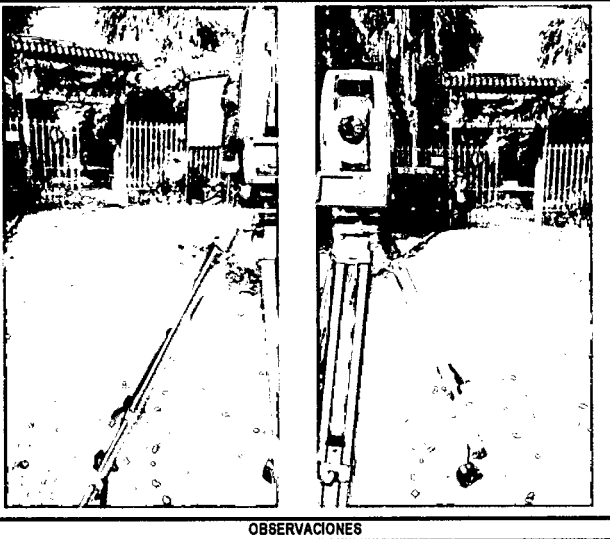

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.2.1	M2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
CONTROL DE PLAGAS				4000	4000
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		4000
			CONTRACTUAL		4000,0

PLANO

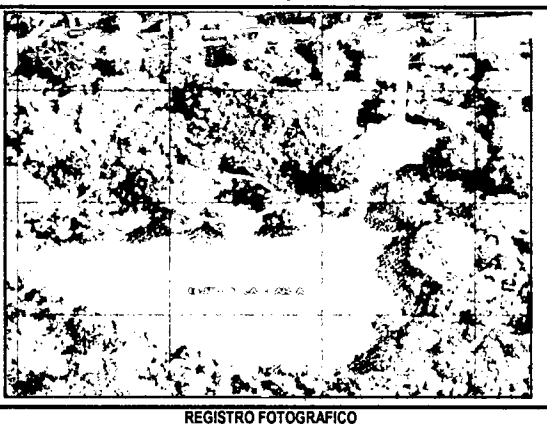

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.2.2.	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
INDIVIDUO >12M	90				90
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			90
		CONTRACTUAL			90,0

PLANO

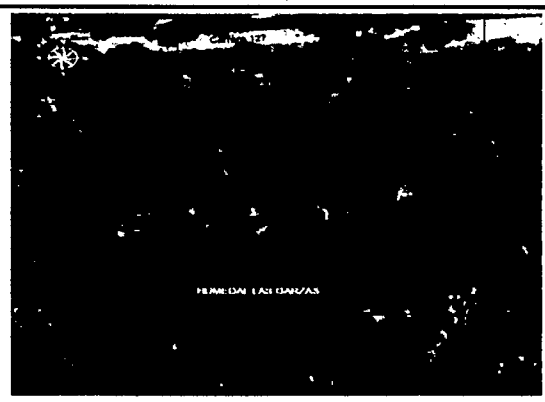

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.2.3	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
INDIVUDUO <12M	60				60
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			60
		CONTRACTUAL			60,0

PLANO

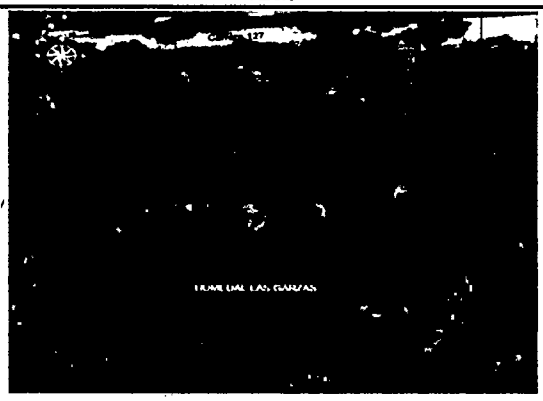

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025


CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.1	M3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Excavacion sendero Peatonal		40	3	0,2	24
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			24
		CONTRACTUAL			24,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO

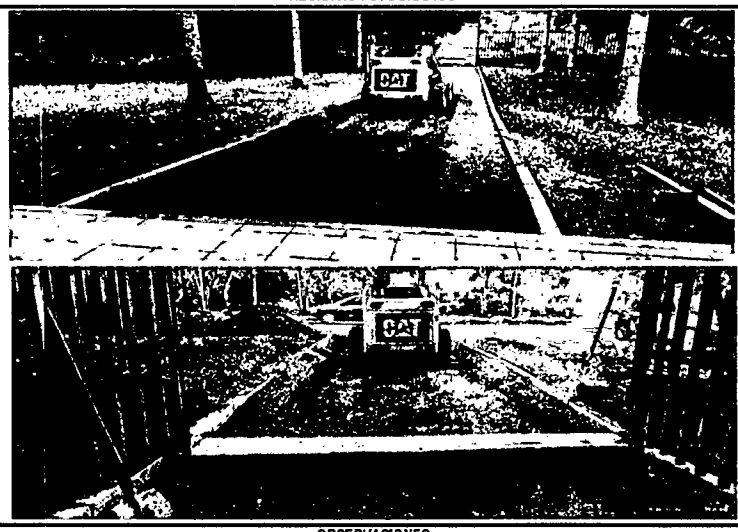

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025


CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.2	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Relleno sub base sendero Peatonal		40	3	0,13	15,6
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			15,6
		CONTRACTUAL			15,6

PLANO

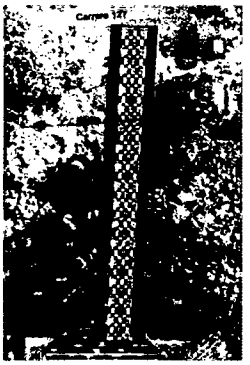

REGISTRO FOTOGRAFICO

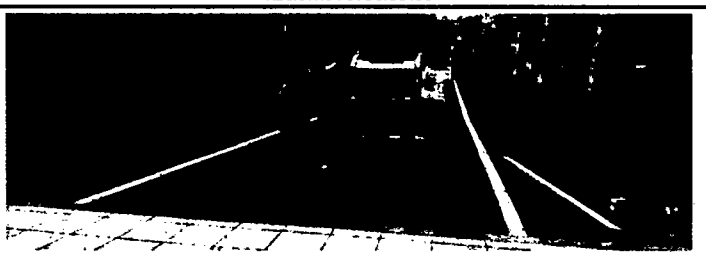



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.3	UND	BORDILLO EN CONCRETO 15X15

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Bordillo	80				80
					0
					0
					0
					0
	TOTAL				80
	CONTRACTUAL				92,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL: PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.6	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Retiro escombros sendero Peatonal		40	3	0,26	31,2
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			31,2
		CONTRACTUAL			31,2

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.7	M3	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Acarreo Material sendero Peatonal		40	3	0,26	31,2
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			31,2
		CONTRACTUAL			31,2

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO



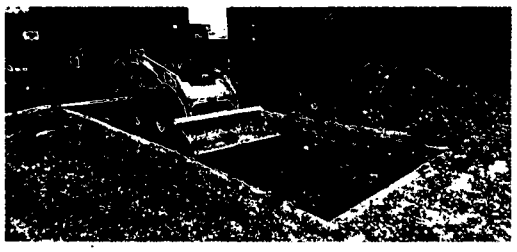

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajistica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.1	M2	CONTROL DE GUADUALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Guadual 1				800	800
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			800
		CONTRACTUAL			800,0

PLANO

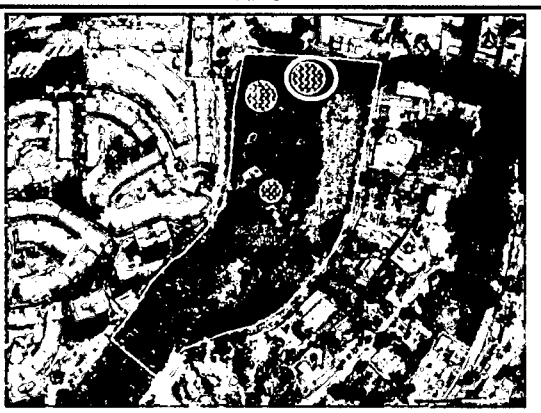

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.2	M2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
CONTROL DE PLAGAS				1141,04	1141,04
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		1141,04
			CONTRACTUAL		4000,0

PLANO

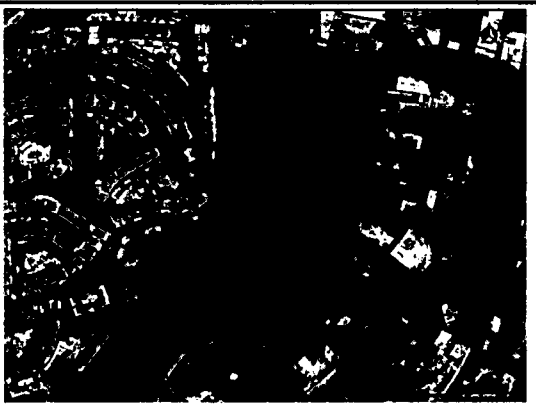

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.3	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
INDIVIDUO >12M	20				20
					0
					0
					0
					0
	TOTAL				20
	CONTRACTUAL				20,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.4	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
INDIVUDUO <12M	80				80
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			80
		CONTRACTUAL			80,0

PLANO

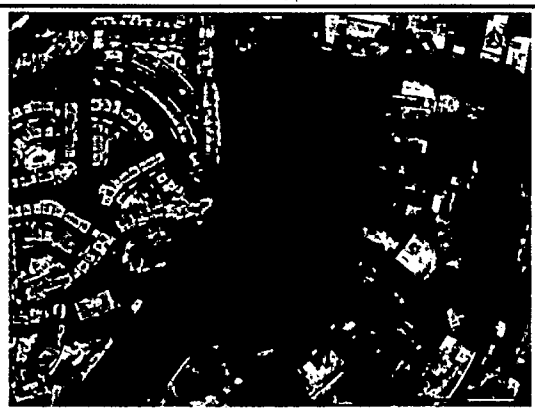

REGISTRO FOTOGRAFICO



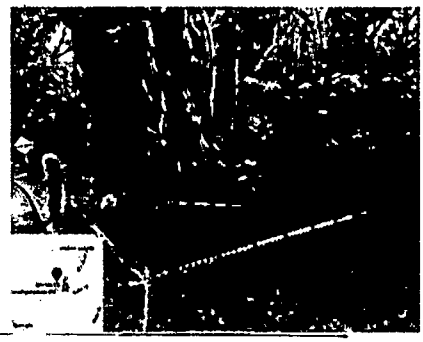

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
6.1.1	m2	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Localizacion y replanteo espejos 1 y 4				1443,75	1443,75
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			1443,75
		CONTRACTUAL			1443,75

PLANO

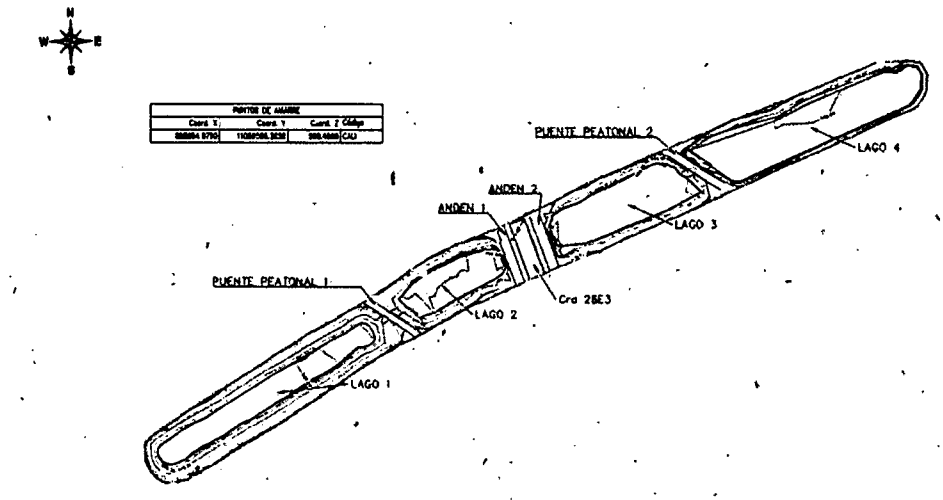

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
6.2.1	M2	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
LIMPIEZA 1ER ESPEJO				2500	2500
LIMPIEZA 2DO ESPEJO				502,71	502,71
					0
					0
					0
		TOTAL			3002,71
		CONTRACTUAL			3002,71

PLANO

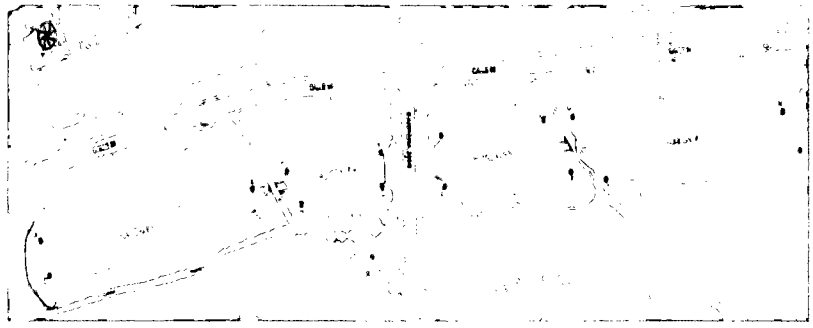

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
6.2.2	M3	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	
EXCAVACION ESPEJO 4				755,18	755,18
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		755,18
			CONTRACTUAL		755,18

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
6.2.3	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
EXCAVACION ESPEJO 4				1316,08	1316,08
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			1316,08
		CONTRACTUAL			1316,08

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
6.2.4	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSÍCIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Retiro de sobrantes espejo 4	122			17	2071,258
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			2071,258
		CONTRACTUAL			2071,258

PLANO

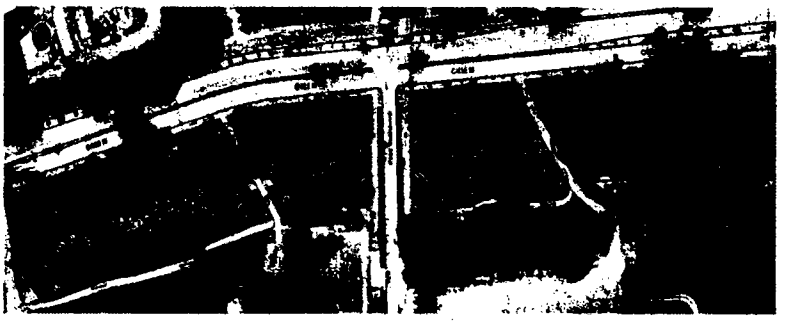

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajistica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
	M2	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Recuperecion Ambiental espejo 4				2068,27	2068,27
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			2068,270
		CONTRACTUAL			2068,270

PLANO

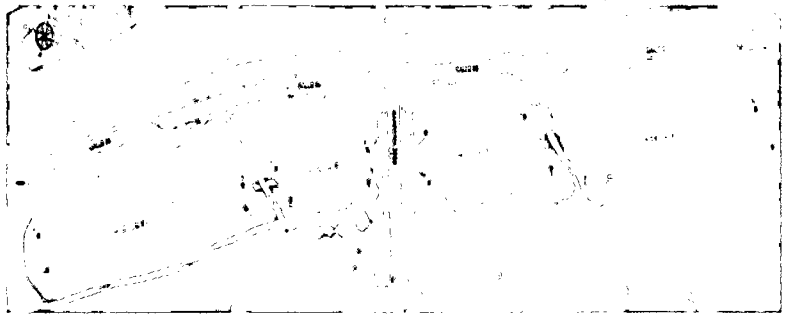

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025


CAPITULO		
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
8.1.1	und	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Estrategia de fortalecimiento comunitarios Isaias Duarte cancino	1				1
Estrategia de fortalecimiento comunitarios Ibis	0,5				0,5
					0
					0
					0
	TOTAL				1,5
	CONTRACTUAL				2,00

PLANO

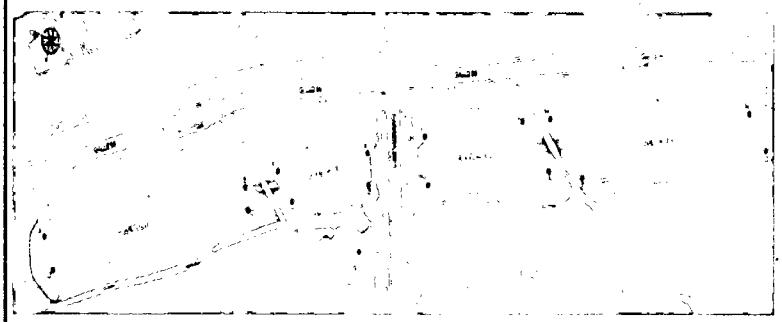

REGISTRO FOTOGRAFICO

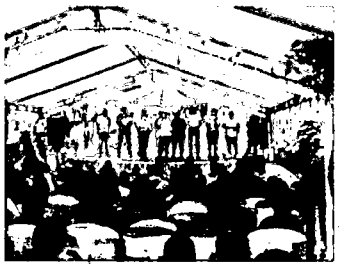





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	05 de Diciembre del 2025

CAPITULO		
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES	
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
9.1.1	und	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Humedal Panamericano	1				1
Parque de las Garzas	1				1
Babilla	1				1
Isaias Duarte cancino	1				1
Limonar	1				1
		TOTAL			5
		CONTRACTUAL			11,00

PLANO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

INFORME TECNICO MENSUAL No. 1

COMPONENTE TECNICO

FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0741 DE 2025

OBJETO: "REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO"

SANTIAGO DE CALI

07 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: ING. JUAN SEBASTIAN CASTRILLON	**NOMBRE:** ING. MELISSA GARCIA	**NOMBRE:** ARQ. JEANNETE NIETO LÓPEZ
FIRMA: SebastianC.	**FIRMA:** Melissa Garcia S.	**FIRMA:**
ENTIDAD: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**ENTIDAD:** FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**ENTIDAD:** CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
FECHA: 05/12/2025	**FECHA: 05/12/2025**	**FECHA: 05/12/2025**

Contenido

1. INTRODUCCION 4
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 7
4.1. OBRA CIVIL 7
4.1.1. HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS 7
4.1.2. HUMEDAL CAÑASGORDAS 10
4.1.3. HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO 13
4.2. COMPONENTE AMBIENTAL. RECUPERACION PAISAJISTICA 15
4.2.1. CONTROL DE GUADUALES 16
4.2.2. CONTROL DE PLAGAS 25
4.2.3. MANEJO SANITARIO DE LOS ÁRBOLES 28
4.3. COMPONENTE SOCIAL 32
4.3.1. Realizar diagnósticos participativos con enfoque diferencial para orientar la intervención social de los proyectos institucionales. 32
4.3.2. Comunicaciones y diseño de presentaciones del Contrato 0741 de 2025 para los seis (6) humedales priorizados. 36
4.3.3. Talleres de educación ambiental "Humedales y biodiversidad" 60
4.3.4. Carnaval de Educación Ambiental – Humedal Isaías Duarte Cancino 79
5. GARANTIAS CONTRACTUALES 92
6. AVANCE DE OBRA 93
8.CUADRO CONTROL DE LLUVIAS 94
9. CONCLUSIONES 96
10. BIBLIOGRAFIA 97

1. INTRODUCCION

En marco al Contrato de Obra Pública; No. 0741 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación Construyamos Futuro Construfuturo cuyo objeto es: "Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario", a continuación, se presenta informe mensual detallado de las actividades correspondientes a los humedales priorizados.

El documento describe las actividades desarrolladas a nivel técnico, administrativo, legal y financiero, así como las dificultades y problemáticas presentadas durante el proceso de ejecución. El objetivo principal es evidenciar todas y cada una de las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de obra, plasmar tanto el seguimiento presupuestal como avance y dar trazabilidad a los diferentes procesos adelantados con el fin de finalizar las obras contratadas.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Contratista de la Obra	**FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO**
NIT.	805.021.814-9
Representante legal	Guillermo Paz Muñoz
Dirección Correspondencia	Calle 13 # 66 Bis 57, Local 138
Correo electrónico	obras@construyamosfuturo.com / rl@construyamosfuturo.com
Teléfono contacto	3153959474 - 3173729594
Interventoría	**CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025**
NIT.	901.988.189-1
Representante legal	Jeannete Nieto López
Dirección Correspondencia	Calle 13 # 66 bis – 57 oficina 151
Correo electrónico	humedalesinterventoria@gmail.com
Teléfono contacto	3186681078
Entidad Contratante:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**
PROYECTO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0741 de 2025**
Objeto del contrato:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS	
Humedales Priorizados: Parque de las Garzas; Humedal Cañasgordas, Humedal Panamericano, Humedal La Babilla, Humedal Ibis, Humedal Isaías Duarte Cancino. **Análisis y estudio de calidad de agua humedales:** La Babilla, La María, Parque de la caña, Pondaje, Charco Azul, Bataclan, El Retiro, Panamericano, Isaías Duarte Cancino, Parque de las Garzas y Limonar.	
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Fecha de inicio:	7 de Octubre 2025
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre 2025
Valor del contrato:	$3.600.000.382

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra Pública No. 0741 de 2025 se ejecuta en la Comuna 22, Comuna 13 y en el corregimiento de Navarro del municipio de Santiago de Cali. Las intervenciones se desarrollan en los humedales Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis, los cuales han sido priorizados por su importancia ecológica, función de conectividad territorial y condiciones actuales de conservación.

Adicionalmente, el contrato contempla la realización de estudios de calidad del agua en los humedales La María, Parque de la Caña, Pondaje, Charco Azul, Bataclán, Isaías Duarte Cancino, La Babilla, Parque de las Garzas, Panamericano, El Retiro y Limonar, con el propósito de establecer una línea base técnica y ambiental que sirva de referencia para el seguimiento, monitoreo y control de estos ecosistemas estratégicos. Este componente permite generar información técnica confiable que respalde la gestión ambiental integral y contribuya a la conservación y recuperación de la biodiversidad urbana.

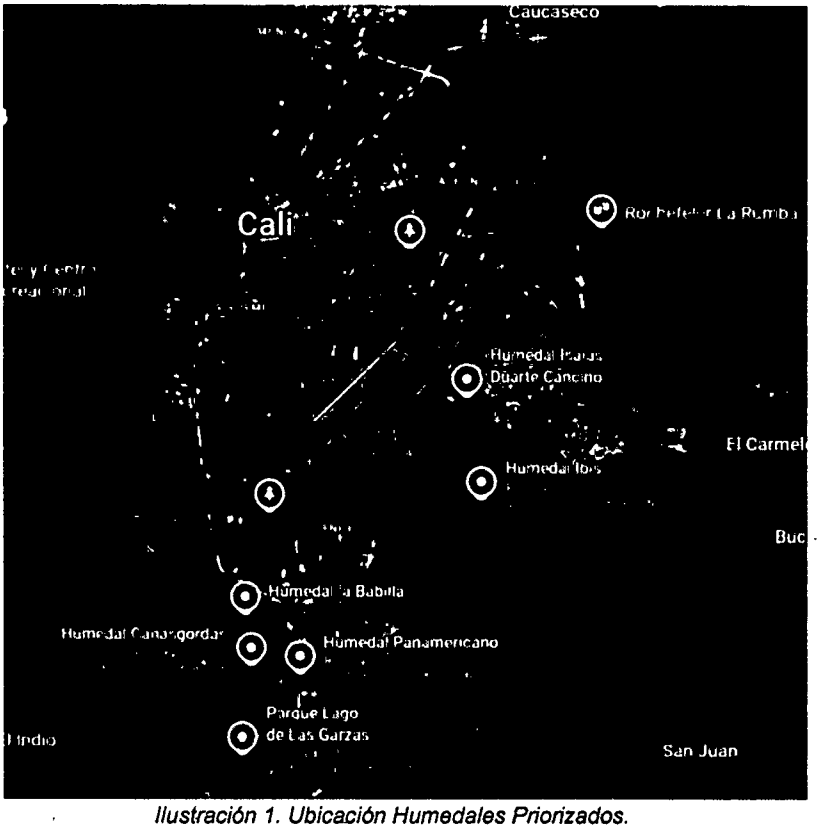


Ilustración 1. Ubicación Humedales Priorizados.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 07 de octubre y el 05 de diciembre de 2025, se ejecutaron las actividades iniciales del contrato, correspondientes a la fase de preconstrucción y a las primeras intervenciones en los humedales priorizados. Estas labores incluyeron acciones de replanteo, descapote, adecuación del terreno, control de vegetación, mantenimiento fitosanitario y actividades preliminares asociadas a la recuperación paisajística y ambiental, además de avances en infraestructura menor y gestión comunitaria.

4.1. OBRA CIVIL

4.1.1. HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS

En el Humedal Parque de las Garzas se ejecutaron las actividades preliminares y de conformación asociadas a la adecuación del acceso peatonal proyectado. Inicialmente se realizó la localización y replanteo topográfico, verificando alineamientos, niveles y puntos de referencia para garantizar la correcta implantación de la sección del sendero.

Posteriormente se desarrollaron excavaciones manuales ($H < 2.5$ m) conforme a las cotas establecidas en los diseños, asegurando la remoción controlada del material existente y la conformación de la caja estructural. Una vez obtenida la geometría requerida, se procedió con el relleno y compactación mediante material granular importado, alcanzando densidades apropiadas para soportar las cargas de servicio y permitir la instalación de los elementos constructivos posteriores.

Como parte del confinamiento lateral del acceso, se ejecutó la instalación de bordillo en concreto, garantizando alineación y nivelación según especificaciones. Además, se adelantaron las actividades de cargue, retiro, acarreo y disposición final en botadero autorizado del material producto de excavación, cumpliendo los procedimientos establecidos para la gestión de residuos de obra.

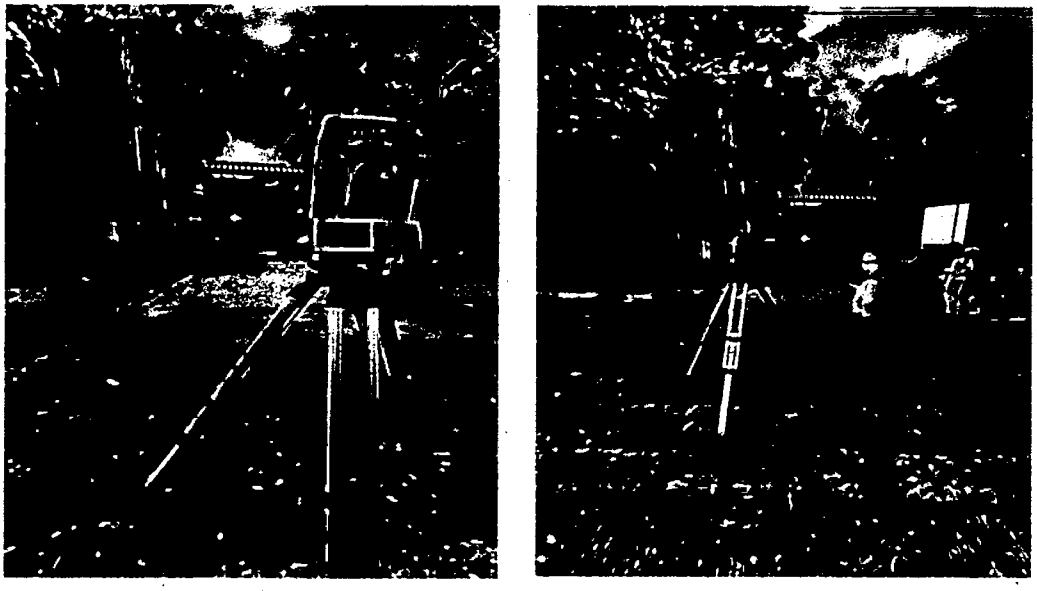


Ilustración 2. Levantamiento topográfico

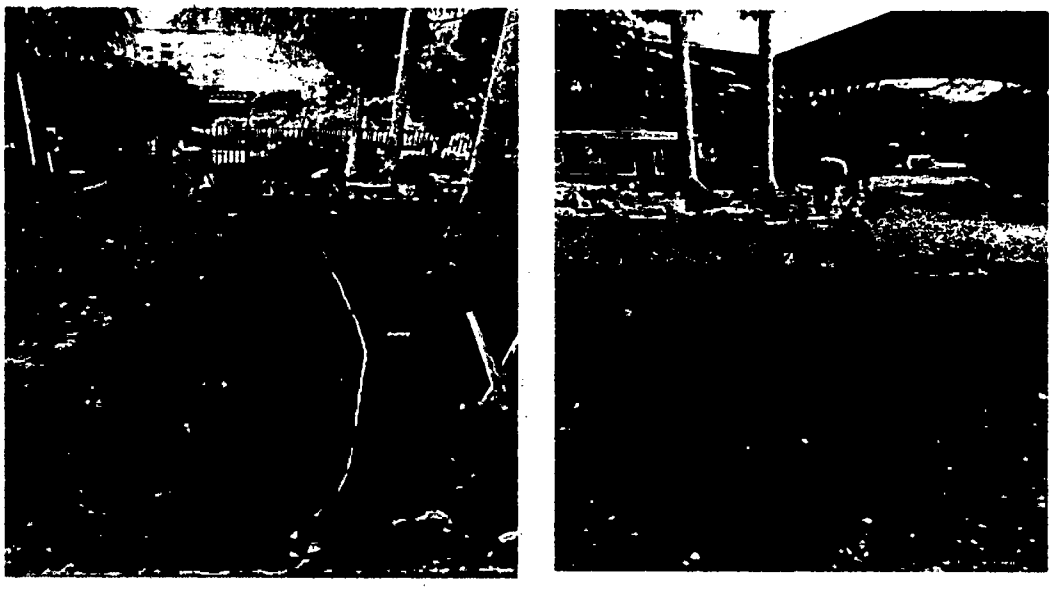


Ilustración 3. Desmonte de guaduas enterradas (confinamiento)

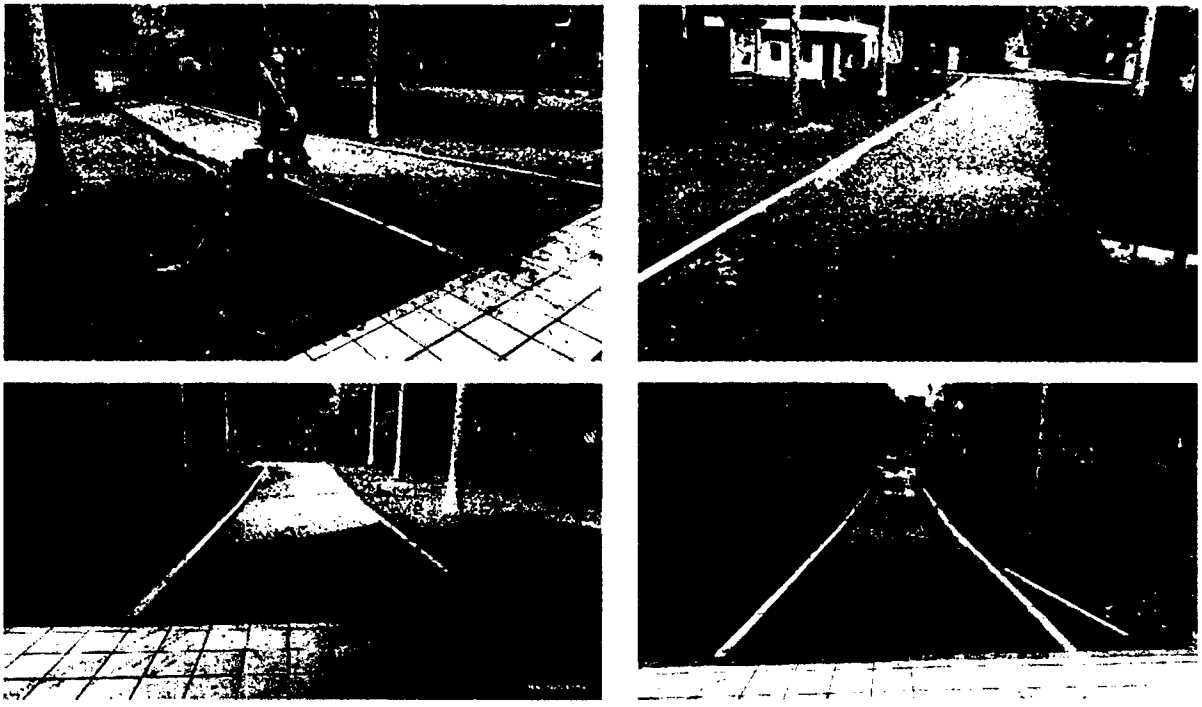


Ilustración 4. Instalación de Bordillos en concreto



Ilustración 5. Excavación Sendero

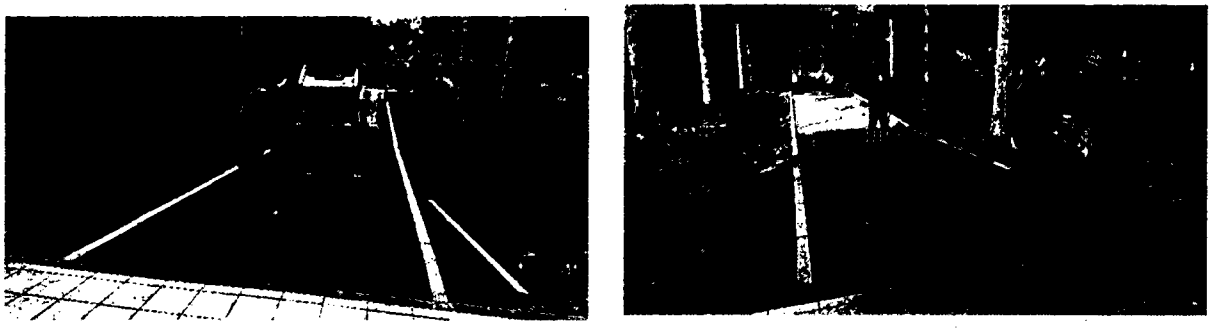


Ilustración 6. Relleno con material importado

4.1.2. HUMEDAL CAÑASGORDAS

En el Humedal Cañasgordas se desarrollaron las actividades iniciales de obra civil correspondientes a la construcción del sendero peatonal contemplado en el proyecto. Las labores comenzaron con la localización y replanteo topográfico del área de intervención, estableciendo ejes, alineamientos y niveles de referencia. Durante esta etapa se identificó la necesidad de realizar ajustes al diseño original, debido a condiciones particulares del terreno y de la ocupación vegetal existente, lo cual obligó a modificar el trazado en un tramo del sendero para garantizar su funcionalidad y compatibilidad con la topografía natural del humedal.

Posteriormente se ejecutó el descapote manual (H = 0.10 m) y la excavación manual (H < 2.5 m) para la conformación de la caja estructural, siguiendo las cotas actualizadas tras el ajuste de diseño. El material producto de la excavación fue objeto de acarreo interno hacia punto de acopio, y posteriormente se realizó el cargue, retiro y disposición final en botadero certificado, cumpliendo con los procedimientos de manejo técnico de materiales.

Una vez conformada la geometría requerida, se procedió con el relleno y compactación mediante material granular importado, obteniendo los niveles de densidad especificados para garantizar la capacidad portante del sendero. En los laterales se avanzó en la instalación del bordillo prefabricado 10x20, elemento fundamental para el confinamiento del pavimento y para la correcta delimitación del sendero. Asimismo, se inició la instalación del sistema de adoquín proyectado, correspondiente a las primeras áreas intervenidas del trazado ajustado.

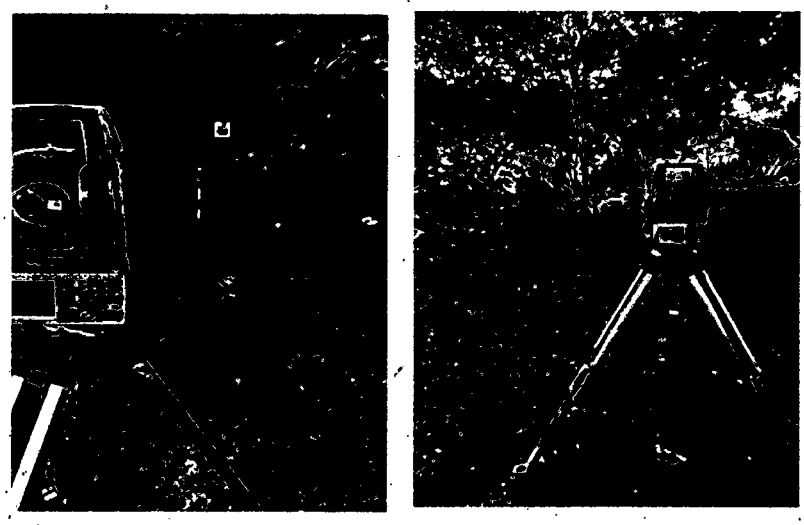


Ilustración 7. Levantamiento Topográfico



Ilustración 8. Excavación de sendero

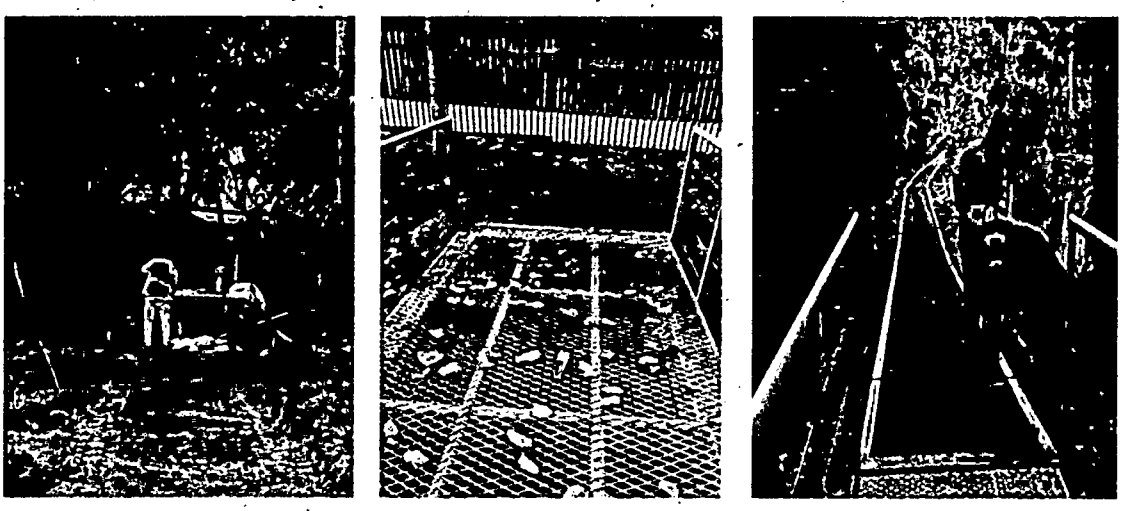


Ilustración 9. Relleno con material importado



Ilustración 10. Instalación de bordillo en concreto

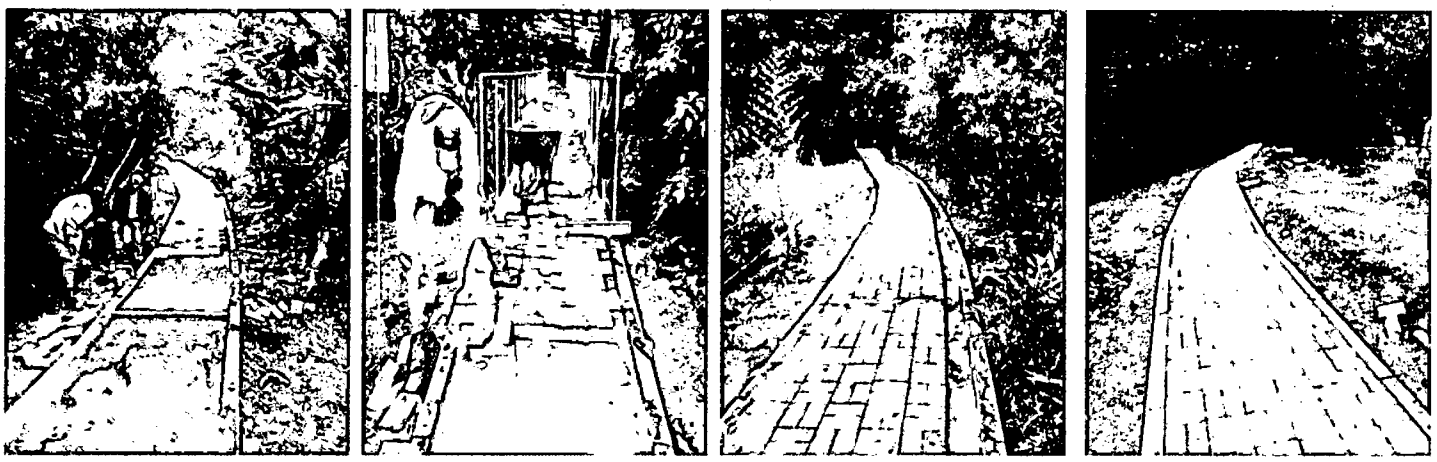


Ilustración 11. Instalación de adoquin

4.1.3. HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO

En el Humedal Isaías Duarte Cancino se ejecutaron las actividades asociadas a la intervención inicial del área, principalmente enfocadas en labores de movimiento de tierras requeridas para la adecuación del espejo de agua y zonas adyacentes. Se inició con la localización y replanteo topográfico, estableciendo puntos de control, alineamientos y niveles de referencia necesarios para orientar las excavaciones y garantizar la correcta delimitación del área de intervención según los diseños contractuales.

Una vez definidos los ejes de trabajo, se procedió con actividades de excavación bajo el agua, empleando métodos manuales y mecánicos de acuerdo con la profundidad y accesibilidad de cada sector. La excavación manual (H < 2 m) permitió intervenir zonas de difícil acceso o de mayor sensibilidad, mientras que la excavación mecánica bajo el agua se aplicó en áreas amplias o con mayores volúmenes de material, optimizando los rendimientos operativos. Estas actividades se ejecutaron siguiendo parámetros de seguridad y control de nivelación, asegurando el retiro del material sedimentado.

El material producto de las excavaciones fue sometido a acarreo interno, cargue y disposición final en botadero certificado, cumpliendo los lineamientos técnicos para el manejo de residuos de excavación. Las cantidades significativas de material retirado durante el periodo reflejan el avance en la conformación inicial del humedal y la recuperación de profundidad funcional del espejo de agua.

Complementariamente, se ejecutaron trabajos de limpieza del espejo de agua, consistentes en el retiro manual del buchón y acumulaciones vegetales flotantes.

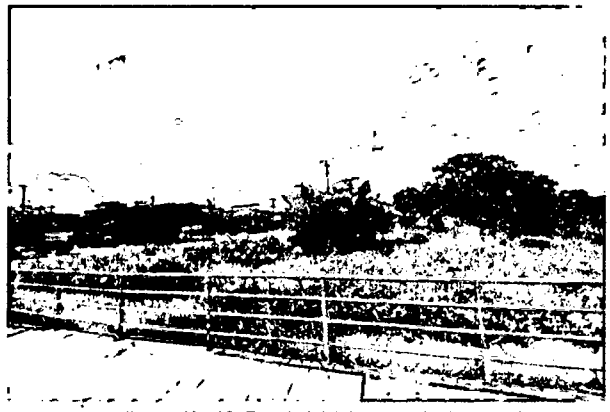


Ilustración 12. Estado inicial de espejo de agua 4

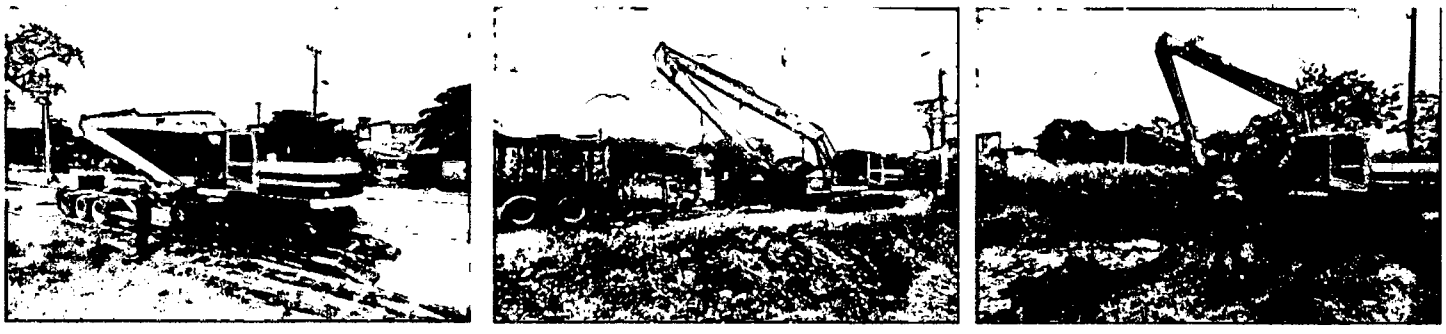


Ilustración 13. Excavación y retiro de material sobrante.



Ilustración 14. Estado espejo 4 después de retiro de material sobrante.

El informe debe expresar lo que se realizo no lo ideal que se debe hacer

4.2. COMPONENTE AMBIENTAL. RECUPERACION PAISAJISTI

El presente capítulo aborda los principales componentes de la gestión ambiental en los humedales urbanos de Cali —Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis—, ecosistemas estratégicos que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica del territorio. La presión antrópica derivada de la urbanización, junto con factores naturales de degradación, exige la implementación de medidas técnicas que garanticen su sostenibilidad y resiliencia.

En primer lugar, se revisa el mantenimiento de guaduales y bambusales, formaciones vegetales de gran importancia ecológica y cultural en el Valle del Cauca. Su manejo silvicultural —incluyendo cosecha selectiva, control de densidad y regeneración asistida— resulta indispensable para conservar la estabilidad de suelos, proteger fuentes hídricas y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos.

Proceso - No evidencia -

Posteriormente, se analiza el control de plagas, con énfasis en la hormiga arriera (*Atta spp.*), especie que, si bien cumple funciones ecológicas relevantes en el reciclaje de materia orgánica y la aireación de suelos, puede ocasionar defoliación masiva y pérdida de cobertura vegetal cuando sus poblaciones se desbordan. En este contexto, se destacan las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP), donde el control químico se reconoce como una herramienta de acción inmediata para reducir poblaciones y mitigar daños, siempre en articulación con prácticas biológicas y culturales.

Finalmente, se aborda el manejo sanitario de los árboles presentes en los humedales seleccionados, enfatizando la necesidad de prácticas de nutrición edáfica que fortalezcan la salud del arbolado y mejoren la resiliencia frente a plagas, enfermedades y condiciones de estrés ambiental. El monitoreo fitosanitario, la aplicación de biofertilizantes y el manejo de cobertura vegetal son medidas clave para garantizar la permanencia y funcionalidad de estos individuos arbóreos en el ecosistema urbano.

Este capítulo, por tanto, integra acciones de conservación, restauración y manejo técnico que buscan consolidar una estrategia ambiental integral para los humedales de Cali, asegurando su aporte a la sostenibilidad territorial y al bienestar de las comunidades que los rodean.

4.2.1. CONTROL DE GUADUALES.

Los guaduales (Guadua angustifolia Kunth) y bambusales constituyen formaciones vegetales de alta importancia ecológica, económica y cultural en Colombia. Estos sistemas cumplen funciones críticas en la protección de cuencas hidrográficas, la estabilización de taludes y suelos, la captura de carbono y la provisión de hábitat para diversas especies de fauna y flora. Además, poseen un valor estratégico en la economía, al ser fuente de materia prima para la construcción sostenible, la artesanía y la agroindustria.

Sin embargo, la dinámica biológica de guaduales y bambusales, caracterizada por ciclos de crecimiento rápido y acumulación de biomasa, exige acciones periódicas de mantenimiento. La ausencia de manejo técnico como se ha evidenciado en los humedales materia de intervención, puede derivar en procesos de degradación, tales como:

- Sobrepoblación de culmos o tallos envejecidos, que disminuye la productividad y aumenta la susceptibilidad a plagas y enfermedades.

- Compactación del suelo y pérdida de cobertura vegetal asociada, afectando la infiltración de agua y la regeneración natural.

- Reducción de la capacidad de conectividad ecológica, limitando el flujo de especies entre fragmentos de bosque y humedales.

El marco normativo colombiano, a través de la Ley 2206 de 2022, promueve el uso productivo y sostenible de la guadua y el bambú, reconociendo su papel en la mitigación del cambio climático y en la identidad cultural del paisaje cafetero. Asimismo, la Resolución 141 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece lineamientos para el registro y manejo de guaduales y bambusales, subrayando la necesidad de planes de conservación y mantenimiento.

En este contexto, el presente numeral se centra en la necesidad de implementar prácticas de mantenimiento técnico periódicos en los guaduales y bambusales presentes en los humedales de La Babilla, Cañasgordas y Panamericano —como el control de densidad, la eliminación de partes o estructuras afectadas o impactadas por diferentes causas, la aplicación de elementos nutricionales y la protección contra agentes degradantes— con el fin de asegurar la sostenibilidad de estos ecosistemas y su integración en la planificación territorial.

Los guaduales presentes en el humedal La Babilla ascienden a 2546 M2, distribuidos en tres manchas que se localizan en la esquina de la calle 13 con carrera 105, en el borde del espejo de agua sobre la calle 14 y en el borde del espejo de agua próximo a las escalinatas. Los guaduales y bambusales en el humedal Cañasgordas corresponden a 7521 M2, distribuidos en varias manchas conexas al espejo de agua y curso hídrico presente en el mismo.

El estado de deterioro de los guaduales y bambusales presentes en estos humedales se considera en la evaluación como alto, obligando al corte y retiro de los tallos que impiden un desarrollo adecuado de los rebrotes, los tallos con malformaciones, tallos secos y envejecidos en pie y los que evidencien afectaciones fitosanitarias entre otros. Con base en ello se procedió a la eliminación de todos los que presentaban algunas de las características mencionadas.

El corte de los tallos necesarios a eliminar se hizo de dos maneras, mecánico con motosierra y manual con serrote, dependiendo de la condición puntual de accesibilidad. El corte de cada tallo se hace a nivel de nudo para evitar la acumulación de agua y otros residuos en los tabiques y su posterior descomposición de tejido vegetal que se convierte en acceso para plagas y patógenos que terminan afectando toda la planta al tratarse de un solo sistema. El corte se hace a nivel basal en cada tallo.

Se adelantó de igual manera el retiro de todo el material vegetal proveniente de barrido y limpieza de las zonas verdes anexas al humedal, que se acumulan en la base de los tallos y que producen un efecto negativo en el desarrollo y conservación del guadual, al producirse aumento de las condiciones externas que ponen en estado de vulnerabilidad al mismo.

Los tallos eliminados de guadua se manejaron a través de los puntos de disposición de residuos para obtener la certificación correspondiente. Su transporte se hizo en camión carpado, con las normas de seguridad requeridas para este tipo de actividad.

En las siguientes fotografías se evidencia el estado inicial de los tallos de los guaduales y bambusales, las actividades de entresaca, corte, limpieza de base, retiro de material a eliminar.



Ilustración 15. Estado inicial de guadual humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 16. Fracturas en tallos de guaduas humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 17. Deformidades en el desarrollo y crecimiento de la guadua humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 18. Organización de material de desecho de guadual Humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 19. Guaduas eliminadas por afectaciones varias
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 20. Corte de puntas de guadua con serrote
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 21. eliminación de látigos o ramas laterales
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 22. Limpieza de la zona basal de guadual
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 23. Evacuación de material guadua en mal estado
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 24. Estado final de guadual en humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 25. Estado inicial de guadual en humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 26. Apronte de guadua en mal estado para retirar del humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 27. Estado final luego de limpieza humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

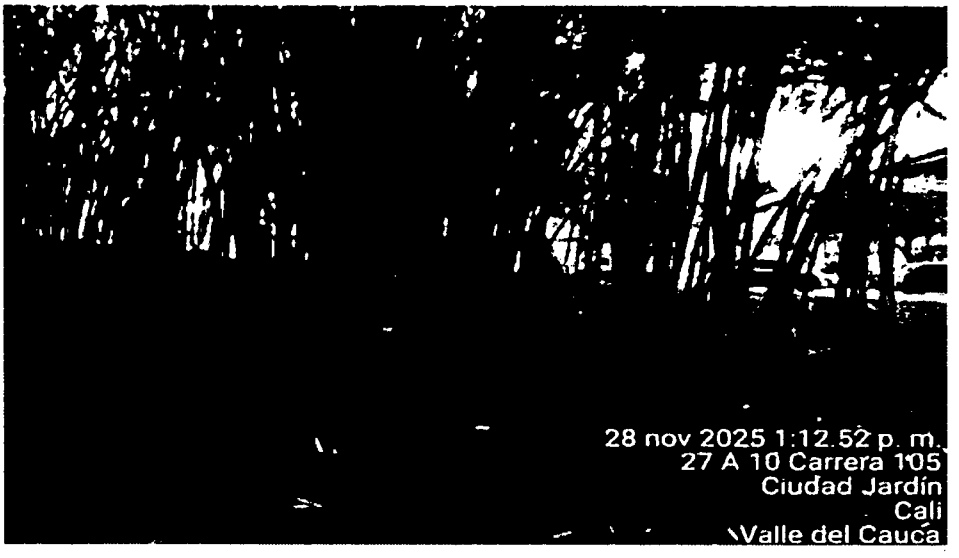


Ilustración 28. Aplicación de abono edáfico guadual humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 29. Cargue de residuos de guadua humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

4.2.2. CONTROL DE PLAGAS

Las hormigas arrieras (Atta spp.) cumplen una función ecológica relevante en los ecosistemas naturales, al participar en el reciclaje de materia orgánica, la aireación de suelos y la dispersión de semillas, contribuyendo así al equilibrio de los humedales urbanos como Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis.

No obstante, cuando sus poblaciones se desbordan o se salen de control, generan impactos negativos significativos: defoliación masiva de especies arbóreas, debilitamiento de la cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad y alteración de los procesos de regeneración natural.

Ante estas condiciones, el control químico se constituye en una medida técnica de acción inmediata y eficaz para reducir las poblaciones de Atta y otras especies de hormigas defoliadoras. Este tipo de manejo se basa en la aplicación dirigida de insecticida el interior del nido, logrando una disminución rápida de la actividad y evitando la expansión de los daños. Si bien el control químico es una herramienta de respuesta inmediata, debe integrarse en un manejo integrado de plagas (MIP) que combine prácticas culturales, biológicas y edáficas, cuando las condiciones climáticas

sean apropiadas y las poblaciones altas presentes se disminuyan, garantizando la sostenibilidad y conservación de los humedales.

Para ejecutar el control, se preparan los agroquímicos y se aplican teniendo en cuenta las normas de seguridad. Las dosis aplicadas corresponden a la comercial referida en cada uno de ellos. La aplicación de los productos debe hacerse periódicamente, con lo cual se busca disminuir paulatinamente la población existente. Los equipos de aplicación son bombas espalderas con capacidad de 20 litros y la bomba termonebulizadora de igual capacidad.

El polígono donde se determinan la evidencia de los sitios detectados como hormigueros se marcan en terreno con estacas de guadua y se cierran con cinta de peligro. Las áreas de control de hormigas en el humedal La Babilla ascienden a 1141,04 M2 y en el humedal Cañasgordas a 2500 M2.



Ilustración 30. Preparación de productos para control de hormiga arriera humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 31. aspecto de zona afectada por hormiga arriera (Atta sp) humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 32. Mosaico registro de control de hormiga arriera humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

4.2.3. MANEJO SANITARIO DE LOS ÁRBOLES

El manejo sanitario de los árboles en los humedales de Cali es esencial para garantizar su salud y longevidad, y debe complementarse con prácticas de nutrición edáfica que fortalezcan el suelo y mejoren la resiliencia de estos ecosistemas frente a plagas, enfermedades y procesos de degradación

Los humedales Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garza y La Babilla, albergan una diversidad de especies arbóreas que cumplen funciones críticas en la regulación hídrica, la captura de carbono, la provisión de hábitat y la conectividad ecológica. Sin embargo, estos árboles enfrentan presiones antrópicas y naturales que requieren un manejo técnico especializado.

Para hacer este manejo se realizó el diagnostico de cada uno de los individuos mayores a doce metros y menores a doce metros de altura, criterio establecido en los términos del proyecto. Este ejercicio de diagnóstico da cuenta de su clasificación botánica, los datos dasométricos, las condiciones sanitarias de su sistema radicular, fuste y estructura aérea.

De igual manera se evalúan las evidencias que haya ante la presencia de plagas y enfermedades y de nutrición.

Con base en estas observaciones se plantea el diagnostico para determinar las necesidades en el individuo y adelantar los correctivos necesarios.

El diagnostico de cada árbol queda consignado en una ficha de campo que luego es transcrita a la base de datos para cuantificar las necesidades de productos agroquímicos, así como las actividades necesarias como parte del manejo. Ver Anexo 01. Ficha Evaluación de Campo.

A la fecha se ha realizado el diagnostico de los árboles del Humedal La Babilla (20 mayores de doce metros y 80 menores a doce metros), árboles de humedal Cañasgordas (100 mayores a doce metros y 100 menores a doce metros, árboles humedal Las Garzas (90 mayores a doce metros y 60 menores a doce metros) y humedal Panamericano (45 mayores a doce metros y 120 menores a doce metros).

El diagnostico indica que, aunque hay evidencias de la presencia de plagas y enfermedades en las poblaciones de árboles evaluadas, su afectación no es significativa, probablemente porque la población de insectos plaga es itinerante por tener hospederos secundarios y por el estado de clima con régimen de lluvia de baja precipitación, aunque se esté en meses de periodo de lluvias.

Se evidencian cambios en la coloración del follaje que lleva a determinar deficiencias nutricionales que conllevan a que el individuo arbóreo pueda ser susceptible a plagas,

enfermedades y estrés ambiental, especialmente por cambios en el régimen hídrico donde se reduce la capacidad de regeneración y aumentan la vulnerabilidad de los árboles.

Con base en lo anterior se concluye que, la falta de nutrientes esenciales en el suelo limita el crecimiento y la resistencia de los árboles frente a agentes patógenos. Por lo tanto, se recomienda la nutrición edáfica como principal estrategia de manejo fitosanitario.

La nutrición edáfica se convierte en un eje fundamental del manejo fitosanitario, ya que fortalece la base del ecosistema: el suelo. Entre las prácticas recomendadas se destacan: Mejora en la capacidad de captura de carbono y regulación hídrica de los humedales, el fortalecimiento de la conectividad ecológica, al garantizar la permanencia de individuos arbóreos sanos y la sostenibilidad a largo plazo, al integrar el manejo fitosanitario con la conservación del suelo y la biodiversidad.

Para el programa de nutrición se hace el cálculo de los requerimientos de cada uno de los individuos y se hace la aplicación puntual en la corona. Se utilizo abono de formulación completa, más suplemento de nitrógeno más elementos menores.



Ilustración 33 Levantamiento de información para fichas de diagnóstico forestal humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 34 Levantamiento de información para fichas de diagnóstico forestal humedal Las Garzas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 35 Socialización técnica actividad de fertilización humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 36 Preparación mezcla de abono edáfico humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 37 Perforación y aplicación de abono edáfico humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

4.3. COMPONENTE SOCIAL

4.3.1. Realizar diagnósticos participativos con enfoque diferencial para orientar la intervención social de los proyectos institucionales.

En relación con la consecución de datos de las poblaciones impactadas en el marco del Contrato de obra 0741 de 2025, es vital el diseño de formatos de intervención y análisis poblacional que identifiquen información focalizada al objeto del contrato y las realidades socioeconómicas y comunitarias de las poblaciones o actores clave del sector.

Para ello, se desarrollaron dos diseños de formatos, clave para 1. Levantamiento de información de caracterización poblacional de las comunidades impactadas y 2. Levantamiento de experiencias y aprendizajes que retroalimenten los procesos de educación ambiental con enfoque a los ecosistemas de humedal y la sinergia comunitaria para la conservación de los humedales priorizados.

Por lo tanto, a continuación, se describen el diseño de los siguientes formatos:

- Caracterización poblacional con énfasis en humedales

Los procesos de intervención e iniciativas que involucran diversos actores comunitarios de la sociedad civil y actores institucionales de un territorio, implica un reto en su abordaje, el cual refiere al conocimiento de las diversas dimensiones que componen tales actores sociales, desde una visión individual, hasta una lectura macro, que arrojen indicadores sociales, económicos, ambientales y de organización social, mediante los cuales levanten información sobre las dinámicas sociales que se tejen alrededor de una cuestión social y visibilicen las condiciones de los distintos grupos poblacionales involucrados (Gallo, Meneses y Minotta, 2014) ; para el presente caso, en la conservación de los humedales urbanos y rurales en la ciudad de Cali.

Es con tal premisa, que la relevancia de esta la caracterización poblacional, como herramienta diagnóstica con datos de primera fuente, sea clave a fin de direccionar de forma más asertiva, las estrategias y programas sociales, en la medida que, con el análisis de su información, se puede fundamentar el diseño, ajuste y desarrollo de acciones transformadoras, a situaciones o cuestiones que se comprenden como problemáticas, ya que, estas se responden satisfactoriamente al tener en cuenta las necesidades e intereses de los grupos poblacionales involucrados (Unión Temporal Proyecto SIGRA, 2022).

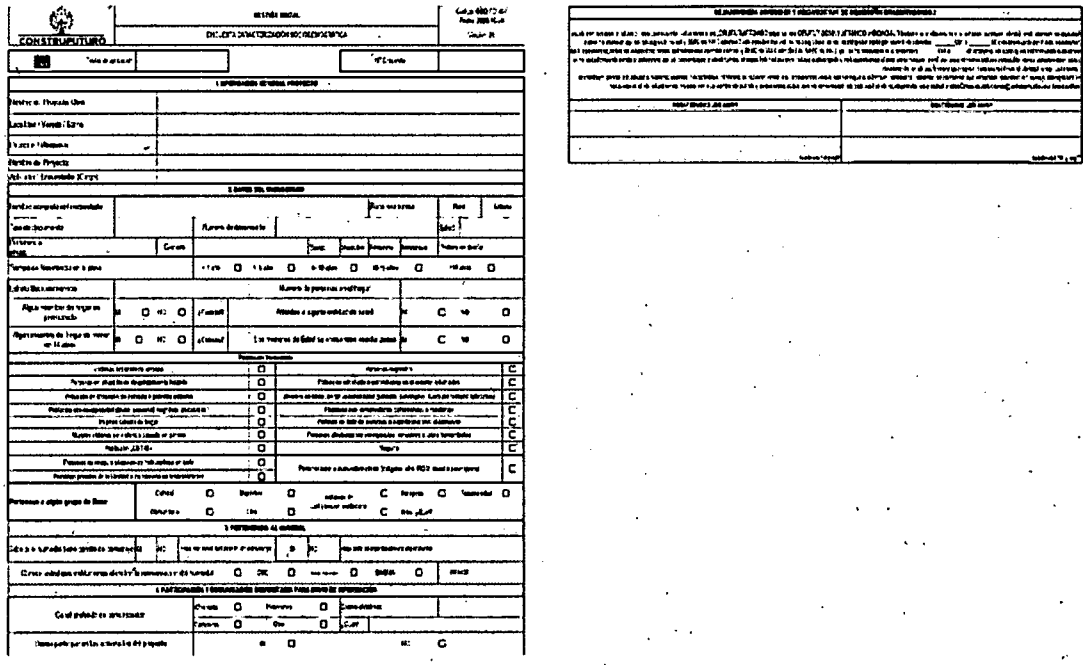


Ilustración 38 Formato de caracterización poblacional humedales
Fuente: Elaboración propia, área de Calidad. Construfuturo.

Por lo tanto, se diseña un formato de caracterización social, mediante cinco (5) secciones de información, la primera correspondiente a datos personales, de contexto familiar y residencial de él o la encuestado. Mientras que la segunda sección corresponde a información sobre condiciones de vulnerabilidad psicosocial.

Por su parte en la tercera sección se consulta sobre formas de participación ciudadana para la conservación del humedal, esta sección es fundamental para conocer en la comunidad del sector, su conocimiento sobre esta instancia de participación comunitaria entorno al humedal y su posibilidad de conectarse con él, a fin aunar esfuerzos al propósito de este, la preservación y restauración de los humedales, según el barrio o territorio rural en el que se encuentren. Mientras que la cuarta y quinta sección están orientadas a autorización sobre canales de información, al interés del encuestado sobre seguir conociendo eventos relacionados y demás gestiones en las que puede pertenecer como garante del proceso.

Finalmente, se añade la sección sobre autorización de uso de información y de permisos para la recolección de información audiovisual de los encuestados cuando participen en actividades ejecutadas desde el proyecto.

La implementación de esta herramienta diagnóstica será en el marco de eventos, encuentros talleres y/o demás ejercicios de construcción grupal, que el proyecto disponga, enfocado a fortalecer una mayor participación en las acciones de conservación ambiental para con el humedal focalizado y desarrollado de actividades eco-pedagógicas que involucren la participación tanto de residentes como de visitantes al humedal.

Su análisis al final del contrato 0741 de 2025, sistematizará y arrojará datos de interpretación cualitativa y cuantitativa de las muestras poblacionales que hayan participado en el diligenciamiento de las encuestas.

- Formato de experiencias en talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario

Ahora, en lo concerniente al levantamiento datos de valor sobre dimensiones de comprensión de las problemáticas de conservación para los ecosistemas de humedal, los retos y desafíos socio-ambientales y de territorio para su cuidado y también la dimensión de capacidad de agencia y organización que las comunidades de los territorios donde están ubicados los espejos de agua y su biodiversidad tienen para con la gestión de acciones, estrategias y alianzas que faciliten mayores prácticas y planes de conservación para con los humedales, es menester la aplicación de una herramienta diagnóstica, de forma que recopile las diferentes percepciones y/o situaciones de contextos desde las comunidades que habitan los territorios de impacto y hábitat de los humedales.

Para ello, los procesos de evaluación de talleres, eventos y demás encuentros comunitarios, desde lo pedagógico, requieren una medición de contexto, cambios y corresponsabilidades de conservación, tanto al inicio de un proyecto como al finalizar del mismo (Cabrera y Pérez, 2023). Con este ejercicio, se evidencia de la efectividad de la intervención educativa, añade información de mejoras continuas para próximos proyectos y también ubica un mapa de actores, como protagonistas y agentes para la promoción y acción participativa, en la misión de conservar sus entornos ecosistémicos.

De acuerdo con la UNESCO, el objetivo final de la educación ambiental es que nuestros entornos de vida sean sanos y saludables. "Aprender haciendo es una de las principales

modalidades de enseñar en lo ambiental" (Bennett, 1984, p.13), dejar evidencia del progreso de estos aprendizajes, es facilitar una mayor efectividad en los acciones y conocimientos que se están compartiendo; de forma que la utilización de una evaluación es una herramienta de mejora eficaz para tales propósitos.

SONDEO DE EXPERIENCIAS PARTICIPANTES
Contrato de obra 0741 de 2025- CVC y Construfuruto
Nov-Dic 2025

Nombre completo: _____
Edad:_____ Sitio: _____
Fecha: _____ Actividad: _____

1. ¿Qué aprendizajes se lleva de su participación en este encuentro?

_____
_____
_____
_____

2. ¿Qué nos recomendarías para mejorar estos encuentros?

_____
_____
_____
_____

3. ¿Pertenece al comité de comanejo del humedal? _____. Le gustaría recibir más información de las actividades que se realizan para su conservación _____.
4. ¿Qué recomendaciones harías para contribuir a la conservación y restauración de los humedales en la ciudad de Cali?

_____
_____
_____
_____

"Los humedales son refugios de vida, con su apoyo, somos guardianes para su conservación"

SONDEO DE EXPERIENCIAS PARTICIPANTES
Contrato de obra 0741 de 2025- CVC y Construfuruto
Nov-Dic 2025

Nombre completo: _____
Edad:_____ Sitio: _____
Fecha: _____ Actividad: _____

1. ¿Qué aprendizajes se lleva de su participación en este encuentro?

_____
_____
_____
_____

2. ¿Qué nos recomendarías para mejorar estos encuentros?

_____
_____
_____
_____

3. ¿Pertenece al comité de comanejo del humedal? _____. Le gustaría recibir más información de las actividades que se realizan para su conservación _____.
4. ¿Qué recomendaciones harías para contribuir a la conservación y restauración de los humedales en la ciudad de Cali?

_____
_____
_____
_____

"Los humedales son el hogar de la biodiversidad, de distintas formas de vida, con su apoyo, somos guardianes de su conservación"

Ilustración 39 Formato sondeo de evaluación de experiencias pedagógicas en campo
Fuente: Elaboración propia, componente de eduación ambiental Contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

El mecanismo de evaluación de este formato, aplica una metodología mixta desde la técnica del sondeo, ya que combina preguntas de respuesta abierta y se analiza mediante ponderación de categorías porcentuadas para una lectura más global de las respuesta al momento de su análisis. Esta compuesta por una sección de información del participante y los siguientes cuatro ítems evaluativos: valoración de los aprendizajes, valoración metodológica, participación comunitaria y valoración de planeación ambiental.

Al finalizar su aplicación, mediante una muesta poblacional de los actores involucrados en las distintas actividades del proyecto, arrojará información clave para establecer categorías referentes y metodologías asertivas en los desafios de conectar a más personas del sector o externas a él, al desarrollo de prácticas de conservación para con sus humedales, que queden plasmados en un plan de educación ambiental con enfoque a los seis humedales impactados en el marco de ejecucción del proyecto.

4.3.2. Comunicaciones y diseño de presentaciones del Contrato 0741 de 2025 para los seis (6) humedales priorizados.

La metodología aplicada para la convocatoria de las comunidades de interés en los humedales de: La Babilla y el Zanjón del Burro, Ecoparque Lago de las Garzas, Cañasgordas, Panamericano, Ibis e Isaías Duarte Cancino, ha sido a partir de la convocatoria vía llamada a los comités de comanejo para la revisión de sus agendas y coordinación de lugar de socialización, envío de flayer de invitación, también relacionamiento con el DAGMA, aliado estratégico en el territorio con enfoque a humedales y la coordinación con la Interventoría Humedales 2025, encargado de la supervisión de ejecución del contrato de obra 0741 de 2025.

Téngase presente que los comités de comanejo en áreas protegidas o humedales, son figuras constituidas por diversos miembros de la comunidad, residentes del perímetro o sectores aledaños que comprenden la ubicación del humedal. O como plantea Álvarez (2017), en el marco de gobernanza socio-ecológica en un determinado contexto, como espacios donde se reconocen saberes locales y se negocian reglas de uso y conservación, se componen comúnmente por grupos mixtos (comunidad, ONG, autoridades ambientales, investigadores, etc) que participan en monitoreo y toma de decisiones para la conservación del humedal que representan.

Los comités de comanejo facilitan la gobernanza en el territorio y la comprensión de los desafíos socio-ambientales que enfrenta un humedal, además fungen como puente con demás miembros residentes del sector para construir redes de trabajo y corresponsabilidades de conservación, ya que están hacen sinergia con las instituciones aliadas, fortalecimiento así de la resiliencia ecológica y social del humedal, monitoreo participativo y veeduría ciudadana para garantizar cumplimiento de medidas de conservación (Álvarez, 2017).

En la ciudad de Santiago de Cali, de acuerdo a los seis (6) humedales priorizados en el Contrato de obra 0741, estos estamentos de autoridad comunitaria, cumplen con la composición que requieren para ser comités de comanejo en los humedales, ya que

cuentan con representación incluso de otros estamentos de participación ciudadana (Juntas de acción comunales, ediles, consejos comunitarios o comités ambientales) a los que pertenecen, además de incluir la presencia de delegados de la institucionalidad territorial, para la veeduría, proposiciones y compromisos, sobre los proyectos o estrategias que son enfocadas a los humedales a cargo. Los anteriores humedales, por humedal, tiene ya constituido un comité de comanejo.

Por lo tanto, el primer ejercicio de socializaciones del Contrato de obra 0741 de 2025 se desarrolló mediante una reunión in situ, convocando a los actores ya mencionados y basándonos en la siguiente agenda: Presentación del objeto del contrato, información relevante del contrato y valor de ejecución para el humedal, humedales priorizados en el contrato, actividades en el humedal en cuestión, actividades de educación ambiental, estrategia de estudios y análisis de calidad de agua, canales de información con la entidad ejecutora.

Por lo tanto, se presentan las siguientes reuniones de socialización realizadas y sus principales momentos dentro de la reunión.

4.3.2.1. Socialización Humedal Ecoparque Lago de las Garzas con DAGMA 5-11-2025


En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo, JAL, Interventoría Humedales 2025, DAGMA y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 5 de noviembre de 2025 en el kisko de educación ambiental, en el Ecoparque Lago de las Garzas. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan la solicitud de cambio de dirección del humedal, ya que se encuentra en un corregimiento. Además, se resalta la estrategia de compromiso colectivo que ofrecen los ediles y comité de comanejo en extender mediante cartas, llamadas y distinto voz a voz, las estrategias de educación ambiental para fortalecer las prácticas comunitarias de conservación en los humedales, de forma que se puedan integrar distintos sectores y actores sociales colindantes, en estos procesos de reflexión y conexión con el humedal.



Ilustración 40 Flayer de invitación comunidad Humedal Ecoparque Lago de las Garzas a presentación de Contrato de obra 0741 de 2025
Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo

Se adjunta presentación visual empleada para la presentación del Contrato de obra 0741 de 2025.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025

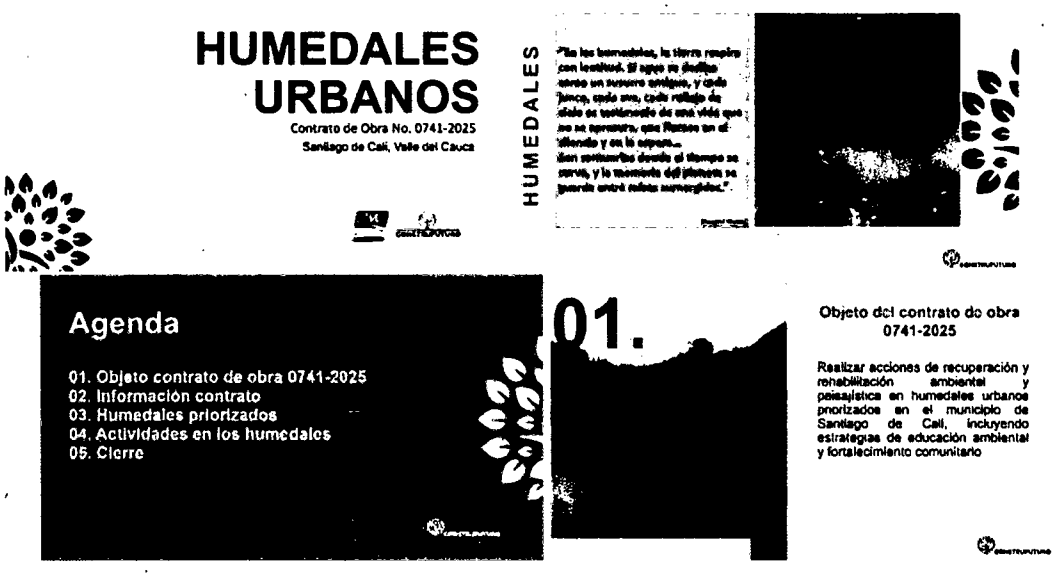


02.

Contratante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
Contratista: Fundación Construyamos Futuro - Construfuturo
Valor asignado a humedal Parque de las Garzas: $157.304.931
Plazo ejecución: hasta 31 de diciembre de 2025

03.

Humedales priorizados

ESTRUCTURA ECOLOGICA DE CALI




QUE ES UN HUMEDAL


En Colombia, la definición de humedal está respaldada por la Ley 2478 de 2025, la cual promueve la conservación de estos ecosistemas en el territorio nacional. Según esta ley:

Un humedal es un ecosistema que incluye áreas de tierra inundadas de manera permanente o temporal, naturales o artificiales, de agua dulce, salobre o salada, incluyendo manglares, pantanos, ciénagas, lagos, lagunas, estuarios, marismas, y cuerpos de agua costeros, entre otros.





HUMEDALES



04.

Actividades Generales en humedales



01. *Socialización contrato*
Recuperación Paisajística
02.
1. Control de hormiga arriera
2. Mantenimiento fitosanitario arbóreo
3. Manejo integral de gramíneas
Análisis de laboratorio de aguas
03.
04. Obras civiles

Actividades Humedal Parque de las Garzas



01. *Socialización contrato* Con comité de comanejo del Humedal
Recuperación Paisajística
02.
1. Control de hormiga arriera
2. Mantenimiento fitosanitario arbóreo
03. *Obra civil:* Adecuación de acceso peatonal



Adecuación de acceso peatonal

CONSTRUFUTURO

Gracias por su atención

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad del humedal Ibis.



Ilustración 41 Socialización Humedal Ecoparque Lago de las Garzas Contrato de obra 0741 de 2025

Fuente: Socialización comunidad Humedal Ecoparque Lago de las Garzas, kiosco educativo-Ecoparque Lago de las Garzas. 5 de noviembre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

4.3.2.2. Socialización Humedal Cañasgordas con comité de comanejo y Acueducto Parcelación Cañasgordas 17-10-2025

En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo, trabajadores del Acueducto Cañasgordas, Interventoría Humedales 2025 y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 17 de octubre de 2025 en las oficinas del Acueducto Parcelación Cañasgordas. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan el compromiso con la apertura del humedal en los momentos de obra, acompañamiento por parte de los miembros del Acueducto, coordinación de ejercicios de pedagogía sobre conservación ambiental en el humedal Cañasgordas con comunidad del sector, se presenta el diseño de la ubicación de creación del sendero y puentes elevados en mapa del humedal, también la revisión de dos esculturas o figuras representantivas del humedal para que puedan quedar en los puntos educativos.

Una momento importante dentro del ejercicio de socialización, refirió a como el humedal parece que está recibiendo un ingreso de agua de aguas negras, de las que no se sabe cuál es la conexión errada. Se recomienda al comité de comanejo hacer seguimiento a la notificación de este hecho al DAGMA, reportado por la entidad ejecutora del contrato de obra 0741 de 2025, Construfuturo. A continuación se adjunta presentación realizada del contrato.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025




02.


Contratante: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
Contratista: Fundación Construyamos Futuro - Construfuturo
Valor asignado a Humedal Cañasgordas: $899.561.768
Plazo ejecución: hasta 31 de diciembre de 2025

03.

Humedales priorizados






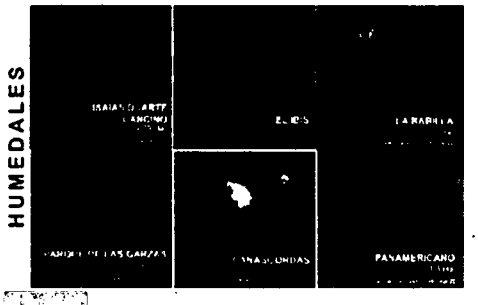

04.

Actividades Humedal Cañasgordas



01. *Socialización contrato*


Recuperación Paisajística

02.
1. Control de hormiga arriera
2. Control de Cuaresmillos
3. Mantenimiento filosanitario arbóreo
4. Mantenimiento de guaduales

03. *Obras civiles*
1. Construcción de senderos peatonales
2. Pasos Elevados
3. Parqueo en Reubicación
4. Baterías Sanitarias



Circuito Senderos Peatonales

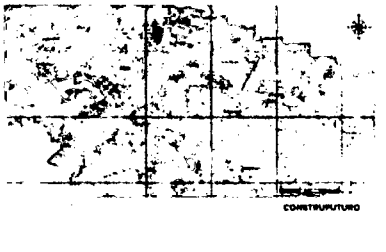

Recuperación Paisajística

La recuperación paisajística en humedales incluye acciones de manejo silvicultural como el control de guaduales, manejo de hormiga arriera y mantenimiento fitosanitario del arbolado, orientadas a conservar la sanidad vegetal, evitar la competencia entre especies y mantener la estabilidad ecológica y paisajística del ecosistema.





Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad Humedal Cañasgordas.






Ilustración 42 Socialización Humedal Cañasgordas Contrato de obra 0741 de 2025
Fuente: Socialización comunidad Humedal Cañasgordas, Acueducto Parcelación Cañasgordas. 17 de octubre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

4.3.2.3. Socialización Humedal Panamericano 21-10-2025

En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo del Humedal Panamericano, Interventoría Humedales 2025 y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 21 de octubre de 2025 en las oficinas de la Junta de Acción Comunal. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan el compromiso el compromiso de los miembros del comanejo para con la convocatoria de comunidad del sector y demás actores para maximizar su participación en las actividades de conservación del humedal, se recomienda también por parte de la comunidad su involucramiento en el seguimiento de las actividades de obra y solicitan enviar cronograma de actividades. Se destaca también la solicitud de involucrar mano de obra

de la comunidad que pueda hacer servicios de limpieza al humedal en el marco de la actividad que tiene el contrato 0741 de 2025.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025

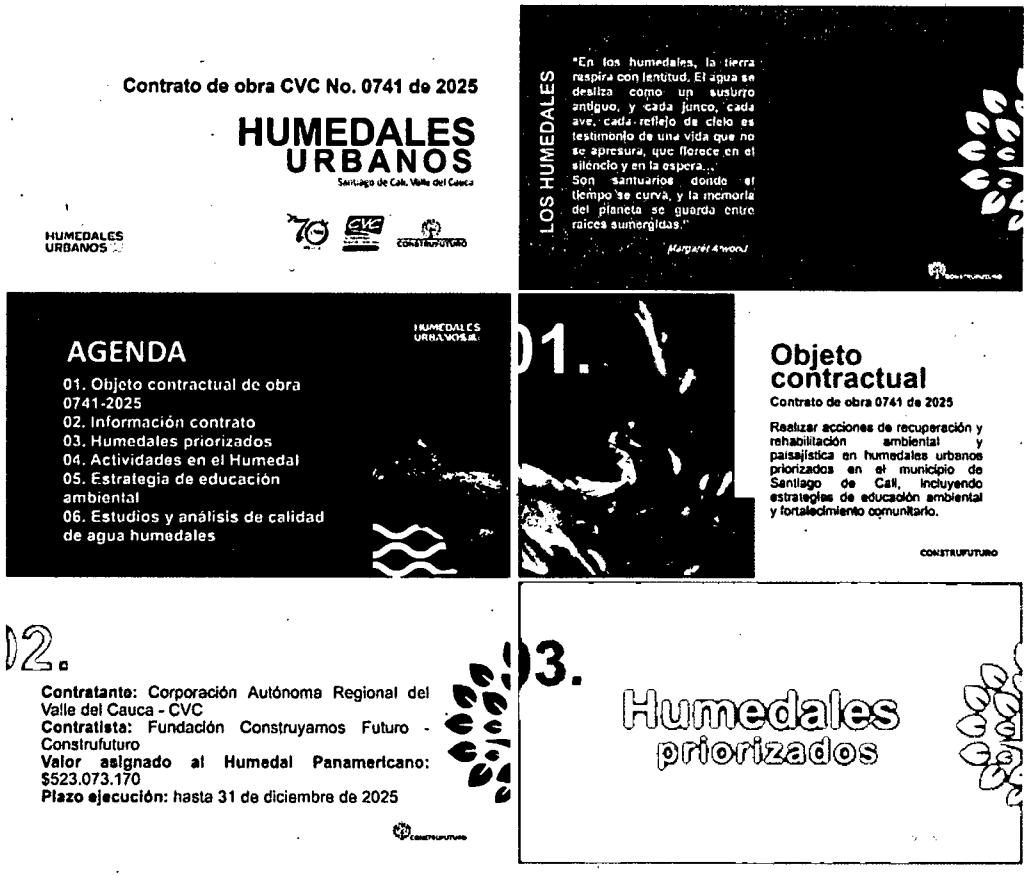


ESTRUCTURA ECOLOGICA DE CALI
¿QUÉ ES UN HUMEDAL?
HUMEDALES
ISAIAS DUARTE CANCINO
EL DIS
LA RAMADA
PANAMERICANO
04.
Actividades Humedal Cañasgordas
01. Socialización contrato Con comité de comanejo del Humedal
02. Recuperación Paisajística 1.Control de hormiga arriera 2.Mantenimiento fitosanitario arbóreo
03. Adecuación de sendero peatonal
CONSTRUFUTURO
05.
Diez (10) Encuentros de formación ambiental en ecosistemas de humedal y sinergia comunitaria
06.
ESTUDIO ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
11 HUMEDALES PÚBLICOS
Gracias
obras@construyamosfuturo.com

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad Humedal Panamericano.

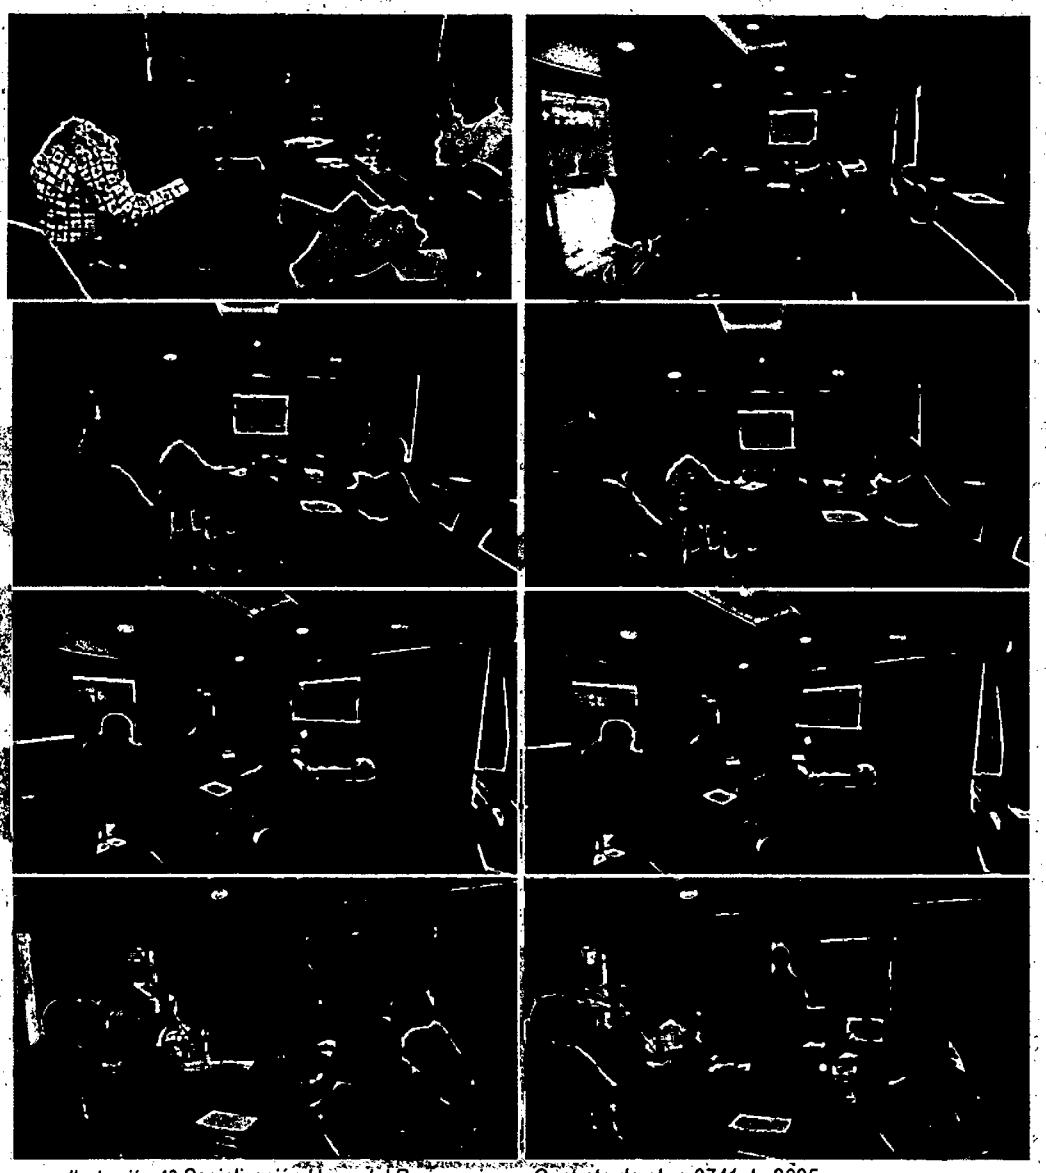


Ilustración 43 Socialización Humedal Panamericano Contrato de obra 0741 de 2025

Fuente: Socialización comunidad Humedal Panamericano, Junta de Acción Comunal. 21 de octubre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

4.3.2.4. Socialización Humedal Isaías Duarte Cancino 17-10-2025

En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo del Humedal Isaías Duarte Cancino, estudiantes de la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino, docentes Humedal Isaías Duarte Cancino, Interventoría Humedales 2025, DAGMA y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 17 de octubre de 2025 en la Institución Educativa Isaías Duarte Cancino. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan el valor de trayectoria comunitaria que tienen para convocar a las comunidades que conservan el humedal, se expone también como la comunidad se proyecta la presentación de propuesta para desarrollo de la iniciativa comunitaria para educación ambiental, también que el contrato pueda involucrar a la comunidad en los servicios de descolmatación del buchón en el humedal de forma manual.

Flayer de invitación comunidad Isaías Duarte Cancino a presentación de Contrato de obra 0741 de 2025



Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

Se adjunta presentación visual empleada para la presentación del Contrato de obra 0741 de 2025.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025





Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad Humedal Isaías Duarte Cancino.




Ilustración 44 Socialización Humedal Isaías Duarte Cancino Contrato de obra 0741 de 2025

Fuente: Socialización comunidad Humedal Isaías Duarte Cancino, Institución Educatica Isaías Duarte Cancino. 17 de octubre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

4.3.2.5. Socialización Humedal Ibis -Corregimiento de Navarro 30-10-2025

En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo del Humedal Ibis en el corregimiento de Navarro, comunidad habitante del sector, miembros del Concejo comunitario, Ediles, Interventoría Humedales 2025, DAGMA y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 30 de octubre de 2025 en el kiosko de la estación, en la Biblioteca Rural del Corregimiento de Navarro. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan la solicitud de cambio de slogan del proyecto, de Humedales Urbanos a Humedales de Cali, de forma que se incluyan los humedales de sectores rurales como ellos, recomiendan y resaltan la estrategia de educación ambiental y fortalecimiento comunitario a partir de conocer y recorrer otros humedales desde un intercambio de experiencias y destacan que el proyecto pueda mantener los canales de información y contacto siempre, sobre las actividades a realizarse en el humedal Ibis.

Flayer de invitación comunidad Ibis a presentación de Contrato de obra 0741 de 2025

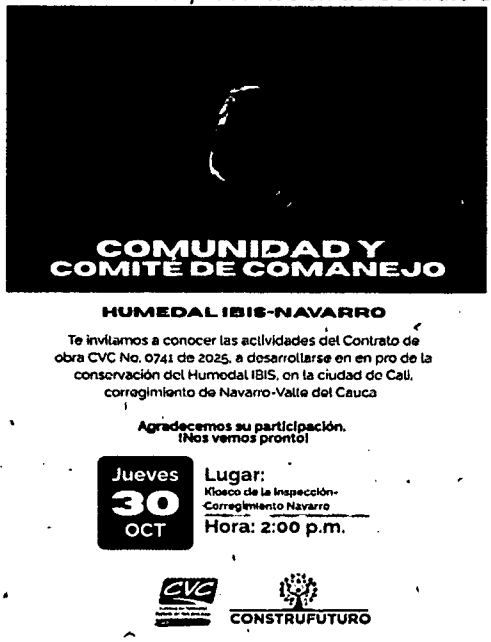


Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo

Se adjunta presentación visual empleada para la presentación del Contrato de obra 0741 de 2025.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025



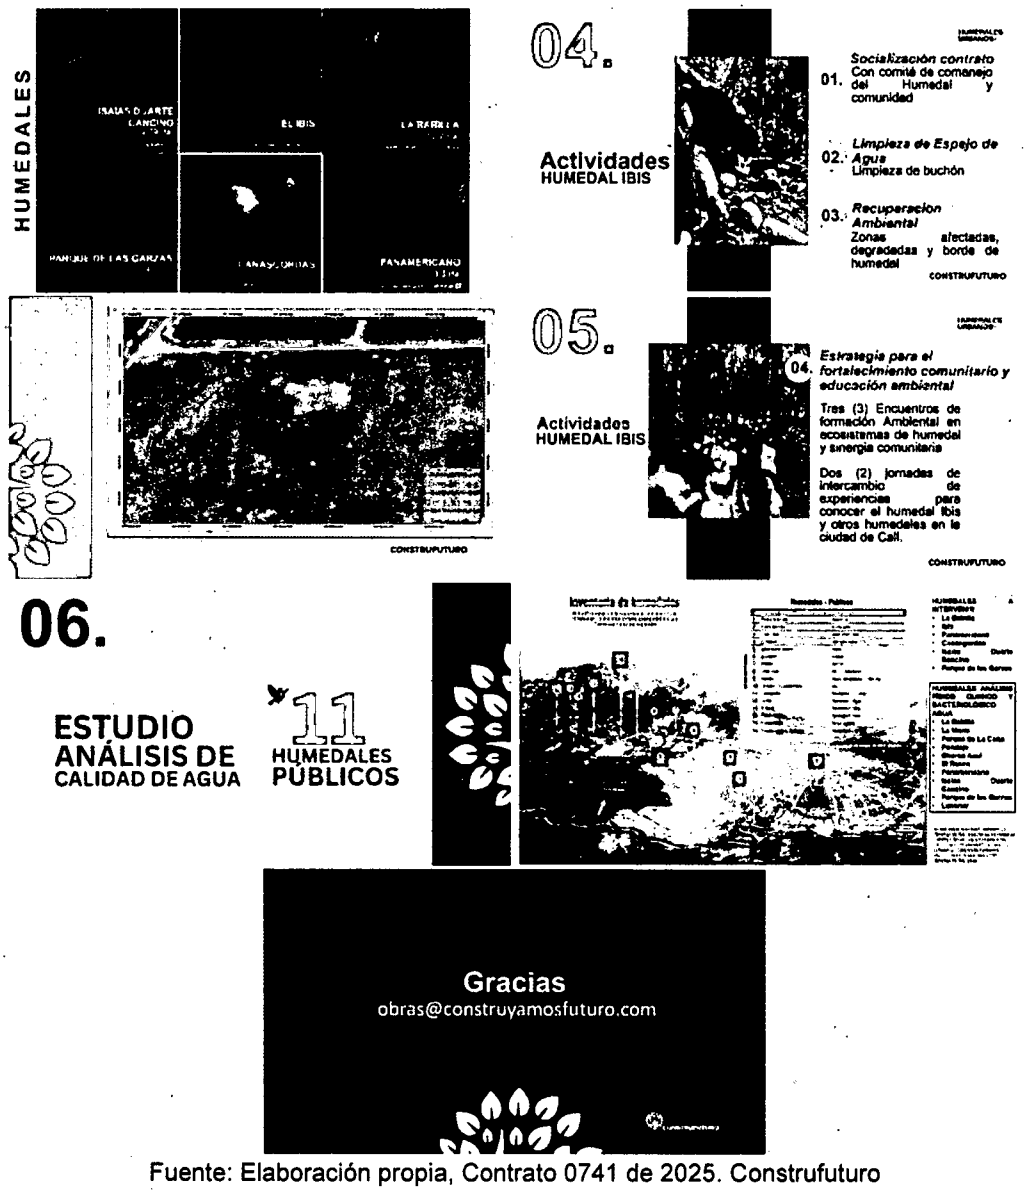

Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad del humedal Ibis.



Ilustración 45 Socialización Ibis Contrato de obra 0741 de 2025


Fuente: Socialización comunidad Humedal Ibi, kiosco de la estación- Biblioteca Rural de Navarro. 30 de octubre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

Los anteriores ejercicios de socialización facilitaron el conocimiento de los actores involucrados en los procesos de conservación comunitaria en la conservación de los humedales visitados también el grado de recepción y recomendaciones para la ejecución. Además, de generar el primer lazo de conexión con los liderazgos en territorio e institucionales para el desarrollo del Contrato de obra de 2025.

4.3.2.6. Socialización Humedal Babilla – 11-11-2025

En la presente reunión de socialización se dan cita miembros del comité de comanejo, JAC, Comité ambiental de la comuna 22, Interventoría Humedales 2025, DAGMA y equipo de Contrato de obra 0741 de 2025, el día 11 de noviembre de 2025 sector de rueniones de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Jardín. Sobre el balance de los principales momentos de la reunión, se destacan la solicitud de la comunidad en conocer el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento a la educación ambiental y fortalecimiento comunitario, recomendando abordar mucho más al sector comercial y visitante del humedal. También se realizan observaciones acerca los planes de cuidado a la fauna cuando se realicen intervenciones en guaduales o individuos arbóreos. Además de, brindar su apoyo en el acompañamiento en campo en las distintas acciones que estén en ejecucción.

Flayer de invitación comunidad Humedal La Babilla- Zanjón del Burro a presentación de Contrato de obra 0741 de 2025

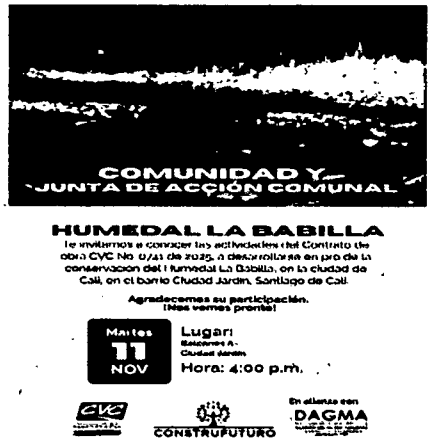

Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo

Se adjunta presentación visual empleada para la presentación del Contrato de obra 0741 de 2025.

Slides de presentación visual Contrato de obra 0741 de 2025





Fuente: Elaboración propia, Contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

A continuación se adjutan memorias de la reunión de socialización Contrato de obra 0741 de 2025 con la comunidad del humedal Ibis.



Ilustración 46 Socialización Humedal La Babilla-Zanjón del Burro Contrato de obra 0741 de 2025

Fuente: Socialización comunidad Humedal La Babilla-Zanjón del Burro, Junta de Acción comunal. 11 de noviembre de 2025, contrato 0741 de 2025. Construfuturo.

Los anteriores ejercicios de socialización facilitaron el conocimiento de los actores involucrados en los procesos de conservación comunitaria de los humedales visitados y priorizados en el marco de ejecución del contrato de obra 0741 de 2025, también se conoció el grado de recepción y recomendaciones de los mismos actores en territorio para una asertiva y acompañada ejecución. Además, con estos primeros encuentros, se genera el primer lazo de conexión con los liderazgos en territorio e institucionales para el desarrollo del Contrato de obra de 2025.

Así, la misión de la continuación de las actividades de ejecución y la estrategia de fortalecimiento comunitario y educación ambiental en conservación de los humedales, debe ser el puente para continuar apostando por la gestión institucional, en sinergia entre el liderazgo comunitario, las redes de colaboración entre la comunidad y los organismos públicos, así como la conexión con el territorio, lo que hacen o tiene como resultado una diferencia sustancial en los procesos de conservación de los humedales en la ciudad (Ferrin, 2025).

Fortalecer los lazos de comunicación, acción participativa integradora y apoyo a las iniciativas de las comunidades de comités de comanejo, al igual que seguir conectado la red de diversos liderazgos en humedales, con la institucionalidad, puede ser un elemento de contexto en la ejecución, transformadora y asertiva.

4.3.3. Talleres de educación ambiental "Humedales y biodiversidad"

Los talleres de educación se llevaron a cabo en tres humedales diferentes: Humedal la Babilla-Zanjón del Burro, Ecoparque Lago de las Garzas y Humedal Panamericano. En cada taller se recibió a los visitantes mediante un reconocimiento de la importancia del espacio donde se encontraban, las normas vigentes y la dinámica de cada humedal dentro de la ciudad. Durante el recorrido se habló sobre la importancia de la red hídrica, los ríos de nuestra ciudad, funciones de los humedales, especies de fauna y flora presentes y el futuro de nuestra ciudad y compromisos como ciudadanos para conservar el agua desde nuestra cotidianidad. Con fichas informativas, se fomentó el diálogo sobre los humedales, juegos de buscar parejas y formar reflexiones grupales.

Taller N°1 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas, Valle del Cauca. 21 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág. de

Proceso: Tipo Reunión

Fecha: 21 11 2025 Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas Externa ☐

Tema: Humedales y biodiversidad Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Hurly Lizeth Sanchez	El oriente y sus Huellas		E	
Dey Dayli Perez Moreno	El Oriente y sus Huellas	3104546919	A	
Maria Liliana Ocaba	el oriente y sus Huellas	3158957767		
Nubia Liliana Peña	El oriente y sus Huellas	3158957767		
Miguel Mosquera	el oriente y sus	3d15(-96		
Yanier Dayana Quintero	El oriente y sus Huellas	3003859688		
Cherolen Peña Cuadros	el oriente y sus Huellas	3216875045		
Nelson Vargas	El oriente y sus Huellas	3145561911		
Lucen Peña	el oriente y sus Huellas	3001691880		
Martha Y	Oriente y sus Huellas	3146136765		
Laura Villalba	PONAL	3228178772		
Chelseen Vanessa	el oriente	3017390550		

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COO FT 0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág ☐ de ☐	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 21 11 2025	Lugar: Ecoparque lago de las Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ingrid silva V	QVS	Promotor	ingridsilva@yahoo.com	
Maribel Lopez	QVS	Promotora		
[illegible]	Quiero vivir Sano.		3163388495	
Maria Monroy	Quiero Vivir Sano	Empresaria	mariamonroygaleano@gmail.com	
[illegible]	Q.V.S.	Empr.	[illegible]	
Sandra chaux.	Q.V.S	Recuperadora	Sandra@hotmail.com.	
Dina Luz Estupiñan	Educ... Ambiental	Biólogo	3156370496	
Alejandra Zamora	Educadora Amb.	Bióloga	alejazamora@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°2 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas





Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas, Valle del Cauca. 22 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 22 | 11 | 2025	Lugar: Ecoparque Lago de los Gaviros	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Sara castillo chaia	Iglesia adventista	visitante	3160530490	
Sandra M. chará	Iglesia Adventista	visitante	3185007410	
Jose dario mejia prieto	Iglesia adventista	visitante	3127607470	
Josè Barrios	L Adventista	Visitante	3232245862	
Martha Cano	1 adventista	visitante	3168968609	
Maria Yeny Tabo	1 adventista	visitante	3145224065	
Jenn Angulo Castro	Iglesia Adventista	Visitante	3003909836	
Luisa M. Montenegro C.	Iglesia Adventista	Visitante.	3162852726.	
Luis A. Morales L.	Iglesia Adventista	Visitante.	3165595690.	
Paola Andrea Gil	Iglesia Adventista	Visitante	3137737543	
Luis Miguel Zamora	Iglesia Adventista	Visitante	3164007887	
Luis Fernando Cano	Iglesia Adventista	Visitante	3181355325	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 22 | 11 | 2025	Lugar: Ecoparque Lago de los Gaviros	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Yeziel Gonzalez	Iglesia Adventista	visitante	Yezgon07capellan@gmail.com	
Silvia Morales	Iglesia Adventista	Visitante	3001950576	
Steven Mosquera	Iglesia Adventista	Visitante	3127775548	
Sofia Mosquera	Iglesia Adventista	Visitante	3127775548	
Omaira Morillo	Iglesia Adventista	Visitante	3197411348	
Jose Javier Hernandez	Iglesia Adven.	visitante	Jjavarma@hotmail.co	
Luz Olivo Hernandez	Iglesia Adven.	Visitante	3178276827	
Alejandra Zamorano	Educadora ambiental	Bióloga	alezamorano@gmail.com	
Diana Luz Estupiñan	Educadora Ambiental	Bióloga	3155 [illegible]	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°3 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque lago de las Garzas, Valle del Cauca. 27 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 27 Nov 2023	Lugar: Ecoparque Lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Taller pedagogico Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Luz Marlyn Tabal	Docente	Docente	luzmerlyn@gmail.com	
Yorleny Dayana Valencia	Gabriel Garcia M.	Estudiante	valenciayandaoi1.com	
Maria Camila Castillo C	Gabriel Garcia M	Estudiante		
Carmen Rosa Padilla	Comuna 17	independiente		
Olfi Balanzon	Comuna 17	pensionado		
Carlos H Gordillo	Comuna 12	pensionado	chgordillo@gmail.com	
LUIS BENJUMEA B	COMUNA 17	INDEPENDIENTE		
Yazmin Barrios	Comuna 17	Independiente	Yarredo@hotmail	
Ana M Pantoja M D.	comuna 17	empresaria	anampachap@gmail.com	
Miguel Angel Eylo	comuna 17	Estudiante	sgsastico20@gmail	Miguel Eylo
Liceth Cardona A.	Comuna 17	Estudiante		
Stephano Smith Mayor Cano	Comuna 17	Estudiante		

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 27 Nov 2023	Lugar: Ecoparque Lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Talle. pedagogico Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Gloria ortega	JAL Sta Anita		miguelhgarcia@g	
Miguel Hgarcia	" "		miguelhgarcia@gmail.com	
Adriana Bermudez	JAC Santa Anita			
Gloria Vidal	JAC Suntuante		gloria vidal	
Ivan Humberto Cano	DAGMA		ivanhcano@	
Alejandra Zuñiga	Educadora Ambiental	Bióloga	alegazuma@gmail.com	

Taller N°4 Humedales y biodiversidad_ Humedal Panamericano



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Humedal Panamericano, Valle del Cauca. 27 de noviembre de 2025,

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág. de

Proceso: Tipo Reunión

Fecha: 27 Nov 2025 Lugar: Humedal Panamericano Externa ☐

Tema: Taller pedagogico Humedales y biodiversidad Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELEFONO	FIRMA
Sonia Giraldo	Ciudadela Comfandi		Gloria-isabel2012@hotmail.com	
Gloria Isabel Lopez	Delegada Emprendim Com 17		gloria-isabel2012@hotmail.com	
Rodrigo Reyes Lucumi	CNSdd Comfandi	Economista	Jarandu71@gmail.com	
NUBY SIDEN TURTEN PA	CIUDADELA COMFANDI	INDEPENDIENTE	paoldeparmeo07@gmail.com	
Clara B. Scarpetta	Sin Sello Mesa Mujeres	AGosta vecchora	clara scarpetta@hotmail.com	
Olga Patricia Londoño Y.	JAC Comuna 17	Vicepresidenta	osmalondo2@hotmail.com	
Anthony Perea Garcia	JAL Asentamiento 17	Edil Florida	anthonygarcia@gmail.com	
Yorleny Valencia R.	CVC/UM.	Estudiante	Valencia0743@comunidad.com	
Hollt Camilo Cortes	Gabriel Cortes M	Estudiante	Hollt.cortes@unicatolica.edu.co	
Luz Yerly Valencia	Comuna 17	Docente	luzyerly@gmail.com	
Carmen Rosa Padilla	Comuna 17.	Independiente	carmenpadilla7@gmail.com	
Alvaro Sepulveda	C. Anita	pensionado	—	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.26

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN					Pág 1 de 1	CVC
Proceso:						Tipo Reunión
Fecha:	27	Nov	2025	Lugar: Humedal Panamericano		Externa ☐
Tema: Taller pedagogico Humedales y biodiversidad						Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Gladys E. Sanchez	Ciudadela Comfandi	Delegado	lusloveda2575@gmail.com	
Yurleny Orejuela Valencia	Ciudadela Carrera M.	Estudiante	Valentinayamaly-2@hotmail.com	
Maria Camila Cadena	Ciudadela Carrera	Estudiante	mariacamilacadena@hotmail.com	
Zaintth Salgado Ortega	JAC Cañaveral	Delegada	zaintthsalgado@gmail.com	
Yuma Estupiñan	Aroborizar		yumaestupinan@gmail.com	
Heiber Plaza	"		"	
Luz Amparo Garcia	Arborizar		"	Luz Adriana C
Maria Esperanza Soto	Ciudadela Guadalupe	Bióloga	3165534118 macsotu@ymail.com	
Mag Isabel Nieto	Comuna 11		chavon196769@gmail.com	
Alejandra Zamorano	Educadora Amb.	Biologa	alejandrazamorano@hotmail.com	

VERSIÓN 03 - Fecha de aplicación 04-03-2019 COD FT 0343 28

Taller N°5 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 28 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. ___ de ___	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 28 | 11 | 2025	Lugar: Ecoparque Lago de la Garza	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ronal Gutiérrez Valdés	JAC. Comuna 4	Líder comunal	ronaldgutierrezvaldes@gmail.com	
Mary Sánchez A.	JAC 1º Mayo	Líder Amb	marysanchez@gmail.com	
Ana M. Lema Arboleda	JAC Ecoparque Lago de la Garza	Pensionado	mylecarmona@hotmail.com	
Nicole Ximena Figueroa T.	JAC Ingenio	Arquitecta/Estudiante	Nicole.figueroa@autónoma.edu.co	
Alba Lucía Valencia	JAC Ingenio	Comerciante	albita.6@hotmail.com	
Fabiano Arciniegas	JAC Comuna 2	Vicepresidente	arquitectural.marinos.01@gmail.com	
Lucía Aguilar	JAL Comuna 17		aguilar9319@hotmail.com	
Maria Rocío Lozano	JAL Comuna 17	Coordinadora	—	
Dinalue Estupiñan	Estadio Antonio Bilbao	Bilbao	3156940020	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. ___ de ___	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 28 | 11 | 2025	Lugar: Ecoparque Lago de la Garza	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Daniel Cabrera	BIODESS	Ing Ambiental	Tecnologiadelatierra@live.com	
Stephanie Grisales	Biodess	Com. social		
Fernanda Ramírez	comuna 17			
Juan José Arbeláez	Comuna 17	Estudiante	juanjos3308@gmail.com	
Mauricio Arboleda	Comuna 17	Independiente	mauricio.4@hotmail.com	
Sandra P. Vargas	Sal. Carretero 2	Hogar.	spvargas@hotmail.com	
Jairo Soto Torres	CVC Cauca Sup.	Ing. Sanitario	sotoromes@hotmail.com	
María Elena Valencia	comuna 17	mg. ambiental	melenavalenco@gmail.com	
Ana Milena Cabrera	comuna 17	Técnico ambiental	cambi —	
Alexander Silva Vargas	comuna 17	AUX. cocina	[illegible]	
José Fabián Muñoz	COMUNA 17		JFSanchez	
Sandra Rivera P.	comuna 17		[illegible]	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°6 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas





Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 28 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág. 1 de 1

Proceso: Tipo Reunión

Fecha: 28 11 2025 Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas — Externa ☐

Tema: Humedales y biodiversidad — Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Julián Naranjo	SENA-CDTI	Instructor	jnaranjo@sena.edu.co	
María Camila Vallejo Alzate	Sena CDTI	Aprendiz	mariacamila.vallejo1@sena.edu.co	
Miguel Ángel Lizcano Mejía	Sena - CDTI	Instructor	malizcano@sena.edu.co	Miguel.
Aitza Dayana Sandoval Villa	Sena - CDTI	Aprendiz	sandovalaitza17@gmail.com	Aitza S
Karol Vanessa Valencia	Sena-CDTI	Aprendiz	carolvalencia37@gmail.com	
Cameron Michael Caicedo	Sena CDTI	Aprendiz	cameroncaicedo@gmail.com	
Andrés Camilo Musicuta G.	SENA - CDTI	Aprendiz	curiktuncjut@comut.com	
manuel Santiago Pertuz M.	Sena - CDTI	Aprendiz	Santiagopertuz2004@gmail.com	Santiago P.
Jhonathan David Ortiz R.	Sena - CDTI	Aprendiz	Jhonatancorrentista@gmail.com	Jhonathan
Laura Andrea Medina López	Sena - CDTI	Aprendiz	lauramedina08@gmail.com	
Lina María Sánchez	Sena-CDTI	Aprendiz	[illegible]	Lina M.
Juan Martín González	SENA-CDTI	Aprendiz	[illegible]	

VERSIÓN 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD. FT 0340 28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 28 / 11 / 2025	Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Juan David Cuero Reyna	SENA - CDTI	Aprendiz	juandavidcuero@gmail.com	
Harold Andrés ordoñez	Sena - CDTI	Aprendiz	haroldordonez968@gmail.com	Harold B.
Lily M Ramirez	2808 ACU.	Acudiente	lindsaychocolatina22@live.com	
Dora Luz Estupiñan	Educadora ambiental	Biólogo	3156570777	
Cristian Rojo Beinal	Sena	Aprendiz	beinalcristian487@gmail	
Yeny Beinal	Particular	Visitante	yeny495@gmail.com	
Katerin Beinal	Particular	Visitante	beinalkalli06@gmail.com	K.P.B.
Alejandra Zamorano	Educadora Ambiental	Diócesis	Alejamorano@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.23

Taller N°7 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 29 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. ___ de ___	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 29 / 11 / 2025	Lugar: Eco parque Lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ryan Hoffing Barona	Colegio 19	Prof-Ciencias	ryanhoffingbarona@hotmail.com	
Juan Miguel Vivas	Col 19	6/1/26	[illegible]	
Jhyan David Mosquera	Iglesia Adventista del 7 día	Visitante	"	
Sonia María Sánchez	Iglesia Adventista	Visitante	"	
Sara Soria Vera	Iglesia Adventista	Visitante	"	Sara V
Dubys Sánchez Mop	Igl Adventista	Visitante	dubysmop@gmail.com	Dubys S.
Gildardo Marín Ramírez	Iglesia adventista 7 día	Visitante	gimer@hotmail.com	
Dina Luz Estupiñan	Educadora ambiental	Bióloga	dilucos@gmail.com	
Alejandra Zamorano	Educadora Ambiental	Bióloga	[illegible]	


VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD. FT.0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. ___ de ___	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 29 / 11 / 2025	Lugar: Eco parque lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Harry Irena Quiroga	Iglesia Adventista del 7	Docente pensionada	[illegible]	
Jhuneth Sánchez	Iglesia Adventista del 7 día	Docente	Jhunethsanchez@hotmail.com	Jhuneth S
Hada Albarracín A.	Iglesia Adventista del 7 día	[illegible]	[illegible]	
Diana Alvarez		[illegible]	[illegible]	
Hilary Manjarrez Sánchez	Iglesia adventista 7día	Estudiante	[illegible]	Hilary M
Isabel Bermudez	Iglesia adventista 7día	Ama de casa		Isabel
Ana Bermudez	Iglesia Adventista	Hogar		Ana B
Josefina Valdes	Iglesia adventista	Hogar		
IVAN PATIÑO	Iglesia adventista			
Yoser Estrada	Fundecva	Visitante	3115388773	
Lina María Hincapié	Iglesia Adventista	Ama de casa	3217820159	
Amparo Moreno	Iglesia Adventista	Ama casa	3048046	Amparo Moreno

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD. FT.0340.28

Taller N°8 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas

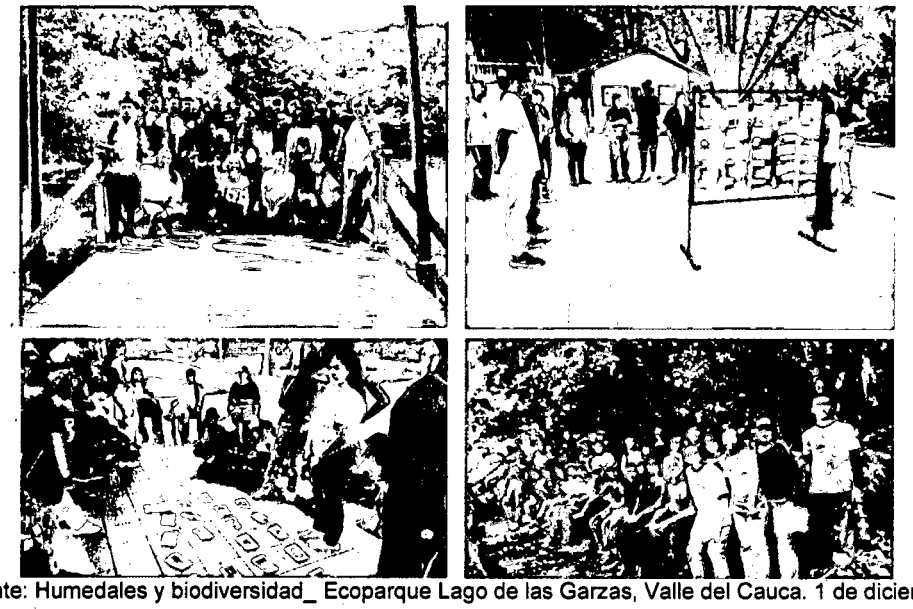

Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 1 de diciembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN — Pág. 1 de 1 — CVC

Proceso: — Tipo Reunión: Externa ☐ Interna ☐

Fecha: 1 / 12 / 2025 — Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas

Tema: Humedales y biodiversidad

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Daniela Angulo Morales	Universidad del Valle	Estudiante	daniela.angulo@correounivalle.edu.co	Daniela Angulo
Javier Benavides	"	"	javier.benavides@ "	Javier
Sandra Patricia Ortiz Tabares	"	"	sandra.ibarra@ "	Sandra
Claudia Elizabeth Tangarife M.	"	"	tangarife.claudia@correounivalle.edu.co	Claudia Tangarife
Samantha Perea Jaramillo	"	Estudiante	samantha.perea@correounivalle.edu.co	Samantha
Yarleny Perez C.	"	"	Yarleny.Perez@correounivalle.edu.co	Yarleny
Maria del mar Rios(a)	"	"	maria.mar.rios@correounivalle.edu.co	Maria del mar
Vera Yulieth Ruiz Ayala	"	"	vera.ruiz@correounivalle.edu.co	Vera Ruiz
Juan Daniel Castañeda Varon	"	"	3160405287	Juan
Dayana Ducuara Hoyos	"	"	dayana.ducuara@correounivalle.edu.co	Dayana
Sofia Castro Canelo	"	"	sofia.castro@correounivalle.edu.co	Sofia C.
Sebastian Agredo Flores	"	"	sebastian.agredo@correounivalle.edu.co	
Alejandra Zamorano	Estudiante Amb.	Biologa	alejzamorano@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 — COD: FT.0340.24

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 1 12 2025	Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Jefferson Gomez Villada	Univalle	Estudiante	318 9776180	
Vanessa Flórez.	Univalle	estudiante	323 522 4841	Vanessa.
Elka Silva Alvarez	Univalle	Estudiante	329 5888407	
Nini Johana Usma	Univalle	Estudiante	3127158137	Nini J. Usma
María Verónica Moreno Sotelo	Univalle	estudiante	3207167907	
KAREN MELISSA CANO M	UNIVALLE	ESTUDIANTE	3209979336	KAREN CANO M
Wendy Tatiana Muñoz Criollo	Univalle	estudiante	3116061921	
Michael Daniel Quiñones Lemos	Univalle	estudiante	3107498058	
Karen Natalia chito	univalle	estudiante	3208691268	karenchito
Brayan Steven Garcia	univalle	Estudiante	3134406449	
Maria Felipe Ortiz Rivera	Univalle	Estudiante	3216189166	
Valeria Pedraza Pizo	Univalle	Estudiante	3164970672	
Dina Luz Estupiñan	Educadora ambiental	Bióloga	3136570499	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°9 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 2 de diciembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 2 12 2025	Lugar: Espacio Lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Juan Sebastian Sevilano	Universidad Cristiano Jose Camacho		3105213912	Juan Sevilano
Ana maria Cardozo Bello	UNIAJC		3011381081	
Nataly Agudelo Robledo	Uni camacho	Estudiante	3163592827	
Laura Lucía Cano	Uni camacho	Estudiante	3127604954	
Karol Yulieth Cano M	Uni camacho	Estudiante	3233689864	
Elkin Julian Ibagon Tovar	Uni camacho	Estudiante	3024955543	
Nicol Vercelis Castaño	Uni camacho	estudiante	3229787559	
Angie Zuleima Arango	Uniajc	Estudiante	3042971137	
Ubi Sami Cortechanga	Uniajc	Estudiante	3209661582	
SANDRA M.D.H.	UNIAJC	Docente	zlombana@profesores.uniajc.edu.co	
Manuel Eduardo Vivero	Uniajc	Estudiante	3135539541	
Nelson Daniel	Uniajc	Estudiante	7165268566	
Fiorella Moscos	Uniajc	Estudiante	3196064326	


VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. de	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 2 12 2025	Lugar: Espacio Lago de los Garzas	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Anderson Hoyos	BPCC		3158128611	
Nerly Yepes	Uni camacho		3138940329	
Brigith Tatiana G	Uni camacho		3233437803	
Melissa Martinez Perea	Uni Camacho		3209546271	Melissa
Laura Sevillano	Uni Camacho		3150339431	
Yhesli Dahiana M.	Uni camacho		3128582095	Dahiana
Estefania Ramirez	Uni camacho		3146416497	
Daniel Eduardo Rendon	Uni camacho		3137699767	
Jorge Luis Pecho	Auxiliar Unicol		3117727617	
Yoselino Narvaez	Uni Camacho		3133486834	Yoselino M
Vanessa Acosta	UNIAJC		3104709376	
Jdieth Melissa Adarme	UNIAJC		3169936317	Jdieth Adarme
Laura Manuel Santiago	Uniajc		3228548567	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°10 Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas

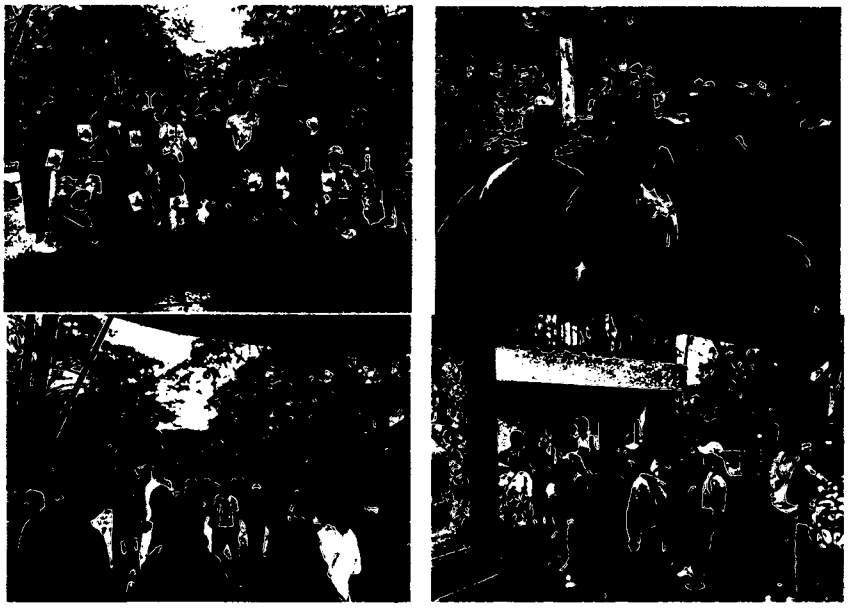

Fuente:Humedales y biodiversidad_ Ecoparque Lago de las Garzas, Valle del Cauca. 4 de diciembre de 2025, Contrato 0741 de 2025.

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág ___ de ___ CVC

Proceso: Tipo Reunión

Fecha: 4 12 2025 Lugar: Ecoparque Lago de las Garzas Externa ☐

Tema: Humedales y biodiversidad Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Santiago Ignacio E	UV	Estudiante	1006626649	Santi
Ariel Mendez	Universidad Valle	Estudiante	3162961801	Ariel
Tanis Cortes	Univalle	Estudiante	3142944179	Tanis
D. Paula Muñoz	Univalle	estudiante	3136927753	Paula
Daniela Cortes Cruz	Univalle	estudiante	3174107869	
Noreli Mosquera	Univalle	Estudiante	3155478479	
Maria Juliana Cortés	univalle	Estudiante	3203113310	
Hannah Lyda Ramos	Univalle	Estudiante	3122929970	
Thu Molina	Univalle	Estudiante	3016642015	
Laura Castaño	Univalle	Estudiante	3174806018	
Jader Leonardo García	UniValle	Estudiante	3147765224	
María Camila Gómez	Univalle	Estudiante	3054498018	
Alejandra Zamorano	Educadora Ambiental	Bióloga	alejamamaq@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD. FT.8340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 4 12 2025	Lugar: Escenario Lago de los Cisnes	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELEFONO	FIRMA
Mariana Arbeláez	Univalle	Estudiante	Marianaarbelaez@correo.univalle.edu.co	
Sebastian Castillo	Univalle	Estudiante	Sebastian.castillo.zu@correo.edu	
Estefani Muelas	Univalle	Estudiante	estefani.muelas@correo.edu	
Jasa Clavijo	Univalle	Estudiante	jasa.clavijo@correo.edu	
Alisson Aparicio Rosa	Univalle	Estudiante	Alisson.Aparicio@correo.edu	
Luis Carlos Bernal M.	Univalle	Estudiante	luis.carlos.bernal@correo.univalle.edu.co	
Juan Lozada Salazar	Univalle	Estudiante	lozada.salazar@correounivalle.edu.co	
Yadys Xilena López	Univalle	Estudiante	yadys.lopez@correo.univalle.edu.co	
Mariana Salazar	Univalle	Estudiante	Salazar.mariana@correo.univalle.edu.co	
Juan Aparicio Silva	Univalle	Estudiante	juan.aparicio@correo.edu	
Valentina Ochoa Ayala	Univalle	Estudiante	valentina.ochoa.ayala@correo.edu	
Juan Camilo Cardona	Univalle	Estudiante	juan.camilo.cardona@correo.edu	3136774077
Dina Luz Estupiñan	Educación ambiental	Biólogo		

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°11 Humedales y biodiversidad_ Humedal La Babilla Zanjón del Burro



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Humedal La Babilla Zanjón del Burro, Valle del Cauca. 6 de diciembre de 2025, Contrato 0741 de 2025

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 6 12 2025	Lugar: Humedal La Babilla	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ofelia Mon	visitante		3178318182	ofelia M
Valeriana	visitante	Fotografa	V7812d.oz	
Mariana G.	visitante	Fotografia	3139429955	
Luis Carlos Mej	Visitante	Biologo	3053796150	
Jessica Rendle	Visitante	Bióloga	3188390080	Jessica R.
Vera Rojas	Visitante	Mesa.	3188390080	
Alyandra Zamorano	Estudiante Ambiental	Biologa	3155580205	
Diaz Luz Elyan	Estudiante Ambiental	Biologa	3156520979	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 6 12 2025	Lugar: Humedal La babilla	Externa ☐
Tema: Humedales y biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Stephanie Prieto Sanchez	Visitante	Psicologa	spssu.ebd@gmail.com	Stephanie P.
[illegible]		Biologo	[illegible]	
Diego Fab Mejia Nova		Ing electronico	diegomejianova.phd@gmail.com	
Diana V Gallego S		Biologa	dianavale.gallegos@gmail.com	Diana Gallego
Maria Guiot		Financiera	mariae2905200@gmail.com	
Yadira L.N		Fotografa	3223830202	
Marlyn E		fotografa	"	
Sebastian E.		Fotografa	"	
Frances Lopez Alonso	Visitante	Conductor	[illegible]	
celeste Cuervares	Visitante			celeste
[illegible]	Visitante		[illegible]	
Juliana Carvajal	Visitante		Julianalobocarvajal@gmail.com	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0340.28

Taller N°12 Humedales y biodiversidad_ Humedal Panamericano



Fuente: Humedales y biodiversidad_ Humedal Panamericano, Valle del Cauca. 7 de diciembre de 2025, Contrato 0741 de 2025

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pag ___ de ___ CVC

Proceso: ,

Fecha: 7 | 12 | 2025 Lugar: Humedal Panamericano

Tema: Humedales y biodiversidad

Tipo Reunión: Externa ☐ Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Jefferson Rodriguez V	Pisno Valle	Ofimario barrido	3148653521	Jefferson R.V
Mauricio Arujol	Foco Cali	Vistas	3134241670	
EULICES CHURY	VICITANTE	MENZOLERO	320 6952345	
Francesca B	Visitante	Sociologa	3168722423	
Louis Henrich Garcia	visitante	conductor	317 2720836	
Louis Samuel Henao A.	visitante	Estudiante	317 2720836	

VERSIÓN: 03 - Fecha de aplicación: 04-03-2019 COD: FT.0348.28

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág ___ de ___	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 3 12 2025 Lugar: Humedal Panamericano		Externa ☐
Tema: Humedales y Biodiversidad		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
M° Camila Valencia G.	VISITANTE	Instructora	camilavalencia92@gmail.com	
E Salome cuero V	Visitante	Estudiante	3136289816	
[illegible]	visitante	Independiente		
Adriana Valencia	visitante	Independiente	alem@gmail.com	
[illegible]	club [illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	club [illegible]	[illegible]	[illegible]	
Dina Luz Estupiñan	Educadora Ambiental	Bióloga	3156540939	
Alejandra Zalvarano	Ed. Ambiental	Bióloga	[illegible]	

VERSIÓN. 03 - Fecha de aplicación. 04-03-2019 COD FT.0340.28

Anexo 2. Soporte de talleres

4.3.4. Carnaval de Educación Ambiental – Humedal Isaías Duarte Cancino

En el marco de este componente, se resalta la realización de una actividad especial en el Humedal Isaías Duarte Cancino, desarrollada el 25 de noviembre de 2025, que integró expresiones artísticas, muestras culturales, actividades educativas y un recorrido ecosistémico, logrando una participación aproximada de 150 asistentes provenientes de instituciones educativas, organizaciones comunitarias y habitantes de la Comuna 15. Este espacio, denominado "El Humedal se viste de Cultura", se enmarcó en el IX Carnaval Ambiental "Inspiración de Vida", y permitió reforzar la apropiación social del humedal, mediante actividades lúdico-pedagógicas y la entrega de materiales ecológicos, en una puesta en escena con soporte logístico adecuado y seguro para los participantes.


















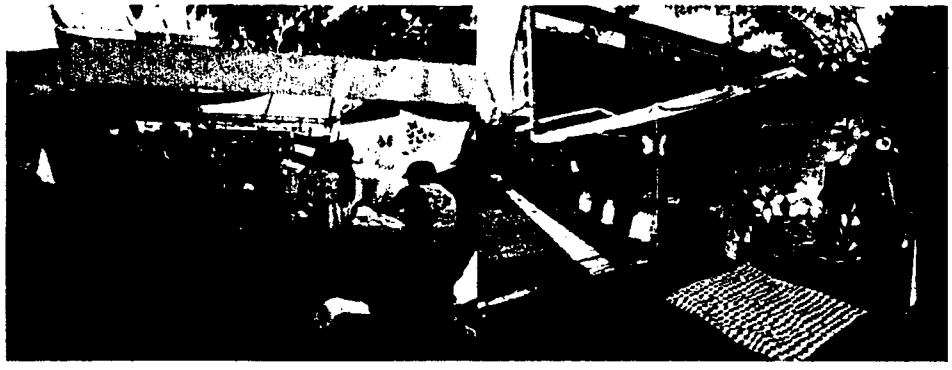



Fuente: Humedales y biodiversidad - Humedal Isaías Duarte Cancino, comuna 15, Valle del Cauca. 25 de noviembre de 2025, Contrato 0741 de 2025

Listados de asistencia al carnaval

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN Pág ___ de ___ CVC

Proceso: Tipo Reunión

Fecha: 25 / 11 / 2025 Lugar: Humedal Isaías Duarte Cancino Externa ☐

Tema: 9 Carnaval ambiental - Inspiración de vida Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Isabel Mesías	Duarte Cancino			
Nelson Angulo	Duarte cancino			
Henry Hurtado	Duarte Cancino			
Jose Luis Yepes	Duarte cancino			
Jorge Ignacio López	Duarte Cancino			
Andy Lizeth López	Duarte cancino			
Edwin Rivas	Duarte Cancino			
Valeria Fierro	Duarte Cancino			
María Rincón	Duarte Cancino			
Andrés Valencia	Duarte Cancino			
Anderson Camacho	Duarte Cancino			
Luz Cabrino	1 D C			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal Isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Maria jose hurtado	Duarte cancino			
Sara cornejo	Duarte cancino			
Ariel jose castro	Duarte cancino			
Javier Urango	Duarte cancino			
Gabriel sarmiento	Duarte cancino			
Diego martinez	Duarte cancino			
Juliana ruiz	Duarte cancino			
Jesica mosquera	Duarte cancino			
Evelin solis	Duarte cancino			
Sandra mercado	Duarte cancino			
Valentina Preciado	Duarte cancino			
Silvia Alexia correa	Duarte cancino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal Isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Josefa mendoza	Duarte Cancino			
Juliana ministerio	Duarte Cancino			
Tiago Preciado	Duarte Cancino			
Camila Daniela	Duarte Cancino			
Bianca Franco	Duarte Cancino			
Valentina Cabrera	Duarte Cancino			
Laura ramirez	Duarte Cancino			
Sinersilver estupiñan	Duarte Cancino			
Samuel ramos	Duarte Cancino			
Luis arauz	Duarte Cancino			
Jeronimo Galvan	Duarte Cancino			
Isamar valencia	Duarte Cancino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal Isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Comoval Inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
isabella cerralles	Duarte cancino			
maria jose pia-	Duarte cancino			
liam vasquez	Duarte cancino			
Diego miranda	Duarte cancino			
Dilan jose herrera	Duarte cancino			
Jeanfcol ramirez	Duarte cancino			
Dexter sanisteria	Duarte cancino			
Asher tiscos	Duarte cancino			
Ashley Arboleda	Duarte cancino			
vanessa Gutierrez	Duarte cancino			
wendy precisado	Duarte cancino			
brenner gutiones	Duarte cancino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 2	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal ISAIAS Duarte Concina	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Andres Jaher sore	Duarte concino			
Leidy daniela	Duarte concino			
Miguel angel murillo	Duarte concino			
Jalen valencia	Duarte concino			
Sara Sanabria	Duarte concino			
Emily canolio	Duarte concino			
Piter reyes yuca	Duarte concino			
Andrea maria cardona	Duarte concino			
Salome zapata	Duarte concino			
Emeli mosquera	Duarte concino			
Ana maria ortiz	Duarte concino			
Emmanuel garcia	Duarte concino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 2 de 2	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal Isaías Duarte Concina	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiracion de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ailin Yuliana Nieva	Duarte Concina			
Sofia Sinisterra	Duarte concino			
Fernanda Peña medina	Duarte concino			
Yanelli Sinisterra	Duarte concino			
Santiago Perlaza	Duarte concino			
David valentierra	Duarte concino			
Daruin hatta	Duarte concino			
Francisca martinez	Duarte concino			
Yari martinez	Duarte concino			
Mirian rivadeneira	Duarte concino			
Yudi rioscos	Duarte concino			
Kevin cabezas	Duarte concino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal ISAIAS Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval "Inspiración de vida"		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Adrian Portocarrero	Duarte Cancino			
Luz Karime Rivas	Duarte Cancino			
Kimberly Marin	Duarte Cancino			
Catalina Castro	Duarte Cancino			
Vivian Palomino	Duarte Cancino			
Wendy Narvaez	Duarte Cancino			
Carlos Segura	Duarte Cancino			
Angel Segura	Duarte Cancino			
Freddy Ortiz	Duarte Cancino			
Alan Vidal	Duarte Cancino			
Mari Cruz Perea	Duarte Cancino			
Mery Ortiz	Duarte Cancino			Mery Ortiz

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal ISAIAS Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval "Inspiración de vida"		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Belen Sharit Angulo	Duarte Cancino			
Yesimar Daniela Cabrera	Duarte Cancino			
Luis Javier Palomino	Duarte Cancino			
Oscar Daniel Casanova	Duarte Cancino			
Diego Miranda	Duarte Cancino			
Thomas Aragon	Duarte Cancino			
Karol Herrera	Duarte Cancino			
Daniela Gil	Duarte Cancino			
Adriana Saul Obregon	Duarte Cancino			
Yanela Reyes Arabia	Duarte Cancino			
Andrea Paz Obando	Duarte Cancino			
Karoly Yante Longa	Duarte Cancino			

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 2	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal Isaías Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Ender David Rodriguez	Duarte Cancino			
Alexa Rodriguez	Duarte Cancino			
Asli Jasmin Rozco	Duarte Cancino			
Mayerlin Rizco	Duarte Cancino			
David Zapata	Duarte Cancino			
Salome Cortez	Duarte Cancino			
Luisa Carreira	Duarte Cancino			
Juana Rivas	Duarte Cancino			
Ana Camila Cano	Duarte Cancino			
Jeison David Cortez	Duarte Cancino			
Miguel Jose Julio Hurtado	Duarte Cancino			
Jeferson Moreses	Duarte Cancino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 2 de 2	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal Isaías Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Mariacamila Roja	Progresando Juntos			
Yoanis Diaz	Progresando Juntos			
Cristian Zuluaga Rosas	Progresando Juntos			
Samuel Roja	Progresando Juntos			
Melani Alejandra Pro	Progresando Juntos			
Jhonsy Rosas	Progresando Juntos			
Andy Shirley Herrera	Progresando Juntos			
Maria Jose Piedra	Progresando Juntos			
Melani Silva	Progresando Juntos			
Luciana Guzmán	Progresando Juntos			
Maily Granja	Progresando Juntos			
Maria Jose Bayer	Progresando Juntos			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal Isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval Inspiración de Vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Will. Duarte	Duarte Cancino			
Yeisa Aldana	Duarte Cancino			
Allison Aldana	Duarte Cancino			
Tatiana Molina	Duarte Cancino			
Astli. Salome Guzmán	Duarte Cancino			
Sandra Milena Garcia	Maestro Duarte Cancino			Sandra Garcia
Juan Yesid Adarme	Duarte Cancino			
Cristian Pineda	Duarte Cancino			
Santiago Peña	Duarte Cancino			
Juan Jose Mesa	Duarte Cancino			
Bellanci Rodriguez	Duarte Cancino			
Paula Rosas	Progresando Juntos			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág. 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 | 11 | 2025	Lugar: Humedal isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Valery Bahños Arias	Progresando Juntos			
Paula Solarzano	Progresando Juntos			
Nicol Moreno	Progresando Juntos			
Jhon Hermenson	Progresando Juntos			
Joseph Molina	Progresando Juntos			
Cristian David Caballero	Progresando Juntos			
Adriana Cobiado	Progresando Juntos			
Sara Valentina Chaverra	Progresando Juntos			
Andres Camilo Ortiz	Progresando Juntos			
Belen Samuel Ascanio	Progresando Juntos			
Tatiana Narvaez	Progresando Juntos			
Jhonpol Fernando Miranda	Progresando Juntos			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal ISAIAS Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval Inspiración de Vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Wilmer Andres Muñoz	Progresando Juntos			
Melany Eduardo Lopez	Progresando Juntos			
Elvin David Bayesta	Norte Cancino			
Juan Perlaza Maturana	Norte Cancino			
Cielo Maria Micolta	Norte Cancino			
Leonardo Banilla	Norte Cancino			
Valeria Cardozo	Norte Cancino			
Yesica Daniel Hinla	Norte Cancino			
Marlin Dayana Castro	Norte Cancino			
Thomas Andres Leon	Norte Cancino			
Yanny Escobar A.	progresando j.			
Nicole Milena Navia	progresando juntos			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág 1 de 1	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal ISAIAS Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspiración de Vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Mariana Gomez	Norte Cancino			
Estiven Quiñones	Norte Cancino			
Neider Cuero	Norte Cancino			
Brian Samuel Quiñones	Norte Cancino			
Yader Steven Cuero Peña	Norte Cancino			
Jose Cobo Ortiz	Norte Cancino			
Rosa Quiñones	Duarte Cancino	Docente		
Brenda Valentina Baya	Norte Cancino			
Andri Guimenez Godoy	Norte Cancino			
Erika Dayana Sinisterra	Norte Cancino			
Maria José Alomia	Norte Cancino			
Micol Ballesteros Prado	Norte Cancino			

LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIÓN	Pág ⌜ de ⌜	CVC
Proceso:		Tipo Reunión
Fecha: 25 / 11 / 2025	Lugar: Humedal Isaias Duarte Cancino	Externa ☐
Tema: 9 Carnaval inspección de vida		Interna ☐

NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD / ÁREA CVC	CARGO / PROFESIÓN / OFICIO	CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO	FIRMA
Jdc David Caicedo	Duarte Cancino			
Jhon Pablo Caillots	Duarte Cancino			
Sara Sofia Lopez	Duarte Cancino			
Donald Mendoza	Duarte Cancino			
Luis Eduardo Hurtado	Duarte Cancino			
Miguel Reyes Munoz	Duarte Cancino			
Viviana Molina	Progresando Junto			
Andres Felipe Quiñones	Duarte Cancino			
Isaac Adulto	Duarte Cancino			
Anderson Camilo Aguirre	Duarte Cancino			
Victor Gonzales	Duarte Cancino			
Miguel Angel Moreno	Duarte Cancino			

Anexo 3. Soportes de carnaval

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

De acuerdo a la ejecución del contrato y en cumplimiento de lo dispuesto en las obligaciones del contrato de obra, suscrito entre la CVC y Construfuturo, a la fecha del presente informe, la fundación se encuentra al día con las garantías contractuales de acuerdo con la suscripción del acta de inicio.

Dado lo anterior se relaciona la información correspondiente a las pólizas contractuales actualizadas contra el acta de inicio con fecha del 7 de octubre de 2025.

POLIZAS	
BENEFICIARIO	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
ASEGURADORA	Seguros Del Estado SA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NUMERO DE POLIZA 45-44-101169582			
AMPARO	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 720.000.076,40	25/09/2025	30/06/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 1.080.000.114,60	25/09/2025	30/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 360.000.038,40	25/09/2025	31/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 720.000.076,40	31/12/2025	31/12/2030

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUMERO DE POLIZA 45-40-101102971			
AMPARO	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 569.400.000,00	25/09/2025	31/12/2025

6. AVANCE DE OBRA

A continuación, se presenta el avance ejecutado durante el presente periodo reportado tanto por el contratista como la interventoría, la siguiente tabla muestra el porcentaje de avance de obra de acuerdo con las actividades ejecutadas al momento del cierre de este informe.

UBICACION	% AVANCE
Etapa Preconstrucción	100%
Humedal Cañasgordas	35,32%
Humedal Panamericano	0%
Humedal Parque de las Garzas	78,84%
Humedal La Babilla	67,25%
Humedal Isaías Duarte Cancino	100%
Humedal Ibis	0%
Fortalecimiento Comunitario	75%
Restauración Ecológica y manejo de humedales	45,45%

8.CUADRO CONTROL DE LLUVIAS

De acuerdo con la gráfica de comportamiento climático para el mes de octubre y noviembre, se evidencia que la ciudad de Cali presentó precipitaciones constantes durante la totalidad del periodo, con presencia de lluvias todos los días del mes. Las temperaturas máximas oscilaron mayormente entre 24°C y 28°C, mientras que las mínimas se mantuvieron entre 15°C y 19°C, lo cual corresponde a un escenario típico de la segunda temporada de lluvias en la región.

Se observa que no hubo días secos, predominando jornadas con cielo cubierto, lluvias continuas e intermitentes, y solo algunos días con leves intervalos de sol. Esta situación climática genera condiciones de alta humedad en el terreno, disminución de la capacidad portante del suelo y dificultades para la ejecución de actividades que dependen de suelo seco, maquinaria en terreno natural, transporte de materiales y ejecución de obras a la intemperie.

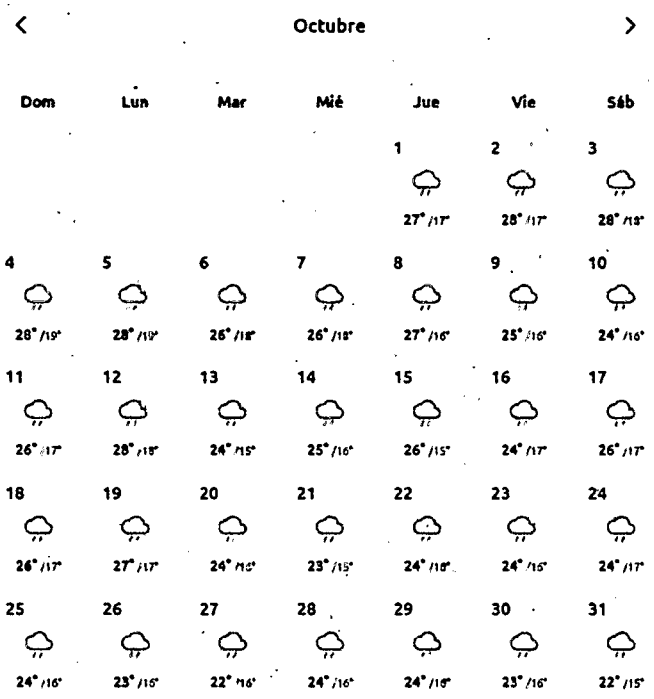


Ilustración 47 Precipitación y lluvia durante el mes de octubre.

Fuente: https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/valle-del-cauca/cali?page=month&month=October

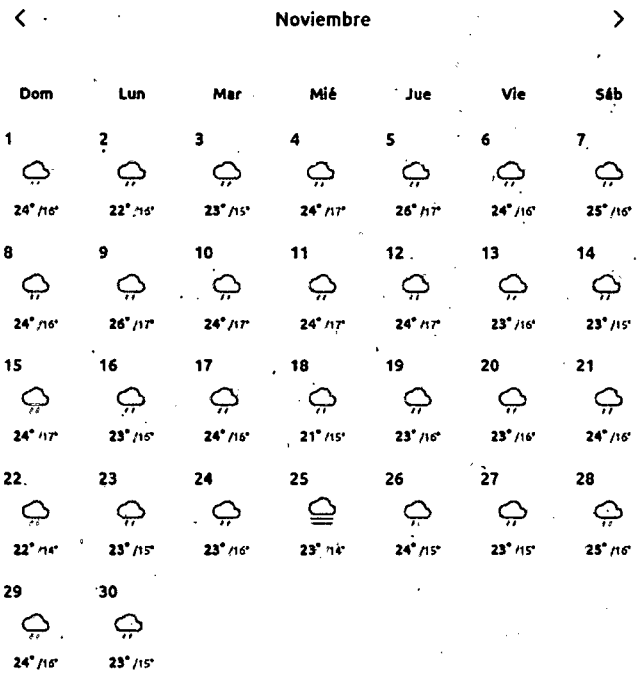


Ilustración 48 Precipitación y lluvia durante el mes de noviembre.

Fuente: https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/valle-del-cauca/cali?page=month&month=November

Dado lo anterior se aclara que de igual forma el registro del clima diario se llevaba en las bitácoras correspondientes a cada uno de los frentes de obra que se ejecutaron durante el presente periodo.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo con la revisión integral de las actividades ejecutadas entre el 07 de octubre y el 05 de diciembre de 2025, se concluye que el proyecto ha logrado consolidar su fase de arranque técnico y operativo en los seis humedales priorizados, cumpliendo con los procedimientos establecidos para la etapa de preconstrucción y avanzando de manera significativa en las primeras intervenciones de obra civil, manejo ambiental y fortalecimiento comunitario.

En el componente de obra civil, se alcanzaron progresos relevantes en los humedales Parque de las Garzas, Cañasgordas e Isaías Duarte Cancino, donde se ejecutaron labores de replanteo, excavación, conformación de estructuras de soporte, instalación de bordillos, adoquines y adecuación del terreno. Estos avances se evidencian en los porcentajes de ejecución reportados en la tabla de avance físico (pág. 93 del informe). No obstante, se identificaron limitaciones derivadas de ajustes necesarios al diseño del sendero del Humedal Cañasgordas y de la falta de viabilidad técnica del diseño suministrado para el Humedal Panamericano, lo cual ha impedido el inicio de actividades constructivas en este último frente.

En cuanto al componente ambiental, se desarrollaron intervenciones esenciales para la recuperación paisajística, destacándose el manejo técnico de guaduales, el control de plagas —principalmente hormiga arriera—, el diagnóstico sanitario del arbolado urbano y la nutrición edáfica en áreas críticas. Estas actividades contribuyen directamente a la estabilización ecológica de los humedales intervenidos y muestran un avance acorde con la programación inicial. Se evidenció la alta carga de material vegetal deteriorado y la necesidad de intervenir zonas con afectación estructural significativa, especialmente en La Babilla y Cañasgordas, lo cual justifica plenamente las acciones ejecutadas.

En el componente social, el proyecto logró establecer articulación efectiva con los comités de comanejo, líderes comunitarios y entidades institucionales, realizando socializaciones en los seis humedales priorizados y desarrollando talleres de educación ambiental con amplio nivel de participación ciudadana. Estas acciones fortalecen la apropiación comunitaria del proyecto y garantizan la trazabilidad social requerida por el contrato.

Finalmente, las condiciones climáticas reportadas en octubre y noviembre —caracterizadas por lluvias constantes a lo largo de todo el periodo, según los registros climáticos incluidos en las páginas 94 y 95— generaron restricciones operativas significativas en los frentes de obra, afectando rendimientos, movilidad de maquinaria, compactación de materiales y continuidad de actividades al aire libre. Esta situación, sumada a los ajustes de diseño en curso, explica la variación en los porcentajes de avance entre los diferentes humedales.

10. BIBLIOGRAFIA

-Álvarez Garnica, S. H. (2017). Construcción comunitaria de los procesos socioecológicos en el humedal tibanica y córdoba, Bogotá D.C. [Trabajo de grado]. Universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A.

-Bennett, D. B. (1984). Evaluación de la educación ambiental en las escuelas. UNESCO -PNUMA Programa Internacional de Educación Ambiental.

-Cabrera-Ardanás, Maudel, & Pérez-García, Maví. (2023). Contribución a la evaluación del impacto de los Talleres de Empoderamiento y Comunicación. *Revista gestión de las personas y tecnología*, *16*(48), 89-114. https://dx.doi.org/10.35588/gpt.v16i48.6502

-Ferrin, L. (10 julio 2025). Gobernanza público-comunitaria, la clave para la protección de los humedales urbanos. [en línea], Pontificia Universidad Javeriana Cali https://www.javerianacali.edu.co/noticias/gobernanza-publico-comunitaria-la-clave-para-la-proteccion-de-los-humedales-urbanos

-Gallo Restrepo, N, E., Meneses Copete, Y, A., & Minotta Valencia, C. (2014). Caracterización poblacional vista desde la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque diferencial. *Investigación y Desarrollo*, 22 (2), 360-401. Retrieved November 07, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612014000200009&lng=en&tlng=es.

-Unión Temporal Proyecto SIGRA. (2022). Metodología de Caracterización de la población en el componente de género e inclusión. CAF y Embajada Británica en Colombia.

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		1
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-115	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352866667	-76,53475
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,38	14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

85

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**2**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-116	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,350966667	-76,53506667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,3	0,6	19

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





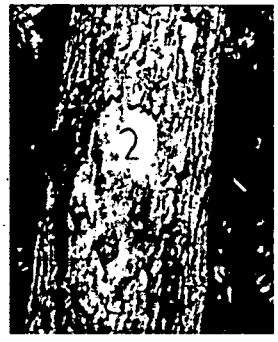

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**3**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-117	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3509	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,3	11,64

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

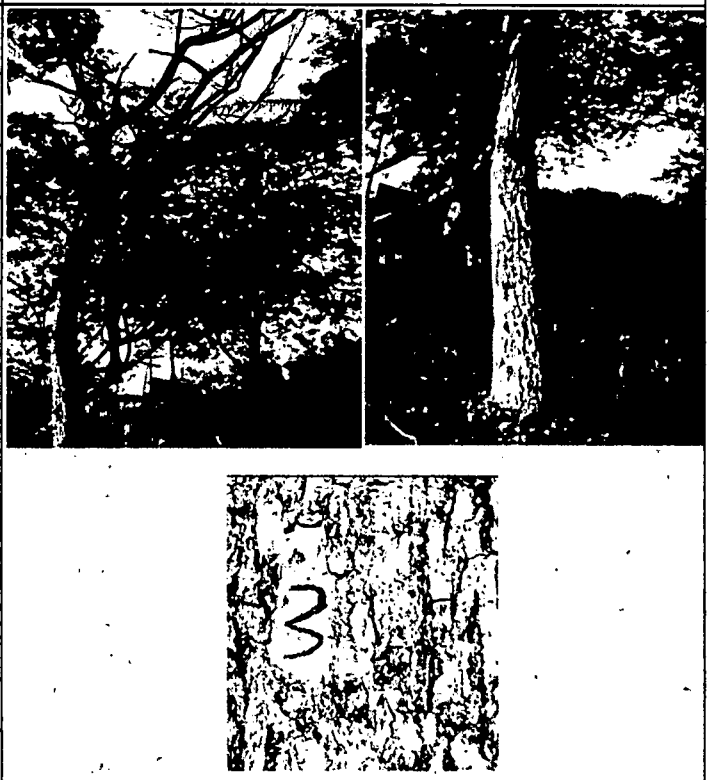

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**4**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-118	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,3509	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,1	0,33	16,92

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**5**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-119	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Guásimo**		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,350966667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,9	0,96	8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

67

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**6**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-120	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351016667	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	0,26	14,42

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			7
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-121	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Rutaceae	3,350983333	-76,53483333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,12	8,42

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

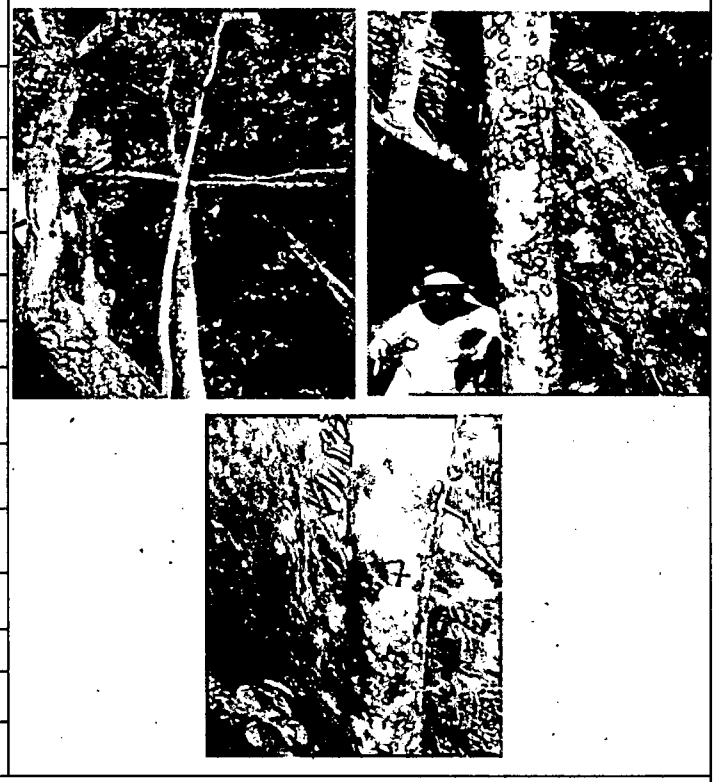

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**8**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-122	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Chiminango	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pithecellobium dulce*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351016667	-76,5348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,3	0,66	16,76

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**9**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-123	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus benjamina	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,351066667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,1	1;11	27,93

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**10**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-124	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35124	-76,53474
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,9	1,62	30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**11**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-125	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus benjamina	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,3	1,19	15,46

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

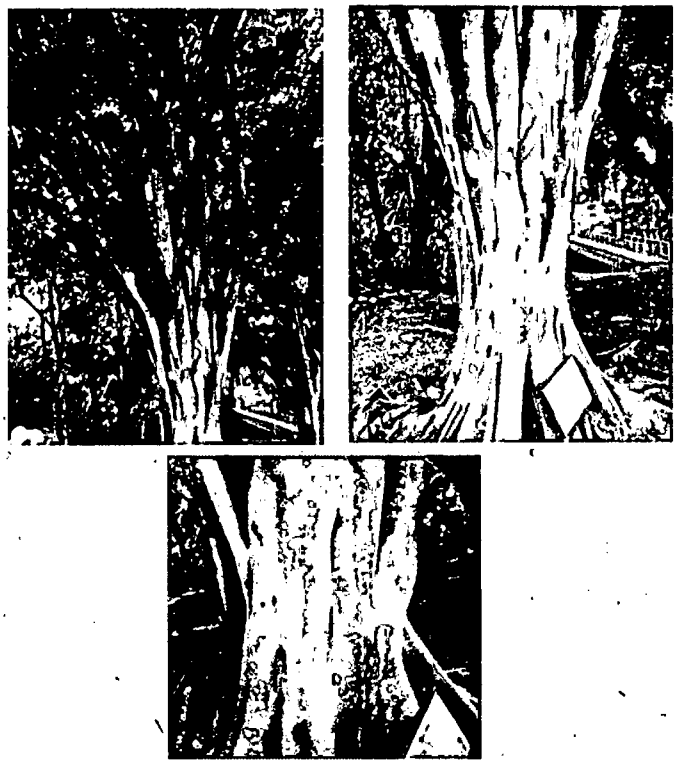

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**12**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-126	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,351216667	-76,53493333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	0,58	18,49

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**13**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-127	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351333333	-76,5349
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,8	0,23	7,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

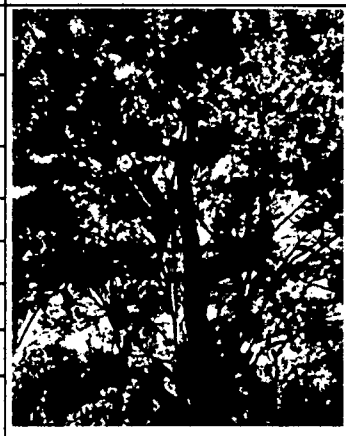



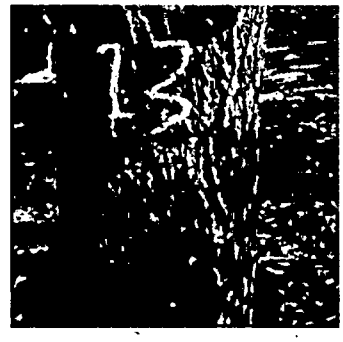

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**14**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-128	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ajouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,3513	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,7	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

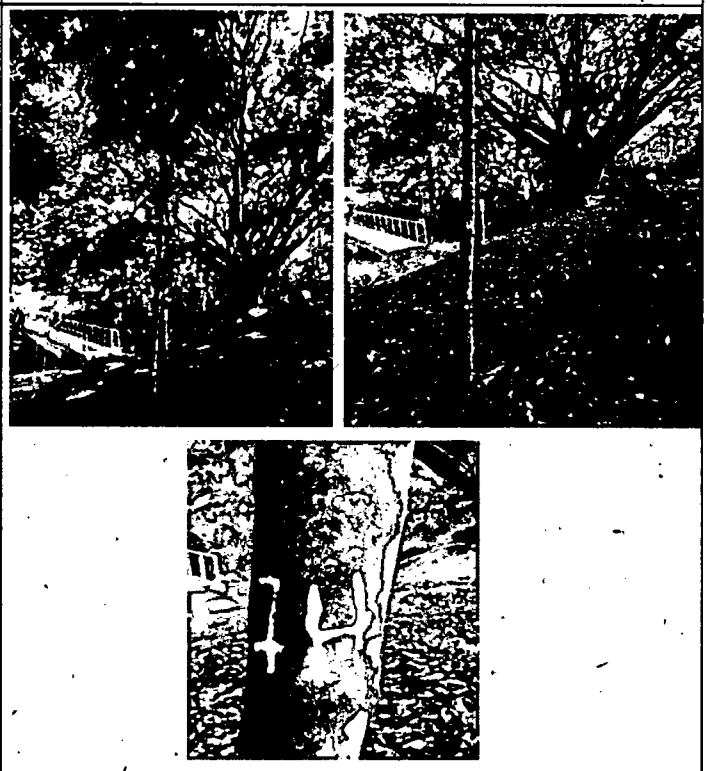

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**15**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-129	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,351316667	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,9	6,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

92

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**16**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-130	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Saman	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53513333	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,95	10,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**17**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-131	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,351416667	-76,53501667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,9	0,15	3,52

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**18**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-132	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Pizamo	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,351333333	-76,53505	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19,6	0,6	16,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**19**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-133	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351416667	-76,53503333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,7	3,54

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

94

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**20**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-134	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mestizo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cupania glabra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,351433333	-76,53525
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,28	7,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**21**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-135	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351383333	-76,53506667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,26	11,21

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

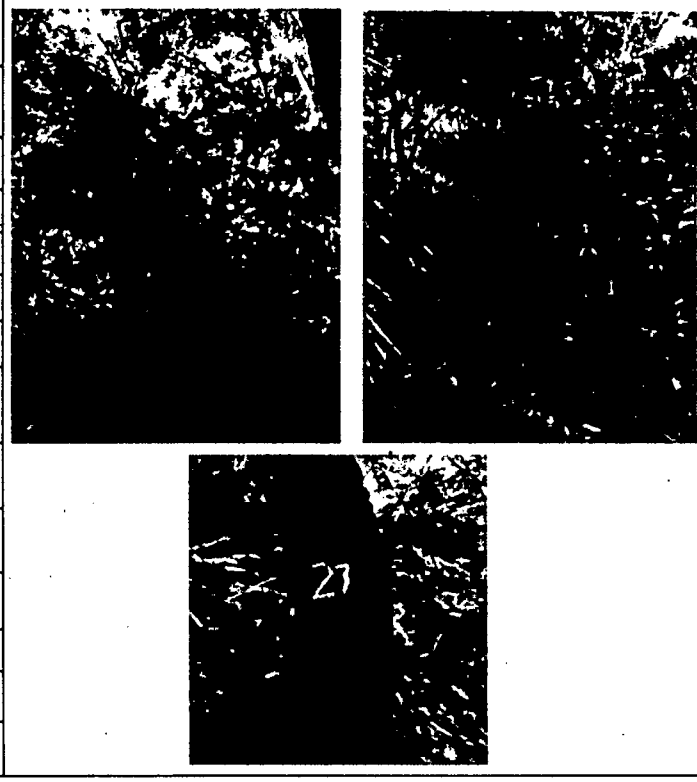

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**22**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-136	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Jigua**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,351333333	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,8	0,15	3,64

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

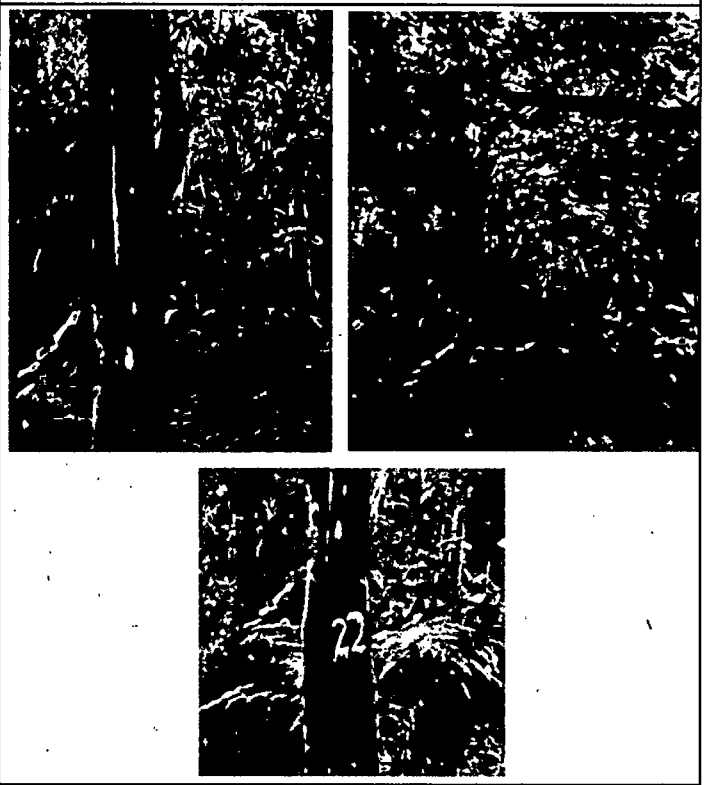

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**23**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-137	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351366667	-76,5351
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,9	0,08	3,21

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**24**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-138	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS.		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,3513	-76,5351
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,2	0,28	7,59

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**25**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-139	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS.		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351333333	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,46	16,16

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**26**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-140	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Meliaceae	3,351316667	-76,53508333	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,14	6,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**27**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-141	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,3514	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,05	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**28**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-142	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**TACHUELO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351216667	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9	0,05	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**29**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-143	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Saman	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,351183333	-76,53523333	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,5	0,39	28

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob.Nutricionales		X
Defoliación.		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

99

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**30**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-144	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35115	-76,53515
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,5	0,67	32,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

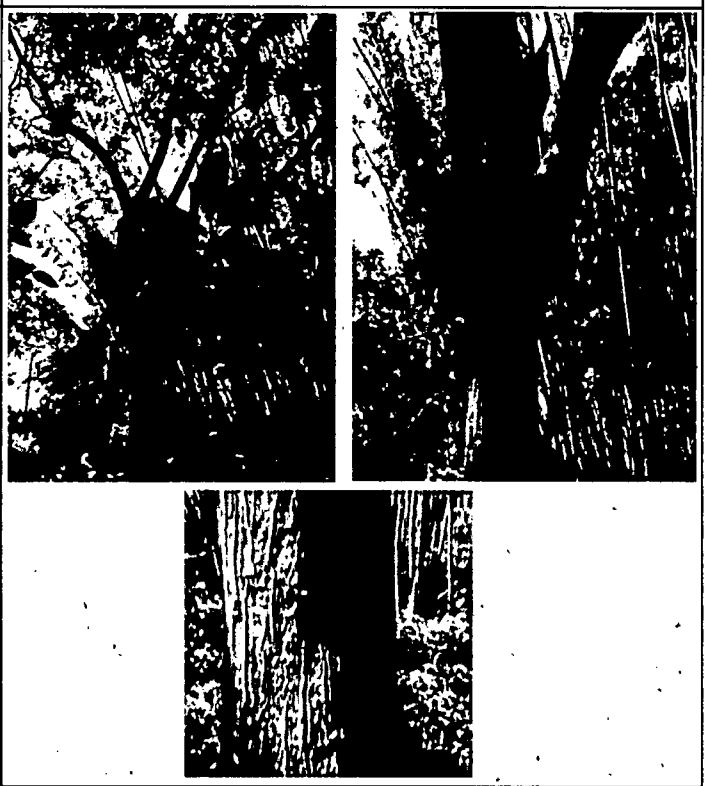

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**31**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-145	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351116667	-76,53525
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,1	0,33	10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

100

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**32**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-146	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35115	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,66	32,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

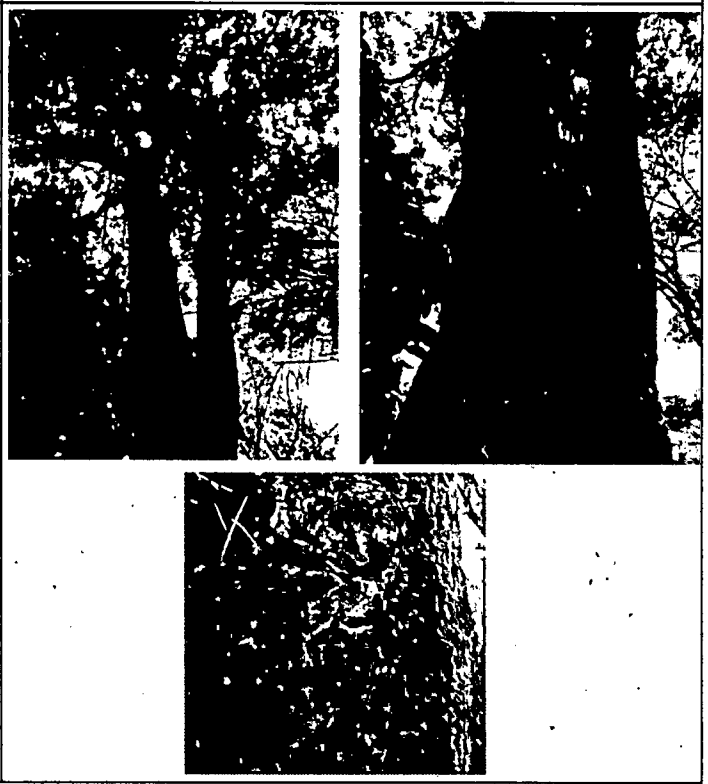

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**33**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-147	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Caoba**		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351166667	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,09	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**34**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-148	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35145	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,3	0,06	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

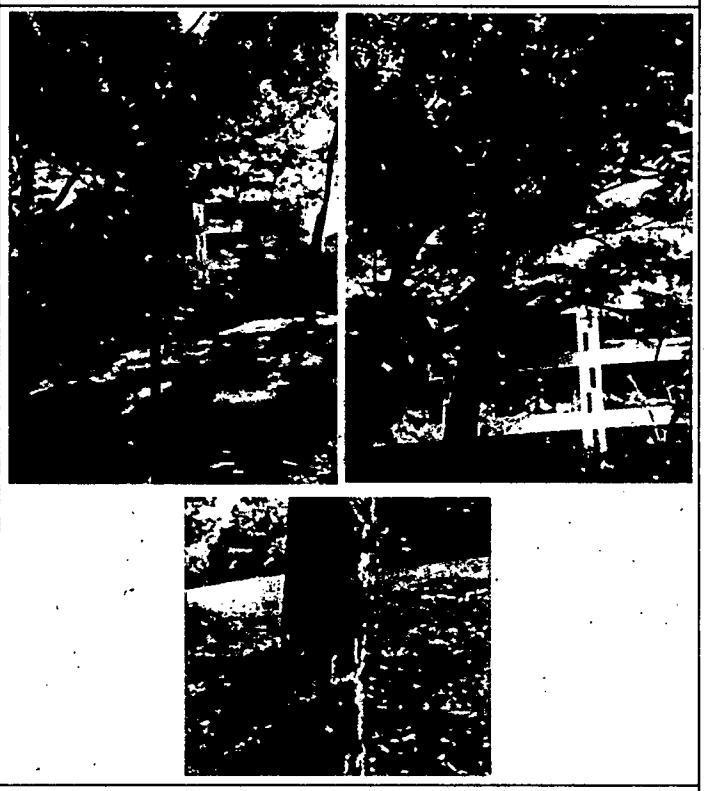

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**35**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-149	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351433333	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,25	11,66

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**36**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-150	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Pizamo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352816667	-76,53396667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3	0,9	9,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**37**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-151	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Tulipan africano	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Spathodea campanulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Bignoniaceae	3,352783333	-76,53393333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,7	0,8	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

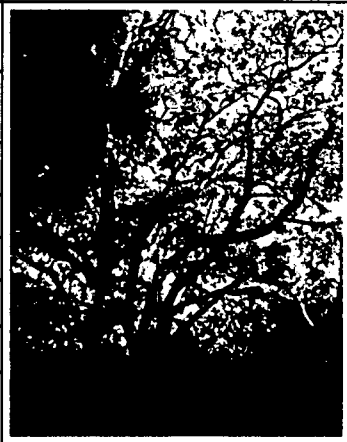





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**38**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-152	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Saman	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351566667	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16	1	37,6

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**39**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-153	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jigua		
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,35155	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,9	0,06	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

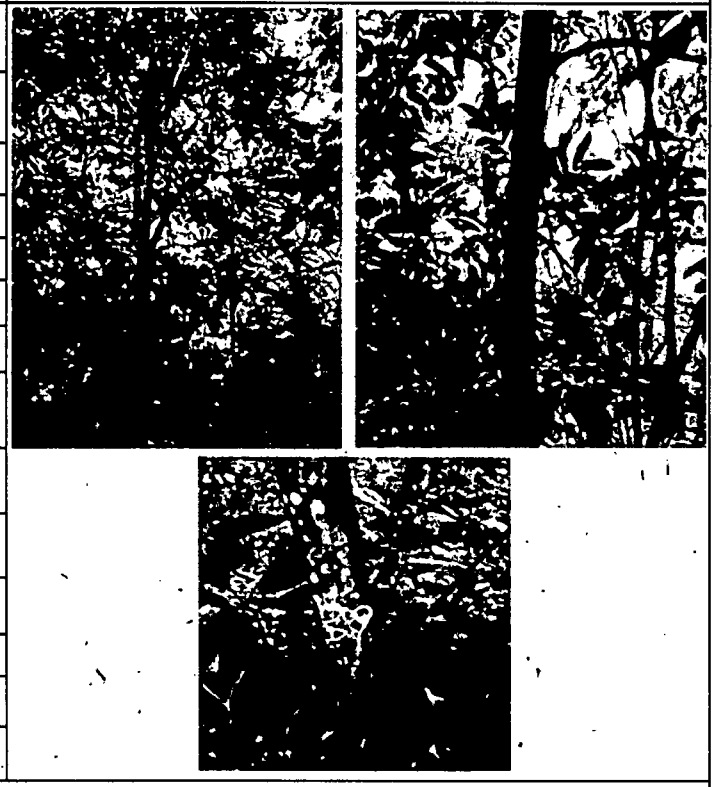

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

104

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**40**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-154	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Árbol del pan	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Artocarpus altilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Moraceae	3,351616667	-76,53481667	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6	0,15	4,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

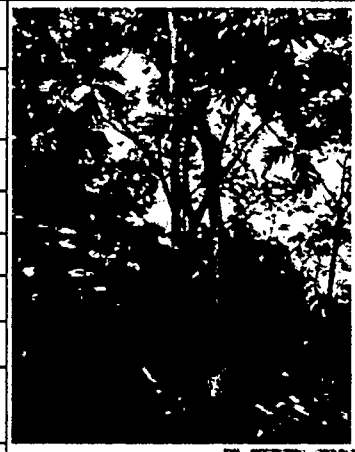



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**41**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-155	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3516	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,13	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**42**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-156	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Urticaceae	3,351683333	-76,53466667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,3	0,15	6

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

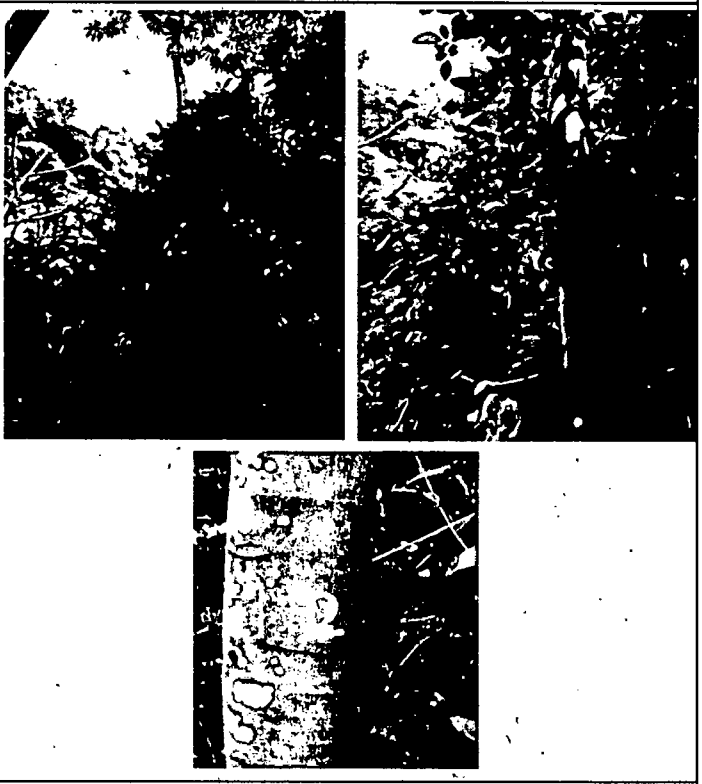

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**43**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-157	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mandarino	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351816667	-76,53466667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,40	0,35	8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**44**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-158	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Browneą grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3518	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,6	0,13	5,32

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**45**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-159	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351866667	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,15	6,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**46**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-160	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,351989	-76,534613	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,7	0,07	3,11

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

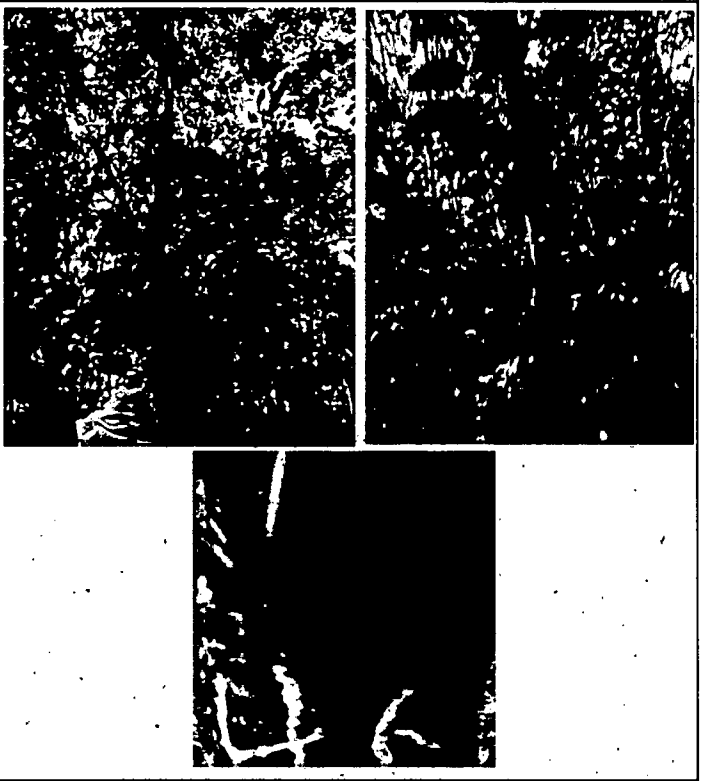

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	47
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-161	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,351933333	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,3	0,03	2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**48**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-162	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352016667	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,15	7

REGISTRO FOTOGRAFICO

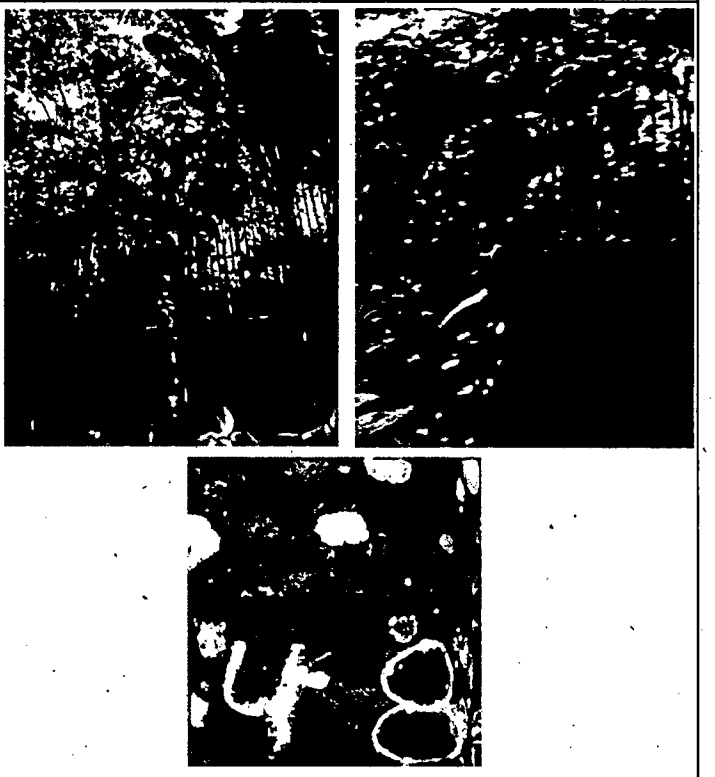

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**49**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-163	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351916667	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,3	0,11	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**50**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-164	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus benjamina**		
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352	-76,5346
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,14	4,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**51**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-165	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,351987	-76,534491
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,2	0,1	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

110

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**52**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-166	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351816667	-76,53381667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,5	1,5	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**53**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-167	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,3	0,1	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

111

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**54**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-168	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,4	0,09	7

REGISTRO FOTOGRAFICO

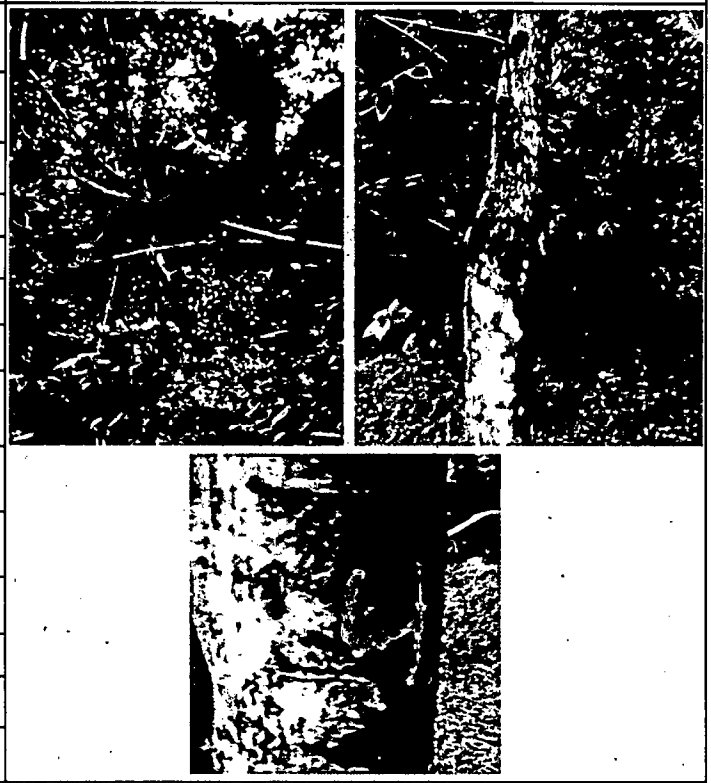

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**55**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-169	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3521	-76,53461667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,5	0,14	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**56**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-170	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352066667	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,14	6,72

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

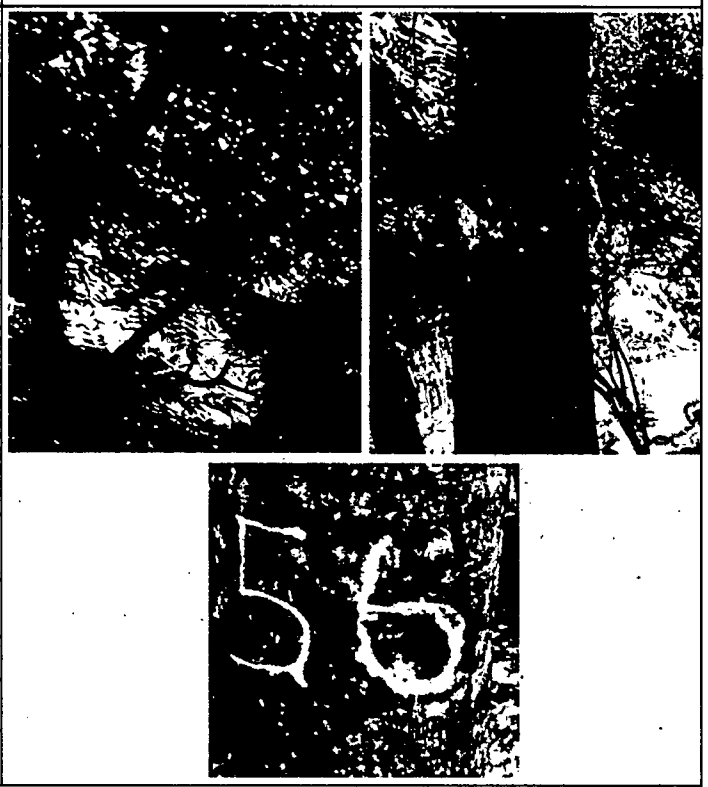

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**57**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-171	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352133333	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,9	0,17	17,23

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**58**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-172	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352066667	-76,53461667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8	0,16	6,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

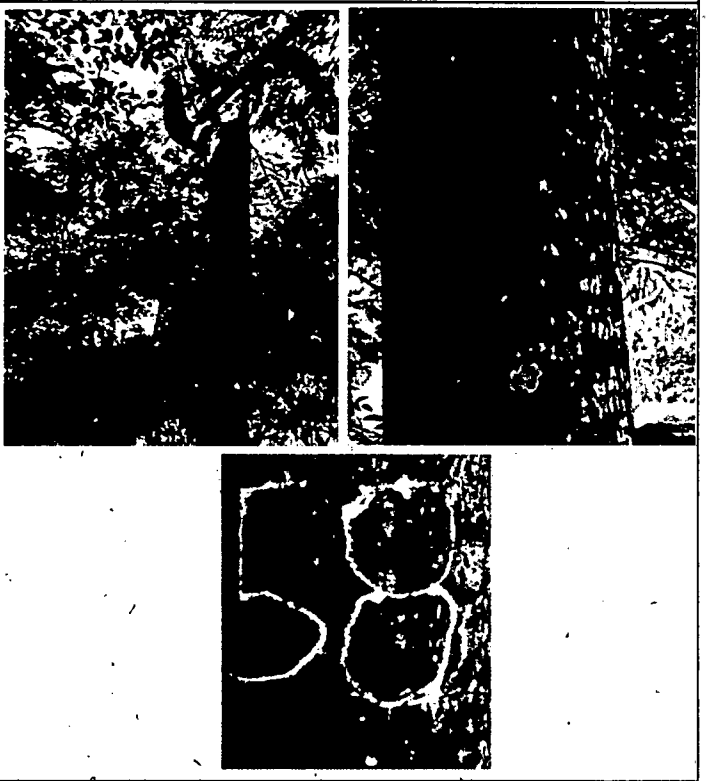

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		59
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-173	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,5347
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,17	9,63

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

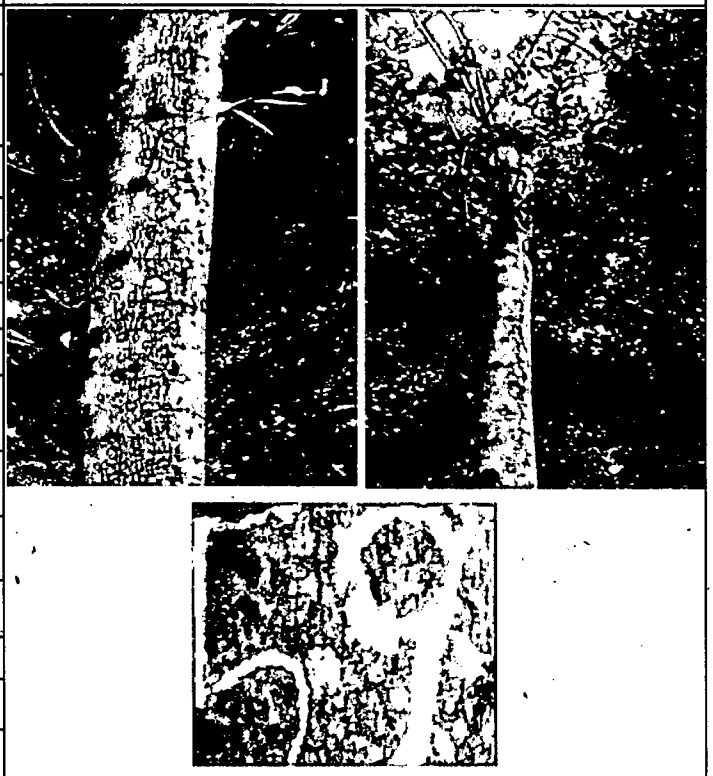

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**60**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-174	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mandarino	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352133333	-76,53468333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,68	8,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**61**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-175	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Mandarino		
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352233333	-76,53468333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,43	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

115

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**62**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-176	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mandarino	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,35215	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,4	0,61	9,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	63
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-177	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL


		GEOREFERENCIACION	
NC	Árbol de la cruz		
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Fabaceae	3,352	-76,53463333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,08	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

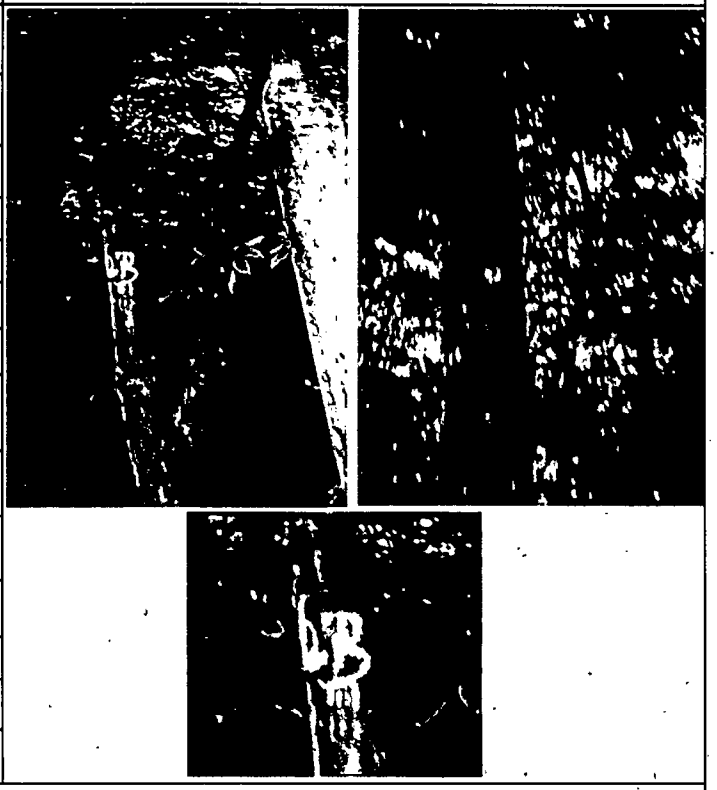

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

116

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**64**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-178	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351966667	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**65**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-179	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351966667	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,08	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**66**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-180	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351983333	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,11	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

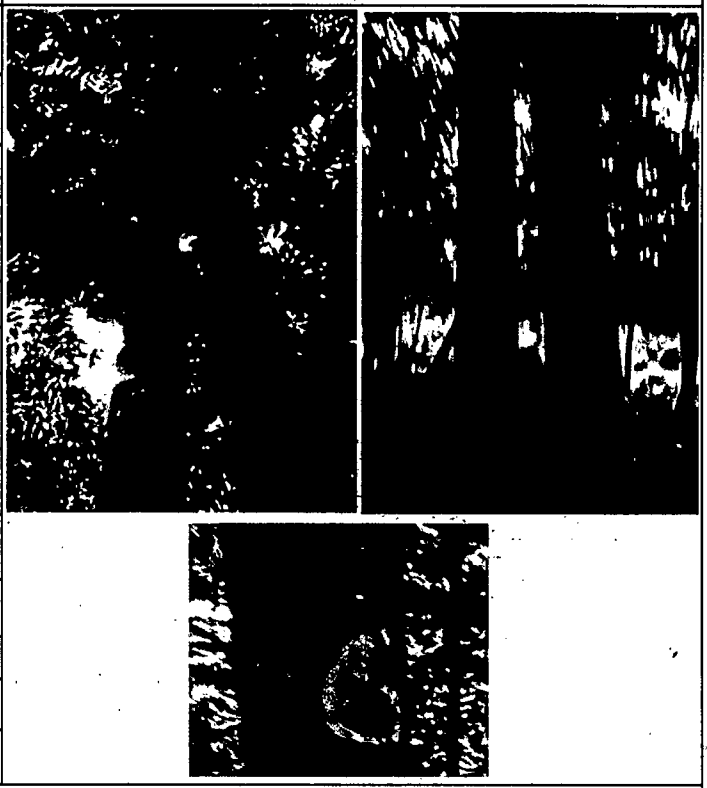

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**67**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-181	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Ceiba pentandra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Malvaceae	3,352833333	-76,53381667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3,4	1,3	14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

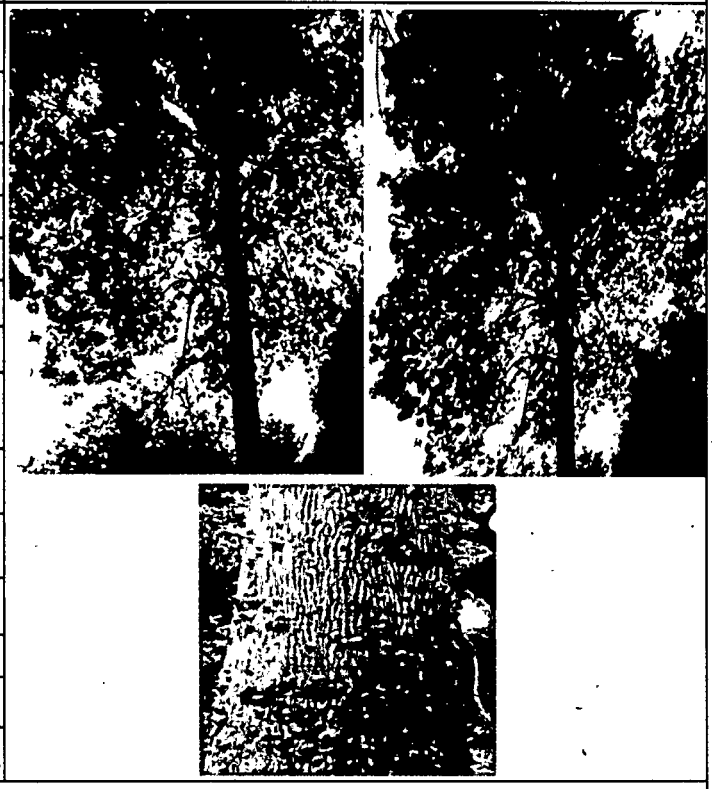

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

118

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**68**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-182	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35195	-76,53468333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,6	0,12	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

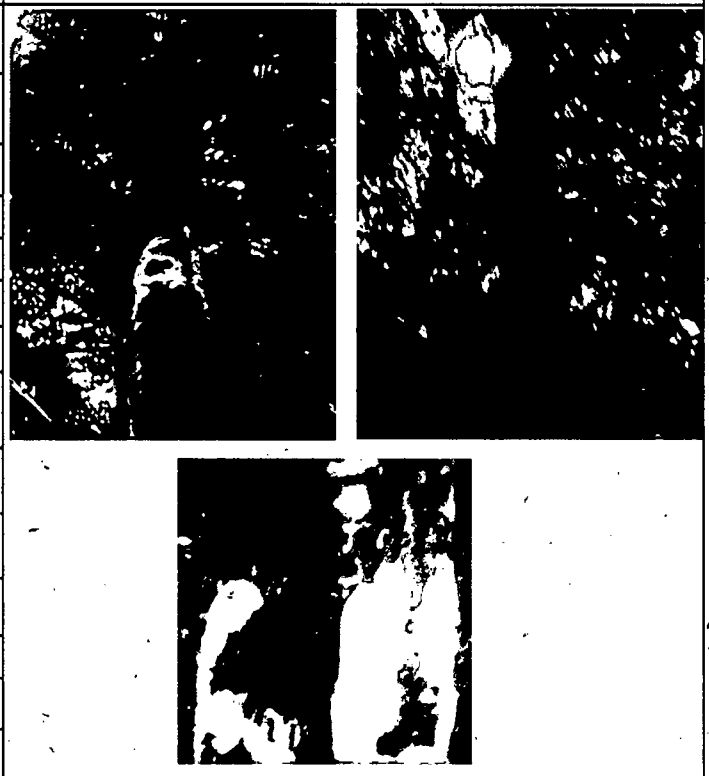

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**69**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-183	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,3531	-76,53388333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,9	8,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERÓ DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**70**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-184	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352033333	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,2	0,54	10,06

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

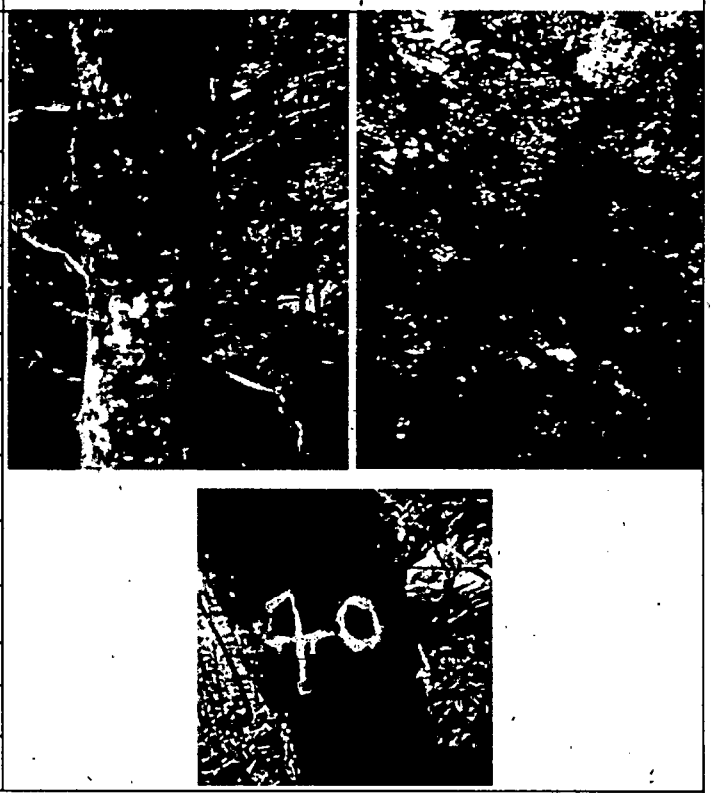

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL -	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**71**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-185	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Balso real	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ochroma pyramidale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,35205	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,28	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**72**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-186	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,8	0,13	3,5

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**73**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-187	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,35215	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,1	0,2	9,18

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**74**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-188	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Araucaria	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Araucaria columnaris*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Araucariaceae	3,35225	-76,5346
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,2	0,73	17,14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**75**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-189	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Mandarino		
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,3522	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,4	0,25	5,14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

122

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**76**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-190	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Casco de buey	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351883333	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,9	0,33	6,37

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**77**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-191	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jagua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352266667	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,6	0,33	4,68

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

123

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**78**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-192	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Casco de buey		
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352216667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	0,1	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

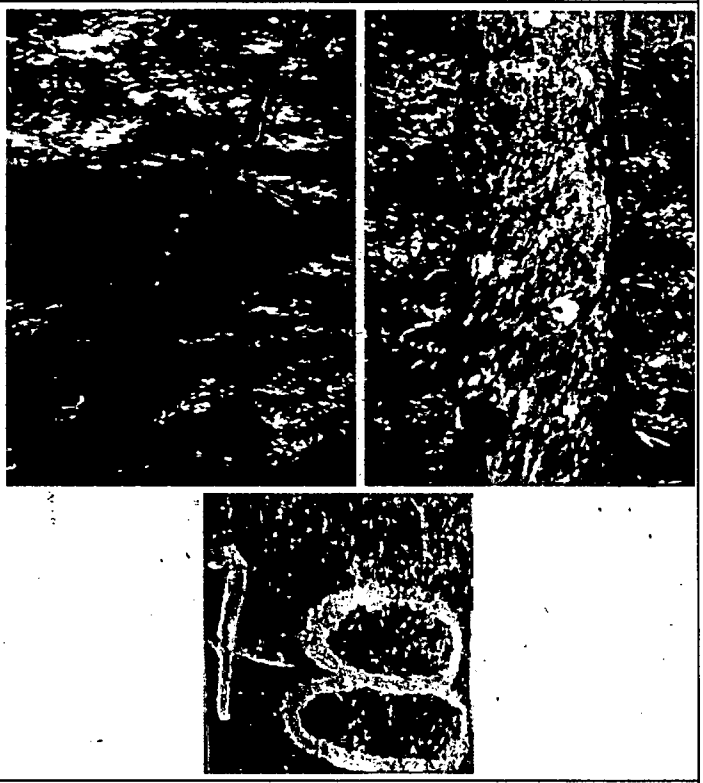

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**79**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-193	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Casco de buey	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,352216667	-76,53481667	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,5	0,19	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

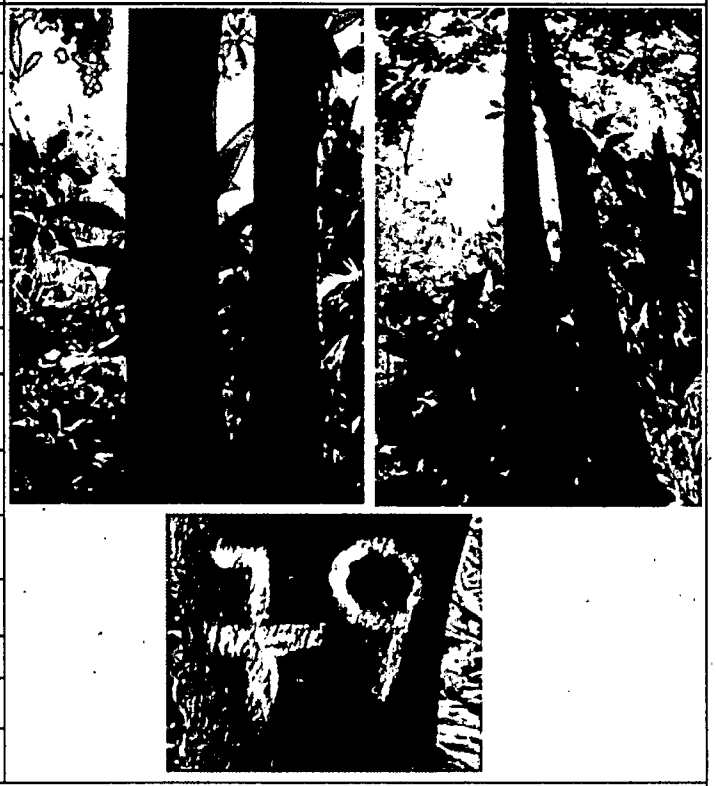

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**80**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-194	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Casco de buey**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3523	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,5	0,21	2,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

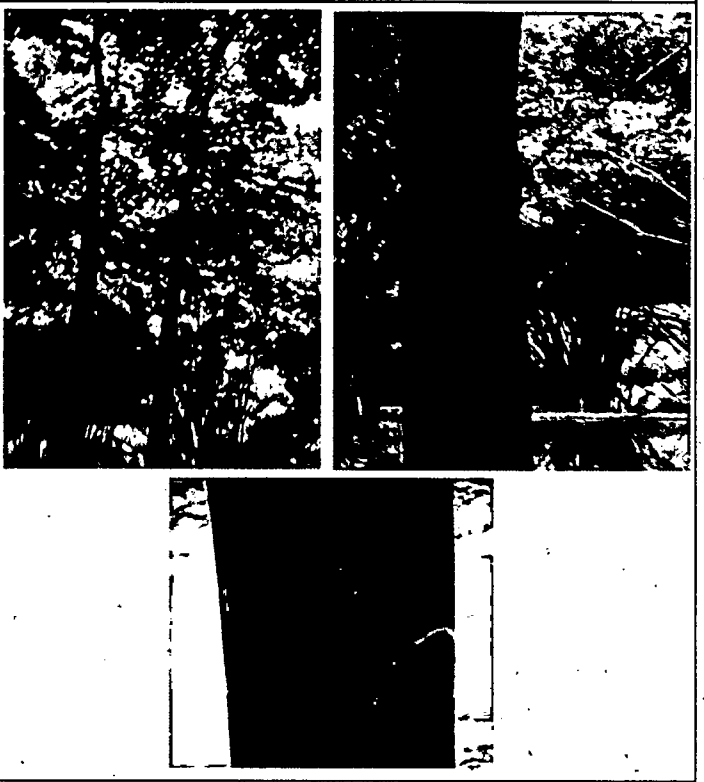

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**81**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-195	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Casco de buey	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35225	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,7	0,13	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

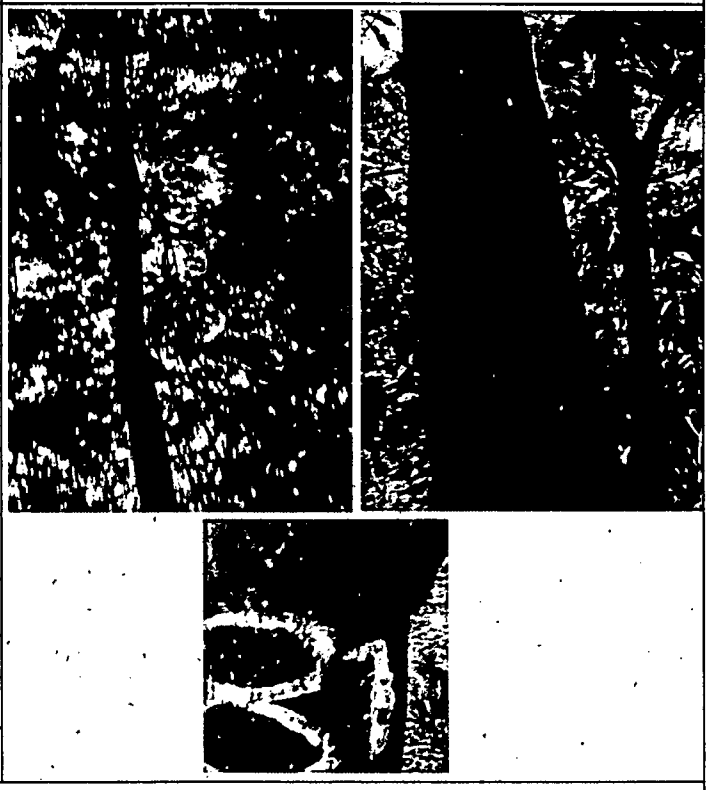

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**82**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-196	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jagua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352233333	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8	0,28	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales ,		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

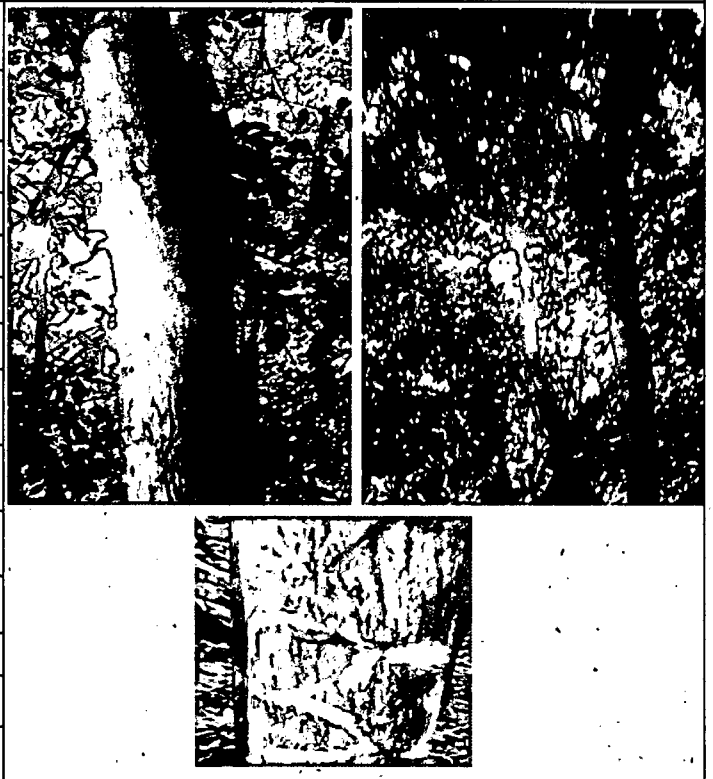

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**83**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-197	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352316667	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,6	0,11	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

126

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**84**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-198	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jagua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352283333	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	3,88

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**85**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-199	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Araucaria	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Araucaria columnaris*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Araucariaceae	3,35215	-76,5345
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
24,8	0,46	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

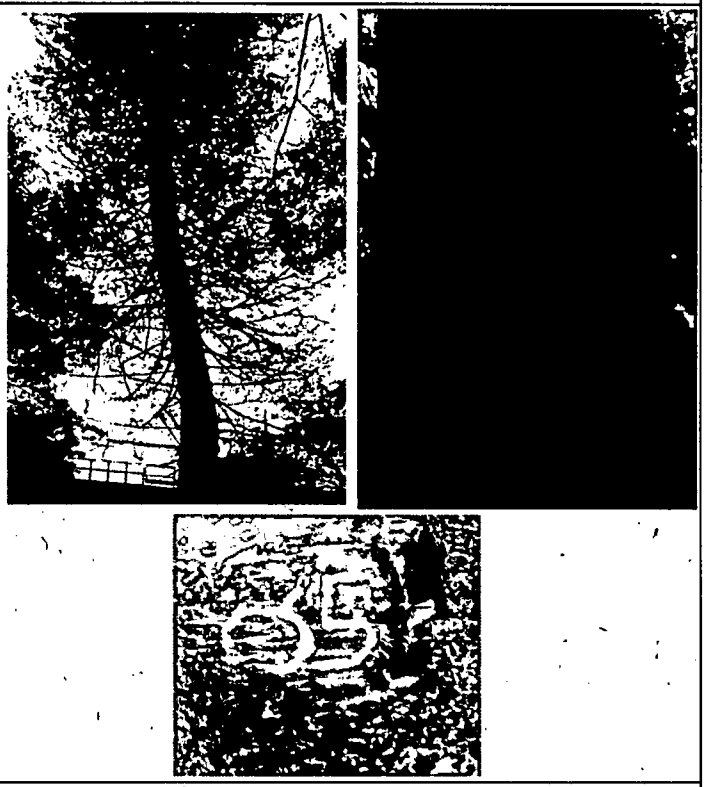

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**86**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-200	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352716667	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,7	0,22	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

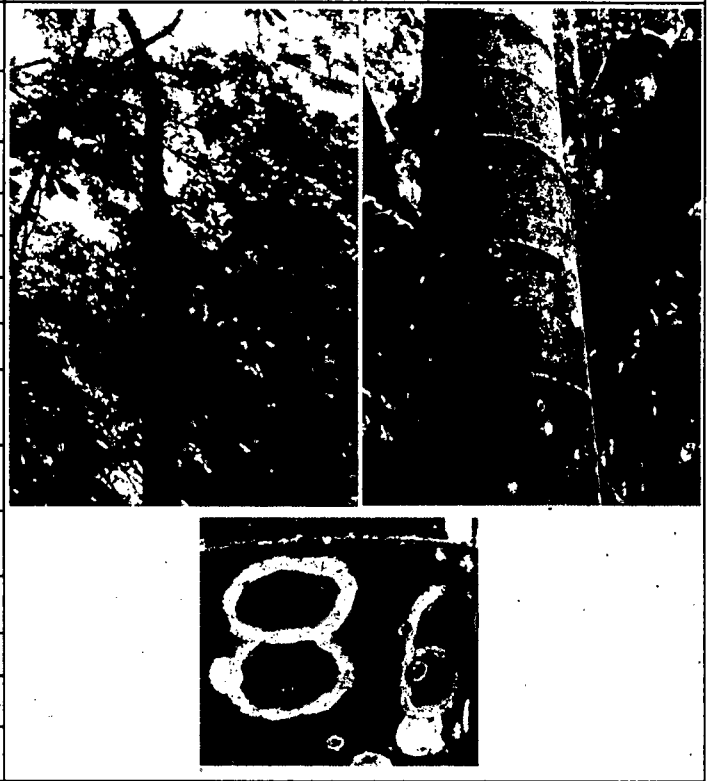

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**87**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-201	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352683333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,7	0,12	1,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

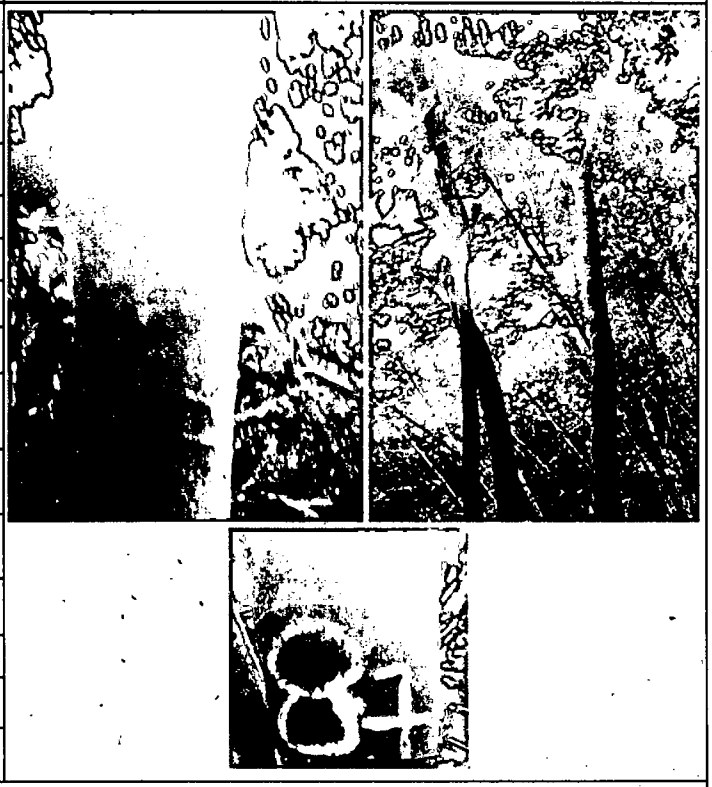

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**88**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-202	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352683333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,2	2,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

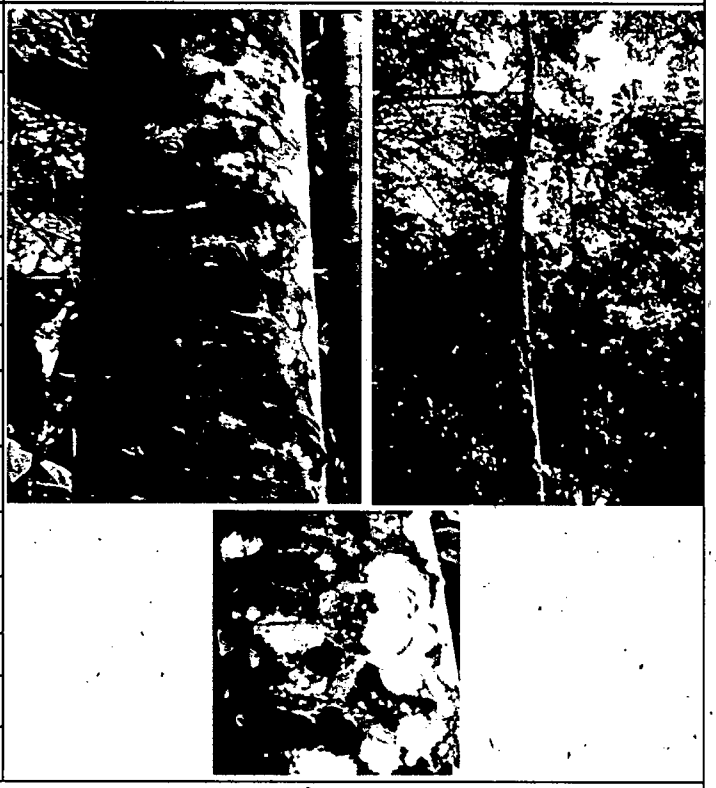

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	89

DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-203	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Vainillo		
ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Fabaceae	3,3527	-76,53446667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,3	0,4	12,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

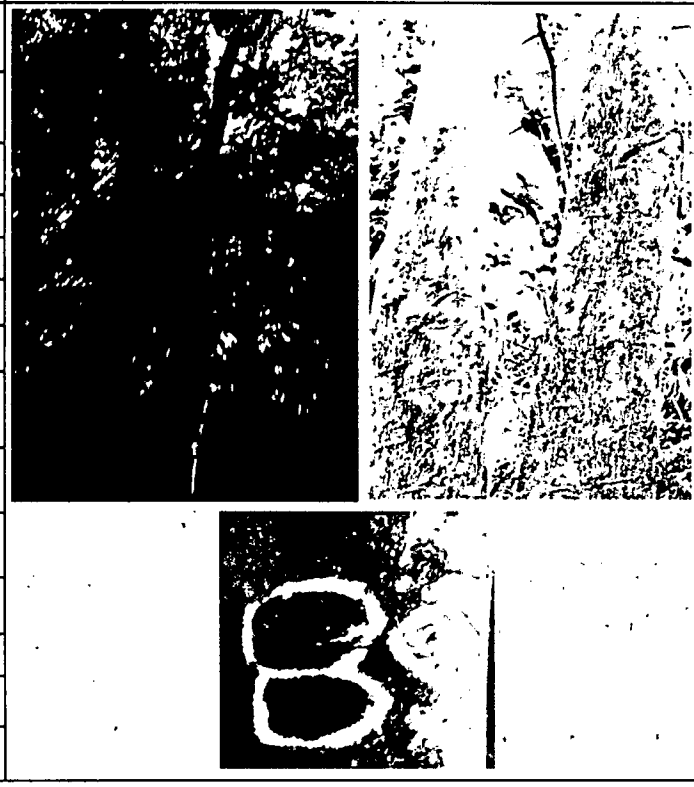

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

129

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**90**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-204	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Guanabano	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Annonaceae	3,352749	-76,534422	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,13	3,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

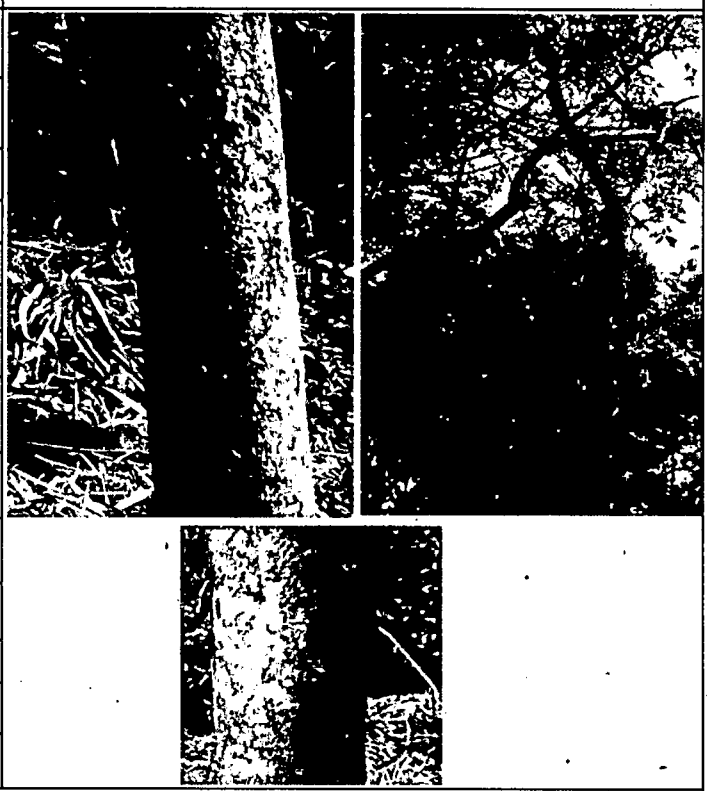

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**91**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-205	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,351928333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,1	0,26	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

130

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**92**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-206	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53453333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,2	0,26	3,2

REGISTRO FOTOGRAFICO

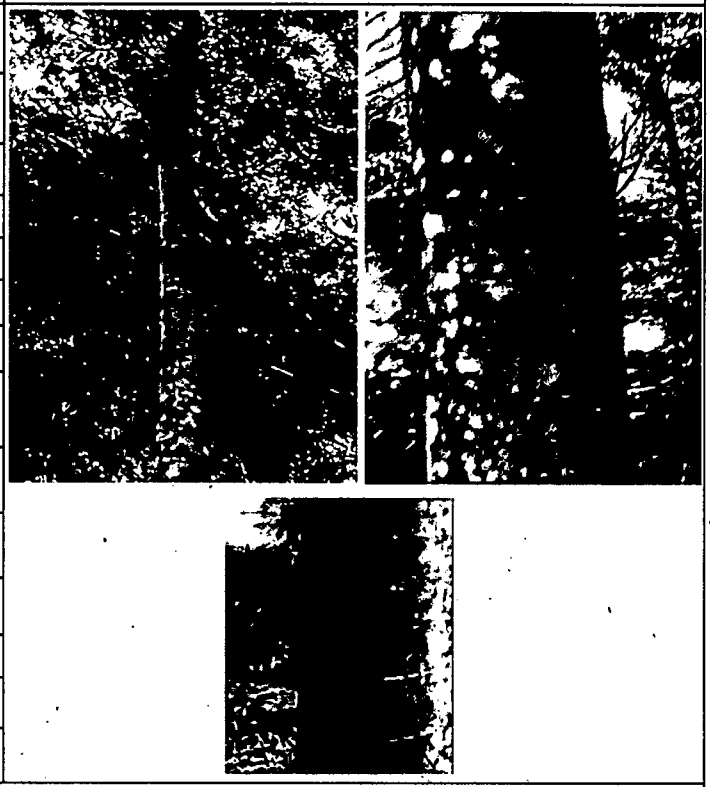

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**93**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-207	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352633333	-76,53451667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,1	0,15	2,6

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

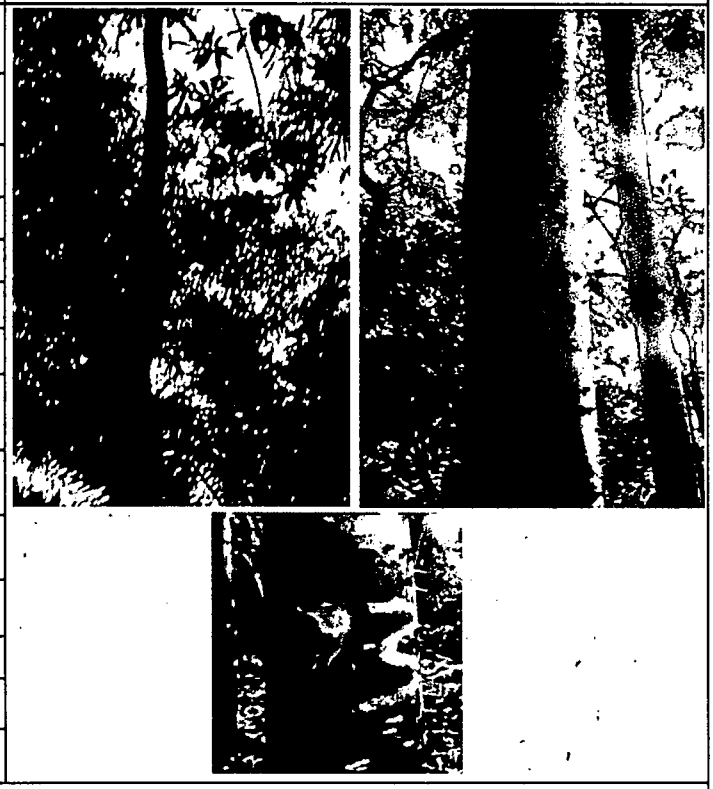

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

131

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**94**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-208	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352775	-76,534387
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,4	0,06	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**95**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-209	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Guanabano	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Annonaceae	3,352666667	-76,536
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,7	0,2	2,24

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

132

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**96**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-210	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352766667	-76,5345
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,10	0,35	8,25

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**97**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-211	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Mango**		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,3528	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,91	12,05

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

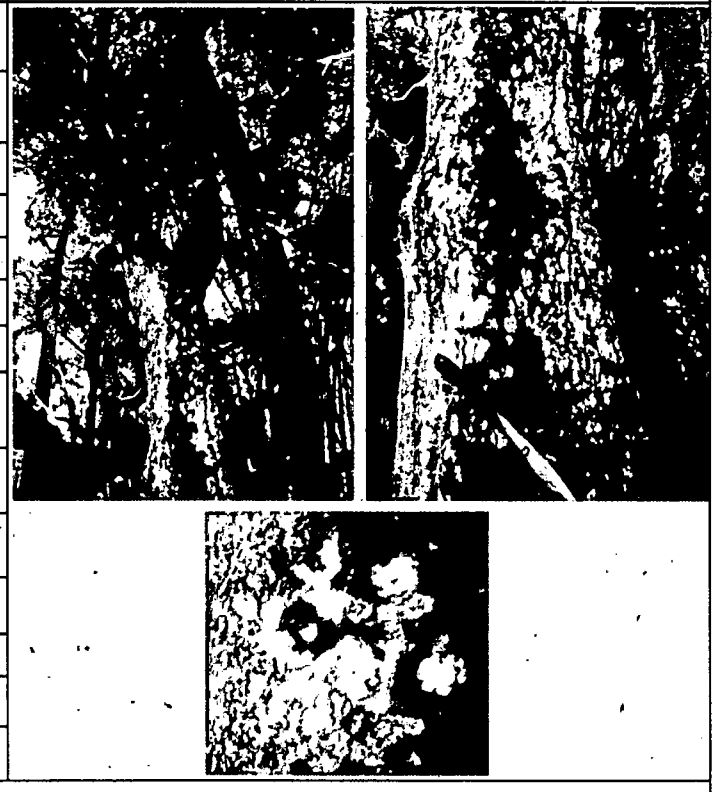

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**98**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-212	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352733333	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,9	18,06

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

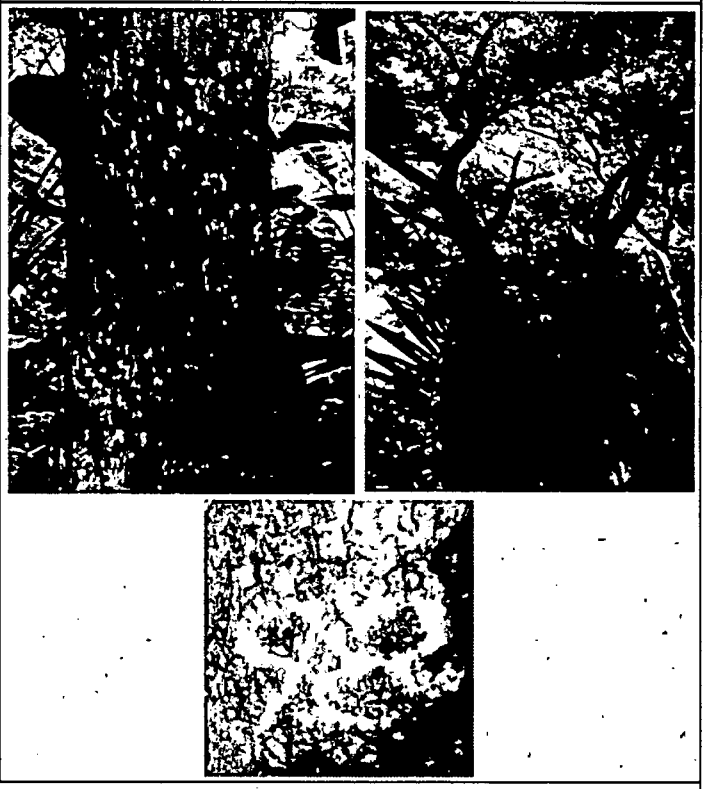

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**99**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-213	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mango	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352766667	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,3	0,15	7,08

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**100**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-214	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higueron	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus glabrata Kunth*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35265	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
9,3	0,14	2,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**101**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-215	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEORÉFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3526	-76,5347
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,5	0,11	2,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

135

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**102**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-216	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3527	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,17	4,23

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

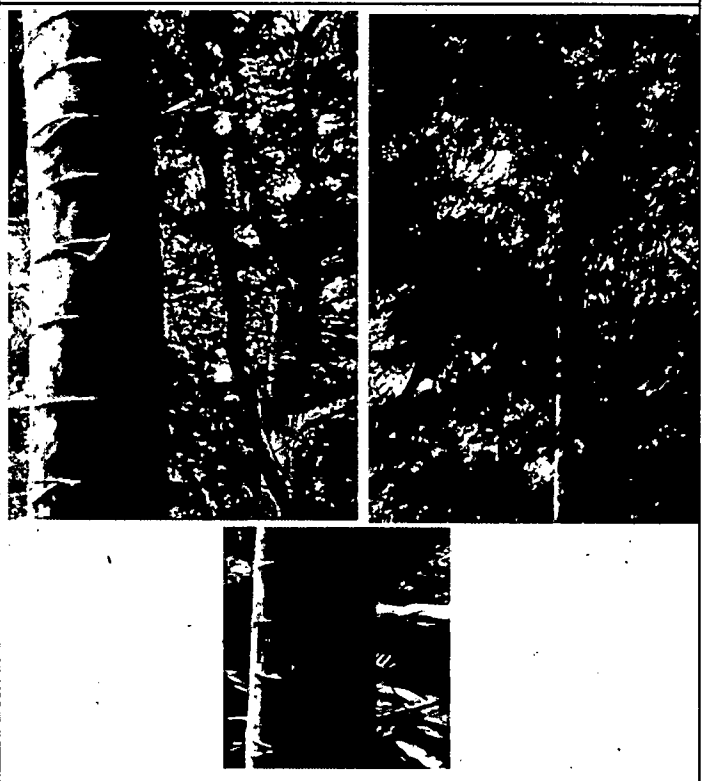

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**103**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-217	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53475
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,39	9,75

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

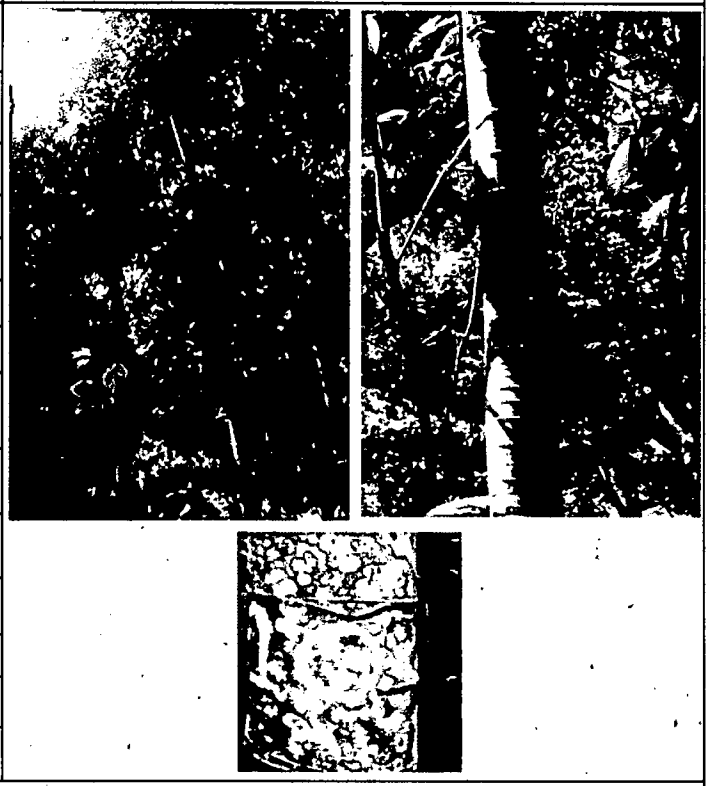

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

136

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**104**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-218	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mango	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352616667	-76,5348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,6	0,46	10,41

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**105**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-219	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352716667	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,3	0,1	4,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

137

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**106**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-220	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352666667	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,13	5,35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

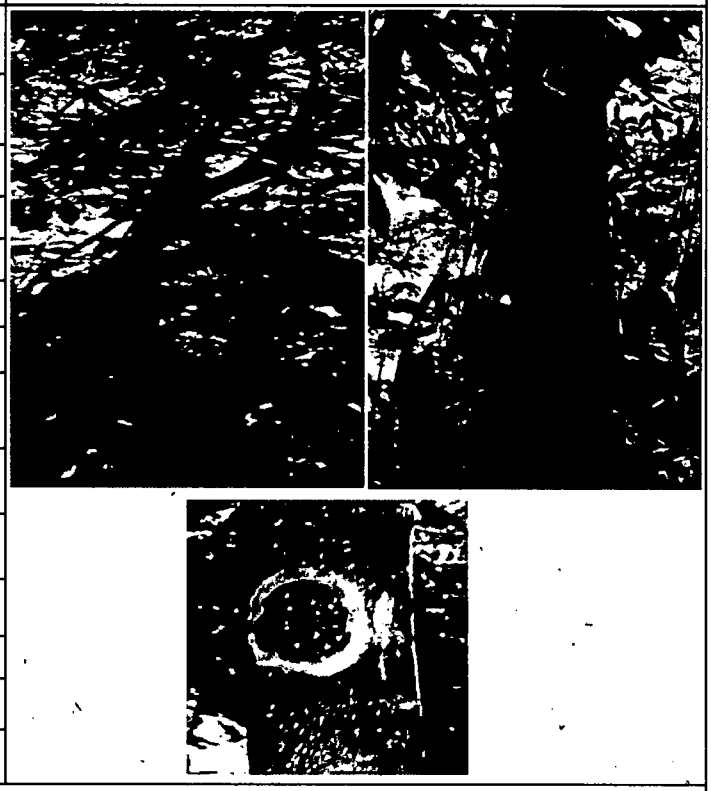

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**86**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-200	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352716667	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,7	0,22	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**108**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-222	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53478333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,7	0,27	3,5

REGISTRO FOTOGRAFICO

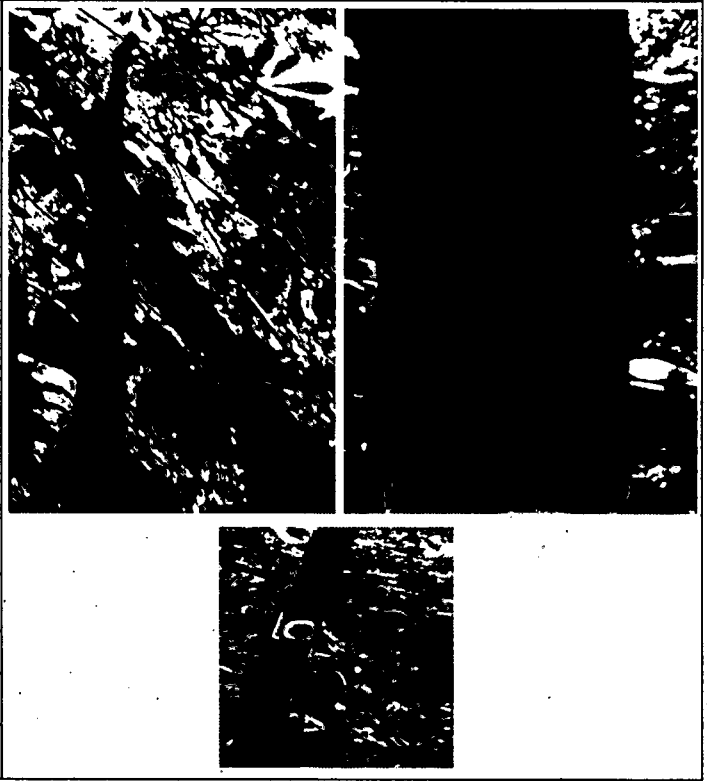

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**109**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-223	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Yarumo		
ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Urticaceae	3,3526	-76,53485
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,9	0,37	9,15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**110**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-224	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352633333	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,08	4,35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**111**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-225	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Higuera blanca		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	3,11

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

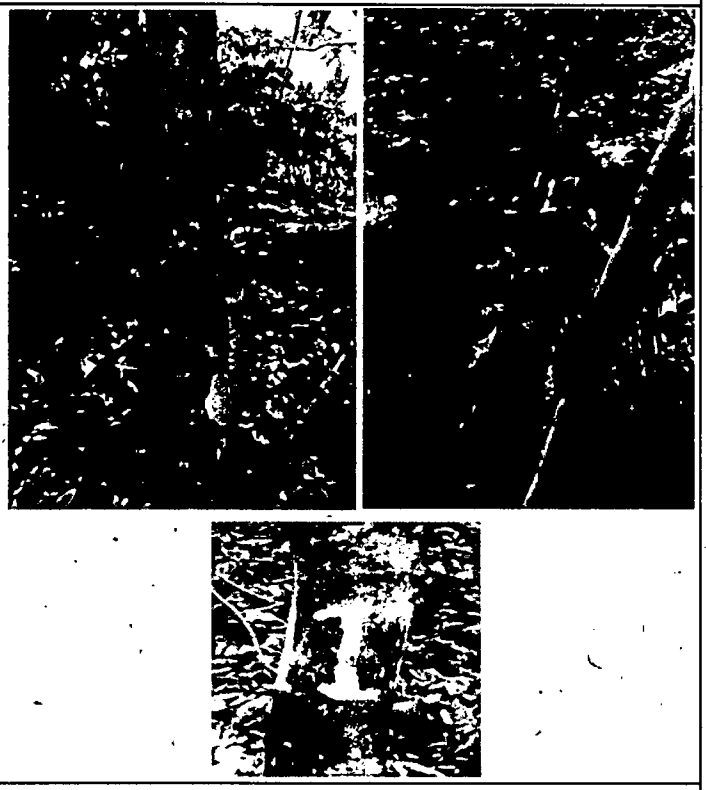

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**112**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-226	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352583333	-76,5348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,64	12,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

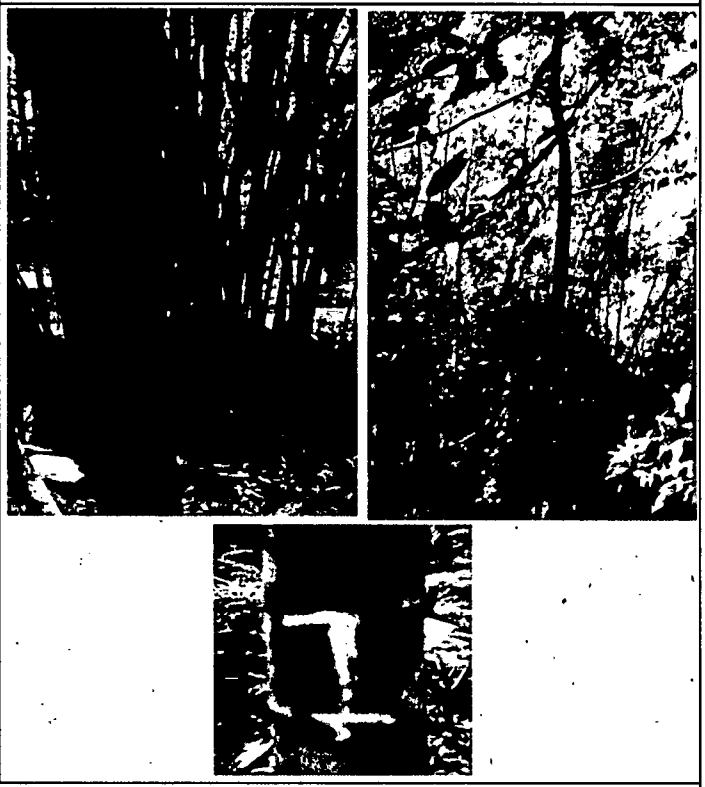

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**113**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-227	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,35255	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,17	7,19

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

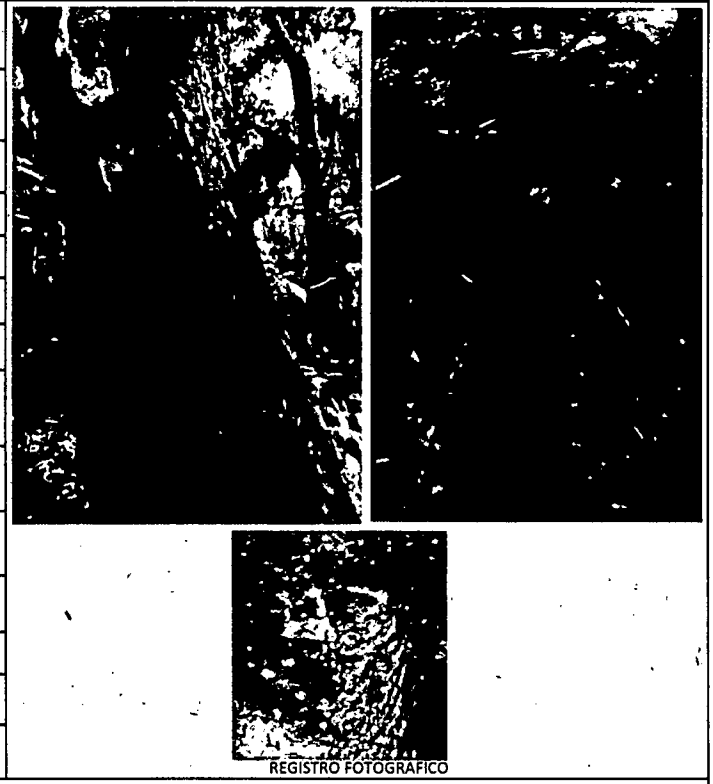

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**114**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-228	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,353066667	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,8	15,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

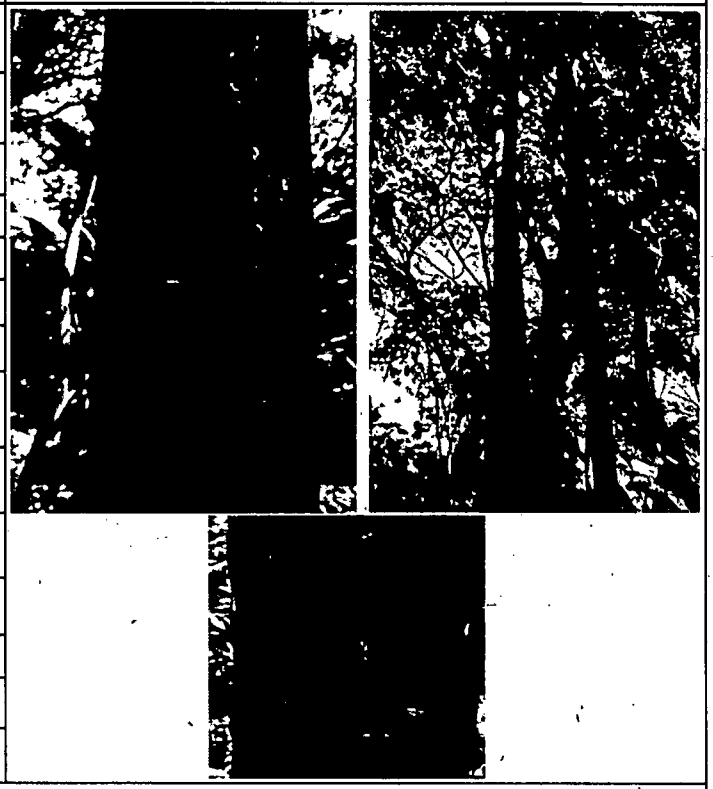

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**115**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-229	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACIÓN**	
	NC	Bohío		
	ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3526	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,1	0,1	5,23

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

142

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**116**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-230	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,6	0,8	15,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

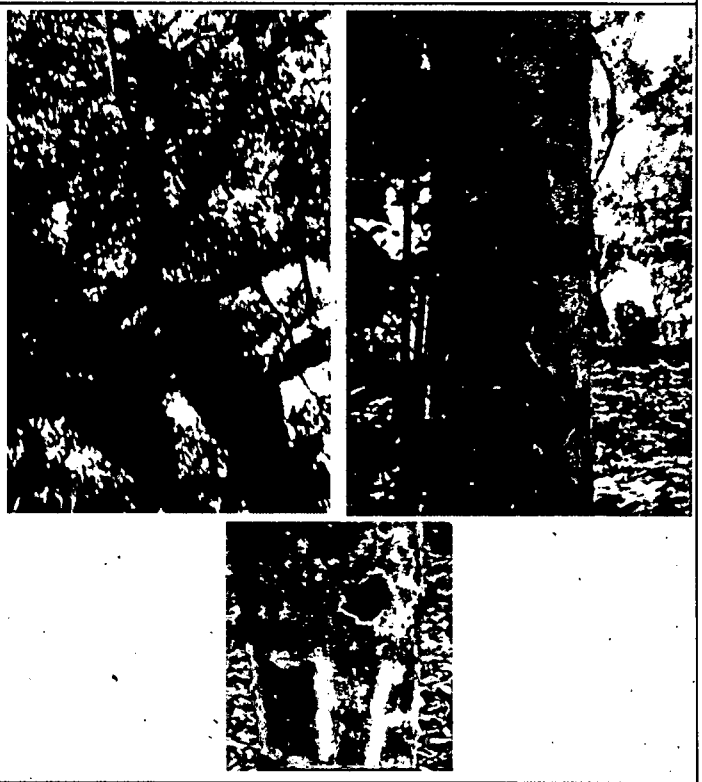

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAM ENTC FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**117**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-231	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,5	0,15	7,58

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**118**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-232	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352516667	-76,5349
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,1	0,26	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

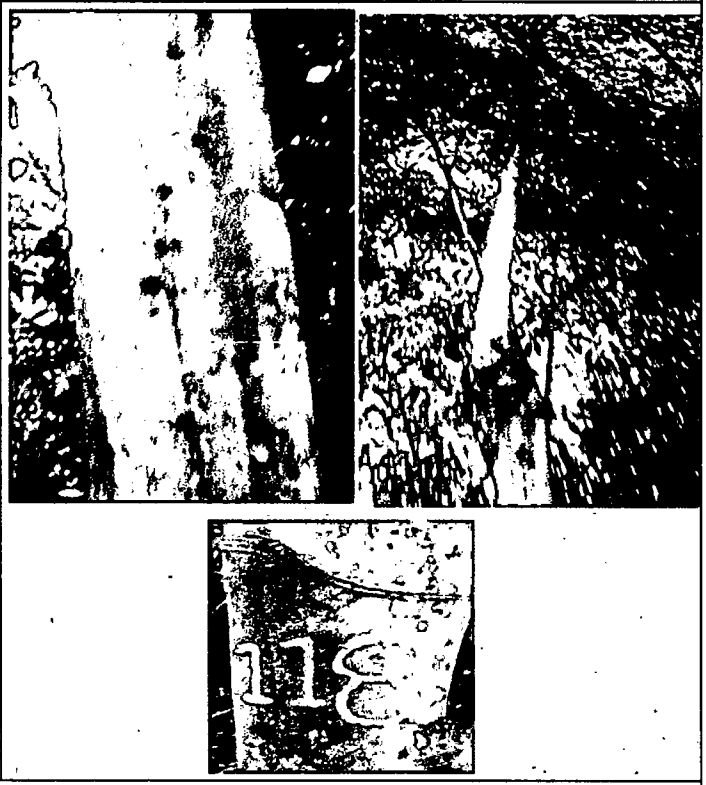

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**119**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-233	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352483333	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,1	0,44	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

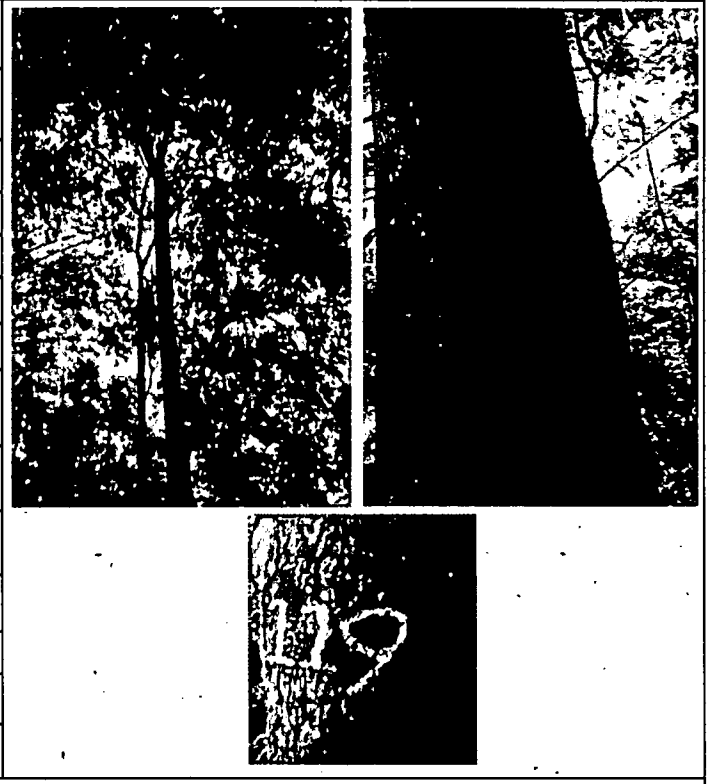

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

144

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**120**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-234	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,5	0,17	7,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**121**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-235	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,2	0,09	3,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

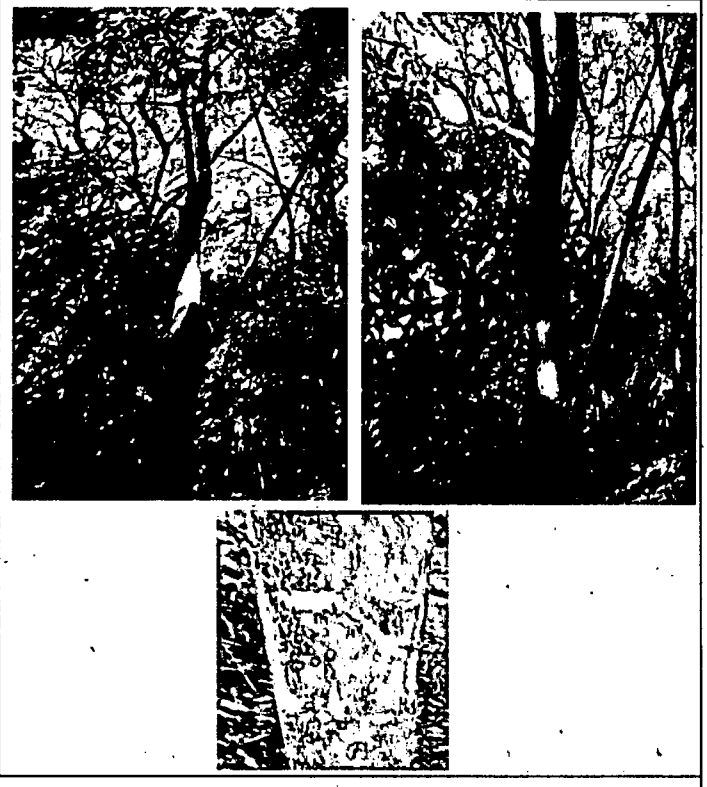

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

145

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	- 13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**122**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-236	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**TACHUELO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,3525	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,21	5,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

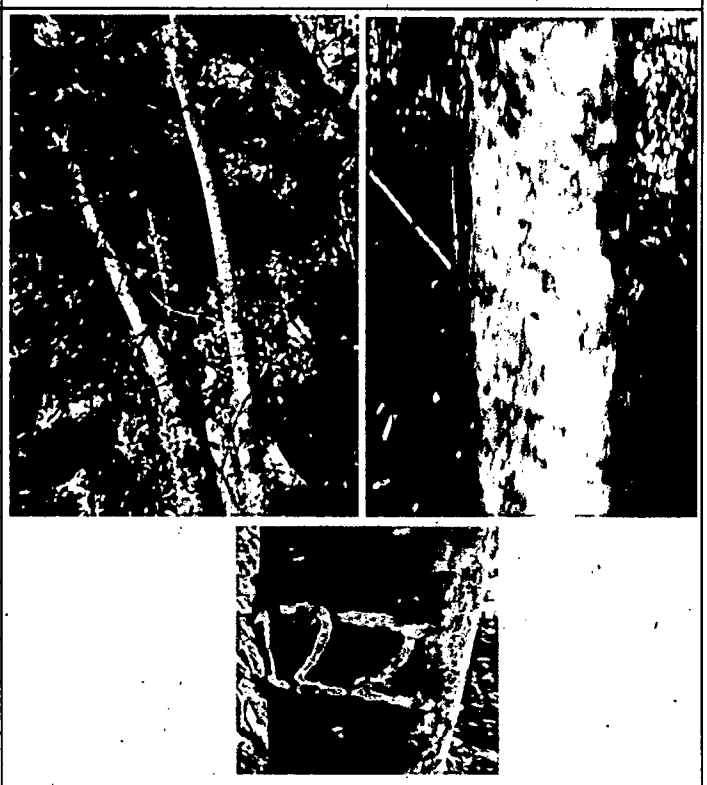

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/05/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**123**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-237	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352666667	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9	0,12	4,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

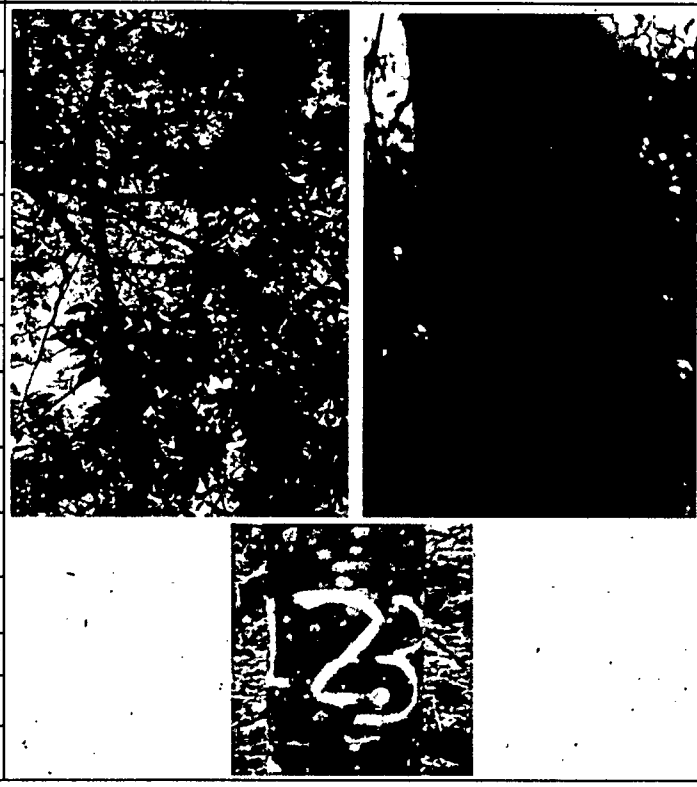

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**124**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-238	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352633333	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	1,52	17,88

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**125**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-239	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352666667	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	1,17	14,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

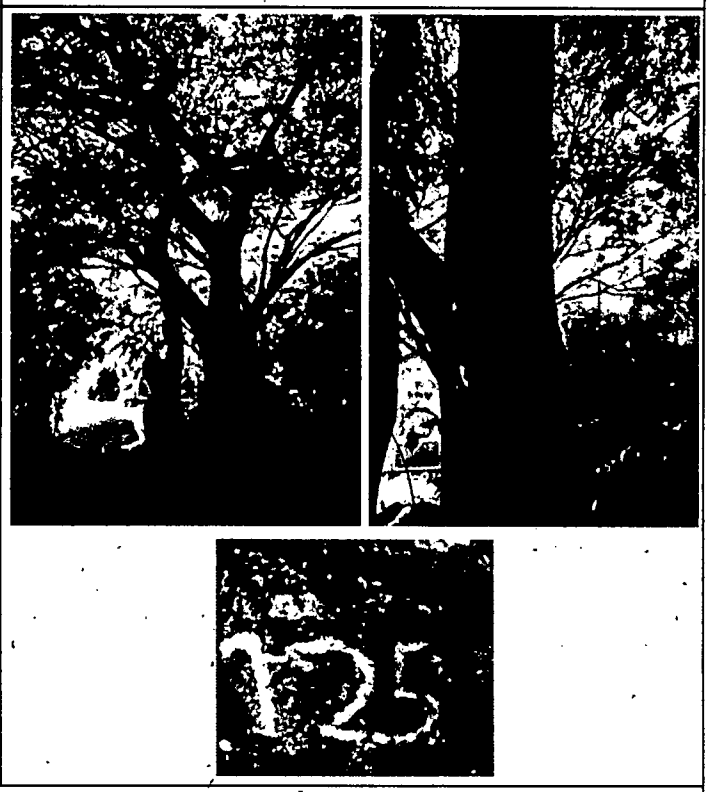

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**126**

DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-240	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Mango	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Anacardiaceae	3,353416667	-76,53368333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,7	1,8	18,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

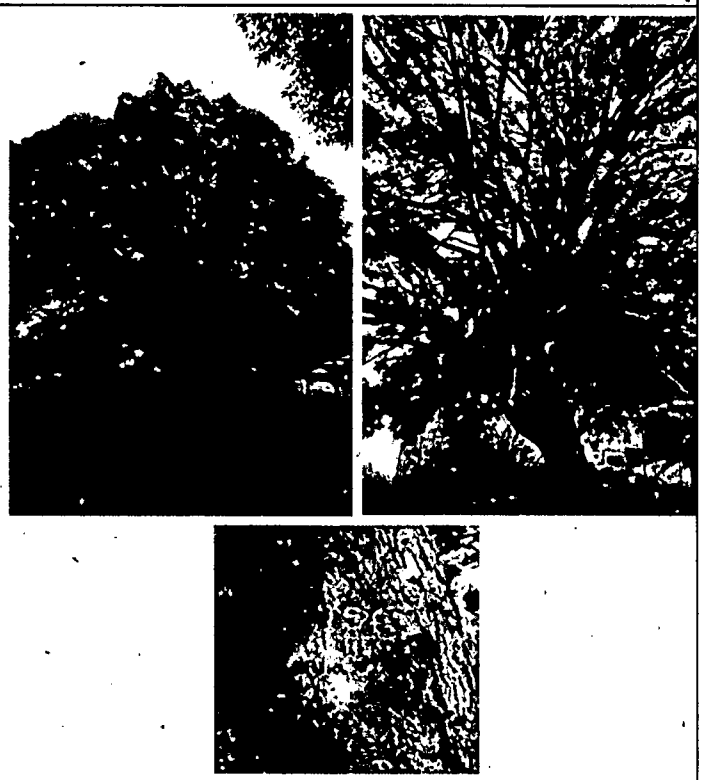

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**127**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-241	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352666667	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,66	9,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

148

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**128**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-242	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Higuera blanca	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,2	1,48	13,86

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

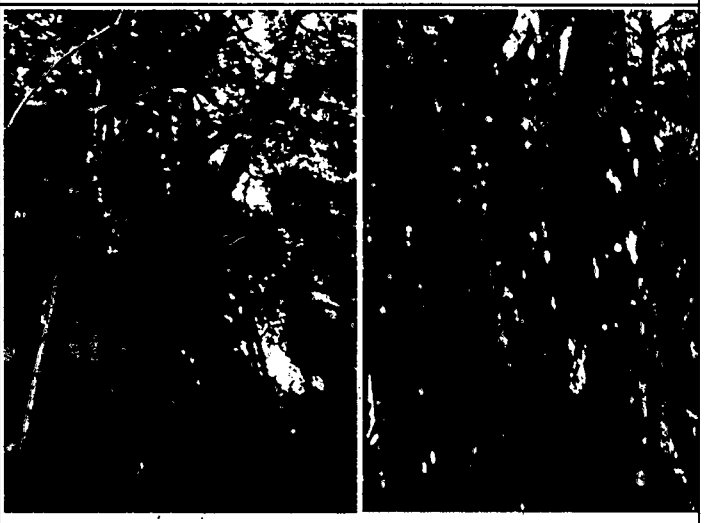



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**129**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-243	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352616667	-76,53511667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,11	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

149

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**130**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-244	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Acacia robinia**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,66	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**131**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-245	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352466667	-76,5352
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,3	0,87	9,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



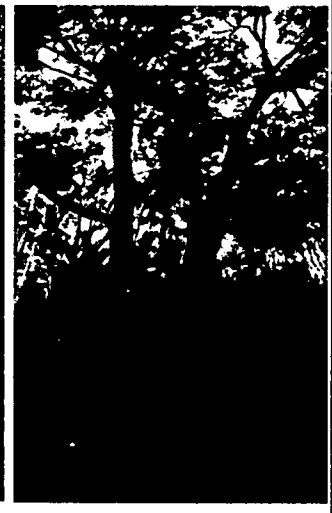



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

150

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**132**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-246	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedrela odorata	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,352416667	-76,5351
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,1	0,48	11,65

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**133**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-247	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Cedrela odorata**		
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,3524	-76,53518333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,4	0,34	12,75

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

159

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**134**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-248	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53511667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,4	0,13	4,25

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura.**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**135**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-249	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35255	-76,53515
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,57	12,41

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

152

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	– 13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**136**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-250	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mestizo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cupania glabra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,351733333	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,83	11,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

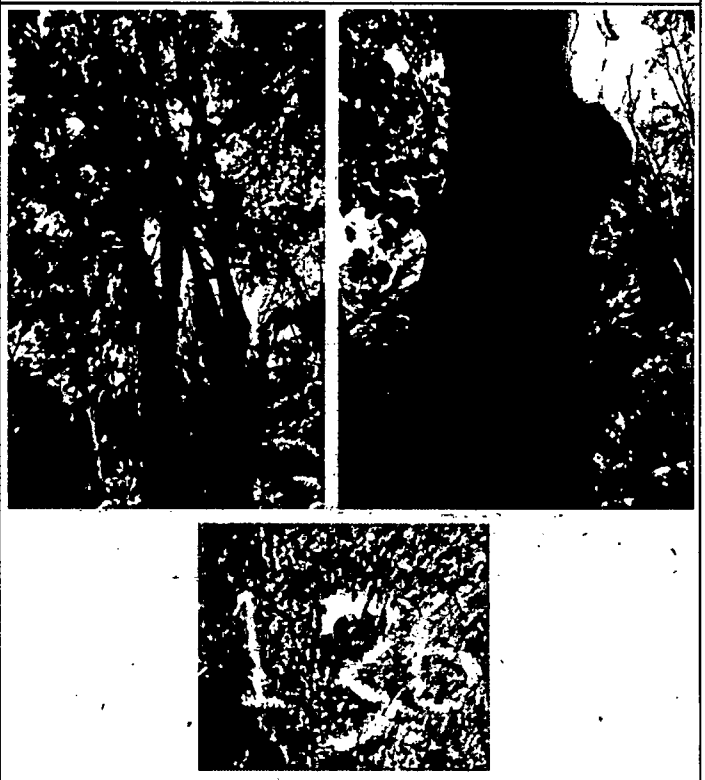

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**137**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-251	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35165	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,11	3,22

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

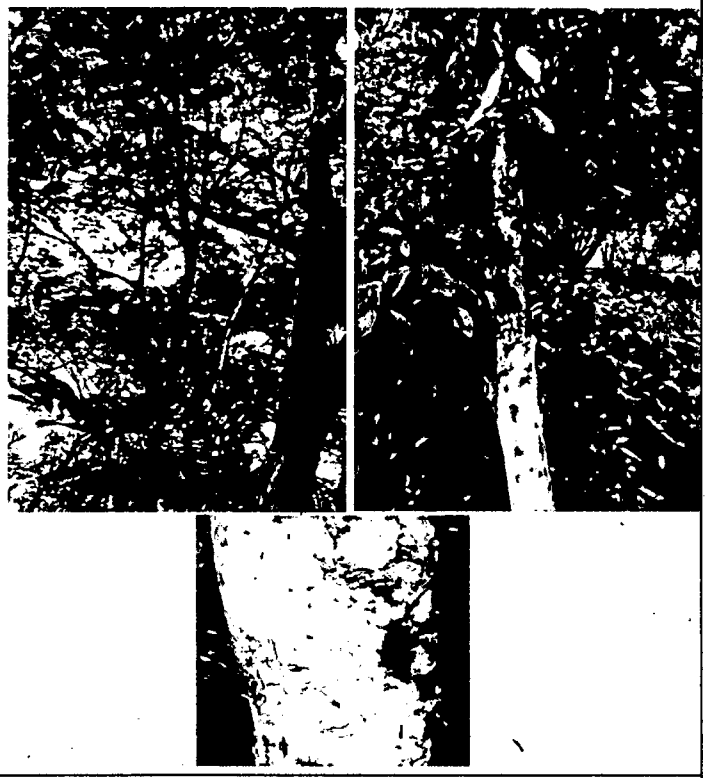

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

153

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**138**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-252	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Gualanday	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,351666667	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,62	17,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

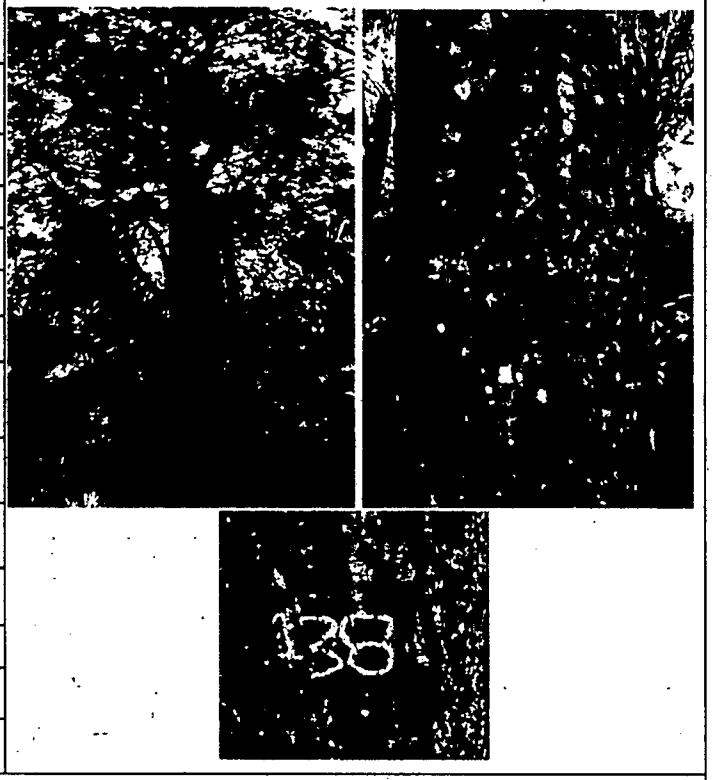

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**139**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-253	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Gualanday**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,3517	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,3	0,46	10,18

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

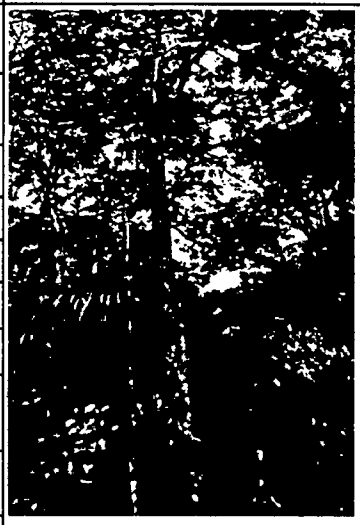





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

154

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**140**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-254	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Cedrela odorata**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35175	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,8	0,19	1,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

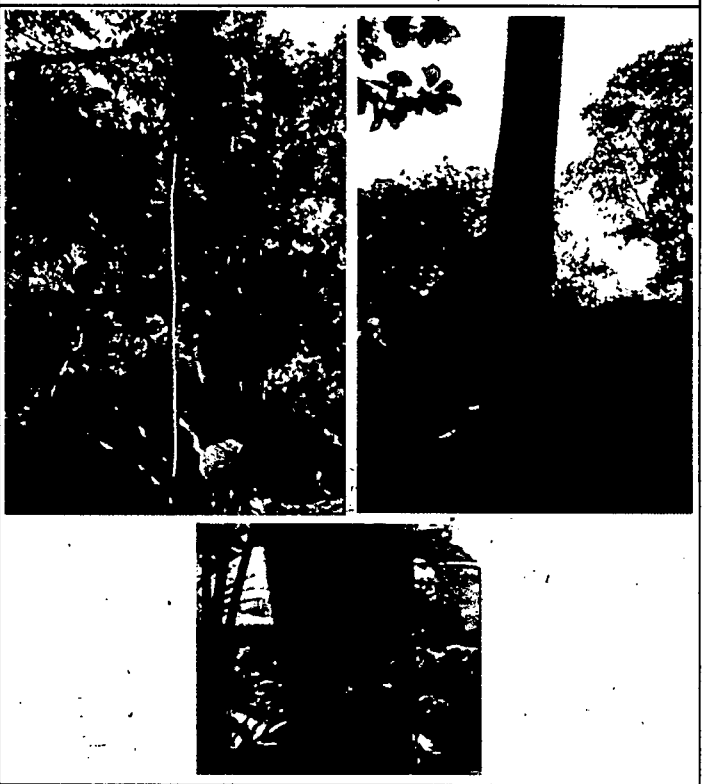

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**141**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-255	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Gualanday	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,351983333	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,9	0,59	18,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

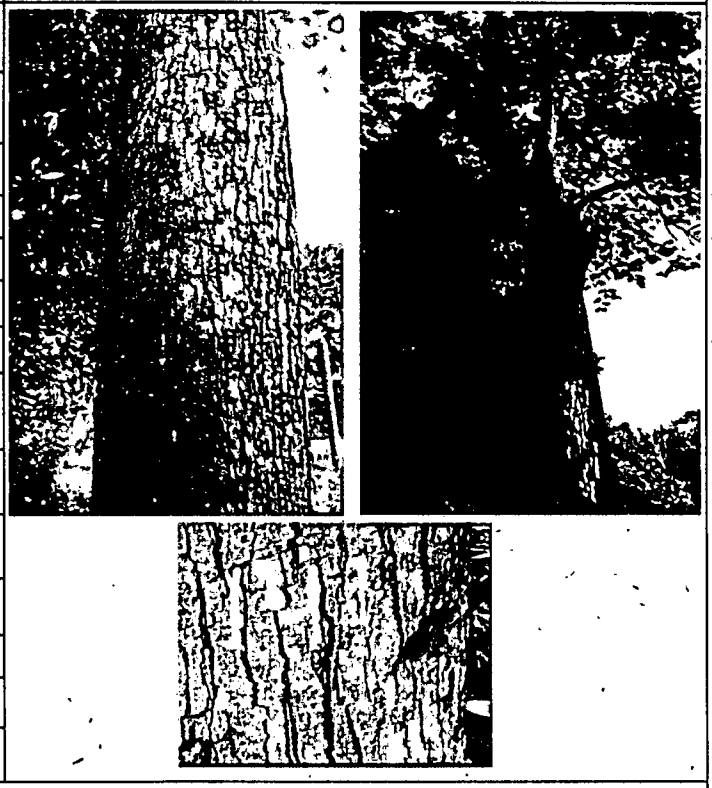

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**142**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-256	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351683333	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	0,36	9,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

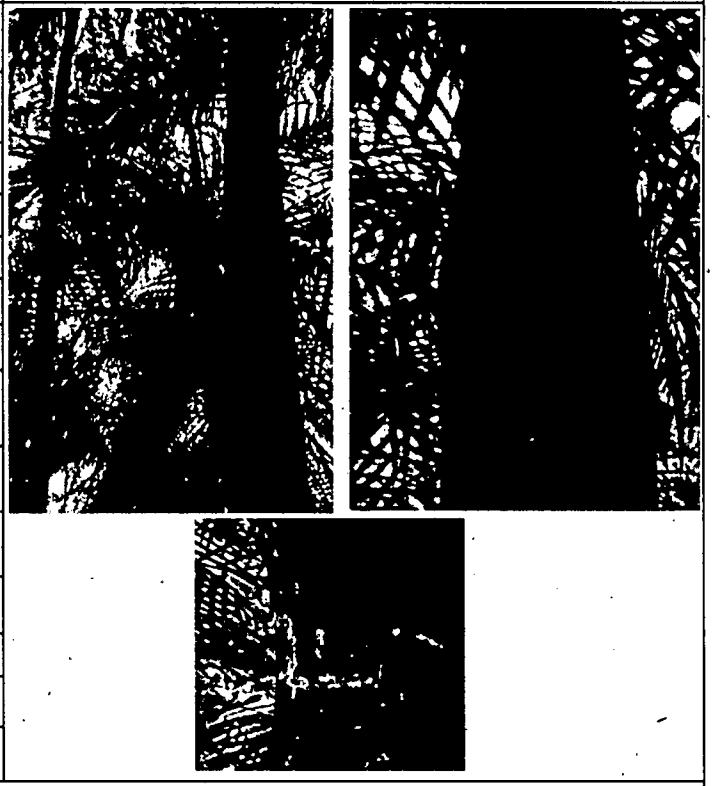

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**143**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-257	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,352233333	-76,53426667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,5	0,79	13,84

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

156

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**144**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-258	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus benjamina	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35235	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,6	0,27	9,43

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**145**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-259	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35235	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,24	8,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

157

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**146**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-260	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35235	-76,53406667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,24	6,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

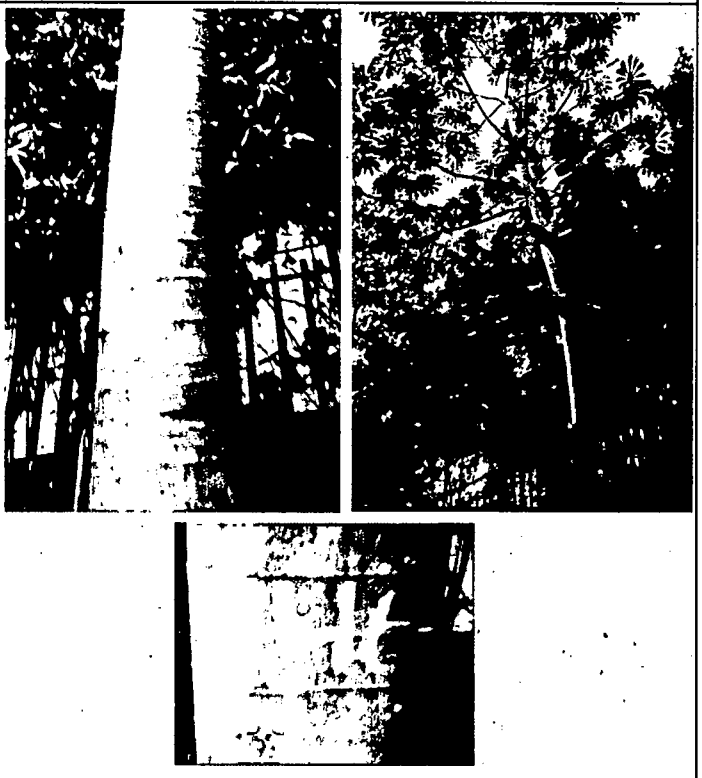

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**147**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-261	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Aguacate	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Persea americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,352383333	-76,53401667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,77	4,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

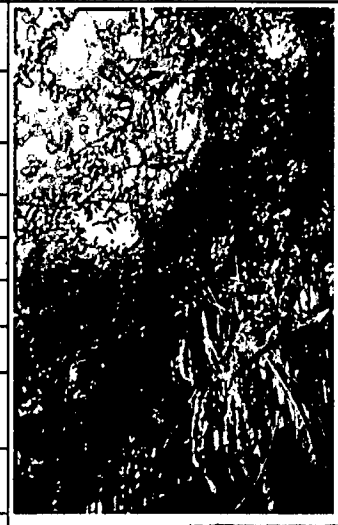





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

153

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**148**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-262	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Jobo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Spondias mombin*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Anacardiaceae	3,35245	-76,53386667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,8	0,44	13,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





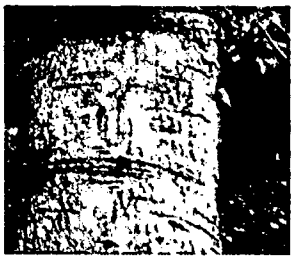

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**149**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-263	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guayabo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,352369	-76,53393
	No, CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,26	7,32

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

159

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**150**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-264	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Eucalipto**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Eucalyptus robusta*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,3533	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,2	0,43	7,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**151**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-265	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Aguacate		
	ESPECIE	*Persea americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,352516667	-76,53378333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,58	11,15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

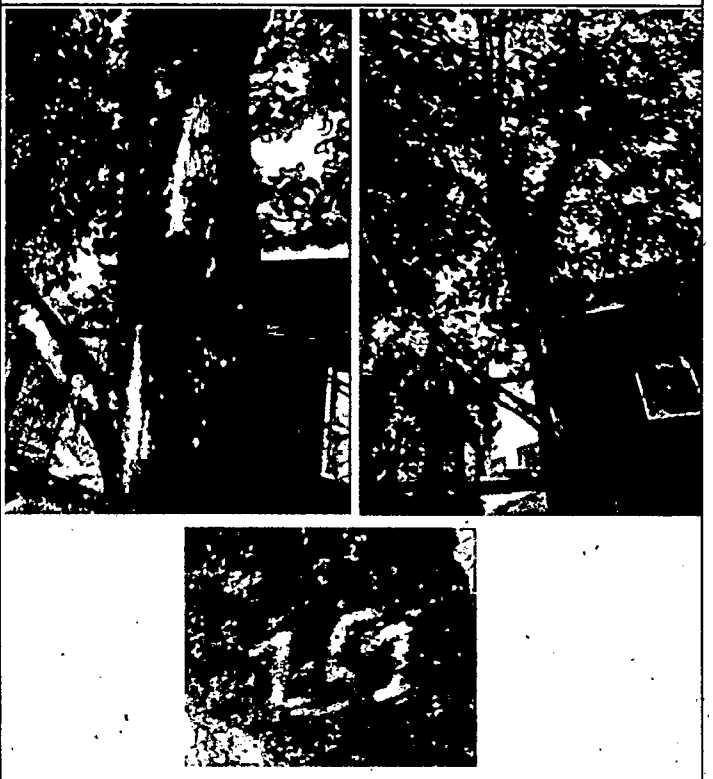

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

160

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**152**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-266	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Aguacate	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Persea americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,35255	-76,53385
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10	0,21	5,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**153**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-267	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Zapote**		
	ESPECIE	*Matisia cordata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,352583333	-76,53371667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,1	0,58	8,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

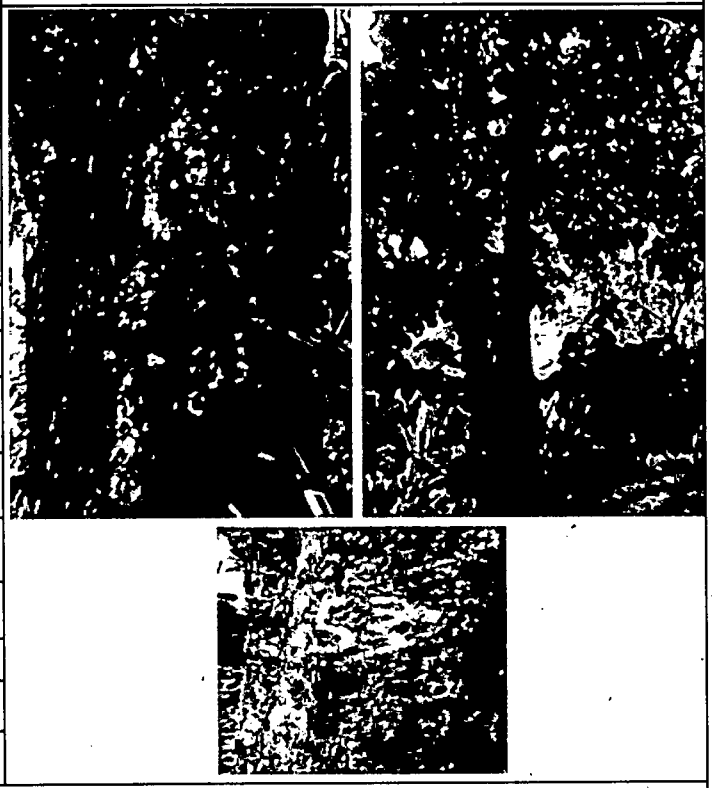

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

161

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**154**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-268	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Bohío**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352983333	-76,53431667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,2	0,72	35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

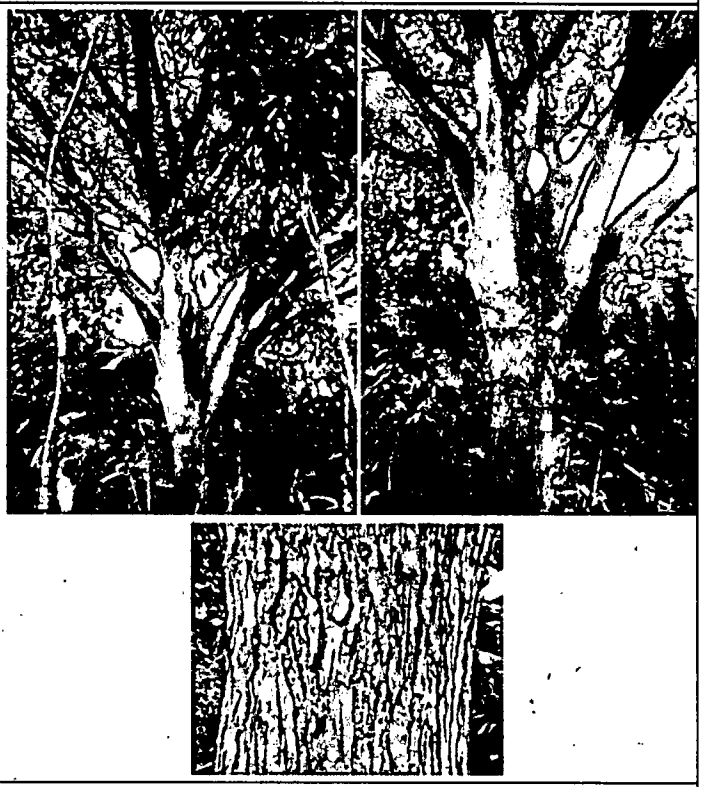

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			155
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-269	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Vainillo		
ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Fabaceae	3,352883333	-76,53405
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,6	0,22	15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**156**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-270	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352366667	-76,53431667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,1	0,65	7

REGISTRO FOTOGRAFICO

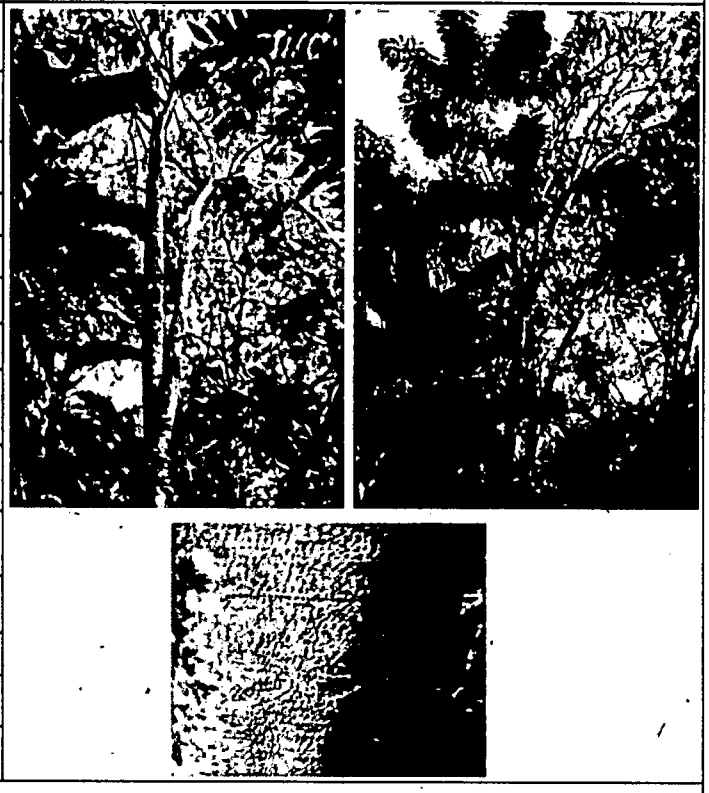

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**157**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-271	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353233333	-76,5343
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,6	0,22	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

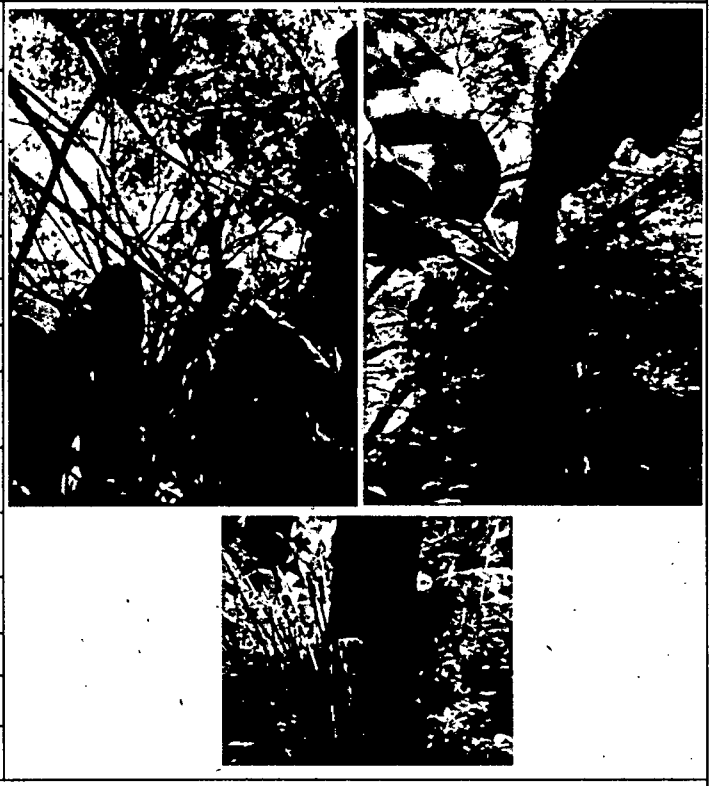

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

163

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**158**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-272	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35325	-76,53431667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,9	0,19	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**159**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-273	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353333333	-76,53423333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	1,01	10,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**160**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-274	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ceiba pentandra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,3534	-76,53433333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17	1,17	16,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

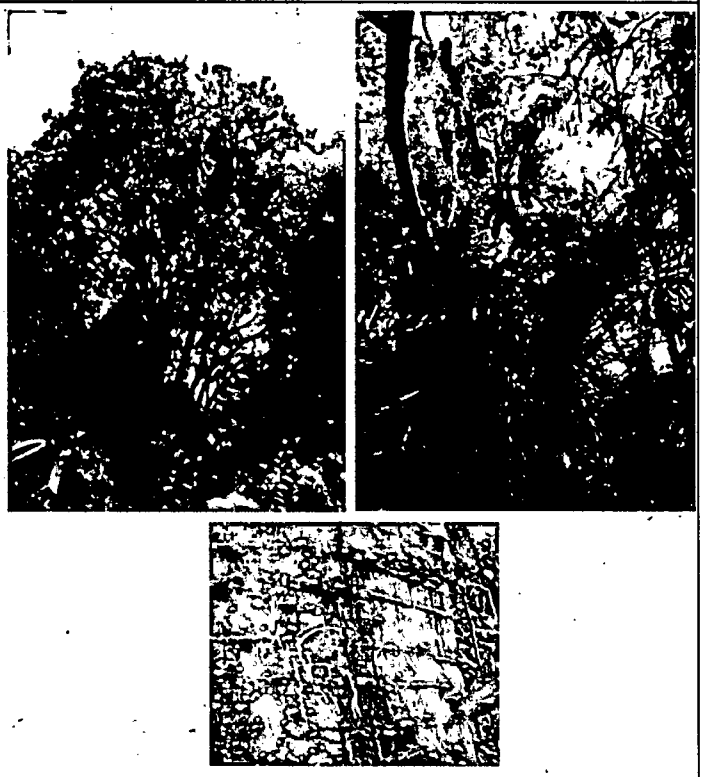

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**161**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-275	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353066667	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,21	5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

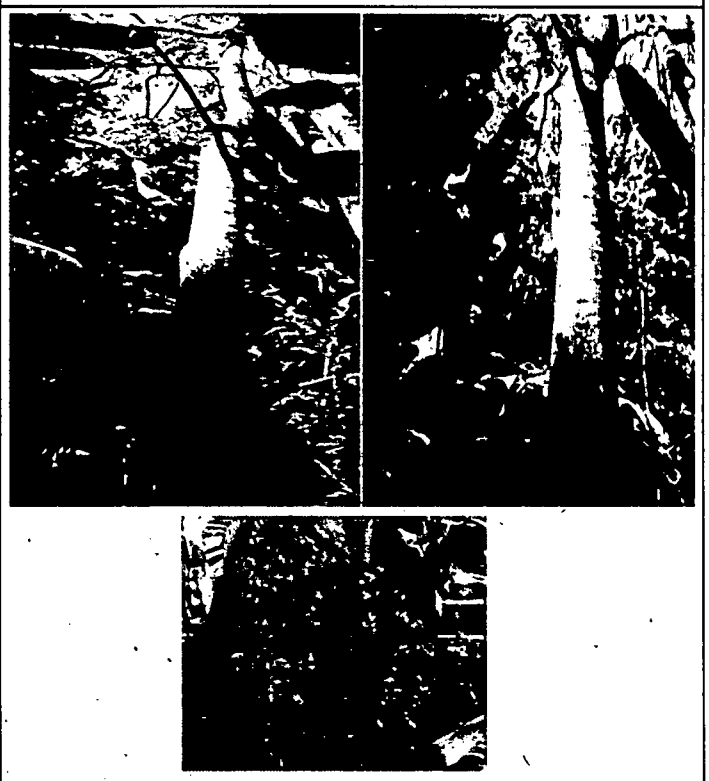

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**162**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-276	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35305	-76,53445
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,2	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



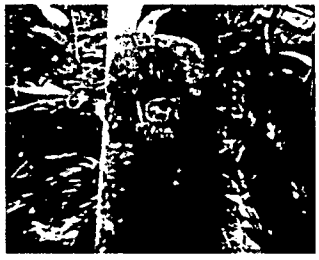

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**163**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-277	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,3532	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,28	6,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

166

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**164**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-278	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353316667	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,3	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







164

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**165**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-279	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353516667	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,23	9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**166**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-280	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3538	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,7	0,33	8,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

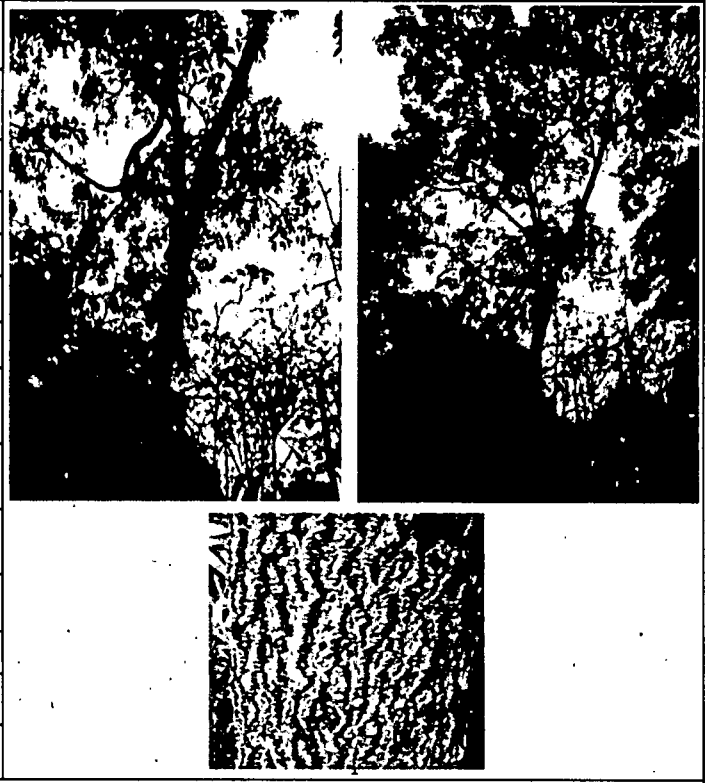

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**167**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-281	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,354783333	-76,53421667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,2	0,14	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

168

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**168**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-282	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35495	-76,53401667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,25	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**169**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-283	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACIÓN**		
ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,355066667	-76,534	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,27	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

169

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**170**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-284	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracoli	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,355216667	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,7	0,24	7,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**171**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-285	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracoli	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,355266667	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,2	0,33	9,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

170

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**172**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-286	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracoli	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,35535	-76,63403333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,56	8,68

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

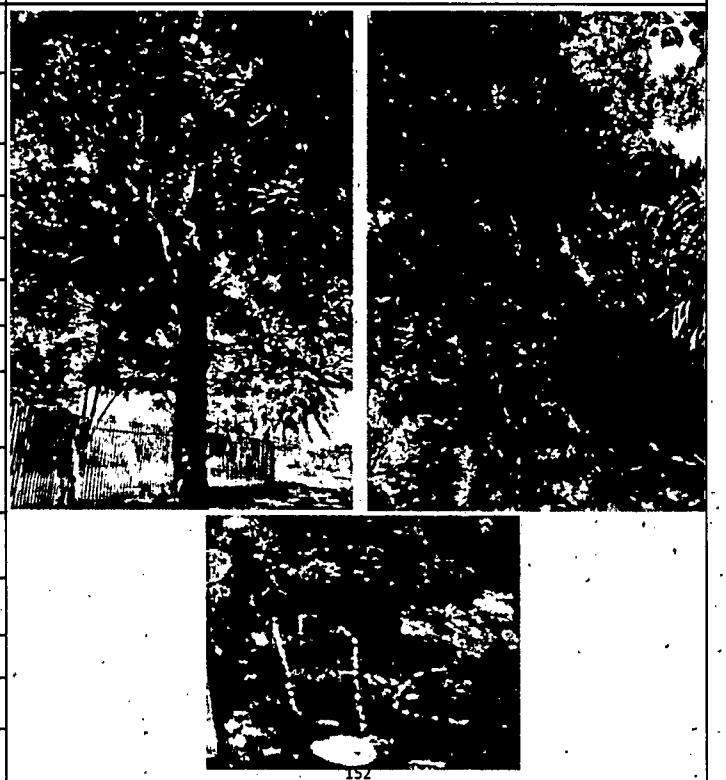

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**173**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-287	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Palma africana		
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,354667	-76,534263
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,5	0,58	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

171

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**174**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-288	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma africana	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,35525	-76,53888333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13	0,42	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**175**

DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-289	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Palma africana		
ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Arecaceae	3,355316667	-76,5338

No. CENSO ARBOREO 2015	0
No CENSO ARBOREO 2023	0

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,6	0,46	3,5

REGISTRO FOTOGRAFICO







ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

172

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**176**
DIRECCIÓN:	Cra..115a #16-290	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,355116667	-76,53373333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,6	0,13	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**177**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-291	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caoba**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,354383333	-76,53365
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15	0,46	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

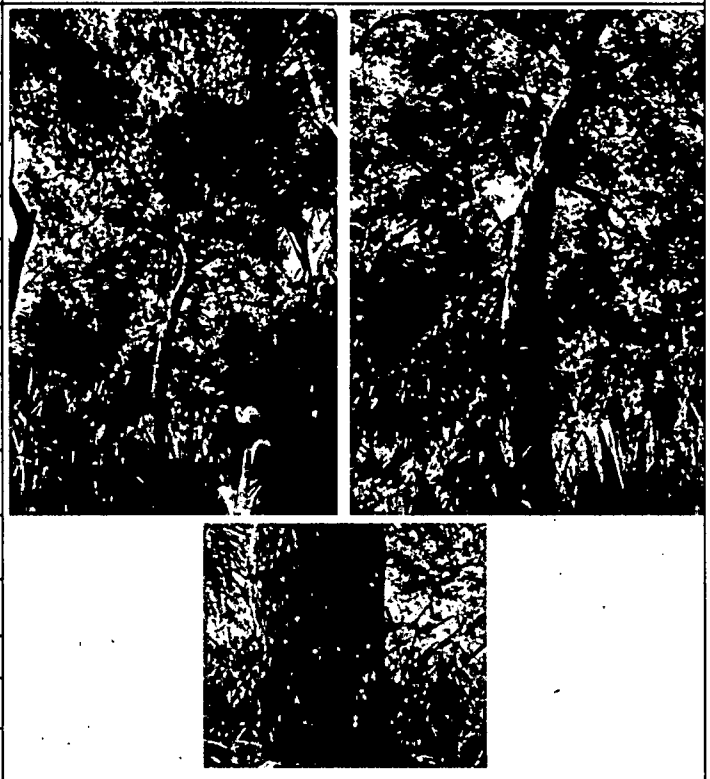

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**178**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-292	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD -**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,354366667	-76,5337
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,4	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

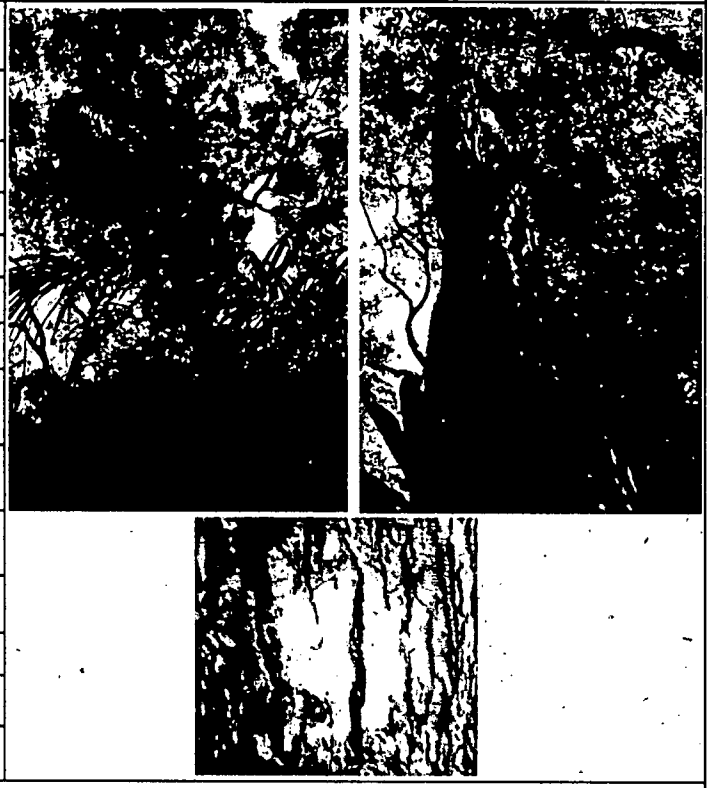

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**179**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-293	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35425	-76,53361667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,7	0,45	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**180**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-294	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353883333	-76,53353333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,3	0,35	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

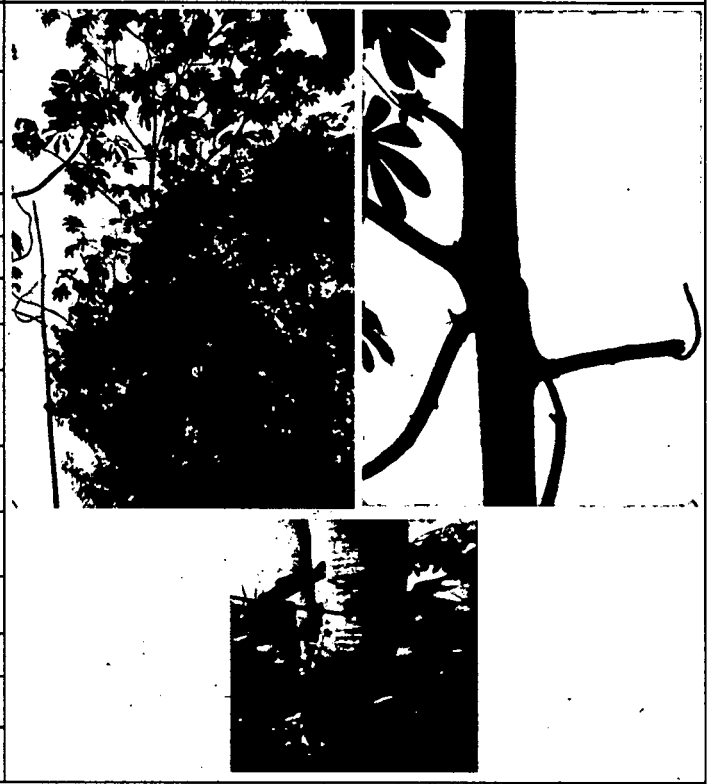

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**181**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-295	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35372	-76,533549
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,3	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**182**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-296	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353716667	-76,5353
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
12,2	0,25	4,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

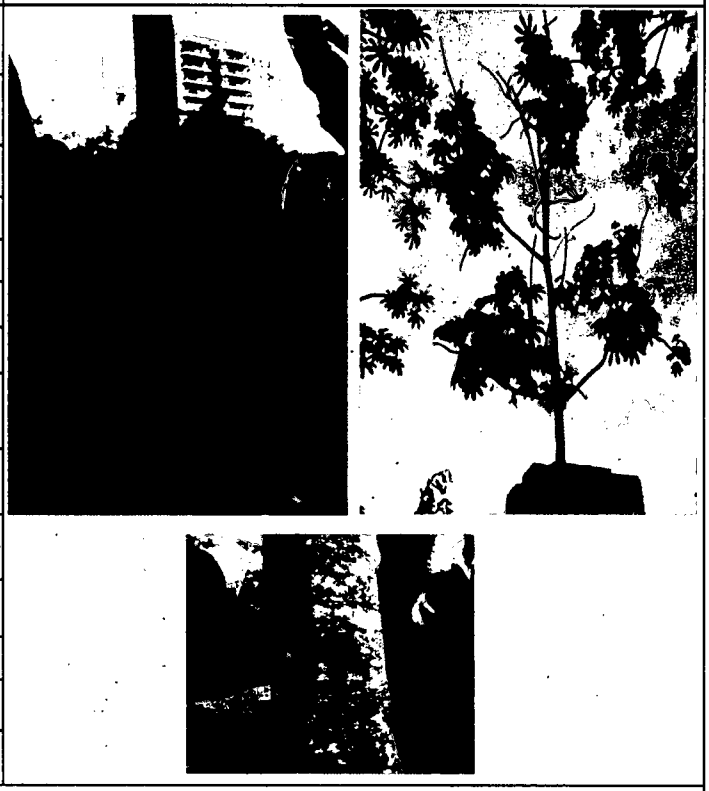

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**183**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-297	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353683333	-76,53363333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,45	6,3

ESTADÓ FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

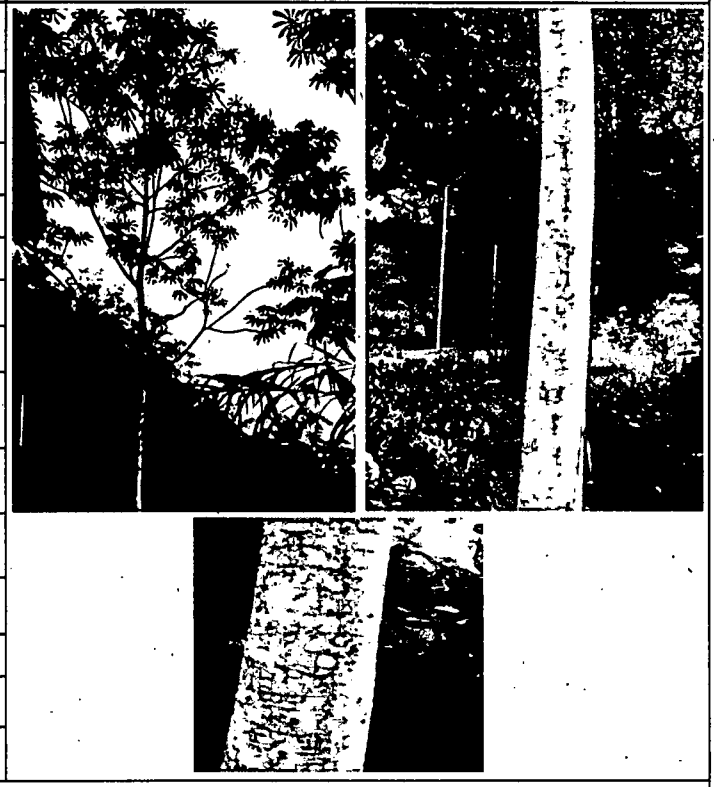

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

176

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**184**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-298	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35355	-76,53435
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16	0,89	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**185**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-299	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35363	-76,53433
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,5	0,9	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

177

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**186**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-300	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35363	-76,53428
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,5	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**187**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-301	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35367	-76,5342
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,9	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**188**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-302	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35382	-76,53398
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,2	0,5	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





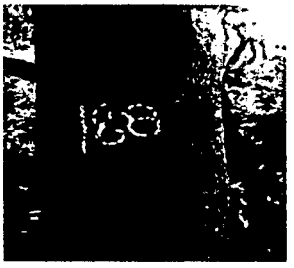

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**189**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-303	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3538	-76,53415
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,24	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

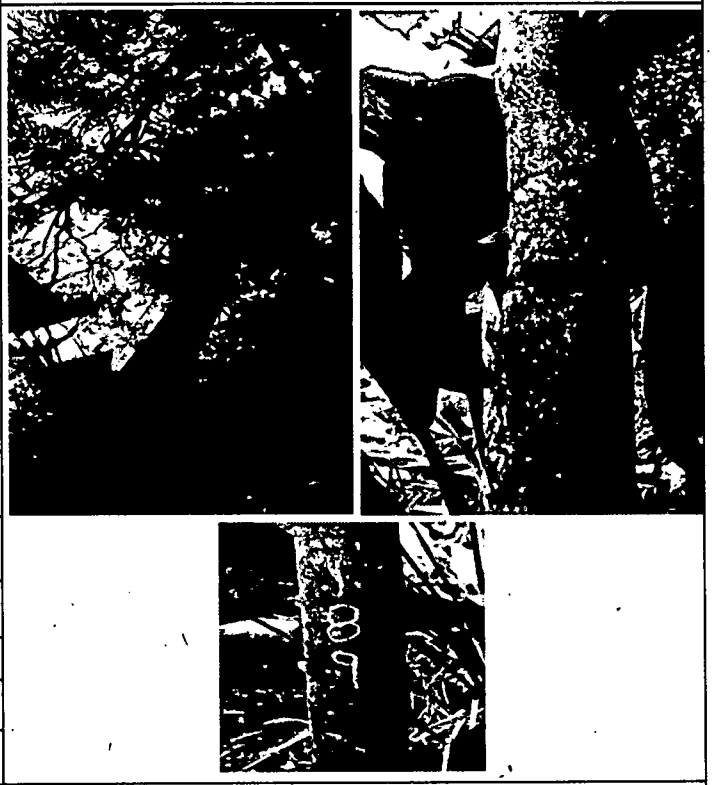

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

179

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**190**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-304	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35387	-76,53333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,3	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

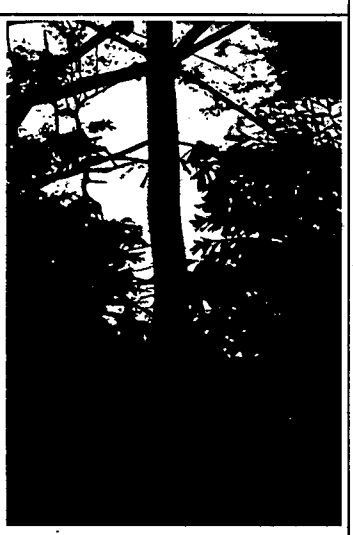
OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**191**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-305	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35402	-76,54985
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,2	0,55	4,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

180

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**192**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-306	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35417	-76,54995
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,48	6,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**193**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-307	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Valnillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35433	-76,53342
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,76	5,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





152

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**194**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-308	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35455	-76,53345
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	1,62	7,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**195**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-309	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35463	-76,5335
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,6	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**196**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-310	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35493	-76,53365
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,2	4,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**197**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-311	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35505	-76,53373
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,3	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

123

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**198**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-312	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35488	-76,53382
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,8	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

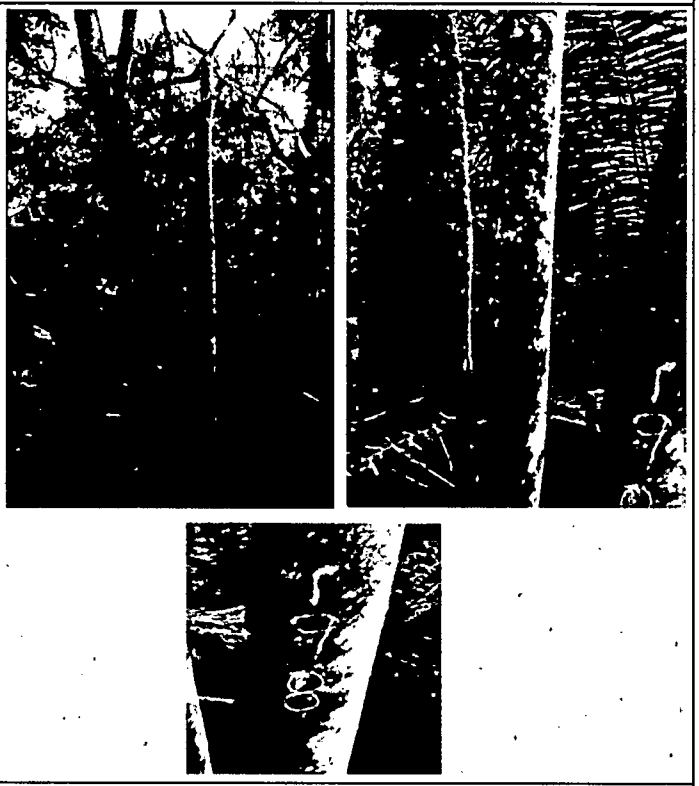

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**199**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-313	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35523	-76,53392
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,53	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







156

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

184

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**200**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-314	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Pizamo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35552	-76,53397
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,98	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



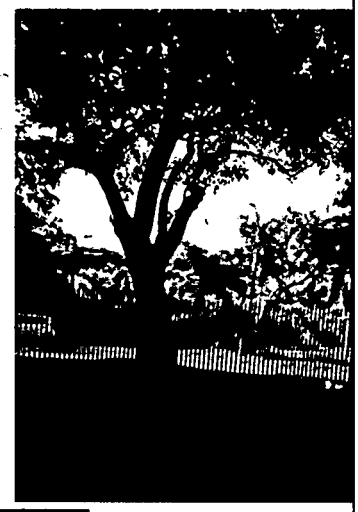



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			1
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 16	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palmiche**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Sabal mauritiiformis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,332795	-76,536632
	No. CENSO ARBOREO 2015	290 347		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.20	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**2**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 17	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Palma abanico de California		
	ESPECIE	Washingtonia filifera	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Areçaceae	3,332765	-76,536511
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 459	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.60	0.40	4.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

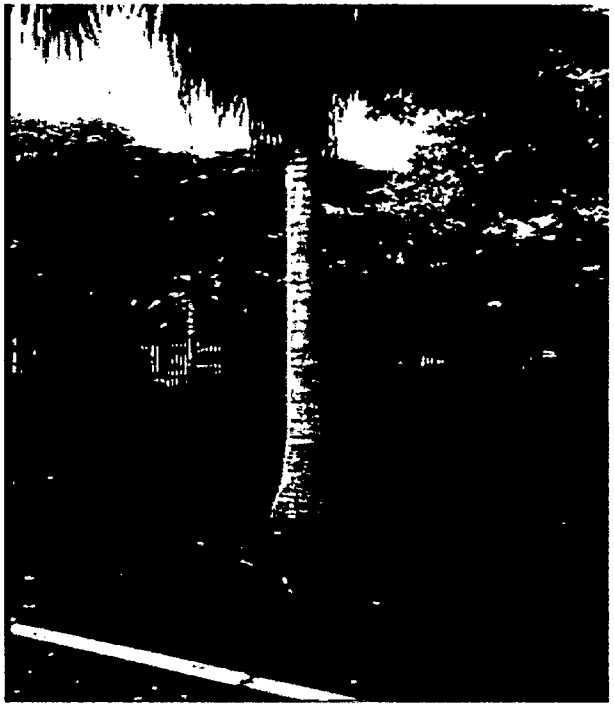

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**3**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 18	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Palma zancona		
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,332704	-76,536599
	No. CENSO ARBOREO 2015	290 345		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17.20	0.45	4.20

REGISTRO FOTOGRAFICO

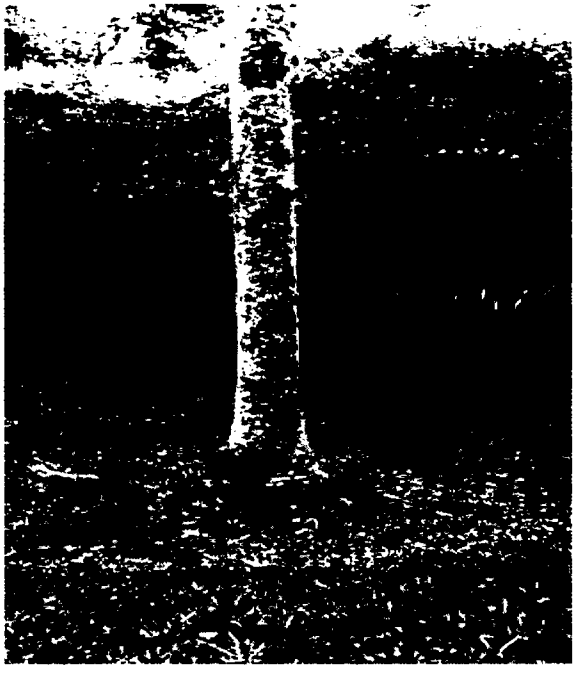

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

186

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**4**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 19	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,332705	-76,536529
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 457	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.40	0.45	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

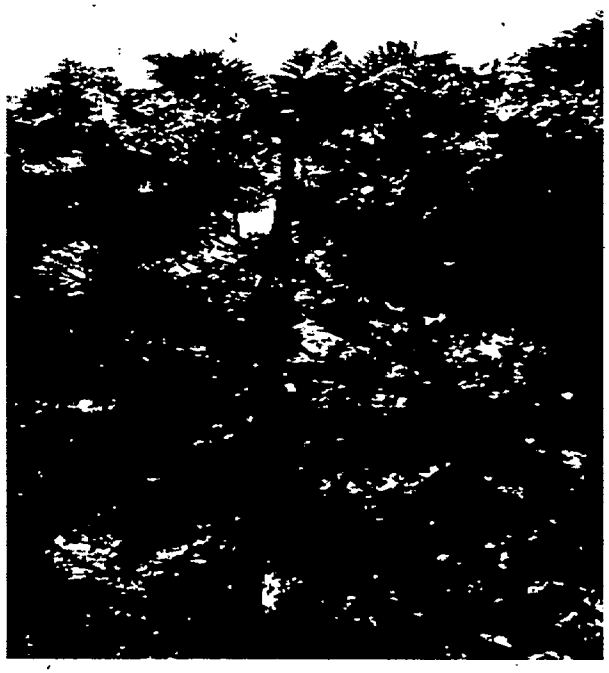

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**5**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 20	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,33266	-76,53661
	No. CENSO ARBOREO 2015		290 344	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
20.40	0.50	3,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

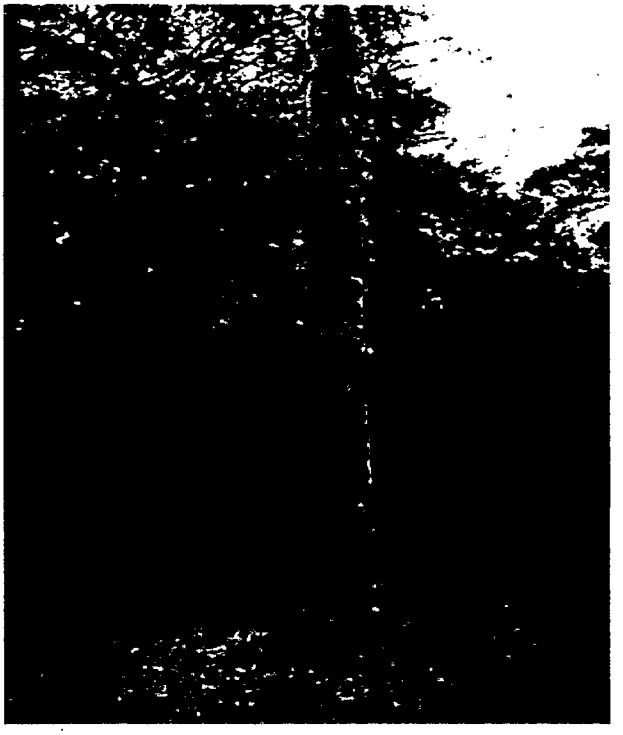

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

187

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**6**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 21	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,33261	-76,536464
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 455	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
20.80	0.45	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

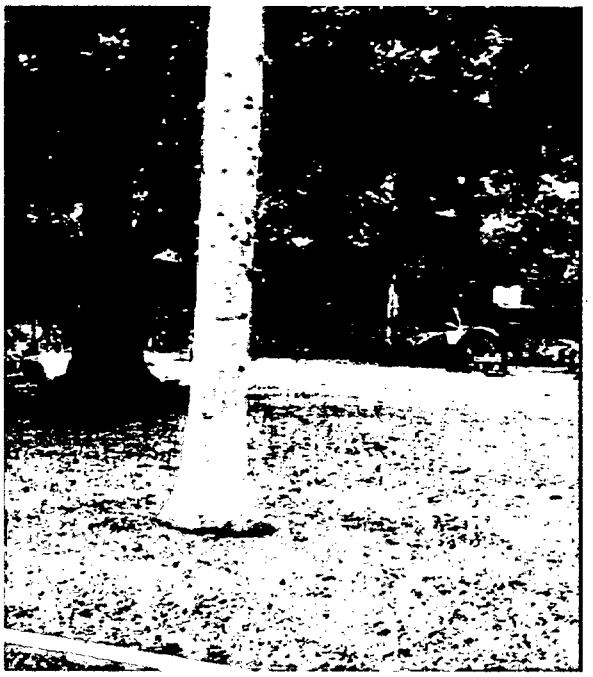

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**7**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 22	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedro rosado	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cedrela odorata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332697	-76,536449
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 456	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
23.40	0.75	8.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

188

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**8**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 23	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol del pan	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Artocarpus altilis	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,332764	-76,536406
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 458	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.40	0.25	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**9**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 24		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Gualanday		
	ESPECIE	Jacaranda caucana	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,332632	-76,536358
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.30	0.50	8.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

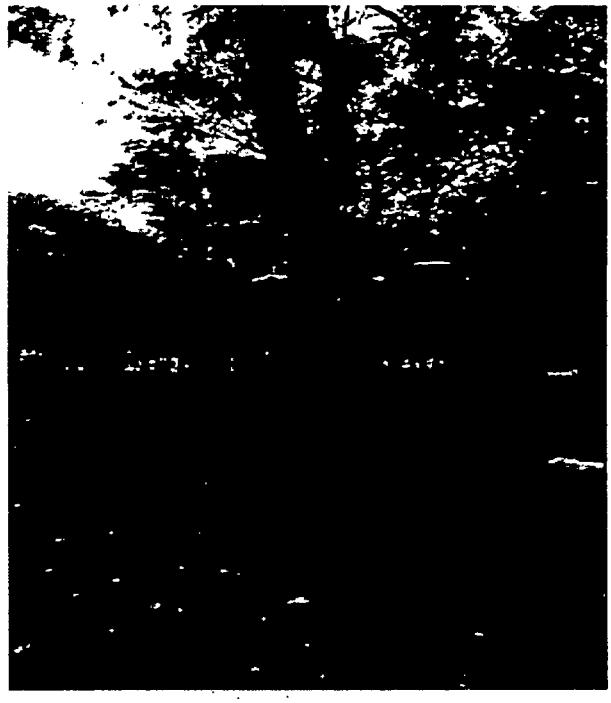

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**10**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 25	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Nogal cafetero	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cordia alliodora	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceas	3,33287	-76,536314
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.40	0.40	7.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

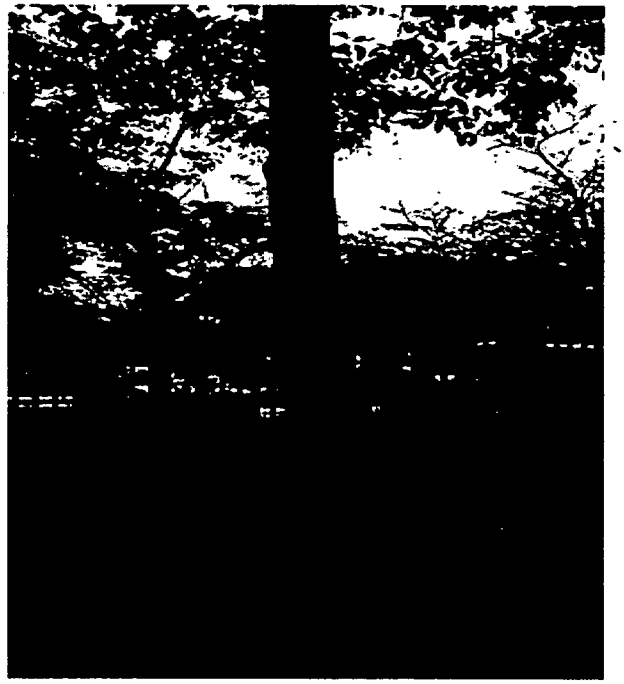

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**11**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 26	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Algarrobo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Hymenaea courbaril	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Caesalpiniaceae	3,332721	-76,536249
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.90	0.80	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

190

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**12**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 27	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mamey	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Mammea americana	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Calophyllaceae	3,332548	-76,53623
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.10	0.48	4.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**13**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 28	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cacao de monte	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Pachira aquatica	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bombacaceae	3,332584	-76,536242
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.40	0.48	7.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**14**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 29	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cacao de monte	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Pachira aquatica	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bombacaceae	3,332487	-76,536272
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.70	0.58	2.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**15**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 30		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	jagua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	genipa americana	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	rubiaceae	3,332437	-76,536343
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
21.20	1.25	8.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**sI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

196

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**16**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 31	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	sin identificar	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	-	3,332398	-76,536259
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.60	0.63	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**17**
DIRECCIÓN:	Cärrera 127 Con Calle 32	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	sin identificar	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	-	3,332542	-76,53627
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.70	0.75	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**18**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 33	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332343	-76,536326
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.90	0.70	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**19**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 34	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedro macho	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Huertea glandulosa	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332351	-76,536337
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.90	0.32	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

194

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**20**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 35	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Cedro macho**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Huertea glandulosa	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332403	-76,536329
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.70	0.55	5.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICÓ SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**21**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 36	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedro macho	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Huertea glandulosa	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332279	-76,536461
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.20	0.22	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**22**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 37	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	maruba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Simarouba amara	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Simaroubaceae	3,332219	-76,53618
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
21.70	1.20	9.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**23**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 38	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Chambimbe**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Sapindus saponaria	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,332696	-76,53667
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 124	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.00	0.58	9.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**24**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 39	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Swietenia macrophylla	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332663	-76,536685
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.40	0.92	10.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**25**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 40		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Swietenia macrophylla	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332525	-76,536683
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
24.10	1.30	7.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

197

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**26**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 41		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	Swietenia macrophylla	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332834	-76,536705
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.80	0.50	6.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**27**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 42	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caoba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Swietenia macrophylla	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332845	-76,536938
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.80	0.42	3.50

REGISTRO FOTOGRAFICO

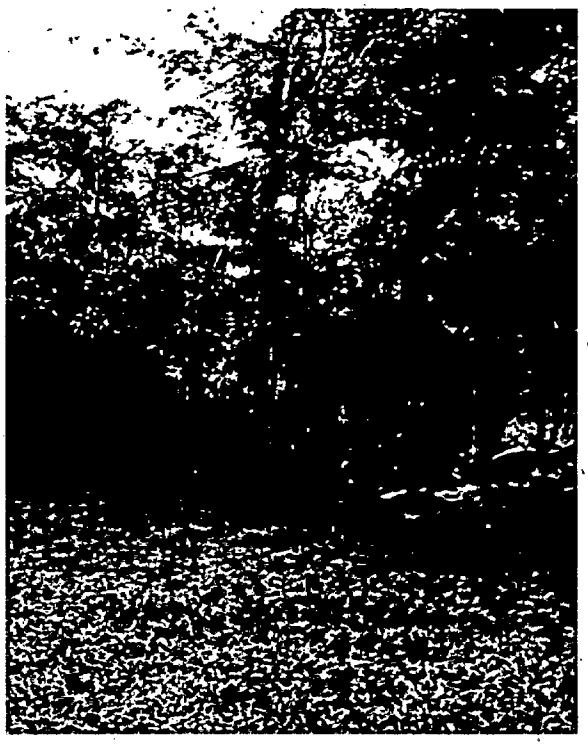

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauco	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**28**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 43	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Orejero	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332698	-76,536903
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 135	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
22.20	1.40	10.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

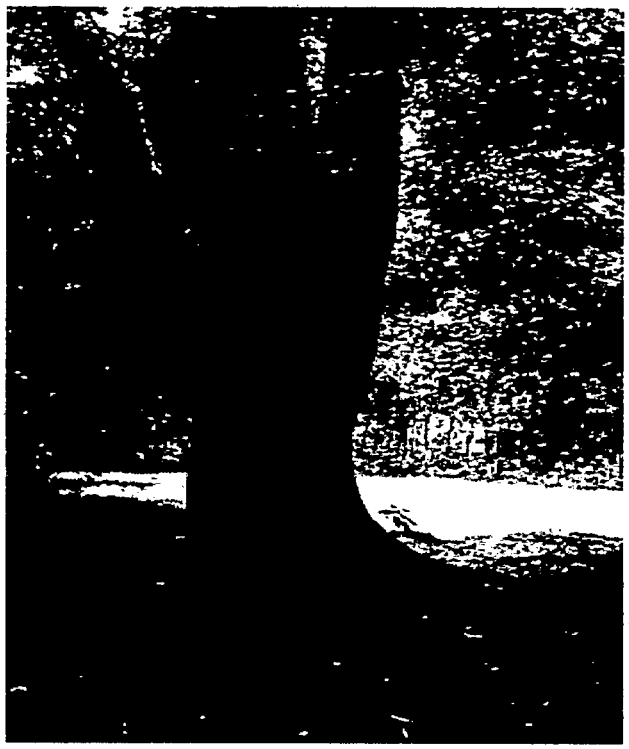

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			29
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 44	BARRIO	PANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mamoncillo		
	ESPECIE	Melicoccus bijugatus	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Sapindaceae	3,332627	-76,536907
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.60	0.32	5.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

199

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**30**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 45		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Orejero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332662	-76,5369
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 138	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.90	0.43	7.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**31**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 46		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cordia alliodora	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceas	3,332635	-76,536924
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.60	0.98	9.20

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

200

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**32**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 47	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,332575	-76,536996
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.40	0.12	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**33**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 48	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,332521	-76,536841
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 784	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.10	0.64	5.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**34**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 49	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Orejero	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332479	-76,536922
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 787	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.40	0.99	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**35**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 50	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Saman	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Albizia saman	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,332492	-76,537109
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.48	7.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

202

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**36**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 51		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Aguacatillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Persea caerulea	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,332458	-76,537126
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 790	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.8	0.72	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**37**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 52	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Meliaceae	3,332424	-76,537086
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.10	0.62	7.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

203

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**38**
DIRECCIÓN:	Carréra 127 Con Calle 53	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Saman	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Albizia saman	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,332522	-76,537187
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 875	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
17.40	0.95	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sí	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**39**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 54		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,332601	-76,537147
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 876	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.20	1.10	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**40**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 55		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	candelillo		
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332819	-76,537118
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.80	0.40	2.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**41**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 56	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Gualanday**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Jacaranda caucana	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,332551	-76,537334
	No. CENSO ARBOREO 2015	289 879		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.60	0.46	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

205

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**42**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 57		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Orejero	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,33272	-76,537232
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 903	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.50	1.15	9.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**43**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 58	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332754	-76,537326
	No. CENSO ARBOREO 2015	289 899		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.60	0.52	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**44**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 59		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Orejero		
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332687	-76,537374
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 882	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diámetro copa (M)
13.90	1.08	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**45**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 60	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Orejero	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Enterolobium cyclocarpum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,332547	-76,537433
	No. CENSO ARBOREO 2015	289 884		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.50	0.85	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**46**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 61	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Ceiba de agua		
	ESPECIE	Hura crepitans	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Euphorbiaceae	3,332503	-76,537409
	No. CENSO ARBOREO 2015		289 885	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.70	0.24	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**47**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 62	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	sin identificar	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	-	3,332718	-76,537564
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.20	0.22	5.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**48**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 63	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,332831	-76,537751
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
6.20	0.13	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**49**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 64	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Zapote	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Matisia cordata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,332553	-76,537718
	No. CENSO ARBOREO 2015		294 557	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.00	0.20	4.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**50**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 65	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Abejuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Colubrina arborescens	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceas	3,332652	-76,537964
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.33	6.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**51**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 66	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jigua		
	ESPECIE	Aiouea montana	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,332452	-76,537959
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.20	0.80	12.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

210

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**52**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 67	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,332323	-76,537827
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.00	0.35	6.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**53**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 68	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Mangifera indica	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,332307	-76,537839
	No. CENSO ARBOREO 2015	290 072		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.55	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**54**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 69	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,332278	-76,537902
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.00	0.42	6.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

)

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA.

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**55**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 70	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,33216	-76,537878
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.50	0.35	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

2.12

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**56**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 71	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Bala de cañón**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Couroupita guianensis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lecythidaceae	3,332294	-76,5381
	No. CENSO ARBOREO 2015		290 090	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.7	0.67	8.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**57**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 72		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	balso	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ochroma pyramidale	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,33203	-76,538035
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.70	0.18	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**58**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 73		**BARRIO**	PANCE	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Azuceno rojo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Plumeria rubra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Apocynaceae	3,332112	-76,537782
	No. CENSO ARBOREO 2015	290 109		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.90	0.43	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**59**

DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 74	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Aiouea montana	**LATITUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Lauraceae	3,332204	-76,537787
No. CENSO ARBOREO 2015	290 108		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.50	0.35	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**60**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 75	**BARRIO**	**PANCE I**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Mamoncillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Melicoccus bijugatus	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,332169	-76,537795
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 706	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.40	0.24	5.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**61**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 76	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mamoncillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Melicoccus bijugatus	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,332126	-76,537719
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.2	0.20	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

215

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**62**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 77	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	mango	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Mangifera indica	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Anacardiaceae	3,332129	-76,537783
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.70	0.18	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**63**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 78	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Acacia robinia		
	ESPECIE	Cenostigma pluviosum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,331917	-76,537791
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.80	1.10	13.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**64**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 79	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cenostigma pluviosum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,33175	-76,537669
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.20	0.31	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**65**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 80	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Acacia amarilla		
	ESPECIE	Caesalpinia peltophoroides	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,331664	-76,537658
	No. CENSO ARBOREO 2015	292 271		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.68	5.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

217

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**66**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 81	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331478	-76,537716
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.20	0.70	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**67**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 82	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cenostigma pluviosum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,331483	-76,537705
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.60	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

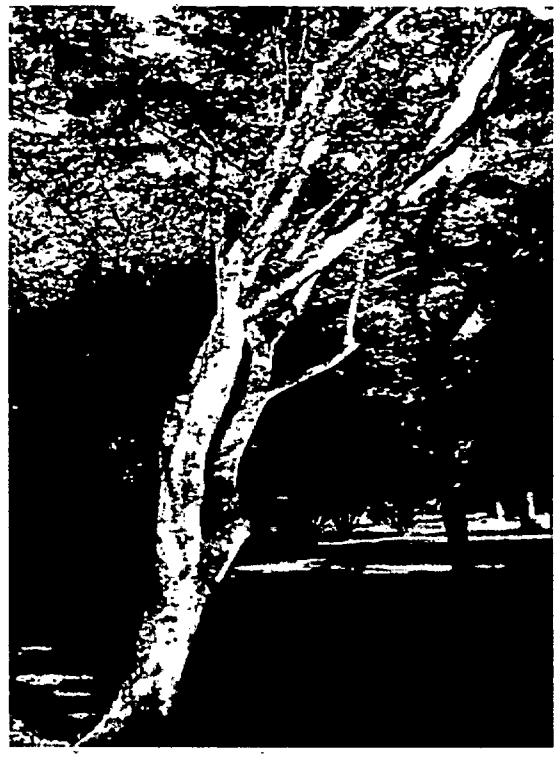

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

298

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**68**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 83	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331377	-76,537578
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.47	7.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**69**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 84	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma zancona**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,331321	-76,537337
	No. CENSO ARBOREO 2015	293 782		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
22.40	0.38	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**70**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 85	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma zancona**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,331292	-76,537308
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.20	0.39	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**sI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**71**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 86	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,33133	-76,537298
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
17.20	0.39	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**72**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 87	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,331284	-76,537348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.30	0.38	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**73**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 88		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma zancona**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,331279	-76,537351
	No. CENSO ARBOREO 2015		293 781	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.1	0.38	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

221

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**74**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 89	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma zancona	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Syagrus sancona	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,33123	-76,537346
	No. CENSO ARBOREO 2015		293 788	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
17.20	0.39	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**75**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 90		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Grosella de Jamaica	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Phyllanthus acuminatus	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Phyllanthaceae	3,331371	-76,537275
	No. CENSO ARBOREO 2015		293 802	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.40	0.52	6.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

222

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**76**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 91		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Acacia robinia		
	ESPECIE	Cenostigma pluviosum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,331336	-76,537134
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.30	0.48	6.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**77**
DIRECCIÓN:	/ Carrera 127 Con Calle 92	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cenostigma pluviosum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,331216	-76,536978
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.10	0.20	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**78**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 93		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Abejuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Colubrina arborescens	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rhamnaceae	3,331237	-76,536877
	No. CENSO ARBOREO 2015		292 178	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.50	0.55	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**79**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 94	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331443	-76,536902
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
20.20	0.65	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**80**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 95		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331442	-76,536982
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.20	0.20	5.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**81**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 96	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Madroño**	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	3,331375	-76,536932
	FAMILIA	Clusiaceae		
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.50	0.24	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**82**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 97	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Rutaceae	3,331349	-76,537165
No. CENSO ARBOREO 2015	294 622		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.80	0.20	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evicencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**83**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 98		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331431	-76,53724
	No. CENSO ARBOREO 2015		294 629	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.40	0.48	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**84**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 99	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331504	-76,537237
	No. CENSO ARBOREO 2015		294 639	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.00	0.55	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**85**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 100	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Pategallina	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Didymopanax morototoni	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	0	3,331548	-76,537245
	No. CENSO ARBOREO 2015	296 078		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.40	0.42	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

227

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**86**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 101		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331526	-76,537281
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.80	0.22	5.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**87**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 102	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331421	-76,537293
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.80	0.47	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CB

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**88**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 103	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331486	-76,537455
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.54	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**89**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 104	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331551	-76,537517
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.80	0.60	6.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

214

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**90**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 105	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331651	-76,537633
	No. CENSO ARBOREO 2015		294 012	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.48	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**91**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 106	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	candelillo		
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331864	-76,536353
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diamétro copa (M)
14.90	0.32	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

230

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**92**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 107		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	maruba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Simarouba amara	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Simaroubaceae	3,332008	-76,536319
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.40	0.65	5.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**93**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 108	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Clusiaceae	3,332016	-76,536192
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.80	0.65	5.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

231

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**94**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 109		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331955	-76,536122
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.40	0.30	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**95**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 110		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331743	-76,536255
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.00	0.52	8.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

232

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**96**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 111	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracoli	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Anacardium excelsum	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,331735	-76,5363
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 792	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.80	0.24	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**97**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 112	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331741	-76,536341
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.90	0.45	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**98**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 113	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331661	-76,536285
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.10	0.72	17.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

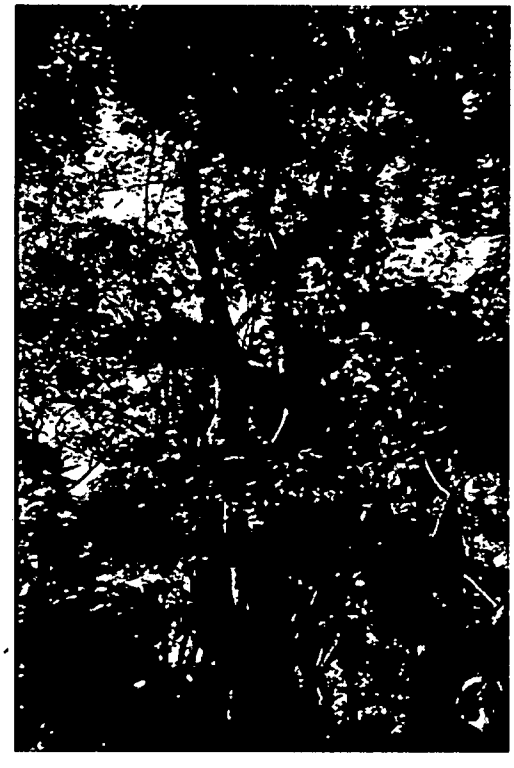

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**99**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 114		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331582	-76,53632
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.50	0.47	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**100**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 115	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331564	-76,536402
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 817	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.40	0.70	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**101**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 116	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331472	-76,536203
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.34	6.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**102**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 117		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331415	-76,536152
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	0.40	6.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**103**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 118	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedro macho	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331528	-76,536245
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 888	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.10	0.39	5.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**104**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 119	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331509	-76,536537
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.80	0.18	2.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**105**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 120	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331441	-76,536618
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.40	0.30	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

37

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**106**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 121		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331492	-76,536665
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.50	0.10	3.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**107**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 122		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331409	-76,536752
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	0.27	4.80

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

238

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**108**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 123	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331331	-76,536894
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.20	0.31	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**109**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 124	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331343	-76,53677
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.50	0.12	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

239

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**110**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 125	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331303	-76,536676
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.20	0.18	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**111**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 126		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331302	-76,536649
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.00	0.47	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**112**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 127	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331441	-76,536604
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.50	0.20	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**113**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 128	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331391	-76,536546
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.42	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

241

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**114**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 129	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331374	-76,536555
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.40	0.40	5.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**115**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 130	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331402	-76,536578
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.50	0.50	6.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**116**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 131	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331383	-76,536539
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.00	0.41	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**117**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 132	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331436	-76,536471
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.60	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**118**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 133	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331376	-76,536413
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.50	0.20	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sí	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**119**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 134	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331306	-76,536579
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.90	0.50	7.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**si**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

244

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**120**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 135		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331213	-76,536597
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.45	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**121**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 136	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331251	-76,536434
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.55	8.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

245

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**122**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 137	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331214	-76,536377
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.20	0.50	3.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO.	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**123**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 138		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331246	-76,536268
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.30	0.45	7.50

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**124**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 139	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedro macho	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331235	-76,536225
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 864	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.56	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**125**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 140	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331191	-76,536271
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.52	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

247

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**126**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 141	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331114	-76,536545
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.20	0.15	4.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**127**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 142	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331195	-76,536681
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.9	0.67	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**128**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 143		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331139	-76,536773
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.74	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	129
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 144	BARRIO	PANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Madroño		
ESPECIE	Garciniama crophylla.	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Clusiaceae	3,331156	-76,536885
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.42	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

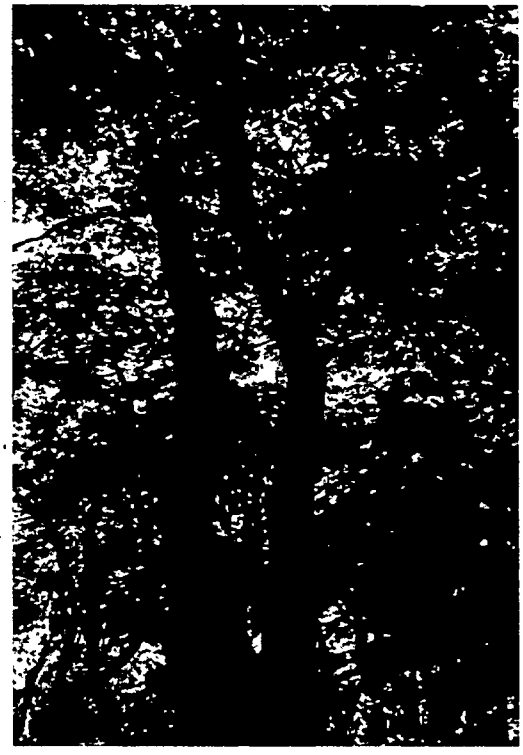

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

249

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**130**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 145	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Madroño	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331149	-76,53708
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.60	0.84	8.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**131**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 146	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING: ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mamoncillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Melicoccus bijugatus	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,331195	-76,537215
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.60	0.60	3:00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauco	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**132**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 147		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mamoncillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Melicoccus bijugatus	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,33126	-76,537181
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.20	0.80	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**133**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 148	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	candelillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Senna spectabilis	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,331318	-76,53706
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.26	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

251

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**134**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 149	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331332	-76,536947
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.45	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**135**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 150	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Carambolo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Averrhoa carambola	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Oxalidaceae	3,331413	-76,536928
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.80	0.50	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**136**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 151	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,33148	-76,536867
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.20	0.11	3.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**137**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 152	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,33144	-76,536899
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.20	0.08	2.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**138**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 153	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cecropia peltata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,331478	-76,537
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.40	0.32	4.50

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**139**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 154	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Madroño.		
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,331536	-76,537117
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.00	0.34	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

254

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**140**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 155	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cecropia peltata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,331607	-76,53719
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.50	0.40	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**141**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 156	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cecropia peltata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,331619	-76,537149
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
13.20	0.47	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**142**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 157	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Cecropia peltata	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,331708	-76,537339
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.10	0.10	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sí	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**143**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 158	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331683	-76,537461
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.40	4.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**144**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 159		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Guarea guidonia	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331753	-76,537507
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.6	0.35	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**145**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 160	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATITUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Malvaceae	3,331671	-76,537572
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.50	0.40	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

257

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**146**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 161		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ceiba	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,331729	-76,537598
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.20	0.42	4.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**147**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 162	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC (	Cedro macho		
	ESPECIE	Guarea sp	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,331798	-76,537609
	No. CENSO ARBOREO 2015		294 002	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.90	0.30	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

258

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**148**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 163	**BARRIO**	PANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		1


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Zanthoxylum rhoifolium	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,331965	-76,537696
	No. CENSO ARBOREO 2015		291 714	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.10	0.32	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

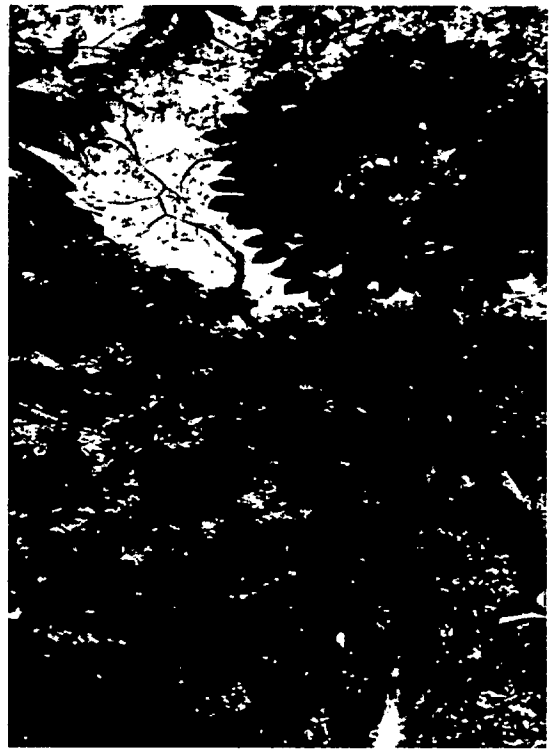

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	sI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**149**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 164		**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	LAS GARZAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Madroño**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	Garciniama crophylla.	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Clusiaceae	3,332146	-76,537684
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
12.80	0.32	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	si	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

259

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	3/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**150**
DIRECCIÓN:	Carrera 127 Con Calle 165	**BARRIO**	**PANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	LAS GARZAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Ceiba		
	ESPECIE	Ceiba pentandra	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,332328	-76,537623
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.50	1.20	12.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**1**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,21879	-76,537164
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.5	0.38	10.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

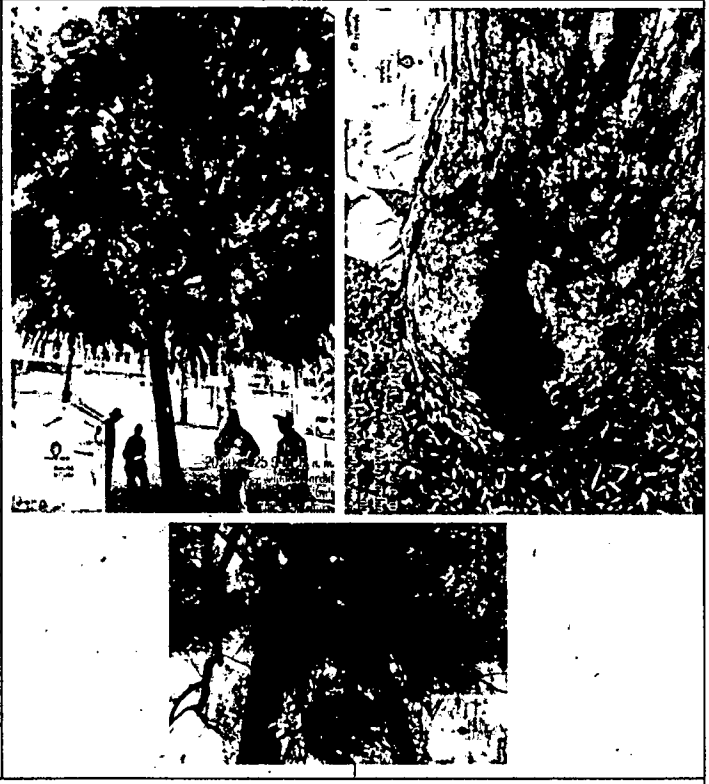

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

260

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**2**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,36453	-76,537223
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total .(M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.8	O.34	6.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**3**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364477	-76,537239
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.20	0.40	10.15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

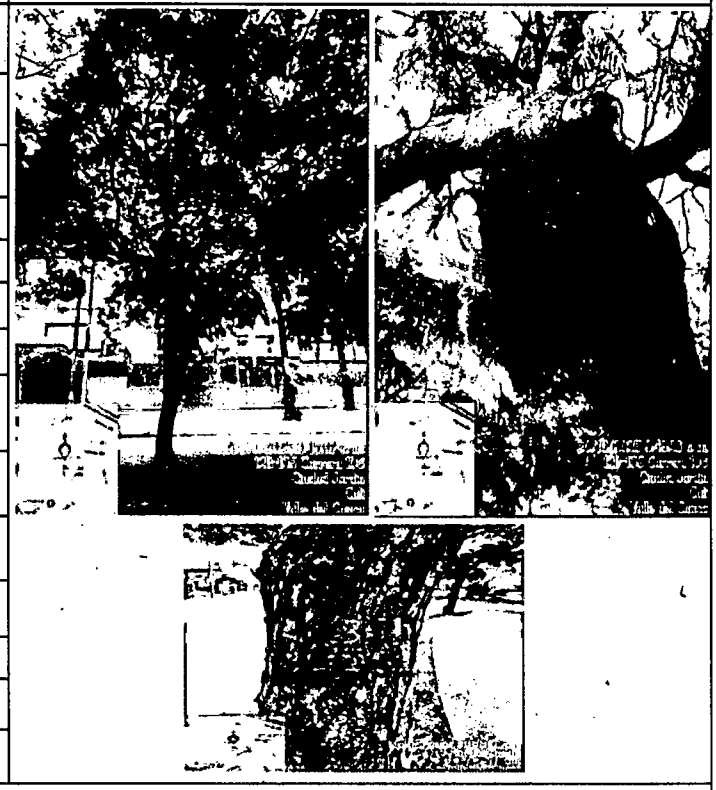

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

269

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**4**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364453	-76,537181
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.9	0.11	4.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**5**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364432	-76,537182
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.5	0.77	12.45

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**6**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364351	-76,537216
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.5	0.96	13.55

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**7**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CEIBA DE AGUA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Hura crepitans*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,364327	-76,537129
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.20	0.68	23.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

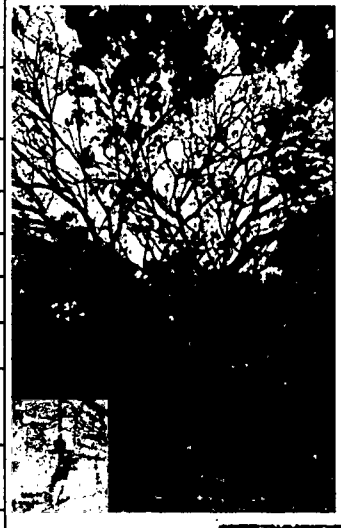





OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**8**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364396	-76,537071
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.30	0.15	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauco	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**9**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**SAMAN**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	FABACEAE	3,364396	-76,536964
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.30	0.59	19.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**10**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CARACOLI**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,364523	-76,53697
	No. CENSO ARBOREO 2015	4969		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.6	0.36	10.55

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**11**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364612	-76,536906
	No. CENSO ARBOREO 2015	4968		
	. No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.80	0.13	4.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

265

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**12**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**SAMAN**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364579	-76,537052
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.40	0.99	26.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**13**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ALGARROBO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ceratonia siliqua*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364353	-76,536898
	No. CENSO ARBOREO 2015		4604	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.51	19.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

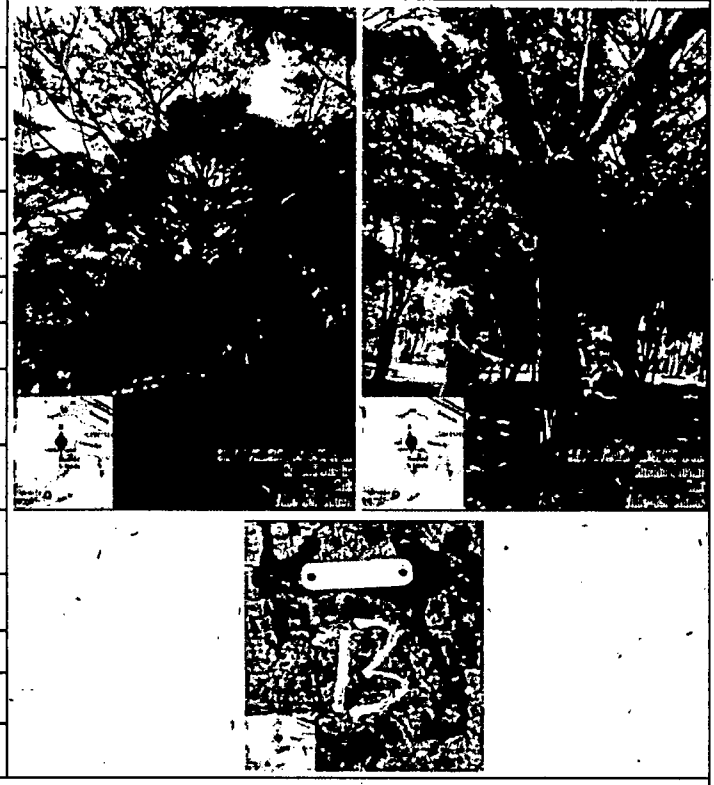

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**14**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**ACACIA ROBINIA**		
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364295	-76,536919
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.70	0.54	14.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**15**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**TULIPAN AFRICANO**		
	ESPECIE	*Spathodea campanulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364432	-76,536852
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.30	0.21	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

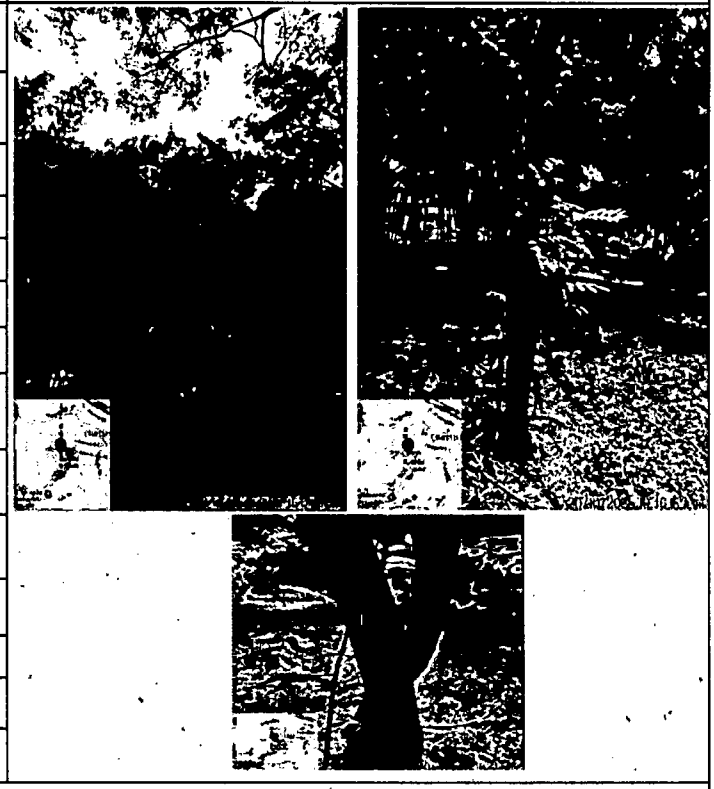

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

267

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauco	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**16**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**BALSO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ochroma pyramidale*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,364264	-76,536818
	No. CENSO ARBOREO 2015	4603		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.5	0.73	22.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

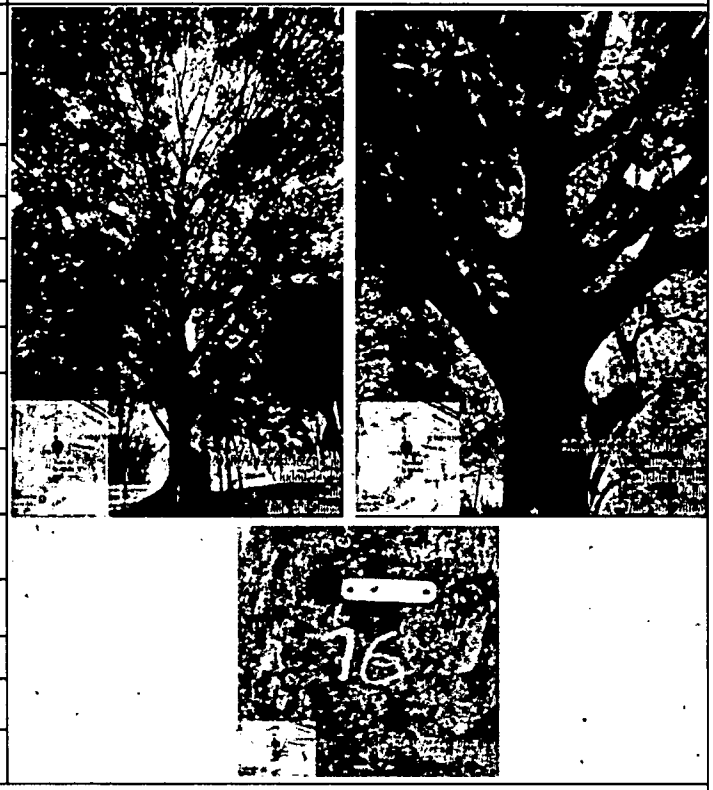

OBSERVACIONES

FISURA SUPERFICIAL EN FUSTE

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**17**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CUCHARO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Myrsine guianensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	PRIMULACEAE	3,364212	-76,53695
	No. CENSO ARBOREO 2015		4991	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.4	0.11	5.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

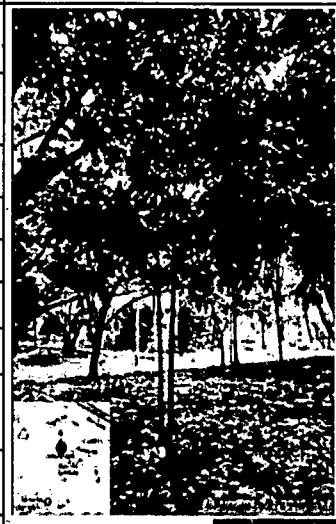





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

268

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**18**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CAOBO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MELIACEAE	3,364203	-76,536977
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15	0.84	16.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**19**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**SAMAN**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	FABACEAE	3,364121	-76,536936
No. CENSO ARBOREO 2015	4992		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.7	0.81	31.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

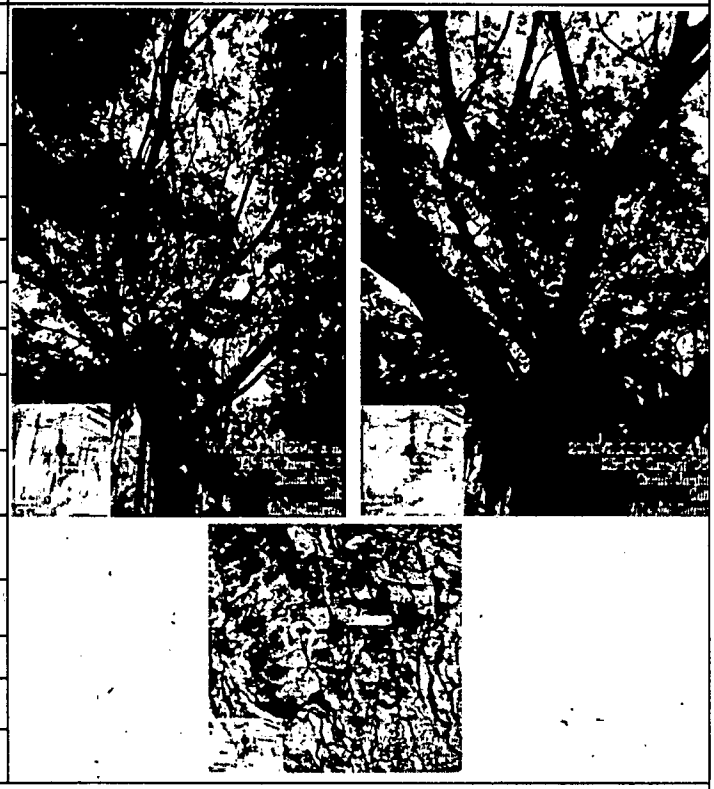

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

269

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**20**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MANZANA DE PLAYA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Crateva tapia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	CAPARACEAE	3,36408	-76,537061
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.40	0.44	10.47

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**21**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUALANDAY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364001	-76,536923
	No. CENSO ARBOREO 2015	4988		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.90	0.75	13.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

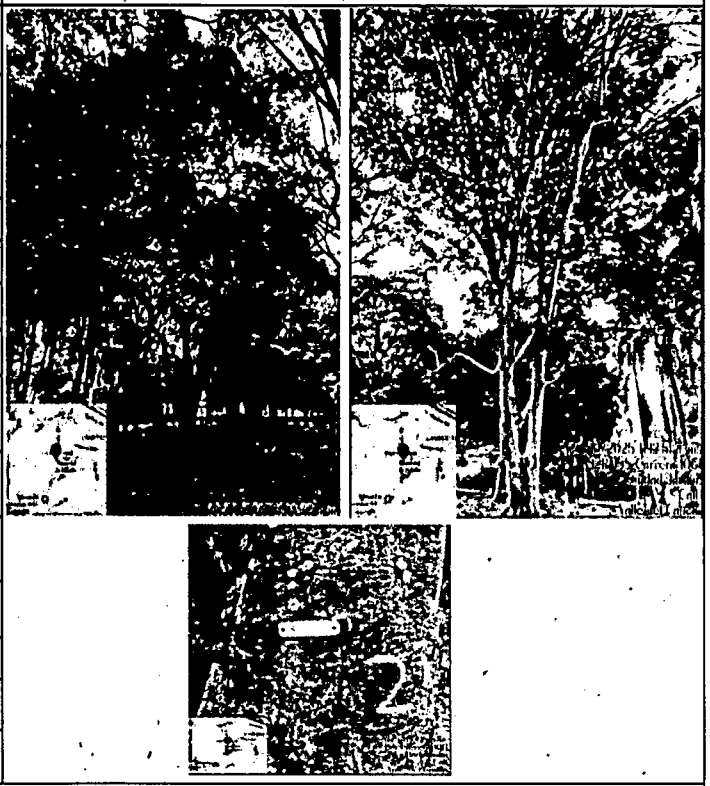

OBSERVACIONES

CICATRIZAR HUECO

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

270

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**22**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**BALSO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ochroma pyramidale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,36405	-76,536838
	No. CENSO ARBOREO 2015	4989		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.60	0.94	24.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**23**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**CAOBO**		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MELIACEAE	3,364065	-76,537102
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17.10	0.86	11.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

271

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**24**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364141	-76,537143
	No. CENSO ARBOREO 2015		4995	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.35	10.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

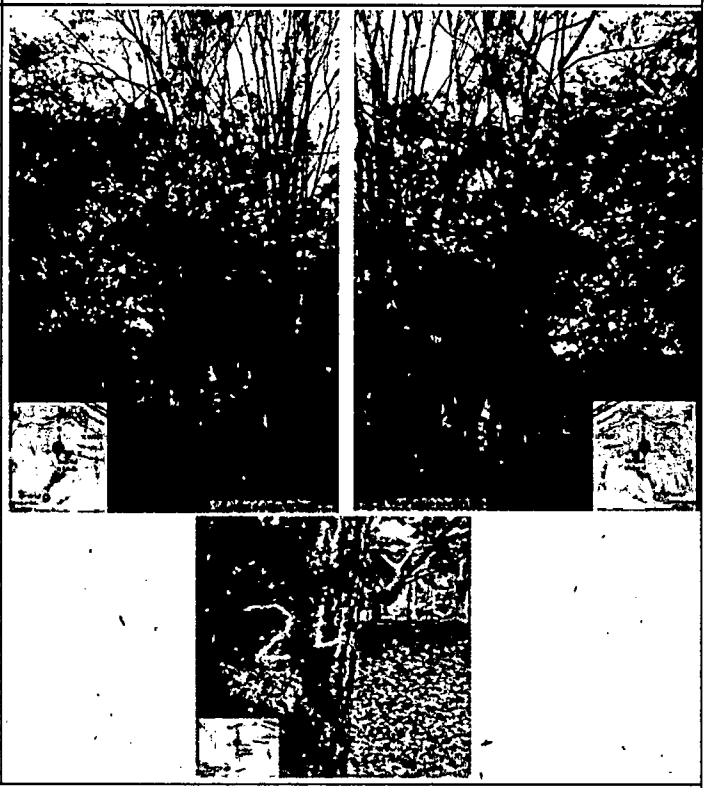

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**25**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MARAÑON**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium occidentale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,364217	-76,53713
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.28	9.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARÍO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

272

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**26**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**ACACIA ROBINIA**		
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364201	-76,53721
	No. CENSO ARBOREO 2015		4976	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.90	0.51	10.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**27**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA NEGRA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Acacia meganoxylon*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364026	-76,537083
	No. CENSO ARBOREO 2015		4982	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.70	0.64	14.20

REGISTRO FOTOGRAFICO

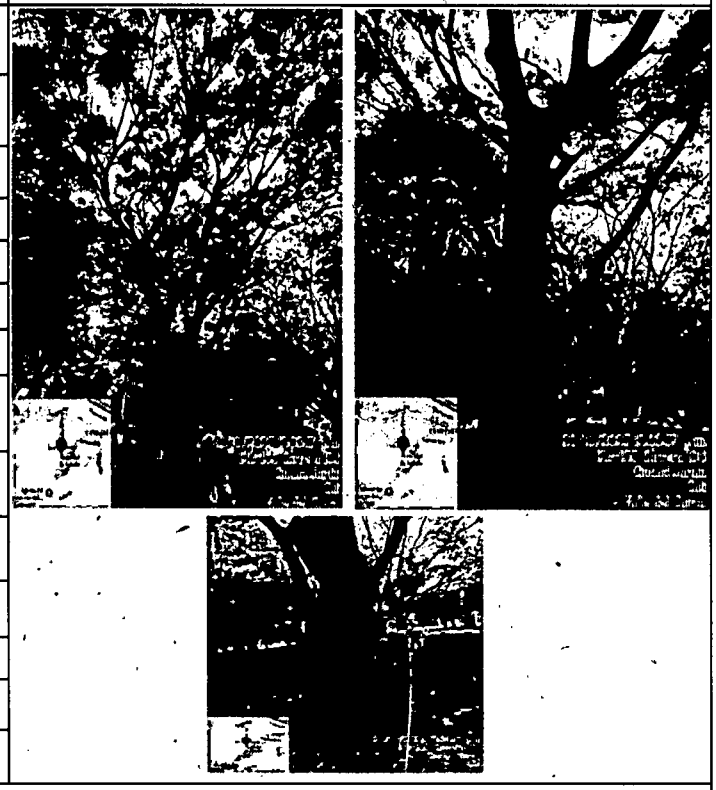

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**28**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CHIMINANGO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pithecellobium dulce*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363993	-76,537154
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.90	0.58	15.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular	X	
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales	X	
Defoliación		
Plagas	X	
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación	X	

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**29**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROJA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Delonix regia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364148	-76,537065
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.70	0.51	13.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**30**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**POMORROSO**		
	ESPECIE	*Syzygium jambos*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,364147	-76,537046
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.90	0.16	8.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**31**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CEIBA DE AGUA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Hura crepitans*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,363855	-76,537075
	No. CENSO ARBOREO 2015		4798	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.40	0.66	8.15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**32**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CAOBO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MELIACEAE	3,363841	-76,537062
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.20	0.79	15.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**33**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363959	-76,536952
	No. CENSO ARBOREO 2015	49103		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.30	0.29	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

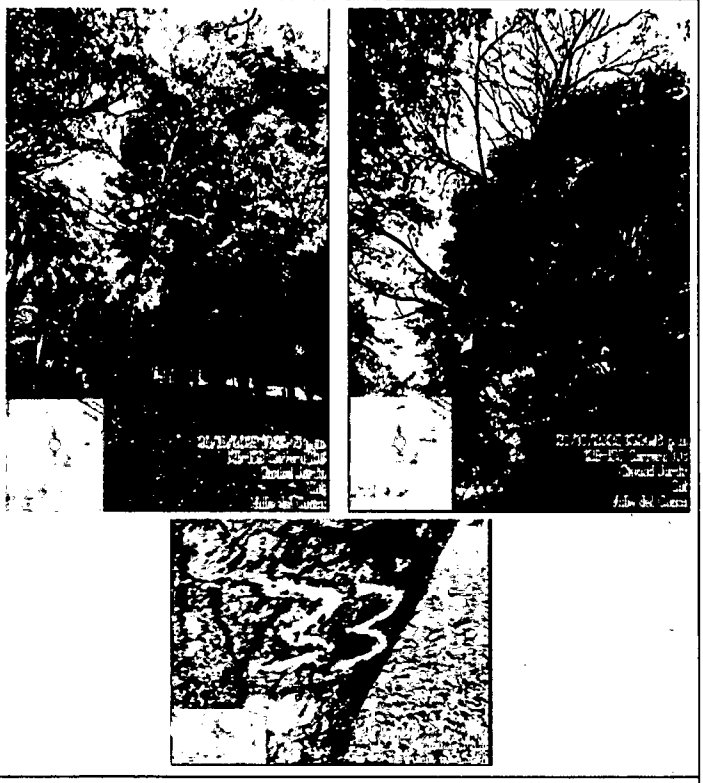

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**34**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MANZANA DE PLAYA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Crateva tapia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	CAPARACEAE	3,363924	-76,537047
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.60	0.20	8.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

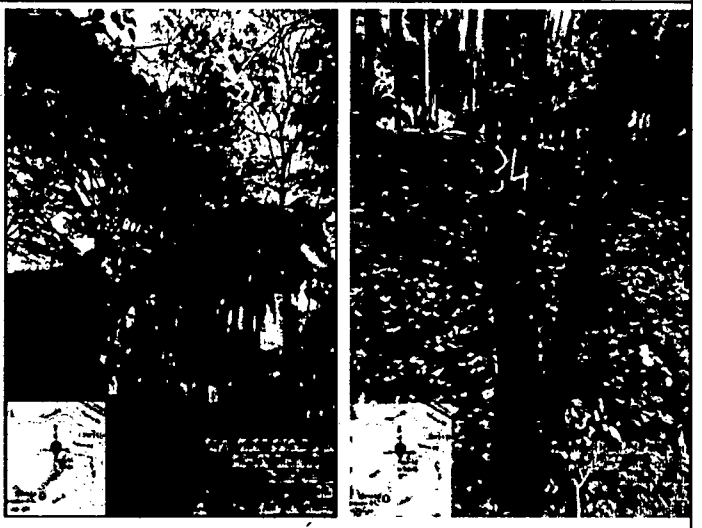

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**35**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**MARAÑON**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Anacardium occidentale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,36396	-76,536968
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.20	11.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

277

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**36**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MAMONCILLO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Melicoccus bijugatus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	SAPINDACEAE	3,363755	-76,536948
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.40	0.68	14.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**37**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363828	-76,53689
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.60	0.10	4.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

276

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**38**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**SAMAN**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	FABACEAE	3,364358	-76,536727
No. CENSO ARBOREO 2015	4910		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.10	1.18	28.30

REGISTRO FOTOGRAFICO

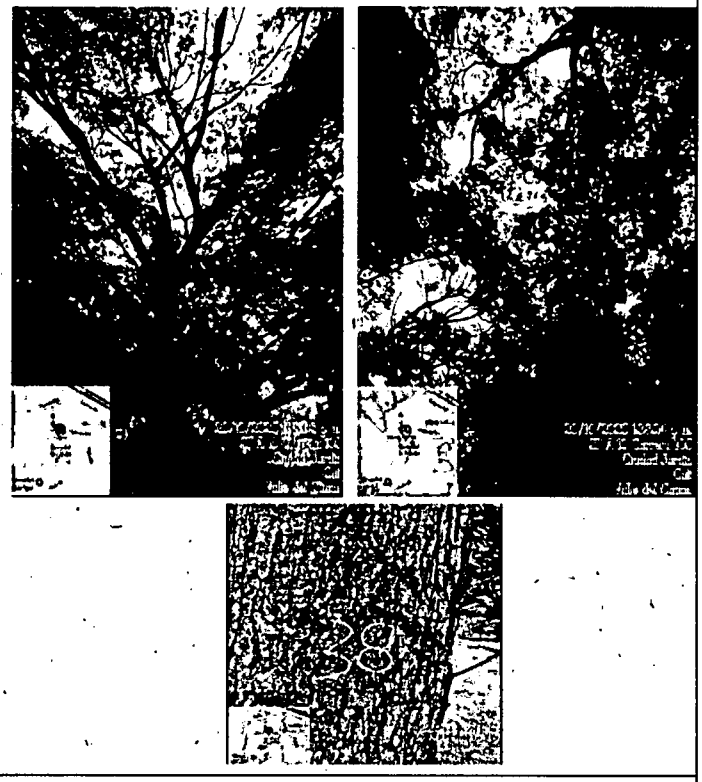

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**39**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACEITE MARIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Calophyllum brasiliense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	CALLOPHYÑÑACEAE	3,364209	-76,536793
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.50	0.30	11.0

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**40**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,364109	-76,536774
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.10	0.39	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**41**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,364147	-76,536694
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19.50	0.30	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

280

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**42**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**SAMAN**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364319	-76,536622
	No. CENSO ARBOREO 2015	4618		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.96	28.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**43**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363769	-76,537225
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No. CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.60	0.54	12.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





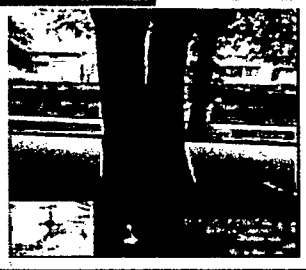

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

284

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**44**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363701	-76,537238
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.36	11.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**45**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROJA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Delonix regia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363658	-76,537121
	No. CENSO ARBOREO 2015		4777	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
20.2	0.89	14.45

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



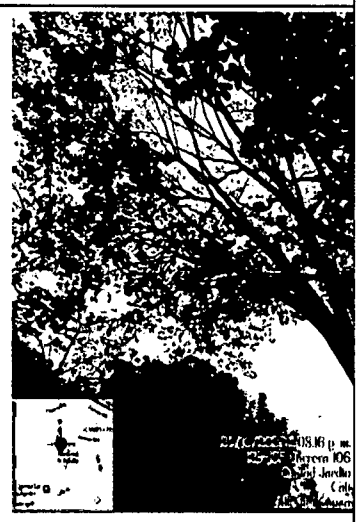



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

282

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**46**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROJA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Delonix regia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363432	-76,537078
	No. CENSO ARBOREO 2015	4763		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.40	0.69	11.35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

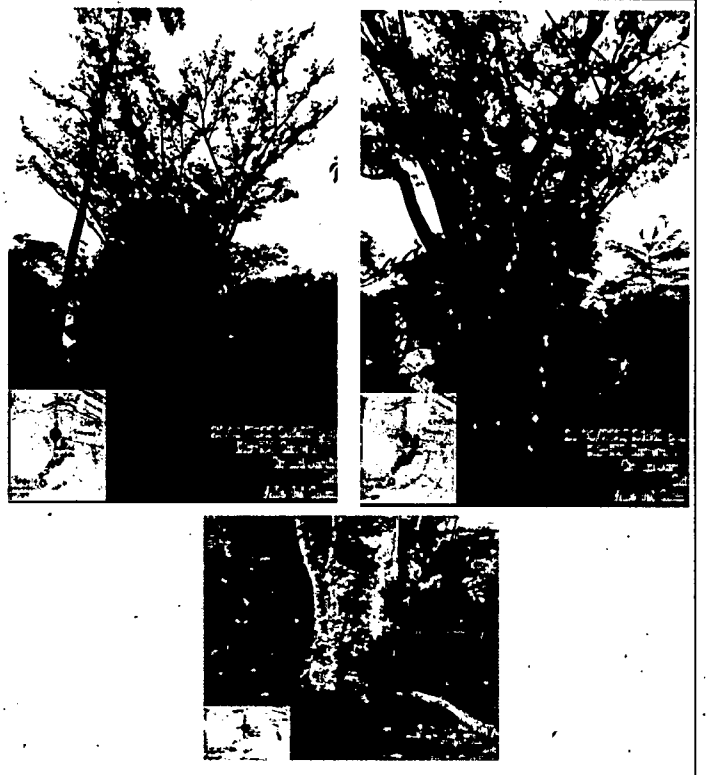

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**47**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363493	-76,536962
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.40	0.25	6.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

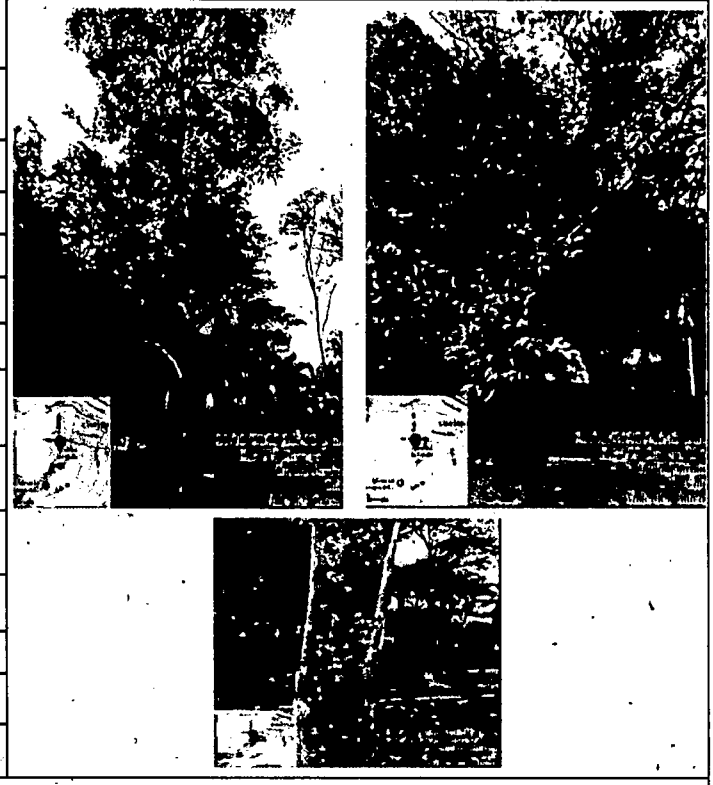

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

183

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**48**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363375	-76,536925
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.36	10.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**49**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363394	-76,536862
	No. CENSO ARBOREO 2015		5285	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.1	0.34	8.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

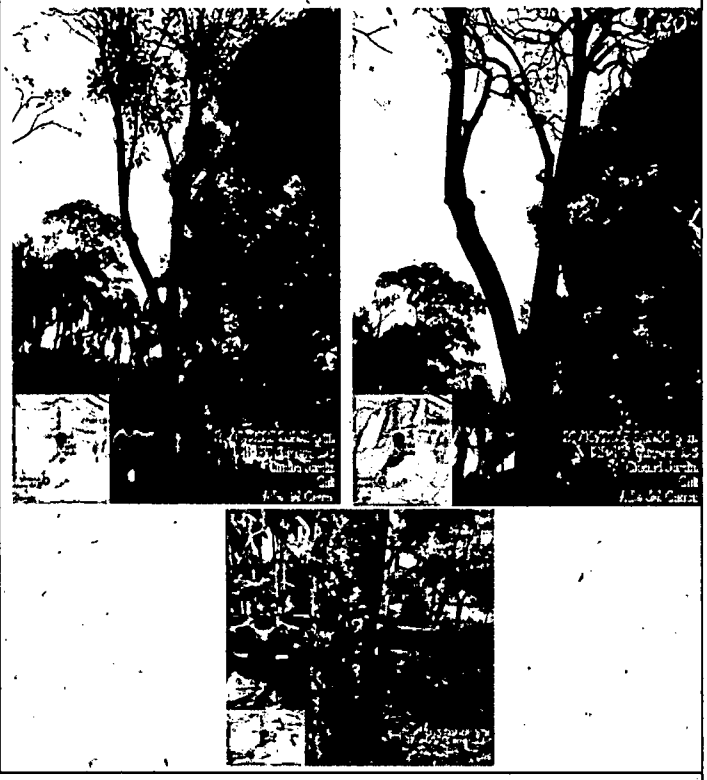

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

254

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO -** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**50**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebula rosea*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363434	-76,536868
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.15	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**51**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACIÓN**	
	NC	**GUAYACAN ROSADO**		
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363404	-76,537018

No. CENSO ARBOREO 2015	4765
No CENSO ARBOREO 2023	0

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	0.19	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

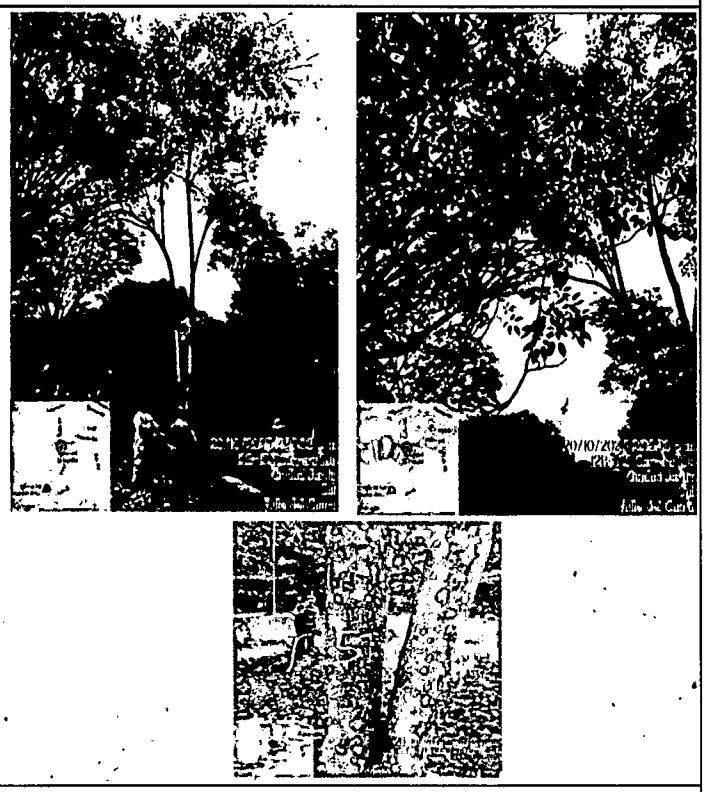

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

285

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**52**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363467	-76,536876
	No. CENSO ARBOREO 2015		5287	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.40	0.11	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

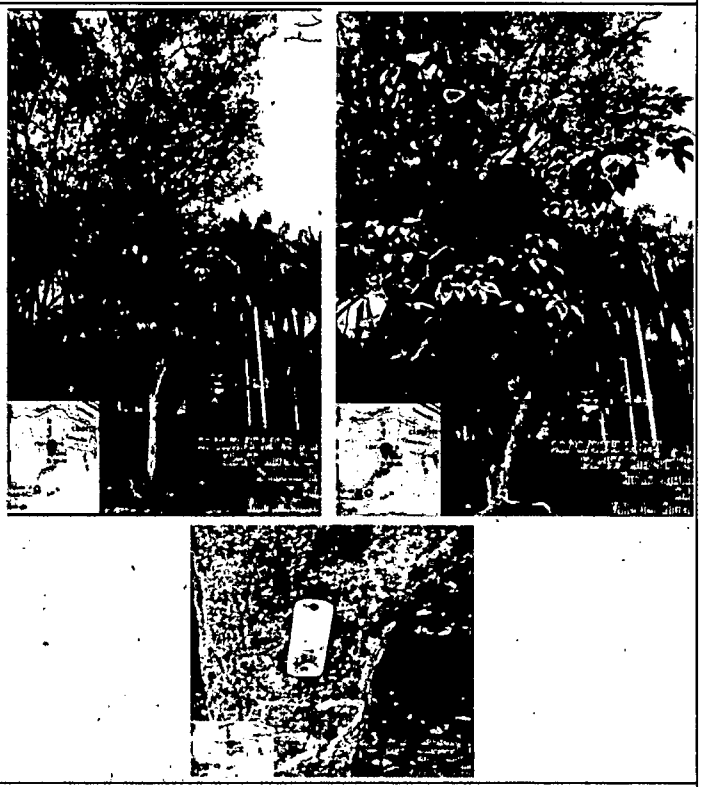

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**53**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363526	-76,536904
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.00	0.14	4.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**54**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363574	-76,536895
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.50	0.11	6.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**55**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363693	-76,536902
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.18	3.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO





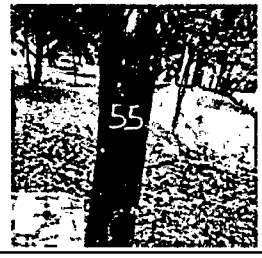

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

287

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**56**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	GUAYABO	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363374	-76,536647
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.10	5.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

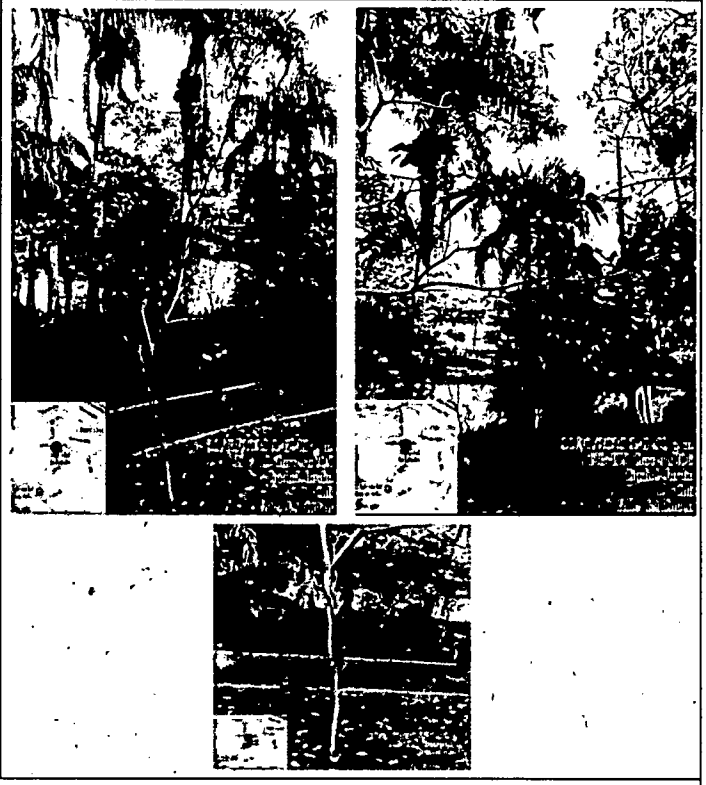

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**57**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYABO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,36334	-76,536551
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.60	0.10	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

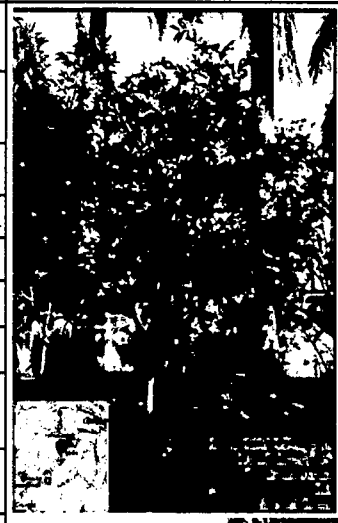





OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

288

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**58**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363324	-76,536577
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.70	0.10	3.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**59**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CASCO DE BUEY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363358	-76,536545
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.80	0.10	3.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	CICATRIZACION	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

126

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**60**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYABO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363368	-76,536512
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.10	0.12	5.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**61**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYABO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,36304	-76,536641
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.20	0.19	5.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

290

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**62**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CIRUELA DULCE**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Spondias dulcis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,363	-76,536652
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.70	0.07	1.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR HUECO

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**63**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYABO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,362969	-76,536658
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.90	0.19	6.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**64**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**NEEM**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Azadirachta indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	MELIACEAE	3,363013	-76,536757
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.50	0.13	3.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

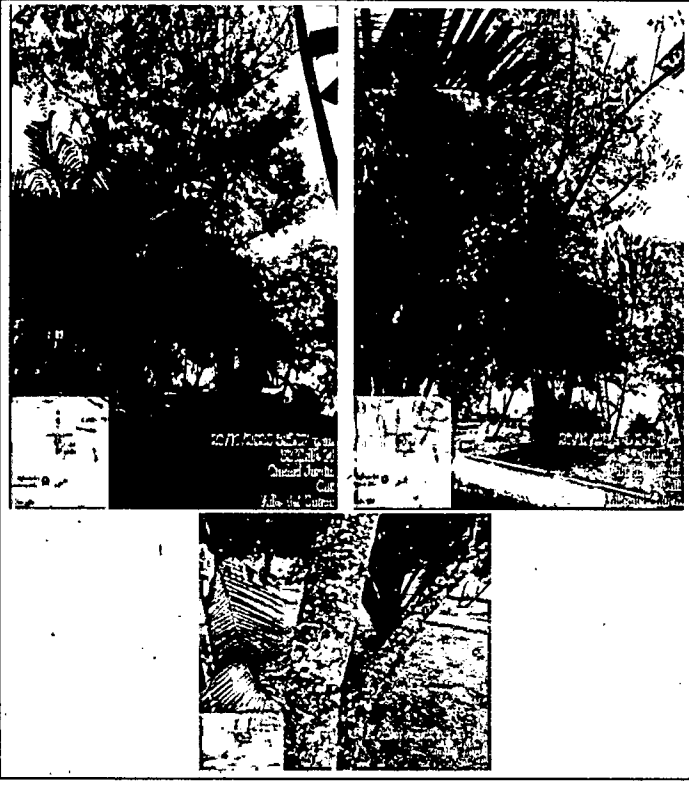

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**65**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**CASTAÑO**		
	ESPECIE	*Pachira speciosa*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,362909	-76,536794
	No. CENSO ARBOREO 2015		4725	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.32	11.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

292

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**66**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**BOHIO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363111	-76,536798
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.60	0.15	9.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

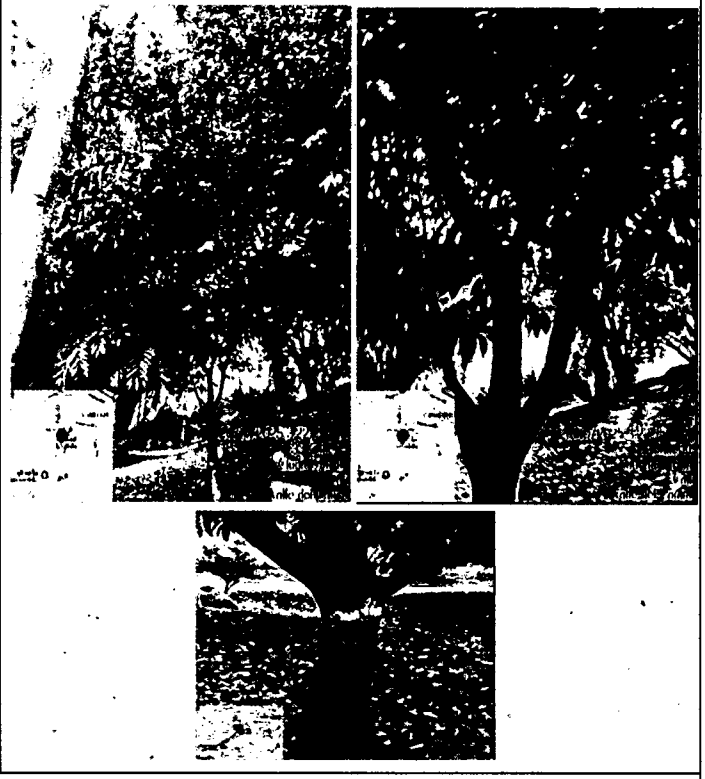

OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**67**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**LAUREL**		
	ESPECIE	*Laurus nobilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	LAURACEAE	3,363149	-76,536811
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.50	0.22	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



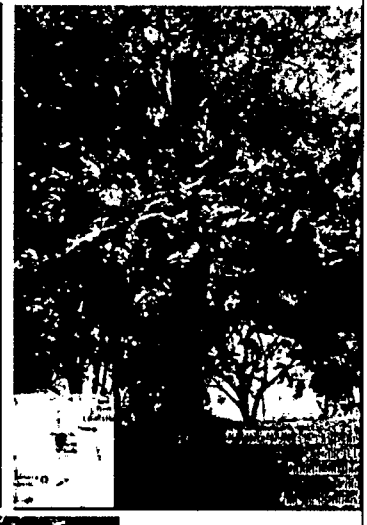



OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

293

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**68**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**AMARGO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Simarauba amara*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	SIMAROUBACEAE	3,36312	-76,536794
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.30	0.22	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRÁFICO

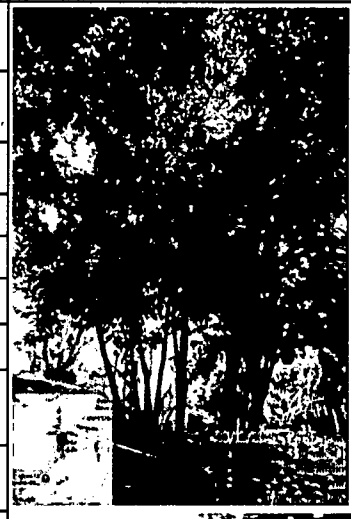





OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**69**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CASCO DE BUEY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363522	-76,536551
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.10	4.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

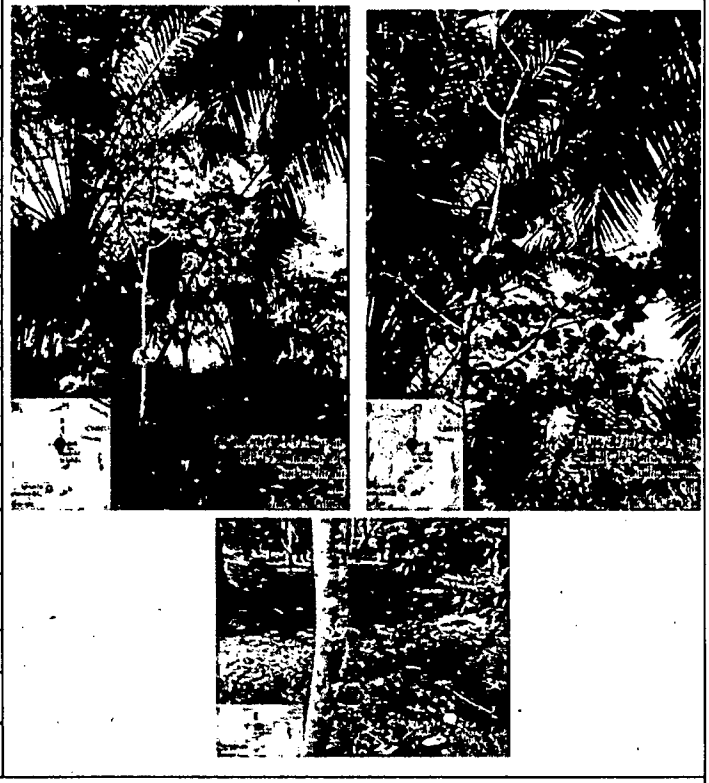

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

294

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**70**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**CIRUELA DULCE**		
	ESPECIE	*Spondias dulcis*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,363441	-76,536624
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.50	0.08	2.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

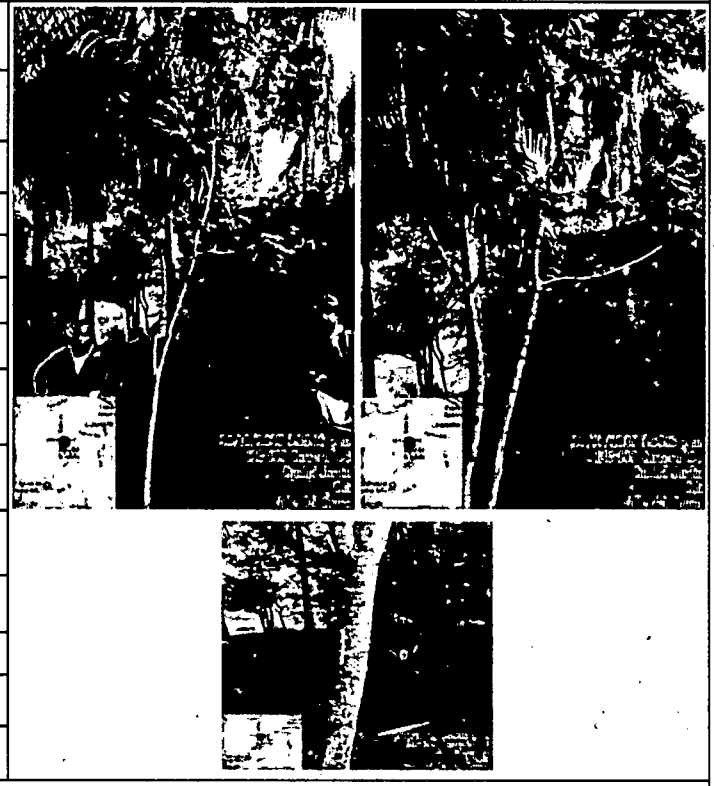

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**71**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363637	-76,536594
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.60	0.11	4.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**72**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	MYRTACEAE	3,363718	-76,536486
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.40	0.10	2.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**73**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MAMONCILLO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Melicoccus bijugatus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	SAPINDACEAE	3,363722	-76,536528
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.40	0.10	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

296

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**74**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CHAMBIMBE**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Sapindus saponaria*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	SAPINDACEAE	3,363748	-76,536619
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.12	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

HORMIGUERO EN COPA ARBOL

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**75**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYABO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,36384	-76,536519
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.70	0.10	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

297

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**76**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**BALSO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ochroma pyramidale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MALVACEAE	3,363807	-76,536522
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura tota. (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.30	0.20	9.40

ESTADÓ FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectacion		

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**77**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CASCO DE BUEY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363753	-76,536612
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.00	0.10	4.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

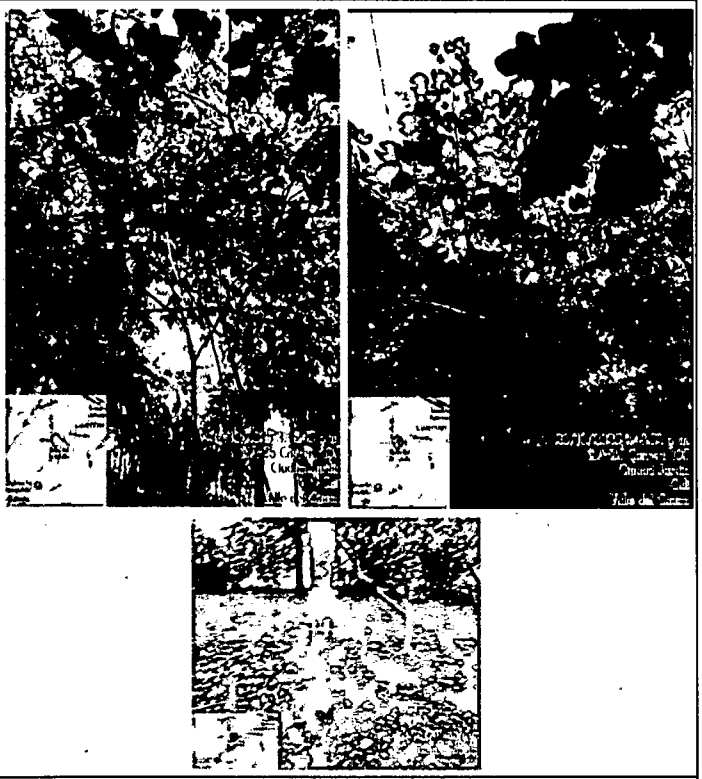

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**78**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**PERA DE MALACA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syzygium malaccense*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,363823	-76,536534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.10	0.10	3.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

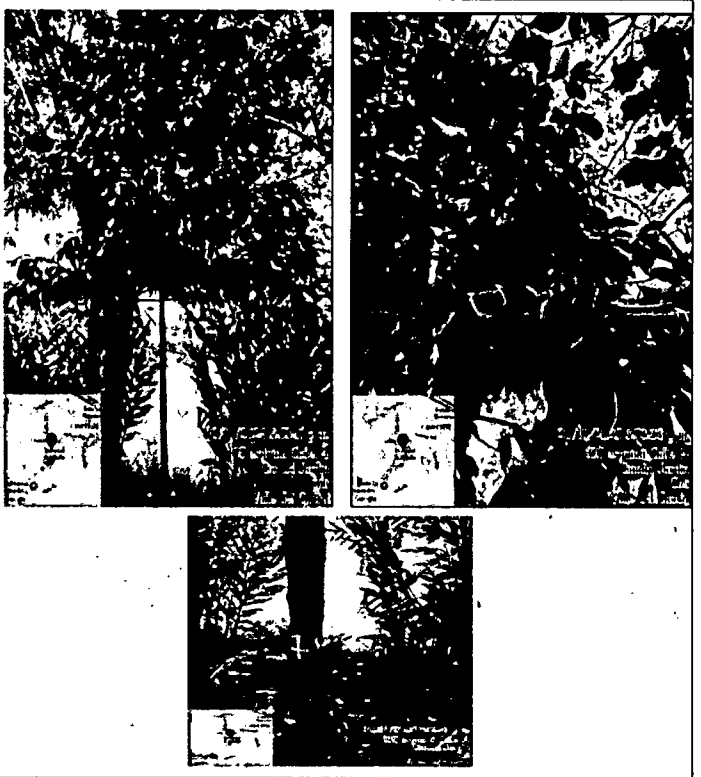

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**79**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**ACACIA ROBINIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363855	-76,536483
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.50	0.22	9.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

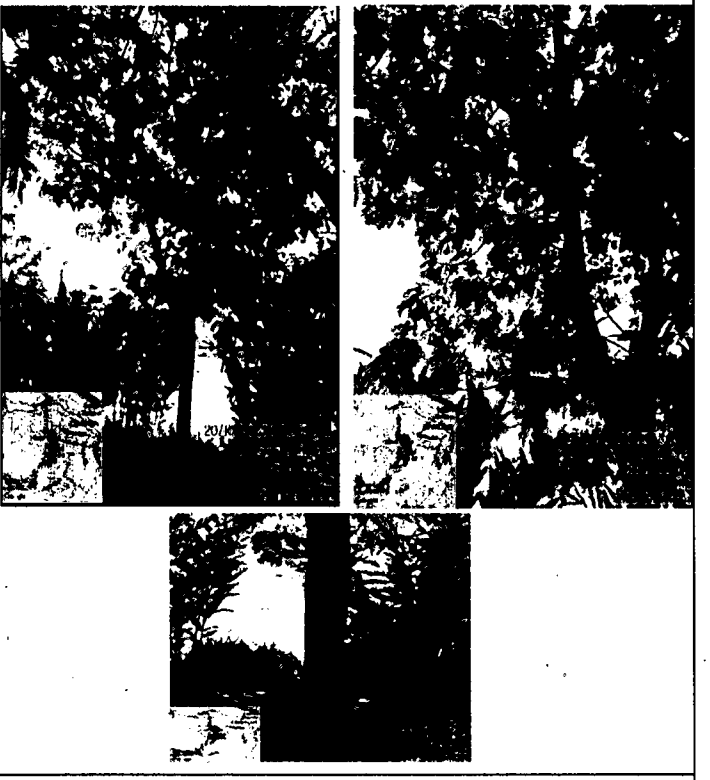

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**80**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**GUANABANO**		
	ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANNONACEAE	3,363891	-76,536498
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.10	0.31	7.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**81**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**CHIMINANGO**		
	ESPECIE	*Pithecellobium dulce*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,363949	-76,536562
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.35	13.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**82**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUALANDAY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364069	-76,536633
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.60	0.90	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**83**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**ARBOL DE LA CRUZ**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	FABACEAE	3,364045	-76,536499
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.80	0.10	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO

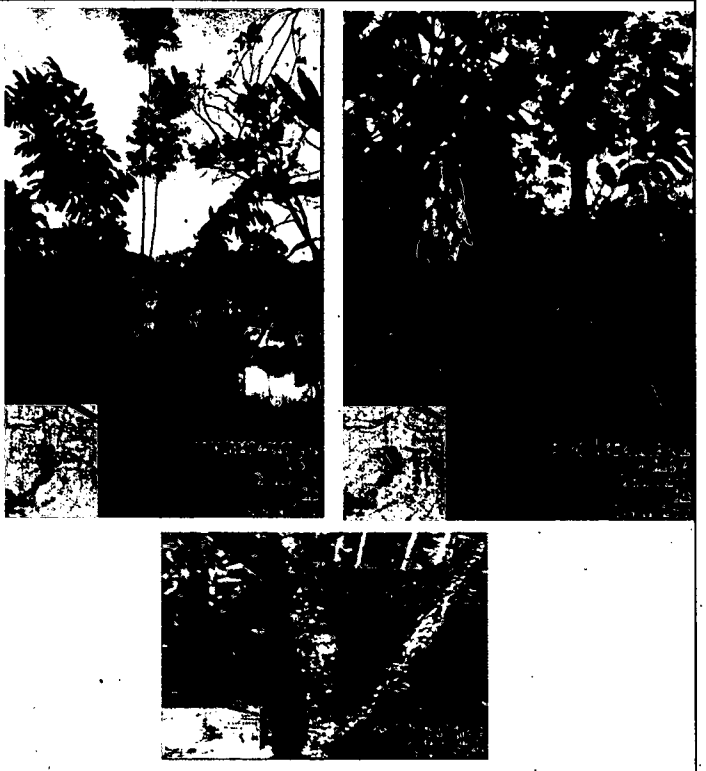

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

301

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**84**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**BOHIO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	FABACEAE	3,364057	-76,536554
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.30	0.20	8.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

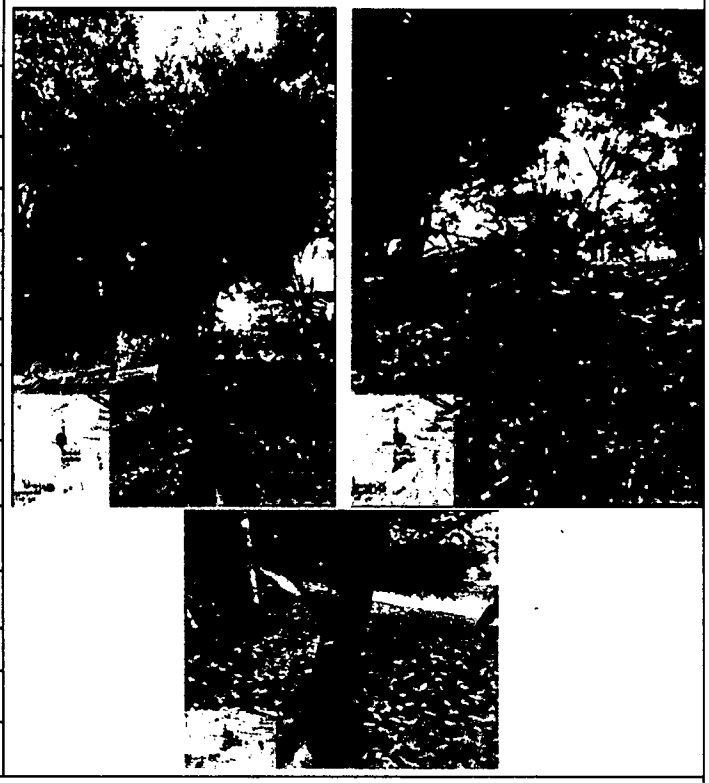

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**85**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364169	-76,536727
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.80	0.15	4.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

302

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**86**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MANGO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANACARDIACEAE	3,364437	-76,536789
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.30	0.20	7.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**87**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN ROSADO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Tabebuia rosea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,36446	-76,536734
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.00	0.80	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO





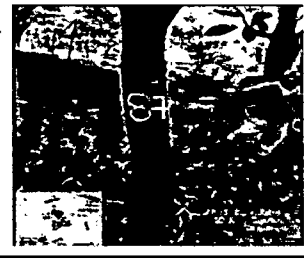

OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**CICATRIZACION**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**88**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**TULIPAN AFRICANO**		
	ESPECIE	*Spathodea campanulata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364502	-76,536519
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.30	0.11	1.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

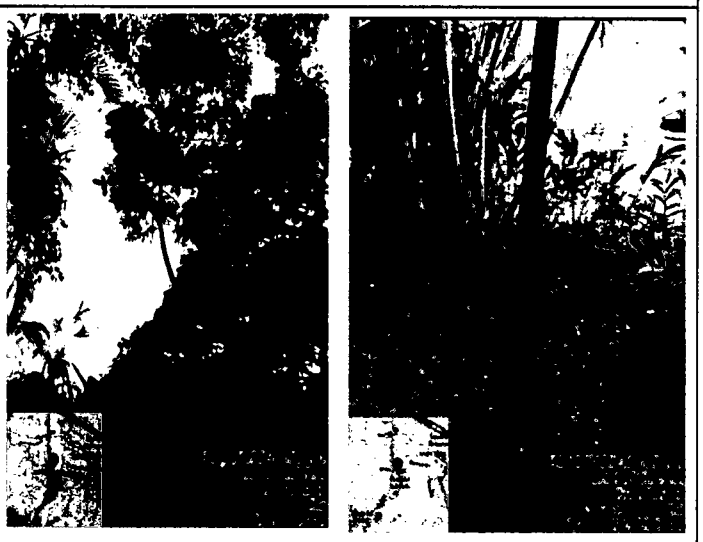

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**89**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MAGNOLIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Magnolia grandiflora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MAGNOLIACEAE	3,364294	-76,536475
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.50	0.11	5.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	NO	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

304

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**90**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**GUAYACAN AMARILLO**	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	3,364371	-76,536004
	FAMILIA	BIGNONIACEAE		
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.20	0.30	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidenc a afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



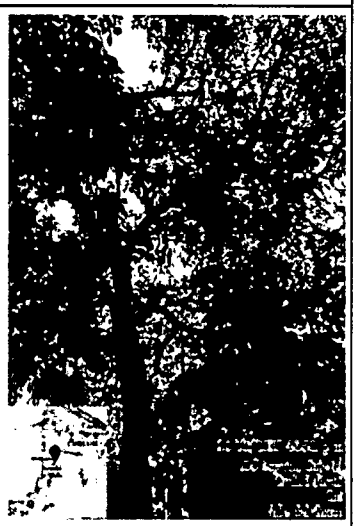



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO.	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**91**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**GUANABANO**		
	ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	ANNONACEAE	3,364307	-76,535953
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.60	0.24	6.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**92**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**MAGNOLIA**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Magnolia grandiflora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MAGNOLIACEAE	3,364327	-76,53599
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.70	2.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

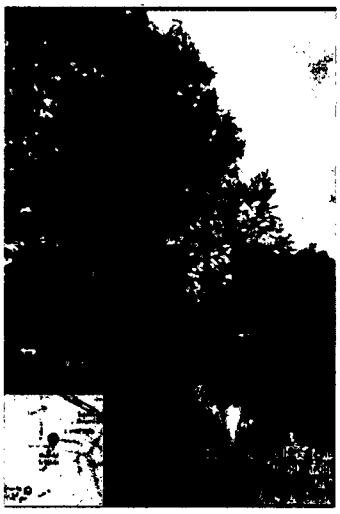



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**93**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**GUAYACAN AMARILLO**		
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364214	-76,536011
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.50	0.24	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**94**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN AMARILLO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,36417	-76,535983
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.30	0.36	8.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**95**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN AMARILLO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,364105	-76,536002
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.50	0.16	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

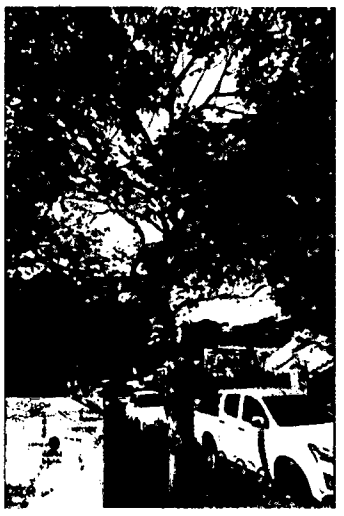

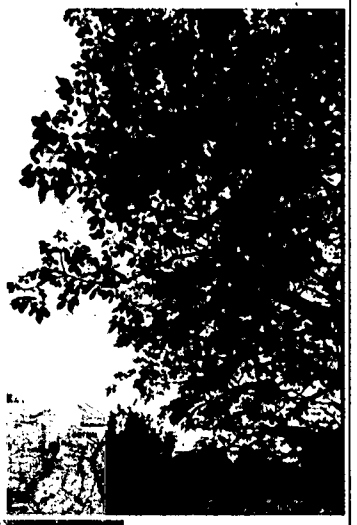



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**96**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUAYACAN AMARILLO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363753	-76,536074
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.60	0.18	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**C.HORMIGA**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANÁ LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025			**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**97**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUALANDAY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363465	-76,536115
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.40	0.30	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

308

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025	**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**98**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105	**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	La Babilla		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUALANDAY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,36335	-76,536139
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.10	0.52	10.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**99**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**GUALANDAY**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	BIGNONIACEAE	3,363223	-76,536176
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.70	0.32	9.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	C.HORMIGA	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

309

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	20/10/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**100**
DIRECCIÓN:	CALLE 13 CARRERA 105		**BARRIO**	CIUDAD JARDIN	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	La Babilla	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**CALISTEMO ROJO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Melaleuca citrina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	MYRTACEAE	3,362953	-76,53628
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.10	0.15	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		
Regular		X
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		X

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		X
No evidencia afectación		

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CICATRIZAR UN CORTE ANTERIOR

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**NO**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	1	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.5	
DAP (m)	0.38	
Diametro copa (m)	10.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,21879	-76,537164
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	2	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.8	
DAP (m)	O.34	
Diametro copa (m)	6.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36453	-76,537223
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	3	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.20	
DAP (m)	0.40	
Diametro copa (m)	10.15	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364477	-76,537239
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	4	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	8.9	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	4.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364453	-76,537181
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

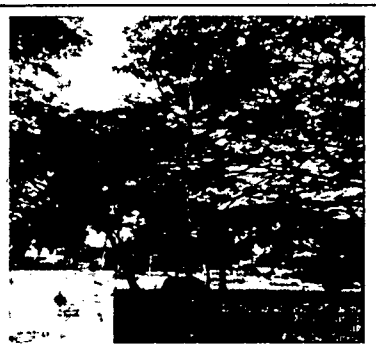



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	5	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	8.5	
DAP (m)	0.77	
Diametro copa (m)	12.45	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364432	-76,537182
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	6	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.5	
DAP (m)	0.96	
Diametro copa (m)	13.55	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364351	-76,537216
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



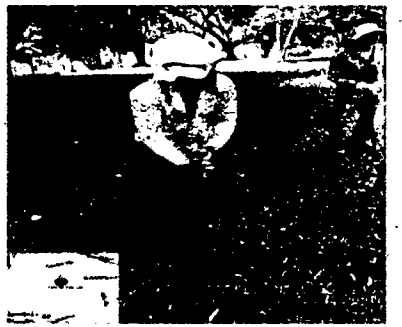



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	7	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CEIBA DE AGUA	
Nombre científico	*Pachira aquatica*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitário	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.20	
DAP (m)	0.68	
Diametro copa (m)	23.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364327	-76,537129
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	8	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	3.30	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	6.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364396	-76,537071
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	9	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	SAMAN	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.30	
DAP (m)	0.59	
Diametro copa (m)	19.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364396	-76,536964
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



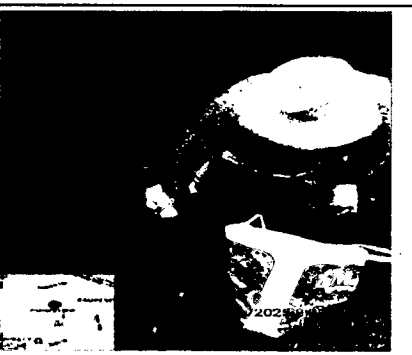

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	10	
ID censo arbóreo	4969	
Nombre común	CARACOLI	
Nombre científico	*Anacardium excelsum*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.6	
DAP (m)	0.36	
Diametro copa (m)	10.55	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364523	-76,53697
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

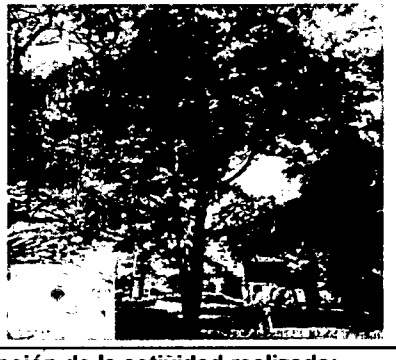





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	11	
ID censo arbóreo	4968	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.80	
DAP (m)	0.13	
Diametro copa (m)	4.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364612	-76,536906
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	12	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	SAMAN	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.40	
DAP (m)	0.99	
Diametro copa (m)	26.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364579	-76,537052
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	13	
ID censo arbóreo	4604	
Nombre común	ALGARROBO	
Nombre científico	*Ceratonia siliqua*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	0.51	
Diametro copa (m)	19.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364353	-76,536898
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

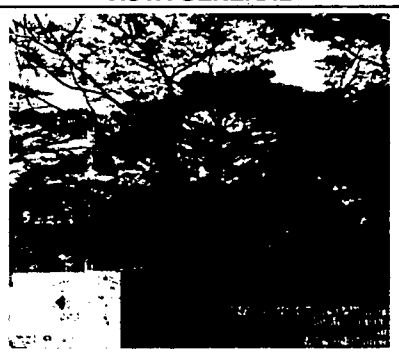

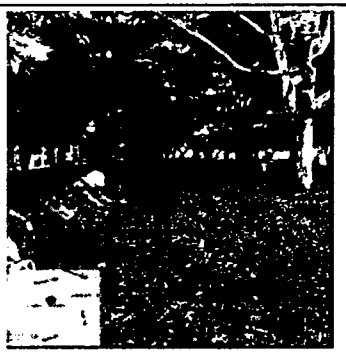



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

0152

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	14	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.70	
DAP (m)	0.54	
Diametro copa (m)	14.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364295	-76,536919
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	15	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	TULIPAN AFRICANO	
Nombre científico	*Spathodea campanulata*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.30	
DAP (m)	0.21	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364432	-76,536852
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



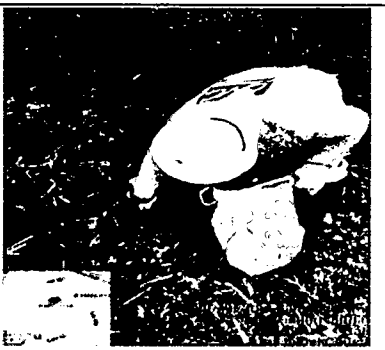

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	16	
ID censo arbóreo	4603	
Nombre común	BALSO	
Nombre científico	*Ochroma pyramidale*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	15.5	
DAP (m)	0.73	
Diametro copa (m)	22.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364264	-76,536818
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	17	
ID censo arbóreo	4991	
Nombre común	CUCHARO	
Nombre científico	*Myrsine guianensis)*	
Familia	PRIMULACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.4	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	5.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364212	-76,53695
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

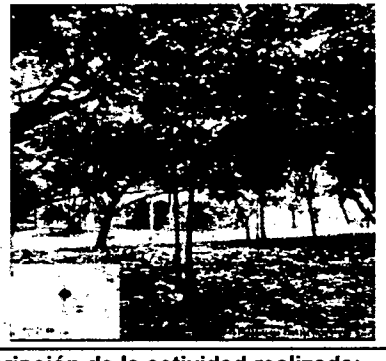



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	18	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CAOBO	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	MELIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	15	
DAP (m)	0.84	
Diametro copa (m)	16.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364203	-76,536977
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	19	
ID censo arbóreo	4992	
Nombre común	SAMAN	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	12.7	
DAP (m)	0.81	
Diametro copa (m)	31.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364121	-76,536936
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	20	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	TOCO	
Nombre científico	*Crateva capparaceae*	
Familia	CAPARACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	8.40	
DAP (m)	0.44	
Diametro copa (m)	10.47	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36408	-76,537061
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	21	
ID censo arbóreo	4988	
Nombre común	GUALANDAY	
Nombre científico	*Jacaranda caucana*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	12.90	
DAP (m)	0.75	
Diametro copa (m)	13.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364001	-76,536923
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	22	
ID censo arbóreo	4989	
Nombre común	BALSO	
Nombre científico	*Ochroma pyramidale*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	12.60	
DAP (m)	0.94	
Diametro copa (m)	24.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36405	-76,536838
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	23	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CAOBO	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	MELIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	17.10	
DAP (m)	0.86	
Diametro copa (m)	11.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364065	-76,537102
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	24	
ID censo arbóreo	4995	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.40	
DAP (m)	0.35	
Diametro copa (m)	10.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364141	-76,537143
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

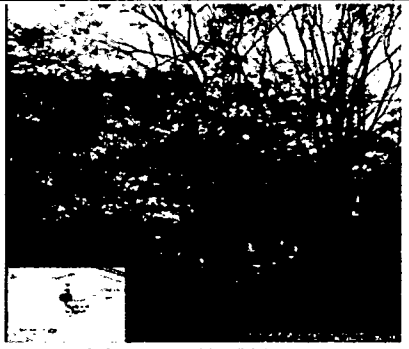





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	25	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MARAÑON	
Nombre científico	*Anacardium occidentale*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.28	
Diametro copa (m)	9.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364217	-76,53713
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	26	
ID censo arbóreo	4976	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.90	
DAP (m)	0.51	
Diametro copa (m)	10.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364201	-76,53721
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	27	
ID censo arbóreo	4982	
Nombre común	ACACIA NEGRA	
Nombre científico	*Acacia meganoxylon*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	12.70	
DAP (m)	0.64	
Diametro copa (m)	14.2O	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364026	-76,537083
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	28	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CHIMINANGO	
Nombre científico	*Pithecellobium dulce*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	14.90	
DAP (m)	0.58	
Diametro copa (m)	15.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363993	-76,537154
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	29	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA ROJA	
Nombre científico	*Delonix regia*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	8.70	
DAP (m)	0.51	
Diametro copa (m)	13.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364148	-76,537065
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	30	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	POMORROSO	
Nombre científico	*Syzygium jambos*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.90	
DAP (m)	0.16	
Diametro copa (m)	8.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364147	-76,537046
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	31	
ID censo arbóreo	4798	
Nombre común	CEIBA DE AGUA	
Nombre científico	*Pachira aquatica*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.40	
DAP (m)	0.66	
Diametro copa (m)	8.15	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363855	-76,537075
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	32	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CAOBO	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	MELIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	16.20	
DAP (m)	0.79	
Diametro copa (m)	15.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363841	-76,537062
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFÚTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	33	
ID censo arbóreo	49103	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.30	
DAP (m)	0.29	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363959	-76,536952
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

32

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	34	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	TOCO	
Nombre científico	*Crateva capparaceae*	
Familia	CAPARACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.60	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	8.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363924	-76,537047
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	35	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MARAÑON	
Nombre científico	*Anacardium occidentale*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.20	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	11.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36396	-76,536968
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

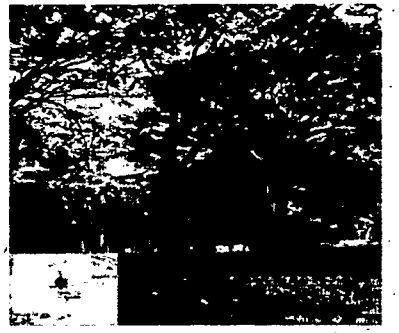



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


233

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	36	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MAMONCILLO	
Nombre científico	*Melicoccus bijugatus*	
Familia	SAPINDACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	12.40	
DAP (m)	0.68	
Diametro copa (m)	14.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363755	-76,536948
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



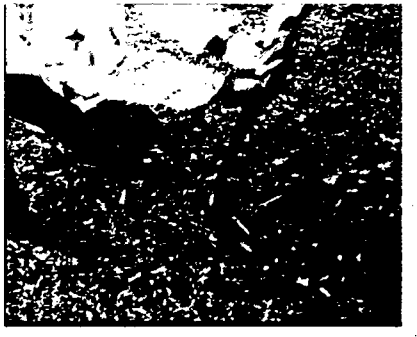



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	37	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.60	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	4.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363828	-76,53689
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	38	
ID censo arbóreo	4910	
Nombre común	SAMAN	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	16.10	
DAP (m)	1.18	
Diametro copa (m)	28.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364358	-76,536727
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	39	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PALO SANTO	
Nombre científico	*Calophyllum inophyllum*	
Familia	CALLOPHYNNACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.50	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	11.0	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364209	-76,536793
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	40	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	19.10	
DAP (m)	0.39	
Diametro copa (m)	7.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364109	-76,536774
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	41	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	19.50	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364147	-76,536694
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	42	
ID censo arbóreo	4618	
Nombre común	SAMAN	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	0.96	
Diametro copa (m)	28.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364319	-76,536622
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	43	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.60	
DAP (m)	0.54	
Diametro copa (m)	12.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363769	-76,537225
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	44	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	13.20	
DAP (m)	0.36	
Diametro copa (m)	11.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363701	-76,537238
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





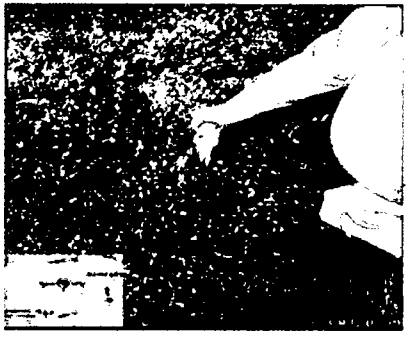

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	45	
ID censo arbóreo	4777	
Nombre común	ACACIA ROJA	
Nombre científico	*Delonix regia*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	20.2	
DAP (m)	0.89	
Diametro copa (m)	14.45	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363658	-76,537121
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	46	
ID censo arbóreo	4763	
Nombre común	ACACIA ROJA	
Nombre científico	*Delonix regia*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	14.40	
DAP (m)	0.69	
Diametro copa (m)	11.35	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363432	-76,537078
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	47	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.40	
DAP (m)	0.25	
Diametro copa (m)	6.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363493	-76,536962
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	48	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.36	
Diametro copa (m)	10.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363375	-76,536925
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	49	
ID censo arbóreo	5285	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	15.1	
DAP (m)	0.34	
Diametro copa (m)	8.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363394	-76,536862
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	50	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363434	-76,536868
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

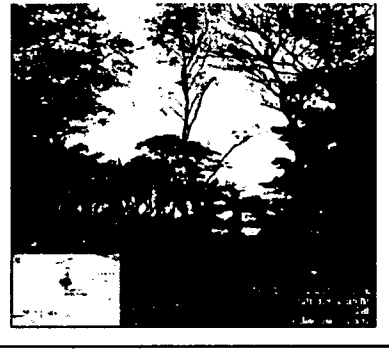





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	51	
ID censo arbóreo	4765	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.40	
DAP (m)	0.19	
Diametro copa (m)	6.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363404	-76,537018
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	52	
ID censo arbóreo	5287	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.40	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363467	-76,536876
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

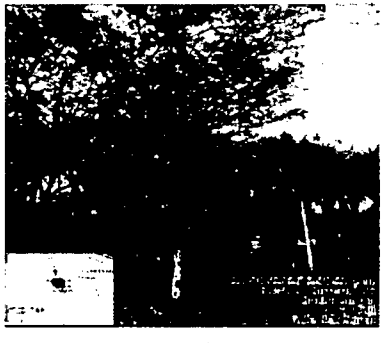





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	53	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.00	
DAP (m)	0.14	
Diametro copa (m)	4.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363526	-76,536904
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	54	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.50	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	6.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363574	-76,536895
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	55	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.18	
Diametro copa (m)	3.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363693	-76,536902
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Direcció́n	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	56	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	5.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363374	-76,536647
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	57	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	3.60	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	4.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36334	-76,536551
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	58	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.70	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	3.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363324	-76,536577
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	59	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CASCO DE BUEY	
Nombre científico	*Bauhinia picta*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.80	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	3.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363358	-76,536545
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	60	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.10	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	5.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363368	-76,536512
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	61	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.20	
DAP (m)	0.19	
Diametro copa (m)	5.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36304	-76,536641
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	62	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CIRUELO	
Nombre científico	*Spondias dulcis*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.70	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	1.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363	-76,536652
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	63	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.90	
DAP (m)	0.19	
Diametro copa (m)	6.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,362969	-76,536658
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	64	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	NEEM	
Nombre científico	*Azadirachta indica*	
Familia	MELIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.50	
DAP (m)	0.13	
Diametro copa (m)	3.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363013	-76,536757
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	65	
ID censo arbóreo	4725	
Nombre común	CACAO	
Nombre científico	*Theobroma cacao*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.40	
DAP (m)	0.32	
Diametro copa (m)	11.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,362909	-76,536794
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





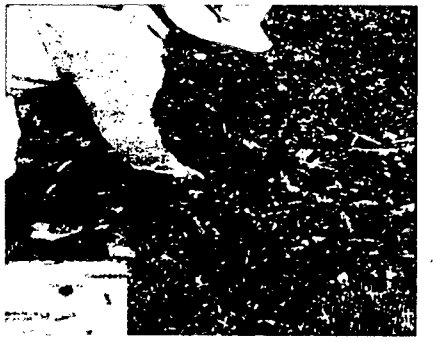

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	66	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	BOHIO	
Nombre científico	*Clitoria fairchildiana*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.60	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	9.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363111	-76,536798
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

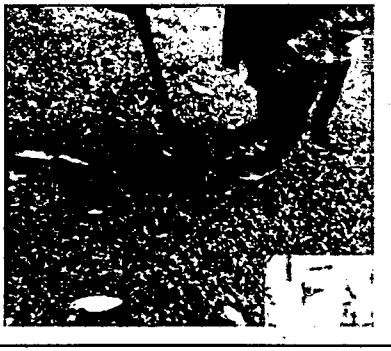
Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	67	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	LAUREL	
Nombre científico	*Laurus nobilis*	
Familia	LAURACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.50	
DAP (m)	0.22	
Diametro copa (m)	7.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363149	-76,536811
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	68	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACEITUNO	
Nombre científico	*Simarauba amara*	
Familia	SIMAROUBACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.30	
DAP (m)	0.22	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36312	-76,536794
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

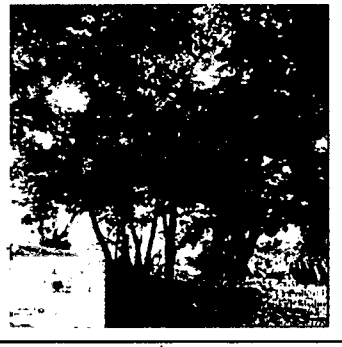



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	69	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CASCO DE BUEY	
Nombre científico	*Bauhinia picta*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	O.10	
Diametro copa (m)	4.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363522	-76,536551
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	70	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CIRUELO	
Nombre científico	*Spondias dulcis*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.50	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	2.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363441	-76,536624
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025
CVC- CONSTRUFUTURO

CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	71	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.60	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	4.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363637	-76,536594
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	72	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.40	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	2.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363718	-76,536486
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	73	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MAMONCILLO	
Nombre científico	*Melicoccus bijugatus*	
Familia	SAPINDACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.40	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363722	-76,536528
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	74	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	JABONCILLO	
Nombre científico	*Sapindus saponaria*	
Familia	SAPINDACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363748	-76,536619
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	75	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYABO	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	3.70	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	5.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36384	-76,536519
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

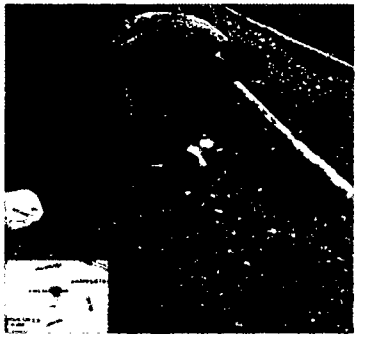
Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	76	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	BALSO	
Nombre científico	*Ochroma pyramidale*	
Familia	MALVACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.30	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	9.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363807	-76,536522
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	77	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CASCO DE BUEY	
Nombre científico	*Bauhinia picta*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.00	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	4.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363753	-76,536612
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Direcciòn	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	78	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	PERA DE MALACA	
Nombre científico	*Syzygium malaccense*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.10	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	3.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363823	-76,536534
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	79	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ACACIA AMARILLA	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.50	
DAP (m)	0.22	
Diametro copa (m)	9.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363855	-76,536483
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	80	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUANABANO	
Nombre científico	*Annona muricata*	
Familia	ANNONACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.10	
DAP (m)	0.31	
Diametro copa (m)	7.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363891	-76,536498
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	81	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CHIMINANGO	
Nombre científico	*Pithecellobium dulce*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.40	
DAP (m)	0.35	
Diametro copa (m)	13.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363949	-76,536562
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	82	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUALANDAY	
Nombre científico	*Jacaranda caucana*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.60	
DAP (m)	0.90	
Diametro copa (m)	2.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364069	-76,536633
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	83	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	ARBOL DE LA CRUZ	
Nombre científico	*Brownea ariza*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	2.80	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364045	-76,536499
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	84	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	BOHIO	
Nombre científico	*Clitoria fairchildiana*	
Familia	FABACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.30	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	8.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364057	-76,536554
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	85	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.80	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	4.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364169	-76,536727
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



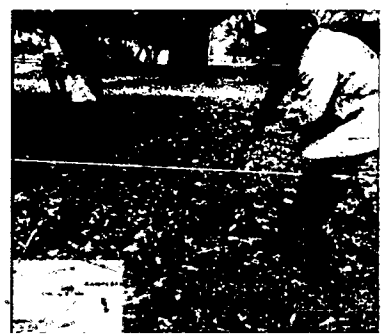



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

352

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	86	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MANGO	
Nombre científico	*Mangifera indica*	
Familia	ANACARDIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.30	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	7.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364437	-76,536789
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	87	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN LILA	
Nombre científico	*Tabebuia rosea*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.00	
DAP (m)	0.80	
Diametro copa (m)	4.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36446	-76,536734
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	88	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	TULIPAN AFRICANO	
Nombre científico	*Spathodea campanulata*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	8.30	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	1.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364502	-76,536519
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





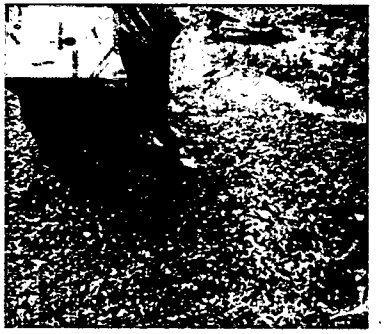

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	89	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MAGNOLIA	
Nombre científico	*Magnolia grandiflora*	
Familia	MAGNOLIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	6.50	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	5.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364294	-76,536475
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

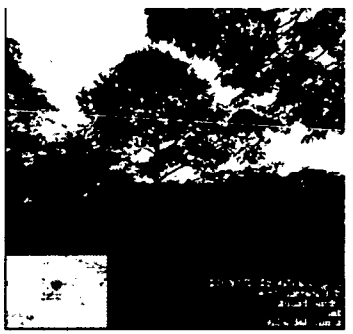



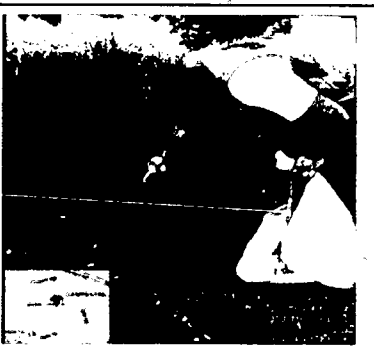

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

35

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	90	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN AMARILLO	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.20	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	7.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364371	-76,536004
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	91	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUANABANO	
Nombre científico	*Annona muricata*	
Familia	ANNONACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	5.60	
DAP (m)	0.24	
Diametro copa (m)	6.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364307	-76,535953
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



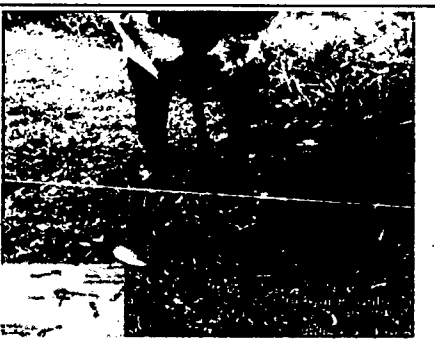

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

355

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	92	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	MAGNOLIA	
Nombre científico	*Magnolia grandiflora*	
Familia	MAGNOLIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.70	
Diametro copa (m)	2.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364327	-76,53599
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Direcció́n	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	93	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN AMARILLO	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.50	
DAP (m)	0.24	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364214	-76,536011
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

359

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	94	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN AMARILLO	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.30	
DAP (m)	0.36	
Diametro copa (m)	8.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36417	-76,535983
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	95	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN AMARILLO	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	9.50	
DAP (m)	0.16	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364105	-76,536002
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

357

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	96	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUAYACAN AMARILLO	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	7.60	
DAP (m)	0.18	
Diametro copa (m)	8.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363753	-76,536074
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	97	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUALANDAY	
Nombre científico	*Jacaranda caucana*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.40	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	8.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363465	-76,536115
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	98	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUALANDAY	
Nombre científico	*Jacaranda caucana*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.10	
DAP (m)	0.52	
Diametro copa (m)	10.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36335	-76,536139
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	99	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	GUALANDAY	
Nombre científico	*Jacaranda caucana*	
Familia	BIGNONIACEAE	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	10.70	
DAP (m)	0.32	
Diametro copa (m)	9.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363223	-76,536176
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

359

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	100	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	CALISTEMO	
Nombre científico	*Callistemon speciosus*	
Familia	MYRTACEAE	
Estado fitosanitario	REGULAR	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	CIUDAD JARDIN	
Comuna	22	
Altura (m)	4.10	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	4.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,362953	-76,53628
Humedal	HUMEDAL LA BABILLA	
Dirección	CALLE 13 CARRERA 105	
Fecha de fertilización	28/11/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

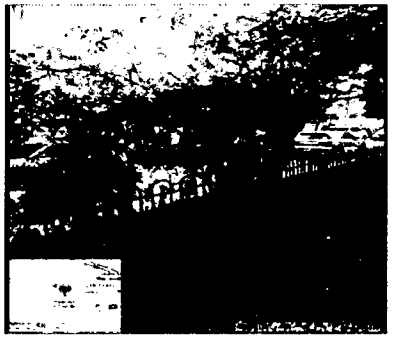





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1088 Nº1088
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental por proyecto		
Nombre o razón social	ALEJANDRO GARZON GUZMAN/SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS	
Documento de identificación o NIT	901191011-8	
Representante Legal	ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN	
Dirección	CALLE 70 # 12B – 77 SIETE DE AGOSTO (Oficina)	
Teléfono	3148095541 - (602) 3848023	
Correo electrónico	suministramosycontratamos@gmail.com	
Municipio o Distrito del Predio	VEREDA LA SOFIA – GUACHENE	
Nombre del Predio	LA SOFIA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Documento de identificación o NIT	8 0 5 0 2 1 8 1 4 - 9
Representante Legal	GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Dirección domicilio	CL 13 66 BIS 57 L 138
Teléfono	3 1 5 3 9 5 9 4 7 4
Correo electrónico	contabilidad@construyamosfuturo.com
Dirección de generación de RCD	LAGO DE LAS GARZAS

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	57.6 TONELADAS

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1088 Nº1088
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	57.6 TONELADAS
Fecha de recepción de los RCD	NOVIEMBRE 05 DEL 2025

DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE	
Nombre o razón social/ Identificación	CESAR AUGUSTO MEZA CC. 1130670905
Placa de Vehículo	BUA237

Teniendo en cuenta que el predio de disposición final LA SOFIA, no cuenta con el instrumento de pesaje y en concordancia con el articulo 9 de la resolución 1257 del 2021, se adocpata lo establecido en el parágrafo 1 TABLA B.3.2-1 incluida en el Titulo B – Cargas del reglamento colombiano de construcción y sismo resistencia NSR -10.

La presente certificación se basa en el anexo II de la resolución 1257 del 2021 ""Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, a los 11 días del mes Noviembre del 2025. Para ser presentada ante la autoridad Ambiental competente **IMPORTANTE PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA.**

Se anexa certificado de calibración de la báscula utilizada para realizar el proceso de pesaje de los RCD recibidos, como lo establece el marco normativo en su artículo 3 de la Resolución 1257 del 2021.

Cordialmente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S NIT: 901.191.011-8

ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN
Representante Legal
Suministramos y Contratamos.

361

CAPÍTULO B.3
CARGAS MUERTAS

B.3.1 — DEFINICIÓN

La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.

B.3.2 — MASAS Y PESOS DE LOS MATERIALES

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales (en kg/m^3) de los materiales las cuales se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s^2, para así obtener valores de peso en N/m^3. En la tabla B.3.2-1 se muestran los valores de la densidad de masa en kg/m^3 para los materiales de uso más frecuente.

Tabla B.3.2-1
Masas de los materiales

Material	*Densidad (kg/m^3)*	*Material*	*Densidad (kg/m^3)*
Acero	7 800	Mortero de inyección para mampostería	2 250
Agua		Mortero de pega para mampostería	2 100
Dulce	1 000	Piedra	
Marina	1 030	Caliza, mármol, cuarzo	2 700
Aluminio	2 700	Basalto, granito, gneis	2 850
Arena		Arenisca	2 200
Limpia y seca	1 440	Pizarra	2 690
Seca de río	1 700	Plomo	11 400
Baldosa cerámica	2 400	Productos bituminosos	
Bronce	8 850	Asfalto y alquitrán	1 300
Cal		Gasolina	700
Hidratada suelta	500	Grafito	2 160
Hidratada compacta	730	Parafina	900
Carbón, apilado	800	Petróleo	850
Carbon vegetal	200	Relleno de ceniza	920
Cemento portland, a granel	1 440	Tableros de madera aglutinada	750
Cobre	9 000	Terracota	
Concreto simple	2 300	Poros saturados	1 950
Concreto reforzado	2 400	Poros no saturados	1 150
Corcho, comprimido	250	Tierra	
Estaño	7 360	Arcilla húmeda	1 750
Grava seca	1 660	Arcilla seca	1 100
Hielo	920	Arcilla y grava seca	1 600
Hierro		Arena y grava húmeda	1 900
Fundido	7 200	Arena y grava seca apisonada	1 750
Forjado	7 700	Arena y grava seca suelta	1 600
Latón	8 430	Limo húmedo consolidado	1 550
Madera laminada	600	Limo húmedo suelto	1 250
Madera seca	450-750	Vidrio	2 600
Mampostería de concreto	2 150	Yeso en tableros para muros	800
Mampostería de ladrillo macizo	1 850	Yeso suelto	1 150
Mampostería de piedra	2 200	Zinc en láminas enrolladas	7 200

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.° 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

362

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1089 Nº1089
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S /
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental por proyecto		
Nombre o razón social	ALEJANDRO GARZON GUZMAN/SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS	
Documento de identificación o NIT	901191011-8	
Representante Legal	ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN	
Dirección	CALLE 70 # 12B – 77 SIETE DE AGOSTO (Oficina)	
Teléfono	3148095541 - (602) 3848023	
Correo electrónico	suministramosycontratamos@gmail.com	
Municipio o Distrito del Predio	VEREDA LA SOFIA – GUACHENE	
Nombre del Predio	LA SOFIA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Documento de identificación o NIT	8 0 5 0 2 1 8 1 4 - 9
Representante Legal	GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Dirección domicilio	CL 13 66 BIS 57 L 138
Teléfono	3 1 5 3 9 5 9 4 7 4
Correo electrónico	contabilidad@construyamosfuturo.com
Dirección de generación de RCD	HUMEDAL CAÑASCORDAS

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	86.4 TONELADAS

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1089
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

Nº1089

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	86.4 TONELADAS
Fecha de recepción de los RCD	NOVIEMBRE 07-10 DEL 2025

DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE	
Nombre o razón social/ Identificación	CESAR AUGUSTO MEZA CC. 1130670905
Placa de Vehículo	BUA237

Teniendo en cuenta que el predio de disposición final LA SOFIA, no cuenta con el instrumento de pesaje y en concordancia con el articulo 9 de la resolución 1257 del 2021, se adocpata lo establecido en el parágrafo 1 TABLA B.3.2-1 incluida en el Titulo B – Cargas del reglamento colombiano de construcción y sismo resistencia NSR -10.

La presente certificación se basa en el anexo II de la resolución 1257 del 2021 ""Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, a los 11 días del mes Noviembre del 2025. Para ser presentada ante la autoridad Ambiental competente **IMPORTANTE PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA.**

Se anexa certificado de calibración de la báscula utilizada para realizar el proceso de pesaje de los RCD recibidos, como lo establece el marco normativo en su artículo 3 de la Resolución 1257 del 2021.

Cordialmente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
NIT: 901 191 011-8

ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN
Representante Legal
Suministramos y Contratamos.

CAPÍTULO B.3
CARGAS MUERTAS

B.3.1 — DEFINICIÓN

La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.

B.3.2 — MASAS Y PESOS DE LOS MATERIALES

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales (en kg/m^3) de los materiales las cuales se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s^2, para así obtener valores de peso en N/m^3. En la tabla B.3.2-1 se muestran los valores de la densidad de masa en kg/m^3 para los materiales de uso más frecuente.

Tabla B.3.2-1
Masas de los materiales

Material	*Densidad (kg/m^3)*	*Material*	*Densidad (kg/m^3)*
Acero	7 800	Mortero de inyección para mampostería	2 250
Agua		Mortero de pega para mampostería	2 100
Dulce	1 000	Piedra	
Marina	1 030	Caliza, mármol, cuarzo	2 700
Aluminio	2 700	Basalto, granito, gneis	2 850
Arena		Arenisca	2 200
Limpia y seca	1 440	Pizarra	2 800
Seca de río	1 700	Plomo	11 400
Baldosa cerámica	2 400	Productos bituminosos	
Bronce	8 850	Asfalto y alquitrán	1 300
Cal		Gasolina	700
Hidratada suelta	500	Grafito	2 160
Hidratada compacta	750	Parafina	900
Carbón, apilado	800	Petróleo	850
Carbon vegetal	200	Relleno de ceniza	920
Cemento pórtland, a granel	1 440	Tableros de madera aglutinada	750
Cobre	9 000	Terracota	
Concreto simple	2 300	Poros saturados	1 950
Concreto reforzado	2 400	Poros no saturados	1 150
Corcho, comprimido	250	Tierra	
Estaño	7 360	Arcilla húmeda	1 750
Grava seca	1 660	Arcilla seca	1 100
Hielo	920	Arcilla y grava seca	1 600
Hierro		Arena y grava húmeda	1 900
Fundido	7 200	Arena y grava seca apisonada	1 750
Forjado	7 700	Arena y grava seca suelta	1 600
Latón	8 430	Limo húmedo consolidado	1 550
Madera laminada	600	Limo húmedo suelto	1 250
Madera seca	450-750	Vidrio	2 600
Mampostería de concreto	2 150	Yeso en tableros para muros	800
Mampostería de ladrillo macizo	1 850	Yeso suelto	1 150
Mampostería de piedra	2 200	Zinc en láminas enrolladas	7 200

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.º 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

365

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1188 Nº1188
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental por proyecto		
Nombre o razón social	ALEJANDRO GARZON GUZMAN/SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS	
Documento de identificación o NIT	901191011-8	
Representante Legal	ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN	
Dirección	CALLE 70 # 12B – 77 SIETE DE AGOSTO (Oficina)	
Teléfono	3148095541 - (602) 3848023	
Correo electrónico	suministramosycontratamos@gmail.com	
Municipio o Distrito del Predio	VEREDA LA SOFIA – GUACHENE	
Nombre del Predio	LA SOFIA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Documento de identificación o NIT	805021814-9
Representante Legal	GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Dirección domicilio	CL 13 66 BIS 57 L 138
Teléfono	3153959474
Correo electrónico	contabilidad@construyamosfuturo.com
Dirección de generación de RCD	HUMEDAL CAÑASCORDAS

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	201 TONELADAS

366

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1188 **Nº1188**
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	201 TONELADAS
Fecha de recepción de los RCD	DEL 13 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE	
Nombre o razón social/ Identificación	CESAR AUGUSTO MEZA CC. 1130670905
Placa de Vehículo	BUA237

Teniendo en cuenta que el predio de disposición final LA SOFIA, no cuenta con el instrumento de pesaje y en concordancia con el articulo 9 de la resolución 1257 del 2021, se adocpata lo establecido en el parágrafo 1 TABLA B.3.2-1 incluida en el Titulo B – Cargas del reglamento colombiano de construcción y sismo resistencia NSR -10.

La presente certificación se basa en el anexo II de la resolución 1257 del 2021 ""Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, a los 25 días del mes Noviembre del 2025. Para ser presentada ante la autoridad Ambiental competente **IMPORTANTE PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA.**

Se anexa certificado de calibración de la báscula utilizada para realizar el proceso de pesaje de los RCD recibidos, como lo establece el marco normativo en su artículo 3 de la Resolución 1257 del 2021.

Cordialmente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
NIT: 901.191.011-8
C.C. 79305043

ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN
Representante Legal
Suministramos y Contratamos.

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.º 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

CAPÍTULO B.3
CARGAS MUERTAS

B.3.1 — DEFINICIÓN

La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.

B.3.2 — MASAS Y PESOS DE LOS MATERIALES

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales (en kg/m^3) de los materiales las cuales se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s^2, para así obtener valores de peso en N/m^3. En la tabla B.3.2-1 se muestran los valores de la densidad de masa en kg/m^3 para los materiales de uso más frecuente.

Tabla B.3.2-1
Masas de los materiales

Material	*Densidad (kg/m^3)*	*Material*	*Densidad (kg/m^3)*
Acero	7 800	Mortero de inyección para mampostería	2 250
Agua		Mortero de pega para mampostería	2 100
Dulce	1 000	Piedra	
Marina	1 030	Caliza, mármol, cuarzo	2 700
Aluminio	2 700	Basalto, granito, gneis	2 850
Arena		Arenisca	2 200
Limpia y seca	1 440	Pizarra	2 600
Seca de río	1 700	Plomo	11 400
Baldosa cerámica	2 400	Productos bituminosos	
Bronce	8 850	Asfalto y alquitrán	1 300
Cal		Gasolina	700
Hidratada suelta	500	Grafito	2 160
Hidratada compacta	730	Parafina	900
Carbón, apilado	800	Petróleo	850
Carbón vegetal	200	Relleno de ceniza	920
Cemento pórtland, a granel	1 440	Tableros de madera aglutinada	750
Cobre	9 000	Terracota	
Concreto simple	2 300	Poros saturados	1 950
Concreto reforzado	2 400	Poros no saturados	1 150
Corcho, comprimido	250	Tierra	
Estaño	7 380	Arcilla húmeda	1 750
Grava seca	1 660	Arcilla seca	1 100
Hielo	920	Arcilla y grava seca	1 600
Hierro		Arena y grava húmeda	1 900
Fundido	7 200	Arena y grava seca apisonada	1 750
Forjado	7 700	Arena y grava seca suelta	1 600
Latón	8 430	Limo húmedo consolidado	1 550
Madera laminada	600	Limo húmedo suelto	1 250
Madera seca	450-750	Vidrio	2 600
Mampostería de concreto	2 150	Yeso en tableros para muros	800
Mampostería de ladrillo macizo	1 850	Yeso suelto	1 150
Mampostería de piedra	2 200	Zinc en láminas enrolladas	7 200

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.° 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

367

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1240 Nº1240
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental por proyecto		
Nombre o razón social	ALEJANDRO GARZON GUZMAN/SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS	
Documento de identificación o NIT	901191011-8	
Representante Legal	ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN	
Dirección	CALLE 70 # 12B – 77 SIETE DE AGOSTO (Oficina)	
Teléfono	3148095541 - (602) 3848023	
Correo electrónico	suministramosycontratamos@gmail.com	
Municipio o Distrito del Predio	VEREDA LA SOFIA – GUACHENE	
Nombre del Predio	LA SOFIA	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de laautoridad ambiental competente por proyecto	
Nombre o razón social	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
Documento de identificación o NIT	805021814-9
Representante Legal	GUILLERMO PAZ MUÑOZ
Dirección domicilio	CL 13 66 BIS 57 L 138
Teléfono	3153959474
Correo electrónico	contabilidad@construyamosfuturo.com
Dirección de generación de RCD	HUMEDAL CAÑASCORDAS

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCDsusceptibles de aprovechamiento:	0
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materialespétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas,sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	129.6 TONELADAS

368

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZON GUZMAN
NIT. 901191011-8

CERTIFICACIÓN Nº 2025- 1240 **Nº1240**
Disposición Final de Tierra y Material sobrante
Realizada por el gestor SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
ALEJANDRO GARZÓN GUZMAN
NIT. 901191011-8

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	0
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	129.6 TONELADAS
Fecha de recepción de los RCD	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

DATOS BASICOS DEL GESTOR DE TRANSPORTE	
Nombre o razón social/ Identificación	CESAR AUGUSTO MEZA CC. 1130670905
Placa de Vehículo	BUA237

Teniendo en cuenta que el predio de disposición final LA SOFIA, no cuenta con el instrumento de pesaje y en concordancia con el articulo 9 de la resolución 1257 del 2021, se adocpata lo establecido en el parágrafo 1 TABLA B.3.2-1 incluida en el Titulo B – Cargas del reglamento colombiano de construcción y sismo resistencia NSR -10.

La presente certificación se basa en el anexo II de la resolución 1257 del 2021 ""Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones" y se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes Diciembre del 2025. Para ser presentada ante la autoridad Ambiental competente **IMPORTANTE PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE ESTE CERTIFICADO COMUNÍQUESE CON NUESTRA OFICINA.**

Se anexa certificado de calibración de la báscula utilizada para realizar el proceso de pesaje de los RCD recibidos, como lo establece el marco normativo en su artículo 3 de la Resolución 1257 del 2021.

Cordialmente,

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S
NIT: 901 191 011-8

ALEJANDRO GARZÓN GUZMÁN
Representante Legal
Suministramos y Contratamos.

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.º 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E. mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

CAPÍTULO B.3
CARGAS MUERTAS

B.3.1 — DEFINICIÓN

La carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Las fuerzas netas de preesfuerzo deben incluirse dentro de la carga muerta.

B.3.2 — MASAS Y PESOS DE LOS MATERIALES

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las densidades de masa reales (en kg/m^3) de los materiales las cuales se deben multiplicar por la aceleración de la gravedad, 9.8 m/s^2, para así obtener valores de peso en N/m^3. En la tabla B.3.2-1 se muestran los valores de la densidad de masa en kg/m^3 para los materiales de uso más frecuente.

Tabla B.3.2-1
Masas de los materiales

Material	*Densidad (kg/m^3)*	*Material*	*Densidad (kg/m^3)*
Acero	7 800	Mortero de inyección para mampostería	2 250
Agua		Mortero de pega para mampostería	2 100
Dulce	1 000	Piedra	
Marina	1 030	Caliza, mármol, cuarzo	2 700
Aluminio	2 700	Basalto, granito, gneis	2 850
Arena		Arenisca	2 200
Limpia y seca	1 440	Pizarra	2 600
Seca de río	1 700	Plomo	11 400
Baldosa cerámica	2 400	Productos bituminosos	
Bronce	8 850	Asfalto y alquitrán	1 300
Cal		Gasolina	700
Hidratada suelta	500	Grafito	2 160
Hidratada compacta	730	Parafina	900
Carbón, apilado	800	Petróleo	850
Carbón vegetal	200	Relleno de ceniza	920
Cemento pórtland, a granel	1 440	Tableros de madera aglutinada	750
Cobre	9 000	Terracota	
Concreto simple	2 300	Poros saturados	1 950
Concreto reforzado	2 400	Poros no saturados	1 150
Corcho, comprimido	250	Tierra	
Estaño	7 360	Arcilla húmeda	1 750
Grava seca	1 680	Arcilla seca	1 100
Hielo	920	Arcilla y grava seca	1 600
Hierro		Arena y grava húmeda	1 900
Fundido	7 200	Arena y grava seca apisonada	1 750
Forjado	7 700	Arena y grava seca suelta	1 600
Latón	8 430	Limo húmedo consolidado	1 650
Madera laminada	600	Limo húmedo suelto	1 250
Madera seca	450-750	Vidrio	2 600
Mampostería de concreto	2 150	Yeso en tableros para muros	800
Mampostería de ladrillo macizo	1 850	Yeso suelto	1 150
Mampostería de piedra	2 200	Zinc en láminas enrolladas	7 200

SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG S.A.S– Calle 70 N.° 12B – 77 B / 7 de agosto
Cali– Colombia Tel (602) 3848023 – Cel 314 809 5541 – 324 287 1249
E-mail suministramosycontratamos@gmail.com-suministramosycontratamosagg@gmail.com

369
