CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

Santiago de Cali, Febrero 17 de 2026

CF-017-2025

Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Atn: ORLANDO BARRETO
Ciudad

Asunto: Radicación Acta Parcial de Obra No. 2 – Contrato de Obra CVC No. 0741 de 2025

Cordial saludo,

Por parte de la Fundación Construyamos Futuro – CONSTRUFUTURO, me permito radicar ante usted la Acta de Cobro Parcial No. 2 correspondiente a las actividades ejecutadas dentro del marco del Contrato de Obra Pública CVC No. 0741 de 2025, cuyo objeto es "Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario".

Para efectos de su revisión, validación y trámite ante las áreas correspondientes de la CVC, adjunto la siguiente documentación obligatoria y complementaria:

Documentos anexos

-Factura electrónica correspondiente al Acta Parcial No. 2.
-Tres (3) copias del Acta Parcial de Obra No. 2 debidamente firmadas por el contratista.
-Memoria de cantidades ejecutadas correspondientes al Acta Parcial No. 2.
-Informe Técnico No. 2, con sus respectivos anexos fotográficos, sociales, ambientales y de soporte.
-Registro Único Tributario – RUT actualizado.
-Certificación bancaria de la cuenta destinada para pagos del contrato.
-Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, correspondiente al periodo exigido.

Quedo atento a cualquier requerimiento, ajuste o información adicional que considere pertinente para la continuidad del proceso administrativo

Atentamente,

Sebastian C

Juan Sebastian Castrillon
C.C. 1.144.089.580 de Cali

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VR TOTAL
1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	SOCIALIZACIÓN	UND	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000		$ -	6	$ 10.200.000
1.1.2	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS	UND	6	$ 5.800.000,00	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000		$ -	6	$ 34.800.000
	SUBTOTAL CAP 1. ETAPA PRECONSTRUCCIÓN:				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS				$ 899.561.768		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1986	$ 4.142,00	$ 8.226.012	2257,20	$ 9.349.322	1986,00	$ 8.226.012	271,20	$ 1.123.310	2257,20	$ 9.349.322
2.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0,1M	M2	1986	$ 3.683,00	$ 7.314.438	2257,20	$ 8.313.268	1986,00	$ 7.314.438	271,20	$ 998.830	2257,20	$ 8.313.268
2.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	0	$ 21.165,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	0,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	100,00	$ 2.116.500
2.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
2.2.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	12000	$ 6.073,00	$ 72.876.000	7521,40	$ 45.677.462	7521,40	$ 45.677.462		$ -	7521,40	$ 45.677.462
2.2.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	18000	$ 3.541,00	$ 63.738.000	18000,00	$ 63.738.000	2500,00	$ 8.852.500	15500,00	$ 54.885.500	18000,00	$ 63.738.000
2.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	100	$ 798.820,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000		$ -	100,00	$ 79.882.000
2.2.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	100	$ 449.273,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300		$ -	100,00	$ 44.927.300
2.2.5	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	0,00	$ 13.000,00	$ -	944,82	$ 12.282.673	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES												
2.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	377	$ 37.879,00	$ 14.280.383	467,15	$ 17.694.985	377,00	$ 14.280.383	90,15	$ 3.414.602	467,15	$ 17.694.985
2.3.2	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	507,6	$ 10.540,00	$ 5.350.104	707,15	$ 7.453.308	507,60	$ 5.350.104	199,42	$ 2.101.887	707,02	$ 7.451.991
2.3.3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	507,6	$ 51.500,00	$ 26.141.400	729,15	$ 37.550.868	507,60	$ 26.141.400	221,55	$ 11.409.568	729,15	$ 37.550.968
2.3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	139	$ 140.297,00	$ 19.501.283	370,58	$ 51.991.262	139,00	$ 19.501.283	231,58	$ 32.489.979	370,58	$ 51.991.262
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	3122	$ 57.490,00	$ 179.483.780	2675,50	$ 153.814.495	544,00	$ 31.274.560	1528,25	$ 87.859.093	2072,25	$ 119.133.653
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	1786	$ 123.941,00	$ 221.358.626	1567,50	$ 194.277.518	212,40	$ 26.325.068	1022,60	$ 126.742.067	1235,00	$ 153.067.135
2.4	PASOS ELEVADOS												
2.4.1	FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI	KLS	2997,3	$ 20.675,00	$ 61.969.178	2997,30	$ 61.969.178		$ -		$ -	0,00	$ -
2.4.2	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	5,13	$ 1.085.280,00	$ 5.567.486	5,13	$ 5.567.488		$ -	5,13	$ 5.567.488	5,13	$ 5.567.488
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	909,21	$ 7.319,00	$ 6.654.508	909,21	$ 6.654.508		$ -	613,54	$ 4.490.499	613,54	$ 4.490.499
2.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	22	$ 65.621,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662		$ -	22,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662
2.5	PERGOLA DE RECIBIMIENTO PARA VISITANTES												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	28,51	$ 78.746,00	$ 2.245.048	28,51	$ 2.245.048		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	81,2	$ 148.784,00	$ 12.082.073	81,20	$ 12.082.073		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8.6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	58,92	$ 53.510,00	$ 3.152.809	58,92	$ 3.152.809		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)	ML	22,8	$ 106.158,00	$ 2.420.402	22,80	$ 2.420.402		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL	UND	96	$ 122.585,00	$ 11.768.160	96,00	$ 11.768.160		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)	UND	6	$ 331.621,00	$ 1.989.726	6,00	$ 1.989.726		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.7	CABALLETE PARA CUBIERTA	ML	5,8	$ 55.091,00	$ 319.528	5,80	$ 319.528		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)	M2	39,8	$ 114.095,00	$ 4.540.981	39,80	$ 4.540.981		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.9	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	1	$ 1.085.280,00	$ 1.085.280	1,00	$ 1.085.280		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	22	$ 57.490,00	$ 1.264.780	22,00	$ 1.264.780		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	20	$ 123.941,00	$ 2.478.820	20,00	$ 2.478.820		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6	BATERIAS SANITARIAS												

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
						CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.6.1	BATERIA SANITARIA DOTADA Y AOTA PARA USO (INC. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)	UND	2	$ 12.700.000,00	$ 25.400.000	2,00	$ 25.400.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6.2	CONEXIÓN A REDES EXISTENTES	GLB	1	$ 12.100.000,00	$ 12.100.000	1,00	$ 12.100.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.7	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-01	PASOS ELEVADOS	UND	0	$ 1.500.000,00	$ -	2,00	$ 3.000.000		$ -	2,00	$ 3.000.000	2,00	$ 3.000.000
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	0	$ 130.000,00	$ -	32,00	$ 4.160.000		$ -	32,00	$ 4.160.000	32,00	$ 4.160.000
NP-03	CONSTRUCCION DE TRINCHOS , INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACION Y ESTABILIZACION.	ML	0	$ 125.000,00	$ -	40,00	$ 5.000.000		$ -	40,00	$ 5.000.000	40,00	$ 5.000.000
	SUBTOTAL CAP. 2 HUMEDAL CAÑAGORDAS:				$ 899.561.758		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
3	HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -		$ -
3.1	PRELIMINARES												
3.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	886,8	$ 4.142,00	$ 3.673.126	888,80	$ 3.673.126		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	130	$ 3.683,00	$ 478.790	130,00	$ 478.790		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	98	$ 21.165,00	$ 2.074.170	98,00	$ 2.074.170		$ -		$ -	0,00	$ -
3.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
3.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	3500	$ 3.541,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500		$ -	3500,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500
3.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	45	$ 798.820,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900		$ -	45,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900
3.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	120	$ 449.273,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760		$ -	120,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760
3.2.4	CONTROL DE GUADUALES	M2	0	$ 6.073,00	$ -	600,00	$ 3.643.800		$ -	600,00	$ 3.643.800	600,00	$ 3.643.800
3.3	ADECUACIÓN DE SENDERO PEATONAL												
3.3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)	M2	887	$ 28.208,00	$ 25.020.496	887,00	$ 25.020.496		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	941	$ 68.508,00	$ 64.486.028	941,00	$ 64.486.028		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.3	RETIRO DE ADOQUÍN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M2	591	$ 11.622,00	$ 6.868.602	591,00	$ 6.868.602		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	591	$ 123.941,00	$ 73.249.131	591,00	$ 73.249.131		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.5	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	106	$ 51.500,00	$ 5.459.000	106,00	$ 5.459.000		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1534	$ 7.318,00	$ 11.227.346	1534,00	$ 11.227.346		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4	ESTRUCTURA DE REBOSE-SALIDA												
3.4.1	PRELIMINARES												
3.4.1.1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN	MES	1	$ 9.459.195,00	$ 9.459.195	1,00	$ 9.459.195		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2		$ 3.683,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
3.4.2.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	36,75	$ 22.629,00	$ 831.616	36,75	$ 831.616		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0.05M (NO INC.ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	8,4	$ 21.516,00	$ 180.734	8,40	$ 180.734		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	248,99	$ 37.879,00	$ 9.431.492	248,99	$ 9.431.492		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	134,568	$ 140.297,00	$ 18.879.487	134,57	$ 18.879.487		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	58,569	$ 36.237,00	$ 2.122.365	58,57	$ 2.122.365		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.6	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	199,946	$ 10.540,00	$ 2.107.431	199,95	$ 2.107.431		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.7	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	199,946	$ 51.500,00	$ 10.297.219	199,95	$ 10.297.219		$ -		$ -	0,00	$ -

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL N°2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.4.3	OBRAS DE ARTE												
3.4.3.1	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0,05-0.07M	M2	8,925	$ 40.434,57	$ 360.879	8,93	$ 360.879		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)	M3	6,4365	$ 1.098.197,07	$ 7.068.545	6,44	$ 7.068.545		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1319,85	$ 7.319,00	$ 9.659.982	1319,85	$ 9.659.982		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4	TUBERÍA DE REBOSE												
3.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO ø=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)	ML	114,66	$ 993.960,61	$ 113.967.524	114,66	$ 113.967.524		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)	UND	2,1	$ 13.413.978,60	$ 28.169.355	2,10	$ 28.169.355		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.3	REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA (INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)	M2	8,4	$ 975.800,00	$ 8.196.720	8,40	$ 8.196.720		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.4	REPOSICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0,1M (INC. ACERO DE REFUERZO)	M2	36,75	$ 206.007,56	$ 7.570.778	36,75	$ 7.570.778		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ 526.718.970		$ -		$ 105.896.960		$ 105.896.960
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS				$ 157.304.931		$ 151.812.712		$ 124.025.237		$ 1.594.505		$ 125.619.742
4.1	PRELIMINARES												
4.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	413	$ 4.142,00	$ 1.710.646	120,00	$ 497.040	120,00	$ 497.040		$ -	120,00	$ 497.040
4.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
4.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000		$ -	4000,00	$ 14.164.000
4.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	90	$ 798.820,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800		$ -	90,00	$ 71.893.800
4.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	60	$ 449.273,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380		$ -	60,00	$ 26.956.380
4.3	ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL												
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	24	$ 37.879,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096		$ -	24,00	$ 909.096
4.3.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	15,8	$ 140.297,00	$ 2.188.633	18,00	$ 2.525.346	15,60	$ 2.188.633	2,40	$ 336.713	18,00	$ 2.525.346
4.3.3	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	92	$ 68.508,00	$ 6.302.736	80,00	$ 5.480.640	80,00	$ 5.480.640		$ -	80,00	$ 5.480.640
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	120	$ 250.120,00	$ 30.014.400	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	168	$ 7.319,00	$ 1.229.592	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.6	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	31,2	$ 51.500,00	$ 1.606.800	36,00	$ 1.854.000	31,20	$ 1.606.800	4,80	$ 247.200	36,00	$ 1.854.000
4.3.7	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	31,2	$ 10.540,00	$ 328.848	36,00	$ 379.440	31,20	$ 328.848	4,80	$ 50.592	36,00	$ 379.440
4.4	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-04	CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,0	$ 873.840,00	$ -	18,00	$ 15.729.120		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTAMPADO TEXTURIZADO EN LOSA CONCRETO	M2	0,0	$ 87.196,75	$ -	120,00	$ 10.463.850		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-06	DESMONTE DE CONFINAMIENTO EN GUADUA	ML	0,0	$ 12.000,00	$ -	80,00	$ 960.000		$ -	80,00	$ 960.000	80,00	$ 960.000
	SUBTOTAL CAP. 4 HUMEDAL PARQUEDE LAS GARZAS:				$ 157.304.931		$ 151.812.712		$ 124.025.237		$ 1.594.505		$ 125.619.742
5	HUMEDAL LA BABILLA				$ 90.440.640		$ 88.795.223		$ 60.817.063		$ 27.978.160		$ 88.795.223
5.1	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
5.1.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	800	$ 6.073,00	$ 4.858.400	2546,00	$ 15.461.858	800,00	$ 4.858.400	1746,00	$ 10.603.458	2546,00	$ 15.461.858
5.1.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3.541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	1141,04	$ 4.040.423	2858,96	$ 10.123.577	4000,00	$ 14.164.000
5.1.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	20	$ 798.820,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400		$ -	20,00	$ 15.976.400
5.1.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	80	$ 449.273,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840		$ -	80,00	$ 35.941.840
5.1.5	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	0.00	$ 6.973,00	$ -	500,00	$ 3.486.500		$ -	500,00	$ 3.486.500	500,00	$ 3.486.500
5.2	AIREADORES												
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA	UND	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.3	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA	ML	0	$ 250.975,00	$ -	15,00	$ 3.764.625		$ -	15,00	$ 3.764.625	15,00	$ 3.764.625
	SUBTOTAL CAP. 5 HUMEDAL LA BABILLA:				$ 90.440.640		$ 88.795.223		$ 60.817.063		$ 27.978.160		$ 88.795.223

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA "CVC"

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

							COBRADO ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CONTRATO ACUMULADO	
							CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO				$ 255.627.551			$ 256.527.551		$ 255.627.598		$ 900.000		$ 256.527.598
6.1	PRELIMINARES													
6.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1443,75	$ 4.142,00	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013		$ -	1443,75	$ 5.980.013
6.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA													
6.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	3002,71	$ 6.973,00	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897		$ -	3002,71	$ 20.937.897
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	755,18	$ 84.878,00	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168		$ -	755,18	$ 64.098.168
6.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1316,078	$ 23.586,00	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.224		$ -	1316,08	$ 31.054.224
6.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	2071,258	$ 51.500,00	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787		$ -	2071,26	$ 106.669.787
6.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL													
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	2068,270	$ 13.000,00	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510		$ -	2068,27	$ 26.887.510
6.4	ACTIVIDADES NO PREVISTAS													
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA EN ALFAJOR PARA CAJA ELECTRICA DE 1,1 X 1,37	UND	0	$ 900.000,00	$ -	1,00	$ 900.000		$ -	1,00	$ 900.000	1,00	$ 900.000
	SUBTOTAL CAP. 6 HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO:				$ 255.627.551		$ 256.527.551		$ 255.627.598		$ 900.000		$ 256.527.598
7	HUMEDAL ISIS:				$ 393.409.176		$ 307.853.278		$ -		$ 307.853.278		$ 307.853.278
7.1	PRELIMINARES													
7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1339	$ 4.142,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138		$ -	1339,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138
7.1.2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	M2	325	$ 24.314,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050		$ -	325,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050
7.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA													
7.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	15684,9	$ 6.973,00	$ 109.370.808	10283,00	$ 71.703.359		$ -	10283,00	$ 71.703.359	10283,00	$ 71.703.359
7.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	568	$ 84.878,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704		$ -	568,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704
7.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1371,40	$ 23.586,21	$ 32.350.847	1371,40	$ 32.350.847		$ -	1371,40	$ 32.350.847	1371,40	$ 32.350.847
7.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	1121,7	$ 51.500,00	$ 57.767.550	1939,40	$ 99.879.100		$ -	1939,40	$ 99.879.100	1939,40	$ 99.879.100
7.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL													
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	3250,16	$ 13.000,00	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080		$ -	3250,16	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080
	SUBTOTAL CAP. 7 HUMEDAL ISIS:				$ 393.409.176		$ 307.853.278		$ -		$ 307.853.278		$ 307.853.278

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 06/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO				$ 230.000.000		$ 230.000.000		$ 172.500.000		$ 57.500.000		$ 230.000.000
8.1	ESTRATEGIA												
8.1.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS	UND	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000	2	$ 230.000.000	1,5	$ 172.500.000	0,5	$ 57.500.000	2	$ 230.000.000
	SUBTOTAL CAP. 8 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO:				$ 230.000.000		$ 230.000.000		$ 172.500.000		$ 57.500.000		$ 230.000.000
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES				$ 111.100.000		$ 111.100.000		$ 50.500.000		$ 60.600.000		$ 111.100.000
9.1	DIAGNÓSTICO												
9.1.1	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	UND	11	$ 10.100.000,00	$ 111.100.000	11	$ 111.100.000	5	$ 50.500.000	6	$ 60.600.000	11	$ 111.100.000
	SUBTOTAL CAP. 9 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES:				$ 111.100.000		$ 111.100.000		$ 50.500.000		$ 60.600.000		$ 111.100.000
	VALOR COSTOS TOTALES				$ 2.615.517.236		$ 2.615.517.236		$ 1.026.222.408		$ 909.125.886		$ 1.935.348.294
	COSTOS INDIRECTOS												
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)				$ 150.000.000		$ 150.000.000,00		$ 58.853.889,07		$ 52.138.399,61		$ 110.992.288,69
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 29.950.045		$ 29.950.045,30				$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 2.615.517.236		$ 2.615.517.236		$ 1.026.222.408,49		$ 909.125.885,64		$ 1.935.348.294,13
	ADMINISTRACION	25,75%			$ 673.495.688		$ 673.495.688		$ 264.252.270		$ 234.099.816		$ 498.352.186
	IMPREVISTOS	0,25%			$ 6.538.793		$ 6.538.793		$ 2.565.556		$ 2.272.815		$ 4.838.371
	UTILIDAD	4%			$ 104.620.689		$ 104.620.689		$ 41.048.896		$ 36.365.035		$ 77.413.932
	TOTAL AIU	30,00%			$ 784.655.171		$ 784.655.171		$ 307.866.723		$ 272.737.766		$ 580.604.488
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 19.877.930		$ 19.877.930		$ 7.799.290		$ 6.909.356		$ 14.708.647
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718
	COSTO TOTAL OBRA				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718

ESTADO DE CUENTAS	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 1.080.000.114 60
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 420.222.693,03
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 372.273.422,09
SALDO AMORTIZADO	$ 792.496.115,12
SALDO POR AMORTIZAR	$ 287.503.999 48

EJECUCION	
OBRA CONTRATADA	$ 3.600.000.382 00
OBRA EJECUTADA A LA FECHA	$ 2.641.653.718,06
VALOR ACTA PARCIAL No.2:	$ 1.240.911.406,95
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:	$ 372.273.422,09
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.2:	$ 868.637.984,87
% EJECUTADO ACTA	34,47%
% EJECUTADO A LA FECHA	73,38%

V° B° Interventoría
Arq. Jeannete Nieto López
Representante legal
Consorcio Interventoria Humedales 2025

V° B° Contratista
Guillermo Paz Muñoz
Representante legal
Fundacion Construyamos Futuro Construfuturo

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	ETAPA PRECONSTRUCCIÓN				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	SOCIALIZACIÓN	UND	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000	6	$ 10.200.000		$ -	6	$ 10.200.000
1.1.2	REVISIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS	UND	6	$ 5.800.000,00	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000	6	$ 34.800.000		$ -	6	$ 34.800.000
	SUBTOTAL CAP 1 ETAPA PRECONSTRUCCIÓN:				$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ 45.000.000		$ -		$ 45.000.000
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS				$ 899.561.788		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
2.1	PRELIMINARES												
2.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1986	$ 4.142,00	$ 8.226.012	2257,20	$ 9.349.322	1986,00	$ 8.226.012	271,20	$ 1.123.310	2257,20	$ 9.349.322
2.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	1986	$ 3.683,00	$ 7.314.438	2257,20	$ 8.313.268	1986,00	$ 7.314.438	271,20	$ 998.830	2257,20	$ 8.313.268
2.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	0	$ 21.165,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	0,00	$ -	100,00	$ 2.116.500	100,00	$ 2.116.500
2.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
2.2.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	12000	$ 6.073,00	$ 72.876.000	7521,40	$ 45.677.462	7521,40	$ 45.677.462		$ -	7521,40	$ 45.677.462
2.2.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	18000	$ 3.541,00	$ 63.738.000	18000,00	$ 63.738.000	2500,00	$ 8.852.500	15500,00	$ 54.885.500	18000,00	$ 63.738.000
2.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	100	$ 788.820,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000	100,00	$ 79.882.000		$ -	100,00	$ 79.882.000
2.2.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	100	$ 449.273,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300	100,00	$ 44.927.300		$ -	100,00	$ 44.927.300
2.2.5	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	0,00	$ 13.000,00	$ -	944,82	$ 12.282.673	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES												
2.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	377	$ 37.879,00	$ 14.280.383	467,15	$ 17.684.885	377,00	$ 14.280.383	90,15	$ 3.414.602	467,15	$ 17.694.985
2.3.2	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	507,6	$ 10.540,00	$ 5.350.104	707,15	$ 7.453.308	507,60	$ 5.350.104	199,42	$ 2.101.887	707,02	$ 7.451.991
2.3.3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	507,6	$ 51.500,00	$ 26.141.400	729,15	$ 37.550.968	507,60	$ 26.141.400	221,55	$ 11.409.568	729,15	$ 37.550.968
2.3.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	139	$ 140.297,00	$ 19.501.283	370,58	$ 51.991.262	139,00	$ 19.501.283	231,58	$ 32.489.979	370,58	$ 51.991.262
2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	3122	$ 57.490,00	$ 179.483.780	2675,50	$ 153.814.495	544,00	$ 31.274.560	1528,25	$ 87.859.093	2072,25	$ 119.133.653
2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	1786	$ 123.941,00	$ 221.358.626	1567,50	$ 194.277.518	212,40	$ 26.325.068	1022,60	$ 126.742.067	1235,00	$ 153.067.135
2.4	PASOS ELEVADOS												
2.4.1	FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA - ACERO ESTRUCTURAL 60000 PSI	KLS	2997,3	$ 20.675,00	$ 61.969.178	2997,30	$ 61.969.178		$ -		$ -	0,00	$ -
2.4.2	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	5,13	$ 1.085.280,00	$ 5.567.486	5,13	$ 5.567.486		$ -	5,13	$ 5.567.486	5,13	$ 5.567.486
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	909,21	$ 7.319,00	$ 6.654.508	909,21	$ 6.654.508		$ -	613,54	$ 4.490.499	613,54	$ 4.490.499
2.4.4	EXCAVACIÓN MANUAL H>2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	22	$ 65.621,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662		$ -	22,00	$ 1.443.662	22,00	$ 1.443.662
2.5	PERGOLA DE RECIBIMIENTO PARA VISITANTES												
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	28,51	$ 78.746,00	$ 2.245.048	28,51	$ 2.245.048		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA EN MADERA ESTRUCTURAL DOBLE 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	81,2	$ 148.794,00	$ 12.082.073	81,20	$ 12.082.073		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN MADERA ESTRUCTURAL 4X8,6CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ)	ML	58,92	$ 53.510,00	$ 3.152.809	58,92	$ 3.152.809		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA EN MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. INMUNIZANTE Y BARNIZ, NO INC. ANCLAJE A PLATINA DE CIMENTACIÓN)	ML	22,8	$ 106.158,00	$ 2.420.402	22,80	$ 2.420.402		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES AÉREAS PARA PERFILES DE MADERA ESTRUCTURAL	UND	96	$ 122.585,00	$ 11.768.160	96,00	$ 11.768.160		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS DE CONEXIÓN A CIMENTACIÓN PARA COLUMNAS DE MADERA ESTRUCTURAL 6X14CM (INC. CONCRETO DE NIVELACIÓN)	UND	6	$ 331.621,00	$ 1.989.726	6,00	$ 1.989.726		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.7	CABALLETE PARA CUBIERTA	ML	5,8	$ 55.091,00	$ 319.528	5,80	$ 319.528		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO COLONIAL (INC. CAÑA BRAVA)	M2	39,8	$ 114.095,00	$ 4.540.981	39,80	$ 4.540.981		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.9	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI	M3	1	$ 1.085.280,00	$ 1.085.280	1,00	$ 1.085.280		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)	ML	22	$ 57.490,00	$ 1.264.780	22,00	$ 1.264.780		$ -		$ -	0,00	$ -
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	20	$ 123.941,00	$ 2.478.820	20,00	$ 2.478.820		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6	BATERIAS SANITARIAS												

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
2.6.1	BATERIA SANITARIA DOTADA Y AOTA PARA USO (INC. INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ACCESORIOS)	UND	2	$ 12.700.000,00	$ 25.400.000	2,00	$ 25.400.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.6.2	CONEXIÓN A REDES EXISTENTES	GLB	1	$ 12.100.000,00	$ 12.100.000	1,00	$ 12.100.000		$ -		$ -	0,00	$ -
2.7	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-01	PASOS ELEVADOS	UND	0	$ 1.500.000,00	$ -	2,00	$ 3.000.000		$ -	2,00	$ 3.000.000	2,00	$ 3.000.000
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	0	$ 130.000,00	$ -	32,00	$ 4.160.000		$ -	32,00	$ 4.160.000	32,00	$ 4.160.000
NP-03	CONSTRUCCION DE TRINCHOS , INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACION Y ESTABILIZACION.	ML	0	$ 125.000,00	$ -	40,00	$ 5.000.000		$ -	40,00	$ 5.000.000	40,00	$ 5.000.000
	SUBTOTAL CAP. 2 HUMEDAL CAÑAGORDAS:				$ 899.561.768		$ 897.711.503		$ 317.752.511		$ 346.802.983		$ 664.555.493
3	HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ -		$ -		$ -		$ -
3.1	PRELIMINARES												
3.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	886,8	$ 4.142,00	$ 3.673.126	886,80	$ 3.673.126		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2	130	$ 3.683,00	$ 478.790	130,00	$ 478.790		$ -		$ -	0,00	$ -
3.1.3	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).	ML	98	$ 21.165,00	$ 2.074.170	98,00	$ 2.074.170		$ -		$ -	0,00	$ -
3.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
3.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	3500	$ 3.541,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500		$ -	3500,00	$ 12.393.500	3500,00	$ 12.393.500
3.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	45	$ 798.820,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900		$ -	45,00	$ 35.946.900	45,00	$ 35.946.900
3.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M	UND	120	$ 449.273,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760		$ -	120,00	$ 53.912.760	120,00	$ 53.912.760
3.2.4	CONTROL DE GUADUALES	M2	0	$ 6.073,00	$ -	600,00	$ 3.643.800		$ -	600,00	$ 3.643.800	600,00	$ 3.643.800
3.3	ADECUACIÓN DE SENDERO PEATONAL												
3.3.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SENDERO EN ADOQUÍN EXISTENTE (INC. REALCE DE PIEZAS UNDIDAS Y LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA)	M2	887	$ 28.208,00	$ 25.020.496	887,00	$ 25.020.496		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.2	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	941	$ 68.508,00	$ 64.466.028	941,00	$ 64.466.028		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.3	RETIRO DE ADOQUÍN 20106 EXISTENTE (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M2	591	$ 11.622,00	$ 6.868.602	591,00	$ 6.868.602		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	591	$ 123.941,00	$ 73.249.131	591,00	$ 73.249.131		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.5	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	106	$ 51.500,00	$ 5.459.000	106,00	$ 5.459.000		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1534	$ 7.319,00	$ 11.227.346	1534,00	$ 11.227.346		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4	ESTRUCTURA DE REBOSE-SALIDA												
3.4.1	PRELIMINARES												
3.4.1.1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA PARA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CHEQUEO DE NIVELES EN EXCAVADO E INSTALACIÓN	MES	1	$ 9.459.195,00	$ 9.459.195	1,00	$ 9.459.195		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.1.2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M	M2		$ 3.683,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2	MOVIMIENTOS DE TIERRA												
3.4.2.1	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO E=01M (NO INC. ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	36,75	$ 22.629,00	$ 831.616	36,75	$ 831.616		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO E=0,05M (NO INC.ACARREO A PUNTO DE ACOPIO)	M2	8,4	$ 21.516,00	$ 180.734	8,40	$ 180.734		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	248,99	$ 37.879,00	$ 9.431.492	248,99	$ 9.431.492		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	134,568	$ 140.297,00	$ 18.879.487	134,57	$ 18.879.487		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE SITIO	M3	58,569	$ 36.237,00	$ 2.122.365	58,57	$ 2.122.365		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.6	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	199,946	$ 10.540,00	$ 2.107.431	199,95	$ 2.107.431		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.2.7	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	199,946	$ 51.500,00	$ 10.297.219	199,95	$ 10.297.219		$ -		$ -	0,00	$ -

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
3.4.3	OBRAS DE ARTE												
3.4.3.1	SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05-0.07M	M2	8,925	$ 40.434,57	$ 360.879	8,93	$ 360.879		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.2	CONCRETO 4000 PSI PARA LOSA DE FONDO Y MUROS (INC. FORMALETA)	M3	6,4365	$ 1.098.197,07	$ 7.068.545	6,44	$ 7.068.545		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	1319,85	$ 7.319,00	$ 9.659.982	1319,85	$ 9.659.982		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4	TUBERÍA DE REBOSE												
3.4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE HORMIGON REFORZADO a=24" (INC. CAMA DE SOPORTE EN MATERIAL GRANULAR)	ML	114,66	$ 993.960,61	$ 113.967.524	114,66	$ 113.967.524		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA ESPECIAL EM CONCRETO REFORZADO TIPO I EMCALI (INC. EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO)	UND	2,1	$ 13.413.978,60	$ 28.169.355	2,10	$ 28.169.355		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.3	REPOSICIÓN DE CAPA DE RODADURA ASFALTICA (INC. SUMINISTRO, COMPACTACIÓN Y ACABADO)	M2	8,4	$ 975.800,00	$ 8.196.720	8,40	$ 8.196.720		$ -		$ -	0,00	$ -
3.4.4.4	REPOSICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0,1M (INC. ACERO DE REFUERZO)	M2	36,75	$ 206.007,56	$ 7.570.778	36,75	$ 7.570.778		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 HUMEDAL PANAMERICANO				$ 523.073.170		$ 628.718.970		$ -		$ 105.896.860		$ 105.896.860
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS				$ 157.304.931		$ 151.812.712		$ 124.025.237		$ 1.594.505		$ 125.619.742
4.1	PRELIMINARES												
4.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	413	$ 4.142,00	$ 1.710.646	120,00	$ 497.040	120,00	$ 497.040		$ -	120,00	$ 497.040
4.2	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
4.2.1	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3,541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000		$ -	4000,00	$ 14.164.000
4.2.2	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	90	$ 798.820,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800	90,00	$ 71.893.800		$ -	90,00	$ 71.893.800
4.2.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	60	$ 449.273,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380	60,00	$ 26.956.380		$ -	60,00	$ 26.956.380
4.3	ADECUACIÓN DE ACCESO PEATONAL												
4.3.1	EXCAVACIÓN MANUAL H<2,5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	24	$ 37.879,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096	24,00	$ 909.096		$ -	24,00	$ 909.096
4.3.2	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO	M3	15,6	$ 140.297,00	$ 2.188.633	18,00	$ 2.525.346	15,60	$ 2.188.633	2,40	$ 336.713	18,00	$ 2.525.346
4.3.3	BORDILLO EN CONCRETO 15X15	ML	92	$ 68.508,00	$ 6.302.736	80,00	$ 5.480.640	80,00	$ 5.480.640		$ -	80,00	$ 5.480.640
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PERMEABLE40406 (INC. CAPA DE GRAVADE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)	M2	120	$ 250.120,00	$ 30.014.400	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	KLS	168	$ 7.319,00	$ 1.229.592	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3.6	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	31,2	$ 51.500,00	$ 1.606.800	36,00	$ 1.854.000	31,20	$ 1.606.800	4,80	$ 247.200	36,00	$ 1.854.000
4.3.7	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO	M3	31,2	$ 10.540,00	$ 328.848	36,00	$ 379.440	31,20	$ 328.848	4,80	$ 50.592	36,00	$ 379.440
4.4	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-04	CONSTRUCCIÓN LOSA EN CONCRETO SIMPLE MR-38, INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU CORRESPONDIENTE SELLADO.	M3	0,0	$ 873.840,00	$ -	18,00	$ 15.729.120		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTAMPADO TEXTURIZADO EN LOSA CONCRETO	M2	0,0	$ 87.198,75	$ -	120,00	$ 10.463.850		$ -		$ -	0,00	$ -
NP-06	DESMONTE DE CONFINAMIENTO EN GUADUA	ML	0.0	$ 12.000,00	$ -	80,00	$ 960.000		$ -	80,00	$ 960.000	80,00	$ 960.000
	SUBTOTAL CAP. 4 HUMEDAL PARQUEDE LAS GARZAS:				$ 157.304.931		$ 151.812.712		$ 124.025.237		$ 1.594.505		$ 125.619.742
5	HUMEDAL LA BABILLA				$ 90.440.640		$ 88.795.223		$ 60.817.063		$ 27.978.160		$ 88.795.223
5.1	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA												
5.1.1	CONTROL DE GUADUALES	M2	800	$ 6.073,00	$ 4.858.400	2546,00	$ 15.461.858	800,00	$ 4.858.400	1746,00	$ 10.603.458	2546,00	$ 15.461.858
5.1.2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA	M2	4000	$ 3,541,00	$ 14.164.000	4000,00	$ 14.164.000	1141,04	$ 4.040.423	2858,96	$ 10.123.577	4000,00	$ 14.164.000
5.1.3	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M	UND	20	$ 798.820,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400	20,00	$ 15.976.400		$ -	20,00	$ 15.976.400
5.1.4	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO <12M	UND	80	$ 449.273,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840	80,00	$ 35.941.840		$ -	80,00	$ 35.941.840
5.1.5	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	0.00	$ 6.973,00	$ -	500,00	$ 3.486.500		$ -	500,00	$ 3.486.500	500,00	$ 3.486.500
5.2	AIREADORES												
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREADOR PARA ESPEJO DE AGUA	UND	1	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.3	ACTIVIDADES NO PREVISTAS												
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA	ML	0	$ 250.975,00	$ -	15,00	$ 3.764.625		$ -	15,00	$ 3.764.625	15,00	$ 3.764.625
	SUBTOTAL CAP. 5 HUMEDAL LA BABILLA:				$ 90.440.640		$ 88.795.223		$ 60.817.063		$ 27.978.160		$ 88.795.223

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA "CVC"

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACION ACTUAL	11/04/2026

							ACTUALIZADOS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		CANTIDAD ACUMULADA	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO				$ 255.627.551		$ 256.527.551		$ 255.627.598		$ 900.000		$ 256.527.598	
6.1	PRELIMINARES													
6.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1443,75	$ 4.142,00	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013	1443,75	$ 5.980.013		$ -	1443,75	$ 5.980.013
6.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA													
6.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	3002,71	$ 6.973,00	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897	3002,71	$ 20.937.897		$ -	3002,71	$ 20.937.897
6.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	755,18	$ 84.878,00	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168	755,18	$ 64.098.168		$ -	755,18	$ 64.098.168
6.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1316,078	$ 23.586,00	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.176	1316,08	$ 31.054.224		$ -	1316,08	$ 31.054.224
6.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	2071,258	$ 51.500,00	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787	2071,26	$ 106.669.787		$ -	2071,26	$ 106.669.787
6.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL													
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	2068,270	$ 13.000,00	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510	2068,27	$ 26.887.510		$ -	2068,27	$ 26.887.510
6.4	ACTIVIDADES NO PREVISTAS													
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA EN ALFAJOR PARA CAJA ELECTRICA DE 1,1 X 1,37	UND	0	$ 900.000,00	$ -	1,00	$ 900.000		$ -	1,00	$ 900.000	1,00	$ 900.000
	SUBTOTAL CAP. 6 HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO:				$ 255.627.551		$ 256.527.551		$ 255.627.598		$ 900.000		$ 256.527.598
7	HUMEDAL IBIS				$ 303.409.178		$ 307.853.278		$ -		$ 307.853.278		$ 307.853.278
7.1	PRELIMINARES													
7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA	M2	1339	$ 4.142,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138		$ -	1339,00	$ 5.546.138	1339,00	$ 5.546.138
7.1.2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS	M2	325	$ 24.314,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050		$ -	325,00	$ 7.902.050	325,00	$ 7.902.050
7.2	LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA													
7.2.1	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	15684,9	$ 6.973,00	$ 109.370.808	10283,00	$ 71.703.359		$ -	10283,00	$ 71.703.359	10283,00	$ 71.703.359
7.2.2	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	568	$ 84.878,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704		$ -	568,00	$ 48.210.704	568,00	$ 48.210.704
7.2.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)	M3	1371,40	$ 23.586,21	$ 32.359.847	1371,40	$ 32.359.847		$ -	1371,40	$ 32.359.847	1371,40	$ 32.359.847
7.2.4	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE	M3	1121,7	$ 51.500,00	$ 57.767.550	1939,40	$ 99.879.100		$ -	1939,40	$ 99.879.100	1939,40	$ 99.879.100
7.3	RECUPERACIÓN AMBIENTAL													
	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL	M2	3250,16	$ 13.000,00	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080		$ -	3250,16	$ 42.252.080	3250,16	$ 42.252.080
	SUBTOTAL CAP. 7 HUMEDAL IBIS:				$ 303.409.178		$ 307.853.278		$ -		$ 307.853.278		$ 307.853.278

HUMEDALES URBANOS

COPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC

ACTA PARCIAL No.2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	PLAZO INICIAL	31/12/2025
No. CONTRATO	0741 DEL 2025	FECHA DE INICIO	07/10/2025
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
VALOR CONTRATO	$ 3.600.000.382	FECHA SUSPENSION 1	29/12/2025
PERIODO FACTURACION	06/12/2025 a 29/12/2025 y 09/02/2026 a 13/02/2026	FECHA SUSPENSION 2	29/01/2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025	FECHA REANUDACION	09/02/2026
CONTRATO INTERVENTORIA	0752 de 2025	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	11/04/2026

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT	VR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANT.	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	PRESENTE ACTA VALOR	CANTIDAD ACUMULADA CANT.	CANTIDAD ACUMULADA VALOR
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO				$ 230.000.000		$ 230.000.000		$ 172.500.000		$ 57.500.000		$ 230.000.000
8.1	ESTRATEGIA												
8.1.1	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HÚMEDALES PRIORIZADOS	UND	2	$ 115.000.000,00	$ 230.000.000	2	$ 230.000.000	1,5	$ 172.500.000	0,5	$ 57.500.000	2	$ 230.000.000
	SUBTOTAL CAP. 8 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO:				$ 230.000.000		$ 230.000.000		$ 172.500.000		$ 57.500.000		$ 230.000.000
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES				$ 111.100.000		$ 111.100.000		$ 50.500.000		$ 60.600.000		$ 111.100.000
9.1	DIAGNÓSTICO												
9.1.1	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES	UND	11	$ 10.100.000,00	$ 111.100.000	11	$ 111.100.000	5	$ 50.500.000	6	$ 60.600.000	11	$ 111.100.000
	SUBTOTAL CAP. 9 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES:				$ 111.100.000		$ 111.100.000		$ 50.500.000		$ 60.600.000		$ 111.100.000
	VALOR COSTOS TOTALES				$ 2.615.517.236		$ 2.615.517.236		$ 1.026.222.408		$ 909.125.886		$ 1.935.348.294
	COSTOS INDIRECTOS												
	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PIPMA)				$ 150.000.000		$ 150.000.000,00		$ 58.853.889,07		$ 52.138.399,61		$ 110.992.288,68
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 29.950.045		$ 29.950.045,30				$ -		$ -
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 2.615.517.236		$ 2.615.517.236		$ 1.026.222.408,49		$ 909.125.885,84		$ 1.935.348.294,13
	ADMINISTRACION	25,75%			$ 673.495.688		$ 673.495.688		$ 264.252.270		$ 234.099.916		$ 498.352.186
	IMPREVISTOS	0,25%			$ 6.538.793		$ 6.538.793		$ 2.565.556		$ 2.272.815		$ 4.838.371
	UTILIDAD	4%			$ 104.620.689		$ 104.620.689		$ 41.048.898		$ 36.365.035		$ 77.413.932
	TOTAL AIU	30,00%			$ 784.655.171		$ 784.655.171		$ 307.866.723		$ 272.737.766		$ 580.604.488
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 19.877.930		$ 19.877.930		$ 7.799.290		$ 6.909.356		$ 14.708.647
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718
	COSTO TOTAL OBRA				$ 3.600.000.382		$ 3.600.000.382		$ 1.400.742.310		$ 1.240.911.407		$ 2.641.653.718

ESTADO DE CUENTAS	
ANTICIPO ENTREGADO	$ 1.080.000.114,60
VALOR AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 420.222.693,03
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 372.273.422,09
SALDO AMORTIZADO	$ 792.496.115,12
SALDO POR AMORTIZAR	$ 287.503.999,48

EJECUCIÓN	
OBRA CONTRATADA	$ 3.600.000.382,00
OBRA EJECUTADA A LA FECHA	$ 2.641.653.718,06
VALOR ACTA PARCIAL No.2:	$ 1.240.911.406,95
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA:	$ 372.273.422,09
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA No.2:	$ 868.637.984,87
% EJECUTADO ACTA	34,47%
% EJECUTADO A LA FECHA	73,38%

V° B° Interventoría
Arq. Jeannete Nieto López
Representante legal
Consorcio Interventoría Humedales 2025

V° B° Contratista
Guillermo Paz Muñoz
Representante legal
Fundación Construyamos Futuro Construfuturo

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.1.1	m2	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Tramo 6		101	0,5		51,60
Tramo 7		75	1,8		135
Tramo 8		47	1,8		84,6
		TOTAL			271,2
		CONTRACTUAL			1986

PLANO

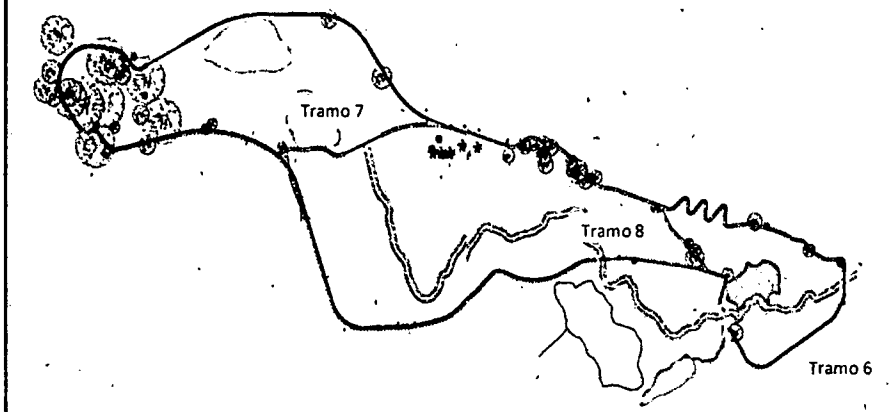

REGISTRO FOTOGRAFICO

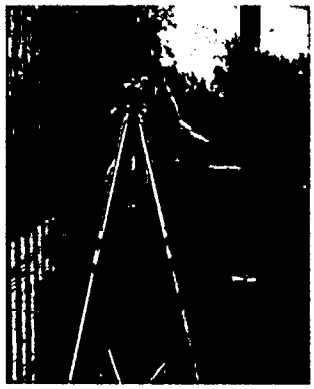

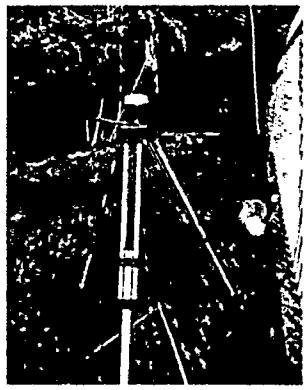

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.1.2	m2	DESCAPOTE MANUAL H=0.1M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Tramo 6		101	0,5		51,60
Tramo 7		75	1,8		135
Tramo 8		47	1,8		84,6
					0
					0,00
		TOTAL			271,2
		CONTRACTUAL			1986

PLANO

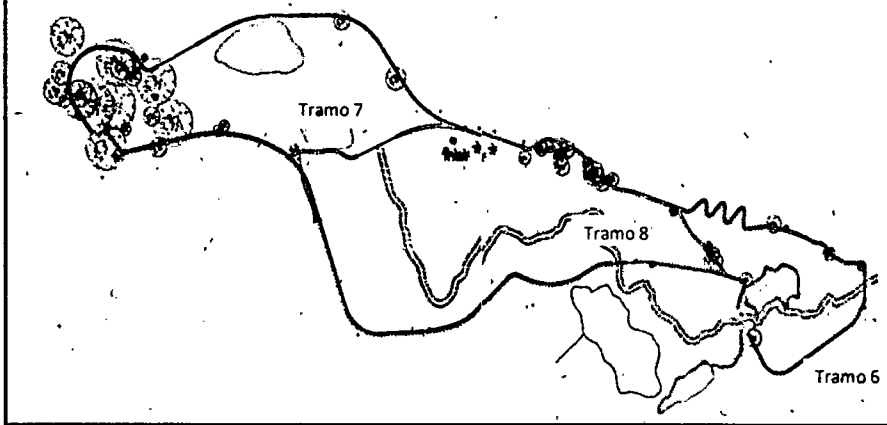

REGISTRO FOTOGRAFICO

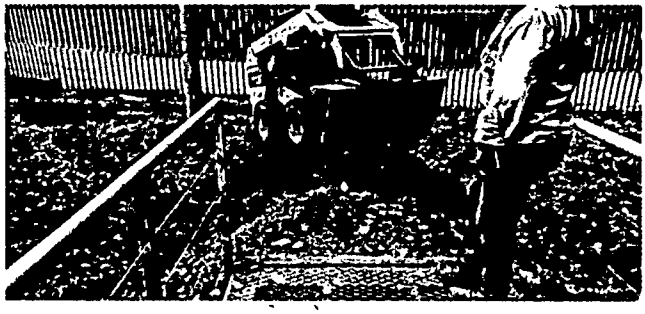

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.1.3	ml	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON ESTRUCTURA EN GUADUA DE AL MENOS 2 METROS DE ALTURA LIBRE (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA).

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Cerramiento Lote privado - Humedal		100			100
					0
					0
					0
					0
					0,00
		TOTAL			100
		CONTRACTUAL			0

PLANO

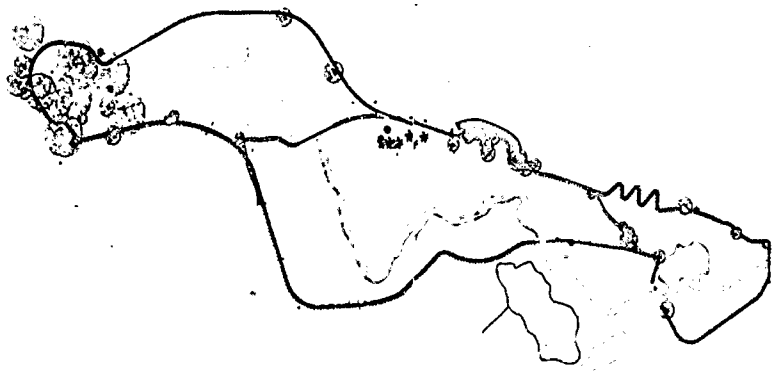

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.2.2	m2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Control hormiga arriera				15500	15500
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			15500
		CONTRACTUAL			18000

PLANO

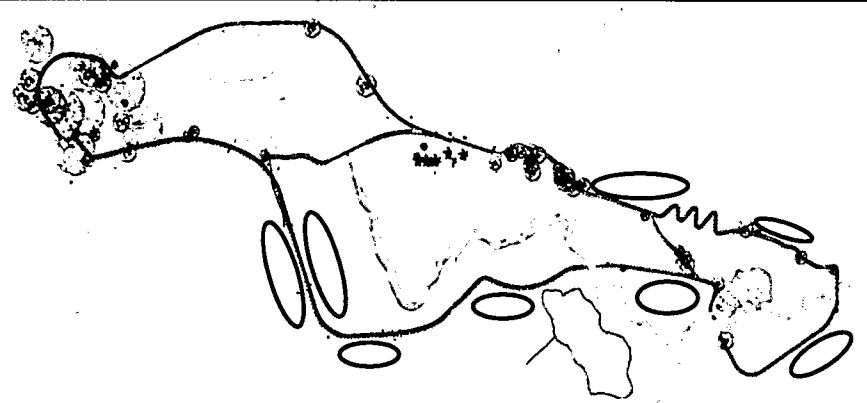

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.1	M3	EXCAVACIÓN MANUAL H<2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	-0,42	0,25	-21,48
Tramo 2		95	-0,55	0,3	-15,68
Tramo 3		366	-0,55	0,3	-60,39
Tramo 4		210,36	1,2	0,3	75,73
Tramo 5		88	1,2	0,3	31,68
Tramo 6		101	1,2	0,3	36,36
Tramo 7		75	1,2	0,3	27,00
Tramo 8		47	1,2	0,3	16,92
		TOTAL			90,15
		CONTRACTUAL			377,0

PLANO

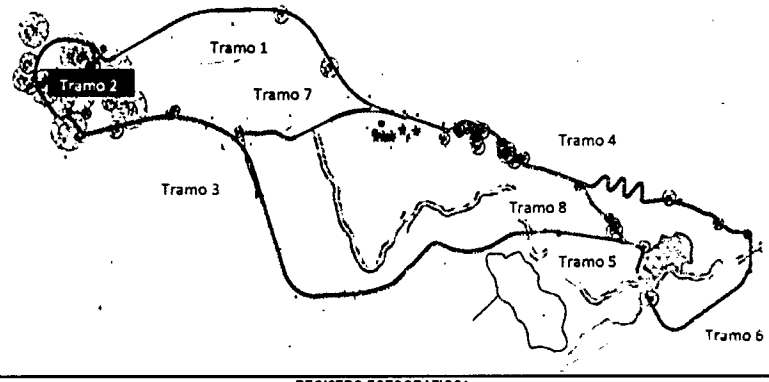

REGISTRO FOTOGRAFICO

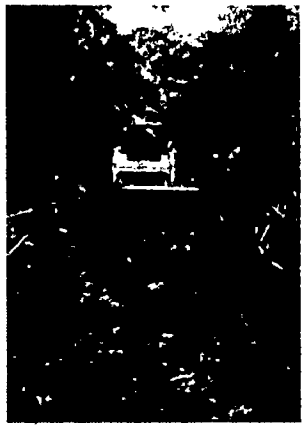



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.2	M3	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO

UBICACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	-0,42	0,25	-21,48
Tramo 2		95	-0,55	0,3	-15,68
Tramo 3		366	-0,55	0,3	-60,39
Tramo 5		88	1,2	0,3	31,68
Tramo 6		101	1,2	0,3	36,36
Tramo 7		75	1,2	0,3	27,00
Tramo 8		47	1,2	0,3	16,92
Viajes de guadua anteriores limpiezas almacenados en el humedal	185				185
		TOTAL			199,42
		CONTRACTUAL			507,6

PLANO

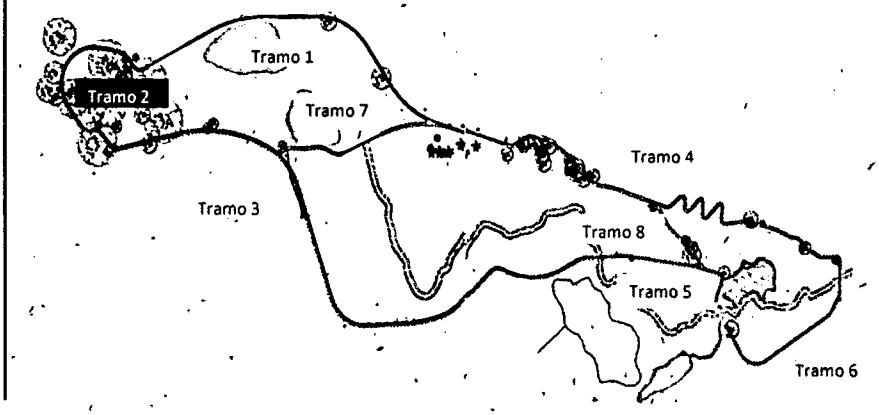

REGISTRO FOTOGRAFICO

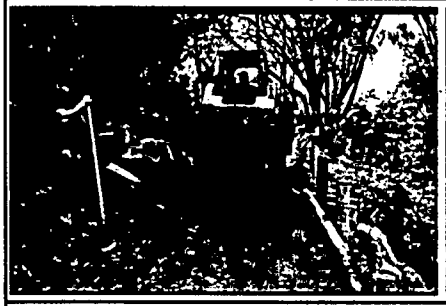



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.3	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

UBICACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1		207	-0,42	0,25	-21,48
Tramo 2		95	-0,55	0,3	-15,68
Tramo 3		366	-0,55	0,3	-60,39
Tramo 5		88	1,2	0,3	31,68
Tramo 6		101	1,2	0,3	36,36
Tramo 7		75	1,2	0,3	27,00
Tramo 8		47	1,2	0,3	16,92
Excavacion cimentacion puentes peatonales	5	1,2	1,8	2,05	22,13
Viajes de guadua anteriores limpiezas	185				185
		TOTAL			221,5
		CONTRACTUAL			507,6

PLANO

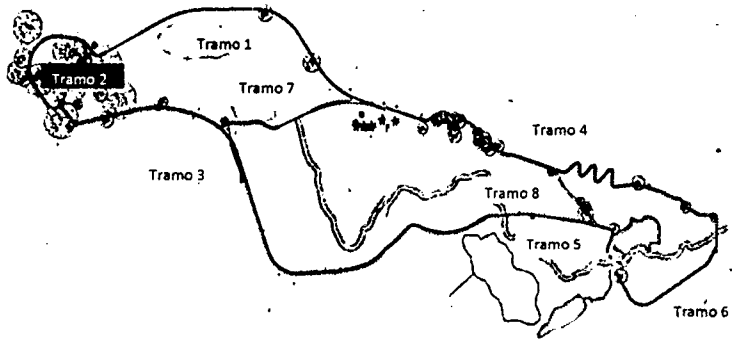

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.4	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1 - cobro acta 1 pendiente		207		0,078	16,146
Tramo 2 - cobro acta 1 pendiente		95		0,078	7,41
Tramo 3 - cobro acta 1 pendiente		366		0,078	28,55
Tramo 4 - cobro acta 1 pendiente		55,94		0,078	4,36
Tramo 4		219,06	1,8	0,15	59,15
Tramo 5		88	1,8	0,15	23,76
Tramo 6		101	1,8	0,15	27,27
Tramo 7		75	1,8	0,15	20,25
Tramo 8		47	1,8	0,15	12,69
Relleno hueco tramo 5 para puente peatonal	32				32
		TOTAL			231,58
		CONTRACTUAL			139,0

PLANO

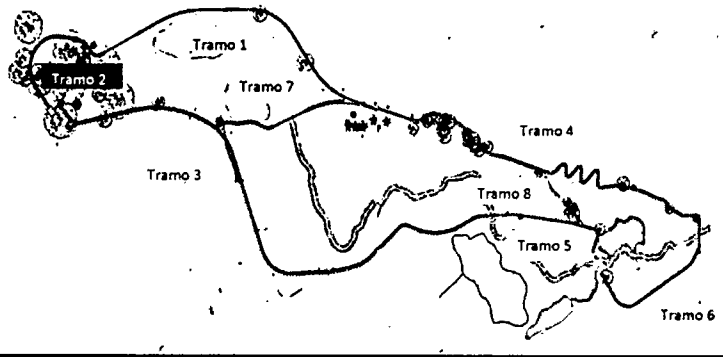

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO 10X20 (NO INC. ACARREOS)


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1	2	30			60
Transversales tramo 1	19	1,25			23,75
Transversales tramo 2	9	1,25			11,25
Tramo 3	2	100			200
Tramo 4	2	275			550
Transversales tramo 4	11	1,25			13,75
Tramo 5	2	88			176
Transversales tramo 5	11	1,25			13,75
Tramo 6	2	101			202
Transversales tramo 6	12	1,25			15
Tramo 7	2	75			150
Transversales tramo 7	7	1,25			8,75
Tramo 8	2	47			94
Transversales tramo 8	8	1,25			10
			TOTAL		1528,25
			CONTRACTUAL		3122,0

PLANO

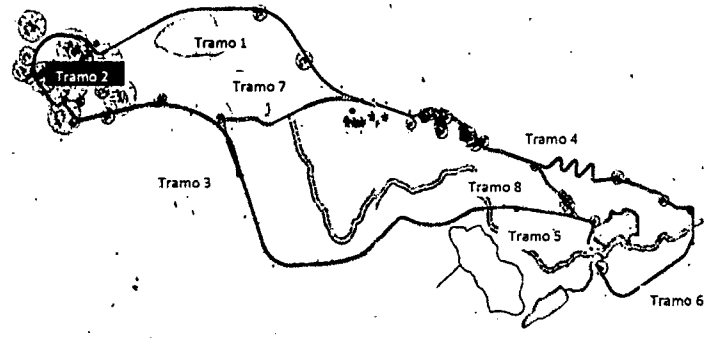

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.3.6	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN 20106 (INC. CAPA DE ARENA DE APOYO, INC. SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Tramo 1 - Cobro acta 1 por 1,2		177	0,05		8,85
Tramo 1		30	1,25		37,5
Tramo 2		95	1,25		118,75
Tramo 3		100	1,25		125
Tramo 4		275	1,25		343,75
Tramo 5		88	1,25		110
Tramo 6		101	1,25		126,25
Tramo 7		75	1,25		93,75
Tramo 8		47	1,25		58,75
		TOTAL			1022,6
		CONTRACTUAL			1786,0

PLANO

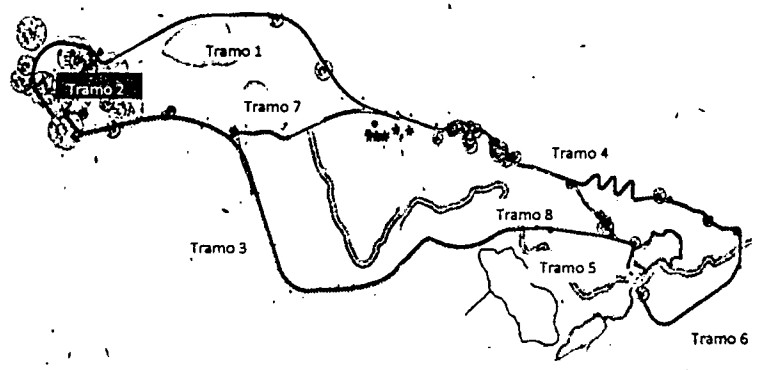

REGISTRO FOTOGRAFICO

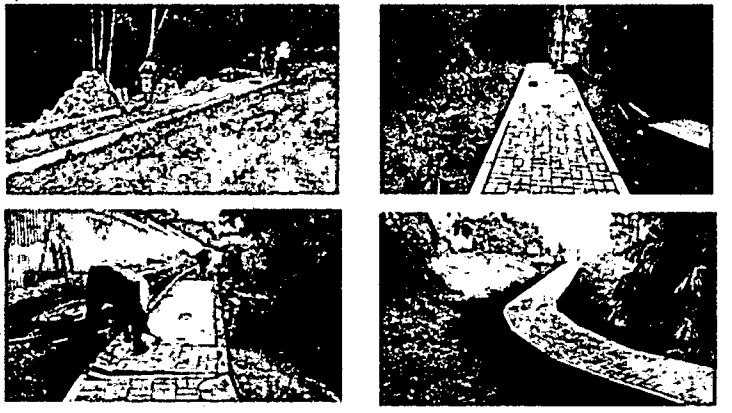

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.4.2	m3	CONCRETO PARA PEDESTAL DE CIMENTACIÓN 3500PSI

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO/ESPESOR	
Cimentacion Puentes Peatonales	5	1,2	1,8	0,3	3,24
Pedestal	5	0,3	0,3	1,5	0,69
Viga	5	0,4	0,4	1,5	1,2
					0
					0
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			5,13
		CONTRACTUAL			5,13

PLANO

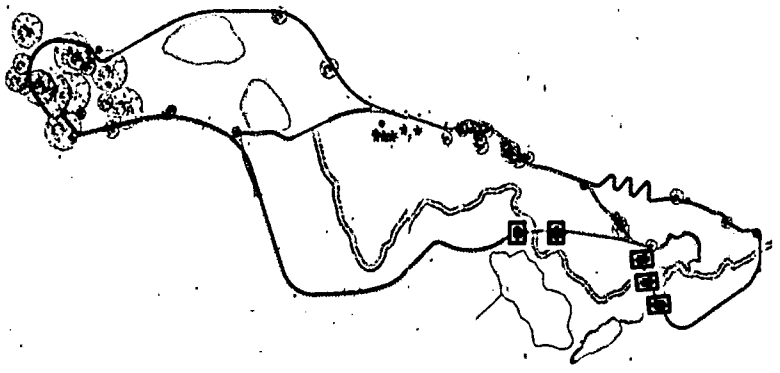

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.4.3	KLS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FLEJADO 60000 PSI


UBICACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	TIPO	PESO (KG/M)	PESO TOTAL	
ZAPATA						
Flejes parrila inferior	70	1,35	#4	0,996	1,34	94,12
	30	1,95	#4	0,996	1,94	58,27
Flejes parrilla superior	70	1,35	#4	0,996	1,34	94,12
	30	1,95	#4	0,996	1,94	58,27
Pedestal	80	2,15	#4	0,996	2,14	171,31
	120	0,7	#3	0,56	0,39	47,04
Viga superior	40	1,7	#4	0,996	1,69	67,73
	45	0,9	#3	0,56	0,50	22,68
		TOTAL				613,54
		CONTRACTUAL				909,2

PLANO

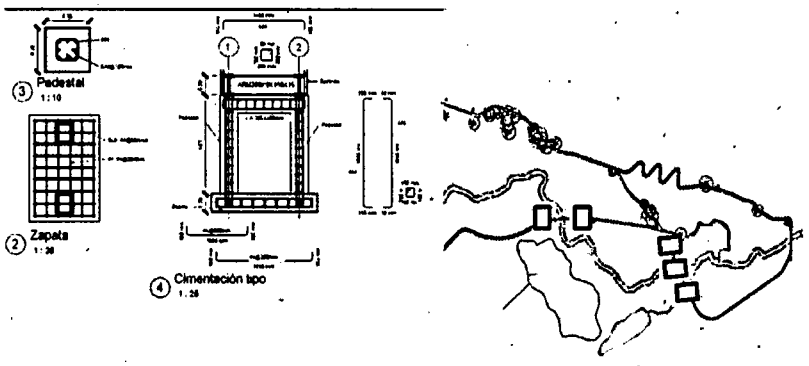

REGISTRO FOTOGRAFICO

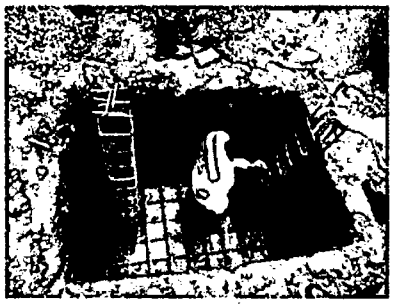

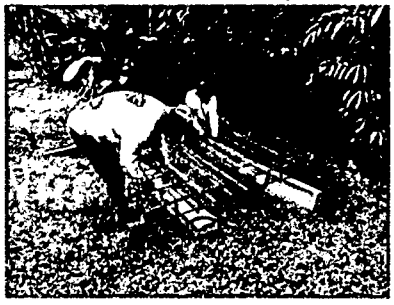

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2.4.4	M3	EXCAVACIÓN MANUAL H>2.5M (NO INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Excavacion Puentes Peatonales	5	1,2	1,8	2,04	22,00
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			22,0
		CONTRACTUAL			22,0


PLANO

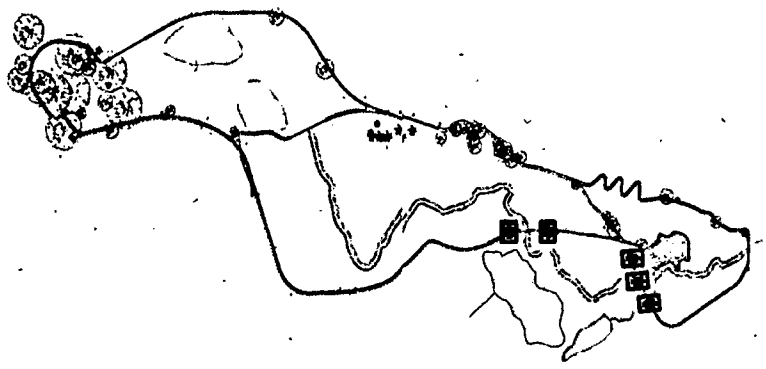

REGISTRO FOTOGRAFICO





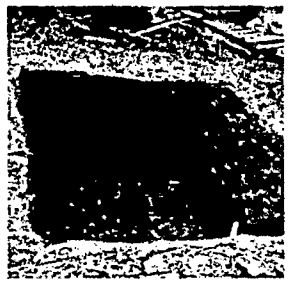

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-01	UND	PASOS ELEVADOS


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Paso elevado cuneta 1	1				1
Paso elevado cuneta 2	1				1
					0
					0
					0
	TOTAL				2
	CONTRACTUAL				0,0


PLANO

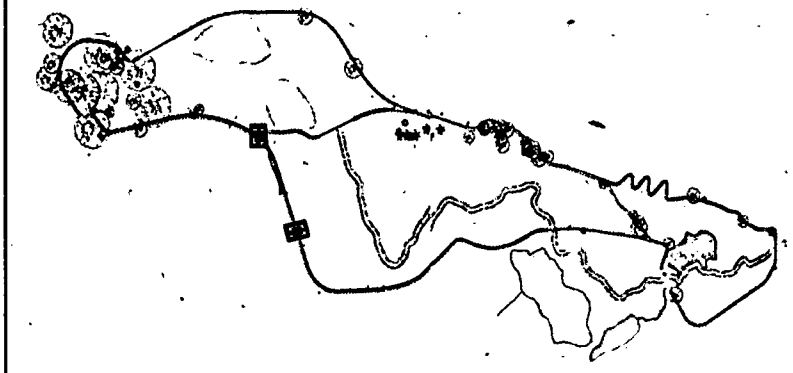


REGISTRO FOTOGRAFICO





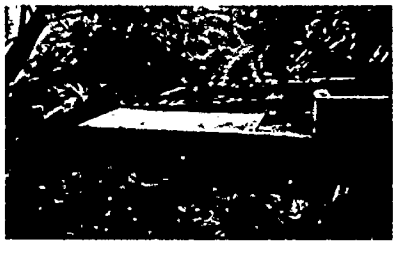

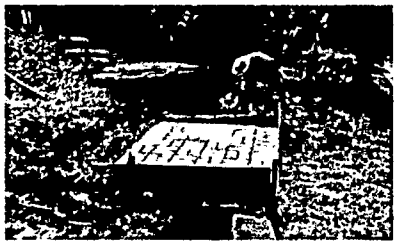

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-02	M3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Viajes tierra negro para relleno costados	32				32
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			32
		CONTRACTUAL			0,0

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
2	HUMEDAL CAÑASGORDAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-03	ML	CONSTRUCCION DE TRINCHOS , INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, INSTALACION Y ESTABILIZACION.

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Trincho tramo 1	2	7			14
Trincho tramo 4	2	7			14
Trincho tramo 7		12			12
					0
					0
		TOTAL			40
		CONTRACTUAL			0,0

PLANO

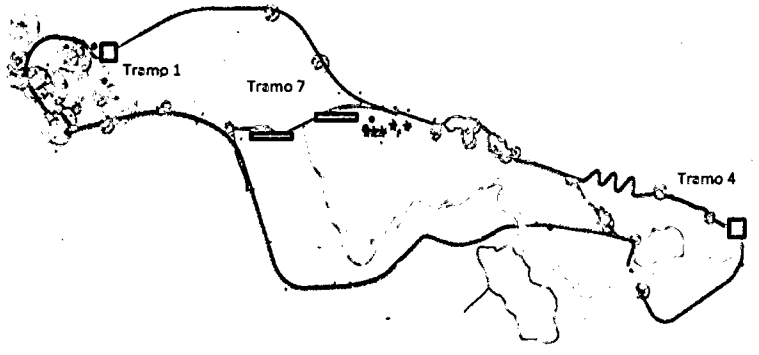

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
3	HUMEDAL PANAMERICANO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.2.1	M2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Control Hormiga Arriera				3500	3500
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		3500
			CONTRACTUAL		3500,0

PLANO

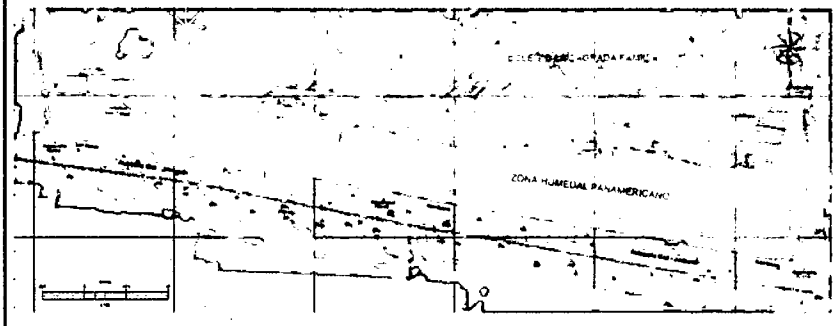

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
3	HUMEDAL PANAMERICANO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.2.2	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVIDUO >12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Mantenimiento arboreo mayores a 12 m	45				45
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			45
		CONTRACTUAL			45,0

PLANO

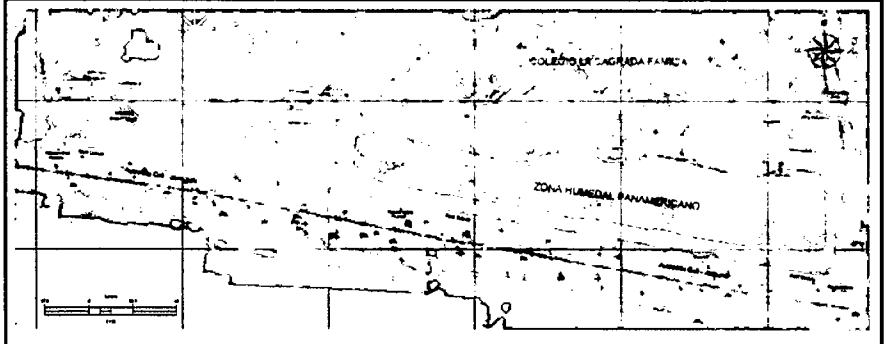

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
3	HUMEDAL PANAMERICANO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.2.3	UND	MANTENIMIENTO FITOSANITARIO ARBÓREO INDIVUDUO <12M

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Mantenimiento arboreo menores a 12 m	120				120
					0
					0
					0
					0
		TOTAL:			120
		CONTRACTUAL			120

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
3	HUMEDAL PANAMERICANO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.2.4	M2	CONTROL DE GUADUALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Guadual				600	600
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			600
		CONTRACTUAL			0,0

PLANO

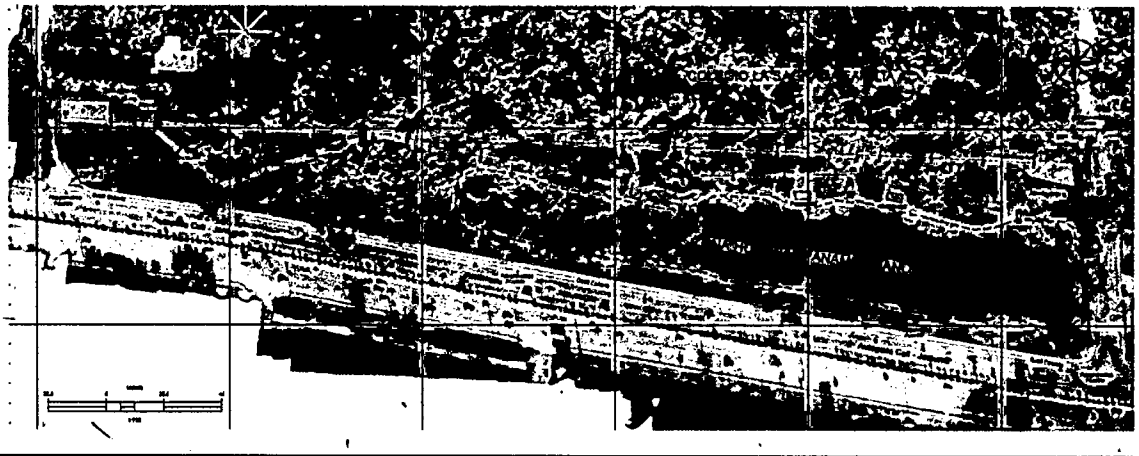

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajistica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.2	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL IMPORTADO

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Relleno sub base sendero Peatonal - Pendiente Cobro acta 1		40	3	0,02	2,4
					0
					0
		TOTAL			2,4
		CONTRACTUAL			15,6

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO

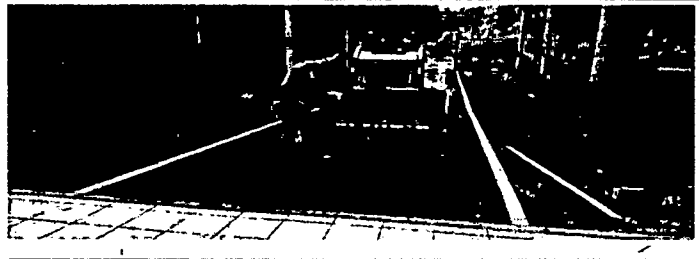



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.6	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Retiro escombros sendero Peatonal - Pendiente Cobro acta 1		40	3	0,04	4,8
					0
					0
		TOTAL			4,8
		CONTRACTUAL			31,2

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO

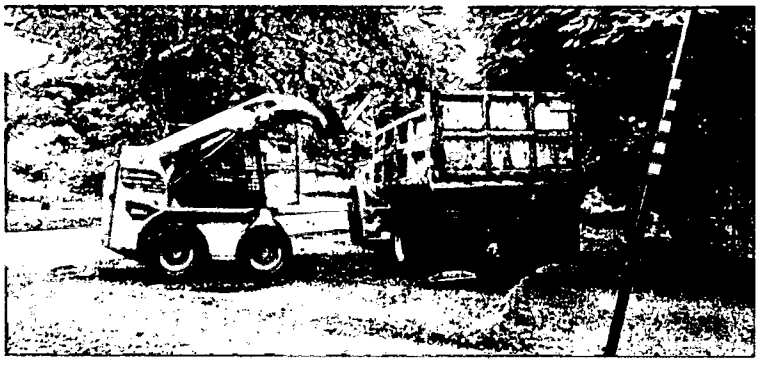

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.3.7	M3	ACARREO MATERIAL DE EXCAVACIÓN HASTA PUNTO DE ACOPIO


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Acarreo Material sendero Peatonal - Pendiente Cobro acta 1		40	3	0,04	4,8
					0
					0
		TOTAL			4,8
		CONTRACTUAL			31,2

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO



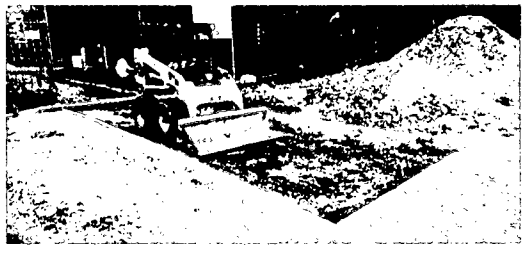

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
4	HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-06	ML	DESMONTE DE CONFINAMIENTO EN GUADUA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
Desmonte de guadua confinamiento sendero existente		80			80
					0
					0
		TOTAL			80
		CONTRACTUAL			0,0

PLANO

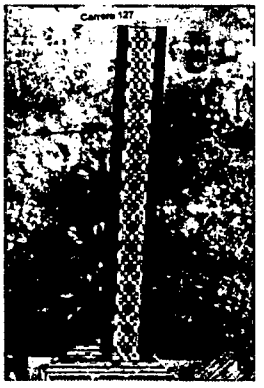

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.1	M2	CONTROL DE GUADUALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Guadual 2				536,26	536,26
Guadual 3				1209,74	1209,74
					0
					0
					0
			TOTAL		1746
			CONTRACTUAL		800,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.2	M2	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ESPECIES INVASORAS FAUNA


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
CONTROL DE PLAGAS				2858,96	2858,96
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			2858,96
		CONTRACTUAL			4000,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO



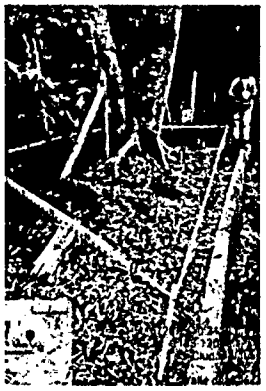

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5.1.5	M2	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Espejo de agua 1		10	25		250
Espejo de agua 2		10	25		250
					0
					0
					0
		TOTAL			500
		CONTRACTUAL			0,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
5	HUMEDAL LA BABILLA	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-07	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Reja metalica		15			15
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			15
		CONTRACTUAL			0,0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
6	HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP-08	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA EN ALFAJOR PARA CAJA ELECTRICA DE 1,1 X 1,37


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Instalacion de marco y tapa	1				1
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			1
		CONTRACTUAL			0

PLANO



REGISTRO FOTOGRAFICO

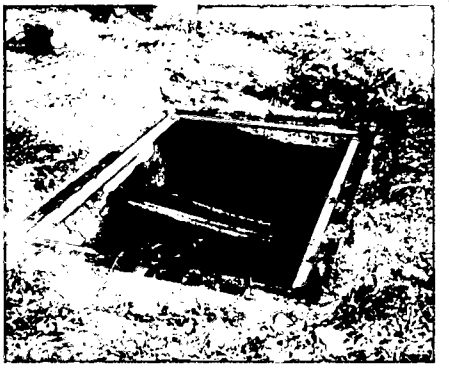

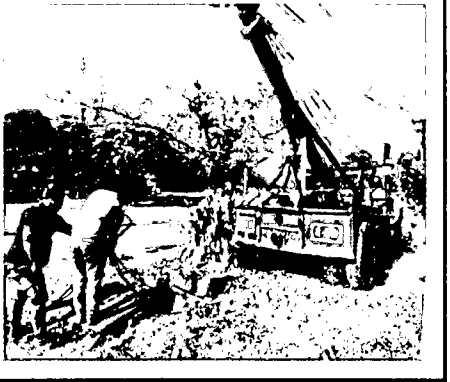

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	**UNIDAD**	**DESCRIPCION**
7.1.1	M2	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO, UBICACIÓN Y MARCADO DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN CON PRIMER PUNTO DE REPLANTEO GEOLOCALIZADO CON TOPOGRAFÍA

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Localizacion humedal Ibis				1339	1339
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			1339,0
		CONTRACTUAL			1339,0

PLANO

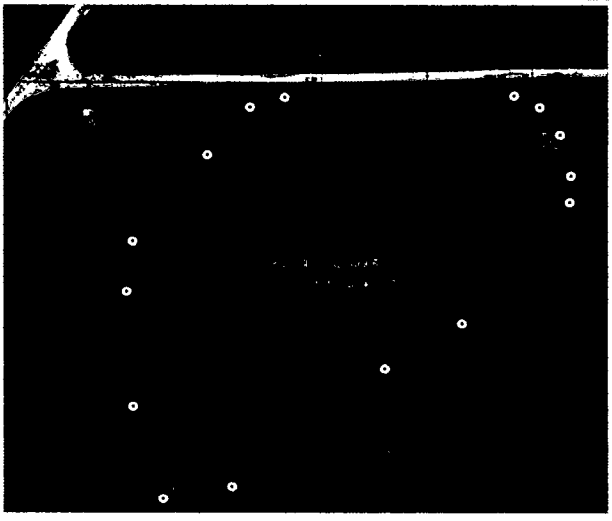

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajlstica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIÀCIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
7.1.2	M2	ADECUACIÓN DE CARRETEABLE PARA INGRESO DE MAQUINARIA - VOLQUETAS - EQUIPOS

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Adecuacion carreteable ingreso maquinaria y volquetas		100	3,25		325
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			325,0
		CONTRACTUAL			325,0

PLANO

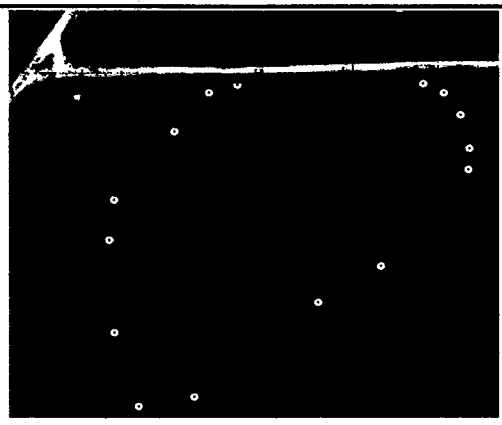

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
7.2.1	M2	LIMPIEZA DE BUCHÓN (INC. RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Limpieza Buchon espejo de agua				10283	10283
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			10283,000
		CONTRACTUAL			15684,900

PLANO

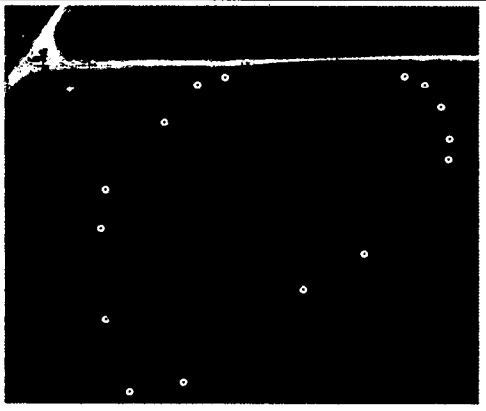

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
7.2.2	M3	EXCAVACIÓN MANUAL BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Excavacion bajo agua				568	568
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			568,00
		CONTRACTUAL			568,00

PLANO

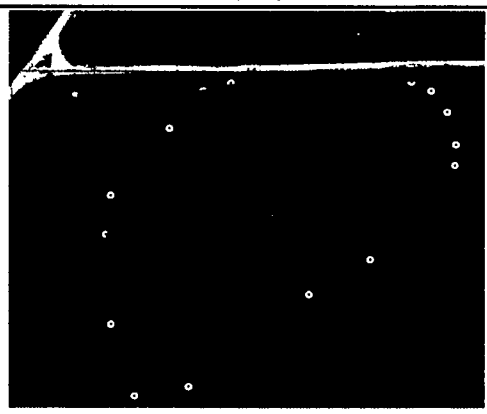

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajlstica en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
7.2.3	M3	EXCAVACIÓN MECÁNICA BAJO EL AGUA H<2M (INC. ACARREO HASTA PUNTO DE ACOPIO)

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Excavacion mecanica bajo agua				1371,4	1371,4
					0
					0
					0
					0
			TOTAL		1371,40
			CONTRACTUAL		1371,40

PLANO

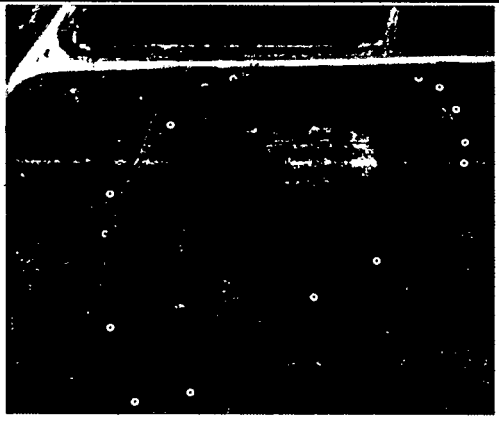

REGISTRO FOTOGRAFICO

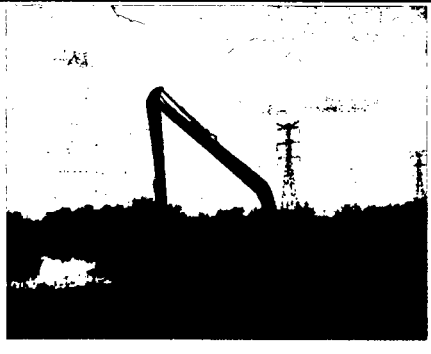



OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
7.2.4	M3	CARGUE Y RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO CERTIFICADO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBRANTE


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	M3	
Cargue y retiro de lodo	114			17	1939,4
					0
					0
					0
					0
	TOTAL				1939,400
	CONTRACTUAL				1121,700

PLANO

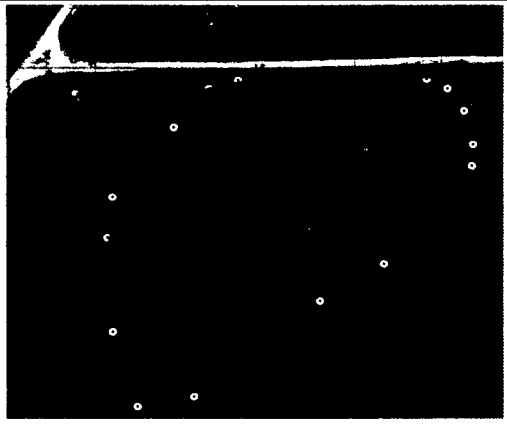

REGISTRO FOTOGRAFICO



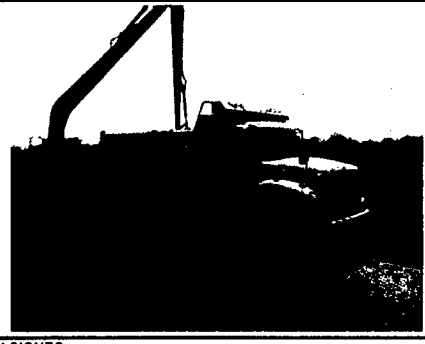

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO
CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026

CAPITULO		
7	HUMEDAL IBIS	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
	m2	RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS AFECTADAS, DEGRADADAS Y BORDE DE HUMEDAL


UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Instalacion de Prado				3250,16	3250,16
					0
					0
					0
					0
		TOTAL			3250,160
		CONTRACTUAL			3250,160

PLANO

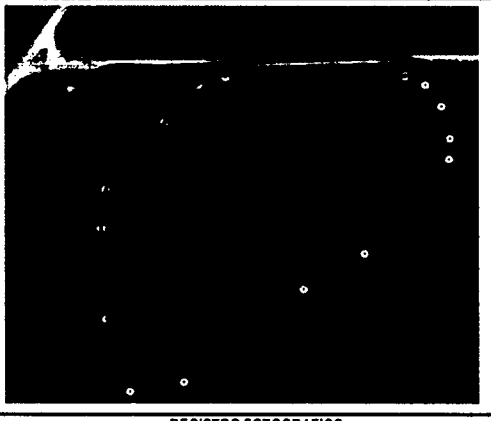

REGISTRO FOTOGRAFICO



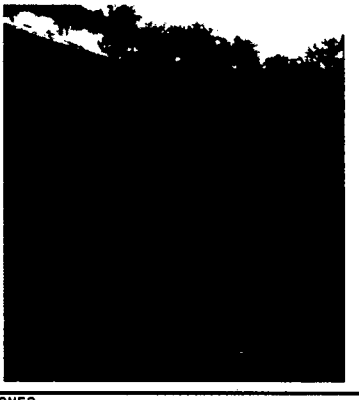

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
8	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
8.1.1	und	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS HABITANTES DE LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES PRIORIZADOS

UBICACIÓN	DIMENSIONES				
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	TOTAL
Estrategia de fortalecimiento comunitarios Ibis	0,5				0,5
					0
					0
					0
	TOTAL				0,5
	CONTRACTUAL				2,00

PLANO

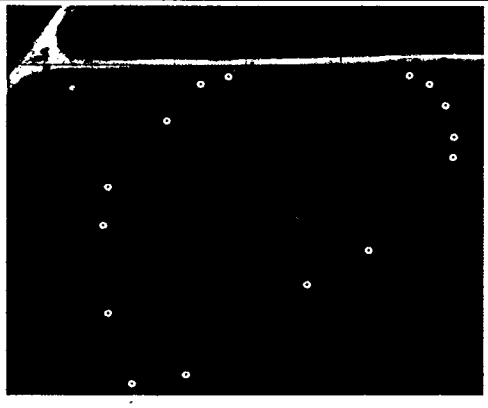

REGISTRO FOTOGRAFICO

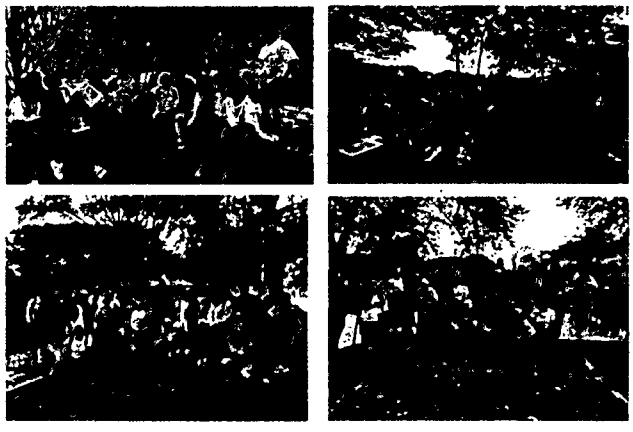

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

HUMEDALES URBANOS	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -VALLE DEL CAUCA	CVC
	MEMORIA DE CALCULO	


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO
ENTIDAD CONTRATANTE	CVC- Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
CONTRATO No.	0741 del 2025

INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Octubre del 2025
FECHA DE CORTE	10 de Febrero del 2026


CAPITULO		
9	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO DE HUMEDALES	
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
9.1.1	und	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA HUMEDALES

UBICACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	AREA	
Humedal La Maria	1				1
Humedal Cañasgordas	1				1
Humedal El Retiro	1				1
Humedal Charco Azul	1				1
Humedal Parque de la Caña	1				1
Humedal Pondaje	1				1
		TOTAL			6
		CONTRACTUAL			11,00

PLANO

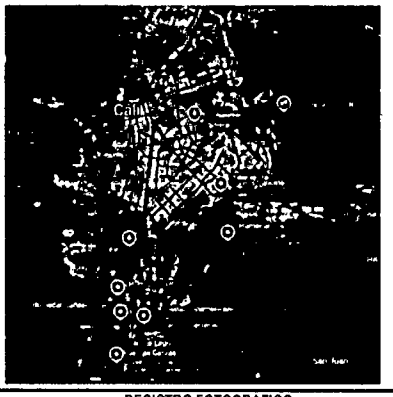

REGISTRO FOTOGRAFICO

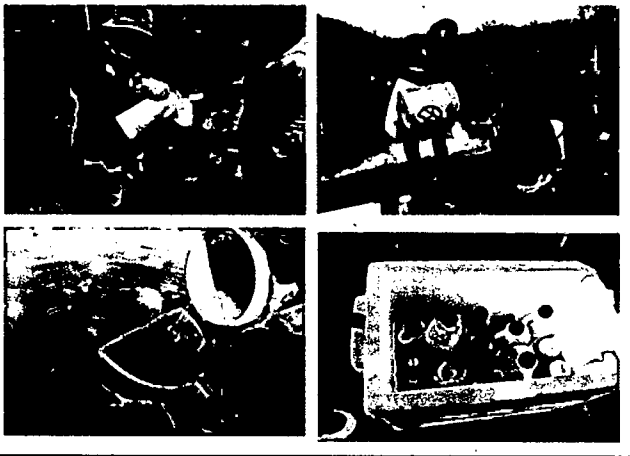

OBSERVACIONES

CONTRATISTA
FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO

INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

INFORME TECNICO MENSUAL No. 2

COMPONENTE TECNICO

FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0741 DE 2025

OBJETO: "REALIZAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA EN HUMEDALES URBANOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYENDO ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO"

SANTIAGO DE CALI

06 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 09 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2026

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: ING. JUAN SEBASTIAN CASTRILLON	**NOMBRE:** ING. MELISSA GARCIA	**NOMBRE:** ARQ. JEANNETE NIETO LÓPEZ
FIRMA: Sebastian C	**FIRMA:** Melissa Garcia S.	**FIRMA:**
ENTIDAD: FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**ENTIDAD:** FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO	**ENTIDAD:** CONSORCIO INTERVENTORÍA HUMEDALES 2025
FECHA: 13/02/2026	**FECHA: 13/02/2026**	**FECHA: 13/02/2026**

Contenido

1. INTRODUCCION 4
2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 5
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 6
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 7
4.1. OBRA CIVIL 7
4.1.1. HUMEDAL CAÑASGORDAS 7
4.1.2. HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS 10
4.1.3. HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO 11
4.1.4. HUMEDAL IBIS 12
4.2. COMPONENTE AMBIENTAL. RECUPERACION PAISAJISTICA 16
4.2.1. CONTROL DE GUADUALES. 17
4.2.2. CONTROL DE PLAGAS 29
4.2.3. MANEJO SANITARIO DE LOS ÁRBOLES 36
4.3. COMPONENTE SOCIAL 41
4.3.1. Diagnosticos participativos con enfoque diferencial para orientar la intervencion social de los proyectos institucionales 41
4.3.2. Implementacion de instrumento de caracterizacion poblacional con enfasis en humedales 42
4.3.3. Implementación de instrumentos de evaluación denominados Sondeo de Experiencias y Semáforo 69
4.3.4. Resultados y análisis general 79
4.3.5. Fortalecimiento comunitario – Elaboración e implementación de una estrategia para el fortalecimiento comunitario y la educación ambiental de los habitantes de las Zonas de los humedales Priorizados 81
5. GARANTIAS CONTRACTUALES 116
6. AVANCE DE OBRA 117
8.CUADRO CONTROL DE LLUVIAS 118
9. CONCLUSIONES 120

32

1. INTRODUCCION

En desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 0741 de 2025, ejecutado por la Fundación Construyamos Futuro – CONSTRUFUTURO para la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, se presenta el Informe Técnico correspondiente al Acta Parcial No. 2, el cual consolida el avance físico, ambiental, social y administrativo del proyecto durante el periodo evaluado.

El presente informe refleja la continuidad de las actividades iniciadas en la fase anterior, así como la consolidación de frentes de obra activos en los humedales priorizados. Durante este periodo se avanzó en la ejecución de actividades de obra civil, restauración ecológica y fortalecimiento comunitario, incorporando ajustes técnicos derivados de condiciones reales de campo, revisión de diseños y coordinación interinstitucional.

Se documentan los avances físicos acumulados, las actividades ejecutadas por componente, el comportamiento operativo de los frentes de trabajo, las condiciones climáticas incidentes en el rendimiento y las situaciones técnicas que han requerido reprogramación o ajustes constructivos.

Este documento tiene como finalidad presentar de manera clara y verificable el estado actual del contrato, soportar las cantidades ejecutadas correspondientes al Acta No. 2 y garantizar la trazabilidad técnica y presupuestal del proyecto, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Contratista de la Obra	**FUNDACION CONSTRUYAMOS FUTURO CONSTRUFUTURO**
NIT.	805.021.814-9
Representante legal	Guillermo Paz Muñoz
Dirección Correspondencia	Calle 13 # 66 Bis 57, Local 138
Correo electrónico	obras@construyamosfuturo.com / rl@construyamosfuturo.com
Teléfono contacto	3153959474 - 3173729594
Interventoría	**CONSORCIO INTERVENTORIA HUMEDALES 2025**
NIT.	901.988.189-1
Representante legal	Jeannete Nieto López
Dirección Correspondencia	Calle 13 # 66 bis – 57 oficina 151
Correo electrónico	humedalesinterventoria@gmail.com
Teléfono contacto	3186681078
Entidad Contratante:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC**
PROYECTO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0741 de 2025**
Objeto del contrato:	"Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el Municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario"
LOCALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS	
Humedales Priorizados: Parque de las Garzas; Humedal Cañasgordas, Humedal Panamericano, Humedal La Babilla, Humedal Ibis, Humedal Isaías Duarte Cancino. **Análisis y estudio de calidad de agua humedales:** La Babilla, La María, Parque de la caña, Pondaje, Charco Azul, Bataclan, El Retiro, Panamericano, Isaías Duarte Cancino, Parque de las Garzas y Limonar.	
Plazo inicial:	Seis (6) meses
Fecha de inicio:	7 de Octubre 2025
Fecha de terminación inicial:	31 de diciembre 2025
Fecha Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2025 hasta 29 de enero de 2026
Fecha Suspensión No.2:	29 de enero de 2026 al 9 de febrero de 2026
Nueva fecha de terminación:	11 de abril de 2026
Valor del contrato:	$3.600.000.382

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra Pública No. 0741 de 2025 desarrolla sus actividades en diferentes sectores del municipio de Santiago de Cali, específicamente en la Comuna 22, la Comuna 13 y el corregimiento de Navarro. Las intervenciones se concentran en los humedales Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis, ecosistemas priorizados por su relevancia ambiental, su papel en la conectividad ecológica urbana y las condiciones actuales que demandan acciones de recuperación y manejo integral.

De manera complementaria, el contrato incluye la ejecución de estudios de calidad de agua en los humedales La María, Parque de la Caña, Pondaje, Charco Azul, Bataclán, Isaías Duarte Cancino, La Babilla, Parque de las Garzas, Panamericano, El Retiro y Limonar. Estos análisis tienen como finalidad establecer una línea base técnica que permita evaluar el estado actual de los cuerpos de agua y generar insumos confiables para el seguimiento, monitoreo y fortalecimiento de la gestión ambiental en estos ecosistemas estratégicos.

Estè componente técnico aporta información fundamental para la toma de decisiones, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad ambiental del territorio urbano.

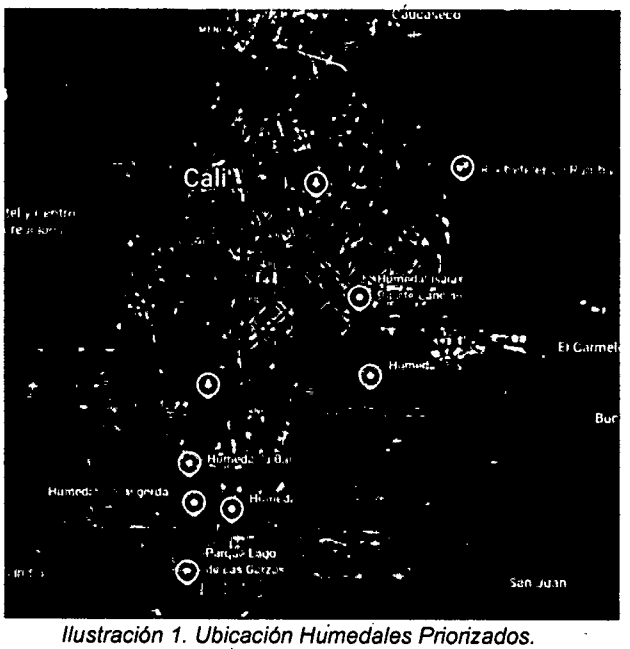


Ilustración 1. Ubicación Humedales Priorizados.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo evaluado para el Acta Parcial No. 2, el proyecto avanzó en la consolidación de los frentes de obra previamente habilitados y en la ejecución de intervenciones hidráulicas, ambientales y de infraestructura en los humedales priorizados. Las actividades desarrolladas comprendieron trabajos de excavación manual y mecánica, descolmatación de espejos de agua, conformación y estabilización de accesos, instalación de elementos estructurales en senderos peatonales, así como la continuidad de labores de recuperación paisajística, control de vegetación y mantenimiento fitosanitario del arbolado existente. De manera complementaria, se ejecutaron acciones de ajuste técnico, balance de cantidades y coordinación operativa necesarias para garantizar la correcta trazabilidad física y presupuestal del contrato.

4.1. OBRA CIVIL


4.1.1. HUMEDAL CAÑASGORDAS

Durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 2 se continuó con la ejecución de actividades contempladas en el componente de recuperación paisajística y construcción de infraestructura peatonal en el Humedal Cañasgordas, consolidando avances significativos tanto en obra civil como en manejo ambiental.

4.1.1.1. Actividades Preliminares

Se completaron las labores de localización y replanteo del área de intervención mediante georreferenciación topográfica, garantizando la correcta implantación de los ejes constructivos y niveles definidos en planos. Estas actividades permitieron ajustar en campo las dimensiones reales del sendero y optimizar las cantidades de excavación y relleno, en concordancia con las condiciones del terreno.

Asimismo, se ejecutaron labores de descapote manual, asegurando la remoción controlada de la capa vegetal superficial en las zonas destinadas a la construcción del sendero, evitando afectaciones innecesarias en áreas no intervenidas.

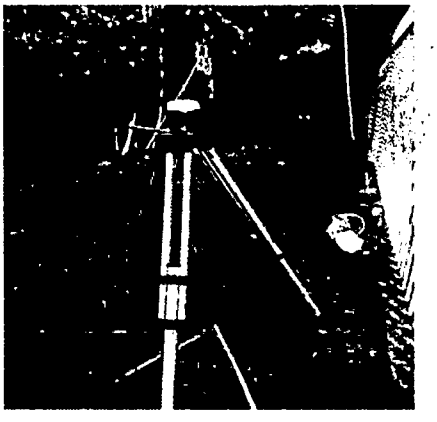

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.1.1.2. Construcción de Senderos Peatonales

Se avanzó en las actividades estructurales del sendero proyectado, iniciando con excavaciones manuales controladas para la conformación de la subrasante, seguidas del acarreo interno y disposición final del material excedente en botadero certificado, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.

Posteriormente, se ejecutaron rellenos y compactaciones con material importado, garantizando la capacidad portante requerida para soportar las cargas de uso peatonal y asegurar la estabilidad a largo plazo de la estructura.

Se continuó con la instalación de bordillos prefabricados en concreto 10x20 cm, asegurando alineación y nivelación conforme a diseño. Asimismo, se avanzó en la colocación de adoquín tipo 20x10x6 cm, incluyendo capa de arena de apoyo y sellado de juntas con arena fina, logrando tramos consolidados del sendero que ya presentan condiciones funcionales.

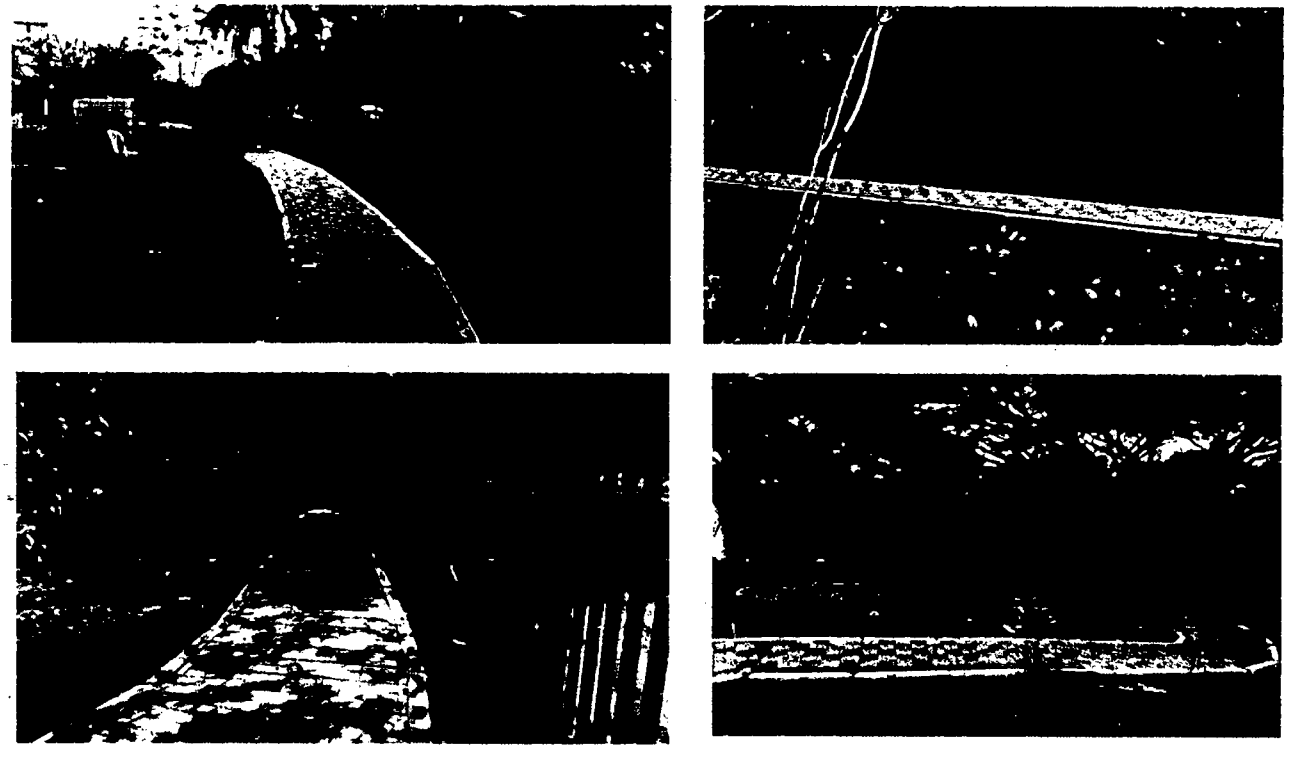


Ilustración 2. Sendero con tierra negra para posterior instalación de prado.

4.1.1.3. Pasos Elevados y Estructuras Complementarias

En el componente de pasos elevados se adelantaron actividades relacionadas con la instalación de acero de refuerzo y conformación de pedestales en concreto de 3.500 PSI, dejando listas las bases estructurales para el montaje definitivo de los elementos metálicos.

Estas actividades fueron ejecutadas garantizando control de niveles, verticalidad y correcta disposición del acero, en cumplimiento de especificaciones técnicas estructurales.

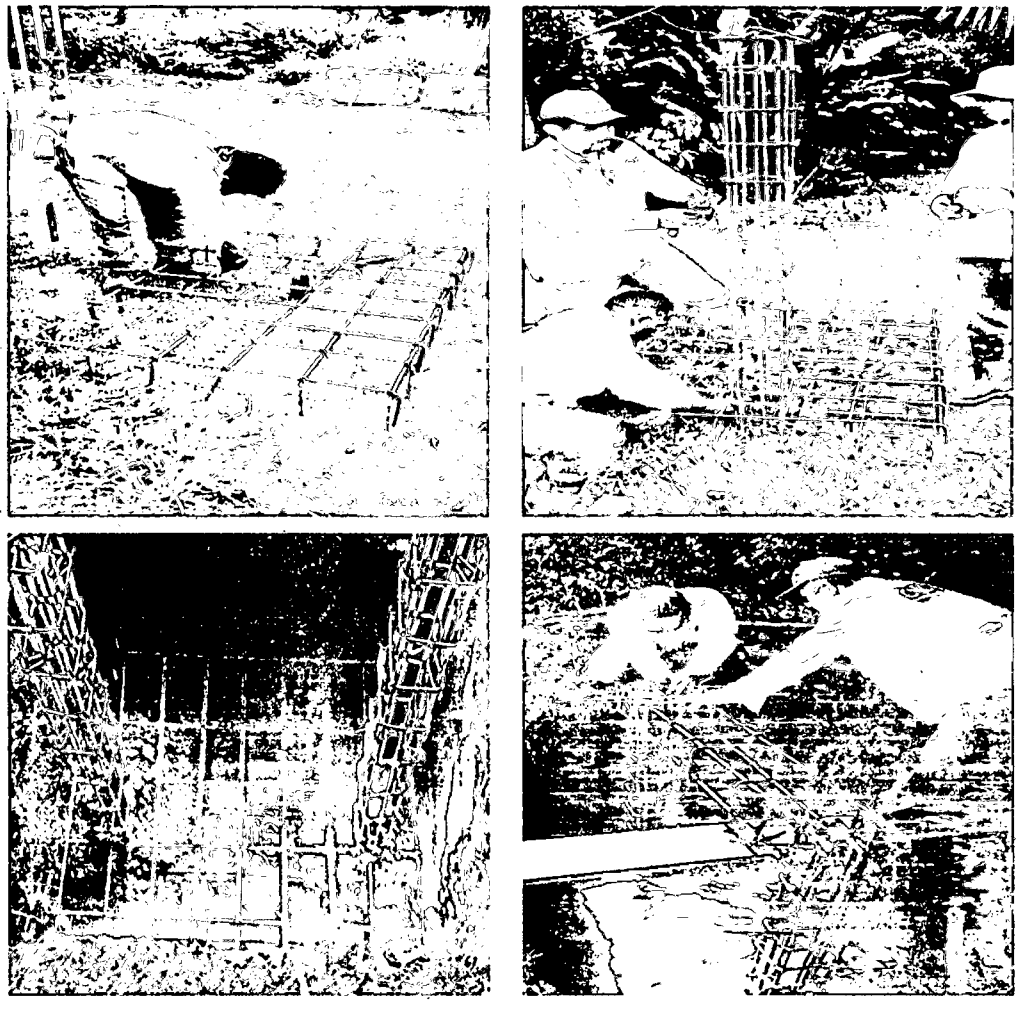


Ilustración 3. Proceso fundición cimentación para pasos elevados.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.1.1.4. Actividades No Previstas

Durante el periodo se ejecutaron actividades no previstas tales como suministro e instalación de tierra negra, construcción de trinchos y adecuaciones complementarias en pasos elevados. Estas intervenciones fueron necesarias para estabilizar taludes menores, mejorar la transición entre niveles del terreno natural y la estructura del sendero, y garantizar la correcta evacuación de aguas superficiales.

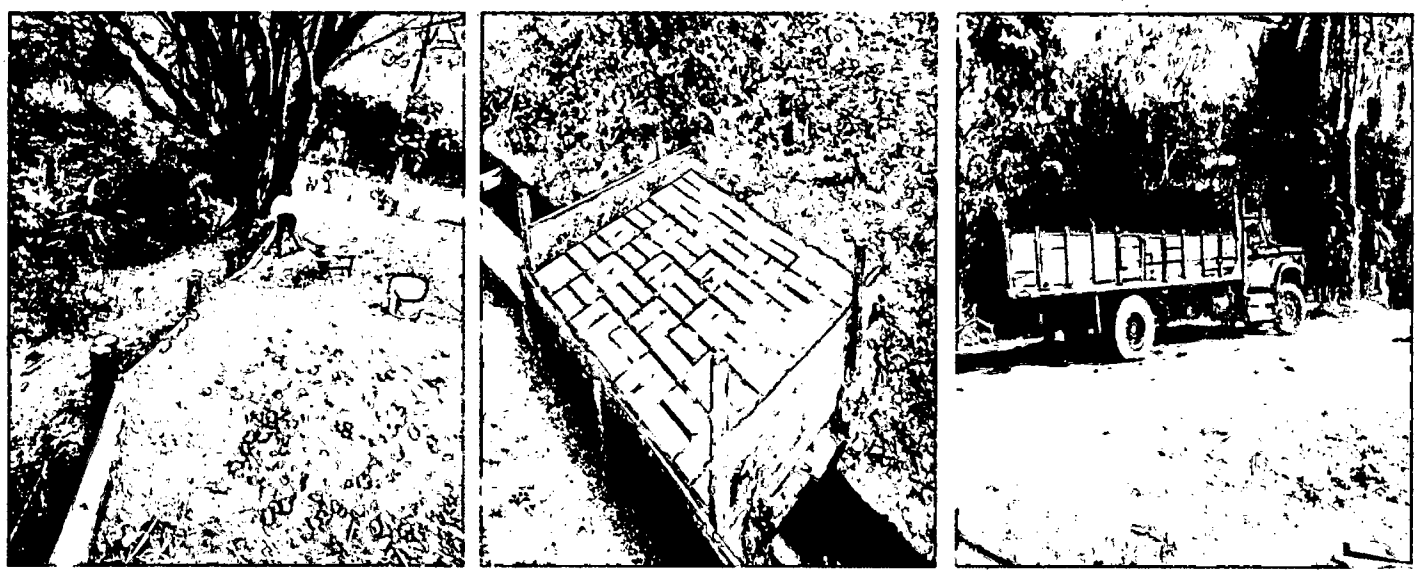


Ilustración 4. Actividades no previstas Humedal Cañasgordas.

4.1.2. HUMEDAL PARQUE DE LAS GARZAS

El presente frente de intervención presenta una condición particular en el marco del Acta Parcial No. 2, dado que las actividades relacionadas no corresponden a ejecución física nueva durante el periodo, sino a la regularización y balance de cantidades previamente ejecutadas, cuya facturación no había sido posible en el acta anterior debido a limitaciones en las cantidades contractuales inicialmente previstas.

Durante el periodo anterior se ejecutaron actividades asociadas a recuperación paisajística y adecuación de acceso peatonal, sin embargo, al momento de estructurar el Acta Parcial No. 1 se evidenció que las cantidades contractuales establecidas resultaban inferiores a las realmente necesarias en campo, situación que impedía reconocer el valor total ejecutado.

4.1.3. HUMEDAL ISAIAS DUARTE CANCINO

Durante el inicio de la ejecución en campo se identificó una condición no contemplada en los diseños ni en el presupuesto contractual inicial: la presencia de una caja eléctrica cuyo marco y tapa se encontraban en estado avanzado de deterioro, presentando hundimiento progresivo y pérdida de estabilidad estructural.

Esta condición generaba un riesgo directo para la seguridad de peatones y usuarios del sector, debido a la posibilidad de colapso parcial de la tapa y exposición de la caja eléctrica.

Ante esta situación, y priorizando el principio de prevención y seguridad, se determinó técnicamente la necesidad de ejecutar el suministro e instalación de marco y tapa en alfajor para caja eléctrica (dimensiones aproximadas 1,10 x 1,37 m), actividad que no estaba prevista inicialmente dentro del alcance contractual.

La intervención incluyó:

- Retiro del elemento deteriorado.
- Verificación de estabilidad de la estructura de la caja.
- Instalación de nuevo marco y tapa con especificaciones adecuadas de resistencia.
- Aseguramiento del correcto asentamiento y nivelación respecto a la superficie circundante.

Este ítem no previsto fue indispensable para garantizar condiciones seguras de tránsito y evitar posibles accidentes en el área intervenida.

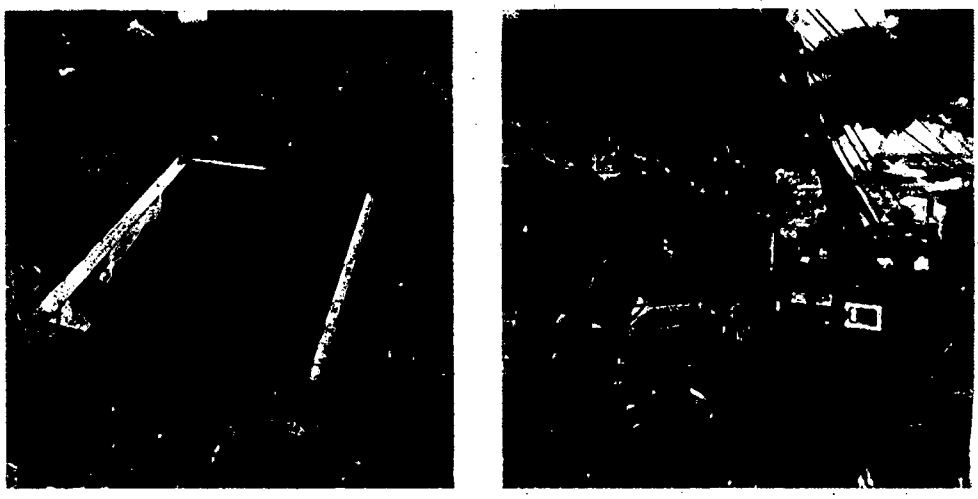


Ilustración 5. Suministro e Instalación de marco con tapa metálica para caja eléctrica.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.1.4. HUMEDAL IBIS

Durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 2 se dio inicio formal a las actividades de descolmatación del Humedal Ibis, constituyéndose este frente como uno de los componentes hidráulicos más significativos del contrato en términos de volumen de material removido, logística de acceso y control ambiental.

4.1.4.1. Adecuación de Accesos y Logística Operativa

Previo al inicio de las labores de excavación, fue necesario realizar la adecuación del carreteable de acceso al humedal, con el fin de permitir el ingreso seguro de maquinaria pesada y volquetas destinadas al transporte del material sedimentado.

Estas actividades incluyeron nivelación superficial, mejoramiento puntual de la vía de acceso y verificación de capacidad portante, garantizando condiciones operativas adecuadas para el tránsito de equipos sin generar afectaciones permanentes en el entorno.

La logística implementada permitió organizar el flujo controlado de volquetas, optimizando tiempos de cargue y descargue y reduciendo impactos en el área de influencia.

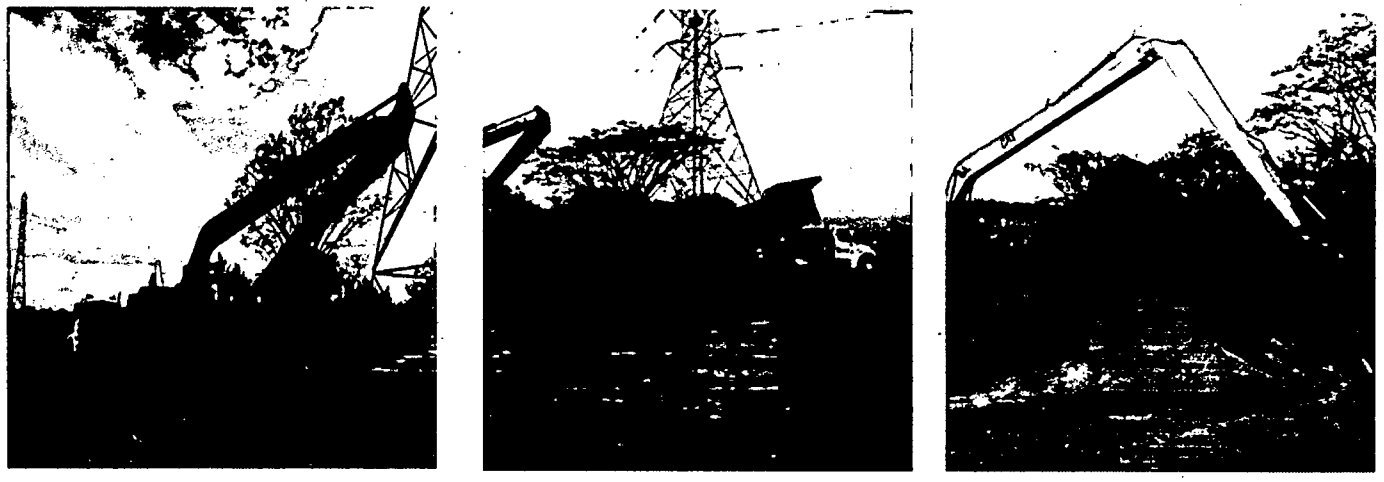


Ilustración 6. Ingreso maquinaria y adecuación carreteable.

4.1.4.2. Limpieza Espejo de agua

Se ejecutaron labores de limpieza de material vegetal flotante (buchón) en un área aproximada de 10.283 m², retirando la cobertura superficial que impedía la oxigenación natural del cuerpo de agua y afectaba su funcionalidad ecológica.

La remoción de esta biomasa permitió recuperar la visibilidad del espejo de agua y facilitar las actividades posteriores de excavación.

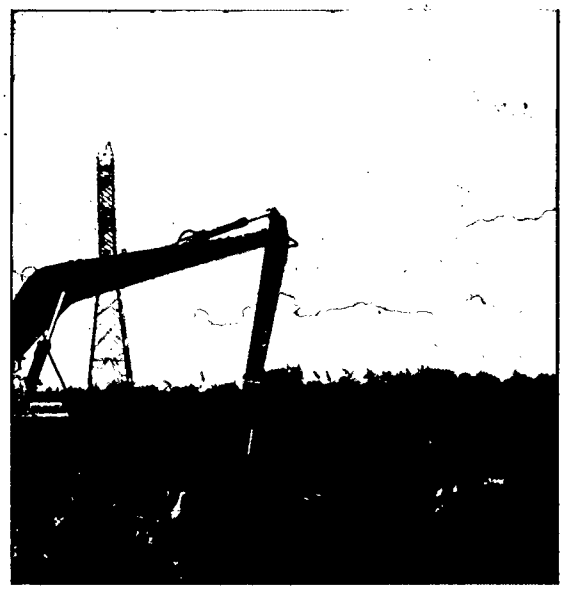


Ilustración 7. Limpieza Buchón.

4.1.4.3. Excavación Manual y Mecánica Bajo Agua

Posteriormente se dio inicio a la excavación bajo agua, combinando procesos manuales en zonas de difícil acceso con excavación mecánica mediante retroexcavadora de orugas, lo que permitió remover material sedimentado acumulado en el fondo del humedal.

Las actividades comprendieron:

- Excavación manual bajo agua en sectores de transición.
- Excavación mecánica bajo agua en zonas centrales.
- Conformación controlada de taludes.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

- Cargue directo a volquetas.
- Transporte y disposición final del material en botadero autorizado.

El proceso fue ejecutado bajo criterios técnicos que garantizan la estabilidad de los bordes del humedal y la recuperación de la profundidad hidráulica proyectada.

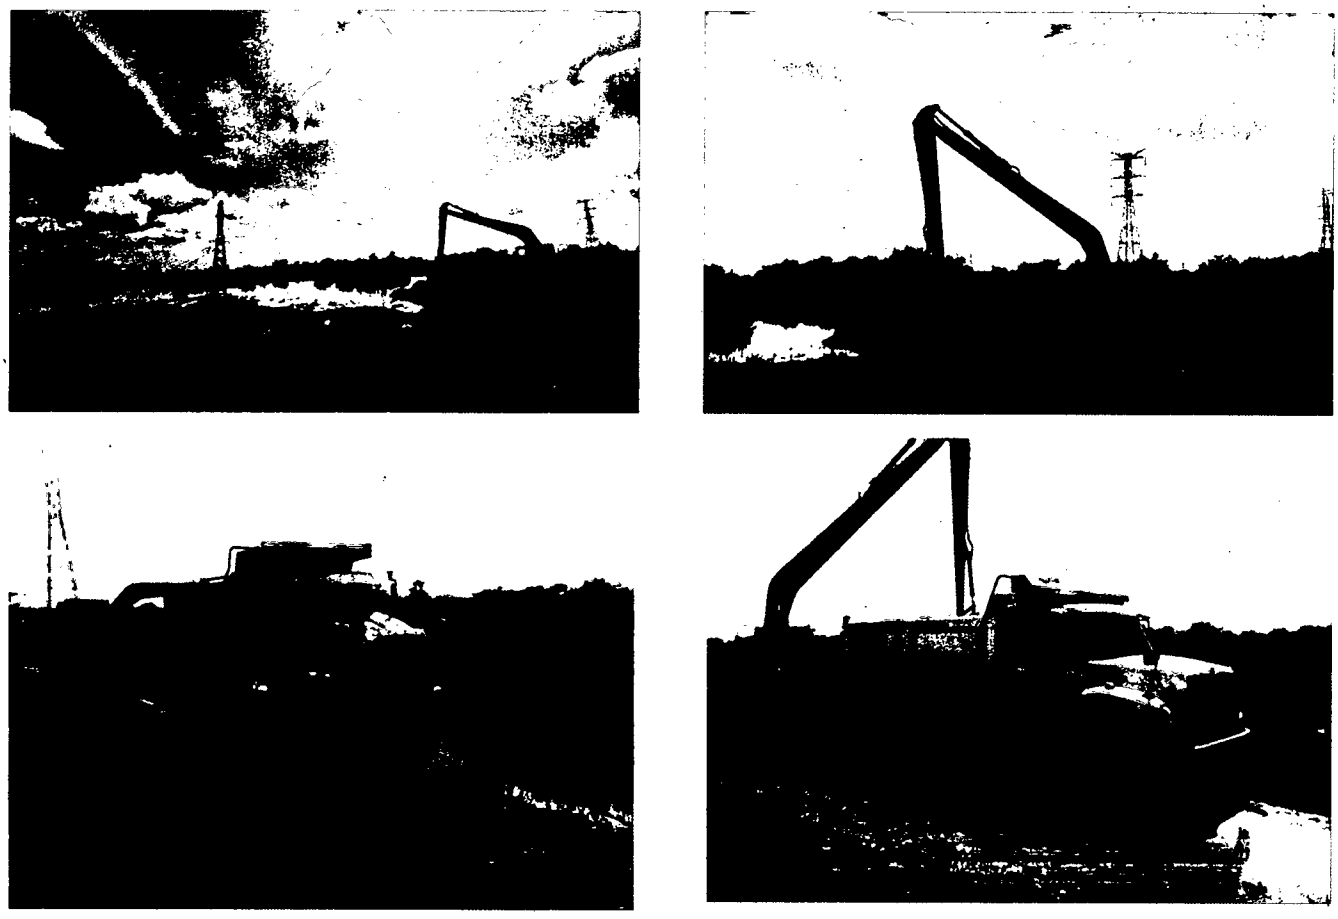


Ilustración 8. Excavación y retiro de lodo.

4.1.4.4. Recuperación Ambiental de Áreas Intervenidas

Una vez removido el material sedimentado, se realizaron labores de recuperación ambiental en aproximadamente 3.250 m², enfocadas en estabilización de bordes y mejoramiento paisajístico del entorno inmediato afectado por la intervención con la maquinaria.

Estas actividades permiten consolidar la intervención hidráulica y asegurar la sostenibilidad del proceso de recuperación.

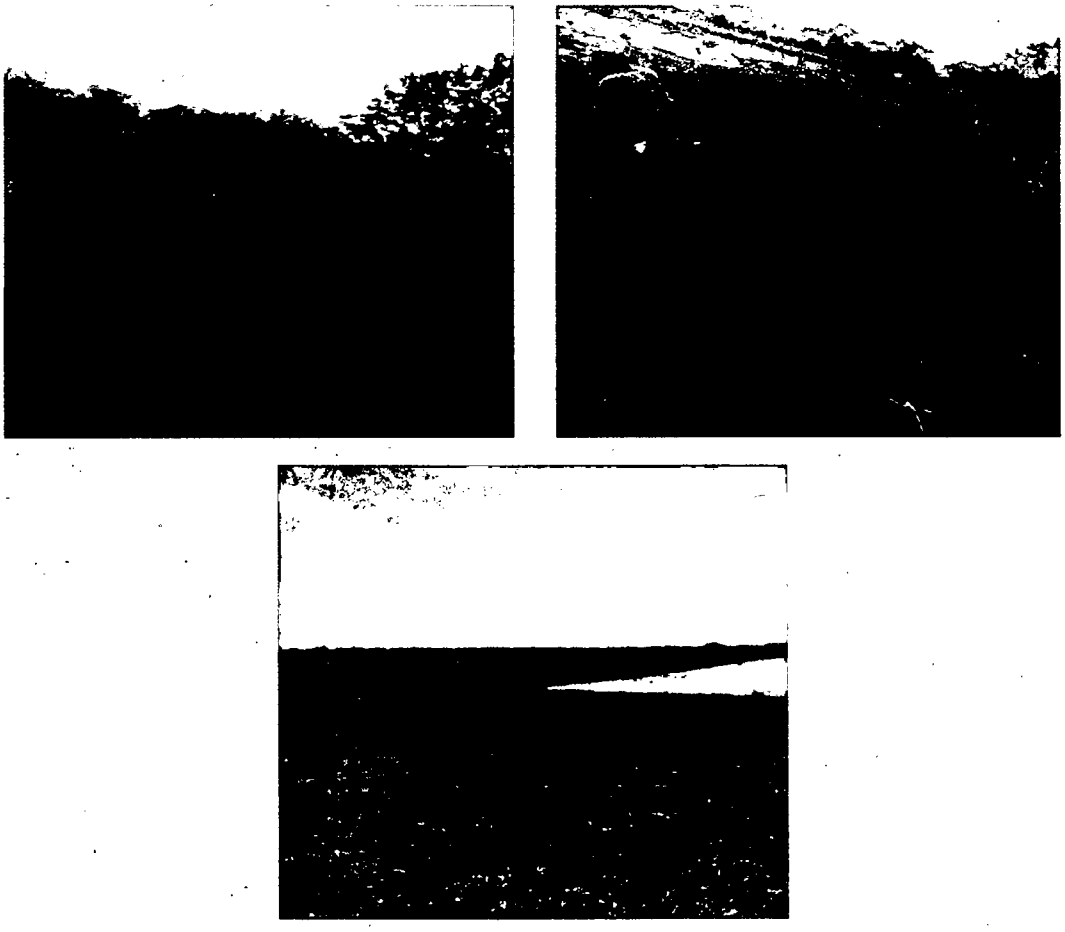


Ilustración 9. Instalación de prado en zonas afectadas.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.2. COMPONENTE AMBIENTAL. RECUPERACIÓN PAISAJISTICA

El presente capítulo aborda los principales componentes de la gestión ambiental en los humedales urbanos de Cali —Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis—, ecosistemas estratégicos que cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica del territorio. La presión antrópica derivada de la urbanización, junto con factores naturales de degradación, exige la implementación de medidas técnicas que garanticen su sostenibilidad y resiliencia.

En primer lugar, se revisa el mantenimiento de guaduales y bambusales, formaciones vegetales de gran importancia ecológica y cultural en el Valle del Cauca. Su manejo silvicultural —incluyendo cosecha selectiva, control de densidad y regeneración asistida— resulta indispensable para conservar la estabilidad de suelos, proteger fuentes hídricas y asegurar la provisión de servicios ecosistémicos.

Posteriormente, se analiza el control de plagas, con énfasis en la hormiga arriera (*Atta spp.*), especie que, si bien cumple funciones ecológicas relevantes en el reciclaje de materia orgánica y la aireación de suelos, puede ocasionar defoliación masiva y pérdida de cobertura vegetal cuando sus poblaciones se desbordan. En este contexto, se destacan las estrategias de manejo integrado de plagas (MIP), donde el control químico se reconoce como una herramienta de acción inmediata para reducir poblaciones y mitigar daños, siempre en articulación con prácticas biológicas y culturales.

Finalmente, se aborda el manejo sanitario de los árboles presentes en los humedales seleccionados, enfatizando la necesidad de prácticas de nutrición edáfica que fortalezcan la salud del arbolado y mejoren la resiliencia frente a plagas, enfermedades y condiciones de estrés ambiental. El monitoreo fitosanitario, la aplicación de biofertilizantes y el manejo de cobertura vegetal son medidas clave para garantizar la permanencia y funcionalidad de estos individuos arbóreos en el ecosistema urbano.

Este capítulo, por tanto, integra acciones de conservación, restauración y manejo técnico que buscan consolidar una estrategia ambiental integral para los humedales de Cali, asegurando su aporte a la sostenibilidad territorial y al bienestar de las comunidades que los rodean.

4.2.1. CONTROL DE GUADUALES.

Los guaduales (*Guadua angustifolia* Kunth) y bambusales constituyen formaciones vegetales de alta importancia ecológica, económica y cultural en Colombia. Estos sistemas cumplen funciones críticas en la protección de cuencas hidrográficas, la estabilización de taludes y suelos, la captura de carbono y la provisión de hábitat para diversas especies de fauna y flora. Además, poseen un valor estratégico en la economía, al ser fuente de materia prima para la construcción sostenible, la artesanía y la agroindustria.

Sin embargo, la dinámica biológica de guaduales y bambusales, caracterizada por ciclos de crecimiento rápido y acumulación de biomasa, exige acciones periódicas de mantenimiento. La ausencia de manejo técnico como se ha evidenciado en los humedales materia de intervención, puede derivar en procesos de degradación, tales como:

- Sobrepoblación de culmos o tallos envejecidos, que disminuye la productividad y aumenta la susceptibilidad a plagas y enfermedades.
- Compactación del suelo y pérdida de cobertura vegetal asociada, afectando la infiltración de agua y la regeneración natural.
- Reducción de la capacidad de conectividad ecológica, limitando el flujo de especies entre fragmentos de bosque y humedales.

El marco normativo colombiano, a través de la Ley 2206 de 2022, promueve el uso productivo y sostenible de la guadua y el bambú, reconociendo su papel en la mitigación del cambio climático y en la identidad cultural del paisaje cafetero. Asimismo, la Resolución 141 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece lineamientos para el registro y manejo de guaduales y bambusales, subrayando la necesidad de planes de conservación y mantenimiento.

En este contexto, el presente numeral se presenta las prácticas de mantenimiento técnico en los guaduales y bambusales presentes en los humedales de La Babilla, Cañasgordas y Panamericano —como el control de densidad, la eliminación de partes o estructuras afectadas o impactadas por diferentes causas, la aplicación de elementos nutricionales y la protección contra agentes degradantes— con el fin de asegurar la permanencia de estas manchas vegetales como parte fundamental de los ecosistemas de cada uno de los sectores que hacen parte de este proyecto.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.2.1.1. Humedal La Babilla

Los guaduales presentes en el humedal La Babilla ascienden a 2546 M2, distribuidos en tres manchas que se localizan en la esquina de la calle 13 con carrera 105, en el borde del espejo de agua sobre la calle 14 y en el borde del espejo de agua próximo a las escalinatas. Su estado de afectación es calificado como alto debido al escaso mantenimiento realizado. En este humedal hay una gran diversidad de especies de animales representada principalmente por aves, iguanas, ardillas, peces, tortugas, guatines y babilla.

En cuanto a la vegetación asociada, corresponde a la característica de la zona de vida de Bosque seco tropical.

Este ecosistema posee dos cuerpos de agua, el primero ubicado una cota más alta que el otro con una extensión de 0,34 Has, y el segundo cuerpo de agua tiene 0,74 Has. Este humedal posee conexión con un fragmento de bosque natural que permite el flujo e intercambio de especies vegetales y de animales. Los esfuerzos de una gestión interinstitucional han permitido fortalecer este humedal como escenario de conservación del patrimonio biótico de la ciudad.

La guadua representa 6,79 % del área total del humedal La Babilla, lo que corresponde a una proporción moderada dentro de la estructura vegetal del humedal. No configura una dominancia espacial del ecosistema, sino que actúa como cobertura puntual en tres manchas estratégicamente ubicadas en cerca al espejo de agua. Desde el punto de vista paisajístico, cumple funciones de estabilización de orillas, regulación microclimática y provisión de hábitat, sin evidenciar expansión descontrolada respecto al área total.



Ilustración 10. Fracturas en tallos de guaduas humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 11. Organización de material de desecho de guadual Humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.

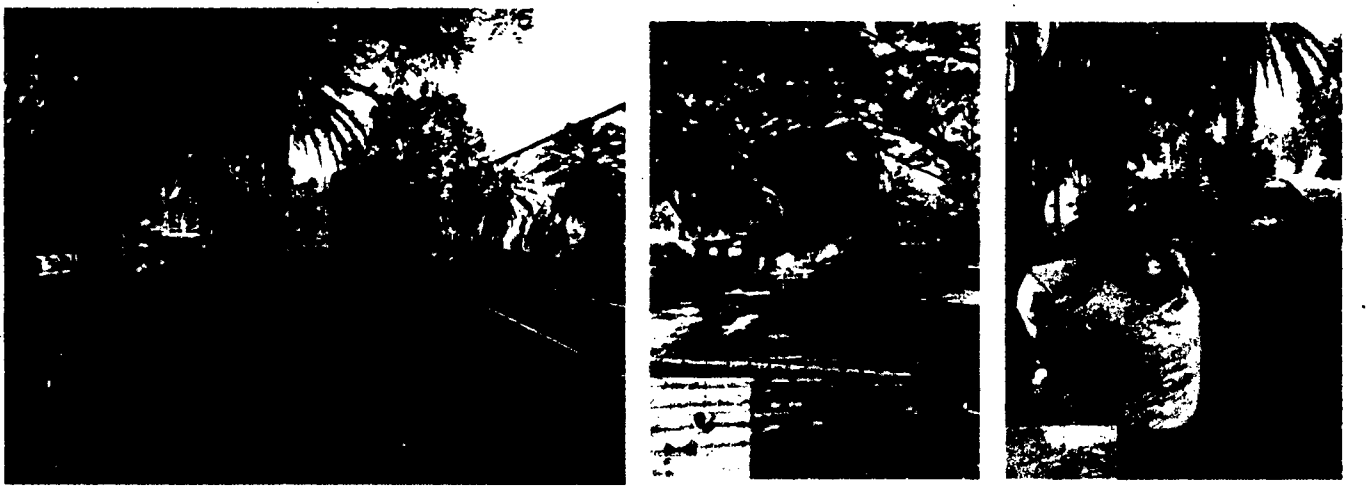


Ilustración 12. Retiro de residuos de guadua humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 Oficina 138



Ilustración 13. Deformidades en el desarrollo y crecimiento de la guadua humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 14. Eliminación de látigos o ramas laterales
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 15. Limpieza de la zona basal de guadual
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 16. Estado final de guadual en humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

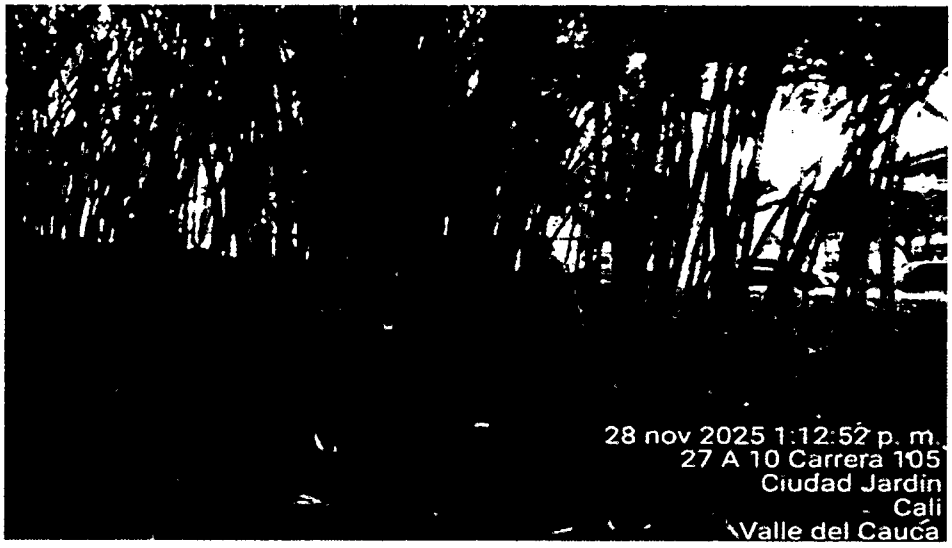


Ilustración 17. Aplicación de abono edáfico guadual humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025.

4.2.1.2. Humedal Cañasgordas

Los guaduales y bambusales en el humedal Cañasgordas ascienden a 7521 M2, distribuidos en varias manchas adjuntas al espejo de agua y curso hídrico presente en el mismo. Los anteriores representan 14,75 % del área total del humedal Cañasgordas.

En este humedal la cobertura en guadua adquiere una participación significativamente mayor dentro del mosaico vegetal. Con cerca del 15 % del área total, la guadua constituye un elemento estructurante del paisaje. Esta proporción justifica plenamente las actividades de manejo silvicultural ejecutadas (entresaca, control de densidad y limpieza basal), orientadas a evitar sobrepoblación de culmos envejecidos, competencia intraespecífica y reducción de diversidad vegetal asociada.

El estado de deterioro de los guaduales presentes en este humedal se considera en la evaluación como alto, obligando al corte y retiro de un gran número de tallos que impiden un desarrollo adecuado de los rebrotes, los tallos con malformaciones, tallos secos y envejecidos en pie y los que evidencien afectaciones fitosanitarias entre otros. Con base

en ello se procedió a la eliminación de todos los que presentaban algunas de las características mencionadas.

El corte de los tallos necesarios a eliminar se hizo de dos maneras, mecánico con motosierra y manual con serrote, dependiendo de la condición puntual de accesibilidad.


El corte de cada tallo se hace a nivel de nudo para evitar la acumulación de agua y otros residuos en los tabiques y su posterior descomposición de tejido vegetal que se convierte en acceso para plagas y patógenos que terminan afectando toda la planta al tratarse de un solo sistema. El corte se hace a nivel basal en cada tallo.

Se adelantó de igual manera el retiro de todo el material vegetal proveniente de barrido y limpieza de las zonas verdes anexas al humedal, que se acumulan en la base de los tallos y que producen un efecto negativo en el desarrollo y conservación del guadual, al producirse aumento de las condiciones externas que ponen en estado de vulnerabilidad al mismo.

Los tallos eliminados de guadua se manejaron a través de los puntos de disposición de residuos para obtener la certificación correspondiente. Su transporte se hizo en camión carpado, con las normas de seguridad requeridas para este tipo de actividad.

En las siguientes fotografías se evidencia el estado inicial de los tallos de los guaduales y bambusales, las actividades de entresaca, corte, limpieza de base, retiro de material a eliminar.



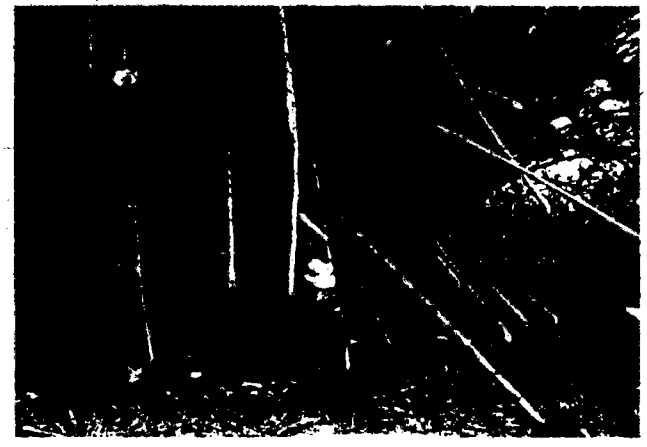

42

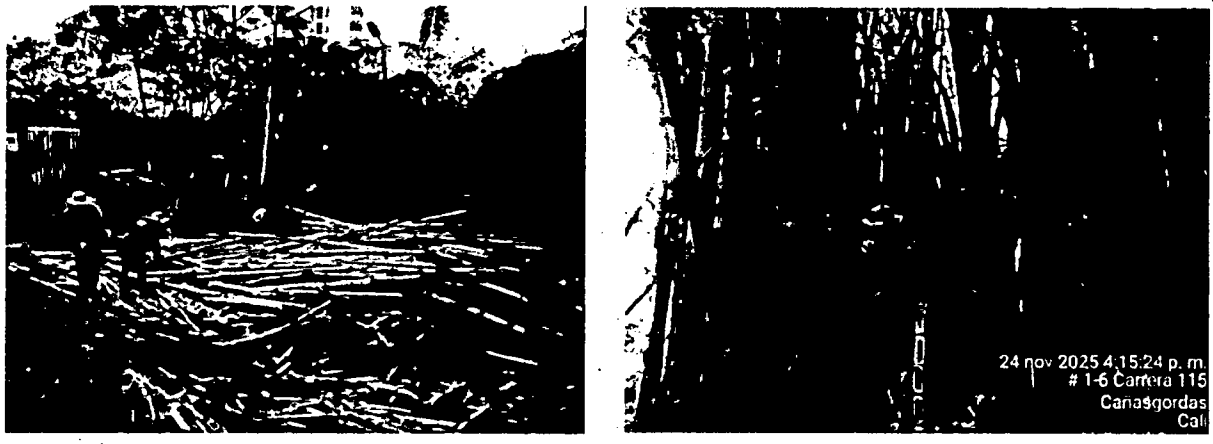


Ilustración 18. Guaduas eliminadas por afectaciones varias
Fuente. Este estudio 2025.



Ilustración 19. Corte de puntas de guadua con serrote
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 20. Evacuación de material guadua en mal estado
Fuente. Este estudio 2025.

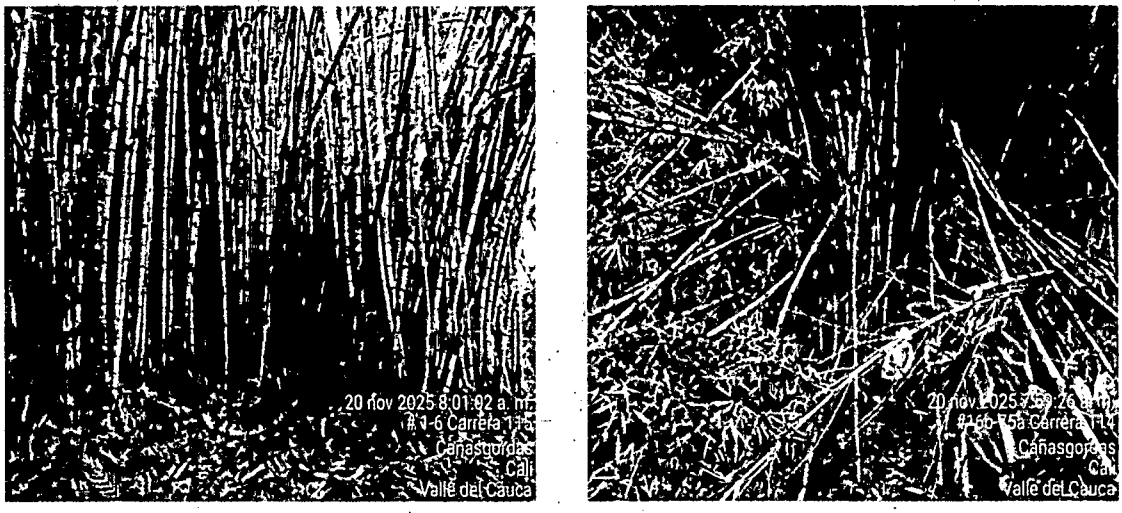


Ilustración 21. Estado inicial de guadual en humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138



Ilustración 22. Apronte de guadua en mal estado para retirar del humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

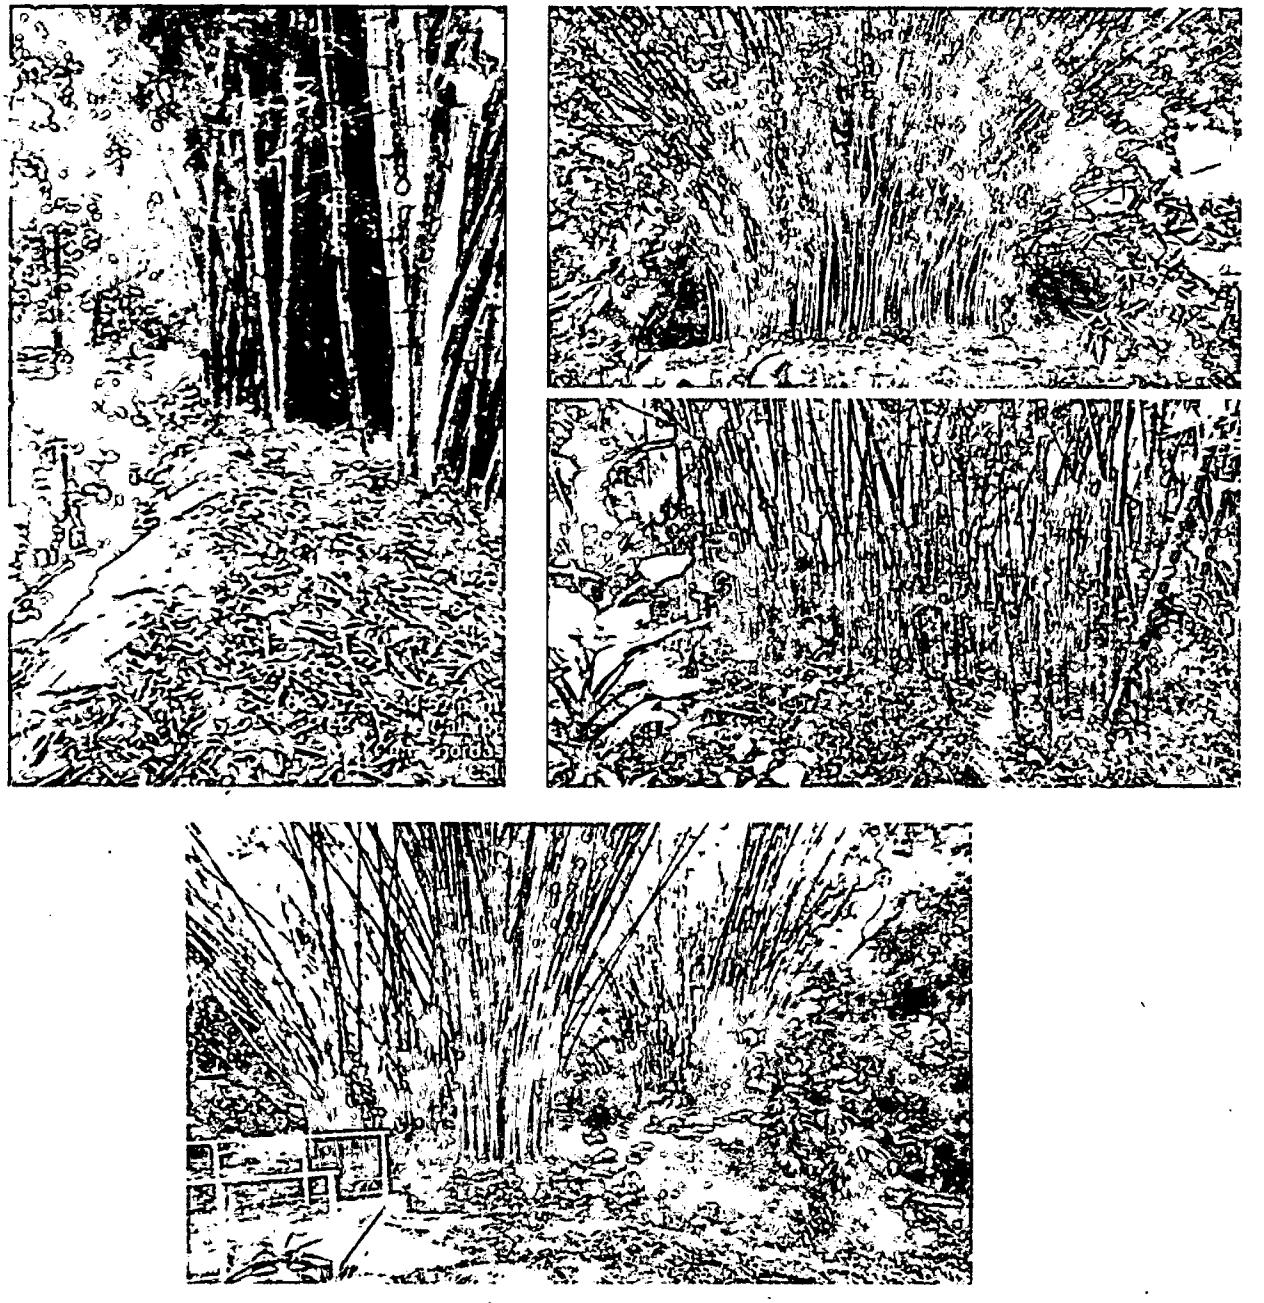


Ilustración 23. Estado final luego de limpieza humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138



Ilustración 24. Cargue de residuos de guadua humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025.

4.2.1.3. Humedal Panamericano

Los guaduales y bambusales en el humedal Panamericano ascienden a 600 M2, distribuidos en el borde del espejo de agua del mismo.

El estado de deterioro de los guaduales presentes en este humedal se considera en la evaluación como alto, como en los otros humedales ya mencionados, haciéndose necesario la intervención de podas y retiro de material en descomposición. Esta estrategia asegurara la permanencia y ampliación de las áreas de esta especie vegetal, de importancia en la conservación del ecosistema presente en este territorio.

La guadua representa 2,31 % del área total del humedal Panamericano. La participación de la guadua es baja dentro del sistema ecológico del humedal. Su presencia se limita a franjas perimetrales asociadas al borde del espejo de agua, donde cumple función de amortiguamiento y protección ribereña. No se evidencia dominancia ni presión significativa sobre otras coberturas vegetales.

4.2.2. CONTROL DE PLAGAS

Las hormigas arrieras (*Atta spp.*) cumplen una función ecológica relevante en los ecosistemas naturales, al participar en el reciclaje de materia orgánica, la aireación de suelos y la dispersión de semillas, contribuyendo así al equilibrio de los humedales urbanos como Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas, La Babilla, Isaías Duarte Cancino e Ibis.

No obstante, cuando sus poblaciones se desbordan o se salen de control, generan impactos negativos significativos: defoliación masiva de especies arbóreas, debilitamiento de la cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad y alteración de los procesos de regeneración natural.

Ante estas condiciones, el control químico se constituye en una medida técnica de acción inmediata y eficaz para reducir las poblaciones de Atta y otras especies de hormigas defoliadoras. Este tipo de manejo se basa en la aplicación dirigida de insecticida el interior del nido, logrando una disminución rápida de la actividad y evitando la expansión de los daños. Si bien el control químico es una herramienta de respuesta inmediata, debe integrarse en un manejo integrado de plagas (MIP) que combine prácticas culturales, biológicas y edáficas, cuando las condiciones climáticas sean apropiadas y las poblaciones altas presentes se disminuyan, garantizando la sostenibilidad y conservación de los humedales.

El interés principal del programa fue disminuir la población activa de Atta spp., cuya proliferación estaba generando:

- Defoliación recurrente.
- Estrés fisiológico en árboles jóvenes.
- Reducción de tasas de rebrote.
- Vulnerabilidad frente a enfermedades oportunistas.

Para ejecutar el control, se preparó una mezcla con agroquímicos y se aplicó teniendo en cuenta las normas de seguridad. Las dosis aplicadas corresponden a la comercial

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

referida en cada uno de ellos. La aplicación de los productos se adelantó en forma periódica para cortar con los ciclos de vida de este género de insectos.

Los equipos de aplicación son bombas espalderas con capacidad de 20 litros y la bomba termonebulizadora de igual capacidad.

Para lograr una reducción efectiva, el control químico se aplicó de manera periódica y estratégica, buscando:

- Interrumpir el ciclo biológico de la colonia.
- Reducir la actividad de forrajeo.
- Disminuir la capacidad reproductiva de la reina.
- Evitar recolonización inmediata del área intervenida.

La frecuencia de aplicación resulta técnicamente determinante, ya que una única intervención no es suficiente para colonias consolidadas. El tratamiento repetido permite reducir gradualmente la población hasta niveles ecológicamente tolerables.

El polígono donde se determinan la evidencia de los sitios detectados como hormigueros se marcaron en terreno con estacas de guadua y se cerraron con cinta de peligro, para tomar la medición correspondiente.


Las áreas de control de hormigas en los humedales fueron las siguientes:

- Humedal La Babilla a 4.000 M^2
- Humedal Cañasgordas a 18.000 M^2.
- Humedal Panamericano 3.500 M^2.
- Humedal Garzas 4.000 M^2

Las superficies sometidas a control químico no fueron definidas de manera aleatoria, sino que corresponden a los polígonos con mayor densidad de hormigueros activos y mayor presión defoliadora sobre:

- Árboles jóvenes.
- Individuos en rebrote.
- Vegetación de regeneración natural.
- Guaduales recién intervenidos silviculturalmente.

En el caso del Humedal Cañasgordas, el alto porcentaje intervenido (35 %) evidencia una condición de población incontrolada, con afectación significativa sobre la estructura vegetal.

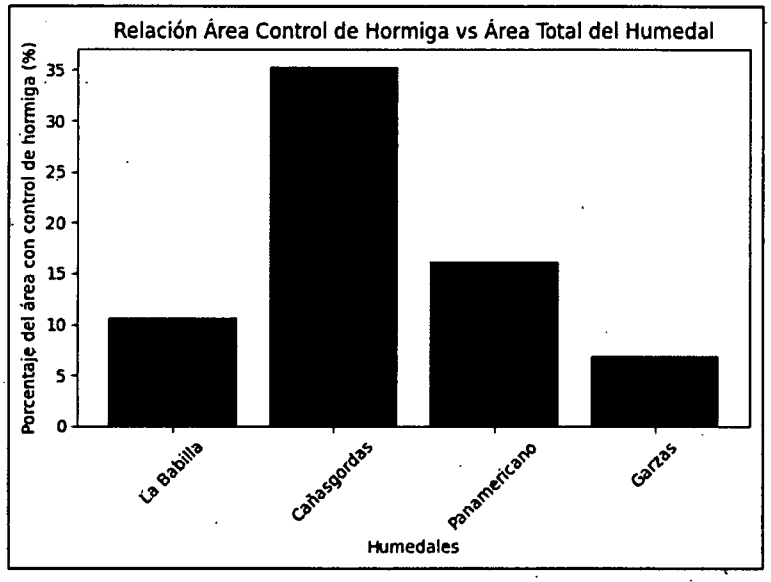

Gráfica 1. Relación Área Control de Hormiga Arriera vs Área Total del Humedal
Fuente. Este estudio 2025

Tabla 1: Porcentaje de control de hormiga arriera con respecto al área total en los humedales intervenidos.

Humedal	Área Total (m²)	Área Control (m²)	% Intervenido
La Babilla	37.500	4.000	**10,67 %**
Cañasgordas	51.000	18.000	**35,29 %**
Panamericano	21.676	3.500	**16,15 %**
Garzas	58.000	4.000	**6,90 %**

Fuente. Este estudio 2025

- **Cañasgordas (35,29 %)**: Condición crítica inicial, con población desbordada y alto riesgo para árboles jóvenes y zonas en regeneración. La frecuencia de aplicación fue determinante para reducir actividad de forrajeo y disminuir la presión sobre brotes nuevos.
- **Panamericano (16,15 %)**: Afectación intermedia, con presencia significativa en bordes ribereños y sectores de renovación vegetal.
- **La Babilla (10,67 %)**: Intervención preventiva–correctiva, focalizada en polígonos con actividad activa de hormigueros.
- **Garzas (6,9 %)**: Intervención puntual, orientada a evitar expansión poblacional hacia zonas de restauración paisajística.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

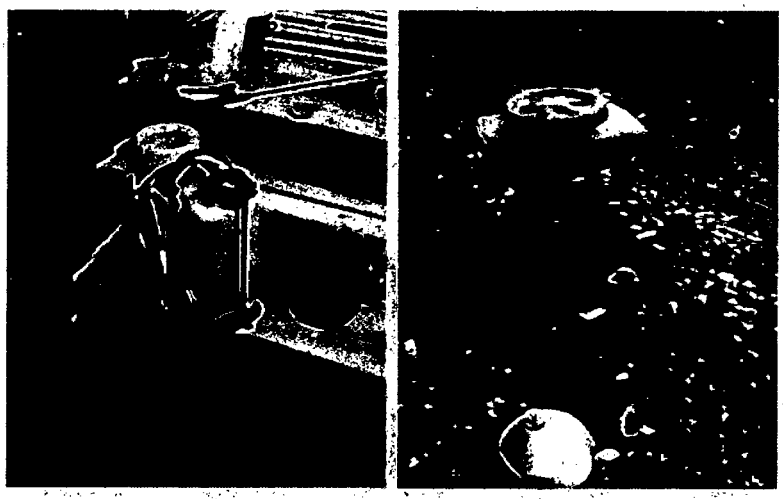


Ilustración 25. Preparación de productos para control de hormiga arriera humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 26. Aspecto de zona afectada por hormiga arriera (Atta sp) humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 27. Mosaico registro de control de hormiga arriera humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

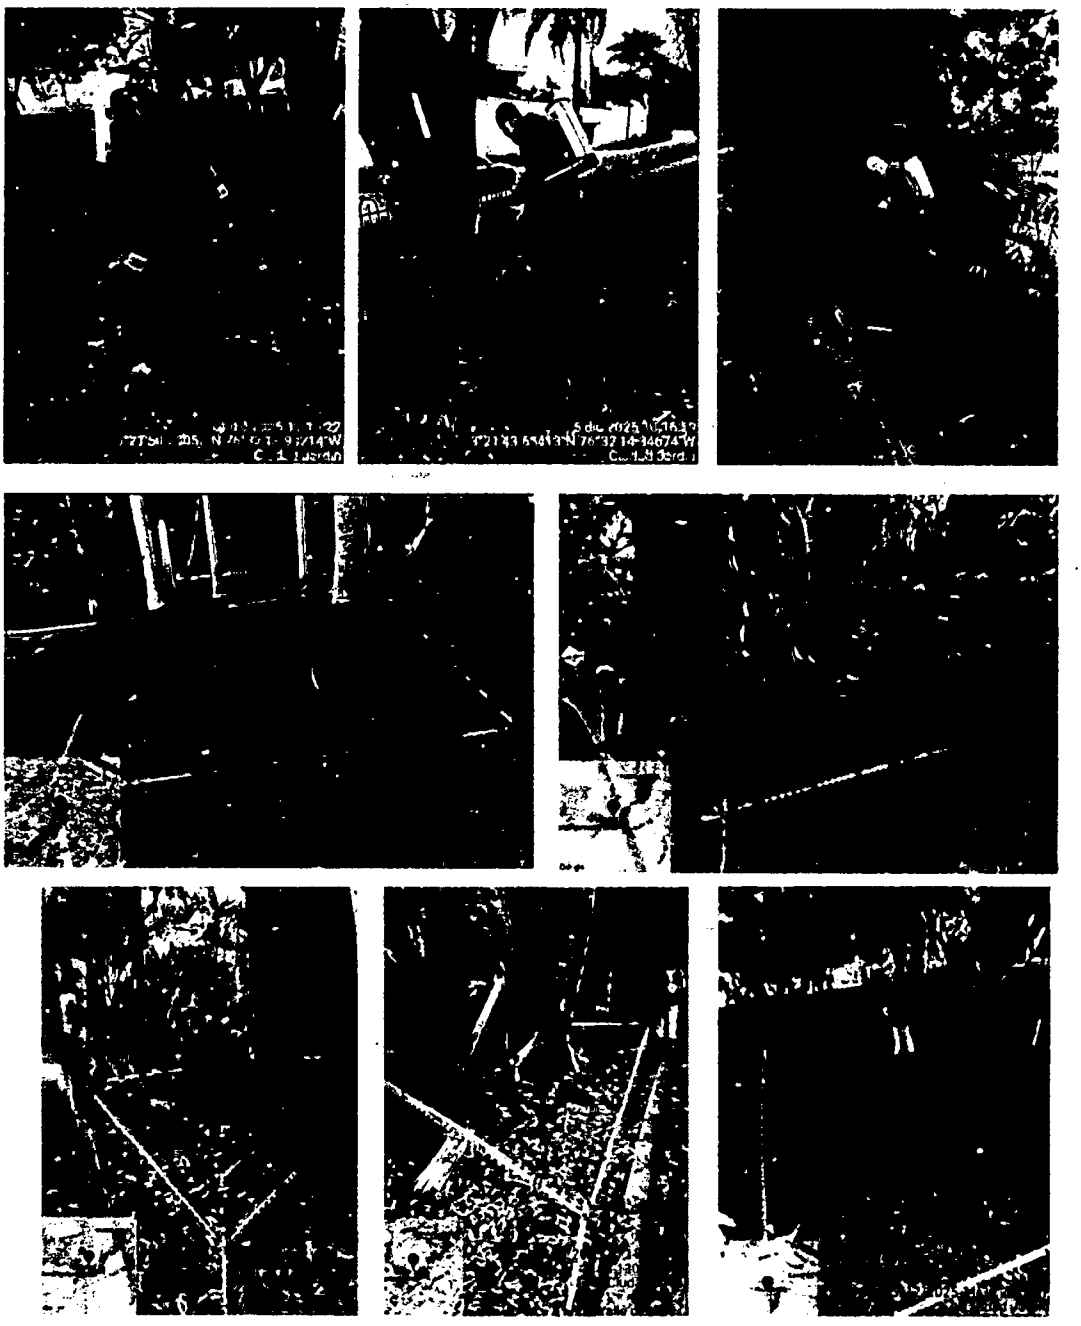


Ilustración 28. Mosaico registro de control de hormiga arriera humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

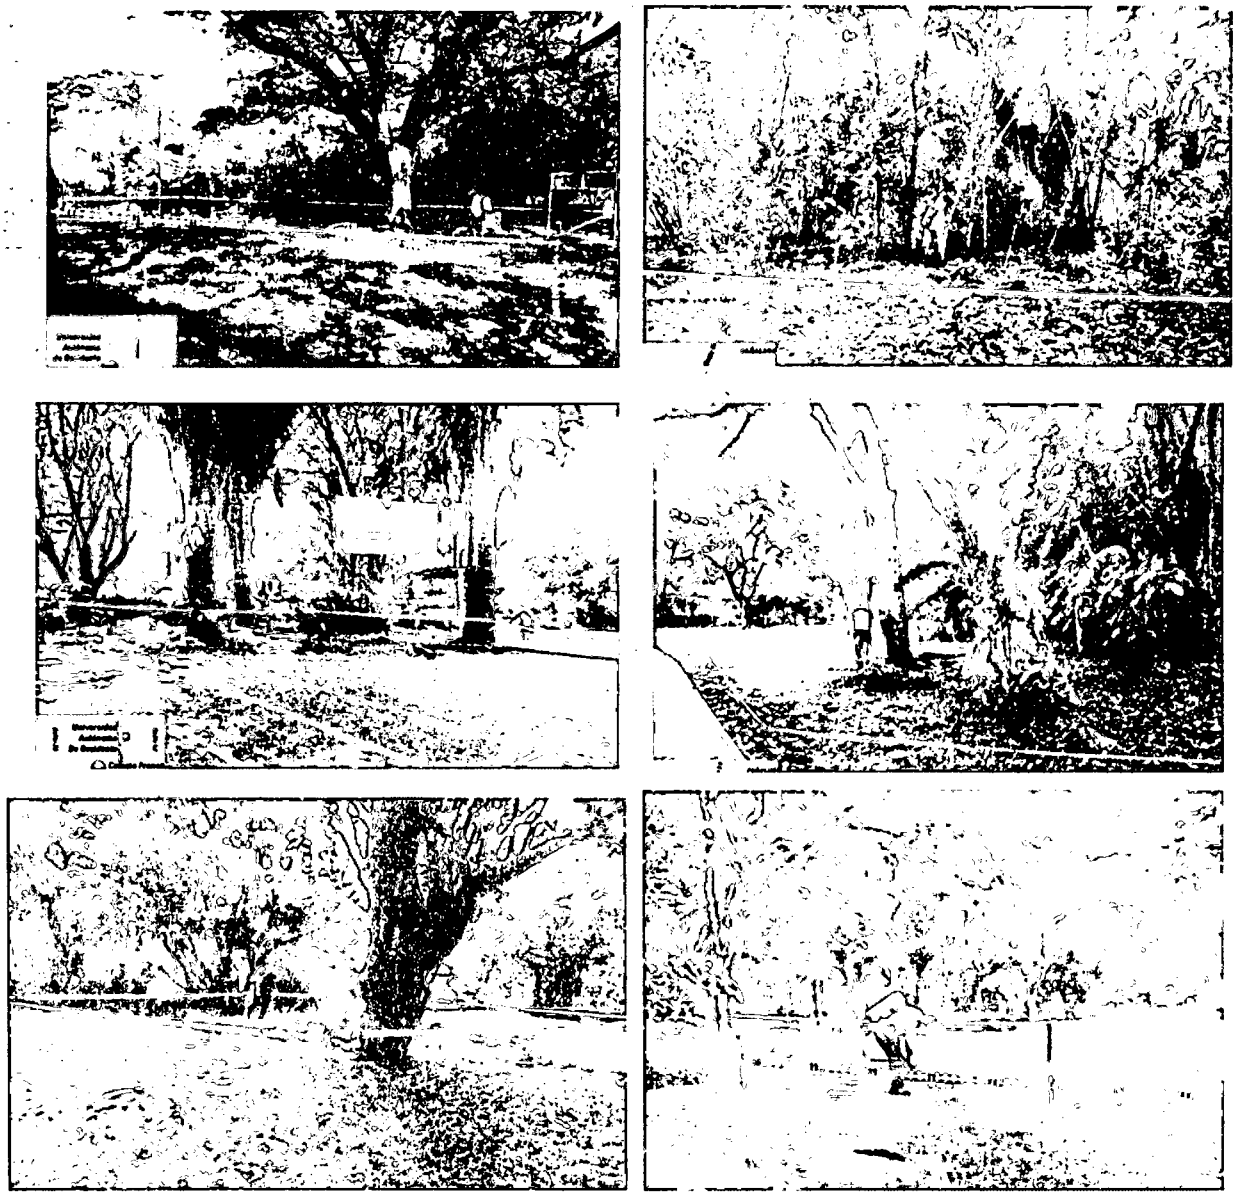


Ilustración 29. Mosaico registro de control de hormiga arriera humedal Panamericano
Fuente. Este estudio 2025

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.2.3. MANEJO SANITARIO DE LOS ÁRBOLES

El manejo sanitario de los árboles en los humedales de Cali es esencial para garantizar su salud y longevidad, y debe complementarse con prácticas de nutrición edáfica que fortalezcan el suelo y mejoren la resiliencia de estos ecosistemas frente a plagas, enfermedades y procesos de degradación

Los humedales Cañasgordas, Panamericano, Parque de las Garzas y La Babilla, albergan una diversidad de especies arbóreas que cumplen funciones críticas en la regulación hídrica, la captura de carbono, la provisión de hábitat y la conectividad ecológica. Sin embargo, estos árboles enfrentan presiones antrópicas y naturales que requieren un manejo técnico especializado.

Para hacer este manejo se realizó el diagnostico de cada uno de los individuos mayores a doce metros y menores a doce metros de altura, criterio establecido en los términos del proyecto. Este ejercicio de diagnóstico da cuenta de su clasificación botánica, los datos dasométricos, las condiciones sanitarias de su sistema radicular, fuste y estructura aérea.

De igual manera, se evaluaron las evidencias que haya ante la presencia de plagas y enfermedades y de nutrición.

Con base en estas observaciones se planteó el diagnostico para determinar las necesidades en el individuo y adelantar los correctivos necesarios.

El diagnostico de cada árbol quedó consignado en una ficha de campo que luego es transcrita a la base de datos para cuantificar las necesidades de productos agroquímicos, así como las actividades necesarias como parte del manejo. Ver Anexo Ficha Evaluación de Campo.

Se realizó el diagnóstico de los árboles del Humedal La Babilla (20 mayores de doce metros y 80 menores a doce metros), árboles de humedal Cañasgordas (100 mayores a doce metros y 100 menores a doce metros, árboles humedal Las Garzas (90 mayores a doce metros y 60 menores a doce metros) y humedal Panamericano (45 mayores a doce metros y 120 menores a doce metros), solicitados en el proyecto. Total general evaluado: 615 árboles

Tabla 2. Número de árboles diagnosticados en cada humedal

Humedal	>12 m	<12 m	Total
La Babilla	20	80	**100**
Cañasgordas	100	100	**200**
Las Garzas	90	60	**150**
Panamericano	45	120	**165**

Humedal Cañasgordas (200 individuos – 32,5 % del total evaluado): Es el humedal con mayor carga arbórea diagnosticada. Presenta una distribución equilibrada entre árboles mayores y menores de 12 m. Su peso dentro del programa de manejo sanitario es prioritario.

Humedal Panamericano (165 individuos – 26,8 %): Predomina el estrato menor de 12 m (120 individuos).

Humedal Las Garzas (150 individuos – 24,4 %): Presenta mayor proporción de árboles adultos (90 >12 m).

Humedal La Babilla (100 individuos – 16,3 %): Es el humedal con menor número evaluado, pero con predominio claro de individuos menores de 12 m (80 %).

El diagnostico indica que, aunque hay evidencias de la presencia de plagas y enfermedades en las poblaciones de árboles evaluadas, su afectación no es significativa, probablemente porque la población de insectos plaga es itinerante por tener hospederos secundarios y por el estado de clima con régimen de lluvia de baja precipitación, aunque se esté en meses de periodo de lluvias.

Se demuestran cambios en la coloración del follaje que lleva a determinar deficiencias nutricionales que conllevan a que el individuo arbóreo pueda ser susceptible a plagas, enfermedades y estrés ambiental, especialmente por cambios en el régimen hídrico donde se reduce la capacidad de regeneración y aumentan la vulnerabilidad de los árboles.

Con base en lo anterior se concluye que, la falta de nutrientes esenciales en el suelo limita el crecimiento y la resistencia de los árboles frente a agentes patógenos. Por lo tanto, se recomienda la nutrición edáfica como principal estrategia de manejo fitosanitario.

La nutrición edáfica se convierte en un eje fundamental del manejo fitosanitario, ya que fortalece la base del ecosistema: el suelo. Entre las prácticas recomendadas se destacan: Mejora en la capacidad de captura de carbono y regulación hídrica de los humedales, el

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

fortalecimiento de la conectividad ecológica, al garantizar la permanencia de individuos arbóreos sanos y la sostenibilidad a largo plazo, al integrar el manejo fitosanitario con la conservación del suelo y la biodiversidad.

Para el programa de nutrición se hace el cálculo de los requerimientos de cada uno de los individuos y se hace la aplicación puntual en la corona. Se utilizó abono de formulación completa, más suplemento de nitrógeno más elementos menores.

El programa de mantenimiento de cada árbol seleccionado esta registrado en ficha individual en cada uno de los humedales intervenidos. Ver Anexo Fichas de mantenimiento de árboles.



Ilustración 30. Levantamiento de información para fichas de diagnóstico forestal humedal Cañasgordas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 31. Levantamiento de información para fichas de diagnóstico forestal humedal Las Garzas
Fuente. Este estudio 2025



Ilustración 32. Socialización técnica actividad de fertilización humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

50

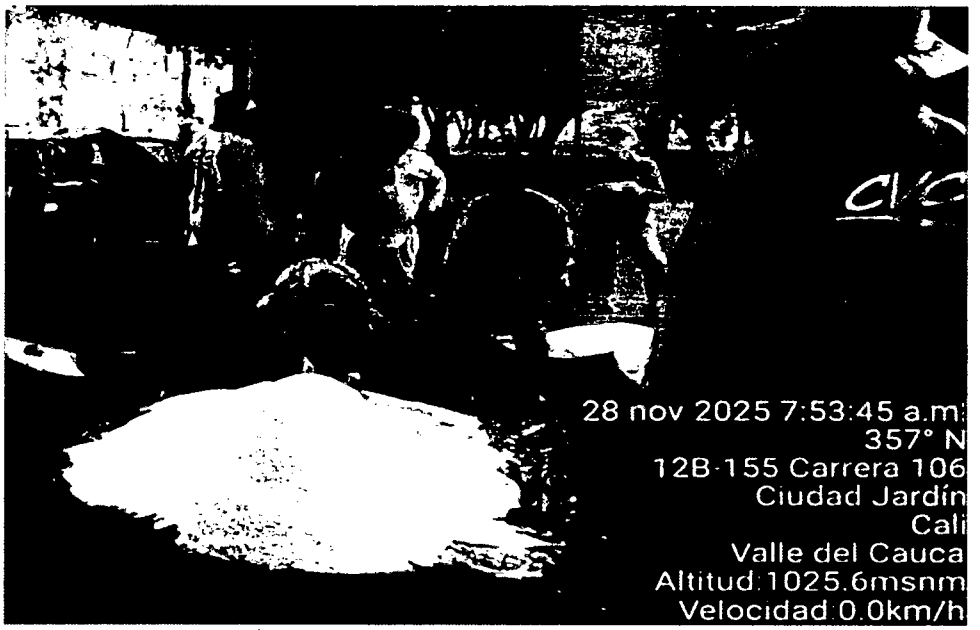


Ilustración 33 Preparación mezcla de abono edáfico humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

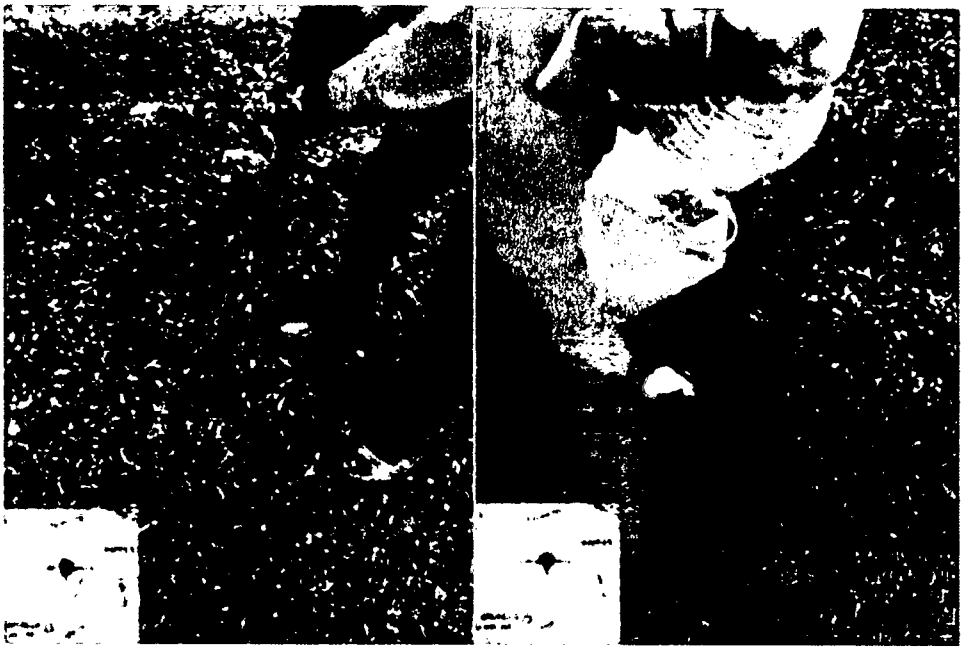


Ilustración 34 Perforación y aplicación de abono edáfico humedal La Babilla
Fuente. Este estudio 2025

4.3. COMPONENTE SOCIAL

4.3.1. Diagnosticos participativos con enfoque diferencial para orientar la intervencion social de los proyectos institucionales

En el marco de la ejecución del Contrato No. 0741 de 2025, el componente de diagnóstico participativo con enfoque diferencial, se consolidó como un eje transversal y estratégico para orientar la intervención social del proyecto, permitiendo una aproximación integral a las realidades sociales, comunitarias, territoriales y ambientales de las poblaciones vinculadas a los humedales priorizados. Este componente se concibió no únicamente como un ejercicio técnico de recolección de información, sino como un proceso progresivo de acercamiento comunitario, reconocimiento del territorio, diálogo social y construcción de confianza entre las comunidades y las acciones institucionales desarrolladas en torno a la recuperación y conservación de los humedales urbanos.

Desde esta perspectiva, el proceso diagnóstico se estructuró bajo el reconocimiento de que los humedales urbanos y periurbanos presentan dinámicas sociales heterogéneas, asociadas a factores como la localización territorial, el grado de residencia y arraigo de las comunidades, las formas de uso y apropiación del ecosistema, la composición etaria de la población, los niveles de organización comunitaria y la relación histórica con los procesos institucionales. En consecuencia, el enfoque diferencial aplicado permitió evitar aproximaciones homogéneas y estandarizadas, privilegiando una lectura contextualizada y situada de cada territorio, ajustada a las particularidades sociales y ambientales de cada humedal.

Con el fin de fortalecer la planeación social del proyecto y generar insumos técnicos para la toma de decisiones, se diseñaron e implementaron dos instrumentos diagnósticos complementarios: (i) un formato de caracterización poblacional con énfasis en humedales y (ii) un formato de levantamiento de experiencias y aprendizajes derivados de los talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario. Ambos instrumentos fueron concebidos como herramientas técnicas flexibles, orientadas a apoyar los procesos pedagógicos, retroalimentar las estrategias de intervención social y aportar información relevante para el análisis territorial.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

4.3.2. Implementacion de instrumento de caracterizacion poblacional con enfasis en humedales

El formato de caracterización poblacional con énfasis en humedales, se estructuró como una herramienta de carácter descriptivo y analítico, orientada a identificar información social relevante de las comunidades vinculadas a los humedales intervenidos. Este instrumento permitió recopilar datos generales de los participantes, información asociada al contexto familiar y residencial, condiciones de vulnerabilidad psicosocial, niveles de participación comunitaria, conocimiento sobre los humedales y disposición frente a los procesos de conservación ambiental. Así mismo, incluyó aspectos relacionados con la autorización para el uso de la información, los canales de comunicación y el interés de los participantes en continuar vinculados a las actividades y procesos del proyecto.

El instrumento se organizó en cinco (5) secciones, que permiten una lectura integral de las condiciones sociales de los participantes. La primera sección, recoge información básica del encuestado, orientada a contextualizar su relación con el territorio. La segunda sección, indaga sobre condiciones de vulnerabilidad psicosocial, permitiendo identificar factores sociales que pueden incidir en la participación comunitaria. La tercera sección, se enfoca en las formas de participación ciudadana y el conocimiento de los mecanismos de gestión ambiental y comunitaria asociados a los humedales. Las secciones cuarta y quinta, están orientadas a la identificación de canales de comunicación, el interés en la continuidad del vínculo con el proyecto y el consentimiento informado para el uso de la información y el registro audiovisual.

La aplicación del formato de caracterización, se realizó de manera articulada a los talleres, jornadas pedagógicas y espacios de educación ambiental desarrollados en el marco del proyecto, entendiendo que estos escenarios constituyen momentos clave para el diálogo comunitario y el intercambio de saberes. No obstante, su implementación presentó alcances diferenciados según las características sociales, etarias y territoriales de cada humedal.

En el humedal Isaías Duarte Cancino, ubicado en la comuna 15 del Distrito de Santiago de Cali, se logró un mayor nivel de aplicación del instrumento durante el periodo correspondiente al mes de diciembre. En este territorio se diligenciaron sesenta y cuatro (64) formatos de caracterización poblacional con personas mayores de 18 años, residentes en la comuna y participantes de los espacios pedagógicos adelantados. Este ejercicio permitió avanzar de manera significativa en el levantamiento de información social del sector, constituyéndose en un insumo relevante para la comprensión de las dinámicas comunitarias asociadas al humedal.

Durante el proceso de aplicación del instrumento en este territorio se identificaron reacciones diversas por parte de los participantes, principalmente relacionadas con la comprensión inicial del objetivo del formato y su vínculo con las actividades pedagógicas desarrolladas. En algunos casos se evidenció reserva frente al suministro de información considerada de carácter personal. Estas situaciones fueron abordadas mediante procesos de explicación, socialización y acompañamiento durante la aplicación del instrumento, resaltando la importancia de la claridad, la transparencia y la construcción de confianza en los procesos de levantamiento de información social.

Adicionalmente, se identificó que una proporción significativa de los talleres desarrollados en este humedal estuvo dirigida a población menor de edad, con rangos aproximados entre los 8 y 16 años. Dado que el formato de caracterización poblacional está diseñado para ser aplicado exclusivamente a personas mayores de edad, esta condición generó una diferencia entre el número total de asistentes a las actividades pedagógicas y el número de formatos efectivamente diligenciados. No obstante, la información recolectada constituye una base técnica válida para el análisis social del territorio.

Para los humedales de Cañas Gordas, La Babilla, Ecoparque de las Garzas, Panamericano e Ibis, durante el periodo de ejecución se desarrollaron múltiples talleres y espacios pedagógicos con la participación de diversas comunidades. Sin embargo, en estos territorios se evidenciaron dinámicas sociales particulares, que incidieron directamente en la aplicación del formato de caracterización poblacional.

En los humedales de La Babilla, Ecoparque de las Garzas y Panamericano, la mayoría de los participantes correspondieron a visitantes y población flotante, es decir, personas que no residen de manera permanente en las áreas de influencia directa de los humedales. Esta condición está asociada a la naturaleza de estos espacios como ecoparques y zonas de recreación ambiental, lo cual, si bien favorece la sensibilización ambiental, limita la aplicación de instrumentos de caracterización orientados a comunidades con posibilidad de vinculación sostenida a los procesos de conservación.

En el humedal Ibis, se presentaron restricciones adicionales asociadas a su ubicación geográfica y a las condiciones de acceso, dado que el cuerpo de agua se encuentra rodeado por predios de carácter privado. Esta situación limitó la cercanía con comunidades residentes y la realización de ejercicios comunitarios continuos, priorizándose acciones de observación participativa, reconocimiento territorial y diálogo con actores presentes de manera ocasional.

En el caso del humedal Cañas Gordas, aunque se identifican vecinos inmediatos, se evidenció una baja participación de estos en los espacios pedagógicos desarrollados, asociada a dinámicas sociales propias del sector. Se identificó una comunidad específica

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

conformada por personas adultas mayores recientemente asentadas en la zona, cuyo vínculo con el humedal se encuentra en proceso de construcción. Dadas las condiciones etarias, el reciente arraigo territorial y la ausencia de procesos organizativos previos, no se evidenció afinidad inmediata con la aplicación del instrumento de caracterización durante el periodo reportado.

De manera transversal, se resalta que en todos los humedales intervenidos las personas participantes manifestaron interés, aceptación y valoración positiva frente al desarrollo del proyecto y a las acciones de educación ambiental implementadas. Aunque en muchos casos, la condición de visitantes limitó la aplicación de instrumentos diagnósticos estructurados, su participación permitió realizar una primera lectura territorial a partir de la observación directa, la escucha activa y el intercambio de saberes, generando insumos cualitativos relevantes para la comprensión de las dinámicas sociales asociadas a los humedales urbanos.

En relación con la información recolectada mediante el formato de caracterización poblacional, se precisa que el proceso de tabulación, sistematización y análisis integral de los datos se consolidó en su totalidad durante el periodo de ejecución reportado. Esta situación responde a la aplicación diferenciada del instrumento según las características territoriales y sociales de cada humedal, así como a la priorización de procesos de acercamiento comunitario, socialización y construcción de confianza. En este sentido, la información recolectada se reconoce como un insumo técnico válido que permite identificar aprendizajes relevantes, sobre la pertinencia y las condiciones necesarias para la aplicación de instrumentos diagnósticos de esta naturaleza.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a cada uno de los ítems que conforman las distintas categorías del instrumento de caracterización, los cuales son analizados de manera individual desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, como base para el análisis integral posterior. recalcando que el instrumento fue aplicado con la comunidad del humedal de Isaías Duarte Cancino en la comuna 15:

DATOS DEL ENCUESTADO

- **Zona residencia**

Este ítem tuvo como finalidad identificar el tipo de territorio en el que habitan las personas encuestadas, diferenciando entre zona rural y zona urbana, lo cual permite establecer el contexto espacial de la población participante. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Zona residencial	Frecuencia	Porcentaje
Rural	0	0 %
Urbana	64	100 %
Total	**64**	**100 %**

El 100 % de las personas encuestadas reside en zona urbana, mientras que no se registró ningún participante proveniente de zona rural. Este resultado indica que la totalidad de la muestra pertenece a contextos urbanos, lo que sugiere que las dinámicas sociales, económicas y de acceso a servicios de la población analizada están fuertemente asociadas a entornos urbanos.

La ausencia de participantes rurales implica que los resultados de la encuesta reflejan exclusivamente la realidad de población urbana, lo cual debe ser tenido en cuenta al momento de interpretar los hallazgos del proyecto y al realizar posibles extrapolaciones o comparaciones. De esta manera, las conclusiones del estudio estarán contextualizadas en problemáticas, condiciones de vida y estructuras propias de zonas urbanas, como mayor acceso a infraestructura, servicios públicos, educación y redes institucionales, pero también a dinámicas propias de la urbanización como densidad poblacional y desigualdad socioeconómica.

- **Edad**

El ítem edad permite identificar la estructura etaria de la población encuestada, lo cual es fundamental para comprender sus características demográficas, sus necesidades sociales y su relación con los objetivos del proyecto. A partir de los datos recolectados, se obtuvo un total de 64 personas, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 94 años, lo que evidencia una muestra amplia y heterogénea en términos generacionales. A continuación, se presenta la frecuencia absoluta y relativa de las edades registradas:

Edad	Frecuencia	Porcentaje
18	1	1,60%
23	2	3,10%
30	1	1,60%
32	3	4,70%
35	1	1,60%
36	3	4,70%
37	2	3,10%
38	1	1,60%
39	1	1,60%

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Edad	Frecuencia	Porcentaje
40	2	3,10%
41	1	1,60%
42	1	1,60%
43	2	3,10%
45	3	4,70%
46	1	1,60%
48	1	1,60%
50	1	1,60%
51	2	3,10%
52	2	3,10%
53	2	3,10%
54	1	1,60%
55	1	1,60%
57	2	3,10%
58	1	1,60%
60	1	1,60%
63	1	1,60%
64	1	1,60%
65	1	1,60%
66	4	6,30%
67	2	3,10%
68	1	1,60%
69	1	1,60%
70	2	3,10%
71	3	4,70%
78	2	3,10%
80	3	4,70%
84	1	1,60%
85	1	1,60%
88	1	1,60%
94	1	1,60%
Total	**64**	**100%**

La población encuestada presenta una amplia diversidad etaria, con edades que abarcan desde los 18 hasta los 94 años, lo que indica una representación intergeneracional significativa. No obstante, se observa una mayor concentración en los grupos de edad media y adulta mayor.

Las edades con mayor frecuencia fueron 66 años (6,3 %), seguidas por los grupos de 32, 36, 45, 71 y 80 años, cada uno con 4,7 % de la muestra. Esto evidencia una presencia importante de personas en etapas de adultez y vejez, lo cual sugiere que el proyecto impacta o involucra de manera relevante a población adulta y adulta mayor.

Asimismo, los grupos de edad comprendidos entre los 50 y los 80 años, concentran la mayor parte de la muestra, lo que permite inferir que la población participante presenta características propias de estas etapas del ciclo vital, como mayor experiencia laboral, posibles condiciones de salud asociadas al envejecimiento y necesidades específicas en términos de bienestar, acceso a servicios y acompañamiento institucional.

Por otro lado, la participación de personas jóvenes es reducida. Las edades entre los 18 y los 30 años representan un porcentaje bajo de la muestra, lo que indica una menor representación de población juvenil dentro del proceso de caracterización.

En conjunto, la distribución etaria muestra que el proyecto se desarrolla principalmente con una población urbana, mayoritariamente adulta y adulta mayor, lo que debe ser considerado al diseñar estrategias, intervenciones y políticas derivadas de los resultados de la encuesta.

- **Pertenencia étnica**

El ítem de pertenencia étnica permite identificar la diversidad cultural de la población encuestada, así como los procesos de autoidentificación étnica, los cuales son fundamentales para comprender las dinámicas sociales, históricas y culturales que atraviesan a la población participante en el proyecto. A partir de la información recolectada, los resultados fueron los siguientes:

Pertenencia étnica	Frecuencia	Porcentaje
Afrodescendiente	7	11%
Indígena	1	2%
Mestizo	26	41%
No se identifica con ninguna etnia	16	25%
No responde	14	22%
Total	**64**	**100%**

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

La distribución de la pertenencia étnica, evidencia una diversidad cultural moderada dentro de la población encuestada, aunque también refleja una presencia importante de procesos de no identificación y ausencia de respuesta.

El grupo más representativo, corresponde a las personas que se reconocen como mestizas, con 26 participantes (40,6 %), lo que concuerda con la composición histórica y demográfica predominante en contextos urbanos colombianos. Este resultado indica que una parte significativa de la población se adscribe a una identidad étnica construida a partir de la mezcla de herencias indígenas, africanas y europeas.

En segundo lugar, se encuentra el grupo de personas que no se identifica con ninguna etnia, que representa el 25 % de la muestra. Este porcentaje es relevante, ya que puede interpretarse como una expresión de distanciamiento frente a las categorías étnicas tradicionales o como una percepción de identidad basada más en lo nacional, urbano o individual que en la pertenencia étnica. Por su parte, el 21,9 % de los encuestados no respondió a este ítem, lo que constituye una proporción considerable. Esta ausencia de respuesta puede estar asociada a desconocimiento, falta de claridad sobre el concepto de pertenencia étnica, o a posibles reservas frente a la autoidentificación en este tipo de categorías.

Finalmente, se identificó una participación de personas afrodescendientes (10,9 %) y una presencia mínima de población indígena (1,6 %), lo que refleja la existencia, aunque limitada, de diversidad étnica en la muestra.

En conjunto, estos resultados muestran que, aunque existe una base mestiza predominante, la población encuestada presenta una composición cultural diversa, atravesada por distintos niveles de identificación, lo cual debe ser considerado en el análisis social del proyecto, especialmente en lo relacionado con inclusión, enfoque diferencial y reconocimiento de la diversidad.

- **Género y sexo**

El ítem de género y sexo, permite identificar la composición de la población encuestada en términos de distribución por sexo y género, lo cual es una variable clave para el análisis sociodemográfico y para la formulación de estrategias con enfoque diferencial dentro del proyecto. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Género	Frecuencia	Porcentaje
Masculino	15	23%
Femenino	49	77%
Total	**64**	**100%**

La distribución por género evidencia una marcada predominancia de mujeres dentro de la población encuestada. Del total de 64 participantes, 49 personas (76,6 %) se identifican con el género femenino, mientras que 15 personas (23,4 %) corresponden al género masculino.

Este resultado indica que, el proyecto tiene una mayor participación femenina, lo que puede estar relacionado con varios factores, como una mayor vinculación de las mujeres a los espacios comunitarios, sociales o institucionales en los que se aplicó la encuesta, o una mayor disposición a participar en procesos de caracterización y diagnóstico social.

La sobrerrepresentación femenina también implica que, los resultados generales del estudio estarán influenciados en mayor medida por las experiencias, percepciones y condiciones de vida de las mujeres. Por tanto, los análisis posteriores y las estrategias derivadas del proyecto, deben considerar un enfoque de género, atendiendo a las necesidades, roles y posibles situaciones de vulnerabilidad que afectan diferencialmente a la población femenina.

Asimismo, la participación masculina, aunque menor, sigue siendo significativa, lo que permite mantener una perspectiva comparativa y evitar una visión completamente homogénea de la población.

- **Tiempo de residencia**

El tiempo de residencia es una variable clave para comprender el nivel de arraigo territorial, estabilidad habitacional y vinculación social de la población encuestada con el entorno en el que habita. Esta información permite identificar si se trata de una comunidad recientemente conformada o, por el contrario, de una población con una trayectoria prolongada en el territorio. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tiempo de residencia	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 año	3	5%
De 1 a 5 años	12	19%
De 6 a 10 años	5	8%
De 10 a 15 años	4	6%
Más de 15 años	40	63%
Total	**64**	**100%**

La distribución del tiempo de residencia, muestra un alto nivel de permanencia y arraigo territorial entre las personas encuestadas. La categoría predominante corresponde a

55

quienes han vivido más de 15 años en el lugar, con 40 personas (62,5 %), lo que indica que la mayoría de la población posee una relación prolongada con el territorio y, por tanto, un conocimiento profundo de sus dinámicas sociales, comunitarias e institucionales.

El grupo de residentes entre 1 y 5 años representa el 18,8 % de la muestra, lo que sugiere la existencia de un sector de población relativamente reciente, posiblemente vinculado a procesos de movilidad urbana, cambios habitacionales o dinámicas socioeconómicas propias del contexto urbano. Por su parte, las personas que llevan menos de un año en el territorio constituyen apenas el 4,7 %, lo que confirma que los procesos de llegada reciente son limitados y que la comunidad presenta una composición mayoritariamente estable.

Los rangos intermedios, entre 6 y 15 años, suman en conjunto el 14,1 % de la población, lo que complementa el panorama de una comunidad que, aunque ha experimentado ciertos cambios poblacionales, mantiene una base sólida de habitantes de larga trayectoria.

En conjunto, estos resultados indican que, el proyecto se desarrolla en una población mayoritariamente consolidada, con fuertes vínculos territoriales, lo que favorece procesos de participación comunitaria, memoria colectiva y apropiación de las iniciativas institucionales que se implementen en el marco del proyecto.

- **Estrato socioeconómico**

El estrato socioeconómico es una variable fundamental para identificar las condiciones materiales de vida, el nivel de acceso a servicios públicos y la posición socioeconómica de la población encuestada. En el contexto colombiano, esta clasificación permite aproximarse a los niveles de vulnerabilidad, pobreza y capacidad de pago de los hogares. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Estrato socioeconómico	Frecuencia	Porcentaje
Estrato 0	7	11%
Estrato 1	29	45%
Estrato 2	20	31%
Estrato 3	5	8%
No responde	3	5%
Total	**64**	**100%**

La distribución del estrato socioeconómico, evidencia que la población encuestada se encuentra mayoritariamente en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. En particular, los estratos 0 y 1 concentran el 56,2 % de la muestra, lo que indica que más de la mitad de los participantes pertenece a los niveles más bajos de la clasificación socioeconómica, caracterizados por limitaciones en ingresos, acceso a bienes y servicios y mayor dependencia de subsidios o apoyos institucionales.

El estrato 1, con 29 personas (45,3 %), constituye el grupo predominante, seguido del estrato 2, que representa el 31,3 %. Este último corresponde a hogares de bajos ingresos, aunque con condiciones ligeramente mejores en comparación con los estratos más bajos. La presencia del estrato 3 es reducida (7,8 %), lo que confirma que la población de nivel socioeconómico medio, es minoritaria dentro de la muestra.

El 10,9 % de personas que se ubican en estrato 0, refleja una situación de alta vulnerabilidad, asociada generalmente a asentamientos precarios, déficit de servicios públicos y condiciones de pobreza estructural. Por último, el 4,7 % que no respondió a este ítem representa una proporción baja, por lo que no afecta de manera significativa la interpretación general del perfil socioeconómico de la población.

En conjunto, estos resultados muestran que el proyecto se desarrolla en un contexto predominantemente de bajos ingresos, lo que refuerza la pertinencia de intervenciones orientadas al fortalecimiento social, económico y comunitario de la población beneficiaria.

- **Número de personas que viven en el mismo hogar**

Este ítem permite identificar el tamaño de los hogares de la población encuestada, lo cual es un indicador relevante para analizar condiciones de habitabilidad, dependencia económica, dinámicas familiares y posibles situaciones de hacinamiento. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Número de personas en el hogar	Frecuencia	Porcentaje
1 persona	10	16%
2 personas	10	16%
3 personas	13	20%
4 personas	16	25%
5 personas	9	14%
6 personas	3	5%
7 personas	3	5%
Total	**64**	**100%**

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

La distribución del número de personas por hogar muestra una predominancia de hogares de tamaño medio, siendo los más frecuentes aquellos conformados por cuatro personas, que representan el 25 % de la muestra: Este tamaño es característico de estructuras familiares nucleares o extensas reducidas, comunes en contextos urbanos de estratos socioeconómicos bajos y medios bajos.

Los hogares de tres personas (20,3 %) y de una y dos personas (15,6 % cada uno) también presentan una participación significativa, lo que indica la coexistencia de distintos tipos de arreglos familiares, que pueden incluir personas que viven solas, parejas sin hijos, o familias pequeñas.

Por otra parte, los hogares numerosos, con cinco o más integrantes, representan el 23,5 % de la muestra, lo que sugiere la presencia de familias extensas o de cohabitación intergeneracional. Este tipo de hogares puede implicar mayores niveles de dependencia económica, presión sobre los ingresos y mayor demanda de servicios y espacios habitacionales.

En conjunto, estos resultados muestran que la población encuestada presenta una estructura familiar diversa, con una tendencia hacia hogares de tamaño medio, pero con una proporción relevante de hogares grandes, lo que refuerza la necesidad de considerar variables de carga familiar y condiciones de vivienda en el análisis integral del proyecto.

- **Presencia de personas pensionadas en el hogar**

Este ítem tiene como objetivo identificar la existencia de ingresos derivados de pensiones dentro de los hogares, lo cual es un indicador relevante de estabilidad económica relativa, dependencia financiera y composición etaria de la población encuestada. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

¿Hay pensionados en el hogar?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	14	22%
No	50	78%
Total	**64**	**100%**

La información recolectada evidencia que, la mayoría de los hogares (78,1 %) no cuenta con personas pensionadas, lo que indica una alta dependencia de ingresos provenientes del trabajo activo, la informalidad o apoyos sociales. Solo el 21,9 % de los hogares reportó la presencia de al menos una persona pensionada, lo que sugiere que los ingresos estables por jubilación son relativamente poco frecuentes en la población encuestada.

Este resultado es consistente con el perfil socioeconómico previamente identificado, caracterizado por una alta concentración en estratos bajos, donde históricamente los niveles de formalización laboral y acceso al sistema pensional han sido limitados.

Al analizar el número de pensionados en los hogares que sí cuentan con este tipo de ingreso, se observa que la mayoría tiene únicamente un pensionado (75 %), mientras que solo un hogar reportó la existencia de dos pensionados (25 %). Esto indica que, incluso entre los hogares con pensión, los ingresos derivados de esta fuente suelen ser reducidos y concentrados en una sola persona, lo que puede implicar que dichos recursos deben ser distribuidos entre varios miembros del hogar.

En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que la población encuestada presenta una alta vulnerabilidad económica, con baja cobertura del sistema pensional y una dependencia marcada de otras fuentes de ingreso para la sostenibilidad de los hogares.

- **Presencia de menores de 14 años en el hogar**

Este ítem permite identificar la existencia de población infantil en los hogares encuestados, lo cual es un indicador clave para analizar dinámicas de cuidado, dependencia económica, necesidades educativas y acceso a servicios sociales. Los resultados generales fueron los siguientes:

¿Hay menores de 14 años en el hogar?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	29	45%
No	32	50%
No responde	3	5%
Total	**64**	**100%**

Entre los 29 hogares que reportaron la presencia de menores de 14 años, la distribución fue la siguiente:

Número de menores de 14 años	Frecuencia	Porcentaje (sobre hogares con menores)
1 menor	18	62%
2 menores	11	38%
Total	**29**	**100%**

La información obtenida muestra que, casi la mitad de los hogares encuestados (45,3 %) convive con al menos un menor de 14 años, lo que evidencia una presencia significativa de población infantil en la comunidad. Este dato es relevante, ya que la existencia de

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

niños y niñas en el hogar implica mayores requerimientos en términos de cuidado, alimentación, educación y protección social.

Al analizar la desagregación interna de estos hogares, se observa que la mayoría (62,1 %) tiene un solo menor, lo que sugiere una carga de crianza moderada. Sin embargo, un porcentaje importante (37,9 %) reporta dos menores, lo que incrementa las demandas económicas y de cuidado dentro del hogar, especialmente en un contexto caracterizado por bajos niveles socioeconómicos y alta vulnerabilidad.

Por otra parte, el 50 % de los hogares no tiene menores de esta edad, lo cual es coherente con la alta presencia de población adulta y adulta mayor identificada en la distribución etaria. Estos hogares pueden presentar otro tipo de necesidades, asociadas principalmente al envejecimiento, la salud y la dependencia económica.

En conjunto, los resultados indican que la población encuestada presenta una composición familiar heterogénea, donde coexisten hogares con responsabilidades de crianza y hogares sin población infantil, lo que refuerza la necesidad de un enfoque diferencial en el diseño de acciones e intervenciones del proyecto.

Afiliación a una entidad de salud

La afiliación a una entidad de salud es un indicador fundamental para evaluar el acceso de la población a los servicios de atención médica, prevención y tratamiento, así como su nivel de inclusión dentro del sistema de seguridad social. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

¿Está afiliado a alguna entidad de salud?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	57	89%
No	3	5%
No responde	4	6%
Total	**64**	**100%**

Los resultados muestran un alto nivel de cobertura en salud, dentro de la población encuestada. El 89,1 % de las personas manifestó estar afiliada a alguna entidad del sistema de salud, lo que indica que la mayoría cuenta, al menos formalmente, con acceso a servicios médicos, consultas, atención hospitalaria y programas de prevención.

No obstante, el 4,7 % de las personas no está afiliado, lo que representa un grupo en condición de exclusión del sistema de seguridad social, y por tanto con mayores riesgos frente a la atención de enfermedades, accidentes o situaciones de emergencia. Aunque este porcentaje es bajo, resulta socialmente significativo, especialmente en una población caracterizada por bajos niveles socioeconómicos.

Por otro lado, el 6,2 % que no respondió a este ítem, puede corresponder a personas que desconocen su estado de afiliación o presentan dificultades para identificar su entidad de salud, lo que también constituye una forma de vulnerabilidad institucional.

En conjunto, estos resultados indican que, si bien existe una cobertura amplia del sistema de salud, persisten brechas de acceso y conocimiento que deben ser consideradas dentro de las acciones del proyecto, especialmente en lo relacionado con orientación, acompañamiento y garantía efectiva del derecho a la salud.

Escolarización de los menores de edad

Este ítem permite evaluar el acceso de los niños, niñas y adolescentes del hogar al sistema educativo formal, lo cual es un indicador clave de garantía de derechos, inclusión social y desarrollo humano. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

¿Los menores de edad están escolarizados?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	26	41%
No	3	5%
No responde	35	55%
Total	**64**	**100%**

Los resultados muestran que 26 personas (40,6 %) afirmaron que los menores de su hogar se encuentran escolarizados, lo que indica que una parte importante de la población infantil accede al sistema educativo formal.

Sin embargo, el 4,7 % de los hogares reportó que los menores no están escolarizados, lo cual constituye una situación de alta vulnerabilidad, ya que implica una posible vulneración del derecho fundamental a la educación y un mayor riesgo de exclusión social.

El porcentaje de no respuesta (54,7 %) es considerablemente alto y se explica en gran medida porque una parte significativa de los hogares no tiene menores de edad, tal como se evidenció en el ítem anterior. No obstante, también puede reflejar desconocimiento, falta de claridad en la pregunta o dificultades en el proceso de diligenciamiento de la encuesta.

En términos generales, los resultados sugieren que, entre los hogares con población infantil, la escolarización es mayoritaria, pero persisten casos que requieren atención prioritaria por parte de las instituciones, especialmente en lo relacionado con reintegración escolar, permanencia educativa y seguimiento a la población en riesgo.

58

Personas en condición de vulnerabilidad

Víctimas del conflicto armado

¿Es víctima del conflicto armado?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	15	23%
No	0	0%
No responde	49	77%
Total	**64**	**100%**

El 23,4 % de la población encuestada se reconoce como víctima del conflicto armado, lo que evidencia una presencia significativa de trayectorias de violencia, desplazamiento y afectación de derechos. Sin embargo, el 76,6 % de los encuestados no respondió a esta pregunta, lo que indica un alto nivel de subregistro y reserva frente a una condición altamente sensible.

En términos técnicos, este patrón sugiere que una proporción considerable de la población puede haber preferido no declarar su condición por razones de miedo, desconfianza institucional o revictimización. Por tanto, la incidencia real del conflicto armado en la población podría ser mayor que la reportada.

Desplazamiento forzado

¿Ha sido víctima de desplazamiento forzado?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	7	11%
No	0	0%
No responde	57	89%
Total	**64**	**100%**

El 10,9 % de los encuestados afirmó haber sido víctima de desplazamiento forzado, lo que implica procesos de ruptura territorial, pérdida de bienes y alta vulnerabilidad social. Sin embargo, el 89,1 % no respondió a este ítem, lo que indica un alto nivel de ocultamiento o dificultad para declarar esta condición.

Esto refuerza la lectura de que el desplazamiento, al igual que otras formas de victimización, se encuentra subregistrado, y que la población encuestada ha estado expuesta a dinámicas de violencia estructural, que no siempre son visibilizadas en los instrumentos de recolección.

Situación de pobreza o pobreza extrema

¿Se encuentra en pobreza o pobreza extrema?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	2	3%
No	0	0%

¿Se encuentra en pobreza o pobreza extrema?	Frecuencia	Porcentaje
No responde	62	97%
Total	**64**	**100%**

Solo el 3,1 % de la población se reconoce en condición de pobreza o pobreza extrema, mientras que el 96,9 % no respondió. Este comportamiento refleja una alta resistencia a la autoidentificación en pobreza, aun cuando otros indicadores del estudio (estrato, ingresos, tamaño del hogar) evidencian condiciones de vulnerabilidad económica.

Desde el punto de vista técnico, este patrón es consistente con procesos de normalización de la precariedad y con barreras culturales para asumir esta categoría.

Discapacidad física, sensorial, cognitiva o psicosocial

¿Presenta algún tipo de discapacidad?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	2%
No	0	0%
No responde	63	98%
Total	**64**	**100%**

La presencia de una persona con discapacidad (1,6 %) se ve acompañada de un subregistro extremo (98,4 % no respondió), lo que sugiere estigmatización, desconocimiento o miedo a declarar este tipo de condición.

Mujer cabeza de hogar

¿Es mujer cabeza de hogar?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	4	6%
No	0	0%
No responde	60	94%
Total	**64**	**100%**

El 6,3 % se reconoce como mujer cabeza de hogar, mientras que la gran mayoría no respondió, lo que evidencia nuevamente una limitación en la autoidentificación de condiciones de vulnerabilidad familiar.

Mujeres víctimas de violencia de género

Mujeres víctimas de violencia de género	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	**64**	**100%**

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Existe un subregistro absoluto de violencia de género, lo que constituye en sí mismo un hallazgo crítico.

Población LGBTI

Población LGBTI	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	**64**	**100%**

La no respuesta total indica barreras culturales y sociales para la autoidentificación, no inexistencia del fenómeno.

Riesgo o situación de calle

¿Se encuentra en riesgo o situación de calle?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

El 100 % de no respuesta en este ítem evidencia un subregistro absoluto de una de las condiciones de vulnerabilidad más críticas. Este resultado no puede interpretarse como ausencia de riesgo, sino como una fuerte barrera para la autoidentificación y declaración, posiblemente asociada al estigma social, al miedo a represalias institucionales o a la desconfianza en los procesos de caracterización.

Desde el análisis social, este patrón confirma que las situaciones de exclusión extrema tienden a quedar invisibilizadas en instrumentos de encuesta cuando no existen garantías de confidencialidad, acompañamiento y protección.

Personas privadas de la libertad o en proceso de resocialización

¿Algún miembro del hogar se encuentra privado de la libertad o en proceso de resocialización?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

La totalidad de la muestra (100 %) optó por no responder este ítem, lo que refleja un alto nivel de reserva, temor o estigmatización social frente a la posible vinculación con el sistema penitenciario o procesos de resocialización. Desde el punto de vista técnico, este

comportamiento genera un vacío de información estadística, impidiendo determinar la magnitud real de esta condición dentro de la población.

Este tipo de resultados es característico de variables altamente sensibles, y debe ser interpretado como un indicador indirecto de exclusión social y desconfianza institucional, más que como evidencia de inexistencia del fenómeno.

Migrantes

¿Algún miembro del hogar es migrante?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

El 100 % de no respuesta en el ítem de migración refleja un alto nivel de subregistro de esta condición dentro de la población caracterizada. La migración, en especial cuando está asociada a situaciones de irregularidad, desplazamiento o vulnerabilidad económica, suele ser un fenómeno ocultado por temor a sanciones, estigmatización o pérdida de beneficios sociales.

Desde una perspectiva técnica, este resultado constituye una limitación significativa de la encuesta, ya que impide identificar dinámicas de movilidad humana que podrían estar incidiendo de manera estructural en las condiciones socioeconómicas del territorio.

Población colombiana retornada

¿Algún miembro del hogar es colombiano retornado?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

La ausencia total de respuestas (100 % no responde) en este ítem indica un vacío completo de información sobre procesos de retorno migratorio, lo cual puede estar relacionado con desconocimiento del concepto, temor a ser identificado como retornado o desconfianza frente al uso de los datos.

Desde el análisis socio institucional, este resultado refuerza la existencia de barreras para el reconocimiento de trayectorias migratorias, lo que dificulta la formulación de políticas públicas orientadas a reintegración social, laboral y territorial.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Jóvenes en situación de vulnerabilidad

¿Existen jóvenes en situación de vulnerabilidad en el hogar?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	2%
No	0	0%
No responde	63	98%
Total	**64**	**100%**

Solo una persona (1,56 %) declaró la presencia de jóvenes en situación de vulnerabilidad en su hogar, mientras que el 98,44 % optó por no responder. Este patrón revela un subregistro extremo de una población que, según la evidencia social, suele estar presente en contextos de precariedad económica, violencia, desescolarización y exclusión.

La elevada tasa de no respuesta, sugiere dificultades para reconocer o admitir la condición de vulnerabilidad juvenil, posiblemente asociadas a estigmatización, desconocimiento del concepto o temor a consecuencias institucionales. Desde una perspectiva técnica, este ítem debe ser considerado de baja confiabilidad estadística directa, pero de alto valor diagnóstico indirecto, al evidenciar barreras estructurales para la visibilización social.

Personas con enfermedades catastróficas o huérfanas

¿Algún miembro del hogar padece una enfermedad catastrófica o huérfana?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

La totalidad de la muestra (100 %) se abstuvo de responder este ítem, lo que evidencia una invisibilización completa de condiciones de salud de alta complejidad dentro de la comunidad. Este comportamiento puede estar asociado a temor al estigma, desconocimiento clínico, o preocupación por el uso de la información.

Desde el punto de vista técnico y social, este resultado constituye una limitación crítica del instrumento de caracterización, ya que impide identificar poblaciones que, por definición, requieren priorización en la atención, protección social y asignación de recursos públicos.

Víctimas de trata de personas o explotación sexual

¿Algún miembro del hogar ha sido víctima de trata de personas o prostitución forzada?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

El 100 % de no respuesta en este ítem confirma una invisibilización absoluta de una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos. La trata de personas y la explotación sexual están asociadas a altos niveles de miedo, coerción, vergüenza y riesgo, lo que explica la negativa total a declarar esta condición en encuestas comunitarias.

Desde una perspectiva técnica, este resultado debe interpretarse como un indicador de silencio estadístico, no como ausencia real del fenómeno, y refuerza la necesidad de estrategias de caracterización cualitativas, confidenciales y con enfoque de protección.

Personas afectadas por emergencias, desastres o crisis humanitarias

¿Algún miembro del hogar ha sido afectado por emergencias, desastres o crisis humanitarias?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	2%
No	0	0%
No responde	63	98%
Total	**64**	**100%**

Solo una persona (1,56 %) reconoció afectación por emergencias o crisis humanitarias, mientras que la gran mayoría (98,44 %) optó por no responder. Este comportamiento confirma una subdeclaración extrema de eventos que, en contextos de alta vulnerabilidad territorial, suelen tener impactos significativos sobre vivienda, ingresos, salud y estabilidad social.

Desde el análisis técnico, la elevada no respuesta sugiere temor, normalización del riesgo o desconfianza en la institucionalidad, lo que limita la capacidad del proyecto para identificar necesidades de gestión del riesgo y atención humanitaria.

61

Perteneciente a comunidad étnica (indígena, afro, ROM, raizal o palenquera)

¿Pertenece a una comunidad étnica?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	0	0%
No	0	0%
No responde	64	100%
Total	**64**	**100%**

La ausencia total de respuestas (100 % no responde) evidencia una barrera cultural y social para la autoidentificación étnica, aun cuando en el módulo general de caracterización sí se reportó población afro, indígena y mestiza. Esta contradicción revela una inconsistencia inducida por el contexto del bloque de vulnerabilidad, donde las personas pueden haber interpretado que reconocerse como parte de una comunidad étnica implicaba quedar categorizadas como población vulnerable.

Desde el análisis técnico, este resultado muestra un efecto de estigmatización institucional que afecta la calidad de la información y conduce a la invisibilización de identidades colectivas.

No se consideran Población Vulnerable

Ninguna (No soy persona vulnerable)	Frecuencia	Porcentaje
Sí	14	22%
No	0	0%
No responde	50	78%
Total	**64**	**100%**

El 21,88 % de los encuestados indicó que no pertenece a ninguna (grupo, comunidad o categoría de vulnerabilidad específica), mientras que la mayoría (78,12 %) optó por no responder.

Este patrón refleja un alto nivel de reserva o desconocimiento frente a la autoidentificación en relación con categorías de vulnerabilidad o participación comunitaria. Desde un enfoque técnico, este resultado indica que gran parte de la población no se identifica dentro de grupos de referencia, lo que limita la visibilidad de ciertas condiciones sociales y la planificación de estrategias de intervención.

Pertenencia a grupos de base u organización social

Tipo de grupo u organización	Frecuencia	Porcentaje
Grupo cultural	8	13%
Grupo comunitario	2	3%
Grupo deportivo	2	3%
Grupo ambiental	2	3%
Junta de Acción Comunal	2	3%
No responde	48	75%
Total	**64**	**100%**

Solo el 25 % de la población manifestó pertenecer a algún tipo de grupo de base u organización social, destacándose principalmente la participación en grupos culturales (12,5 %). El 75 % de no respuesta refleja una baja visibilidad de la organización comunitaria, lo cual puede deberse tanto a débil tejido social organizado como a desconocimiento del concepto de "grupo de base".

Desde el punto de vista del proyecto, este resultado es relevante, ya que la limitada asociatividad formal puede afectar la capacidad de gestión colectiva, participación ciudadana y sostenibilidad de procesos comunitarios.

Participación en instancias de participación ciudadana

Tipo de instancia de participación	Frecuencia	Porcentaje
Mesa o grupo de tercera edad	19	30%
Espacio de discapacidad	1	2%
No responde	44	69%
Total	**64**	**100%**

El 31,25 % de la población, reportó algún tipo de vinculación a instancias de participación ciudadana, predominando ampliamente los espacios de tercera edad (29,69 %). Esto evidencia una alta participación de personas mayores en escenarios organizativos, lo cual es coherente con la estructura etaria envejecida previamente identificada. Sin embargo, el 68,75 % de no respuesta, indica que la mayoría de la población no se encuentra vinculada o no reconoce su participación en mecanismos formales de representación, lo que refleja bajos niveles de articulación comunitaria institucionalizada.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

PERTENENCIA AL HUMEDAL

Conocimiento sobre el humedal: existencia de comité

¿Sabe si el humedal tiene comité de comanejo?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	14	22%
No	42	66%
No responde	8	13%
Total	**64**	**100%**

Solo 21,88 % de los encuestados afirmó conocer la existencia de un comité del humedal, mientras que la mayoría (65,63 %) indicó que no lo sabe. Un 12,5 % no respondió. Este resultado evidencia un bajo nivel de conocimiento comunitario sobre los mecanismos de gestión y gobernanza del humedal, lo que puede limitar la participación activa y la toma de decisiones en la protección del ecosistema. Además, la proporción significativa de "no responde", sugiere que existe desinformación o desinterés frente a la estructura organizativa del humedal.

Pertenencia al comité del humedal

¿Es miembro del comité del humedal?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	2%
No	55	86%
No responde	8	13%
Total	**64**	**100%**

Solo 1,56 % de los encuestados pertenece formalmente al comité del humedal, mientras que la gran mayoría (85,94 %) indicó que no lo es. Un 12,5 % no respondió. Estos resultados muestran que la participación directa en la gestión del humedal, es extremadamente baja, lo que evidencia una limitada articulación entre la comunidad y los espacios de gobernanza ambiental. Además, la proporción de no respuesta, indica que un segmento de la población no se siente informado o implicado en la estructura del comité, reflejando la necesidad de estrategias de sensibilización y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Pertenencia a organización ambiental

¿Hace parte de alguna organización ambiental?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	1	2%
No	11	17%
No responde	52	81%
Total	**64**	**100%**

Solo 1,56 % de los encuestados pertenece a una organización ambiental, mientras que 17,19 % indicó que no pertenece y la gran mayoría (81,25 %) no respondió. Estos resultados muestran un bajo nivel de participación ciudadana en organizaciones ambientales, lo que evidencia una escasa articulación de la comunidad con espacios de gestión y protección del humedal. La elevada proporción de "no responde", indica también desconocimiento, desinterés o percepción de irrelevancia de estas organizaciones dentro de la población.

Desde un enfoque técnico, este ítem refleja la necesidad de estrategias de sensibilización y fortalecimiento de la participación ambiental comunitaria, para mejorar la gobernanza local y la conservación de los ecosistemas.

Conocimiento sobre instituciones que atienden la conservación del humedal

Conoce usted que instituciones atienden la conservación del humedal	Frecuencia	Porcentaje
CVC	22	34%
Policía Ambiental	2	3%
DAGMA	20	31%
OPAFCO	1	2%
No conoce / No sabe	5	8%
No responde	31	48%
Total	**64**	**100%**

El 34,38 % de los encuestados mencionó a CVC como institución encargada de la conservación, seguido por 31,25 % que indicó DAGMA. Solo un pequeño porcentaje reconoce a Policía Ambiental (3,13 %) u OPAFCO (1,56 %), mientras que 7,81 % respondió "no sabe" y 48,44 % no respondió.

Estos resultados evidencian que, menos de la mitad de la población conoce formalmente las instituciones responsables del humedal, lo que refleja un débil nivel de sensibilización y comunicación institucional. La elevada proporción de "no responde", indica desinformación o desconexión con los procesos de conservación, lo que puede limitar la participación ciudadana y la efectividad de las políticas ambientales locales.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN

Canal de comunicación para información sobre el humedal

Canal de comunicación	Frecuencia	Porcentaje
Correo electrónico	1	2%
WhatsApp	16	25%
No responde	47	73%
Total	**64**	**100%**

El 25 % de los encuestados indicó que, utiliza WhatsApp como canal de comunicación, mientras que solo 1,56 % mencionó correo electrónico. La gran mayoría (73,44 %) no respondió, lo que refleja un bajo nivel de articulación y comunicación formal con los canales disponibles para temas del humedal.

Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer los canales de comunicación comunitaria, especialmente utilizando medios accesibles y de uso cotidiano como WhatsApp, pero también mejorando la visibilidad y promoción de correos electrónicos u otros mecanismos oficiales. La elevada "no respuesta", puede indicar desconocimiento de los canales existentes o falta de interés en la información institucional.

Deseo de participar en las actividades del proyecto

¿Desea participar en las actividades del proyecto?	Frecuencia	Porcentaje
Sí	8	13%
No	11	17%
No responde	45	70%
Total	**64**	**100%**

Solo 12,5 % de los encuestados expresó interés en participar en las actividades del proyecto, mientras que 17,19 % indicó que no desea participar. La gran mayoría (70,31 %) no respondió, lo que refleja un bajo nivel de involucramiento o desconocimiento sobre el proyecto.

Esta situación evidencia que la participación comunitaria activa es limitada, y que es necesario diseñar estrategias de sensibilización, motivación y acercamiento para aumentar el interés y la implicación de la población en las iniciativas del humedal. La elevada proporción de no respuesta también puede indicar temor, desinterés o falta de claridad sobre las actividades propuestas.

A partir de la experiencia desarrollada, se identifica que la aplicación efectiva de herramientas de caracterización poblacional, requiere la existencia de condiciones iniciales favorables, tales como el grado de residencia permanente de las comunidades, el nivel de arraigo territorial, la apropiación del humedal como espacio ambiental, los niveles de interés y comprensión frente a los procesos de conservación, así como variables etarias y educativas, que inciden en la disposición para participar en ejercicios de levantamiento de información social.

En este sentido, la experiencia desarrollada evidencia que, los ejercicios de caracterización poblacional con enfoque diferencial, constituyen una herramienta pertinente y valiosa para orientar la intervención social en proyectos de recuperación ambiental, siempre que se den condiciones mínimas de residencia, arraigo territorial, nivel de apropiación del humedal y disposición comunitaria frente a los procesos de conservación. Así mismo, el análisis del proceso permite concluir que la aplicación de instrumentos diagnósticos estructurados, debe complementarse, y en algunos contextos priorizarse, con herramientas metodológicas más dinámicas y flexibles, capaces de adaptarse a los perfiles etarios, las dinámicas comunitarias, los niveles de comprensión y las formas particulares de relación que las comunidades establecen con los humedales. Desde esta perspectiva, el diagnóstico participativo desarrollado en el marco del contrato, no solo permitió orientar las acciones ejecutadas, sino que generó aprendizajes técnicos relevantes para la formulación de futuras estrategias de intervención social, en las cuales la lectura contextual del territorio y la adecuación metodológica, se consolidan como factores determinantes para la pertinencia, efectividad y sostenibilidad de los procesos de educación ambiental y fortalecimiento comunitario.

A continuación, se presenta el instrumento diseñado para la caracterización poblacional con enfoque en humedales, el cual fue utilizado como herramienta técnica para el levantamiento de información social en los territorios intervenidos. Este instrumento se incluye con el fin de facilitar su comprensión, evidenciar su estructura y alcance metodológico, y servir como referente para el análisis del proceso diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Anexo 1 Formatos De Caracterización Poblacional Diligenciados Por La Comunidad

CONSTRUFUTURO	GESTIÓN SOCIAL	Código: GSO-FO-001
	ENCUESTA CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA	Fecha: 2025-10-28
		Versión: 01

Fecha de aplicación:		N° Encuesta	

1.INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO	
Nombre del Proyecto/ Obra	Contrato de obra 0741 de 2025
Localidad / Vereda / Barrio	Comuna 15, barrio Mojica, Humedal Isaías Duarte Cancino
Dirección / Ubicación	Humedal Isaías Duarte Cancino, calle 96 con carrera 28 D1
Nombre del Proyecto:	Realizar acciones de recuperación y rehabilitación ambiental y paisajística en humedales urbanos priorizados en el municipio de Santiago de Cali, incluyendo estrategias de educación ambiental y fortalecimiento comunitario.
Aplicador / Encuestador (Cargo):	

2. DATOS DEL ENCUESTADO									
Nombre completo del encuestado:						Zona residencia:	Rural	Urbana	
Tipo de documento:		Número de documento:					Edad:		
Pertenencia étnica:		Genero:		Sexo:	Masculino	Femenino	Intersexual	Prefiero no decirlo	
Tiempo de Residencia en la zona		< 1 año	1- 5 año	6- 10 años	10-15 años	>15 años			
Estrato Socioeconómico:			Número de personas en el hogar:						
Algún miembro del hogar es pensionado:	SI	NO	¿Cuántos?		Afiliados a alguna entidad de salud:		SI	NO	
Algún miembro del hogar es menor de 14 años :	SI	NO	¿Cuántos?		Los menores de Edad se encuentran escolarizados		SI	NO	

Población Vulnerable			
Victimas del conflicto armado		Personas migrantes	
Personas en situación de desplazamiento forzado		Población retornada o colombianos en el exterior retornados	
Población en condición de pobreza o pobreza extrema		Jóvenes en situación de vulnerabilidad (pobreza, desempleo, fuera del sistema educativo)	
Población con discapacidad (física, sensorial, cognitiva, psicosocial)		Personas con enfermedades catastróficas o huérfanas	
Mujeres cabeza de hogar		Victimas de trata de personas o explotación sexual/comercial	
Mujeres victimas de violencia basada en género		Personas afectadas por emergencias, desastres o crisis humanitarias	
Población LGBTIQ+		Ninguno	
Personas en riesgo o situación de habitabilidad en calle		Perteneciente a comunidad étnica (indígena, afro, ROM, raizal o palenquera)	
Personas privadas de la libertad o en proceso de resocialización			

Pertenece a algún grupo de Base:	Cultural	Deportivo	Instancia de participación ciudadana	Religioso	Tercera edad
	Comunitario	Otro		Otro, ¿Cuál?	

3. PERTENENCIA AL HUMEDAL						
Sabe si el humedal tiene comité de comanejo:	SI	NO	Eres miembro del comité de comanejo:	SI	NO	Hago parte de organización una org ambiental:
Conoce usted que instituciones atienden la conservación del humedal:	CVC	Policía Ambiental	DAGMA	OTROS_____		

4. PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN				
Canal preferido de comunicación	Whatsapp	Reuniones	Correo electrónico	
	Carteleras	Otro:	¿Cuál?	
Desea participar en las actividades del proyecto	SI	NO		

5.CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN Y REGISTROS AUDIOVISUALES

Autorizo de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a la entidad FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS FUTURO por su sigla CONSTRUFURURO, para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales con fines documentales SI_____ o NO_____, además de tomar registros fotográficos de mi participación en las actividades del Contrato 0741 de 2025 y hacer divulgación de las mismas en redes sociales o documentación gráfica del proyecto SI_____ o NO_____ conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes sobre protección de datos personales. Los datos recolectados serán utilizados exclusivamente para los fines relacionados con la caracterización y diagnóstico social, evaluación del impacto comunitario y seguimiento de los proyectos u obras desarrolladas en la comunidad, garantizando la confidencialidad, seguridad y uso ético de la información.
El titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, así como revocar la presente autorización, comunicándose a través del correo electrónico institucional: socialhumedales@construfuturo.comDeclaro haber sido informado(a) de la finalidad del tratamiento de mis datos personales y de los derechos que me asisten como titular de la información.

FIRMA Y NOMBRE DEL ENCUESTADO	FIRMA Y NOMBRE DEL ENCUESTADOR
Tipo y N° Identidad:_____	Tipo y N° Identidad:_____

Ilustración 35 Formato de caracterización poblacional humedales
Fuente: Elaboración propia, área de Calidad. CONSTRUFUTURO

4.3.3. Implementación de instrumentos de evaluación denominados Sondeo de Experiencias y Semáforo

En el marco del desarrollo de los talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario asociados al proyecto, se contempló la implementación de un instrumento orientado a la evaluación de los espacios pedagógicos, concebido como una herramienta para recoger percepciones, aprendizajes y niveles de apropiación de los contenidos abordados con las comunidades participantes. No obstante, atendiendo a la diversidad de perfiles etarios, las dinámicas comunitarias, los contextos territoriales y las características socioculturales de las poblaciones vinculadas a los distintos humedales, la aplicación de este instrumento presentó alcances diferenciados, lo cual condujo a la adopción de metodologías evaluativas complementarias y adaptativas, coherentes con el enfoque diferencial y participativo del proyecto.

En el caso específico del humedal Isaías Duarte Cancino, se implementó una metodología participativa denominada "semáforo", diseñada como un mecanismo de evaluación inmediata, oral y lúdica, orientada a facilitar la expresión de percepciones por parte de los participantes frente a los contenidos desarrollados durante los talleres. Esta dinámica consistió en, la selección de uno de tres colores, mediante los cuales los asistentes manifestaron su nivel de comprensión: el color verde, cuando el contenido fue comprendido de manera clara y se reconoció su aplicabilidad en la vida cotidiana; el color amarillo, cuando el tema fue entendido de manera parcial o generó dudas; y el color rojo, cuando el contenido no fue comprendido o presentó dificultades significativas.

La implementación de esta herramienta permitió obtener retroalimentación en tiempo real, identificar de manera oportuna los temas que requerían mayor profundización y ajustar las explicaciones durante el desarrollo de los espacios pedagógicos, fortaleciendo así el proceso formativo y la calidad de la intervención educativa.

Si bien, inicialmente se había previsto el uso de un formato de evaluación estructurado, durante la ejecución de los talleres se priorizó la adopción de mecanismos participativos acordes con las condiciones del territorio y las características de la población asistente. En este sentido, la metodología del semáforo se consolidó como una alternativa pertinente y efectiva, al facilitar la participación activa de los asistentes, permitir la expresión de opiniones en contextos con posibles limitaciones de lectoescritura o de tiempo, y promover un ambiente pedagógico dinámico e incluyente. De manera general, los resultados obtenidos mediante esta estrategia evidenciaron adecuados niveles de comprensión y apropiación de los contenidos abordados, así como un interés manifiesto por parte de los participantes en aplicar los aprendizajes adquiridos en su entorno

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

cotidiano. Adicionalmente, la dinámica permitió identificar temáticas específicas que generaron mayor inquietud, las cuales fueron reforzadas durante los talleres, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos formativos del proyecto.

Para el resto de los humedales intervenidos, la evaluación de los espacios pedagógicos se desarrolló a través de una metodología cualitativa denominada sondeo de experiencias, orientada a recoger percepciones, aprendizajes y aportes de los participantes de manera narrativa y reflexiva. En cada grupo se seleccionó uno o más participantes para realizar el sondeo de la actividad desarrollada, registrando sus apreciaciones y reflexiones sobre los contenidos abordados, la metodología empleada y la relevancia de los temas tratados. Los participantes de estos ejercicios presentaron un rango etario amplio, comprendido entre los 12 y los 70 años, y provenían de diferentes sectores de la ciudad, lo cual aportó una visión diversa e integral sobre la percepción ciudadana frente a los humedales urbanos.

A partir de los sondeos de experiencias realizados, se identificaron aprendizajes recurrentes asociados al reconocimiento de los humedales como ecosistemas estratégicos para la biodiversidad urbana, la comprensión de su papel como reguladores hídricos, la identificación de la fauna y flora asociada a estos ecosistemas, y la valoración de la conservación ambiental como un elemento fundamental para el bienestar humano y el equilibrio ecológico. Así mismo, los participantes destacaron la importancia de los humedales, como espacios públicos y escenarios educativos, reconociendo su potencial para el aprendizaje ambiental y la sensibilización ciudadana.


En cuanto a los aportes para la conservación, los sondeos evidenciaron propuestas orientadas al fortalecimiento de la educación ambiental en instituciones educativas, la realización de campañas de sensibilización comunitaria, la promoción de jornadas de limpieza y manejo adecuado de residuos sólidos, la implementación de procesos de restauración ecológica y siembra de especies nativas, la conformación de grupos comunitarios de guardianes del humedal y la necesidad de mantener procesos de formación y acompañamiento continuo por parte de las instituciones. Estos aportes reflejan un alto nivel de apropiación social y corresponsabilidad frente a la protección de los humedales, así como una disposición positiva para participar activamente en acciones de conservación.

En términos generales, los resultados obtenidos mediante las distintas metodologías de evaluación implementadas evidencian un adecuado nivel de valoración y apropiación de los humedales por parte de la ciudadanía participante. Las actividades desarrolladas fortalecieron el conocimiento ambiental, promovieron el sentido de corresponsabilidad y generaron interés en la participación activa en los procesos de conservación de estos ecosistemas estratégicos para la ciudad de Santiago de Cali. Así mismo, la experiencia

permite concluir que los procesos de evaluación pedagógica en contextos comunitarios, deben contemplar herramientas flexibles y adaptativas, capaces de responder a las variables sociales, etarias, territoriales y culturales de cada comunidad, garantizando la pertinencia metodológica y la efectividad de los procesos formativos.

A continuación, se presenta la imagen del instrumento de evaluación de los espacios pedagógicos, el cual fue utilizado en los procesos desarrollados con las comunidades de los humedales Ibis, Panamericano, Ecoparque Lago de las Garzas, Cañasgordas y La Babilla–Zanjón del Burro, como herramienta de apoyo para la recolección de percepciones y aprendizajes derivados de los talleres de educación ambiental y fortalecimiento comunitario.

Anexo 2 Formatos De Sondeo De Experiencias Diligenciados Por Los Participantes

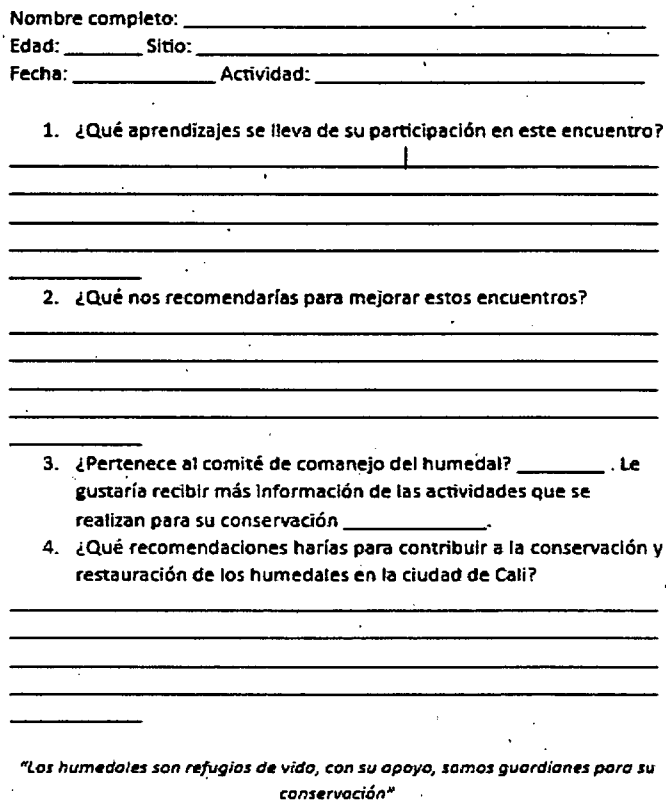

Nombre completo: _____
Edad: _____ **Sitio:** _____
Fecha: _____ **Actividad:** _____

1. ¿Qué aprendizajes se lleva de su participación en este encuentro?

_____
_____
_____
_____
_____

2. ¿Qué nos recomendarías para mejorar estos encuentros?

_____
_____
_____
_____
_____

3. ¿Pertenece al comité de comanejo del humedal? _____ . Le gustaría recibir más información de las actividades que se realizan para su conservación _____.
4. ¿Qué recomendaciones harías para contribuir a la conservación y restauración de los humedales en la ciudad de Cali?

_____
_____
_____
_____
_____

"Los humedales son refugios de vida, con su apoyo, somos guardianes para su conservación"

Ilustración 36 Formato sondeo de evaluación de Figura 1. Formato sondeo de evaluación
Fuente: Elaboración propia, componente de educación ambiental Contrato 0741 de 2025. CONSTRUFUTURO.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

A continuación, se presenta la tabulación sistematizada y el análisis técnico de las respuestas obtenidas a partir de las interacciones, experiencias y percepciones de los participantes durante el desarrollo de las jornadas de educación ambiental realizadas en los humedales IBIS, Babilla, Las Garzas, Panamericano y Cañasgordas. Esta información consolida los aportes cualitativos y cuantitativos recolectados en campo, permitiendo identificar tendencias, niveles de participación, valoraciones comunitarias y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de conservación, apropiación social y sostenibilidad de estos ecosistemas urbanos, constituyéndose en un insumo fundamental para la evaluación del impacto de las actividades desarrolladas y la proyección de futuras estrategias de intervención ambiental y social

Pregunta 1: ¿Qué aprendizajes se lleva de su participación en este encuentro?

Tabla 2. Tabla de tabulación de respuestas pregunta 1

EJE DE APRENDIZAJE IDENTIFICADO	NÚMERO DE MENCIONES
Importancia de la conservación de los humedales	28
Conservación de la biodiversidad (fauna y flora)	17
Reconocimiento de los humedales como ecosistemas urbanos	14
Valor de los humedales para la biodiversidad de la ciudad	13
Importancia de los humedales para la fauna (aves y otras especies)	10
Relación entre humedales y bienestar físico y mental	1
Humedales como reguladores ambientales y ecosistémicos	6
Rol de los humedales frente al cambio climático	1
Humedales como pulmones ambientales de la ciudad	1
Valor recreativo, educativo y ambiental de los humedales	1
Amor y cuidado por la naturaleza	2

Total de respuestas tabuladas: 28

Nota técnica: Una misma respuesta puede aportar a más de un eje temático, dado el carácter abierto de la pregunta.

El análisis de las respuestas, evidencia que el principal aprendizaje adquirido por la totalidad de los participantes (100 %) está relacionado con la importancia de la conservación de los humedales, consolidándose este concepto como el eje central de los procesos pedagógicos desarrollados durante los encuentros.

De manera complementaria, se identifica una alta apropiación del valor ecológico de los humedales, especialmente en lo referente a la biodiversidad asociada (fauna y flora), lo cual refleja que las actividades implementadas lograron fortalecer el reconocimiento de

estos ecosistemas, como espacios estratégicos para la conservación de especies y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.

Asimismo, un número significativo de participantes manifestó aprendizajes asociados al reconocimiento de los humedales como ecosistemas urbanos, resaltando su papel dentro del entramado ambiental de Cali y su contribución a la calidad de vida de la ciudadanía. Este aspecto resulta relevante, ya que permite trascender la visión de los humedales como espacios aislados y posicionarlos como componentes fundamentales del territorio urbano.

De forma más puntual, algunas respuestas destacan aprendizajes relacionados con el rol de los humedales en la regulación ambiental, su contribución frente al cambio climático, su función como pulmones verdes de la ciudad, así como su impacto positivo en el bienestar físico y mental de las personas. Aunque estos temas presentan una menor frecuencia, su aparición demuestra un nivel de reflexión más profundo y una comprensión integral de los servicios ecosistémicos que ofrecen estos espacios.

En conjunto, los resultados permiten afirmar que los encuentros generaron aprendizajes significativos, fortaleciendo la conciencia ambiental, el sentido de responsabilidad frente al cuidado de los humedales y la valoración de estos ecosistemas como patrimonio natural urbano. Estos aprendizajes constituyen una base sólida, para promover procesos continuos de educación ambiental, participación comunitaria y apropiación social de los humedales intervenidos.

Pregunta 2: ¿Qué nos recomendarías para mejorar estos encuentros?

Tabla 2. Tabla de tabulación de respuestas pregunta 2

N.º	CATEGORÍA DE RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	FRECUENCIA
1	Conocer otros humedales	Interés en visitar y conocer otros humedales de la ciudad	5
2	Difusión y comunicación	Mayor promoción por redes sociales, medios de comunicación y canales comunitarios	6
3	Mayor frecuencia de actividades	Solicitud de que los encuentros se realicen más seguido durante el año	3
4	Actividades educativas	Realización de más talleres y actividades formativas	4
5	Enfoque en fauna	Talleres específicos para el cuidado y protección de la fauna	1
6	Actividades para adultos	Inclusión de espacios pedagógicos dirigidos a población adulta	1
7	Articulación con universidades	Extender los encuentros a estudiantes de diferentes carreras universitarias	2
8	Articulación con colegios	Llevar las actividades educativas a instituciones educativas	1
9	Participación comunitaria	Involucrar vecinos y ciudadanía en general	3

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

N.°	CATEGORÍA DE RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	FRECUENCIA
10	Siembra de árboles	Interés en actividades de siembra y cuidado de árboles	1
11	Actividades en otros espacios	Replicar actividades en otros humedales o lugares similares	2
12	Continuidad de procesos con niños	Mantener los encuentros con población infantil	1
13	Valoración positiva sin recomendaciones	Manifestaciones de satisfacción total sin sugerencias de mejora	4

Total de respuestas tabuladas: 28

El análisis de las respuestas asociadas a la pregunta "¿Qué nos recomendarías para mejorar estos encuentros?" permite identificar una percepción ampliamente positiva por parte de los participantes frente al desarrollo de las actividades pedagógicas implementadas en los humedales intervenidos. Un número significativo de respuestas manifiesta satisfacción general, indicando que los encuentros cumplieron con las expectativas de los asistentes y que la metodología utilizada resultó pertinente, clara y atractiva.

No obstante, de manera complementaria, las recomendaciones formuladas evidencian oportunidades de fortalecimiento relacionadas principalmente con la estrategia de comunicación y difusión. Los participantes coinciden en la necesidad de ampliar y diversificar los canales informativos, especialmente a través de redes sociales, medios comunitarios y espacios públicos, con el fin de garantizar una mayor convocatoria, participación anticipada y acceso equitativo a la información por parte de la ciudadanía en general.

Otro eje relevante identificado corresponde al fortalecimiento de la educación ambiental, destacándose la solicitud de incrementar el número de talleres, profundizar en temáticas asociadas al cuidado de la fauna, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como extender estas actividades a distintos públicos, incluyendo población adulta, estudiantes universitarios y comunidades educativas. Esta recomendación refleja un alto nivel de interés por parte de la ciudadanía en continuar vinculándose a procesos formativos relacionados con la conservación de los humedales.

Así mismo, se resalta la importancia de ampliar la cobertura territorial de las actividades, permitiendo que más comunidades conozcan otros humedales de la ciudad y participen activamente en espacios similares. En este sentido, la invitación a involucrar a vecinos aledaños, colegios y universidades se configura como una estrategia clave para fortalecer la apropiación social del territorio y promover procesos de corresponsabilidad ambiental.

Finalmente, algunas respuestas sugieren avanzar hacia acciones prácticas y experienciales, como jornadas de siembra y talleres de mayor duración, especialmente durante periodos vacacionales, lo cual permitiría profundizar los aprendizajes y consolidar procesos educativos más sostenidos en el tiempo.

En conjunto, los resultados evidencian que los encuentros desarrollados constituyen una estrategia pedagógica efectiva, valorada positivamente por la comunidad, y que su fortalecimiento futuro puede orientarse hacia una mayor difusión, diversificación de públicos, ampliación territorial y profundización de las acciones educativas y participativas, contribuyendo de manera significativa a la conservación y apropiación social de los humedales urbanos de Santiago de Cali.

Pregunta **No. 3: ¿Pertenece al comité de comanejo del humedal?**

Tabla 3. Tabla de tabulación de respuestas pregunta 3

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	ACCIÓN DE RESPUESTA FÍSICA IDENTIFICADA	FRECUENCIA OBSERVADA
Pertenencia al comité de comanejo	No pertenece al comité de comanejo del humedal	28
Pertenencia al comité de comanejo	Sí pertenece al comité de comanejo del humedal	0

El análisis de las respuestas a la pregunta **"¿Pertenece al comité de comanejo del humedal?",** evidencia que la totalidad de las personas encuestadas manifiesta **no formar parte** de dicho comité, lo que indica una ausencia total de representación directa de los participantes dentro de los espacios formales de gobernanza y comanejo de los humedales.

Este resultado permite inferir que, si bien existe un alto interés ciudadano en participar en actividades pedagógicas, educativas y de sensibilización ambiental —como se evidencia en las preguntas anteriores—, dicho interés aún no se ha traducido en una vinculación formal a los mecanismos institucionales de participación comunitaria existentes para la gestión y conservación del ecosistema.

La no pertenencia al comité de comanejo, puede estar asociada a factores como el desconocimiento de la existencia del comité, la falta de divulgación sobre sus funciones, los requisitos para integrarse o la percepción de barreras institucionales para la participación activa. En este sentido, los resultados resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de socialización, convocatoria y formación ciudadana orientadas a promover la integración de la comunidad en estos espacios de decisión y corresponsabilidad ambiental.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Finalmente, esta información representa una oportunidad para el proyecto, en tanto permite identificar un escenario propicio para estimular la conformación y fortalecimiento del comité de comanejo, articulando los procesos pedagógicos desarrollados en los encuentros con rutas claras de participación comunitaria, que faciliten la apropiación social del humedal y la sostenibilidad de las acciones de conservación a largo plazo.

Pregunta No. 3 A: ¿Le gustaría recibir más información de las actividades que se realizan para su conservación?

Tabla 4. Tabla de tabulación de respuestas pregunta 3 A

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	ACCIÓN DE RESPUESTA FÍSICA IDENTIFICADA	FRECUENCIA
Interés por la información	Sí	25
Interés por la información	No responde	3

Total de respuestas: 28

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que una amplia mayoría de los participantes (25 personas) manifiesta su interés en recibir más información sobre las actividades que se desarrollan para la conservación del humedal. Este resultado refleja una alta receptividad y disposición de la comunidad, hacia los procesos informativos y educativos relacionados con la protección de estos ecosistemas.

La existencia de 3 respuestas sin manifestación (no responde) no representa una oposición al proceso, sino que puede asociarse a factores como falta de tiempo para responder, dudas al momento de la encuesta o desinterés parcial en expresar una posición concreta, sin que ello implique una percepción negativa frente a las actividades de conservación.

En términos generales, los datos permiten concluir que existe un escenario favorable para fortalecer las estrategias de divulgación, comunicación y educación ambiental, orientadas a mantener informada a la ciudadanía, sobre las acciones de conservación del humedal. Este interés constituye una oportunidad para consolidar procesos de participación comunitaria, apropiación social del territorio y corresponsabilidad ambiental, aspectos clave para la sostenibilidad a largo plazo de los humedales urbanos de la ciudad de Cali.

Pregunta No. 4: ¿Qué recomendaciones harías para contribuir a la conservación y restauración de los humedales en la ciudad de Cali?

Tabla 5. Tabla de tabulación de respuestas pregunta 4

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	ACCIÓN DE RESPUESTA FÍSICA IDENTIFICADA	FRECUENCIA
Corresponsabilidad ciudadana	Promover procesos que fortalezcan la corresponsabilidad de la comunidad en la conservación de los humedales	1
Enfoque intergeneracional	Protección de la biodiversidad como legado para futuras generaciones	1
Educación ambiental formal	Fortalecer la educación ambiental en instituciones educativas en todos los niveles	1
Sensibilización y comunicación	Implementar campañas de sensibilización por medios tradicionales y digitales	1
Gestión de residuos sólidos	Realizar brigadas de limpieza con enfoque pedagógico	1
Educación ambiental comunitaria	Desarrollar más talleres sobre humedales, biodiversidad y servicios ecosistémicos	1
Manejo de residuos	Fortalecer la separación en la fuente y la correcta disposición de basuras	1
Conservación ecológica	Control de especies invasoras y protección de flora y fauna nativa	1
Difusión de información	Incrementar la divulgación ambiental por redes sociales y canales comunitarios	1
Educación para todas las edades	Campañas educativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos	1
Regulación ambiental	Fortalecer la vigilancia de la franja de protección de los humedales	1
Formación académica	Incorporar cátedras, charlas y espacios formativos sobre humedales	1
Restauración ecológica	Proteger y conservar la vegetación y especies asociadas a los humedales	1
Señalización ambiental	Instalar señales informativas sobre aves y biodiversidad	1
Control comunitario	Fortalecer la vigilancia comunitaria para prevenir contaminación	1
Concientización ambiental	Desarrollar campañas de concientización para población infantil y adulta	1
Participación ciudadana	Jornadas de siembra de árboles con seguimiento	1
Articulación institucional	Procesos de siembra con colegios y familias	1
Apropiación social	Garantizar que más ciudadanos conozcan y cuiden los humedales	1
Educación superior y básica	Educación ambiental en colegios y universidades	1
Continuidad de procesos	Fortalecer la permanencia de los talleres ambientales	1
Participación familiar	Espacios pedagógicos para niños con participación de padres	1
Trabajo con escuelas	Actividades educativas con instituciones escolares	1
Formación estudiantil	Talleres dirigidos a estudiantes con enfoque práctico	1

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CATEGORÍA DE ANÁLISIS	ACCIÓN DE RESPUESTA FÍSICA IDENTIFICADA	FRECUENCIA
Educación ambiental permanente	Procesos continuos de educación ambiental para la ciudadanía	1
Promoción digital	Difusión de actividades ambientales por redes y medios digitales	1
Liderazgo juvenil	Conformación de grupos infantiles y juveniles guardianes del humedal	1
Restauración con seguimiento	Procesos de siembra y restauración con acompañamiento técnico	1

Total de respuestas: 28

El análisis de las respuestas a la Pregunta No. 4, evidencia una visión integral por parte de la comunidad frente a la conservación y restauración de los humedales urbanos de la ciudad de Cali. Las recomendaciones formuladas abarcan dimensiones ambientales, educativas, sociales, institucionales y comunitarias, lo que demuestra un alto nivel de comprensión sobre la complejidad de estos ecosistemas y la necesidad de abordarlos desde múltiples enfoques.

Se destaca de manera reiterada, la importancia de la educación ambiental, tanto en escenarios formales (colegios y universidades) como en espacios comunitarios, reconociéndola como una herramienta fundamental para la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos con la protección de los humedales. Asimismo, se resalta el valor de los procesos intergeneracionales, especialmente aquellos dirigidos a niños y jóvenes, entendidos como actores clave para la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Otro eje relevante identificado es, la corresponsabilidad ciudadana, donde los participantes reconocen que la conservación de los humedales no depende exclusivamente de las entidades institucionales, sino del compromiso activo de la comunidad, a través de acciones como jornadas de limpieza, vigilancia comunitaria, siembras y participación en actividades educativas.

Adicionalmente, las respuestas ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la comunicación y divulgación ambiental, mediante el uso de redes sociales, señalización informativa y campañas de sensibilización, con el fin de ampliar el alcance de las iniciativas y garantizar que un mayor número de ciudadanos conozca, valore y se apropie de estos ecosistemas estratégicos.

Finalmente, las recomendaciones relacionadas con la restauración ecológica, control de especies invasoras, protección de la biodiversidad y regulación de las franjas de protección, reflejan una comprensión técnica de los factores que afectan la integridad de

los humedales, lo cual constituye un insumo valioso para la planificación y ejecución de acciones ambientales articuladas entre comunidad e instituciones.

4.3.4. Resultados y análisis general

El análisis integral de la información recolectada, a partir de las diferentes preguntas aplicadas durante las jornadas de sensibilización y educación ambiental en torno a los humedales urbanos de la ciudad de Cali, permite evidenciar un alto nivel de receptividad, apropiación y valoración por parte de las comunidades participantes, así como un interés genuino por fortalecer los procesos de conservación, restauración y sostenibilidad de estos ecosistemas estratégicos.

En primer lugar, los resultados asociados a las preguntas relacionadas con la percepción y mejora de los encuentros, reflejan una evaluación ampliamente positiva de las actividades desarrolladas. La mayoría de los participantes manifestó satisfacción frente a la metodología, los contenidos abordados y la forma en que se llevaron a cabo los talleres, destacando la pertinencia de los espacios pedagógicos y su contribución al fortalecimiento del conocimiento ambiental. Las recomendaciones formuladas se orientan principalmente a ampliar la cobertura territorial, incrementar la frecuencia de los encuentros, diversificar los públicos (niños, jóvenes, adultos y comunidad universitaria) y fortalecer los canales de comunicación y divulgación, lo que evidencia no solo aceptación, sino también una clara demanda por la continuidad y expansión de este tipo de iniciativas.

En relación con la participación organizativa, los resultados de la pregunta sobre la pertenencia al comité de comanejo de los humedales, indican que la totalidad de los asistentes no forma parte de estos espacios formales de participación. Este hallazgo resulta especialmente relevante, ya que demuestra que las jornadas lograron convocar a población que, si bien no está vinculada de manera directa a estructuras organizativas, sí muestra interés en informarse, participar y fortalecer su relación con los humedales. Este escenario, representa una oportunidad estratégica para promover procesos de vinculación progresiva de nuevos actores comunitarios, fortaleciendo la gobernanza ambiental y los esquemas de participación ciudadana, en torno a estos ecosistemas.

Por su parte, las respuestas a la pregunta relacionada con el interés en recibir mayor información sobre las actividades de conservación, evidencian una disposición ampliamente favorable por parte de la comunidad. La alta proporción de participantes que manifestó su interés en continuar recibiendo información, confirma la efectividad de los encuentros como mecanismos de sensibilización y ratifica la necesidad de fortalecer estrategias de comunicación permanentes, claras y accesibles. Este resultado respalda

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

la importancia de consolidar canales de difusión estables, que permitan mantener informada a la ciudadanía y fomentar una participación más activa y sostenida en el tiempo.

En cuanto a las recomendaciones formuladas para la conservación y restauración de los humedales, se identifica una visión integral y bien estructurada por parte de los participantes, quienes reconocen la complejidad de estos ecosistemas y la necesidad de abordarlos desde múltiples dimensiones. Las propuestas abarcan aspectos relacionados con la educación ambiental formal y comunitaria, la corresponsabilidad ciudadana, la protección de la biodiversidad, la gestión adecuada de residuos sólidos, la restauración ecológica, la regulación y vigilancia ambiental, y la participación intergeneracional.

Resulta especialmente significativo, el énfasis que la comunidad otorga a la educación ambiental como eje transversal para la conservación de los humedales, destacando la importancia de trabajar con instituciones educativas, familias, niños y jóvenes, así como de promover procesos pedagógicos continuos que fortalezcan el conocimiento, la apropiación y el sentido de pertenencia. De igual forma, se resalta la necesidad de promover acciones prácticas, como jornadas de limpieza, siembras con seguimiento técnico y conformación de grupos comunitarios o juveniles de guardianes del humedal, lo cual evidencia una clara disposición de la ciudadanía para pasar del conocimiento a la acción.

De manera transversal, el análisis de todas las preguntas permite concluir que, las jornadas no solo cumplieron un rol informativo, sino que se consolidaron como espacios de diálogo, reflexión y construcción colectiva, fortaleciendo la relación entre la comunidad, el territorio y las instituciones. La participación activa, las respuestas positivas y las recomendaciones formuladas reflejan un impacto significativo en términos de sensibilización ambiental y apropiación social de los humedales urbanos.

En este sentido, los resultados obtenidos constituyen un insumo técnico y social de gran valor para la planeación y fortalecimiento de futuras estrategias de educación ambiental, participación ciudadana y gestión integral de los humedales en la ciudad de Cali, ratificando la pertinencia de continuar articulando esfuerzos entre la autoridad ambiental, las entidades territoriales y la comunidad, en pro de la sostenibilidad y protección de estos ecosistemas estratégicos.

4.3.5. Fortalecimiento comunitario – Elaboración e implementación de una estrategia para el fortalecimiento comunitario y la educación ambiental de los habitantes de las Zonas de los humedales Priorizados

4.3.5.1. Metodología integral para el desarrollo de los talleres de educación ambiental en humedales urbanos

El diseño e implementación de la metodología para el desarrollo de los talleres de educación ambiental en los humedales urbanos, contemplados en el proyecto, respondió a un enfoque integral, participativo y territorialmente diferenciado, orientado a garantizar la pertinencia, efectividad y sostenibilidad de los procesos formativos adelantados con las comunidades. Este enfoque partió, del reconocimiento de que los humedales urbanos no constituyen únicamente espacios ecológicos de alta relevancia ambiental, sino también escenarios sociales complejos, atravesados por dinámicas de uso, apropiación, conflicto y convivencia, que inciden directamente en la forma en que la ciudadanía se relaciona con estos ecosistemas.

En este sentido, la metodología no fue concebida como un modelo homogéneo de aplicación generalizada, sino como un conjunto de estrategias pedagógicas flexibles, adaptadas a las particularidades sociales, culturales, territoriales y ambientales de cada humedal y de las comunidades vinculadas a los procesos de formación. Este principio metodológico, permitió reconocer que los niveles de conocimiento previo, apropiación territorial, interés ambiental, arraigo comunitario y capacidades de participación, varían significativamente entre los distintos contextos, haciendo necesario un abordaje diferencial que potenciara los aprendizajes y garantizara una participación efectiva.

4.3.5.2. Fundamentos conceptuales del enfoque metodológico

La metodología se fundamentó en los principios de la educación ambiental comunitaria, el aprendizaje significativo y la pedagogía vivencial Entendiendo la educación ambiental, como un proceso continuo, que busca no solo la adquisición de conocimientos, sino la transformación de actitudes, prácticas y valores en relación con el entorno natural. Bajo este enfoque, los humedales fueron asumidos como "aulas vivas", en las que el aprendizaje se construye a partir de la experiencia directa, la observación, el diálogo y la reflexión colectiva.

Asimismo, se incorporó el enfoque de participación comunitaria como eje transversal del proceso, promoviendo la construcción colectiva del conocimiento y el reconocimiento de los saberes locales como insumo fundamental para el fortalecimiento de los procesos de

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

conservación. Este enfoque permitió generar espacios de intercambio horizontal, en los que las comunidades no fueron concebidas únicamente como receptoras de información, sino como actores activos en la construcción de propuestas, reflexiones y compromisos frente al cuidado de los humedales.

4.3.5.3. Diferenciación metodológica a partir del reconocimiento territorial

Como resultado del análisis previo de las dinámicas territoriales y comunitarias, se definió la implementación de dos estrategias metodológicas diferenciadas: una metodología específica aplicada en el Humedal Isaías Duarte Cancino y una metodología común aplicada en los humedales Ibis, Cañas Gordas, Babilla, Panamericano y Las Garzas. Esta diferenciación respondió a la necesidad de adecuar los procesos pedagógicos a los contextos particulares de cada territorio, reconociendo tanto las problemáticas ambientales predominantes, como las formas de interacción cotidiana entre la comunidad y el humedal.

Esta decisión metodológica, permitió optimizar los procesos de aprendizaje, fortalecer la apropiación comunitaria y garantizar que los contenidos abordados resultaran pertinentes y aplicables en la vida cotidiana de los participantes. Asimismo, evidenció la importancia de concebir la educación ambiental como un proceso dinámico, capaz de ajustarse a las realidades sociales y culturales de cada contexto.

4.3.5.4. Metodología aplicada en el Humedal Isaias Duarte Cancino

Para el Humedal Isaías Duarte Cancino, se implementó una metodología estructurada a partir del desarrollo de talleres temáticos de educación ambiental, orientados al abordaje de problemáticas ambientales concretas previamente identificadas en el territorio. La definición de esta metodología, respondió a un análisis contextual del entorno urbano y social del sector, así como a la identificación de prácticas cotidianas, que generan impactos directos sobre el humedal, entre las cuales se destacan la disposición inadecuada de residuos sólidos, la débil cultura ambiental ciudadana y la tenencia irresponsable de mascotas.

En este sentido, los talleres fueron organizados en torno a tres ejes temáticos prioritarios: manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, cultura ambiental ciudadana y tenencia responsable de mascotas. Cada uno de estos ejes fue desarrollado mediante espacios pedagógicos con objetivos claramente definidos, orientados a promover procesos de sensibilización, comprensión y apropiación de buenas prácticas

ambientales, fortaleciendo el reconocimiento del humedal como un espacio común, cuya conservación depende de la corresponsabilidad entre instituciones y comunidad.

Desde el enfoque pedagógico, los talleres se estructuraron en fases secuenciales, que incluyeron una introducción contextual al tema, el desarrollo de actividades participativas y lúdicas, y espacios de evaluación y retroalimentación. Esta estructura metodológica permitió, por un lado, identificar los saberes previos de los participantes y, por otro, evidenciar prácticas cotidianas que inciden negativamente sobre el humedal, facilitando la construcción colectiva de alternativas de mejora aplicables a la vida diaria de la comunidad.

El uso de metodologías participativas y materiales didácticos adaptados al contexto local, favoreció la participación activa de los asistentes y promovió un aprendizaje significativo, accesible e incluyente, especialmente para poblaciones con diferentes niveles de escolaridad y experiencia previa en temas ambientales. De esta manera, la metodología implementada permitió establecer una relación directa entre los contenidos abordados y la cotidianidad de los participantes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y corresponsabilidad frente al cuidado del Humedal Isaías Duarte Cancino, así como la adopción de actitudes orientadas a la sostenibilidad ambiental y la convivencia comunitaria.

Como complemento fundamental a la metodología implementada en el Humedal Isaías Duarte Cancino, se diseñó, validó y utilizó un conjunto de piezas pedagógicas, concebidas como herramientas de apoyo, para facilitar la comprensión de los contenidos ambientales, incentivar la interacción entre los participantes y fortalecer la apropiación de prácticas responsables relacionadas con el cuidado del entorno y la tenencia responsable de mascotas.



El proceso de creación y diseño de las piezas pedagógicas inició con la definición de los contenidos temáticos y metodológicos a desarrollar en los talleres ambientales, en coherencia con los objetivos establecidos en el Plan de Gestión Social y Ambiental y con las características socioculturales de las poblaciones participantes. Durante esta etapa se priorizó el diseño de herramientas pedagógicas que permitieran transmitir los mensajes ambientales de manera clara, dinámica y accesible, promoviendo la participación activa, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo.

En este contexto, se determinó realizar un ajuste metodológico frente a la estrategia inicialmente planteada en el contrato, sustituyendo el rompecabezas de ecosistemas por la escalera ambiental, al considerarse una herramienta de más fácil implementación, con una dinámica interactiva e incluyente, especialmente adecuada para los tiempos disponibles y para el perfil de los participantes de los talleres.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Como resultado de este proceso, se diseñaron las siguientes piezas pedagógicas:

Tabla 6. Consolidado Piezas pedagógicas empleadas en el humedal IDC.

PIEZA PEDAGOGICA	CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
Rayuela ambiental	Tres (3) unidades	
Juego "Concéntrese"	Tres (3) unidades	
Cuentos infantiles ambientales	Cincuenta (50) unidades).	

PIEZA PEDAGOGICA	CANTIDADES	REGISTRO FOTOGRAFICO
Escalera ambiental	Cincuenta (50) unidades).	
Kits de tenencia responsable de mascotas	Cincuenta (50) unidades).	

Una vez elaborados los diseños, se revisaron los contenidos, el enfoque metodológico y los elementos gráficos de cada pieza, garantizando la coherencia con los objetivos del proyecto y la correcta aplicación de los lineamientos de identidad visual e imagen institucional.

Posterior a la validación, se procedió a la producción física de las piezas pedagógicas, respetando las cantidades mínimas establecidas contractualmente. El material fue emitido y dispuesto para su utilización durante el desarrollo de los talleres ambientales, integrándose de manera articulada a las metodologías lúdicas y participativas definidas para cada eje temático.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Dado que la cantidad de insumos producidos, no cubría la totalidad de la población impactada, se implementó como estrategia de entrega, la realización de rifas pedagógicas, las cuales consistieron en formular preguntas relacionadas con los temas abordados durante cada taller. Esta dinámica permitió, simultáneamente, evaluar el nivel de aprendizaje de los participantes y captar su atención de manera más efectiva, al informar desde el inicio de cada jornada que al finalizar se realizaría la rifa de los materiales pedagógicos.

El proceso de diseño, revisión, validación, producción, emisión y utilización de las piezas pedagógicas se encuentra debidamente soportado mediante registros fotográficos, evidencias de uso en campo y documentos técnicos, los cuales se anexan al informe final como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A continuación, se presenta la representación consolidada de las piezas pedagógicas entregadas a la comunidad, en los diferentes espacios de educación ambiental, entendidas estas como los materiales didácticos diseñados y utilizados para apoyar los procesos formativos, fortalecer la apropiación social del conocimiento y promover prácticas responsables en torno a la conservación de los humedales urbanos.

Tabla 7. Consolidado piezas pedagógicas entregadas a la comunidad

FECHA	LUGAR	TEMATICA	ACTIVIDAD (TALLER - RECORRIDO)	MATERIAL PEDAGOGICO EMPLEADO Y ENTREGADO	KITS AMBIEN-TALES ENTRE *GADOS
11/12/2025	Unidad Recreativa Laureano Gómez	Residuos Solidos	Taller- Integrantes Escuela De Salsa "Estrellas Con Estilo Latino"	rayuela ambiental y la escalera ambiental (21 unidades)	0
12/12/2025	Parque Morichal 3	Tenencia Responsable De Mascotas	Taller - Adulto Mayor	concéntrese de tenencia responsable de mascotas	12
15/12/2025	Academia De Baile Comuneros 1	Residuos Solidos	Taller - Integrantes Escuela De Salsa "Full Dance"	rayuela ambiental, cuentos ambientales (23 unides)	23
15/12/2025	Caseta Comunal Mojica	Residuos Solidos	Taller - Madres Comunitarias	concéntrese de residuos sólidos	10
16/12/2025	Kiosco Morichal 2	Tenencia Responsable De Mascotas	Taller -Adulto Mayor	concéntrese de tenencia responsable de mascotas	10
17/12/2025	Zona Cero - Ciudad Córdoba	Tenencia Responsable De Mascotas	Taller - Adulto Mayor	el concéntrese de tenencia responsable de mascotas	9

FECHA	LUGAR	TEMATICA	ACTIVIDAD (TALLER - RECORRIDO)	MATERIAL PEDAGOGICO EMPLEADO Y ENTREGADO	KITS AMBIEN-TALES ENTRE *GADOS
18/12/2025	Puerta A Puerta Mojica 2	Residuos Solidos	Taller - Comunidad En General	escalera ambiental (2 unidades) y cuentos (2 unidades)	0
19/12/2025	Coliseo Ciudad Córdoba 3a 3b	Cultura Ciudadana	Taller - Comunidad En General	cuentos (12 unidades) y la escalera ambiental (11 unidades), concéntrese	0
22/12/2025	Polideportivo Ciudad Córdoba Sector 3	Residuos Solidos	Taller - Adulto Mayor	el concéntrese de cultura ciudadana y la escalera ambiental (16 unidades)	0
23/12/2025	Academia De Baile Dinastía Salsera	Tenencia Responsable De Mascotas	Taller- Integrantes Escuela De Salsa "Dinastía Salsera"	cuentos (15 unidades) y concéntrese	9

4.3.5.5. Metodología aplicada en los humedales Ibis, Cañasgordas, La babilla, Panamericano y Las Garzas

En los humedales Ibis, Cañas Gordas, Babilla, Panamericano y Las Garzas, se implementó una metodología común basada en el aprendizaje vivencial y el enfoque de "aprender conociendo", que buscó vincular directamente a la comunidad con los ecosistemas urbanos de manera activa y participativa. Este enfoque metodológico reconoció los humedales como espacios privilegiados para la educación ambiental, en los cuales la experiencia directa con la biodiversidad, la vegetación y los cuerpos de agua, se convierte en el principal vehículo de aprendizaje, fortaleciendo la percepción del entorno como un patrimonio natural que requiere cuidado y conservación.

El objetivo general de esta metodología, fue fomentar procesos de aprendizaje vivencial que permitieran a los participantes explorar, comprender y valorar los humedales urbanos como ecosistemas estratégicos para la biodiversidad, la regulación hídrica y el bienestar ambiental y social de la ciudad. A partir de este objetivo, se definieron objetivos específicos orientados a:

- Fortalecer el diálogo entre comunidad e instituciones, promoviendo la interacción y la construcción colectiva de conocimiento sobre los humedales.
- Despertar el interés y la curiosidad de la comunidad por conocer los humedales como espacios de aprendizaje y de vida.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138





- Promover los humedales como aulas vivas de educación ambiental, donde la teoría se articula con la práctica mediante dinámicas participativas.
- Reconocer la importancia de los servicios ecosistémicos de los humedales urbanos, utilizando herramientas lúdicas, observación directa y metodologías participativas.

La metodología se desarrolló principalmente mediante recorridos guiados, estructurados en estaciones temáticas, que permitieron abordar de manera integral los distintos componentes del ecosistema. Cada estación incluyó actividades participativas, como observación de fauna, identificación de plantas, medición básica de calidad del agua y análisis de la relación entre los humedales y la ciudad. Durante los recorridos se fomentó el intercambio de saberes y la reflexión colectiva, empleando recursos visuales, narrativas, cuentos ambientales, fichas de trabajo y dinámicas lúdicas que facilitaron la comprensión de conceptos complejos y su relación con la vida cotidiana de los participantes.

El uso de piezas pedagógicas y materiales de apoyo, tuvo un papel central en el fortalecimiento del aprendizaje. Se emplearon fichas de información, guías impresas de los humedales de Cali, libros de aves, cuadernos de actividades, bingo ambiental, juegos de busca parejas y otros recursos lúdicos, que permitieron que los participantes analizaran imágenes, resolvieran ejercicios y reforzaran conocimientos sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y la importancia de la conservación. Este material facilitó la interacción constante con los facilitadores y permitió que los asistentes aportaran sus observaciones, experiencias y preguntas, generando un aprendizaje activo y significativo.

Tabla 8. Consolidado Piezas pedagógicas empleadas en los humedales de IBIS, Cañasgordas, Panamericano, Babilla y Las Garzas

PIEZA PEDAGOGICA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Imágenes de apoyo de 50 *50 cm, plastificadas.	

PIEZA PEDAGOGICA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Cartilla, guía ilustrada de aves	
Bingo	   
Busca parejas	 

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

El tema de la biodiversidad en los humedales fue eje central en los talleres, destacando la riqueza de especies y los servicios que estos ecosistemas proporcionan a la fauna, flora y población humana. Se hizo especial énfasis en las aves, debido a su visibilidad, carisma y reconocimiento por parte de la comunidad, así como en la red hídrica de la ciudad, incluyendo los siete ríos, quebradas, lagunas y acuíferos, y la importancia del río Cauca en su recorrido por Cali, resaltando tanto los valores ecológicos como los culturales asociados al agua.

Adicionalmente, los talleres incluyeron la entrega de elementos pedagógicos y recuerdos de participación, como cuadernos, lapiceros, bolsas de tela y termos, fortaleciendo la apropiación y el vínculo de los participantes con los humedales. Se promovió la reflexión sobre la importancia de acciones concretas que cada individuo puede adoptar en su vida diaria para contribuir a la protección y conservación de los ecosistemas, fomentando la corresponsabilidad ambiental y la continuidad de hábitos sostenibles.

El enfoque metodológico utilizado permitió que los participantes no solo recibieran información, sino que experimentaran, reflexionaran y se comprometieran activamente, integrando conocimientos con prácticas cotidianas y fortaleciendo su sentido de pertenencia hacia los humedales. De esta manera, los talleres cumplieron con los objetivos de generar aprendizaje vivencial, participación comunitaria, educación ambiental y sensibilización sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, consolidando un modelo replicable para otros humedales de la ciudad.

Evaluación, sistematización y articulación de la información

Con el fin de garantizar una adecuada sistematización del proceso, se consolidó la información correspondiente a la ejecución de los talleres mediante un cuadro resumen que recoge, de manera sintética y ordenada, las principales variables de cada espacio pedagógico desarrollado, tales como fecha, humedal intervenido, temática abordada, número de participantes y características generales de la población asistente.

Tabla 9. Consolidado de los talleres de educación ambiental en humedales urbanos

N.	FECHA	HUMEDAL	LUGAR	TEMATICA	N. ASISTENTES
1	15/11/2025	CAÑAS GORDAS	HUMEDAL CAÑAS GORDAS	Humedales y Biodiversidad	16
2	21/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	32
3	22/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	21
4	27/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	18

N.	FECHA	HUMEDAL	LUGAR	TEMATICA	N. ASISTENTES
5	27/11/2025	PANAMERICANO	HUMEDAL PANAMERICANO	Humedales y Biodiversidad	22
6	28/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	22
7	28/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	20
8	29/11/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	21
9	01/12/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	26
10	02/12/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	26
11	04/12/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	26
12	06/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	20
13	07/12/2025	PANAMERICANO	HUMEDAL PANAMERICANO	Humedales y Biodiversidad	32
14	10/12/2025	IBIS	BIBLIOTECA NAVARRO	Humedales y Biodiversidad	21
15	12/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	22
16	13/12/2025	GARZAS grupo 1	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	20
17	13/12/2025	GARZAS grupo 2	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	20
18	13/12/2025	PANAMERICANO Grupo 1	HUMEDAL PANAMERICANO	Humedales y Biodiversidad	20
19	13/12/2025	PANAMERICANO Grupo 2	HUMEDAL PANAMERICANO	Humedales y Biodiversidad	20
20	14/12/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	22
21	14/12/2025	GARZAS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	30
22	14/12/2025	CAÑAS GORDAS	HUMEDAL CAÑAS GORDAS	Humedales y Biodiversidad	22
23	16/12/2025	IBIS	ECOPARQUE LAS GARZAS	Humedales y Biodiversidad	36
24	16/12/2025	IBIS-PANAMERICANO	HUMEDAL PANAMERICANO	Humedales y Biodiversidad	36
25	19/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	22
26	19/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	24
27	20/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	22
28	20/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	21
29	26/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	35
30	26/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	24

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CONSTRUFUTURO

HUMEDALES URBANOS

Nit. 805021814-9

N.	FECHA	HUMEDAL	LUGAR	TEMATICA	N. ASISTENTES
31	27/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	22
32	28/12/2025	BABILLA	HUMEDAL LA BABILLA	Humedales y Biodiversidad	21
33	30/12/2025	CAÑAS GORDAS	HUMEDAL CAÑAS GORDAS	Humedales y Biodiversidad	19
34	06/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	RESIDUOS SOLIDOS	20
35	06/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	RESIDUOS SOLIDOS	20
36	28/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	RESIDUOS SOLIDOS	20
37	28/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	RESIDUOS SOLIDOS	20
38	28/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	RESIDUOS SOLIDOS	20
39	29/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	CULTURA CIUDADANA	20
40	29/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	I.E.ISAIAS DUARTE CANCINO	CULTURA CIUDADANA	20
41	29/11/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	CORDON ECOLOGICO COMUNA 15	CULTURA CIUDADANA	15
42	11/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	UNIDAD RECREATIVA LAUREANO GOMEZ	RESIDUOS SOLIDOS	21
43	12/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	PARQUE MORICHAL 3	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	11
44	15/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	ACADEMIA DE BAILE COMUNEROS 1	RESIDUOS SOLIDOS	23
45	15/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	CASETA COMUNAL MOJICA	RESIDUOS SOLIDOS	15
46	16/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	KIOSCO MORICHAL 2	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	16
47	17/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	ZONA CERO - CIUDAD CORDOBA	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	17
48	18/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	PUERTA A PUERTA MOJICA 2	RESIDUOS SOLIDOS	12
49	19/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	COLISEO CIUDAD CORDOBA 3A 3B	CULTURA CIUDADANA	23
50	22/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	POLIDEPORTIVO CIUDAD CORDOBA SEC 3	RESIDUOS SOLIDOS	16

N.	FECHA	HUMEDAL	LUGAR	TEMATICA	N. ASISTENTES
51	23/12/2025	ISAIAS DUARTE CANCINO	ACADEMIA DE BAILE DINASTIA SALSERA	TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	24
51	TOTALES				1114

El consolidado presentado en la tabla anterior, permite evidenciar el alcance territorial y social del componente de educación ambiental desarrollado en el marco del proyecto, así como las diferencias en los niveles de participación entre los distintos humedales intervenidos. Estas variaciones responden a factores asociados a las dinámicas propias de cada territorio, tales como el grado de apropiación comunitaria del humedal, las condiciones de acceso, la presencia de población residente o flotante, y la vocación recreativa o ecológica de cada espacio. No obstante, en todos los casos se registró una participación activa y receptiva por parte de los asistentes, lo cual permitió desarrollar los contenidos pedagógicos previstos y generar espacios de diálogo, reflexión y sensibilización ambiental.

Los resultados obtenidos evidencian que la estrategia metodológica implementada logró adaptarse de manera efectiva a contextos sociales heterogéneos, garantizando la participación de públicos diversos, incluyendo comunidad residente, visitantes, comerciantes, estudiantes y población flotante.

Así mismo, el número total de talleres desarrollados y de participantes impactados, refleja un proceso sostenido y continuo de intervención social, más allá de acciones aisladas, lo cual contribuye de manera significativa al fortalecimiento de capacidades comunitarias y a la construcción de una cultura ambiental orientada a la conservación de los humedales urbanos.

Desde una lectura integral, el impacto alcanzado mediante la realización de 51 talleres y la vinculación de 1.114 participantes, constituye un resultado relevante en términos de cobertura, apropiación social y alcance pedagógico, alineado con los objetivos del contrato y con los lineamientos de educación ambiental promovidos por la autoridad ambiental. Estos resultados ratifican la pertinencia de continuar fortaleciendo este tipo de procesos formativos, incorporando metodologías flexibles, participativas y ajustadas a las realidades territoriales, como estrategia clave para la sostenibilidad de las intervenciones ambientales y la consolidación de una ciudadanía corresponsable con la protección de los humedales de la ciudad.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Reflexiones metodológicas y aprendizajes del proceso

La experiencia desarrollada, evidencia que los procesos de educación ambiental en humedales urbanos requieren metodologías flexibles, dinámicas y adaptativas, capaces de responder a las particularidades territoriales y comunitarias. La implementación de metodologías diferenciadas, permitió fortalecer la efectividad de los procesos formativos, optimizar la participación comunitaria y garantizar la pertinencia de los contenidos abordados.

Asimismo, el proceso permitió identificar que las herramientas de caracterización y evaluación deben concebirse como instrumentos dinámicos, susceptibles de ajuste según variables como el perfil etario de los participantes, los niveles de arraigo territorial, los grados de apropiación del humedal, los intereses ambientales y los niveles de comprensión de las comunidades. En este sentido, la experiencia sugiere que, más que la aplicación de instrumentos estandarizados, resulta estratégico avanzar hacia la construcción de metodologías flexibles, que se adapten a las dinámicas comunitarias y potencien los procesos de aprendizaje.

En conclusión, la metodología implementada constituye una experiencia significativa que aporta aprendizajes relevantes para futuros procesos de educación ambiental en humedales urbanos, evidenciando la importancia de reconocer las particularidades territoriales, promover la participación comunitaria y concebir los humedales, como escenarios vivos de aprendizaje, reflexión y construcción colectiva de sostenibilidad ambiental.

A continuación, se presenta la tabla consolidada de resultados de las jornadas de educación ambiental desarrolladas en el marco del proyecto, la cual sintetiza el alcance cuantitativo del proceso formativo adelantado en los humedales priorizados. En total, se logró impactar a 1.114 participantes mediante la realización de 51 talleres y espacios pedagógicos, evidenciando una cobertura significativa y una alta participación comunitaria en los diferentes territorios intervenidos. Este resultado refleja no solo el cumplimiento de las metas establecidas, sino también el interés, la receptividad y la disposición de la ciudadanía, para vincularse a procesos de educación ambiental orientados a la conservación de los humedales urbanos. La información se presenta de manera desagregada por cada humedal, detallando el número de talleres realizados y la cantidad de participantes por territorio, lo cual permite una lectura comparativa del alcance del proceso y facilita la identificación de dinámicas diferenciadas de participación y apropiación comunitaria.

Tabla 10. Consolidado cuantitativo de los talleres en los humedales urbanos

HUMEDAL	N. DE PARTICIPANTES	N. DE TALLERES
Ecoparque Lago de las Garzas	304	13
Humedal La Babilla-Zanjón del Burro	233	10
Humedal Panamericano	130	5
Humedal Ibis	57	3
Humedal Cañasgordas	57	3
Humedal Isaías Duarte Cancino	333	18
TOTAL DE PARTICIPANTES	**1114**	**51**

La información consolidada de seguimiento y control, evidencia una distribución equilibrada de actividades entre recorridos pedagógicos, talleres presenciales y acciones lúdicas, predominando la modalidad de "taller–recorrido", la cual representó el 75 % del total de las intervenciones. Esta modalidad resultó altamente pertinente para los humedales con acceso controlado o con alta afluencia de visitantes.

En el material documental, se presenta un recorrido informativo sobre el registro fotográfico, en el cual se consolida una muestra representativa de las actividades desarrolladas durante el desarrollo del proyecto. A través de este recorrido, se evidencia la participación de las comunidades y de las personas que interactúan de manera directa con los espacios intervenidos, así como el acompañamiento técnico realizado mediante visitas en campo y procesos de seguimiento desarrollados a lo largo del periodo de ejecución. Este material recoge, de manera sintética y ordenada, los principales momentos del proceso adelantado, reflejando el trabajo articulado entre los actores involucrados y los esfuerzos realizados para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.



Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 6 de noviembre de 2025.





Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 6 de noviembre de 2025.



+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 28 de noviembre de 2025.	Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 28 de noviembre de 2025.
	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 28 de noviembre de 2025.	Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 29 de noviembre de 2025.
	
Taller de cultura ambiental ciudadana, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15,29 de noviembre de 2025.	Taller de cultura ambiental ciudadana, estudiantes de la IE Isaías Duarte Cancino, comuna 15, 29 de noviembre de 2025.




	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, comuna 15, 1 de diciembre de 2025.	Taller de tenencia responsable de mascotas, comuna 15, 12 de diciembre de 2025.
	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, comuna 15, 15 de diciembre de 2025.	Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, comuna 15, 15 de diciembre de 2025.
	
Taller de tenencia responsable de mascotas, comuna 15, 16 de diciembre de 2025.	Taller de tenencia responsable de mascotas, comuna 15, 17 de diciembre de 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

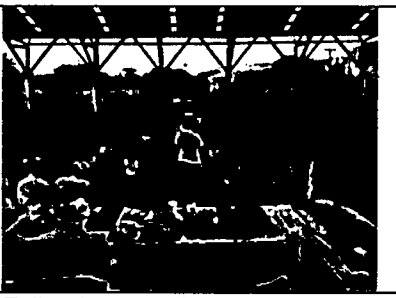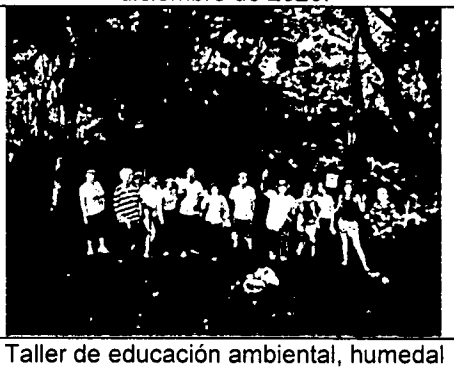	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, comuna 15, 18 de diciembre de 2025.	Taller de tenencia responsable de mascotas, comuna 15, 19 de diciembre de 2025.
	
Taller de manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, comuna 15, 22 de diciembre de 2025.	Taller de tenencia responsable de mascotas, comuna 15, 23 de diciembre de 2025.
	
Taller de educación ambiental, humedal Cañasgordas, 15 de noviembre de 2025.	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 21 de noviembre de 2025.



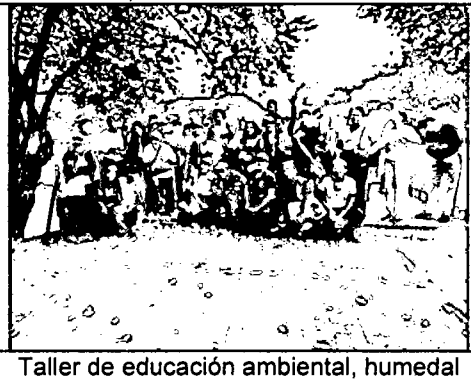
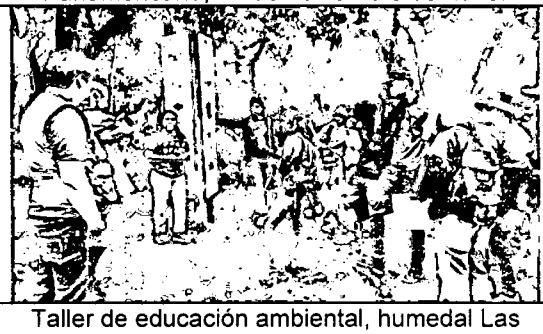
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 22 de noviembre de 2025.	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 27 de noviembre de 2025.
	
Taller de educación ambiental, humedal Panamericano, 27 de noviembre de 2025.	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 28 de noviembre de 2025.
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 28 de noviembre de 2025.	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 29 de noviembre de 2025.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

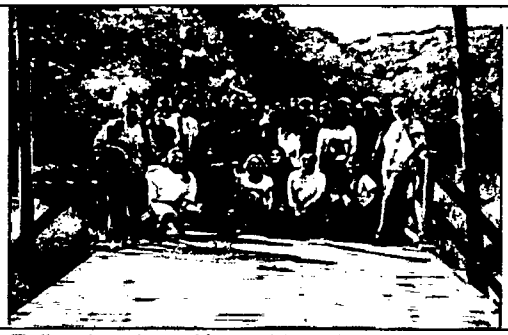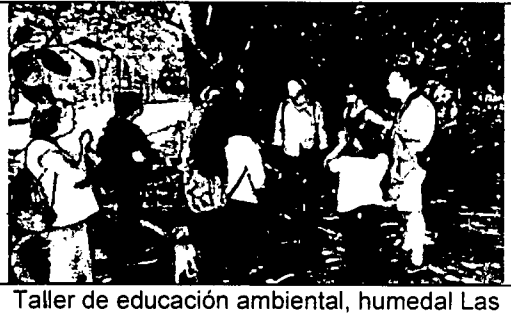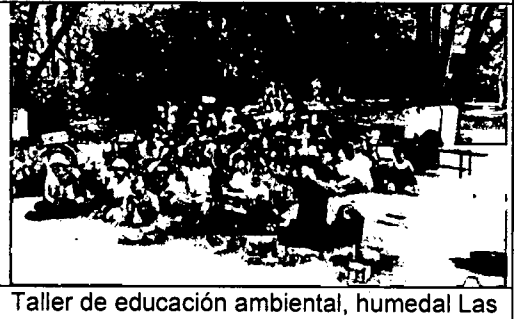	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 1 de diciembre de 2025.	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 2 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 4 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 6 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 7 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal IBIS, 10 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 12 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 13 de diciembre de 2025

	
Taller de educación ambiental, humedal Panamericano, 13 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Panamericano, 13 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 14 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 14 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 14 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 16 de diciembre de 2025

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

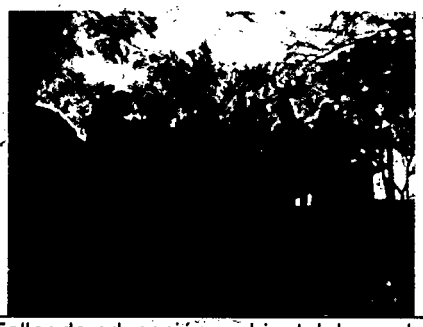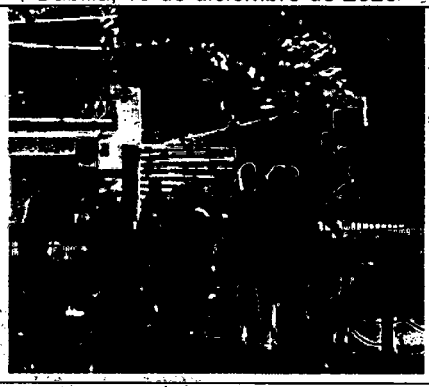	
Taller de educación ambiental, humedal Panamericano, 16 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Las Garzas, 16 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 19 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 19 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 20 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 20 de diciembre de 2025

	
Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 26 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 20 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 27 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Babilla, 28 de diciembre de 2025
	
Taller de educación ambiental, humedal Cañasgordas, 30 de diciembre de 2025	Taller de educación ambiental, humedal Cañasgordas, 30 de diciembre de 2025

Actividades macro comunitarias con enfoque participativo y de identidad territorial

Adicionalmente al desarrollo de los talleres pedagógicos y espacios formativos realizados a lo largo del proceso, se llevaron a cabo dos actividades macro comunitarias, concebidas como escenarios de mayor alcance territorial y social, orientadas a fortalecer la apropiación ciudadana, la visibilización de los humedales urbanos y la construcción colectiva de una cultura ambiental. Estas actividades fueron planificadas, organizadas y

ejecutadas bajo una metodología participativa, con énfasis en el enfoque de identidad territorial, reconociendo a las comunidades como actores fundamentales en los procesos de conservación y sostenibilidad de los ecosistemas urbanos.

La implementación de estas jornadas, respondió a la necesidad de generar espacios amplios de encuentro comunitario, que permitieran trascender el formato de taller tradicional y propiciar experiencias significativas, vivenciales y colectivas, en las que confluyeran expresiones culturales, actividades lúdico-pedagógicas, recorridos ecosistémicos y acciones simbólicas orientadas al reconocimiento del valor ambiental, social y cultural de los humedales de la ciudad. En este sentido, ambas actividades se constituyeron en estrategias de educación ambiental no formal, con capacidad de convocar diversos públicos y de generar impactos positivos a escala comunitaria y urbana.

A. Carnaval de Educación Ambiental – Humedal Isaac Suárez Cancero

La primera de estas actividades macro, correspondió al Carnaval de Educación Ambiental, realizado el 25 de noviembre en el Humedal Isaac Suárez Cancero, un espacio estratégico para la estructura ecológica urbana y para los procesos de apropiación comunitaria en la Comuna 15. Esta jornada fue concebida como un evento integrador, denominado "El Humedal se viste de Cultura", enmarcado en el IX Carnaval Ambiental "Inspiración de Vida", lo que permitió articular la iniciativa con dinámicas ambientales y culturales de mayor alcance a nivel de ciudad.

El carnaval integró una metodología participativa, basada en el reconocimiento de la identidad local, incorporando expresiones artísticas, muestras culturales, actividades educativas, juegos ambientales y un recorrido ecosistémico guiado, que facilitaron el acercamiento de los participantes al humedal desde múltiples lenguajes y formas de aprendizaje. Esta diversidad metodológica, permitió atender distintos rangos etarios y perfiles poblacionales, favoreciendo la inclusión de niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como de representantes de instituciones educativas, organizaciones comunitarias y habitantes del sector.

La jornada logró una participación aproximada de 180 asistentes, quienes interactuaron activamente en las diferentes estaciones y actividades propuestas. A través de dinámicas lúdico-pedagógicas y experiencias sensoriales, se promovió el reconocimiento del humedal como un ecosistema vivo, fundamental para la regulación ambiental, la biodiversidad y la calidad de vida urbana. Asimismo, la entrega de materiales ecológicos y el acompañamiento permanente del equipo técnico y logístico, contribuyeron a reforzar los mensajes de cuidado ambiental y sostenibilidad.

Desde un enfoque social y territorial, este espacio permitió fortalecer la apropiación social del humedal, consolidándolo no solo como un área ambiental protegida, sino también como un lugar de encuentro, expresión cultural y construcción de tejido social. La puesta en escena, contó con un soporte logístico adecuado y condiciones de seguridad que garantizaron el desarrollo efectivo de la jornada, generando una experiencia positiva y significativa para los participantes.

B. Celebración de la Vida en los Humedales – Ecoparque Lago de las Garzas

La segunda actividad macro comunitaria, se desarrolló el 21 de diciembre de 2025, en el Ecoparque Lago de las Garzas, bajo la denominación "Celebración de la Vida en los Humedales", una jornada de carácter conmemorativo, educativo y simbólico, orientada a resaltar la importancia de la conservación ambiental y la memoria colectiva asociada a este espacio emblemático de la ciudad.

El Ecoparque Lago de las Garzas representa un caso emblemático de recuperación ambiental urbana, resultado de un proceso de más de 30 años que ha logrado consolidar un humedal con alta biodiversidad, ampliamente valorado por la comunidad y visitantes. Este espacio no solo cumple una función ecológica fundamental, sino que también se ha constituido en un escenario de educación ambiental, recreación pasiva, cultura, deporte y observación de aves, siendo uno de los sitios más visitados para actividades académicas y comunitarias.

La jornada conmemoró los 30 años de la siembra de más de 500 árboles, realizada en memoria de las víctimas del accidente de American Airlines ocurrido en 1995, hecho que marcó profundamente la historia del lugar y que dio origen a un proceso de resignificación territorial, convirtiendo una tragedia en un símbolo de vida, conservación y resiliencia ambiental. En este contexto, la actividad adquirió un alto valor simbólico y pedagógico, al vincular la memoria histórica con la educación ambiental y la participación ciudadana.

La metodología de la jornada incluyó, la bienvenida a los asistentes y la narración de la historia del lugar, la proyección de un video conmemorativo, el encendido de velas en el monumento, la lectura de versos acompañados de música, relatos sobre el humedal y sus aves, así como un recorrido guiado por el ecosistema. Adicionalmente, se desarrollaron actividades lúdicas y de pintura con niños, juegos ambientales, la entrega de un refrigerio y la entrega de plantas ornamentales, promoviendo la interacción intergeneracional y el aprendizaje significativo.

A continuación, se presenta el cuadro consolidado que resume las fechas, horarios, temáticas, lugares y número de asistentes de las actividades macro comunitarias desarrolladas:

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

Tabla 11. Consolidado de las actividades macro comunitarias


N.	FECHA	HORA	HUMEDAL	LUGAR	TEMATICA	ACTIVIDAD	N. ASISTENTES
1	21/12/2025	8 am a 5 pm	Ecoparque De Las Garzas, Cañas Gordas, La Babilla, Ibis Y Panamericano	Ecoparque Las Garzas	Humedales Y Biodiversidad	Celebración De La Vida En Los Humedales	204
2	25/11/2025	6 am a 2 pm	Isaías Duarte Cancino	Humedal Isaías Duarte Cancino	Carnaval Ambiental	Carnaval - Recorrido	180
2	**TOTALES**						**384**

Ambas actividades macro, evidenciaron una respuesta altamente positiva por parte de las comunidades, reflejada en los niveles de participación, el interés manifestado por los asistentes y la apropiación de los mensajes ambientales transmitidos. Estos espacios permitieron visibilizar de manera masiva los proyectos y acciones desarrolladas, ampliando su alcance más allá de los participantes directos de los talleres y fortaleciendo el posicionamiento de los humedales como componentes esenciales de la sostenibilidad urbana.

La realización de estas jornadas, permitió adaptar las metodologías a las características específicas de cada población, teniendo en cuenta factores como la ubicación territorial, las dinámicas sociales propias de cada sector y las condiciones logísticas del entorno urbano. Esta flexibilidad metodológica, fue clave para garantizar la pertinencia de las actividades y maximizar su impacto educativo, social y ambiental.

Asimismo, estas actividades se alinearon con los objetivos de sustentabilidad ambiental de los espacios urbanos, promoviendo una visión integral del territorio que reconoce la interdependencia entre comunidad, ecosistemas y ciudad. La articulación institucional y el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el DAGMA resultaron fundamentales para el desarrollo efectivo de las jornadas, garantizando el respaldo técnico, logístico y ambiental necesario para su adecuada ejecución.

En conjunto, las actividades macro comunitarias, se consolidaron como estrategias clave de educación ambiental, participación ciudadana y fortalecimiento del tejido social, contribuyendo significativamente a la sensibilización, apropiación y valoración de los humedales urbanos como patrimonio ambiental y cultural de la ciudad.

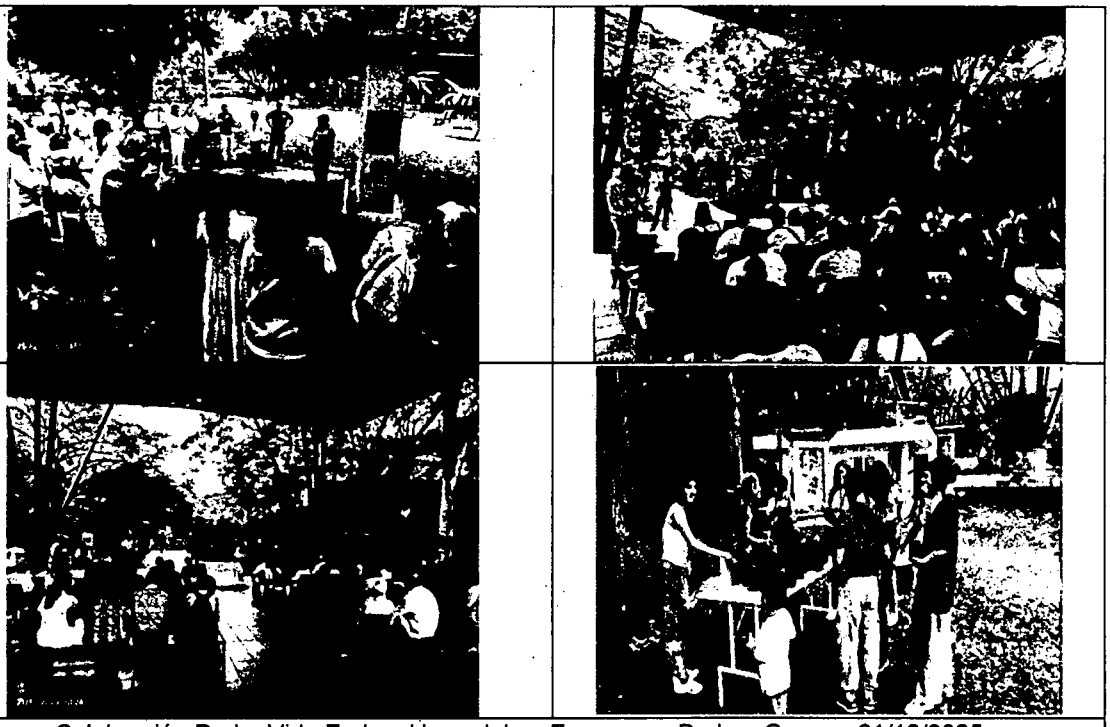

Celebración De La Vida En Los Humedales, Ecoparque De Las Garzas, 21/12/2025



Carnaval Ambiental, Isaías Duarte Cancino, 25/11/2025

84

Análisis territorial y contextual por humedal

- Humedal Isaías Duarte Cancino – Comuna 15

El Humedal Isaías Duarte Cancino, se caracteriza por una fuerte relación con la población residente de la Comuna 15, siendo este el principal grupo beneficiario de las acciones desarrolladas. La mayoría de los participantes correspondieron a personas mayores de edad, estudiantes y actores comunitarios vinculados a instituciones educativas y organizaciones locales.

Es importante señalar que este humedal presenta condiciones particulares de seguridad, asociadas a dinámicas sociales propias del sector y a la presencia de un asentamiento irregular colindante, identificado por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat del Distrito. En coherencia con los alcances del proyecto y las competencias institucionales, no se realizaron intervenciones directas con dicha población, evitando generar expectativas ajenas a los objetivos del contrato y considerando los antecedentes sociales y políticos asociados a este tipo de asentamientos en la ciudad.

A pesar de estas limitaciones, las actividades desarrolladas lograron un impacto positivo, fortaleciendo el conocimiento de la comunidad sobre el valor ecológico del humedal, las prácticas de cultura ciudadana y la importancia del manejo adecuado de residuos y la tenencia responsable de mascotas.

Humedal Ibis – Corregimiento de Navarro

El Humedal Ibis, se localiza en el corregimiento de Navarro y presenta condiciones territoriales y operativas particulares que inciden directamente en la forma como se desarrollan los procesos de educación ambiental, participación comunitaria y apropiación social del ecosistema. A diferencia de otros humedales urbanos del Distrito Especial de Santiago de Cali, este humedal no cuenta con acceso permanente habilitado para la comunidad, ni con infraestructura que permita la realización de visitas masivas o recorridos continuos, dado que se encuentra inserto en predios de carácter privado. Esta condición implicó, desde el inicio del proyecto, la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas alternativas, que garantizaran el acceso al conocimiento, la sensibilización ambiental y la comprensión del valor ecosistémico del humedal, aun en ausencia de experiencias frecuentes in situ.

En este contexto, el componente social y pedagógico asociado al Humedal Ibis, se estructuró a partir de un enfoque flexible, adaptativo y contextualizado, que priorizó el diálogo comunitario, el trabajo con actores locales y la generación de espacios de

intercambio de saberes fuera del polígono directo del humedal. Como primera acción pedagógica, se desarrolló un taller ambiental en la Biblioteca de Navarro, espacio comunitario estratégico que facilitó la convocatoria de habitantes del corregimiento interesados en conocer el humedal, sus procesos de recuperación y las intervenciones ambientales que se adelantan en el marco del contrato. Este primer encuentro permitió presentar información técnica sobre el humedal, socializar los objetivos del proyecto, explicar los alcances del contrato y resolver inquietudes iniciales de la comunidad.

A partir de este espacio pedagógico, surgió de manera espontánea una iniciativa comunitaria orientada a ampliar el proceso formativo, mediante la visita a otros humedales priorizados dentro del contrato, como estrategia para conocer de forma directa las dinámicas ecológicas, sociales y educativas de estos ecosistemas urbanos. Esta propuesta fue acogida como una oportunidad pedagógica complementaria, en tanto permitió que los participantes contrastaran la información técnica recibida con la experiencia directa en otros humedales de la ciudad, fortaleciendo su comprensión integral sobre el funcionamiento de la red de humedales urbanos de Cali y el rol estratégico que cumple el Humedal Ibis dentro de dicha red.

La visita a otros humedales se consolidó como un espacio de aprendizaje significativo, en el cual se promovió el intercambio de saberes entre la comunidad participante y los talleristas, articulando conocimientos técnicos con las percepciones, experiencias y lecturas territoriales de los asistentes. Esta experiencia facilitó el reconocimiento de los humedales urbanos como ecosistemas vivos, con múltiples servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica, la biodiversidad, la conectividad ecológica y el bienestar social. Así mismo, fortaleció el sentido de pertenencia y reconocimiento del Humedal Ibis como parte integral del patrimonio ambiental del Distrito Especial de Santiago de Cali.

De manera paralela, estos espacios pedagógicos contribuyeron al fortalecimiento del interés comunitario por involucrarse de forma más activa en los procesos que se adelantan en el territorio. Como resultado de este proceso, un grupo de participantes manifestó su intención de conformar un grupo comunitario de seguimiento a las actividades y obras que se desarrollan en el Humedal Ibis, entendiendo este ejercicio como una forma de control social ciudadano y veeduría sobre el uso de los recursos públicos y las intervenciones ambientales ejecutadas en el territorio.

Frente a esta manifestación, la Fundación expresó su disposición para facilitar espacios de diálogo, información y socialización, orientados a garantizar procesos claros, transparentes y oportunos sobre las intervenciones que se ejecutan en el humedal. No obstante, se dejó claridad en que estos espacios de seguimiento comunitario, no hacen parte del componente pedagógico del proyecto ni de las actividades de educación ambiental propiamente dichas, sino que se enmarcan en los mecanismos de control social y participación ciudadana contemplados en la normatividad vigente sobre

85

contratación pública. Aun así, se reconoció este ejercicio como un aporte complementario, que fortalece el empoderamiento comunitario, promueve la corresponsabilidad ambiental y contribuye a generar condiciones de confianza entre la comunidad, el ejecutor y las entidades contratantes.

Durante el mes de enero, se mantuvo una comunicación constante con los líderes y actores sociales del corregimiento de Navarro, teniendo en cuenta la existencia de organizaciones comunitarias que, si bien no se encuentran constituidas legalmente como veedurías ciudadanas, ejercen de manera activa funciones de control social ciudadano sobre el corredor ambiental de Navarro y, en particular, sobre el Humedal Ibis. En este contexto, uno de los líderes comunitarios manifestó el interés de realizar un espacio informativo con actores sociales, líderes y residentes del sector de Navarro, interesados en los temas ambientales y en el desarrollo del proyecto.

Como resultado de esta solicitud, el día 13 de enero, se llevó a cabo una reunión comunitaria con la participación de aproximadamente veinte (20) personas, en las instalaciones de la Biblioteca del corregimiento de Navarro, a las 9 de la mañana. En este espacio, se abordaron diversas inquietudes y temas relacionados con la ejecución del proyecto.

Uno de los principales asuntos tratados, correspondió a la inquietud comunitaria sobre la disposición final del material proveniente de las actividades técnicas realizadas en el humedal, específicamente aquellas asociadas al retiro de lodos y al tránsito de volquetas desde el área de intervención. La comunidad manifestó su preocupación frente a la posible disposición de este material en la vereda El Estero, perteneciente al corregimiento de Navarro, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Frente a esta inquietud, se aclaró que dicha situación correspondió únicamente a uno de los viajes realizados, en el cual, a solicitud expresa de un residente del sector de El Estero, se dispuso una parte del material con fines específicos asociados a actividades agrícolas del predio. Se precisó que esta acción fue excepcional, no volvió a repetirse y no corresponde al procedimiento regular del proyecto. Así mismo, se informó de manera clara que, la disposición final del material proveniente de las actividades técnicas del proyecto se realiza en sitios autorizados ubicados en los municipios de Candelaria y Puerto Tejada, cumpliendo con los lineamientos ambientales, contractuales y normativos vigentes. Se ofrecieron disculpas por las posibles incomodidades generadas y se reiteró el compromiso de la Fundación con el estricto cumplimiento de los estándares ambientales exigidos.

Otro de los temas abordados durante la reunión estuvo relacionado con la solicitud de vinculación de mano de obra local para los trabajos de empradización y recuperación paisajística del humedal. Frente a esta solicitud, se explicó que dichas labores

corresponden a actividades técnicas muy específicas, que requieren perfiles ocupacionales asociados a jardinería, paisajismo y manejo ambiental, y que el número de personas requeridas para estas labores es reducido, estimándose entre dos y cuatro personas. En este marco, una de las lideresas comunitarias solicitó la posibilidad de remitir hojas de vida con estos perfiles para ser tenidas en cuenta, en eventuales procesos de vinculación, solicitud que fue aceptada, aclarando que la selección dependerá de las necesidades técnicas del proyecto y de la idoneidad de los perfiles presentados.

De igual forma, se enfatizó que el contrato no contempla ni condiciona la contratación obligatoria de mano de obra local, no obstante, se manifestó la voluntad de la Fundación de considerar, en la medida de lo posible, la participación de personas del territorio que cumplan con los perfiles requeridos, como una forma de aporte al fortalecimiento del vínculo comunitario.

Durante el espacio también se socializaron otras solicitudes comunitarias, entre ellas la instalación de una valla informativa una vez finalicen las actividades técnicas del proyecto, con el fin de brindar información clara sobre el humedal, las intervenciones realizadas y su importancia ambiental.

Así mismo, se planteó la necesidad de realizar procesos de alinderamiento o delimitación, que permitan diferenciar de manera clara el área del humedal frente a los predios privados colindantes, evitando confusiones territoriales y fortaleciendo la protección del ecosistema. Estas solicitudes fueron recogidas para ser elevadas a la supervisión del contrato.

Adicionalmente, la comunidad solicitó el apoyo institucional, para identificar al grupo de control social mediante algún elemento distintivo, como camisetas, chalecos u otra prenda alusiva, solicitud que igualmente será puesta en consideración de las entidades correspondientes.

De igual manera, la comunidad manifestó el interés de realizar, una vez concluidas las actividades técnicas del proyecto, un recorrido de reconocimiento en el humedal, con el fin de conocer de manera directa el territorio y las acciones ejecutadas. Frente a esta solicitud, se explicó que este tipo de recorridos requieren una logística específica en términos de transporte, seguridad y responsabilidades, por lo cual su viabilidad será evaluada con la supervisión del contrato.


En el marco de la reunión, el equipo técnico y social del proyecto, realizó una presentación detallada sobre los avances alcanzados a la fecha en el Humedal Ibis, abordando las actividades de limpieza del espejo de agua, recuperación ambiental de zonas degradadas y manejo del borde del humedal. Estas acciones fueron sustentadas

86

mediante registros fotográficos y audiovisuales que permitieron evidenciar el ingreso de maquinaria, los procesos de intervención y los resultados preliminares obtenidos. Así mismo, se informó sobre los encuentros de formación ambiental y las jornadas de intercambio de experiencias realizadas con comunidades de otros humedales de la ciudad.

La jornada permitió evidenciar una disposición positiva por parte de la comunidad, así como un alto interés en mantenerse informada y participar de manera activa en los procesos asociados al humedal. Se reiteró la importancia de que los integrantes del grupo de control social asuman el compromiso de replicar la información en sus entornos comunitarios y de mantener una participación constante en los espacios que se convoquen. Finalmente, se recordó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y la Fundación, haciendo uso de los mecanismos institucionales dispuestos para la atención de inquietudes, solicitudes y propuestas, con el fin de garantizar procesos transparentes, oportunos y articulados que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades previstas y al fortalecimiento del ejercicio de control social en el territorio.

En términos generales, este espacio ratificó que el acompañamiento social y pedagógico desarrollado en el Humedal Ibis ha sido un elemento clave para garantizar la comprensión comunitaria del proyecto, fortalecer la confianza entre la institucionalidad y la población del corregimiento de Navarro y consolidar procesos de apropiación social del territorio. Así mismo, permitió reiterar a los asistentes el alcance real del componente educativo y social del contrato, diferenciándolo claramente de los espacios de participación ciudadana asociados al control social y la veeduría comunitaria. Finalmente, se destacó que la continuidad del diálogo, la socialización permanente de los avances técnicos y la articulación con los actores locales constituyen factores determinantes para la sostenibilidad de las intervenciones ambientales, el fortalecimiento del tejido social y la proyección de procesos comunitarios informados y corresponsables en torno a la conservación del Humedal Ibis.

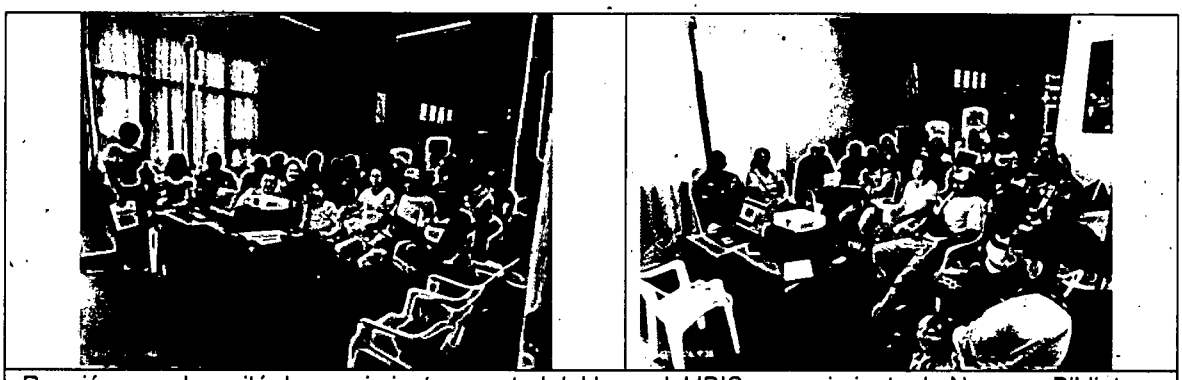

Reunión con el comité de seguimiento y control del humedal IBIS, corregimiento de Navarro, Biblioteca del corregimiento, enero 13 de 2026

Humedal La Babilla – Zanjón del Burro, Panamericano y Ecoparque Lago de las Garzas

Estos humedales se caracterizan por recibir una alta afluencia de visitantes, turistas y población flotante, especialmente durante fines de semana y temporadas recreativas. En consecuencia, la estrategia metodológica priorizó talleres–recorrido, estaciones temáticas y actividades lúdicas orientadas a públicos diversos, con distintos niveles educativos y de apropiación ambiental.

El Ecoparque Lago de las Garzas se consolidó como un escenario clave para procesos de educación ambiental urbana, permitiendo la articulación con visitantes frecuentes, instituciones educativas y colectivos ambientales. El evento de cierre realizado en este espacio reforzó el sentido de corresponsabilidad ciudadana y la visibilización de los humedales como aulas vivas de aprendizaje.

En el caso de La Babilla y Panamericano, se evidenció un impacto significativo en la sensibilización frente a prácticas inadecuadas, como la disposición incorrecta de residuos y la interacción inadecuada con la fauna silvestre, aspectos recurrentes en estos ecosistemas.

87

Humedal Cañas Gordas

El Humedal Cañas Gordas presenta una dinámica particular, dado que no ha estado habilitado para el ingreso masivo de visitantes y se encuentra rodeado por sectores con características socioeconómicas específicas, donde la participación comunitaria directa es limitada. No obstante, se logró una vinculación estratégica con actores puntuales, como el Club Señor Club, ubicado en cercanías al humedal, lo cual permitió adelantar acciones de educación ambiental focalizadas y pertinentes.

Estas intervenciones evidencian la importancia de adaptar la estrategia a contextos donde la comunidad residente no se involucra de manera espontánea, pero donde existen actores institucionales o privados que pueden convertirse en aliados para la conservación del ecosistema.

Análisis cualitativo del impacto

Desde una perspectiva cualitativa, los talleres generaron impactos positivos en términos de:

- Incremento del conocimiento ciudadano sobre los humedales urbanos y sus servicios ecosistémicos.
- Sensibilización frente a prácticas cotidianas que afectan negativamente estos ecosistemas.
- Fortalecimiento de actitudes proambientales y de corresponsabilidad ciudadana.
- Adecuación de contenidos, lenguaje y dinámicas pedagógicas a los grupos etarios, niveles educativos e intereses de los participantes.

Las metodologías participativas permitieron que los asistentes no solo recibieran información, sino que reflexionaran sobre su rol como ciudadanos y visitantes de los humedales, generando compromisos individuales y colectivos para su cuidado.

Análisis cuantitativo y perfil de la población participante

De acuerdo con los registros consolidados, la participación estuvo compuesta mayoritariamente por personas mayores de edad, estudiantes, líderes comunitarios, visitantes ocasionales y población flotante. En el caso del Humedal Isaías Duarte Cancino, predominó la participación de residentes de la Comuna 15, mientras que en los humedales con mayor vocación recreativa se evidenció una mayor diversidad de perfiles.

A nivel global, se estima que más del 80 % de los participantes manifestó, en las evaluaciones finales, haber adquirido nuevos conocimientos sobre los humedales y su

importancia ambiental, y cerca del 70 % identificó cambios potenciales en sus prácticas cotidianas relacionadas con el manejo de residuos, el respeto por la fauna y el uso responsable del espacio público.

La información analizada, demuestra que la estrategia de educación ambiental y fortalecimiento comunitario fue pertinente, efectiva y coherente con los objetivos del proyecto. El cumplimiento de la meta de 51 talleres, sumado a las actividades de cierre, evidencia una gestión eficiente y una adecuada articulación entre la planificación metodológica y la ejecución en territorio.

La adaptación de las estrategias a las particularidades de cada humedal, permitió maximizar el impacto, incluso en contextos con restricciones de acceso, seguridad o participación comunitaria, consolidando los humedales como espacios de aprendizaje, reflexión y construcción de ciudadanía ambiental.

El análisis desarrollado en el presente informe, correspondiente al periodo evaluado, se fundamentó en la aplicación de técnicas de observación directa en territorio, análisis preliminar de la información recolectada, revisión de información documentada, seguimiento permanente a los espacios pedagógicos desarrollados con las comunidades y en la utilización de los instrumentos y herramientas diseñadas para el componente social y de educación ambiental. Estos elementos permitieron al ejecutor realizar una lectura integral y contextualizada de los avances, alcances y dinámicas sociales asociadas a la intervención en los humedales priorizados, garantizando coherencia metodológica y trazabilidad en el proceso de ejecución.

No obstante, teniendo en cuenta que una parte significativa de las actividades de cierre y de los espacios pedagógicos se desarrollaron durante la última semana del mes, el proceso de consolidación de soportes, sistematización de evaluaciones y análisis detallado de la información recolectada se realizará de manera integral en el siguiente periodo de reporte. Este ejercicio permitirá presentar un análisis más completo, ordenado y consistente, incorporando la totalidad de los registros, evidencias y resultados derivados de los espacios ejecutados, en cumplimiento del compromiso del ejecutor de entregar información debidamente organizada, validada y técnicamente sustentada.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra CVC No. 0741 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y la Fundación Construyamos Futuro – CONSTRUFUTURO, y conforme a la suscripción del Acta de Prórroga No. 1, a la fecha del presente informe la Fundación se encuentra al día con la actualización de las garantías contractuales, ajustadas al nuevo plazo de ejecución aprobado.

En consecuencia, se relaciona a continuación la información correspondiente a las pólizas contractuales actualizadas, las cuales incorporan el término prorrogado y mantienen la vigencia, cobertura y amparos exigidos por la entidad contratante, conforme a lo establecido en el Acta de Prórroga No. 1 suscrita el 10 de febrero de 2026.

POLIZAS	
BENEFICIARIO	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
ASEGURADORA	Seguros Del Estado SA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
NUMERO DE POLIZA 45-44-101169582			
AMPARO	**SUMA ASEGURADA ACTUAL**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 720.000.076,40	25/09/2025	11/10/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 1.080.000.114,60	25/09/2025	11/10/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 360.000.038,40	25/09/2025	11/04/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 720.000.076,40	31/12/2025	31/12/2030

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUMERO DE POLIZA 45-40-101102971			
AMPARO	SUMA ASEGURADA ACTUAL	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 700.362.000,00	25/09/2025	11/04/2026

6. AVANCE DE OBRA

A continuación, se presenta el avance ejecutado durante el presente periodo reportado tanto por el contratista como la interventoría, la siguiente tabla muestra el porcentaje de avance de obra de acuerdo con las actividades ejecutadas al momento del cierre de este informe.

UBICACION	% AVANCE
Etapa Preconstrucción	100%
Humedal Cañasgordas	74,03%
Humedal Panamericano	20,11%
Humedal Parque de las Garzas	82,75%
Humedal La Babilla	100%
Humedal Isaías Duarte Cancino	100%
Humedal Ibis	100%
Fortalecimiento Comunitario	100%
Restauración Ecológica y manejo de humedales	100%

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

8.CUADRO CONTROL DE LLUVIAS

De acuerdo con la gráfica de comportamiento climático correspondiente al mes de diciembre de 2025 y al periodo comprendido entre el 9 y el 13 de febrero de 2026, se evidenció la presencia de precipitaciones recurrentes en la ciudad de Santiago de Cali, con jornadas caracterizadas por lluvias intermitentes y alta nubosidad.

Durante diciembre se registraron condiciones típicas de temporada húmeda, con temperaturas máximas que oscilaron entre 24°C y 29°C y mínimas entre 16°C y 20°C. Para el periodo del 9 al 13 de febrero de 2026, se presentaron eventos de lluvia que incidieron directamente en la humedad del terreno y en las condiciones operativas de los frentes de obra.

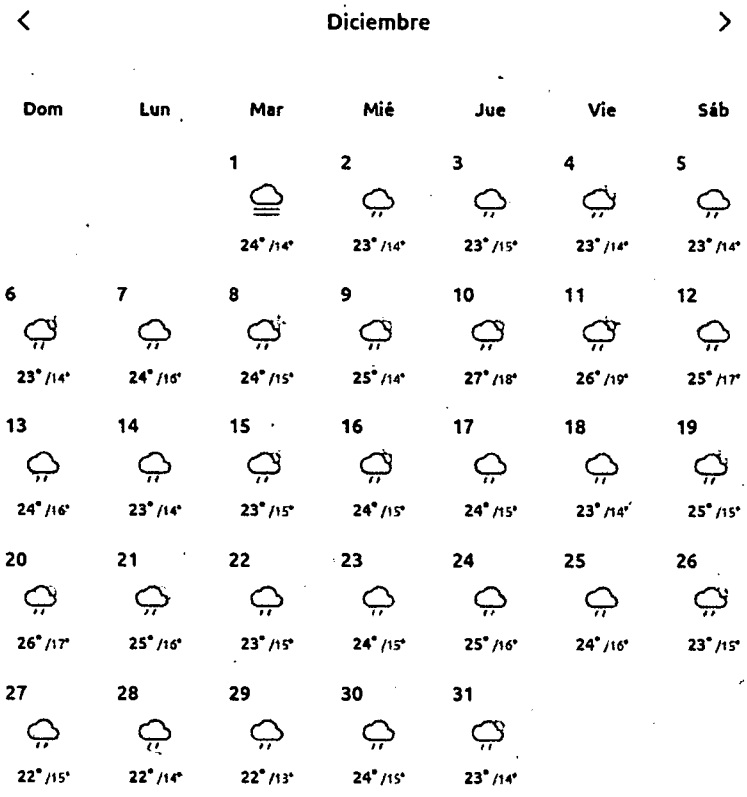


Ilustración 47 Precipitación y lluvia durante el mes de Diciembre.

Fuente: https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/valle-del-cauca/cali?page=month&month=December

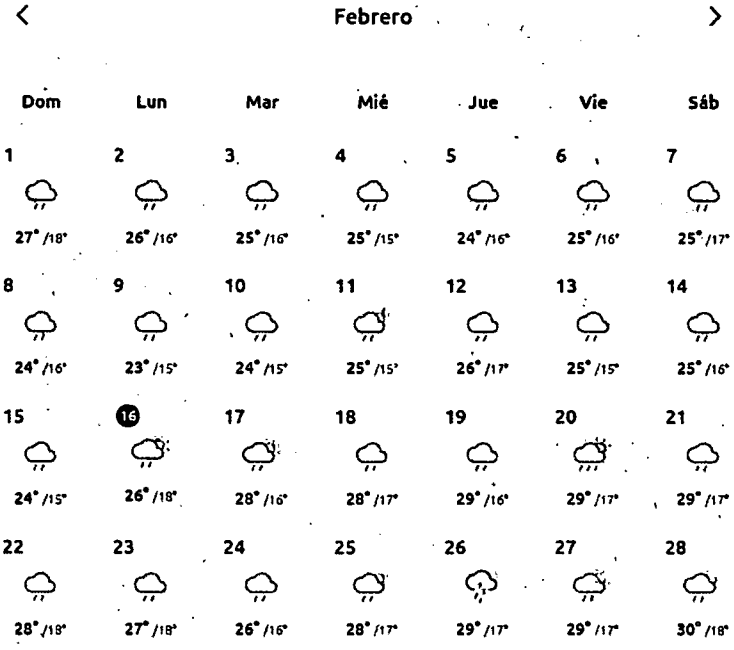


Ilustración 48 Precipitación y lluvia durante el mes de febrero.

Fuente: *https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/valle-del-cauca/cali?page=month&month=February*

Dado lo anterior se aclara que de igual forma el registro del clima diario se lleva en las bitácoras correspondientes a cada uno de los frentes de obra que se ejecutaron durante el presente periodo.

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

9. CONCLUSIONES

En el marco del Acta Parcial No. 2 del Contrato de Obra Pública No. 0741 de 2025, se consolidó un avance significativo en los componentes de obra civil, recuperación ambiental y fortalecimiento comunitario, evidenciando una ejecución técnica articulada, coherente con el objéto contractual y ajustada a las condiciones reales encontradas en campo.

Desde el componente de obra civil, las intervenciones desarrolladas en los humedales priorizados permitieron avanzar en la recuperación funcional y estructural de los ecosistemas intervenidos. En el Humedal Cañasgordas se consolidaron frentes de construcción de senderos peatonales y cimentaciones de pasos elevados, garantizando estabilidad estructural, control de niveles y correcta implantación conforme a diseño. En el Humedal Parque de las Garzas se regularizaron y soportaron técnicamente cantidades ejecutadas en periodos anteriores, asegurando trazabilidad presupuestal mediante el respectivo balance contractual.

En el Humedal Isaías Duarte Cancino se ejecutó un ítem no previsto correspondiente al suministro e instalación de marco y tapa para caja eléctrica, intervención necesaria para mitigar un riesgo inminente a la seguridad de los usuarios, evidenciando la capacidad de respuesta técnica frente a situaciones no contempladas inicialmente. Por su parte, en el Humedal Ibis se desarrolló la descolmatación hidráulica del espejo de agua, incluyendo adecuación de accesos, excavación manual y mecánica bajo agua, cargue, transporte y disposición final en sitio autorizado, logrando recuperar profundidad hidráulica y funcionalidad ecosistémica del cuerpo de agua.

Estas acciones reflejan una ejecución técnica basada en diagnóstico en campo, control operativo, cumplimiento normativo y adaptación a variables climáticas y logísticas propias del territorio.

En cuanto al componente ambiental, el análisis de cobertura permitió establecer que la guadua presenta comportamientos diferenciados según el humedal Cañasgordas: 14,75 % del área total., La Babilla: 6,79 %, Panamericano: 2,31 %. Estos valores demuestran que, si bien la guadua no constituye una cobertura dominante generalizada en todos los humedales, en Cañasgordas sí representa un elemento estructurante relevante dentro del paisaje. La ausencia histórica de mantenimiento técnico generó: Sobrepoblación de culmos envejecidos, acumulación de biomasa seca, competencia intraespecífica. mayor susceptibilidad a plagas y deterioro estructural.

Las intervenciones de entresaca, limpieza basal y control de densidad permitieron: recuperar la estructura funcional del guadual, mejorar la aireación interna, disminuir riesgos fitosanitarios y optimizar su función como estabilizador de bordes hídricos.

Desde el punto de vista paisajístico, el manejo no buscó reducción de cobertura, sino mejoramiento estructural, asegurando que la guadua continúe cumpliendo su papel ecológico sin convertirse en elemento de desequilibrio dentro del ecosistema

Respectivamente al control de hormiga arriera, el diagnóstico inicial evidenció poblaciones desbordadas, particularmente en el Humedal Cañasgordas, donde el área intervenida alcanzó el 35,29 % del total del humedal. En los demás sistemas se registraron intervenciones proporcionales a la magnitud de afectación. El enfoque técnico priorizó la disminución poblacional, no la erradicación total, mediante aplicaciones periódicas que permitieran: interrumpir el ciclo biológico, reducir la actividad de forrajeo, disminuir la presión sobre estratos jóvenes, evitar recolonización inmediata. La frecuencia de intervención fue determinante para controlar colonias consolidadas, especialmente en zonas con mayor densidad de hormigueros activos.

La estrategia priorizada para el mantenimiento de los árboles emplazados en los humedales fue la nutrición edáfica, mediante aplicación puntual de formulación completa con nitrógeno y elementos menores, orientada a: fortalecer el sistema radicular, incrementar la capacidad fotosintética, mejorar la respuesta frente a estrés ambiental y aumentar resiliencia estructural. El manejo fitosanitario adoptado aborda la causa estructural del debilitamiento (suelo y nutrición) y no únicamente sus síntomas.

Las acciones ejecutadas en guaduales, control de hormiga arriera y manejo sanitario del arbolado no constituyen intervenciones aisladas, sino un modelo integral de recuperación ecosistémica, cuyos efectos sinérgicos permiten: consolidar la estructura vertical del bosque urbano, mejorar la estabilidad de bordes ribereños, incrementar la captura de carbono, fortalecer la conectividad ecológica, estabilizar procesos sucesionales, reducir vulnerabilidad frente a eventos climáticos.

El componente ambiental ejecutado durante el contrato permitió pasar de una condición de mantenimiento reactivo a un esquema técnico preventivo, basado en diagnóstico, intervención focalizada y fortalecimiento estructural del ecosistema. En términos paisajísticos, las intervenciones realizadas no solo corrigen afectaciones puntuales, sino que consolidan una base ecológica que garantiza sostenibilidad a mediano y largo plazo para los humedales urbanos priorizados del municipio de Santiago de Cali.

En el componente social y pedagógico en los humedales priorizados, se logró evidenciar un impacto positivo en términos de participación y apropiación ambiental.

Se desarrollaron espacios pedagógicos y comunitarios en los humedales Ibis, Cañasgordas, La Babilla, Panamericano, Parque de las Garzas e Isaías Duarte Cancino, alcanzando una participación acumulada de 1.114 personas en 51 actividades, lo que refleja una adecuada capacidad de convocatoria y gestión territorial.

91

Los instrumentos de evaluación aplicados evidenciaron que más del 80 % de los participantes fortaleció su comprensión sobre la importancia ecológica de los humedales urbanos y su función en la regulación hídrica y conservación de biodiversidad. Asimismo, se identificó una disposición significativa a modificar prácticas cotidianas que generan impactos negativos sobre estos ecosistemas.

Desde el punto de vista cualitativo, se observó una resignificación progresiva del humedal como espacio estratégico para la ciudad, pasando de percepciones asociadas a problemáticas urbanas hacia una valoración como ecosistema clave para el bienestar ambiental y social.

La implementación de metodologías participativas, vivenciales y adaptadas a cada territorio permitió ajustar la estrategia a las condiciones específicas de cada humedal, fortaleciendo la legitimidad del proyecto y facilitando la articulación con actores comunitarios e institucionales.

En términos generales, el componente social no solo cumplió con las metas establecidas en el contrato, sino que contribuyó a fortalecer la relación entre comunidad e institucionalidad, generando bases favorables para la sostenibilidad social de las intervenciones ambientales ejecutadas.

De manera integral, el Acta Parcial No. 2 evidencia que el proyecto no se limita a la ejecución de actividades constructivas aisladas, sino que consolida un modelo de intervención técnica, ambiental y socialmente articulado, donde la recuperación hidráulica, el fortalecimiento ecosistémico y la apropiación comunitaria operan de manera complementaria.

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

FICHAS TECNICAS DE DIAGNOSTICO HUMEDAL PANAMERICANO

92

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			1
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Samán	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,365833333	-76,64166667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18.50	0.95	15.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**2**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Pizamo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,364166667	-76,6425
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.40	1.26	9.30


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



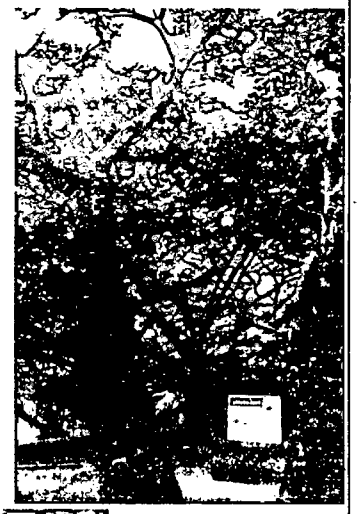



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**3**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Samán	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,360833333	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.60	0.97	12.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

94

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**4**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Samán		
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,36	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.50	.097	13.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**5**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mamoncillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Melicoccus bijugatus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,361388889	-76,64083333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.60	0.30	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

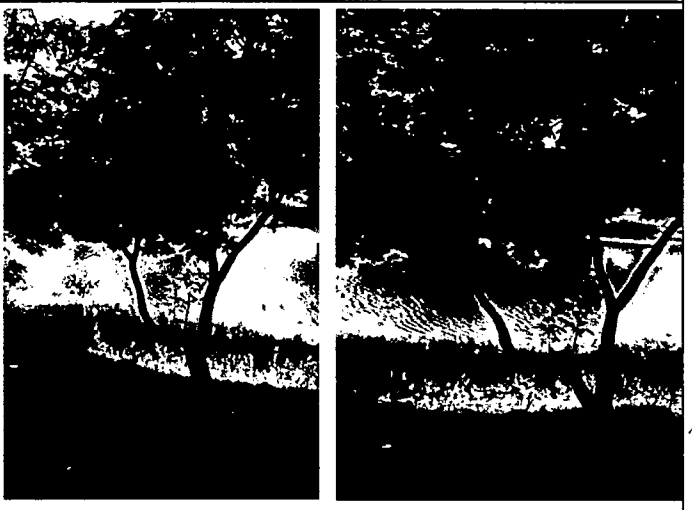

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**6**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma Alejandra	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Archontophoenix alexandrae*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,361388889	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.80	0.19	4.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**7**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,362222222	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.30	0.87	8.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**8**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Palma de vino**		
	ESPECIE	*Attalea butyracea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,364722222	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.50	0.97	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**9**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma de vino	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Attalea butyracea*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,363611111	-76,64444444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.70	0.96	7.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

97

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**10**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma de vino	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Attalea butyracea*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,363333333	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.10	0.98	8.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**11**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Chiminango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pithecellobium dulce*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,363055556	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.70	0.83	6.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

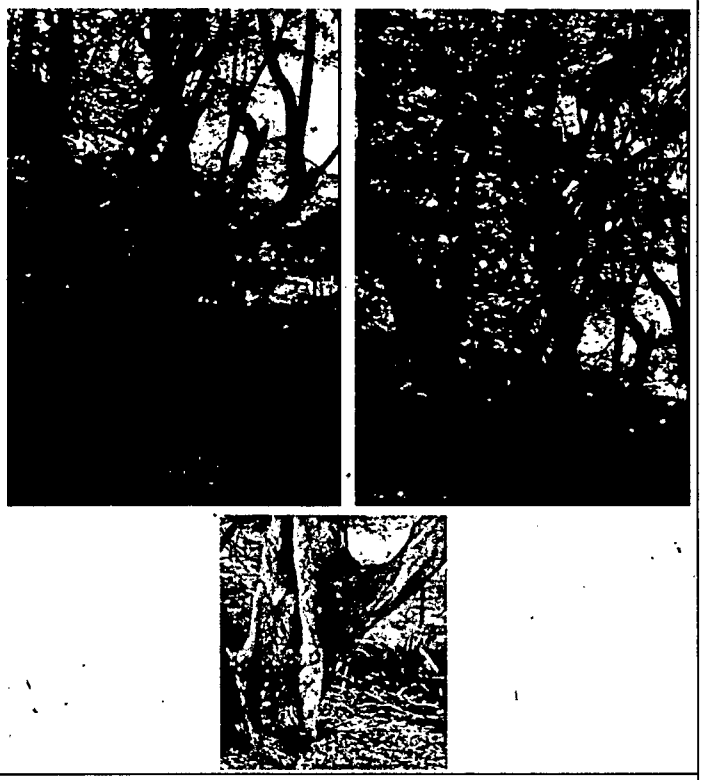

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

98

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**12**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACIÓN**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,361944444	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.30	0.35	6.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**13**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,361111111	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.50	0.47	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**14**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guanabano	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Annonaceae	3,361666667	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.15	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**15**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,359166667	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.20	0.32	3990

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO


OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

100

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**16**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,358888889	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.40	0.47	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**17**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,357222222	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.50	0.62	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**18**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Igua		
	ESPECIE	*Albizia guachapele*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,356666667	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total – (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.70	1.32	12.40


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



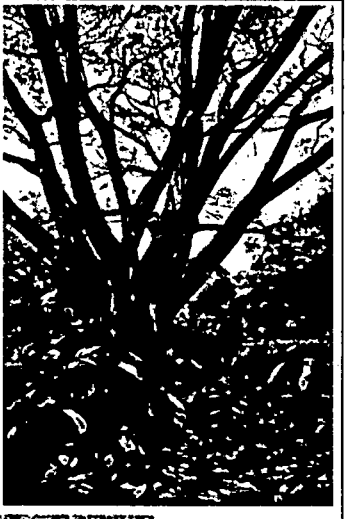



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**19**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Igua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia guachapele*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,355555556	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.50	0.64	9.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

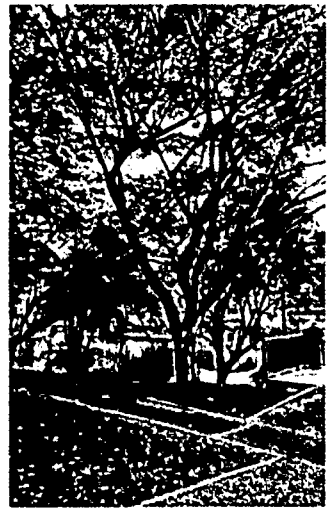





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**20**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACIÓN**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,353888889	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.80	0.35	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

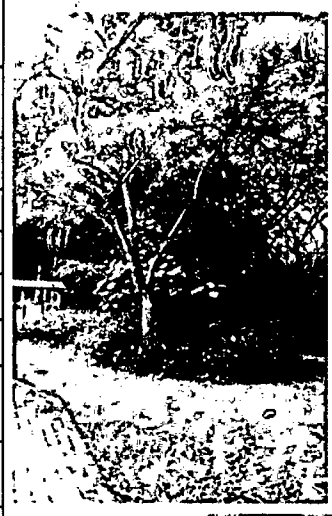





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**21**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,354722222	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.70	11.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**22**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,352777778	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.10	0.82	11.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

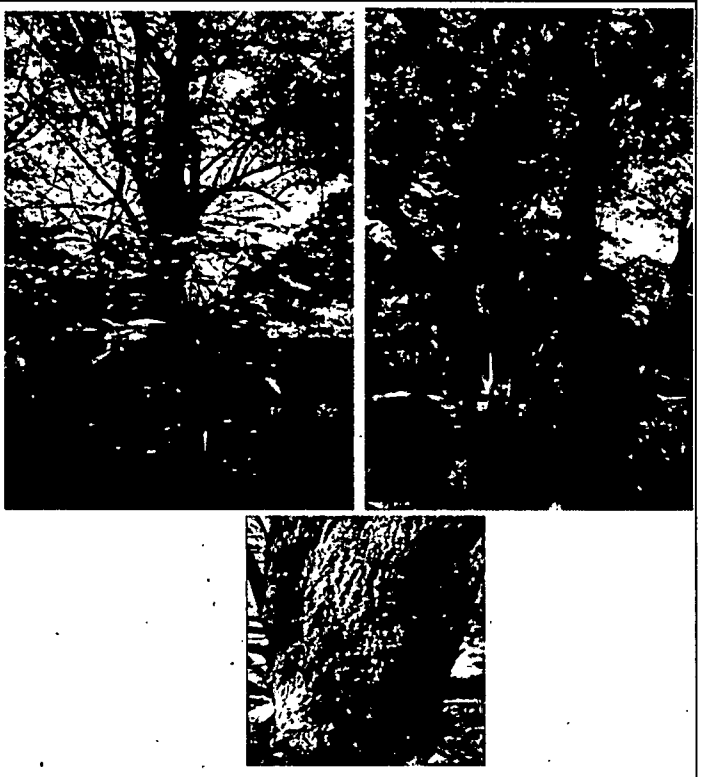

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: PROYECTO	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**23**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351666667	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.20	0.89	14.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**24**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,35	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.70	0.67	10.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**25**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Guásimo		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351111111	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.90	0.95	10.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**26**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Palma de azúcar		
	ESPECIE	*Syagrus romanzoffiana*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,61	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.40	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**27**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma de azúcar	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Syagrus romanzoffiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,609444444	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.40	0.49	3.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**28**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,606666667	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17.10	1.10	12.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

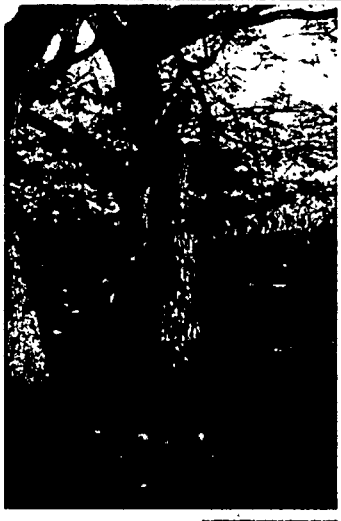





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**29**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracolí	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,606388889	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17.50	1.30	11.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RÁIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**30**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,602777778	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	1.50	9.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**31**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Samán	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,6025	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.90	0.65	12.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**32**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,598888889	-76,66722222
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.50	0.12	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

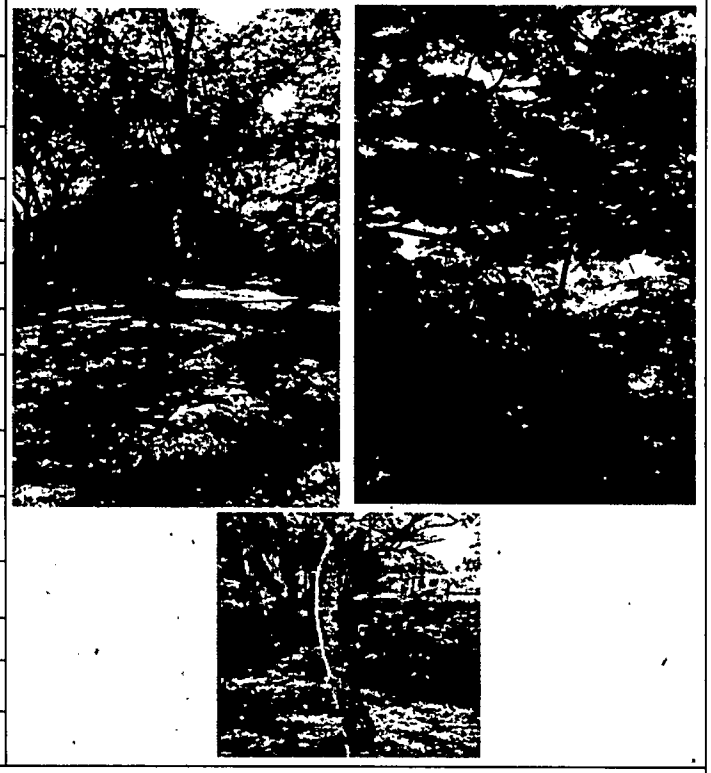

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**33**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,598611111	-76,6425
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No.CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.15	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**34**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Samán**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,598333333	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16.50	0.92	12.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauco	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**35**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,598333333	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.70	0.44	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**36**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,598333333	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.90	0.27	7.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**37**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,596388889	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13.20	0.98	11.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

111

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**38**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,596944444	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.90	0.45	9.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**39**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Malvaceae	3,592777778	-76,64277778
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	1.30	11.80


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



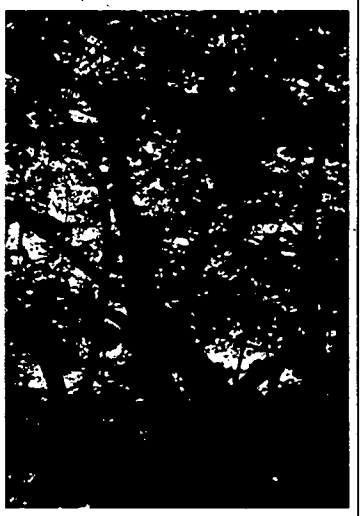



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**40**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Guásimo		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,5925	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.90	1.20	10.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**41**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,592222222	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.50	0.26	5.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**42**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,590277778	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.80	0.05	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**43**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,589722222	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.60	0.25	5.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**44**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,588055556	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	1.20	10.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

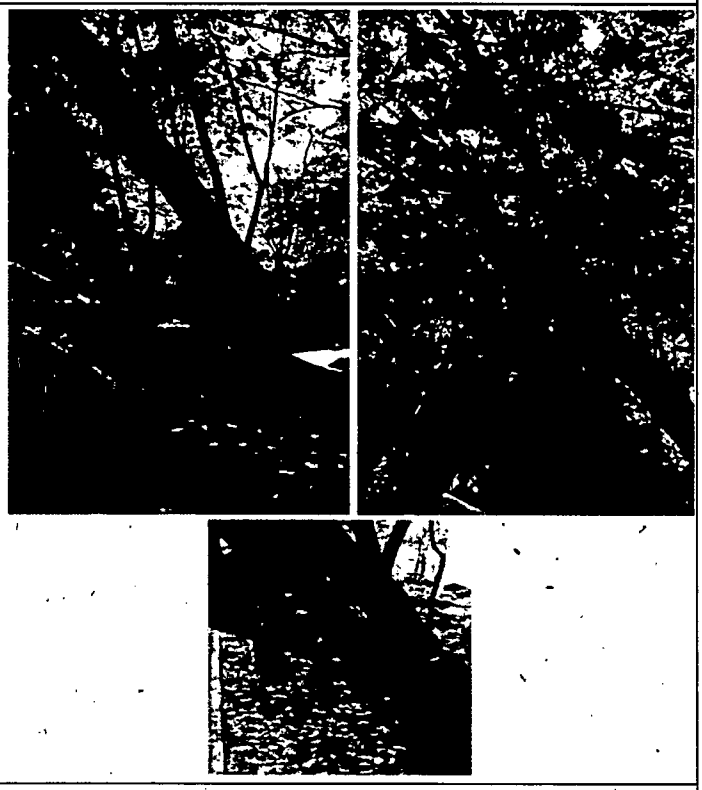

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**45**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,589444444	-76,64638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.23	6.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**46**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Nogal cafetero		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,586388889	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.80	0.95	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRÁFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA'	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**47**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,586388889	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diamétro copa (M)
14.20	1.20	12.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

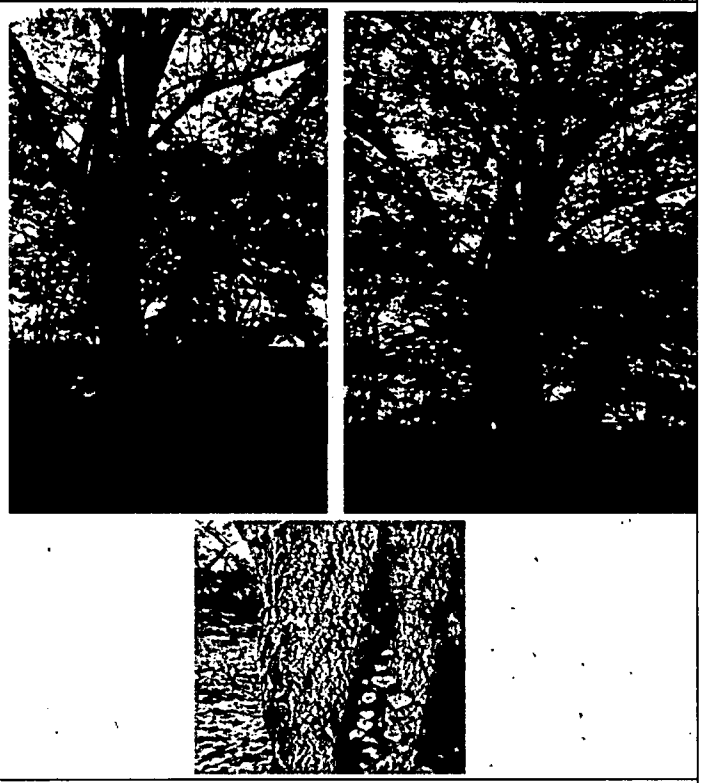

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

116

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	EVALUACIÓN DE CAMPO Contrato de Obra CVC 0741-2025 Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	48

DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,585833333	-76,64055556
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.20	0.48	13.10


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**49**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,586944444	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.22	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**50**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,586944444	-76,64027778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.50	0.45	7.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACION DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**51**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,588333333	-76,64111111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.40	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**52**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,588888889	-76,63972222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.90	0.59	7.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**53**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Malvaceae	3,583611111	-76,64472222
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.30	0.15	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA		NO	**AVIFAUNA**		NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO		SI	**NUTRICION VEGETAL**		SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**54**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,583611111	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.90	0.12	3.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			55
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,583611111	-76,64444444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.40	0.47	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**56**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,582222222	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.40	0.62	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**57**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,581388889	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.80	0.69	8.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

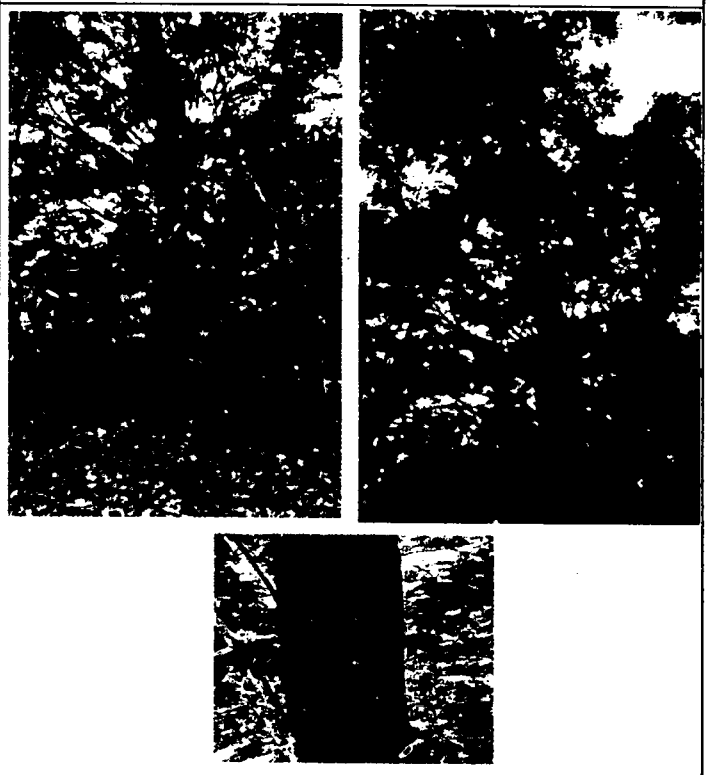

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

121

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**58**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,581666667	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.70	0.15	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**59**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,580833333	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.40	0.09	4.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

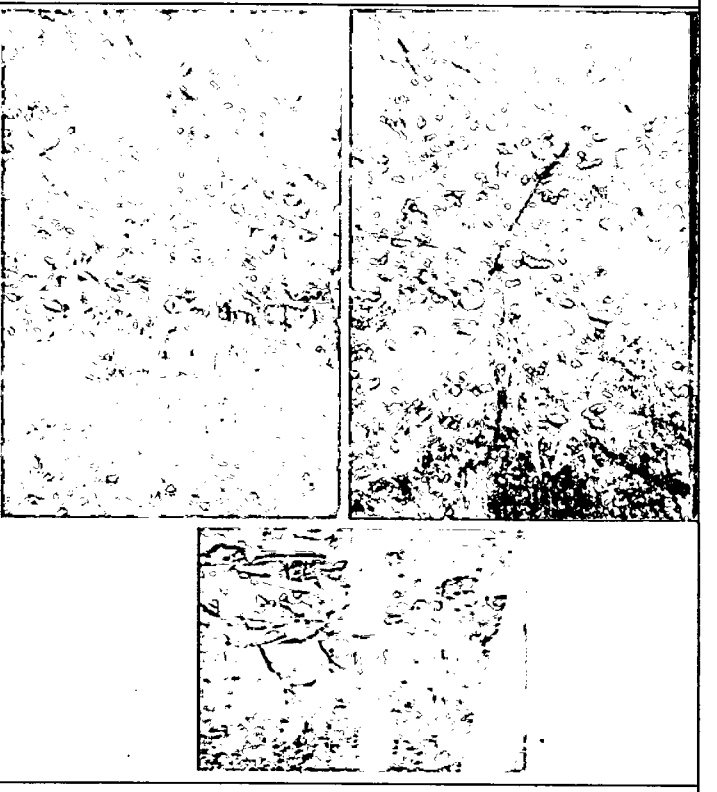

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**60**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,580555556	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.08	3.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**61**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,580277778	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.20	0.30	4.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

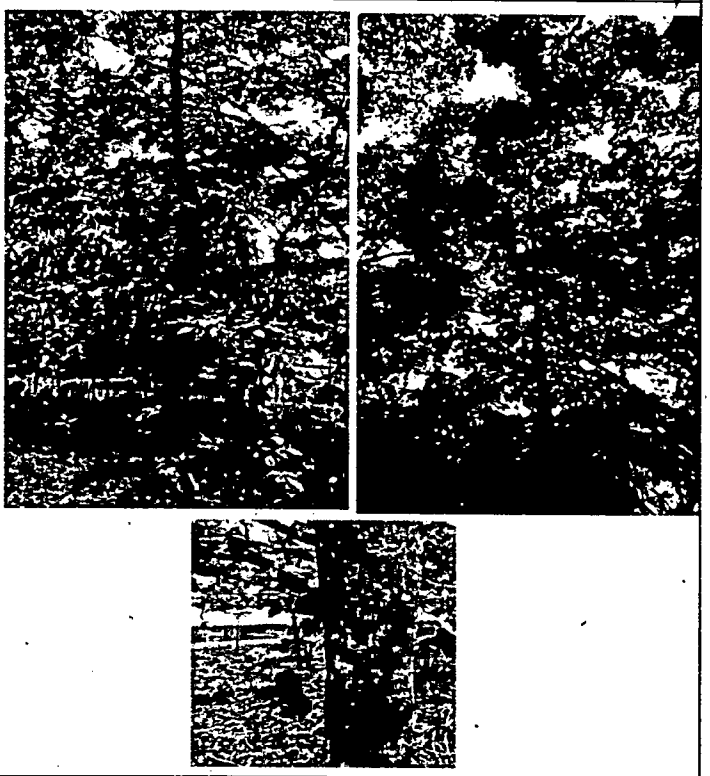

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**62**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,460555556	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.12	4.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			63
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,583055556	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.90	0.10	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





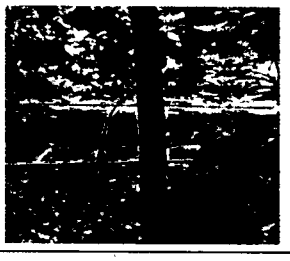

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**64**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,581388889	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.10	0.78	10.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**65**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,582777778	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.30	0.78	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

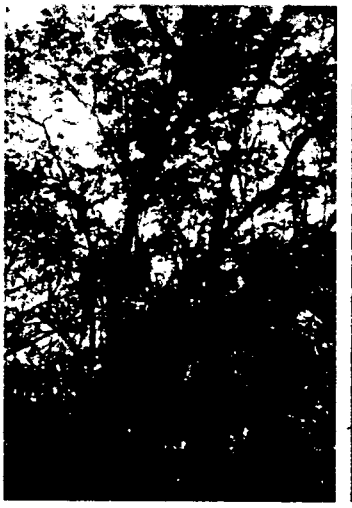





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**66**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Samán	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,579722222	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.00	0.72	12.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**67**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	**PANAMERICANO**		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,579444444	-76,64194444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.20	1.15	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



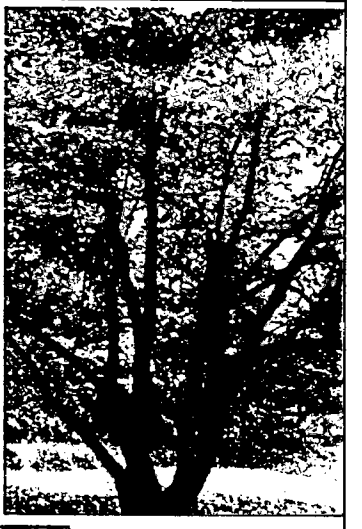



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**68**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Samán	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Samanea saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,5775	-76,64111111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.50	1.20	16.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**69**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,58	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.30	0.89	6.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

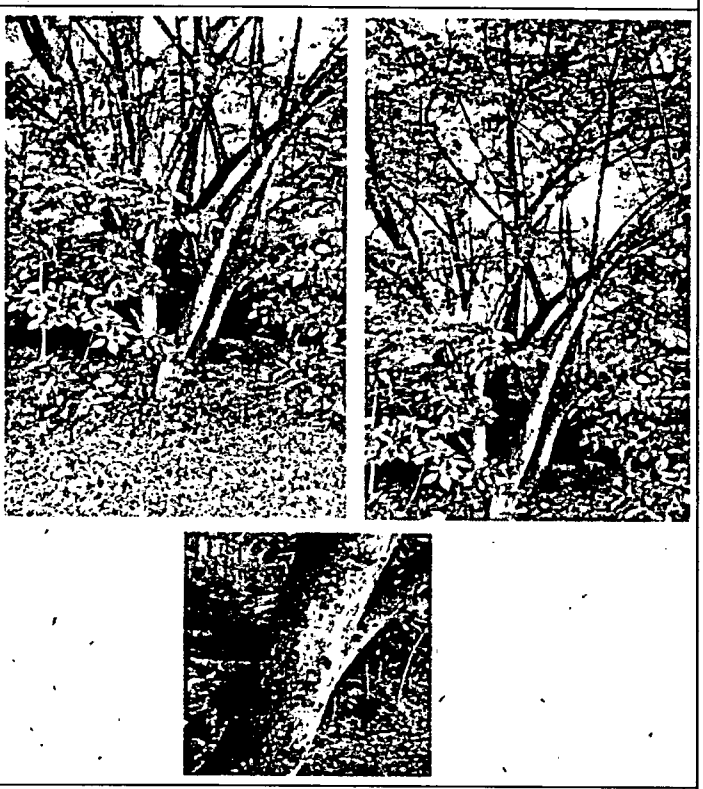

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**70**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,577777778	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12.50	1.28	8.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**71**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,578611111	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	0.20	6.70

REGISTRO FOTOGRAFICO

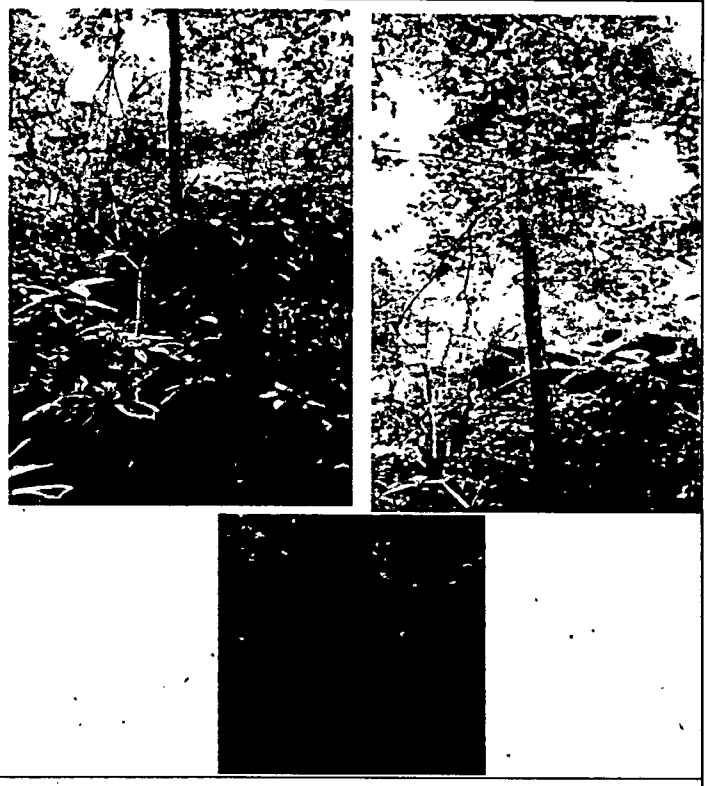

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**72**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.05	2.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**73**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma manila**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,578611111	-76,64083333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.40	0.10	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

129

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**74**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Zapote**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pouteria sapota*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapotaceae	3,573888889	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.30	0.46	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**75**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Zapote**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pouteria sapota*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapotaceae	3,573333333	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.60	0.48	7.70

REGISTRO FOTOGRAFICO

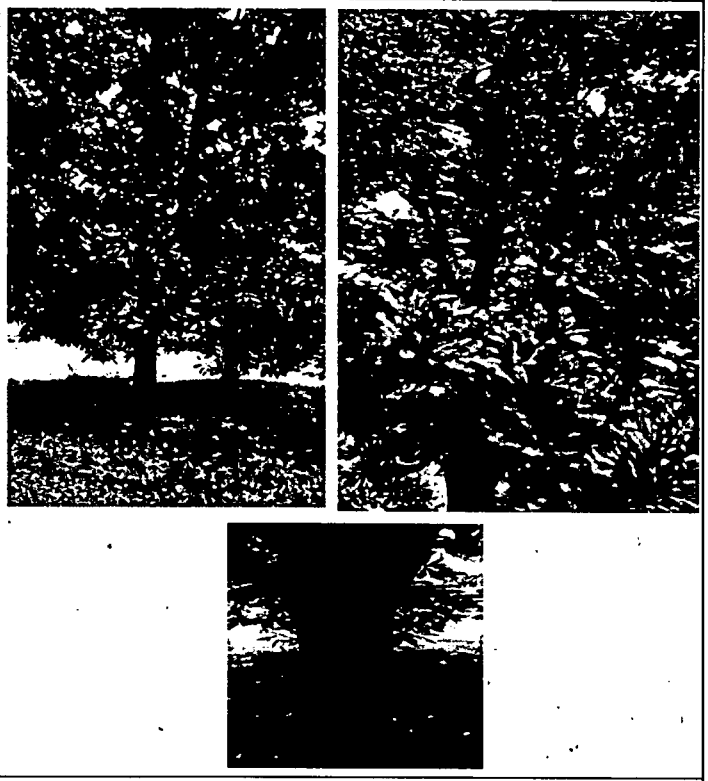

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

130

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**76**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,574166667	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.80	0.48	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

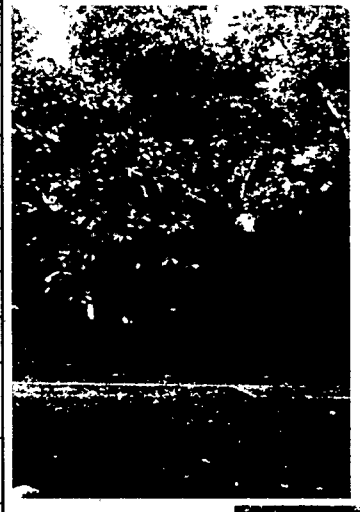





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO:**			**77**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.83	7.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

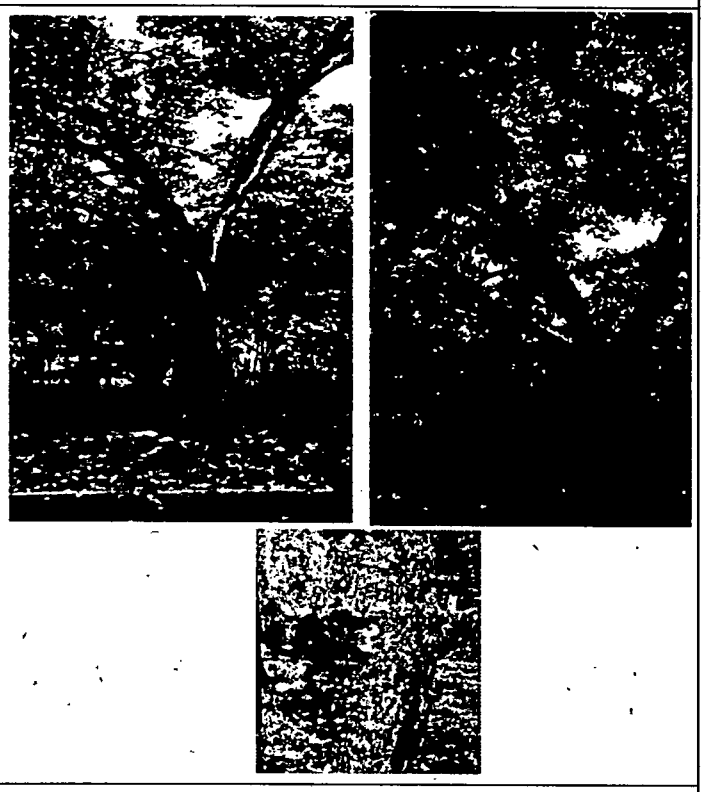

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**78**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,576388889	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.20	0.72	6909

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			79
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Nogal cafetero		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575277778	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14.70	0.48	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

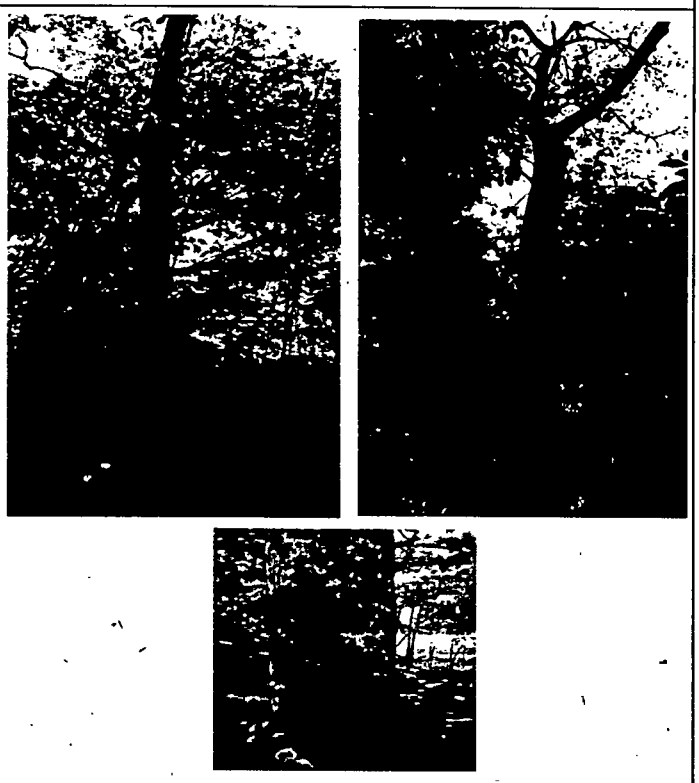

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

132

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	4/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**80**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracolí	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,576944444	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.30	0.75	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**81**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la via Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caracolí**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,578333333	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.10	0.50	7.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**82**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracolí	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,579444444	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.60	0.98	7.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**83**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Nogal cafetero**		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,580555556	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15.40	0.65	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**84**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,574444444	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.11	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**85**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,579444444	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	0.10	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

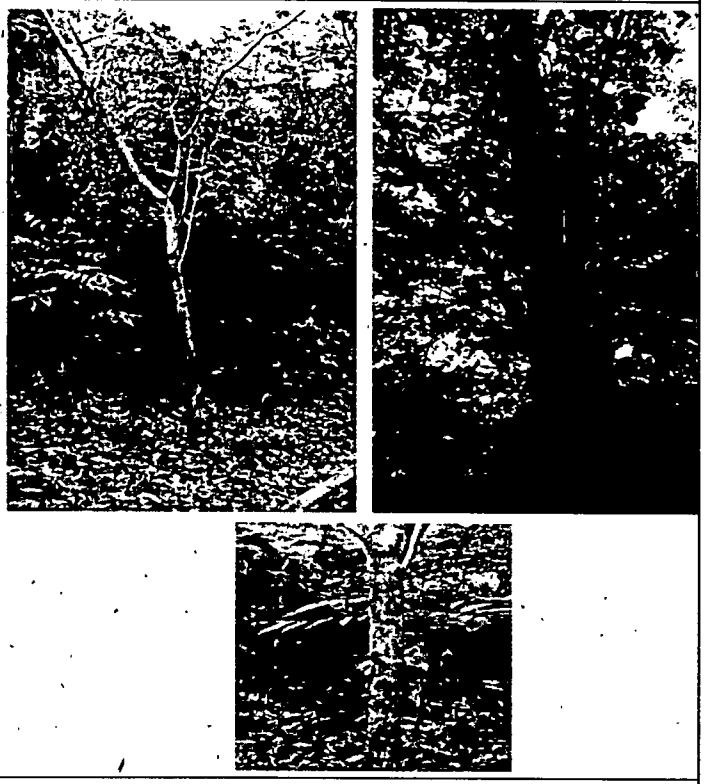

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

135

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**86**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,578333333	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.20	0.12	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: **INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**.NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**87**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus insipida**		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,578333333	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.70	0.70	3.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

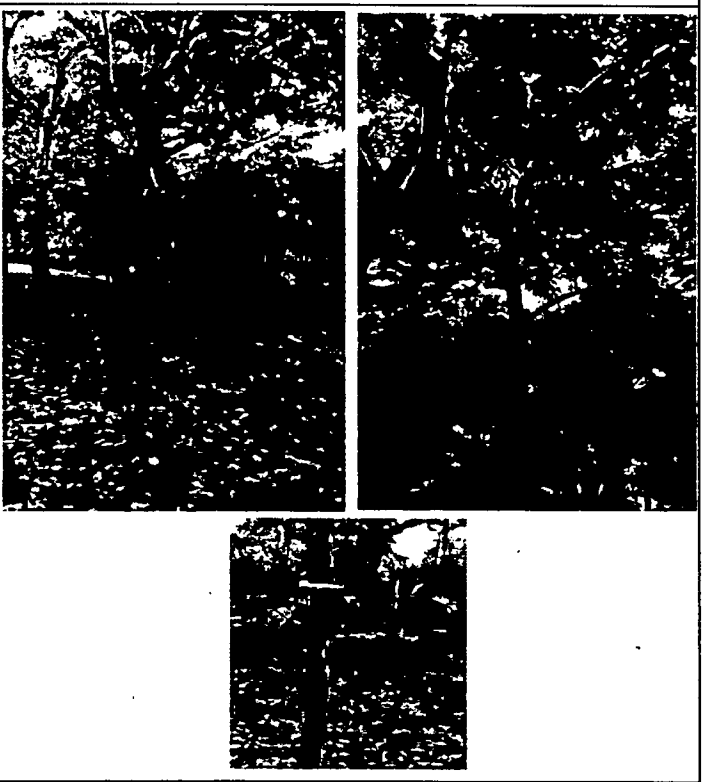

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**88**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,5775	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.20	0.07	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			89
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Guásimo		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,576944444	-76,64666667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.40	0.08	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**90**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,575833333	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.10	0.11	4.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





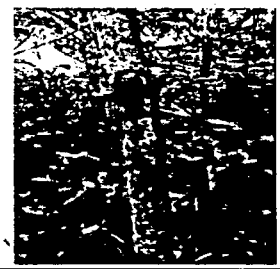

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		91
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Ficus insipida		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,575	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.80	0.07	3.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**92**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma manila**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,572777778	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.10	1.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

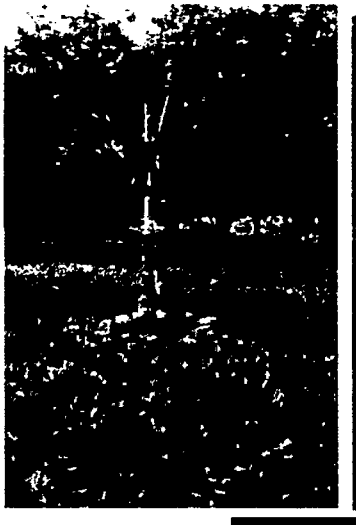

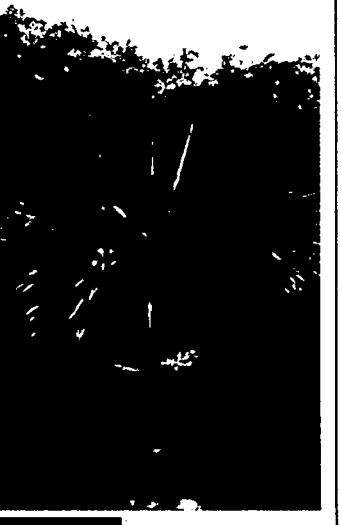



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			93
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Palma manila		
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Arecaceae	3,571111111	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.14	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

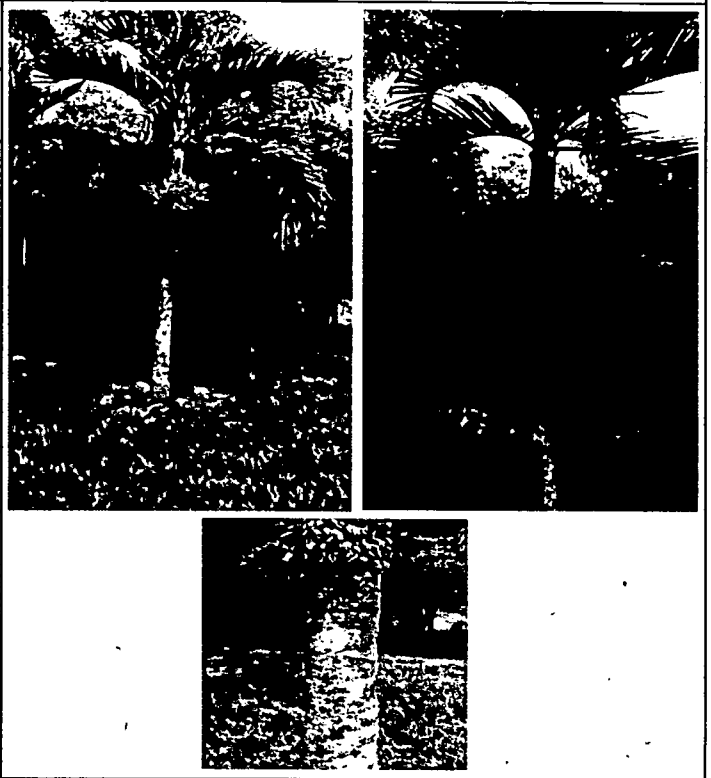

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

139

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**94**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma manila	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,570555556	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.40	0.16	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**95**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance .	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma manila**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,570555556	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.90	0.15	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

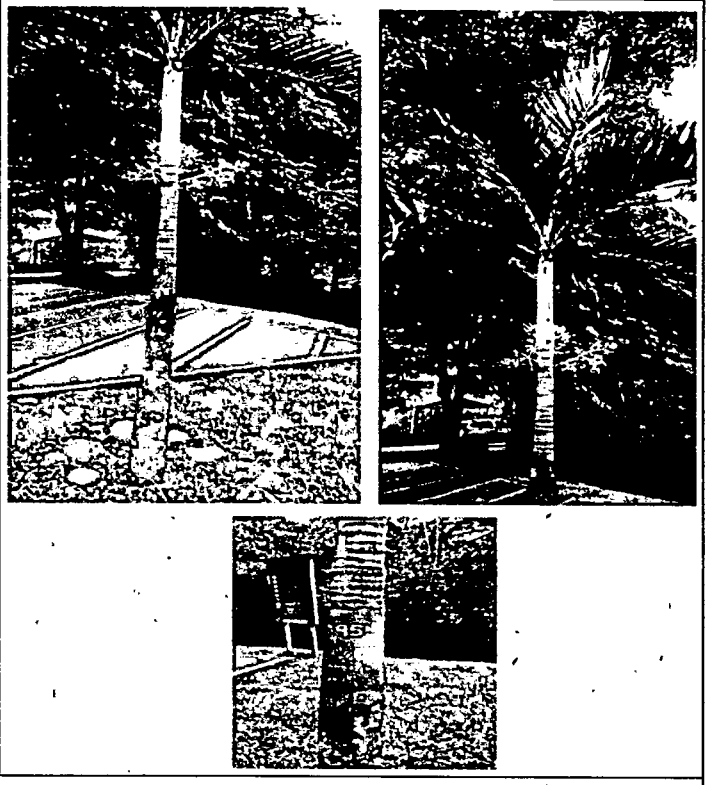

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**96**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,571666667	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
10.10	0.88	9.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**97**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	Guayacan amarillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Handroanthus chrysanthus*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,570555556	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.40	0.34	7.20

REGISTRO FOTOGRAFICO

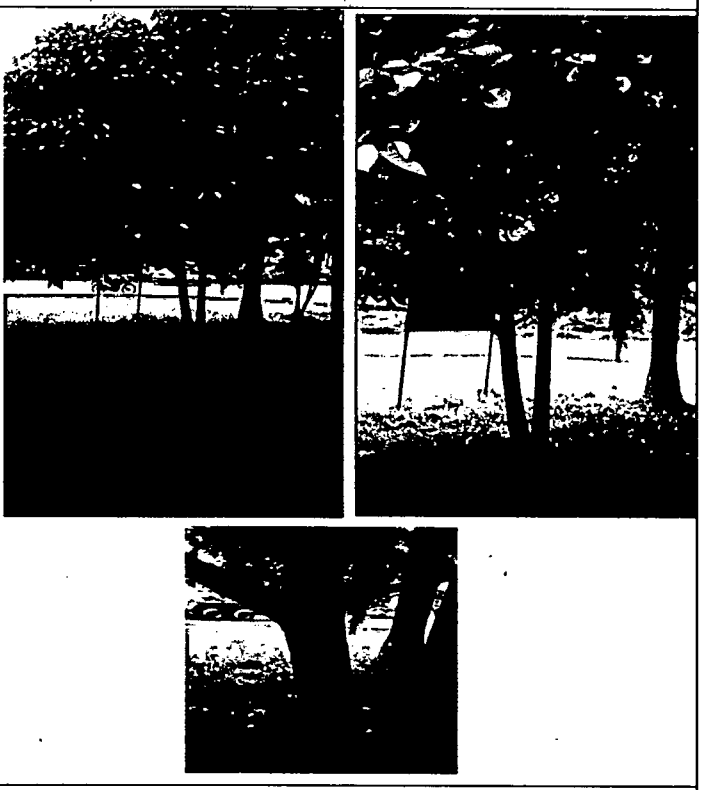

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**98**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma real**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Roystonea regia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,569444444	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.80	0.50	6.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		99
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Palma manila		
	ESPECIE	*Adonidia merrillii*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Arecaceae	3,568055556	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.10	0.18	3.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

142

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**100**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,568611111	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.80	0.62	7.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**101**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus insipida**		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,584166667	-76,64638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.60	0.05	1.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**102**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus insipida	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,586388889	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.04	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		103
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Nogal cafetero	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Boraginaceae	3,584166667	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.90	0.05	1.20

REGISTRO FOTOGRAFICO

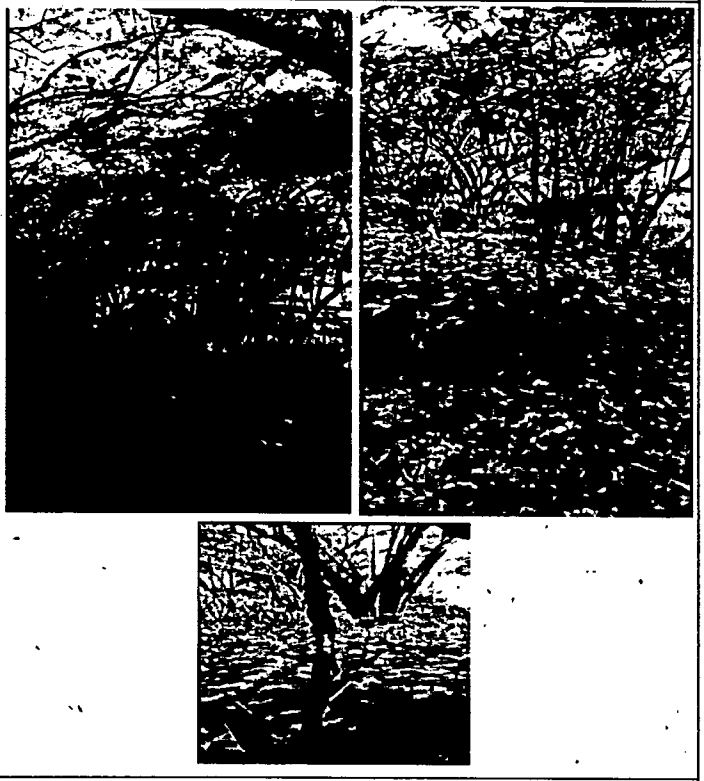

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

144

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**104**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,580833333	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.80	0.05	2.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



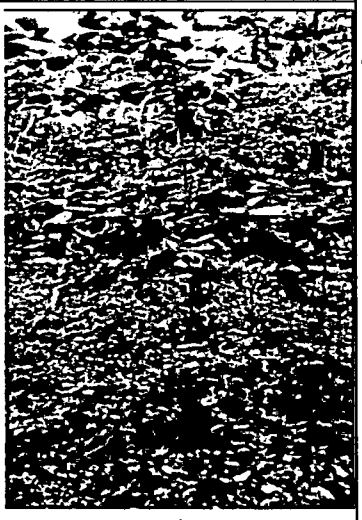



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**105**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,580833333	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.80	0.06	3.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

145

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**106**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,580833333	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.20	0.05	2.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**107**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,579166667	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.07	2.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

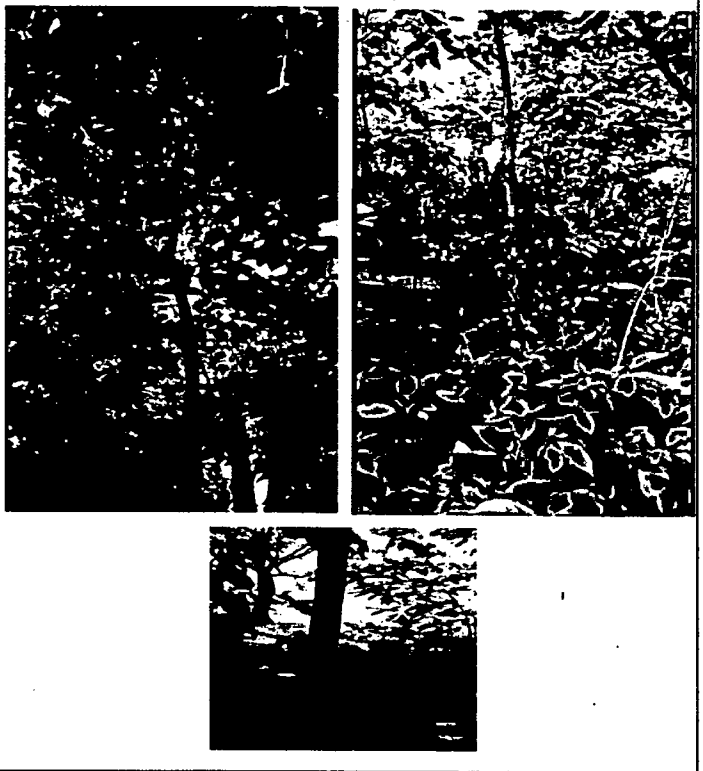

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

146

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**108**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,579166667	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.40	0.06	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: **INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**109**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Nogal cafetero**		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,578888889	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.50	0.04	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**110**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la via Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,578055556	-76,64222222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.50	0.05	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**111**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,576666667	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.20	0.07	3.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

148

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**112**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575277778	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.00	0.06	2.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

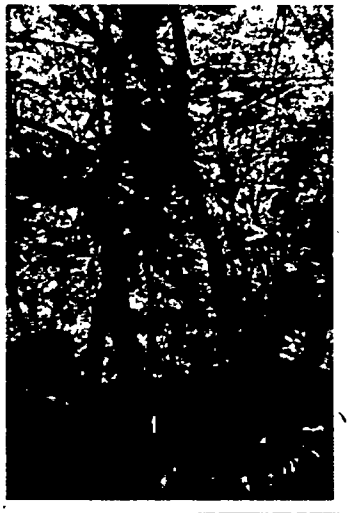





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**113**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575555556	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.00	0.05	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**114**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.90	0.06	2.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

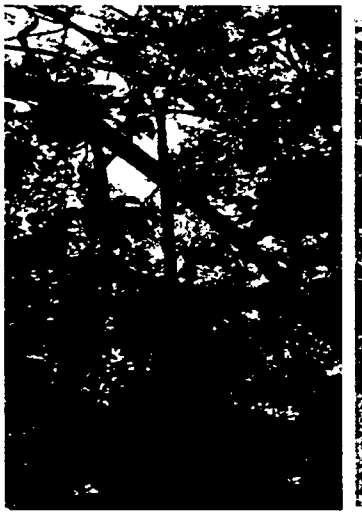





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**115**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Nogal cafetero**		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,575833333	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.10	0.08	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

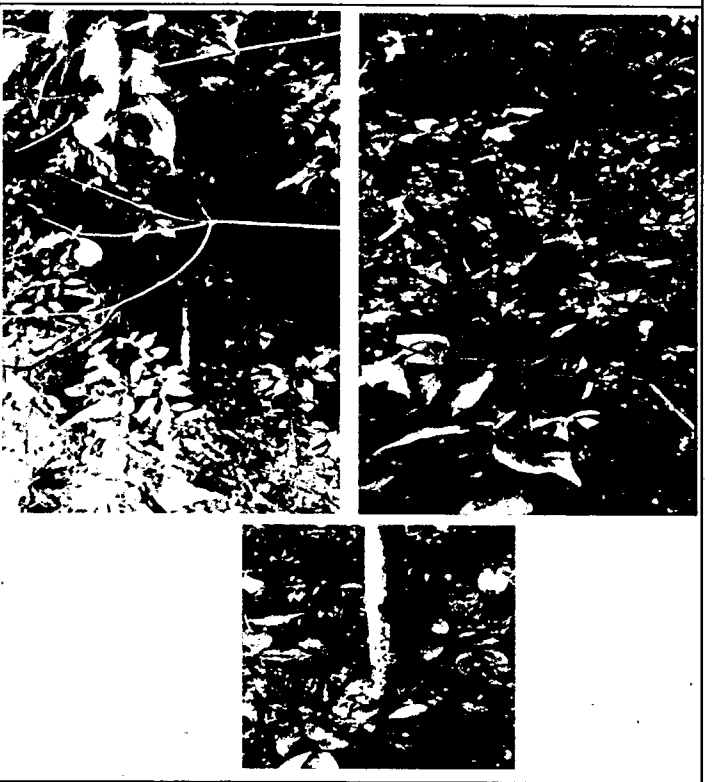

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**116**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guamo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Inga sp*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,583333333	-76,64111111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.30	0.06	3.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**117**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,583611111	-76,64055556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.80	0.05	3.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

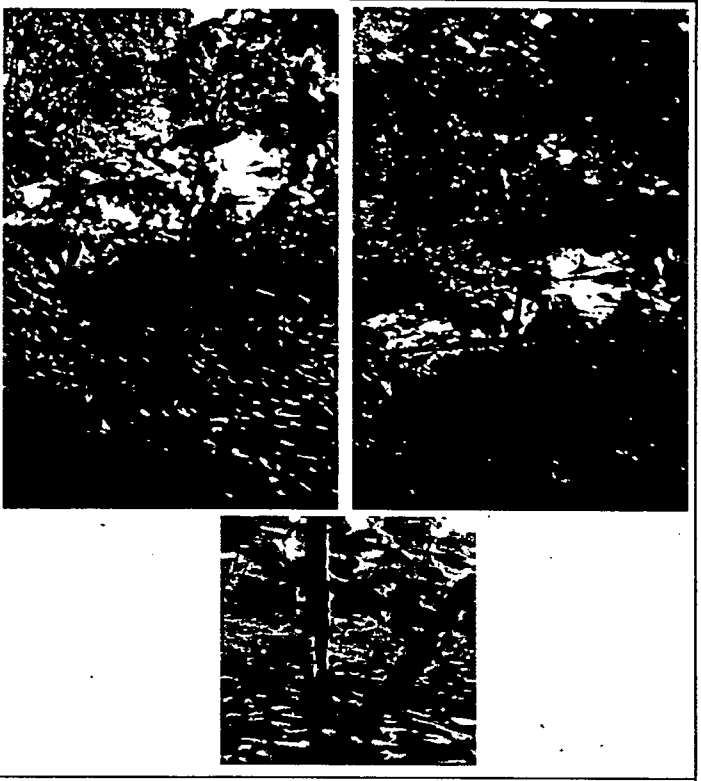

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

151

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**118**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERÉNCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,583611111	-76,64027778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.00	0.08	3.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**119**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Eabaceae	3,583611111	-76,64
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.90	0.18	3.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**120**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,590277778	-76,63916667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.40	0.17	4.30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			121
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,592777778	-76,63888889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.30	0.24	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

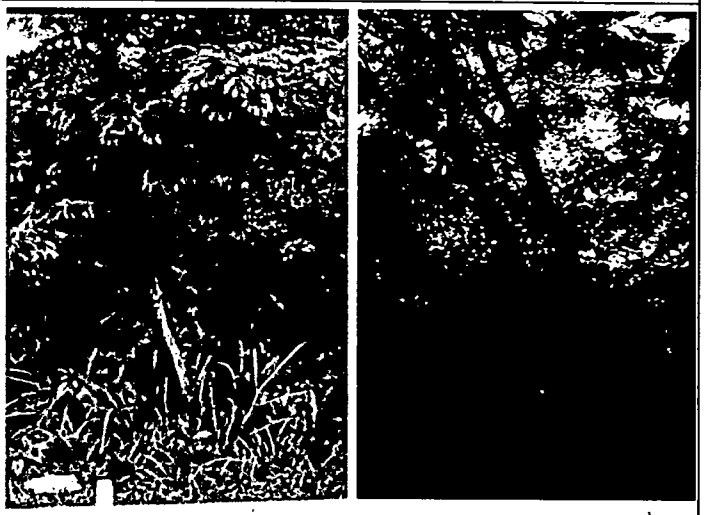

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**122**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la via Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,593888889	-76,63805556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.20	0.51	7.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



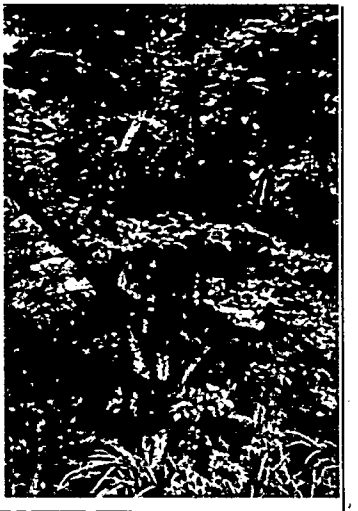



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		123
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,605277778	-76,63638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.50	1.30	9.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

154

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**124**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,609166667	-76,63555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9.90	1.30	10.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		125
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Guamo		
	ESPECIE	*Inga edulis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,36	-76,63333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.00	0.24	4.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
gas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**126**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma africana**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,367222222	-76,63333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10.90	0.52	8.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**127**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma africana**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,366388889	-76,63416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11.80	0.70	8.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

156

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**128**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,358888889	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.10	0.08	3.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**129**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la via Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Cedro**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,358055556	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5.40	0.05	1.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**130**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Matarraton**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Gliricidia sepium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,620277778	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.90	0.08	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACIÓN SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**131**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,620555556	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.20	0.08	1.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**132**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guayabo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,605833333	-76,64527778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.10	0.30	2.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**133**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guayabo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,605833333	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.09	4.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

159

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**134**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guayabo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,604444444	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.80	0.10	3.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		135
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Nogal cafetero	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Boraginaceae	3,599166667	-76,64111111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.00	0.07	3.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**136**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,592777778	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6.20	0.21	4.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		137
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO: Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Papayuelo		
	ESPECIE	*Cnidoscolus aconitifolius*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Euphorbiaceae	3,590833333	-76,64666667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.05	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

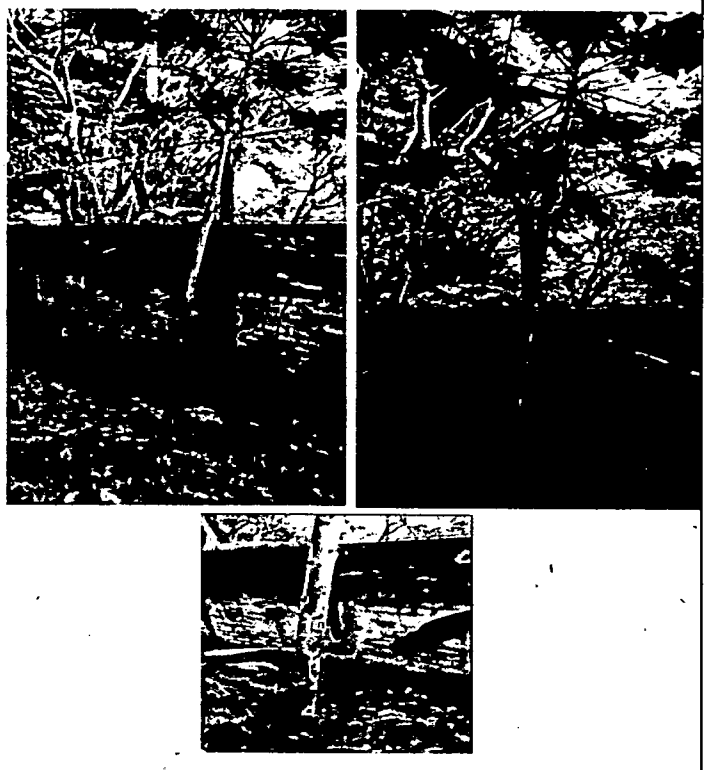

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NÚMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**138**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Papayuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cnidoscolus aconitifolius*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Euphorbiaceae	3,591111111	-76,64666667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.05	1.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: **INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	**CONSTRUFUTURO**

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**139**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Matarraton**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Gliricidia sepium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,591388889	-76,64583333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.00	0.03	2.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

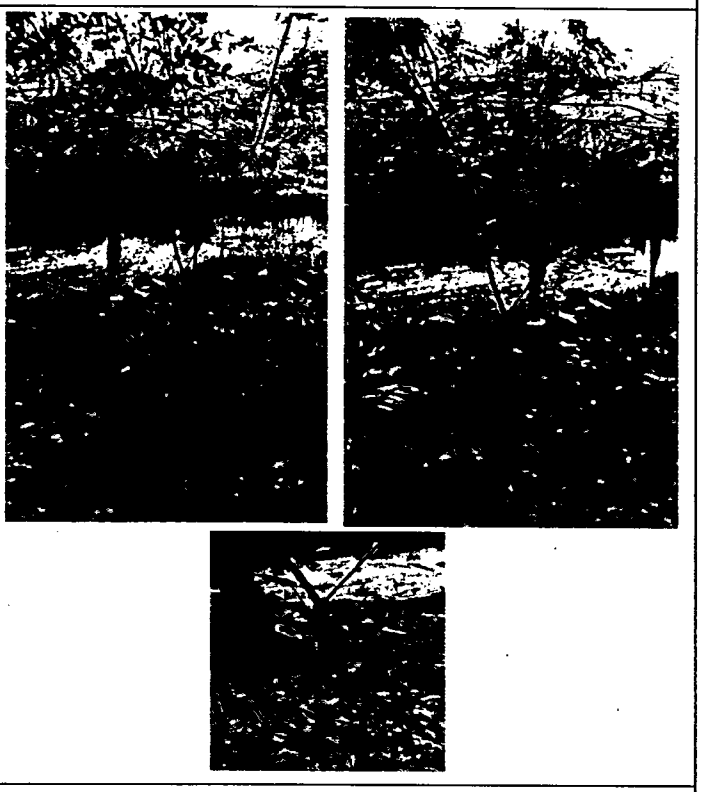

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**140**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,588611111	-76,67111111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.90	0.05	1.40


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



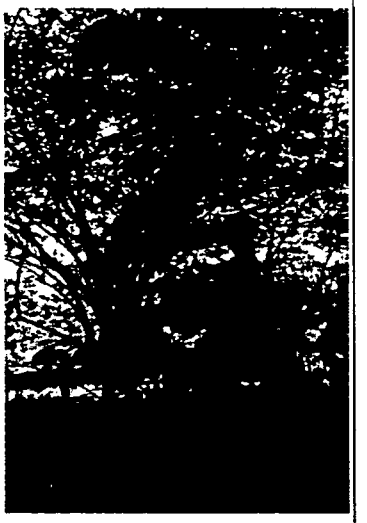



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**141**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus insipida**		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,581944444	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.50	0.06	3110

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

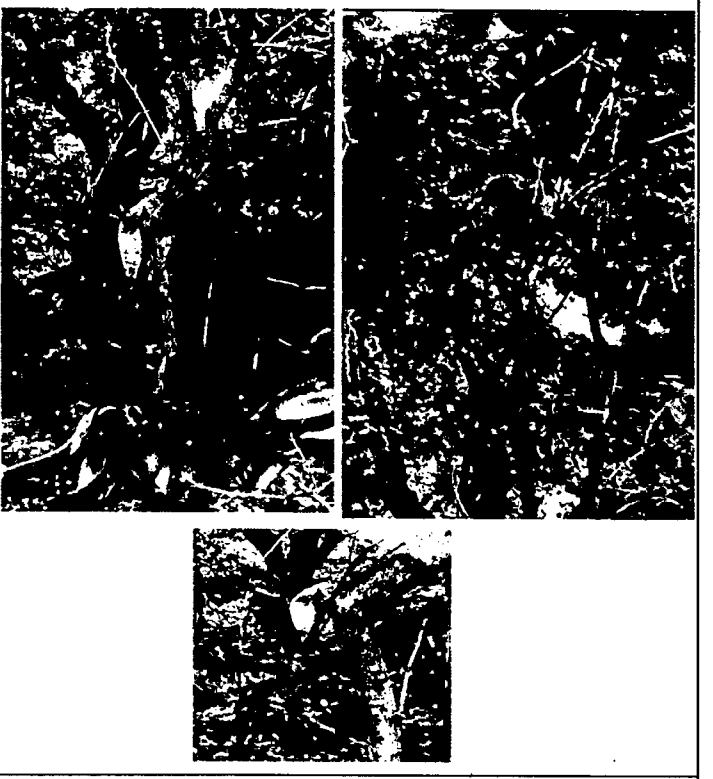

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

165

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**142**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus insipida	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,581388889	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7.20	0.06	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		143
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,581944444	-76,64638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.04	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

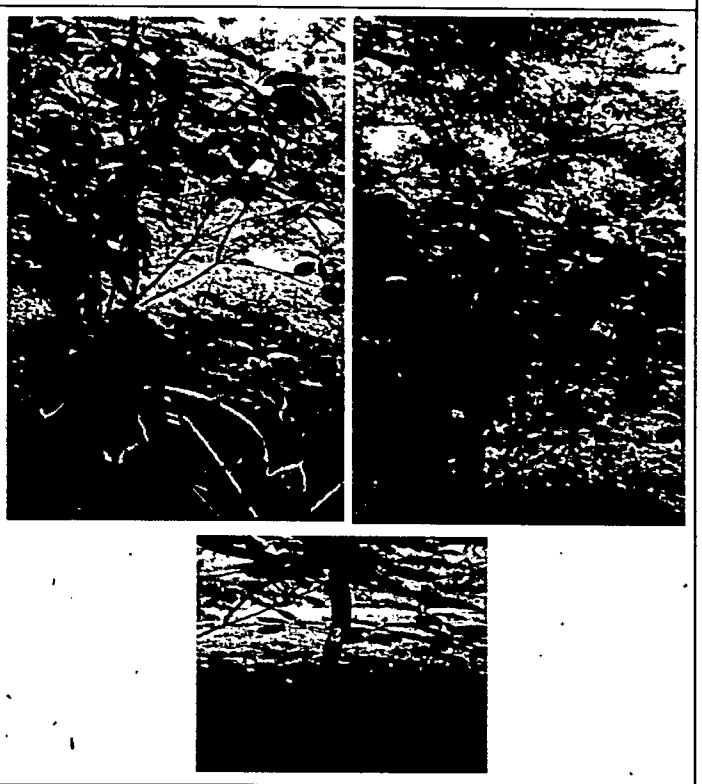

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

164

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**144**
DIRECCIÓN:-	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,580555556	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.70	0.04	1.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



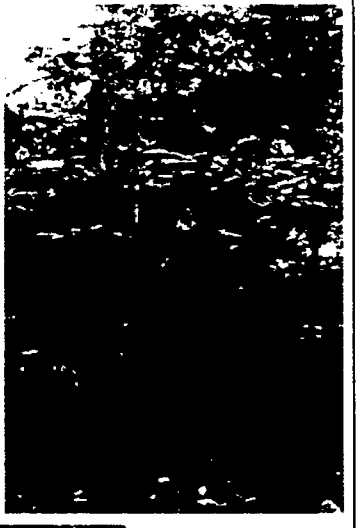



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**145**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,581388889	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.90	0.03	2.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

165

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**146**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Ficus insipida		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,579166667	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.04	2.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		147
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Acacia robinia		
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,5825	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.10	0.04	1.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

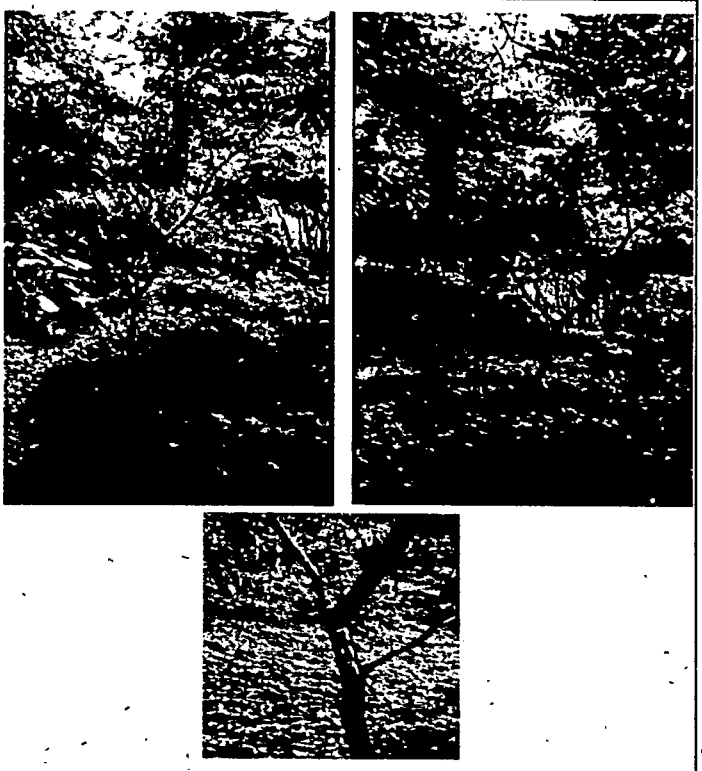

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

166

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**148**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Nogal cafetero**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Boraginaceae	3,581111111	-76,64638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.80	0.05	1.10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**149**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Cheflera**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Schefflera actinophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Araliaceae	3,578888889	-76,64611111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.40	0.05	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

167

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**150**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,576944444	-76,64666667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.80	0.04	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

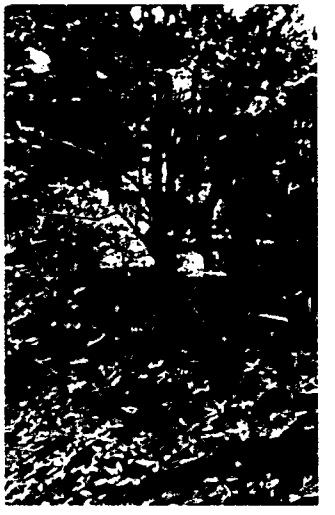

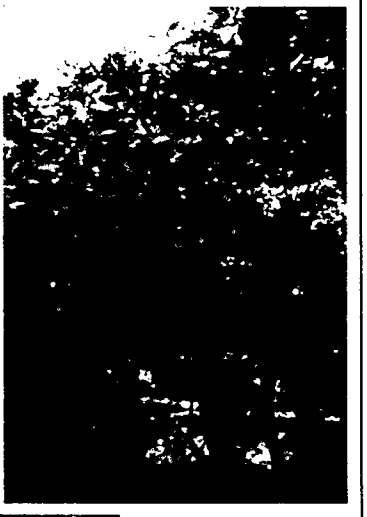



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			151
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundi kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,576666667	-76,64638889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.50	0.06	5.40

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

168

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**152**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,576666667	-76,64555556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.20	0.05	1.50


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

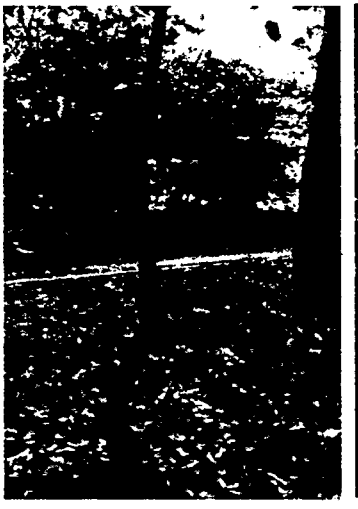

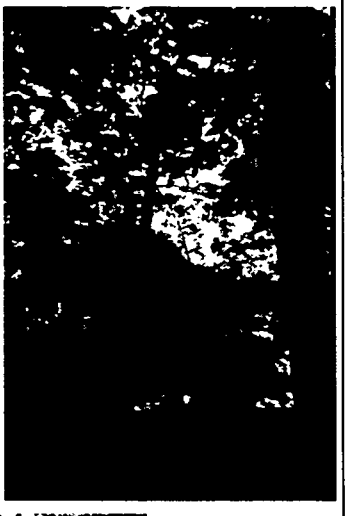



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		153
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		BARRIO: Parcelaciones Pance	COMUNA:	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL:	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,576388889	-76,645
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.80	0.04	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**154**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus insipida	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,576111111	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.04	1.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**155**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus insipida**		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,575555556	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.20	0.05	3.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**156**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la via Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,576111111	-76,64444444
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.60	0.04	2.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**157**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,576111111	-76,64472222
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.60	0.04	1.80

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**158**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Tachuelo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,576666667	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.10	0.04	1.70

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI.

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**159**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,577222222	-76,64361111
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.80	0.09	1.60

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
agas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



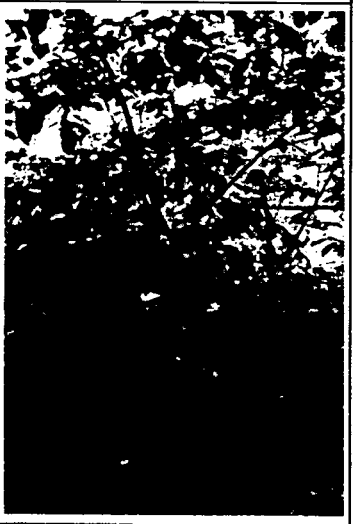



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

172

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**160**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus insipida**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,576388889	-76,64333333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.00	0.04	2.50

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**161**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Cheflera**		
	ESPECIE	*Schefflera actinophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Araliaceae	3,578055556	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
2.70	0.04	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
lagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

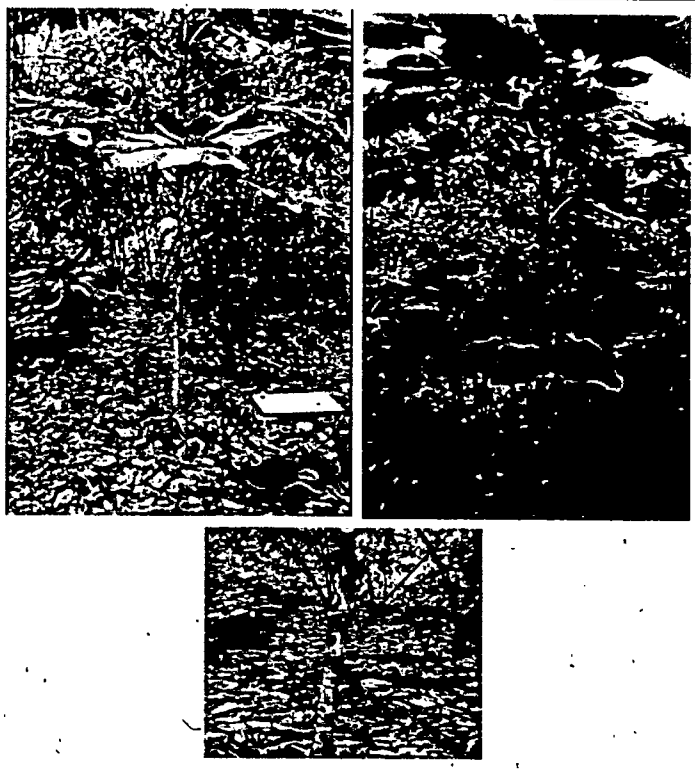

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**162**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,578333333	-76,64305556
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.90	0.04	1.00

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			163
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	BARRIO	Parcelaciones Pance	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Ficus insipida		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,578055556	-76,64277778
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8.10	0.05	2.90

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

174

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**164**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3		**BARRIO**	Parcelaciones Pance	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	PANAMERICANO	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Ficus insipida	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,578611111	-76,64388889
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
4.00	0.04	1.20

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	5/12/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**165**
DIRECCIÓN:	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	**BARRIO**	**Parcelaciones Pance**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	PANAMERICANO		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,578611111	-76,64416667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3.80	0.04	2.10


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

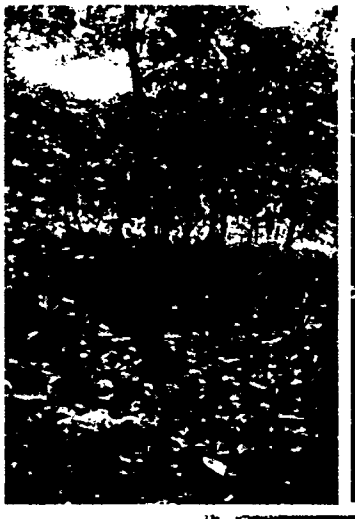





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

115

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO HUMEDAL PANAMERICANO

176

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	1	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	18.50	
DAP (m)	0.95	
Diametro copa (m)	15.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,365833333	-76,64166667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	2	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Pizamo	
Nombre científico	*Erythrina poeppigiana*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	13.40	
DAP (m)	1.26	
Diametro copa (m)	9.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364166667	-76,6425
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	3	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Elabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.60	
DAP (m)	0.97	
Diametro copa (m)	12.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,360833333	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

728

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	4	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.50	
DAP (m)	.097	
Diametro copa (m)	13.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	5	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mamoncillo	
Nombre científico	*Melicoccus bijugatus*	
Familia	Sapindaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.60	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	7.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,361388889	-76,64083333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	6	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma Alejandra	
Nombre científico	*Archontophoenix alexandrae*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.80	
DAP (m)	0.19	
Diametro copa (m)	4.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,361388889	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	7	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.30	
DAP (m)	0.87	
Diametro copa (m)	8.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,362222222	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	8	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma de vino	
Nombre científico	*Attalea butyracea*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.50	
DAP (m)	0.97	
Diametro copa (m)	7.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,364722222	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	9	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma de vino	
Nombre científico	*Attalea butyracea*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.70	
DAP (m)	0.96	
Diametro copa (m)	7.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363611111	-76,64444444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	10	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma de vino	
Nombre científico	*Attalea butyracea*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.10	
DAP (m)	0.98	
Diametro copa (m)	8.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363333333	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	11	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Chiminango	
Nombre científico	*Pithecellobium dulce*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.70	
DAP (m)	0.83	
Diametro copa (m)	6.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,363055556	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	12	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.30	
DAP (m)	0.35	
Diametro copa (m)	6.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,361944444	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	13	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.50	
DAP (m)	0.47	
Diametro copa (m)	7.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,361111111	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	








Descripción de la actividad realizada:	
Aplicación de fertilización edafica	
Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

183

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	14	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guanabano	
Nombre científico	*Annona muricata*	
Familia	Annonaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.20	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,361666667	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	15	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.20	
DAP (m)	0.32	
Diametro copa (m)	3990	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,359166667	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

284

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	16	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.40	
DAP (m)	0.47	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,358888889	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	17	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	13.50	
DAP (m)	0.62	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,357222222	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	18	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Igua	
Nombre científico	*Albizia guachapele*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.70	
DAP (m)	1.32	
Diametro copa (m)	12.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,356666667	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





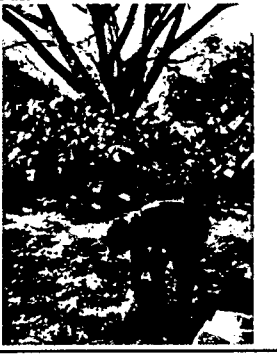

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	19	
ID censo arbóreo		
Nombre común	Igua	
Nombre científico	*Albizia guachapele*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.50	
DAP (m)	0.64	
Diametro copa (m)	9.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,355555556	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	20	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.80	
DAP (m)	0.35	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,353888889	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	21	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	13.20	
DAP (m)	0.70	
Diametro copa (m)	11.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,354722222	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:
Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	22	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	13.10	
DAP (m)	0.82	
Diametro copa (m)	11.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352777778	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	23	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.20	
DAP (m)	0.89	
Diametro copa (m)	14.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351666667	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	24	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mango	
Nombre científico	*Mangifera indica*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.70	
DAP (m)	0.67	
Diametro copa (m)	10.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	25	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.90	
DAP (m)	0.95	
Diametro copa (m)	10.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351111111	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	26	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma de azúcar	
Nombre científico	*Syagrus romanzoffiana*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.40	
Diametro copa (m)	4.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,61	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	27	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma de azúcar	
Nombre científico	*Syagrus romanzoffiana*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.40	
DAP (m)	0.49	
Diametro copa (m)	3.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,609444444	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

106

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	28	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	17.10	
DAP (m)	1.10	
Diametro copa (m)	12.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,606666667	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	29	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caracolí	
Nombre científico	*Anacardium excelsum*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	17.50	
DAP (m)	1.30	
Diametro copa (m)	11.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,606388889	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

191

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	30	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.20	
DAP (m)	1.50	
Diametro copa (m)	9.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,602777778	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	31	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.90	
DAP (m)	0.65	
Diametro copa (m)	12.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,6025	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	32	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.50	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,598888889	-76,66722222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



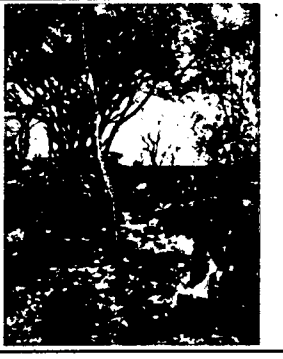

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	33	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	4.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,598611111	-76,6425
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

193

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	34	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	16.50	
DAP (m)	0.92	
Diametro copa (m)	12.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,598333333	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:



Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	35	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.70	
DAP (m)	0.44	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,598333333	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

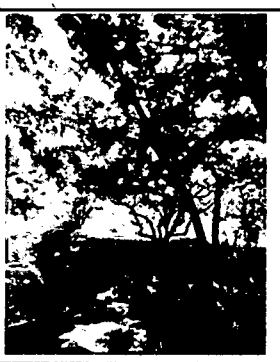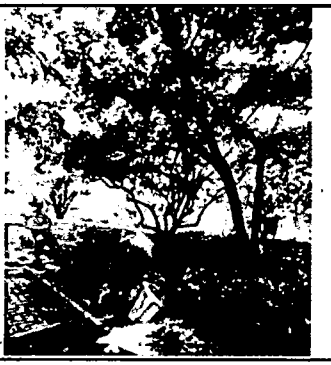Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	36	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.90	
DAP (m)	0.27	
Diametro copa (m)	7.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,598333333	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	37	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	13.20	
DAP (m)	0.98	
Diametro copa (m)	11.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,596388889	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

195

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	38	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.90	
DAP (m)	0.45	
Diametro copa (m)	9.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,596944444	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	39	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	1.30	
Diametro copa (m)	11.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,592777778	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	40	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.90	
DAP (m)	1.20	
Diametro copa (m)	10.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,5925	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	41	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.50	
DAP (m)	0.26	
Diametro copa (m)	5.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,592222222	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	42	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.80	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,590277778	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	43	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.60	
DAP (m)	0.25	
Diametro copa (m)	5.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,589722222	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	44	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.40	
DAP (m)	1.20	
Diametro copa (m)	10.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,588055556	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	45	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.23	
Diametro copa (m)	6.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,589444444	-76,64638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	46	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.80	
DAP (m)	0.95	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,586388889	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	47	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	1.20	
Diametro copa (m)	12.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,586388889	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


202

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	48	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.20	
DAP (m)	0.48	
Diametro copa (m)	13.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,585833333	-76,64055556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



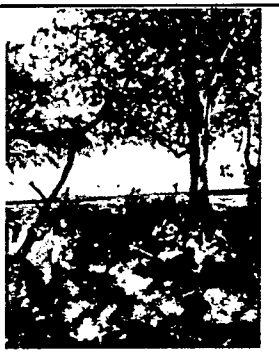



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	49	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.22	
Diametro copa (m)	4.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,586944444	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	50	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.50	
DAP (m)	0.45	
Diametro copa (m)	7.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,586944444	-76,64027778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	51	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.20	
DAP (m)	0.40	
Diametro copa (m)	8.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,588333333	-76,64111111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

202

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	52	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.90	
DAP (m)	0.59	
Diametro copa (m)	7.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,588888889	-76,63972222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	53	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.30	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

323

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	54	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.90	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	3.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	55	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.40	
DAP (m)	0.47	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64444444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

204

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	56	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.40	
DAP (m)	0.62	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,582222222	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	57	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.80	
DAP (m)	0.69	
Diametro copa (m)	8.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581388889	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

205

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

PICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	58	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.70	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	4.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581666667	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	59	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.40	
DAP (m)	0.09	
Diametro copa (m)	4.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580833333	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC-CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	60	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	3.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580555556	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	61	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.20	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	4.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580277778	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

202

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	62	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	4.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,460555556	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	63	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.90	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	4.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583055556	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:
Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

198

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	64	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.10	
DAP (m)	0.78	
Diametro copa (m)	10.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581388889	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	65	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.30	
DAP (m)	0.78	
Diametro copa (m)	8.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,582777778	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	66	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.00	
DAP (m)	0.72	
Diametro copa (m)	12.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579722222	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	67	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.20	
DAP (m)	1.15	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579444444	-76,64194444
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

02

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	68	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Samán	
Nombre científico	*Samanea saman*	
Familia	Babaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.50	
DAP (m)	1.20	
Diametro copa (m)	16.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,5775	-76,64111111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	69	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.30	
DAP (m)	0.89	
Diametro copa (m)	6.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,58	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

212

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	70	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	12.50	
DAP (m)	1.28	
Diametro copa (m)	8.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,577777778	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	71	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	0.20	
Diametro copa (m)	6.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578611111	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	72	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	73	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.40	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa.(m)	2.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578611111	-76,64083333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

213

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	74	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Zapote	
Nombre científico	*Pouteria sapota*	
Familia	Sapotaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.30	
DAP (m)	0.46	
Diametro copa (m)	7.20	
Coordenadas (Latitud; Longitud)	3,573888889	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	75	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Zapote	
Nombre científico	*Pouteria sapota*	
Familia	Sapotaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.60	
DAP (m)	0.48	
Diametro copa (m)	7.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,573333333	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

294

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	76	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.80	
DAP (m)	0.48	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,574166667	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	77	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	0.83	
Diametro copa (m)	7.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





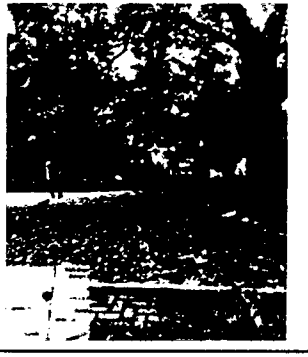

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	78	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.20	
DAP (m)	0.72	
Diametro copa (m)	6909	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576388889	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

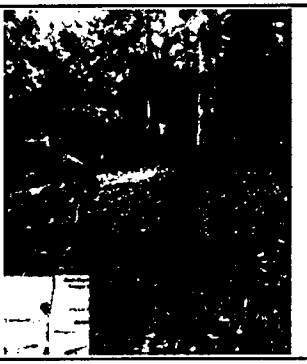
Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	79	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	14.70	
DAP (m)	0.48	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575277778	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


916

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	80	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caracolí	
Nombre clentifico	*Anacardium excelsum*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.30	
DAP (m)	0.75	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576944444	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



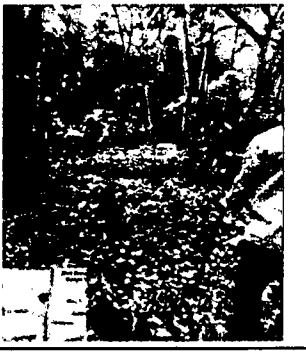

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	81	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caracolí	
Nombre científico	*Anacardium excelsum*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.10	
DAP (m)	0.50	
Diametro copa (m)	7.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578333333	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	82	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caracolí	
Nombre científico	*Anacardium excelsum*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.60	
DAP (m)	0.98	
Diametro copa (m)	7.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579444444	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	83	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	15.40	
DAP (m)	0.65	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580555556	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	84	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,574444444	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	


Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	85	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.40	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	4.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579444444	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	86	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.20	
DAP (m)	0.12	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578333333	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	87	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.70	
DAP (m)	0.70	
Diametro copa (m)	3.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578333333	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

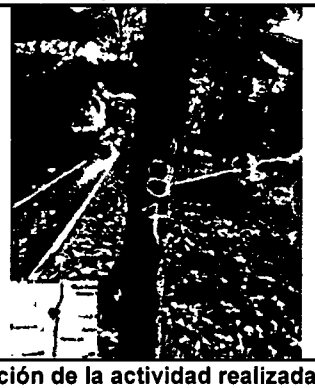





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

20

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	88	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	5.20	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,5775	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	89	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	5.40	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576944444	-76,64666667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

224

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	90	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.10	
DAP (m)	0.11	
Diametro copa (m)	4.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575833333	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	91	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.80	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	3.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

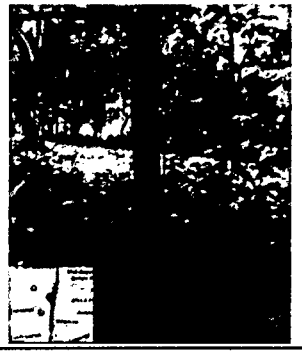





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

222

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	92	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	1.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,572777778	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO,	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	93	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.14	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,571111111	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

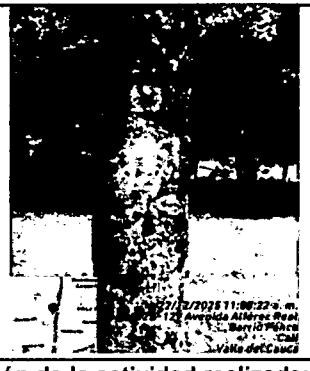





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	94	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.40	
DAP (m)	0.16	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,570555556	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	95	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.90	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,570555556	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	96	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mango	
Nombre científico	*Mangifera indica*	
Familia	Anacardiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.10	
DAP (m)	0.88	
Diametro copa (m)	9.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,571666667	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	



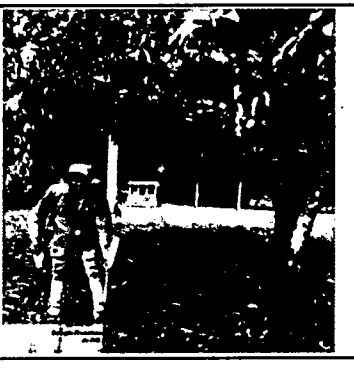



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	97	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guayacan amarillo	
Nombre científico	*Handroanthus chrysanthus*	
Familia	Bignoniaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.40	
DAP (m)	0.34	
Diametro copa (m)	7.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,570555556	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

125

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	98	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma real	
Nombre científico	*Roystonea regia*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.80	
DAP (m)	0.50	
Diametro copa (m)	6.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,569444444	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	99	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma manila	
Nombre científico	*Adonidia merrillii*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.10	
DAP (m)	0.18	
Diametro copa (m)	3.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,568055556	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

92

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	100	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.80	
DAP (m)	0.62	
Diametro copa (m)	7.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,568611111	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	101	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.60	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,584166667	-76,64638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

227

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	102	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,586388889	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	103	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.90	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,584166667	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

118

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	104	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.80	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580833333	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	105	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.80	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	3.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580833333	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

129

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	106	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.20	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580833333	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	107	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	2.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579166667	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

230

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	108	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.40	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579166667	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	109	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	5.50	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578888889	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	110	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.50	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578055556	-76,64222222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES		
Número de árbol	111	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.20	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	3.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576666667	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

232

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	112	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.00	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	2.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575277778	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	113	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.00	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575555556	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

233

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	114	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.90	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	2.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	115	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.10	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	4.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575833333	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

232

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	116	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guamo	
Nombre científico	*Inga sp*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.30	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	3.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583333333	-76,64111111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	117	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.80	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	3.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64055556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

235

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	118	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.00	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	3.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64027778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	119	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.90	
DAP (m)	0.18	
Diametro copa (m)	3.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,583611111	-76,64
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

239


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	120	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.40	
DAP (m)	0.17	
Diametro copa (m)	4.30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,590277778	-76,63916667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





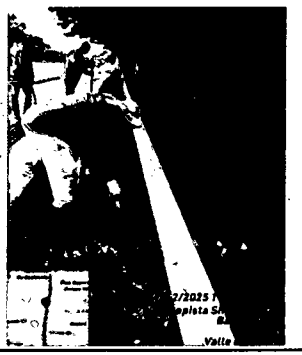

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	121	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.30	
DAP (m)	0.24	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,592777778	-76,63888889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

232

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	122	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.20	
DAP (m)	0.51	
Diametro copa (m)	7.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,593888889	-76,63805556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	123	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.50	
DAP (m)	1.30	
Diametro copa (m)	9.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,605277778	-76,63638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	124	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	9.90	
DAP (m)	1.30	
Diametro copa (m)	10.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,609166667	-76,63555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	125	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guamo	
Nombre científico	*Inga edulis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.00	
DAP (m)	0.24	
Diametro copa (m)	4.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,36	-76,63333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

239

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca · DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	126	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma africana	
Nombre científico	*Elaeis guineensis*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	10.90	
DAP (m)	0.52	
Diametro copa (m)	8.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,367222222	-76,63333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	127	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Palma africana	
Nombre científico	*Elaeis guineensis*	
Familia	Arecaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	11.80	
DAP (m)	0.70	
Diametro copa (m)	8.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,366388889	-76,63416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

042

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	128	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.10	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	3.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,358888889	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	129	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Cedro	
Nombre científico	*Cedrela odorata*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	5.40	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,358055556	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

172

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	130	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Matarraton	
Nombre científico	*Gliricidia sepium*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.90	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,620277778	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	131	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.20	
DAP (m)	0.08	
Diametro copa (m)	1.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,620555556	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

242

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	132	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guayabo	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	Myrtaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.10	
DAP (m)	0.30	
Diametro copa (m)	2.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,605833333	-76,64527778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía-Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	133	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guayabo	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	Myrtaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.09	
Diametro copa (m)	4.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,605833333	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	134	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guayabo	
Nombre científico	*Psidium guajava*	
Familia	Myrtaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.80	
DAP (m)	0.10	
Diametro copa (m)	3.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,604444444	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:



Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	135	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.00	
DAP (m)	0.07	
Diametro copa (m)	3.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,599166667	-76,64111111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

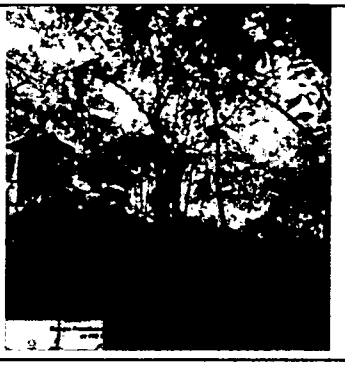VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

2/4

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	136	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	6.20	
DAP (m)	0.21	
Diametro copa (m)	4.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,592777778	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	

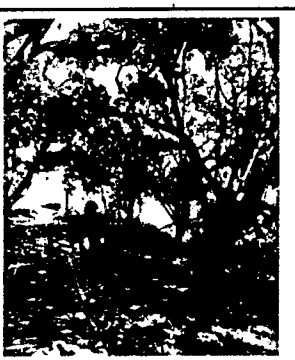
Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA-FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	137	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Papayuelo	
Nombre científico	*Cnidoscolus aconitifolius*	
Familia	Euphorbiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,590833333	-76,64666667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

245

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	138	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Papayuelo	
Nombre científico	*Cnidoscolus aconitifolius*	
Familia	Euphorbiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,591111111	-76,64666667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	139	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Matarraton	
Nombre científico	*Gliricidia sepium*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.00	
DAP (m)	0.03	
Diametro copa (m)	2.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,591388889	-76,64583333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	140	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.90	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,588611111	-76,67111111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	141	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.50	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	3110	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581944444	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

242

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	142	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	7.20	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581388889	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	143	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Acacia robinia	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581944444	-76,64638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

242

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	144	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.70	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,580555556	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	145	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.90	
DAP (m)	0.03	
Diametro copa (m)	2.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581388889	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	146	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,579166667	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	147	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Acacia robinia	
Nombre científico	*Cenostigma pluviosum*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.10	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,5825	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

250

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	148	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.80	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,581111111	-76,64638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	149	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Cheflera	
Nombre científico	*Schefflera actinophylla*	
Familia	Araliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.40	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578888889	-76,64611111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





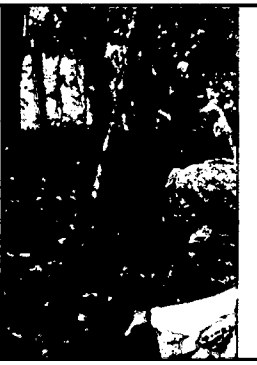

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	150	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.80	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576944444	-76,64666667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	151	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.50	
DAP (m)	0.06	
Diametro copa (m)	5.40	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576666667	-76,64638889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	152	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.20	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	1.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576666667	-76,64555556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	153	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.80	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576388889	-76,645
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	

VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

332

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	154	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576111111	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	155	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575555556	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

152

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	155	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.20	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	3.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,575555556	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

PICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	157	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.60	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.80	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576111111	-76,64472222
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	158	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.10	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.70	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576666667	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	159	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.80	
DAP (m)	0.09	
Diametro copa (m)	1.60	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,577222222	-76,64361111
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	160	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.00	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.50	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,576388889	-76,64333333
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	161	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Cheflera	
Nombre científico	*Schefflera actinophylla*	
Familia	Araliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	2.70	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578055556	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	162	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.90	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.00	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578333333	-76,64305556
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	163	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	8.10	
DAP (m)	0.05	
Diametro copa (m)	2.90	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578055556	-76,64277778
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

852

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	164	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus insipida	
Nombre científico	*Ficus insipida*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	4.00	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	1.20	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578611111	-76,64388889
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	165	
ID censo arbóreo	16	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	Parcelaciones Pance	
Comuna	22	
Altura (m)	3.80	
DAP (m)	0.04	
Diametro copa (m)	2.10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,578611111	-76,64416667
Humedal	PANAMERICANO	
Dirección	Margen derecha de la vía Cali – Jamundí kilómetro 3	
Fecha de fertilización	22/12/2025	
VISTA GENERAL	**MANTENIMIENTO**	





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edafica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

252

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

FICHAS TECNICAS DE DIAGNOSTICO HUMEDAL CAÑASGORDAS

260

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			1
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-115	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,352866667	-76,53475
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,38	14

REGISTRO FOTOGRAFICO

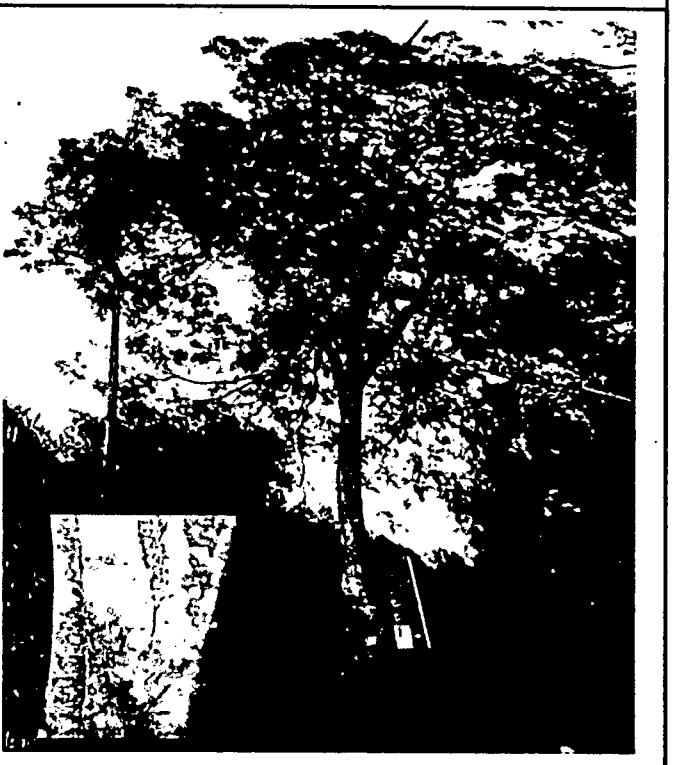

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

261

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**2**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-116	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,350966667	-76,53506667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,3	0,6	19

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



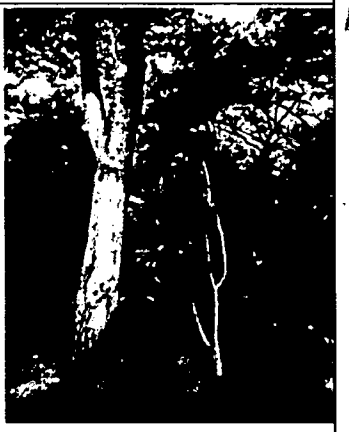



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			3
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-117	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Saman		
	ESPECIE	*Albizia saman*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,3509	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,3	11,64

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**4**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-118	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,3509	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
17,1	0,33	16,92

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

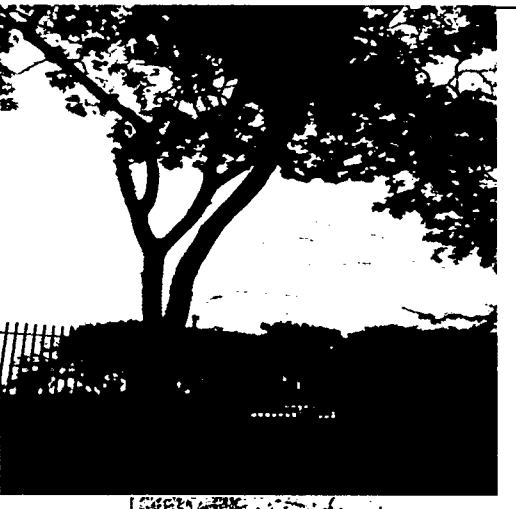



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**5**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-119	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,350966667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,9	0,96	8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**6**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-120	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351016667	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	0,26	14,42

REGISTRO FOTOGRAFICO







ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**7**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-121	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,350983333	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,12	8,42

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

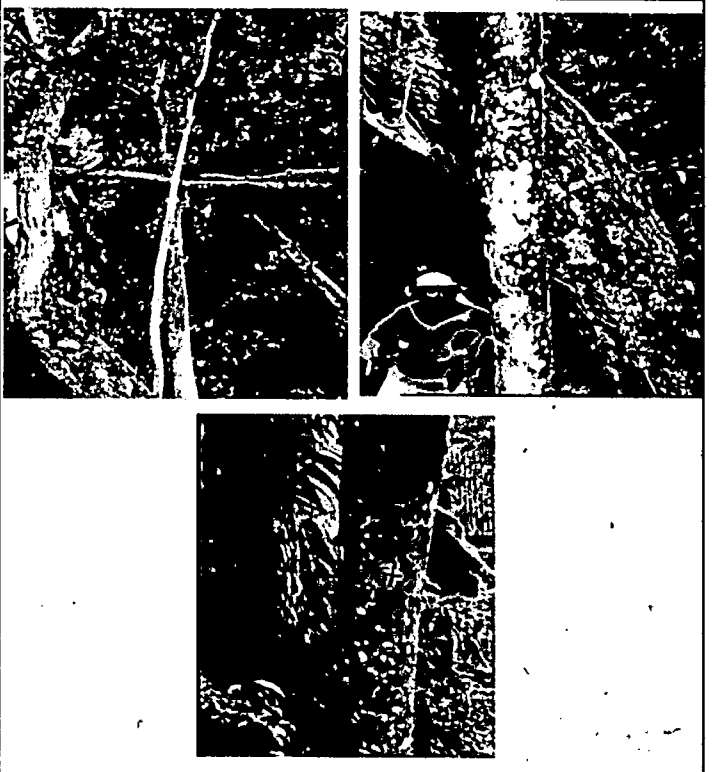

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**8**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-122	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Chiminango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Pithecellobium dulce*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351016667	-76,5348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,3	0,66	16,76

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			9
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-123	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Ficus benjamina		
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,351066667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,1	1,11	27,93

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**10**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-124	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35124	-76,53474
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,9	1,62	30

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





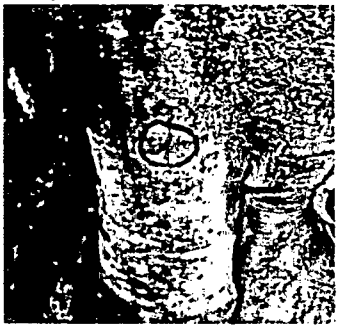

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			11
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-125	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Ficus benjamina		
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,35	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,3	1,19	15,46

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

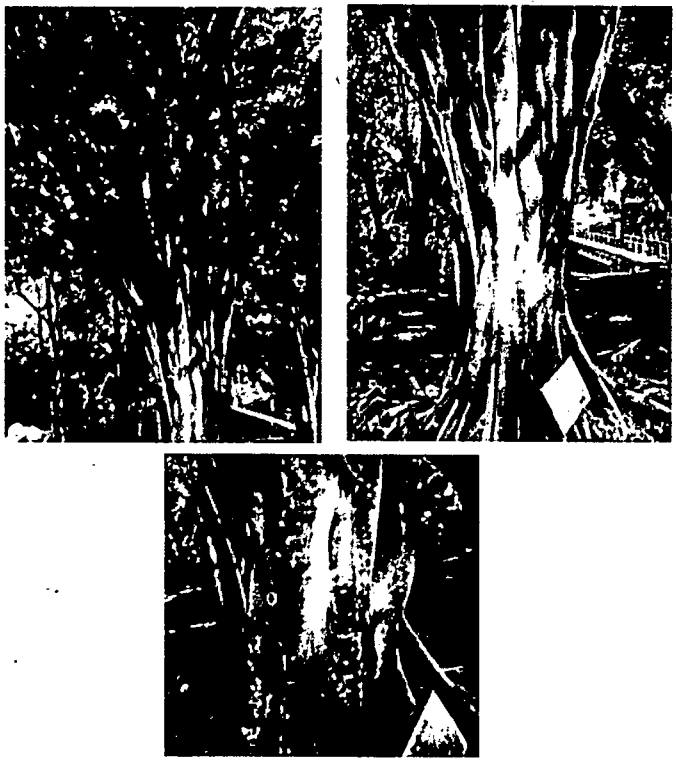

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

266

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**12**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-126	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,351216667	-76,53493333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	0,58	18,49

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			13
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-127	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Meliaceae	3,351333333	-76,5349
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,8	0,23	7,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

267

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**14**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-128	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,3513	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,7	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			15
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-129	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Jigua		
	ESPECIE	*Aiouea montana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Lauraceae	3,351316667	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,9	6,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**16**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-130	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,95	10,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





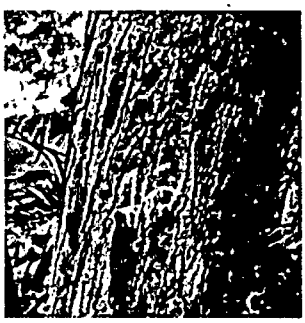

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			17
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-131	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Jigua		
	ESPECIE	*Aiouea montana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Lauraceae	3,351416667	-76,53501667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,9	0,15	3,52

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**18**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-132		**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Pizamo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351333333	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
19,6	0,6	16,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**19**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-133	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tachuelo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351416667	-76,53503333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,7	3,54

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

270

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**20**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-134	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mestizo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cupania glabra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,351433333	-76,53525
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,28	7,62

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





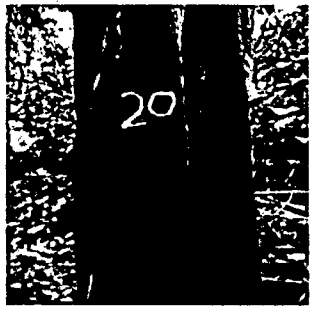

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**21**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-135	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caoba**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351383333	-76,53506667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,26	11,21

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





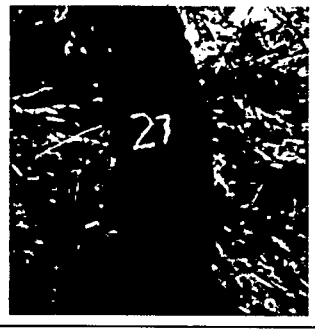

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

271

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**22**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-136	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jigua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,351333333	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
6,8	0,15	3,64

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

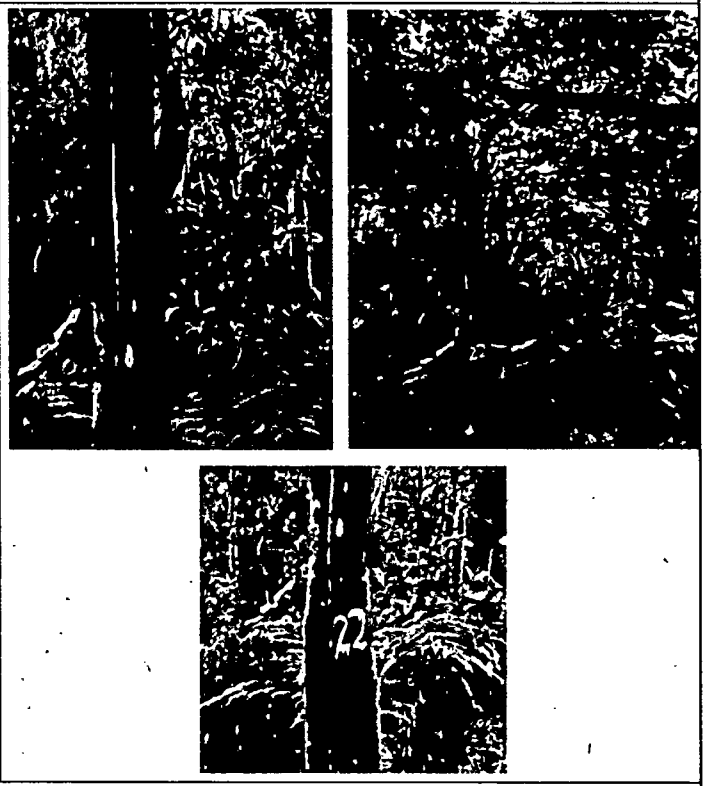

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**23**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-137		BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Meliaceae	3,351366667	-76,5351
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,9	0,08	3,21

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

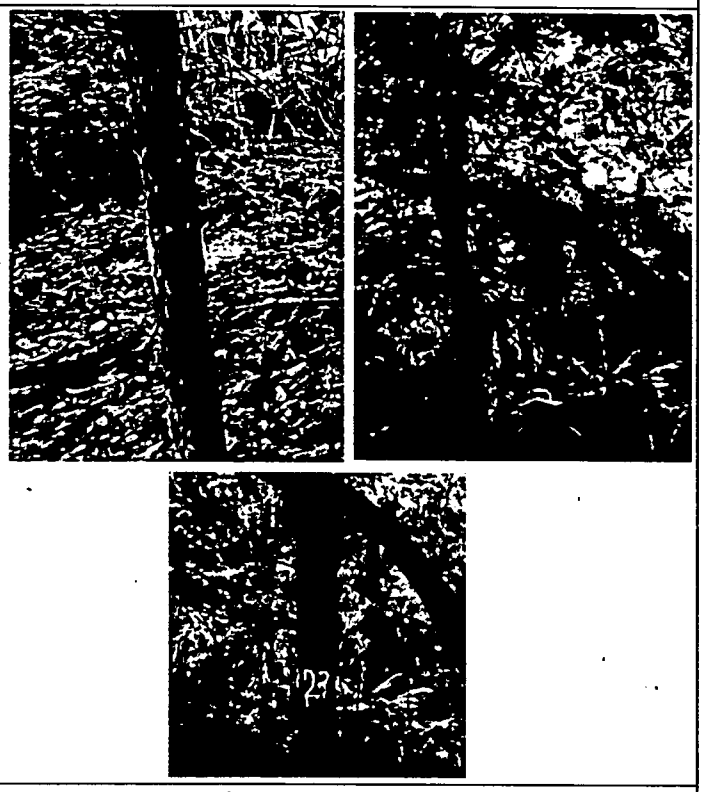

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

272

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**24**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-138	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Trompillo**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Meliaceae	3,3513	-76,5351	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,2	0,28	7,59

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**25**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-139	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guásimo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351333333	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,46	16,16

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**26**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-140		**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351316667	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,14	6,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**27**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-141	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Jigua**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Aiouea montana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,3514	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,05	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

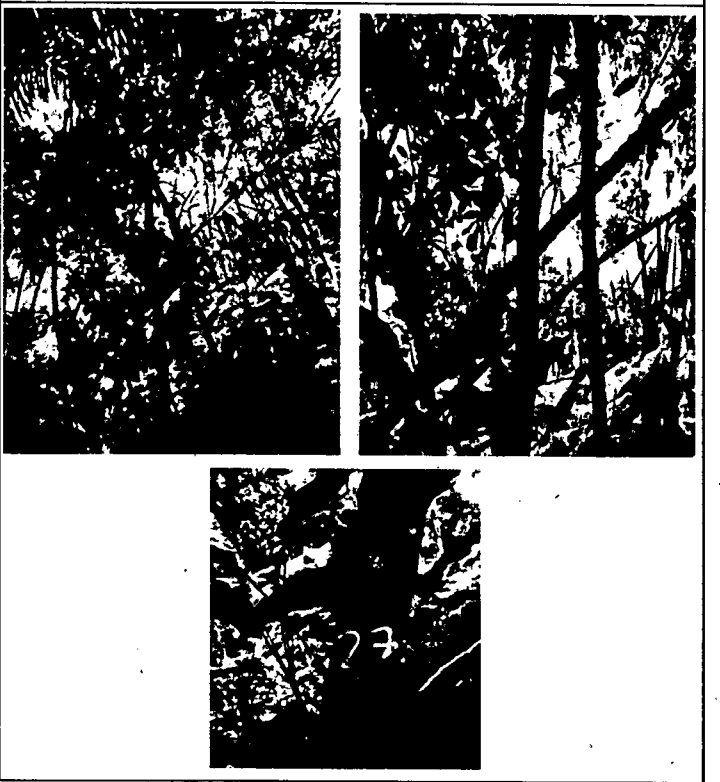

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**28**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-142	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**TACHUELO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,351216667	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9	0,05	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**29**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-143	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351183333	-76,53523333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,5	0,39	28

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

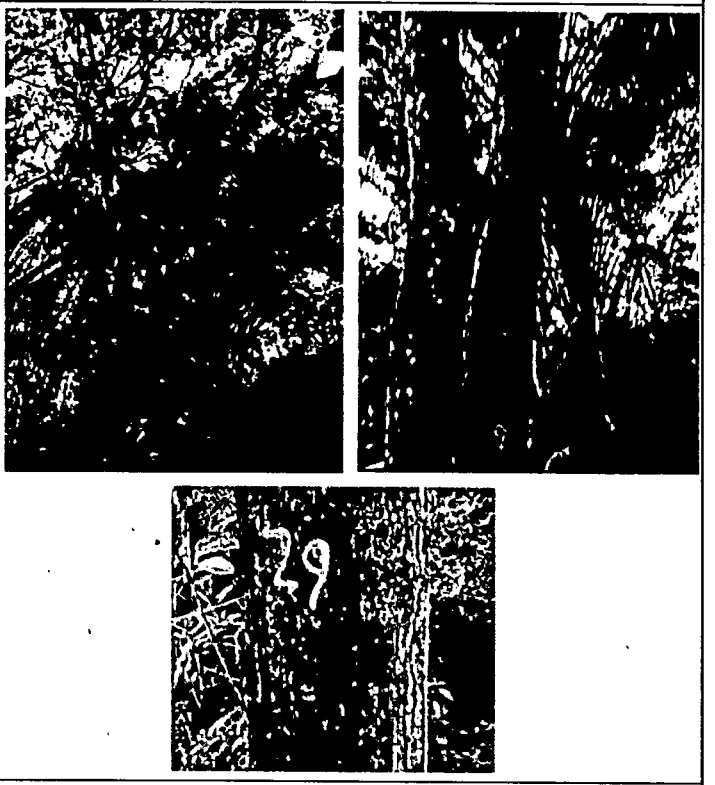

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**30**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-144	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35115	-76,53515
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,5	0,67	32,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

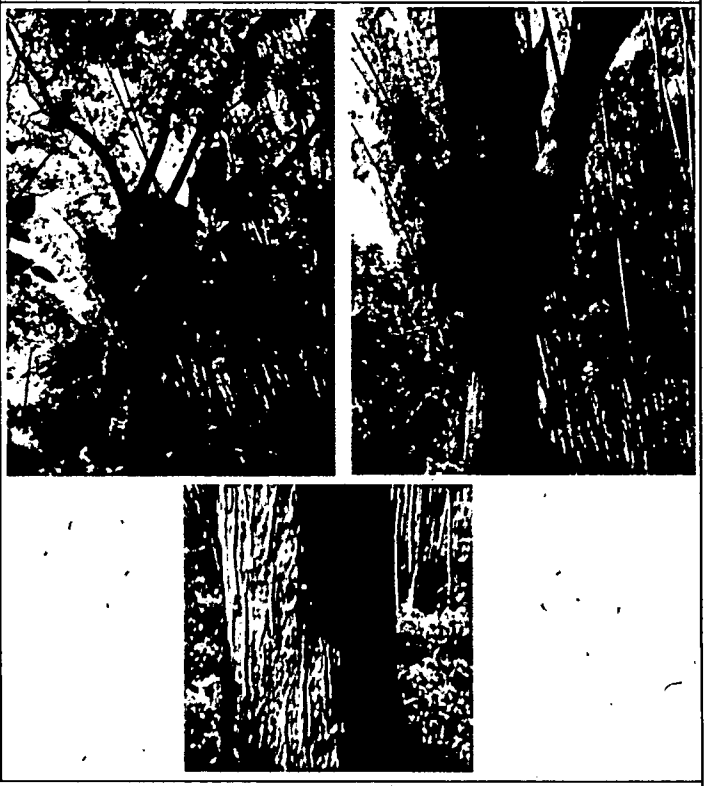

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			31
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-145	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Saman		
	ESPECIE	*Albizia saman*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,351116667	-76,53525
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,1	0,33	10

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

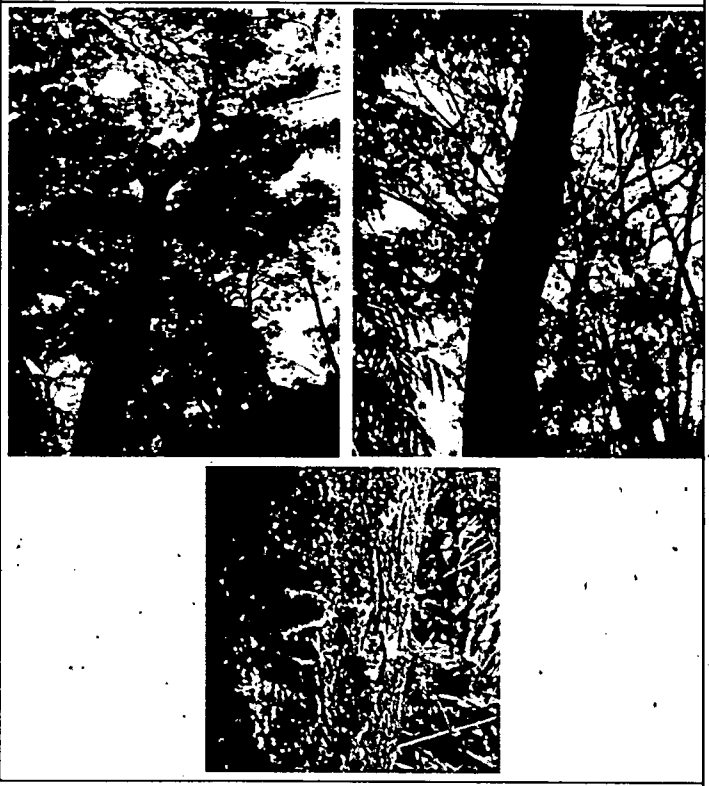

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

276

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**32**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-146	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Trompillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35115	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,66	32,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**33**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-147	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caoba**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,351166667	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,09	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

277

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**34**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-148	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35145	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,3	0,06	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**35**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-149	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351433333	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,25	11,66

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

278

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**36**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-150	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Pizamo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana* ,	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352816667	-76,53396667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3	0,9	9,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**37**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-151	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Tulipan africano**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Spathodea campanulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,352783333	-76,53393333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,7	0,8	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**38**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-152	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**Saman**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Albizia saman*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Fabaceae	3,351566667	-76,53481667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16	1	37,6

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

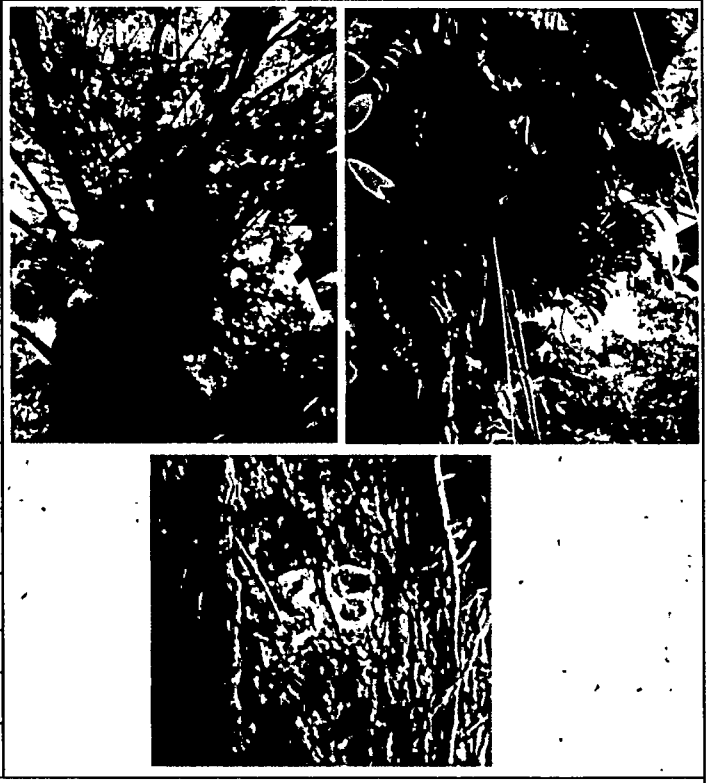

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		39
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-153		BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Jigua		
	ESPECIE	*Aiouea montana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Lauraceae	3,35155	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,9	0,06	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

280

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**40**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-154	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Árbol del pan**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Artocarpus altilis*	**LATITUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Moraceae	3,351616667	-76,53481667	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6	0,15	4,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**41**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-155	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,3516	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,13	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

281

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**42**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-156	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,351683333	-76,53466667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,3	0,15	6

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		43
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-157	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mandarino		
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,351816667	-76,53466667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,40	0,35	8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

282

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**44**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-158	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3518	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,6	0,13	5,32

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			45
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-159	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,351866667	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA		
Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,15	6,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**46**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-160	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351989	-76,534613
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,7	0,07	3,11

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			47
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-161	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,351933333	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
5,3	0,03	2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

284

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**48**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-162	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352016667	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,15	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: **INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**49**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-163	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351916667	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,3	0,11	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**50**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-164	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Ficus benjamina**		
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352	-76,5346
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,14	4,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

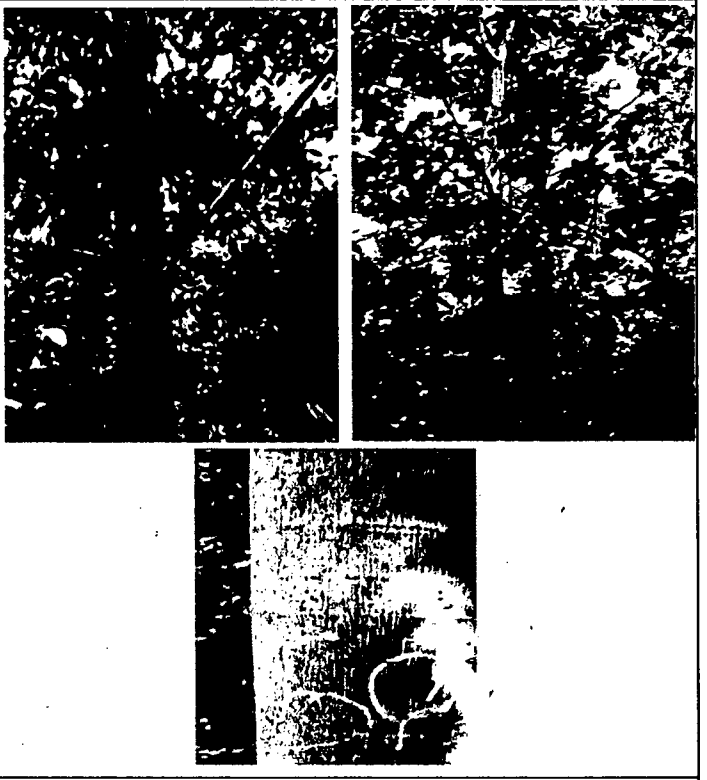

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**51**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-165	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,351987	-76,534491
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,2	0,1	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

286

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**52**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-166	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351816667	-76,53381667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,5	1,5	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			53
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-167	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,3	0,1	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**54**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-168	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,4	0,09	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		55
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-169	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,3521	-76,53461667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,5	0,14	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**56**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-170	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352066667	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,14	6,72

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

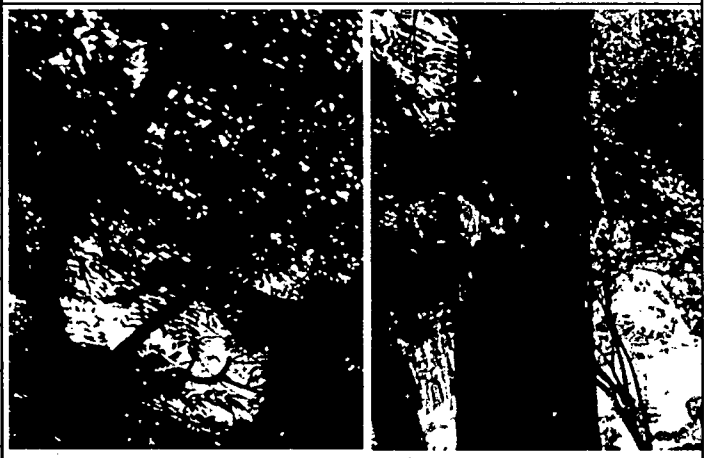

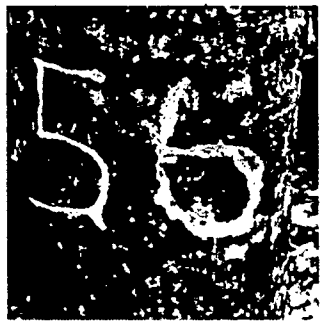

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**57**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-171	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352133333	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,9	0,17	17,23

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**58**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-172	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352066667	-76,53461667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8	0,16	6,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**59**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-173	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352083333	-76,5347
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,17	9,63

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

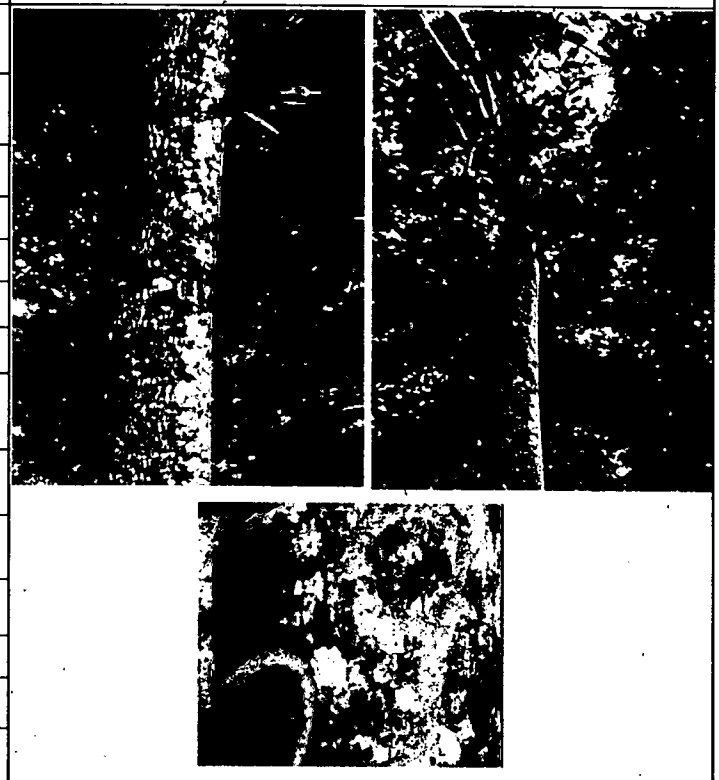

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**60**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-174	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mandarino**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352133333	-76,53468333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,68	8,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**61**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-175	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mandarino**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,352233333	-76,53468333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,43	4,5

REGISTRO FOTOGRAFICO

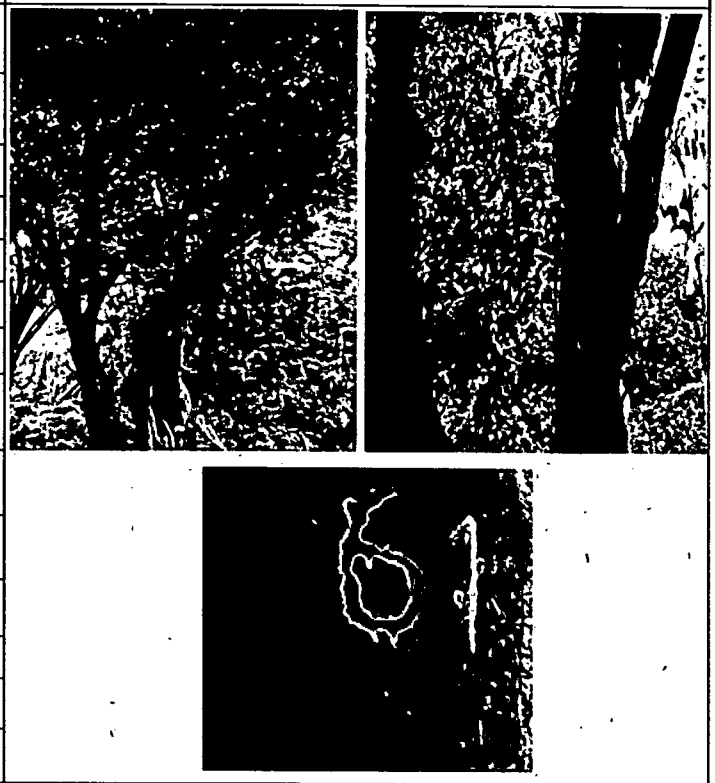

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

291

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**62**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-176	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mandarino**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,35215	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
8,4	0,61	9,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			63
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-177	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,08	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

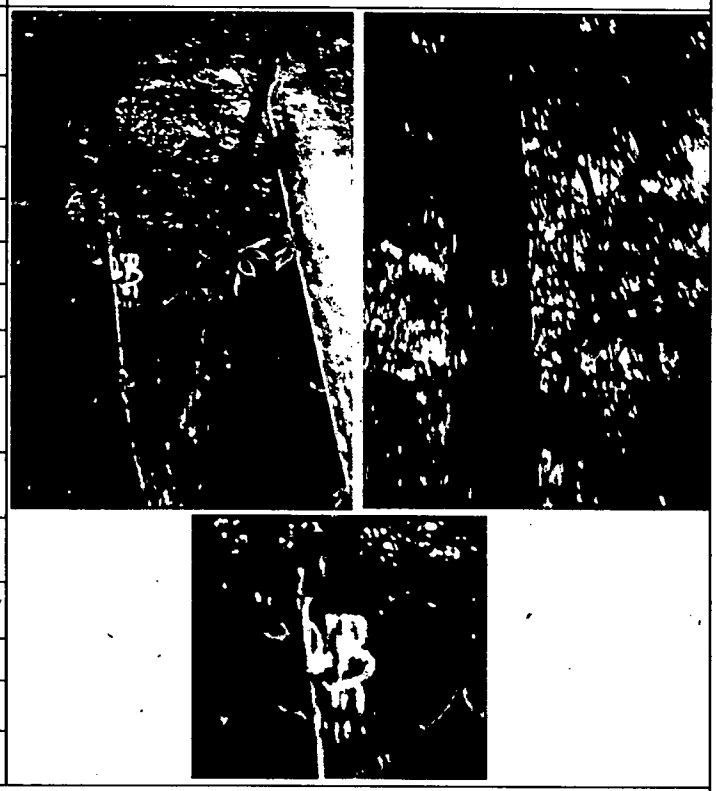

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

292

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**64**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-178	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351966667	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			65
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-179	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,351966667	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,08	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

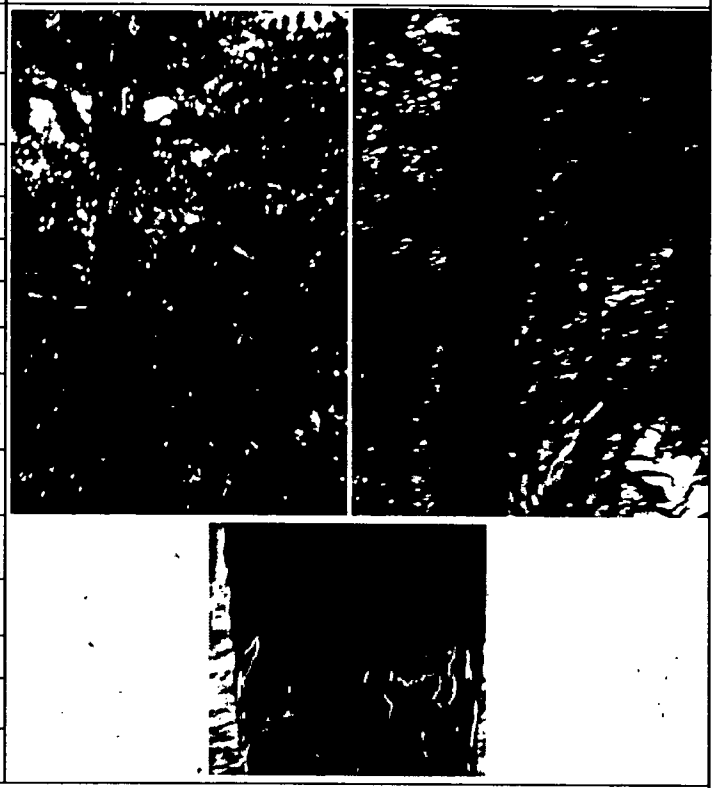

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

293

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**66**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-180	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351983333	-76,53465
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,11	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			67
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-181	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Ceiba		
	ESPECIE	*Ceiba pentandra*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,352833333	-76,53381667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
3,4	1,3	14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

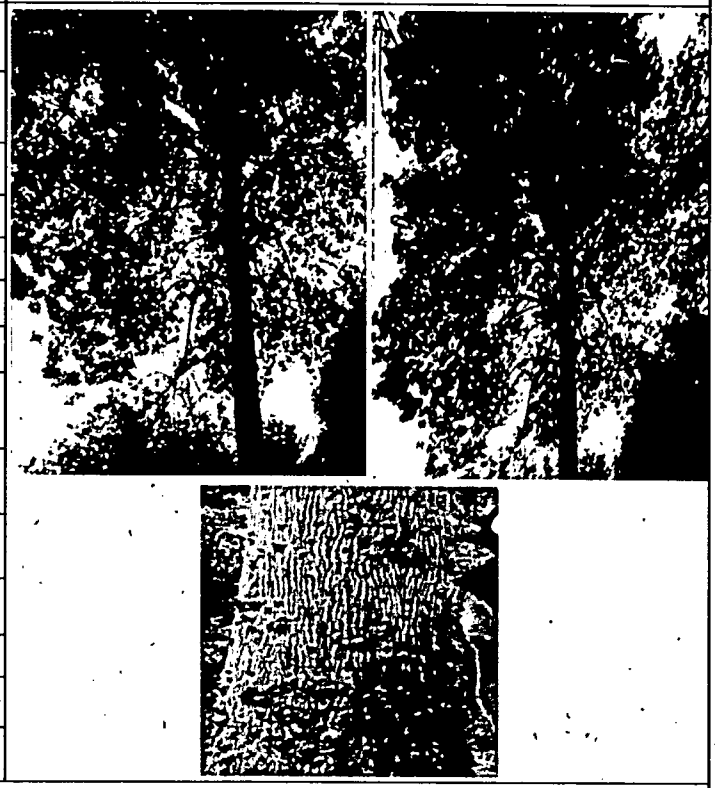

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

294

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**68**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-182	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATITUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,35195	-76,53468333	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,6	0,12	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			69
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-183	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Nogal cafetero		
	ESPECIE	*Cordia alliodora*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Boraginaceae	3,3531	-76,53388333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,9	8,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

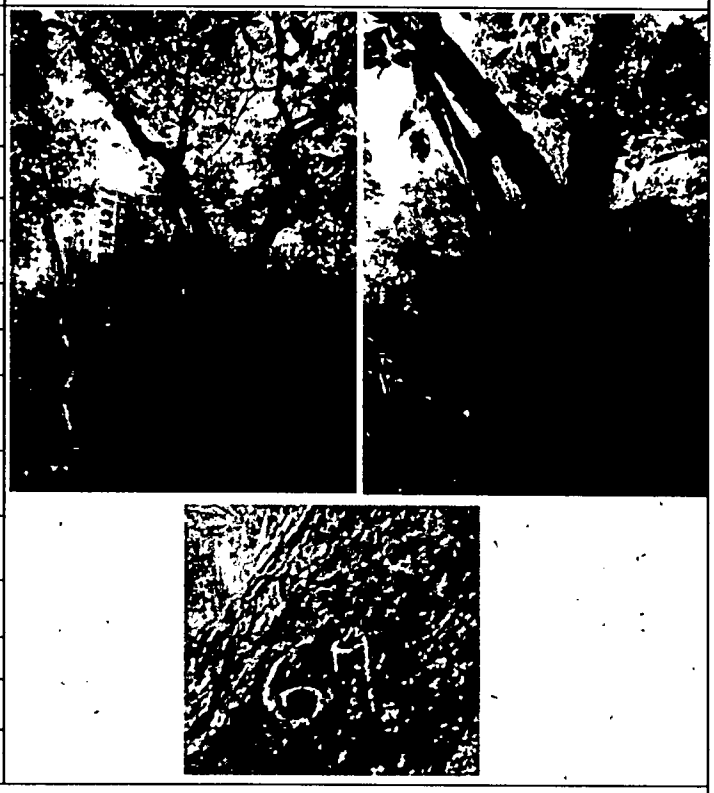

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

295

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**70**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-184		**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352033333	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,2	0,54	10,06

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**71**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-185	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Balso real**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ochroma pyramidale*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,35205	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,28	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

296

CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**72**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-186	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,8	0,13	3,5

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**73**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-187	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Guásimo		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,35215	-76,53471667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,1	0,2	9,18

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

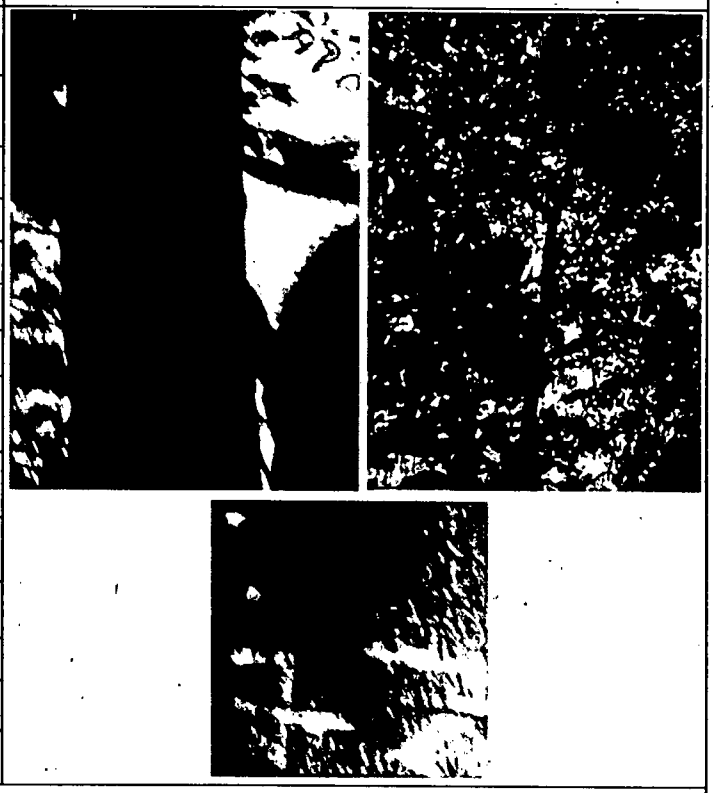

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

297

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**74**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-188	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Araucaria**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Araucaria columnaris*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Araucariaceae	3,35225	-76,5346	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,2	0,73	17,14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

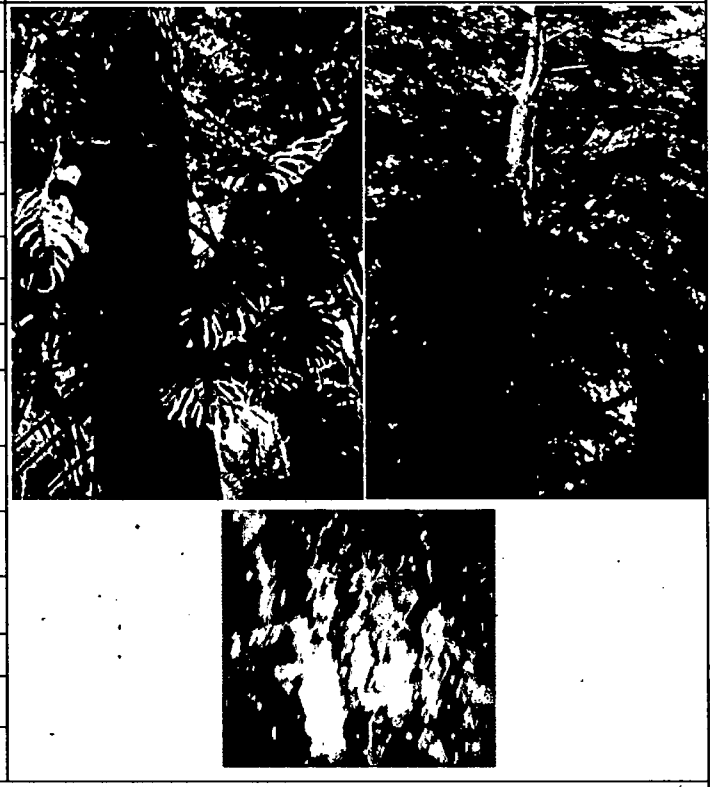

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	12/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			75
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-189	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mandarino		
	ESPECIE	*Citrus reticulata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,3522	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,4	0,25	5,14

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**76**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-190	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Casco de buey**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,351883333	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,9	0,33	6,37

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**77**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-191	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352266667	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,6	0,33	4,68

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

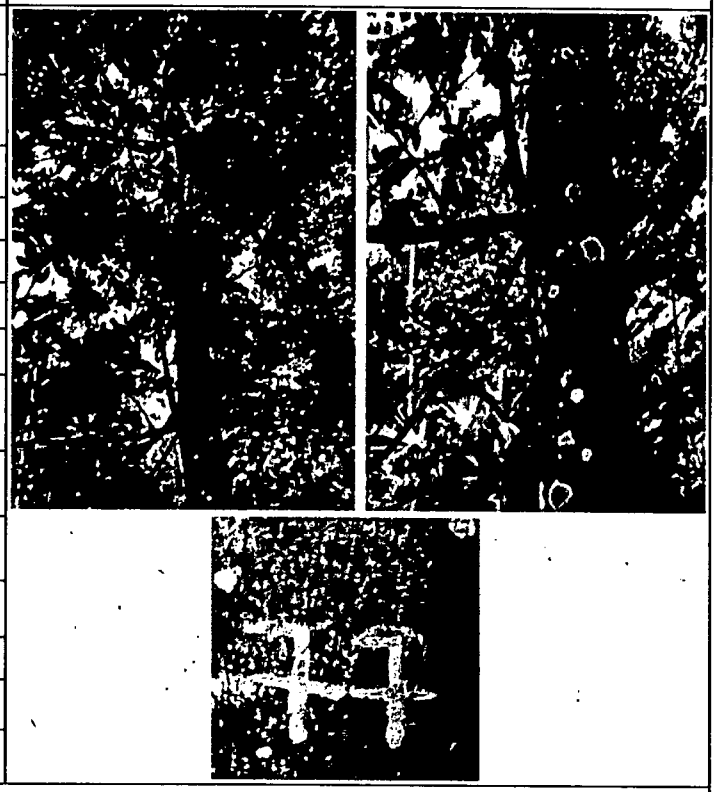

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

299

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**78**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-192	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Casco de buey**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352216667	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	0,1	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





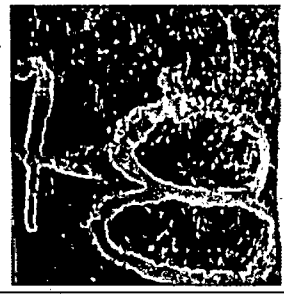

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			79
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-193	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Casco de buey		
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352216667	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,5	0,19	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

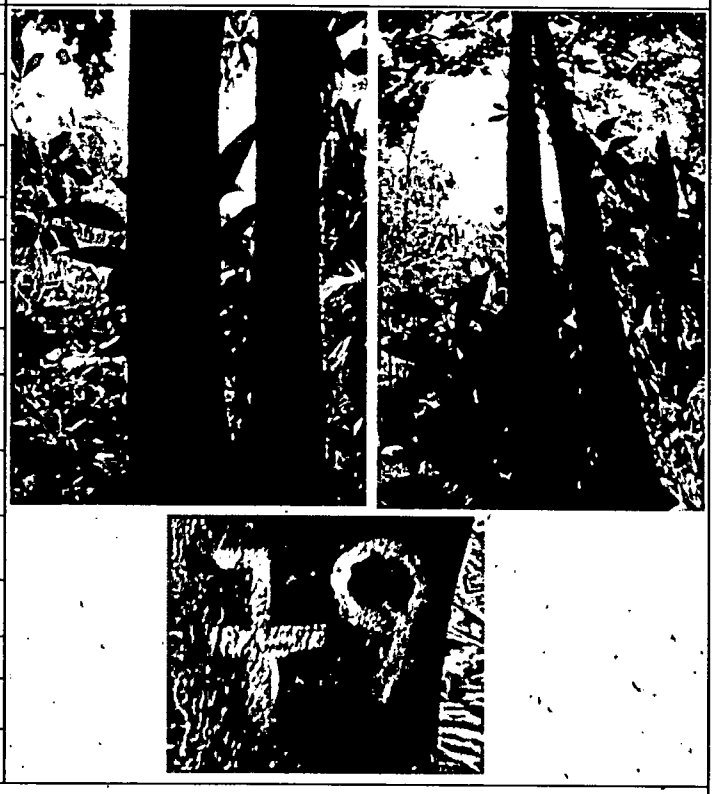

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

300

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**80**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-194	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Casco de buey**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3523	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,5	0,21	2,9

ESTADO FISICO .SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

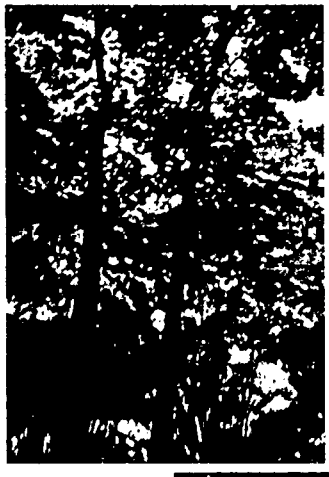

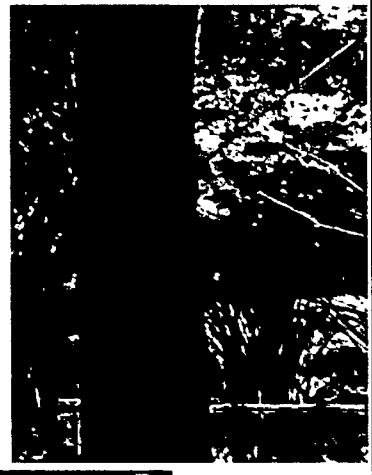



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			81
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-195	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Casco de buey	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Bauhinia variegata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,35225	-76,53481667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,7	0,13	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

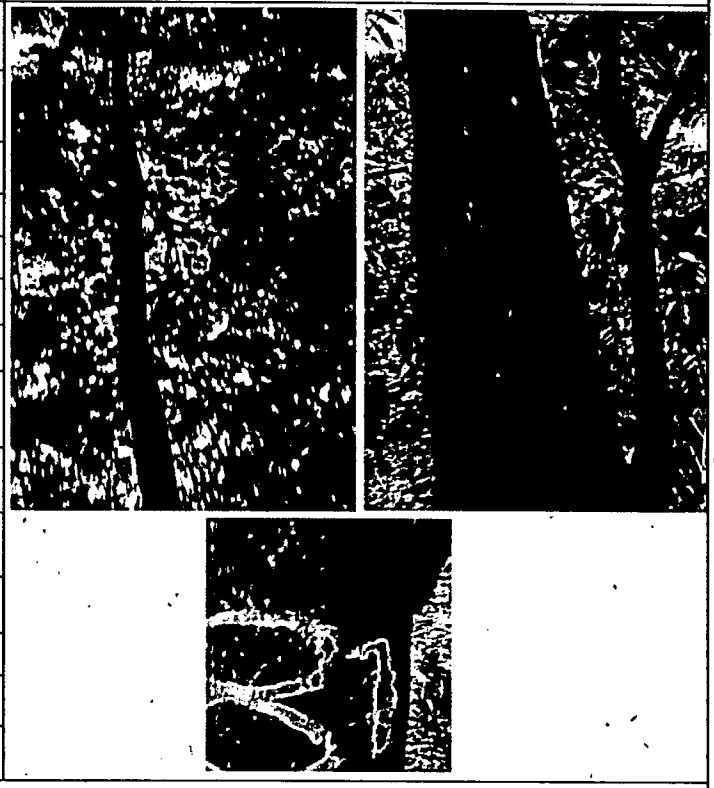

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**82**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-196		**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352233333	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8	0,28	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		83
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-197	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352316667	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,6	0,11	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

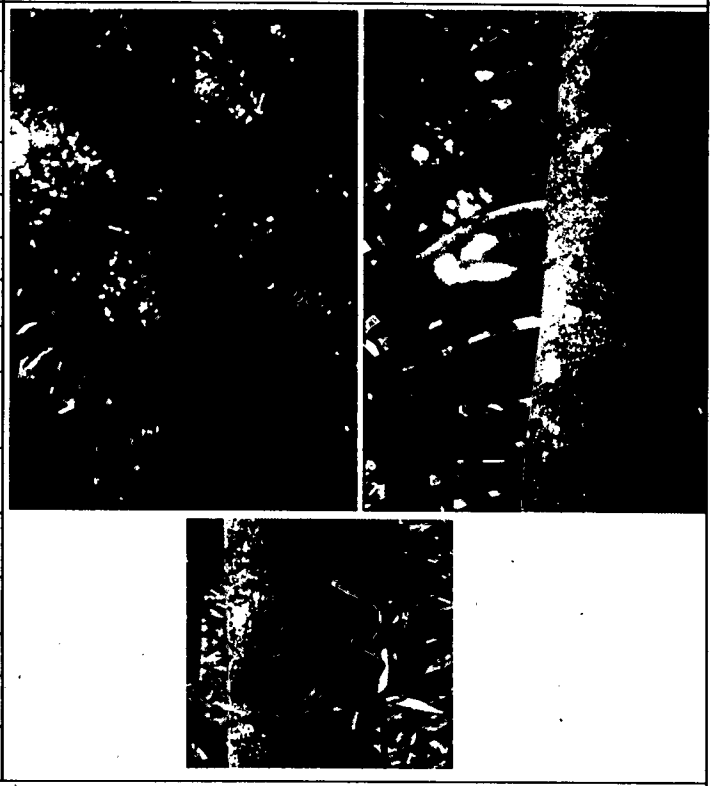

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

32

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**84**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-198	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Jagua	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Genipa americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rubiaceae	3,352283333	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	3,88

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		85
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-199	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Araucaria		
	ESPECIE	*Araucaria columnaris*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Araucariaceae	3,35215	-76,5345
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
24,8	0,46	2,5

REGISTRO FOTOGRAFICO

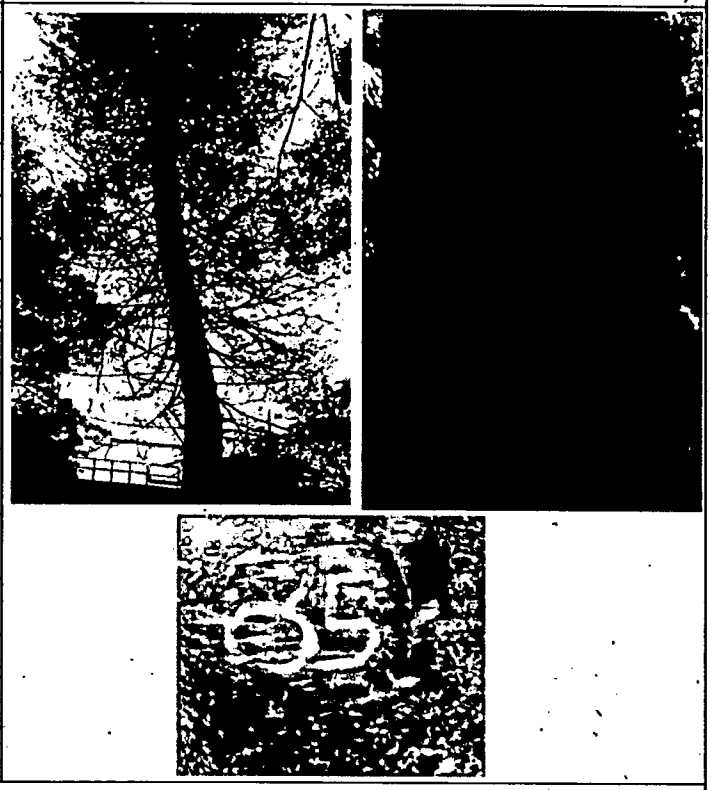

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**86**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-200	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352716667	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,7	0,22	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





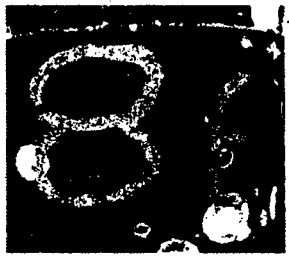

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**87**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-201	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352683333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,7	0,12	1,8

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**88**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-202	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352683333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,2	2,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**89**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-203	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,3527	-76,53446667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,3	0,4	12,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

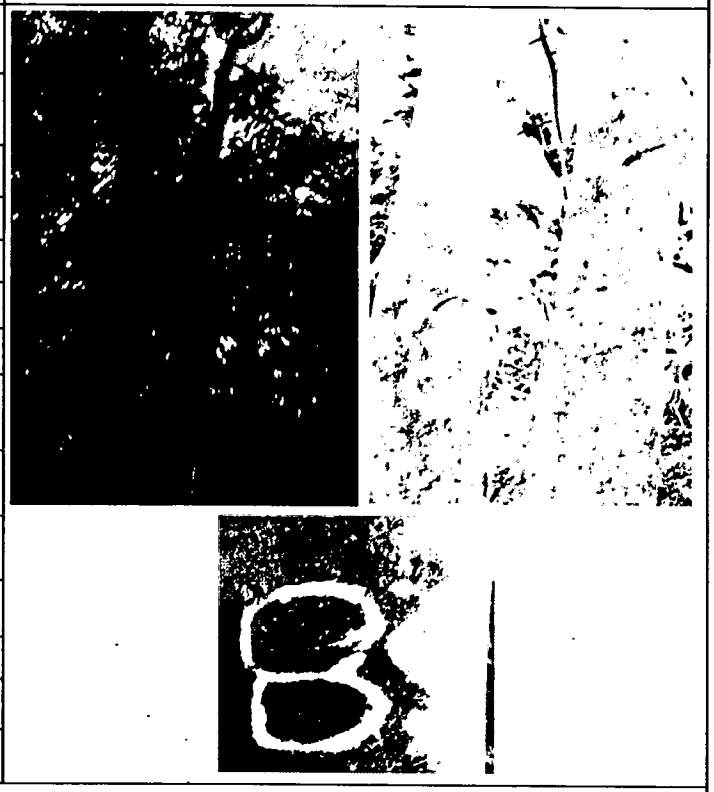

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**90**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-204	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Guanabano**		
	ESPECIE	*Annona muricata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Annonaceae	3,352749	-76,534422
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,13	3,4

REGISTRO FOTOGRAFICO



ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			91
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-205	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,351928333	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,1	0,26	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia aféctación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

306

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**92**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-206	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53453333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,2	0,26	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			93
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-207	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Tachuelo		
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rutaceae	3,352633333	-76,53451667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,1	0,15	2,6

REGISTRO FOTOGRAFICO

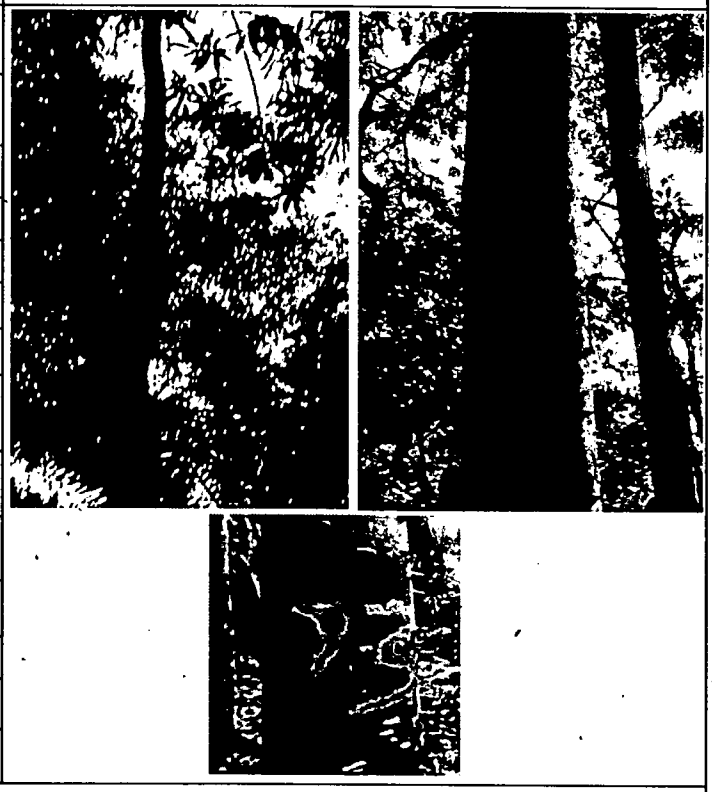

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**94**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-208	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,352775	-76,534387	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,4	0,06	3,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

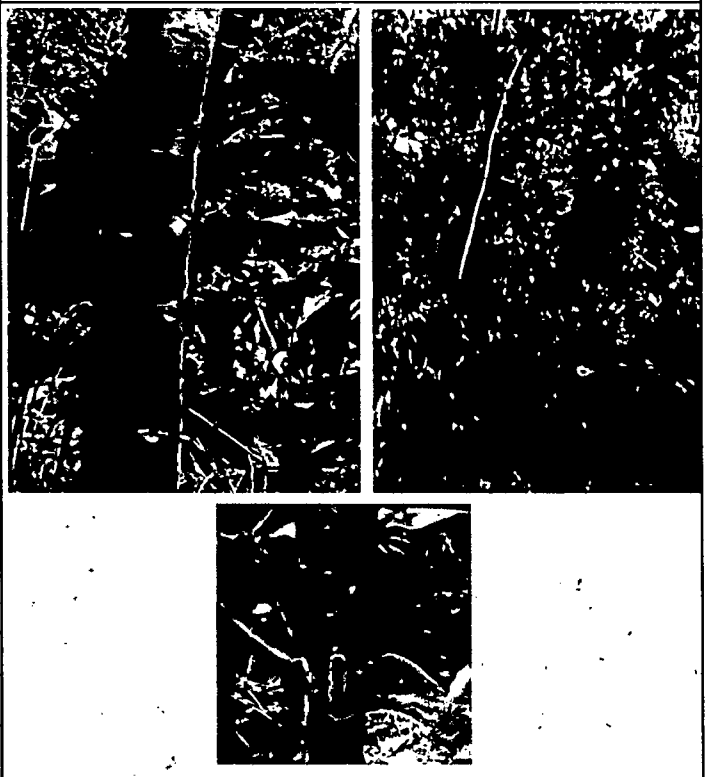

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			95
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-209	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Guanabano		
	ESPECIE	*Annona muricata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Annonaceae	3,352666667	-76,536
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,7	0,2	2,24

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**96**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-210	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352766667	-76,5345
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,10	0,35	8,25

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

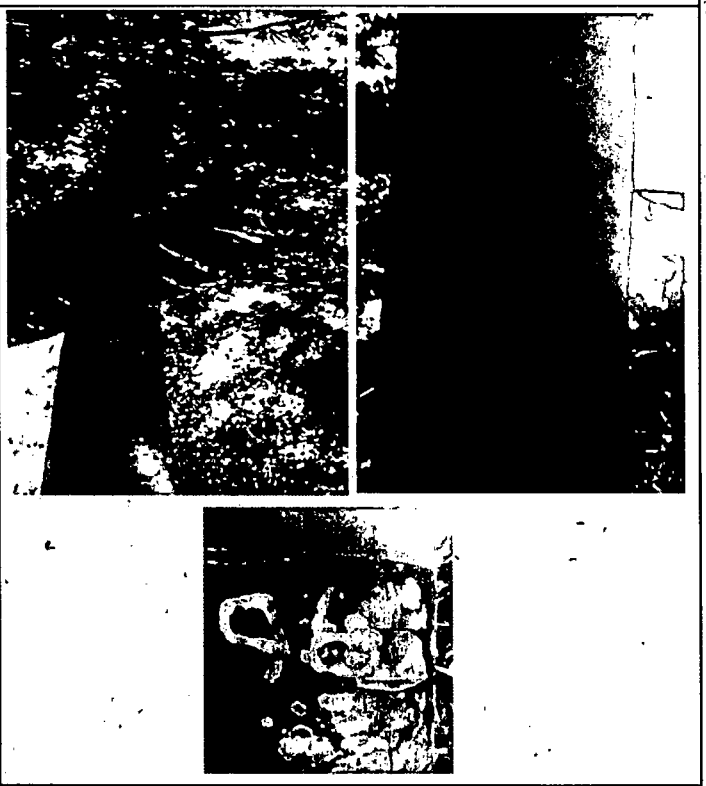

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		97
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-211	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,3528	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,91	12,05

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**98**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-212	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352733333	-76,53458333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,9	18,06

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			99
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-213	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Mango		
ESPECIE	*Mangifera indica*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Anacardiaceae	3,352766667	-76,53473333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,3	0,15	7,08

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

310

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**100**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-214	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higueron**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus glabrata Kunth*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35265	-76,53463333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,3	0,14	2,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			101
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-215	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,3526	-76,5347
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,5	0,11	2,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

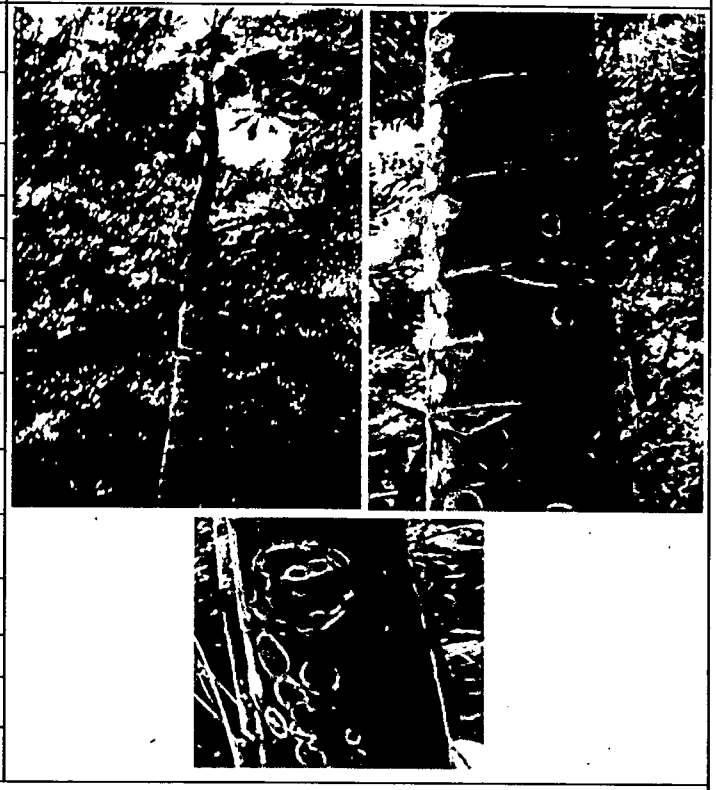

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**102**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-216	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3527	-76,53476667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,4	0,17	4,23

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

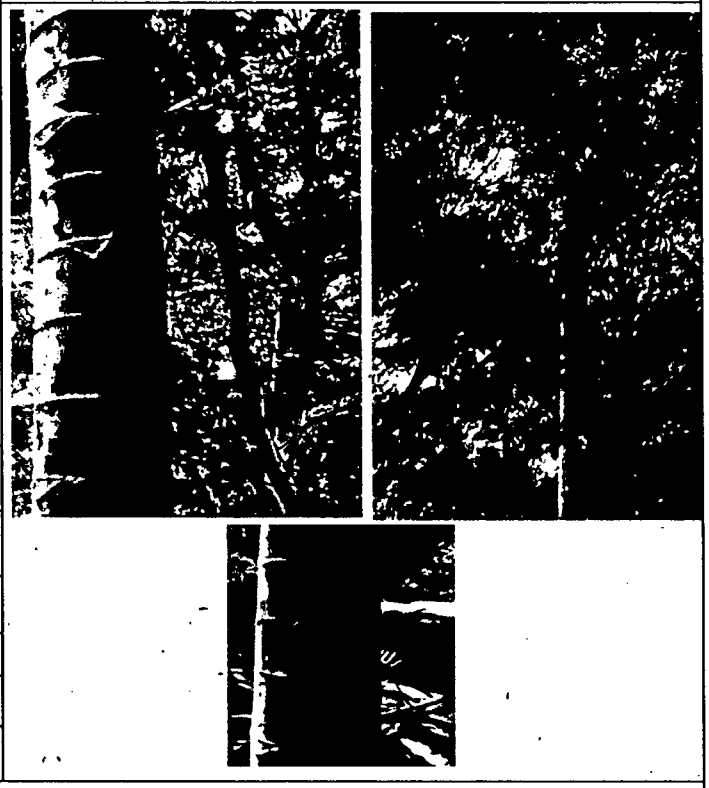

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			103
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-217	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53475
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,39	9,75

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**104**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-218	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Anacardiaceae	3,352616667	-76,5348	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
15,6	0,46	10,41

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: **INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**105**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-219	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352716667	-76,53473333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,3	0,1	4,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

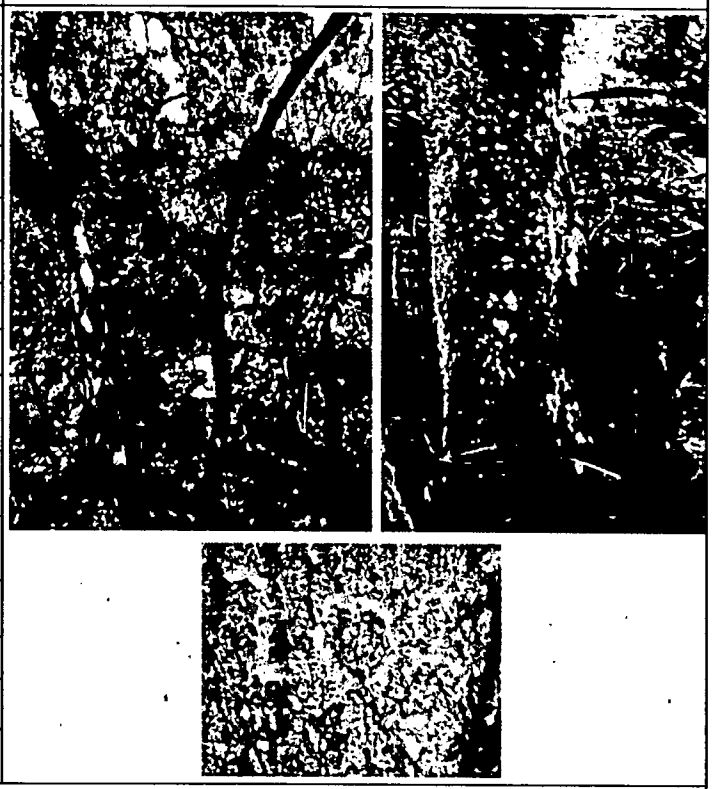

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

393

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**106**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-220	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	- Árbol de la cruz	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,352666667	-76,53485	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,13	5,35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





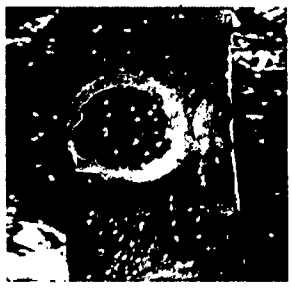

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			86
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-200	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,352716667	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,7	0,22	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

314

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**108**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-222	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,352616667	-76,53478333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,7	0,27	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

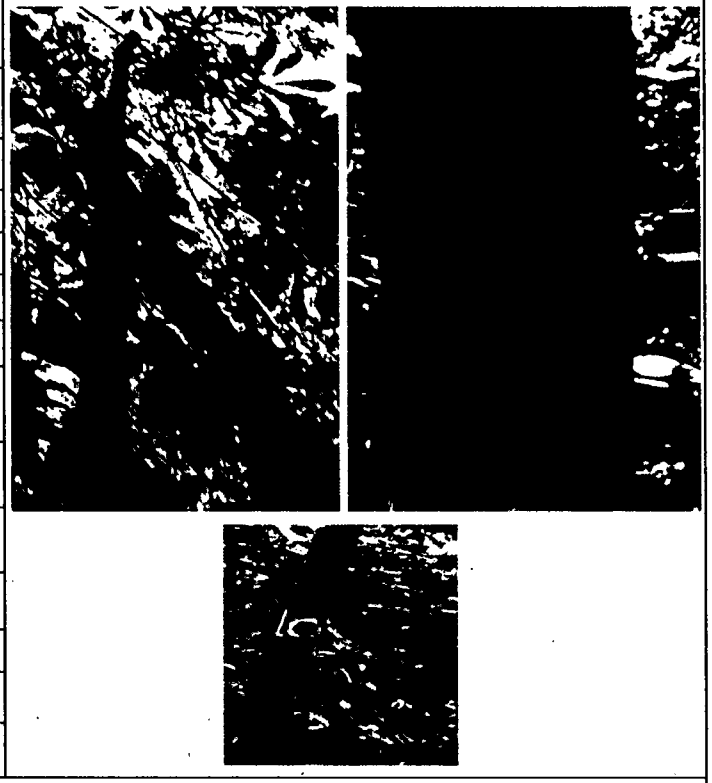

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	109
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-223	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,3526	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,9	0,37	9,15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**110**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-224	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Moraceae	3,352633333	-76,53488338	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,08	4,35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		-X

REGISTRO FOTOGRAFICO

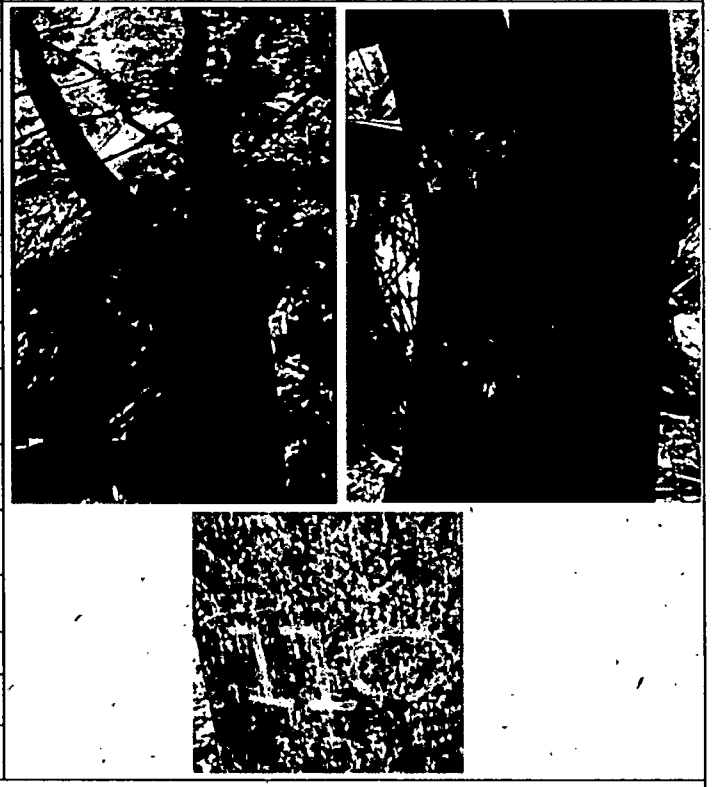

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			111
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-225	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Higuera blanca		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,2	0,07	3,11

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

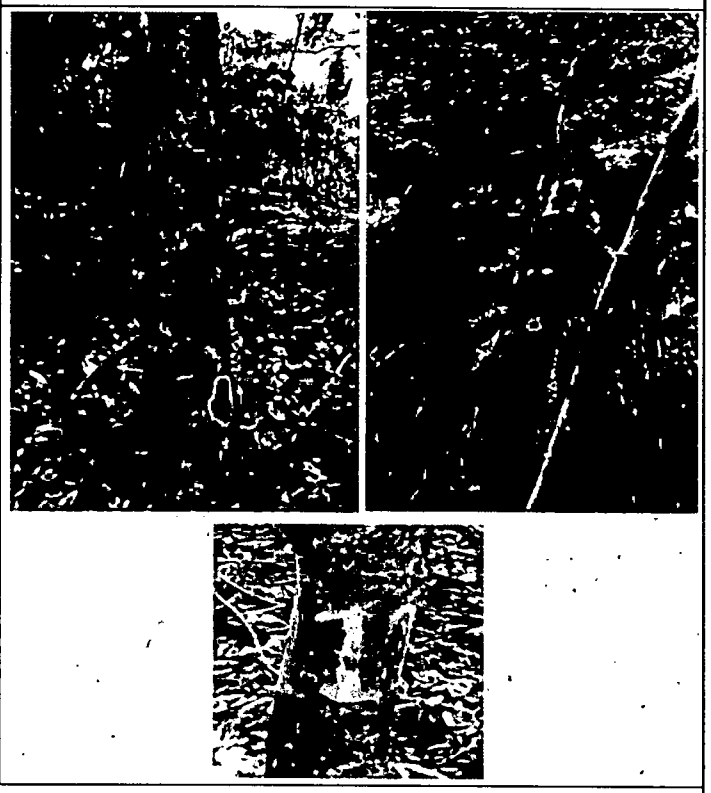

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

316

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**112**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-226	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352583333	-76,5348
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,5	0,64	12,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		113
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-227	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,35255	-76,53485
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,17	7,19

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**114**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-228	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,353066667	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9,6	0,8	15,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

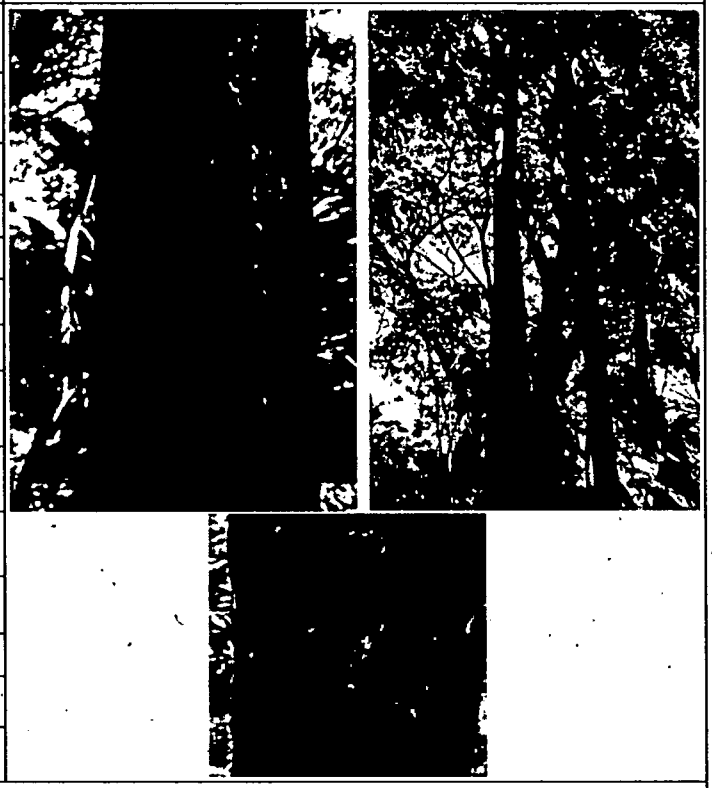

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		115
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-229	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Bohio		
	ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,3526	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,1	0,1	5,23

REGISTRO FOTOGRAFICO

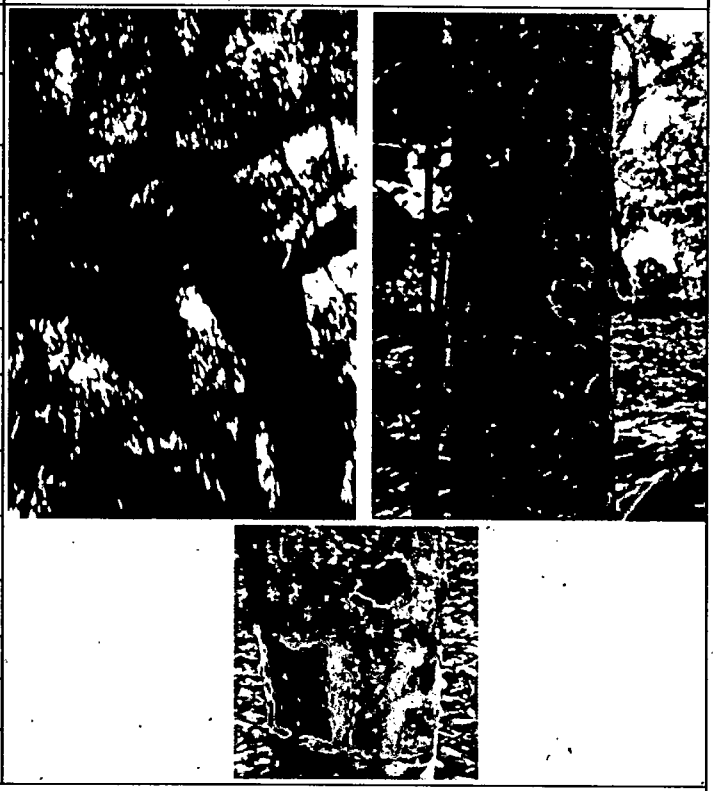

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

318

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**116**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-230	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,3	0,8	15,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

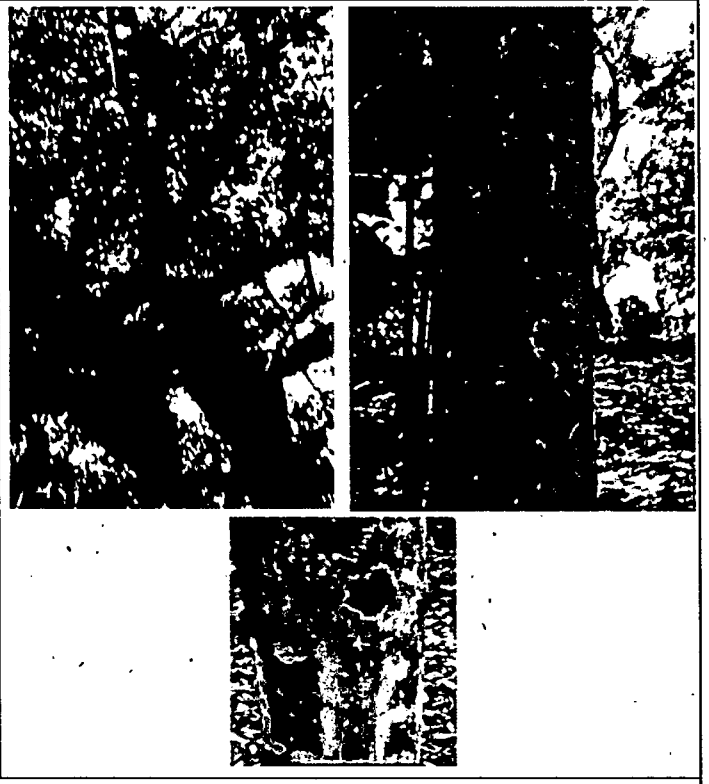

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			117
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-231	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Higuera blanca		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,5	0,15	7,58

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

394

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICÚLTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**118**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-232	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352516667	-76,5349
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
9,1	0,26	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





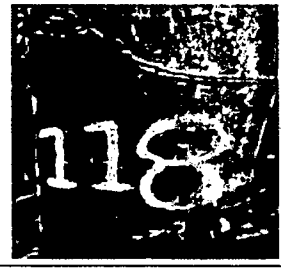

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			119
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-233	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Árbol de la cruz	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352483333	-76,53483333
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,1	0,44	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

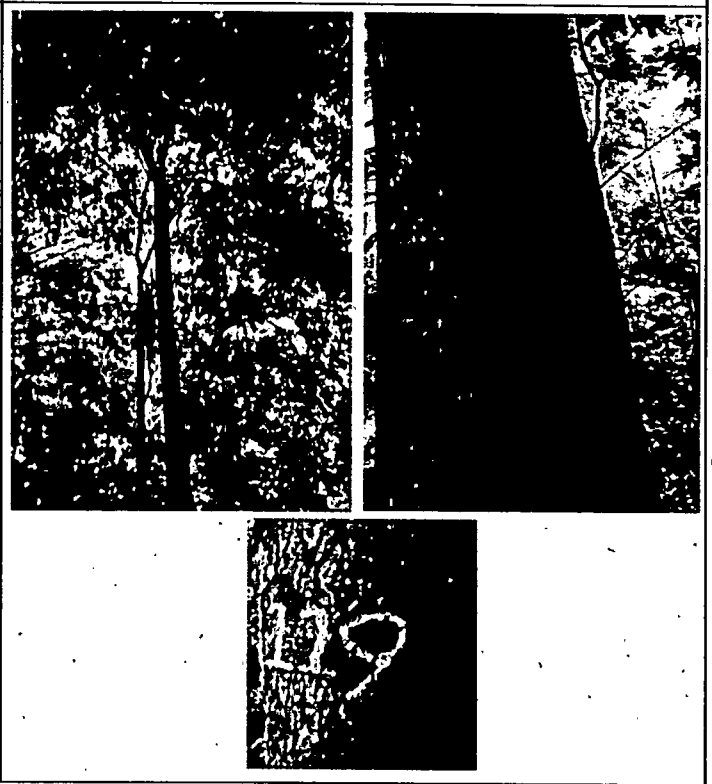

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

320

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**120**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-234	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352566667	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,5	0,17	7,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	121
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-235	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Higuera blanca		
ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53498333
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,2	0,09	3,8

REGISTRO FOTOGRAFICO

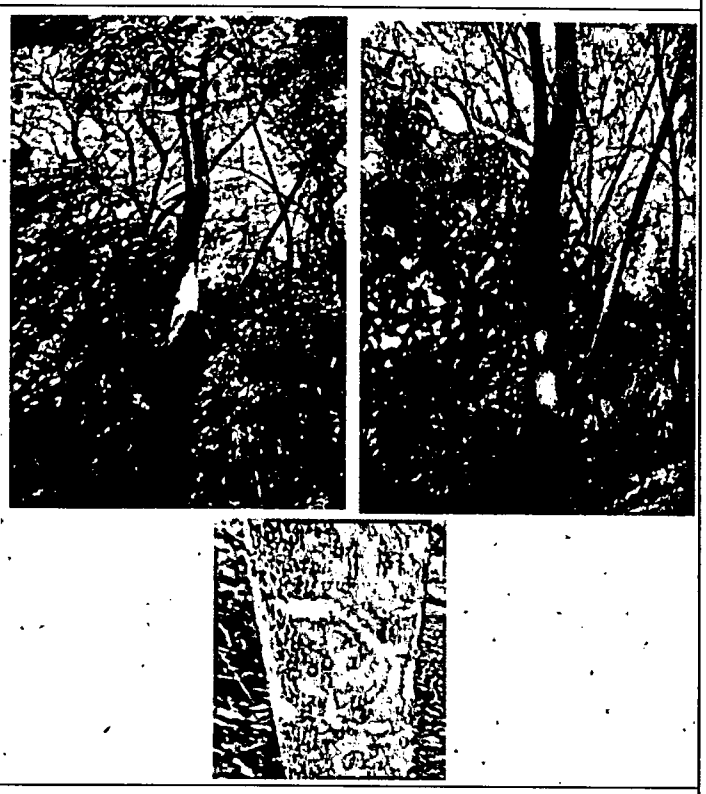

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

321

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**122**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-236	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**TACHUELO**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Zanthoxylum rhoifolium*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Rutaceae	3,3525	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
6,5	0,21	5,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2/05/1900	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			123
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-237	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,352666667	-76,53488333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
9	0,12	4,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**124**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-238	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,352633333	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	1,52	17,88

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





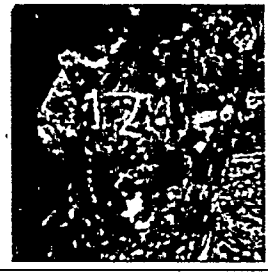

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		125
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-239	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Higuera blanca		
	ESPECIE	*Ficus insipida*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Moraceae	3,352666667	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	1,17	14,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

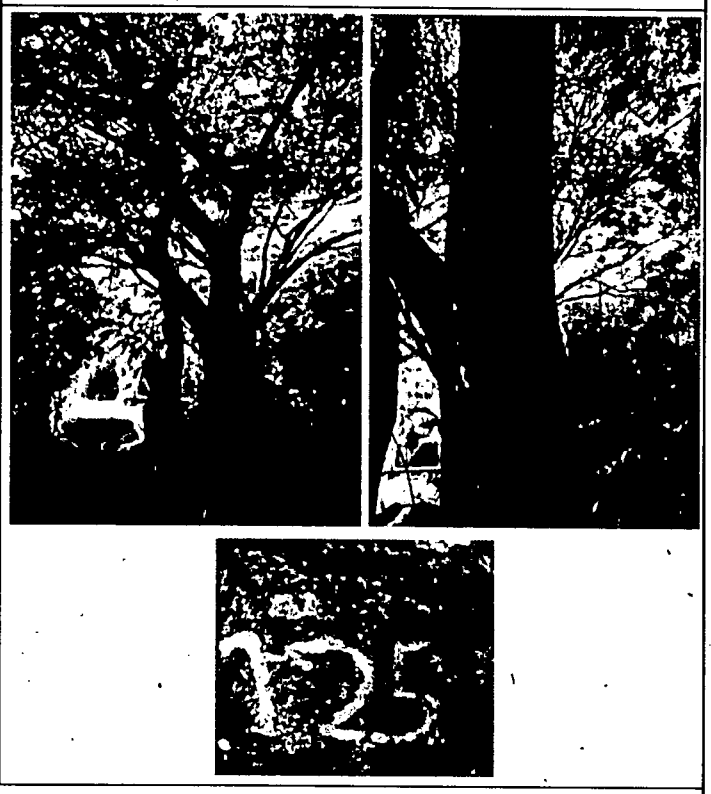

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**126**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-240	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mango**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Mangifera indica*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,353416667	-76,53368333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,7	1,8	18,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO	127
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-241	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Mango		
	ESPECIE	*Mangifera indica*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,352666667	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,66	9,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

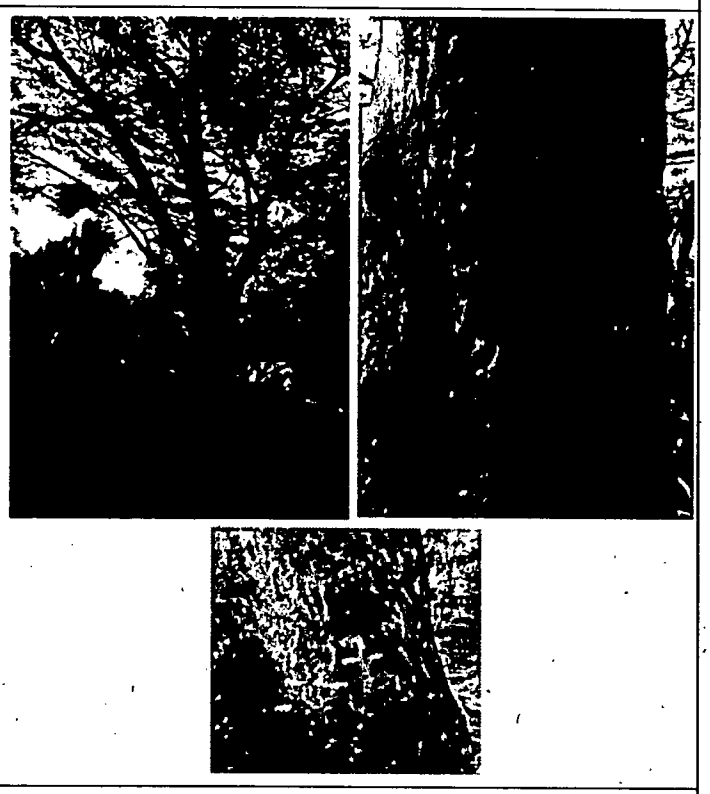

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**128**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-242	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL	**NC**	**Higuera blanca**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus insipida*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,3526	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
11,2	1,48	13,86

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

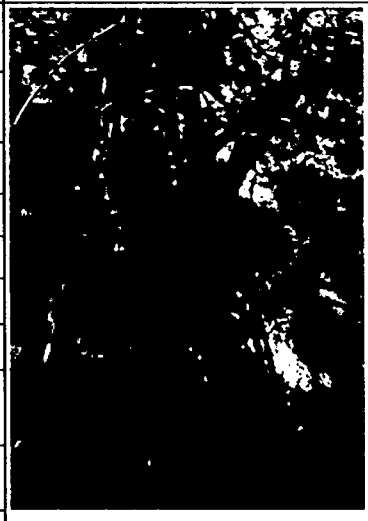





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			129
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-243	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352616667	-76,53511667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,11	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

videncia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**130**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-244	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Acacia robinia	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53513333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,8	0,66	6,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

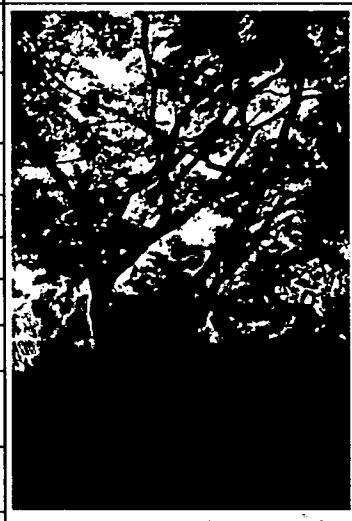



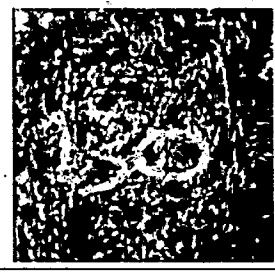

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			131
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-245	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Acacia robinia		
	ESPECIE	*Cenostigma pluviosum*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,352466667	-76,5352
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,3	0,87	9,26

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

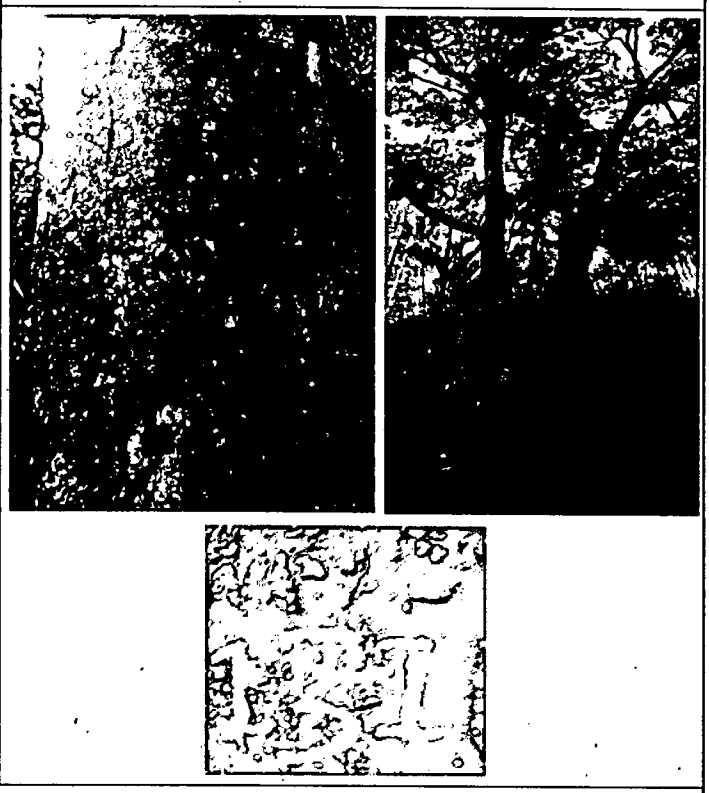

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

326

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**132**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-246	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Cedrela odorata	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,352416667	-76,5351
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,1	0,48	11,65

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



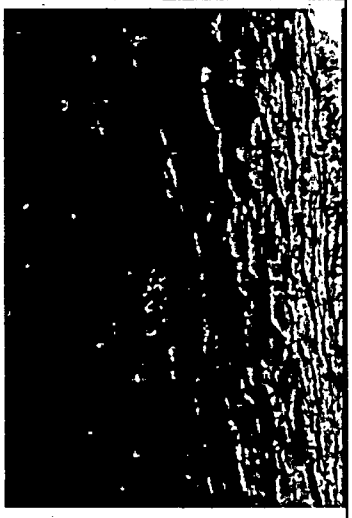

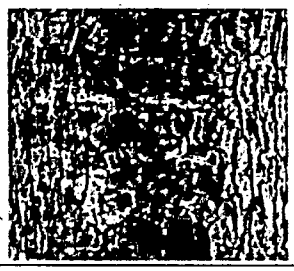

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**133**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-247	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Cedrela odorata**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,3524	-76,53518333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,4	0,34	12,75

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





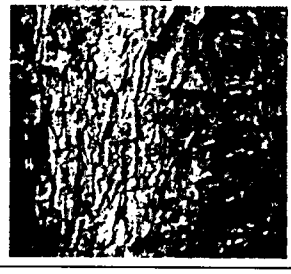

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**134**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-248	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Fabaceae	3,352533333	-76,53511667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,4	0,13	4,25


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



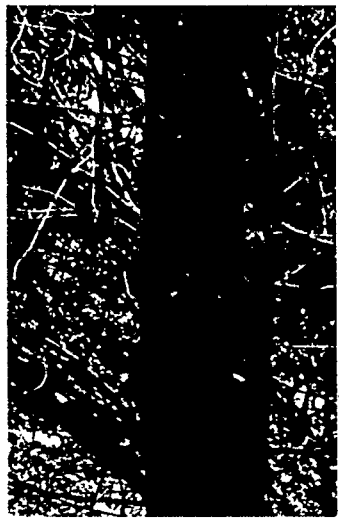



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			135
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-249	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Árbol de la cruz		
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,35255	-76,53515
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,57	12,41

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

326

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**136**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-250	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Mestizo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cupania glabra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Sapindaceae	3,351733333	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,83	11,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





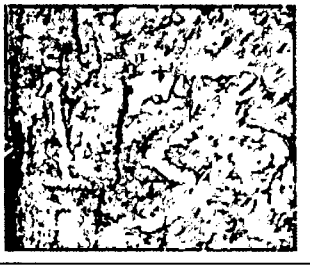

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**137**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-251	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Árbol de la cruz**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Brownea grandiceps*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35165	-76,53505
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,11	3,22

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

:videncia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

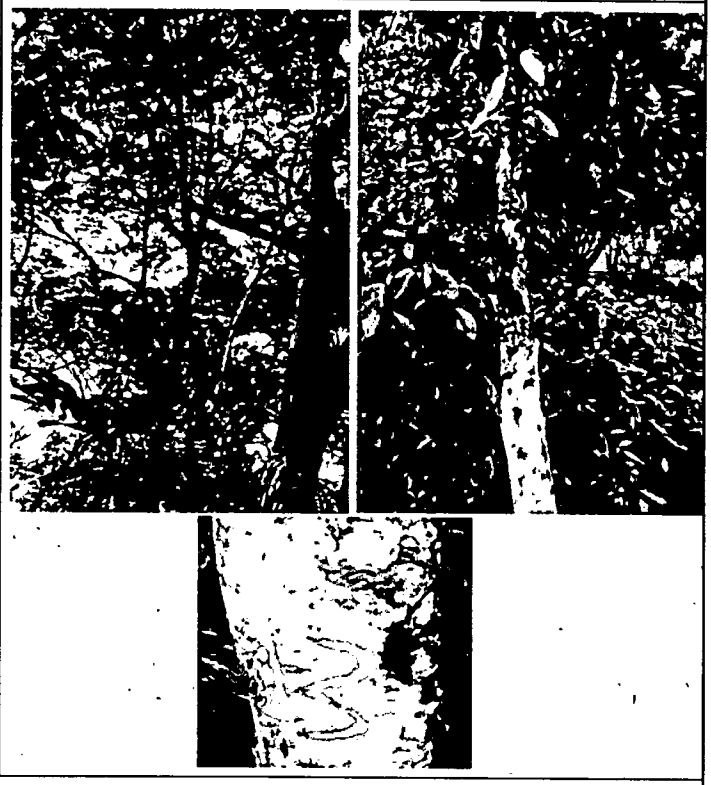

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**138**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-252	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Gualanday	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,351666667	-76,53496667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,62	17,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

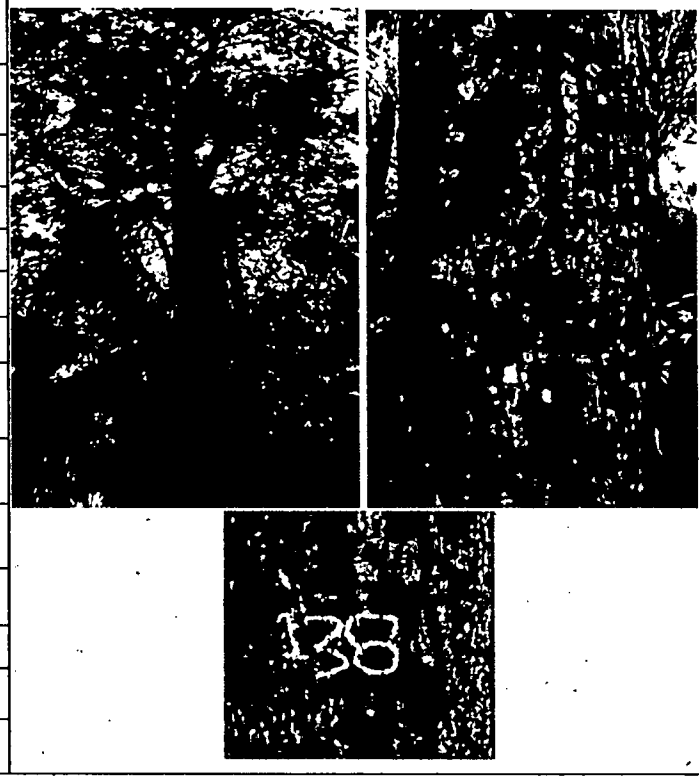

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**139**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-253	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Gualanday**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,3517	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,3	0,46	10,18

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

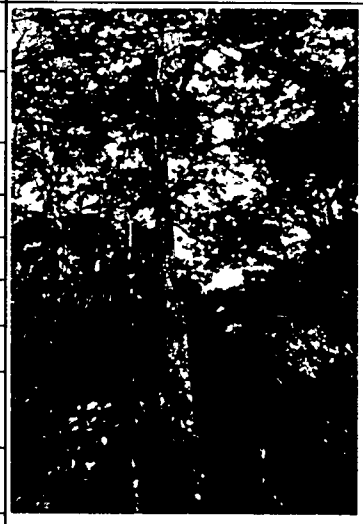





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**140**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-254	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Cedrela odorata**		
	ESPECIE	*Cedrela odorata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35175	-76,53498333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,8	0,19	1,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

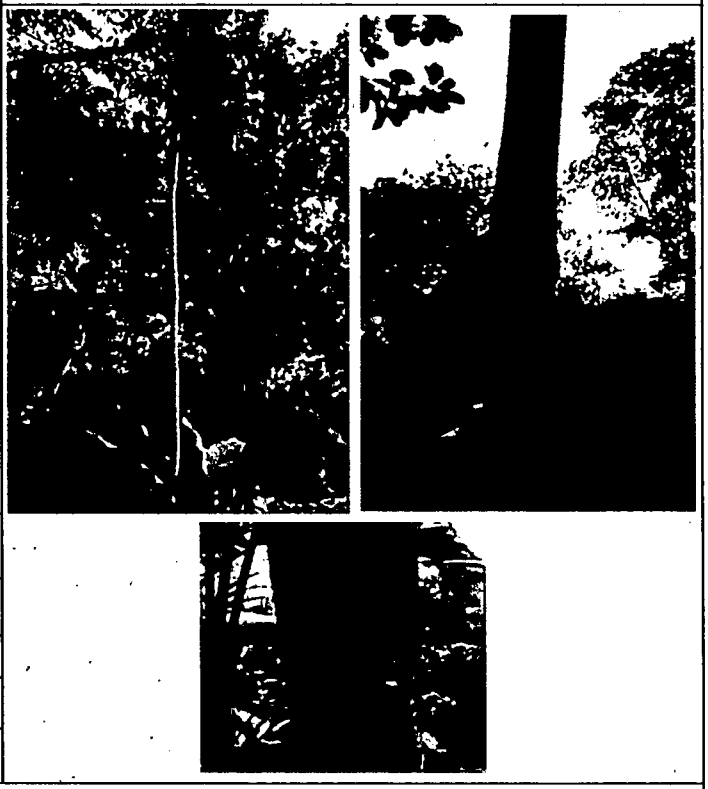

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			141
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-255	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Gualanday	GEOREFERENCIACION	
	ESPECIE	*Jacaranda caucana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Bignoniaceae	3,351983333	-76,53486667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,9	0,59	18,7

REGISTRO FOTOGRAFICO

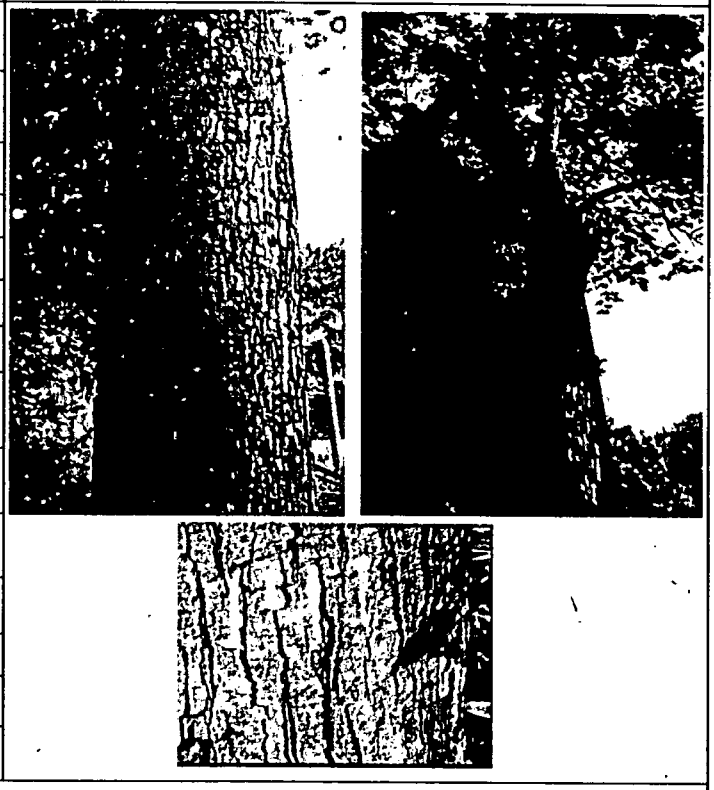

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

331

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**142**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-256	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Guásimo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,351683333	-76,53495
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,2	0,36	9,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

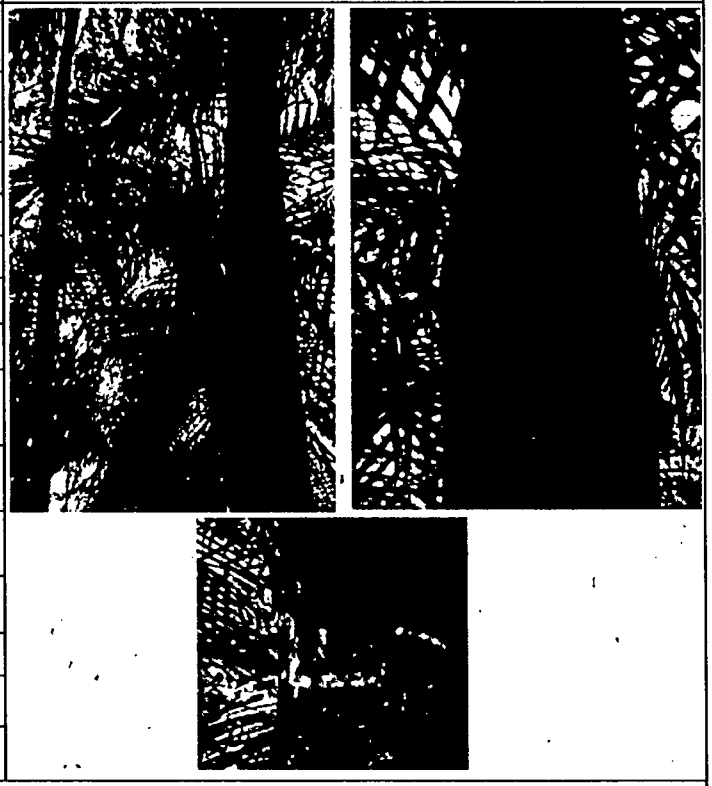

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		143
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-257	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Guásimo		
	ESPECIE	*Guazuma ulmifolia*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Malvaceae	3,352233333	-76,53426667
	No. CENSO ARBOREO 2015	0		
	No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
8,5	0,79	13,84

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

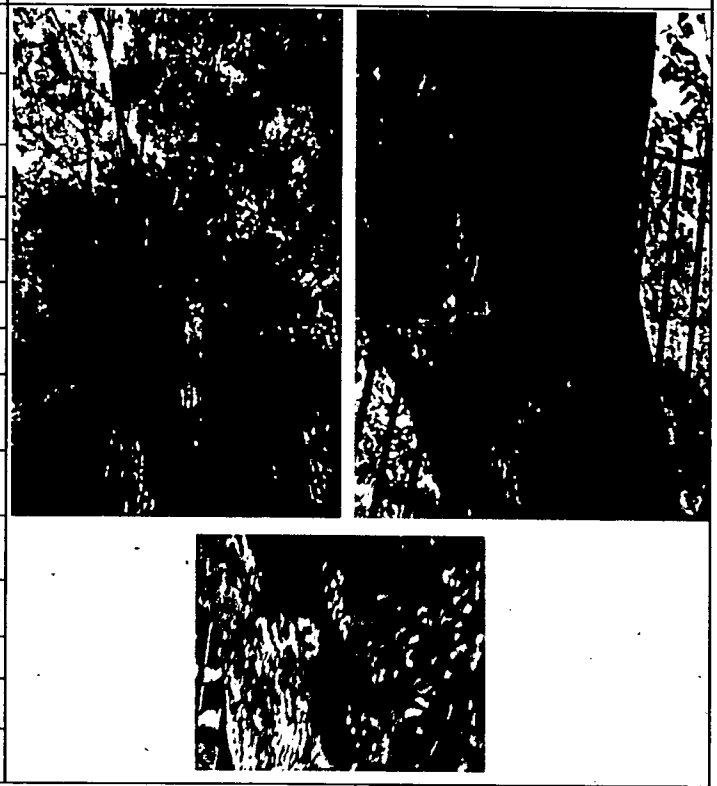

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

336

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**144**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-258	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Ficus benjamina**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Ficus benjamina*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Moraceae	3,35235	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,6	0,27	9,43

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			145
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-259	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,35235	-76,53411667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10,2	0,24	8,36

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**146**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-260	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35235	-76,53406667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,4	0,24	6,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			147
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-261	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Aguacate		
	ESPECIE	*Persea americana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Lauraceae	3,352383333	-76,53401667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7,1	0,77	4,4

REGISTRO FOTOGRAFICO

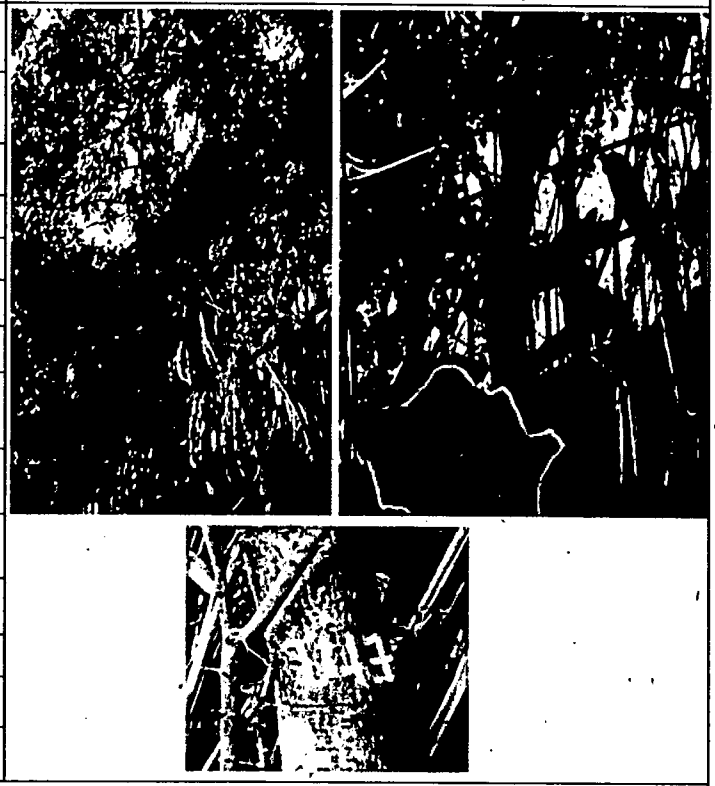

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

334

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**148**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-262	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Jobo**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Spondias mombin*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Anacardiaceae	3,35245	-76,53386667	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
6,8	0,44	13,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**149**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-263	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Guayabo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Psidium guajava*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,352369	-76,53393
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
7	0,26	7,32

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

335

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**150**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-264	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Eucalipto**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Eucalyptus robusta*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Myrtaceae	3,3533	-76,53508333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,2	0,43	7,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**151**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-265	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Aguacate**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Persea americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Lauraceae	3,352516667	-76,53378333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,58	11,15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

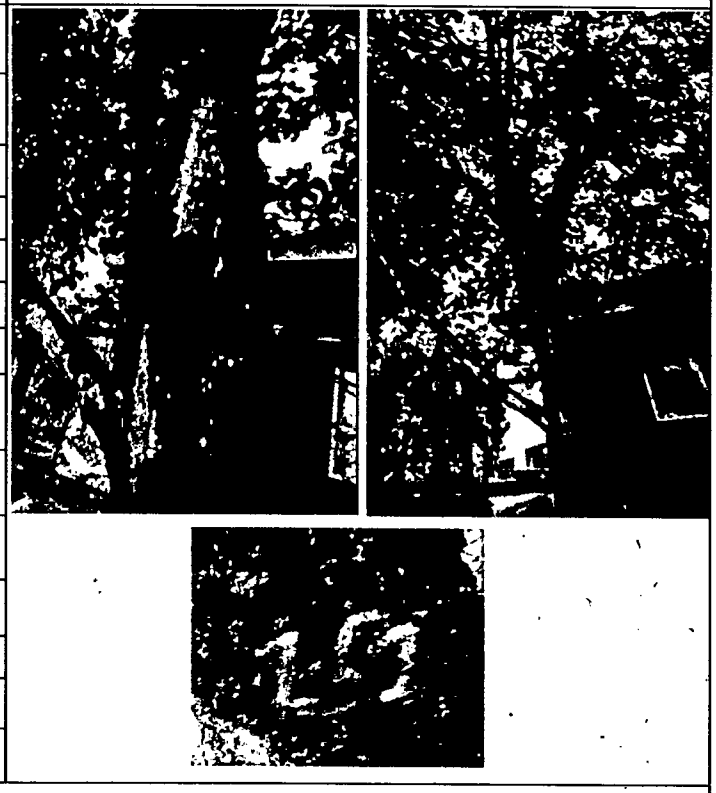

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

336

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**152**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-266	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	**Aguacate**	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Persea americana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Lauraceae	3,35255	-76,53385	
No. CENSO ARBOREO 2015		0		
No CENSO ARBOREO 2023		0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
10	0,21	5,38

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

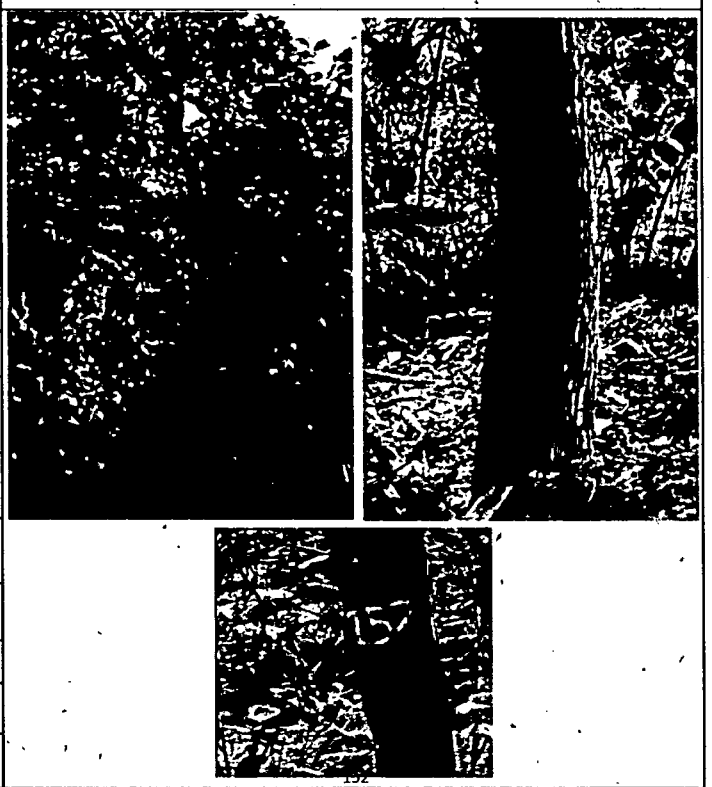

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	13/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**153**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-267	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Zapote**		
	ESPECIE	*Matisia cordata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,352583333	-76,53371667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,1	0,58	8,36

REGISTRO FOTOGRAFICO

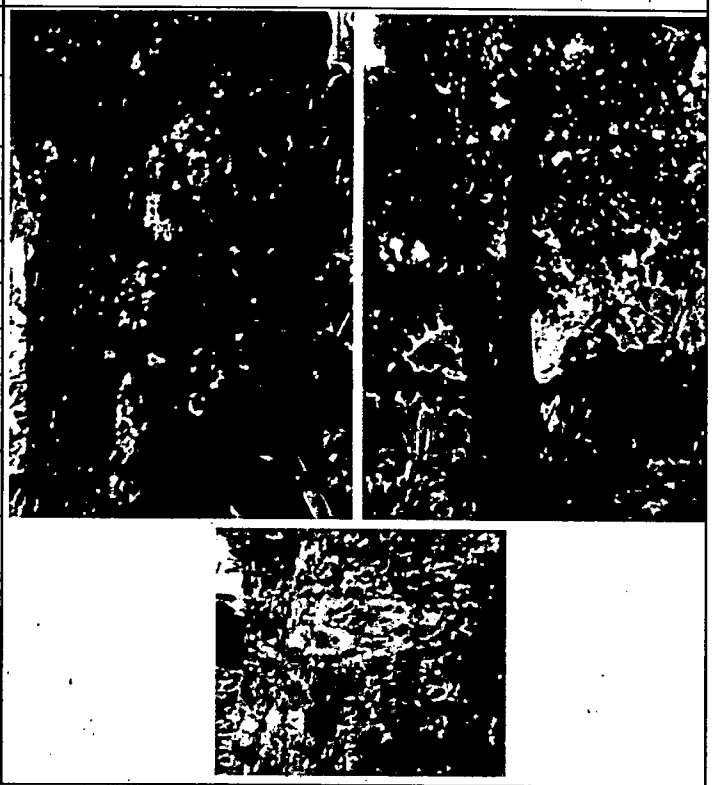

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

337

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**154**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-268	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

NC	**Bohio**	**GEOREFERENCIACION**	
ESPECIE	*Clitoria fairchildiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
FAMILIA	Fabaceae	3,352983333	-76,53431667
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,2	0,72	35

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

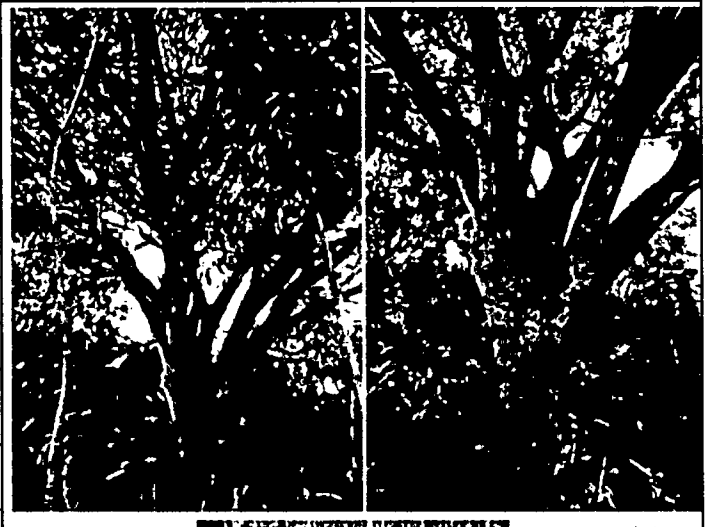

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

EVALUACIÓN DE CAMPO

Contrato de Obra CVC 0741-2025

Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO

Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura

CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			155
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-269	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL

		GEOREFERENCIACION	
NC	Vainillo		
ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
FAMILIA	Fabaceae	3,352883333	-76,53405
No. CENSO ARBOREO 2015	0		
No CENSO ARBOREO 2023	0		

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,6	0,22	15

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**156**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-270	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,352366667	-76,53431667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16,1	0,65	7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

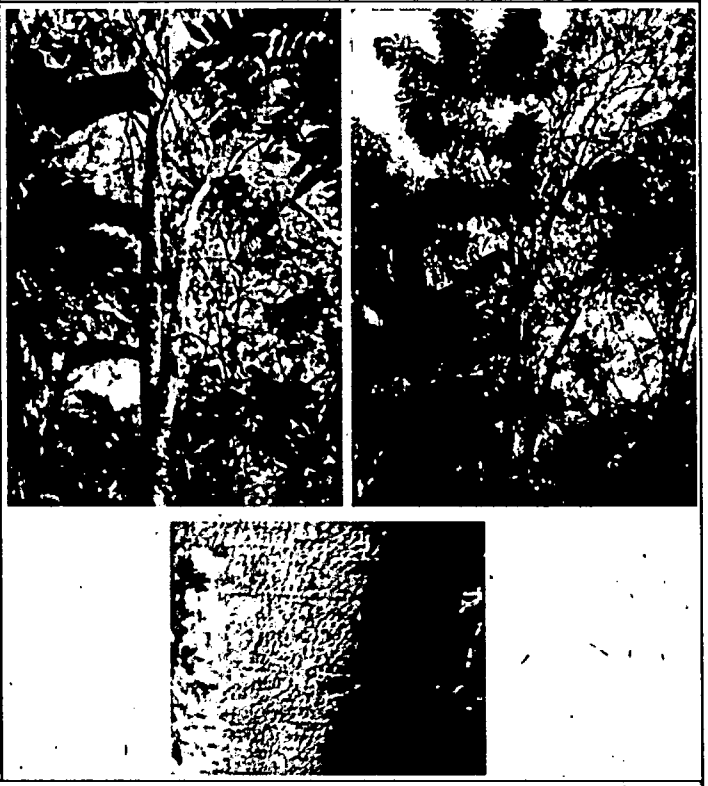

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			157
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-271	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,353233333	-76,5343
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,6	0,22	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

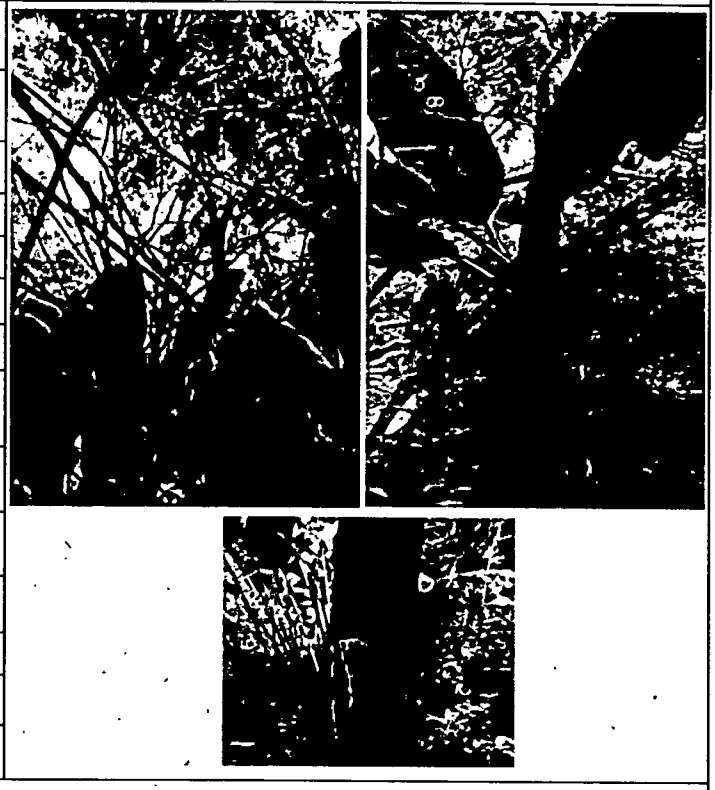

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

339

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**158**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-272	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35325	-76,53431667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,9	0,19	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**159**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-273	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353333333	-76,53423333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,4	1,01	10,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

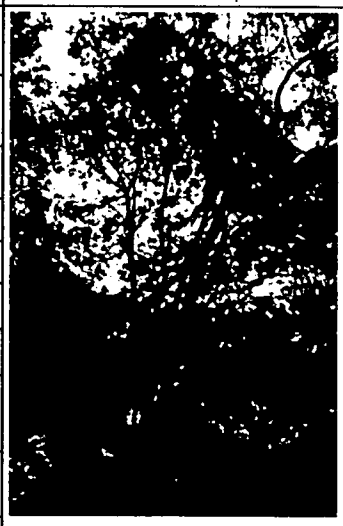





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

340

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**160**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-274	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Ceiba		
	ESPECIE	*Ceiba pentandra*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Malvaceae	3,3534	-76,53433333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17	1,17	16,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

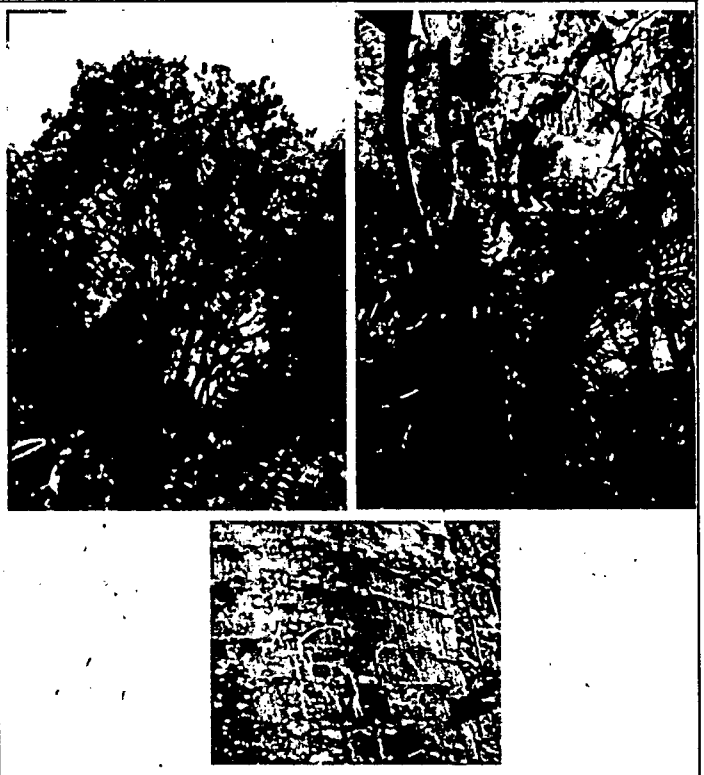

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		161
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-275	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,353066667	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,21	5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

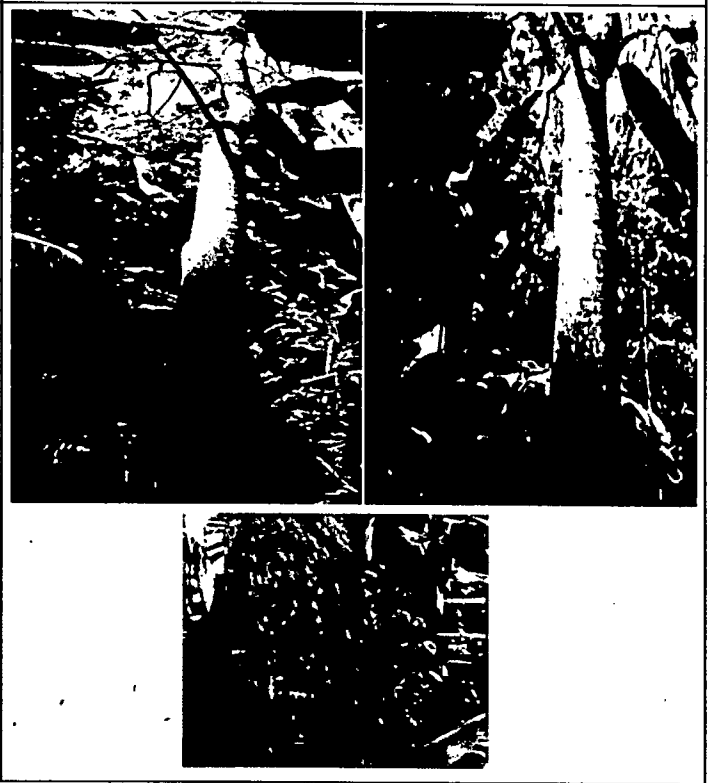

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

341

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**162**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-276	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35305	-76,53445
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12	0,2	4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			163
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-277	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Jagua		
	ESPECIE	*Genipa americana*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Rubiaceae	3,3532	-76,53441667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,28	6,2

REGISTRO FOTOGRAFICO

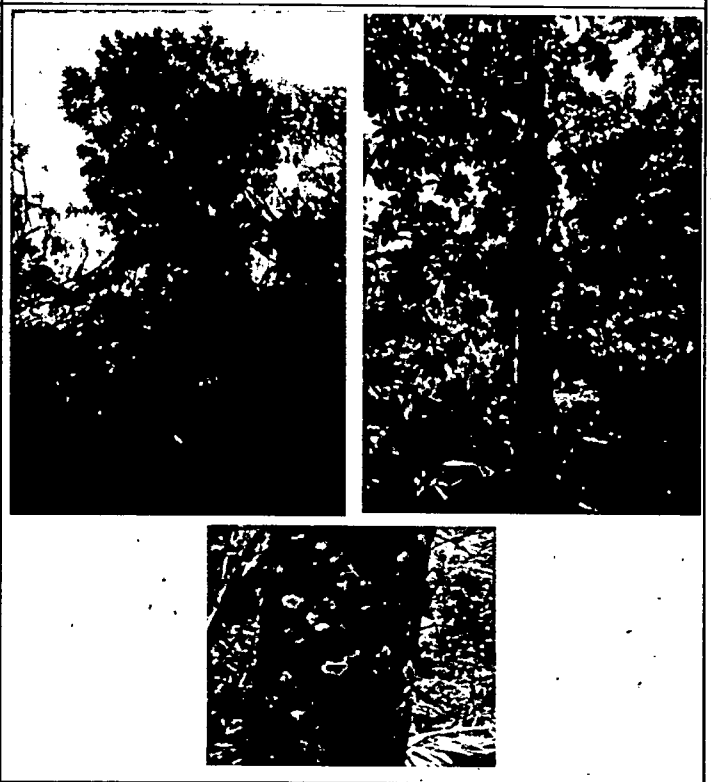

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

342

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**164**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-278	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353316667	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,4	0,3	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**165**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-279	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Vainillo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,353516667	-76,53455
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,23	9

REGISTRO FOTOGRAFICO





ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**166**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-280		**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA** 22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA		**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS	

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3538	-76,53438333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,7	0,33	8,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

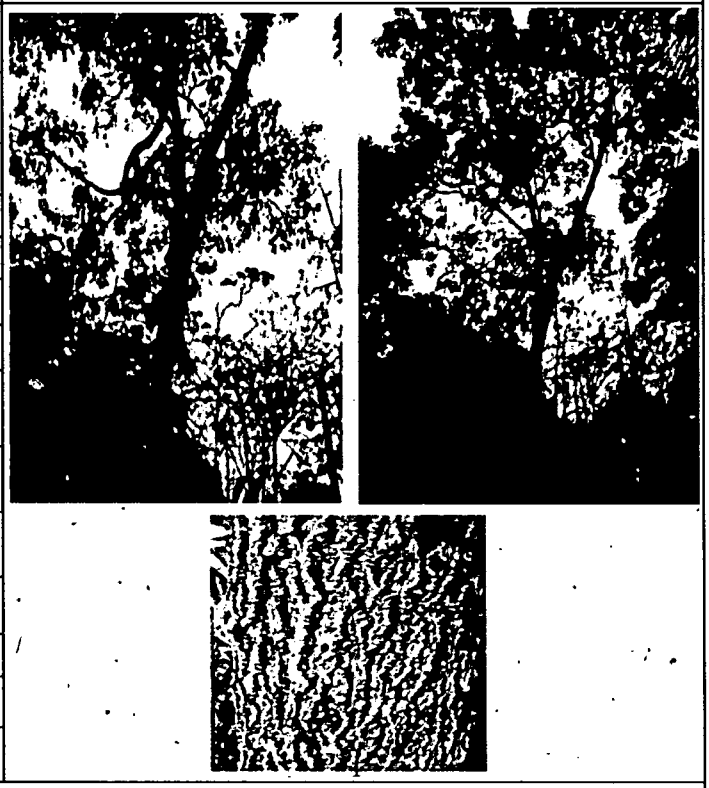

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			167
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-281	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,354783333	-76,53421667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,2	0,14	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

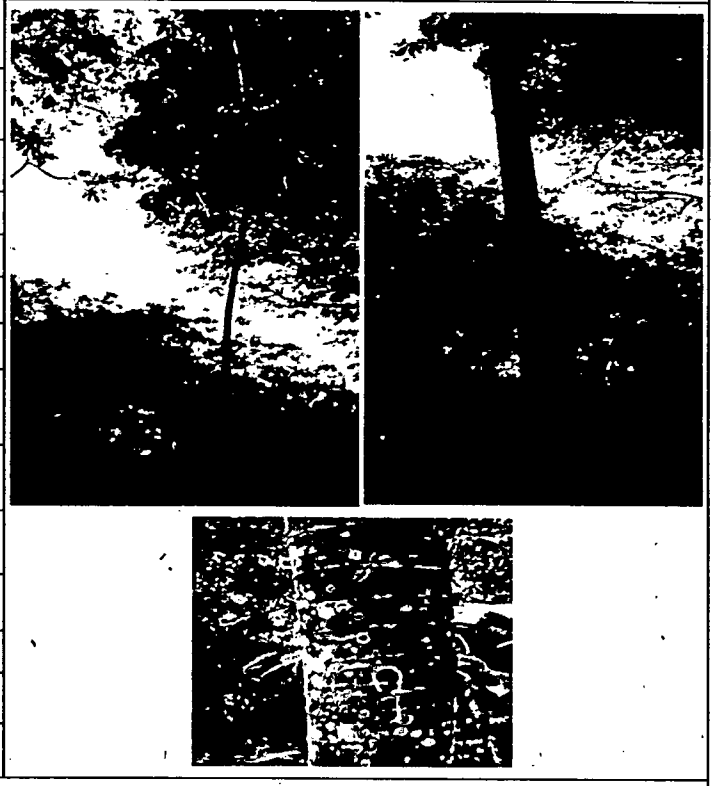

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

344

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**168**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-282	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35495	-76,53401667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,9	0,25	4,1

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			169
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-283	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,355066667	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,27	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

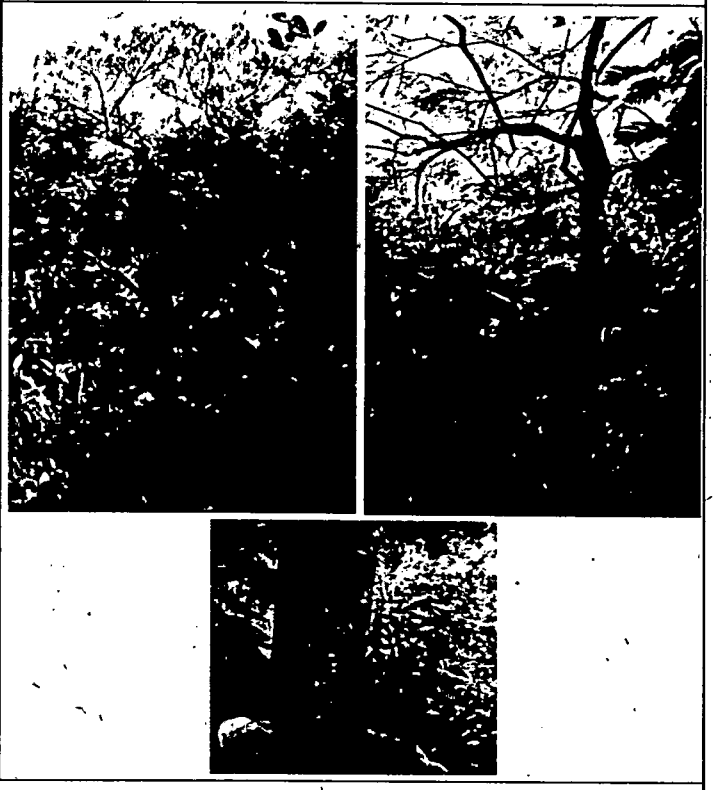

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

345

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**170**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-284	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caracoli**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,355216667	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,7	0,24	7,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**171**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-285	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caracoli**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,355266667	-76,534
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
18,2	0,33	9,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

346

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**172**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-286	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Caracoli	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Anacardium excelsum*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Anacardiaceae	3,35535	-76,53403333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,56	8,68

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

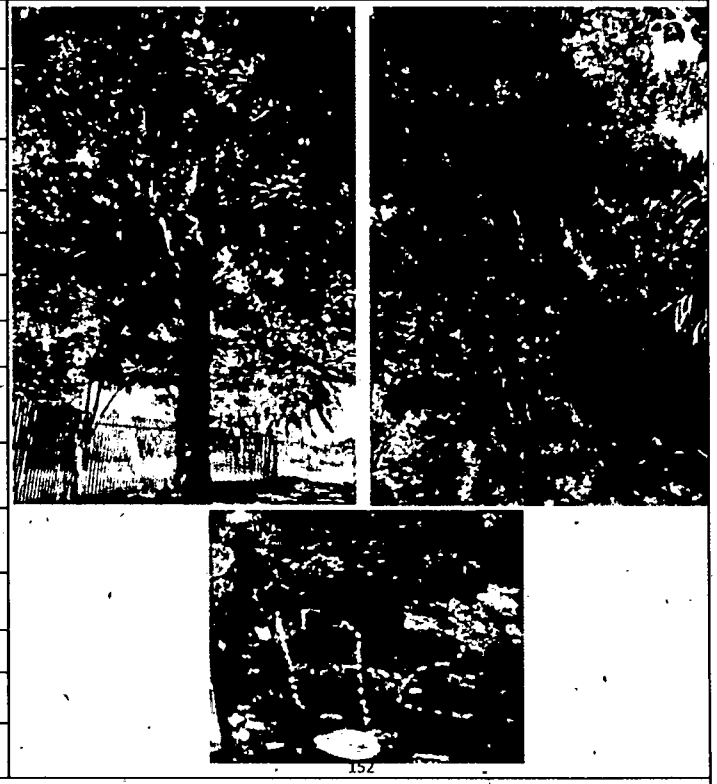

152

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**173**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-287	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Palma africana**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,354667	-76,534263
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,5	0,58	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**174**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-288	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma africana	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Arecaceae	3,35525	-76,53888333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13	0,42	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**175**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-289	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Palma africana	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Elaeis guineensis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Arecaceae	3,355316667	-76,5338
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA


Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,6	0,46	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

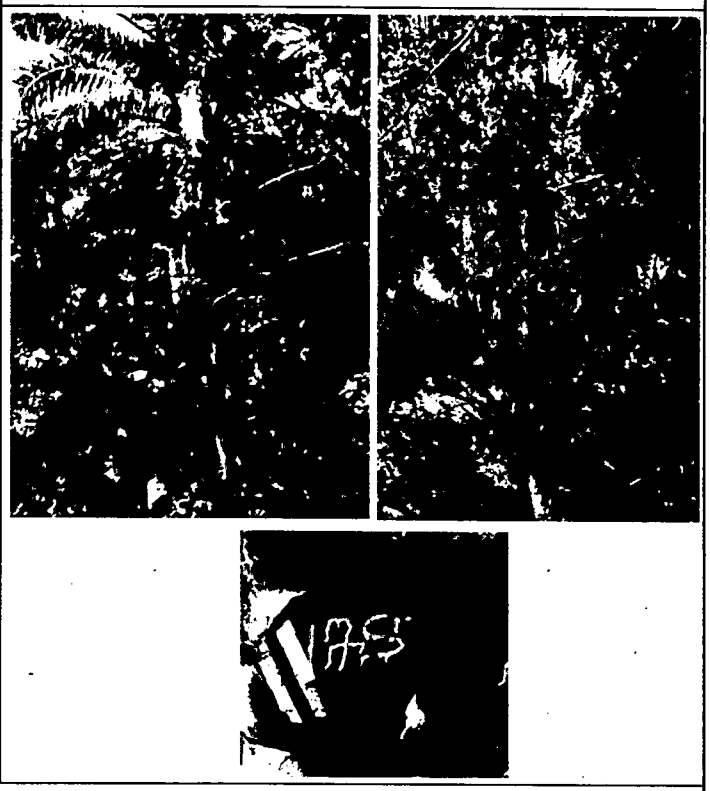

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

345

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**176**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-290	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,355116667	-76,53373333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	


DENDROMETRIA

Altura total (M)	**DAP (M)**	**Diametro copa (M)**
12,6	0,13	2,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



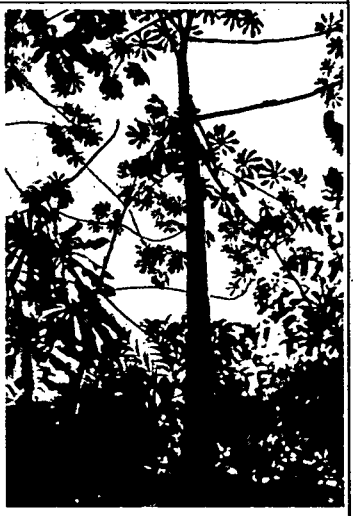



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		177
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-291	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Meliaceae	3,354383333	-76,53365
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15	0,46	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**178**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-292	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL:				
	NC	**Caoba**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,354366667	-76,5337
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,4	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			179
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-293	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Meliaceae	3,35425	-76,53361667
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,7	0,45	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**180**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-294	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353883333	-76,53353333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,3	0,35	3,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		181
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-295	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,35372	-76,533549
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
15,4	0,3	3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**182**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-296	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,353716667	-76,5353
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,2	0,25	4,2


ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



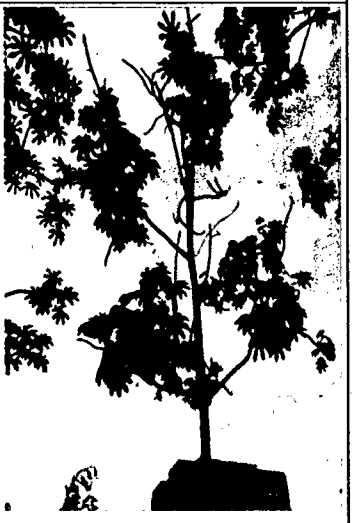



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	**NO**	**AVIFAUNA**	**NO**
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	**SI**	**NUTRICION VEGETAL**	**SI**

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	19/11/2025	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			183
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-297	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,353683333	-76,53363333
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
14,2	0,45	6,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

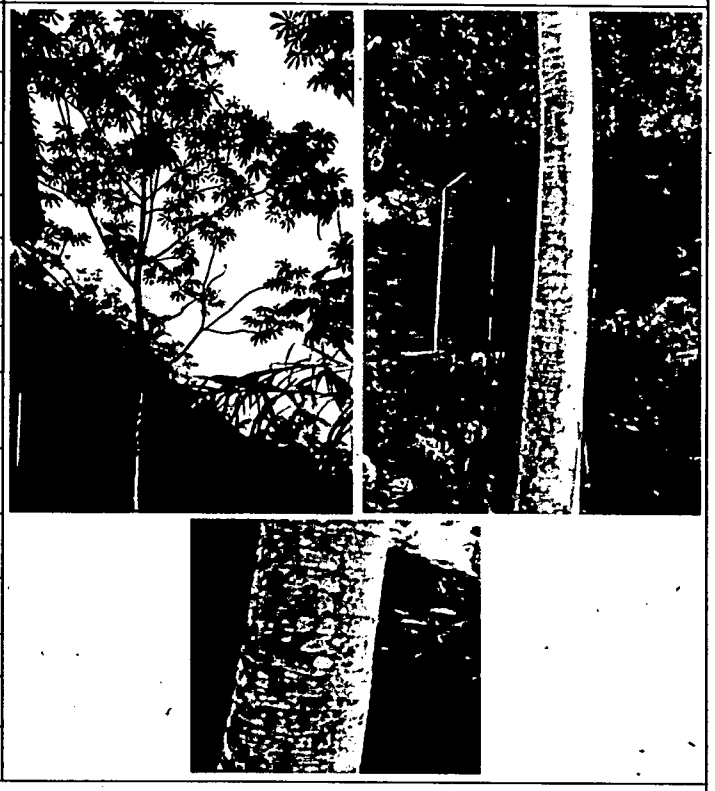

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

352

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**184**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-298	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Yarumo**		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35355	-76,53435
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
16	0,89	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900	NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO			185
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-299	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Urticaceae	3,35363	-76,53433
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
17,5	0,9	3,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**186**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-300	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Caoba		
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35363	-76,53428
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,5	7,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**187**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-301	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Caoba**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Swietenia macrophylla*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35367	-76,5342
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,9	8,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**188**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-302	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Trompillo		
	ESPECIE	*Guarea guidonia*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Meliaceae	3,35382	-76,53398
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,2	0,5	5,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





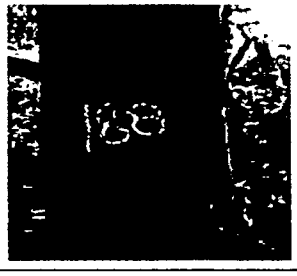

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**189**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-303	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Yarumo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,3538	-76,53415
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,24	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

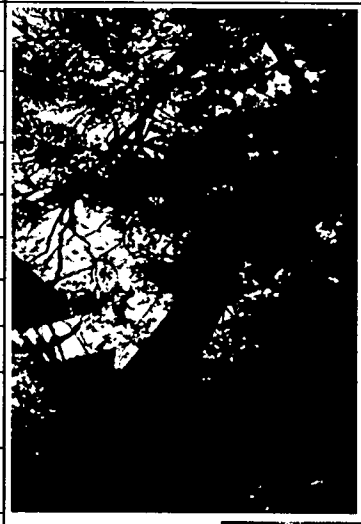





OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**190**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-304	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**		
ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**	
FAMILIA	Fabaceae	3,35387	-76,53333	
No. CENSO ARBOREO 2015	0			
No CENSO ARBOREO 2023	0			

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,5	0,3	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA


Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**191**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-305	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35402	-76,54985
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,2	0,55	4,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

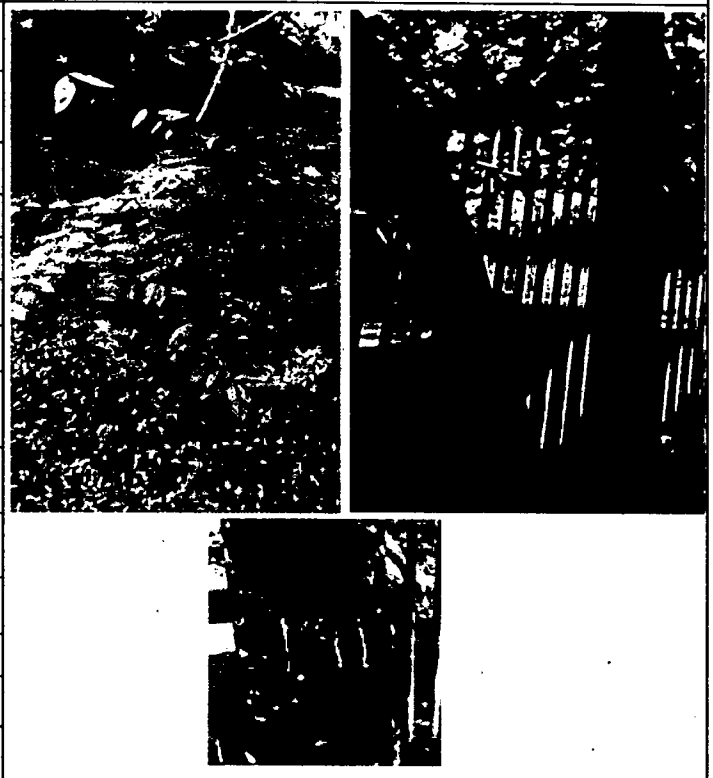

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

356

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	16/05/1900		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**192**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-306	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35417	-76,54995
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
13,4	0,48	6,7

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO. Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		193
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-307	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,35433	-76,53342
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,76	5,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







152

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

397

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025		**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**		**194**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-308	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35455	-76,53345
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	1,62	7,8

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	1/01/1900		NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO		195
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-309	BARRIO	PARCELACION SPANCE	COMUNA	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	HUMEDAL	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			GEOREFERENCIACION	
	NC	Vainillo		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	LATIDUD	LONGITUD
	FAMILIA	Fabaceae	3,35463	-76,5335
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,8	0,6	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		


ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





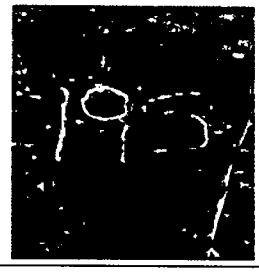

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	AVIFAUNA	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	NUTRICION VEGETAL	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

356

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**196**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-310	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	Yarumo		
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35493	-76,53365
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,3	0,2	4,3

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**197**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-311	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		


DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Yarumo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Cecropia peltata*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Urticaceae	3,35505	-76,53373
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,3	4,5

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		
ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		
ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

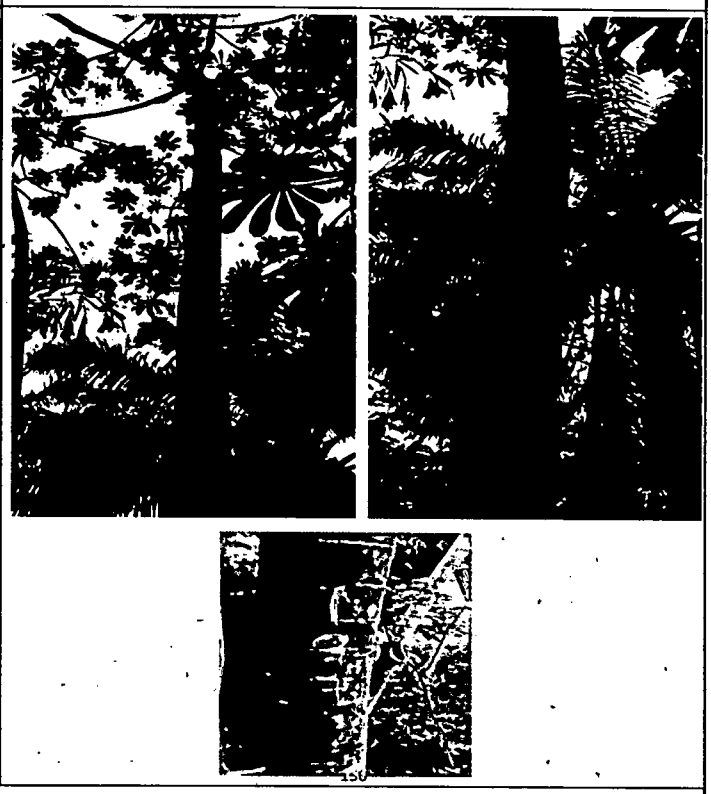

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

359

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**198**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-312	**BARRIO**	PARCELACION SPANCE	**COMUNA**	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	Vainillo	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35488	-76,53382
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,8	7,9

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO

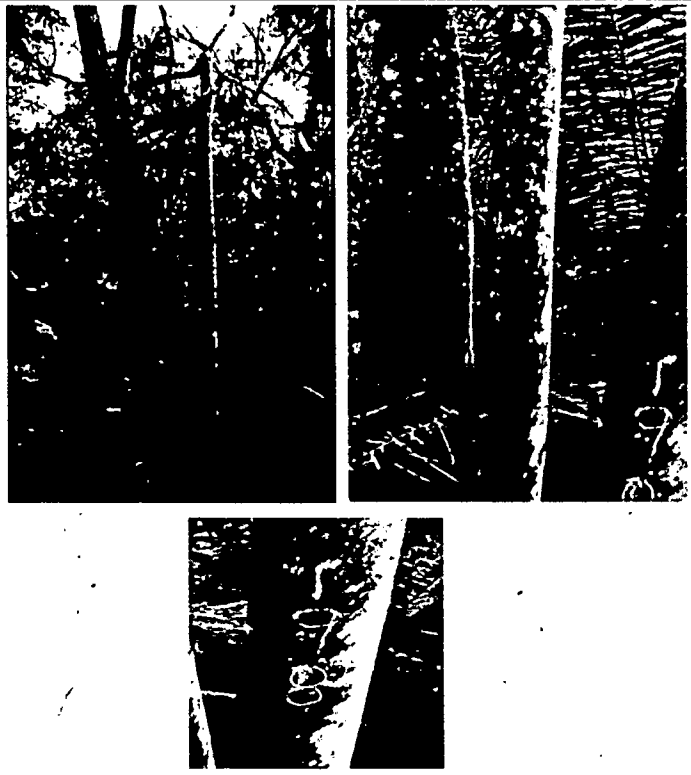

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025	**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**			**199**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-313	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	22
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL			**GEOREFERENCIACION**	
	NC	**Vainillo**		
	ESPECIE	*Senna spectabilis*	**LATITUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35523	-76,53392
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,4	0,53	5,4

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE		
Bueno		X
Regular		
Malo		


ESTADO FISICO SANITARIO COPA		
Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ		
Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO





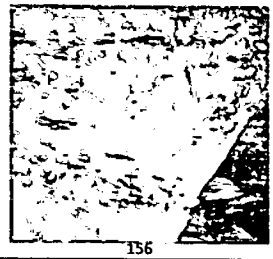

156

OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

360

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	**EVALUACIÓN DE CAMPO** **Contrato de Obra CVC 0741-2025** **Formato: INFORMACION SILVICULTURAL POR INDIVIDUO** **Revisión Dendrométrica - Fitosanitaria y nutricional - Fitoarquitectura**	CONSTRUFUTURO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	21/11/2025			**NUMERO DEL INDIVIDUO EN EL PROYECTO**	**200**
DIRECCIÓN:	Cra. 115a #16-314	**BARRIO**	**PARCELACION SPANCE**	**COMUNA**	
PROFESIONAL A CARGO:	ING. ANA ESPAÑA	**HUMEDAL**	HUMEDAL CAÑASGORDAS		

DATOS GENERALES DEL ÁRBOL				
	NC	**Pizamo**	**GEOREFERENCIACION**	
	ESPECIE	*Erythrina poeppigiana*	**LATIDUD**	**LONGITUD**
	FAMILIA	Fabaceae	3,35552	-76,53397
	No. CENSO ARBOREO 2015		0	
	No CENSO ARBOREO 2023		0	

DENDROMETRIA

Altura total (M)	DAP (M)	Diametro copa (M)
12,1	0,98	8,2

ESTADO FISICO SANITARIO FUSTE

Bueno		X
Regular		
Malo		

ESTADO FISICO SANITARIO COPA

Enfermedades		
Prob Nutricionales		X
Defoliación		
Plagas		

ESTADO FISICO SANITARIO RAIZ

Evidencia afectación		
No evidencia afectación		X

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

0

CONCEPTO TÉCNICO

PODA	NO	**AVIFAUNA**	NO
TRATAMIENTO FITOSANITARIO	SI	**NUTRICION VEGETAL**	SI

PROFESIONAL INGENIERO DE CAMPO: ING. ANA LUCIA ESPAÑA

CONSTRUFUTURO

Nit. 805021814-9

HUMEDALES URBANOS

FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO HUMEDAL CAÑASGORDAS


361

+57 315 3959474 fundacion@construyamosfuturo.com Calle 13 66bis 57 - Oficina 138

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	1	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,4	
DAP (m)	0,38	
Diametro copa (m)	14	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352866667	-76,53475
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

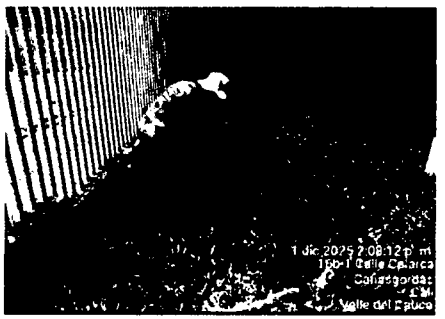VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	1	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuélo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,4	
DAP (m)	0,38	
Diametro copa (m)	14	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352866667	-76,53475
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	



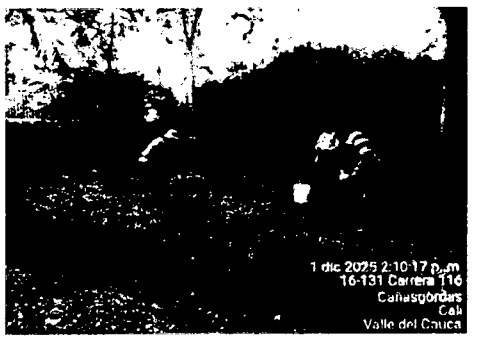



Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	3	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12,1	
DAP (m)	0,3	
Diametro copa (m)	11,64	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3509	-76,53488333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

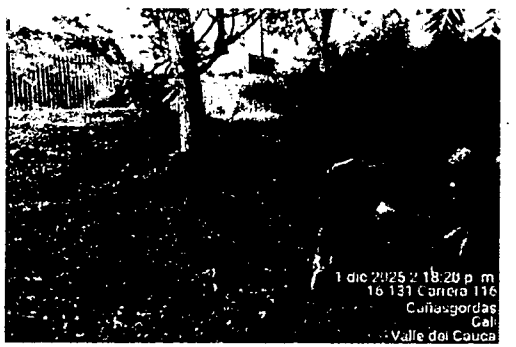VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	4	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,1	
DAP (m)	0,33	
Diametro copa (m)	16,92	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3509	-76,53485
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	5	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,9	
DAP (m)	0,96	
Diametro copa (m)	8	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,350966667	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	6	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,4	
DAP (m)	0,26	
Diametro copa (m)	14,42	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351016667	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	7	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12,1	
DAP (m)	0,12	
Diametro copa (m)	8,42	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,350983333	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	8	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Chiminango	
Nombre científico	*Pithecellobium dulce*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,3	
DAP (m)	0,66	
Diametro copa (m)	16,76	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351016667	-76,5348
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	9	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus benjamina	
Nombre científico	*Ficus benjamina*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,1	
DAP (m)	1,11	
Diametro copa (m)	27,93	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351066667	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	10	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus benjamina	
Nombre científico	*Ficus benjamina*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	14,9	
DAP (m)	1,62	
Diametro copa (m)	30	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35124	-76,53474
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	11	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus benjamina	
Nombre científico	*Ficus benjamina*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	18,3	
DAP (m)	1,19	
Diametro copa (m)	15,46	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35	-76,53496667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

365

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	12	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus benjamina	
Nombre científico	*Ficus benjamina*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,4	
DAP (m)	0,58	
Diametro copa (m)	18,49	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351216667	-76,53493333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	13	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caoba	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	18,8	
DAP (m)	0,23	
Diametro copa (m)	7,62	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351333333	-76,5349
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

296

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	14	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,5	
DAP (m)	0,7	
Diametro copa (m)	3	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3513	-76,53496667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra..115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	15	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7	
DAP (m)	0,9	
Diametro copa (m)	6,62	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351316667	-76,53498333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

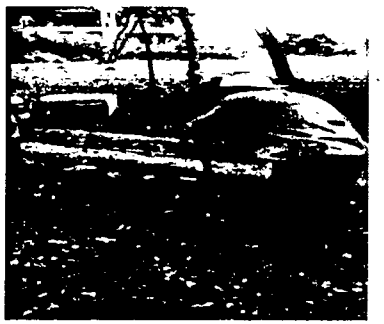VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	16	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	14,4	
DAP (m)	0,95	
Diametro copa (m)	10,3	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352533333	-76,53513333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	17	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,9	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	3,52	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351416667	-76,53501667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	18	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Pizamo	
Nombre científico	*Erythrina poeppigiana*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	19,6	
DAP (m)	0,6	
Diametro copa (m)	16,36	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351333333	-76,53505
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	19	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,5	
DAP (m)	0,7	
Diametro copa (m)	3,54	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351416667	-76,53503333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	20	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mestizo	
Nombre científico	*Cupania glabra*	
Familia	Sapindaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,2	
DAP (m)	0,28	
Diametro copa (m)	7,62	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351433333	-76,53525
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	21	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caoba	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12	
DAP (m)	0,26	
Diametro copa (m)	11,21	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351383333	-76,53506667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	22	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,8	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	3,64	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351333333	-76,53513333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES


Número de árbol	23	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Trompillo	
Nombre científico	*Guarea guidonia*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,9	
DAP (m)	0,08	
Diametro copa (m)	3,21	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351366667	-76,5351
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO



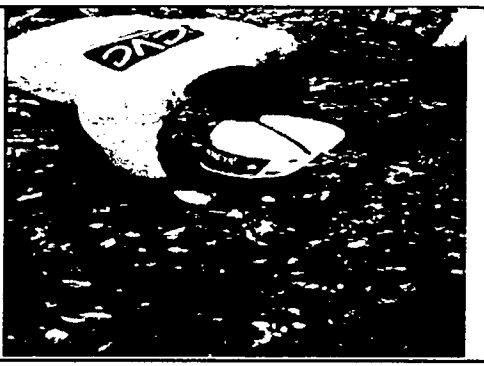

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES


Número de árbol	24	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Trompillo	
Nombre científico	*Guarea guidonia*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,2	
DAP (m)	0,28	
Diametro copa (m)	7,59	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3513	-76,5351
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO



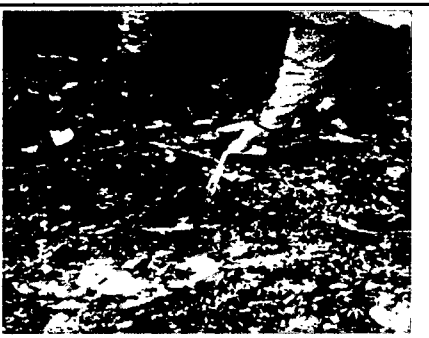

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	25	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,9	
DAP (m)	0,46	
Diametro copa (m)	16,16	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351333333	-76,53505
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

163

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	26	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Trompillo	
Nombre científico	*Guarea guidonia*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12,1	
DAP (m)	0,14	
Diametro copa (m)	6,26	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351316667	-76,53508333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES

Número de árbol	27	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,5	
DAP (m)	0,05	
Diametro copa (m)	3	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3514	-76,53498333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	28	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	TACHUELO	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9	
DAP (m)	0,05	
Diametro copa (m)	2,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351216667	-76,53508333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

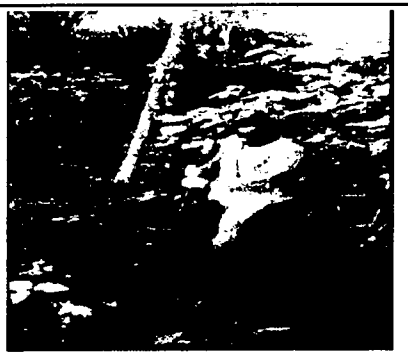



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	29	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,5	
DAP (m)	0,39	
Diametro copa (m)	28	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351183333	-76,53523333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	30	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,5	
DAP (m)	0,67	
Diametro copa (m)	32,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35115	-76,53515
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

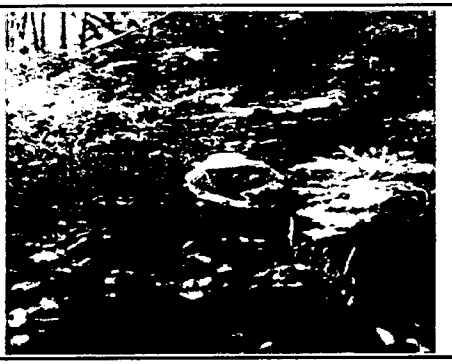



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	31	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,1	
DAP (m)	0,33	
Diametro copa (m)	10	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351116667	-76,53525
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

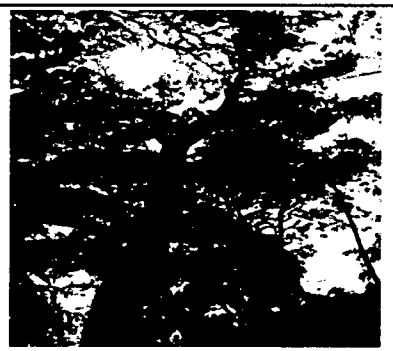

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	32	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Trompillo	
Nombre científico	*Guarea guidonia*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,4	
DAP (m)	0,66	
Diametro copa (m)	32,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35115	-76,53513333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	

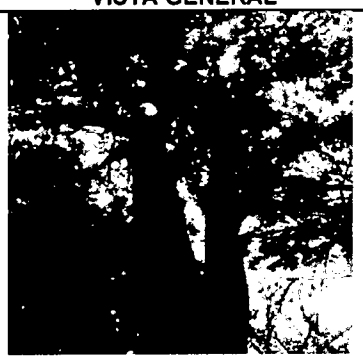





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	33	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Caoba	
Nombre científico	*Swietenia macrophylla*	
Familia	Meliaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,1	
DAP (m)	0,09	
Diametro copa (m)	3,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351166667	-76,53508333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	34	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	5,3	
DAP (m)	0,06	
Diametro copa (m)	3	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35145	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	





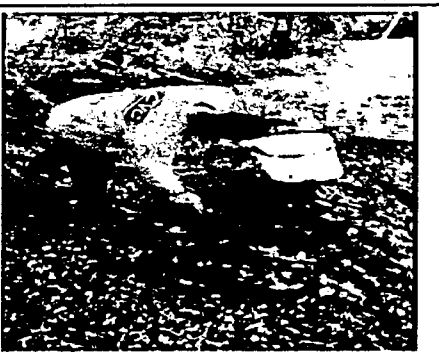

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	35	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	14,4	
DAP (m)	0,25	
Diametro copa (m)	11,66	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351433333	-76,53471667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

343

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	36	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Pizamo	
Nombre científico	*Erythrina poeppigiana*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	3	
DAP (m)	0,9	
Diametro copa (m)	9,4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352816667	-76,53396667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	37	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tulipan africano	
Nombre científico	*Spathodea campanulata*	
Familia	Bignoniaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12,7	
DAP (m)	0,8	
Diametro copa (m)	7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352783333	-76,53393333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

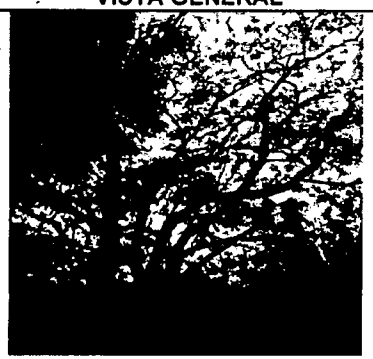

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	38	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Saman	
Nombre científico	*Albizia saman*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	16	
DAP (m)	1	
Diametro copa (m)	37,6	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351566667	-76,53481667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	39	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jigua	
Nombre científico	*Aiouea montana*	
Familia	Lauraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,9	
DAP (m)	0,06	
Diametro copa (m)	3,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35155	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	40	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol del pan	
Nombre científico	*Artocarpus altilis*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	4,4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351616667	-76,53481667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	





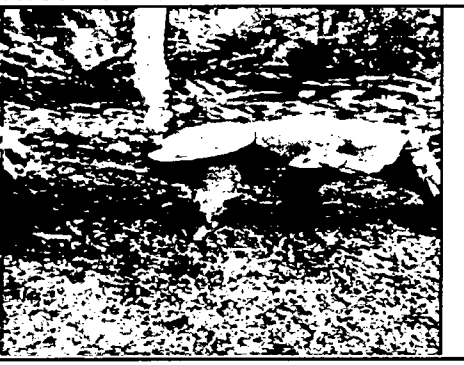

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	41	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,2	
DAP (m)	0,13	
Diametro copa (m)	4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3516	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	42	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8.3	
DAP (m)	0.15	
Diametro copa (m)	6	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351683333	-76,53466667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	43	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mandarino	
Nombre científico	*Citrus reticulata*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	5,4O	
DAP (m)	0,35	
Diametro copa (m)	8	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351816667	-76,53466667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	44	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	11,6	
DAP (m)	0,13	
Diametro copa (m)	5,32	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3518	-76,53471667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	

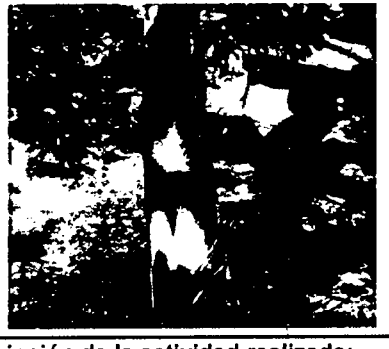





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	45	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,4	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	6,36	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351866667	-76,53473333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

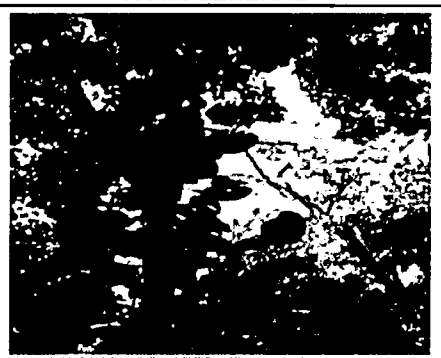

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

384

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	46	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,7	
DAP (m)	0,07	
Diametro copa (m)	3,11	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351989	-76,534613
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL — **APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	47	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	5,3	
DAP (m)	0,03	
Diametro copa (m)	2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351933333	-76,534
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	48	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,4	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352016667	-76,53458333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	49	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,3	
DAP (m)	0,11	
Diametro copa (m)	4,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351916667	-76,53471667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	50	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ficus benjamina	
Nombre científico	*Ficus benjamina*	
Familia	Moraceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,6	
DAP (m)	0,14	
Diametro copa (m)	4,2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352	-76,5346
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	51	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,2	
DAP (m)	0,1	
Diametro copa (m)	3,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351987	-76,534491
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	52	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	16,5	
DAP (m)	1,5	
Diametro copa (m)	7,9	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351816667	-76,53381667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	53	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,3	
DAP (m)	0,1	
Diametro copa (m)	7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352083333	-76,53465
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

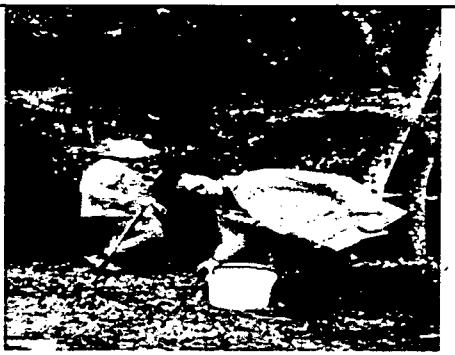



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATÓ DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	54	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,4	
DAP (m)	0,09	
Diametro copa (m)	7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352083333	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	55	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,5	
DAP (m)	0,14	
Diametro copa (m)	7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3521	-76,53461667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

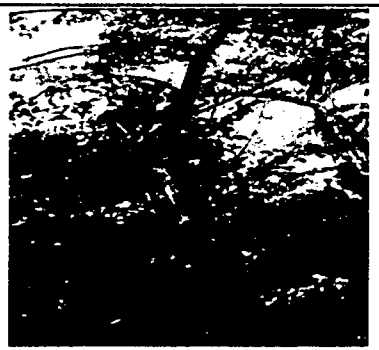

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	56	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,4	
DAP (m)	0,14	
Diametro copa (m)	6,72	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352066667	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES


Número de árbol	57	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,9	
DAP (m)	0,17	
Diametro copa (m)	17,23	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352133333	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GÉNERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO



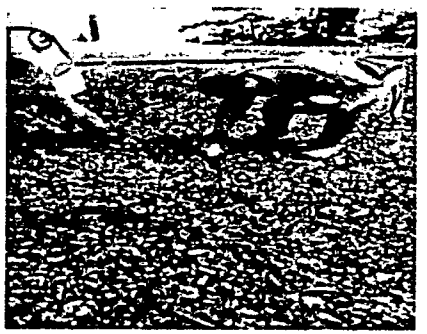

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

390

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	58	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8	
DAP (m)	0,16	
Diametro copa (m)	6,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352066667	-76,53461667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	59	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,5	
DAP (m)	0,17	
Diametro copa (m)	9,63	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352083333	-76,5347
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA — **Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	60	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mandarino	
Nombre científico	*Citrus reticulata*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,1	
DAP (m)	0,68	
Diametro copa (m)	8,7	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352133333	-76,53468333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

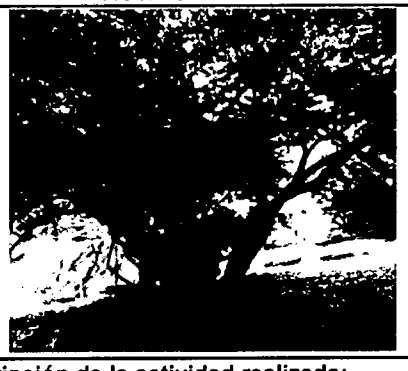

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

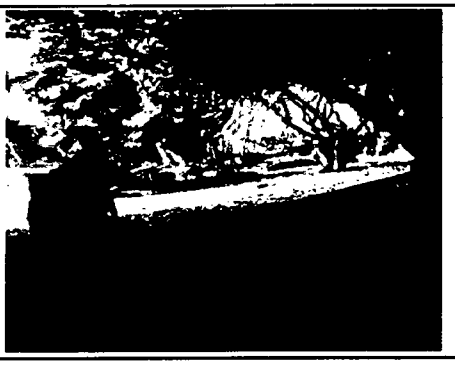



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES


Número de árbol	61	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mandarino	
Nombre científico	*Citrus reticulata*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,2	
DAP (m)	0,43	
Diametro copa (m)	4,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352233333	-76,53468333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO



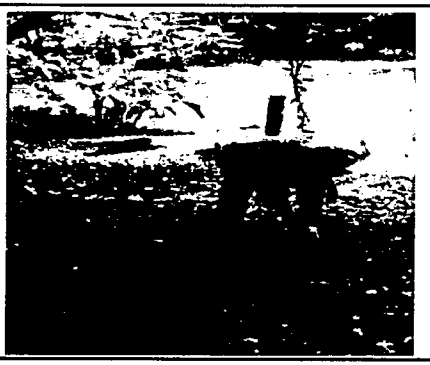

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica


Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA — **Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	62	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mandarino	
Nombre científico	*Citrus reticulata*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,4	
DAP (m)	0,61	
Diametro copa (m)	9,4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35215	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	

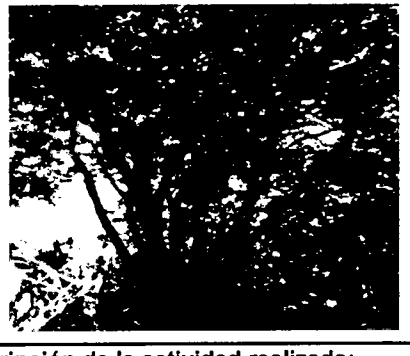





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES


Número de árbol	63	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,2	
DAP (m)	0,08	
Diametro copa (m)	6,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO



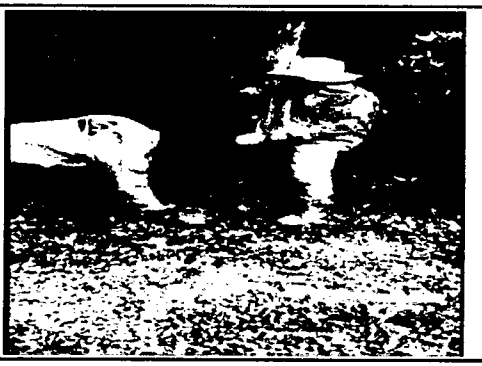

Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	64	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,2	
DAP (m)	0,07	
Diametro copa (m)	6,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351966667	-76,53463333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	65	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7	
DAP (m)	0,08	
Diametro copa (m)	4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351966667	-76,53465
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	66	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,8	
DAP (m)	0,11	
Diametro copa (m)	4,1	
Coordcnadas (Latitud, Longitud)	3,351983333	-76,53465
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

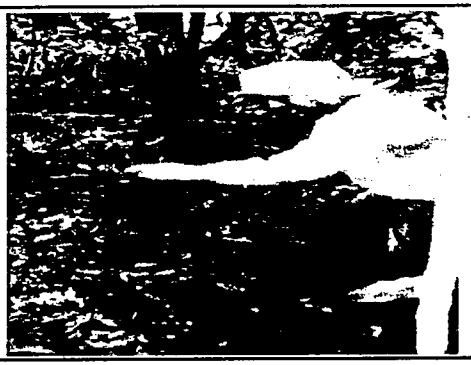



Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	67	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Ceiba	
Nombre científico	*Ceiba pentandra*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	3,4	
DAP (m)	1,3	
Diametro copa (m)	14	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352833333	-76,53381667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

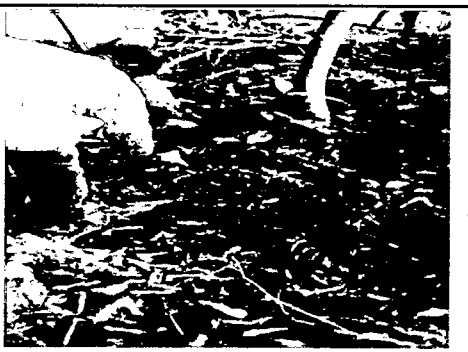VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

393

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	68	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Browniea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,6	
DAP (m)	0,12	
Diametro copa (m)	4,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35195	-76,53468333
Humedal	CANASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	69	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Nogal cafetero	
Nombre científico	*Cordia alliodora*	
Familia	Boraginaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	15,9	
DAP (m)	0,9	
Diametro copa (m)	8,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3531	-76,53388333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

316

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	70	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,2	
DAP (m)	0,54	
Diametro copa (m)	10,06	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352033333	-76,53473333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	71	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Balso real	
Nombre científico	*Ochroma pyramidale*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	12,8	
DAP (m).	0,28	
Diametro copa (m)	5,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35205	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**


394


CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	72	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,8	
DAP (m)	0,13	
Diametro copa (m)	3,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352	-76,53481667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	73	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guásimo	
Nombre científico	*Guazuma ulmifolia*	
Familia	Malvaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,1	
DAP (m)	0,2	
Diametro copa (m)	9,18	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35215	-76,53471667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	74	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Araucaria	
Nombre científico	*Araucaria columnaris*	
Familia	Araucariaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,2	
DAP (m)	0,73	
Diametro copa (m)	17,14	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35225	-76,5346
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO


FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	75	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Mandarino	
Nombre científico	*Citrus reticulata*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,4	
DAP (m)	0,25	
Diametro copa (m)	5,14	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3522	-76,53455
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO

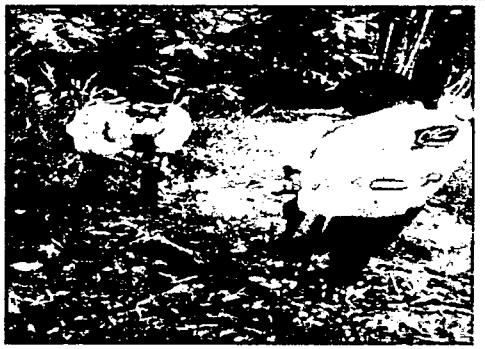



Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

163

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	76	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Casco de buey	
Nombre científico	*Bauhinia variegata*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,9	
DAP (m)	0,33	
Diametro copa (m)	6,37	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351883333	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	77	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jagua	
Nombre científico	*Genipa americana*	
Familia	Rubiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	17,6	
DAP (m)	0,33	
Diametro copa (m)	4,68	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352266667	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:


Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	78	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Casco de buey	
Nombre científico	*Bauhinia variegata*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,2	
DAP (m)	0,1	
Diametro copa (m)	2,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352216667	-76,53476667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

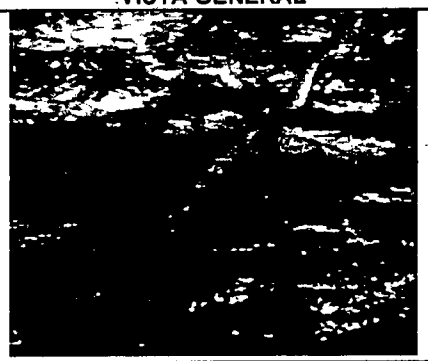VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	79	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Casco de buey	
Nombre científico	*Bauhinia variegata*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,5	
DAP (m)	0,19	
Diametro copa (m)	3,2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352216667	-76,53481667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	80	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Casco de buey	
Nombre científico	*Bauhinia variegata*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,5	
DAP (m)	0,21	
Diametro copa (m)	2,9	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3523	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	81	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Casco de buey	
Nombre científico	*Bauhinia variegata*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,7	
DAP (m)	0,13	
Diametro copa (m)	3,2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35225	-76,53481667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	82	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jagua	
Nombre científico	*Genipa americana*	
Familia	Rubiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8	
DAP (m)	0,28	
Diametro copa (m)	4,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352233333	-76,53485
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL

APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	83	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jagua	
Nombre científico	*Genipa americana*	
Familia	Rubiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	8,6	
DAP (m)	0,11	
Diametro copa (m)	3,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352316667	-76,53485
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	84	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Jagua	
Nombre científico	*Genipa americana*	
Familia	Rubiaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,2	
DAP (m)	0,07	
Diametro copa (m)	3,88	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352283333	-76,53483333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	85	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Araucaria	
Nombre científico	*Araucaria columnaris*	
Familia	Araucariaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	24,8	
DAP (m)	0,46	
Diametro copa (m)	2,5	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,35215	-76,5345
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	86	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	10,7	
DAP (m)	0,22	
Diametro copa (m)	8,2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352716667	-76,53438333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	87	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,7	
DAP (m)	0,12	
Diametro copa (m)	1,8	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352683333	-76,53441667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	88	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	9,5	
DAP (m)	0,2	
Diametro copa (m)	2,3	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352683333	-76,53441667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	
		

Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	89	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Vainillo	
Nombre científico	*Senna spectabilis*	
Familia	Eabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	11,3	
DAP (m)	0,4	
Diametro copa (m)	12,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,3527	-76,53446667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	90	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guanabano	
Nombre científico	*Annona muricata*	
Familia	Annonaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	7,4	
DAP (m)	0,13	
Diametro copa (m)	3,4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352749	-76,534422
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	
VISTA GENERAL	**APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO**	







Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA — **Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	91	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	18,1	
DAP (m)	0,26	
Diametro copa (m)	5,4	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,351928333	-76,53441667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025** **CVC- CONSTRUFUTURO**	**CONSTRUFUTURO**

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	92	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Yarumo	
Nombre científico	*Cecropia peltata*	
Familia	Urticaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	18,2	
DAP (m)	0,26	
Diametro copa (m)	3,2	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352616667	-76,53453333
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	93	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Tachuelo	
Nombre científico	*Zanthoxylum rhoifolium*	
Familia	Rutaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	11,1	
DAP (m)	0,15	
Diametro copa (m)	2,6	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352633333	-76,53451667
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	94	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Árbol de la cruz	
Nombre científico	*Brownea grandiceps*	
Familia	Fabaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,4	
DAP (m)	0,06	
Diametro copa (m)	3,1	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352775	-76,534387
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA	**Firma**

CVC Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATO DE OBRA CVC 0741-2025 CVC- CONSTRUFUTURO	CONSTRUFUTURO

FICHA TÉCNICA FORESTAL MANTENIMIENTO DE ARBOLES

Número de árbol	95	
ID censo arbóreo	0	
Nombre común	Guanabano	
Nombre científico	*Annona muricata*	
Familia	Annonaceae	
Estado fitosanitario	BUENO	
Emplazamiento	BOSQUE URBANO	
Barrio	PARCELACIOONES PANCE	
Comuna	22	
Altura (m)	6,7	
DAP (m)	0,2	
Diametro copa (m)	2,24	
Coordenadas (Latitud, Longitud)	3,352666667	-76,536
Humedal	CAÑASGORDAS	
Dirección	Cra. 115a #16-115	
Fecha de fertilización	1/12/2025	

VISTA GENERAL



APLICACIÓN DE TRATAMIENTO FITOSANITARIO





Descripción de la actividad realizada:

Aplicación de fertilización edáfica

Elaborado por: Ing.Agrónomo ANA LUCIA ESPAÑA | **Firma**
