

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1			**CONTRATAR LAS ADECUACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LOS DERECHO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ - ANTIOQUIA**	**92 días**	**mié 16/10/24**	**jue 30/1/25**	
2			INICIO	0 días	mié 16/10/24	mié 16/10/24	
3		**1,00**	**OBRAS PRELIMINARES, DEMOLICION, REMOCION, DESMONTE Y RETIRO**	**10 días**	**vie 18/10/24**	**mar 29/10/24**	
4		1,01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	1 día	vie 18/10/24	vie 18/10/24	2FC+2 días
5		1,02	DESMONTE DE BAJANTES DE AGUA LLUVIA	2 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	11
6		1,03	DESMONTE DE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	5CC
7		1,04	DESMONTE DE INCRUSTRACIONES DE BAÑOS	2 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	5CC
8		1,05	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS	2 días	lun 21/10/24	mar 22/10/24	5CC
9		1,06	DESMONTE DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO, INCLUYE RETIRO SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR	3 días	lun 21/10/24	mié 23/10/24	8CC
10		1,07	REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	3 días	jue 24/10/24	dom 27/10/24	9
11		1,08	REMOCION DE PLANTILLA DE NIVELACION Y/O PAÑETE EN CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE CAPA IMPERMEABILIZANTE	1 día	sáb 19/10/24	dom 20/10/24	4
12		1,09	REMOCION DE GUARDAESCOBA INCLUYE RETIRO	2 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	10CC
13		1,10	REMOCION DE PINTURA Y/O ESTUCO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	4 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	10CC
14		1,11	DEMOLICION DE ALFAJÍA EN CONCRETO REFORZADO	4 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	12CC
15		1,12	DEMOLICION DE POYO INCLUYE RETIRO DE	4 días	mar 22/10/24	vie 25/10/24	11CC+2 días
16		1,13	DESMONTE DE REJILLA METALICA	2 días	jue 24/10/24	vie 25/10/24	15CC+2 días
17		1,14	DEMOLICION DE BUITRON	3 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	16
18		1,15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.05 MTS / 0.08 MTS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	5 días	mar 22/10/24	dom 27/10/24	15CC
19		1,16	DEMOLICION DE JARDINERA INTERNA	3 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	17CC
20		1,17	DESMONTE DE CUARTO FRI	2 días	sáb 19/10/24	lun 21/10/24	4CC+1 día

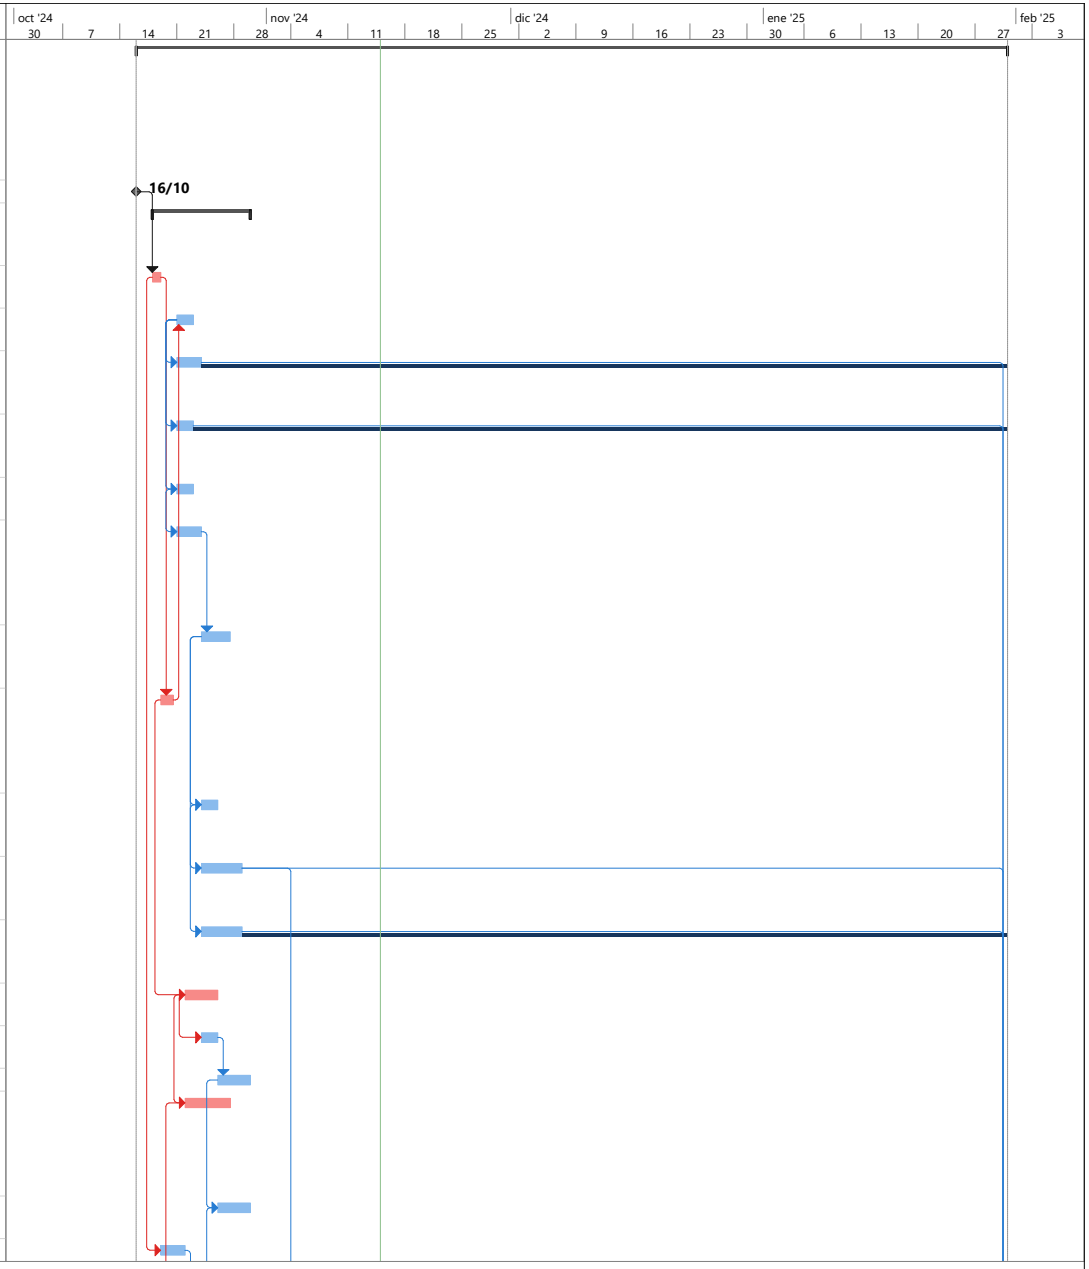

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
21		1,18	DEMOLICIÓN DE MESON ACABADO EN ENCHAPE, GRANITO O SIMILAR INCLUYE RETIRO DE	2 días	mar 22/10/24	mié 23/10/24	20
22		1,19	DEMOLICION DE MURO (E= 0.10MTS/0.15MTS) INCLUYE CORTE CON PULIDORA	3 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	19CC
23		**2,00**	**REPARACIONES, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES**	**33 días**	**lun 21/10/24**	**mié 27/11/24**	
24		2,01	REPARACION DE FISURAS EN MURO INCLUYE LIMPIEZA Y SELLANTE	4 días	vie 25/10/24	mar 29/10/24	22CC-1 día
25		2,02	LIMPIEZA DE MUROS CON CONCENTRACION DE HONGOS, MOHOS, MUSGOS, INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	5 días	vie 25/10/24	mié 30/10/24	24CC
26		2,03	LIMPIEZA BAJO PLACA CON CONCENTRACION DE HONGOS, MOHOS, MUSGOS, INCLUYE DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	6 días	mar 29/10/24	lun 4/11/24	25CC+3 días
27		2,04	LIMPIEZA DE PISO, INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	5 días	jue 24/10/24	mar 29/10/24	21
28		2,05	LIMPIEZA DE TERRAZAS, AZOTEAS, LOSA CANALES INCLUYE REMOCION MOHO, DESMANCHE CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MAQUINA A PRESION	4 días	lun 21/10/24	jue 24/10/24	18CC-2 días
29		2,06	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y/O PUERTA VENTANAS INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE Y SELLO CON SILICONA SI ES	5 días	vie 22/11/24	mié 27/11/24	26FC+15 días
30		2,07	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICA 1.00m X 2.40m INCLUJE PINTURA, CAMBIO DE CERRADURA Y BISAGRAS	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	28
31		2,08	MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICA DOBLE 1.28m X 2.50m INCLUJE PINTURA, CAMBIO DE CERRADURA Y BISAGRAS	1 día	vie 25/10/24	vie 25/10/24	30CC
32		2,09	MANTENIMIENTO DE BARANDA DE MADERA INCLUYE LIJADA, PINTURA, AJUSTE PARA FIJACION	3 días	vie 22/11/24	lun 25/11/24	29CC

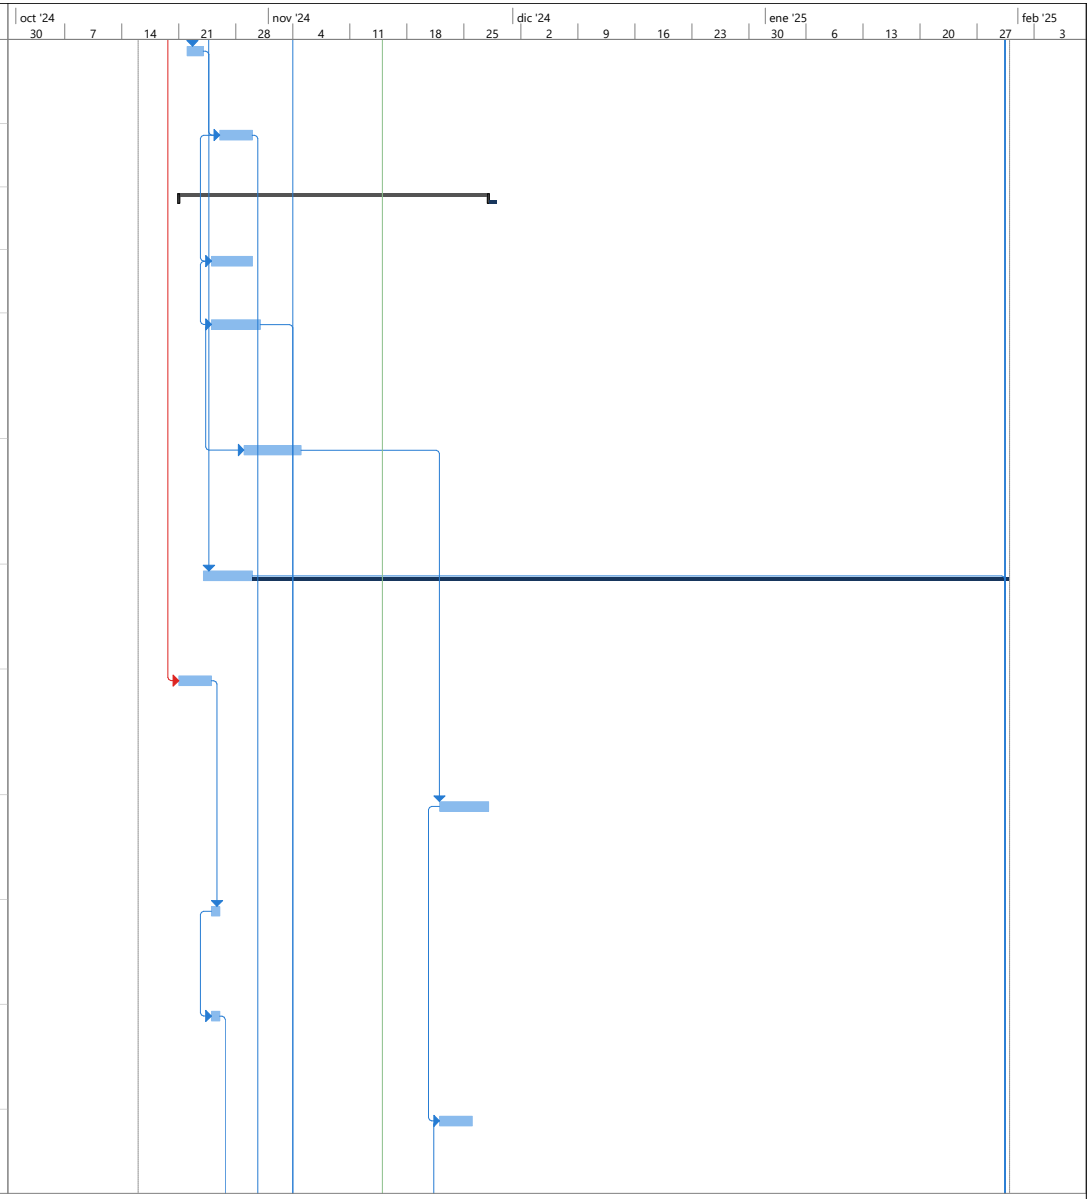

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
33		2,10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REJAS, INCLUYE TRABAJOS DE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	4 días	sáb 23/11/24	mié 27/11/24	32CC+1 día
34		2,11	IMPERMEABILZANTE A DOS MANOS QUE ACTUE COMO REPARADOR EN MURO EN MAL ESTADO POR HUMEDAD INCLUYE REMOCION DE PINTURA, ESTUCO Y/O PAÑETE,	15 días	lun 4/11/24	mié 20/11/24	25FC+3 días
35		2,12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERA METÁLICA (INCLUYE ENGRASE DE RIELES, AJUSTES, LIJADA Y PINTURA ANTICORROSIVA TIPO ESMALTE,DESMONTEY REINSTALACION SI ES NECESARIO)	3 días	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	31
36		2,13	CONCRETO DE 17.2 Mpa (2500 PSI) PARA ALFAJÍA, INCLUYE REFUERZO SE ACERO 2 #2 Y ESTRIBOS #2	6 días	jue 21/11/24	mié 27/11/24	34
37		2,14	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MANTO ASFALTICO INCLUYE PINTURA EN ALUMINIO Y SELLO DE GRIETAS	8 días	lun 18/11/24	mar 26/11/24	34CC+12 días
38		2,15	S/I CUBIERTA EN POLICARBONATO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA	2 días	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	36CC+2 días
39		2,16	CONCRETO DE 21 Mpa ELABORADO EN SITIO PARA COLUMNAS DE 0.12m X 0.20m, INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL DE 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2	5 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24	37CC-2 días
40		2,17	ANCLAJE EPOXICO PARA REFUERZO #3	5 días	vie 15/11/24	mié 20/11/24	39CC
41		**3,00**	**REVESTIMIENTOS**	**18 días**	**vie 15/11/24**	**jue 5/12/24**	
42		3,01	PISO CERAMICA INSTITUCIONAL	10 días	sáb 23/11/24	mié 4/12/24	45CC
43		3,02	GUARDAESCOBA EN CERAMICA INSTITUCIONAL	8 días	mié 27/11/24	jue 5/12/24	42CC+3 días
44		3,03	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	6 días	vie 29/11/24	jue 5/12/24	43CC+2 días
45		3,04	PARED EN CERAMICA DE 0.30m x 0.60m	10 días	sáb 23/11/24	mié 4/12/24	46FC-4 días
46		3,05	PAÑETE ALLANADO PARA FILOS EN MORTERO 1:4	11 días	vie 15/11/24	mié 27/11/24	66CC
47		3,06	PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADA, E=	8 días	mar 19/11/24	mié 27/11/24	46CC+3 días
48		**4,00**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**32 días**	**sáb 2/11/24**	**lun 9/12/24**	

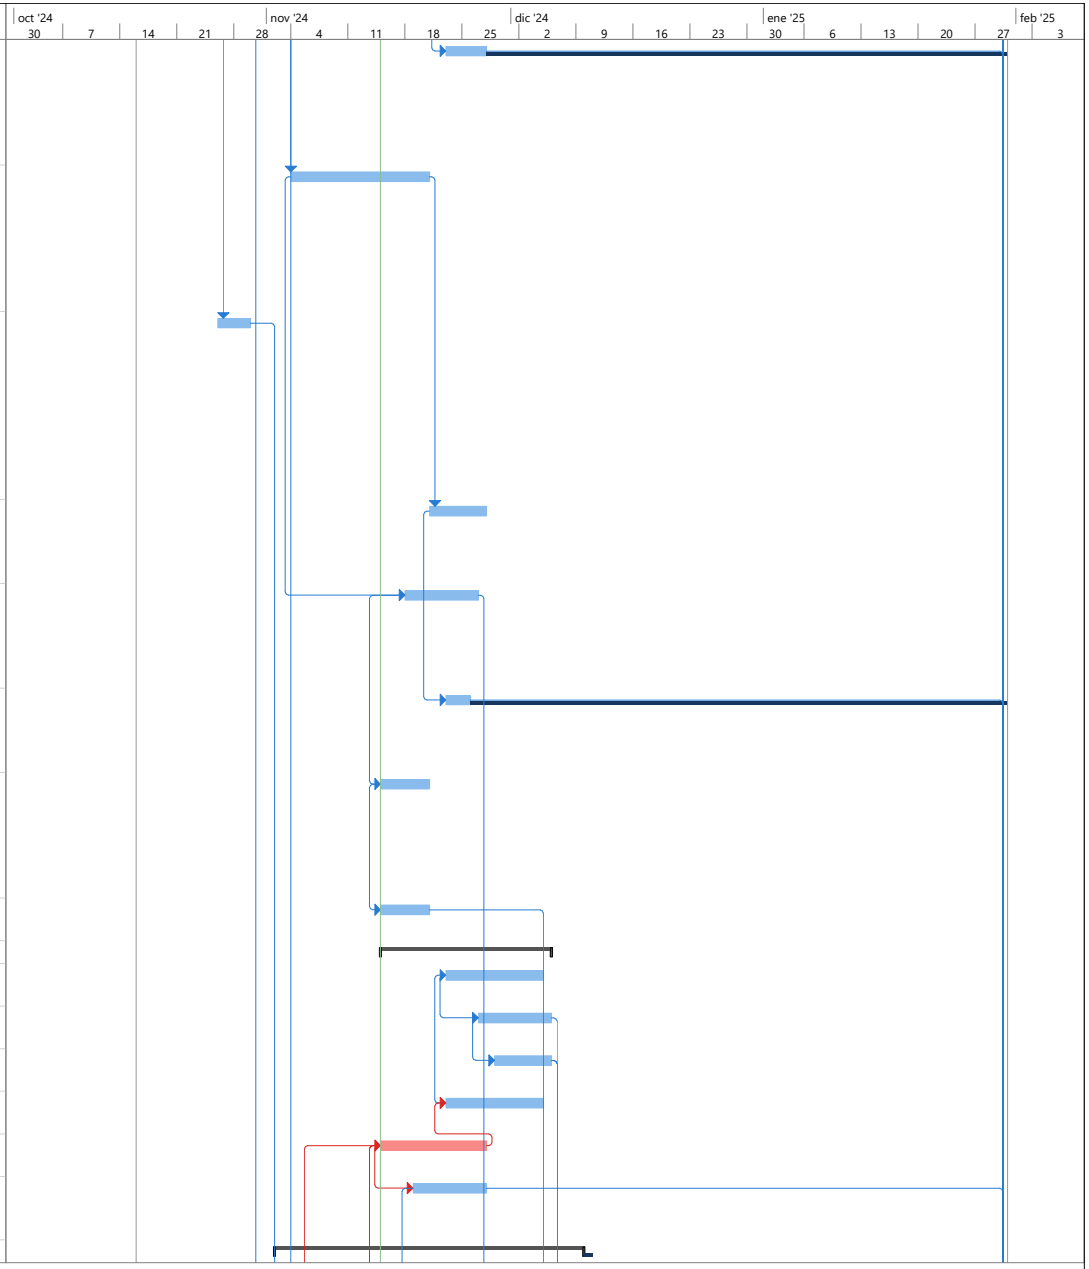

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49		4,01	S/I TUBERIA PRESION DE 3/4" RDE 21 INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	35FC+3 días
50		4,02	S/I ELECTROBOMBA DE 0.5 HP 110V/220V ENTRADA Y SALIDAS DE 3/4" SEGÚN DISEÑO INCLUYE COMPONENTE DE SUCCION	4 días	jue 5/12/24	lun 9/12/24	40FC+12 días
51		4,03	S/I CODO HIDARULICO DE 3/4" X 90°	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	49CC
52		4,04	S/I TUBERIA DE IMPULSION DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	51CC
53		4,05	S/I TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 2000 LTS INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS SUS COMPONENTES	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	50FC-2 días
54		4,06	S/I TUBERIA DE DISTRIBUCION DE 3/4" RDE 21 DE BAJADA INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	52CC
55		4,07	S/I TEE HIDARULICA DE 3/4 CON REDUCCION A 1/2"	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	54CC
56		4,08	S/I BUJE HIDRAULICO PVC 3/4" A 1/2"	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	55CC
57		4,09	S/I CODO HIDARULICO DE 1/2" X 90°	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	56CC
58		4,10	S/I TEE HIDARULICA DE 1/2"	4 días	mar 5/11/24	vie 8/11/24	57CC+2 días
59		4,11	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA SANITARIO INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y RESANE	5 días	mié 6/11/24	lun 11/11/24	58CC
60		4,12	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA LAVATRAPEROS O SIMILAR INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y RESANE	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	59CC+2 días
61		4,13	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA LAVAMANOS INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y RESANE	4 días	vie 8/11/24	mar 12/11/24	60CC
62		4,14	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PARA LAVAPLATOS INCLUYE REGATA, PERFORACION, AMARRE Y	1 día	vie 8/11/24	vie 8/11/24	61CC
63		4,15	S/I TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 13.5 INCLUYE REGATA Y RELLENO	9 días	vie 8/11/24	lun 18/11/24	62CC
64		4,16	S/I VALVULA DE CONTROL EN PVC DE DIAMETRO DE	6 días	mar 12/11/24	lun 18/11/24	63CC+3 días
65		4,17	S/I VALVULA DE CONTROL EN PVC DE DIAMETRO DE	6 días	mar 12/11/24	lun 18/11/24	64CC
66		4,18	S/I ACOMETIDA DOMICILIARIA DE	4 días	vie 15/11/24	mar 19/11/24	65CC+3 días

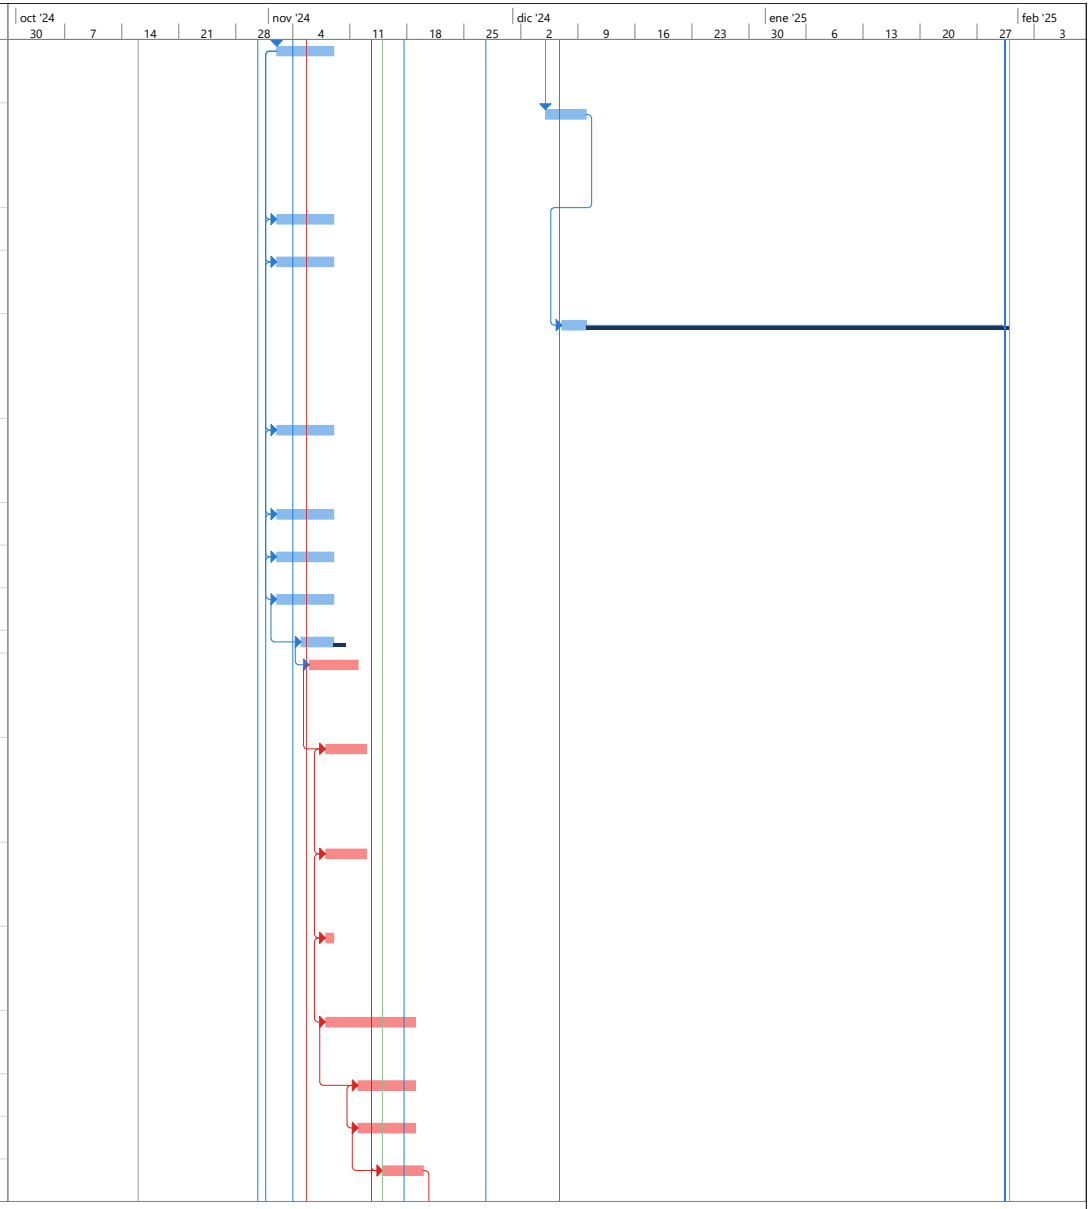

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora			


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
67		4,19	CASETA DE ELECTROBOMBA DE 1m x 1m x 1m EN BLOQUE DE 0.10m x 0.20m x 0.4m, INCLUYE CIMIENTOS, PAÑETE, PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA, LOSA	4 días	mié 20/11/24	dom 24/11/24	66
68		**5,00**	**INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES**	**17 días**	**lun 28/10/24**	**vie 15/11/24**	
69		5,01	PUNTO SANITARIO DE 4" PARA PISO INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	49CC
70		5,02	PUNTO SANITARIO DE 4" PARA PISO INCLUYE PERFORACION, AMARRE Y	6 días	sáb 2/11/24	vie 8/11/24	69CC
71		5,03	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA PISO, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL DE SITIO	6 días	lun 4/11/24	dom 10/11/24	70CC+1 día
72		5,04	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA PISO INCLUYE PERFORACION, AMARRE Y	5 días	lun 4/11/24	vie 8/11/24	71CC
73		5,05	PUNTO SANITARIO DE 2" PARA LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE	6 días	lun 4/11/24	dom 10/11/24	72CC
74		5,06	S/I YEE SANITARIA 4" x 2"	5 días	mar 5/11/24	dom 10/11/2	73CC+1 día
75		5,07	S/I YEE SANITARIA 2"	3 días	mar 5/11/24	jue 7/11/24	74CC
76		5,08	S/I CODO SANITARIO DE 2" X	1 día	jue 7/11/24	jue 7/11/24	75CC+2 días
77		5,09	S/I BUJE PVC SANITARIO 2" A	1 día	jue 7/11/24	jue 7/11/24	76CC
78		5,10	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" DESCOLGADA	4 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	77CC
79		5,11	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" DESCOLGADA	4 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	78CC
80		5,12	BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES 4", INCLUYE ACCESORIOS	3 días	mar 5/11/24	jue 7/11/24	69CC+2 días
81		5,13	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" INCLUYE REGATA Y	9 días	mar 5/11/24	jue 14/11/24	80CC
82		5,14	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE REGATA Y	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	81CC+2 días
83		5,15	CAJA DE REGISTROS EN CONCRETO 21 MPA DE 0,6x0,6x0,6MTS, INCLUYE TAPA, REFUERZO, MORTERO IMPERMEABILIZANTE,	10 días	mar 5/11/24	vie 15/11/24	82CC-2 días
84		5,16	S/I CÚPULA TRAGANTES 6" X	4 días	lun 28/10/24	jue 31/10/24	83CC-7 días
85		5,17	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 4", INCLUYE	8 días	lun 28/10/24	mar 5/11/24	84CC
86		5,18	S/I CODO SANITARIO 4"	6 días	lun 28/10/24	dom 3/11/24	85CC
87		**6,00**	**APARATOS SANITARIOS E INCRUSTRACIONES**	**8 días**	**vie 6/12/24**	**dom 15/12/24**	
88		6,01	S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	4 días	vie 6/12/24	mar 10/12/24	44

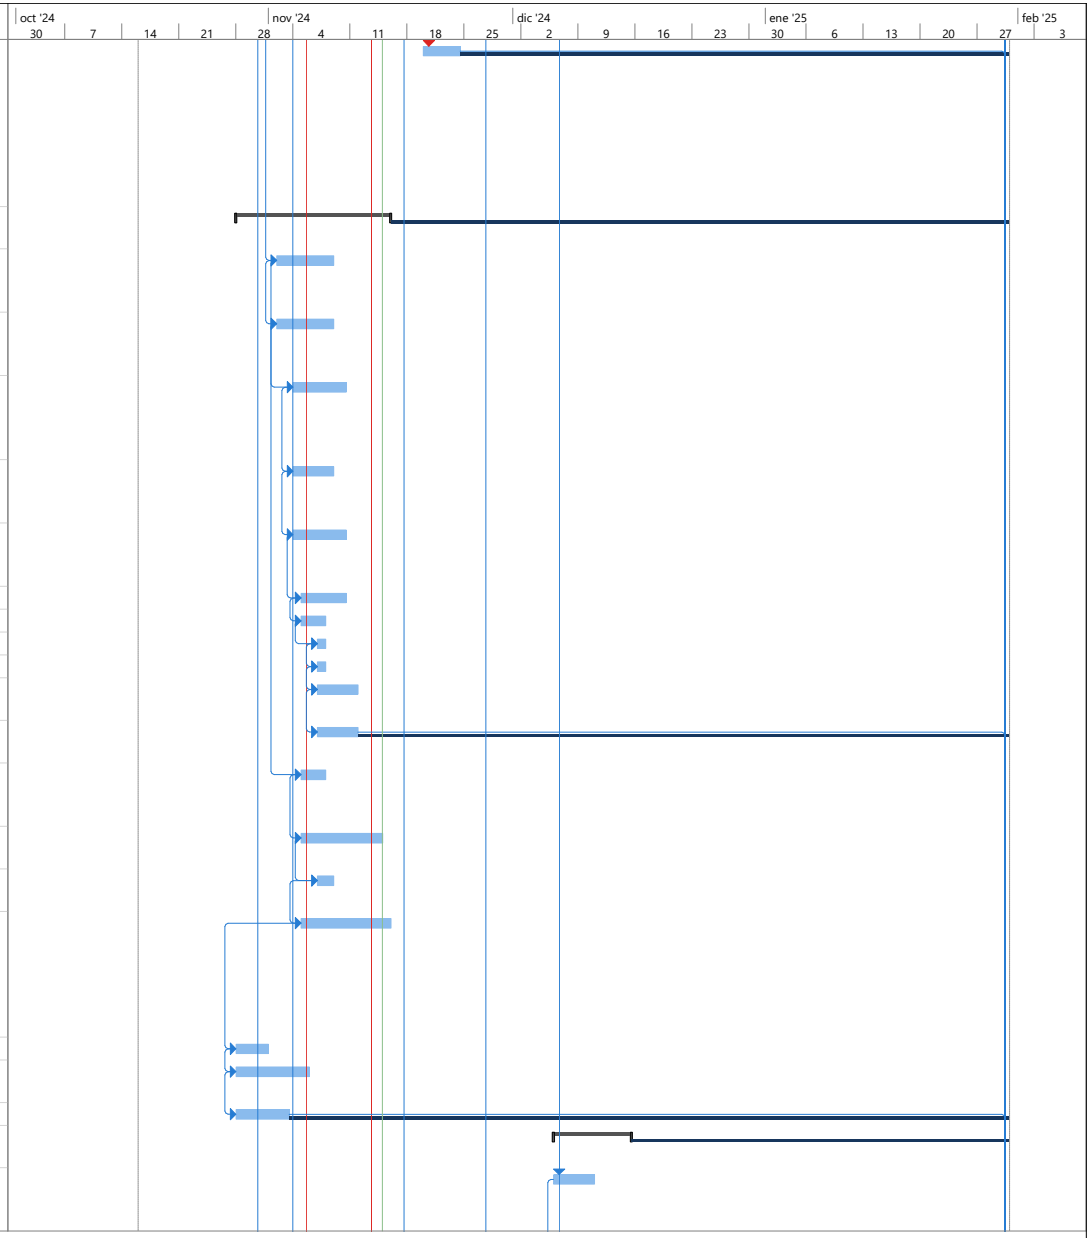

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora			


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
89		6,02	S/I LAVAMANOS CON PEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL	4 días	lun 9/12/24	jue 12/12/24	88CC+2 días
90		6,03	LAVATRAPEROS DE 0.50m x 0.60m x 0.40m EN BLOQUE Y ACABADO ENCHAPADO	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	89CC
91		6,04	S/I LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	90CC
92		6,05	BARRA DOBLE L PISO - MURO PARA BAÑOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	1 día	lun 9/12/24	lun 9/12/24	91CC
93		6,06	BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA ANTIDESLIZANTE 60CM 1	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24	92
94		6,07	S/I REJILLA CUADRADA DE 100 X 100mm	2 días	mar 10/12/24	mié 11/12/24	93CC
95		6,08	S/I DISPENSADOR DE SOBREPONER EN MURO, PARA TOALLAS DE PAPEL, ACABADO EN ACERO	2 días	jue 12/12/24	vie 13/12/24	94
96		6,09	S/I DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED DE UN 1 LITRO	3 días	jue 12/12/24	dom 15/12/24	95CC
97		6,10	S/I DISPENSADOR CROMADO REDONDO DE PARED PARA PAPEL	3 días	jue 12/12/24	dom 15/12/24	96CC
98		6,11	S/I GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS Y/O POCETAS	1 día	vie 13/12/24	vie 13/12/24	97CC+1 día
99		**7,00**	**CARPINTERÍA**	**7 días**	**vie 6/12/24**	**vie 13/12/24**	
100		7,01	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 0.70m x 1.90, INCLUYE MARCO,	1 día	vie 6/12/24	vie 6/12/24	44
101		7,02	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 1.10m x 2.20, INCLUYE MARCO,	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	100
102		7,03	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 0.90m x 2.20, INCLUYE MARCO,	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	101CC

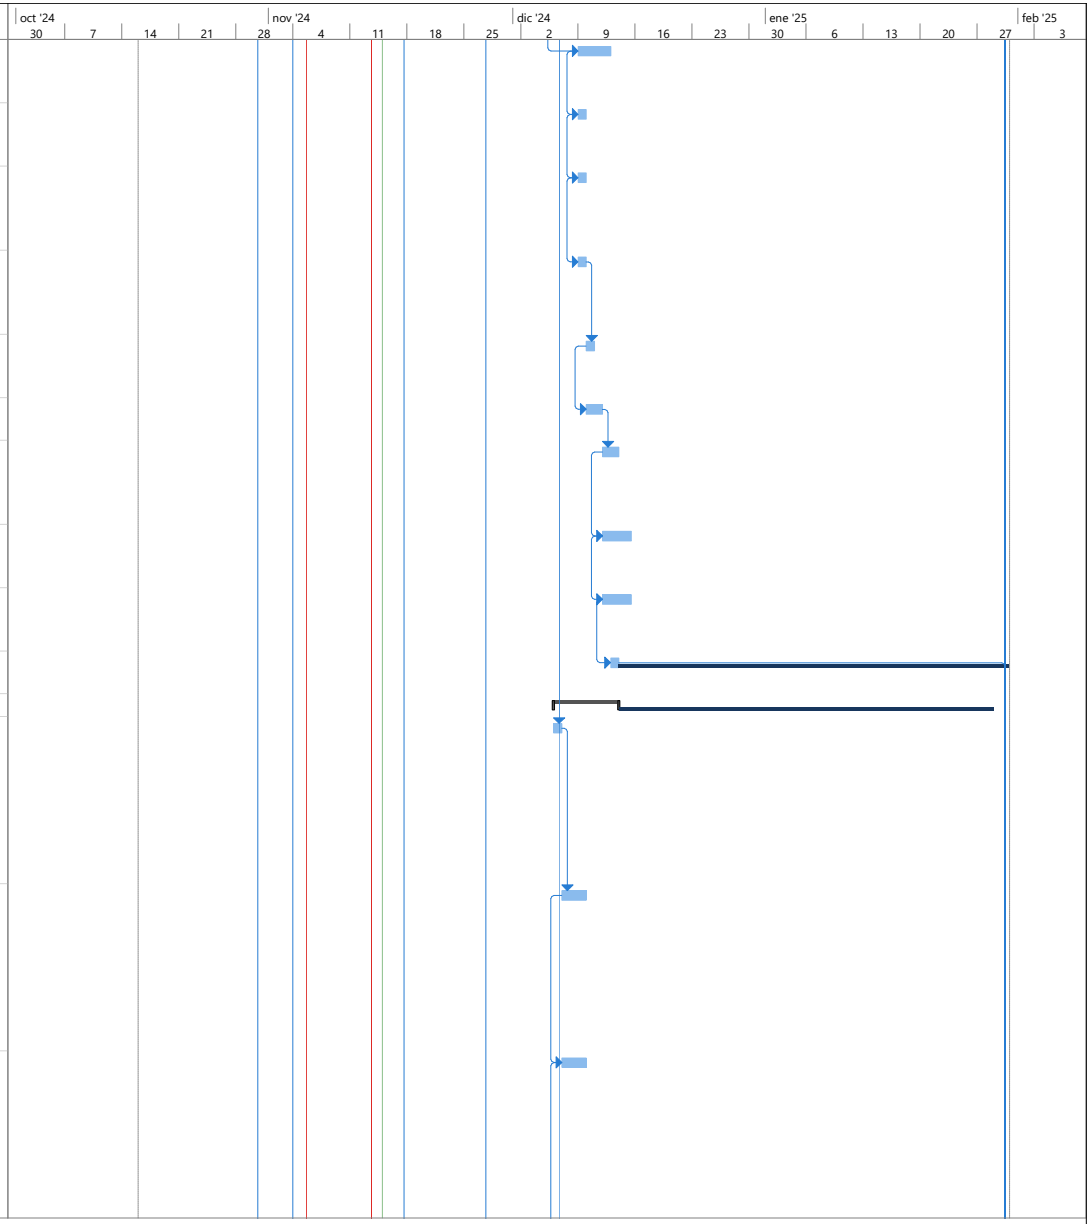

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
103		7,04	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 0.80m x 2.20, INCLUYE MARCO,	1 día	sáb 7/12/24	dom 8/12/24	102CC
104		7,05	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 0.70m x 2.00, INCLUYE MARCO,	2 días	sáb 7/12/24	lun 9/12/24	103CC
105		7,06	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 1.10m x 1.90, INCLUYE MARCO,	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24	104
106		7,07	S/I PUERTA DE MADERA MELAMINICA RANURADA COLOR MACADAMIA VETA VERTICAL (O REF. SIMILAR SEGÚN RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR) DE 0.70m x 2.20, INCLUYE MARCO,	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24	105CC
107		7,08	S/I COCINA INTEGRAL 1.50M, INCLUYE MESÓN SUPERFICIE SOLIDA,MUEBLE INFERIOR Y SUPERIOR EN MADERA,	3 días	mié 11/12/24	vie 13/12/24	106
108		7,09	S/I BARANDAS METALICA EN TUBO GALVANIZADO 1 1/2" A DOS HILERAS CON SOPORTE CADA 1.5M EN TUBO DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE,	1 día	jue 12/12/24	jue 12/12/24	107CC+1 día
109		**8,00**	**ESTRUCTURAS LIVIANAS Y DIVISIONES**	**25 días**	**vie 15/11/24**	**vie 13/12/24**	
110		8,01	MURO LÁMINA DE PANEL YESO DE 12.7MM. DOBLE CARA (E=12 CM) INCLUYE PINTURA A DOS MANOS	10 días	vie 15/11/24	mar 26/11/24	46CC
111		8,02	S/I CIELO RASO EN FIBRA MINERAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	20 días	jue 21/11/24	vie 13/12/24	110CC+5 días

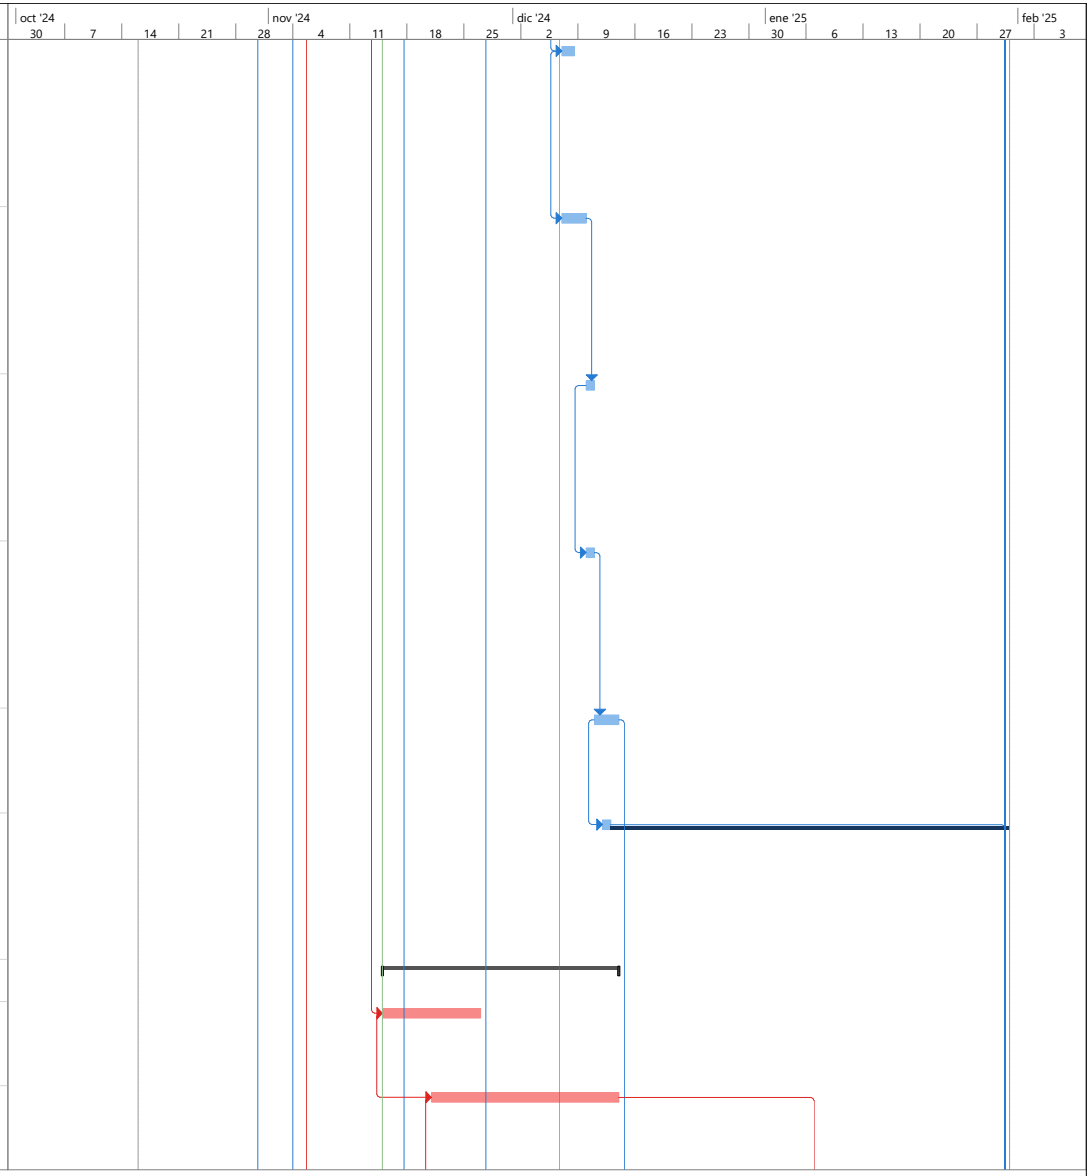

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora			

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
112		8,03	VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA PUERTAS EN VIDRIOS Y/O DIVISIONES MONTADO SOBRE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, PUERTA BATIENTE MONTADA SOBRE BOTELLA DE GIRO PISO Y SUPERIOR EN TUBO DE 2", GATO HIDRÁULICO CERRADURA Y	8 días	jue 5/12/24	vie 13/12/24	111CC+12 días
113		**9,00**	**ESTUCO Y PINTURAS**	**21 días**	**vie 6/12/24**	**lun 30/12/24**	
114		9,01	ESTUCO LINEAL SOBRE PAÑETE MUROS INTERIORES	7 días	vie 6/12/24	vie 13/12/24	43
115		9,02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	18 días	mar 10/12/24	lun 30/12/24	114CC+3 días
116		9,03	PINTURA EN VINILO PARA EXTERIORES (A 3 MANOS)	8 días	vie 20/12/24	dom 29/12/24	115CC+9 días
117		**10,00**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**80 días**	**mié 30/10/24**	**jue 30/1/25**	
118		10,01	SUMINISTRO E INSTLACION DE TRF DE 30 KVA 13,200/220-127 TIPO POSTE: ESTO INCLUYE, ELEMENTOS DE FIJACION Y PROTECCION.	15 días	mar 7/1/25	jue 23/1/25	111FC+20 días
119		10,02	SUMINSTRO E INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA A 13,2 KV, DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA SUBESTACION DE 30 KVA TRIFASICO TIPO POSTE , INCLUYE, APERTURA DE HUECOS E HINCADA DE POSTES, SEGÚN PLANOS	12 días	mar 7/1/25	lun 20/1/25	118CC
120		10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	7 días	sáb 18/1/25	dom 26/1/25	119FC-2 días
121		10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION DESDE TRF DE 30 KVA HASTA GABINETE PRINCIPAL EN 4X No. 2 FASES MAS 1X No. 6,EN	15 días	mar 7/1/25	jue 23/1/25	119CC
122		10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL TIPO INTERIOR DE BAJA TENSION PARA PROTECCIONES, INCLUYE: BREAKER GENERAL DE 3X100 AMP EN AIRE Y DEMAS ELEMENTOS DE PROTECCION, SEGUN	7 días	jue 7/11/24	jue 14/11/24	46CC-7 días

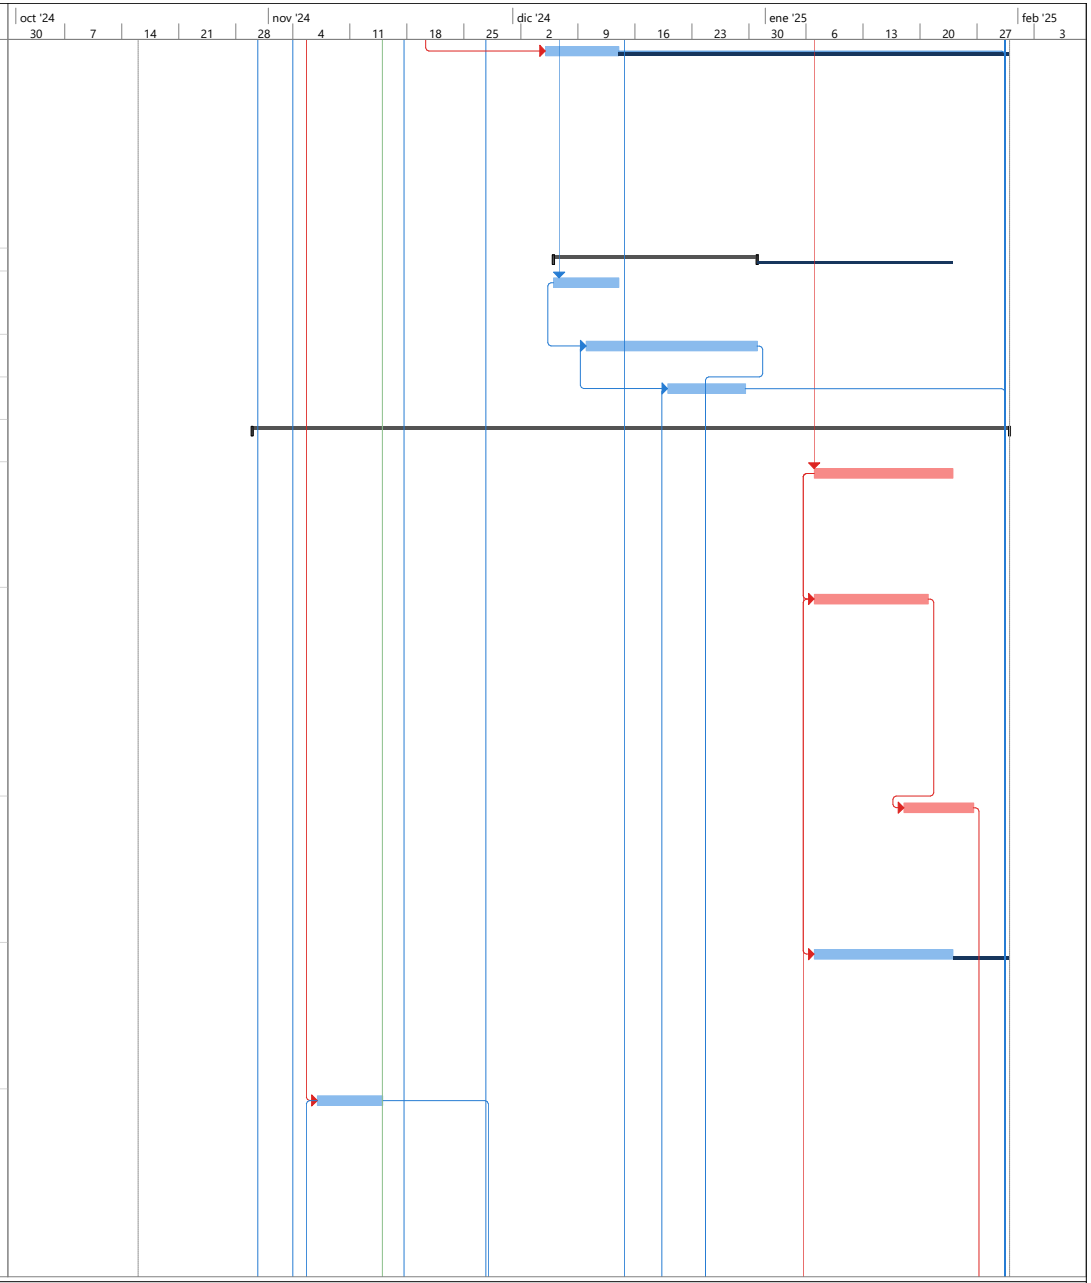


Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base

Hito de línea base	Progreso	Margen de demora
Resumen de línea base	Progreso manual	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
123		10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE BY-PASS TIPO INTERIOR GENERAL EN CUARTO DE RACK DE 10 KVA BT PARA PROTECCIONES , INCLUYE BREAKER DE 3X60 AMP. Y DEMAS ELEMTOS SEGÚN	6 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24	122CC
124		10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN CUARTO DE RACK HASTA T-LTN, CABLE	8 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24	123CC
125		10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL UBICADO EN CUARTO DE RACK HASTA T-A.A.1,	8 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24	124CC
126		10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE GENERAL, HASTA BY-PASS DE 10 KVA EN CUARTO DEL RACK, EN	8 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24	125CC
127		10,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GABINETE BY-PASS DE 10 KVA UBICADO EN EL CUARTO DEL RACK HASTA T-REG UBICADO EN EL CUARTO RACK EN CABLE	8 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24	126CC
128		10,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DESDE GABINETE BY-PASS de 10 KVA HASTA UPS de 10 KVA Y RETORNO DE UPS A	8 días	jue 7/11/24	vie 15/11/24	127CC
129		10,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA CON 6 VARILLAS DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTRS CABLE DESNUDO No. 2/0	6 días	jue 7/11/24	mié 13/11/24	128CC
130		10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 36 CTOS TRIFÁSICO	3 días	jue 7/11/24	dom 10/11/24	129CC
131		10,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MB DE 18 CTOS TRIFÁSICO	5 días	jue 7/11/24	mar 12/11/24	130CC
132		10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES	4 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	131CC
133		10,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS ENCHUFABLES	5 días	jue 7/11/24	mar 12/11/24	132CC

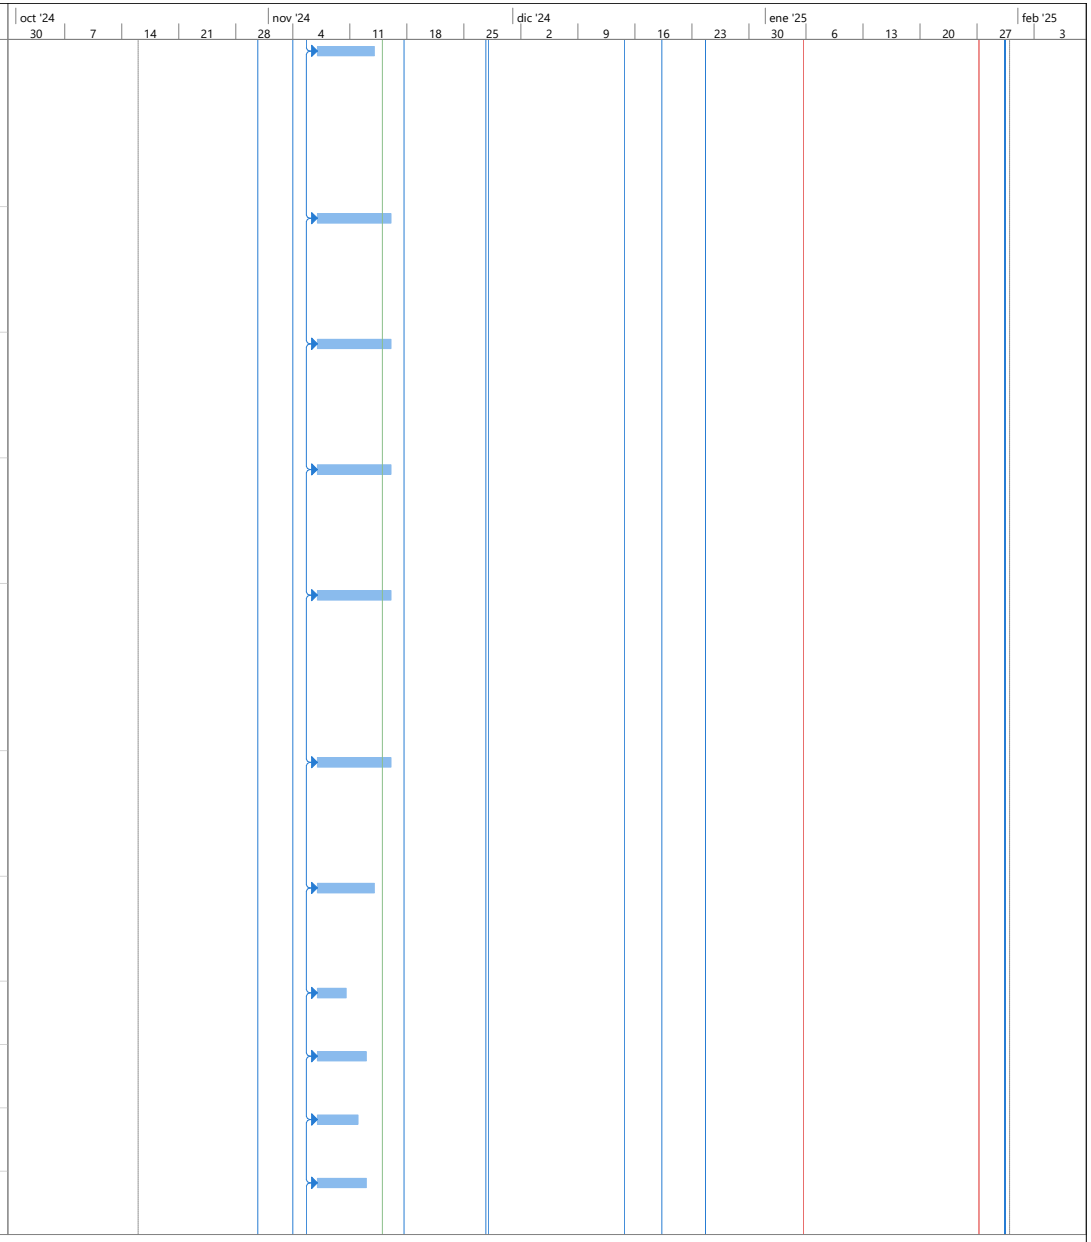

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora			


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
134		10,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKERS ENCHUFABLES BIPOLARES	2 días	jue 7/11/24	vie 8/11/24	133CC
135		10,18	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1 TONELADA Y CABLE THW 3XNo.12 AWG LIBRE DE HALOGENOS (220	10 días	jue 7/11/24	lun 18/11/24	134CC
136		10,19	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 1,5	9 días	jue 7/11/24	dom 17/11/24	135CC
137		10,20	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE POTENCIA DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLITT DE 2 TONELADA	12 días	jue 7/11/24	mié 20/11/24	136CC
138		10,21	SUMI NISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION DE SEÑAL DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MUNI SPLITT DE 1, 1,5 Y 2 TONELADA EN CABLE	12 días	jue 7/11/24	mié 20/11/24	137CC
139		10,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4", CAJAS 4X4 EMT,UNIONES CURVAS EMT Y FLEXI METALICO DE 3/4" PARA CONEXIÓN DE CONDENSADORAS DE	11 días	jue 7/11/24	mar 19/11/24	138CC
140		10,23	SALIDAS PARA EXTRACTORES DE BAÑO	4 días	jue 7/11/24	lun 11/11/24	139CC
141		10,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 10 KVA PARA PUESTOS DE TRABAJO ONLINE, CON AUTONOMIA DE 10 MINUTOS Y TRF DE	3 días	jue 28/11/24	dom 1/12/24	122FC+11 días
142		10,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS CON P.T. 120V. NORMAL. Color blanco, Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA, Y	11 días	mar 12/11/24	dom 24/11/24	140CC+4 días

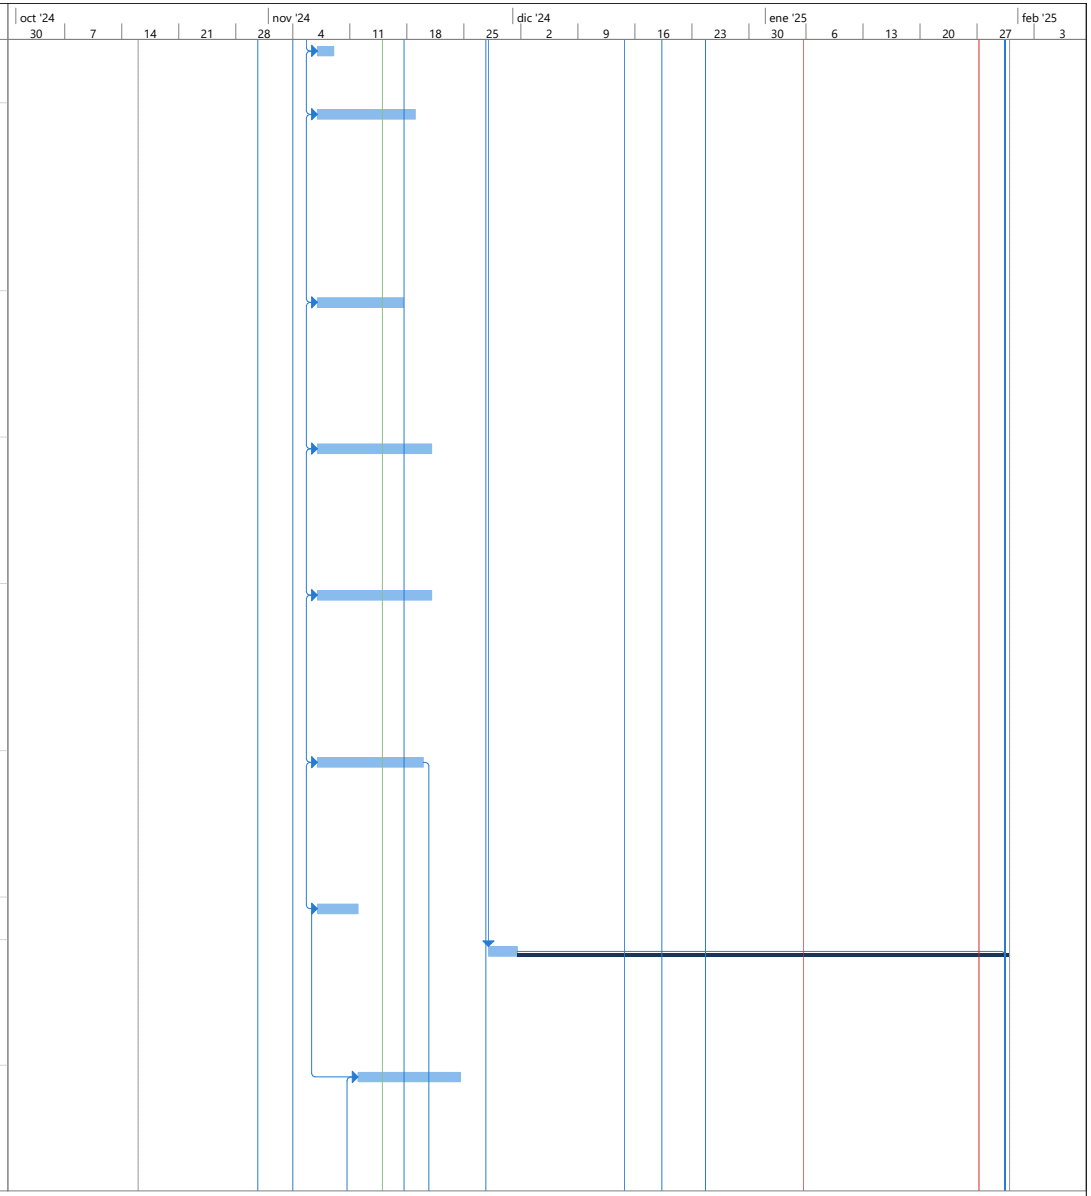

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora	


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
143		10,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS REGULADOS CON P.T. 120V. color naranja,Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA	12 días	mar 12/11/24	lun 25/11/24	142CC
144		10,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA TOMAS GFCI CON P.T. 120V. color BLANCO ,Cable 3XNo12 LSHF, POR CANALETA METALICA Y	3 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24	143CC
145		10,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5 CMS CON SEPARADOR ENTRE CABLEADO ELECTRICO Y	11 días	mar 26/11/24	dom 8/12/24	143
146		10,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES 120V.	12 días	mar 26/11/24	lun 9/12/24	145CC
147		10,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA LUCES DE	7 días	mar 26/11/24	mar 3/12/24	146CC
148		10,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARCIALES DE CIRCUITOS RAMALES PARA SALIDAS DE LUCES EN ALAMBRE	14 días	mar 26/11/24	mié 11/12/24	147CC
149		10,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS	2 días	mar 26/11/24	mié 27/11/24	148CC
150		10,33	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA LED REDONDA DE 18 WATT	8 días	mar 26/11/24	mié 4/12/24	149CC
151		10,34	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE EN DRY WALL DE LUMINARIA PANEL LED DE 60X60, 40 WATT	8 días	mar 26/11/24	mié 4/12/24	150CC
152		10,35	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE LAMPARA TIPO MIKY MOUSE PARA EMERGENCIAS	5 días	mar 26/11/24	dom 1/12/24	151CC
153		10,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TROQUEL PIRAMIDAL TRIPLE	8 días	mar 26/11/24	mié 4/12/24	152CC
154		10,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO EN MURO, INCLUYE	7 días	mar 26/11/24	mar 3/12/24	153CC
155		10,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA	4 días	mar 26/11/24	vie 29/11/24	154CC
156		10,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE EN MURO, INCLUYE CANCHADA	2 días	mar 26/11/24	mié 27/11/24	155CC

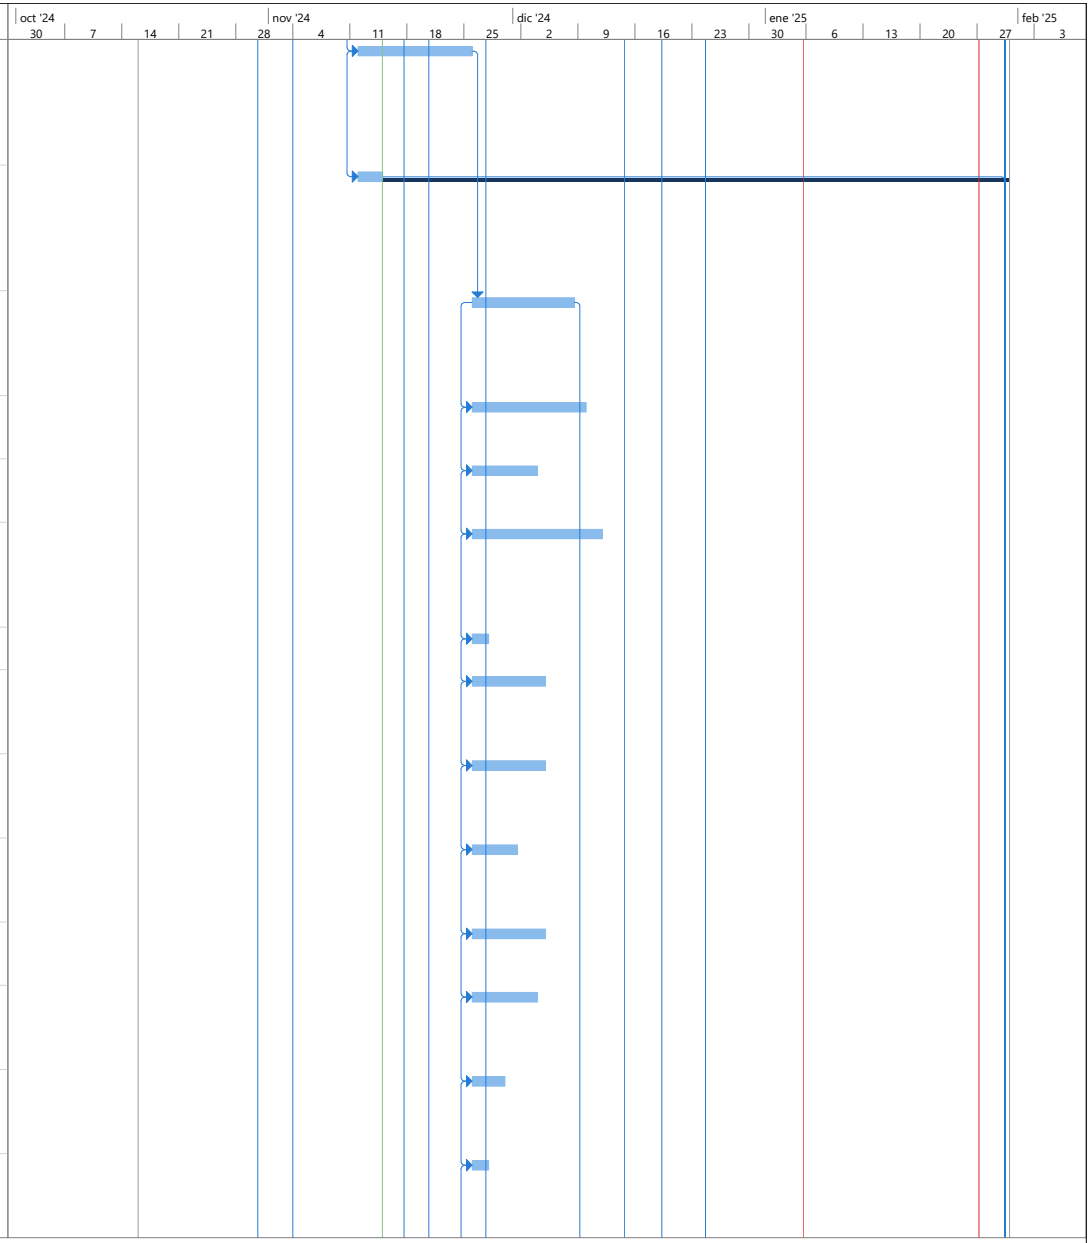

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
157		10,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" Y	7 días	mar 26/11/24	mar 3/12/24	156CC
158		10,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA EMT DE 1/2" Y	7 días	mar 26/11/24	mar 3/12/24	157CC
159		10,42	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA SEÑAL DE EVACUACIO(SALIDA),120 V, ALAMBRE 3XNo12 AWG,EMT	3 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	158CC
160		10,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE	3 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	159CC
161		10,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA VIDEO BEAM EN SALA DE JUNTAS Y AUDITORIO(NO INCLUYE EL	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24	160CC
162		10,45	CABLE DE TIERRA No.8 PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE DUCTOS METALICOS PARA CABLEADO	3 días	mar 26/11/24	jue 28/11/24	161CC
163		10,46	DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE QUE NO SE VAYA A USAR EN LA SEDE	2 días	mié 30/10/24	jue 31/10/24	22
164		10,47	CERTIFICACION RETIE PLENA Y RETILAP	3 días	lun 27/1/25	mié 29/1/25	120
165		10,48	DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS Y MEMORIAS PARA PRESENTAR AL OPERADOR DE RED PARA SU APROBACION Y PLANOS RECORD FINALES PARA CERTIFICACION RETIE	3 días	mar 28/1/25	jue 30/1/25	164CC+1 día
166		**11,00**	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**	**8 días**	**lun 9/12/24**	**mar 17/12/2**	
167		11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE VOZ Y DATOS DOBLE (INCLUYE CABLE, JACKS, Y TODO LO NECESARIO PARA	8 días	lun 9/12/24	mar 17/12/24	145
168		**12,00**	**INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES**	**6 días**	**mié 20/11/24**	**mar 26/11/24**	
169		12,01	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.000~12.000~13.800 BTU/H, 2200V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF: VS122C7	5 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	139
170		12,02	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.685~18.000~18.300 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz Cooling Only,control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF: VS182C7	5 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	169CC

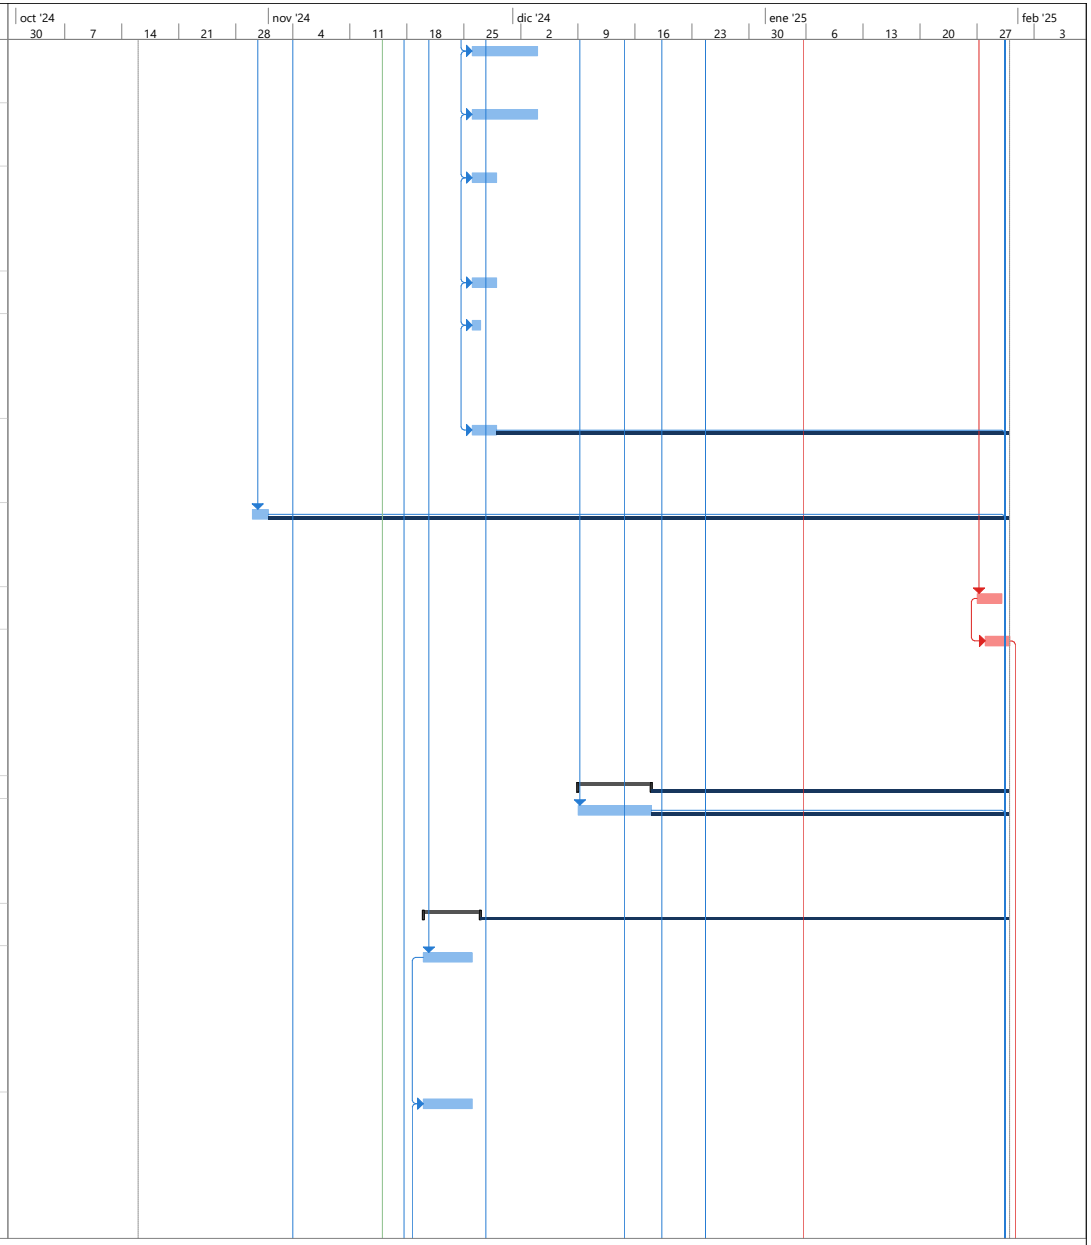

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
171		12,03	SUMINISTRO E INSTALACION Minisplit Inverter 3.500~22.000~24.500 BTU/H, 220V/1Ph/60Hz Cooling Only, control inalambrico, gas refrigerante R-410A REF; VS242C7	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	170CC
172		12,04	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA DE AIRE TAMAÑO 1.2M 220V,	2 días	mié 20/11/24	jue 21/11/24	171CC
173		12,05	SUMINISTRO E INSTALACION BASES DE CONDENSADORAS TIPO PIE AMIGO O TIPO MESA CON SOPORTES DE CAUCHO ATORNILLADO A LA	4 días	mié 20/11/24	dom 24/11/24	172CC
174		12,06	SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTORES AXIALES DE	3 días	mié 20/11/24	vie 22/11/24	173CC
175		12,07	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO DE 4PUL PARA EXTRACCION	5 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	174CC
176		12,08	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS TIPO PERSIANSAS DE	4 días	mié 20/11/24	dom 24/11/24	175CC
177		12,09	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø1/4 : Ø1/2 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE	5 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	176CC
178		12,10	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE COBRE TIPO L Ø3/8 : Ø 5/8 ASILADA CADA DIAMETRO, INCLUYE CODOS, UNIONES, TEE, SOLDADURA SOPORTE	6 días	mié 20/11/24	mar 26/11/24	177CC
179		12,11	PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, CON NITROGENO GASEOSO A	3 días	mié 20/11/24	vie 22/11/24	178CC
180		12,12	GAS REFRIGERANTE R410A	3 días	mié 20/11/24	vie 22/11/24	179CC
181		**13,00**	**DOTACION**	**5 días**	**jue 26/12/24**	**mar 31/12/2**	
182		13,01	S/I PUESTO DE TRABAJO 1.50 MTS EN L CON	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	115FC-4 días
183		13,02	SUMINISTRO Y TRASPORTE DE SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	182CC
184		13,03	S/I SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	183CC
185		13,04	SUMINISTRO Y TRANSPORTE SOPORTE MONITOR STANDARD MODULAR 2 CAJONES	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	184CC
186		13,05	SUMINISTRO Y TRANSPORTE TANDEM POR	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	185CC
187		13,06	SUMINISTRO Y TRANSPORTE JUEGO DE MESA GUARDERIA INCLUYE	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	186CC

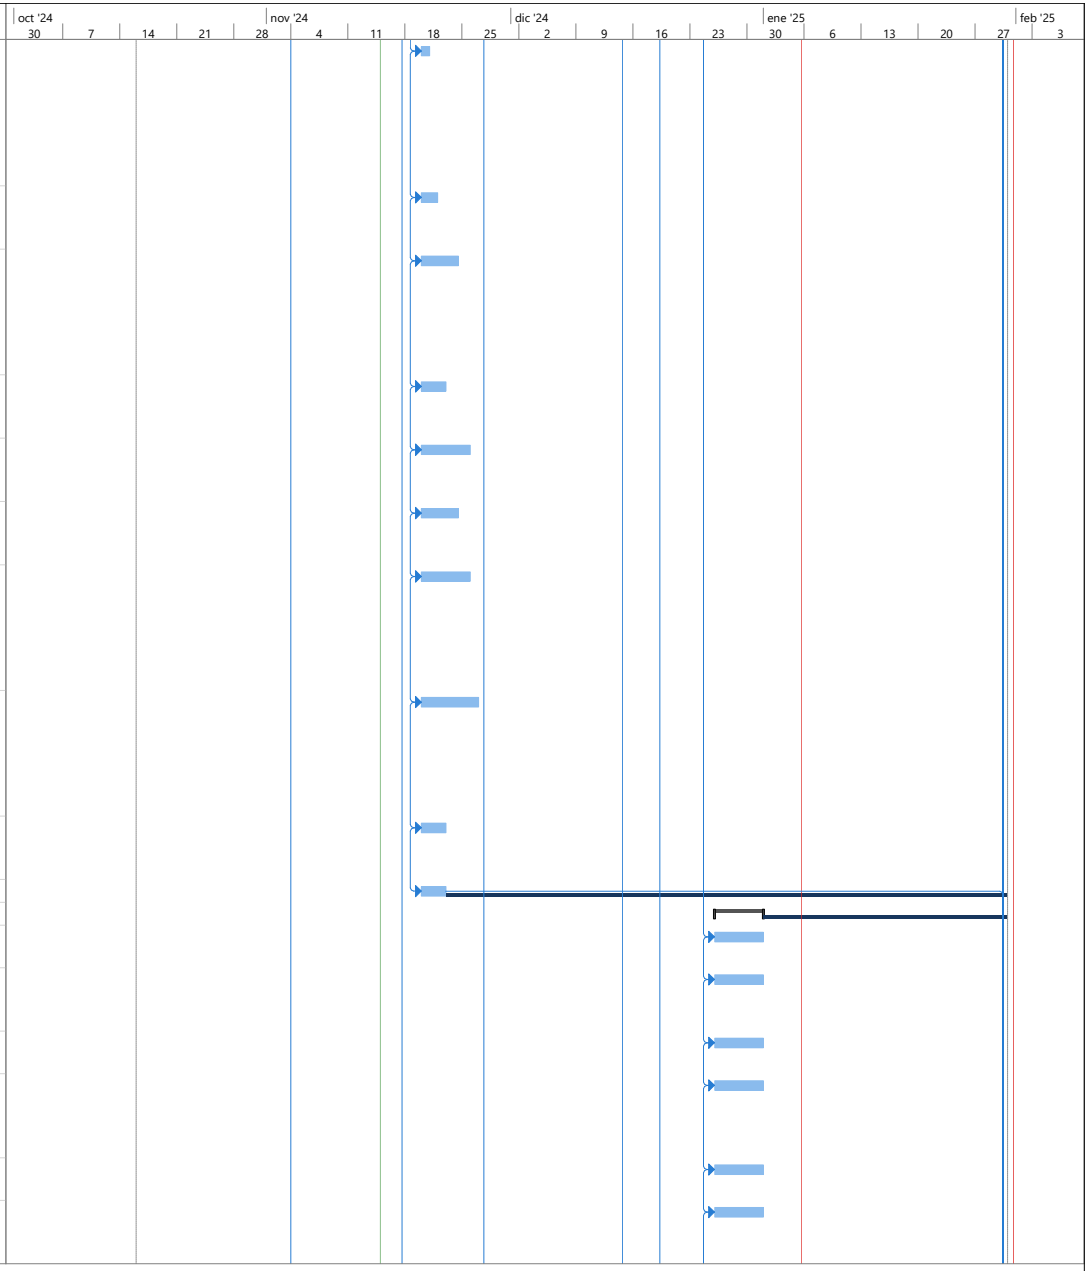

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora


Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
188		13,07	SUMINISTRO Y TRANSPORTE LOCKER GUARDERIA POR 6	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	187CC
189		13,08	S/I TAPETE PISO FOMI 1.20m x 1.20m	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	188CC
190		13,09	S/I SISTEMA DE ARCHIVADOR RODANTE	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	189CC
191		13,10	S/I SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE 0.30m x 0.20m, EN IMPRESIÓN DIGITAL PLASTIFICADO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 60, EN ALTA RESOLUCIÓN, INCLUYE CINTA DOBLE FAZ PARA INSTALACIÓN, Y SISTEMAS DE FIJACIÓN EN MURO (TORNILLO Y CHAZO EN	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	190CC
192		13,11	S/I AVISO INSTITUCIONAL EN CAJA DE LUZ CON FOTOCELDA EN LAMINA ENVEJECIDA ESTILO COBRE Y APLIQUES EN ACRILICO DE 1.80m x 0.30m	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	191CC
193		13,12	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MESA AUXILIAR PARA JUNTAS DE SUPERFICIE REDONDA DE DIAMETRO 1.20M EN MADERA ENCHAPADA Y ESTRUCTURA EN ACERO	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	192CC
194		13,13	S/I PANTALLA TELÓN DE PROYECCIÓN PARED 244X183CM	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	193CC
195		13,14	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLA AUXILIAR DE DESCANSO ERGONÓMICA, DISEÑO MODERNO Y LUJOSO CON ASIENTO ACOLCHADO, RESPALDO Y	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	194CC
196		13,15	S/I PROYECTOR 119W 4000 LUMENS HD	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	195CC
197		13,16	SUMINISTRO LINE ARRAY CON AMPLIFICADOR	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	196CC
198		13,17	SUMINISTRO DE MICRÓFONO DE MANO	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	197CC
199		13,18	S/I DE ESTANTERIA INDUSTRIAL DE 4 NIVELES DE DIMENSIONES 1.96 X 1.83 X 0.61 (O DIMENSIONES SIMELARES DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL	5 días	jue 26/12/24	mar 31/12/24	198CC
200		**NP**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**57 días**	**lun 4/11/24**	**mié 8/1/25**	
201		NP. 1	S/I DE MALLA ELECTROSOLDA (15X15Cm 4.0Mm 6X2.35M)	8 días	mar 19/11/24	mié 27/11/24	47CC

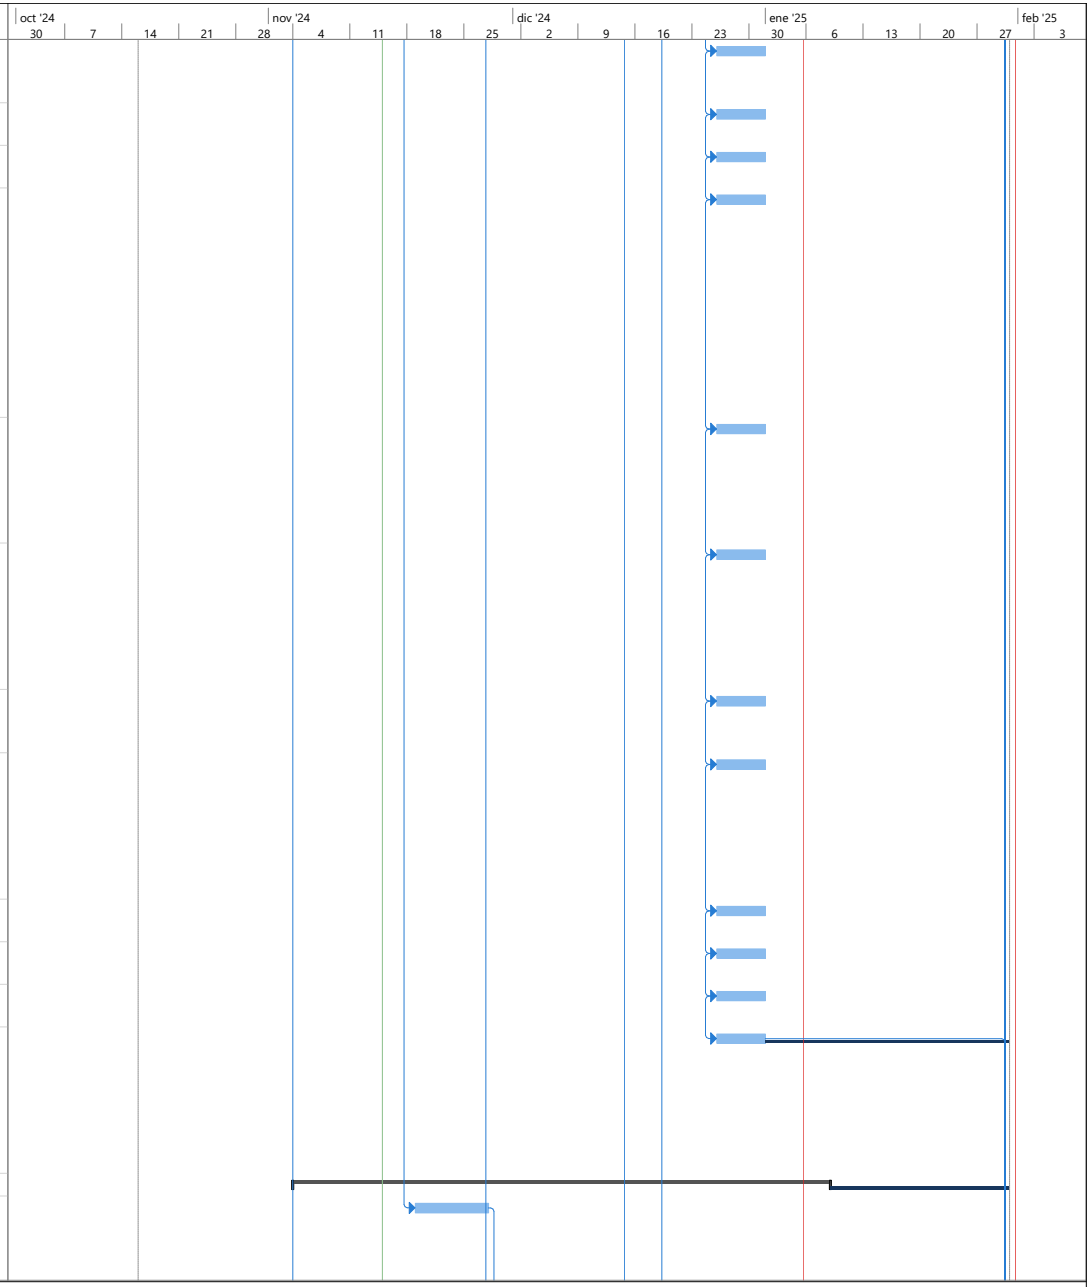

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
202		NP. 2	S/I RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELLECIONADO ESP. DE LA CAPA DE RELLENO (15 CM. MINIMO). PARA CARCAMOS EXISTENTES EN PRIMER PISO Y CAJA DE INSPECCION	7 días	jue 28/11/24	jue 5/12/24	201
203		NP. 3	S/I DE CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	2 días	sáb 14/12/24	lun 16/12/24	107
204		NP. 4	S/I DE MURO ESTRUCTURAL PARA ANTEPECHO EN TERRAZA.	8 días	sáb 7/12/24	lun 16/12/24	202FC+1 día
205		NP. 5	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ETERNIT	11 días	lun 4/11/24	vie 15/11/24	13FC+5 días
206		NP. 6	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE	10 días	jue 7/11/24	lun 18/11/24	205CC+3 días
207		NP. 7	ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUES Y CUBIERTA DE POLICARBONATO.	8 días	mié 27/11/24	jue 5/12/24	37
208		NP. 8	ANDEN Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS	12 días	mar 24/12/24	lun 6/1/25	116CC+3 días
209		NP. 9	INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO PARA ACOMETIDA ELECTRICA	2 días	mar 7/1/25	mié 8/1/25	118CC
210			FIN	0 días	jue 30/1/25	jue 30/1/25	199;6;7;13;14;27;

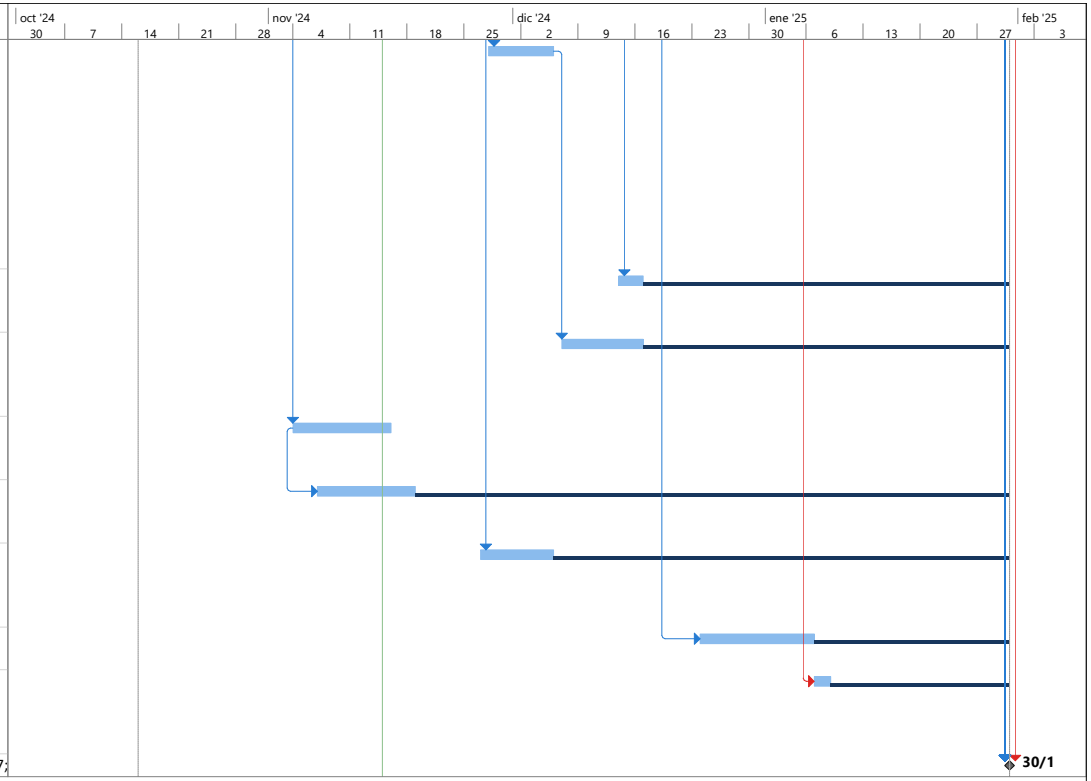

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: vie 15/11/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	Margen de demora	
