INFORME TÉCNICO CONVENIO 2347 DE 2025, MINISTERIO DEL INTERIOR - MUNICIPIO DE SAN PABLO, NARIÑO
PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO"

VALOR:	**$ 2.450.000.000**

LOCALIZACIÓN	**CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO**

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO			
DESCRIPCION	**ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA**	**INTERVENTORÍA**	**TOTAL PROYECTO**
VALOR PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981,00		
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISE		$ 84.123.457,00	
VALOR PRESUPUESTO DE OBRA	$ 1.846.883.748,00		
VALOR PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA DE OBRA		$ 369.164.814,00	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 1.996.711.729,00**	**$ 453.288.271,00**	**$ 2.450.000.000,00**

VALOR DEL CONVENIO	DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2,450,000,000), incluídos todos los impuestos a que haya lugar, los cuales serán aportados de la siguiente manera: APORTES DEL MINISTERIO – FONSECON: Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE ($2.450.000.000), discriminados así: C. Vigencia 2025. Con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 38225 de fecha 7 de noviembre de 2025 con un saldo por comprometer de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS PESOS MC/TE (857.500.000), rubro presupuestal A-03-03-01-032 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON. D. Vigencia 2026. Con cargo al cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025, el cual se afectará en la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MC/TE ($1.592.500.000) APORTES DEL MUNICIPIO: El Municipio de SAN PABLO Departamento de NARIÑO aportará el lote de terreno en el que se ejecutará la obra de infraestructura, individualizado e identificado así:

Datos de identificación	Descripción
Dirección actual	Cra 3. No. 5 - 08 Barrio Bolivar San Pablo
Nomenclatura y localización	N/A
Número de matrícula inmobiliaria	246-7654
No. Catastral:	526930100000000300017000000000
Propietario actual	SAN PABLO-NARIÑO
Área de predio que pertenece al propietario en referencia	6.400,00m²
Servicios públicos con los que cuenta el predio:	N/A

PORTE MINISTERIO DEL INTERIO	$	2.450.000.000,00

BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

FECHA DE CONVENIO:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO:	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 12 DE 2025
FECHA FINAL:	JULIO 31 DE 2026

PÓLIZA No.:	775-47-994000003078 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO
SUPERVISOR MINISTERIO:	MANUEL ANTONIO LINARES

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO"

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El Municipio de San Pablo, se caracteriza por ser un Municipio receptor de familias víctimas del desplazamiento, la mayoría de ellas ubicadas en la zona rural, a la fecha el Municipio no cuenta con la estrategia de caracterización aplicada, pero se apoya con la información que proporciona la Red Nacional de información de la Unidad para las Victimas, con los datos suministrados por RNI, se pueden adelantar diseños de programas o planes de gobierno, para contribuir en el goce efectivo de derechos de la población víctima. En el municipio, en el año 2019 se presentaron 6 casos de riñas, un hurto a personas y un homicidio, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional, y en el primer trimestre de 2020 se presentó un caso de lección por accidente tránsito y una muerte por accidente de tránsito. Aunado a lo anterior, se observa en la siguiente grafica que la tasa de hurtos a comercio presentó un alza considerable desde el 2016 hasta el 2018, mientras que la tasa de hurtos a residencias se redujo en este mismo periodo. Frente a los delitos sexuales, para el año 2019 se presentó una reducción significativa, como se observa en la siguiente gráfica, demostrando que las acciones preventivas y reeducativas tiene efectos positivos en el mediano plazo. Además, la violencia también se presenta contra la pareja, flagelo que debilita la unión familiar, afectando directamente el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Violencia intrafamiliar Niños, niñas y adolescentes/Violencia social. A nivel nacional en cuanto al tipo de violencia intrafamiliar en Colombia, la proporción de casos violencia hacia niños, niñas y adolescentes está en tercer lugar (13,7%), después de la violencia de pareja (64,33%) y por otros familiares (20,11%). Al igual que el resto de las violencias intrafamiliares, la mujer es la víctima más frecuente. En el año 2014 se realizaron 10.402 dictámenes por violencia contra niños, niñas y adolescentes; la diferencia con el 2013 es de 694 casos y la tasa por 100.000 habitantes es de 67,14. Se observa que en la última década este tipo de violencia intrafamiliar presenta una tendencia al descenso, más evidente en los tres últimos años. La recreación por su parte es vista como un campo con formado por políticas, instituciones, y organizaciones públicas, privadas, sociales y solidarias, actores, recursos, lenguajes que lo diferencian de otros campos y por un capital simbólico, económico y cultural. Tiene a su cargo la responsabilidad de aportar las condiciones para garantizar a los miembros de una sociedad el acceso al ejercicio de la recreación en un marco de equidad, igualdad y justicia. Teniendo en cuenta la problemática existente en el municipio de San Pablo, se evidencia una descomposición familiar o desintegración familiar, lo cual genera las diferentes problemáticas de violencia intrafamiliar que conllevan a la inasistencia alimentaria, problemas psicológicos y emocionales, posibles casos de abuso sexual, baja autoestima, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, y por ende descomposición social evidenciada en la primera infancia, la infancia y la adolescencia del municipio.

JUSTIFICACIÓN:	La Ley 62 de 1993 establece los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana como una herramienta de planeación que atiende las situaciones que alteran la convivencia y la seguridad ciudadana. En este sentido, formular el Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), facilita el trabajo de las autoridad es de policía, pues se convierte en la hoja de ruta que permite priorizar acciones, optimizar el uso de los recursos, realizar una coordinación interinstitucional, y mejora el proceso de seguimiento y evaluación de las estrategias de convivencia y seguridad ciudadana, en todos los municipios y departamentos de Colombia. Teniendo en cuenta la problemática existente en el municipio de San pablo, se evidencia una descomposición familiar o desintegración familiar, lo cual genera las diferentes problemáticas de violencia intrafamiliar que conllevan a la inasistencia alimentaria, problemas psicológicos y emocionales, posibles casos de abuso sexual, baja autoestima, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas, y por ende descomposición social evidenciada en la primera infancia, la infancia y la adolescencia del municipio. Se deben implementar estrategias, programas, acciones o proyectos de convivencia basados en la unión familiar, el respeto y el amor. Esto con el fin de que la desintegración familiar no afecte internamente a la convivencia del municipio. Teniendo en cuenta que los problemas planteados que influyen directamente en la segregación espacial de la población, es importante que el proyecto permita el desarrollo de las libertades deportivas, recreativas y de actividad física de los niños, jóvenes y población en general, favoreciendo las interacciones, el proyecto proporcionara la ejecución de acciones y programas que se deben realizar en el municipio, dirigidos a la primera infancia, jóvenes, adolescentes y adultos; todo lo anterior con el objeto mejorar la percepción de seguridad y convivencia ciudadana, reduciendo los factores de riesgo y causas asociadas a los delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, por medio del liderazgo interinstitucional y estableciendo una cultura ciudadana de legalidad y sana Convivencia. En virtud de lo anterior es importante dotar al municipio de una INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA, que es un proyecto que se concibe como un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal (tiene que alcanzar a todas las personas) para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley. Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al presentar altas tasas de delitos. En cambio, los pequeños pueblos suelen ofrecer mejores condiciones de seguridad. Esto, en cierta forma, está vinculado a la masividad, ya que los millones de habitantes de una urbe se vuelven anónimos. En los pueblos, es menos probable que una persona pueda delinquir sin que nadie se entere.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	EL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN”, Proyecto que se concibe como un espacio de encuentro que promueve el fortalecimiento del tejido social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios multifuncionales son lugares especiales que incentivan la integración permitiendo desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como la calidad de vida. Los siguientes espacios conforman el proyecto Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” – Configuración 1A: Área: 1116 m2 • Área polivalente multipropósito • Edificio de servicios • Gimnasio biosaludable • Pista de trote • Zona de juegos infantiles • Urbanismo

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A INTERVENIR:	Número Matricula: 246-7654 Propietario: San Pablo Nariño Área: 6.400,00m²

TIEMPO DE EJECUCIÓN:	Contratación y legalización estudios, diseños, obra e interventorías: 3.5 meses Ejecución estudios y diseños: 1.5 meses Ejecución de la construcción: 6 meses Retie - Retilap: 1 mes Tiempo Total: 12 meses

1, COMPONENTE TÉCNICO **PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:**	Luego de adelantar los procesos licitatorios de los Estudios, Diseños y Obra Civil y la Interventoría, se procederá a iniciar Obra, cuyas principales actividades para ejecutar son las siguientes: Área: 1116 m2 • Área polivalente multipropósito • Edificio de servicios • Gimnasio biosaludable • Pista de trote • Zona de juegos

2, COMPONENTE ADMINISTRATIVO	A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 2347 de 2025.

CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Marzo 3 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 716575 (2026-2-003122-006664) - Solicitud de cargue de informes mensuales en plataforma secop	* Oficio 716575 .pdf * poliza san pablo narino 2347 de 2025_20260305122945.pdf



De: <correspondencia@mininterior.gov.co>
Date: mar, 3 de mar de 2026, 10:46 p.m.
Subject: ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 716575 (2026-2-003122-006664)
To: <notificaciones@solidaria.com.co>, <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>
Cc: <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Apreciado ciudadano(a),

Se le ha asignado un nuevo documento con Id: 716575.


Podrá descargar la imagen del documento haciendo clic Aquí

Adicionalmente, podrá descargar los archivos adjuntos relacionados al documento haciendo clic Aquí

Este correo fue generado automáticamente por MININTERIOR.

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
2	Marzo 9 de 2026	Ketlyn Nicolle Rojas Olmos	Seguimiento Convenio 2347 - 2025	Sin anexos

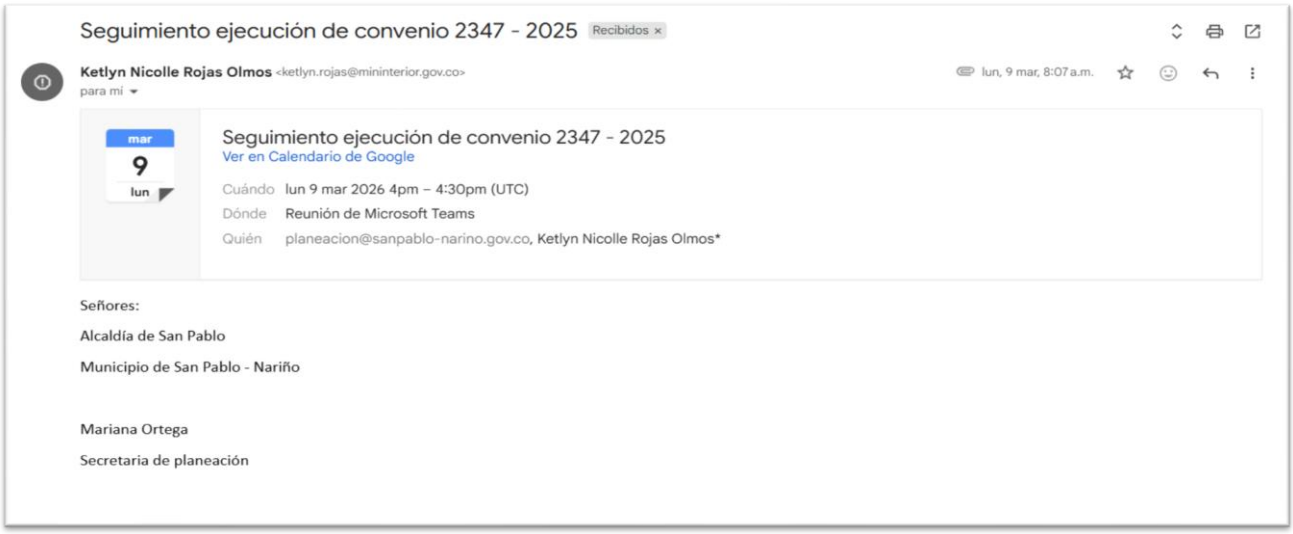

Seguimiento ejecución de convenio 2347 - 2025 Recibidos ×

Ketlyn Nicolle Rojas Olmos <ketlyn.rojas@mininterior.gov.co>
para mí

lun, 9 mar, 8:07 a.m.

mar 9 lun

Seguimiento ejecución de convenio 2347 - 2025
Ver en Calendario de Google

Cuándo lun 9 mar 2026 4pm – 4:30pm (UTC)
Dónde Reunión de Microsoft Teams
Quién planeacion@sanpablo-narino.gov.co, Ketlyn Nicolle Rojas Olmos*

Señores:

Alcaldía de San Pablo

Municipio de San Pablo - Nariño

Mariana Ortega

Secretaria de planeación

#	FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
3	Marzo 6 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 718411 (2026-2-003122-007276) - Solicitud de documentación para segundo desembolso	*Oficio 718411 * Póliza San Pablo Narino 2347 de 2025_20260305122945.pdf

El vie, 6 mar 2026 a las 7:59, <correspondencia@mininterior.gov.co> escribió:

> Apreciado ciudadano(a),
>
> Se le ha asignado un nuevo documento con Id: 718411.
>
> Podrá descargar la imagen del documento haciendo clic Aquí
>
> Adicionalmente, podrá descargar los archivos adjuntos relacionados al documento haciendo clic Aquí
>
> Este correo fue generado automáticamente por MININTERIOR.
>
> Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

4	Marzo 11 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 720950 (2026-2-003122-008224) - Cumplimiento cronograma - Solicitud entrega de estudios y diseños definitivos.	* Oficio 720950.pdf * poliza san pablo narino 2347 de 2025_20260310125707.pdf

Date: mié, 11 de mar de 2026, 8:50 a.m.
Subject: ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 720950 (2026-2-003122-008224)
To: <NOTIFICACIONES@solidaria.com.co>, <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>
Cc: <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Apreciado ciudadano(a),

Se le ha asignado un nuevo documento con Id: 720950.

Podrá descargar la imagen del documento haciendo clic Aquí

Adicionalmente, podrá descargar los archivos adjuntos relacionados al documento haciendo clic Aquí

Este correo fue generado automáticamente por MININTERIOR.

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

5	Marzo 26 de 2026	Ketlyn Nicolle Rojas Olmos	Seguimiento Convenio 2347 - 2025	Sin anexos

De: **Ketlyn Nicolle Rojas Olmos** <ketlyn.rojas@mininterior.gov.co>
Date: jue, 26 mar 2026 a las 14:07
Subject: Comite de Seguimiento convenio 2347 de 2025
To: planeacion@sanpablo-narino.gov.co <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, alcaldia@sanpablo-narino.gov.co <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>

Señores:

Alcaldía de San Pablo

Municipio de San Pablo - Nariño

MARIANA ORTEGA

Secretario de planeación

Asunto: Citación a comité virtual seguimiento ejecución del convenio 2347 de 2025 San Pablo – Nariño.

Me dirijo a ustedes en el marco del Convenio N° 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo. Con el propósito de coordinar un comité de seguimiento a la ejecución del mencionado convenio, específicamente a los procesos de contratación y cumplimiento a la programación del proyecto, deseamos convocar a todas las partes interesadas el viernes 27 de marzo de 2026 a las 9:00 am.

6	Marzo 31 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 733476 (2026-2-003122-012089) - Modificación fecha de entrega de estudios y diseños	* Oficio 733476.pdf * poliza san pablo narino 2347 de 2025_20260331152427.pdf

De: <correspondencia@mininterior.gov.co>
Date: mar, 31 mar 2026 a las 15:38
Subject: ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 733476 (2026-2-003122-012089)
To: <NOTIFICACIONES@solidaria.com.co>, <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>, <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>
Cc: <manuel.linares@mininterior.gov.co>

Apreciado ciudadano(a),

Se le ha asignado un nuevo documento con Id: 733476.

Podrá descargar la imagen del documento haciendo clic Aquí


Adicionalmente, podrá descargar los archivos adjuntos relacionados al documento haciendo clic Aquí

Este correo fue generado automáticamente por MININTERIOR.

Este es un correo informativo, al cual no debe enviar ninguna respuesta o información ya que no recibirá respuesta alguna por parte de este correo al no ser oficial ni estar avalado por la entidad para emitir respuestas.

CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR

	FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
1	Marzo 13 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	Respuesta - ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 718411 (2026-2-003122-007276)	* OFICIO CONVENIO 2347 DE 2025 MIN DEL INTERIOR RESPUESTA OFICIO 718411 MARZO 6 DE 2026.pdf * Anexos.zip

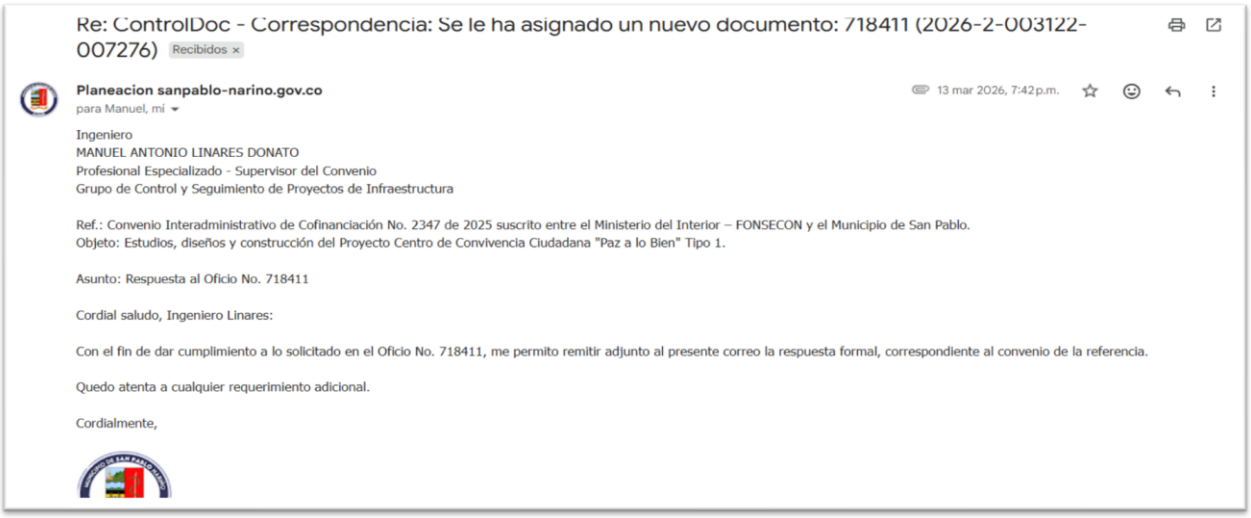

Re: ControlDoc - Correspondencia: Se le ha asignado un nuevo documento: 718411 (2026-2-003122-007276) Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co 13 mar 2026, 7:42 p.m.
para Manuel, mí

Ingeniero
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado - Supervisor del Convenio
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura

Ref.: Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2347 de 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de San Pablo.
Objeto: Estudios, diseños y construcción del Proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1.

Asunto: Respuesta al Oficio No. 718411


Cordial saludo, Ingeniero Linares:

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el Oficio No. 718411, me permito remitir adjunto al presente correo la respuesta formal, correspondiente al convenio de la referencia.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

2	Marzo 17 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	Informe de avance del convenio 2347 de 2025 correspondiente al mes de febrero de 2026	* 1 INFORME FINANCIERO FEBRERO 2026 * 3 INFORME TÉCNICO FEBRERO 1 AL 28 2026

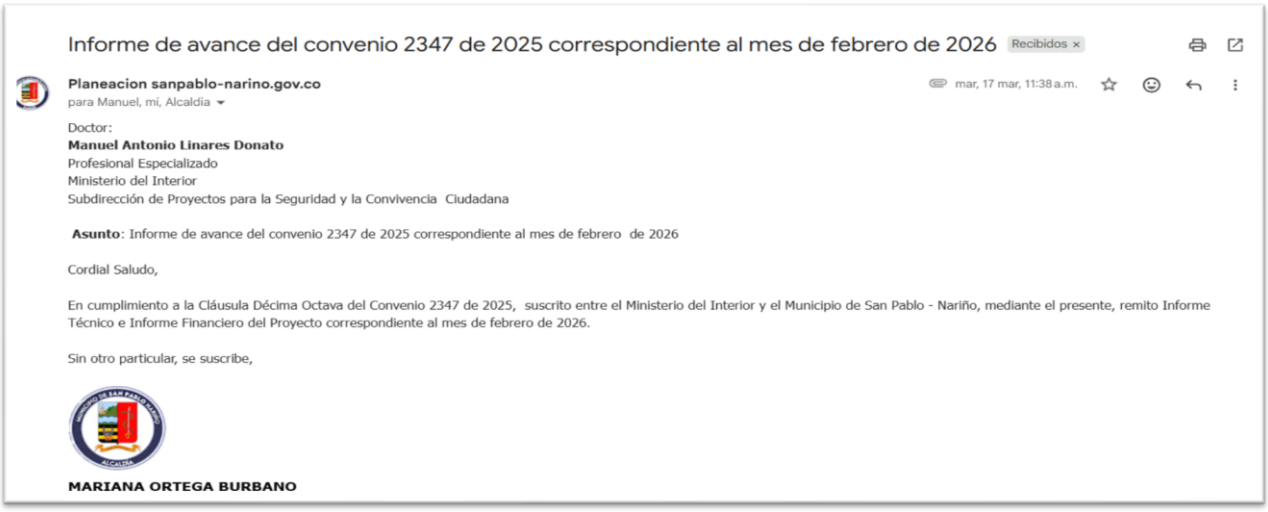

Informe de avance del convenio 2347 de 2025 correspondiente al mes de febrero de 2026 Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co mar, 17 mar, 11:38 a.m.
para Manuel, mí, Alcaldia

Doctor:
Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Asunto: Informe de avance del convenio 2347 de 2025 correspondiente al mes de febrero de 2026


Cordial Saludo,

En cumplimiento a la Cláusula Décima Octava del Convenio 2347 de 2025, suscrito entre el Ministerio del Interior y el Municipio de San Pablo - Nariño, mediante el presente, remito Informe Técnico e Informe Financiero del Proyecto correspondiente al mes de febrero de 2026.

Sin otro particular, se suscribe,

MARIANA ORTEGA BURBANO

3	Marzo 18 de 2026	Manuel Antonio Linares Donato	Convenio 2347-2025 - Respuesta a oficio con Radicado 2026-2-003122-008224	* 110-1902-064 RESPUESTA OFICIO 720950 MARZO 11 DE 2026 CONVENIO 2347 DE 2025 MIN DEL INTERIOR.pdf

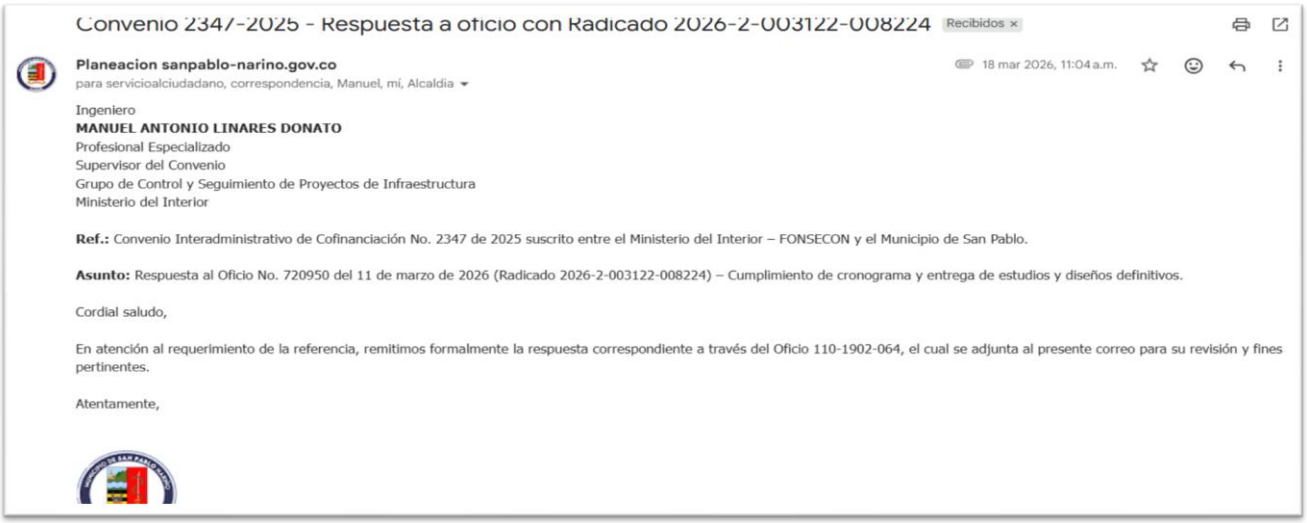

Convenio 2347-2025 - Respuesta a oficio con Radicado 2026-2-003122-008224 Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co 18 mar 2026, 11:04 a.m.
para servicioalciudadano, correspondencia, Manuel, mí, Alcaldia

Ingeniero
MANUEL ANTONIO LINARES DONATO
Profesional Especializado
Supervisor del Convenio
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura
Ministerio del Interior

Ref.: Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2347 de 2025 suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de San Pablo.

Asunto: Respuesta al Oficio No. 720950 del 11 de marzo de 2026 (Radicado 2026-2-003122-008224) – Cumplimiento de cronograma y entrega de estudios y diseños definitivos.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento de la referencia, remitimos formalmente la respuesta correspondiente a través del Oficio 110-1902-064, el cual se adjunta al presente correo para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

4	Marzo 26 de 2026	Ketlyn Nicolle Rojas Olmos	130-1902-024 Remisión de soportes y cumplimiento de compromisos de acta No. 3 del 18 de marzo	1 CONTRATO DE OBRA LP 005-2025.pdf 2CONTRATO INTV. CM 02-2026_merged.pdf 3. SOLICITUD CAMBIO DE FECHA REVISION DISEÑOS.pdf 130-0101-004 Acta de socialización Proyecto Paz a lo Bien.pdf 130-1902-024 Remisión de soportes y cumplimiento de compromisos de acta No. 3 del 18 de marzo.pdf INICIO DE TRABAJOS DE GEOTECNIA Y TOPOGRAFÍA PAZ A LO BIEN (1).pdf

130-1902-024 Remisión de soportes y cumplimiento de compromisos de acta No. 3 del 18 de marzo

Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co jue, 26 mar, 6:25 p.m. (hace 9 días)

para Ketlyn.rojas, mí, galeras.sas, proyectoscivilesnar, Alcaldía

Señores:
Ministerio del Interior
Ketlyn Nicolle Rojas Olmos
Apoyo a la Supervisión
Correo: Ketlyn.rojas@mininterior.gov.co

Referencia: *Convenio 2347-25 cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para Desarrollar los Estudios, Diseños y Construcción del Proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1 del Municipio de San Pablo – Nariño"*

Asunto: *Remisión de soportes y cumplimiento de compromisos de acta No. 3 del 18 de marzo de 2026 – Contratos derivados del Convenio No. 2347-25.*

Cordial saludo,

En atención a los compromisos adquiridos en el comité de seguimiento realizado el pasado 18 de marzo de 2026, y en mi calidad de Secretaria de Planeación del municipio de San Pablo, procedo a dar respuesta a los requerimientos técnicos y administrativos del Convenio No. 2347-25. De este convenio se derivan el Contrato de Obra LP 005-

3, COMPONENTE FINANCIERO	A la fecha los contratos de los Estudios, Diseños y Obra y el de Interventoría, se encuentran en ejecución desde el día 17 de marzo de 2026. A la fecha el contratista de Estudios, Diseños y Obra radicó Plan de Inversión de Anticipo para revisión y aprobación. La Interventoría no ha tramitado aún su anticipo respectivo.

Para la adición de recursos del convenio No. 2347 de 2025 firmado con el Ministerio del interior se realizó el siguiente procedimiento; mediante acuerdo No. 018 del 28 de noviembre del año 2025 se autorizó al alcalde Municipal De San Pablo - Nariño, Para Comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para ejecución del Proyecto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Proyecto Centro de Convivencia Ciudadana "Paz A Lo Bien" Tipo 1 del municipio de San Pablo – Nariño; mediante decreto No. 001 del 01 de enero del año en curso se hizo la incorporación de recursos en el presupuesto Municipal.
Con fecha 02 de enero de 2026 se expide Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2026000157 por valor de $453,288,271 con el siguiente objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO; además se expide Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2026000158 con el siguiente objeto: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN" CONFIGURACION TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO – NARIÑO, por valor de $1,996,711,729.

4, COMPONENTE JURÍDICO	A la fecha los contratos para los Estudios, Diseños y Obra, así como la Interventoría, se encuentran en ejecución. A la fecha en la plataforma Secop se encuentra la siguiente información:

AVANCE A LA FECHA:

•Proceso licitatorio para Contratación de Estudios, Diseños y Construcción:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53139&g-recaptcha-response=0cAFcWeA4v6x4_p3xQkBk8siPhX6JQYGGF3VD8hZcPx05Vlr68DqHd20EetNXm1T0D_NYSsVAcNSVc4acuyBWCt6FoofP6mOP-i_0PtmQ72YOa0BD3ECFkDsP_CRdWyPTq5J8VkBwQbMUjesq3XxbCKGRQ62Ij_30CNqswbShpkw5fVy7vHx-Rikg74_DbVtrf48JDBlv9yv60ePZRMuf3tiMZY4ga8ORn2pHJJiBhegVe2CPChfQsrG42jc6PrDTRu9tdu6s49dPQYcSyuIfPGw226uN1tdyCpdBDGv75Se0jiwD_z026IAYOXAlGR5AN3EfmjcnNVAs2gTcfYtJH_epruFG_XuFtewuJaDO1cje1x_bt4ctfcKWCACjiQjGSkq0Eq0j6CfWsMMU3z2IH_bsFztVfKTA7FaB_b10RK93ex_SU79gI1J8fhUneP0mf-ayM65wWEzvA1Z9tpHMxl3T4mIJPaOK4hePou719vcN5Ru24BllFkKp-_cKVJQqYWkRHFhY3T2uText02BDlW0c9t_5OA7LiwP8PsMcN8RyYf_HXUdzrIaIJ4NxLiYmJf4ti2N8mj93UDCRtMEwdowyjszbioMB8ixJzVXd851YJrQLLDaTPsbt7rJrUrNWsL8Avxcq8rn9bFGvSC0sRTR_ZJ6ZPCjpCUwtidBcewsk9bEUmk-ZK8iQx7SD-DefyMxq2f1JEwR4tTVEz9-o6Wxqwea8pT_NrrSWbSiQvD27UFLsiYI99b_7LtrW0-cPgB9k0oPxlhkEjkzPuolW2XUyu0r-1hAvzdHKwqIceVG14ugSP9mhjEGZO1RFcF_X9JCB1P4clX4ioMvgUGXAx2FSkWsOCWwfDp83md5tdbAIFo7mzSMPzmIKvNkKDj7A--tcvowDCczVn4VV1MFMU-fLbdvFKnl6Lh1RWHkl9jwSSMN0-bhX2-nM

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 1.996.711.729
Estado:	Adjudicado
Tipo de proceso:	Licitación obra pública
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Aviso de licitación:	Publicación Secop Diciembre 18 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 28 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de Pliegos de Condiciones:	Publicación Secop Diciembre 31 de 2025
Adenda No. 1	Publicación Secop Diciembre 31 de 2025
Acta de cierre:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Informe Preliminar de Evaluación:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Informe final de evaluación documentos Sobre No. 1	Publicación Secop Febrero 3 de 2026
Acta de Adjudicación	Publicación Secop Febrero 3 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 3 de 2026

El contrato para Estudios, diseños y construcción fue adjudicado al CONSORCIO CONVIVENCIA SAN PABLO, representado legalmente por HERNAN DARIO MALTE. Valor propuesta: $1,996,711,729

•Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14612120&g-recaptcha-response=0cAFcWeA63YeM_EnuW0o6azqG-XMoCk0uXks8s8NZW2qJXy6y-ouMKKU_LGZKTzdcRZ5AttH4_blSecknlVq5Esp3bsnpBG3SeoUrQzdIfipY_6P5KA8DxLmb36XTK04POOaG_kLpekE5uXZuvmS41mRWtdytJTG1JLHoFiURrDy1lpflKAppJlQSFJ9TnduhclGmRbhC9z2eCTfim5FUSmlRy4pItTtGRNtLWoVk3gvzHnV4tJierbIaNaqn_jM--HWp2tW3Bcu_8IpTyTQ9USFRQd43OYiOy8f23SsfZL8ksRX5RKZ9lsxCgfDhRLju_ua3wXoysm4i6mWQjgBWVIySHOOqmLzV6OfjkHtTlh6NWoTPEkTwrnapyTAlIB6qPE96TyJHljU_aViuA6y-N_AlCX2qetcWaKNGXfiQMWHpBXyZSZb9-6ZcHrwgh2aCLgWZ7yOXfNpRgobjcd9A_YBmJvKi8GDgduLB_vaxRxOHm7xbSPWxDAKxh3BeXSTNki710M04eeePo4KpG7HJVo_fwdG0EumvH2gBbferC_7K7esVwt0k4Q-ovlMWt4h3rhSrVSNMqfzhOkUHgbtPMzg9J0WeJektbuUhhM_YIuvLozp7H003jcjJR5ElQI8gaRoGFFgC65I9wNxoyBnI8ITXo35gcxdMCSK-h8w5WLcK2gxMZevG_73Z4pcxsqywOj4xtIQ_XfC2fWiX6wVE8shKT7tSULkpQCwaXAi5rPJzlpO7z9i5v---I_1ldG611Hs6Ug4bqeJ_l8unmXrEiEer75amFkBpiNYKcIWO5AKlCHaMEkc5U815s4_XlapC0gRlWgkznfaRLRMnLAVcNZ1UDmux5nYB5ZecPYrilligQpS2to-L3yk8Ztahc9dAsizogNw_nfX8A39BhkaHZuALFJLvd--MbGBayjFifEWT_Zha6zR7bIN4

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y POSIBLE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 453.288.271
Estado:	Convocado
Tipo de proceso:	Concurso de Méritos Abierto
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Aviso de la convocatoria:	Publicación Secop Enero 19 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 28 de 2025
Aviso:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Acto que ordena Apertura del proceso:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Enero 29 de 2025
Adenda No. 1	Publicación Secop Febrero 4 de 2025
Cierre del proceso de contratación	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Adenda No. 2	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Febrero 10 de 2025
Informe final de evaluación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025
Acta de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2025

El contrato para la"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DECONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO" fue adjudicado al CONSORCIO iINTERVENTORPIA CONVIVENCIA SP, representado legalmente por DARIO FERNANDO PATIÑO CAMPIÑO. Valor propuesta: $453.288.271

5, CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	Con un avance actual del 16%, el proyecto se encuentra en fase de estudios y diseños. El contratista realizará la entrega completa de estos productos al Ministerio del Interior el próximo 13 de abril

RESPONSABLE:

FIRMA:	
NOMBRE:	MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
CARGO:	ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA:	ABRIL 5 DE 2026
