ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS
ZONA DE IPIALES "ACIZI"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN5090-2025

Objeto: Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES EN LOS RESGUARDOS DE LOS CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO
Secretario de Infraestructura

Informe N°2

27 de enero de 2026 – 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO:	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"	
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES	
VALOR TOTAL APORTES PARA EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**TOTAL VALOR INICIAL DEL CONVENIO**	$1.144.981.727,30
	FUENTE 1 Gobernación de Nariño	$ 1.141.731.751,30
	FUENTE 2 Asociación de Cabildos Indigenas de la Zona de Ipiales - ACIZI	$3.249.976,00 en bienes y servicios
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	El plazo de ejecución del convenio será de UN MES Y MEDIO (1.5) meses contados, a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. Este plazo se fija en virtud de la ordenanza No. 24 del 19 de diciembre de 2024, expedida por la Honorable Asamblea Departamental de Nariño que autoriza al señor Gobernador para pactar plazos para la recepción de bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal 2024.	
PLAZO ADICIONAL 1	Según Anexo modificatorio No.1, Prorrogar el plazo de ejecución del convenio Interadministrativo GN5090-2025, por el termino de tres (03) meses, hasta el 10 de mayo de 2026.	
PLAZO ADICIONAL...n	N/A	
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	

SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO	ING. GABRIEL FERNANDO OSEJO Secretario de Infraestructura ING. LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA Subsecretario de infraestructura y vías		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	2025110058		
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA TERMINACION EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	10 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA TERMINACIÓN EJECUCION REPROGRAMADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	10 DE MAYO DE 2026		
VALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN5090-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES – ACIZI.	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $1.144.981,727.30** **Fuente 1 Gobernación de Nariño: $1.141.731,751,30** **Fuente 2 Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales: $3.249.976,00** **VALOR DEL CONTRATO FINAL: $1.144.981,727.30**		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

2.1 Fuente de Financiación N°1 – Gobernación de Nariño

A la fecha aún no se efectúa el pago del primer desembolso:

CONCEPTO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	PORCENTAJE DE OBRA	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO (Anticipo si aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				N/A

RENDIEMIENTOS FINANCIEROS (Convenio o contrato interadministrativo)

FECHA DE GENERACIÓN	VALOR GENERADO	VALOR CONSIGNADO	VALOR PENDIENTE DE GIRO	FECHA DEL GIRO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				

3. INFORME DEL SUPERVISOR MES ACTUAL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

3.1. Aspectos Jurídicos: Desde la suscripción del acta de inicio del convenio interadministrativo, a la fecha se han adelantado los procesos de contratación de los contratos derivados y las actas de inicio, cabe aclarar que dentro del convenio se identifican 2 actividades a realizar así:

- **Mantenimiento rutinario de vías rurales:** Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad y teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales- ACIZI y aprobado por el secretario de infraestructura y minas se realizará mantenimiento rutinario de 66.5 km, distribuidos entre los resguardos indígenas del sur del departamento, los cuales se relacionan a continuación:

No.	RESGUARDOS INDIGENAS ZONA SUR DE NARIÑO	KM
1	Resguardo de Aldea de María Putisnan	9,5
2	Resguardo de Mueses	9,5
3	Resguardo de Pastas	9,5
4	Resguardo de Males	9,5
5	Resguardo de San Juan	9,5
6	Resguardo Indígena de Ipiales	9,5
7	Resguardo Indígena de Yaramal	9,5

Suministro de dotación elementos de protección personal, herramienta y equipo: teniendo en cuenta que este tipo de implementos no pueden ser adquiridos en un solo establecimiento comercial, por la naturaleza de los mismos, se derivaron de la actividad 4 contratos:

Contrato No. 1: Objeto: "El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO TIPO INSTITUCIONAL, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre la el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales - ACIZI. El proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-1.

Contrato No. 2: Objeto: "El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD

ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre la el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales - ACIZI. El proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-2.

Contrato No. 3: Objeto: El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "ALQUILER DE MOTONIVELADORA", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre la el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales – ACIZI". El proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-1.

Contrato No. 4: Objeto: "El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre la el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales - ACIZI. El proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-2N.

- **Personal administrativo:** Con el propósito de fortalecer el proceso de supervisión del proyecto, se contrató un equipo administrativo conformado por: un ingeniero administrador, ingenieros civiles residentes de campo, inspectores, un abogado, un contador, un auxiliar contable y un profesional en trabajo social.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CONTRATO
Víctor Hugo López Guamantica	Ingeniero Administrador	16079884	No. PS 001-Cl-GN5090
Andrés Libardo Delgado Goyes	Ingeniero Residente	98365034	No. PS 002-Cl-GN5090
Sara Fernanda Escobar Solarte	Ingeniera Residente	1094959113	No. PS 003-Cl-GN5090
Hernan Enrique Narvaez Chacon	Ingeniero Residente	87715148	No. PS 004-Cl-GN5090
Jairo Albeiro Rosero Ituyan	Inspector	13010514	No. PS 005-Cl-GN5090
Edwin Alexander Ibarra Rojas	Inspector	1086754063	No. PS 006-Cl-GN5090
Jairo Branderley Puerchambu	Inspector	1085951083	No. PS 007-Cl-GN5090
Angela Jacqueline Rivera	Abogada	59310804	No. PS 008-Cl-

Ojeda			GN5090
Leidy Johana Bernal Chamorro	Contador	1085949387	No. PS 009-Cl-GN5090
Diana Carolina Ituyan Irua	Auxiliar Contable	1085933150	No. PS 010-Cl-GN5090
Sandra Patricia Cuaspud Caliz	Trabajador social	27254145	No. PS 011-Cl-GN50901

3.2. Aspectos financieros: según las obligaciones especificas estipuladas en el convenio, se apertura cuenta bancaria de ahorros No. 0.35-89074-8 en el banco de Bogotá, para el manejo de los recursos exenta de gravámenes, con el nombre "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS RURALES EN LOS RESGUARDOS DE LOS CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", la cual es de uso exclusivo para el convenio.

Avance de los pagos financiados por el ejecutor

Se presenta un avance de ejecución del 70.15% con un valor total de $800.924.823,54, cabe resaltar que el Anticipo está en trámite.

ITEM	No CONVENIO	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	VALOR ACTA PARCIAL No. 2	VALOR ACTA PARCIAL No. 3	TOTAL PAGADO DESDE HACIENDA HASTA LA FECHA CON RECURSOS DEL ANTICIPO
1	GN5090-2025	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL					

Se tienen pendientes los pagos para el personal administrativo y de campo de apoyo a la supervisión del proyecto, para el mes laborado de febrero de 2026.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	CONTRATO	MES ENERO	MES FEBRERO
Víctor Hugo López Guamantica	Ingeniero Administrador	16079884	No. PS 001-Cl-GN5090	$5,694,000.00	$2,847,000.00
Andrés Libardo Delgado Goyes	Ingeniero Residente	98365034	No. PS 002-Cl-GN5090	$4,270,500.00	$2,135,250.00
Sara Fernanda Escobar Solarte	Ingeniera Residente	1094959113	No. PS 003-Cl-GN5090	$4,270,500.00	$2,135,250.00
Hernan Enrique Narvaez Chacon	Ingeniero Residente	87715148	No. PS 004-Cl-GN5090		$2,135,250.00
Jairo Albeiro Rosero Ituyan	Inspector	13010514	No. PS 005-Cl-GN5090		$1,423,500.00
Edwin Alexander Ibarra	Inspector	108675406	No. PS 006-Cl-	$2,847,000.00	$1,423,500.00

Rojas		3	GN5090		
Jairo Branderley Puerchambu	Inspector	1085951083	No. PS 007-Cl-GN5090	$2,847,000.00	$1,423,500.00
Angela Jacqueline Rivera Ojeda	Abogada	59310804	No. PS 008-Cl-GN5090	$4,270,500.00	$2,135,250.00
Leidy Johana Bernal Chamorro	Contador	1085949387	No. PS 009-Cl-GN5090	$4,270,500.00	$2,135,250.00
Diana Carolina Ituyan Irua	Auxiliar Contable	1085933150	No. PS 010-Cl-GN5090	$2,847,000.00	$1,423,500.00
Sandra Patricia Cuaspud Caliz	Trabajo social	27254145	No. PS 011-Cl-GN50901	$3,558,750.00	$1,779,375.00
Alquiler de Camioneta	N/A	N/A	No. PS 011-Cl-GN50901	$4,500,000.00	$2,250,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS				$49,375,750.00	23,246,625.00

Con respecto a valores correspondientes al suministro de elementos de protección personal, herramientas y equipos se ha totalizado una cuenta por pagar por el valor de **$ 72,095,177.70** a la señora Sandra Patricia Cuaspud Caliz y en lo correspondiente al suministro de recebo se informa que se ha totalizado una cuenta por pagar por un valor de $ **$502,591,144.25** a la señora Nelsa Goretty Pabon Hernandez.

3.3. Aspectos técnicos: Cumplimiento de Metas del Contrato interadministrativo/convenio,

Teniendo en cuenta que del 27 de enero de 2026 a 26 de febrero de 2026 se ejecutó 9 KM, el avance físico ejecutado de acuerdo con la meta del Convenio Interadministrativo es:

MESES	KM POR MES	AVANCE DE META = 99.75 KM CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REPORTE MENSUAL	% AVANCE SOBRE 99.75 KM
1. 26 de diciembre 2025 a 26 de enero 2026	34	34	34,08
2. 27 de enero 2026 a 26 de febrero 2026	9	9	9,02
TOTAL AVANCE		**43**	**43,1**

3.4 Avance del Proyecto:

Resumen Ejecutivo:

- **Mantenimiento rutinario de vías rurales:**

De acuerdo con la información suministrada por el equipo administrativo y de campo que brinda apoyo a la supervisión, el proyecto registra un avance de ejecución consolidado de 43 kilómetros intervenidos desde el 26 de diciembre de 2025 al 26 de febrero de 2026, conforme al siguiente detalle:

ITEM	CONVENIO NO.	OBJETO	Valor Total Convenio	AVANCE 26 de diciembre de 2025 a 26 de enero de 2026 - KM	Valor Ejecutado Acumulado a 26 de enero de 2025
1	GN5090-2025	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"	$ 1.144.981.727,30	43	$ 800,924,823.54
					$ 800,924,823.54

- **Suministro de dotación elementos de protección personal, herramienta y equipo:**

Respecto a los contratos de suministros derivados, con la información suministrada por el equipo administrativo y de campo que ejerce el apoyo a la supervisión de los contratos, se presenta a continuación el estado y avance de ejecución:

Contrato No. 1: Objeto: "El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO TIPO INSTITUCIONAL, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales - ACIZI. El proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-1.

DESCRIPCION ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS			
CONVENIO No. GN5090-2025. Objeto: Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales -	UND	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"				
UNIFORMES (overol)	Und	35	86,338.82	3,021,859
BOTAS tipo ingeniero: bota de seguridad 2021IE	Par	38	119,717	4,549,246
BOTAS impermeable: Bota PVC con puntera	Par	7	67,325	471,275
GUANTES DE PROTECCION: Guante poliester Textura C/ Nitrilo EN388 -4121	Par	38	8,963	340,594
GAFAS DE PROTECCION: Lente claro antiempañante, con tratamiento anti rayadura recubiertos con filtro UV, elaborado en policarbonato, marco en PVC flexible. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad. Patillas retractiles de ajuste de 4 posiciones, cordón de seguridad. certificación norma Anzi Z87.1	Par	8	7,633	61,064
CHALECOS REFLECTIVOS (Naranja fluorescente con cinta reflectiva)	Und	38	11,078	420,964
TAPABOCAS (Máscara para polvo de uso industrial, material polipropileno, dimensión 10x15x1 cm, cantidad de filtros 2, profundidad 8 cm, área de cobertura 14 m2	Und	38	1,232	46,816
GUANTES EN CARNAZA LARGOS CON REFUERZO	Und	105	19,635	2,061,675
DELANTALES DE CARANZA PARA GUADAÑEROS: Incluye protección del pecho y parte media	Par	14	78,763	1,102,682
MASCARA DE PROTECCION CARA PARA GUADAÑEROS	Und	14	32,313	452,382
CASCOS: Casco Resistente a impacto ANSI Z89.1: Casco Industrial Tipo I (Protección contra impactos superiores), Clase E. (Protección limitada frente a contactos	Und	45	21,154	951,930

accidentales y de corta duración con elementos conductores con alto voltaje –Pruebas a 20.000-30.000v–). Dos puntos con correa				
CONJUNTO IMPERMEABLE: Material PVC amarillo, protección corporal, conjunto en dos piezas, 100% impermeable, tela antidesgarro, hebillas para ajuste	Und	38	81,633	3,102,054
CANILLERAS PROTECTORAS	Und	18	74,567	1,342,206
SUBTOTAL EPP				**$17,924,747**

DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO	**VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS**			
CONVENIO No. GN5090-2025. Objeto: Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
ADQUISICION GUADAÑAS: Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	14	2,223,116	31,123,624
GASTOS GUADAÑAS				
CUCHILLAS GUADAÑA 350 mm, Espesor 1,6 mm perforación 1".	Und	21.0	12,815	269,115
BUJIAS PARA GUADAÑA Cilindrada 41,6 cm3 - Potencia 2Kw - Peso 8,1 Kg	Und	63.0	15,533	978,579
MALLA PROTECTORA PARA ROCERÍA	Und	14.0	153,300	2,146,200
SEÑALES TEMPORALES CONOS : Altura 70 cm con cinta reflectiva	Und	56.0	57,966	3,246,096
SEÑAL PRECAUCION: Señal preventiva movil precaución 22x15 cm vinilo adhesivo, modelo SP-005-AD H-PQ - Señalización punto ecológico	Und	28.0	17,950	502,600

ZAPAPICO 5 LIBRAS con cabo, Largo 467 mm, pala 200 mm, ancho pala 108 mm	Und	42.0	64,842	2,723,364
CABO, REPUESTO PARA ZAPAPICO	Und	42.0	9,100	382,200
PALA PUNTA No.2 EL PRECIO SE REFIERE A SIN CABO ANCHO 23,2 CM X ALTO 51,3 CM	Und	42.0	24,554	1,031,268
CABO, REPUESTO PARA PALA	Und	42.0	8,933	375,186
BUGY CAPACIDAD 100 LITROS, CON LLANTA ANTIPINCHAZO 3,5" CON CUÑA PLASTICA	Und	14.0	294,300	4,120,200
MACHETE 3 CANALES 18 PULGADAS	Und	70.0	23,972	1,678,040
CINTA DE PELIGRO (Cinta amarilla señalización rollo x 500 m)	Rollo	14.0	35,345	494,830
CAMILLA DE EMERGENCIA POLIETILENO: Material: Polietileno de alto impacto Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 185 cm. x 45 cm x 5cm Peso: 7 Kg. Soporta carga: 150 Kg. Inmovilizador: 3 correas de nylon de 2" con hebilla clic clac Colores: Anaranjado y amarillo Propiedades: 100% traslúcida a los rayos X	Und	7.0	260,167	1,821,169

BOTIQUIN DE EMERGENCIA: 10 Alcohol toallita en sobre 1 Algodón paquete x 25 gr 1 Aplicadores paquete x 20 unidades 1 Bajalenguas paquete x 20 unidades 2 Compresa abdominal 1 Cuello ortopédico blando espuma tipo Thomas 10 Cura unidad 5 Gasa estéril 7.5x7.5 por 5 unidades 1 Guante par empacado individual vinilo 1 Manual de primeros auxilios 1 Micropore de 1/2" x 5 yardas 1 Pito metálico 1 Linterna dinamo recargable no necesita pilas 1 Suero oral sales para rehidratación sobre 1 Tijera sencilla 1 Venda elástica 3" x 5 yardas 1 Yodopovidona solución 60ml 1 Maletín medico térmico de 30cm x 15cm x 11cm elaborado en lona codra y termolón, dos manijas, estampado a una tinta.	Und	7.0	72,813	509,691
EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS	Und	7.0	76,467	535,269
PUNTO ECOLOGICO PORTATIL 3 PUESTOS 50L, BLANCO VERDE Y NEGRO	Und	7.0	319,000	2,233,000
SUBTOTAL HERRAMIENTA Y EQUIPO				**$54,170,431.00**

VALOR TOTAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO	**$72.095.177.70**

Contrato No. 2: Objeto: "El contratista se compromete para con La Asociación de Cabildos Indígenas de la zona de Ipiales, a realizar el "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR RECEBO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE", para el proyecto denominado "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño" No. GN5090-2025 suscrito entre la el Departamento de Nariño y La Asociación de Cabildos Indígenas de Ipiales - ACIZI. El

proceso se adjudicó mediante Contrato No. GN5090-2.

SUMINISTRO RECEBO				
DESCRIPCION MATERIAL	**UND**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RECEBO mes 1	M3	4.908	$98,332.00	$489,721,626.22
RECEBO mes 2	M3	203	$98,332.00	$19,961,396.03
VALOR TOTAL				**$502,591,144.25**

El contrato tiene un avance del 70.15% de ejecución al día 26 de febrero de 2026. A continuación, se reporta las cantidades y valores ejecutados del contrato:

3.4.1 Avance del Proyecto:

A continuación, se presenta el consolidado en porcentaje del avance financiero de los capítulos del Convenio Interadministrativo No. GN5090-2025

Ítem	detalle	% de avance	Valor Ejecutado
1	Mantenimiento rutinario vías rurales	11,53%	$ 131,632,051.58
2	Suministro de dotación elementos de protección personal, herramienta y equipo	50,33%	$ 574,686,321.95
3	Administración y Personal administrativo	6.36%	$ 72,622,375.00
4	Interventoría	1,93%	$ 21,993,075.00
Porcentaje y valor total acumulado		**70,15%**	**$ 800,924,823.54**

A la fecha del presente informe, el proyecto presenta un avance consolidado del 70.15% en la meta ejecutada, respecto al presupuesto oficial del proyecto en cuanto a los recursos económicos aportados por las partes. Respecto al cumplimiento de la

ejecución en lo referente al mantenimiento de vías rurales se tiene un valor de alquiler de motoniveladora por pagar de $77,974,126.09

Con el empleo de maquinaria correspondiente al uso de motoniveladora para el mantenimiento de las vías rurales, se ha ejecutado en un 11,53% del valor total del convenio.

El uso eficiente de la maquinaria permitió mejorar la conectividad en los corregimientos intervenidos. La gestión técnica garantizó que se atendieran los requerimientos operativos para el mantenimiento de las vías rurales, optimizando la utilización de las maquinas.

Cuadro de cantidades ejecutadas:

it.	DESCRIPCIÓN	RESGUARDOS INDIGENAS	FECHA	VALORES CONTRATADOS			
				UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	MOTONIVELADORA 250 HP	MALES CORDOBA	12/01/2026	HORA	102	$ 201,484.00	$ 20,551,320.055
2	MOTONIVELADORA 250 HP	ALDEA DE MARIA	19/01/2026	HORA	102	$ 201,484.00	$ 20,551,320.055
3	MOTONIVELADORA 250 HP	YARAMAL	22/01/2026	HORA	102	$ 201,484.00	$ 20,551,320.055
4	MOTONIVELADORA 250 HP	SAN JUAN	16/02/2026	HORA	81	$ 201,484.00	$ 16,320,165.930
	VALOR TOTAL ACUMULADO:						**$ 77,974,126.09**

El reporte hace parte del informe de Gestión Técnica y Operativa de Maquinaria Amarilla presentado en el mes de febrero de 2026 por el equipo administrativo y de campo que ejerce el apoyo a la supervisión del proyecto "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño". Se anexa al presente documento el informe generado.

3.5 Actas Parciales:

- ✓ Hasta el momento no se ha entregado a la Gobernación de Nariño **Actas de Recibo Parcial** del Convenio Interadministrativo No. GN5090-2025.

AVANCE RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

- **Resumen:**

PERIODO DEL INFORME:	DEL 27 DE ENERO DE 2025 A 26 DE FEBRERO DE 2026
% AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	**AVANCE EJECUTADO ACUMULADO TOTAL: 70,15%**
% AVANCE REPROGRAMADO ACUMULADO:	**37,5%**
VIGENCIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO: (FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL)	DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1:	DESDE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 10 DE MAYO DE 2026


4. Anexos

4.1 Anexos aspectos jurídicos. N/A

VICTOR HUGO LOPEZ GUAMANTICA
Ingeniero Administrador
C.C. 16.079.884 de Manizales
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
NIT. 837.000.096-3

JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA
CC. 98.338.054
Representante Legal
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DE LA ZONA DE IPIALES

NIT. 837.000.096-3




YAMID ESTRADA ZAMBRANO
Director Interventoría
C.C. 13.070.217 de Pasto

REGISTRO FOTOGRAFICO

RESGUARDO INDIGENA DE ALDEA DE MARIA






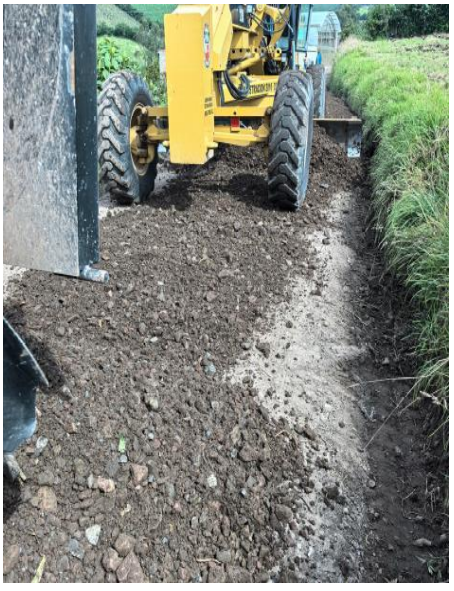







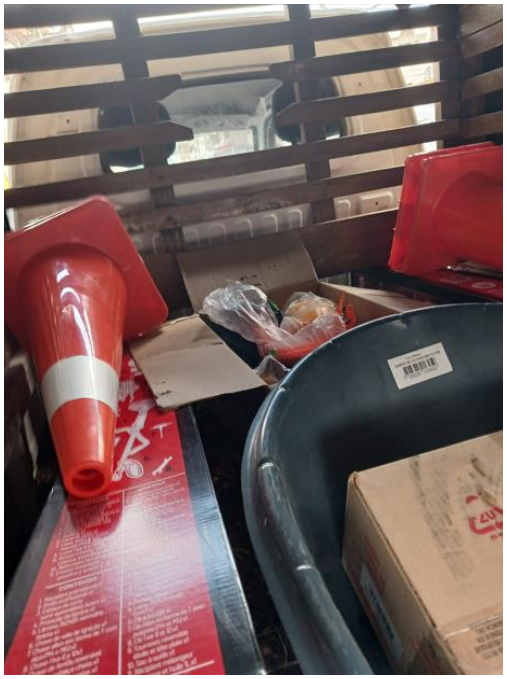



RESGUARDO INDIGENA DE MALES










RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL

















RESGUARDO INDIGENA DE PASTAS







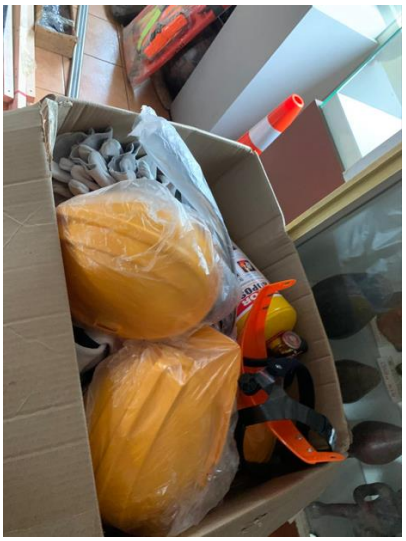




JESÚS
VMU-718




BELLOTA

RESGUARDO INDIGENA DE SAN JUAN





















BELLOTA
BELLOTA


BELLOTA


HERRAGRO



RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES









BELLOTA


BELLOTA



