

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **1** | **PROYECTO LP-002-SG-2025 MEDICINA LEGAL CARTAGENA** | | 91 días | **lun 15/12/25** | **mar 12/05/26** | COP 842,829,333.04 |
| 2 | | **1.1** | **FASE ADMINISTRATIVA Y PREPARACIÓN** | | 11 días | **lun 15/12/25** | **sáb 27/12/25** | COP 0.00 |
| 3 | | 1.1.1 | Documentos y trámites iniciales | | 5 días | lun 15/12/25 | vie 19/12/25 | COP 0.00 |
| 4 | | 1.1.2 | Compras y contratación de materiales | | 11 días | lun 15/12/25 | sáb 27/12/25 | COP 0.00 |
| 5 | | 1.1.3 | HITO: FIN FASE ADMINISTRATIVA - INICIO OBRA | | 0 días | sáb 27/12/25 | sáb 27/12/25 | COP 0.00 |
| 6 | | **1.2** | **FASE 1: IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA** | | 25 días | **lun 26/01/26** | **mié 25/02/26** | COP 83,655,670.00 |
| 7 | | **1.2.1** | **Cap VI - Impermeabilización Cubierta (Membrana)** | | 25 días | **lun 26/01/26** | **mié 25/02/26** | COP 83,655,670.00 |
| 8 | | 1.2.1.1 | 1.10 Retiro de membrana impermeabilizante existente, incluye retiro de todos los elementos que conforman la | Oficial Impermeabilización;A | 10 días | lun 26/01/26 | vie 6/02/26 | COP 4,516,390.00 |
| 9 | | 1.2.1.3 | 6.8 Suministro e instalación de membrana sarnafil | Oficial Impermeabilización;A | 15 días | vie 6/02/26 | mié 25/02/26 | COP 79,139,280.00 |
| 10 | | 1.2.2 | HITO: CUBIERTA IMPERMEABILIZADA | | 0 días | mié 25/02/26 | mié 25/02/26 | COP 0.00 |
| 11 | | **1.3** | **FASE 2: IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS** | | 25 días | **jue 19/02/26** | **mar 24/03/26** | COP 24,978,715.00 |
| 12 | | **1.3.1** | **Cap VI - Impermeabilización Fachadas** | | 25 días | **jue 19/02/26** | **mar 24/03/26** | COP 24,978,715.00 |
| 13 | | 1.3.1.1 | 6.1 Reparación de humedades en mampostería existente, con resina acuosa de impregnación a dos | Oficial Albañilería;Ayudante | 6 días | jue 19/02/26 | jue 26/02/26 | COP 3,762,880.00 |
| 14 | | 1.3.1.2 | 6.3 Prelavado de áreas de fachada en ladrillo a la vista | Oficial Impermeabilización;A | 5 días | jue 19/02/26 | mié 25/02/26 | COP 6,667,200.00 |
| 15 | | 1.3.1.3 | 6.4 Emboquillado de fachada en ladrillo a la vista | Ayudante Impermeabilización;C | 8 días | jue 19/02/26 | lun 2/03/26 | COP 75,585.00 |
| 16 | | 1.3.1.4 | 6.5 Impermeabilización de fachadas en ladrillo a la vista mediante hidrófugo | Ayudante Impermeabilización;C | 8 días | lun 2/03/26 | mié 11/03/26 | COP 7,159,050.00 |
| 17 | | 1.3.1.5 | 6.6 Siliconado perimetral de juntas de ventanas | Ayudante Impermeabilización;C | 4 días | jue 12/03/26 | mar 17/03/26 | COP 912,870.00 |
| 18 | | 1.3.1.6 | 6.7 Lavado y brillado general de ventanería y perfilería | Oficial Acabados;Ayudante | 4 días | jue 12/03/26 | mar 17/03/26 | COP 829,440.00 |
| 19 | | 1.3.1.7 | 6.2 Corrección de filtración en cielorraso, incluye inspección y detección de tubería con filtraciones o | Oficial Impermeabilización;A | 5 días | mar 17/03/26 | mar 24/03/26 | COP 5,571,690.00 |
| 20 | | 1.3.2 | HITO: FACHADAS IMPERMEABILIZADAS | | 0 días | mar 24/03/26 | mar 24/03/26 | COP 0.00 |
| 21 | | **1.4** | **FASE 3: PRIMER PISO - OBRA CIVIL Y SISTEMAS** | | 35 días | **mié 25/03/26** | **mar 12/05/26** | COP 126,864,823.06 |
| 22 | | **1.4.1** | **Cap I - Preliminares Primer Piso** | | 8 días | **lun 6/04/26** | **mié 15/04/26** | COP 2,796,282.50 |
| 23 | | 1.4.1.1 | 1.1 Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 | COP 768,565.00 |
| 24 | | 1.4.1.2 | 1.2 Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | mar 14/04/26 | mié 15/04/26 | COP 316,260.00 |
| 25 | | 1.4.1.3 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 | COP 614,048.33 |
| 26 | | 1.4.1.4 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | mié 8/04/26 | jue 9/04/26 | COP 47,075.00 |
| 27 | | 1.4.1.5 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de | Oficial Albañilería;Ayudante | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 | COP 521,476.67 |
| 28 | | 1.4.1.6 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | Ayudante Carpintería | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 | COP 494,260.00 |
| 29 | | 1.4.1.7 | 1.14 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | sáb 11/04/26 | mar 14/04/26 | COP 34,597.50 |
| 30 | | 1.4.2 | HITO: PRELIMINARES 1ER PISO COMPLETADOS | | 0 días | mié 15/04/26 | mié 15/04/26 | COP 0.00 |
| 31 | | **1.4.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias 1er Piso** | | 2 días | **mié 15/04/26** | **vie 17/04/26** | COP 274,230.00 |
| 32 | | 1.4.3.1 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 274,230.00 |
| 33 | | **1.4.4** | **Cap IV - Bases y Pisos 1er Piso** | | 8 días | **mié 8/04/26** | **vie 17/04/26** | COP 2,037,955.00 |
| 34 | | 1.4.4.3 | 4.1 Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 1,347,307.00 |
| 35 | | 1.4.4.4 | 4.6 Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger | Ayudante Albañilería;Oficial | 6 días | mié 8/04/26 | mié 15/04/26 | COP 690,648.00 |
| 36 | | **1.4.5** | **Cap V - Cielorrasos 1er Piso** | | 7 días | **sáb 11/04/26** | **lun 20/04/26** | COP 3,579,500.00 |
| 37 | | 1.4.5.1 | 5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. | Oficial Drywall;Ayudante | 7 días | sáb 11/04/26 | lun 20/04/26 | COP 3,279,430.00 |
| 38 | | 1.4.5.2 | 5.2 Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral | Ayudante Drywall;Oficial | 7 días | sáb 11/04/26 | lun 20/04/26 | COP 300,070.00 |
| 39 | | **1.5.6** | **Cap VI - Impermeabilizaciones** | | **3 días** | **mié 8/04/26** | **vie 10/04/26** | **COP 412,687.50** |
| 40 | | 1.5.6.1 | 6.9 Reparación de humedades en mampostería existente | | 3 días | mié 8/04/26 | vie 10/04/26 | COP 412,687.50 |
| 41 | | **1.4.6** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas 1er Piso** | | 25 días | **mié 25/03/26** | **mar 28/04/26** | COP 25,861,369.00 |
| 42 | | 1.4.6.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de | Oficial Electricista;Ayudante | 3 días | sáb 11/04/26 | mié 15/04/26 | COP 104,690.00 |
| 43 | | 1.4.6.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 393,510.67 |
| 44 | | 1.4.6.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 129,983.33 |
| 45 | | 1.4.6.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 565,380.00 |
| 46 | | 1.4.6.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 331,464.00 |
| 47 | | 1.4.6.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | COP 180,057.00 |
| 48 | | 1.4.6.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 | Oficial General;Ayudante | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | COP 358,396.00 |
| 49 | | 1.4.6.8 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 | COP 1,042,395.00 |
| 50 | | 1.4.6.9 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 | COP 9,027,406.67 |
| 51 | | 1.4.6.10 | 11.20 Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público | Oficial Electricista;Ayudante | 3 días | mié 25/03/26 | vie 27/03/26 | COP 4,431,819.00 |
| 52 | | 1.4.6.11 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 | COP 6,630,603.33 |
| 53 | | 1.4.6.12 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | Ayudante Electricista;Oficial | 3 días | sáb 28/03/26 | mié 1/04/26 | COP 2,665,664.00 |
| 54 | | **1.4.7** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Interior 1er Piso** | | 13 días | **mié 15/04/26** | **sáb 2/05/26** | COP 9,091,169.72 |
| 55 | | 1.4.7.1 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | mié 15/04/26 | jue 16/04/26 | COP 860,222.67 |
| 56 | | 1.4.7.2 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | COP 439,504.00 |
| 57 | | 1.4.7.3 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 1,142,202.25 |
| 58 | | 1.4.7.4 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | vie 17/04/26 | lun 20/04/26 | COP 338,622.67 |

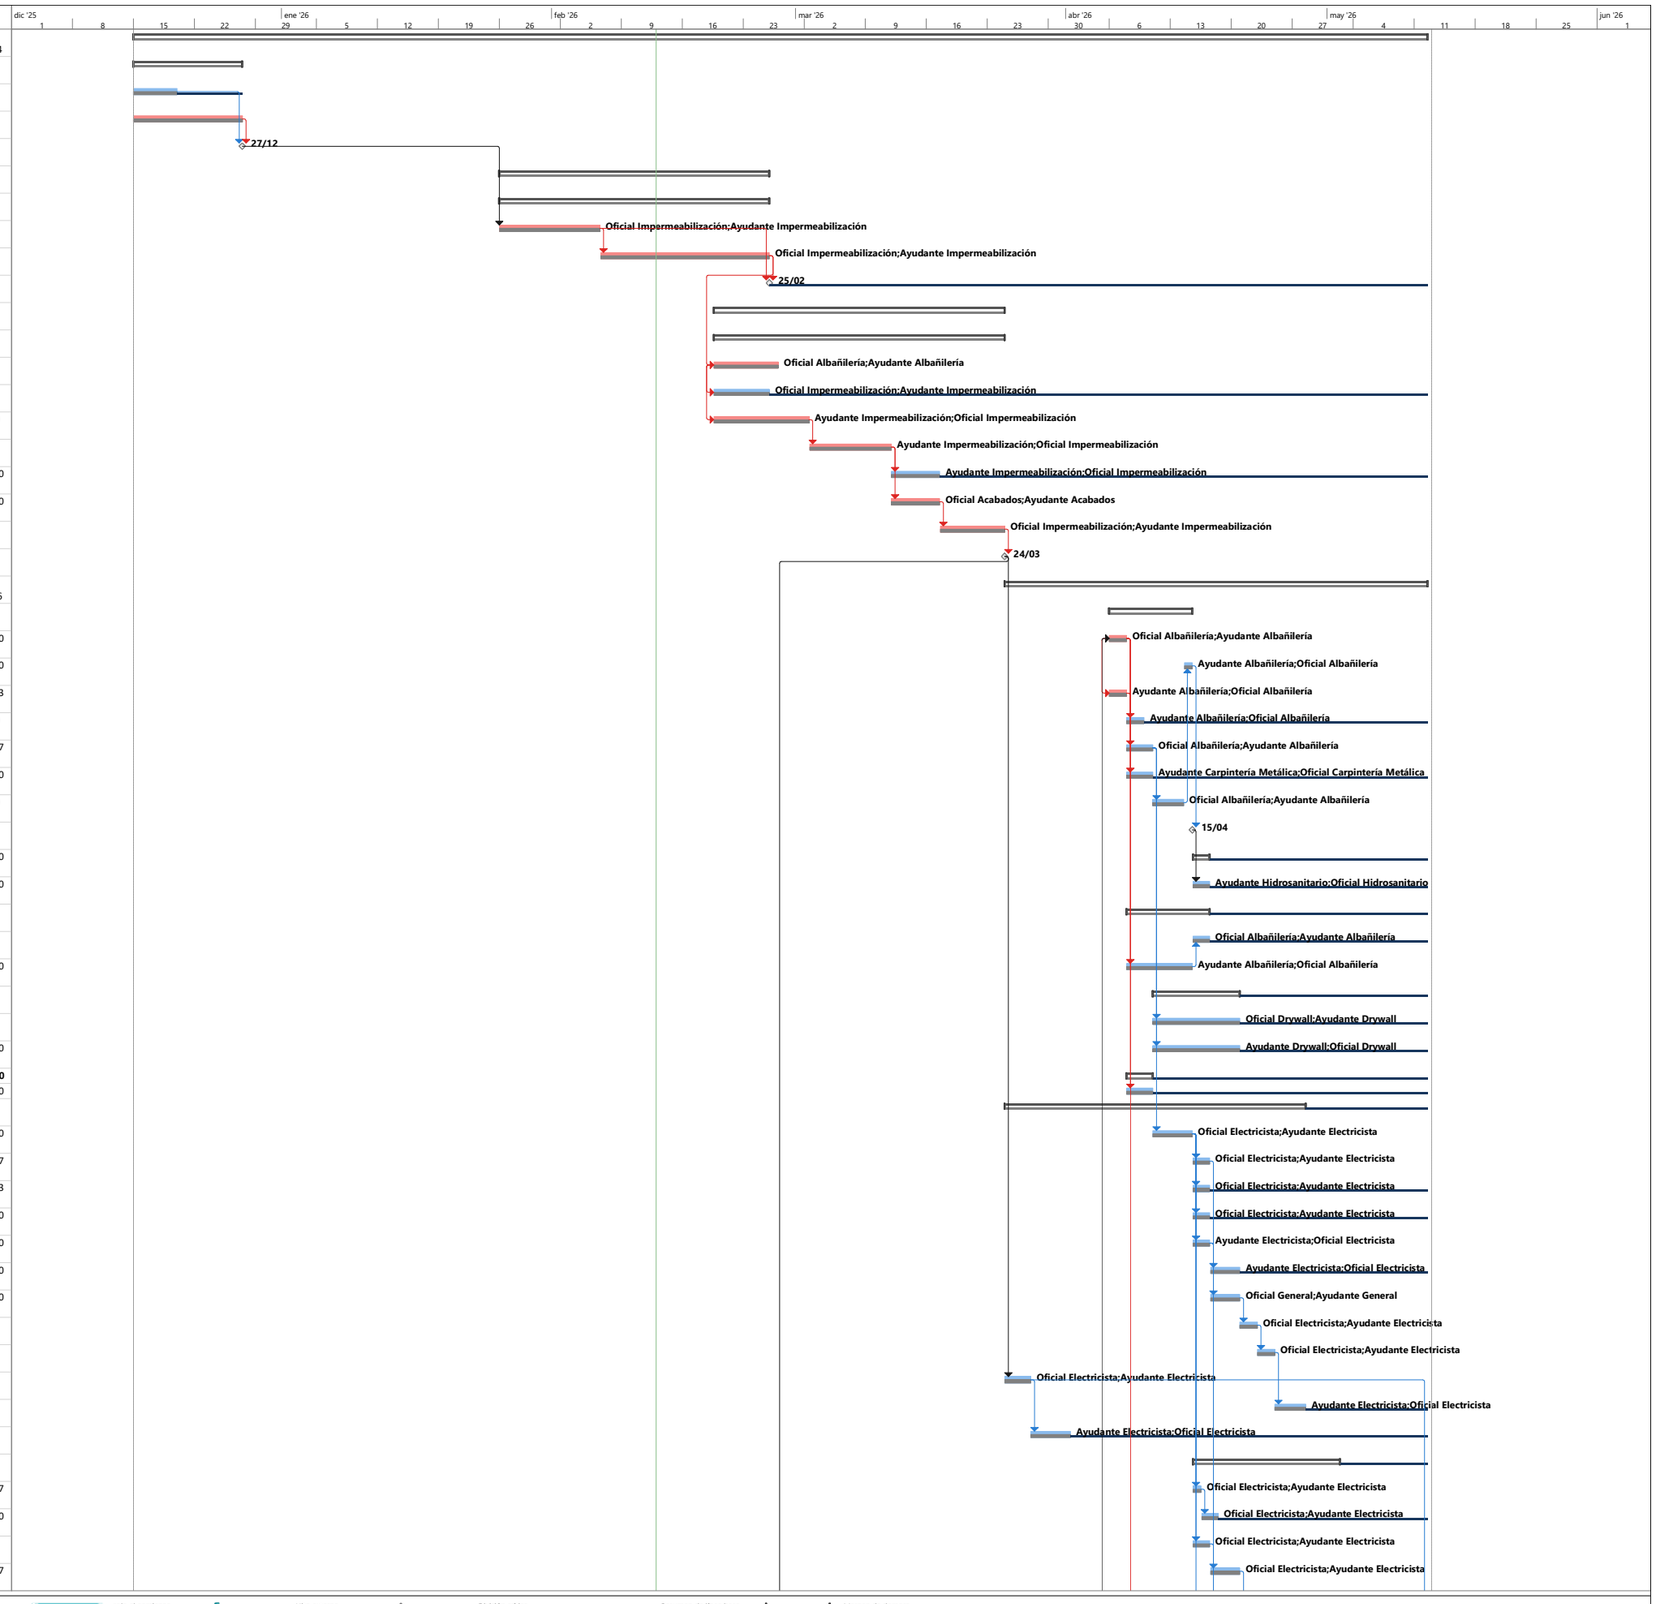


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica · Resumen de línea base · Margen de demora
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Línea base · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Hito de línea base · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | 1.4.7.5 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 | COP 251,594.40 |
| 60 | | 1.4.7.6 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 | COP 251,594.40 |
| 61 | | 1.4.7.7 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 | COP 3,767,115.33 |
| 62 | | 1.4.7.8 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado | Oficial General;Ayudante | 2 días | mar 28/04/26 | jue 30/04/26 | COP 504,520.00 |
| 63 | | 1.4.7.9 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 231,492.67 |
| 64 | | 1.4.7.10 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mié 15/04/26 | vie 17/04/26 | COP 588,825.33 |
| 65 | | 1.4.7.11 | 12.11 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | vie 17/04/26 | sáb 18/04/26 | COP 715,476.00 |
| 66 | | **1.4.8** | **Cap XIII - Sistemas Aire Acondicionado Convencional** | | 8 días | **jue 30/04/26** | **mar 12/05/26** | COP 20,570,576.50 |
| 67 | | 1.4.8.1 | 13.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema | Oficial HVAC | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 1,192,482.00 |
| 68 | | 1.4.8.2 | 13.2 Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU | Oficial HVAC | 3 días | vie 8/05/26 | mar 12/05/26 | COP 8,969,768.00 |
| 69 | | 1.4.8.3 | 13.3 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU | Oficial HVAC | 2 días | lun 4/05/26 | mar 5/05/26 | COP 5,708,706.00 |
| 70 | | 1.4.8.4 | 13.4 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, | Oficial HVAC | 2 días | mié 6/05/26 | jue 7/05/26 | COP 3,210,487.00 |
| 71 | | 1.4.8.5 | 13.5 Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V | Oficial HVAC | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 | COP 853,979.00 |
| 72 | | 1.4.8.6 | 13.6 Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de | Oficial HVAC | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 635,154.50 |
| 73 | | **1.4.9** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes 1er Piso** | | 6 días | **mié 8/04/26** | **mié 15/04/26** | COP 2,326,110.00 |
| 74 | | 1.4.9.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | Oficial Albañilería;Ayudante | 6 días | mié 8/04/26 | mié 15/04/26 | COP 1,525,400.00 |
| 75 | | 1.4.9.2 | 3.2 Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | mié 8/04/26 | jue 9/04/26 | COP 241,460.00 |
| 76 | | 1.4.9.3 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | Ayudante Albañilería;Oficial | 3 días | vie 10/04/26 | mar 14/04/26 | COP 559,250.00 |
| 77 | | **1.4.10** | **Cap IX - Pinturas 1er Piso** | | 12 días | **mié 15/04/26** | **jue 30/04/26** | COP 49,543,707.50 |
| 78 | | 1.4.10.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | Oficial Pintura;Ayudante | 7 días | mié 15/04/26 | jue 23/04/26 | COP 783,085.00 |
| 79 | | 1.4.10.2 | 9.3 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos | Oficial Pintura;Ayudante | 5 días | vie 24/04/26 | jue 30/04/26 | COP 48,760,622.50 |
| 80 | | **1.4.11** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios 1er Piso** | | 5 días | **jue 30/04/26** | **jue 7/05/26** | COP 6,852,671.00 |
| 81 | | 1.4.11.1 | 7.3 Suministroe instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 1,440,304.00 |
| 82 | | 1.4.11.2 | 7.5 Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | lun 4/05/26 | mar 5/05/26 | COP 636,000.00 |
| 83 | | 1.4.11.3 | 7.7 Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | mié 6/05/26 | jue 7/05/26 | COP 4,776,367.00 |
| 84 | | **1.4.12** | **Cap X - Varios 1er Piso** | | 4 días | **jue 30/04/26** | **mié 6/05/26** | COP 3,047,017.67 |
| 85 | | 1.4.12.1 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | Oficial Acabados;Ayudante | 2 días | jue 30/04/26 | lun 4/05/26 | COP 1,037,166.00 |
| 86 | | 1.5.13.2 | 10.2 Suministro e instalación de cinta antideslizante foto-l | Ayudante Acabados;O | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 220,493.00 |
| 87 | | 1.4.12.2 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | Ayudante Carpintería | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 302,586.67 |
| 88 | | 1.4.12.3 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | Ayudante Carpintería | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 1,486,772.00 |
| 89 | | **1.4.13** | **Cap VIII - Elementos Metálicos 1er Piso** | | 2 días | **jue 7/05/26** | **vie 8/05/26** | COP 471,546.67 |
| 90 | | 1.4.13.1 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 | COP 471,546.67 |
| 91 | | 1.5 | HITO: PRIMER PISO COMPLETADO | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 92 | | **1.6** | **FASE 4: SEGUNDO PISO** | | 28 días | **sáb 28/02/26** | **mié 8/04/26** | COP 126,644,330.06 |
| 93 | | **1.6.1** | **Cap I - Preliminares Segundo Piso** | | 13 días | **sáb 28/02/26** | **mar 17/03/26** | COP 2,796,282.50 |
| 94 | | 1.6.1.1 | 1.1 Demolición de acabado de piso en enchape cerámico, epóxico o tablón de gres y afinado hasta de 10 cm. | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | sáb 28/02/26 | mar 3/03/26 | COP 768,565.00 |
| 95 | | 1.6.1.2 | 1.2 Desmonte de aparatos sanitarios (sanitario y orinales). | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | mar 3/03/26 | mié 4/03/26 | COP 316,260.00 |
| 96 | | 1.6.1.3 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | Ayudante Albañilería;Oficial | 4 días | mar 3/03/26 | sáb 7/03/26 | COP 614,048.33 |
| 97 | | 1.6.1.4 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | lun 9/03/26 | mar 10/03/26 | COP 47,075.00 |
| 98 | | 1.6.1.5 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de | Ayudante Albañilería;Oficial | 4 días | lun 9/03/26 | jue 12/03/26 | COP 521,476.67 |
| 99 | | 1.6.1.6 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | Ayudante Carpintería | 3 días | mar 3/03/26 | vie 6/03/26 | COP 494,260.00 |
| 100 | | 1.6.1.7 | 1.14 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso en fibra mineral. | Oficial Albañilería;Ayudante | 3 días | vie 13/03/26 | mar 17/03/26 | COP 34,597.50 |
| 101 | | 1.6.2 | HITO: PRELIMINARES 2o PISO COMPLETADOS | | 0 días | mar 17/03/26 | mar 17/03/26 | COP 0.00 |
| 102 | | **1.6.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias 2o Piso** | | 2 días | **mar 17/03/26** | **jue 19/03/26** | COP 274,230.00 |
| 103 | | 1.6.3.1 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 274,230.00 |
| 104 | | **1.6.4** | **Cap IV - Bases y Pisos 2o Piso** | | 8 días | **mar 3/03/26** | **jue 12/03/26** | COP 2,037,955.00 |
| 105 | | 1.6.4.3 | 4.1 Construcción de guarda escoba media caña en granito lavado de 0,10 m. x 0,10 m., | Ayudante Albañilería;Oficial | 3 días | mar 10/03/26 | jue 12/03/26 | COP 1,347,307.00 |
| 106 | | 1.6.4.4 | 4.6 Suministro e instalación acabado de piso en gravilla lavada grano 1 color a escoger | Ayudante Albañilería;Oficial | 5 días | mar 3/03/26 | lun 9/03/26 | COP 690,648.00 |
| 107 | | **1.6.5** | **Cap V - Cielorrasos 2o Piso** | | 7 días | **vie 13/03/26** | **sáb 21/03/26** | COP 3,579,500.00 |
| 108 | | 1.6.5.1 | 5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard 6mm. | Ayudante Drywall;Oficial | 7 días | vie 13/03/26 | sáb 21/03/26 | COP 3,279,430.00 |
| 109 | | 1.6.5.2 | 5.2 Cambio de láminas de cielorraso en fibra mineral | Ayudante Drywall;Oficial | 7 días | vie 13/03/26 | sáb 21/03/26 | COP 300,070.00 |
| 110 | | **1.6.6** | **Cap VI - Impermeabilizaciones** | | **3 días** | **lun 9/03/26** | **mié 11/03/26** | **COP 412,687.50** |
| 111 | | 1.6.6.1 | 6.9 Reparación de humedades en mampostería existente | | 3 días | lun 9/03/26 | mié 11/03/26 | COP 412,687.50 |
| 112 | | **1.6.6** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas 2o Piso** | | 21 días | **mar 3/03/26** | **mar 31/03/26** | COP 25,861,369.00 |
| 113 | | 1.6.6.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de | Ayudante Electricista;Oficial | 3 días | vie 13/03/26 | mar 17/03/26 | COP 104,690.00 |
| 114 | | 1.6.6.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 393,510.67 |
| 115 | | 1.6.6.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 129,983.33 |
| 116 | | 1.6.6.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 565,380.00 |

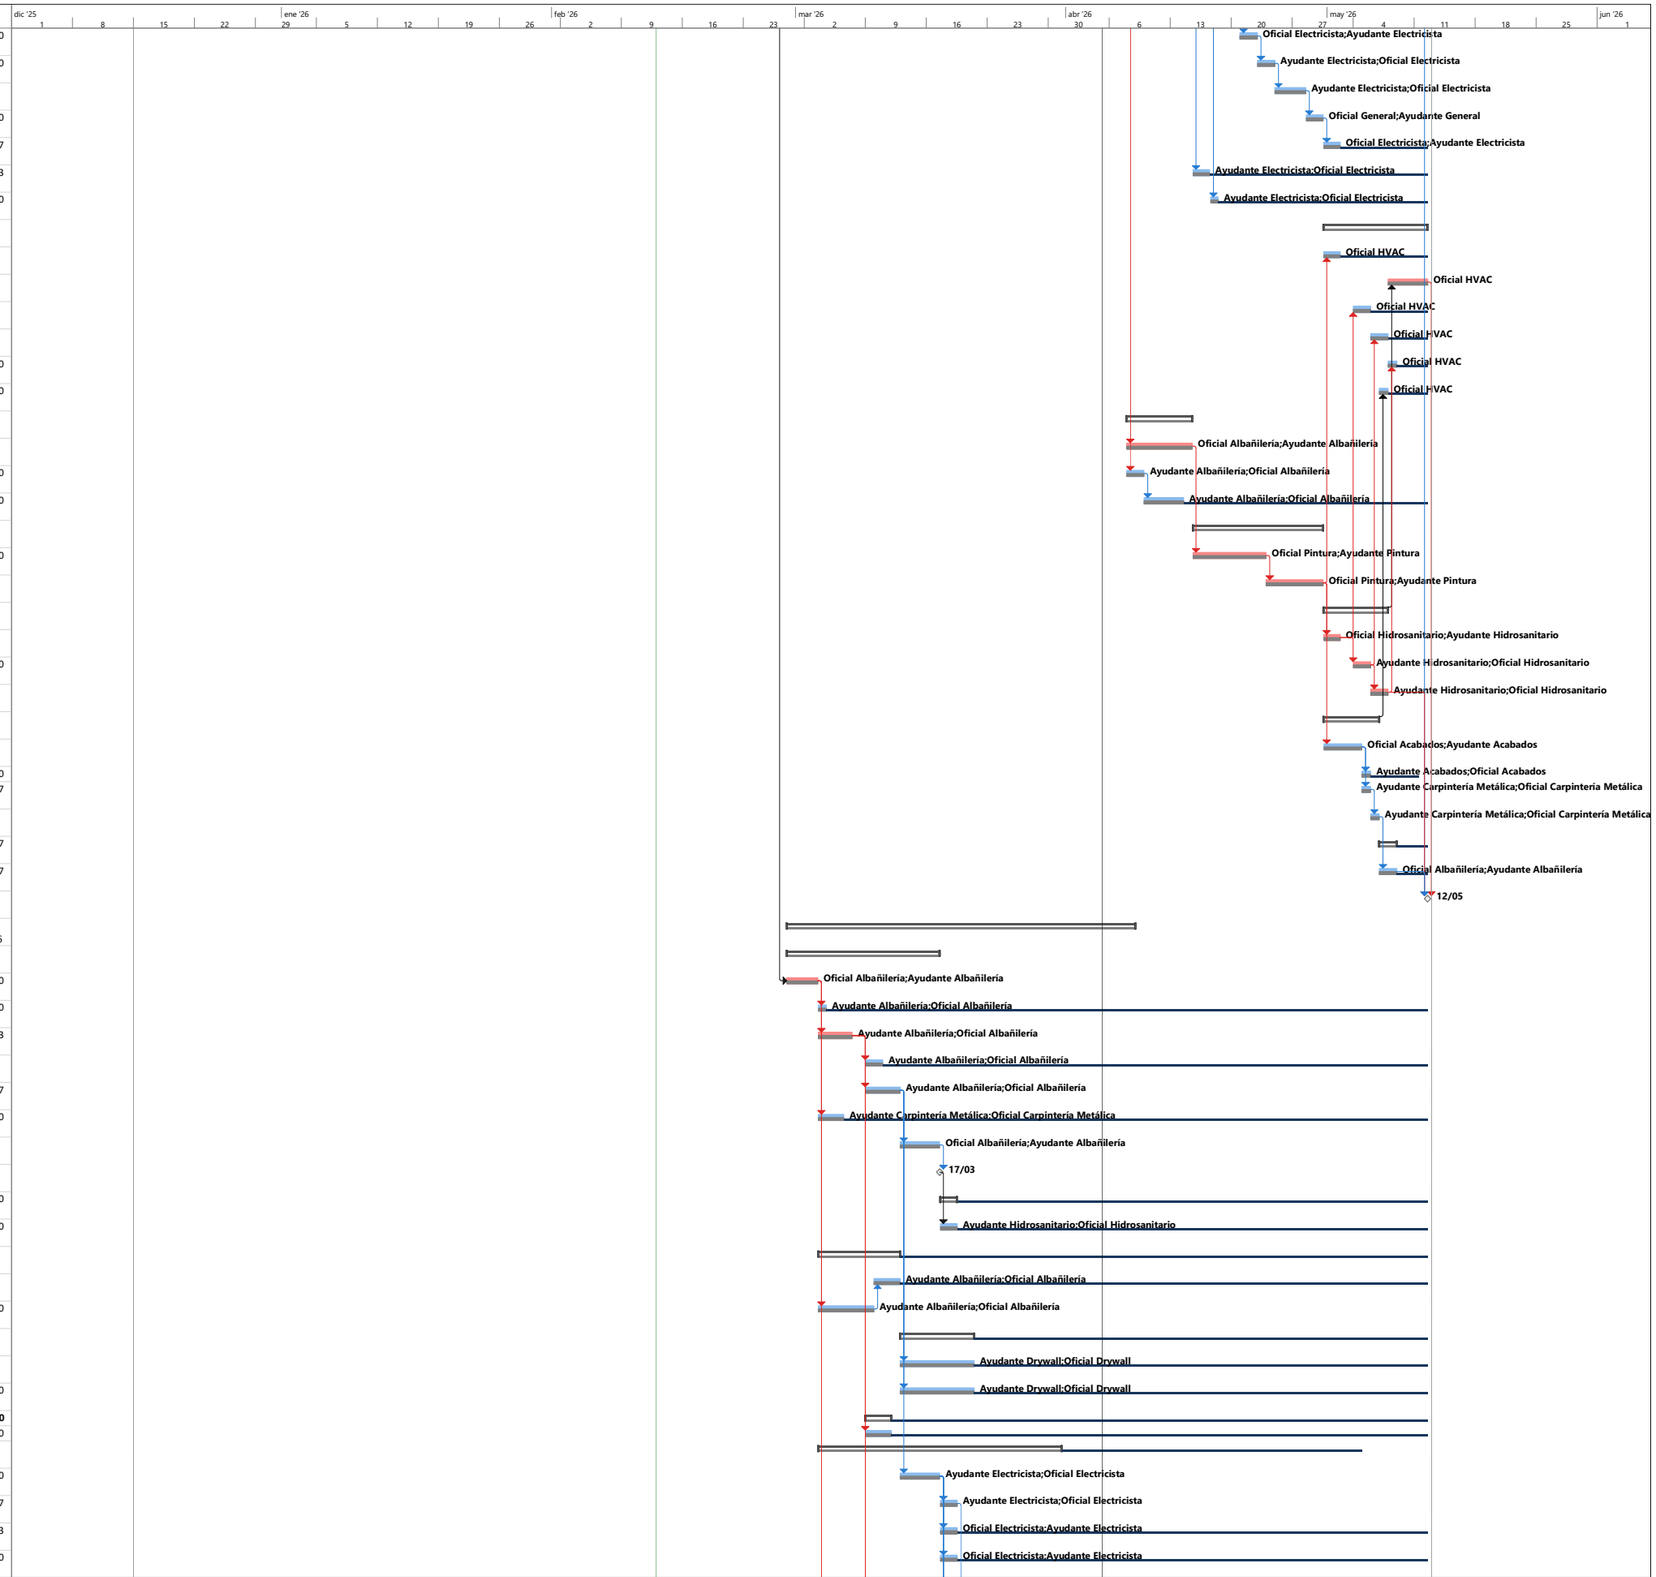


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica · Resumen de línea base · Margen de demora
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Línea base · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Hito de línea base · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | | 1.6.6.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 331,464.00 |
| 118 | | 1.6.6.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 | COP 180,057.00 |
| 119 | | 1.6.6.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 | Oficial General;Ayudante | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 | COP 358,396.00 |
| 120 | | 1.6.6.8 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mar 24/03/26 | mié 25/03/26 | COP 1,042,395.00 |
| 121 | | 1.6.6.9 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | COP 9,027,406.67 |
| 122 | | 1.6.6.10 | 11.20 Suministro e instalación de luminaria solar para aplicación de alumbrado público | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 3/03/26 | jue 5/03/26 | COP 4,431,819.00 |
| 123 | | 1.6.6.11 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 | COP 6,630,603.33 |
| 124 | | 1.6.6.12 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | Ayudante Electricista;Oficial | 3 días | jue 5/03/26 | lun 9/03/26 | COP 2,665,664.00 |
| 125 | | **1.6.7** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Interior 2o Piso** | | 13 días | **mar 17/03/26** | **lun 6/04/26** | COP 9,091,169.72 |
| 126 | | 1.6.7.1 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 17/03/26 | mié 18/03/26 | COP 860,222.67 |
| 127 | | 1.6.7.2 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mié 18/03/26 | vie 20/03/26 | COP 439,504.00 |
| 128 | | 1.6.7.3 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 1,142,202.25 |
| 129 | | 1.6.7.4 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | jue 19/03/26 | sáb 21/03/26 | COP 338,622.67 |
| 130 | | 1.6.7.5 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | mar 24/03/26 | mié 25/03/26 | COP 251,594.40 |
| 131 | | 1.6.7.6 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | jue 26/03/26 | vie 27/03/26 | COP 251,594.40 |
| 132 | | 1.6.7.7 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 | COP 3,767,115.33 |
| 133 | | 1.6.7.8 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado | Oficial General;Ayudante | 2 días | mar 31/03/26 | sáb 4/04/26 | COP 504,520.00 |
| 134 | | 1.6.7.9 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | lun 6/04/26 | lun 6/04/26 | COP 231,492.67 |
| 135 | | 1.6.7.10 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | Ayudante Electricista;Oficial | 2 días | mar 17/03/26 | jue 19/03/26 | COP 588,825.33 |
| 136 | | 1.6.7.11 | 12.11 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente | Ayudante Electricista;Oficial | 3 días | jue 19/03/26 | mar 24/03/26 | COP 715,476.00 |
| 137 | | **1.6.8** | **Cap XIII - Sistemas Aire Acondicionado Convencional** | | 7 días | **sáb 28/03/26** | **mié 8/04/26** | COP 20,570,576.50 |
| 138 | | 1.6.8.1 | 13.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de sistema | Oficial HVAC | 1 día | sáb 28/03/26 | lun 30/03/26 | COP 1,192,482.00 |
| 139 | | 1.6.8.2 | 13.2 Suministro e instalación de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 18.000 BTU | Oficial HVAC | 2 días | mar 7/04/26 | mié 8/04/26 | COP 8,969,768.00 |
| 140 | | 1.6.8.3 | 13.3 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 12.000 BTU | Oficial HVAC | 2 días | lun 30/03/26 | mié 1/04/26 | COP 5,708,706.00 |
| 141 | | 1.6.8.4 | 13.4 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, | Oficial HVAC | 2 días | mié 1/04/26 | lun 6/04/26 | COP 3,210,487.00 |
| 142 | | 1.6.8.5 | 13.5 Suministro e instalacion de ventilador industrial tipo pared, con control remoto con capacidad de 90 W, 120V | Oficial HVAC | 1 día | mar 7/04/26 | mar 7/04/26 | COP 853,979.00 |
| 143 | | 1.6.8.6 | 13.6 Suministro de materiales y mano de obra para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de | Oficial HVAC | 1 día | lun 6/04/26 | lun 6/04/26 | COP 635,154.50 |
| 144 | | **1.6.9** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes 2o Piso** | | 6 días | **lun 9/03/26** | **lun 16/03/26** | COP 2,326,110.00 |
| 145 | | 1.6.9.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | Oficial Albañilería;Ayudante | 4 días | lun 9/03/26 | jue 12/03/26 | COP 1,525,400.00 |
| 146 | | 1.6.9.2 | 3.2 Cambio de piezas rotas o en mal estado en enchape cerámico (piso-pared) homologando caracteristicas | Ayudante Albañilería;Oficial | 3 días | lun 9/03/26 | mié 11/03/26 | COP 241,460.00 |
| 147 | | 1.6.9.3 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | Ayudante Albañilería;Oficial | 3 días | jue 12/03/26 | lun 16/03/26 | COP 559,250.00 |
| 148 | | **1.6.10** | **Cap IX - Pinturas 2o Piso** | | 11 días | **vie 13/03/26** | **vie 27/03/26** | COP 49,543,707.50 |
| 149 | | 1.6.10.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | Oficial Pintura;Ayudante | 5 días | vie 13/03/26 | jue 19/03/26 | COP 783,085.00 |
| 150 | | 1.6.10.2 | 9.3 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos | Oficial Pintura;Ayudante | 6 días | jue 19/03/26 | vie 27/03/26 | COP 48,760,622.50 |
| 151 | | **1.6.11** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios 2o Piso** | | 5 días | **sáb 28/03/26** | **lun 6/04/26** | COP 6,852,671.00 |
| 152 | | 1.6.11.1 | 7.3 Suministro e instalación de lavamanos de colgar en porcelana blanco (Happy Blanco) | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | sáb 28/03/26 | lun 30/03/26 | COP 1,440,304.00 |
| 153 | | 1.6.11.2 | 7.5 Suministro e instalación de conjunto grifería completa sanitario | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | lun 30/03/26 | mié 1/04/26 | COP 636,000.00 |
| 154 | | 1.6.11.3 | 7.7 Destape red sanitaria existente incluye sondeo de tubería reemplazo de accesorios y tubería existente | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 2 días | mié 1/04/26 | lun 6/04/26 | COP 4,776,367.00 |
| 155 | | **1.6.12** | **Cap X - Varios 2o Piso** | | 4 días | **sáb 28/03/26** | **sáb 4/04/26** | COP 2,826,524.67 |
| 156 | | 1.6.12.2 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | Oficial Acabados;Ayudante | 2 días | sáb 28/03/26 | mar 31/03/26 | COP 1,037,166.00 |
| 157 | | 1.6.12.3 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | Ayudante Carpintería | 1 día | mar 31/03/26 | mié 1/04/26 | COP 302,586.67 |
| 158 | | 1.6.12.4 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | Ayudante Carpintería | 1 día | mié 1/04/26 | sáb 4/04/26 | COP 1,486,772.00 |
| 159 | | **1.6.13** | **Cap VIII - Elementos Metálicos 2o Piso** | | 2 días | **lun 6/04/26** | **mar 7/04/26** | COP 471,546.67 |
| 160 | | 1.6.13.1 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | lun 6/04/26 | mar 7/04/26 | COP 471,546.67 |
| 161 | | 1.7 | HITO: SEGUNDO PISO COMPLETADO | | 0 días | mié 8/04/26 | mié 8/04/26 | COP 0.00 |
| 162 | | **1.8** | **FASE 5: PLAN DE CHOQUE MORGUE** | | 28 días | **lun 6/04/26** | **mar 12/05/26** | COP 190,434,645.91 |
| 163 | | **1.8.1** | **Cap I - Preliminares Morgue** | | 15 días | **lun 6/04/26** | **jue 23/04/26** | COP 6,557,771.00 |
| 164 | | 1.8.1.1 | 1.13 Limpieza y desinfección con hipoclorito y detergente de áreas a intervenir en sala de necropsias | Ayudante Albañilería;Oficial | 3 días | lun 6/04/26 | mié 8/04/26 | COP 174,920.00 |
| 165 | | 1.8.1.3 | 1.3 Desmonte de divisiones de baño en lámina metálica. | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | jue 9/04/26 | vie 10/04/26 | COP 401,499.00 |
| 166 | | 1.8.1.4 | 1.8 Desmonte, adecuación y reinstalación de mesas de necropsias | Oficial General;Ayudante | 1 día | sáb 11/04/26 | lun 13/04/26 | COP 1,181,112.00 |
| 167 | | 1.8.1.5 | 1.11 Demolición de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural | Oficial Albañilería;Ayudante | 3 días | lun 13/04/26 | jue 16/04/26 | COP 2,174,040.00 |
| 168 | | 1.8.1.6 | 1.12 Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | sáb 11/04/26 | lun 13/04/26 | COP 769,545.00 |
| 169 | | 1.8.1.7 | 1.4 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad hasta encontrar mampostería | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | COP 614,048.33 |
| 170 | | 1.8.1.8 | 1.5 Regatas para instalación de puntos hidráulicos, sanitarios y/o eléctricos | Oficial Electricista;Ayudante | 2 días | lun 20/04/26 | mar 21/04/26 | COP 47,075.00 |
| 171 | | 1.8.1.9 | 1.6 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, PVC, madera o láminas metálicas, incluye desmonte de | Oficial Drywall;Ayudante | 3 días | lun 20/04/26 | mié 22/04/26 | COP 521,476.67 |
| 172 | | 1.7.1.9 | 1.7 Desmonte de guarda camillas, incluye el desmonte de | Oficial Acabados;Ayu | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 179,795.00 |
| 173 | | 1.8.1.10 | 1.9 Desmonte y reinstalación de puertas o ventanas. | Oficial Carpintería Metálica;Ayudante | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 494,260.00 |

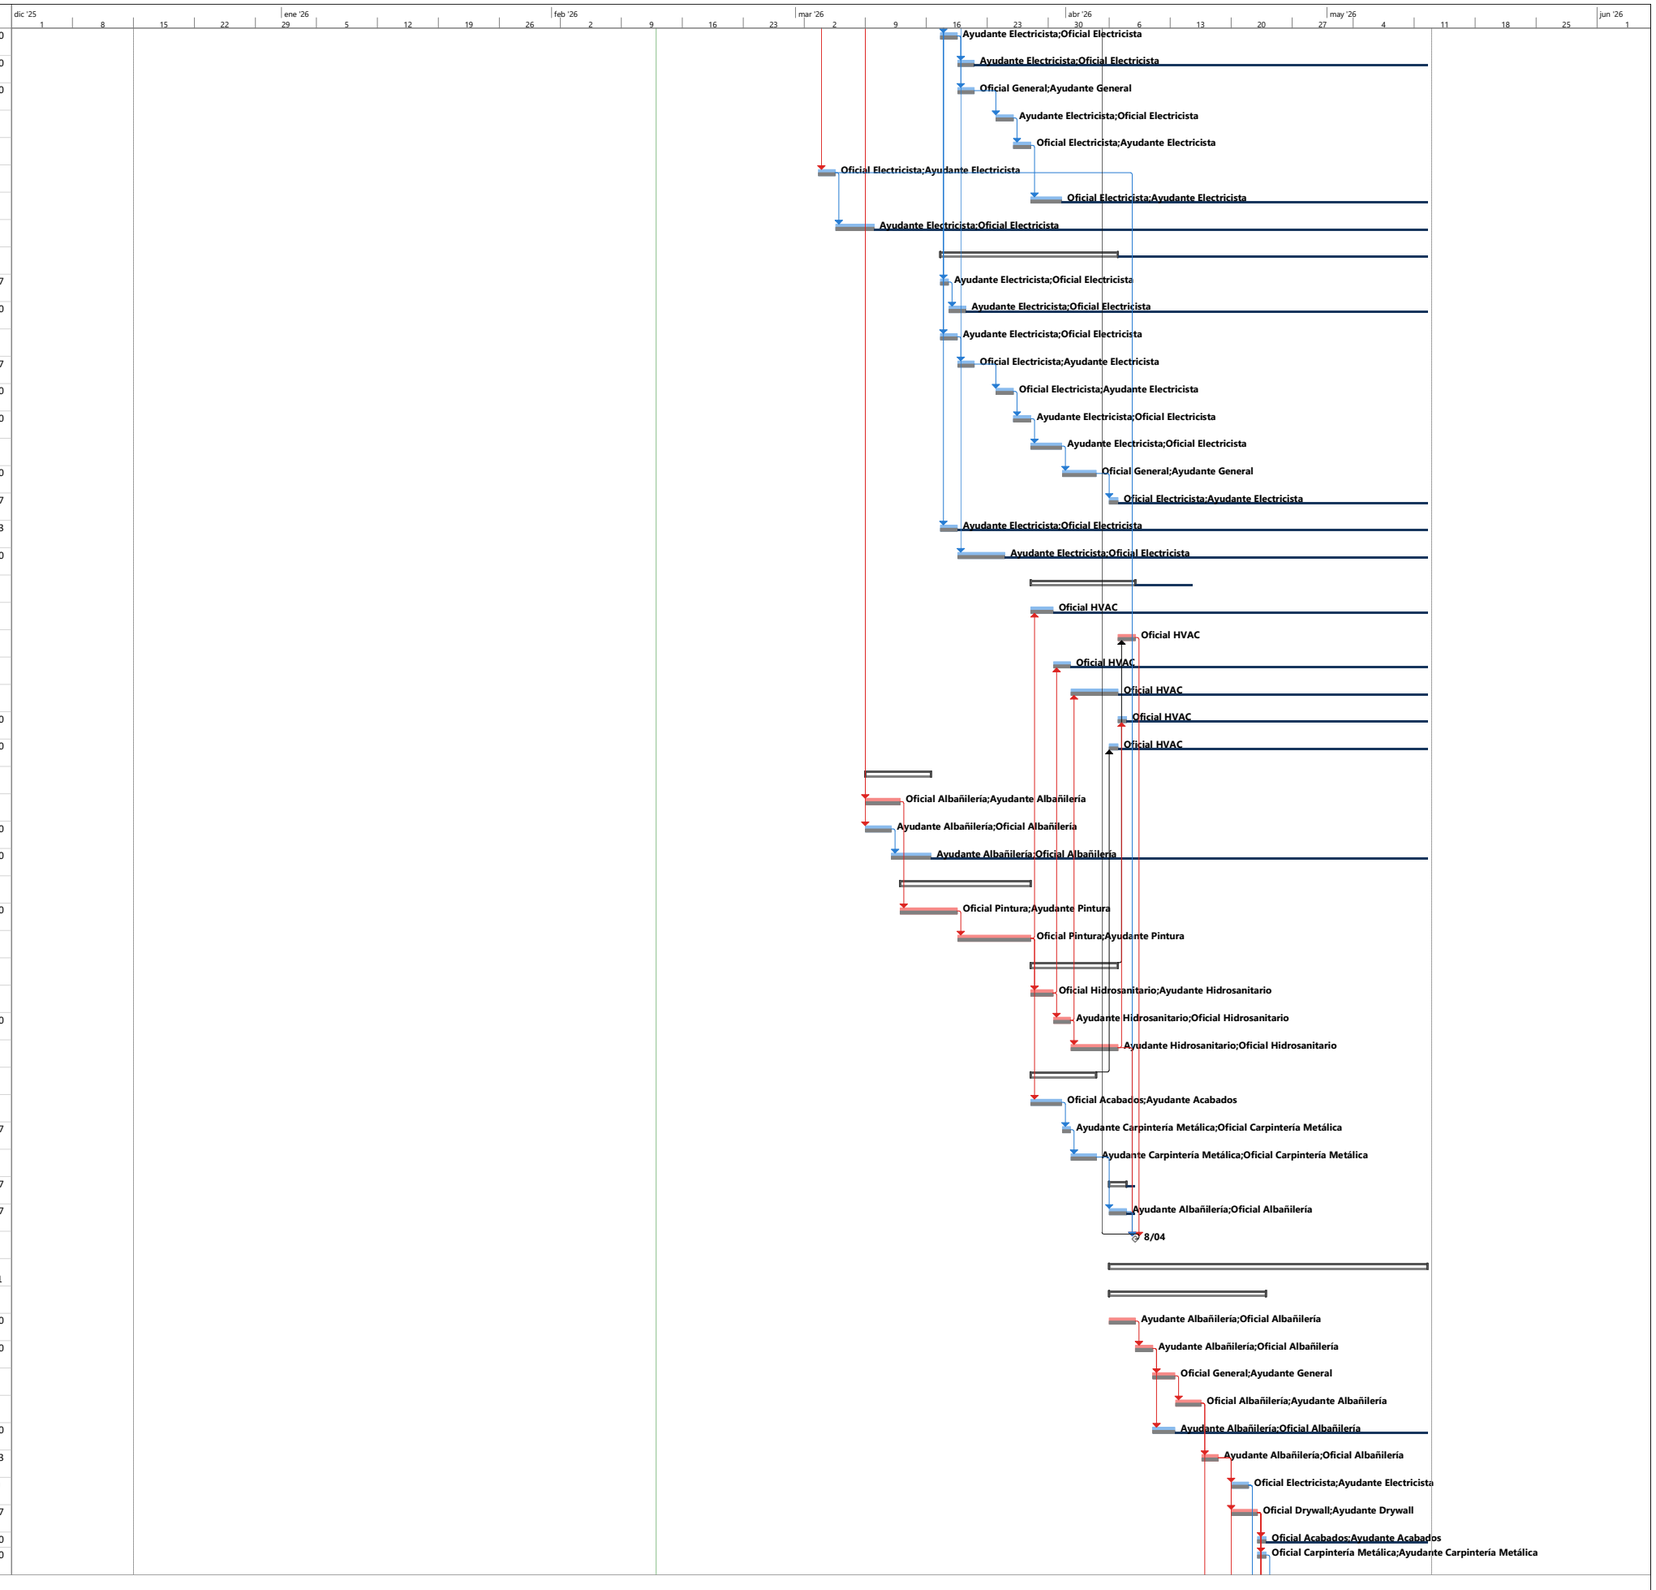



Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica · Resumen de línea base · Margen de demora
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Línea base · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Hito de línea base · Progreso manual

| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | | 1.8.2 | HITO: DEMOLICIONES MORGUE COMPLETADAS | | 0 días | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 0.00 |
| 175 | | **1.8.3** | **Cap II - Instalaciones Hidrosanitarias Morgue** | | 3 días | **mié 22/04/26** | **vie 24/04/26** | COP 2,049,969.00 |
| 176 | | 1.8.3.1 | 2.1 Punto Sanitario de 2", incluye tubería hasta 1,50 m, accesorios PVC | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | COP 511,236.00 |
| 177 | | 1.8.3.2 | 2.2 Tubería PVC-sanitaria 2", incluye tubería PVC, accesorios PVC | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | COP 553,460.00 |
| 178 | | 1.8.3.3 | 2.3 Punto agua fría de 1/2", incluye tubería hasta 1,5 m, accesorios de PVC | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 134,445.00 |
| 179 | | 1.8.3.4 | 2.4 Red agua fría PVC presión 1/2", Incluye tubería de PVC RDE 9, accesorios de PVC | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 391,830.00 |
| 180 | | 1.8.3.5 | 2.5 Registro PVC 1/2" (Válvula 235 PSI) tipo pesado | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 184,768.00 |
| 181 | | 1.8.3.6 | 2.6 Sondeo de punto sanitario y/o desagüe con sonda eléctrica | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | COP 274,230.00 |
| 182 | | **1.8.4** | **Cap IV - Bases y Pisos Morgue** | | 6 días | **jue 16/04/26** | **jue 23/04/26** | COP 29,451,843.00 |
| 183 | | 1.8.4.1 | 4.5 Placa de contrapiso en concreto de 3,000 psi, | Oficial Albañilería;Ayudante | 2 días | jue 16/04/26 | sáb 18/04/26 | COP 5,792,715.00 |
| 184 | | 1.8.4.2 | 4.2 Alistado de piso y pendientado en mortero impermeabilizado 1 :3 | Oficial Albañilería;Ayudante | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 | COP 2,877,840.00 |
| 185 | | 1.8.4.3 | 4.3 Reparación de piso epóxico semiliso color plano, incluye preparación de la superficie, tratamiento de | Ayudante Albañilería;Oficial | 2 días | mar 21/04/26 | mié 22/04/26 | COP 17,765,550.00 |
| 186 | | 1.8.4.4 | 4.4 Reparación de mediacaña (zócalo) en mortero epóxico, semiliso color plano, altura r= 3 cm, h= 9 cm, | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 3,015,738.00 |
| 187 | | **1.8.5** | **Cap V - Cielorrasos Morgue** | | 2 días | **jue 23/04/26** | **vie 24/04/26** | COP 4,184,280.00 |
| 188 | | 1.8.5.1 | 5.3 Suministro e instalación de cielo raso en PVC sistema GSP plano | Oficial Drywall;Ayudante | 2 días | jue 23/04/26 | vie 24/04/26 | COP 4,184,280.00 |
| 189 | | **1.8.6** | **Cap III - Muros, Pañetes y Enchapes Morgue** | | 2 días | **lun 20/04/26** | **mar 21/04/26** | COP 2,084,650.00 |
| 190 | | 1.8.6.1 | 3.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 | COP 1,525,400.00 |
| 191 | | 1.8.6.2 | 3.3 Mantenimiento y renovación de mesones de lavamanos en material pétreo 0,60 m de ancho | Ayudante Albañilería;Oficial | 1 día | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | COP 559,250.00 |
| 192 | | **1.8.7** | **Cap XI - Instalaciones Eléctricas Morgue** | | 7 días | **jue 23/04/26** | **sáb 2/05/26** | COP 65,684,561.25 |
| 193 | | 1.8.7.1 | 11.1 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado ó sitio donde la Entidad indique, de | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 104,690.00 |
| 194 | | 1.8.7.2 | 11.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 220V para sistema de aire | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 393,510.67 |
| 195 | | 1.8.7.3 | 11.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 129,983.33 |
| 196 | | 1.8.7.4 | 11.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 565,380.00 |
| 197 | | 1.8.7.5 | 11.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 331,464.00 |
| 198 | | 1.8.7.6 | 11.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 180,057.00 |
| 199 | | 1.8.7.7 | 11.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 | Oficial General;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 358,396.00 |
| 200 | | 1.8.7.8 | 11.8 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 321,816.00 |
| 201 | | 1.8.7.9 | 11.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 679,612.00 |
| 202 | | 1.8.7.10 | 11.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 573,744.00 |
| 203 | | 1.8.7.11 | 11.11 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 229,100.00 |
| 204 | | 1.8.7.12 | 11.12 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 1,042,395.00 |
| 205 | | 1.8.7.13 | 11.13 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de sensor de presencia para control de | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 1,111,568.00 |
| 206 | | 1.8.7.14 | 11.14 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable para caja | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 168,780.00 |
| 207 | | 1.8.7.15 | 11.15 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica para caja 5800 con | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 77,454.00 |
| 208 | | 1.8.7.16 | 11.16 Desmonte de luminaria de incrustar existente 60 x 60 cm, tubo fluorescente T8 de 4x17W | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 3,131,296.00 |
| 209 | | 1.8.7.17 | 11.17 Desmonte de luminaria de incrustar existente 30x120cm tubo fluorescente T8 de 2x32W; o 120 W | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,064,013.00 |
| 210 | | 1.8.7.18 | 11.18 Desmonte de luminaria panel circular led existente circular 18-25W | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 823,328.00 |
| 211 | | 1.8.7.19 | 11.19 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, 3000K-6500K, 4051lm, IP40 | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 9,027,406.67 |
| 212 | | 1.8.7.21 | 11.21 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 18W, minimo 4000K, 1300lm, IP20 montaje de | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 652,185.00 |
| 213 | | 1.8.7.22 | 11.22 Suministro e Instalación de luminaria tipo bala stil led Flat 22W, 100,000 horas | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,841,868.00 |
| 214 | | 1.8.7.23 | 11.23 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W hermética IP65 acabado en pintura | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,723,950.00 |
| 215 | | 1.8.7.24 | 11.24 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W hermética acabado en pintura | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,418,235.00 |
| 216 | | 1.8.7.25 | 11.25 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backligh | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 20,561,808.00 |
| 217 | | 1.8.7.26 | 11.26 Desmonte,limpieza, desinfeccion mantenimiento y reinstalacion de luminaria de incrustar | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 292,908.00 |
| 218 | | 1.8.7.27 | 11.27 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 6,630,603.33 |
| 219 | | 1.8.7.28 | 11.28 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 2,665,664.00 |
| 220 | | 1.8.7.29 | 11.29 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 936,649.00 |
| 221 | | 1.8.7.30 | 11.30 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 1,142,202.25 |
| 222 | | 1.8.7.31 | 11.31 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 548,352.00 |
| 223 | | 1.8.7.32 | 11.32 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 621,444.00 |
| 224 | | 1.8.7.33 | 11.33 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 415,584.00 |
| 225 | | 1.8.7.34 | 11.34 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 652,795.00 |
| 226 | | 1.8.7.35 | 11.35 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible tipo americana conduit | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 1,592,904.00 |
| 227 | | 1.8.7.36 | 11.36 Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 AWG LSZH fase roja | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 1,668,072.00 |
| 228 | | 1.8.7.37 | 11.37 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de canaleta de superficie plástica dexson o | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 2,005,344.00 |
| 229 | | **1.8.8** | **Cap XII - Sistemas Seguridad Morgue** | | 10 días | **mar 28/04/26** | **mar 12/05/26** | COP 8,456,253.32 |
| 230 | | 1.8.8.1 | 12.1 Desmonte, retiro y reinstalación de salida para sensor de humo fotoeléctrico | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 439,504.00 |

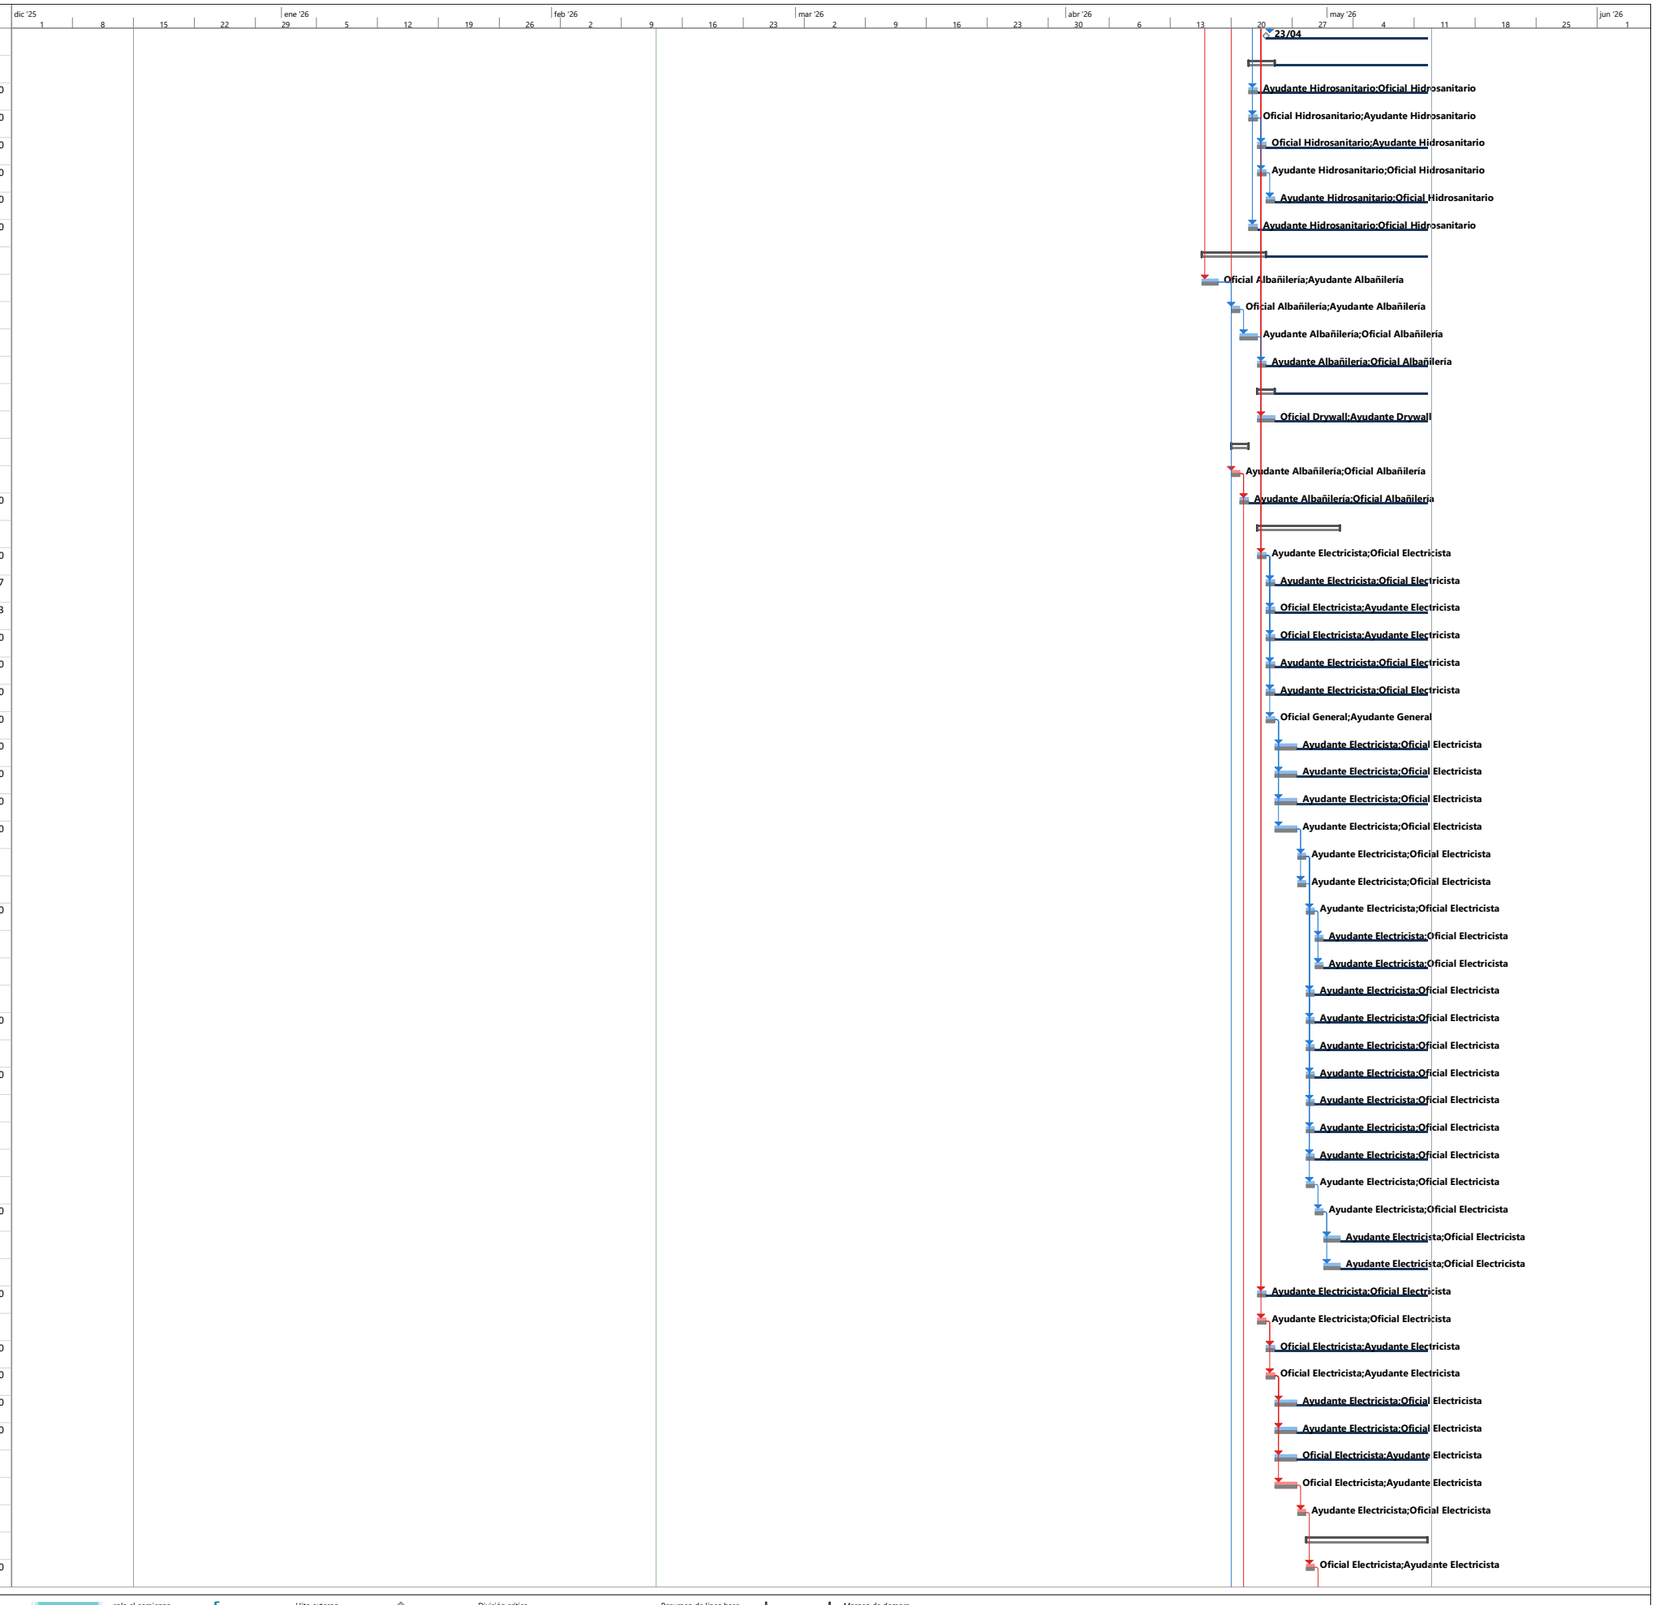
dic '25
ene '26
feb '26
mar '26
abr '26
may '26
jun '26
23/04
Ayudante Hidrosanitario;Oficial Hidrosanitario
Oficial Hidrosanitario;Ayudante Hidrosanitario
Oficial Hidrosanitario;Ayudante Hidrosanitario
Ayudante Hidrosanitario;Oficial Hidrosanitario
Ayudante Hidrosanitario;Oficial Hidrosanitario
Ayudante Hidrosanitario;Oficial Hidrosanitario
Oficial Albañilería;Ayudante Albañilería
Oficial Albañilería;Ayudante Albañilería
Ayudante Albañilería;Oficial Albañilería
Ayudante Albañilería;Oficial Albañilería
Oficial Drywall;Ayudante Drywall
Ayudante Albañilería;Oficial Albañilería
Ayudante Albañilería;Oficial Albañilería
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Oficial Electricista;Ayudante Electricista
Oficial Electricista;Ayudante Electricista
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Oficial General;Ayudante General
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Ayudante Electricista;Oficial Electricista
Ayudante Electricista;Oficial Electricista


| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | | 1.8.8.2 | 12.2 Desmonte y retiro de sensor de humo fotoeléctrico | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 860,222.67 |
| 232 | | 1.8.8.3 | 12.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 251,594.40 |
| 233 | | 1.8.8.4 | 12.4 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico direccionable listado UL | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 3,767,115.33 |
| 234 | | 1.8.8.5 | 12.5 Suministro e Instalación de Sensor doble tecnologia humo,fotoelectrico y temperatura direccionable listado | Oficial General;Ayudante | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 504,520.00 |
| 235 | | 1.8.8.6 | 12.6 Suministro e Instalación de Strobo multicandela con sirena electrónica 12V/24V | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 231,492.67 |
| 236 | | 1.8.8.7 | 12.7 Suministro e Instalación de Estación Manual | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 588,825.33 |
| 237 | | 1.8.8.8 | 12.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma de cobre | Oficial Electricista;Ayudante | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 | COP 338,622.67 |
| 238 | | 1.8.8.9 | 12.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 | COP 1,142,202.25 |
| 239 | | 1.8.8.10 | 12.10 Suministro e instalacion de baterias de 12 V, 9A | Ayudante Electricista;Oficial | 1 día | lun 11/05/26 | mar 12/05/26 | COP 332,154.00 |
| 240 | | **1.8.9** | **Cap IX - Pinturas Morgue** | | 3 días | **mar 21/04/26** | **jue 23/04/26** | COP 5,070,150.00 |
| 241 | | 1.8.9.1 | 9.1 Estuco acrílico, incluye filos (esquineras plásticas) | Ayudante Pintura;Oficial | 1 día | mar 21/04/26 | mar 21/04/26 | COP 783,085.00 |
| 242 | | 1.8.9.2 | 9.2 Suministro e instalación de pintura epóxica poliamida, recubrimiento protector para muros y techos | Ayudante Pintura;Oficial | 2 días | mié 22/04/26 | jue 23/04/26 | COP 4,287,065.00 |
| 243 | | **1.8.10** | **Cap VII - Griferías y Aparatos Sanitarios Morgue** | | 4 días | **vie 24/04/26** | **mié 29/04/26** | COP 28,057,994.00 |
| 244 | | 1.8.10.1 | 7.6 Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico de dos puestos accionamiento con pedal | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 2 días | vie 24/04/26 | lun 27/04/26 | COP 18,120,900.00 |
| 245 | | 1.8.10.2 | 7.2 Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en porcelana sanitaria brillante color blanco | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 3,154,748.00 |
| 246 | | 1.8.10.3 | 7.4 Suministro e instalación de grifería Institucional de mesa tipo push para lavamanos | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 3,609,333.00 |
| 247 | | 1.8.10.4 | 7.1 Suministro e instalación de orinal blanco de entrada superior, 0,5 lpf Gricol o similar | Ayudante Hidrosanitario;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 3,173,013.00 |
| 248 | | **1.8.11** | **Cap VIII - Elementos Metálicos Morgue** | | 8 días | **lun 20/04/26** | **mié 29/04/26** | COP 20,324,715.67 |
| 249 | | 1.8.11.1 | 8.3 Suministro e instalación de división de baño, fabricadas en acero inoxidable calibre 20 | Ayudante Carpintería | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 | COP 10,409,704.00 |
| 250 | | 1.8.11.2 | 8.4 Suministro e instalación de división de orinal, fabricado en acero inoxidable calibre 20 ref. 304 | Oficial Hidrosanitario;Ayuda | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 4,954,896.00 |
| 251 | | 1.8.11.3 | 8.2 Suministro e instalación ángulos (3,0*3,0") en lámina de acero inoxidable calibre 16 | Oficial Carpintería Metálica;Ayudante | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 630,679.00 |
| 252 | | 1.8.11.4 | 8.5 Suministro e instalación de rejilla de cárcamo vehicular de 0,50 m de ancho elaborada en varilla | Oficial HVAC | 1 día | lun 20/04/26 | lun 20/04/26 | COP 3,857,890.00 |
| 253 | | 1.8.11.5 | 8.1 Mantenimiento de puerta, incluye asegurado del marco a la mampostería | Oficial Albañilería;Ayudante | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 471,546.67 |
| 254 | | **1.8.12** | **Cap X - Varios Morgue** | | 3 días | **lun 27/04/26** | **jue 30/04/26** | COP 18,512,458.67 |
| 255 | | 1.8.12.1 | 10.1 Suministro e instalacion de espejo de 5 mm | Ayudante Acabados;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 1,037,166.00 |
| 256 | | 1.8.12.2 | 10.3 Suministro e instalación de cierrapuertas (gato hidráulico) | Ayudante Carpintería | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 302,586.67 |
| 257 | | 1.8.12.3 | 10.4 Suministro e instalación de guarda camilla en PVC | Oficial Acabados;Ayudante | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 13,776,210.00 |
| 258 | | 1.8.12.4 | 10.5 Suministro e instalación de terminales para guarda camilla | Oficial Acabados;Ayudante | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 767,748.00 |
| 259 | | 1.8.12.5 | 10.6 Suministro e instalación de rinconeras para guarda camilla | Oficial Acabados;Ayudante | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 419,428.00 |
| 260 | | 1.8.12.6 | 10.7 Suministro e instalación de esquineros para guarda camilla | Ayudante Acabados;Oficial | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 184,476.00 |
| 261 | | 1.8.12.7 | 10.8 Suministro e instalación de jaboneras en acero inoxidable | Oficial Acabados;Ayudante | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,486,772.00 |
| 262 | | 1.8.12.8 | 10.9 Suministro e instalación de tapa registro de 20×20 cm de empotrar | Oficial Acabados;Ayudante | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 538,072.00 |
| 263 | | **1.9** | **FASE 6: SISTEMAS HVAC MORGUE (Paralelo Plan Choque)** | | 15 días | **mié 22/04/26** | **mar 12/05/26** | COP 290,251,149.01 |
| 264 | | **1.9.1** | **Cap XIV - Sistema Extracción Sala Necropsias** | | 10 días | **mié 22/04/26** | **mar 5/05/26** | COP 53,959,524.17 |
| 265 | | 1.9.1.1 | 14.1 Suministro de materiales y mano de obra para realizar el mantenimiento de unidad manejadora sistema | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 5,398,489.00 |
| 266 | | 1.9.1.2 | 14.2 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | COP 1,900,140.00 |
| 267 | | 1.9.1.3 | 14.3 Desmonte, retiro y disposición en sitio donde la Entidad indique dentro de la sede unidad de Sistema de | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 23/04/26 | jue 23/04/26 | COP 1,877,507.00 |
| 268 | | 1.9.1.4 | 14.4 Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida de unidad manejadora de aproximadamente | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | vie 24/04/26 | vie 24/04/26 | COP 410,875.00 |
| 269 | | 1.9.1.5 | 14.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 20 Fabricado a todo costo incluye | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 2,174,710.00 |
| 270 | | 1.9.1.6 | 14.6 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo incluye | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 2 días | sáb 25/04/26 | mar 28/04/26 | COP 19,321,721.00 |
| 271 | | 1.9.1.7 | 14.7 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | sáb 25/04/26 | lun 27/04/26 | COP 593,344.00 |
| 272 | | 1.9.1.8 | 14.8 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 16"X8" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 302,185.00 |
| 273 | | 1.9.1.9 | 14.9 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 14"X8" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 847,353.00 |
| 274 | | 1.9.1.10 | 14.10 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 12"X6" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 380,446.67 |
| 275 | | 1.9.1.11 | 14.11 Dampers regulación de caudal en la ducteria de 10"X6" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 607,425.00 |
| 276 | | 1.9.1.12 | 14.12 Rejilla para toma de aire 14"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 330,027.00 |
| 277 | | 1.9.1.13 | 14.13 Rejilla para toma de aire 12"X12" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 344,521.50 |
| 278 | | 1.9.1.14 | 14.14 Rejilla para toma de aire 10"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 185,908.00 |
| 279 | | 1.9.1.15 | 14.15 Rejilla para toma de aire 8"X8" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 27/04/26 | mar 28/04/26 | COP 740,565.00 |
| 280 | | 1.9.1.16 | 14.16 Suministro e instalación de pre filtros plata o similar para retención de partículas 24"X24"X2" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 229,850.00 |
| 281 | | 1.9.1.17 | 14.17 Suministro e instalación de fltros de carbón activado tipo granular o peletizado para retención de | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 2,940,208.00 |
| 282 | | 1.9.1.18 | 14.18 Suministro e instalación de filtros HEPA para retención de partículas de 0,3 micras | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 5,941,986.00 |
| 283 | | 1.9.1.19 | 14.19 Mantenimiento de tableros de fuerza y control exitentes | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 2,374,424.00 |
| 284 | | 1.9.1.20 | 14.20 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de extracción de Sala de | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 7,057,839.00 |
| 285 | | 1.9.2 | HITO: SISTEMA EXTRACCIÓN NECROPSIAS COMPLETADO | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 0 días | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 0.00 |
| 286 | | **1.9.3** | **Cap XV - Sistema AC Sala Necropsias y Rayos X** | | 9 días | **mar 28/04/26** | **lun 11/05/26** | COP 108,815,389.67 |
| 287 | | 1.9.3.1 | 15.1 Sistema de aire acondicionado área de sala de necropsias y rayos X | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 2 días | vie 8/05/26 | lun 11/05/26 | COP 68,443,502.00 |

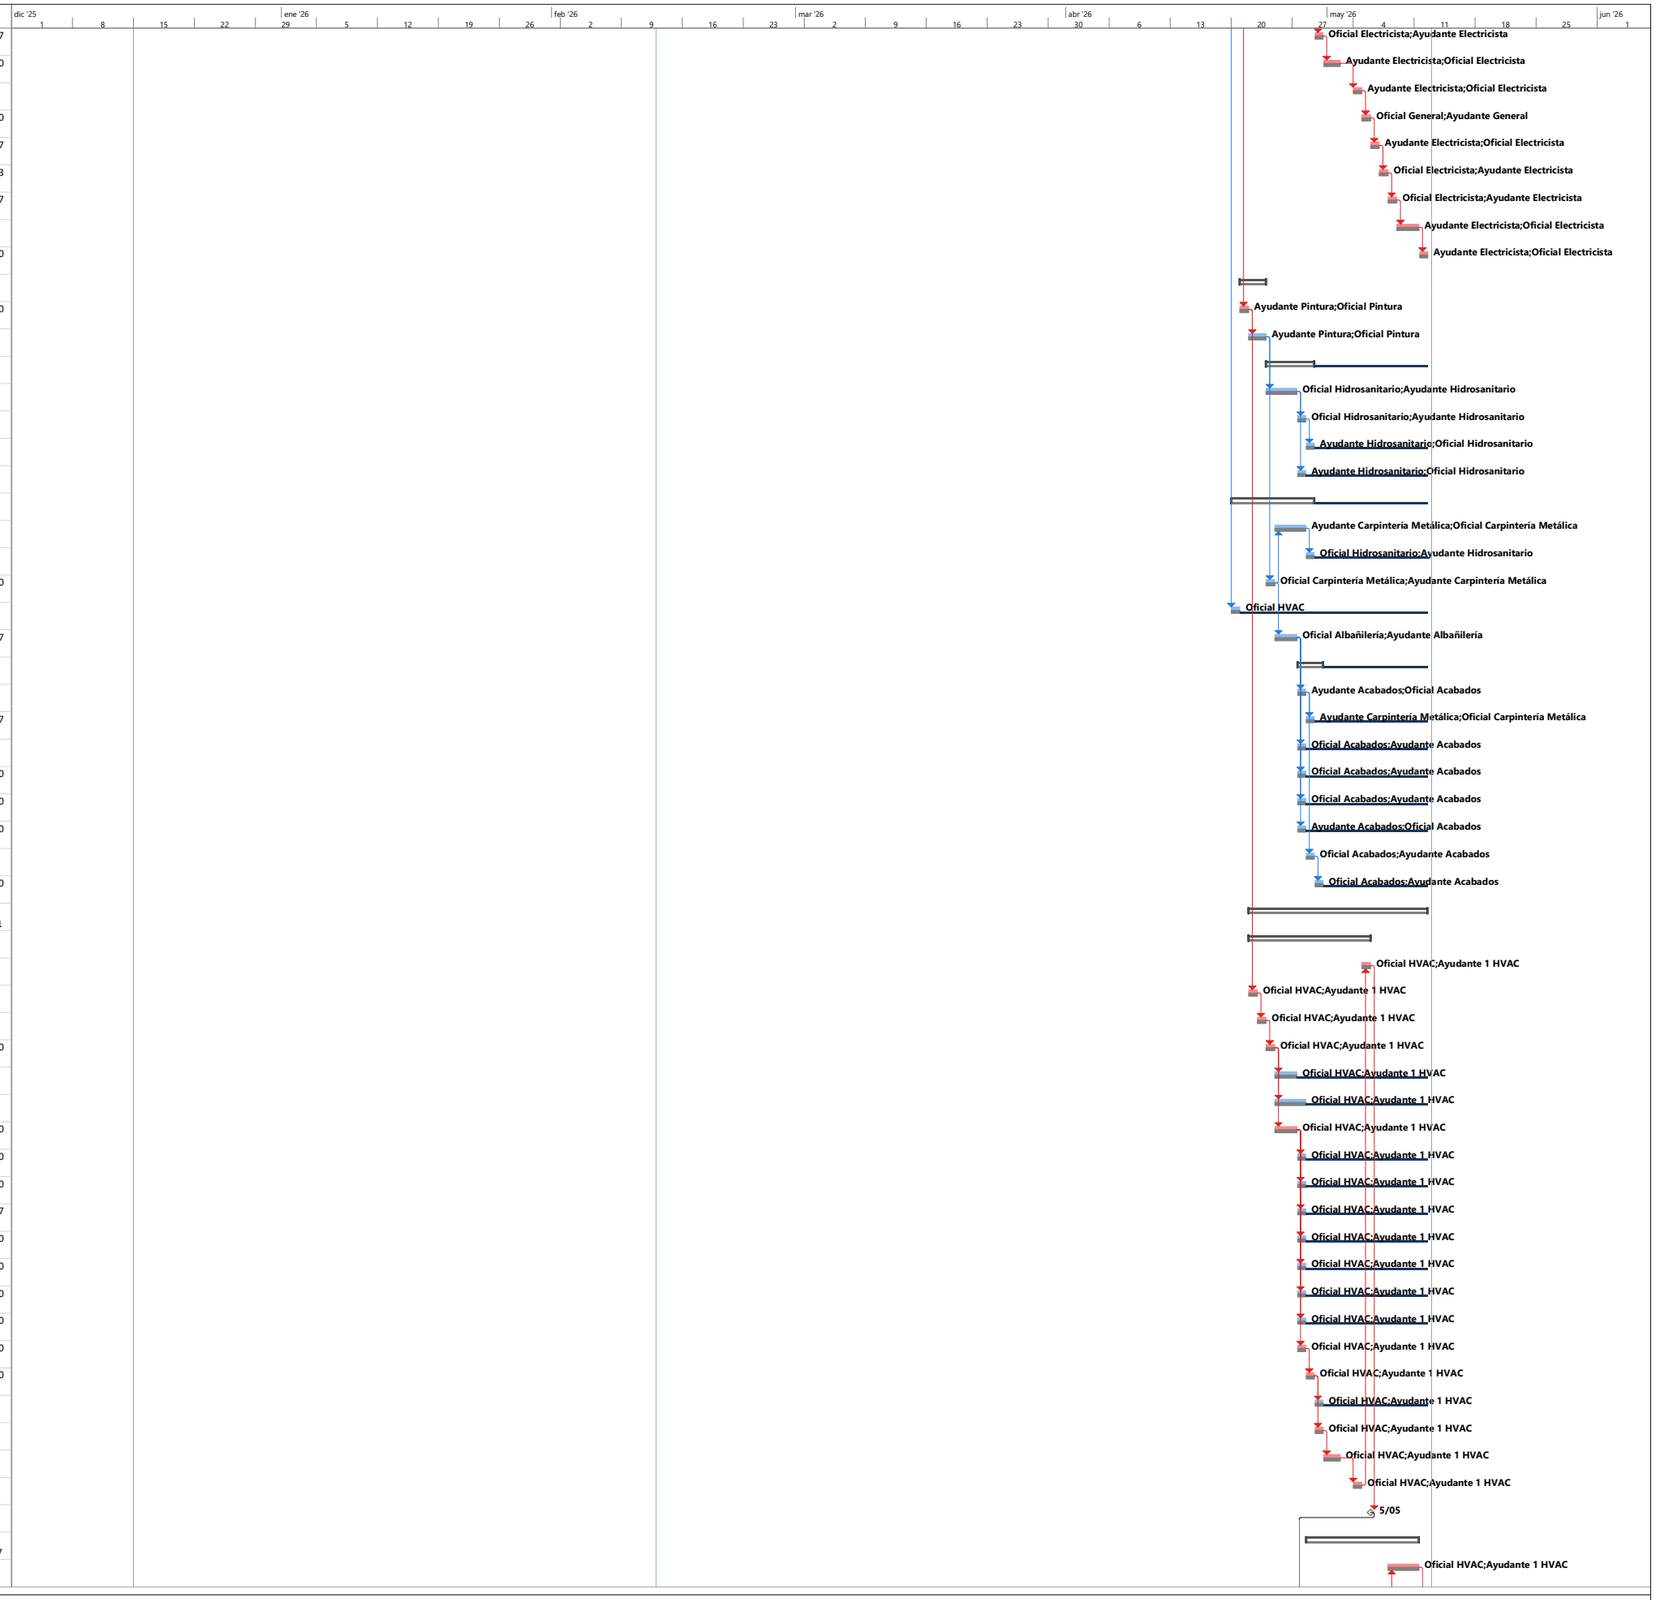



Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica · Resumen de línea base · Margen de demora
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Línea base · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Hito de línea base · Progreso manual


| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Nombres de los recursos | Duración | Comienzo | Fin | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | | 1.9.3.2 | 15.2 Desmonte, retiro y disposición final de unidad manejadora sistema de extracción existente para sala de | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 28/04/26 | mié 29/04/26 | COP 1,576,812.00 |
| 289 | | 1.9.3.3 | 15.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 11,125,611.25 |
| 290 | | 1.9.3.4 | 15.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 3 días | mié 29/04/26 | lun 4/05/26 | COP 593,344.00 |
| 291 | | 1.9.3.5 | 15.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 29/04/26 | jue 30/04/26 | COP 11,125,611.25 |
| 292 | | 1.9.3.6 | 15.6 Dampers regulación de caudal en la ductería de 18"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 2 días | jue 30/04/26 | lun 4/05/26 | COP 441,781.00 |
| 293 | | 1.9.3.7 | 15.7 Dampers regulación de caudal en la ductería de 16"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 442,085.00 |
| 294 | | 1.9.3.8 | 15.8 Dampers regulación de caudal en la ductería de 16"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 3 días | jue 30/04/26 | mar 5/05/26 | COP 528,924.00 |
| 295 | | 1.9.3.9 | 15.9 Dampers regulación de caudal en la ductería de 16"X8" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 30/04/26 | sáb 2/05/26 | COP 302,185.00 |
| 296 | | 1.9.3.10 | 15.10 Dampers regulación de caudal en la ductería de 14"X12" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 988,893.00 |
| 297 | | 1.9.3.11 | 15.11 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12"X6" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 380,446.67 |
| 298 | | 1.9.3.12 | 15.12 Rejilla para toma de aire 16"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 1,082,568.00 |
| 299 | | 1.9.3.13 | 15.13 Rejilla para toma de aire 10"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 185,908.00 |
| 300 | | 1.9.3.14 | 15.14 Rejilla difusora de aire 14"X12" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 1,187,544.00 |
| 301 | | 1.9.3.15 | 15.15 Rejilla difusora de aire 10"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 438,772.50 |
| 302 | | 1.9.3.16 | 15.16 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 1,248,088.00 |
| 303 | | 1.9.3.17 | 15.17 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 8,723,314.00 |
| 304 | | 1.9.4 | HITO: SISTEMA AC NECROPSIAS COMPLETADO | | 0 días | lun 11/05/26 | lun 11/05/26 | COP 0.00 |
| 305 | | **1.9.5** | **Cap XVI - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SALA DE SÉPTICOS** | | 6 días | **lun 4/05/26** | **lun 11/05/26** | COP 72,401,497.00 |
| 306 | | 1.9.5.1 | 16.1 Sistema de aire acondicionado área sépticos, de expansion directa, doble circuito, doble pared, con | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 | COP 45,828,520.00 |
| 307 | | 1.9.5.2 | 16.2 Desmonte, retiro y disposición final en botadero autorizado de ductos del sistema de ventilación exitente | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 633,380.00 |
| 308 | | 1.9.5.3 | 16.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 7,068,546.00 |
| 309 | | 1.9.5.4 | 16.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 226,116.00 |
| 310 | | 1.9.5.5 | 16.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 7,068,546.00 |
| 311 | | 1.9.5.6 | 16.6 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 286,625.00 |
| 312 | | 1.9.5.7 | 16.7 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12"X8" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 264,971.00 |
| 313 | | 1.9.5.8 | 16.8 Rejilla para toma de aire 14"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 330,027.00 |
| 314 | | 1.9.5.9 | 16.9 Rejilla difusora de aire 12"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 723,364.00 |
| 315 | | 1.9.5.10 | 16.10 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 | COP 1,248,088.00 |
| 316 | | 1.9.5.11 | 16.11 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 | COP 8,723,314.00 |
| 317 | | 1.9.6 | HITO: SISTEMA AC SEPTICOS COMPLETADO | | 0 días | lun 11/05/26 | lun 11/05/26 | COP 0.00 |
| 318 | | **1.9.7** | **Cap XVII - SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO** | | 7 días | **lun 4/05/26** | **mar 12/05/26** | COP 55,074,738.17 |
| 319 | | 1.9.7.1 | 17.1 Sistema de aire acondicionado tipo paquete para área de archivo y exclusas patología | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 11/05/26 | mar 12/05/26 | COP 21,775,929.00 |
| 320 | | 1.9.7.2 | 17.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | COP 11,125,611.25 |
| 321 | | 1.9.7.3 | 17.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 593,344.00 |
| 322 | | 1.9.7.4 | 17.4 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 Fabricado a todo costo | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mar 5/05/26 | mar 5/05/26 | COP 11,125,611.25 |
| 323 | | 1.9.7.5 | 17.5 Dampers regulación de caudal en la ductería de 16"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 528,924.00 |
| 324 | | 1.9.7.6 | 17.6 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12"X6" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | mié 6/05/26 | mié 6/05/26 | COP 380,446.67 |
| 325 | | 1.9.7.7 | 17.7 Rejilla para toma de aire 14"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 | COP 330,027.00 |
| 326 | | 1.9.7.8 | 17.8 Rejilla para toma de aire 12"X12" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 344,521.50 |
| 327 | | 1.9.7.9 | 17.9 Rejilla difusora de aire 14"X14" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 2 días | jue 7/05/26 | vie 8/05/26 | COP 565,046.00 |
| 328 | | 1.9.7.10 | 17.10 Rejilla difusora de aire 10"X10" | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | jue 7/05/26 | jue 7/05/26 | COP 438,772.50 |
| 329 | | 1.9.7.11 | 17.11 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | vie 8/05/26 | vie 8/05/26 | COP 1,248,088.00 |
| 330 | | 1.9.7.12 | 17.12 Suministro e instalación de tablero fuerza y control tipo intemperie para el sistema de aire acondicionado | Oficial HVAC;Ayudante 1 | 1 día | sáb 9/05/26 | lun 11/05/26 | COP 6,618,417.00 |
| 331 | | 1.9.8 | HITO: SISTEMA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE PARA EXCLUSAS Y ARCHIVO COMPLETADO | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 332 | | **1.9.9** | **Pruebas Integrales HVAC y Entrega Morgue** | | 0 días | **mar 12/05/26** | **mar 12/05/26** | COP 0.00 |
| 333 | | 1.9.9.1 | Pruebas presión caudal renovación aire | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 334 | | 1.9.9.2 | Balanceo sistema HVAC completo morgue | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 335 | | 1.9.9.3 | Pruebas hidráulicas y eléctricas | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 336 | | 1.10 | HITO: MORGUE OPERATIVA - ENTREGA | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |
| 337 | | 1.11 | HITO: PROYECTO COMPLETADO - ENTREGA FINAL | | 0 días | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | COP 0.00 |

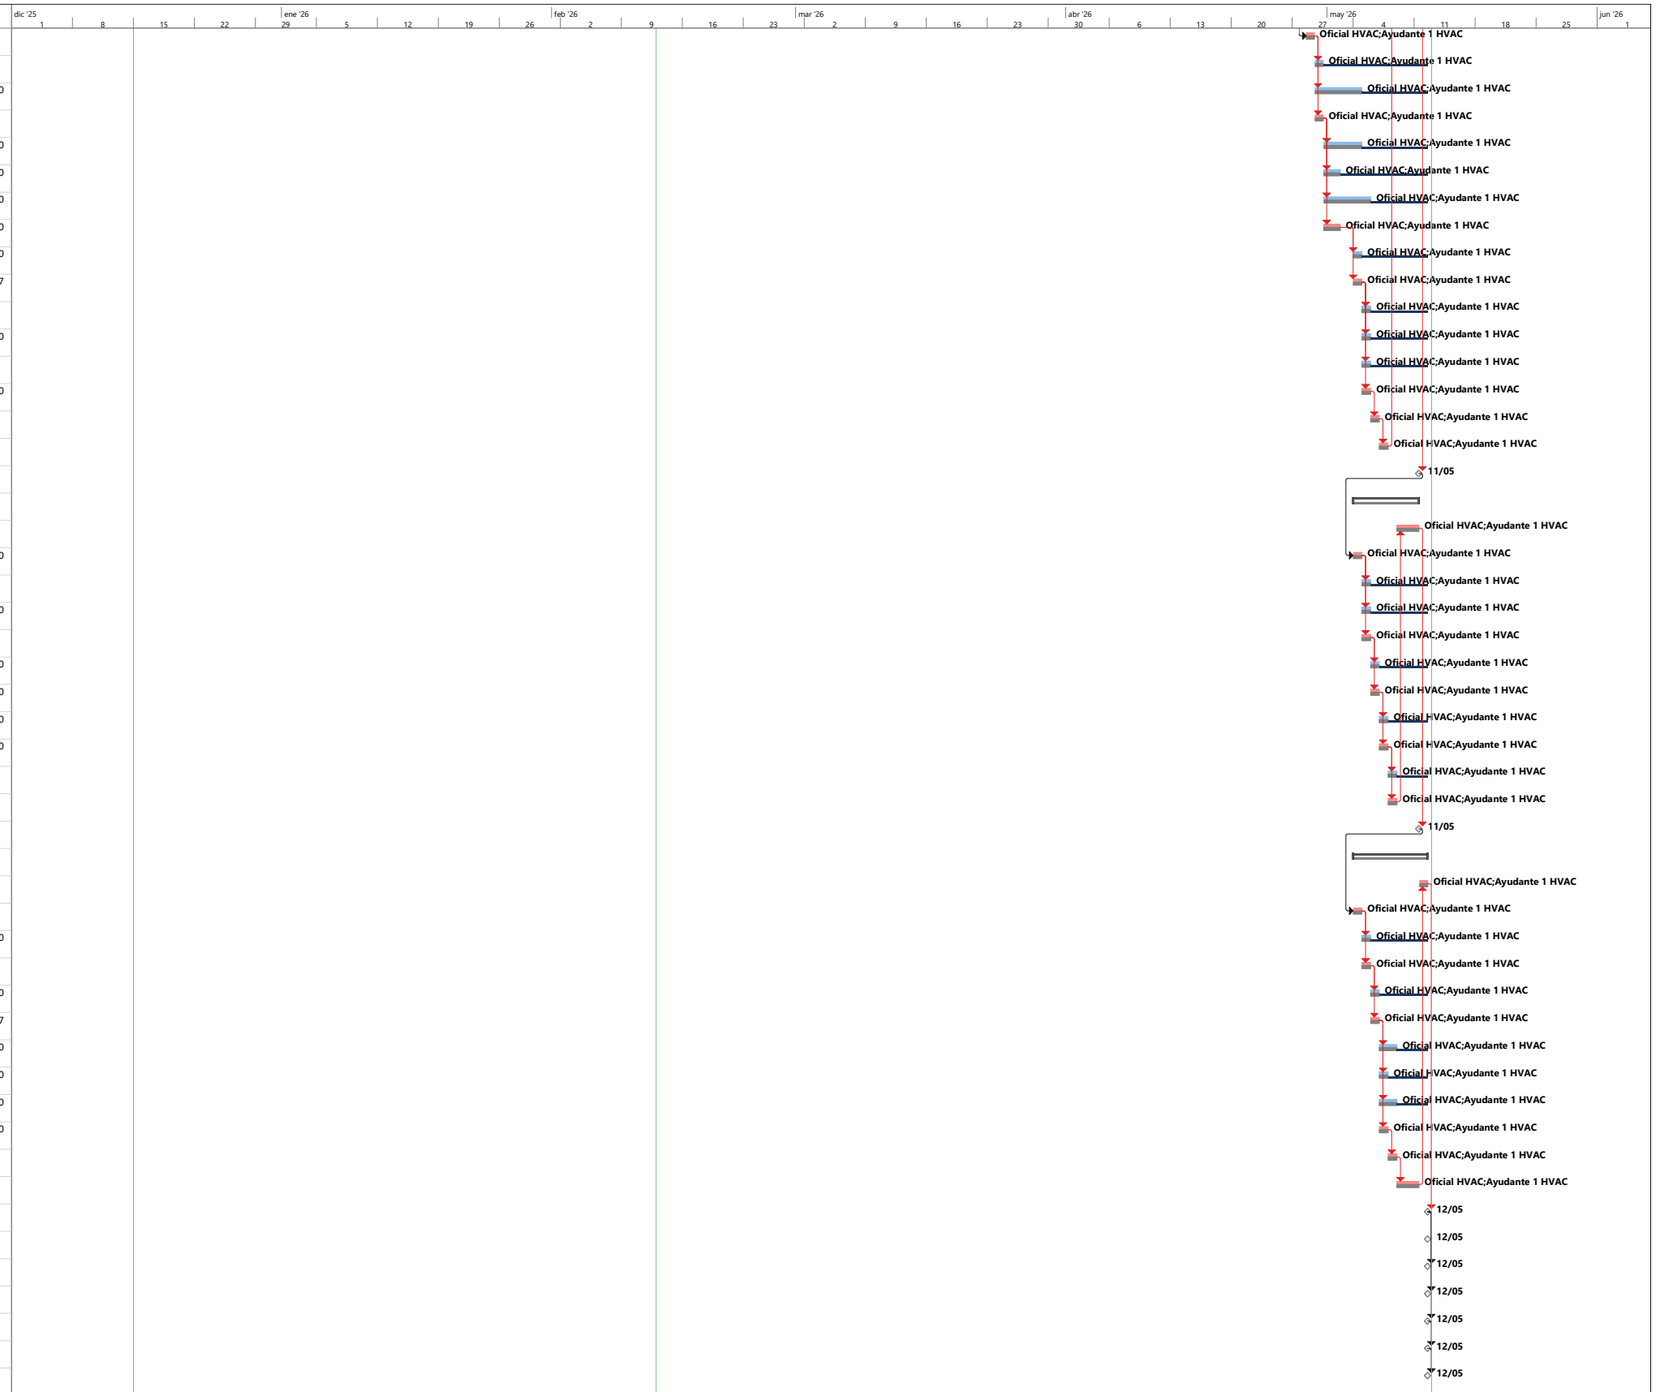

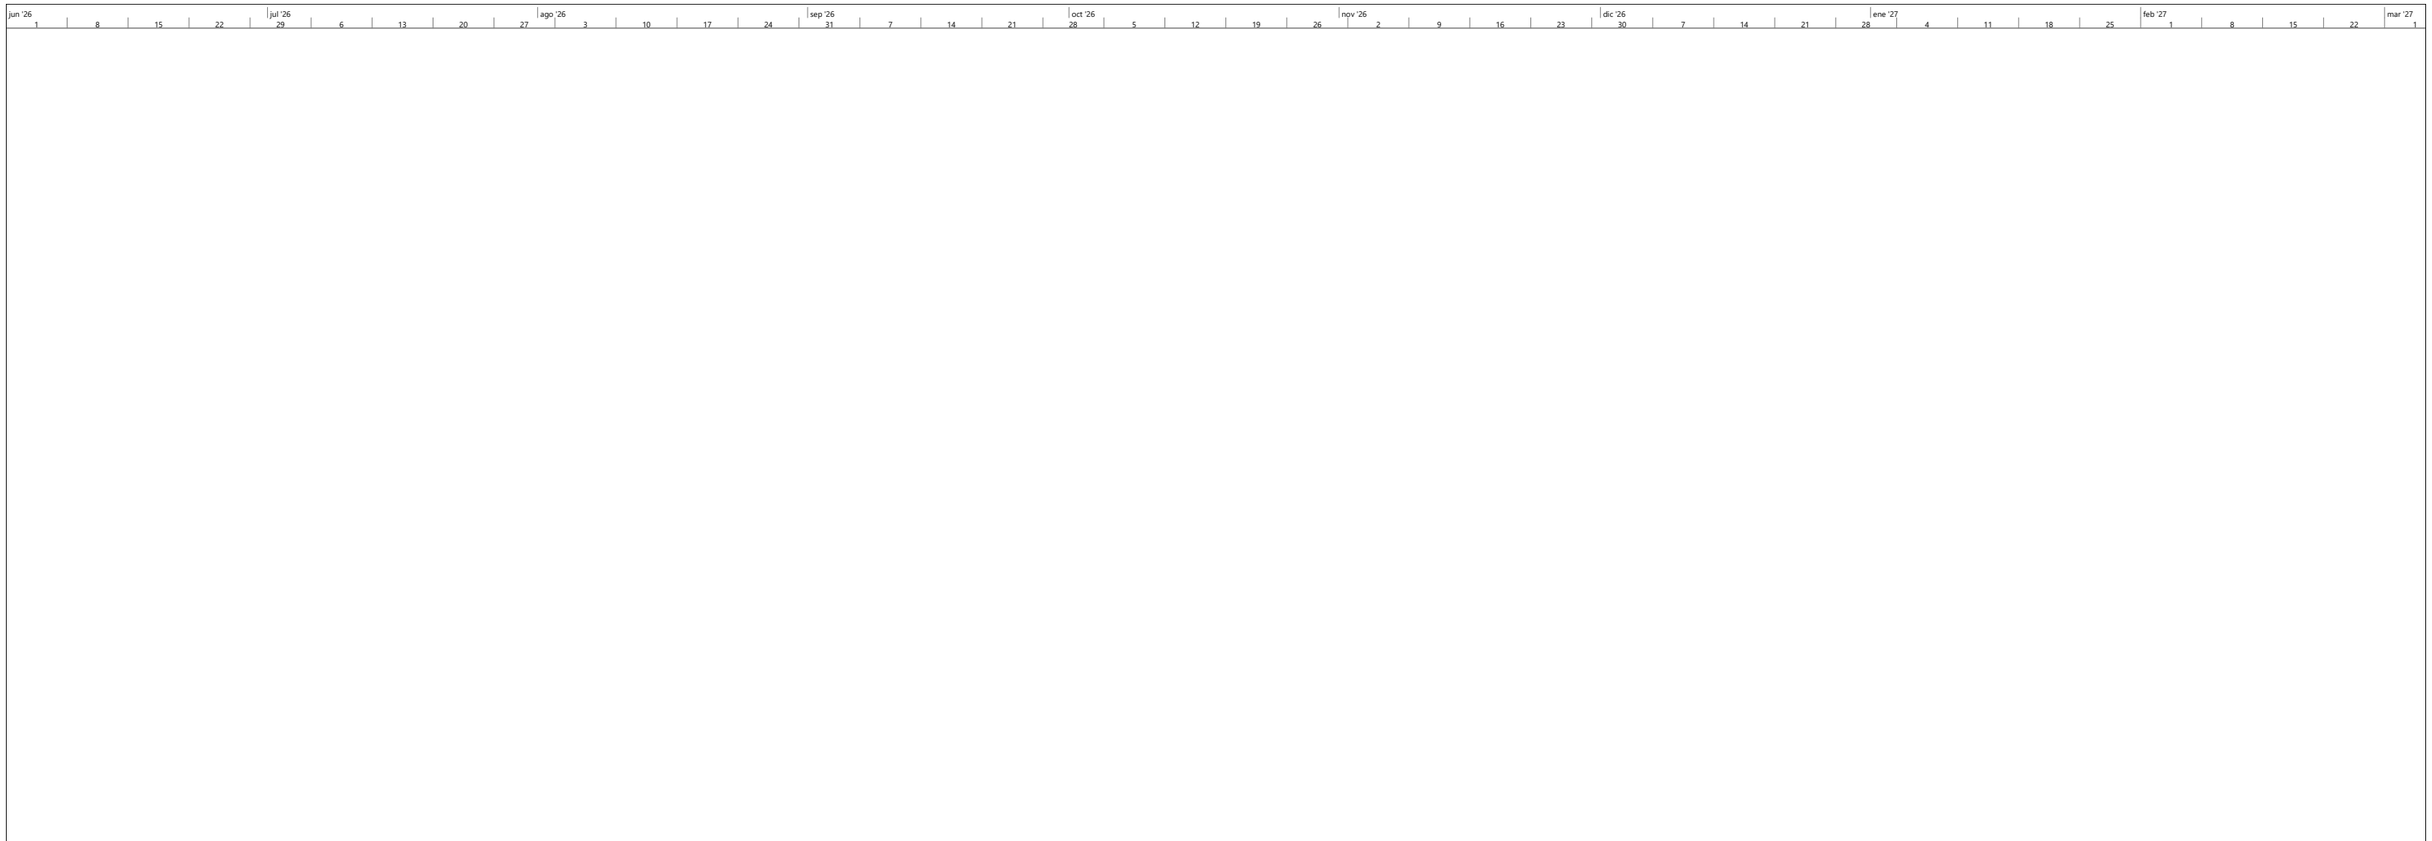


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora




**rio**


**ia Metálica**

**ería Metálica**

**ería Metálica**


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen | | Hito inactivo | | solo duración | | solo el comienzo | | Hito externo | | División crítica | | Resumen de línea base | | Margen de demora | | | |
| División | | Resumen del proyecto | | Resumen inactivo | | Informe de resumen manual | | solo fin | | Fecha límite | | Línea base | | Progreso | | | | | |
| Hito | | Tarea inactiva | | Tarea manual | | Resumen manual | | Tareas externas | | Tareas críticas | | Hito de línea base | | Progreso manual | | | | | |

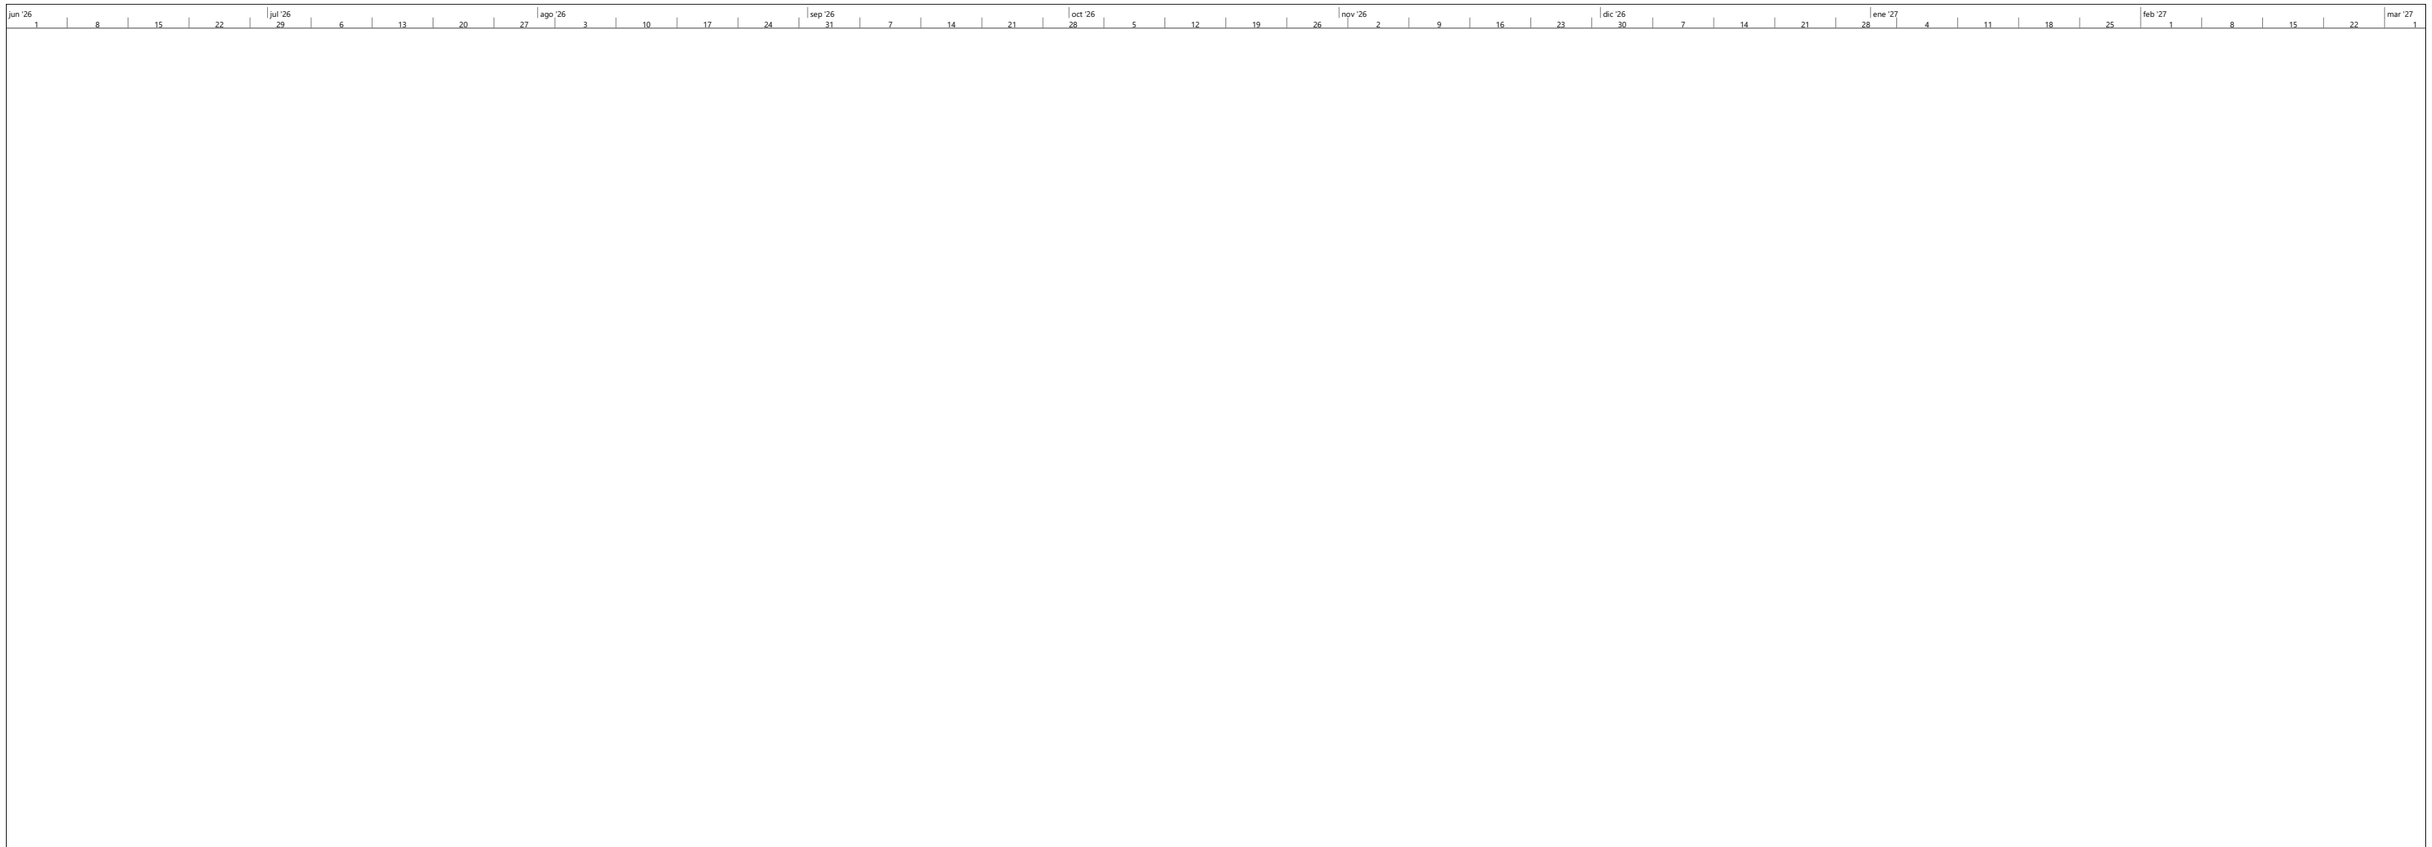


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

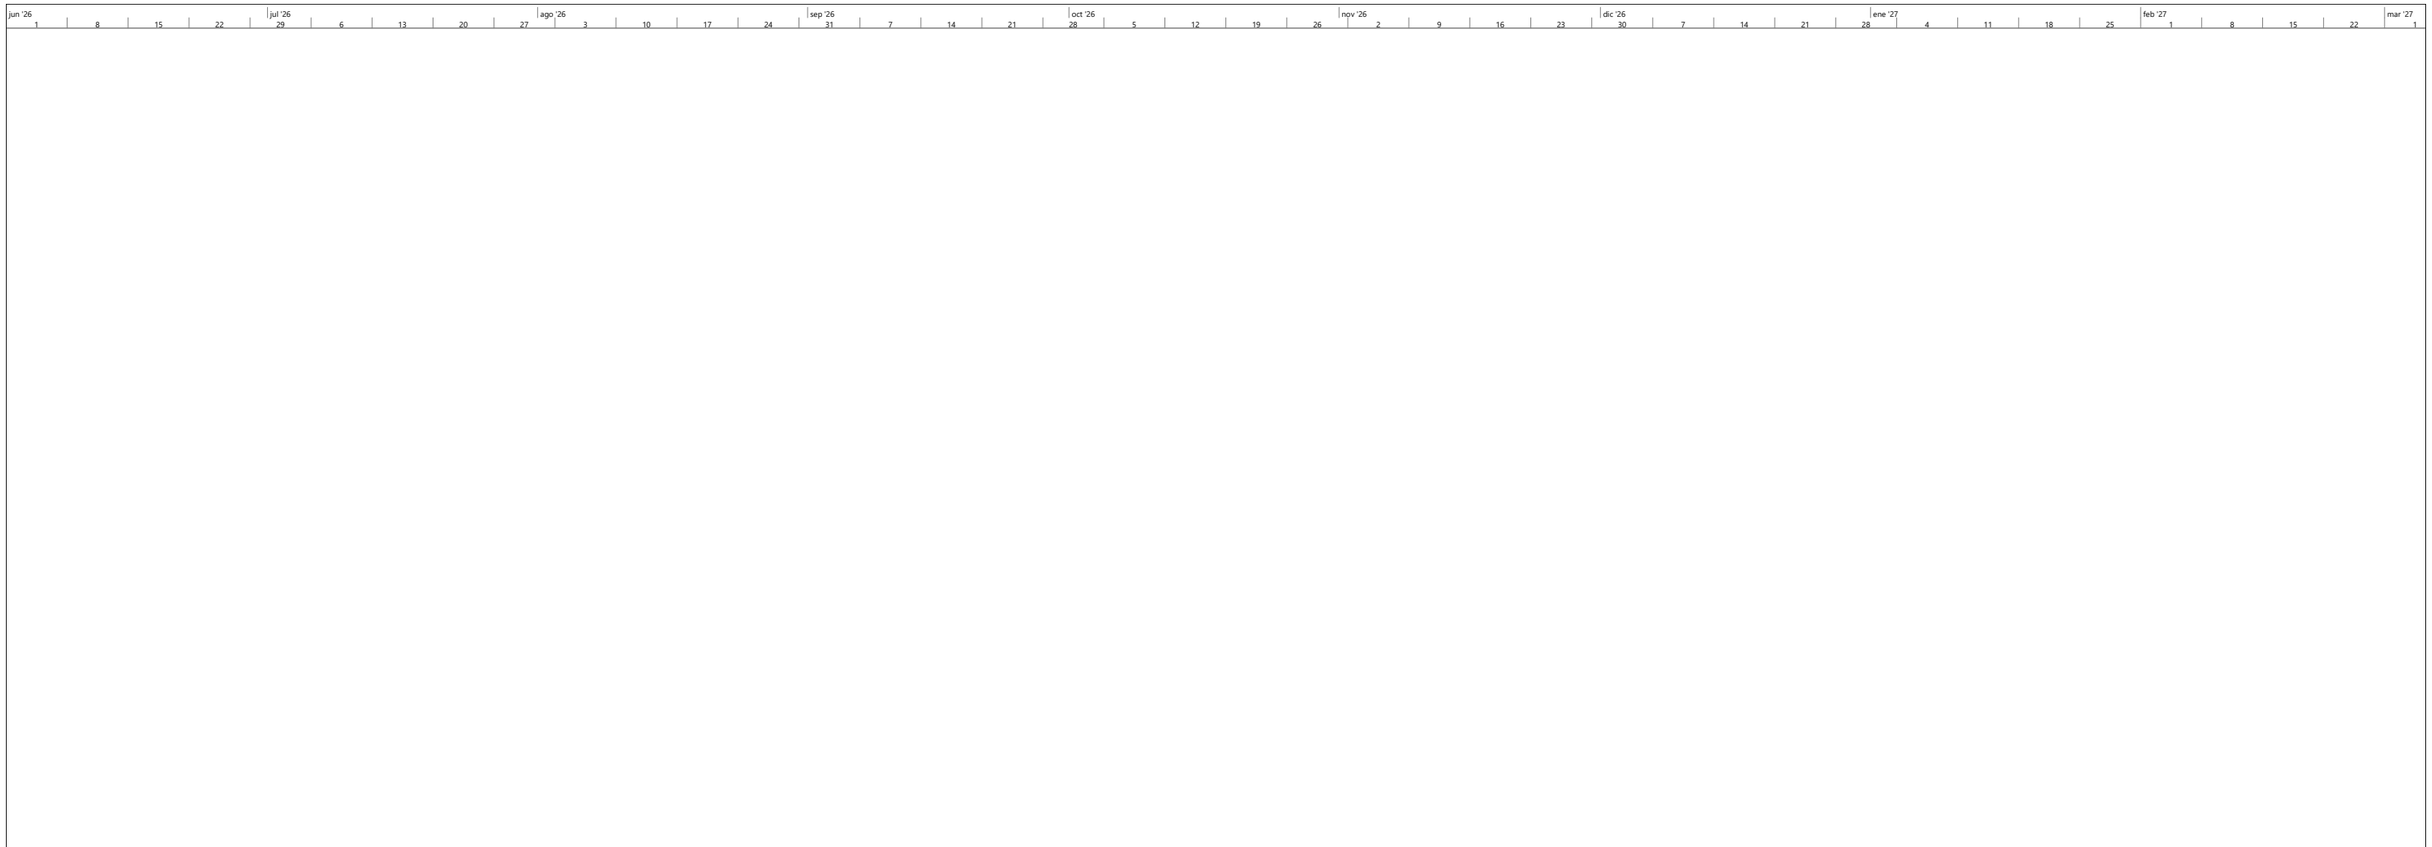
jun '26
1
8
15
22
jul '26
29
6
13
20
27
ago '26
3
10
17
24
sep '26
31
7
14
21
oct '26
28
5
12
19
26
nov '26
2
9
16
23
dic '26
30
7
14
21
28
ene '27
4
11
18
25
feb '27
1
8
15
22
mar '27
1

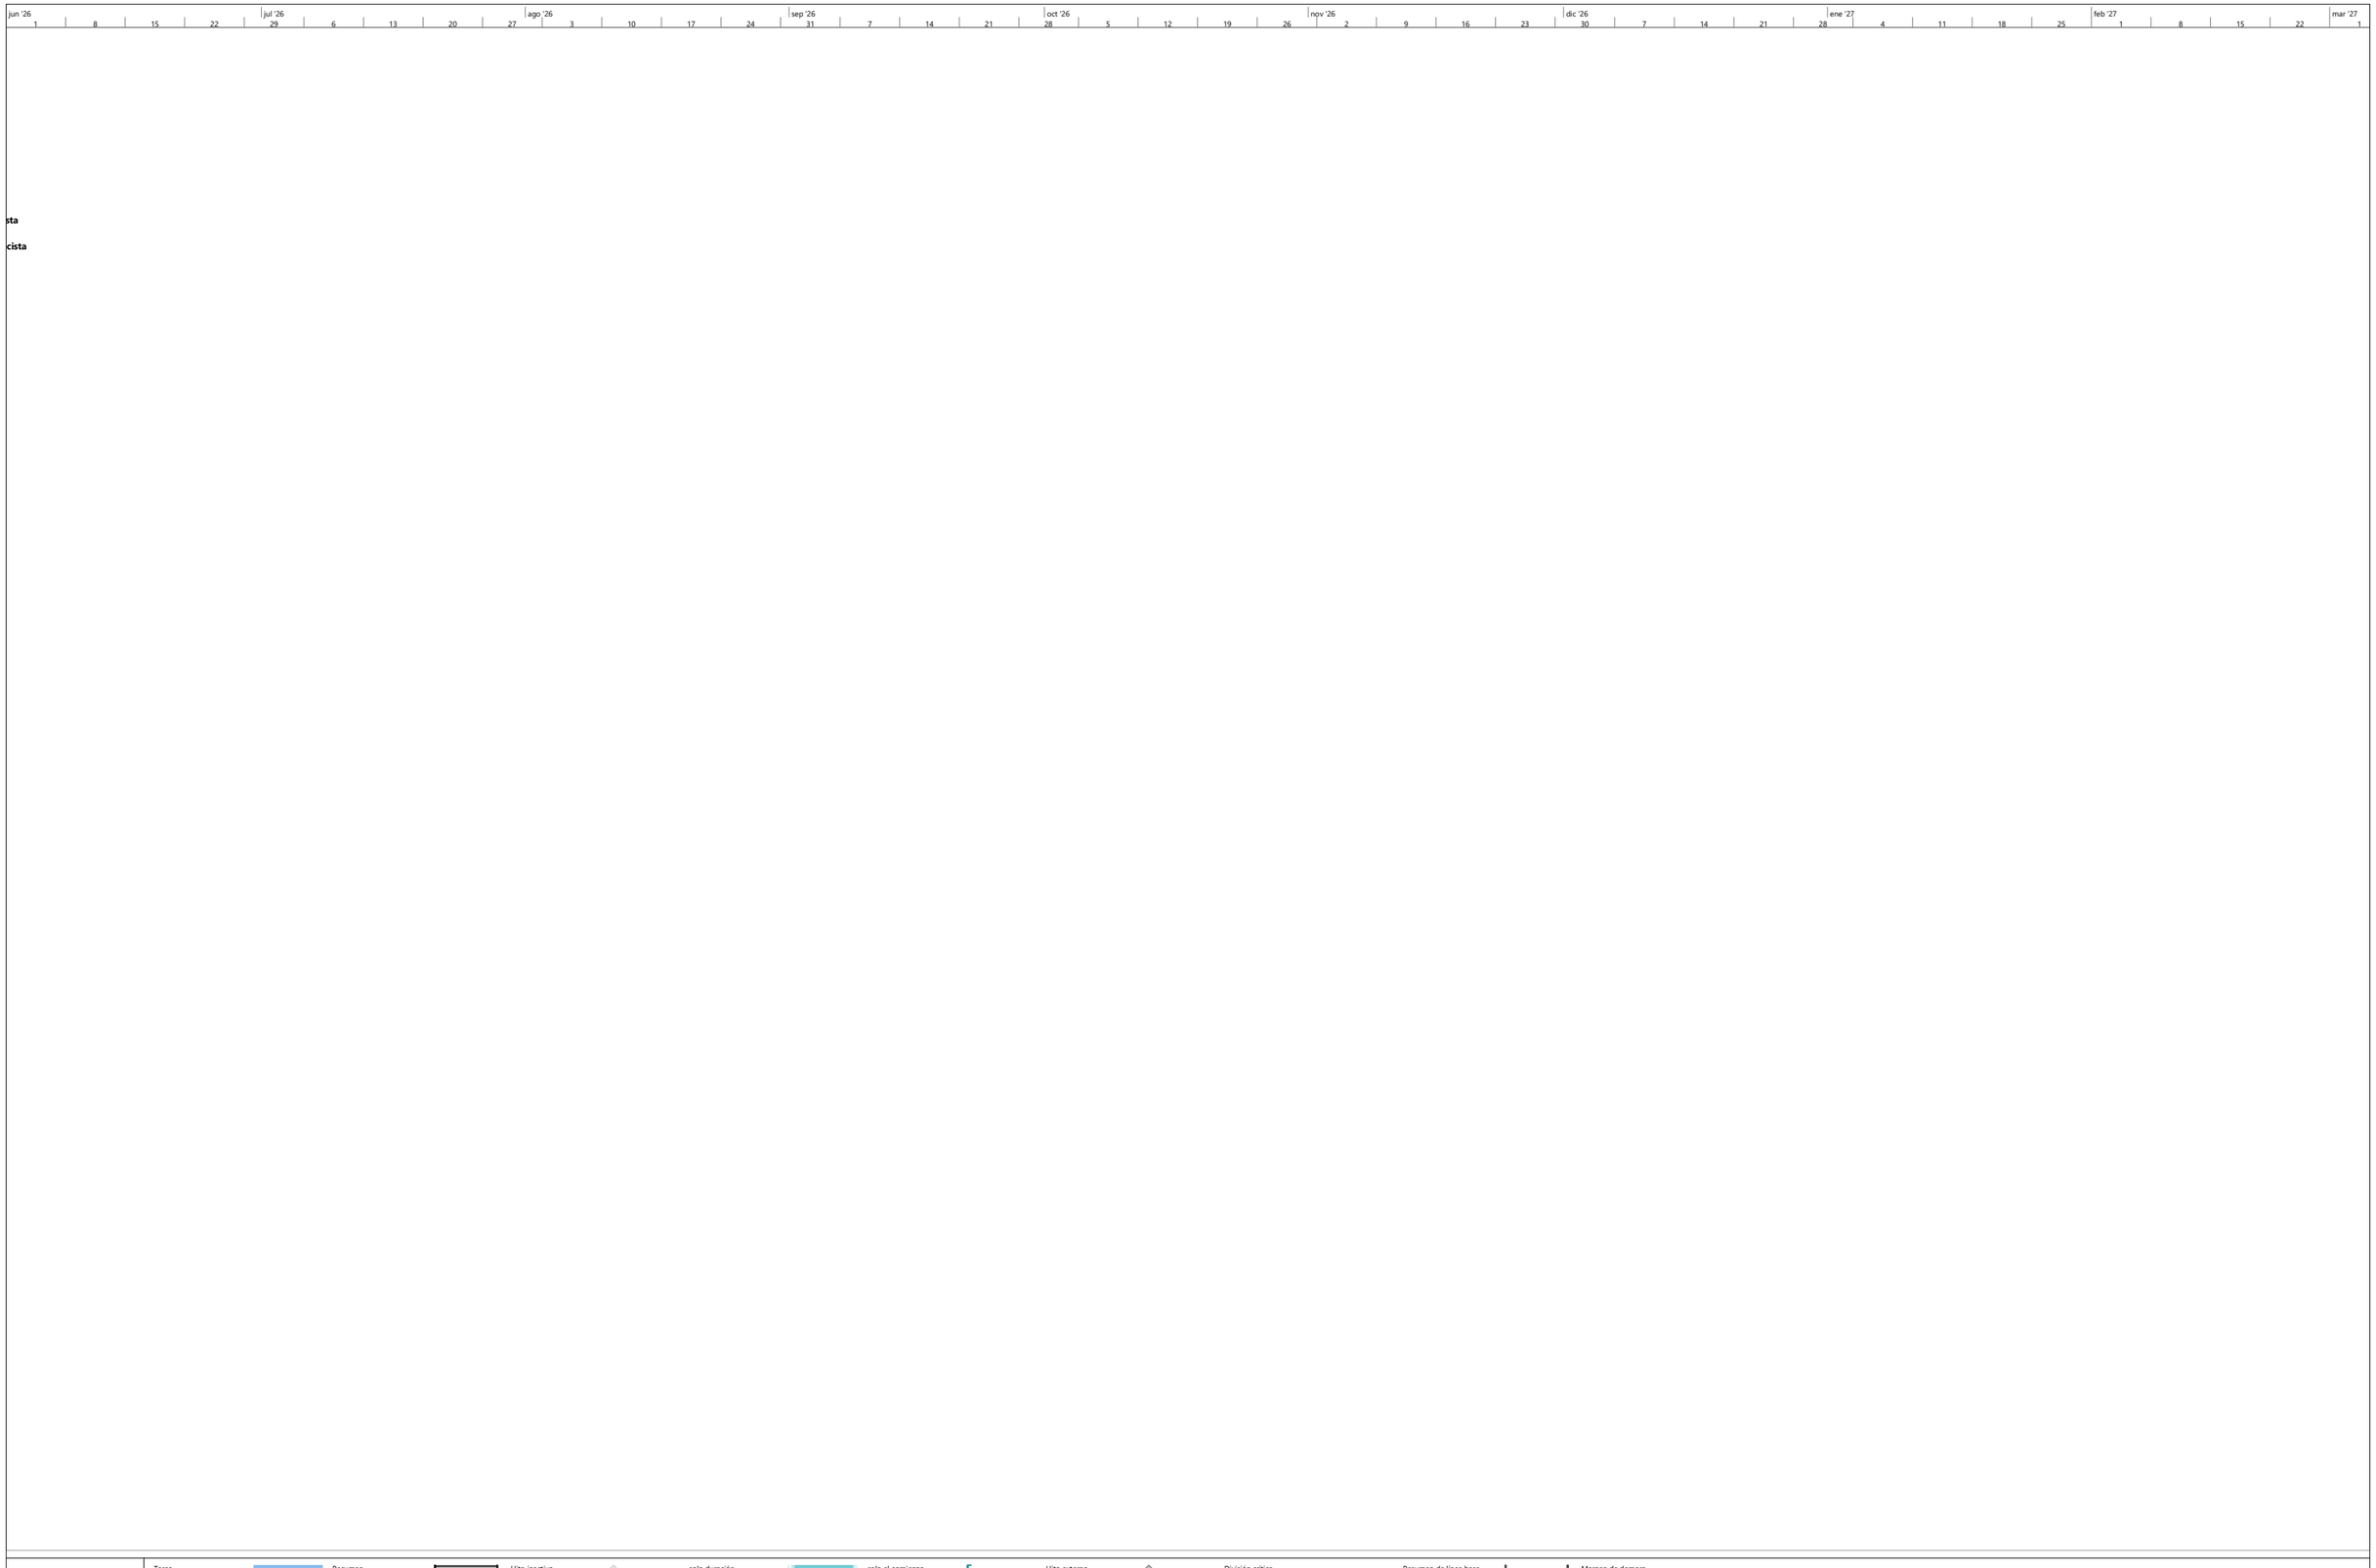


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora

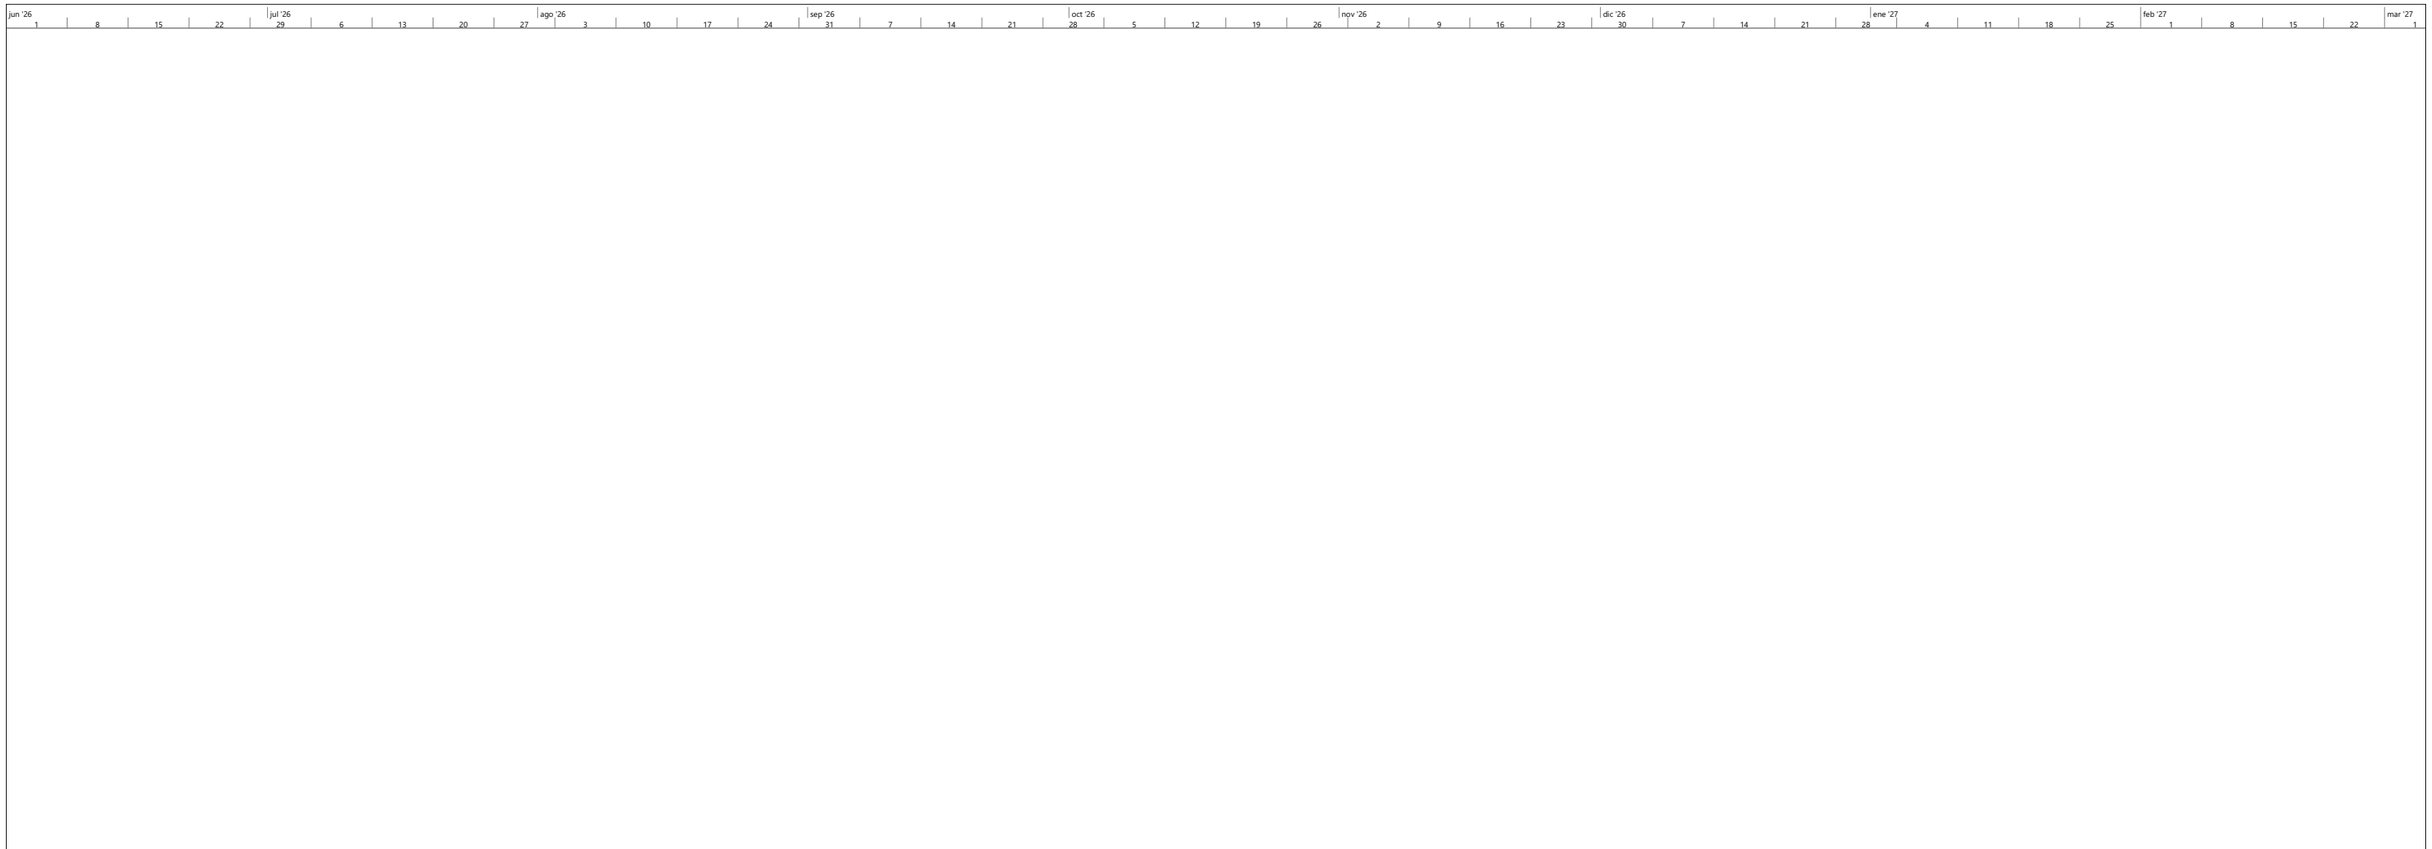


Proyecto: Programacion medici
Fecha: vie 13/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
Margen de demora
