	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS-ESCOM 301

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: Marzo Año: 2026

CONTRATO N°. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: ECONTAINERS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 272.800.000,00

FORMA DE PAGO FINAL: El valor total del contrato se cancelará en UN ÚNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL equivalente a los servicios recibidos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
10 DE ABRIL DE 2026	ÚNICO PAGO DEL 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	UNICO PAGO CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL DE CONFORMIDAD CON LOS BIENES FACTURADOS CON CORTE AL 10 DE ABRIL DE 2026

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 09 Mes 12 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes 12 Año 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 31-01-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO (CONSTITUYENDO LA RESERVA PRESUPUESTAL) Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes 01 Año 2026

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 28-02-2026, SE MODIFICA EL ANEXO TÉCNICO RESPECTO A LA CUBIERTA DE LOS SHELTERSE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: Día 25 Mes 02 Año 2026

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 10-04-2026, SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO Y SE MODIFICAN LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12 DE DICIEMBRE DE 2025 hasta el 10 DE ABRIL DE 2026

Porcentaje Avance en tiempo (Corte 28-02-2026): 65.83%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes recibidos):

MES	VALOR
VLR. EJEC. DIC	$ 0,00
VLR. EJEC. ENE	$ 0,00
VLR. EJEC. FEB	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO	**$ 0,00**
%	**0,00%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

ANDRES ALBERTO BONILLA ROA	INGENIERO CIVIL - RESIDENTE / SUPERVISOR	15202-378306 BYC
RAFAEL OLANO	MAESTRO DE ejecución del contrato	071037-06477132
LEONARDO JAIME	OFICIAL DE ejecución del contrato	EXPERIENCIA CERTIFICADA
LUIS EDUARDO MIELES ROMERO	TÉCNICO ELECTRICISTA CERTIFICADO RETIE	1052997796-129054
EDWIN PARRA DUARTE	PLOMERO/FONTANERO	EXPERIENCIA CERTIFICADA
JHON IVAN BOCAREJO	OPERADOR DE GRÚA O MONTACARGAS	SDS 8779
EDWIN ARNULFO GIL DIAZ	SOLDADOR	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA CERTIFICADA
FAUSTO DE JESUS CARBONO LASSO	AYUDANTE 1	N/A
FERNELIS BORJA	AYUDANTE 2	N/A
DIEGO MAURICIO DIAZ ROJAS	AYUDANTE 3	N/A
DIEGO FELIPE MORALES CURREA	AYUDANTE 4	N/A

NOTA: Se deja constancia de que el personal relacionado en este informe se encuentra vinculado a la ejecución del contrato durante el lapso reportado. Adicionalmente, se certifica que dicho personal es de nacionalidad colombiana, para efectos del seguimiento que el supervisor debe realizar en cumplimiento de la Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades:

1. El día 7 febrero de 2026, se envió un correo a pvalencia@econtainers.co, en el cual se notificó las novedades encontradas en el diligenciamiento de los formatos ESP del personal que participará en la ejecución del contrato.
2. El día 9 de febrero de 2026 se envió a la cuenta de correo pvalencia@econtainers.co la solicitud del listado final de personal que hará parte de la ejecución del contrato, conforme lo establecido en el acta de inicio del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las novedades presentadas por el contratista para la ejecución de mencionado trámite.
3. El día 10 de febrero de 2026 09:09hrs se envió un correo a la cuenta pvalencia@econtainers.co, recabando la información solicitada el día 9 de febrero de 2026.
4. El día 10 de febrero de 2026 09:56 se recibió respuesta de la solicitud de la información, con la respuesta “recibido en revisión”.
5. El día 10 de febrero de 2026, se envió al correo pvalencia@econtainers.co, la siguiente solicitud:

CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Para: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
CC: PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 10/02/2026 10:19 A

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 8/02/2036 10:19 AM

Yopal- Casanare

Señores
ECONTAINERS
Bogotá D.C.

Cordial saludo, siguiendo instrucciones del señor Segundo Comandante del GACAS, me permito solicitar información a cerca de la ejecución del contrato.

Teniendo presente que a la fecha faltan 19 días para el cumplimiento del plazo otorgado, y no ha sido posible la comunicación vía telefónica con ustedes, desde el día miércoles 4 de febrero, solicito por favor nos informen:

1. Si tienen contemplado realizar una prorroga adicional del contrato para la ejecución, por favor nos lo dejen saber.
2. Envíen a través de este medio el nuevo cronograma de ejecución de la obra.
3. Por favor nos remitan la información solicitada en los correos anteriores

Lo anterior, con el fin de garantizar la operación del sitio

Cordialmente;

Capitán Tiria Contreras Christian Mauricio
Comandante Escuadrilla ARP 3017
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 #19-20
Christian.tiria@fac.mil.co

6. El día 11 de febrero de 2026 se recibió la respuesta del correo anterior, acerca de la información, así:

PV Paula Valencia
Para: CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
CC: PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 11/02/2026 10:38 AM

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 9/02/2036 10:38 AM

Buenos dias

Estimado Capitan

Es un gusto saludarte. El telefono no es un mecanismo de comunicacion oficial, sin embargo dede el miercoles 4 de febrero solo he recibido una sola llamada tuya y fue el dia lunes. Agradezco no transgiversar la informacion


Con respecto a los puntos mencionados como lo informe en el correo enviado el dia lunes esta en tramite.

feliz dia



---

7. El día 11 de febrero de 2026, se recibió la respuesta de la solicitud de información del correo enviado por la supervisión del contrato el día 7 de febrero de 2026, así:

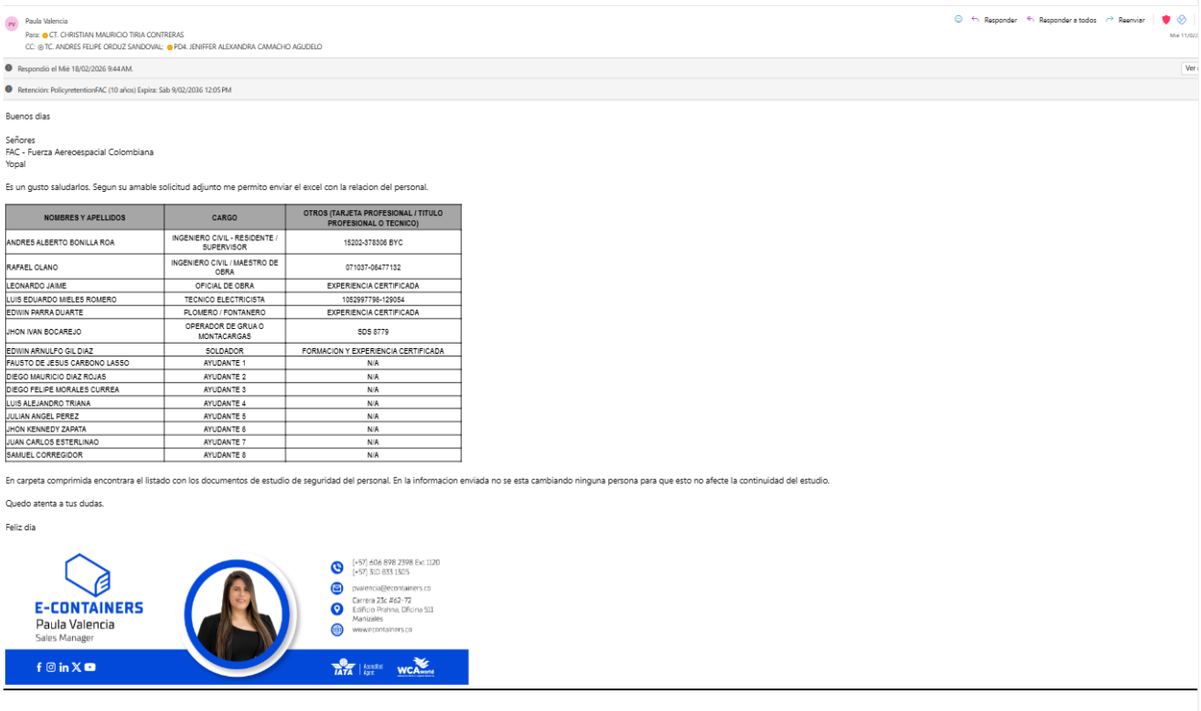

PV Paula Valencia
Para: CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
CC: TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Respondió el Mié 18/02/2026 9:44 AM.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 9/02/2036 12:05 PM

Buenos dias

Señores
FAC - Fuerza Aereoespacial Colombiana
Yopal

Es un gusto saludarlos. Segun su amable solicitud adjunto me permito enviar el excel con la relacion del personal.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL / TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANDRES ALBERTO BONILLA ROA	INGENIERO CIVIL - RESIDENTE / SUPERVISOR	15202-378306 BYC
RAFAEL OLANO	INGENIERO CIVIL / MAESTRO DE OBRA	071037-06477132
LEONARDO JAIME	OFICIAL DE OBRA	EXPERIENCIA CERTIFICADA
LUIS EDUARDO MIELES ROMERO	TECNICO ELECTRICISTA	1052997796-129054
EDWIN PARRA DUARTE	PLOMERO / FONTANERO	EXPERIENCIA CERTIFICADA
JHON IVAN BOCAREJO	OPERADOR DE GRUA O MONTACARGAS	SDS 8779
EDWIN ARNULFO GIL DIAZ	SOLDADOR	FORMACION Y EXPERIENCIA CERTIFICADA
FAUSTO DE JESUS CARBONO LASSO	AYUDANTE 1	N/A
DIEGO MAURICIO DIAZ ROJAS	AYUDANTE 2	N/A
DIEGO FELIPE MORALES CURREA	AYUDANTE 3	N/A
LUIS ALEJANDRO TRIANA	AYUDANTE 4	N/A
JULIAN ANGEL PEREZ	AYUDANTE 5	N/A
JHON KENNEDY ZAPATA	AYUDANTE 6	N/A
JUAN CARLOS ESTERLINAO	AYUDANTE 7	N/A
SAMUEL CORREGIDOR	AYUDANTE 8	N/A


En carpeta comprimida encontrara el listado con los documentos de estudio de seguridad del personal. En la informacion enviada no se esta cambiando ninguna persona para que esto no afecte la continuidad del estudio.

Quedo atenta a tus dudas.


Feliz dia

De igual manera se recibieron los correos de respuesta a las solicitudes enviadas el día 9 y 10 de febrero con la información del personal requerido para la ejecución del contrato.

8. El día 11 de febrero de 2026, se recibió por parte del contratista un correo electrónico de la cuenta pvalencia@econtainers.co en el cual enviaban el nuevo cronograma de trabajo del proyecto, y la solicitud de prórroga de plazo de ejecución, documentos que se anexan como adjuntos.
9. El día 11 de febrero de 2026 18:14 hrs se recibió un correo electrónico de la cuenta pvalencia@econtainers.co en el cual se solicita la confirmación para el envío de los documentos en físico del personal para la ejecución de los ESP.
10. El día 11 de febrero de 2026 18:31 hrs se recibió un correo electrónico de la cuenta pvalencia@econtainers.co solicitando que las reuniones de seguimiento se den cada 15 días.
11. El día 16 de febrero de 2026, se dio trámite ante el ordenador del gasto la solicitud de prórroga del contrato, mediante oficio No FAC-S-2026-033221-CI del 16 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOMESCOM-ESNAV, el cual se anexa al presente informe.
12. El día 17 de febrero se recibió un correo electrónico de la cuenta pvalencia@econtainers.co solicitando información del trámite de los documentos y la prórroga del contrato.
13. El día 18 de febrero se realizó una reunión de seguimiento del contrato, con la participación de la supervisión y el contratista, la especialista en contratación del GACAS, en ella se verifican los siguientes ítems:

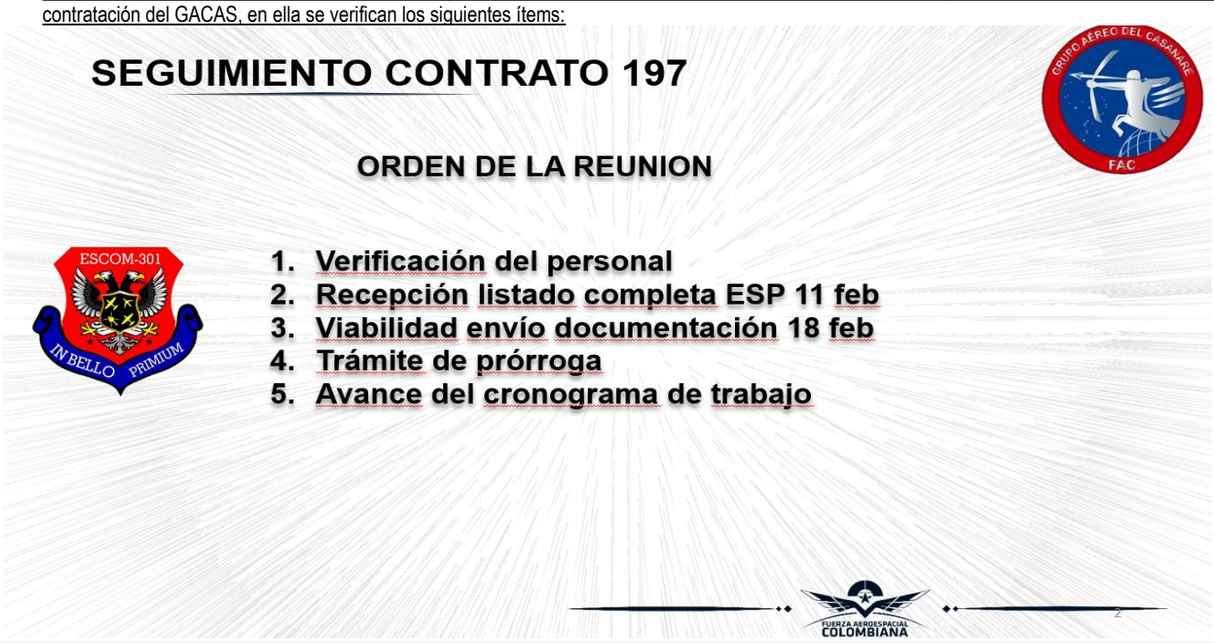

14. De igual manera se realiza acta de la reunión FAC-S-2026-019232-AG, la cual se anexa al presente informe.
15. El día 19 de febrero se recibió un correo electrónico de la cuenta pvalencia@econtainers.co en el cual enviaron el nuevo cronograma de trabajo, así mismo, enviaron la guía de entrega de los documentos físicos de ESP.

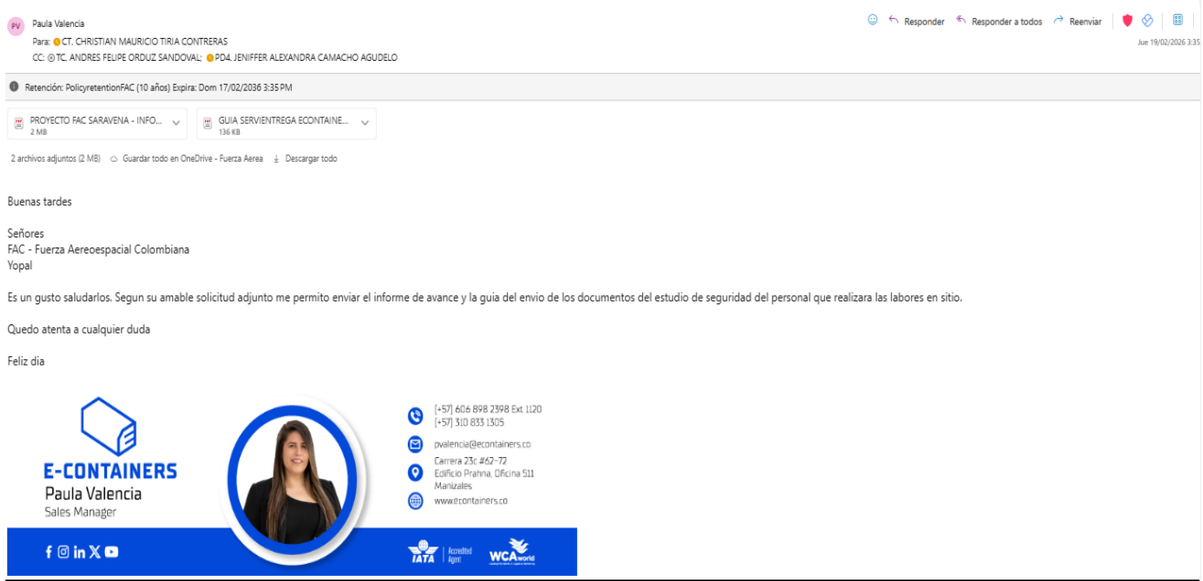

16. El día 25 de febrero de 2026 se recibió por parte del asesor de contratación del BACOF, el siguiente correo:

CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS
Para: CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
CC: TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 25/02/2026 9:04 AM

Reenvió este mensaje el Mié 25/02/2026 9:06 AM.
Ver conversación

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 23/02/2036 9:04 AM

Buenos días Capitán, espero se encuentre muy bien.

En relación al modificatorio de extensión de plazo de ejecución del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 que fue aprobado por la Entidad el lunes 23 de febrero, me permito informar que al momento de enviado este correo el mismo no ha sido aprobado por la empresa contratista; por lo cual, se reitera la solicitud de contactar al contratista para que se apruebe cuanto antes.

Así mismo, se recomienda realizar seguimiento constante para que la empresa realice el ajuste de garantías de acuerdo al nuevo plazo de ejecución.

Quedaremos al tanto de cualquier novedad.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 Nº26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

17. El día 25 de febrero de 2026 se reenvió el correo solicitando la aceptación de la prórroga, así:

CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Para: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>
CC: CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS; PD4. JENIFFER ALEXANDRA CAMACHO AGUDELO; TC. ANDRES FELIPE ORDUZ SANDOVAL

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 25/02/2026 9:0

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 23/02/2036 9:06 AM

Yopal- Casanare

Señores
ECONTAINERS
Bogotá D.C.

Buenos días, cordial saludo, me permito solicitar tenga a bien realizar la aprobación del modificatorio del contrato y la modificación de las pólizas acorde a lo establecido.

Cordialmente;

Capitán Tiria Contreras Christian Mauricio
Comandante Escuadrilla ARP 3017
Grupo Aéreo del Casanare
Calle 40 #19-20
Christian.tiria@fac.mil.co

18. El día 25 de febrero de 2026, se recibió por parte de la cuenta pvalencia@econtainers.co en el cual confirman que se aceptó la prórroga y se solicito a las aseguradoras, el cambio en las garantías; así mismo esta información se retransmite al asesor Cristian Quevedo.

19. El día 25 de febrero de 2026, se recibió por parte de la cuenta pvalencia@econtainers.co en el cual confirman que las pólizas ya fueron cargadas al sistema.

20. El día 26 de febrero de 2026 se recibió por parte del asesor Cristian Quevedo, un correo de modificación de las pólizas, y este se reenvía al contratista, así:

CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Para: Paula Valencia <pvalencia@econtainers.co>

Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 26/02/2026 9:5

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/02/2036 9:53 AM

Señores
ECONTAINERS
Bogotá DC

Cordial saludo, por medio del presente solicito modifiquen la póliza, acorde a las instrucciones emitidas por el asesor de contratación del Bacof.

Christian Tiria
cdte ESCARP3017

Sent from Outlook for iOS

From: CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS <CRISTIAN.QUEVEDO@FAC.MIL.CO>
Sent: Thursday, February 26, 2026 9:51:25 AM
To: CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS <CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO>
Subject: RV: Observación póliza cumplimiento 197-2025 - adquisición shelter - Modif 3

Buenos días Capitán, espero se encuentre muy bien.

Me permito solicitar sea comunicada esta observación realizada por el asesor jurídico sobre las expedición de pólizas por modificatorio del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025.

Quedaremos atentos.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 Nº26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

21. El día 3 de marzo de 2026, se recibió un correo por parte de Cristian Quevedo, notificando que las garantías del contrato no han sido modificadas, la cual se reenvió al contratista.

CRISTIAN CAMILO QUEVEDO COLLAZOS
Para: CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
CC: TE. SERGIO ANDRES AYALA VILLOTA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mar 3/03/2026 4:5

Reenvió este mensaje el Mar 3/03/2026 5:25 PM.
Ver conversa
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 29/02/2036 4:53 PM

Buenas tardes Capitán, espero se encuentre muy bien.

Me permito informar que, al momento de enviado este correo, la corrección solicitada el día 26 de febrero sobre la póliza de garantía del modificatorio del contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 aún no ha sido cargada en plataforma por parte del contratista.

Por favor tomar comunicación urgente con la empresa contratista para subsanar la novedad informada.

Quedaremos atentos.

Cordialmente,

CO. Cristian Camilo Quevedo Collazos
Sección Compras Públicas
Base Aérea Comando FAC – BACOF
Carrera 54 N°26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel. 3043640813
cristian.quevedo@fac.mil.co

22. El día 4 de marzo de programó una reunión de seguimiento, la cual no pudo darse por situaciones de disponibilidad del personal, la misma se encuentra programada para el día 6 de marzo de 2026.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA PARA ESTE INFORME.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. **Estudios de Seguridad de Personal (ESP):** Es imperativa la corrección y entrega inmediata de los formatos de Estudios de Seguridad l Personal (ESP) de los empleados de ECONTAINERS S.A.S., con el fin de tramitar los accesos a la unidad y evitar mayores retrasos en la ejecución en sitio del contrato.
2. **Ejecución del Contrato:** Se encuentra pendiente la entrega, instalación y puesta en funcionamiento, a todo costo, del shelter habitacional y el shelter de baños adecuados con mobiliario, equipos necesarios para funcionamiento y electrodomésticos, incluyendo el desmonte, retiro y disposición final del shelter habitacional y de baños actualmente instalado, así:

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
1	SHELTER ADECUADO PARA BAÑOS (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 144.531.900,00
2	SHELTER HABITACIONAL (según especificaciones técnicas)	1.00	VG	$ 110.000.000,00
3	SOFACAMA SENCILLO (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 833.000,00
4	NEVERA BOTTOM FREZEER (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 3.630.000,00
5	TELEVISOR SMARTV DE 65 (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 4.142.000,00
6	HORNO MICROONDAS 120 V (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 484.400,00
7	COLCHÓN SENCILLO ORTOPÉDICO DE MEDIDAS 120X190 (según especificaciones técnicas)	4.00	UN	$ 7.393.700,00
8	BOMBA HIDROFLOW HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP 50 LITROS (según especificaciones técnicas)	1.00	UN	$ 1.785.000,00
TOTAL				**$ 272.800.000,00**

3. **Gestión de Shelters Anteriores:** Realizar el desmonte, retiro y ubicación de los shelters actuales según designe el supervisor, para su posterior disposición final.
4. recibir la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato, para la catalogación OTAN.
5. Una vez recibido a satisfacción el contrato, tramitar el pago.
6. Una vez cumplidas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	**CT. TIRIA CONTRERAS CHRISTIAN**
FIRMA:	
C.C. No.	1090408415
DEPENDENCIA:	ESCOM -GACAS

Vo. Bo.:

CT. PUENTES CARVAJAL NICOLAY
Comandante ESCOM (E)

TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Gerente Proyecto GACAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		SE VERIFICARON AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		DE ACUERDO A LO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		SE HA MANTENIDO COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL CONTRATISTA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO. DE IGUAL MANERA, SE HAN EFECTUADO REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		N/A	El contrato se encuentra en ejecución

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-019232-AG	**Lugar y Fecha**	SINCRÓNICA,18-02-2026
Asunto	Reunión seguimiento contrato 197-00-COFAC-BACOF-2025		
Oficina Productora	ESCARP 3017		
Hora Inicio	15:00	**Hora Finalización**	15:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:
VERIFICACIÓN DEL QUORUM
DESARROLLO DE LA TEMÁTICA
CONCLUSIONES

Desarrollo:

Se dió inicio a la reunión a la reunión por parte del Capitán TIRIA.



SEGUIMIENTO CONTRATO 197

ORDEN DE LA REUNION

1. Verificación del personal
2. Recepción listado completa ESP 11 feb
3. Viabilidad envío documentación 18 feb
4. Trámite de prórroga
5. Avance del cronograma de trabajo

Se continuó con el flujo de la reunión, informando a la empresa ECONTAINERS, que la recepción de los documentos para el trámite de los ESP fue recepcionado el día 11 de febrero de 2026, y se encuentra en trámite por parte del Escuadrón de Inteligencia Aérea.

Se informa a la empresa ECONTAINERS, que ya pueden realizar el envío de la documentación física para el trámite de los ESP, informando por parte de la empresa que estos serán enviados el día 19 de febrero de 2026, y enviarán el comprobante del envío mediante correo electrónico.

Respecto al avance del proyecto, se dió paso al ingeniero Andrés Bonilla, quien indicó que el avance del proyecto se encontraba con un avance del 37% ejecutado, dejando como claridad que a la fecha se encontraba el shelter de baños listo, para la aplicación del recubrimiento de poliuretano.

Así mismo el shelter de alojamiento se encuentra en preparación para forrado.

Compromiso recepción de documentos el día 19 de febrero de 2026, conforme el desarrollo de la reunión, expuso el cornograma de actividades realizadas y las pendientes.

Por parte de la supervisión del contrato se consulto por la fecha prevista para el inicio de movimiento hacia el punto de entrega.

EL contratista consultó acerca de la seguridad del personal para la movilidad, a lo cual la supervisión le indicó, que al momento que sea adecuado, se dará la luz verde en cuanto al tema de seguridad, para iniciar el movimiento de los elementos.

COMPROMISOS


Por parte de la supervisión informar una vez se encuentren realizados los ESP al personal contratista.

Por parte del contratista, enviar el comprobante de envío de los documentos en físico.

Por parte del contratista el envío del cronograma de trabajo actualizado, acorde a lo expuesto por parte del ingeniero Andrés Bonilla.

Programación de la siguiente reunión.

Se anexa como listado de asistencia, la evidencia de conexión de la aplicación teams.

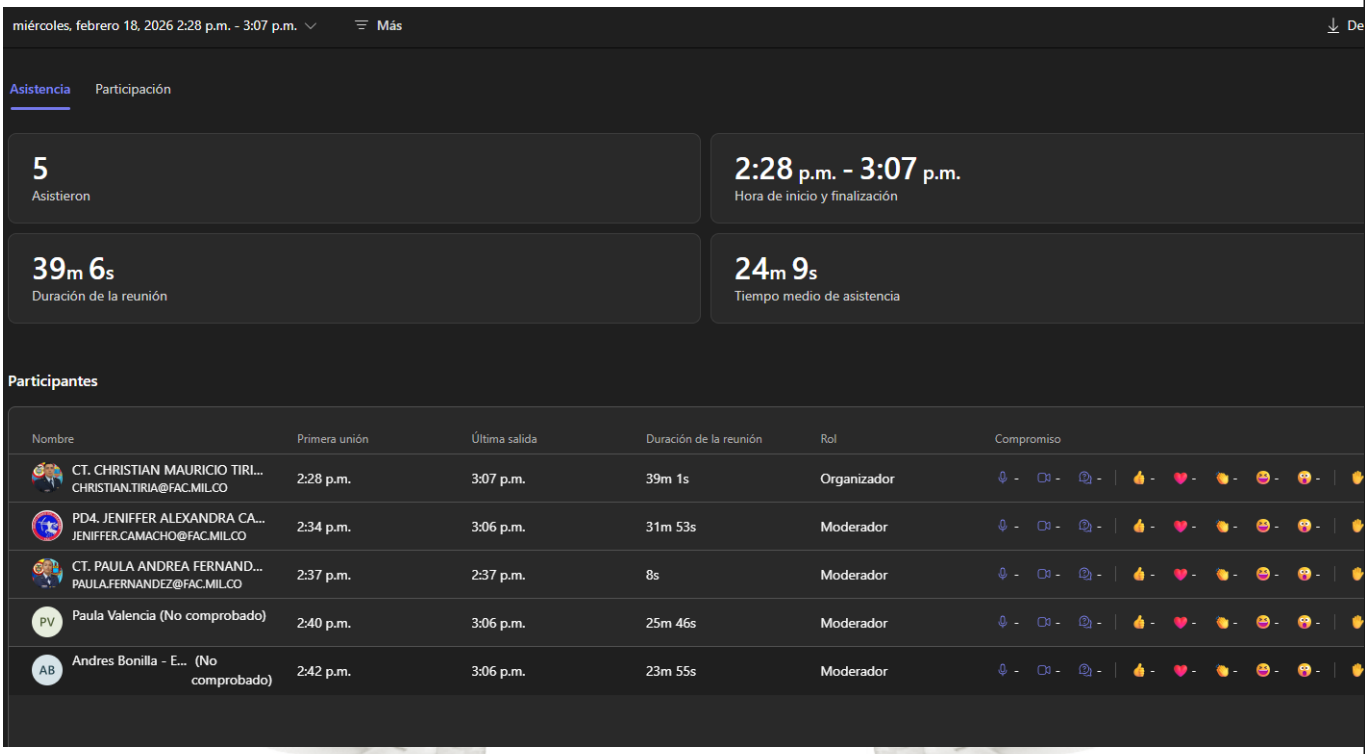

miércoles, febrero 18, 2026 2:28 p.m. - 3:07 p.m. Más

Asistencia Participación

5
Asistieron

2:28 p.m. - 3:07 p.m.
Hora de inicio y finalización

39m 6s
Duración de la reunión

24m 9s
Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol	Compromiso
CT. CHRISTIAN MAURICIO TIRI... CHRISTIAN.TIRIA@FAC.MIL.CO	2:28 p.m.	3:07 p.m.	39m 1s	Organizador	
PD4. JENIFFER ALEXANDRA CA... JENIFFER.CAMACHO@FAC.MIL.CO	2:34 p.m.	3:06 p.m.	31m 53s	Moderador	
CT. PAULA ANDREA FERNAND... PAULA.FERNANDEZ@FAC.MIL.CO	2:37 p.m.	2:37 p.m.	8s	Moderador	
Paula Valencia (No comprobado)	2:40 p.m.	3:06 p.m.	25m 46s	Moderador	
Andres Bonilla - E... (No comprobado)	2:42 p.m.	3:06 p.m.	23m 55s	Moderador	

NOTA: En la imagen se observa la conexión de la CT FERNANDEZ, quien se encontraba encargada del ESCOM 301, pero no asistió en la reunión.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

Capitán CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS
Comandante Escuadrilla Aeronaves Remotamente Pilotadas

Elaboró: CT. TIRIA / ESNAV Revisó: CT. TIRIA / ESNAV Aprobó:CT. TIRIA / ESNAV

E-CONTAINERS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

INFORME TÉCNICO 003-2026

18-02-2026

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

info@econtainers.co

INFORME TÉCNICO No 003-2026

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N°	197-00-B-COFAC-BACOF-2025
OBJETO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO
VALOR DEL CONTRATO	$ 272.800.000,oo
LUGAR DE EJECUCIÓN	PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS EL LUGAR DE EJECUCIÓN ES LA CIUDAD DE YOPAL, CASANARE, GRUPO AÉREO DEL CASANARE, PERO LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN LOS LUGARES DONDE ESTÁN LAS BASES DE LANZAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARP A SABER: BASES DE LANZAMIENTO DE SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTEADAS DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA UBICADO EN EL BATALLÓN DE CABALLERÍA NO. 18 GENERAL REVEIZ PIZARRO.
CONTRATANTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
SUPERVISOR	CT. TIRIA CONTRERRAS CHRISTIAN (SUPERVISOR PRINCIPAL) T4. MOYANO CARREÑO DIEGO (SUPERVISOR SUPLENTE)
CONTRATISTA	E-CONTAINERS SAS
NIT CONTRATISTA	900.641.692-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAIRO VALENCIA HINCAPIE

2. ALCANCE

2.1. BATERIA DE BAÑOS 40FT

- Shelter tipo marítimo de 40 pies (40 pies de largo, 2.44 Mts de ancho, 2.59 Mts de alto), distribución según planos.
- Tablero de protecciones con circuitos independientes para la iluminación, aires acondicionados, tomas de corriente (30 metros de acometida subterránea), trifásico de 12 circuitos, garantizando la conexión eléctrica de la red principal al shelter.
- 02 detector de Humo.
- 02 cabinas para ducha en vidrio templado de 6mm, con puertas corredizas, manillas en acero inoxidable, grifería con 3 funciones de alta presión, desagüe, iluminación interna y piso antideslizante con dimensiones aproximadas a 1.5 metros cuadradas cada una.
- 02 orinales de pared ahorradores de agua, con fluxómetro y válvula tipo push, con medidas aproximadas de separación de 1 mt y altura respecto al piso hasta el borde superior del urinario es de 58 a 65 cm.

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Barranquilla 605 3989700
Bucaramanga 607 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

- Dos (02) divisiones de baño para orinales en resina fenólica.
- 02 sanitarios redondos, de dos piezas, de consumo ecológico (4.8 Lts) por descarga.
- Dos (02) divisiones de baños en resina fenólica para los sanitarios, con sus respectivas puertas, bisagras de retorno automático, laminado compacto y mecanismo de apertura sin llaves con área de 1.2 metros cuadrados cada uno aproximadamente.
- Baños y orinales, totalmente enchapados en cerámica tráfico 5.
- Paredes del shelter enchapados hasta 45 cm de altura con cerámica del mismo tono del piso (Estilo madera Zesu inout).
- Guarda escobas impermeabilizados.
- 02 extractores de olores ubicados en la parte posterior de los sanitarios.
- 02 lavamanos en base en cerámica, con grifería, espejos en la parte superior y accesorios (llave mono control para AF y AC), así mismo, con (01) mueble en madera con divisiones (02 cajones en los extremos y 01 cajón central) para almacenamiento.
- Iluminación con 6 Lámparas eléctricas herméticas tipo LED 50W Luz Blanca para todo el shelter y su respectiva instalación eléctrica con interruptores individuales.
- Cuatro (04) tomas corrientes dobles 110 V, distribuidos según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), NTC-2050.
- Cubierta de techo curvado hacia abajo en los laterales y evacuación de aguas lluvias en con soporte en columnas al shelter en material resistente a la corrosión.
- Dos (02) ventanas corredizas (1 Mts x 1.1 Mts) dos por cada lateral del shelter, el lateral más largo, con persianas en PVC y vidrios oscuros herméticos 8 mm de espesor, con Persianas Tipo doble enrollable, Color blanco (1 Mts x 1.1 Mts).
- Sistema de tuberías de agua potable para el lavamanos, ducha y sanitarios (15 metros de acometida y 25 metros de acometida exterior subterránea con conexión a red principal).conexiones internas del shelter en tubo PVC Presión ½" 9-500 Psi y la conexión a la red principal el tubo PVC presión ¾" 21-200 Psi, incluye los respectivos accesorios para su conexión y correcto funcionamiento.
- Sistema de tuberías de aguas negras (15 metros de salida). Con su respectiva adecuación a la tubería principal. Conexión del sanitario tubo PVC sanitario de 3", conexión desagüe de lavamanos y orinales tubo PVC de 2", desagüe de ducha en tubo PVC de 3", tubería de conexión del shelter al pozo séptico tubería sanitaria de 4".
- Un (01) sistema de acceso tipo escalera metálica en acero inoxidable, con baranda y sistema antideslizante que permite la limpieza del calzado, unida (soldada) al shelter, con mínimo 02 escalones, máximo 5 escalones, los requeridos en ese rango para el acceso a nivel del piso del shelter.
- Adecuación del terreno y cimentación, incluye seis (06) dados de (30cm ancho x 30cm largo x 50 cm de alto) en concreto de resistencia mínima de 3.500 Psi para la base, con sus respectivas zapatas de acuerdo con las condiciones del suelo y especificaciones del dado.
- Un (01) mueble para baño de 1,7 metros (Alto) X 71 Cms (Frente) X 72 Cms (Fondo), asegurado al shelter para evitar movimientos o caída.
- Una (1) puerta de acceso principal simple de apertura exterior, 1 metro de ancho, 2,0 metros de alto y 30 mm de espesor con cerradura, chapa de manija y antipánico, cada una con brazo hidráulico para puerta. La puerta deberá contar con burlete perimetral para evitar el ingreso de polvo y agua, así mismo sistema que permita asegurar el shelter tanto del exterior cómo del interior.
- Protección aislamiento termoacústico, mediante lana de fibra de vidrio para asegurar un ambiente interior confortable.

- Las paredes del shelter junto con sus interiores en láminas de madecor blando de 15mm RH.
- El techo en la parte interna debe recubrirse con PVC resistente a la humedad e inerte a los microorganismos.
- Piso de tráfico 5 en cerámica, sobre placa fibrocemento perfectamente tratado para ser resistente a la humedad e impermeabilizado estilo madera Zesu inout.
- La estructura metálica del shelter deberá tener una capa protectora de corrosión, así como la calidad del tipo de pintura que sea aplicado, deberá garantizar la menor proliferación de hongos y ataques corrosivos.
- Techo impermeabilizado con resina de fibra de vidrio.
- Las paredes y el techo cuenten con mallado metálico de seguridad y de soporte de los equipos, aislamiento y recubrimiento interno.
- Debe contar con protección exterior, aplicación de 3 mills base epóxica y aplicación de 2 mills esmalte uretano (Color Institucional Gris FAC).
- El ingreso del Shelter debe tener un letrero informativo (BAÑOS), que sea visible en todas las condiciones de iluminación, de 60 Cms alto x 80 Cms de ancho.
- Banco de asiento, de 1.5 Mts largo, 45 cm alto, 30 cm ancho, instalado y asegurado para zona de espera en el baño.
- 01 aire acondicionado de 18000 BTU tipo mini Split junto con su respectivo control remoto con tecnología Inverter de alta eficiencia, módulo de conexión wifi y bajo ruido, acoplado, instalado con protector electrónico de picos eléctricos y funcional, garantía de 1 año, con protector de Voltaje para aire acondicionado de 110V. Incluye la conexión eléctrica y tubería de drenaje en tubo PVC de presión de ¾"

2.2. DORMITORIO 40FT

- Shelter tipo marítimo de 40 pies (40 pies de largo, 2.44 Mts de ancho, 2.59 Mts de alto), distribución según planos.
- Tablero de protecciones con circuitos independientes para la iluminación, aires acondicionados, tomas de corriente (30 metros de acometida subterránea), trifásico de 12 circuitos garantizando la conexión eléctrica de la red principal al shelter.
- Adecuación del terreno y cimentación, incluye seis (06) dados de (30cm ancho x 30cm largo x 50 cm de alto) en concreto de resistencia mínima de 3.500 Psi para la base, con sus respectivas zapatas de acuerdo con las condiciones del suelo y especificaciones del dado.
- Iluminación 4 con Lámparas eléctricas herméticas tipo LED 50W Luz Blanca para todo el shelter.
- Ocho (08) tomas corrientes dobles 110 V, distribuidos según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), NTC-2050.
- Dos (02) tomas corrientes dobles 220 V, distribuidos según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), NTC-2050.
- Una (01) sistema de acceso tipo escalera metálica en acero inoxidable, con baranda y sistema antideslizante que permite la limpieza del calzado, unida (soldada) al shelter, con mínimo 02 escalones, máximo 5 escalones, los requeridos en ese rango para el acceso a nivel del piso del shelter.
- Cubierta a 4 aguas, en teja metálica Steel standing sean calibre 26 tipo panel color verde colmena o similar, caballete del mismo material y todos los accesorios para su instalación y correcto

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

funcionamiento (incluye estructura metálica en perfil tubular rectangular de 100mm X 40mm x 1.5m a una distancia de 0.90 mt entre espacios, tornillo autoperforante con neopreno de 10X3/4).

- Dos (02) ventanas corredizas (1 Mts x 1.1 Mts) dos por cada lateral del shelter, con persianas en PVC y vidrios oscuros herméticos 8 mm de espesor, con Persianas Tipo doble enrollable, Color blanco (1 Mts x 1.1 Mts).
- Piso de tráfico 5 en cerámica, sobre placa fibrocemento perfectamente tratado para ser resistente a la humedad e impermeabilizado, con guarda escobas de 45 cm de alto en cerámica impermeabilizada.
- La estructura metálica del shelter deberá tener una capa protectora de corrosión, así como la calidad del tipo de pintura que sea aplicado, deberá garantizar la menor proliferación de hongos y ataques corrosivos.
- Techo impermeabilizado con resina de fibra de vidrio.
- Soporte base de pared para extintor.
- Las paredes y el techo deben tener mallado metálico de seguridad y de soporte de los equipos, aislamiento y recubrimiento interno.
- Debe contar con protección exterior, aplicación de 3 mills base epóxica y aplicación de 2 mills esmalte uretano (Color Institucional Gris FAC).
- El ingreso del Shelter debe tener un letrero informativo (HABITACIONAL), que sea visible en todas las condiciones de iluminación, de 60 Cms alto x 80 Cms de ancho.
- 01 aire acondicionado de 18000 BTU tipo mini Split junto con su respectivo control remoto con tecnología Inverter de alta eficiencia, módulo de conexión wifi y bajo ruido, acoplado, instalado con protector electrónico de picos eléctricos y funcional, garantía de 1 año, con protector de Voltaje para aire acondicionado de 110V. Incluye la conexión eléctrica y tubería de drenaje en tubo PVC de presión de ¾".
- 2 camarote metálico sencillo de 02 pisos, con sus respectivas tablas. 120x190. Incluida la escalera, para poder subir al segundo nivel, asegurado al shelter para evitar movimientos o caída.
- 2 muebles tipo armario de 1,7 metros (Alto) X 71 Cms (Frente) X 72 Cms (Fondo), asegurado al shelter para evitar movimientos o caída.
- 2 Mesa de noche con dos cajones, asegurado al shelter para evitar movimientos o caída.

2.3. MOBILIARIO ADICIONAL

- 1 sofacama sencillo.
- 1 nevera bottom frezeer, medidas 70 Cms ancho, 1.85 Mts alto, 70 Cms profundo. Capacidad 461 Lts, 3 cajones de congelador trasparentes, dispensador de agua externo, compresor smart, con protector de Voltaje para nevera de 110 V, corriente máxima de 10A 50-60 Hz.
- 1 televisor Smartv de 65" junto con su respectivo control remoto, soporte de pared extensible de 03 brazos, instalado y en funcionamiento, así como, su respectiva antena TDT, garantía de 1 año.
- 1 horno microondas 120 V, color gris capacidad de 20 L, de potencia de 700W y garantía de 01 año.
- 4 colchón sencillo ortopédico de medidas 120x190, anti-ácaros resortado, con espuma de alta densidad y 5 años de garantía, con protector para colchón antifluido: Protector para colchón antifluido, 100% poliéster, protección contra ácaros y hongos, antialérgico, que no genere calor, para colchones de hasta 30 cm para cama sencilla 120X190, sistema de ajuste con resorte.
- 1 bomba Hidroflow Hidroneumática 1/2 Hp 50 Litros

Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

3. EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el avance por etapas de fabricación de cada una de las unidades del proyecto en mención

% EJECUTADO	37.28%
% PROYECTADO	37.87%
AVANCE / RETRASO	-0.59%

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (DIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	% EJECUTADO	% EJECUTADO GLOBAL	% PROYECTADO	% PROYECTADO GLOBAL
1	**DORMITORIO 40FT**							
1.1	**RESTAURACIÓN**							
1.1.1	Latonería	6	13/02/2026	17/02/2026	100.0%	3.55%	100%	3.55%
1.1.2	Grateado	3	18/02/2026	20/02/2026	100.0%	1.78%	0%	0.00%
1.1.3	Aplicación hueso duro	2	23/02/2026	24/02/2026	50.0%	0.59%	0%	0.00%
1.1.4	Lijado hueso duro	2	25/02/2026	26/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.2	**DETALLADO**							
1.2.1	Fondeo con anticorrosivo	1	27/02/2026	27/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.2.2	Aplicación masilla roja	2	2/03/2026	3/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.2.3	Lijado masilla roja	2	19/01/2026	20/01/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.3	**ESTRUCTURACIÓN PUERTAS Y VENTANAS**							
1.3.1	Cimbrado y cortes de vanos puertas y ventanas	3	18/02/2026	20/02/2026	100.0%	1.78%	0%	0.00%
1.3.2	Fabricación de marcos	2	23/02/2026	24/02/2026	100.0%	1.18%	0%	0.00%
1.3.3	Instalación de marcos	1	25/02/2026	25/02/2026	100.0%	0.59%	0%	0.00%
1.3.4	Resoldado de marcos	1	26/02/2026	26/02/2026	100.0%	0.59%	0%	0.00%
1.3.5	Fabricación puerta	1	27/02/2026	27/02/2026	100.0%	0.59%	0%	0.00%
1.3.6	Instalación de puerta	1	2/03/2026	2/03/2026	50.0%	0.30%	0%	0.00%
1.3.7	Instalación de ventanas	1	3/03/2026	3/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
1.4.1	Instalación cajas y soportes	2	4/03/2026	5/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.4.2	Instalación de tubería	1	6/03/2026	6/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.4.3	Cableado	1	9/03/2026	9/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.4.4	Instalación caja de circuitos	1	10/03/2026	10/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.4.5	Instalación de aparatos y luminarias	1	17/03/2026	17/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.5	**FORRADO**							
1.5.1	Instalación de estructura liviana para muros y techos	4	25/02/2026	2/03/2026	20.0%	0.47%	0%	0.00%
1.5.2	Instalación de aislante termoacustico	2	6/03/2026	9/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.5.3	Instalación de laminas de madecor	3	10/03/2026	12/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.5.4	Instalación de madecanto y tapatornillos	2	13/03/2026	16/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.5.5	Protección de muros y techos	1	17/03/2026	17/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.5.6	Detalles finales	1	18/03/2026	18/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.6	**INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO**							
1.6.1	Fabricación sopórte	1	3/03/2026	3/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.6.2	Soldadura de soporte	1	4/03/2026	4/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.6.3	Instalación de aire	1	1/04/2026	1/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.7	**INSTALACIÓN DE PISO**							

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (DIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	% EJECUTADO	% EJECUTADO GLOBAL	% PROYECTADO	% PROYECTADO GLOBAL
1.7.1	Reparación de piso	2	13/03/2026	13/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.7.2	Instalación eterboard	2	16/03/2026	17/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.7.3	Instalación de enchape	3	25/03/2026	27/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.7.4	Instalación de boquilla	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.7.5	Instalación guardaescoba	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.8	**ACABADOS INTERNOS**							
1.8.1	Alistamiento de superficie	1	1/04/2026	1/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.8.2	Limpieza y detallado	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.9	**ACABADOS EXTERNOS**							
1.9.1	Alistamiento de superficie	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.9.2	Empapelado	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.9.3	Aplicación de pintura final	2	1/04/2026	2/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.10	**LOGISTICA Y TRANSPORTE**							
1.10.1	Cargue unidades en Bogotá	1	18/03/2026	18/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.10.2	Transporte de contenedores Bogotá - Saravena	2	19/03/2026	21/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.10.3	Descargue de contenedores de unidad	1	22/03/2026	23/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.11	**CUBIERTA**							
1.11.1	Corte y armado de cubierta	1	24/03/2026	24/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.11.2	Presentación de estructura	1	25/03/2026	25/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.11.3	Soldado de estructura	1	26/03/2026	26/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.11.4	Aplicación de pintura	1	27/03/2026	27/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.11.5	Instalación de tejado	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.12	**REMATES Y VARIOS**							
1.12.1	Sikado	1	28/03/2026	28/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.12.2	Instalación de cerraduras	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.12.3	Aseo final	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.12.4	Instalación placa de producto de venta	1	1/04/2026	1/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
1.12.5	Armado de mobiliario	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2	**BAÑO 40FT**							
2.1	**RESTAURACIÓN**							
2.1.1	Latonería	6	29/12/2025	5/01/2025	100.0%	3.55%	100%	3.55%
2.1.2	Grateado	3	6/01/2026	8/01/2026	100.0%	1.78%	100%	1.78%
2.1.3	Aplicación hueso duro	2	9/01/2026	12/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.1.4	Lijado hueso duro	2	13/01/2026	14/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.2	**DETALLADO**							
2.2.1	Fondeo con anticorrosivo	1	15/01/2026	15/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (DIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	% EJECUTADO	% EJECUTADO GLOBAL	% PROYECTADO	% PROYECTADO GLOBAL
2.2.2	Aplicación masilla roja	2	16/01/2026	17/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.2.3	Lijado masilla roja	2	19/01/2026	20/01/2026	50.0%	0.59%	100%	1.18%
2.3	**ESTRUCTURACIÓN PUERTAS Y VENTANAS**							
2.3.1	Cimbrado y cortes de vanos puertas y ventanas	3	6/01/2026	8/01/2026	100.0%	1.78%	100%	1.78%
2.3.2	Fabricación de marcos	2	9/01/2026	12/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.3.3	Instalación de marcos	1	13/01/2026	13/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.3.4	Resoldado de marcos	1	14/01/2026	14/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.3.5	Fabricación puerta	1	15/01/2026	15/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.3.6	Instalación de puerta	1	16/01/2026	16/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.3.7	Instalación de ventanas	1	19/01/2026	19/01/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
2.4.1	Instalación cajas y soportes	2	15/01/2026	16/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.4.2	Instalación de tubería	1	17/01/2026	17/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.4.3	Cableado	1	19/01/2026	19/01/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.4.4	Instalación caja de circuitos	1	20/01/2026	20/01/2026	50.0%	0.30%	100%	0.59%
2.4.5	Instalación de aparatos y luminarias	1	27/01/2026	27/01/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.4.6	Instalació red voz y dotos	1	26/01/2026	26/01/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.5	**FORRADO**							
2.5.1	Instalación de estructura liviana para muros y techos	4	13/01/2026	14/01/2026	100.0%	2.37%	100%	2.37%
2.5.2	Instalación de aislante termoacustico	2	16/02/2026	17/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.5.3	Instalación de laminas de madecor	3	18/02/2026	20/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.5.4	Instalación de madecanto y tapatornillos	2	23/02/2026	24/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.5.5	Protección de muros y techos	1	25/02/2026	25/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.5.6	Detalles finales	1	26/02/2026	26/02/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.6	**INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO**							
2.6.1	Fabricación sopórte	1	2/03/2026	3/03/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.6.2	Soldadura de soporte	1	4/03/2026	4/03/2026	100.0%	0.59%	100%	0.59%
2.6.3	Instalación de aire	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.7	**INSTALACIÓN DE PISO**							
2.7.1	Fabricación de poyo	2	16/01/2026	19/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.7.2	Instalación eterboard	2	24/01/2026	26/01/2026	100.0%	1.18%	100%	1.18%
2.7.3	Instalación de enchape	2	25/03/2026	26/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.7.4	Instalación de boquilla	1	27/03/2026	27/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.7.5	Instalación guardaescoba	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**							
2.8.1	Red agua potable	2	20/01/2026	21/01/2026	80.0%	0.95%	100%	1.18%

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (DIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	% EJECUTADO	% EJECUTADO GLOBAL	% PROYECTADO	% PROYECTADO GLOBAL
2.8.2	Red agua residual	2	22/01/2026	23/01/2026	80.0%	0.95%	100%	1.18%
2.8.3	Instalación sanitarios, orinal, lavamanos, ducha	2	1/04/2026	2/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.9	**ACABADOS INTERNOS**							
2.9.1	Alistamiento de superficie	1	31/03/2026	31/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.9.2	Limpieza y detallado	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.10	**ACABADOS EXTERNOS**							
2.10.1	Alistamiento de superficie	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.10.2	Empapelado	1	27/03/2026	27/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.10.3	Aplicación de pintura final	2	31/03/2026	1/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.11	**LOGISTICA Y TRANSPORTE**							
2.11.1	Cargue unidades en Bogotá	1	18/03/2026	18/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.11.2	Transporte de contenedores Bogotá - Saravena	2	19/03/2026	21/03/2026	0.0%	0.00%	100%	1.18%
2.11.3	Descargue de contenedores de unidad	1	22/03/2026	23/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.12	**CUBIERTA**							
2.12.1	Corte y armado de cubierta	1	24/03/2026	24/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.12.2	Presentación de estructura	1	25/03/2026	25/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.12.3	Soldado de estructura	1	26/03/2026	26/03/2026	0.0%	0.00%	100%	0.59%
2.12.4	Aplicación de pintura	1	27/03/2026	27/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.12.5	Instalación de tejado	1	30/03/2026	30/03/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.13	**REMATES Y VARIOS**							
2.13.1	Sikado	1	1/04/2026	1/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.13.2	Instalación de cerraduras	1	2/04/2026	2/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.13.3	Aseo final	1	2/04/2026	2/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.13.4	Instalación placa de producto de venta	1	3/04/2026	3/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
2.13.5	Armado de mobiliario	1	2/04/2026	2/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
3	**ENTREGA Y CIERRE DOCUMENTAL**							
3.1	**REVISIÓN**							
3.1.1	Preentrega para revisión de novedades	1	4/04/2026	4/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
3.1.2	Atención denovedades encontradas por parte del contratista	5	5/04/2026	6/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
3.2	**CIERRE DOCUMENTAL**							
3.2.1	Cita entrega formal de unidades	1	7/04/2026	7/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%
3.2.2	Entrega de documentos y cierre para facturación	4	8/04/2026	10/04/2026	0.0%	0.00%	0%	0.00%

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Grifería de duchas x 2 und



Espejos para baño x 2 und



Mueble de lavamanos x 1 und



Cortinas blackout x 8 und



Bancas de baño x 2 und



Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Aires acondicionados de 18.000 BTU x 2 und




Mesa de noche x 2 und




Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Soporte para TV x 1 und

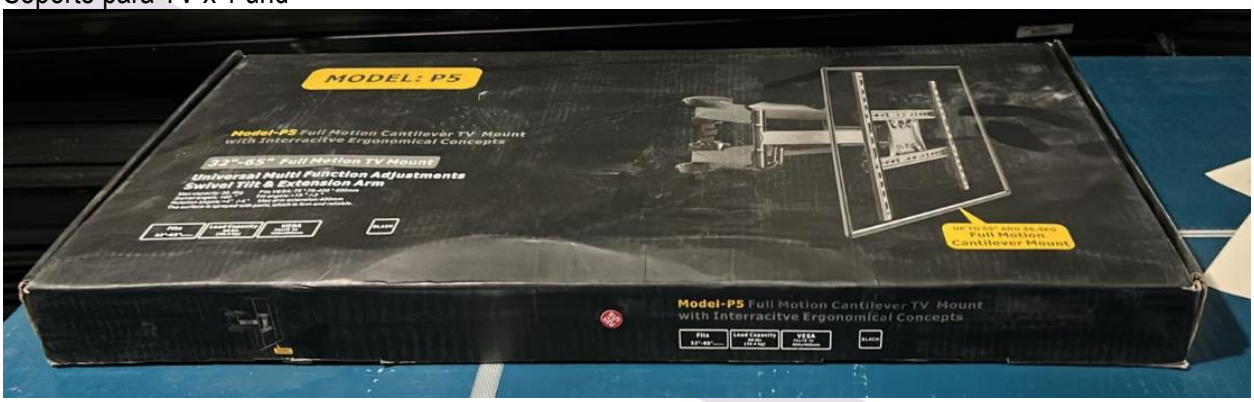

Antena para TDT x 1 und



Horno microondas x 1 und



Encuéntranos en:
601 7940250
604 5908913
602 3989700
606 8982398
605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

E-CONTAINERS
WWW.ECONTAINERS.CO

info@econtainers.co

Colchones semidobles 1.20 m de ancho x 4 und



Protectores para colchón de 1.20 m de ancho x 4 und



Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Tv x 1 und



Protección de voltaje para aires x 2 und



Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Detectores de humo x 2 und



Bomba Hidroflow



Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292


Contenedor Dormitorios





Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

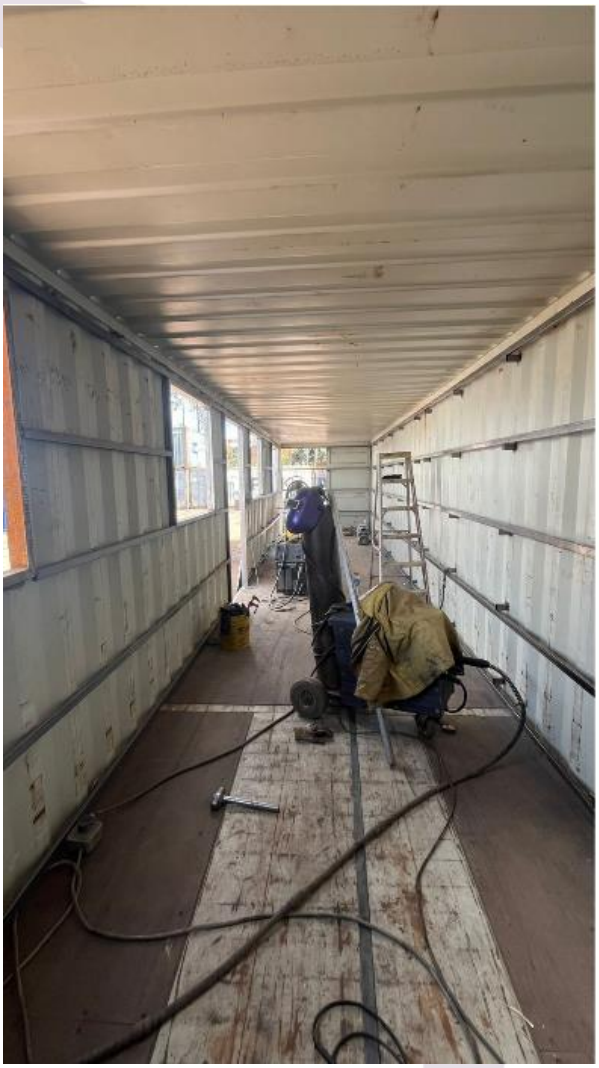



Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

Contenedor Baños





Encuéntranos en:
Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292



Encuéntranos en:

Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292







Encuéntranos en:

á 601 7940250

lín 604 5908913

602 3989700

ales 606 8982398

gena 605 6503956

Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356

3043572292





Encuéntranos en:

Bogotá 601 7940250
Medellín 604 5908913
Cali 602 3989700
Manizales 606 8982398
Cartagena 605 6503956
Servicio al Cliente Ext. Opción 4

WhatsApp y línea comercial 3116394356
3043572292

ECONTAINERS S.A.S

FUERZA AEREA DE COLOMBIA - SARAVENA

Agrupar por: Hito Ver: All Tasks Expandido en 11/02/2026 12:05 p. m.

Zoho Projects

V	ID	Nombre de Tarea		% Porcentaje completado
		1° DIMMOTORD 40FT		0%
		1 RESTAURACIÓN (4)		0%
	FA1-T159	2.1. Latonería		0%
	FA1-T160	2.2. Granizado		0%
	FA1-T161	2.3. Aplicación hueso duro		0%
	FA1-T162	2.4. Ljado hueso duro		0%
		1 DETALLADO (3)		0%
	FA1-T156	3.1. Fondeo con anticorrosivo		0%
	FA1-T157	3.2. Aplicación masilla roja		0%
	FA1-T158	3.3 Ljado masilla roja		0%
		1 ESTRUCTRUCIÓN PUERTAS Y VENTANAS (7)		0%
	FA1-T149	Cimbrado y cortes de vanos puertas y ventanas		0%
	FA1-T150	Fabricación de marcos		0%
	FA1-T151	Instalación marcos		0%
	FA1-T152	Resoldado de marcos		0%
	FA1-T153	Fabricación puerta		0%
	FA1-T154	Instalación puerta		0%
	FA1-T155	Instalación ventanas		0%
		1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (5)		0%
	FA1-T143	Instalación de cajas y soportes NO REGULADA		0%
	FA1-T144	Instalación tubería NO REGULADA		0%
	FA1-T145	Cableado NO REGULADA		0%
	FA1-T146	Instalación caja de circuitos		0%
	FA1-T147	Instalación aparatos y luminarias		0%
		1 FORRADO (6)		0%
	FA1-T137	6.1. Instalación estructura liviana para muros, techos y divisiones		0%
	FA1-T138	8.3. Instalación aislante		0%
	FA1-T139	8.4. Instalación de placas de drywall, PVC, eterboard, madecor, lamina galvanizada, entre otros		0%
	FA1-T140	8.5. Instalación de madecantro y tapatornillos		0%
	FA1-T141	8.7. Protección de muros y techos		0%
	FA1-T142	8.8. Detalles finales		0%
		1 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (3)		0%
	FA1-T124	12.1. Fabricación soporte		0%
	FA1-T125	12.2. Soldadura soporte		0%
	FA1-T126	12.3. Instalación aire		0%
		1 INSTALACIÓN DE PISO (5)		0%
	FA1-T132	9.1. Reparación de piso		0%
	FA1-T133	9.5. Instalación eterboard		0%
	FA1-T134	9.6. Instalación de enchape		0%
	FA1-T135	9.7. Instalación de boquilla		0%
	FA1-T136	9.8. Instalación guardaescoba		0%
		1 ACABADOS INTERNOS (2)		0%
	FA1-T130	10.1. Alistamiento superficia		0%
	FA1-T131	10.2. Limpieza y detallado		0%
		1 ACABADOS EXTERNOS (3)		0%
	FA1-T127	11.1. Alistamiento superficie		0%
	FA1-T128	11.2. Empapelado superficie		0%
	FA1-T129	11.3. Aplicación pintura final		0%
		1 TRANSPORTE Y LOGISTICA (3)		0%
	FA1-T163	12.1. Cargue contenedor Bogota		0%
	FA1-T164	12.2. Traslado contenedor Bogotá -Saravena		0%
	FA1-T165	12.3. Descargue y posicionamiento de unidad		0%
		1 REMATES Y VARIOS (5)		0%
	FA1-T119	13.2. Sikado		0%
	FA1-T120	13.3. Instalación cerraduras		0%
	FA1-T121	13.4. Aseo final		0%
	FA1-T122	13.7. Instalación placa de producto en venta		0%
	FA1-T123	13.8. Armado de mobiliario		0%
		1 CUBIERTA (5)		0%
	FA1-T166	14.1. Corte y fabricación de cubierta		0%
	FA1-T167	14.2. Presentación de estructura		0%
	FA1-T168	14.3. Soldado de cubierta		0%
	FA1-T169	14.4. Aplicación de pintura		0%
	FA1-T170	14.5. Instalación de tejadó		0%
		1° BAÑOS 40FT		42%
		1 RESTAURACIÓN (4)		100%
	FA1-T104	2.1. Latonería		100%
	FA1-T105	2.2. Granizado		100%
	FA1-T106	2.3. Aplicación hueso duro		100%
	FA1-T107	2.4. Ljado hueso duro		100%
		1 DETALLADO (3)		100%
	FA1-T101	3.1. Fondeo con anticorrosivo		100%
	FA1-T102	3.2. Aplicación masilla roja		100%
	FA1-T103	3.3 Ljado masilla roja		100%
		1 ESTRUCTRUCIÓN PUERTAS Y VENTANAS (7)		86%
	FA1-T94	Cimbrado y cortes de vanos puertas y ventanas		100%
	FA1-T95	Fabricación de marcos		100%
	FA1-T96	Instalación marcos		100%
	FA1-T97	Resoldado de marcos		100%
	FA1-T98	Fabricación puerta		100%
	FA1-T99	Instalación puerta		100%
	FA1-T100	Instalación ventanas		0%
		1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (5)		83%
	FA1-T88	Instalación de cajas y soportes NO REGULADA		100%
	FA1-T89	Instalación tubería NO REGULADA		100%
	FA1-T90	Cableado NO REGULADA		100%
	FA1-T91	Instalación caja de circuitos		100%
	FA1-T92	Instalación aparatos y luminarias		0%
		1 FORRADO (6)		16%
	FA1-T81	6.1. Instalación estructura liviana para muros, techos y divisiones		100%
	FA1-T82	8.3. Instalación aislante		0%
	FA1-T83	8.4. Instalación de placas de drywall, PVC, eterboard, madecor, lamina galvanizada, entre otros		0%
	FA1-T84	8.5. Instalación de madecantro y tapatornillos		0%
	FA1-T86	8.7. Protección de muros y techos		0%
	FA1-T87	8.8. Detalles finales		0%
		1 INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO (3)		66%
	FA1-T65	12.1. Fabricación soporte		100%
	FA1-T66	12.2. Soldadura soporte		100%
	FA1-T67	12.3. Instalación aire		0%
		1 INSTALACIÓN DE PISO (5)		40%
	FA1-T74	9.1. Fabricación de poyo		100%
	FA1-T77	9.5. Instalación eterboard		100%
	FA1-T78	9.6. Instalación de enchape		0%
	FA1-T79	9.7. Instalación de boquilla		0%
	FA1-T80	9.8. Instalación guardaescoba		0%
		1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (3)		0%
	FA1-T175	6.1. Red agua potable		80%
	FA1-T176	6.2. Red agua residual		80%
	FA1-T177	6.3. Instalación sanitario, orinal, lavamanos, duchas, lavaplatos, entre otros		0%
		1 ACABADOS INTERNOS (2)		0%
	FA1-T71	10.1. Alistamiento superficia		0%
	FA1-T72	10.2. Limpieza y detallado		0%
		1 ACABADOS EXTERNOS (3)		0%
	FA1-T68	11.1. Alistamiento superficie		0%
	FA1-T69	11.2. Empapelado superficie		0%
	FA1-T70	11.3. Aplicación pintura final		0%
		1 TRANSPORTE Y LOGISTICA (3)		0%
	FA1-T108	12.1. Cargue contenedor Bogota		0%
	FA1-T109	12.2. Traslado contenedor Bogotá -Saravena		0%
	FA1-T110	12.3. Descargue y posicionamiento de unidad		0%
		1 REMATES Y VARIOS (5)		0%
	FA1-T60	13.2. Sikado		0%
	FA1-T61	13.3. Instalación cerraduras		0%
	FA1-T62	13.4. Aseo final		0%
	FA1-T63	13.7. Instalación placa de producto en venta		0%
	FA1-T64	13.8. Armado de mobiliario		0%
		1 CUBIERTA (5)		0%
	FA1-T114	14.1. Corte y fabricación de cubierta		0%
	FA1-T115	14.2. Presentación de estructura		0%
	FA1-T116	14.3. Soldado de cubierta		0%
	FA1-T117	14.4. Aplicación de pintura		0%
	FA1-T118	14.5. Instalación de tejadó		0%
		1° ENTREGA Y CIERRE DOCUMENTAL		0%
		1 REVISIÓN (2)		0%
	FA1-T171	Preentrega para revisión de novedades		0%
	FA1-T172	Atención de novedades encontradas por parte del contratista		0%
		1 CIERRE DOCUMENTAL (2)		0%
	FA1-T173	Cita entrega formal de unidades		0%
	FA1-T174	Entrega de documentos y cierre para facturación		0%

Legends

Hito

Listas de tareas — Tarea — Subtarea — Tarea con duración cero — Línea de fondo — Línea base y retraso — Ruta crítica — Tarea Slack — Tarea de consolidación — Subtareas de remonta — Tarea cerrada — Tarea cerrada con retraso — Tarea cerrada antes del

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-033221-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-033221-CI del 16 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESCOM-ESNAV

Señor Teniente Coronel
JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF
Bogotá - D.C.

Asunto: Solicitud trámite prórroga contrato 197-00-B-COFAC-BACOF-2025

En mi calidad de Supervisor, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, que en referencia al contrato No. **197-00-B-COFAC-BACOF-2025** que tiene por objeto: **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO,** tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificación al contrato.

Lo anterior teniendo en cuenta la solicitud recibida por parte de ECONTAINERS SAS el día 11 de febrero de 2026 vía correo electrónico, la cual se adjunta en el presente documento.

Que, en mi calidad de Supervisor, una vez verificada la solicitud elevada por el contratista, y de acuerdo a las consultas realizadas con personal técnico de esta UMA, considero:

1. Solicitud de ampliación del plazo contractual: Verificadas las condiciones con el personal del GACAS, se considera que la solicitud de prórroga SÍ ES VIABLE.

   Teniendo en cuenta que el contratista indicó que en su proceso de calidad se identificó una desviación técnica, la cual en pro de garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos, se hace necesario extender el plazo de ejecución.

Así mismo, y acorde a lo mostrado en el cronograma de trabajo actualizado, se evidenció, que la desviación técnica identificada es de caracter crítico en la ejecución del contrato, motivo por el cual, en pro de asegurar el debido cumplimiento de la instalación de los elementos, se hace necesario extender su plazo de ejecución.

Ante lo anterior, se debe tener las siguientes consideraciones:

1. La prórroga solicitada no implica incremento del valor contractual, ni modifica el alcance u obligaciones sustanciales del contrato, acorde al documento recibido.
2. ECONTAINERS S.A.S., mantendrá la coordinación permanente con la Supervisión, y presentará/ajustará el cronograma para aprobación, conforme a la definición de cronograma y su control por el Supervisor.

En tal sentido, me permito solicitar que el contrato se modifique en los siguientes aspectos:

Plazo de Ejecución: A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento yejecución del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 10 de abril 2026.

Forma de Pago: Se realizará única entrega con corte de facturación 10 de abril de 2026 y único pago del 100% CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO AL PAC DEL TERCER BIMESTRE DE 2026, DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.

GARANTÍAS: Se modifiquen las garantías, así:

AMPARO	SUFICIENCIA	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	81.840.000,00	09-12-2025	10-10-2026
Pago de salarios	5%	13.640.000,00	09-12-2025	10-04-2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50%	136.400.000,00	09-12-2025	10-04-2027
Resposabilidad civil extra contractual	200 SMMLV	284.700.000,00	09-12-2025	10-04-2026

Cordialmente;

Capitán CHRISTIAN MAURICIO TIRIA CONTRERAS

Comandante Escuadrilla Aeronaves Remotamente Pilotadas

Supervisor Contrato

Anexo: SOLCITUD MODIFICACIÓN CONTRATISTA/ CRONOGRAMA DE TRABAJO ACTUALIZADO

Elaboró: CT. TIRIA / ESNAV Revisó: PD4. CAMACHO / SECOM Aprobó:CT. TIRIA / ESNAV

Bogotá D.C., 10 de febrero 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – FAC
BASE AEROESPACIAL COFAC / BACOF
Supervisor del Contrato
Contrato No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual

Cordial saludo,
En mi calidad de Representante Legal de ECONTAINERS S.A.S., contratista dentro del Contrato No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de shelters habitacionales y de baños adecuados, me permito presentar solicitud formal de prórroga del plazo de ejecución hasta el día diez (10) de abril de 2026, con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas y contractuales:

HECHO TÉCNICO SOBREVINIENTE – DESVIACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD

Durante la fase de revisión y aseguramiento de calidad del sistema constructivo y de los componentes técnicos instalados, se identificó una desviación técnica que requiere intervención correctiva integral, con el fin de garantizar que las unidades cumplan a cabalidad con los estándares funcionales, de seguridad, habitabilidad y durabilidad exigidos contractualmente.

Esta desviación no corresponde a fallas por negligencia operativa, sino a hallazgos propios de los protocolos de control de calidad aplicados en fase avanzada del proceso productivo e instalación, en observancia directa de la obligación contractual de garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN FUNCIONAL Y VALIDACIONES TÉCNICAS
Durante el desarrollo del proyecto y en las etapas de validación técnica realizadas conjuntamente con la supervisión, se identificaron ajustes técnicos requeridos dentro del proceso de optimización funcional, los cuales hacen necesario ampliar el plazo inicialmente establecido.

Es importante precisar que dichas acciones corresponden a una medida preventiva orientada a asegurar el correcto desempeño de las unidades y no constituyen reconocimiento de incumplimiento contractual alguno, sino que obedecen al principio de colaboración y buena fe entre las partes para alcanzar el objetivo final del contrato.

Cabe resaltar que, a lo largo del proyecto:

- Se realizaron revisiones técnicas, validaciones y acompañamiento con conocimiento de la supervisión contractual.
- Las decisiones técnicas adoptadas se desarrollaron dentro del marco operativo normal del proyecto.
- El enfoque permanente de ECONTAINERS ha sido garantizar estándares óptimos de calidad y durabilidad para la Entidad.

IMPACTO GLOBAL EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La atención de la desviación técnica y la implementación de los ajustes funcionales descritos implican un ajuste transversal del cronograma, toda vez que:

- Interfiere rutas críticas de instalación y puesta en marcha.
- Obliga a reprogramar actividades técnicas especializadas.
- Requiere disponibilidad de personal y recursos adicionales.
- Demanda nuevos tiempos de verificación y validación por supervisión.

En consecuencia, el plazo inicialmente previsto resulta insuficiente para garantizar la terminación del objeto contractual bajo condiciones óptimas de calidad, funcionalidad y recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

ALCANCE Y BENEFICIOS DE LA PRÓRROGA SOLICITADA

La prórroga requerida permitirá:

- Evitar reprocesos posteriores que puedan generar mayores costos operativos para la Entidad.
- Garantizar la estabilidad técnica y funcional de las unidades.
- Reducir riesgos futuros asociados al uso operativo de las mismas.
- Asegurar la terminación satisfactoria del objeto contractual bajo estándares de calidad.

FUNDAMENTO CONTRACTUAL Y NORMATIVO

La presente solicitud se sustenta en los principios de:

- Planeación.
- Economía.
- Responsabilidad.
- Calidad del servicio público.

Así mismo, se enmarca en las disposiciones del Estatuto General de Contratación Estatal que permiten la modificación de los contratos mediante acuerdo de las partes, cuando ello resulte necesario para garantizar el cumplimiento del objeto contratado y la correcta prestación del servicio.

PLAZO SOLICITADO Y CONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA FAC

Con fundamento en lo anterior, solicitamos respetuosamente, prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el día diez (10) de abril 2026.

Es importante precisar que dentro de este término:

- Se incluye el tiempo requerido para la corrección técnica.
- Se contempla la reprogramación de actividades finales.
- Se incorpora una (1) semana adicional requerida por la Entidad para fines administrativos posteriores a la entrega final, tales como:

    - Verificaciones documentales.
    - Actas de recibo a satisfacción.
    - Trámites de almacén y cierre contractual.

Lo anterior con el fin de garantizar un proceso de entrega ordenado, verificable y ajustado a los procedimientos internos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Reiteramos nuestro compromiso institucional y técnico con:

- La correcta ejecución del contrato.
- El cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- La entrega de soluciones plenamente operativas.
- La observancia de los estándares de calidad exigidos por la FAC.

Desde nuestra posición, mantenemos la disposición de participar en cualquier espacio de revisión técnica o mesa de trabajo que la Entidad considere pertinente, en aplicación de los principios de equilibrio contractual, razonabilidad técnica y eficiencia administrativa.

La presente prórroga tiene como único propósito asegurar la terminación satisfactoria del objeto contractual, evitando riesgos técnicos futuros y garantizando la estabilidad funcional de las unidades entregadas.

Agradecemos la atención prestada y solicitamos respetuosamente se adelante el trámite del modificatorio contractual correspondiente.

Cordialmente,

JOHN JAIRO VALENCIA HINCAPIÉ
Representante Legal
ECONTAINERS S.A.S.
NIT 900.641.692-1

Anexo cronograma ajustado
