Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

INFORME 30

CONVENIO No. 2339 - 2023

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES MEDIANTE SUBSIDIO DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS; OICATA, SANTA ROSA DE VITERBO, TOPAGA, MONGUI, MONGUA, FIRAVITOBA, CUCAITA, SAMACA, CALDAS, TUNJA.

Foto: Municipio de Tópaga



PRESENTADO A:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

FEBRERO 23 DE 2026

TUNJA

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

GENERALIDADES

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

Decreto 0389 de 27 de marzo del 2023.
"Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Monguí y Mongua del Departamento de Boyacá" mediante Decreto No. 0176 de 23 de febrero de 2023, emitido por el Gobernador de Boyacá se priorizó, aprobó y se designó a la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Monguí y Mongua del Departamento de Boyacá" identificado con código BPIN 2022000050029, el cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

FASE
El proyecto se encuentra en fase I: Gestión de permisos, construcción de las redes, gasificación en avance y puestas en servicio por sectores

FECHA DE INICIO:
25 de Mayo de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución inicial: NUEVE (09) MESES – Marzo-24
Plazo de ejecución Prórroga N°1 SEIS (06) MESES – Septiembre 24
Plazo de ejecución Prórroga N°2 DOCE (12) MESES – Septiembre 25
Plazo de ejecución Prórroga N°3 DOCE (4) MESES – Marzo 26
Suspención N°1

ENTIDAD EJECUTORA
Gas Natural Cundiboyacense SA ESP

ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
Departamento de Boyacá – secretaria de Minas y Energía

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

1. **AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**

FECHA DE CORTE: febrero 23 2026

MUNICIPIO OICATA

La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 441 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 74%, Puesta en servicio el 70% para un total de 420 usuarios.

MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO

La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 583 usuarios (igual al potencial inicial), construcción de instalaciones internas en un 117%. Puesta en servicio 112% para un total de 558 usuarios

MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO

La red de distribución avanza en un 99%, el potencial interno está en 290 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 64%, Puesta en servicio 64% para un total de 287 usuarios.

MUNICIPIO MONGUI

La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 400 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 53%. Puesta en servicio el 51% para un total de 379 usuarios.

MUNICIPIO MONGUA

La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 396 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio el 61% para un total de 344 usuarios.

MUNICIPIO FIRAVITOBA

La red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 300 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 50%. Puesta en servicio 0%

MUNICIPIO CUCAITA

La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 183 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 80%. Puesta en servicio 66% para un total de 151 usuarios.

MUNICIPIO SAMACA

La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 416 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 104%. Puesta en servicio 102% para un total de 408 usuarios.

MUNICIPIO CALDAS

La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 177 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 80%, puesta en servicio 80% para un total de 177 usuarios.

MUNICIPIO TUNJA

La red de distribución avanza en un 90%, el potencial interno está en 730 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 96%. Puesta en servicio el 88% para un total de 667 usuarios.

**** Los porcentajes informados están basados en el total de altas informadas iniciales en el contrato, no las informadas como potencial interno**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

2. CUADRO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 4.870 subsidios, de los cuales a la fecha se han aplicado un total de **3.391 subsidios** que corresponden a los clientes que han sido puestos en servicio hasta la fecha de corte del informe actual: **23** de **febrero de 2026**.

Consideraciones presupuestales: El presupuesto total del presente convenio es de $ 6.477.820.760, en el corte de noviembre de 2024 se presentó factura electrónica F94G-1 por valor de **$2.259.921.452** correspondiente a **1.699** subsidios y en el corte de noviembre de 2025 se presentó factura electrónica F94G-5 por valor de **$1.501.737.092** correspondiente a **1129** subsidios.

En el corte del presente informe al 23 de febrero de 2026, se dieron un total de 135 altas.

Tabla No. 1. Descripción de las conexiones.

CORTE AL 23 DE FEBRERO DEL 2026										
MUNICIPIO	% AVANCE RED DE DISTRIBUCIÓN	POTENCIAL INICIAL ALCALDIAS	POTENCIAL VANTI	TOTAL COMERCIALIZACION	INSTALACIONES CONSTRUIDAS	% AVANCE CONSTRUCCION INSTALACIONES	ALTAS EN SERVICIO	% DE INSTALACIONES EN SERVICIO	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
OICATA	95%	600	441	441	441	74%	420	70%	$ 1.330.148	$ 558.662.160
STA ROSA DE VITERBO	90%	500	583	583	583	117%	558	112%	$ 1.330.148	$ 742.222.584
TOPAGA	99%	450	290	290	290	64%	287	64%	$ 1.330.148	$ 381.752.476
MONGUI	95%	750	400	400	400	53%	379	51%	$ 1.330.148	$ 504.126.092
MONGUA	90%	560	396	396	364	65%	344	61%	$ 1.330.148	$ 457.570.912
FIRAVITOBA	85%	400	300	300	200	50%	0	0%	$ 1.330.148	$ -
CUCAITA	100%	230	183	183	183	80%	151	66%	$ 1.330.148	$ 200.852.348
SAMACA	100%	400	416	416	416	104%	408	102%	$ 1.330.148	$ 542.700.384
CALDAS	100%	220	177	177	177	80%	177	80%	$ 1.330.148	$ 235.436.196
TUNJA	90%	760	730	730	730	96%	667	88%	$ 1.330.148	$ 887.208.716
TOTAL	94%	4870	3916	3916	3784	78%	3391	70%	-	**$ 4.510.531.868**
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO										4870
VALOR TOTAL EJECUTADO										$ 4.510.531.868
VALOR POR EJECUTAR										$ 1.967.288.892
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-1										$ 2.259.921.452
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-5										$ 1.501.737.092
VALOR PENDIENTE POR COBRAR										$ 748.873.324


Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

3. EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN

Actividades de adecuación de redes en el municipio de Mongua sectores veredales con la señalización establecida para el tipo de trabajo en desarrollo, garantizando las condiciones para entrega de obras finales de redes.





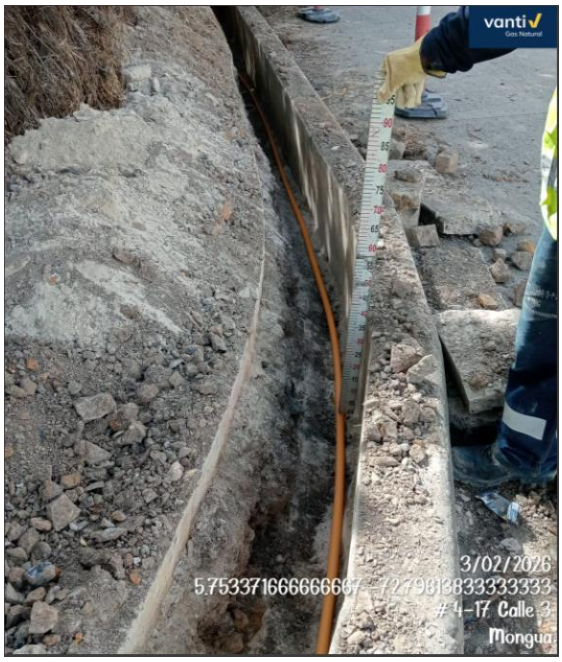

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

Actividades de obra de tendido, gasificacion y terminado de redes de gas natural en los sectores veredal, los trabajos se realizan bajo los parámetros de la normativa técnica colombiana establecidas.











Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

5. SEGUIMIENTO GESTIÓN DE PERMISOS

MUNICIPIO	OBSERVACIONES GESTION DE PERMISOS
STA ROSA DE VIRTERBO	Corpoboyacá Estado: 5 cruces Radicado No. 014303 del 20/05/2025: INVIAS Estado: radicado con observaciones enviadas el 01/10/2025 Radicado 25/08/2025 No. 55775
MONGUA	Permiso: Corpoboyacá radicado 23/07/2025 radicado 021133

Conforme a la información suministrada, nos permitimos confirmar que, al corte del 23 de febrero de 2026, el alcance total de construcción de redes contempladas para el presente convenio se encuentra en un 94% de avance de ejecución de obras, debido a los permisos pendientes en gestión relacionados en el cuadro anterior.

Cordialmente,

Juan Sebastian Muñoz
Representante legal Gas Natural Cundiboyacense
