Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

CONVENIO No. GN5090-2025

OBJETO: Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"

INFORME DE SUPERVISION No.1

PERIODO: 26/12/2026 AL 31/01/2026

San Juan de Pasto, Enero de 2026

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	31/05/2025	CON CORTE :	31/05/2025

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	GN5090-2025

DETALLE DE PROCESO NUMERO:	Convenio interadministrativo			
PROYECTO BPIN No:	2024003520136			
CONVENIO No.:	GN05090 del 7 de noviembre de 2025			
CDP No.:	2025110058	FECHA:	6/11/2025	$ 2.000.000.000,00
REGISTRO No:	2025110221	FECHA:	7/11/2025	$ 1.141.731.751,30

OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales - ACIZI a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Mantenimiento rutinario de vías rurales en los Resguardos de los Cabildos Indígenas de la zona sur del Departamento De Nariño"
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES
NIT:	837.000.096-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA
CC.	98.338.054

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

SUPERVISOR	GABRIEL FERNANDO OSEJO			
SUBSECRETARIO	LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA			
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION	KAREN LIZETH SOLARTE			
META FISICA (M)	66,50	KM de mantenimiento rutinario		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.144.981.727,30			
FUENTE DE FINANCIACION:	PROPIOS			
VALOR FINANCIACIÓN DEPARTAMENTO	$ 1.141.731.751,30			
VALOR FINANCIACION MUNICIPIPO	$ 3.249.976,00			
VALOR ANTICIPO DE CONVENIO:	$ 456.692.700,52			
SALDO:				
VALOR CONVENIO ADICIONAL1	N.A			
VALOR FINAL DE CONTRATO:	$ 1.144.981.727,30			
PLAZO INICIAL CONTRATO (MES):	1,5			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	26/12/2025			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	10/02/2026			
FECHA DE MODIFICACION No.1:	N.A			
FECHA DE SUSPENSION No.1:	N.A			
FECHA DE REINICIO No.1:	N.A			
FECHA DE TERMINACION SEGÚN R1:	N.A			
PORCENTEJE ANTICIPO	40%			
TOTAL ANTICIPO	$ 456.692.700,52			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ -			
GARANTIAS:	Seguros del Estado S.A			
Póliza No.:	41-44-101299234			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	70,00%	% EJECUTADO:	51,31%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO	0,00%
META FISICA A LA FECHA	34	51,3%		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: El Convenio fue suscrito el 7 de noviembre de 2025 y se suscribió acta de inicio el 26 de diciembre de 2026.

ACIZI ha realizado la contratación de los suministro de implementos de seguridad industrial, herramientas, equipo, suministro de recebo y contratación del personal administrativo e interventoria para el seguimiento de las obras.

Durante la ejecución se ha realizado adición con material de recebo en una longitud de 34 Km, mejorando la capa de rodadura y las condiciones de transitabilidad.

ASPECTOS FINANCIEROS :

ACIZI realizó el pago de estampillas según lo acordado en el anexo del convenio, con lo cua se procedió a solicitar la legalización del Convenio ante el DAC, dicha legalización se encuentra pendiente para realizar el trámite del anticipo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Una vez suscrito el Convenio ACIZI procedió a realizar los trámites para la obtención de la póliza, suscrita el acta de inicio, nuevamente realizaron los trámites ante la asegurado y presentaron al Departamento para su respectiva aprobación por parte del DAC.

ACIZI presenta informe mensual de ejecución del convenio según las obligaciones pactadas en el anexo del convenio, por parte del apoyo a la supervisión se realiza observaciones y se solicita se allegue los contratos derivados como soporte del informe mensual.

ASPECTOS LEGALES :


No se presentan acciones de tipo legal

Proyectó:
Ing. Karen Lizeth Solarte
Contratista Apoyo Supervisión
Gobernacion de Nariño.

Revisó:
Ing. Luis Alberto Castillo Jojoa.
Sub-Secretario de Infraestructira y Vias
Gobernacion de Nariño.


Revisó:
Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretaria de Infraestructira y Vias
Gobernacion de Nariño.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

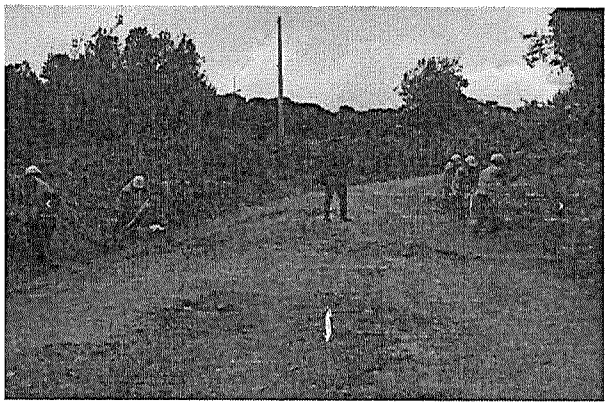





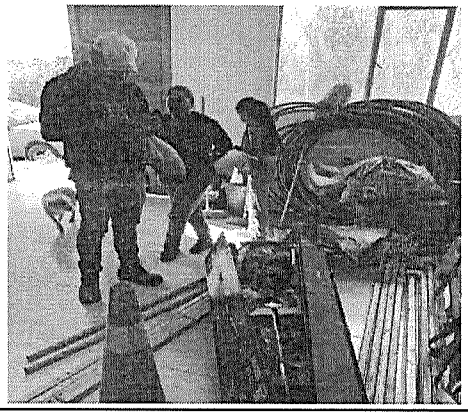





Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN5090-2025	VALOR CONTRATO	$ 1.144.981.727,30

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
TOTAL		$ -	$ -	$ 0,00	$ -	$ 0,00	$ 0,00		

AVANCE FISICO EN ACTAS	0,00%
AVANCE FINANCIERO	0,00%
AVANCE FISICO DE OBRA	81,91%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN5090-2025

VALOR CONTRATO: $ 1.144.981.727,30

ANTICIPO (40%) $ 456.692.700,52 40%

GARANTIAS:	Seguros del Estado S.A
Póliza No.:	41-44-101299234

Anexo 0 Póliza inicial	FECHA APROBACION	10/11/2025	FECHA EXPEDICION	10/11/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 114.498.172,73	10%	7-nov-25	22-jun-26	Inicial	
Buen manejo y correcta inversión	$ 456.692.700,52	40%	7-nov-25	22-jun-26	Inicial	

Anexo 1 Acta de inicio	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	29/12/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 114.498.172,73	10%	26-dic-25	10-ago-26	Acta de inicio	
Buen manejo y correcta inversión	$ 456.692.700,52	40%	26-dic-25	10-ago-26	Acta de inicio	

Observaciones

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE PROGRAMADO VS EJECUCION

CONTRATO No.: 5090-2025

CAP.	ACT	DETALLE -ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1	Mantenimiento rutinario vías rurales	$ 322.280.955,00	$ 104.074.040,79	$ (218.206.914,21)	-68%
2	2	Suministro de dotación elementos de protección personal, herramienta y equipo	$ 662.724.815,90	$ 480.908.143,00	$ (181.816.672,90)	-27%
3	3	Personal Administrativo	$ 83.328.170,40	$ 56.493.250,00	$ (26.834.920,40)	-32%
4	4	Interventoría	$ 73.397.810,00	$ 48.931.873,00		
		COSTO TOTAL DIRECTO	**$ 1.068.333.941,30**	**$ 690.407.306,79**	$ (377.926.634,51)	-35%

