

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**1**	**CS San Marcelo 010**	**546.25 días**	**mié 26/02/25**	**mar 9/03/27**	**$ 134,258,632,686.00**
2	1.1	Acta de inicio.	0 días	mié 26/02/25	mié 26/02/25	$ 0.00
3	1.2	Etapa precontractual	44 días	mié 26/02/25	vie 25/04/25	$ 0.00
4	1.3	Suspensión No 1	1 día	mié 24/12/25	lun 5/01/26	$ 0.00
5	**1.4**	**CONSTRUCCIÓN K0+000 - K14+850**	**502.13 días**	**vie 25/04/25**	**mar 9/03/27**	**$ 109,877,346,506.00**
6	**1.4.1**	**CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES EXCLUYE TRAMOS (K13+000 A**	**451 días**	**vie 25/04/25**	**mar 5/01/27**	**$ 11,160,117,794.00**
7	1.4.1.1	localización y replanteo topográfico	451 días	vie 25/04/25	mar 5/01/27	$ 194,632,208.00
8	1.4.1.2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	365 días	mar 1/07/25	mar 3/11/26	$ 4,033,876,347.00
9	1.4.1.3	Demolición de estructuras (incluye retiro)	365 días	mar 1/07/25	mar 3/11/26	$ 100,104,824.00
10	1.4.1.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	365 días	mar 1/07/25	mar 3/11/26	$ 2,732,268,206.00
11	1.4.1.5	Desmonte y desinstalación de postes y estructuras existentes. Incluye	300 días	vie 25/04/25	mié 3/06/26	$ 144,452,000.00
12	1.4.1.6	Suministro e instalación de poste. Incluye estructura y tendido de línea de media	300 días	vie 5/09/25	jue 15/10/26	$ 595,096,080.00
13	1.4.1.7	cerca de alambre de púas con postes de madera; distancia entre postes 1,5 m	118 días	mié 1/04/26	mié 9/09/26	$ 460,522,170.00
14	1.4.1.8	tala de arboles tipo i (20m<h<30m) incluye disposición final;no incluye	118 días	mié 1/04/26	mié 9/09/26	$ 267,664,320.00
15	1.4.1.9	tala de arboles tipo ii (10m<h<20m) incluye disposición final;no incluye	118 días	mié 1/04/26	mié 9/09/26	$ 710,626,581.00
16	1.4.1.10	tala de arboles tipo iii (h<10m) incluye disposición final, no incluye destoconado.	118 días	mié 1/04/26	mié 9/09/26	$ 295,182,798.00
17	1.4.1.11	traslado red de gas en caliente de 6" y/o 4" de diámetro en zona rural y urbana;	118 días	mié 1/04/26	mié 9/09/26	$ 1,625,692,260.00
18	**1.4.2**	**CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE (K13+000 A K14+080 Y K8+800 A**	**422.13 días**	**mar 1/07/25**	**vie 29/01/27**	**$ 23,133,012,295.00**
19	1.4.2.1	terraplén	385 días	mar 1/07/25	mar 1/12/26	$ 14,137,713,526.00
20	1.4.2.2	piedra rajon compacta	192 días	mié 1/04/26	mar 15/12/26	$ 89,497,250.00
21	1.4.2.3	cemento hidráulico para capa tratada con cemento	217 días	lun 6/04/26	vie 29/01/27	$ 1,896,704,720.00
22	1.4.2.4	material granular tratado con cemento, como capa estructural, no incluye sum.	217 días	lun 6/04/26	vie 29/01/27	$ 7,009,096,799.00
23	**1.4.3**	**CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO**	**451 días**	**jue 5/06/25**	**mié 10/02/27**	**$ 366,976,285.00**
24	1.4.3.1	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m	451 días	jue 5/06/25	mié 10/02/27	$ 361,208,287.00
25	1.4.3.2	Riego de imprimacion CRL-1	451 días	jue 5/06/25	mié 10/02/27	$ 5,767,998.00
26	**1.4.4**	**CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO EXCLUYE (K13+000 A K14+080 Y K8+800 A**	**221 días**	**lun 4/05/26**	**mié 3/03/27**	**$ 41,238,775,167.00**
27	1.4.4.1	pavimento en concreto hidráulico, modulo de rotura 45 mpa (incluye, corte y	215 días	lun 4/05/26	mar 23/02/27	$ 40,718,221,257.00
28	1.4.4.2	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - ANDENES	53 días	mar 15/12/26	mié 3/03/27	$ 179,074,830.00
29	1.4.4.3	Bordillo de Concreto; incluye la preparación de la superficie de apoyo, base y	53 días	mar 15/12/26	mié 3/03/27	$ 341,479,080.00
30	**1.4.5**	**SECTOR K8+800 - K11+000**	**79 días**	**mié 11/11/26**	**jue 4/03/27**	**$ 16,084,300,064.00**
31	**1.4.5.1**	**CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES**	**50 días**	**mié 11/11/26**	**jue 28/01/27**	**$ 1,232,495,353.00**
32	1.4.5.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	50 días	mié 11/11/26	jue 28/01/27	$ 734,795,689.00
33	1.4.5.1.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	50 días	mié 11/11/26	jue 28/01/27	$ 497,699,664.00
34	**1.4.5.2**	**CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE**	**65 días**	**jue 12/11/26**	**mié 17/02/27**	**$ 5,256,863,815.00**
35	1.4.5.2.1	terraplén	50 días	jue 12/11/26	jue 28/01/27	$ 3,287,065,600.00
36	1.4.5.2.2	cemento hidráulico para capa tratada con cemento	50 días	mié 2/12/26	mié 17/02/27	$ 419,515,920.00
37	1.4.5.2.3	material granular tratado con cemento, como capa estructural, no incluye	50 días	mié 2/12/26	mié 17/02/27	$ 1,550,282,295.00
38	**1.4.5.3**	**CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO**	**14 días**	**mar 16/02/27**	**jue 4/03/27**	**$ 9,594,940,896.00**
39	1.4.5.3.1	pavimento en concreto hidráulico, modulo de rotura 45 mpa (incluye, corte y	14 días	mar 16/02/27	jue 4/03/27	$ 9,594,940,896.00
40	**1.4.6**	**SECTOR K13+000 - K14+080**	**79 días**	**mié 11/11/26**	**jue 4/03/27**	**$ 7,713,170,360.00**
41	**1.4.6.1**	**CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES**	**50 días**	**mié 11/11/26**	**jue 28/01/27**	**$ 937,970,160.00**
42	1.4.6.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	50 días	mié 11/11/26	jue 28/01/27	$ 559,204,080.00

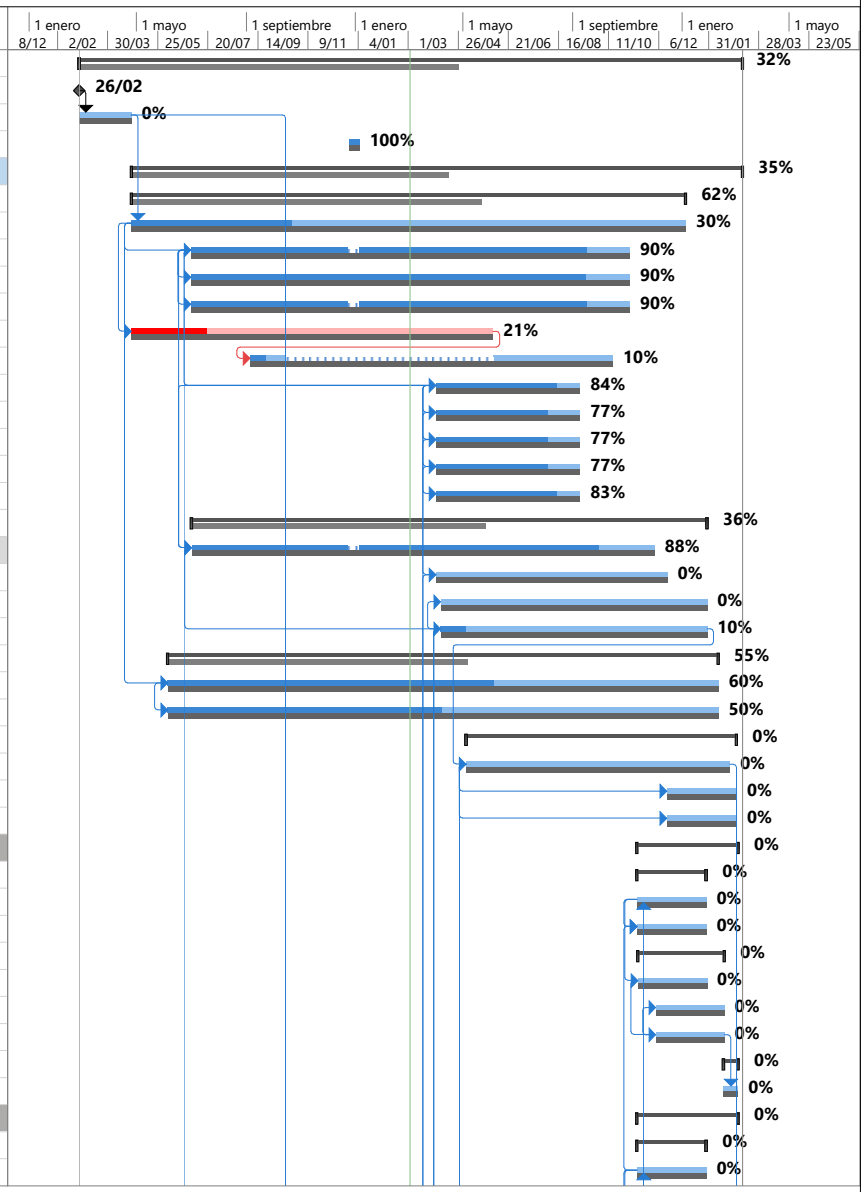


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
43	1.4.6.1.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	50 días	mié 11/11/26	jue 28/01/27	$ 378,766,080.00
44	**1.4.6.2**	**CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE**	**65 días**	**jue 12/11/26**	**mié 17/02/27**	**$ 1,691,606,106.00**
45	1.4.6.2.1	terraplén	50 días	jue 12/11/26	jue 28/01/27	$ 655,065,216.00
46	1.4.6.2.2	cemento hidráulico para capa tratada con cemento	50 días	mié 2/12/26	mié 17/02/27	$ 220,756,320.00
47	1.4.6.2.3	material granular tratado con cemento, como capa estructural, no incluye	50 días	mié 2/12/26	mié 17/02/27	$ 815,784,570.00
48	**1.4.6.3**	**CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO**	**14 días**	**mar 16/02/27**	**jue 4/03/27**	**$ 5,083,594,094.00**
49	1.4.6.3.1	pavimento en concreto hidráulico, modulo de rotura 45 mpa (incluye, corte y	14 días	mar 16/02/27	jue 4/03/27	$ 5,083,594,094.00
50	**1.4.7**	**CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS Y**	**338.13 días**	**jue 20/11/25**	**mar 2/03/27**	**$ 5,752,785,026.00**
51	1.4.7.1	Excavación manual en material común	254 días	jue 20/11/25	vie 30/10/26	$ 15,912,013.00
52	1.4.7.2	Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI)	254 días	vie 21/11/25	mar 3/11/26	$ 16,990,686.00
53	1.4.7.3	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa	254 días	vie 12/12/25	lun 23/11/26	$ 1,361,889,723.00
54	1.4.7.4	Acero de refuerzo Fy=420MPA	254 días	mié 26/11/25	vie 6/11/26	$ 891,485,973.00
55	1.4.7.5	Concreto clase ciclopeo	224 días	lun 6/04/26	lun 8/02/27	$ 31,840,300.00
56	1.4.7.6	Relleno para estructuras con material recebo	254 días	jue 20/11/25	vie 30/10/26	$ 48,346,719.00
57	1.4.7.7	Tubería de concreto reforzado, clase d de 900 mm de diámetro interior.	165 días	vie 12/12/25	mar 28/07/26	$ 27,010,588.00
58	1.4.7.8	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye conformación de superficie	130 días	mié 2/09/26	mar 2/03/27	$ 1,276,693,026.00
59	1.4.7.9	Filtro francés con tubería perforada de 4"; incluye geotextil y grava. No incluye	140 días	mié 3/06/26	lun 7/12/26	$ 1,078,909,250.00
60	1.4.7.10	TUBERÍA DE DRENAJE NOVAFORT 12"	145 días	mié 3/06/26	mar 15/12/26	$ 1,003,706,748.00
61	**1.4.8**	**CAPITULO 7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**136 días**	**mié 2/09/26**	**mar 9/03/27**	**$ 4,428,209,515.00**
62	1.4.8.1	Línea de demarcación con pintura en frio	10 días	mar 23/02/27	lun 8/03/27	$ 236,544,000.00
63	1.4.8.2	Tacha reflectiva	10 días	mié 24/02/27	mar 9/03/27	$ 189,518,000.00
64	1.4.8.3	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III	10 días	mar 23/02/27	lun 8/03/27	$ 214,655,868.00
65	1.4.8.4	Defensas metálicas	10 días	mar 23/02/27	lun 8/03/27	$ 54,531,647.00
66	1.4.8.5	Jersey de hormigón base 0.50m h=0.81m	130 días	mié 2/09/26	mar 2/03/27	$ 3,732,960,000.00
67	**1.5**	**CONSTRUCCIÓN SEXTA ENTRADA K0+000 - K2+581**	**372.25 días**	**mar 14/10/25**	**mar 9/03/27**	**$ 24,381,286,180.00**
68	**1.5.1**	**CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES**	**290 días**	**mar 14/10/25**	**mié 11/11/26**	**$ 3,785,273,288.00**
69	1.5.1.1	localización y replanteo topográfico	278.25 días	mar 14/10/25	mar 27/10/26	$ 60,822,565.00
70	1.5.1.2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	240 días	vie 19/12/25	mié 11/11/26	$ 1,768,839,625.00
71	1.5.1.3	Demolición de estructuras (incluye retiro)	240 días	vie 19/12/25	mié 11/11/26	$ 16,128,297.00
72	1.5.1.4	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación,	240 días	vie 19/12/25	mié 11/11/26	$ 1,198,089,351.00
73	1.5.1.5	cerca de alambre de púas con postes de madera; distancia entre postes 1,5 m	167 días	mié 1/04/26	mié 11/11/26	$ 132,424,830.00
74	1.5.1.6	tala de arboles tipo i (20m<h<30m) incluye disposición final;no incluye	167 días	mié 1/04/26	mié 11/11/26	$ 30,590,208.00
75	1.5.1.7	tala de arboles tipo ii (10m<h<20m) incluye disposición final;no incluye	167 días	mié 1/04/26	mié 11/11/26	$ 78,364,836.00
76	1.5.1.8	tala de arboles tipo iii (h<10m) incluye disposición final, no incluye destoconado.	167 días	mié 1/04/26	mié 11/11/26	$ 32,539,836.00
77	1.5.1.9	traslado red de gas en caliente de 6" y/o 4" de diámetro en zona rural y urbana;	167 días	mié 1/04/26	mié 11/11/26	$ 467,473,740.00
78	**1.5.2**	**CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE**	**270 días**	**mié 14/01/26**	**mar 19/01/27**	**$ 8,256,923,408.00**
79	1.5.2.1	terraplen	240 días	mié 14/01/26	vie 27/11/26	$ 6,076,928,000.00
80	1.5.2.2	piedra rajon compacta	190 días	mié 1/04/26	lun 14/12/26	$ 89,497,250.00
81	1.5.2.3	cemento hidráulico para capa tratada con cemento	37 días	jue 19/11/26	mar 19/01/27	$ 445,221,504.00
82	1.5.2.4	material granular tratado con cemento, como capa estructural, no incluye sum.	37 días	jue 19/11/26	mar 19/01/27	$ 1,645,276,654.00
83	**1.5.3**	**CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO**	**40 días**	**jue 17/12/26**	**jue 18/02/27**	**$ 9,681,483,500.00**
84	1.5.3.1	pavimento en concreto hidráulico, modulo de rotura 45 mpa (incluye, corte y	40 días	jue 17/12/26	jue 18/02/27	$ 9,681,483,500.00

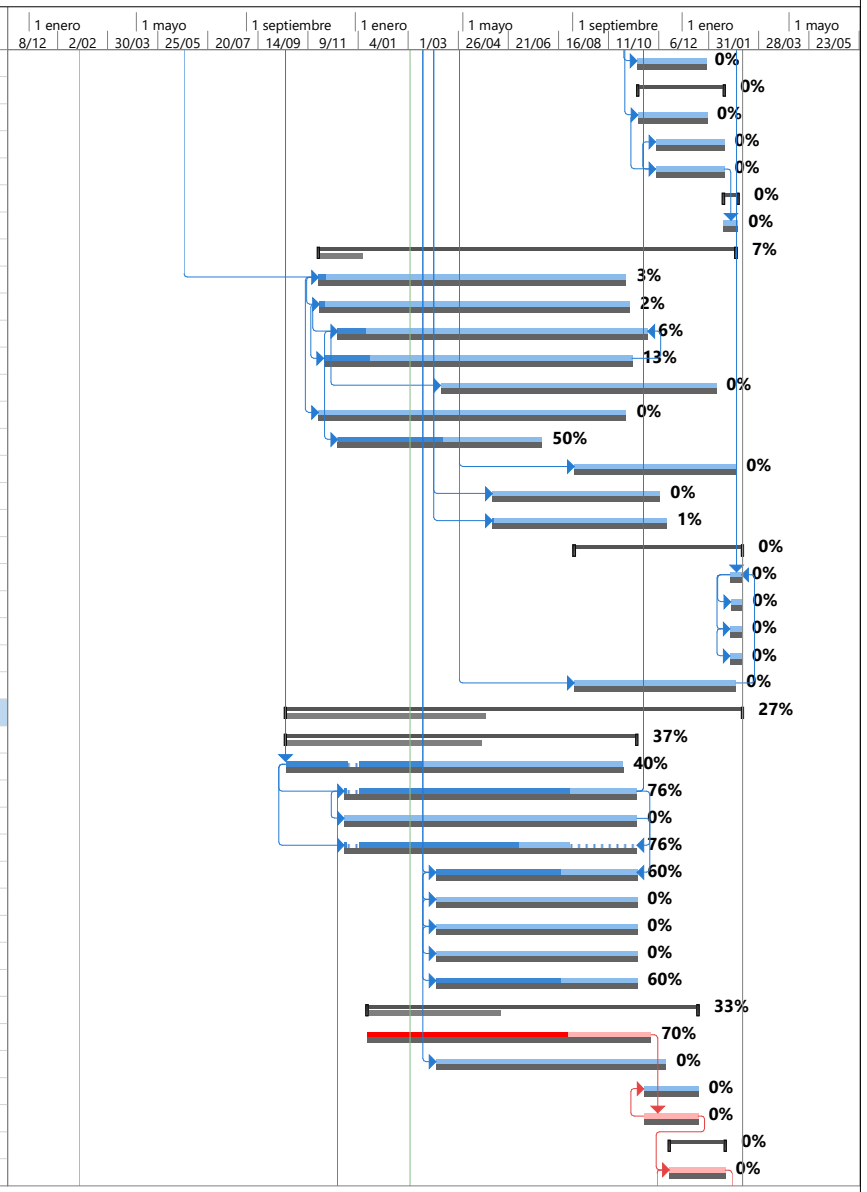

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
85	**1.5.4**	**CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS Y**	**133.25 días**	**mié 26/08/26**	**jue 25/02/27**	**$ 1,708,703,945.00**
86	1.5.4.1	Excavación manual en material común	85 días	mié 26/08/26	mar 15/12/26	$ 3,454,874.00
87	1.5.4.2	Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI)	85 días	jue 27/08/26	mié 16/12/26	$ 3,441,529.00
88	1.5.4.3	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa	65 días	vie 25/09/26	mar 22/12/26	$ 581,341,120.00
89	1.5.4.4	Acero de refuerzo Fy=420MPA	85 días	lun 31/08/26	lun 21/12/26	$ 353,170,904.00
90	1.5.4.5	Concreto clase ciclopeo	80 días	jue 27/08/26	jue 10/12/26	$ 31,840,300.00
91	1.5.4.6	Relleno para estructuras con material recebo	66 días	vie 25/09/26	mar 5/01/27	$ 10,499,835.00
92	1.5.4.7	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye conformación de superficie	45 días	vie 18/12/26	jue 25/02/27	$ 644,702,503.00
93	1.5.4.8	TUBERÍA DE DRENAJE NOVAFORT 24"	85 días	mié 26/08/26	mar 15/12/26	$ 21,970,840.00
94	1.5.4.9	TUBERÍA DE DRENAJE NOVAFORT 36"	85 días	mié 26/08/26	mar 15/12/26	$ 58,282,040.00
95	**1.5.5**	**CAPITULO 7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**24 días**	**lun 8/02/27**	**mar 9/03/27**	**$ 948,902,039.00**
96	1.5.5.1	Línea de demarcación con pintura en frio	15 días	jue 18/02/27	mar 9/03/27	$ 50,688,000.00
97	1.5.5.2	Tacha reflectiva	15 días	jue 18/02/27	mar 9/03/27	$ 40,611,000.00
98	1.5.5.3	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III	15 días	jue 18/02/27	mar 9/03/27	$ 45,997,686.00
99	1.5.5.4	Defensas metálicas	15 días	jue 18/02/27	mar 9/03/27	$ 11,685,353.00
100	1.5.5.5	Jersey de hormigón base 0.50m h=0.81m	22 días	lun 8/02/27	vie 5/03/27	$ 799,920,000.00
101	1.6	Fin del contrato	0 días	mar 9/03/27	mar 9/03/27	$ 0.00

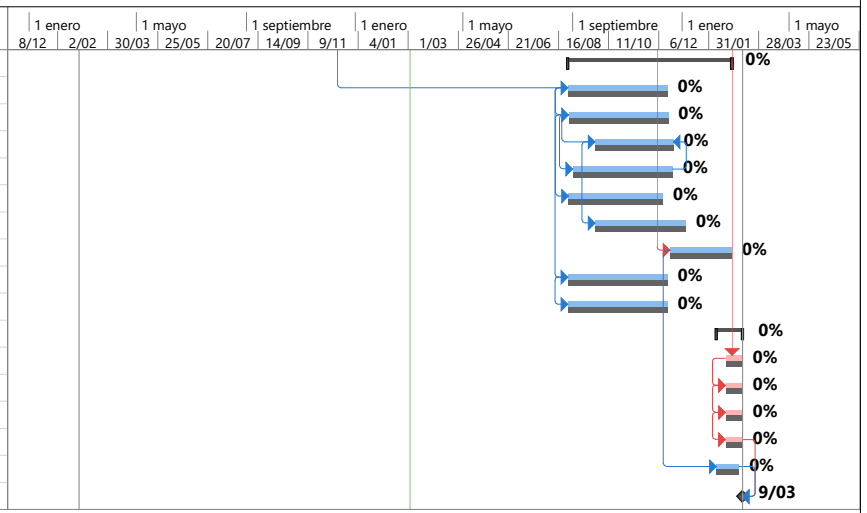

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

CURVA S DE SEGUIMIENTO

CONTRATO: **202500029**
CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN MARCELO 010**
FECHA DE CORTE: **1/03/2026**

Semana	fecha de corte	Valor acumulado programado	% programado	Valor acumulado ejecutado	% ejecutado
1	23/02/2025	$ -	0.0%		0%
2	2/03/2025	$ -	0.0%		0%
3	9/03/2025	$ -	0.0%		0%
4	16/03/2025	$ -	0.0%		0%
5	23/03/2025	$ -	0.0%		0%
6	30/03/2025	$ -	0.0%		0%
7	6/04/2025	$ -	0.0%		0%
8	13/04/2025	$ -	0.0%		0%
9	20/04/2025	$ -	0.0%		0%
10	27/04/2025	$ 3,332,614.82	0.0%		0%
11	4/05/2025	$ 23,328,303.74	0.0%		0%
12	11/05/2025	$ 48,322,914.90	0.0%		0%
13	18/05/2025	$ 73,317,526.05	0.1%		0%
14	25/05/2025	$ 98,312,137.21	0.1%		0%
15	1/06/2025	$ 123,306,748.36	0.1%		0%
16	8/06/2025	$ 146,423,822.65	0.1%		0%
17	15/06/2025	$ 179,221,897.23	0.1%		0%
18	22/06/2025	$ 212,019,971.80	0.2%		0%
19	29/06/2025	$ 238,258,431.46	0.2%	$ 1,048,000,000.00	1%
20	6/07/2025	$ 722,085,026.98	0.5%	$ 2,096,000,000.00	2%
21	13/07/2025	$ 1,428,956,684.15	1.1%	$ 3,144,000,000.00	2%
22	20/07/2025	$ 2,135,828,341.33	1.6%	$ 4,192,000,000.00	3%
23	27/07/2025	$ 2,842,699,998.50	2.1%	$ 5,240,000,000.00	4%
24	3/08/2025	$ 3,549,571,655.67	2.6%	$ 6,400,000,000.00	5%
25	10/08/2025	$ 4,115,068,981.40	3.1%	$ 7,560,000,000.00	6%
26	17/08/2025	$ 4,821,940,638.57	3.6%	$ 8,720,000,000.00	6%
27	24/08/2025	$ 5,387,437,964.31	4.0%	$ 9,880,000,000.00	7%
28	31/08/2025	$ 6,094,309,621.48	4.5%	$ 11,040,000,000.00	8%
29	7/09/2025	$ 6,805,311,715.89	5.1%	$ 12,165,000,000.00	9%
30	14/09/2025	$ 7,538,736,183.87	5.6%	$ 13,290,000,000.00	10%
31	21/09/2025	$ 8,272,160,651.86	6.2%	$ 14,415,000,000.00	11%
32	28/09/2025	$ 9,005,585,119.84	6.7%	$ 15,540,000,000.00	12%
33	5/10/2025	$ 9,739,009,587.82	7.3%	$ 16,700,000,000.00	12%
34	12/10/2025	$ 10,472,434,055.81	7.8%	$ 17,860,000,000.00	13%
35	19/10/2025	$ 11,063,175,484.58	8.2%	$ 19,020,000,000.00	14%
36	26/10/2025	$ 11,803,031,504.25	8.8%	$ 20,180,000,000.00	15%
37	2/11/2025	$ 12,542,887,523.93	9.3%	$ 21,090,000,000.00	16%
38	9/11/2025	$ 13,134,772,339.67	9.8%	$ 21,247,034,567.96	16%
39	16/11/2025	$ 13,874,628,359.34	10.3%	$ 22,038,137,963.99	16%
40	23/11/2025	$ 14,466,924,839.71	10.8%	$ 22,631,560,880.24	17%
41	30/11/2025	$ 15,222,048,506.34	11.3%	$ 22,650,800,700.00	17%
42	7/12/2025	$ 15,988,703,322.91	11.9%	$ 22,867,661,381.04	17%
43	14/12/2025	$ 16,607,980,251.41	12.4%	$ 23,553,941,944.02	18%
44	21/12/2025	$ 17,415,233,913.53	13.0%	$ 24,240,222,507.00	18%
45	28/12/2025	$ 17,590,768,156.11	13.1%	$ 24,240,222,507.00	18%
46	4/01/2026	$ 17,590,768,156.11	13.1%	$ 24,240,222,507.00	18%
47	11/01/2026	$ 18,690,743,281.38	13.9%	$ 24,670,611,645.54	18%
48	18/01/2026	$ 19,656,379,650.55	14.6%	$ 27,891,498,505.41	21%
49	25/01/2026	$ 20,690,127,925.06	15.4%	$ 28,049,064,724.80	21%
50	1/02/2026	$ 21,896,942,688.03	16.3%	$ 28,331,317,763.96	21%
51	8/02/2026	$ 23,113,591,370.03	17.2%	$ 28,835,847,591.35	21%
52	15/02/2026	$ 24,335,367,495.45	18.1%	$ 29,340,377,418.73	22%
53	22/02/2026	$ 25,562,865,093.74	19.04%	$ 29,344,864,245.00	22%
54	1/03/2026	$ 25,562,865,093.74	19.04%	$ 29,344,864,245.00	22%
54	1/03/2026	$ 25,750,018,238.00	19.18%	$ 29,344,864,245.00	22%
55	8/03/2026	$ 26,612,400,999.48	19.82%		
56	15/03/2026	$ 27,474,783,760.96	20.46%		
57	22/03/2026	$ 28,337,166,522.44	21.11%		
58	29/03/2026	$ 29,199,549,283.91	21.75%		
59	5/04/2026	$ 30,156,871,620.75	22.46%		
60	12/04/2026	$ 31,114,193,957.58	23.17%		
61	19/04/2026	$ 32,071,516,294.41	23.89%		
62	26/04/2026	$ 33,028,838,631.24	24.60%		
63	3/05/2026	$ 34,560,642,247.50	25.74%		
64	10/05/2026	$ 36,092,445,863.76	26.88%		
65	17/05/2026	$ 37,624,249,480.02	28.02%		
66	24/05/2026	$ 39,156,053,096.28	29.16%		
67	31/05/2026	$ 40,687,856,712.54	30.31%		
68	7/06/2026	$ 42,531,507,392.30	31.68%		
69	14/06/2026	$ 44,375,158,072.07	33.05%		
70	21/06/2026	$ 46,218,808,751.83	34.43%		
71	28/06/2026	$ 48,062,459,431.60	35.80%		
72	5/07/2026	$ 49,530,592,249.41	36.89%		
73	12/07/2026	$ 50,998,725,067.22	37.99%		
74	19/07/2026	$ 52,466,857,885.03	39.08%		
75	26/07/2026	$ 53,934,990,702.84	40.17%		
76	2/08/2026	$ 55,403,123,520.65	41.27%		
77	9/08/2026	$ 57,277,692,335.51	42.66%		
78	16/08/2026	$ 59,152,261,150.36	44.06%		
79	23/08/2026	$ 61,026,829,965.21	45.45%		
80	30/08/2026	$ 62,901,398,780.06	46.85%		

CURVA S DE SEGUIMIENTO

CONTRATO: **202500029**
CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN MARCELO 010**
FECHA DE CORTE: **1/03/2026**

81	6/09/2026	$	64,824,002,483.11	48.28%	
82	13/09/2026	$	66,746,606,186.16	49.71%	
83	20/09/2026	$	68,669,209,889.21	51.15%	
84	27/09/2026	$	70,591,813,592.26	52.58%	
85	4/10/2026	$	72,135,992,736.10	53.73%	
86	11/10/2026	$	73,680,171,879.94	54.88%	
87	18/10/2026	$	75,224,351,023.78	56.03%	
88	25/10/2026	$	76,768,530,167.62	57.18%	
89	1/11/2026	$	78,312,709,311.46	58.33%	
90	8/11/2026	$	80,796,483,006.27	60.18%	
91	15/11/2026	$	83,280,256,701.07	62.03%	
92	22/11/2026	$	85,764,030,395.88	63.88%	
93	29/11/2026	$	88,247,804,090.68	65.73%	
94	6/12/2026	$	91,256,121,978.94	67.97%	
95	13/12/2026	$	94,264,439,867.19	70.21%	
96	20/12/2026	$	97,272,757,755.44	72.45%	
97	27/12/2026	$	100,281,075,643.69	74.69%	
98	3/01/2027	$	102,965,048,127.81	76.69%	
99	10/01/2027	$	105,649,020,611.93	78.69%	
100	17/01/2027	$	108,332,993,096.05	80.69%	
101	24/01/2027	$	111,016,965,580.17	82.69%	
102	31/01/2027	$	113,700,938,064.29	84.69%	
103	7/02/2027	$	116,945,382,909.67	87.10%	
104	14/02/2027	$	120,189,827,755.04	89.52%	
105	21/02/2027	$	123,434,272,600.42	91.94%	
106	28/02/2027	$	126,678,717,445.79	94.35%	
107	7/03/2027	$	130,468,675,065.89	97.18%	
108	9/03/2027	$	134,258,632,686.00	100.00%	

