LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Contratista	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO				
Supervisor	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				
Número de contrato/vigencia	No. CO1.PCCNTR.8169110 - INTERVENTORIA - LOTE 6				
Informe N°	6	Periodo del informe	6/03/2026	Hasta el	5/04/2026

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto	SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría			CUMPLE	137 - 144
Obligaciones específicas del contrato	SI		CUMPLE	144 - 152
Informes semanales	SI		CUMPLE	215 - 325
Personal Aprobado	SI		CUMPLE	106 - 107
Verificación de licencias y permisos vigentes	N.A.		N.A.	
Pólizas actualizadas con modificaciones	SI		CUMPLE	100 - 101
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	SI		CUMPLE	106 - 107
Directiva distrital N° 1 de 2011	N.A.		N.A.	
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	N.A.		N.A.	
Verificacion de la matriz de riesgos	SI		CUMPLE	109 - 111
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	SI		CUMPLE	30 - 34
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	SI		CUMPLE	334 - 355
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)	SI		CUMPLE	379 - 380
Bitácora	SI		CUMPLE	155 - 214
Reseña fotográfica del periodo por semana	SI		CUMPLE	369 - 377
Actividades no previstas del proyecto	N.A.		N.A.	
Ponderación de elementos de calidad	SI		CUMPLE	109 - 111
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	N.A.		N.A.	
Programación y control de obra	SI		CUMPLE	37 - 68
Aspectos Técnicos				
Control del plan de calidad y ensayos de material	SI		CUMPLE	109 - 111
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales	SI		CUMPLE	382 - 385
Verificación de la amortización del anticipo	N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra	SI		CUMPLE	78
Aspectos Sociales	SI		CUMPLE	118
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	SI		CUMPLE	111 - 117
Seguridad y salud en el trabajo -	SI		CUMPLE	118 - 137
Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período.	SI		CUMPLE	106 107
Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del profesional y de	SI		CUMPLE	106 107
Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	356 - 380
Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	338 - 392
Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	132 - 135
CD con todos los soportes requeridos.	SI		CUMPLE	152
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.	N.A.		N.A.	
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra	N.A.		N.A.	
4. Conclusiones y recomendaciones				
5. Anexos				
6. Documentos Secop II				
Acta de inicio	SI		CUMPLE	
Garantías	SI		CUMPLE	
Designación del supervisor	SI		CUMPLE	
Informes mensuales	SI		CUMPLE	
Actas parciales	SI		CUMPLE	
Modificaciones	SI		CUMPLE	
Suspensión (si aplica)	N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de terminación	N.A.		N.A.	
Acta de entrega	N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión	N.A.		N.A.	
Acta de liquidación	N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110	**Aprobó**	**Revisó.**
JOHN CASTAÑEDA		
Elaboró: Residente de Interventoría	Director de Interventoría	Apoyo a la Supervisión.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CO1.PCCNTR.8169110

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE NO. 2"

INTERVENTOR:
CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

CONTRATISTA DE OBRA:
CONSORCIO PAIS
LOTE: 6

INFORME MENSUAL No. 06
PERIODO REPORTADO 06/03/2026- 05/04/2026

BOGOTA D.C.

ÍNDICE DE REVISIONES INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 06			
NÚMERO DE REVISIÓN	**CAPÍTULO MODIFICADO**	**FECHA DE MODIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
0	Documento Original	3/04/2026	

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		**INFORME MENSUAL 06 DE INTERVENTORÍA**
REVISIÓN		
Responsable Elaboración Componente Técnico	Nombre	Ing. John Freddy Castañeda
	Firma	JOHN CASTAÑEDA
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente SST	Nombre	Ana Bermúdez Hernández
	Firma	Ana Ma Bermúdez A
	Fecha	
Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente Estructural	Nombre	Juan C Cortés Cortés
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Componente de Costos, Presupuestos y Programación	Nombre	Edwin Sierra Hernández
	Firma	
	Fecha	

Título Documento		**INFORME MENSUAL 06 DE INTERVENTORÍA**
Responsable de la Revisión del Componente Hidráulico	Nombre	Luis González Camargo
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Revisión del Informe	Nombre	Arq. Héctor Villazón
	Firma	
	Fecha	
Responsable de la Aprobación del Informe	Nombre	Arq. Santiago Ángel
	Firma	
	Fecha	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10

2.1 LOCALIZACIÓN 11

2.2 ESTADO INICIAL 13

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 14

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja 14
..... 14
2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A 16
2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B 17
2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C 18
2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B 19
2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A 20
2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda 21
2.3.9 Colegio Santa Librada 22
2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A 23
2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 24

2.4 EMERGENCIAS 24

3. CONTRATO DE OBRA 25

3.1 INFORMACIÓN GENERAL 25

3.1.1 GARANTÍAS 26

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 30

3.3 INFORME DE AVANCE 35

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 36
3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS 37
3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO 37
3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA 69

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA 69

3.4.1 EQUIPO 69
3.4.2 PERSONAL 69

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA 71

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL 71
3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES 71
3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS 71
3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 72

3.5.5 ESTADO FINANCIERO 78
3.6 ESTADO DEL TIEMPO 79
3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO 79
3.8 OBLIGACIONES GENERALES 79
3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS 88
4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 99
4.1. INFORMACIÓN GENERAL 99
4.1.1. GARANTÍAS 100
4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 101
4.2.1 ADMINISTRATIVAS 101
4.2.2 TÉCNICAS 102
4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 103
4.2.4 LEGAL 104
4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR 104
4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA 105
4.3.2 EQUIPO 107
4.4 INFORMACION FINANCIERA 107
4.4.1 PRESUPUESTO 107
4.4.2 ESTADO FINANCIERO 108
A. PAGOS EFECTUADOS 108
5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA 108
6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. 111
7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 118
REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 136
8. OBLIGACIONES GENERALES 137
9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 144
10. REGISTRO FOTOGRAFICO 152
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 152

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sedes Educativas 13
Tabla 2. Información general contrato de obra 26
Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista 30
Tabla 4- Avance Financiero 35
Tabla 5. Porcentajes Acumulados 35
Tabla 6 - Certificado disponibilidad presupuestal 72
Tabla 7 - Listado APU´S 77
Tabla 8 - Pagos Realizados 78
Tabla 9 - Obligaciones Generales Contratista 88
Tabla 10 - Obligaciones Especificas Contratista 99
Tabla 11 - Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110 100
Tabla 12 - Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 101
Tabla 13 - Personal de Interventoría 107
Tabla 14 - Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría 107
Tabla 15. Pagos realizados a la interventoría 108
Tabla 16 - Obligaciones Generales - Interventoría 144
Tabla 17 - Obligaciones Especificas - Interventoría 152
Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Orlando Fals 164
Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio sierra morena 165
Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Arborizadora Baja 166
Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Fabio Lozano Simonelli 167
Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Calasanz 168
Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada 169
Tabla 24 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza 170
Tabla 25 - Registro fotográfico Colegio Tenerife Granada Sur Sede A 171

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme 11
Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades 12
Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja 14
Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz 15
Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A 16
Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B 17
Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C 18
Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B 19

Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A 20
Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda 21
Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada 22
Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa 23
Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A 24
Ilustración 14 Flujo de Caja Semanal 36
Ilustración 15 Curva s – Programado vs ejecutado 36
Ilustración 16 - Actividades Orlando Fals 38
Ilustración 17- Actividades Sierra Morena 39
Ilustración 18 - Actividades Unión Europea Sede B 46
Ilustración 19 - Actividades Arborizadora Baja 50
Ilustración 20 - Actividades Fabio Lozano Simonelli 55
Ilustración 21 - Actividades Estrellas del Sur Sede B 58
Ilustración 22 - Actividades Calasanz (Buenavista) 59
Ilustración 23 - Actividades Santa Librada 62
Ilustración 24 Actividades Estrella del Sur Sede A 65

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Bitacora de obra 37
Anexo 2. Informe Semanal 37
Anexo 3. Ensayo de Laboratorio 79
Anexo 4. Actas de comité 101
Anexo 5. Planillas de pago 107
Anexo 6. Certificado pago Parafiscales 107
Anexo 7. Acta De Interventoría 108
Anexo 8. Registro de Capacitaciones ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Anexo 9. Registro fotográfico 152
Anexo 10. Relación de Correspondencia 154

1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

Es por esto que la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** a través de la **DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (DCCEE)**, es la encargada de liderar, planificar y ejecutar proyectos de construcción, adecuación, ampliación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles educativos y administrativos del Distrito. En desarrollo de estas funciones y con base en los diagnósticos realizados por los gestores territoriales y especialistas de la DCCEE, se ha determinado la conveniencia de adelantar un programa de **ADECUACIONES, MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS** que permitan garantizar la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las sedes, en concordancia con los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El presente proyecto corresponde al proceso contractual **SED-LP-OP-DCCEE-012-2025**, mediante el cual se seleccionará a los contratistas encargados de ejecutar las obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la **ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS MENORES PRIORITARIAS**, necesarias para asegurar la prestación continua y eficiente del servicio educativo en Bogotá D.C.

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, mediante la **LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025,** cuyo objeto es: **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS**" - **LOTE NO. 6** se adjudicó al **CONSORCIO PAIS,** representado legalmente por **Juan Carlos Velásquez Forero** identificado con No. CC 80.217.561 de Bogotá, consorcio integrado por (CONSTRUCUTRA PAIS identificada con NIT. 901.063.647-3 con una participación del 30%, CONSTRUCOL S.A.S identificada con

NIT.1.053.341.203 con una participación del 30%, CONSTRUCCIONES VYP S.A.S identificada con NIT. 901.368.837-6, con una participación del 10%, FAPAIS S.A.S identificada con NIT. 901.762.077-4) por un valor total de la propuesta económica de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($2.232.049.023,00) y un valor de emergencias de CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS ($100.000.000,00), valor que no sobrepasa el presupuesto oficial y que no fue objeto de corrección aritmética, con un plazo de ejecución de siete (7) meses para la intervención de Nueve (9) instituciones educativas y que para su efectiva supervisión integral se debe de contar con una interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera. Posteriormente, al contrato se le realizó una adición por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($785.001.422,00) y una adición en plazo de un (1) mes y quince (15) días, para un valor total del contrato de TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.117.050.445,00).

Del mismo modo, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** luego de adjudicado el contrato de interventoría **CO1.PCCNTR.8169110** al CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, adelanto el proceso de contratación a través de convocatoria concurso de méritos abierto No. **SED-CM-A-DCCEE-018-2025** y que mediante **RESOLUCIÓN 0073 DE 05 DE AGOSTO DE 2025** por medio de la cual se adjudica el proceso cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – LOTE No. 2** al proponente **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO,** representado legalmente por el señor ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX, identificado con CC. 79.602.923 de Bogotá D.C., (Consorcio integrado por **SEIING SAS BIC** identificado con Nit. 900.208.425-6, con participación del 50% y **ARQUITECTURA E INGENEIRIA DE CONSULTA ARINCO SAS** identificada con Nit. 901.094.289-2, con un porcentaje de participación del 50%) por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VVEINTIOCHO PESOS M/CTE **($796.278.928,00),** incluido IVA y demás tributos que se causen o se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato por un plazo de SIETE (7) meses.

Mediante el comunicado No. SERINCO-SED-INT-2025-121 del 4 de diciembre de 2025, el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00)** IVA incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Con este informe, ***CONSORCIO PAIS*** *y* ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de marzo y el 05 de abril del año 2026.

La interventoría ***CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** será la encargada de realizar la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar.

Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se desarrollarán en la ciudad de **BOGOTÁ D.C**., el proyecto abarca dos (2) de las veinte (20) localidades que conforman el territorio distrital, las cuales se encuentran ubicadas en el sector sur de la ciudad: **CIUDAD BOLÍVAR** y **USME**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán **siete (7)** instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de **Cuatro (4)** instituciones educativas, solo en el área urbana.

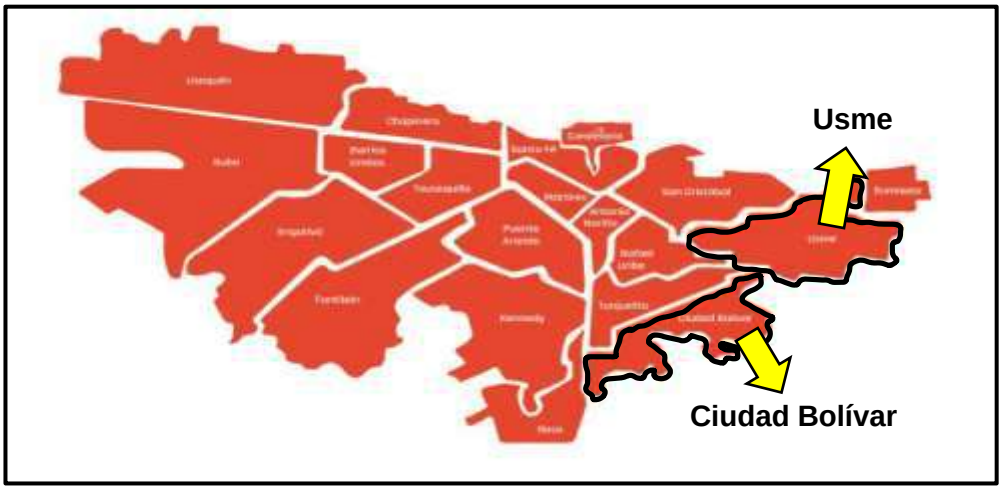


Ilustración 1. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
Fuente: Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.

Se deja claridad que de acuerdo con la adición firmada el día 12 de diciembre de 2025 se añaden dos nuevos colegios uno en la localidad de Ciudad Bolívar y un colegio en la Localidad de Usme.



Ilustración 2. Localización de las Escuelas en las Localidades
Fuente: Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Arborizadora Baja	A	Calle 59 a Bis Sur # 45 -16	Ciudad Bolívar	14 Semanas

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN
Colegio Buena Vista I.E.D Calasanz	A	Cra. 17f # 77A - 13 Sur	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio estrella del sur Seda A	A	Cra.7 P No. 72-25 Sur	Ciudad Bolívar	5 Semanas
Colegio estrella del sur Seda b	B	Calle 75 sur # 18 B - 45	Ciudad Bolívar	15 Semanas
Colegio Sierra Morena Sede C	C	Carrera 46A No. 79D- 15 Sur	Ciudad Bolívar	23 Semanas
Colegio Unión europea Sede B	B	Calle 69B sur # 17 N 92	Ciudad Bolívar	14 Semanas
Colegio Fabio Lozano Simónelli Sede A	A	Calle 65 Sur # 5-65	Usme	19 Semanas
Colegio Orlando Fals Borda	A	Cra 12 # 72-60 Sur	Usme	15 Semanas
Colegio Santa Librada	A	Calle 75A Sur # 9A-45	Usme	18 Semanas
Colegio Guillermo Cano Izasa	A	Cra. 16ª # 62-35 Sur	Ciudad Bolivar	23 Semanas
Tenerife Granada Sur	A	Cra. 14b Bis # 91 sur 14	Usme	12 Semanas

Tabla 1. Sedes Educativas
Fuente: Propia

2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera, se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

2.3.1 Colegio Arborizadora Baja



Ilustración 3. Esquema de Distribución Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la cubierta en el Área de preescolar y sus baños adjuntos.
- Reparación de la cancha en la zona de bachillerato, este ítem incluye: Adecuación de la gradería
- Demolición y reconstrucción de una placa
- Remplazo de los marcos de futbol, baloncesto y suministro de los parales y malla para la cancha de voleibol.

2.3.2 Colegio Buenavista I.E.D Calasanz

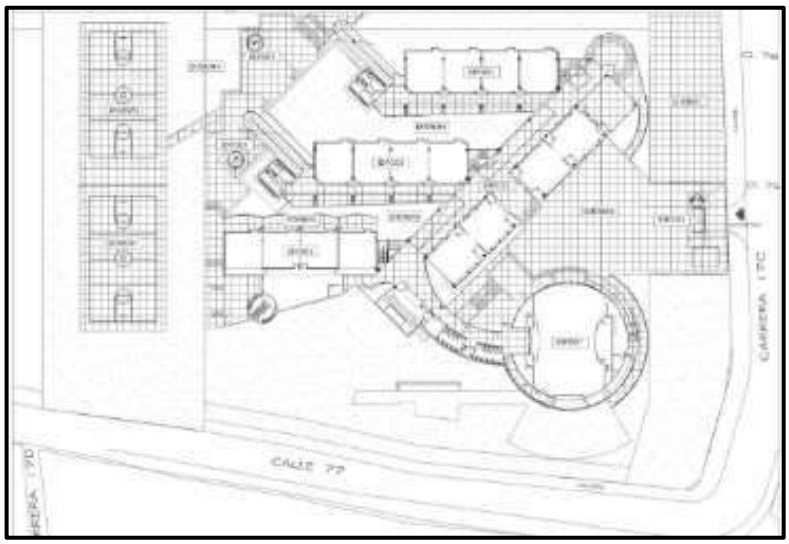


Ilustración 4. Esquema de Distribución Colegio Buenavista I.E.D Calasanz
Fuente: *Propia*

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar en la sede educativa es el cambio de la cubierta de la zona del comedor
- El contratista deberá contemplar un cerramiento perimetral para mitigar el ingreso de palomas al área.

2.3.3 Colegio Estrella del Sur Sede A.

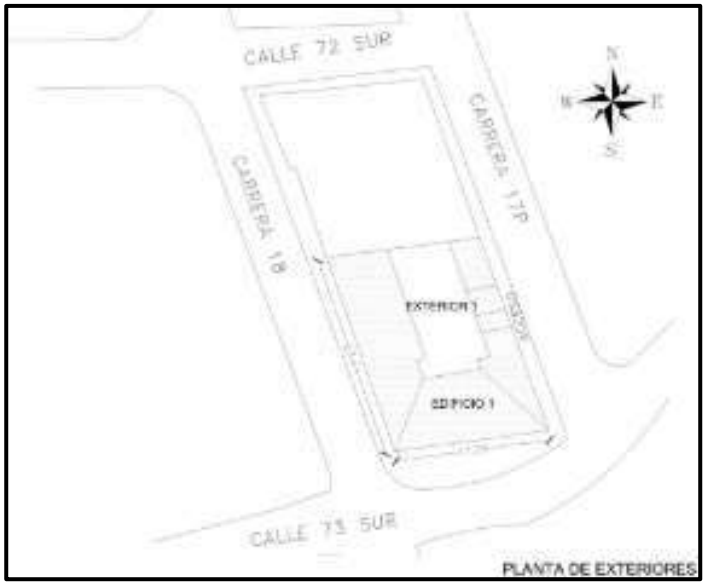


Ilustración 5. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de la puerta principal de la entrada
- Cambio total de las dos baterías sanitarias

2.3.4 Colegio Estrella Del Sur Sede B

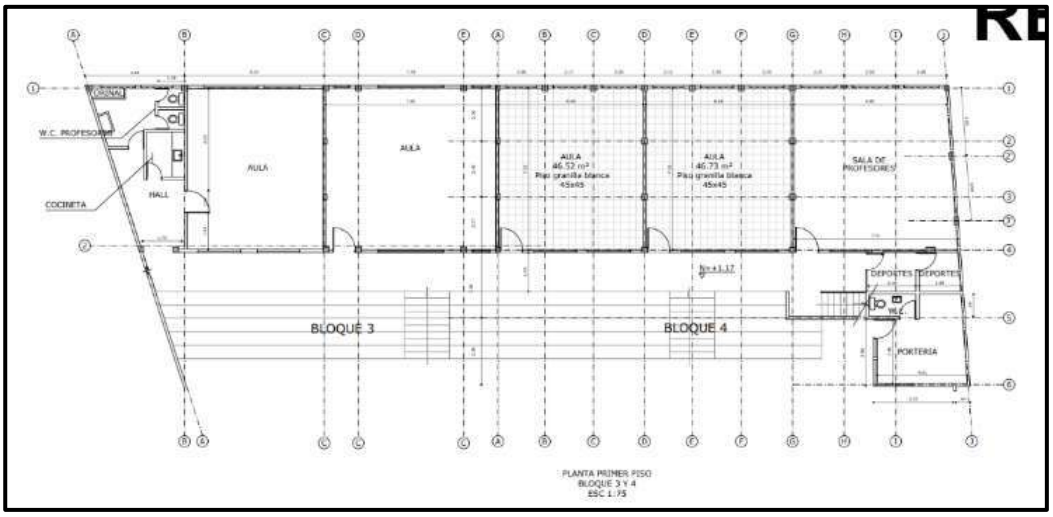


Ilustración 6. Esquema de Distribución Colegio Estrella del Sur Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Cambio de puertas y ventanas en todas las aulas que allí se encuentran y de igual forma en el área administrativa.
- Cambio de la puerta principal de entrada del colegio.

2.3.5 Colegio Sierra Morena Sede C

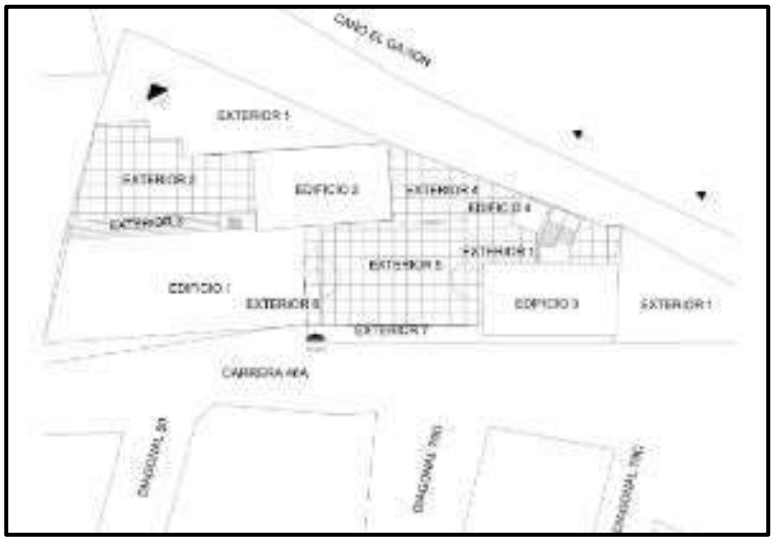


Ilustración 7. Esquema de Distribución Colegio Sierra Morena Sede C
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Adecuación del cuarto de basuras
- Adecuación de la rampa de acceso, incluyendo de igual forma la instalación de barandas metálicas
- Revisión de la aplicación de pintura para los salones, el contratista tendrá la misión de analizar el estado de esta, ya que de acuerdo con la visita los salones se encuentran en buen estado.

2.3.6 Colegio Unión Europea Sede B

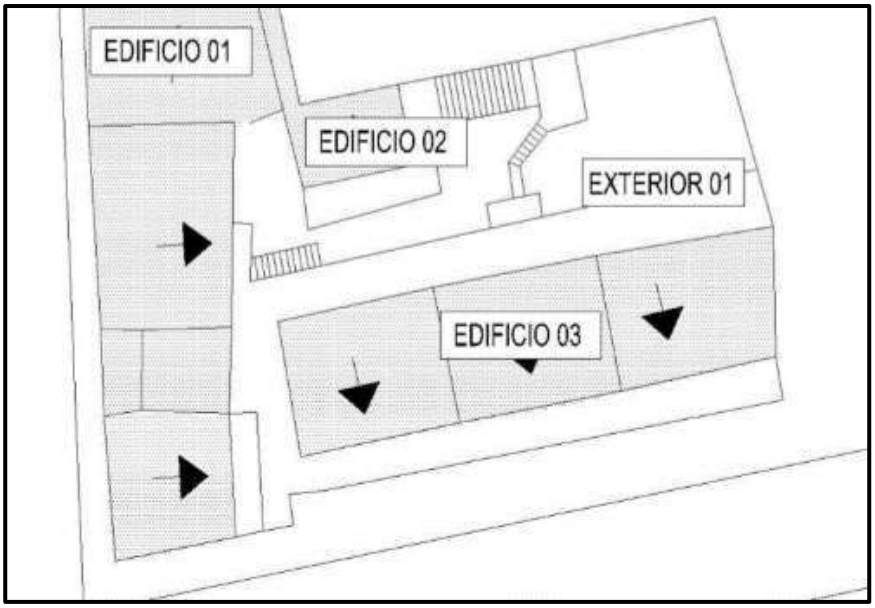


Ilustración 8. Esquema de Distribución Colegio Unión Europea Sede B
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo para realizar en la sede educativa es el cambio de cubierta ubicado en tres aulas, para una mejor ubicación es donde se encuentra el aula de informática

2.3.7 Colegio Fabio Lozano Simonelli Sede A

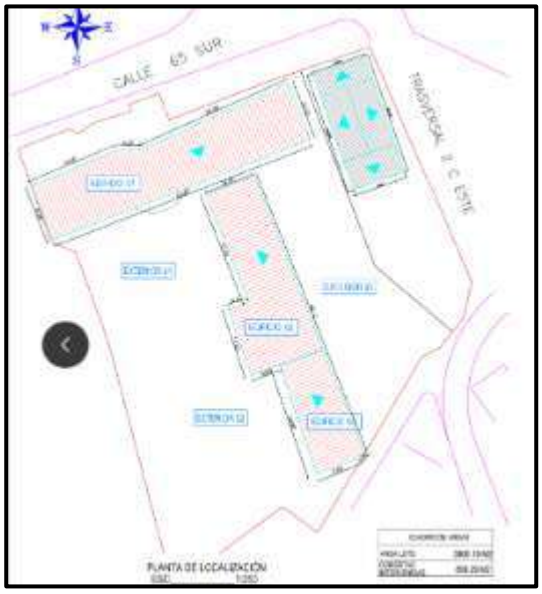


Ilustración 9. Esquema de Distribución Colegio Fabio Lozano Simonelli sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Manejo de aguas lluvias en la cancha colindante con el salón de los laboratorios
- Cambio total de las dos baterías sanitarias del tercer piso
- Sustitución de los pisos en todos los salones del tercer piso.

2.3.8 Colegio Orlando Fals Borda

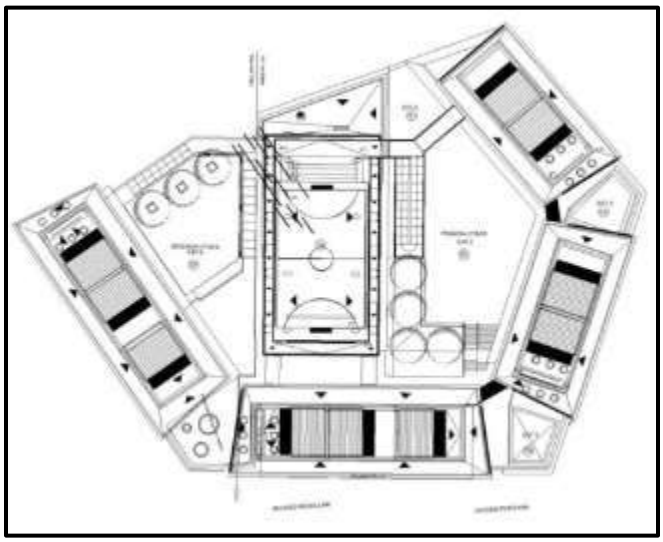


Ilustración 10. Esquema de Distribución Colegio Orlando Fals Borda
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- El trabajo por realizar consiste en la impermeabilización de la placa ubicada en la terraza debido a que se presenta empozamientos en la misma y esta filtra hacia el área de recreación del colegio, además de ello se encuentra afectando los techos de los salones.

2.3.9 Colegio Santa Librada



Ilustración 11. Esquema de Distribución Colegio Santa Librada
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización de la terraza del comedor, previa verificación técnica que evidencia filtraciones por la junta de dilatación entre dos estructuras.
- Impermeabilización de la terraza en la zona de las materas.

2.3.10 Colegio Guillermo Cano Izasa Sede A

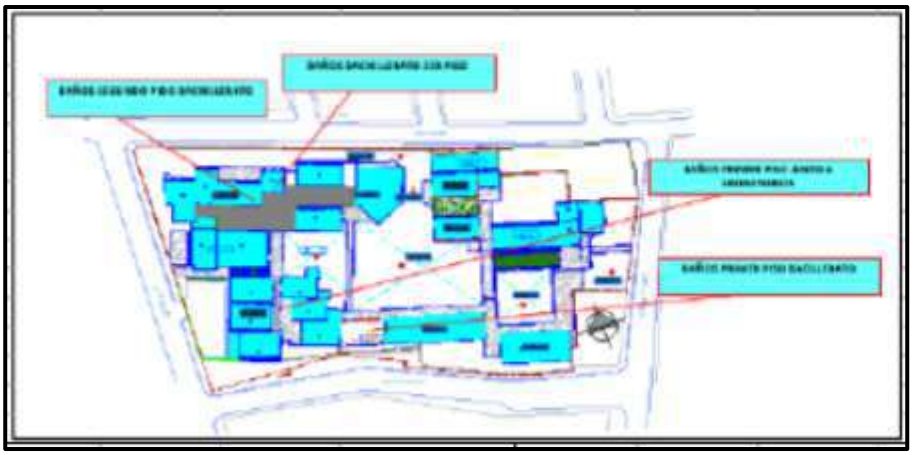


Ilustración 12 Esquema de Distribución Colegio Guillermo Cano Izasa
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Mejoramiento de Baterías Sanitarias en bloque bachillerato
- Mejoramiento de instalaciones Hidrosanitarias
- Adecuación de la red eléctrica – Baterías Sanitarias.

2.3.11 Colegio Tenerife Granda Sur Sede A

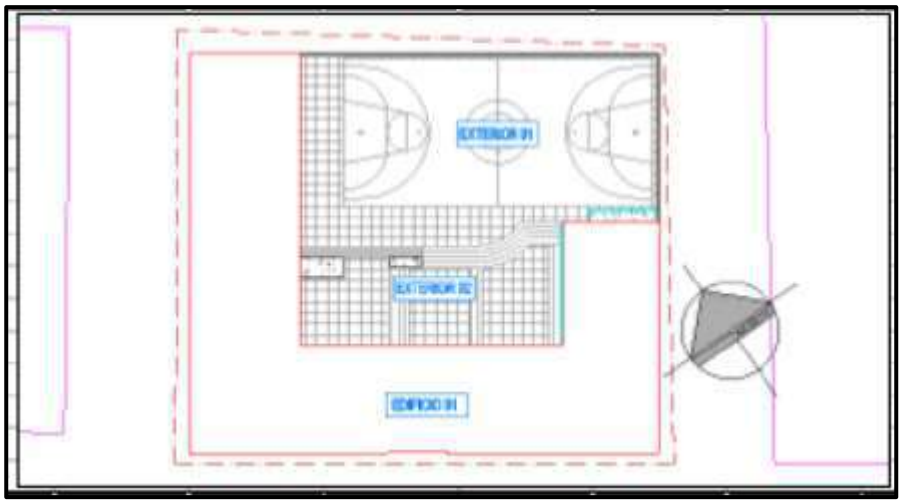


Ilustración 13 Esquema de Distribución Colegio Tenerife Granda Sur Sede A
Fuente: Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Impermeabilización Tanque aguas potable
- Mantenimiento correctivo motobombas
- Mejoramiento de barandas

2.4 EMERGENCIAS

En el marco de la ejecución del contrato, la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), contempla la atención de emergencias en la infraestructura educativa distrital, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la prestación del servicio educativo.

Estas emergencias corresponden a situaciones imprevistas o de fuerza mayor que afectan las condiciones físicas de las edificaciones como daños estructurales, filtraciones, desprendimientos, fallas en cubiertas o deterioro de redes eléctricas e hidrosanitarias las cuales requieren una intervención inmediata y coordinada.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 416.900.290,00)*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Teniendo en cuenta los informes preliminares y reportes institucionales, durante el presente periodo no se han presentado ni ejecutado atenciones por concepto de emergencias en las instituciones educativas a cargo del contrato.

3. CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.6
CONTRATISTA	CONSORCIO PAIS - NIT 901.974.049-8
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8154780
VALOR INICIAL	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($2.332.049.023).
VALOR ADICIÓN No.1	SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422)
VALOR FINAL	TRES MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.117.050.445)
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES

CONTRATO DE OBRA	
PLAZO ADICIÓN No.1	UN MES (01) Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 2. Información general contrato de obra
Fuente: Propia

3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	05/12/2026	$ 466.409.804,60

PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	05/04/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/04/2026	05/04/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2025	05/04/2026	$ 427.050.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**

PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	12/01/2027	$ 466.409.804,60
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	13/05/2029	$ 233.204.902,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 466.409.804,60

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 7		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	08/05/2026	$ 427.050.000,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
AMIT – HMACC	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00
MANTENIMIENTO	03/09/2025	10/06/2026	$ 2.332.049.023,00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	03/09/2025	10/06/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/09/2025	10/06/2026	$ 349.807.353,45

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	39-44-101175397 -Anexo 8		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	24/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	27/02/2027	$ 623.410.089,00
PAGOS DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	28/06/2029	$ 311.705.044,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/05/2026	05/05/2028	$ 623.410.089,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	39-40-101045911 -Anexo 10		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/10/2025	23/06/2026	$ 511.771.500,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE	BY - 100000027 -Anexo 5		
TIPO DE MODIFICACIÓN	POR ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 ADICIÓN Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/01/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		

	INICIAL	FINAL	VALOR
DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
CICLÓN, HURACAN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
AMIT – HMACC	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
MANTENIMIENTO	13/07/2026	20/08/2026	$ 3.117.050.445,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	13/07/2026	20/08/2026	$ 466.409.804,06
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	13/07/2026	20/08/2026	$ 349.807.353,45

Tabla 3. Pólizas contrato de obra - Contratista
Fuente: Propia

3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de marzo y el 05 de abril de 2026, se realizaron actividades de visita, además de ello el contratista de obra realizó las siguientes tareas en cada una de las instituciones educativas.

- CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja
- CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C
- CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B
- CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda
- CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli
- CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B
- CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)
- CPF 546 – Colegio Santa Librada
- CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A
- CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza

Además de ello el contratista de obra CONSORCIO PAIS realizo las siguientes actividades referentes a cada una de las instituciones educativas mencionadas a continuación:

- **CPF 581 – Colegio Orlando Fals Borda**

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado óptimo del alistado, se procedió con la aplicación de la membrana de poliurea, actuando como capa impermeabilizante. Previamente a esta actividad, y siguiendo la recomendación del especialista en la aplicación de la membrana, se ejecutó una junta de dilatación perimetral tanto en la placa de la cubierta del área de rectoría como en la placa de la terraza de la cafetería. Posteriormente, se realizó la aplicación de la membrana de poliurea en cada una de las zonas señaladas, dando por concluida de esta forma la actividad de impermeabilización con poliurea.

Para el frente de obra faltan las siguientes actividades:

Conexión bajante de la terraza de la zona de la rectoría, y de igual forma la conexión de la misma a la placa de la zona de la cafería para la conexión al cárcamo y realizar la pintura de la tubería utilizada para la bajante.

- **CPF 1913 – Colegio Sierra Morena Sede C**

Se culminó satisfactoriamente con la instalación de la estructura metálica correspondiente a la adecuación del cuarto de residuos. Asimismo, se procedió con la colocación de la cubierta mediante teja tipo sándwich.

En cuanto al frente de la intervención, aún se encuentra pendiente la ejecución de los trabajos de pintura en los muros colindantes a la cancha, así como en los paramentos cercanos a la zona donde se adecuó la rampa

- **CPF 1930 – Colegio Unión Europea Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1904 – Colegio Arborizadora Baja**

A raíz de las precipitaciones registradas en los últimos días, se evidenció la presencia de empozamientos o encharcamientos en varios sectores de la cancha. Ante esta situación,

se solicitó formalmente al Consorcio País la subsanación de las No Conformidades detectadas en dicha área.

Por otra parte, en el bloque correspondiente a primera infancia, se completó la instalación de la capa de alistado necesaria para la posterior colocación del piso de caucho. Dicho proceso se ejecutó conforme a las recomendaciones técnicas del proveedor del piso de caucho, quien indicó que la instalación del revestimiento únicamente podrá realizarse una vez transcurridos veinte (20) días calendario después de la finalización del alistado, con el fin de garantizar las condiciones óptimas de fraguado y secado de la base.

En atención a lo observado tanto en la cancha como en la zona de primera infancia, se convocó a una reunión de trabajo con el personal del colegio y con los padres de familia. Como resultado de dicha reunión, el contratista CONSORCIO PAÍS adquirió el compromiso formal de realizar la entrega de cada uno de los espacios intervenidos el día 10 de abril de 2026

- **CPF 523 – Colegio Fabio Lozano Simonelli**

Se completaron los trabajos de instalación de enchape en pisos y muros correspondientes a las dos baterías sanitarias. Una vez finalizada esta actividad, se procedió con la instalación de las divisiones en acero inoxidable, la cual alcanza actualmente el 100% de su ejecución. De igual manera, se realizó la instalación de los lavamanos en policuarzo para ambas baterías sanitarias.

Paralelamente, se iniciaron y culminaron las actividades correspondientes a las instalaciones eléctricas, entre las que se incluyen: la instalación de interruptores, la colocación de luminarias, el montaje del tablero eléctrico y la respectiva conexión al tablero principal, garantizando así la operatividad del sistema eléctrico en los espacios intervenidos.

Por otra parte, se inició la construcción de la caja de inspección. y se culminó la actividad del cielo raso en pvc en el aula de profesores No obstante, para la culminación total de las actividades del frente de obra, aún se encuentran pendientes los siguientes trabajos:

- Instalación de los aparatos sanitarios (tazas, grifería, entre otros).
- Terminación del cárcamo ubicado en la zona de la cancha.
- Instalación de los espejos en las baterías sanitarias.

Estas actividades complementarias serán ejecutadas en el transcurso de los próximos días hábiles, con el fin de dar por concluido el frente de obra en su totalidad.

- **CPF 1918 – Colegio Estrella del Sur Sede B**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1974 – Colegio Calasanz (Buena Vista)**

Se ha iniciado y completado la instalación del cielo raso en PVC en la zona de la rampa colindante al aula múltiple, área en la cual se ejecutó dicha actividad. Esta intervención tuvo como finalidad principal impedir el ingreso de palomas al aula múltiple, mitigando así los riesgos asociados a la presencia de aves en espacios interiores (contaminación, daños estructurales y afectaciones a la salubridad).

Asimismo, se inició y culminó el mantenimiento de las canales, garantizando su correcto funcionamiento frente a escorrentías y precipitaciones.

No obstante, aún se encuentra pendiente por ejecutar la actividad correspondiente a la instalación de un flanche perimetral en la zona de la cubierta, con el propósito de reforzar la barrera física contra el ingreso de palomas y complementar las medidas implementadas en el cielo raso.

- **CPF 546 – Colegio Santa Librada**

Se culmino con la media caña de las cuatro jardineras. De igual forma que en el frente de obra del colegio Orlando fals borda, una vez alcanzado el tiempo de fraguado óptimo del alistado, se procedió con la aplicación de la membrana de poliurea, actuando como capa impermeabilizante. Previamente a esta actividad, y siguiendo la recomendación del especialista en la aplicación de la membrana, se ejecutó una junta de dilatación perimetral en cada una de las cuatro jardineras, Posteriormente, se realizó la aplicación de la membrana de poliurea en cada una de las jardineras, dando por concluida de esta forma la actividad de impermeabilización con poliurea.

- **CPF 1917 – Colegio Estrella del Sur Sede A**

Frente de obra al 100% de las actividades

- **CPF 1959 – Colegio Guillermo Cano Isaza**

Se continúa con las labores de enchape en pisos y muros en las dos zonas actualmente en ejecución. La primera de ellas se ubica en el primer piso, al costado de los laboratorios, mientras que la segunda se localiza en el tercer piso, en el área correspondiente a las aulas.

En la zona del primer piso, se culminó con la instalación total del enchape en las dos baterías sanitarias existentes en dicho nivel, completando así el 100% de esta actividad en dichas áreas.

En cuanto a la zona del tercer piso, se reporta un avance significativo: se ha ejecutado en su totalidad el alistado y el pañete, alcanzando un 100% de cumplimiento. En lo que respecta al enchape de pisos y muros, a la fecha se registra un avance del 80%, quedando pendiente la finalización del porcentaje restante para dar por concluida la intervención de la actividad del enchape en este nivel.

- **CPF 548 – Colegio Tenerife Granda Sur Sede A**

Se dio inicio a las actividades correspondientes a la impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable. Como primera medida, se realizó una inspección detallada tanto en la parte superior (exterior) como en el interior del tanque, identificando ciertos puntos críticos que requerían tratamiento previo para garantizar una correcta impermeabilización.

Las acciones ejecutadas fueron las siguientes:

1. **Sellado de fisuras**: Se procedió a sellar las fisuras localizadas en la parte superior del tanque, con el fin de controlar la humedad que se evidenciaba en la cara interna de la tapa del tanque.
2. **Impermeabilización con poliurea**: Posterior al sellado, se aplicó una membrana de poliurea en la superficie exterior de la tapa del tanque, como medida complementaria para mitigar el ingreso de humedad.
3. **Aplicación de pintura epóxica en el interior de la tapa**: En la cara interna de la tapa del tanque, se utilizó una pintura tipo epóxica, con el objetivo de proteger el acero de la tapa contra la corrosión y contribuir adicionalmente al control de la humedad.

Una vez subsanados los puntos críticos encontrados durante la inspección, se procedió con la impermeabilización general del tanque, la cual reporta a la fecha un avance de ejecución del 70%.

De igual manera, con el fin de proporcionar condiciones seguras de tránsito en la parte superior del tanque, se aplicó una pintura antideslizante sobre la superficie externa del mismo.

3.3 INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, se cuenta con los siguientes porcentajes que se mostraran en la Tabla No.4

% Programado	% Ejecutado
$ 1.561.593.927,18 (69,85%)	$ 1.579.050.526,44 (70.63%)
Adelanto de $ 17.456.599,26 (0,78%)	

Tabla 4- *Avance Financiero*
Fuente: Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164.884.421,00	100,00%	$ 155.249.499,23	94,16%	$ 164.884.421,00	-5,84%
UNION EUROPEA	$ 165.727.196,00	100,00%	$ 165.727.196,00	100,00%	$ 165.727.196,00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 109.036.666,50	89,89%	$ 89.646.648,62	73,91%	$ 121.299.091,00	-15,99%
FABIO LOZANO	$ 169.892.716,07	69,64%	$ 194.667.868,22	79,80%	$ 243.945.084,00	10,16%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494.079.400,58	100,00%	$ 482.300.656,68	97,62%	$ 494.079.400,58	-2,38%
BUENAVISTA	$ 169.818.729,00	100,00%	$ 159.064.993,54	93,67%	$ 169.818.729,00	-6,33%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72.206.451,00	100,00%	$ 72.206.450,25	100,00%	$ 72.206.451,00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 48.125.173,43	20,55%	$ 84.380.748,53	36,03%	$ 234.227.860,00	15,48%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75.074.063,00	100,00%	$ 75.074.063,00	100,00%	$ 75.074.063,00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 6.821.740,70	5,25%	$ 60.972.206,69	46,90%	$ 130.006.456,00	41,65%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 85.927.369,90	23,58%	$ 39.760.195,66	10,91%	$ 364.449.204,00	-12,67%
TOTALES	**$ 1.561.593.927,18**	**69,85%**	**$ 1.579.050.526,44**	**70,63%**	**$ 2.235.717.955,58**	**0,78%**

Tabla 5. *Porcentajes Acumulados*
Fuente: Propia

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo al flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.14 e Ilustración No.15

FLUJO DE CAJA SEMANAL	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21
	9-feb-26	16-feb-26	23-feb-26	2-mar-26	9-mar-26	16-mar-26	23-mar-26	30-mar-26
	15-feb-26	22-feb-26	1-mar-26	8-mar-26	15-mar-26	22-mar-26	29-mar-26	5-abr-26

FLUJO SEMANAL	$ 213.056.188,16	$ 110.476.148,46	$ 188.626.326,49	$ 50.342.165,75	$ 57.771.222,92	$ 56.039.286,41	$ 37.030.078,43	$ 73.115.935,47
	9,53%	4,94%	8,44%	2,25%	2,58%	2,51%	1,66%	3,27%
FLUJO ACUMULADO	$ 988.192.763,24	$ 1.098.668.911,70	$ 1.287.295.238,19	$ 1.337.637.403,95	$ 1.395.408.626,86	$ 1.451.447.913,28	$ 1.488.477.991,71	$ 1.561.593.927,18
	44,20%	49,14%	57,58%	59,83%	62,41%	64,92%	66,58%	69,85%

Ilustración 14 *Flujo de Caja Semanal*
Fuente: Propia

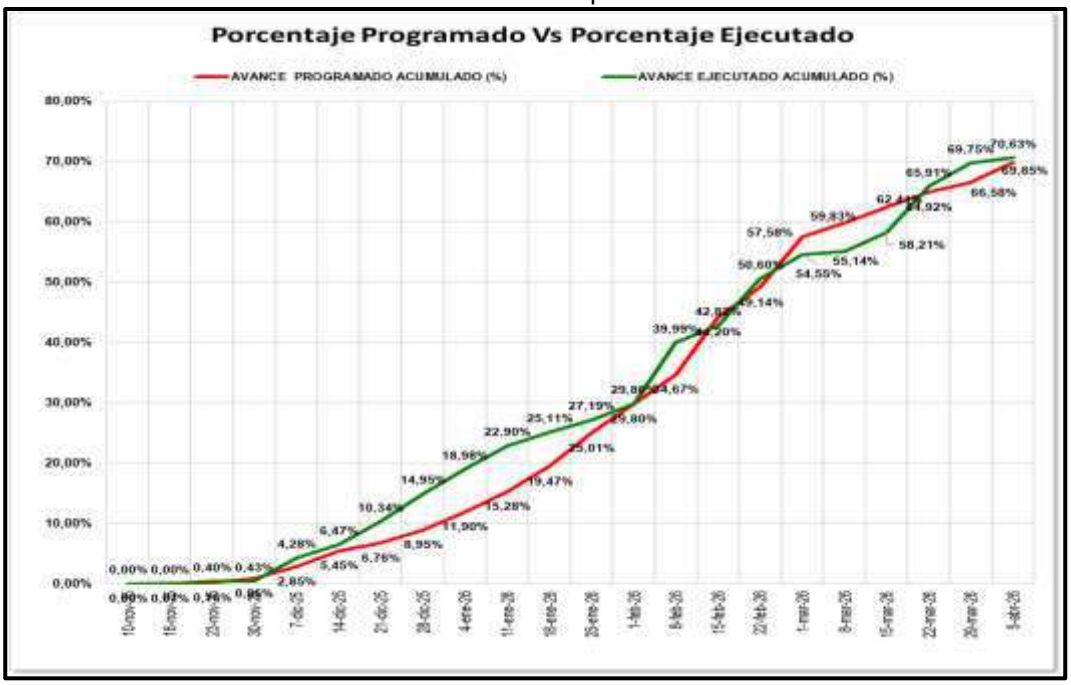


Ilustración 15 Curva s – Programado vs ejecutado
Fuente: Propia

3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance de igual forma en el anexo No.02 se presentarán los informes semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio País semana por semana.

Anexo 1. Bitacora de obra
Anexo 2. Informe Semanal

3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO

Para la fecha del presente periodo, y dando alcance al cronograma de obra vigente, el contratista debería llevar en ejecución las siguientes actividades de acuerdo con cada institución educativa, pero como se evidencia en los puntos anteriores se cuenta con un atraso debido a que no ha realizado en su totalidad las actividades programadas.

Se presentarán las Ilustraciones No.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36,50	264,84	301,34	301,34		$ 4.233,48	$ 1.275.715,60	$(1.121.193,73)	825,59%	825,59%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91,00	(62,60)	28,40	28,40		$31.110,25	$ 883.530,99	$ 1.947.501,40	100,00%	100,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,50	264,84	301,34	301,34		$18.044,21	$ 5.437.442,99	$(4.778.829,24)	825,59%	825,59%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301,34	-181,34	120,00	120,00		$33.201,35	$ 3.984.162,12	$ 6.020.732,99	39,82%	39,82%

CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 21			
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79,20			79,20		$69.099,55	$ 5.472.684,59	$ -	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34,00			34,00		$107.273,69	$ 3.647.305,34	$ -	100,00%	100,00%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16,00	(13,00)	3,00	2,00		$166.952,47	$ 333.904,95	$ 2.337.334,64	12,50%	12,50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,00			11,00	11,00	$ 91.590,40	$ 1.007.494,39	$ 2.106.579,18	32,35%	32,35%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58,50	136,16	194,66	194,66		$ 27.185,71	$ 5.291.971,11	$(3.701.606,83)	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44,00	(16,20)	27,80	3,00		$ 91.590,40	$ 274.771,20	$ 3.755.206,36	6,82%	6,82%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96,00	(72,00)	24,00	2,00		$ 5.565,04	$ 11.130,08	$ 523.113,53	2,08%	2,08%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73,00	189,00	248,96	248,96		$ 45.289,29	$11.275.220,89	$(7.969.102,94)	341,04%	341,04%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	300,00			300,00		$ 34.369,67	$10.310.901,48	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262,00	31,46	293,46	293,46		$361.355,09	$106.043.263,51	$(11.368.231,00)	112,01%	112,01%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA							$155.249.499,23			

Ilustración 16 - *Actividades Orlando Fals*
Fuente: Propia

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47,37			47,37		$ 7.045,00	$333.721,66	$ -	100,00 %	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60,00			53,10		$ 31.110,25	$1.651.954,06	$214.660,70	88,50%	88,50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1,76			1,76		$274.656,52	$483.395,48	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20,80	7,20	28,00	28,00		$ 21.488,46	$601.677,01	$(154.716,95)	134,62 %	134,62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12,60			12,60		$ 11.376,96	$143.349,70	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,84			36,84		$107.273,69	$3.951.962,61	$ -	100,00 %	100,00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32,64	0,72	31,92	-		$ 93.547,94	$ -	$3.053.405,00	0,00%	0,00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,20			3,40		$ 15.633,37	$ 53.153,46	$ 59.407,00	47,22%	47,22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,29			4,00		$ 11.761,45	$ 47.045,82	$ 15.172,00	75,61%	75,61%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 21			
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1,76	6,86	8,62	4,45		$91.988,38	$409.348,31	$(247.448,75)	252,84 %	252,84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24,87	-9,60	15,27	15,27		$21.702,97	$331.382,67	$208.370,00	61,40%	61,40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11,84			11,84		$165.931,21	$1.964.625,47	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7,00	7,00	14,00	14,00		$176.060,25	$2.464.579,38	$(1.232.158,00)	199,98 %	199,98%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275,63			275,63		$ 23.042,63	$6.351.239,56	$ -	100,00 %	100,00%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12,60			2,00		$146.133,16	$292.266,33	$1.549.012,00	15,87%	15,87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00			-		$78.726,73	$ -	$ 472.360,38	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8,00			-		$28.310,86	$ -	$ 226.487,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00			-		$129.729,46	$ -	$ 259.458,91	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29,00			-		$14.988,50	$ -	$ 434.667,00	0,00%	0,00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42,05	8,55	50,60	50,60		$193.996,53	$9.816.224,55	$(1.658.670,00)	120,33 %	120,33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11,84			11,84		$165.931,21	$1.964.625,47	$ -	100,00 %	100,00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2,96			2,96		$592.067,38	$1.752.519,43	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420,50	(366,54)	53,96	53,96		$ 7.255,46	$391.504,61	$2.659.416,00	12,83%	12,83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91,39			91,39		$ 7.103,01	$649.144,22	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,00	10,00	16,00	16,00		$143.600,90	$2.297.614,44	$(1.436.009,00)	266,67 %	266,67%

CPF	1913	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 21			
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4,00	-4,00	0,00	-		$1.618.437,02	$ -	$6.473.748,09	0,00%	0,00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3,00			1,00		$875.947,70	$875.947,70	$1.751.895,00	33,33%	33,33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33,78			33,78		$1.120.163,13	$37.839.110,41	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226,80			226,80		$ 23.042,63	$5.226.068,03	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36,84			36,84		$264.771,67	$9.754.188,24	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$89.646.648,62**			

Ilustración 17*- Actividades Sierra Morena*
Fuente: Propia

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168,00	10,14	178,14	178,14		$ 4.233,48	$ 754.151,38	$ (42.927,00)	106,04 %	106,04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45,00	7,80	52,80	23,83		$31.110,25	$ 741.422,37	$ 658.538,70	52,96%	52,96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136,13	-104,13	32,00	32,00		$ 3.248,63	$ 103.956,25	$ 338.280,13	23,51%	23,51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5,83	0,00	5,83	-		$144.722,00	$ -	$ 843.729,29	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36,30			36,30		$ 26.782,33	$ 972.198,70	$ -	100,00 %	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5,15	7,35	12,50	12,50		$ 27.938,51	$ 349.231,40	$ (205.348,06)	242,72 %	242,72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168,00	5,63	173,63	173,63		$ 36.752,18	$ 6.381.281,40	$ (206.914,79)	103,35 %	103,35%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 11.967,87	$ 287.228,79	$ (71.807,20)	133,33 %	133,33%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 21			
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18,00	6,00	24,00	24,00		$ 7.469,97	$ 179.279,20	$ (44.819,80)	133,33 %	133,33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1,00			-		$ 55.922,89	$ -	$ 55.922,89	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7,00	0,00	7,00	-		$ 32.498,47	$ -	$ 227.489,29	0,00%	0,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3,90	-3,90	0,00	-		$ 18.687,73	$ -	$ 72.882,16	0,00%	0,00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19,43			19,43		$ 21.844,63	$ 424.441,11	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00			4,00		$126.905,79	$ 507.623,16	$ -	100,00 %	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3,90			3,90		$ 89.839,27	$ 350.373,14	$ -	100,00 %	100,00%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 21			
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515,11	-1076,19	2438,92	2.438,92		$23.042,63	$56.199.126,28	$(80.997.372,11)	-226,63 %	-226,63%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19,43			19,43		$ 42.469,67	$ 825.185,65	$ (825.185,65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0,50			0,50		$341.855,19	$ 170.927,60	$ (170.927,60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26,40	18,13	44,53	44,53		$ 91.590,40	$ 4.078.520,47	$ (1.660.533,93)	245,62 %	245,62%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1,00	-1,00	0,00			$875.947,70	$ -	$ 875.947,70	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213,75	0,29	214,04	214,04		$264.771,67	$56.671.727,78	$ (76.783,78)	100,14 %	100,14%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 21			
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18,15			18,15		$106.267,26	$ 1.928.750,73	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34,90			34,9		$91.590,40	$ 3.196.504,93	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42,00			42		$ 23.315,15	$ 979.236,14	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTROEINSTALACIÓNDE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRELIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42,00			42		$ 20.790,98	$ 873.221,16	$ -	100,00 %	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21,00	3,00	24,00	24		$180.330,15	$ 4.327.923,59	$ (540.990,45)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21,00	3,00	24,00	24		$238.055,44	$ 5.713.330,57	$ (714.166,32)	114,29 %	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22,50	8,50	31,00	31		$304.166,74	$9.429.168,84	$(2.585.417,26)	137,78 %	137,78%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32,35	0,75	33,10	33,1		$222.048,37	$ 7.349.801,01	$ (166.536,28)	102,32 %	102,32%

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 21			
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61,70			61,70		$17.207,77	$1.061.719,44	$ -	100,00 %	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224,21			224,21		$ 4.663,84	$ 1.045.679,27	$ -	100,00 %	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA							$165.727.196,00			

Ilustración 18 *- Actividades Unión Europea Sede B*
Fuente: Propia

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786,72			786,72		$ 7.045,00	$ 5.542.442,56	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96,25	26,21	122,46	122,46		$ 31.110,25	$ 3.809.760,73	$(815.399,55)	127,23%	127,23%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466,58	17,92	484,50	484,50		$ 107.273,69	$51.974.101,11	$(1.922.344,00)	103,84%	103,84%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5,25			-		$ 22.300,62	$ -	$ 117.078,27	0,00%	0,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145,00			145,00		$ 32.594,26	$ 4.726.167,12	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145,00			145,00		$ 42.650,45	$ 6.184.314,87	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 21			
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323,02			323,02		$ 36.752,18	$11.871.653,14	$ 37,00	100,00%	100,00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35,50			35,50		$ 8.680,11	$ 308.143,88	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25,00			25,00		$ 7.469,97	$ 186.749,17	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2,00			2,00		$ 398.950,46	$ 797.900,91	$ -	100,00%	100,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21,00			-		$ 11.761,45	$ -	$ 246.991,00	0,00%	0,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16,80			16,80		$ 91.988,38	$ 1.545.404,84	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258,10	8,38	266,48	266,48		$ 135.394,33	$36.079.203,26	$(1.133.927,00)	103,24%	103,24%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15,52			2,22		$ 66.591,58	$ 147.833,30	$ 885.668,00	14,30%	14,30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103,10			103,10		$ 176.060,25	$18.151.811,59	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129,05			129,05		$ 176.060,25	$22.720.575,03	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87,00			87,00		$ 76.033,93	$ 6.614.951,64	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809,76	-142,50	1667,26	1.667,26		$ 23.042,63	$38.418.051,96	$3.283.574,00	92,13%	92,13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2,00					$1.088.548,32	$ -	$ 2.177.097,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684,78	-162,78	522,00	522,00		$ 11.730,42	$ 6.123.281,59	$ 1.909.479,00	76,23%	76,23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3,00			2,00		$ 5.565,04	$ 11.130,08	$ 5.565,00	66,67%	66,67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323,02			323,02		$ 264.771,67	$85.526.544,13	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35,50			35,50		$ 305.515,84	$10.845.812,21	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484,50	-43,86	440,64	440,64		$ 225.361,76	$99.303.405,31	$ 9.884.367,00	90,95%	90,95%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484,50			440,64		$ 77.589,44	$34.189.010,49	$ 3.403.073,00	90,95%	90,95%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353,72			353,72		$ 18.365,30	$ 6.496.173,31	$ -	100,00%	100,00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2,00	-1,00	1,00	1,00		$12.850.061,48	$12.850.061,48	$12.850.061,00	50,00%	50,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00			4,00		$ 126.905,79	$ 507.623,16	$ 126.906,00	80,00%	80,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118,00			118,00		$ 15.217,85	$ 1.795.706,06	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118,00			118,00		$ 16.070,48	$ 1.896.316,55	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25,00			25,00		$ 180.330,15	$ 4.508.253,74	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22,00			22,00		$ 238.055,44	$ 5.237.219,69	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3,00			3,00		$ 193.810,36	$ 581.431,07	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194,18			194,18		$ 9.167,13	$1.780.074,18	$ -	100,00%	100,00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197,54			197,54		$ 5.046,98	$ 996.981,04	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							$ 482.300.656,68			

Ilustración 19 - *Actividades Arborizadora Baja*
Fuente: *Propia*

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201,02	-802,02	399,00	399,00		$ 4.233,48	$ 1.689.156,84	$3.395.332,00	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51,83			42,00		$ 31.110,25	$ 1.306.630,33	$ 305.813,72	81,03%	81,03%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235,29	20,63	255,92	255,92		$ 32.594,26	$ 8.341.522,00	$(672.419,50)	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,64	1,35	29,99	29,99		$ 22.300,62	$ 668.795,68	$ (30.105,84)	100,00%	100,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55,48	30,02	85,50	85,50		$ 12.649,16	$ 1.081.503,32	$ (379.727,83)	154,11%	154,11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28,00			28,00		$ 20.708,69	$ 579.843,18	$ -	100,00%	100,00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15,05			3,93		$ 66.591,58	$ 261.545,07	$ 740.658,14	26,10%	26,10%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 21			
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17,32			17,32		$ 33.174,37	$ 574.580,07	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28,00			28,00		$ 27.281,50	$ 763.882,01	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66,00			66,00		$ 27.938,51	$ 1.843.941,79	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8,00			8,00		$ 7.469,97	$ 59.759,73	$ -	100,00%	100,00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55,30			49,77		$ 32.569,97	$ 1.621.007,52	$ 180.111,95	90,00%	90,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22,90			22,90		$ 18.687,73	$ 427.949,09	$ -	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 21			
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12,80			12,80		$ 135.394,33	$ 1.733.047,38	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194,67			194,67		$ 135.394,33	$26.357.213,62	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49,31			49,31		$135.394,33	$ 6.676.294,26	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548,06	-548,06	0,00			$ 69.868,54	$ -	$38.292.151,98	0,00%	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158,76			123,83		$ 7.103,01	$ 879.565,91	$ 248.108,19	78,00%	78,00%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171,60	-44,68	126,92	122,00		$ 140.306,40	$17.117.380,80	$ 6.959.197,44	71,10%	71,10%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1,00			1,00		$ 572.567,48	$ 572.567,48	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8,00			8,00		$ 180.330,15	$ 1.442.641,20	$ -	100,00%	100,00%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32,00			32,00		$ 23.315,15	$ 746.084,68	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32,00			32,00		$ 20.790,98	$ 665.311,36	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8,00			8,00		$238.055,44	$ 1.904.443,52	$ -	100,00%	100,00%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55,30			49,77	49,77	$ 130.345,99	$ 6.487.320,16	$ 720.813,35	90,00%	90,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226,69	12,39	239,08	239,08		$ 126.224,49	$30.177.196,69	$(1.563.366,10)	105,46%	105,46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17,44	76,23	93,67	93,67		$ 33.727,50	$ 3.159.254,93	$(2.571.047,33)	537,10%	537,10%
WIN DE ALUMINIO	M	18,00			18,00		$ 15.372,99	$ 276.713,90	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131,00			92,03		$ 98.222,57	$ 9.039.423,54	$ 3.827.733,73	70,25%	70,25%

CPF	523	IED			Fabio Lozano Simonelli			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11,73			11,73		$1.128.301,00	$13.238.355,63	$ (3.384,90)	100,03%	100,03%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47,82			47,82		$ 989.338,00	$47.313.111,17	$ (2.968,01)	100,01%	100,01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80			1,80		$ 989.338,00	$ 1.780.808,40	$ (0,00)	100,00%	100,00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66,72	216,43	283,15	283,15		$ 20.236,50	$ 5.729.964,98	$(4.379.785,70)	424,39%	424,39%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176,38			22,85		$ 6.610,59	$ 151.051,98	$ 1.014.923,88	12,95%	12,95%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI							$194.667.868,22			

Ilustración 20 *- Actividades Fabio Lozano Simonelli*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28	20,48	577,76	577,76		$ 4.233,48	$2.445.932,98	$ (86.702,00)	103,67%	103,67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88,20	-88,20	0,00	-		$154.730,98	$ -	$(13.647.272,19)	0,00%	0,00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54,17			33,24		$ 33.174,37	$1.102.716,03	$ 694.339,54	61,36%	61,36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95,99	-32,70	63,29	63,29		$ 29.391,49	$1.860.302,19	$ 960.987,18	65,94%	65,94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28,37					$707.267,02	$ -	$ 20.065.165,47	0,00%	0,00%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25,81	6,00	31,81	31,81		$829.259,39	$26.378.824,17	$ (4.975.639,28)	123,25%	123,25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1,43			1,43		$798.362,30	$ 1.145.011,22	$ (3.353,12)	100,29%	100,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87,25			63,29		$467.649,33	$29.597.525,99	$ 11.204.877,91	72,54%	72,54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141,20			141,20		$ 9.408,62	$ 1.328.459,99	$ 37,63	100,00%	100,00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141,20			141,20		$ 22.829,47	$ 3.223.429,87	$ 91,32	100,00%	100,00%

CPF	1918	IED			Estrella del Sur Sede B			SEMANA 21			
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141,20			141,20		$ 17.207,77	$ 2.429.668,36	$ 68,83	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577,76			577,76		$ 4.663,84	$2.694.579,45	$ -	100,00%	100,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B							$72.206.450,25			

Ilustración 21 - *Actividades Estrellas del Sur Sede B*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538,32			538,32		$ 4.233,48	$ 2.278.964,69	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78,28	11,72	90,00	90,00		$31.137,23	$ 2.802.350,52	$(364.928,00)	114,97%	114,97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538,32					$ 3.248,63	$ -	$1.748.804,00	0,00%	0,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12,00	12,00		$ 7.469,97	$ 89.639,60	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1,00			1,00		$101.214,88	$ 101.214,88	$ -	100,00%	100,00%

CPF	1918	IED			CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)			SEMANA 21			
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538,82	-118,82	420,00	420,00		$ 36.749,48	$15.434.783,28	$4.366.574,00	77,95%	77,95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841,40	-1486,40	355,00	355,00		$ 23.042,63	$ 8.180.132,94	$34.250.562,26	19,28%	19,28%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44,00			44,00		$130.345,99	$ 5.735.223,77	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538,31	-68,31	470,00	470,00		$264.771,67	$124.442.683,87	$18.086.552,63	87,31%	87,31%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA							**$159.064.993,54**			

Ilustración 22 - *Actividades Calasanz (Buenavista)*
Fuente: *Propia*

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557,28			557,28		$ 4.233,48	$2.359.231,39	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128,18			25,00		$31.110,25	$ 777.756,15	$3.209.955,18	19,50%	19,50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65,03	-39,70	25,33	25,33		$15.633,37	$ 395.993,28	$ 620.644,82	38,95%	38,95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,90			16,47		$32.594,26	$ 536.827,40	$1.676.322,59	24,26%	24,26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27,20			13,34		$21.844,63	$ 291.407,33	$ 302.766,53	49,04%	49,04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372,13			241,34		$13.385,77	$3.230.454,85	$1.750.791,81	64,85%	64,85%

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 21			
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63,87			38,32		$34.724,48	$1.330.642,26	$ 887.210,59	60,00%	60,00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16,47	-16,47	0,00			$18.044,21	$ -	$ -	0,00%	0,00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194,87			194,87		$ 9.443,70	$1.840.293,82	$1.840.293,82	100,00%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59,96			59,96		$91.988,38	$5.515.765,80	$5.515.765,80	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63,33			13,44		$91.988,38	$1.236.323,87	$1.236.323,87	21,22%	21,22%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333,93	1,67	335,60	218,00		$69.679,67	$15.190.376,21	$15.190.376,21	65,28%	65,28%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208,04			118,00		$25.122,94	$ 2.964.506,94	$ 2.964.506,94	56,72%	56,72%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19,60			13,44		$62.023,52	$ 833.596,15	$ 833.596,15	68,57%	68,57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48,00			24,00		$16.863,75	$ 404.730,00	$ 404.730,00	50,00%	50,00%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110,00			110,00		$16.863,75	$ 1.855.012,50	$ 1.855.012,50	100,00%	100,00%

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 21			
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356,60			108,00		$34.369,67	$ 3.711.924,53	$3.711.924,53	30,29%	30,29%
CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,00			6,00	6,00	$68.114,71	$ 408.688,26	$ 408.688,26	100,00%	100,00%
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7,20			7,20	7,20	$157.817,72	$ 1.136.287,57	$ 1.136.287,57	100,00%	100,00%
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6,00			6,00	6,00	$101.978,47	$ 611.870,81	$ 611.870,81	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335,60			110,00		$361.355,09	$39.749.059,39	$39.749.059,39	32,78%	32,78%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA							**$84.380.748,53**			

Ilustración 23 - *Actividades Santa Librada*
Fuente: *Propia*

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20,56			20,56		$ 4.233,48	$ 87.040,26	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40,30	-31,81	8,49	8,49		$ 31.110,25	$ 264.138,88	$ 989.604,00	21,07%	21,07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-2,22	17,30	17,30		$ 32.594,26	$ 563.880,63	$ 72.359,00	88,63%	88,63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-5,96	13,56	13,56		$ 22.300,62	$ 302.396,45	$ 132.912,00	69,47%	69,47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,65	-2,49	38,16	38,16		$ 12.649,16	$ 482.692,01	$ 31.496,00	93,87%	93,87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19,52	-4,52	15,00	15,00		$ 20.708,69	$ 310.630,28	$ 93.603,00	76,84%	76,84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,36	-5,02	6,34	6,34		$ 33.174,37	$ 210.325,50	$ 166.535,00	55,81%	55,81%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15,00			15,00		$ 27.281,50	$ 409.222,50	$ -	100,00%	100,00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15,00			15,00		$182.479,27	$2.737.188,99	$ -	100,00%	100,00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19,52			19,52		$ 42.650,45	$ 832.536,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,52	-1,99	17,53	17,53		$126.224,49	$2.212.715,38	$ 251.187,00	89,81%	89,81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0,80			0,80		$ 67.218,91	$ 53.775,13	$ -	100,00%	100,00%
WIN DE ALUMINIO	M	3,00			3,00		$ 15.372,99	$ 46.118,98	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44,84			40,81		$116.158,86	$4.740.210,72	$ 468.353,00	91,01%	91,01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5,20			5,20		$707.267,02	$3.677.788,50	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2,16	0,12	2,28	2,28		$1.127.967,67	$2.571.766,29	$ (135.356,00)	105,56%	105,56%

CPF	1917	IED			ESTRELLA DEL SUR (IED) A			SEMANA 21			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7,00	1,00	8,00	8,00		$873.470,75	$6.987.765,98	$ (873.471,00)	114,29%	114,29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00			2,00		$616.820,66	$1.233.641,32	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5,00			5,00		$404.611,28	$2.023.056,40	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2,00			2,00		$ 41.130,01	$ 82.260,02	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28,82	12,82	41,64	41,64		$ 989.338,20	$41.196.042,70	$(12.683.316,00)	144,48%	144,48%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1,80	-0,80	1,00	1,00		$989.338,20	$ 989.338,20	$ 791.471,00	55,56%	55,56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44,84			40,81		$ 36.193,65	$1.476.990,67	$ 145.933,00	91,01%	91,01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35,50			35,50		$ 21.599,09	$ 766.767,73	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2,16			2,16	2,16	$123.260,52	$ 266.242,73	$ -	100,00%	100,00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111,32			100,19		$ 4.663,84	$ 467.270,00	$ 51.909,00	90,00%	90,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A							$75.074.063,00			

Ilustración 24 *Actividades Estrella del Sur Sede A*
Fuente: *Propia*

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125,48			56,47		$ 4.233,48	$ 239.064,38	$ 292.152,00	45,00%	45,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68,00			27,20		$31.110,25	$ 846.198,69	$1.269.298,00	40,00%	40,00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129,54			56,06		$32.594,26	$1.827.233,99	$2.395.026,00	43,28%	43,28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150,00			76,50		$11.376,96	$ 870.337,46	$ 836.207,00	51,00%	51,00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40,00			10,00		$ 7.469,97	$ 74.699,67	$ 224.099,00	25,00%	25,00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100,00			15,00		$18.687,73	$ 280.316,00	$1.588.457,00	15,00%	15,00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364,26			129,31		$12.649,16	$1.635.663,09	$2.971.921,00	35,50%	35,50%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7,20			5,10		$65.869,81	$ 335.936,02	$ 138.327,00	70,83%	70,83%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	22,00			8,80		$20.708,69	$ 182.236,43	$ 273.355,00	40,00%	40,00%

CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 21			
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)											
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,61			7,56		$33.174,37	$ 250.798,23	$ 631.972,00	28,41%	28,41%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78,00			26,00		$27.281,50	$ 709.319,01	$1.418.638,00	33,33%	33,33%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35,00			18,85		$61.099,39	$1.151.723,50	$ 986.755,00	53,86%	53,86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129,54			101,94	37,70	$126.224,49	$12.867.324,94	$3.483.796,00	78,69%	78,69%
WIN DE ALUMINIO	M	30,00			18,00	10,00	$ 15.372,99	$ 276.713,90	$ 184.476,00	60,00%	60,00%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364,26			177,00		$ 36.193,65	$6.406.276,90	$6.777.624,00	48,59%	48,59%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364,26			120,20	21,95	$98.222,57	$11.806.353,47	$23.972.202,00	33,00%	33,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							$ 39.760.195,66			

Ilustración 25 *Actividades Guillermo Cano Isaza*
Fuente: *Propia*

CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 21			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193,00			193,00		$ 4.294,19	$ 828.777,76	$ -	100,00%	100,00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39,00			26,00		$31.110,25	$ 808.866,40	$ 404.433,00	66,67%	66,67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24,83			24,83		$38.696,24	$ 960.827,52	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44,28			44,28		$361.355,09	$16.000.803,20	$ -	100,00%	100,00%
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44,28			44,28	44,28	$ 65.757,83	$ 2.911.756,81	$ -	100,00%	100,00%
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150,00			97,50		$404.730,00	$39.461.175,00	$21.248.325,00	65,00%	65,00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							$60.972.206,69			

Ilustración 26 Actividades Tenerife – Granda Sur
Fuente: *Propia*

3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo se mantiene la atención de la emergencia en la DILE de Usme (Dirección Local de Educación de Usme), correspondiente a las actividades de impermeabilización en la placa de los tanques de almacenamiento de agua. A la fecha, la atención de esta emergencia presenta un porcentaje de ejecución del 81.58%.

Para este mismo periodo se cuenta con un presupuesto aproximado para la realización de la emergencia en el DILE (Dirección Local de educación de Usme) por un valor de $ 45.000.000), para la fecha del presente informe el contratista CONSORCIO PAIS, presento un balance para la emergencia contando con un presupuesto actualizado de $ 26.605.858.

De igual forma fueron asignadas dos nuevas emergencias al contratista Consorcio País, una en el colegio Arborizadora Baja sede A por un valor aproximado de $ 35.000.000, y la segunda para el colegio Calasanz Buena Vista con un valor aproximado para la emergencia de $ 100.413.274, se encuentra a la espera de unos ajustes a la programación para que inicien las emergencias.

3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

3.4.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

3.4.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección

El personal clave para el Grupo 2, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-043-L6- REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6**, enviado a la Secretaría de Educación Distrital SED se dio aprobación a los profesionales del contratista, sin embargo posteriormente, mediante oficio **SERINCO-SDE-2025-330-L6 CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6**, se realizó el cambio de los profesionales correspondientes a residente e inspector; por lo tanto, esta interventoría dio aprobación a las siguientes hojas de vida:

PERSONAL MINIMO DE OBRA		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR	WILSON LEONARDO PARRA ROBLES	100%
RESIDENTE	RONAL JAIR CLAVIJO	100%
ESTRUCTURAL	JIMMY VERGARA SILVA	10%
AMBIENTAL	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	20%
PROF. SST	YONH JAIRO GUARIN PATERNINA	10%
ESP. ELÉCTRICO	CAMILO ANDRES LANCHEROS COY	10%
ESP. HIDROSANITARIO	JEISSON ARNULFO SIERRA LEÓN	10%
PROF. DE COSTOS	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	10%
TÉCNICO SST 1	CINDY LORENA RIVERA	100%
TÉCNICO SST 2	EDINSON FABER FORERO BARRANTE	100%
INSPECTOR DE OBRA 1	ALVARO ZAMIR BENITEZ MENDOZA	100%
INSPECTOR DE OBRA 2	IVAN BAUTISTA MACIAS	100%

3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO PAIS es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CINETO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRENITA Y TRES PESOS M/CTE. ($2.215.148.733)

Y se cuenta con una adición por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($785.001.422) INC.IVA

3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES

los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L5-2025-074

3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para el periodo del presente informe, se tiene previsto un presupuesto aproximado de $45.000.000 para la atención de la emergencia en el DILE (Dirección Local de Educación de Usme). A la fecha, esta emergencia presenta un balance de $26.605.858.

Para el desarrollo de este componente, el contrato cuenta con un presupuesto total asignado de ***CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($416.900.290,00),*** destinado exclusivamente a la atención de emergencias, el cual será utilizado conforme a las necesidades que se presenten y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la SED y la interventoría.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.6 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8154780.

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1642	20/02/2025	4924	03/09/2025	$2.332.049.023
3697	05/12/2025	7577	22/12/25	$785.001.422
TOTAL				$3.117.050.445

Tabla 6 - *Certificado disponibilidad presupuestal*
Fuente: *Propia*

3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.1.3	Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico.
1.1.6	Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención)
1.2.4	Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.6	Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.8	Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.9	Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.10	Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.13	Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.17	Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados)

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
1.2.18	Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.19	Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.20	Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.21	Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.23	Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.24	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.32	Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados)
1.2.33	Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados)
1.2.36	Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.2.40	Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas)
1.2.41	Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel)
1.2.47	Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.3.1	Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado)
1.4.1	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada)
1.4.2	Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad. incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados
1.4.4	Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
1.4.7	Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados)
2.1.1	Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
2.1.2	Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
2.1.6	Relleno con material seleccionado
2.1.8	Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación)
2.2.1	Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero)
2.2.4	Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero)
2.2.7	Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo.
2.2.13	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación.
2.3.5	Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo requerido para su correcta ejecución y funcionamiento).
2.4.1	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi
2.4.2	Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m
2.5.1	Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura)
3.1.4	Muro ladrillo prensado macizo
3.1.7	Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones.
4.2.3	Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios
4.2.4	Suministro e instalación accesorios PVC-S 4"
4.2.11	Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios
4.5.1	Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2"
4.5.2	Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2"
4.5.5	Suministro e instalación punto sanitario 4"
4.5.6	Suministro e instalación punto sanitario 2"
4.6.1	Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2"
4.7.1	Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada
4.7.3	Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada
4.7.7	Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados)
4.8.1	Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)
4.8.2	Suministro e instalación geotextil nt 1600
4..9.12	Sondeo y revisión de desagües

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
5.1.1	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.3	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.5	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.10	Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra
5.1.15	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka
5.1.25	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.26	Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación.
5.1.38	Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación.
5.1.40	Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados
5.1.46	Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre
5.1.47	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050.
7.1.1	Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04
7.2.1	Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado
7.2.10	Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm
7.2.15	Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba
7.2.17	Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores
7.2.37	Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45
9.1.1	Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
	instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas.
9.2.2	Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco)
9.3.7	Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte)
9.3.10	Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso
10.1.5	Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
10.1.7	Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push)
10.1.11	Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de 3 c
10.1.12	Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón)
10.1.15	Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica
10.1.16	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3"
11.1.4	Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1"
11.1.10	Desinstalación de parque infantil en zona verde.
11.1.10	Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde.
12.1.2	Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado)
12.1.7	Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm
12.1.9	Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (incluye andamio certificado)
12.2.1	Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados)
12.2.2	Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm)
12.2.3	Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado
12.2.4	Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados)
12.2.5	Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados)
12.3.1	Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras
12.3.2	Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica

LISTADO DE ITEMS DE APU´s APROBADOS	
ITEM	**DESCRIPCION**
14.1.2	Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm
16.1.1	Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado
16.1.3	Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados)
16.1.11	Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2
16.1.13	Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente)
16.1.15	Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación
16.1.18	Suministro e instalación de cubierta modular tipo sándwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente instalados).
16.1.19	Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sándwich
16.1.20	Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica
16.1.21	Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm
16.1.22	Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte.
16.1.25	Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina)
18.1.1	Aseo general final y limpieza
18.1.4	Protección provisional de elementos y superficies existentes con cartón corrugado, plástico o similar (incluye retiro y disposición).

Tabla 7 - Listado APU´S
Fuente: *Elaboración Propia*

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO PAIS presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO a través del oficio SERINCO-SDE-L6-2025-040.

3.5.5 ESTADO FINANCIERO

A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista Consorcio País a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.2 Informes Semanales.

B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.

ACTA	%	VALOR	ESTADO
1	11,6%	$ 361.718.611,00	PAGADO
2	13,97%	$ 435.348.486,00	PAGADO
TOTAL	**25,57%**	**$ 797.067.097,00**	

Tabla 8 - *Pagos Realizados*
Fuente: *Elaboración Propia*

3.6 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias durante el presente periodo que han afectado la realización actividades en exterior. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO PAÍS**, en el informe técnico, presenta las fichas técnicas de los materiales utilizados en las actividades de obra, los ensayos de laboratorio realizados se evidencian en los informes mensuales anteriores.

Anexo 3. Ensayo de Laboratorio

3.8 OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	Si cumple, el contratista consorcio País subió las pólizas a la plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
2	Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.	Cumple con lo estipulado en el contrato	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
3	Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Cumple aplica para el presente periodo	Al momento del presente periodo se ha realizado el pago del acta parcial No.1, y el pago del acta parcial No.2
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.	Cumple	
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por	El contratista a la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.		
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones	Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo al contrato y acta de inicio.	
8	Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	No aplica para el presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	a la fecha del presente informe cumple con los requerimientos	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento	Cumple Parcialmente	De acuerdo a los avances presentados debe presentar un plan de contingencia para cumplir con la obligación
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.		
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple, a la fecha no se han presentado reportes negativos de acuerdo a la obligación.	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	A la fecha el contratista cumple con lo estipulado en la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato.	A la fecha cumple con lo estipulado en la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.	Cumple a la fecha con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Cumple a la fecha con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
17	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Cumple	Se presentan en el informe mensual del contratista
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.	Cumple para el presente periodo del informe	
19	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	No aplica para el presente periodo.	
20	El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Cumple no se ha reportado nada referente a la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
22	El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Cumple	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Cumple	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Cumple a la fecha con la obligación	
25	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	Cumple a la fecha con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Cumple	
27	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
28	Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Cumple	
29	Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Cumple	
30	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Cumple a la fecha la obligación	
31	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.	No aplica.	A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan.
32	Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
33	Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No aplica	No se ha presentado aun la información que la obligación requiere.
34	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No aplica para el presente periodo.	
35	Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo.	
36	Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo.	
37	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal.	No aplica para el presente periodo.	
38	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Cumple	
39	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra.	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
40	Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Cumple, de haber afectaciones el contratista deberá reparar o restituir lo que llegase a dañar.	
41	Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015.	No aplica para el presente periodo.	
42	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Cumple	
43	Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas.	Cumple, se presenta cada mes y cada vez que un nuevo personal ingresa a los frentes de obra.	
44	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión.	Cumple para el periodo del presente informe	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
45	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Cumple para el periodo del presente informe	
46	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	No aplica para el presente periodo.	
47	Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	Cumple	
48	El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato.	A la fecha el contratista no ha requerido de dar respuesta en los días que estipula la obligación	
49	Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría.	Se cuenta con el avance semanal que realiza la interventoría	
50	El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de	Cumple	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025.		

Tabla 9 - *Obligaciones Generales Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93).	Cumple, el contratista realizo la entrega de los documentos estipulados en la obligación	
2	Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación y subió las pólizas a la	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior.	plataforma SECOP II, las cuales fueron aprobadas el día 29/10/2025	
3	Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio.	El contratista realizo la entrega de la documentación requerida en la obligación a la entidad y subió el acta de inicio a la plataforma SECOP II, el día 09/10/2025	
4	Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar	La interventoría remitió mediante oficio SERINCO-SDE-L6-2025-012 en el cual se le requería al contratista la documentación mencionada en la obligación mencionada.	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido.		
5	Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos.	Cumple	
6	Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave.	Cumple	
7	Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes.		
8	Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.	Cumple con la obligación	
9	Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital".	Cumple con la obligación	
10	Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales).	Cumple con la obligación	
11	Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin.		
12	Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	SED. El Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras.		
13	Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El	Cumple	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra.		
14	Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas.	Cumple con la obligación	
15	Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias.	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
16	Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta obligación, el contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación.	Cumple con la obligación	
17	Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
18	Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos.	Cumple con la obligación	
19	Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
20	Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades." del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad.	Cumple con la obligación	
21	Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes.	No aplica para el presente periodo	
22	Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato	No aplica para el presente periodo	
23	Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.	No aplica para el presente periodo	
24	Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos.		
25	Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio.	Cumple con la obligación	
26	Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente	Cumple con la obligación	
27	Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED.	No aplica para el presente periodo	
28	Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales.		
29	Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas.	Cumple con la obligación	

Tabla 10 - *Obligaciones Especificas Contratista*
Fuente: *Elaboración Propia*

4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS "
CONTRATISTA	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8169110
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA
VALOR ADICIÓN	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA
VALOR FINAL	NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($924.609.851,00) INC. IVA
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
PRORROGA	UN MES (01) Y QUINCE DIAS (15)

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE JUNIO DE 2026
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME

Tabla 11 - *Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia.*

4.1.1. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ACTA DE INICIO suscrita el 6 de octubre de 2025.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 0		
TIPO DE MODIFICACION	POR SUSCRIPCION DE CONTRATO		
FECHA DE EXPEDICION	09/09/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	04/10/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	04/04/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/04/2026	04/04/2031	$ 159.236.827,00
ACTA DE INICIO			
PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2		
TIPO DE MODIFICACION	POR ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICION	08/10/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	06/10/2025	05/11/2026	$ 159.236.827,00
PRESTACIONES SOCIALES	06/10/2025	06/05/2029	$ 79.618.414,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/05/2026	06/05/2031	$ 159.236.827,00
MODIFICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA			

PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	BCH – 100046043 – Anexo 6		
TIPO DE MODIFICACION	POR MOFICICACION No.1 – ADICION Y PRORROGA		
FECHA DE EXPEDICION	31/12/2025		
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEFGURADO**
	INICIO	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO	04/09/2025	20/12/2026	$ 184.921.970,20
PRESTACIONES SOCIALES	04/09/2025	20/06/2029	$ 92.460.985,10
CALIDAD DEL SERVICIO	20/06/2026	20/06/2031	$ 184.921.970,20

Tabla 12 - *Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110*
Fuente: *Propia*

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.2.1 ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Presentación y revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados de acuerdo con los alcances y el presupuesto contractual.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra.
- Elaboración de informes semanales de interventoría No.17, No.18, No.19, No.20, No.21.
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.
- Elaboración de comunicaciones referentes a estados de cada frente de obra, solicitudes de planes de contingencia teniendo en cuenta los atrasos en cada frente
- Elaboración de comités de obra.
- Elaboración de informes Mensuales de acuerdo con el periodo de corte.

Anexo 4. Actas de comité

Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:

- Se valida y se da aprobación del Plan de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista de obra Consorcio País.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio País.
- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.
- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio País.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio País.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas.
- Organización documental.
- Se realiza seguimiento al plan ambiental con enfoque PIGA.
- Se identifica la adecuación de puntos de acopio para la acumulación de los materiales RCD generados a partir de las demoliciones realizadas.
- Se realiza retiro de material RCD.
- Se identifica ingreso de material pétreo a la obra.
- No se realiza aprovechamiento ni circularidad de RCD por el contratista de obra en el presente periodo.
- El contratista da cumplimiento al cronograma de capacitaciones ambientales y el plan de trabajo de este.

4.2.2 TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Visitas técnicas de verificación de cantidades y avances en cada una de las instituciones educativas.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de

la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.

- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos, de igual forma revisión y validación de ítems No previstos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Revisión y aprobación de los planes ambientales (PMA-RCD y PIGA), verificando su alineación con los lineamientos de la SED y las normas ambientales aplicables.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.
- Revisión de acta de corte de obra y de igual forma revisión de informes mensuales de cada uno de los componentes

4.2.3 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.
- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.
- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales, y de igual forma se realizó la revisión de los ítems no previstos para ser aprobados por parte de la supervisión

- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, de igual forma cada uno de los balances de acuerdo con las actividades que se encuentran en ejecución con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.
- Revisión semana por semana para verificación de actividades realizadas y de avances de obra.
- Revisión de acta parcial de obra, para el respectivo trámite ante la entidad contratante.

4.2.4 LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se realiza la revisión de los informes mensuales de acuerdo al periodo.
- Se realiza la elaboración de los informes mensuales de acuerdo a cada uno de los periodos incluyendo el de mención del 06 de marzo de 2026 al 05 de abril de 2026. En el cual se consolida la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental.

4.3 RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

4.3.1 PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Tres (3) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista estructural
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Especialista en Redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio
- Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
- Un (1) Asesor jurídico
- Seis (6) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Seis (6) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA*** se radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S-2025-320192_RTA da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido".* Posteriormente, mediante el oficio SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA, la

interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	Héctor Villazón Gutiérrez	100%
Profesional de apoyo	Viviana Miranda Cañón	100%
Residentes de Interventoría (3)	Ana Pardo Duarte	100%
	César Carvajal González	
	Jhon Quintero Acevedo	
Especialista Estructural	Juan Cortés Cortés	30%
Especialista Ambiental	Luis González Camargo	60%
Especialista en redes eléctricas, Telefónicas, Voz y datos	Daniel Gómez Sánchez	30%
Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio	Luis González Camargo	30%
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	Ana Bermúdez Hernández	30%
Profesional de costos presupuestos y programación de obra	Edwin Sierra Hernández	30%
Asesor Jurídico	Alejandra Nieto Puentes	15%
Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo (6)	Fabian Adolfo Paredes Serrano	100%
	Johanna Henao Cristancho	
	José Vanegas López	
	Marilyn Ospina López	
	Shirley Castillo Curieux	
	Diana Yanneth Reyes Mora	
Inspectores de interventoría (6)	Julieth Ceballos García	100%
	John Castañeda Mesías	
	Iván Rene Molano Gallo	
	Carlos Santiago Buitrago	
	Humberto Bernal Lozano	

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
	Camilo Andrés Cardenas	

Tabla 13 - *Personal de Interventoría*
Fuente: *Propia*

Anexo 5. Planillas de pago
Anexo 6. Certificado pago Parafiscales

4.3.2 EQUIPO

CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

4.4 INFORMACION FINANCIERA

4.4.1 PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).

Y se cuenta con una adición por un valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

CDP	FECHA	RP	FECHA	VALOR RP
1984	05/03/2025	5012	05/09/2025	796.184.131
3698	5/12/2025	7587	23/12/2025	128.425.720
TOTAL				924.609.851

Tabla 14 - *Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*
Fuente: *Propia.*

4.4.2 ESTADO FINANCIERO

A. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se encuentra pendiente el pago de costo fijo No. 4 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.496.236), al igual que el acta de costo variables No. 4 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($33.730.926).

ACTA	%	VALOR	VALOR VARIABLE – LOTE6	PAGO
Costo fijo No. 1	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 2	4,92%	$45.496.236	N/A	$45.496.236
Costo fijo No. 3	4,92%	$45.496.236,06	N/A	$45.496.236,06
Costo Variable No. 3	10,39%	$96.091.514,94	$18.180.024,14	$96.091.514,94
Costo fijo No. 4	4,92%	$45.496.236	N/A	$ 45.496.236
Costo Variable No. 4	3,65%	$33.730.926	$8.792.235,88	$ 33.730.926
Costo Fijo No.5	4.92%	$45.496.236	N/A	PENDIENTE POR PAGO
Costo Variable No.5	7.38%	$68.226.931	N/A	PENDIENTE POR PAGO
TOTAL		**$425.530.552**	**$26.972.260,02**	**$311.807.385**

Tabla 15. *Pagos realizados a la interventoría*
Fuente: *Elaboración Propia*

Anexo 7. Acta De Interventoría

5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO PAIS, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad

requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.
- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.
- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo a las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.

A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

CONTRATISTA	CONTRATO	LOTE	FECHA DE ENTREGA	VERSIONES	ESTADO
CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CO1.PCCNTR.8155135	4	26 de septiembre de 2025 3 de octubre de 2025 8 de octubre de 2025 23 de octubre de 2025	V0 V1 V2 V3	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO FORTALEZA	CO1.PCCNTR.8154895	5	15 de octubre de 20225 23 de octubre de 2025	V0 V1	PARCIALMENTE APROBADO
CONSORCIO PAIS	CO1.PCCNTR.8154780	6	22 de septiembre de 2025 22 de octubre de 2025	V0 V1	APROBADO

***Tabla 14**. Plan calidad*
***Fuente:** Propia*

TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 6

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.



El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Alcance
2. Descripción del proyecto
3. Necesidad
4. Conveniencia
5. Impacto del proyecto
6. Directrices organizacionales
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos
8. Liderazgo y compromiso
9. Entradas del Plan de Calidad
10. Roles y autoridades
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
12. Planificación de cambios
13. Apoyo
14. Operación

15. Auditorias
16. Ponderación
17. Registros

El contratista entrega un Plan integral con el desarrollo de la mayoría de los contenidos requeridos para el aseguramiento de la calidad. Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación. Adicionalmente se solicita la revisión del alcance de los controles de los ensayos e inspecciones de las actividades según la normativa. El contratista hace la subsanación y complementación y se aprueba.

6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades de demolición:

- Colegio Santa Librada, demolición placa maciza perteneciente a la conexión de la bajante con la caja de inspección.

El material producto de las excavaciones fue acopiado temporalmente en sitio y retirado en menos de 24 horas.

El contratista aporta los certificados y reportes en los anexos del Decreto 507 de 2023, correspondientes al mes de febrero 2026, de igual forma presenta los vales del transporte de RCD en el mes de marzo 2026 a las escombreras CEMEX y GRECO, y los soportes de solicitud de certificados a los mismos, para realizar el reporte en la plataforma web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Es importante señalar que, el contratista realizó el cargue correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, en la plataforma web de la Secretaría Distrital de Ambiente.

MANEJO DE ESCOMBRO.

Este proyecto contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de aproximadamente **1521 Toneladas**, según los estudios técnicos preliminares realizados.

Los escombros generados durante este período fueron retirados en un plazo máximo de **24 horas** tras su producción, dado que el proyecto se desarrolla en una zona de alto tránsito peatonal.

Para el mes de febrero, el Consorcio País realizó la entrega de los certificados de disposición final de RCD correspondientes al mes de febrero (mes vencido), en planta de aprovechamiento GRECO, por una cantidad de **17,92 Ton – 14 m3**, los cuales son certificados como material de aprovechamiento.

Así mismo, el contratista reporta para el mes de marzo de 2026, el retiro y disposición final de RCD de **29 m3 – 37,12 Ton**, generados por las actividades de demolición, el cual fue dispuesto en **GRECO y CEMEX** y se encuentra pendiente su certificado, el cuál será remitido en el siguiente informe.

El contratista CONSORCIO PAÍS, no dispuso residuos de construcción en zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto.





TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

Durante este periodo, se llevó a cabo la disposición final de **37,12 Toneladas** de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, asegurando su traslado hasta los sitios de disposición (CEMEX y GRECO). Esta labor se ejecutó utilizando volqueta sencilla, las cuales se encontraban debidamente carpadas, sin exceder su capacidad.

El transporte de los escombros se efectuó en horarios planificados para evitar interferencias con las horas pico del tráfico vehicular y respetando los horarios de descanso de los residentes del sector. Además, se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por las autoridades de tránsito competentes.

PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio País, manifiesta no haber hecho ingreso de materiales insumo como pétreos o no pétreos, por tanto, no se presentan cantidades ni certificados de los proveedores.

PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES.


CONSORCIO PAÍS, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligroso entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los

residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas. Los residuos ordinarios se separaron según el PGIRS y se entregaron a cada una de las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá.



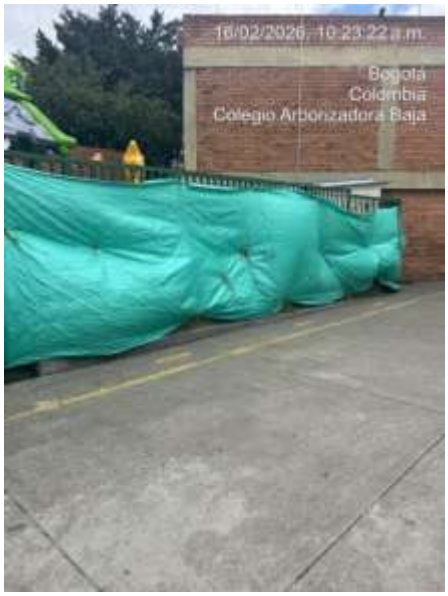

DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio País, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que las actividades se realizan al interior de las instituciones educativas, no se han realizado actividades que requieran de retroexcavadoras, ni vibrocompactadores, por tanto, no se tienen establecidos Planes Estratégicos Viales.

Sin embargo, para el retiro de residuos de construcción y demolición, si se hace uso de volquetas sencillas, las cuales realizan el transporte de dichos residuos a los sitios autorizados, los cuales, tal y como se mencionó con anterioridad al retirarse de los sitios de obra, van debidamente carpados y sin exceso de carga, las cuales dan cumplimiento a las normativas de tránsito.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para este periodo se trabajó con la siguiente maquinaria amarilla y volquetas:

- Volquetas sencillas.

PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, el contratista realizó capacitaciones en los siguientes temas ambientales:

- Uso y ahorro de agua,
- Prevención de la contaminación atmosférica,
- Control de material particulado.

MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el periodo evaluado, se identificaron actividades de manejo y disposición de los residuos generados en obra, así como medidas de orden, aseo y limpieza en cada uno de los frentes de trabajo.







PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES.

En el presente periodo reportado, se realizaron excavaciones manuales para tubería sanitaria, y excavación de grava común y tierra negra.

Tal como se ha mencionado en el desarrollo del informe, dicho material de excavación, se ha dispuesto debidamente en los sitios autorizados.

RELLENOS.

Durante el presente periodo, no se realizaron actividades de relleno, de acuerdo con lo reportado por el contratista.

PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

De manera semanal, el contratista ejecutó labores de limpieza, organización y mantenimiento en las vías de acceso de entrada y salida, garantizando que permanecieran libres de escombros y materiales en las zonas donde se realizaron retiros de RCD.

PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

PRELIMINARES.
No aplico en el periodo.

DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes

EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES

No aplico en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien avisará a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.
- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas

Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.
2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

    - Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
    - Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
    - Control de actividades de alto riesgo mediante:
    - Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
    - Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
    - Validación de documentación del personal idóneo.
    - Permisos de trabajo seguro en alturas.
    - Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
    - Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

6	1913	CIUDAD BOLIVAR	SIERRA MORENA	C – DIVINO NIÑO	TV 46 A No 79 D 15 SUR

COLEGIO SIERRA MORENA

Actividades:

1. Instalación Eléctrica y superboard

	**Observación del hallazgo:** Durante los recorridos de verificación no se evidenció personal ejecutando actividades en obra. No obstante, se requirió al contratista la implementación inmediata de medidas de orden y aseo en las áreas intervenidas, así como garantizar la adecuada disposición final de los materiales y residuos generados. Así mismo, se solicitó el reforzamiento del cerramiento del área, con el propósito de asegurar condiciones óptimas de seguridad, delimitación y control del sitio.

6	1904	CIUDAD BOLIVAR	ARBORIZADORA BAJA	A - ARBORIZADORA BAJA	CL 59 I SUR No 44 A 02

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA

Actividades:

1. fundida de bordillos y tapa de cajas
2. Fundida de placa para adecuación del cuarto de basuras


Bogotá
Colombia
Colegio Arborizadora Baja




Bogotá
Colombia


111951
Bogotá
Colombia





Observación del hallazgo:
Se verificó el adecuado cerramiento, así como la correcta señalización y demarcación del área de construcción. De igual manera, se constató el uso apropiado de los elementos de protección personal por parte del personal en obra.

Así mismo, se requirió al contratista mantener condiciones óptimas de orden y aseo antes, durante y después de la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y accidentes derivados de condiciones inseguras.

6	546	USME	SANTA LIBRADA	A – SANTA LIBRADA	CL 75 A SUR No 1 B 45 ESTE

COLEGIO SANTA LIBRADA









Observación del hallazgo:
Durante las actividades de lavado de piso en la terraza, se verificó el uso adecuado de los elementos de protección personal (casco, guantes, gafas y botas de seguridad). No se evidenciaron actividades clasificadas como de alto riesgo.


Así mismo, se constató el traslado de materiales de manera segura, empleando ayudas mecánicas y herramientas adecuadas, con el fin de prevenir lesiones asociadas a la manipulación manual de cargas.

6	581	USME	ORLANDO FALS BORDA	A – BARRANQUILLITA NUEVO	KR 12 No 72 60 SUR

COLEGIO ORLANDO FALS BORDA





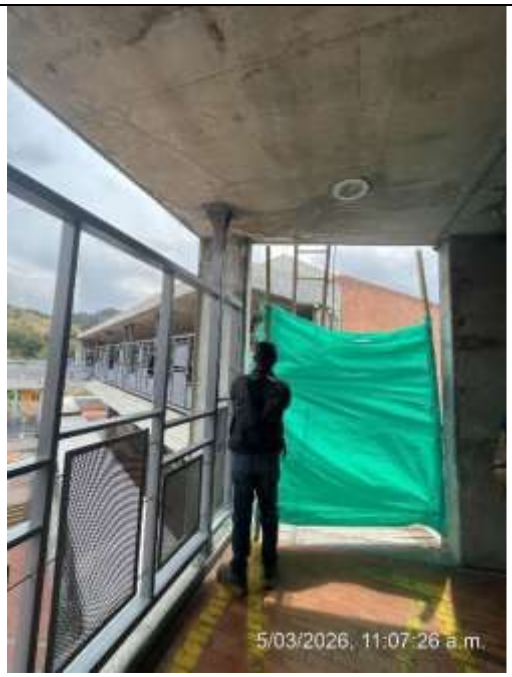



Observación del hallazgo:
Durante la verificación en campo se identificó la ejecución de actividades clasificadas como de alto riesgo sin la implementación de las medidas de prevención y control requeridas. En particular, se evidenciaron escaleras de acceso sin el debido aseguramiento, constituyendo una condición insegura

reiterativa y en contravención de la normatividad vigente en materia de trabajo en alturas.

Así mismo, se observó que el área de intervención carecía de señalización y demarcación adecuada, incumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución 4272 de 2021, en lo referente a la delimitación y control de áreas para la ejecución de trabajos en altura.

En cumplimiento de las funciones de interventoría y con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, se dejó constancia en bitácora de la suspensión inmediata de las actividades, hasta tanto el contratista implemente y evidencie el cumplimiento integral de los requisitos normativos aplicables en materia de trabajo seguro en alturas.

6	523	USME	FABIO LOZANO SIMONILLI	A – FABIO LOZANO SIMONELLI	KR 4 ESTE No 65 31 SUR

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI










11/03/2026, 11:08:35 a.m.




13 mar 2026 1:55:30 p.m.
Calle 65 Sur
Usme
Bogotá, D.C.







Observación del hallazgo:
Durante los recorridos de interventoría se verificó que el personal contaba con los elementos de protección personal acordes con las actividades ejecutadas y los peligros asociados. Así mismo, se evidenciaron condiciones adecuadas de orden y aseo, así como el retiro de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en obra; en consecuencia, se solicitó al contratista la presentación de los certificados de disposición final correspondientes.

De igual manera, se verificó el adecuado cerramiento del área intervenida. En los espacios correspondientes a la cancha, se requirió al contratista mantener condiciones óptimas de orden y aseo antes, durante y después de la ejecución de las actividades, con el fin de prevenir incidentes y accidentes asociados a riesgos locativos.

6	1959	CIUDAD BOLIVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A – GUILLERMO CANO	KR 16ª # 62-35 SUR

COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA


Carrera 16C 62-93
111951
Bogotá
Colombia



Carrera 16C 62-93
111951
Bogotá
Colombia


9/03/2026, 10:13:11 a.m.
Carrera 16C 62-93


11/03/2026, 11:22:54 a.m.
Carrera 16C 62-81
111951
Bogotá
Colombia



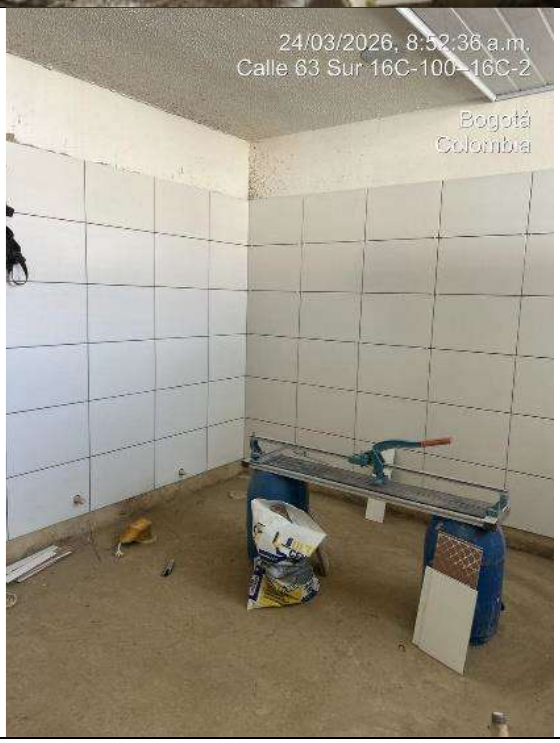


24/03/2026, 8:52:36 a.m.
Calle 63 Sur 16C-100-16C-2
Bogotá
Colombia


24/03/2026, 8:42:45 a.m.
Carrera 16C 62-93
111951
Bogotá
Colombia









Observación del hallazgo: Durante el recorrido de verificación se constató la adecuada implementación de la señalización de seguridad y el cerramiento del área de trabajo. Así mismo, se evidenciaron condiciones satisfactorias de orden y aseo, incluyendo el retiro

de materiales de obra. En este sentido, se solicitó al contratista la presentación de los certificados de disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD).

De igual manera, se verificó que el personal en obra cumpliera con el uso adecuado de los elementos de protección personal, conforme a las actividades ejecutadas y los riesgos asociados.

6	1974	CIUDAD BOLIVAR	CALASANZ BUENA VISTA	A – BUENA VISTA	CL 59 I SUR N 44 A 02

COLEGIO BUENAVISTA IED (CALAZANS) SEDE A





Observación del hallazgo: Durante la visita de campo, la interventoría requirió al contratista el cumplimiento estricto de lo establecido en la Resolución 4272 de 2021, en materia de trabajo seguro en alturas. En este sentido, se solicitó la implementación y socialización del plan de rescate, así como la aplicación del procedimiento de Trabajo Seguro en Alturas (TSA), con el fin de validar las condiciones de seguridad en la ejecución de las actividades.

En atención a las omisiones evidenciadas, se procedió a realizar los respectivos llamados de atención formales al profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dejando la correspondiente trazabilidad documental.

Con el fin de dejar trazabilidad de la novedad, se dejó constancia en bitácora de la suspensión de las actividades, hasta que se cumplieran con los estándares de seguridad en trabajo en altura.

FRENTES DE OBRA CON EL 100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, CONFORME A LO PROGRAMADO.

6	1930	CIUDAD BOLIVAR	UNION EUROPEA	B – MARIA CANO (UNION EUROPEA)	CL 69 B SUR No 17 N 92

6	1918	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	B – ESTRELLA II	CL 75 SUR No 18 B 45
6	1917	CIUDAD BOLIVAR	ESTRELLA DEL SUR	A – ESTRELLA I	KR 17 P No 72 25 SUR

VERIFICACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA Y GESTIÓN ADELANTADA POR LA INTERVENTORIA














Durante el mes de marzo se realizó la entrega de los elementos de protección personal (EPP) conforme a las actividades ejecutadas en obra. Así mismo, se verificó el uso adecuado de dichos elementos por parte del personal.

Adicionalmente, se solicitó al contratista la remisión de las actas de entrega de EPP, con el fin de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual manera, durante los recorridos de interventoría se efectuó seguimiento al uso correcto de los EPP; en caso de evidenciarse incumplimientos, se procedió a notificar al contratista para la adopción de acciones correctivas inmediatas, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Así mismo, se evidenció que el contratista ejecutó durante el mes de marzo charlas de capacitación y sensibilización sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), con el fin de garantizar su correcta utilización y porte durante la ejecución de las actividades en obra, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ENTREGA DE EPP

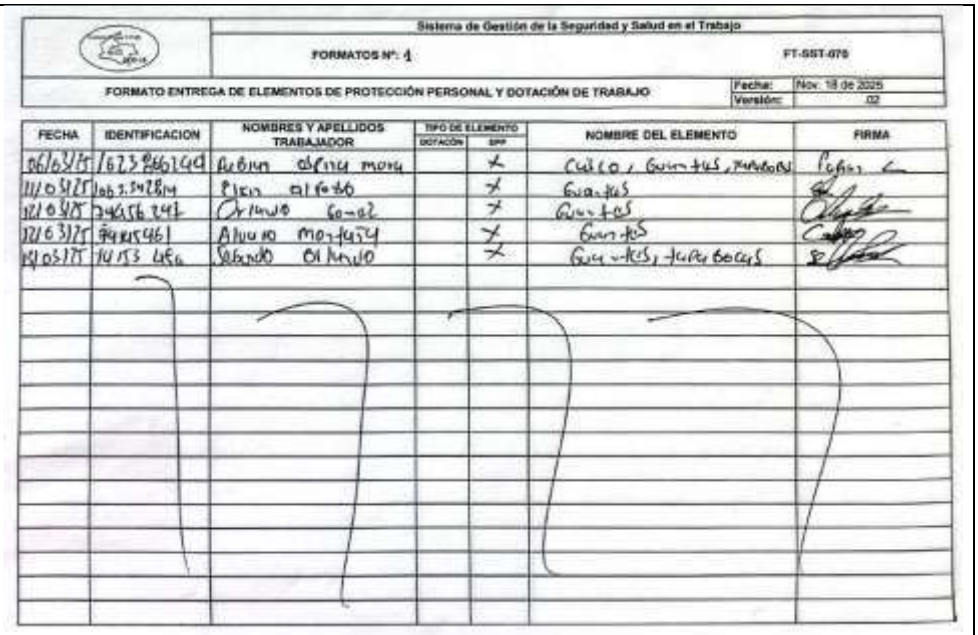


Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATOS N°: 1 — FT-SST-075

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO — Fecha: Nov. 18 de 2025 — Versión: 02

FECHA	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR	TIPO DE ELEMENTO: DOTACIÓN	TIPO DE ELEMENTO: EPP	NOMBRE DEL ELEMENTO	FIRMA
06/03/25	1023866149	Aubin [illegible]		X	Cuello, Guantes, Tapabocas	
11/03/25	1065.748[illegible]	[illegible]		X	Guantes	
12/03/25	7[illegible]	[illegible]		X	Guantes	
12/03/25	9[illegible]	[illegible]		X	Guantes	
13/03/25	1015[illegible]	[illegible]		X	Guantes, tapabocas	

REGISTRO DE CHARLA DE USO CORRECTO DE EPP

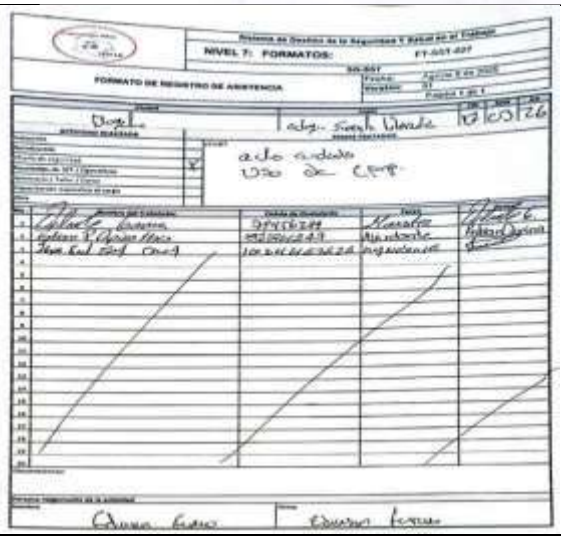

NIVEL 7: FORMATOS — FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 06/03/26

Tema: uso adecuado de EPP



CHARLA DE PREVENCION Y PROMOCION







FECHA	TEMA
03/03/2026-04/03/2026	Manejo del estrés laboral
03/03/2026	Procedimiento de emergencia
05/03/2026	Ahorro y usos eficiente de energía
11/03/2026	Prevención osteomuscular
12/03/2026	Señalización de seguridad
13/03/2026	Señalización de seguridad
16/03/2026	Atención de emergencias ambientales
16/03/2026	Condiciones de seguridad
18/03/2026	Orden y aseo en puesto de trabajo
20/03/2026	Investigaciones de accidentes
23/03/2026	Higiene postural
26/03/2026	Cuidado de manos

Anexo 8. Registro Capacitaciones

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista implementar la señalización, delimitación y demarcación de áreas de trabajo, excavaciones y centros de acopio, conforme a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se deberá remitir mensualmente a la interventoría las actas de entrega de elementos de protección personal (EPP), debidamente firmadas por el empleador y el trabajador, con el fin de garantizar la trazabilidad correspondiente.

- Se sugiere la instalación de puntos ecológicos en obra, con el propósito de prevenir la acumulación desordenada de residuos y fomentar una adecuada gestión ambiental.
- Las inspecciones preoperacionales y revisiones a equipos y herramientas deberán ejecutarse de manera periódica (mínimo mensual) durante toda la vigencia del proyecto, dejando los respectivos soportes documentales.
- El personal operativo deberá conocer y aplicar las políticas, procedimientos y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA); en este sentido, se solicita al contratista evidenciar su socialización y cumplimiento.
- Se recomienda al contratista implementar pausas activas, así como desarrollar charlas de autocuidado y promoción de actos seguros, con el fin de fortalecer la cultura preventiva en obra.

REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el presente periodo el Contratista gestiono varios procesos de gestión documental para la aprobación del personal en las obras, y así poder permitir el acceso e inicio de los trabajadores en obra. Los cuales quedan registrados los siguientes registros de aprobación de personal en obra.

jueves, 12 de marzo de 2026	FABER FORERO	1.022.989.108	OFICIAL
jueves, 12 de marzo de 2026	JOSE CIRO TOVAR HERRERA	19.452.631	JOSE CIRO TOVAR HERRERA
jueves, 12 de marzo de 2026	ANDERSON DIAZ RAMIREZ	1.031.125.311	TECNICO ELECTRICO
jueves, 12 de marzo de 2026	GILMER DIAZ	1.031.153.649	TECNICO ELECTRICO
miércoles, 18 de marzo de 2026	ORLANDO GOMEZ	79.456.299	CONSORCIO PAIS
miércoles, 18 de marzo de 2026	ELKIN ORTIZ	1.003.392.819	CONSORCIO PAIS
miércoles, 18 de marzo de 2026	JHON JAIRO RUIZ AGUIRRE	79.667.531	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS
miércoles, 18 de marzo de 2026	JHOAN STIVEN JARAMILLO CAMPO	1.024.556.316	ESTRUCTURAS GUERRERO SAS

viernes, 6 de marzo de 2026	ANDRES CAMILO BALLESTEROS	7.320.705	ANDRES CAMILO BALLESTEROS
viernes, 6 de marzo de 2026	SEBASTIAN MORENO	1.012.316.173	ANDRES CAMILO BALLESTEROS
martes, 10 de marzo de 2026	PATRICIA MOLINA FONSECA	51.712.385	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
martes, 10 de marzo de 2026	JOSE TORRES	79.379.390	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
miércoles, 11 de marzo de 2026	ELKIN ALFONSO ORTIZ YANCE	1.003.392.819	AYUDANTE
miércoles, 11 de marzo de 2026	JEISSON DAZA	1.020.781.600	RESIDENTE IMPRIM
miércoles, 11 de marzo de 2026	ANDRES FANDIÑO	80.748.984	OFICIAL
miércoles, 11 de marzo de 2026	JOSE ALFREDO JIMENEZ R	14.013.920	CONDUCTOR
miércoles, 11 de marzo de 2026	SERGIO FABIAN TOBAR OSPINA	1.071.168.525	OPERARIO
miércoles, 11 de marzo de 2026	MERQUECIDED QUINTERO ARCIRIA	1.002.047.944	OPERARIO
jueves, 12 de marzo de 2026	FABIAN RICARDO OSPINA	1.023.866.249	AYUDANTE DE OBRA
viernes, 13 de marzo de 2026	FERNANDO FERNANDEZ DELGADO	3.450.588	INDUTECHOS SAS
viernes, 13 de marzo de 2026	FERNANDO MORENO ZAMBRANO	1.021.670.739	INDUTECHOS SAS
viernes, 13 de marzo de 2026	JOHN ALEJANDRO BEJARANO	1.069.258.450	IBR ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS
viernes, 13 de marzo de 2026	NELSON YAIR SALGADO	1.149.439.077	IBR ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SAS
lunes, 16 de marzo de 2026	JHON EDWAR ARAGON OYOLA	1.110.232.752	INDUTECHOS SAS
jueves, 19 de marzo de 2026	EDGAR HERNANDO VARGAS RODRIGUEZ	79.556.276	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
jueves, 19 de marzo de 2026	GABRIEL IGNACIO RINCON CARDENAS	79.849.453	IGT SAS
jueves, 19 de marzo de 2026	RODRIGO HERNANDEZ MATEUS	80.770.400	IGT SAS
miércoles, 25 de marzo de 2026	KLAY KENI FERNANDEZ RAMIREZ	6.499.830	QUALITY INDUSTRIAL COATING SAS
viernes, 27 de marzo de 2026	WILDER GOIVANY PAJARITO NAVARRETE	80.794.672	REMODELACIONES WP SAS
viernes, 27 de marzo de 2026	JUAN ANDRES ESPITIA BARRERA	19.358.061	REMODELACIONES WP SAS
viernes, 27 de marzo de 2026	CARLOS JULIO NAVARRETE BALLEN	2.983.911	REMODELACIONES WP SAS
viernes, 27 de marzo de 2026	ARTURO SAENZ BERNAL	1.023.934.807	REMODELACIONES WP SAS

8. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías.	El Consorcio Serinco Educativo remitió las pólizas a la entidad y subió las mismas a la plataforma SECOP II, el día 27/10/2025	
2	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido	Cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes.		
3	Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes.	Para el presente periodo se cuenta con el pago de cuatro actas dentro de las cuales se encuentra el pago fijo y el pago variables según el avance de obra. y se encuentra pendiente el pago de una quinta acta.	
4	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar.	No aplica para el presente periodo	
5	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado.	No aplica para el presente periodo	
6	Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda,	Se cumple con la obligación de acuerdo con el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
	acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.		
7	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto.	Se cumple con la obligación	
8	Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	Se cumple con la obligación de acuerdo al presente periodo	
9	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
10	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.	Se cumple con la obligación	
11	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
13	Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	
14	Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato.	Se cumple con la obligación	
15	Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3	Se cumple con la obligación	
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
17	Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables.	Se cumple con la obligación	
18	Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión.	Se cumple con la obligación	
19	Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.	Se cumple con la obligación	
20	La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
21	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.	Se cumple con la obligación	
22	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.	Se cumple con la obligación	
23	Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique.	Se cumple con la obligación	
24	Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	Se cumple con la obligación	
25	Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Se cumple con la obligación	
26	Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Se cumple con la obligación	
27	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	No aplica para el presente periodo	
28	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad.	Se cumple con la obligación	
29	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6	Se cumple con la obligación	
30	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
31	Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED.	Se cumple con la obligación	
32	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas.	No aplica para el presente periodo	
33	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Se cumple con la obligación	
34	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista.	No aplica para el presente periodo	
35	Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	No aplica para el presente periodo	
36	Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes.	No aplica para el presente periodo	
37	Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE	OBSERVACIONES
38	La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 16 - *Obligaciones Generales - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.	No aplica para el presente periodo	
2	Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF	Se cumple con la obligación	
3	Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	Se cumple con la obligación	
4	Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.	Se cumple con la obligación	
6	Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.	Se cumple con la obligación	
7	Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.	Se cumple con la obligación	
8	Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
9	Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.	Se cumple con la obligación	
11	Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.	Se cumple con la obligación	
12	Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.	Se cumple con la obligación	
13	Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.	Se cumple con la obligación	
14	Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.	Se cumple con la obligación	
15	El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.	Se cumple con la obligación	
16	Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
17	En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.	Se cumple con la obligación	
18	Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.	No aplica para el presente periodo	
19	Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.	Se cumple con la obligación	
20	Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.	Se cumple con la obligación	
21	Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.	Se cumple con la obligación	
22	Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
23	Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.	Se cumple con la obligación	
24	Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.	Se cumple con la obligación	
25	Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.	Se cumple parcialmente, debido a que se encuentra en verificación el acta parcial de obra.	
26	Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.	Se cumple con la obligación	
27	Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes mes a mes serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de periodicidad	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.		
28	Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.	No aplica para el presente periodo	
29	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
30	Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.	No aplica para el presente periodo	
31	Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.	No aplica para el presente periodo	
32	Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.	No aplica para el presente periodo	
33	Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.	Se cumple con la obligación	
34	Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.		
35	Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.	Se cumple con la obligación	
36	Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.	Se cumple con la obligación	
37	Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.	Se cumple con la obligación	
38	Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.	Se cumple con la obligación	
39	Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.	Se cumple con la obligación	
40	En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación	Se cumple con la obligación	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
	contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.		
41	Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.	No aplica para el presente periodo	
42	Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.	No aplica para el presente periodo	
43	Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.	No aplica para el presente periodo	
44	En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.	No aplica para el presente periodo	
45	En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.	No aplica para el presente periodo	

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLE	OBSERVACIONES
46	El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.	Se cumple con la obligación	

Tabla 17 - *Obligaciones Especificas - Interventoría*
Fuente: *Propia.*

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico se realizó durante las visitas de seguimiento en la etapa de ejecución de las obras en las diferentes sedes educativas, con el fin de documentar el avance y el estado de las intervenciones. Este material permite respaldar las observaciones técnicas, evidenciar las actividades ejecutadas, identificar situaciones relevantes en campo y servir como soporte visual.

Anexo 9. Registro fotográfico

Se adjunta video mediante el cual se evidencian los avances de obra correspondientes a cada sede intervenida, el cual podrá ser consultado a través del siguiente enlace:

- Link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1CgrGlYEDegJZa1DIrikGB3FgxNxT-wAR?usp=drive_link

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el registro audiovisual del progreso de ejecución.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se solicitó y recalcó al contratista que no se admite el ingreso a personal que no cuente con su Seguridad Social al día así mismo su ARP y respectivas dotaciones en especial en temáticas de trabajó en alturas. No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cumpla con este ítem y se recalcó en cuanto al tema de trabajos en alturas que se deben implementar todas las medidas y protocolos de seguridad al respecto.

2. Se sugiere al contratista dar un buen manejo y disposición de los materiales ya que no se recibirán trabajos que no estén en óptimas condiciones en cuanto a su ejecución, terminado y calidad de los materiales y ante todo garantizando el cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas y metodologías de ejecución de cada tarea.

3. De acuerdo con el análisis de los porcentajes acumulados por sede (numeral 3.3), se evidencia que, aunque el avance financiero global ejecutado (70,63%) supera ligeramente al programado (69,85%), cuatro sedes presentan atrasos superiores al 5% en su ejecución acumulada frente a lo programado: Sierra Morena (-15,99%), Guillermo Cano Isaza (-12,67%), Buenavista (-6,33%) y Orlando Fals Borda (-5,84%). Esta situación refleja una brecha crítica en la planificación y el ritmo de ejecución por parte del contratista.

4. En el numeral 3.3.3 (Obras programadas para el presente informe), se detallan actividades que el contratista debía ejecutar durante el período. Sin embargo, al contrastar con el numeral 3.2, se observa que en sedes como Sierra Morena los trabajos de pintura en muros colindantes a la cancha continúan pendientes. Esto indica que el contratista no logró cerrar las actividades programadas dentro del período mensual, lo que ha generado un efecto acumulativo de rezagos que compromete los hitos de entrega parcial establecidos para el 10 de abril de 2026 en sedes como Arborizadora Baja.

5. Si bien sedes como Unión Europea, Estrella del Sur A y B reportan un 100% de ejecución acumulada, otras como Santa Librada presentan un avance del 36,03% frente a un programado del 20,55% (sobrecumplimiento), mientras que Tenerife Granada Sur muestra un avance del 46,90% frente a un programado del 5,25%. Esta heterogeneidad extrema en los porcentajes de avance por sede (numeral 3.3) evidencia que el contratista ha concentrado recursos en frentes específicos, descuidando otros, lo que genera desequilibrios en la programación general y dificulta una liquidación ordenada por sedes al cierre del contrato

6. Hemos reiterado al contratista de obra la necesidad de actualizar el balance la reprogramación de acuerdo con las cantidades reales a ejecutar para que no se sigan presentando atrasos en el comparativo programado vs ejecutado.

7. Durante este periodo se le solicita a Consorcio País, presentar los alcances, programaciones y presupuestos para atención de las emergencias de ***Arborizadora Baja Sede A, Luis Eduardo Mora Osejo Sede A y Calasanz Buenavista Sede A.***

8. Finalmente, en cuanto a las tareas y/o actividades a ejecutarse en este proyecto las mismas no son definitivas ya que pueden darse situaciones en las que se requieran incorporar nuevas tareas acorde a las necesidades y priorización de estas para cada frente y así mismo enmarcadas dentro del Objeto del Proyecto y su Presupuesto. No se autorizará al Contratista la incorporación y ejecución de tareas que no sean previamente evaluadas y avaladas por parte de SED é Interventoría.

9. Por medio de comunicado ***SERINCO-SED-2025-392-L6-Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6*** se les sugirió a los contratistas *"… entregar el informe completo antes de la fecha prevista inicialmente (10-abr-2026), de esa forma tendrían un poco más de tiempo para realizar las correcciones si se encuentra alguna observación.*

   Y se les informó, que una vez *"…sean entregados nuevamente a interventoría los informes completos subsanados, a más tardar el 17 de abril, les comunicamos que si persiste alguna observación en cualquiera de los componentes del informe, a partir del sábado 18 de abril empezará a contabilizarse los descuentos por concepto de ANS…*"

10. Se remiten observaciones a los Manuales de Mantenimiento de las ***IED Estrella del Sur, Sedes A y B***, así como al de ***IED Unión Europea***, las cuales no han sido subsanadas a la fecha.

11. Asimismo, se solicitó al contratista de obra subsanar unas no conformidades en el paquete de APU´s de Ítems No Previstos entregados, las cuales no han sido atendidas al cierre del periodo.

Anexo 10. Relación de Correspondencia

ANEXO No. 1. BITACORA DE OBRA

Colegio Tenerife Granada Sur. 09/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se hizo la respectiva acta de vecindad para determinar como estan los alrededores donde se va a ejecutar la obra, con el contratista se definió el tipo de trabajo a ejecutar para impermeabilizar el tanque.

Colegio Tenerife Granada Sur. 11/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó el cerramiento para delimitar la zona de trabajo a intervenir.

Colegio Tenerife Granada Sur. 12/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se hizo la limpieza de la tubería oxidada, se aplicó el antizorrosivo en la parte superior de la placa del tanque, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

Powered by CamScanner

Colegio Tenerife Granada Sur. 13/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó el sellado de las dilataciones existentes en la placa superior del tanque.

JOHN CASTELLANOS
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 16/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se aplicó una primer mano de la pintura impermeabilizante en el techo del tanque, se bizo la aplicación del imprimante en la placa superior para después instalar la poliurea.

JOHN CASTELLANOS
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur 17/03/2026.

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se aplicó la primer mano de poliurea en la placa de la cubierta del tanque, se bizo la aplicación de una segunda mano de pintura impermeabilizante en el techo del tanque.

JOHN CASTELLANOS
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur 18/03/2026

Powered by CamScanner

Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
El día de hoy no se ejecutaron actividades por temas de lluvia; ya que, se necesita que las paredes internas de los muros del tanque estén secas para iniciar el proceso de impermeabilización, se presentaron lluvias moderadas durante el día de 7:00 am. a 1:00 pm.

JOHN ASTUDILLO
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 14/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Actividades realizadas:
No se realizaron actividades por temas de humedecimiento en la parte interna del tanque; ya que, se necesita que las paredes internas de los muros del tanque estén secas para iniciar el proceso de impermeabilización, " con interventoría se proyecto la solución y quedaron sustentadas en las cantidades del contrato del Colegio

JOHN ASTUDILLO
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur 20/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó la segunda mano de poliurea en la placa de la cubierta del tanque, se cerraron las dilataciones de las escaleras con cordones de Sicaflex y se aplicó la poliurea en las escaleras.

JOHN ASTUDILLO
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Colegio Tenerife Granada Sur. 21/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó de pulir los detalles de la soldura en la placa de la cubierta del tanque y se recibe a satisfacción.

[illegible]
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 24/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Actividades realizadas:

No se ejecutaron actividades debido a que aún se encuentran humedas las paredes internas del tanque y estas deben estar secas para iniciar el proceso de impermeabilización, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

[illegible]
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 25/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó de aplicar la pintura en el techo del tanque, s inició a instalar el geotextil para luego colocar la geomembra y poder impermeabilizar las paredes del tanque, se presentaron fuerte lluvias durante la tarde.

[illegible]
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 26/03/2026

Powered by CamScanner

Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal Operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la impermeabilización en la parte interna del tanque, se aplicó otra mano de pintura en el techo del tanque para impermeabilizar, se realizó la pulida de la placa superior del tanque para instalar la pintura solicitada.

John castellanos
interventoría

Colegio Tenerife Granada Sur. 27/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició a aplicar la pintura en la placa superior del tanque Según la referencia sdicitada por la interventoría, se presentaron lluvias leves durante la mañana de 7:00 Am a 10:00 Am.

John castellanos
interventoría

Colegio Tenerife Granada Sur. 28/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua aplicando la pintura en la placa superior del tanque Según la referencia solicitada por la interventoría.

John castellanos
interventoría

Powered by CamScanner

Colegio Tenerife Granada Sur 30/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se sigue aplicando la pintura en la placa superior del tanque según la referencia sdicitada por la interventoría, con la interventoría se definió el tratamiento a realizar en la caja de inspección para evitar la humedad que se está presentando en una de las paredes interna del tanque de almacenamiento, se presentaron lluvias durante la mañana de 7:00 AM a 10:00 AM.

JOHN ASTUDILLO
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 31/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 Inspector, 1 SiSo.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó de aplicar la pintura en la placa superior del tanque según la referencia solicitada por la interventoría

JOHN ASTUDILLO
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 01/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SiSo.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó el sellado de la fisura en la caja de inspección.

JOHN ASTUDILLO
INSPECTOR

Powered by CamScanner

Colegio Tenerife Granada Sur. 04/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se continua la impermeabilización en la parte interna del tanque, Se aplicó otra mano de pintura impermeabilizante en el techo del tanque.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Tenerife Granada Sur. 06/04/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se terminó el proceso de la impermeabilización en la parte interna del tanque de reserva.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Powered by CamScanner

Emergencia Dile Usme 20/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación del bypass para no dejar sin el servicio de agua potable a está institución.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme 22/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo el desmonte de la tubería existente y el retiro de los seis tanques de suministro; además, se hizo el retiro del manto existente sobre la placa de la cubierta.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme. 23/01/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se recibe el material para aplicar el pendentado de la Cubierta.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Emergencia Dile Usme 24/01/2026
Personal administrativo

Norma

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se aplicó el pendientado impermeabilizado en la placa de la cubierta.

Jean asistencia
INGENIERIA

Emergencia Dile Usme. 26/01/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se realizó el afinado en la placa impermeabilizada de la cubierta y se aplicó la respectiva media caña.

Jean asistencia
INGENIERIA

Nota: Desde el día 26/01/2026 hasta el 08/03/2026 Se dejo que la placa fundida de la cubierta tubiera su respectivo fraguado para iniciar con la instalación de la Poliurea y sus demás componentes.

Emergencia Dile Usme. 08/03/2026.
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el tratamiento de las fisuras encontradas y se hicieron las respectivas dilataciones con su sellado en poliuretano para evitar fisuras a futuro.

Norma

Powered by CamScanner

John castrillon
Inspector

Emergencia Dilea Usme 09/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo la instalación de la capa de imprimante para después aplicar la poliurea.

John castrillon
Inspector

Emergencia Dile Usme 10/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación de la primer mano de poliurea en la cubierta.

John castrillon
Inspector

Emergencia Dile Usme 13/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante:
Actividades realizadas:
Se hizo el sellado de la grieta encontrada en los muros mediante la instalación del producto Sica boom, luego se aplicó el pañete Sicatop 101 para dejar hermeticá la fisura; finalmente se aplisó la segunda mano de poliurea en la cubierta y se da por terminada dicha actividad.

John castrillon
Inspector

Norma

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de la instalación de la cubierta tipo Sándwich.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Calasanz Buenavista. 25/02/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de la instalación de la cubierta tipo sándwich.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Calasanz Buenavista. 26/02/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de la instalación de la cubierta tipo Sándwich.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Calasanz Buenavista. 13/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Powered by CamScanner

Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo la reinstalación de los 10 lámparas existentes y se añadio tubería y cableado nuevo para 2 lámparas.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Calasanz Buenavista 14/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de instalar el reflector faltante y de está manera se culminan las instalaciones eléctricas con su respectivo orden y aseo.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Calasanz Buenavista 19/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició la instalación del techo en PVC en el sector de acceso a la planta número 2 del comedor.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

Colegio Calasanz Buenavista 20/03/2026
Personal administrativo

Powered by CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo el retiro de los RCD más exactamente el sobrante de la cubierta "hierro", se continua la instalación del techo en PUC en el sector de acceso a la planta número 2 del comedor.

Colegio Calasanz Buenavista. 21/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación del techo en PUC en el sector de acceso a la planta número 2 del comedor, se presentaron lluvias leves durante la tarde.

Colegio Calasanz Buenavista. 24/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación del techo en PUC en el sector de acceso a la planta número 2 del comedor, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

Powered by CamScanner

Colegio Calasanz Buenavista 25/03/2026

Personal administrativo.

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se inició con la limpieza y lavado de las canales en concreto y en acero, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

Jhon castro
residente

Colegio Calasanz Buenavista 26/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo

2 oficiales, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se inició la actividad de tapar el acceso de las palomas con el respectivo flanche, Se término la instalación del techo en PVC en el sector de acceso al segundo nivel del comedor.

Jhon castro
residente

Colegio Calasanz Buenavista. 27/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Personal operativo

2 oficiales, 2 ayudantes.

Actividades realizadas:

Se terminó la limpieza y lavado de las canales en concreto y en acero, se continua la actividad de tapar el acceso de las palomas con el respectivo flanche,

Powered by CamScanner

Se realizó un apique en la zona donde se va a instalar el tanque de reserva para identificar el tipo de terreno con el que se cuenta, Se presentaron lluvias durante la mañana de 7:00 AM a 10:00 AM.

JUAN CASTEJON
INGENIERO

Colegio Calasanz Buenavista 28/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se sigue la actividad de tapar el acceso de las palomas con el respectivo flanche.

JUAN CASTEJON
INGENIERO

Colegio Calasanz Buenavista.

Powered by CamScanner

Personal operativo.
1 Oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se Sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda 03/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda. 04/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTRO
INSPECTOR

Colegio Orlando Fals Borda. 05/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.

Scanned with CamScanner

1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el arreglo de la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda. 06/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se hizo el aseo general en la placa de la cubierta para poder instalar la poliurea, se realizó la instalación de la bajante en la parte superior de la placa.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda. 09/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó la limpieza de los muros adicionales de la cubierta donde se va a aplicar la poliurea, se hizo el resane en el núcleo perteneciente a la bajante instalada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda. 14/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se recibe el material para iniciar a instalar la poliurea, se realizó el corte de las dilataciones perimetrales donde pega la poliurea para evitar posibles filtraciones a futuro.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORÍA

Colegio Orlando Fals Borda. 15/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó la imprimación de la cubierta para poder iniciar a instalar la poliurea.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORÍA

Colegio Orlando Fals Borda. 16/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de la instalación de la poliurea en la cubierta. "la actividad se terminó el mismo día".

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORÍA


Colegio Orlando Fals Borda. 28/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se hizo el corte con pulidora en el tramo cerca a la cafetería y se inició la demolición del respectivo piso para instalar la tubería de la bajante.

JOHN OSPINO
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda. 29/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de realizar la demolición en el tramo cerca a la cafetería para instalar la tubería de la bajante.



JOHN OSPINO
INGENIERO

Colegio Orlando Fals Borda. 30/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó la conexión de la respectiva tubería con el cárcamo y se adicó el alistado sobre la tubería, queda pendiente la instalación de la gravilla lavada roña; se presentaron lluvias durante la mañana de 7:00 AM a 10:00 AM.

JOHN OSPINO
INGENIERO

Scanned with CamScanner

Colegio Orlando Fals Borda. 04/04/2025

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó el suministro e instalación de la grapilla lavada mona.

JOHN ALEXIS
INTERVENTORIA

27/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL, Operativo

1. Oficial, 2 Ayudantes.

Actividades: Se realiza la Instalación de la estructura metalica de la baranda

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

17/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1. SISO

PERSONAL OPERATIVO

1. Oficial, 1 Ayudante.

ACTIVIDADES. Se realiza la Instalación de la Cubierta del Cuarto de shut.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada 05/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de acopio del material proveniente de la terraza en la parte baja para después ser cargado en volqueta y llevado a la escombrera certificada.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 06/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó lavado y aseo general a toda la respectiva terraza.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 09/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se aplicó la media caña de la jardinera número cuatro" ya se tiene todo listo para la instalación de la polirea.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 13/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se inició el lavado del ladrillo de la cubierta para después aplicar el hidrófugo.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 14/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua el lavado del ladrillo de la cubierta para después aplicar el hidrófugo.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 16/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el lavado del ladrillo de la cubierta para después aplicar el hidrófugo.

JOHN CASTAÑEDA
INGENIERO

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada. 17/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó una limpieza general en la cubierta para poder instalar la poliurea, se inició a realizar el corte con pulidora para la zona perimetral donde se va a aplicar la poliurea en las jardineras.

[redacted]
Residente

Colegio Santa Librada. 18/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de realizar el corte con pulidora para la zona perimetral donde se va a aplicar la poliurea en las jardineras, se ultimaron detalles para el día de mañana realizar la imprimación según la lluvia, se presentaron lluvias durante la mayor parte del día "moderadas" (7:00 am a 1:00pm)

[redacted]
Residente

Colegio Santa Librada 20/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el arreglo de unas fisuras adicionales encontradas,

Scanned with CamScanner

en las jardineras a impermeabilizar, se trajo a obra la canal que se debe instalar con las respectivas secciones de andamios. "Actividad que se iba a ejecutar el día de mañana"; Pero por decisión del arquitecto Santiago y la rectora trasladaron la actividad para el próximo fin de semana la cual se iniciara el sábado 28 de marzo y tendra plazo de entregarse en el transcurso de semana santa.

Colegio Santa Librada. 24/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo.

2 oficiales, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se realizó la instalación de la cubierta adicional en la zona de ingreso del cuarto piso donde se está presentando la filtración, se inició el proceso de imprimación en las jardineras de la cubierta para después proceder a aplicar poliurea, Se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

Colegio Santa Librada. 25/03/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 siso.

Personal operativo.

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se continua el proceso de imprimación en las jardineras de la cubierta para después proceder a aplicar poliurea, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

Scanned with CamScanner

John Asteveos
Interventoría

Colegio Santa Librada. 26/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de impriMación en las jardineras de la cubierta para después proceder a aplicar poliurea, el día de mañana se inicia la instalación de la poliurea según el clima que se presente.

John Asteveos
Interventoría

Colegio Santa Librada 27/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se pulieron unos detalles para iniciar a aplicar la poliurea en las jardineras; "debido al clima lluvioso que se presento hoy no se pudo iniciar a aplicar poliurea y queda la actividad para el día de mañana, se presentaron lluvias leves durante la mañana de 7:00 am a 10:00 am.

John Asteveos
Interventoría

Colegio Santa Librada. 28/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.

Scanned with CamScanner

Actividades realizadas:
Se realizó la instalación de la poliurea en las jardineras de la cubierta, se inició el proceso de la instalación de la canal en el comedor, se hizo la perforación en la pared para identificar por donde va el tubo donde se va a conectar la canal y despues de hacer la respectiva demolición se identificó que esa tubería no estaba conectada a ninguna red principal; por el contrario evacuaba al predio vecino razón por la cuál no estaba en servicio. Despues de hacer dicha revisión se definió con interventoría que la bajante se va a conducir por la columna y se va a conectar a la caja de inspección que se encuentra en la parte interna del comedor.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Colegio Santa Librada. 24/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se realizó el corte con pulidora y demolición del piso por donde se va a instalar la tubería.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Colegio Santa Librada 30/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:

Scanned with CamScanner

Se término de hacer la excavación para la instalación de la tubería que conecta al cárcamo, o caja de inspección; Se terminó de realizar el proceso de instalación de la canal en el comedor y se inició a pintar la respectiva canal, se hicieron los arreglos en la poliurea de las jardineras de la cubierta, Se presentaron lluvias leves durante toda la mañana.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE

Colegio Santa Librada 31/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación de la poliurea en las jardineras de la terraza, Se término de pintar la canal del comedor, se inició a instalar la tubería que conecta la canal con la caja de inspección, Se aplicó el alistado en el piso que conecta la canal con la caja de inspección.

JOHN CASTAÑEDA
RESIDENTE

Colegio Santa Librada 01/04/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se terminó de instalar la tubería que conecta la canal con la caja de inspección y se aplicó la pintura en la respectiva tubería.

Scanned with CamScanner

Colegio Santa Librada 04/04/2026

Personal administrativo

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.

Personal operativo

1 oficial, 1 ayudante.

Actividades realizadas:

Se aplicó el cemento blanco para evitar el tropezon en el comedor mientras se instala las baldesas de porcelanato

John Castillo
Residente

05/02/2026 Cano isaza.
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Actividades a realizar
Demolicion de enchapa y Pañete
Elmin Gutierrez.
inspector de obra.
JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

06/02/2026 Cano isaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Demolicion de enchapes y Pañete
Elmin Gutierrez
inspector de obra
JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

07/02/2026 Cano isaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante
Demoliciones de pisos
Elmin Gutierrez
inspector de obra

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

09/02/2026 Cono iniza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar
recolección de escombros, demoliciones.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Jose [illegible]
INSPECTOR

10/02/2026. Cono iniza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar
recolección de escombros y demoliciones.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Jose [illegible]
INSPECTOR

11/02/2026. Cono iniza.
personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar.
se inician pruebas en los bancos de la cono. de
laboratorios.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

Jose [illegible]
INSPECTOR

Scanned with CamScanner

12/02/2026 cono inicio.
Personal administrativo
1 residente, 1 sisO, 1 inspector.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
Pintura y orden y aseo.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

13/02/2026 cono inicio.
Personal administrativo
1 residente, 1 sisO, 1 inspector.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
Pintura.
Elmin Gutierrez.
inspector de obra.

14/02/2026 cono inicio.
Personal administrativo
1 residente, 1 sisO, 1 inspector.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar
Pintura, orden y aseo.
Elmin Gutierrez.
inspector de obra.

16/02/2026 Cono isaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar
Retiros y Plomería.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN ESTIVEN
INTERVENTORIA

17/02/2026 Cono isaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante
Actividades a realizar.
Se inician demoliciones en los baños de 3 piso.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN ESTIVEN
INTERVENTORIA

18/02/2026 cono isaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
Demoliciones 3 piso, Plomería Cocinas Lavaderos.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOHN ESTIVEN
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

19/02/2026 Cano ixaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
personal operativo
2 oficiales, y 1 ayudante
Actividades a realizar.
Demoliciones 3 piso, plomería baños
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOSE ASTUDILLO
INSPECTOR

20/02/2026 Cano ixaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realizar.
Demoliciones 3piso, enchapes baños laboratorio.
Elmin Gutierrez.
inspector de obra.

JOSE ASTUDILLO
INSPECTOR

21/02/2026 Cano ixaza.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades a realize.
Demoliciones 3 piso y enchapes baños laboratorio.
Elmin Gutierrez
inspector de obra.

JOSE ASTUDILLO
INSPECTOR

23/02/2026 cono isaac.
Personal administrativo.
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
personal operativo.
1 oficial, 1 ayudante, ~~1 siso~~.
Actividades a realizar,
Condiciones 3piso.
Epp en edificio
inspeccion de obra.

JOHN CASTILLO
INVENTORIA

24/02/2026 cono isaac.
Personal administrativo
1 residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
2 ayudantes,
Actividades a realizar.
Condiciones 3piso.
Epp en edificio
inspeccion de obra.

JOHN CASTILLO
INVENTORIA

25/02/2026. cono isaac.
Personal administrativo.
1 residente, 1 inspecto, 1 siso.
Personal operativo.
2 ayudantes.
Actividades a realizar.
Condiciones 3piso.
Epp en edificio.
inspeccion de obra.

JOHN CASTILLO
INVENTORIA

Scanned with CamScanner

Miercoles 25/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 Oficial, 2 Ayudentes

ACTIVIDADES: Se realiza la demolición de enchape en el tercerpiso en el baño 3.

RESIDENTE DE OBRA. JOHN CASTRO INTERVENTORIA

26/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

3 Ayudentes.

ACTIVIDADES: Se continua con la ~~reste~~ demolición del enchape del piso de la bateria del baño 3.

RESIDENTE DE OBRA. JOHN CASTRO INTERVENTORIA.

27/02/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

3 Ayudentes.

ACTIVIDADES: Se inicia con la demolición del del enchape del piso de la bateria N°4 del tercer piso

RESIDENTE DE OBRA JOHN CASTRO INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

28/02/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

3 Ayudantes.

ACTIVIDADES: se inicia con la demolición del enchape de pared, de la bateria N° 4 de los Baños del tercer piso

RESIDENTE DE OBRA — JOHN OSTIGUEN — INTERVENTORIA

02/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 Oficial, 3 Ayudantes

ACTNIDADES: Se inicia con el peñete de la bateria del baño N°1, Piso 1.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN OSTIGUEN — INTERVENTORIA

03/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1. Oficial 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con la construcción del peñete y se realiza las instaciones de los punto hidraulicos que requieran cambio.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN OSTIGUEN — INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

04/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Oficial, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: se realiza demolición del enchape de las paredes del baño principal del tercer piso, paralelamente se continua con el pañete de la bateria del baño N°1 del piso 1.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

05/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1. Oficial, 3 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con el pañete de las paredes en la bateria 1 del piso 1. paralelamente se coloca con la instalación de enchape en la Ubicación Anteriormente mencionada

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

06/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza la instalación de enchape de la baria del baño 1 del piso 1.

Scanned with CamScanner

RESIDENTE DE OBRA. INTERVENTORIA

07/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente. 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: se continue con la instalación de enchape de la bateria N°1 del piso 1. de igual manera se instala laminas de win en los esquinas del baño.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

09/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: se inicia con la instalación de enchape de pared en el baño 2. Piso 1.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

10/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL Operativo

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con la instalación del enchape de la bateria N°1 piso 1.

Scanned with CamScanner

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

11/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso.

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: se continua con la Instalación de enchape en la bateria N2, piso 1.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA

12/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de enchapes piso 1. Bateria 2, demolición de Alistado piso 3 Bateria 1.

JOHN CASTAÑEDA

RESIDENTE DEL OBRA INTERVENTORIA

13/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, , 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de enchape de piso Bateria 2, primer piso; Demolición de Alistado

Scanned with CamScanner

Residente de Obra — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

14/03/2024.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 Siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de enchape batería N° 1 piso 1. Demolición de Alistado Batería 2 piso 3.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

15/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATNO

1 Residente, 1 Inspector, 1 Siso

PERSONAL OPERATNO.

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: emboquillado de la batería N° 1 del piso 1. Demolición de Alistado batería 3 piso 3

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

17/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 Siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: emboquillado de la batería N°1 - piso 1.; Instalación de peñete batería 2 - piso 3

Scanned with CamScanner

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTIJOS INTERVENTORIA

18/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Construcción de Alistado Bateria 3 - PISO 3; Instalación de enchape piso, bateria 2 - PISO 1.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTIJOS INTERVENTORIA

19/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de enchape de piso, bateria N°2 - PISO 1. Ejecución de Alistado Bateria 4 piso 3.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTIJOS INTERVENTORIA

20/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape piso bateria N°2

Scanned with CamScanner

- piso 1 ; ejecucion de Alistado Aire pesillo - piso 3

RESIDENTE DE OBRA — INTERVENTORIA

21/03/2026

PERSONAL ADMINTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES Instalación de Enchape pared baño 3 piso 3, fundición de Alistado baño 4 - piso 3

RESIDENTE DE OBRA — INTERVENTORIA

24/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISC

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape piso Bateria 2 - piso 1. Instalacion de Enchape pared baño 3 piso 3.

RESIDENTE DE OBRA — INTERVENTORIA

25/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

Scanned with CamScanner

ACTIVIDADES : Instalacion de enchape de pared Bateria N°3 - PISO 3. Instalación de enchape piso bateria N° - PISO 1.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

26/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES : Instalación de Enchape pared piso 3 - Bateria 3. Fundición de Aligerado Bateria 4 - PIS 3.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

27/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES : Embaquillado Bateria N°2 - PISO 1 Instalación de Enchape pared PIS 3 - Bateria 3

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

28/03/2026

PERSONA ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

Scanned with CamScanner

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchape Bateria 4. piso 3. y Bateria 1 - piso 3

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA

INTERVENTORIA

31/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector. 1500

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTIVIDADES: Instalación de Enchepe de pared Bateria 4 y 1 - piso 3

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA.

INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Actividades: se continua con la demolición del alistado y el traciego del escombro dentro las instalaciones

12/03/2026

JOHN CASTRO
INTERVENTORIA

personal Administrativo
1. Residente, 1 Inspector, 1 siso
personal Operativo
1 Oficial, 1 Ayudante
Actividades.: Se finaliza con la demolición del alistado y con el traciego del escombro., dentro de las instalaciones

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTRO
INTERVENTOR.

16/03/2026.
Personal ADMINISTRATIVO
1. Residente, 1 Inspector, 1 siso.
PERSONAL OPERATIVO
1 Oficial, 3 Ayudantes.
Actividades: Durante la jornada se realiza el alistado del piso de jardin de niños con la parte tecnica correspondiente por lo solicitado por Interventoria

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTRO
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

17/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 Oficial, 1 Ayudante.

Actividades: Se realiza, el afinado del alisto del area de jardin de niños, ya en horas de la tarde se finaliza y se completa 100% la actividad

RESIDENTE DE OBRA. JOHN CASTRO INTERVENTORIA.

18/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se inicia con excavaciones a Uno de los costados, en el sector de las canchas, para realizar la Construcción del cerramiento contra Impacto.

RESIDENTE DE OBRA. JOHN CASTRO INTERVENTORIA

19/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO.

1 Ayudante.

ACTIVIDADES: Se continua con la excavación al costado frontal de la cancha, para

Scanned with CamScanner

realizar la viga, del cerramiento contra Impacto.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

30/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL OPERATIVO

1 Ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con la excavación para la viga del cerramiento contra Impacto en el area de la cancha Intervenida.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA.

26/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector. 1 SISO.

PERSONAL OPERATNO.

1 Ayudante; 1 Oficial.

ACTIVIDADES: Se inicia con la excavación de los pilotes, de la Viga del cerramiento, ~~xxx~~ de al costado frontal de la cancha.

RESIDENTE DE OBRA — JOHN CASTAÑEDA INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

27/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

3 Ayudantes, 1 maestro.

ACTIVIDADES: Se continua con la excavación de los pilotes del cerramiento contra Impacto en la seccion frontal de la cancha. paralelamente se realize una revisión tecnica del alistado para la instalación de la baldosa de tipo vinisol, en el area de jardin de niños.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTROJA

INTERVENTORIA:

28/03/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Residente de Obra, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

2 Ayudantes. 1 Oficial, 1 maestro.

ACTIVIDADES: Se inicia con el amarrado de la estructura de los pilotes y la viga de cimentacion, Paralelamente se continua con una de las excavaciones; que presenta un ciclopeo, por lo que se realiza demolición con rotomartillo.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTROJA

INTERVENTORIA.

Scanned with CamScanner

30/03/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO.

1 maestro, 2 Ayudantes, 1 Ornamentador

ACTIVIDADES. Durante la jornada, se realiza la la niveleción y plomedo de la tubería, para los ejes principales de los pilotes; paralelamente se inicia con el encofrado. En horas de la tarde se soldan los tubos a la estructura de los pilotes.

RESIDENTE DE OBRA — INTERVENTORIA

01/04/2026

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. Residente, 1 Inspector, 1 SISO

PERSONAL Operativo

1. maestro, 1 Oficial, 2 Ayudantes

ACTNIDADES: Se realiza la Fundición de la Viga y los pilotes, paralelamente se seca cilindros de concreto, para los ensayos de resistencia.

Residente de Obra. — INTERVENTORIA

06/04/2026.

PERSONAL ADMINISTRATIVO.

1. Pesidente, 1 Inspector, 1 siso

PERSONAL OPERATIVO

1 maestro, 1 Inspector, 1 SISO

ACTIVIDADES: Durante la jornada se realiza el alistado perimetral de la zona de jardin de niños, para Instelar posteriorment el granito lavado. por parte de la estructura del cerramiento se trae las Modulos con los tubos metalicos para la correspondiente Instalación del cerramiento contra Impacto.

RESIDENTE DE OBRA

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició el proceso de enchape de pared del baño de hombres.

JOHN CASTILLO
MAESTRO

Colegio Fabio Lozano Simonelli. 10/03/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape de pared del baño de hombres, se sigue fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTILLO
MAESTRO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 11/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue el proceso de enchape de pared del baño de hombres, Se continua fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTILLO
MAESTRO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 12/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.

Scanned with CamScanner

Personal operativo
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua el proceso de enchape de pared del baño de hombres, Se sigue fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 13/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se Sigue el proceso de enchape de pared del baño de hombres, se continua fundiendo la cuneta de 3000 PSI alrededor de la cancha.

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 14/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 Siso.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de enchape de pared del baño de hombres.

JOHN CASTAÑEDA
INSPECTOR

Colegio Fabio Lozano Simonelli 16/03/2026
Personal administrativo

Scanned with CamScanner

1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se finalizó la emboquillada del enchape del baño de hombres y queda listo para temas eléctricos, mesones de policuarzo y divisiones.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegio Fabio Lozano Simonelli 17/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó limpieza general en los baños ya terminados, se limpió la zona de la cuneta, se aplicó el granito de la bocacuerta de la entrada a los baños.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Colegio Fabio Lozano Simonelli. 18/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se realizó la instalación de los mesones en policuarzo en los baños, se inició la instalación de los puntos eléctricos, se comenzó la instalación de las divisiones en acero inoxidable de los baños, se presentaron lluvias durante el día de 7:00 am a 1:00 pm.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTORIA

Scanned with CamScanner

Colegio Fabio Lozano Simonelli 19/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de los puntos eléctricos, se sigue la instalación de las divisiones en acero inoxidable de los baños.

Colegio Fabio Lozano Simonelli 20/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de los puntos eléctricos, se terminó la instalación de las divisiones en acero inoxidable de los baños.

Colegio Fabio Lozano Simonelli: 21/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 1 ayudante.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de los puntos eléctricos.

Colegio: Fabio Lozano Simonelli 24/03/2026
Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue la instalación de los puntos eléctricos, se realizó el sondeo en la tubería instalada, se pegaron las rejillas de los respectivos baños, se presentaron fuertes lluvias de 1:00 pm a 6:00 pm.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 25/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
3 oficiales, 3 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación de los puntos eléctricos, se inició la excavación de la respectiva caja de inspección, se comenzó a aplicar la pintura en el techo de los baños, se cargo un viaje de escombro y se llevo a la escombrera certificada, se presentaron fuertes lluvias durante la tarde.

JOHN CASTRO
INGENIERO

Colegio Fabio Lozano Simonelli 26/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación de los puntos eléctricos, se

Continua la excavación de la respectiva caja de inspección, se pegaron las rejillas de los sifones correspondientes a la cuneta alrededor de la cancha.

JOHN CASTIBLANCO
INGENIERO RESIDENTE

Colegio Fabio Lozano Simonelli 27/03/2026

Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 siso.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se sigue la excavación de la respectiva caja de inspección, se sigue aplicando la pintura en el techo de los baños, se presentaron lluvias leves durante la mañana de 7:00 am a 10:00 am.

JOHN CASTIBLANCO
INGENIERO RESIDENTE

Colegio Fabio Lozano Simonelli 28/03/2026

Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo
1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó la excavación de la respectiva caja de inspección, Se terminó de aplicar la pintura en el techo de los baños tipo 1, se aplicó la pintura epóxica en la pared de los baños, Se hizo la desinstalación del techo en drywall "drainbol" de la sala de profesores.

JOHN CASTIBLANCO
INGENIERO RESIDENTE

Colegio Fabio Lozano Simonelli 30/03/2026

Scanned with CamScanner

Personal administrativo
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficial, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se inició la construcción de la caja de inspección, se inició la instalación del techo en PVC en la sala de profesores, se presentaron lluvias leves durante la mañana de 7:00 AM a 10:00 AM.

JOHN CASTRO
INSPECTOR 1

Colegio Fabio Lozano Simonelli 31/03/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua la construcción de la caja de inspección, se sigue la instalación del techo en PVC en la sala de profesores, se realizó la conexión de la tubería de la caja de inspección nueva con la caja de inspección principal.

JOHN CASTRO
INSPECTOR 1

Colegio Fabio Lozano Simonelli 01/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se continua la instalación del techo en PVC en la sala de profesores, se presentaron lluvias leves durante la tarde.

JOHN CASTRO
INSPECTOR 1

Scanned with CamScanner

Colegio Fabio Lozano Simonelli 04/04/2026.
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó la instalación del tedso en PVC en la sala de profesores, se terminó el proceso de fundir la cuneta alrededor de las canchas, se instaló la malla electrosoldada faltante para la cuneta y la tubería rasb

Colegio Fabio Lozano Simonelli 06/04/2026
Personal administrativo.
1 Residente, 1 inspector, 1 SISO.
Personal operativo.
2 oficiales, 2 ayudantes.
Actividades realizadas:
Se terminó el proceso de construcción de la caja d inspección queda faltando unicamente el marco y la tapa

ANEXO No. 2. INFORMES SEMANALES

FECHA: 8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 104 Dias ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			GRUPO 2
CORTE DEL INFORME: 8 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PAIS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	47.25%	43.21%	100.00%		$ 164,884,421	$ 71,238,470	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	92.72%	97.50%	100.00%		$ 165,727,196	$ 161,579,434	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	78.70%	62.88%	69.91%		$ 121,299,091	$ 76,277,533	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	41.76%	45.03%	33.71%		$ 243,945,084	$ 109,854,926	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	90.96%	94.32%	100.00%		$ 494,079,401	$ 466,000,104	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	70.38%	90.23%	83.76%		$ 169,818,729	$ 153,228,555	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	99.63%	99.63%	93.31%		$ 72,206,451	$ 71,937,067	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	15.49%	16.33%	8.64%		$ 234,227,860	$ 38,251,415	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	90.19%	98.14%	100.00%		$ 75,074,063	$ 73,676,306	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife					$ 130,006,456	$ -	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	2.82%	2.93%	11.24%		$ 364,449,204	$ 10,689,461	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						55.14%	59.83%		$ 2,235,717,956	$ 1,232,733,272																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	0.00%	35.05%	100.00%		$ 45,000,000	$ 15,774,544	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja					$ 35,000,000																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						35.05%	100.00%		$ 80,000,000	$ 15,774,544																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
0	9	0	9	$ 1,232,733,272
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 15,774,544
TOTAL				
0	10	0	10	$ 1,248,507,816
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10		TOTAL OBRA		10		21		32		$ 90,992,472	
11		$ 361,963,041.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	55.14%	11.61%	59.53%
PROGRAMADO	59.83%		
ATRASO	-4.69%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:


FECHA:	8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 43.21%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	  
2C 62.88%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	 

FECHA: 8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 97.50%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	  
4A 94.32%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	  


FECHA: 8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
4/1/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

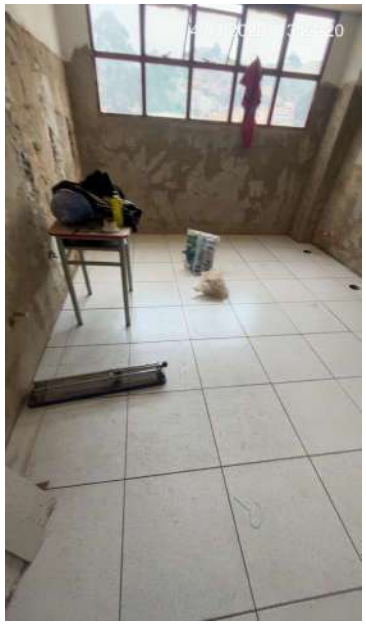TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 45.03%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 99.63%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA


FECHA: 5/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 90.23%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
8A 16.33%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  

FECHA:	5/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

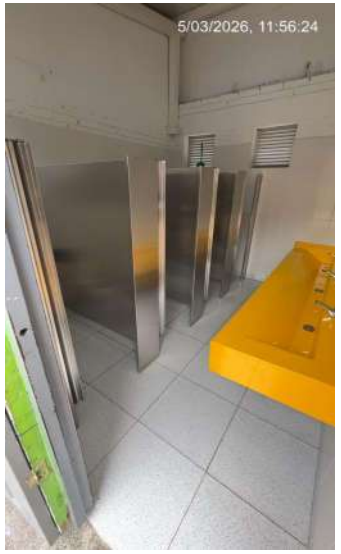TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 98.14%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	 
10A 20.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA:	8/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

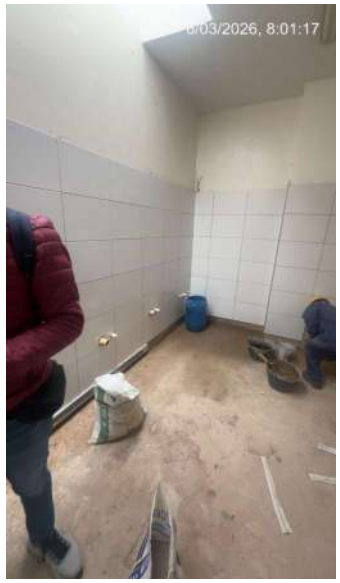TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 2.93%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 17			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		301.34	301.34	301.34		$ 33,201.35	$ 10,004,895.11	$ (10,004,895.11)	100.00%	100.00%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	2.00	1.00	$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	(8.54)	253.46	100.87		$ 361,355.09	$ 36,449,887.51	$ 58,225,144.99	38.50%	38.50%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	$ 71,238,470.42			
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 17			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			253.58	253.58	$ 23,042.63	$ 5,843,149.61	$ 508,090.00	92.00%	92.00%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	-366.54	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78	5.78	$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			91.97	91.97	$ 23,042.63	$ 2,119,230.50	$ 3,106,838.00	40.55%	40.55%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 76,277,532.90**			

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 17			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00			168.00		$ 4,233.48	$ 711,223.93	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00			22.88		$ 31,110.25	$ 711,802.43	$ 688,158.64	50.84%	50.84%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13			32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83			1.91		$ 144,722.00	$ 275,961.71	$ 567,767.58	32.71%	32.71%

DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15			5.15		$ 27,938.51	$ 143,883.34	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00			168.00		$ 36,752.18	$ 6,174,366.61	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00			18.00		$ 11,967.87	$ 215,421.59	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00			18.00		$ 7,469.97	$ 134,459.40	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00			7.00		$ 32,498.47	$ 227,489.29	$ -	100.00%	100.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90			3.90		$ 18,687.73	$ 72,882.16	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90	3.76	$ 89,839.27	$ 349,951.69	$ 421.45	99.88%	99.88%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1059.91	2455.20	2,455.20		$ 23,042.63	$ 56,574,260.27	$ (80,997,372.11)	-231.64%	-231.64%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	40.08		$ 91,590.40	$ 3,670,943.19	$ (1,252,956.66)	151.82%	151.82%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00					$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			40.6		$ 23,315.15	$ 946,594.94	$ 32,641.20	96.67%	96.67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			40.6		$ 20,790.98	$ 844,113.79	$ 29,107.37	96.67%	96.67%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00			21		$ 180,330.15	$ 3,786,933.14	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00			21		$ 238,055.44	$ 4,999,164.25	$ -	100.00%	100.00%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			14.52		$ 106,267.26	$ 1,543,000.58	$ 385,750.15	80.00%	80.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	27.5		$ 304,166.74	$ 8,364,585.26	$ (1,520,833.68)	122.22%	122.22%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1	3.98	$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			168.16	168.16	$ 4,663.84	$ 784,271.12	$ 261,408.16	75.00%	75.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 161,579,433.73**			
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00	145.00	$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%

DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	8.38	266.48	266.48		$ 135,394.33	$ 36,079,203.26	$ (1,133,927.00)	103.24%	103.24%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76			1,531.00		$ 23,042.63	$ 35,278,263.47	$ 6,423,363.00	84.60%	84.60%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			102.65		$ 15,217.85	$ 1,562,112.10	$ 233,594.00	86.99%	86.99%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			102.65		$ 16,070.48	$ 1,649,634.69	$ 246,682.00	86.99%	86.99%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00	3.00	$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 466,000,104.18**			
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%

DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	100.00	11.16	$ 140,306.40	$ 14,030,640.00	$ 10,045,938.24	58.28%	58.28%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08	43.33	$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			13.10	13.10	$ 15,372.99	$ 201,386.23	$ 75,327.67	72.78%	72.78%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			45.92	45.92	$ 98,222.57	$ 4,510,380.63	$ 8,356,776.65	35.05%	35.05%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	216.43		$ 20,236.50	$ 4,379,785.70	$ (3,029,606.42)	324.39%	324.39%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 109,854,926.43**			
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			520.00		$ 4,663.84	$ 2,425,196.12	$ 269,383.32	90.00%	90.00%
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B			**$ 71,937,066.93**			
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 153,228,554.90**			
CPF	**1918**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00	28.16	$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			97.64	10.18	$ 25,122.94	$ 2,453,003.88	$ 2,453,003.88	46.93%	46.93%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%


TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 38,251,414.90**			
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30					$ 31,110.25	$ -	$ 1,253,743.00	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52			17.65		$ 32,594.26	$ 575,269.06	$ 60,971.00	90.42%	90.42%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52			18.14		$ 22,300.62	$ 404,622.50	$ 30,686.00	92.95%	92.95%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52			19.52		$ 20,708.69	$ 404,233.53	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36			11.36		$ 33,174.37	$ 376,860.83	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52			17.27		$ 126,224.49	$ 2,180,124.22	$ 283,778.00	88.48%	88.48%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16			2.16		$ 1,127,967.67	$ 2,436,410.17	$ -	100.00%	100.00%


SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	11.82	40.64	40.64		$ 989,338.20	$ 40,205,121.56	$ (11,692,395.00)	141.01%	141.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50	35.50	$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19	100.19	$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A	**$ 73,676,306.02**			
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 17**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			91.07		$ 36,193.65	$ 3,296,156.14	$ 9,887,745.00	25.00%	25.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			23.00	11.00	$ 36,193.65	$ 832,454.06	$ 12,351,447.00	6.31%	6.31%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 10,689,461.48**			

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**55.14%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**1,232,733,271.88**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,235,717,955.58**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mar 08 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 71,238,470.42	43.21%	$ 164,884,421.00	-56.79%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 161,579,433.73	97.50%	$ 165,727,196.00	-2.50%
SIERRA MORENA	$ 84,799,015.71	69.91%	$ 76,277,532.90	62.88%	$ 121,299,091.00	-7.03%
FABIO LOZANO	$ 82,231,052.83	33.71%	$ 109,854,926.43	45.03%	$ 243,945,084.00	11.32%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494,079,400.58	100.00%	$ 466,000,104.18	94.32%	$ 494,079,400.58	-5.68%
BUENAVISTA	$ 142,241,770.17	83.76%	$ 153,228,554.90	90.23%	$ 169,818,729.00	6.47%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 67,378,404.09	93.31%	$ 71,937,066.93	99.63%	$ 72,206,451.00	6.31%
SANTA LIBRADA	$ 20,243,531.72	8.64%	$ 38,251,414.90	16.33%	$ 234,227,860.00	7.69%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 73,676,306.02	98.14%	$ 75,074,063.00	-1.86%
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A					$ 130,000,770.00	
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 40,978,548.84	11.24%	$ 10,689,461.48	2.93%	$ 364,449,204.00	-8.31%
TOTALES	**$ 1,337,637,403.95**	**59.83%**	**$ 1,232,733,271.88**	**55.14%**	**$ 2,235,712,269.58**	

OBSERVACIONES: En el periodo anterior se contabilizaban seis (6) colegios con atrasos, para esta semana encontramos siete (7). ***Unión Europea y Estrella del Sur***, colegios a los que se le vencio su plazo contractual promedian un 2% de atraso. ***Arborizadora Baja*** que también finalizó su plazo de entrega, registra un atraso superior al 5%. ***Orlando Fals, Buenavista y Guillermo Cano***, siguen con su tendencia de atraso mostrada en las semanas mas recientes. El porcentaje de atraso acumulado del contrato se incrementó un poco alcanzando en esta semana un 4.69%. Se le informó al contratista que debe entregar, a mas tardar el vie-13-mar-2026, terminadas y a satisfacción, las obras de dos colegios cuyo plazo contractual ya expiró so pena de dar inicio a los procesos sancionatorios pertinentes.

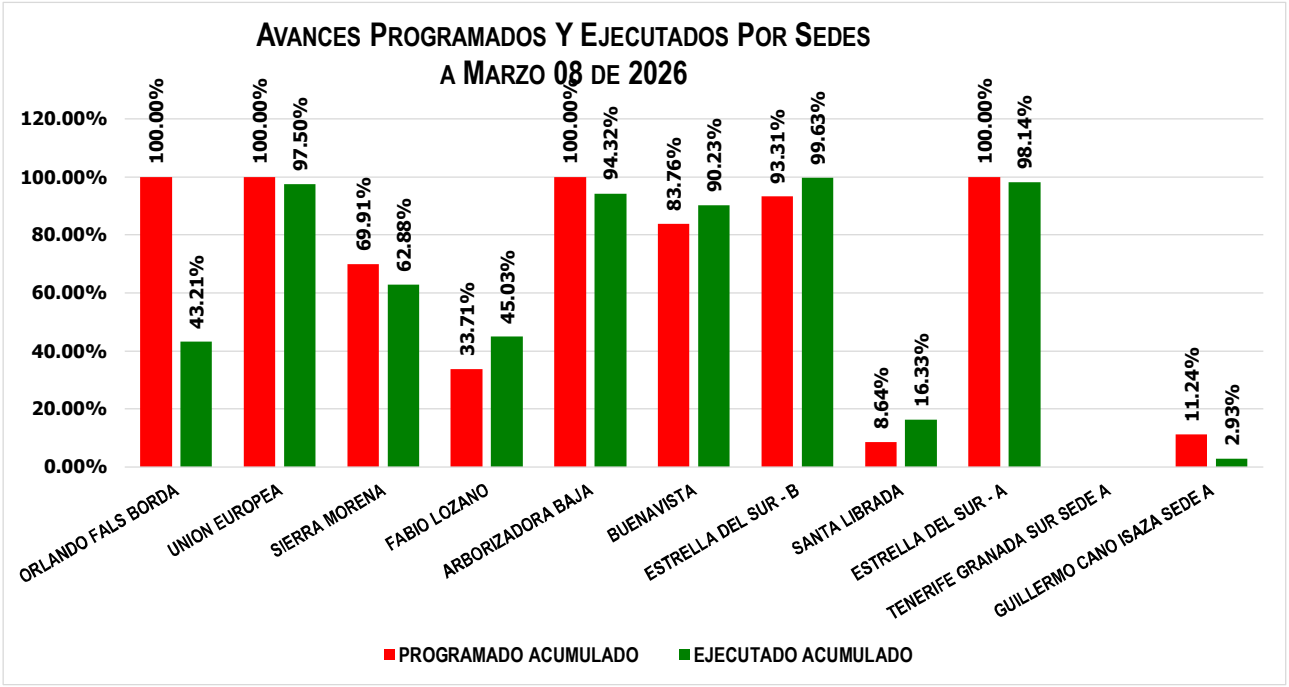

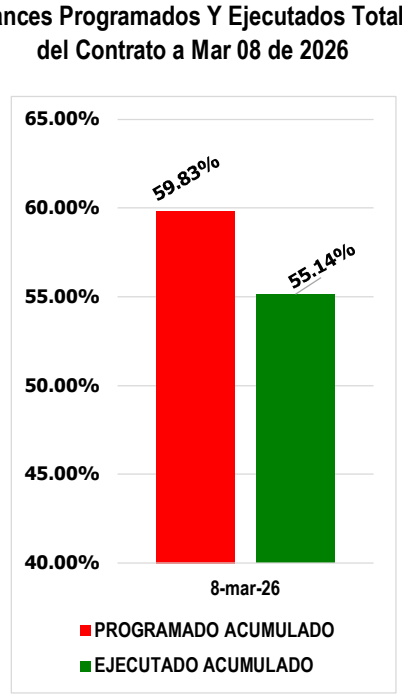

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Mar. 08 2026

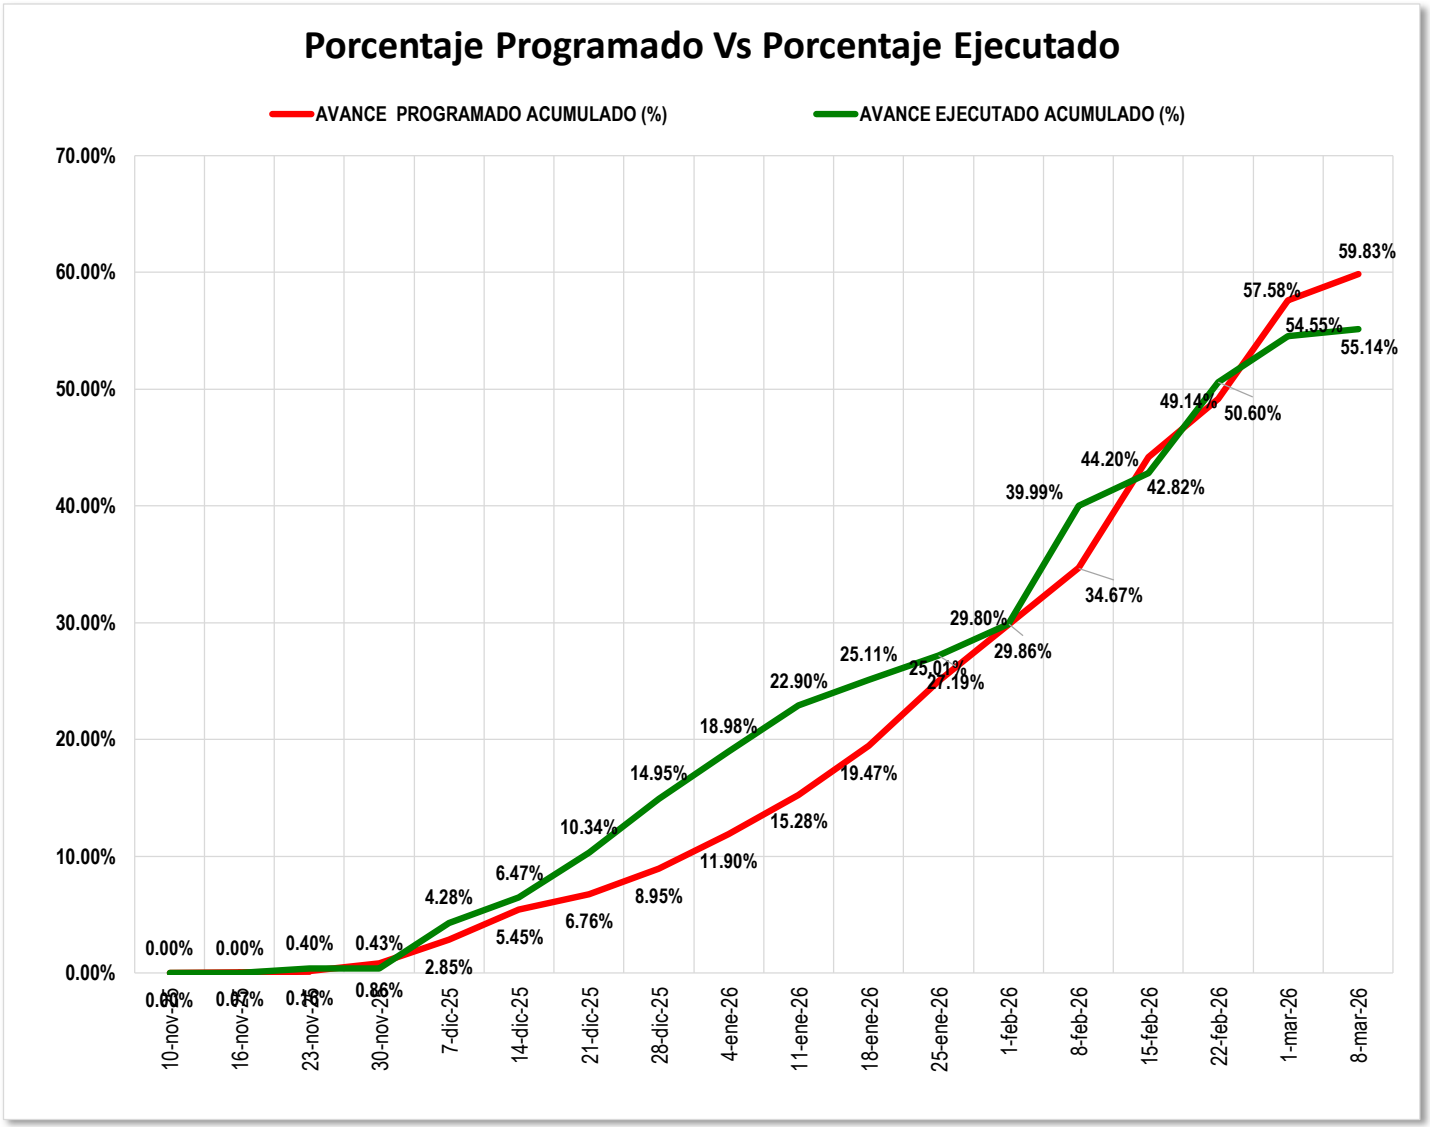

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.16%	0.40%
30-nov-25	0.86%	0.43%
7-dic-25	2.85%	4.28%
14-dic-25	5.45%	6.47%
21-dic-25	6.76%	10.34%
28-dic-25	8.95%	14.95%
4-ene-26	11.90%	18.98%
11-ene-26	15.28%	22.90%
18-ene-26	19.47%	25.11%
25-ene-26	25.01%	27.19%
1-feb-26	29.80%	29.86%
8-feb-26	34.67%	39.99%
15-feb-26	44.20%	42.82%
22-feb-26	49.14%	50.60%
1-mar-26	57.58%	54.55%
8-mar-26	**59.83%**	**55.14%**
15-mar-26	62.41%	
22-mar-26	64.92%	
29-mar-26	66.58%	
5-abr-26	69.85%	
12-abr-26	76.13%	
19-abr-26	81.09%	
26-abr-26	83.33%	
3-may-26	85.13%	
10-may-26	86.89%	
17-may-26	90.91%	
24-may-26	93.34%	
31-may-26	96.80%	
7-jun-26	98.24%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 97 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		GRUPO 2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS	
15 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028

SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	43.21%	49.71%	100.00%		$ 164,884,421	$ 81,956,262	10/11/2025	28/02/2026
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	97.50%	100.00%	100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	62.88%	63.30%	76.25%		$ 121,299,091	$ 76,785,623	10/11/2025	18/04/2026
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	45.03%	52.26%	39.94%		$ 243,945,084	$ 127,494,316	1/12/2025	11/04/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	94.32%	97.37%	100.00%		$ 494,079,401	$ 481,063,794	24/11/2025	28/02/2026
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	90.23%	90.29%	92.41%		$ 169,818,729	$ 153,329,770	10/12/2025	21/03/2026
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	99.63%	100.00%	100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	16.33%	21.73%	10.29%		$ 234,227,860	$ 50,889,995	15/01/2026	2/05/2026
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	98.14%	100.00%	100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	0.00%	1.26%	1.13%		$ 130,006,456	$ 1,637,644	9/03/2026	7/06/2026
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	2.93%	4.19%	13.99%		$ 364,449,204	$ 15,272,607	13/01/2026	19/06/2026
TOTAL FRENTES DE OBRA						58.21%	62.41%		$ 2,235,717,956	$ 1,301,437,720		

EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO

590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	0.00%	81.58%	100.00%		$ 26,605,858	$ 21,703,882	26/01/2026	1/03/2026
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja					$ 35,000,000			
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.58%	100.00%		$ 61,605,858	$ 21,703,882		

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 1,301,437,720
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 21,703,882
TOTAL				
2	8	0	10	$ 1,323,141,602
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10		TOTAL OBRA		10		21		32		$ 90,992,472	
11		$ 361,963,041.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	58.21%	11.61%	62.26%
PROGRAMADO	62.41%		
ATRASO	-4.20%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:

FECHA: 15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 49.71%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	  
2C 63.30%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA: 15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	 
4A 97.37%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	 

FECHA:	15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 52.26%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	 

FECHA: 15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 90.29%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	 
8A 21.73%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	 

FECHA:	15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	 
10A 20.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	 

FECHA:	15/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	GRUPO 2

CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 4.19%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 1.26%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 18			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		301.34	301.34	301.34		$ 33,201.35	$ 10,004,895.11	$ (10,004,895.11)	100.00%	100.00%
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	2.00		$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	(8.54)	253.46	130.53	29.66	$ 361,355.09	$ 47,167,679.36	$ 47,507,353.14	49.82%	49.82%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	$ 81,956,262.27			
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 18			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	-366.54	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			91.97		$ 23,042.63	$ 2,119,230.50	$ 3,106,838.00	40.55%	40.55%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 76,785,622.84**			

CPF	1930	IED			UNIÓN EUROPEA			SEMANA 18			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	168.67%	168.67%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.7	61.7	$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**			

CPF	1904	IED			ARBORIZADORA BAJA			SEMANA 18			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%

DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00		$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00			116.00	116.00	$ 42,650.45	$ 4,947,451.90	$ 1,236,862.97	80.00%	80.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	8.38	266.48	266.48		$ 135,394.33	$ 36,079,203.26	$ (1,133,927.00)	103.24%	103.24%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA							**$ 481,063,793.71**			
CPF	**523**	**IED**			**Fabio Lozano Simonelli**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00	22.00	$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00	4.90	$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03	46.11	$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73			1.17	1.17	$ 1,128,301.00	$ 1,323,497.07	$ 11,911,473.66	10.00%	10.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82			7.17	7.17	$ 989,338.00	$ 7,096,521.47	$ 40,213,621.69	15.00%	15.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			0.18	0.18	$ 989,338.00	$ 178,080.84	$ 1,602,727.56	10.00%	10.00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 127,494,316.48**			
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**			
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00	1.00	$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 153,329,769.78**			
CPF	**1918**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00	20.36	$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%

TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			33.56	33.56	$ 361,355.09	$ 12,127,076.67	$ 12,127,076.67	10.00%	10.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 50,889,994.63**			
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%
				SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A				**$ 75,074,063.00**			
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			10.00	10.00	$ 7,469.97	$ 74,699.67	$ 224,099.00	25.00%	25.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			15.00	15.00	$ 18,687.73	$ 280,316.00	$ 1,588,457.00	15.00%	15.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10	5.10	$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%


DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85	18.85	$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			18.85	18.85	$ 126,224.49	$ 2,379,331.72	$ 13,971,789.00	14.55%	14.55%
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			8.00	8.00	$ 15,372.99	$ 122,983.96	$ 338,206.00	26.67%	26.67%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			91.07		$ 36,193.65	$ 3,296,156.14	$ 9,887,745.00	25.00%	25.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			29.58	6.58	$ 36,193.65	$ 1,070,608.31	$ 12,113,292.00	8.12%	8.12%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 15,272,606.58**			
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 18**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00	193.00	$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00	26.00	$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 1,637,644.16**			

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**58.21%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**1,301,437,719.70**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,235,717,955.58**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mar 15 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 81,956,262.27	49.71%	$ 164,884,421.00	-50.29%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	0.00%
SIERRA MORENA	$ 92,485,421.52	76.25%	$ 76,785,622.84	63.30%	$ 121,299,091.00	-12.94%
FABIO LOZANO	$ 97,435,932.54	39.94%	$ 127,494,316.48	52.26%	$ 243,945,084.00	12.32%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494,079,400.58	100.00%	$ 481,063,793.71	97.37%	$ 494,079,400.58	-2.63%
BUENAVISTA	$ 156,933,355.45	92.41%	$ 153,329,769.78	90.29%	$ 169,818,729.00	-2.12%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	0.00%
SANTA LIBRADA	$ 24,110,060.68	10.29%	$ 50,889,994.63	21.73%	$ 234,227,860.00	11.43%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	0.00%
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 1,471,121.50	1.13%	$ 1,637,644.16	1.26%	$ 130,006,456.00	0.13%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 51,001,203.60	13.99%	$ 15,272,606.58	4.19%	$ 364,449,204.00	-9.80%
TOTALES	$ 1,395,408,626.86	62.41%	$ 1,301,437,719.70	58.21%	$ 2,235,717,955.58	-4.20%

OBSERVACIONES: En este periodo el contratista entrega las ***IED Estrella del Sur Sedes A y B y Unión Europea. La IED Orlando Fals Borda,*** cuyo plazo de entrega ya venció presenta un atraso superior al 50%, mientras que ***Sierra Morena y Guillermo Cano Isaza*** presentan atrasos del 12.94 y 9.80% respectivamente. El atraso general del contrato se sitúa en 4.20 %

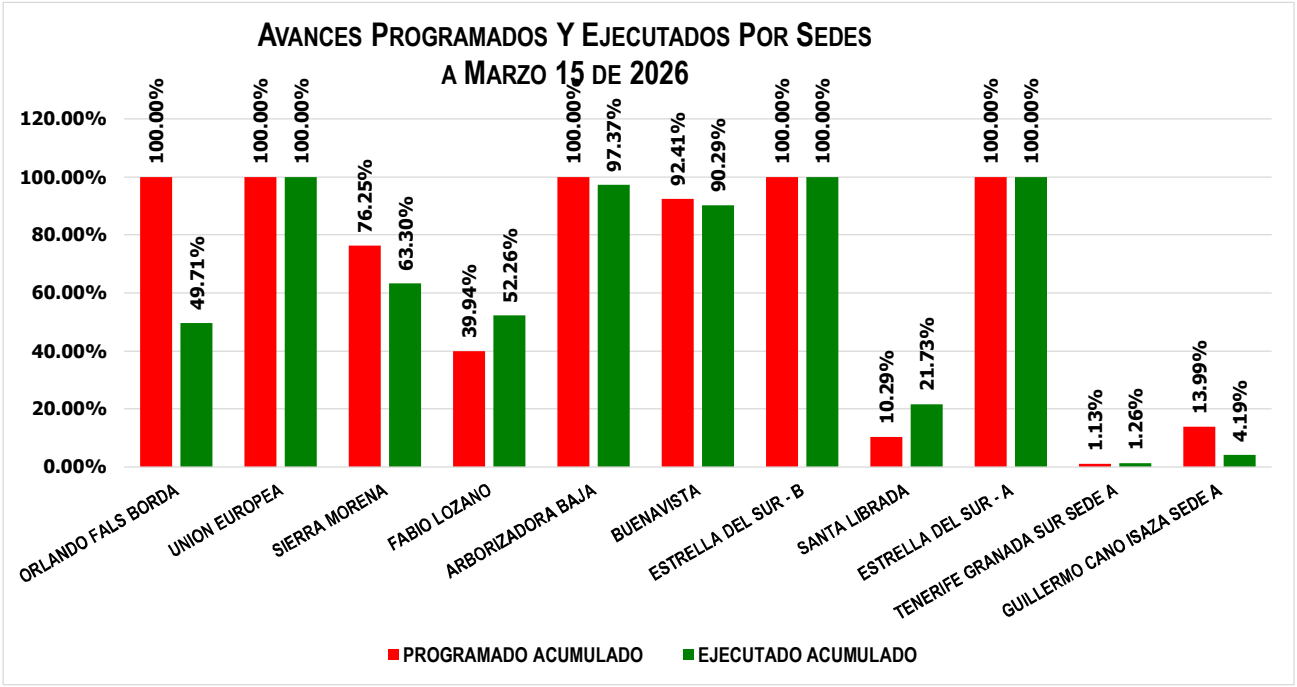

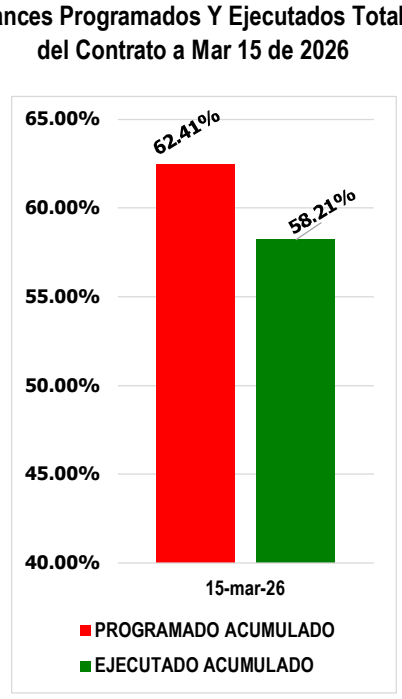

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Mar. 15 2026

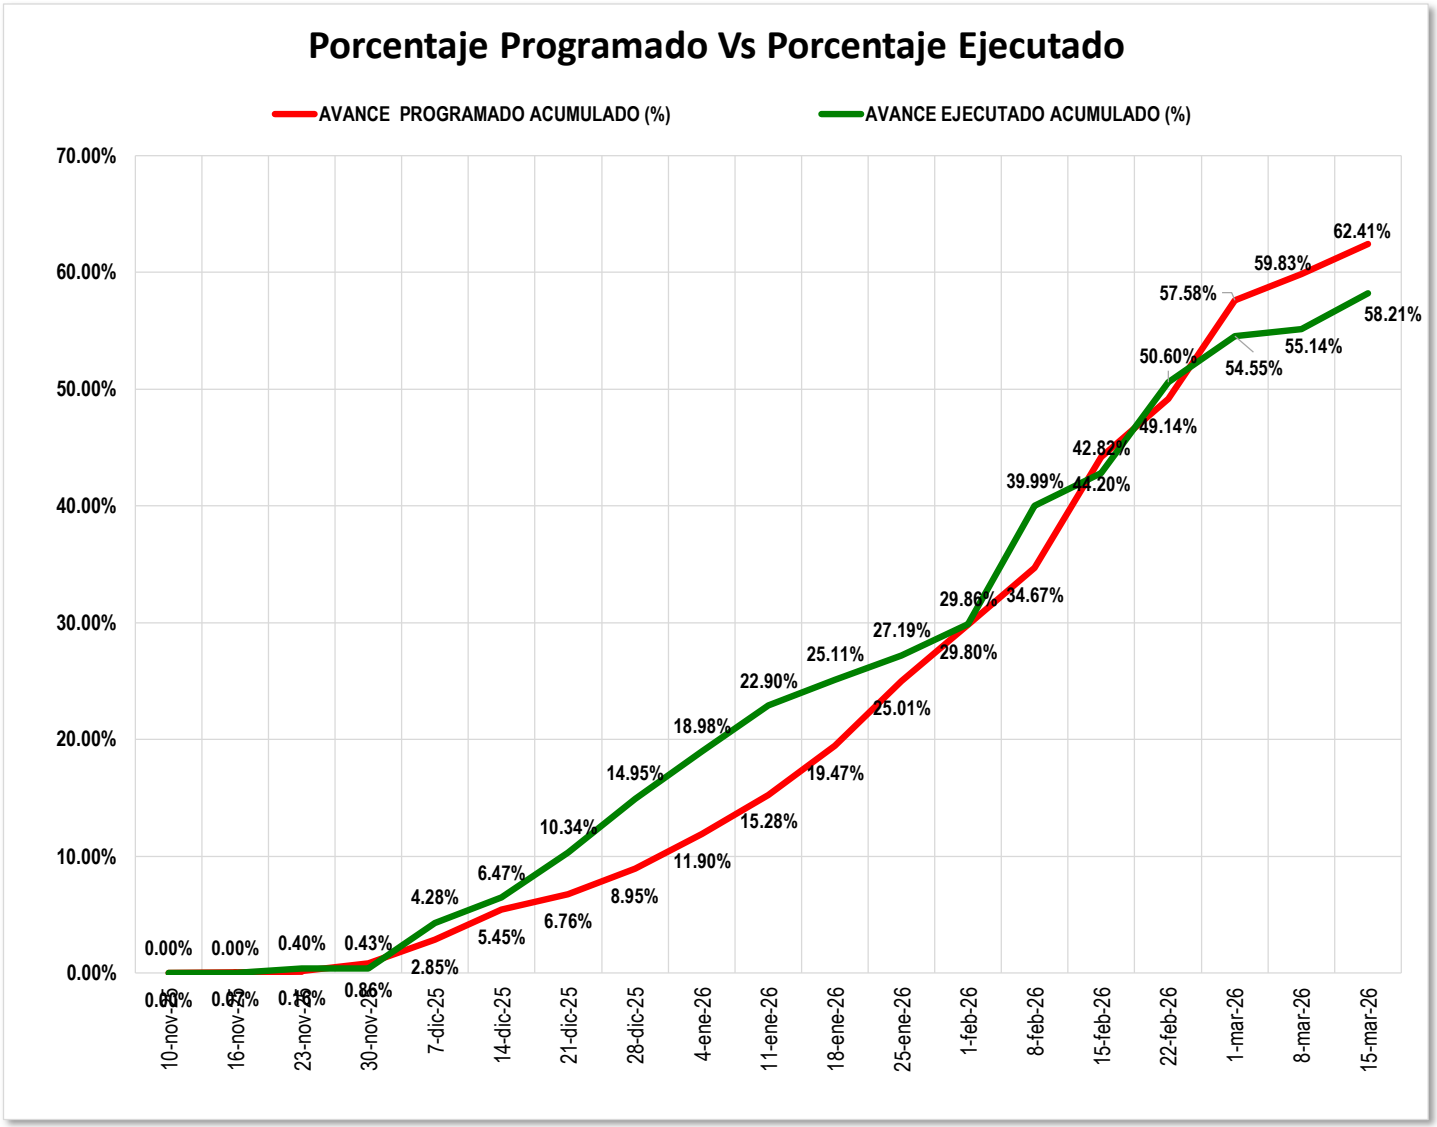

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.16%	0.40%
30-nov-25	0.86%	0.43%
7-dic-25	2.85%	4.28%
14-dic-25	5.45%	6.47%
21-dic-25	6.76%	10.34%
28-dic-25	8.95%	14.95%
4-ene-26	11.90%	18.98%
11-ene-26	15.28%	22.90%
18-ene-26	19.47%	25.11%
25-ene-26	25.01%	27.19%
1-feb-26	29.80%	29.86%
8-feb-26	34.67%	39.99%
15-feb-26	44.20%	42.82%
22-feb-26	49.14%	50.60%
1-mar-26	57.58%	54.55%
8-mar-26	59.83%	55.14%
15-mar-26	**62.41%**	**58.21%**
22-mar-26	64.92%	
29-mar-26	66.58%	
5-abr-26	69.85%	
12-abr-26	76.13%	
19-abr-26	81.09%	
26-abr-26	83.33%	
3-may-26	85.13%	
10-may-26	86.89%	
17-may-26	90.91%	
24-may-26	93.34%	
31-may-26	96.80%	
7-jun-26	98.24%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 23/03/2026 | DIAS RESTANTES: 90 Dias | ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 2

CORTE DEL INFORME: 22 de marzo de 2026

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PAIS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

FECHAS		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026

PLAZOS EN DIAS		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	211	211
SUSPENSIONES		
PRÓRROGAS	46	46
TOTAL	257	257

VALOR CONTRATO		
ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA — SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA	POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028	39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	49.71%	93.55%		100.00%		$ 164,884,421	$ 154,242,005	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	63.30%	73.91%		80.21%		$ 121,299,091	$ 89,646,649	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	52.26%	74.97%		46.32%		$ 243,945,084	$ 182,883,041	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	97.37%	97.62%		100.00%		$ 494,079,401	$ 482,300,657	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	90.29%	93.33%		100.00%		$ 169,818,729	$ 158,491,471	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	21.73%	23.31%		14.58%		$ 234,227,860	$ 54,601,919	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	1.26%	14.31%		1.98%		$ 130,006,456	$ 18,599,275	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	4.19%	5.44%		17.19%		$ 364,449,204	$ 19,837,712	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						65.91%		64.92%		$ 2,235,717,956	$ 1,473,610,438																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	0.00%	81.58%		100.00%		$ 26,605,858	$ 21,703,882	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)						$ 100,413,274																					
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.58%		100.00%		$ 162,019,132	$ 21,703,882																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 1,473,610,438
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 21,703,882
TOTAL				
2	8	0	10	$ 1,495,314,320
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
				2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
		14		3		14		25		36	
		15		4		15		26		37	
		16		5		16		27		38	
		17		6		17		28		39	
		18		7		18		29		40	
		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
		20		9		20		31			
		TOTAL OBRA				21		32		$ 90,992,472	
$ 361,963,041.00				11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	65.91%	11.61%	64.98%
PROGRAMADO	64.92%		
ATRASO	0.99%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			












OBSERVACIONES:


FECHA:	23/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 93.55%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	 
2C 73.91%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	 

FECHA: 23/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

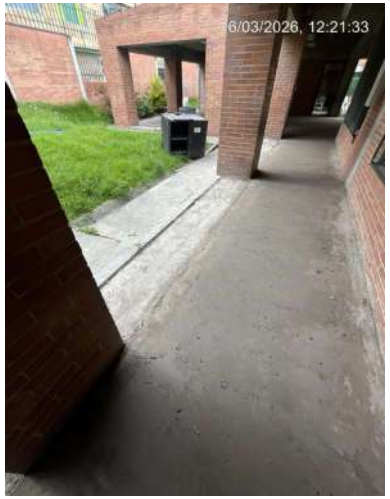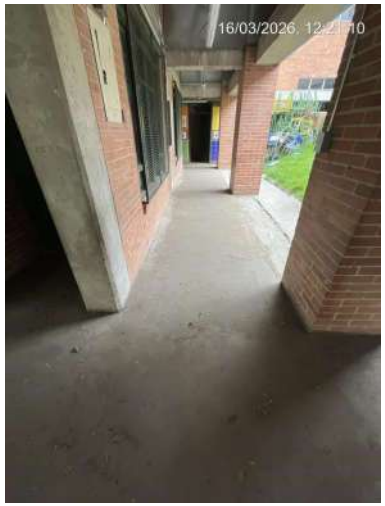TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 97.62%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	 

FECHA: 23/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

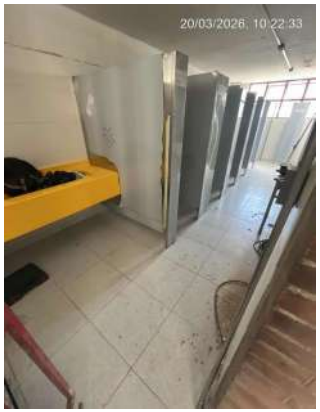TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 74.97%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	FRENTE AL 100%

FECHA: 23/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 166 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 93.33%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	 
8A 23.31%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	 

FECHA: 23/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 20.00%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA**

FECHA:	23/03/2026						
DIAS RESTANTES	195	Dias	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
REGISTRO FOTOGRAFICO						GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 5.44%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 14.31%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 19			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	-62.60	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-181.34	120.00	120.00		$ 33,201.35	$ 3,984,162.12	$ 6,020,732.99	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20			79.20		$ 69,099.55	$ 5,472,684.59	$ -		
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00			34.00		$ 107,273.69	$ 3,647,305.34	$ -		
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	-13.00	3.00	2.00		$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	-72.00	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	300.00			300.00		$ 34,369.67	$ 10,310,901.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	31.46	293.46	293.46	162.93	$ 361,355.09	$ 106,043,263.51	$ (11,368,231.00)	112.01%	112.01%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	$ 154,242,004.84			
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 19			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%

DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	-366.54	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	(4.00)	-	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80	134.83	$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84			36.84	36.84	$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 89,646,648.62**			
CPF	**1930**	**IED**				**UNIÓN EUROPEA**		**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	168.67%	168.67%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	(1.00)	-			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.90		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42.00		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42.00		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%

SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70	61.70	$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**			
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00		$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00			145.00	29.00	$ 42,650.45	$ 6,184,314.87	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	8.38	266.48	266.48		$ 135,394.33	$ 36,079,203.26	$ (1,133,927.00)	103.24%	103.24%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%

CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 482,300,656.68**			
CPF	**523**	**IED**				**Fabio Lozano Simonelli**		**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%

ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	(548.06)	-			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	(44.68)	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00	1.00	$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			6.00	6.00	$ 180,330.15	$ 1,081,980.90	$ 360,660.30	75.00%	75.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73			11.73	10.56	$ 1,128,301.00	$ 13,238,355.63	$ (3,384.90)	100.03%	100.03%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82			47.82	40.65	$ 989,338.00	$ 47,313,111.17	$ (2,968.01)	100.01%	100.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			1.80	1.62	$ 989,338.00	$ 1,780,808.40	$ (0.00)	100.00%	100.00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 182,883,040.68**			
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%
				SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B				**$ 72,206,450.25**			
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			39.60	39.60	$ 130,345.99	$ 5,161,701.39	$ 573,522.38	90.00%	90.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 158,491,471.17**			
CPF	**1918**	**IED**			**SANTA LIBRADA (IED)**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%

MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60			108.00	108.00	$ 34,369.67	$ 3,711,924.53	$ 3,711,924.53	30.29%	30.29%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			33.56		$ 361,355.09	$ 12,127,076.67	$ 12,127,076.67	10.00%	10.00%
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA			**$ 54,601,919.16**			
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	(1.99)	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	(0.80)	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A			**$ 75,074,063.00**			
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 19**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			10.00		$ 7,469.97	$ 74,699.67	$ 224,099.00	25.00%	25.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			15.00		$ 18,687.73	$ 280,316.00	$ 1,588,457.00	15.00%	15.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31	47.69	$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%


DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			18.85		$ 126,224.49	$ 2,379,331.72	$ 13,971,789.00	14.55%	14.55%
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			8.00		$ 15,372.99	$ 122,983.96	$ 338,206.00	26.67%	26.67%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00	85.93	$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			69.78	40.20	$ 36,193.65	$ 2,525,593.23	$ 10,658,307.00	19.16%	19.16%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 19,837,712.26**			


CPF	548	IED			TENERIFE - GRANADA SUR (IED)			SEMANA 19			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00	193.00	$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00	26.00	$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83	24.83	$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28	44.28	$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 18,599,274.89**			

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**65.91%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $	**1,473,610,437.55**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $	**2,235,717,955.58**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mar 22 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 154,242,004.84	93.55%	$ 164,884,421.00	-6.45%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 97,292,394.72	80.21%	$ 89,646,648.62	73.91%	$ 121,299,091.00	-6.30%
FABIO LOZANO	$ 113,002,773.00	46.32%	$ 182,883,040.68	74.97%	$ 243,945,084.00	28.65%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494,079,400.58	100.00%	$ 482,300,656.68	97.62%	$ 494,079,400.58	-2.38%
BUENAVISTA	$ 169,818,729.00	100.00%	$ 158,491,471.17	93.33%	$ 169,818,729.00	-6.67%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 34,143,483.39	14.58%	$ 54,601,919.16	23.31%	$ 234,227,860.00	8.73%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 2,580,392.45	1.98%	$ 18,599,274.89	14.31%	$ 130,006,456.00	12.32%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 62,638,609.15	17.19%	$ 19,837,712.26	5.44%	$ 364,449,204.00	-11.74%
TOTALES	$ 1,451,447,913.28	64.92%	$ 1,473,610,437.55	65.91%	$ 2,235,717,955.58	0.99%

OBSERVACIONES: En este periodo, aunque el adelanto total del contrato es inferior al 1%, las ***IED Orlando Fals Borda, Sierra Morena y Buenavista Calazans*** reportan atrasos superiores al 6%. Por otro lado el atraso de la ***IED Guillermo Cano Isaza*** está cercano al 12%, y el colegio ***Arborizadora Baja*** presenta atrasos del 2.38%. En general, el contrato presenta un buen panorama reflejo del trabajo realizado en las semanas mas recientes. Es un poco preocupante los atrasos que registran las 4 sedes enunciadas anteriormente por lo que solicita al contratista de obra tomar las medidas necesarias para mitigarlos.

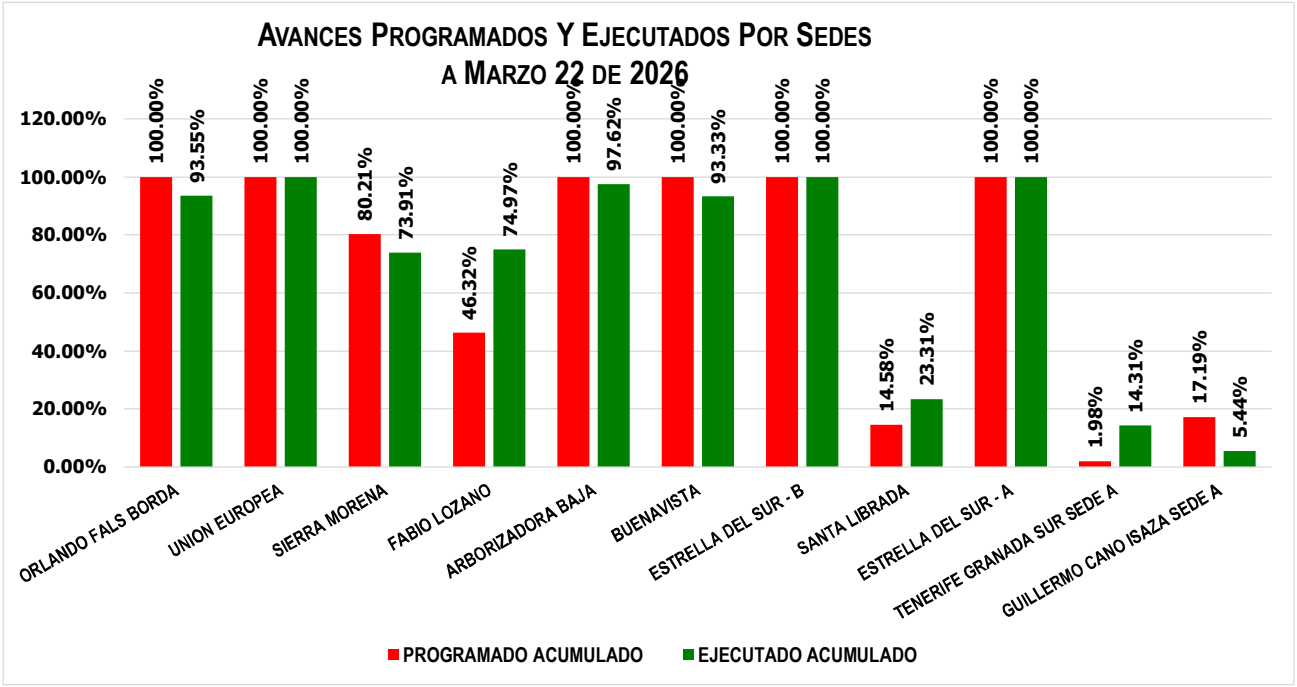

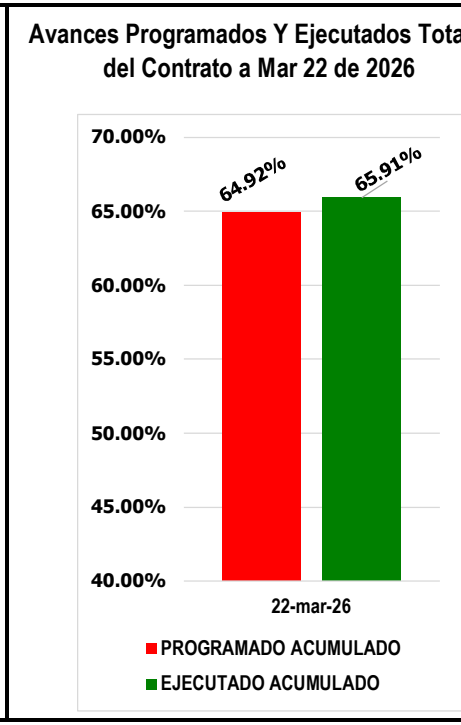

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Mar. 22 2026

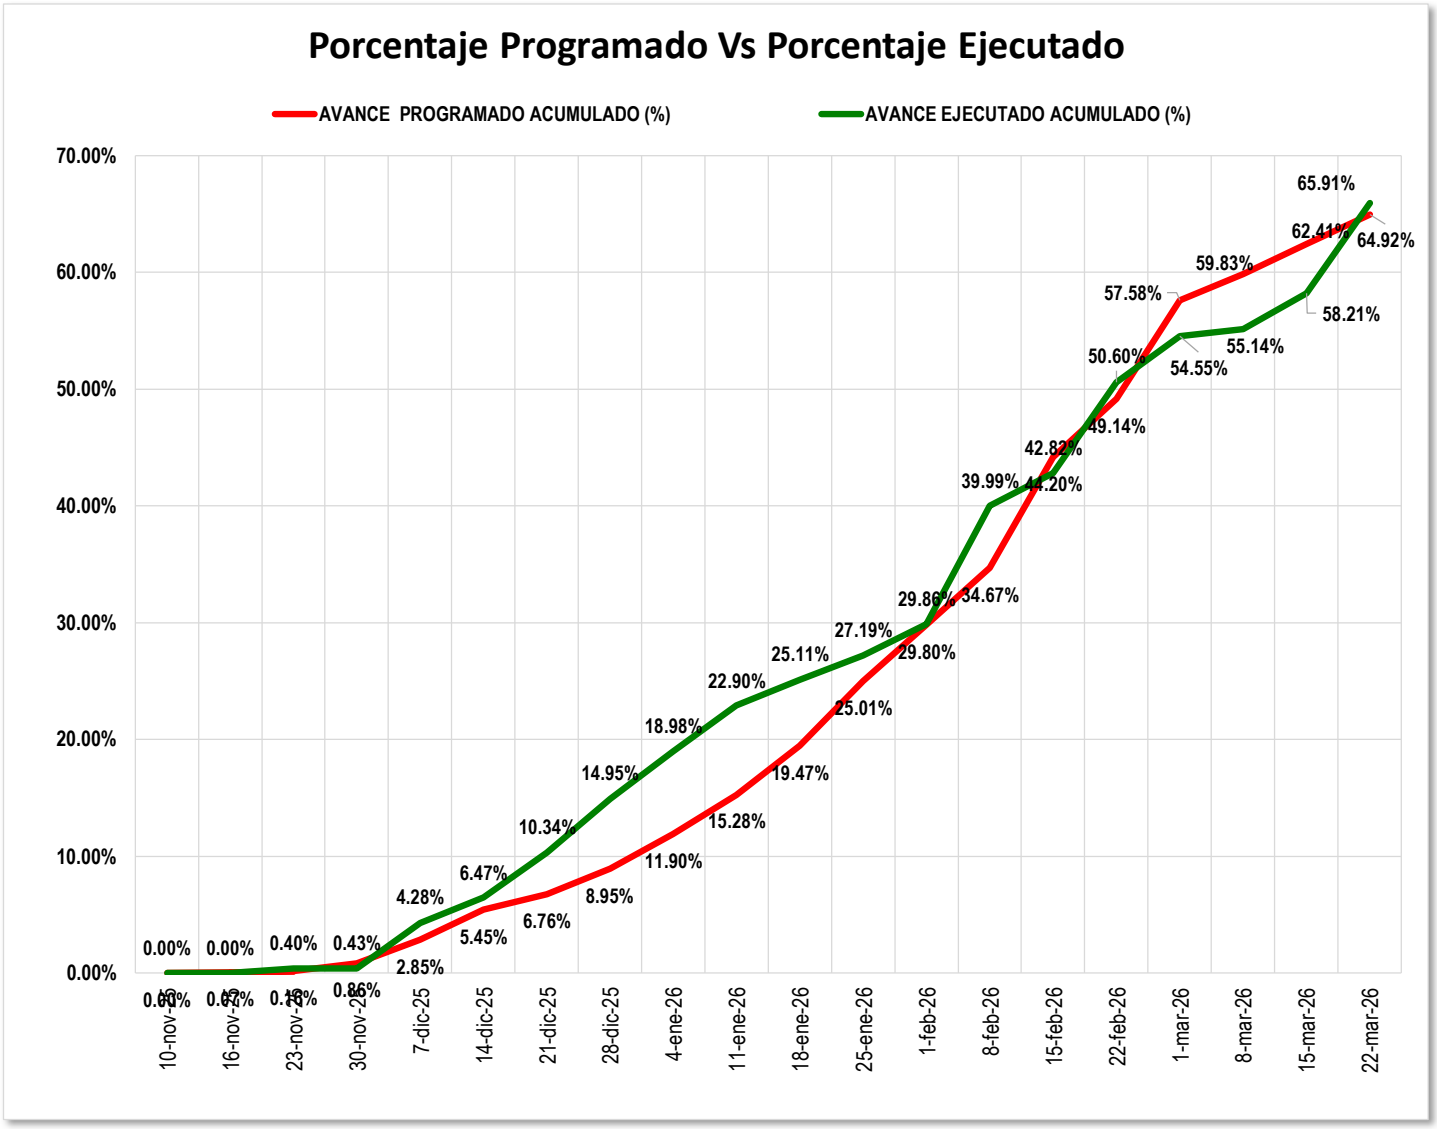

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.16%	0.40%
30-nov-25	0.86%	0.43%
7-dic-25	2.85%	4.28%
14-dic-25	5.45%	6.47%
21-dic-25	6.76%	10.34%
28-dic-25	8.95%	14.95%
4-ene-26	11.90%	18.98%
11-ene-26	15.28%	22.90%
18-ene-26	19.47%	25.11%
25-ene-26	25.01%	27.19%
1-feb-26	29.80%	29.86%
8-feb-26	34.67%	39.99%
15-feb-26	44.20%	42.82%
22-feb-26	49.14%	50.60%
1-mar-26	57.58%	54.55%
8-mar-26	59.83%	55.14%
15-mar-26	62.41%	58.21%
22-mar-26	**64.92%**	**65.91%**
29-mar-26	66.58%	
5-abr-26	69.85%	
12-abr-26	76.13%	
19-abr-26	81.09%	
26-abr-26	83.33%	
3-may-26	85.13%	
10-may-26	86.89%	
17-may-26	90.91%	
24-may-26	93.34%	
31-may-26	96.80%	
7-jun-26	98.24%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES 83 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			GRUPO	2
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO PAIS			
29 de marzo de 2026	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO			

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154780	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRÓRROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	GARANTE:	SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028

SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)	PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	93.55%	93.55%	100.00%		$ 164,884,421	$ 154,242,005	10/11/2025	28/02/2026																		
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%	100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																		
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	73.91%	73.91%	84.90%		$ 121,299,091	$ 89,646,649	10/11/2025	18/04/2026																		
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	74.97%	77.14%	52.37%		$ 243,945,084	$ 188,180,548	1/12/2025	11/04/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	97.62%	97.62%	100.00%		$ 494,079,401	$ 482,300,657	24/11/2025	28/02/2026																		
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	93.33%	93.67%	100.00%		$ 169,818,729	$ 159,064,994	10/12/2025	21/03/2026																		
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%	100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																		
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	23.31%	35.10%	17.26%		$ 234,227,860	$ 82,223,902	15/01/2026	2/05/2026																		
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%	100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																		
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	14.31%	44.66%	2.69%		$ 130,006,456	$ 58,060,450	9/03/2026	7/06/2026																		
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	5.44%	8.97%	19.76%		$ 364,449,204	$ 32,691,817	13/01/2026	19/06/2026																		
TOTAL FRENTES DE OBRA						69.75%	66.58%		$ 2,235,717,956	$ 1,559,418,730																				
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																														
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	0.00%	81.58%	100.00%		$ 26,605,858	$ 21,703,882	26/01/2026	1/03/2026																		
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja					$ 35,000,000																					
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)					$ 100,413,274																					
566	LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)	USME	A	Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo																										
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.58%	100.00%		$ 162,019,132	$ 21,703,882																				

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 1,559,418,730
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 21,703,882
TOTAL				
2	8	0	10	$ 1,581,122,612
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR	No ACTA INTERVENTORIA	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30			
9		20		9		20		31		TOTAL INTERVENTORIA	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11	$ 361,963,041.00			11		22		33		$ 90,992,472	


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	69.75%	11.61%	67.70%
PROGRAMADO	66.58%		
ATRASO	3.17%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			










OBSERVACIONES:

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 93.55%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
2C 73.91%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA:	29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780		CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110		INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	**FRENTE AL 100%**
4A 97.62%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	**NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA**

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Días	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 77.14%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	   
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.					INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA					GRUPO 2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 93.67%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	 
8A 35.10%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	 

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA**

FECHA: 29/03/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
4/1/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 8.97%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 44.66%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 20			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	(181.34)	120.00	120.00		$ 33,201.35	$ 3,984,162.12	$ 6,020,732.99	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20			79.20		$ 69,099.55	$ 5,472,684.59	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00			34.00		$ 107,273.69	$ 3,647,305.34	$ -	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	2.00		$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%
JUNTA DE DILATACION INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS	M	300.00			300.00		$ 34,369.67	$ 10,310,901.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	31.46	293.46	293.46		$ 361,355.09	$ 106,043,263.51	$ (11,368,231.00)	112.01%	112.01%
						SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA		**$ 154,242,004.84**			
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 20			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%

CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	-366.54	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80		$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 INCLUYE TAPAS DE BORDE DE	M2	36.84			36.84		$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA	**$ 89,646,648.62**			
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%

EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	168.67%	168.67%
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%

SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.7		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**			
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00		$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00			145.00		$ 42,650.45	$ 6,184,314.87	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	8.38	266.48	266.48		$ 135,394.33	$ 36,079,203.26	$ (1,133,927.00)	103.24%	103.24%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 482,300,656.68**			
CPF	**523**	**IED**				**Fabio Lozano Simonelli**		**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%

DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77	49.77	$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00	2.00	$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00	32.00	$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00	32.00	$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00	8.00	$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73			11.73		$ 1,128,301.00	$ 13,238,355.63	$ (3,384.90)	100.03%	100.03%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82			47.82		$ 989,338.00	$ 47,313,111.17	$ (2,968.01)	100.01%	100.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			1.80		$ 989,338.00	$ 1,780,808.40	$ (0.00)	100.00%	100.00%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 188,180,548.07**			
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**			
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00	4.40	$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 159,064,993.54**			

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 20			
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60			108.00		$ 34,369.67	$ 3,711,924.53	$ 3,711,924.53	30.29%	30.29%

SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			110.00	76.44	$ 361,355.09	$ 39,749,059.39	$ 39,749,059.39	32.78%	32.78%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 82,223,901.89**			
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A			**$ 75,074,063.00**			
CPF	**1959**	**IED**			**GUILLERMO CANO ISAZA (IED)**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			10.00		$ 7,469.97	$ 74,699.67	$ 224,099.00	25.00%	25.00%
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			15.00		$ 18,687.73	$ 280,316.00	$ 1,588,457.00	15.00%	15.00%
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%


DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			64.24	45.39	$ 126,224.49	$ 8,108,661.51	$ 8,242,459.00	49.59%	49.59%
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			8.00		$ 15,372.99	$ 122,983.96	$ 338,206.00	26.67%	26.67%
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			98.25	28.47	$ 98,222.57	$ 9,650,367.95	$ 26,128,187.00	26.97%	26.97%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	**$ 32,691,816.77**			
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 20**			
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00		$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83		$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28		$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00			97.50	97.50	$ 404,730.00	$ 39,461,175.00	$ 21,248,325.00	65.00%	65.00%
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR	**$ 58,060,449.89**			

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**69.75%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**1,559,418,729.55**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,235,717,955.58**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Mar 29 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 154,242,004.84	93.55%	$ 164,884,421.00	-6.45%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 102,982,214.23	84.90%	$ 89,646,648.62	73.91%	$ 121,299,091.00	-10.99%
FABIO LOZANO	$ 127,743,979.19	52.37%	$ 188,180,548.07	77.14%	$ 243,945,084.00	24.77%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494,079,400.58	100.00%	$ 482,300,656.68	97.62%	$ 494,079,400.58	-2.38%
BUENAVISTA	$ 169,818,729.00	100.00%	$ 159,064,993.54	93.67%	$ 169,818,729.00	-6.33%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 40,429,431.01	17.26%	$ 82,223,901.89	35.10%	$ 234,227,860.00	17.84%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 3,498,875.69	2.69%	$ 58,060,449.89	44.66%	$ 130,006,456.00	41.97%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 72,033,231.01	19.76%	$ 32,691,816.77	8.97%	$ 364,449,204.00	-10.79%
TOTALES	$ 1,488,477,991.71	66.58%	$ 1,559,418,729.55	69.75%	$ 2,235,717,955.58	3.17%

OBSERVACIONES: Igual que en el periodo anterior, se mantiene un adelanto con relación a lo programdo. Al cierre de esta semana encontramos que las ***IED Orlando Fals Borda y Buenavista Calasanz*** registran atrasos superiores al 6%, mientras que en las ***IED Sierra Morena y Guillermo Cano Isaza*** , los traos están cercanos al 11%. El porcentaje de adelanto ejecutado es superior al 3%

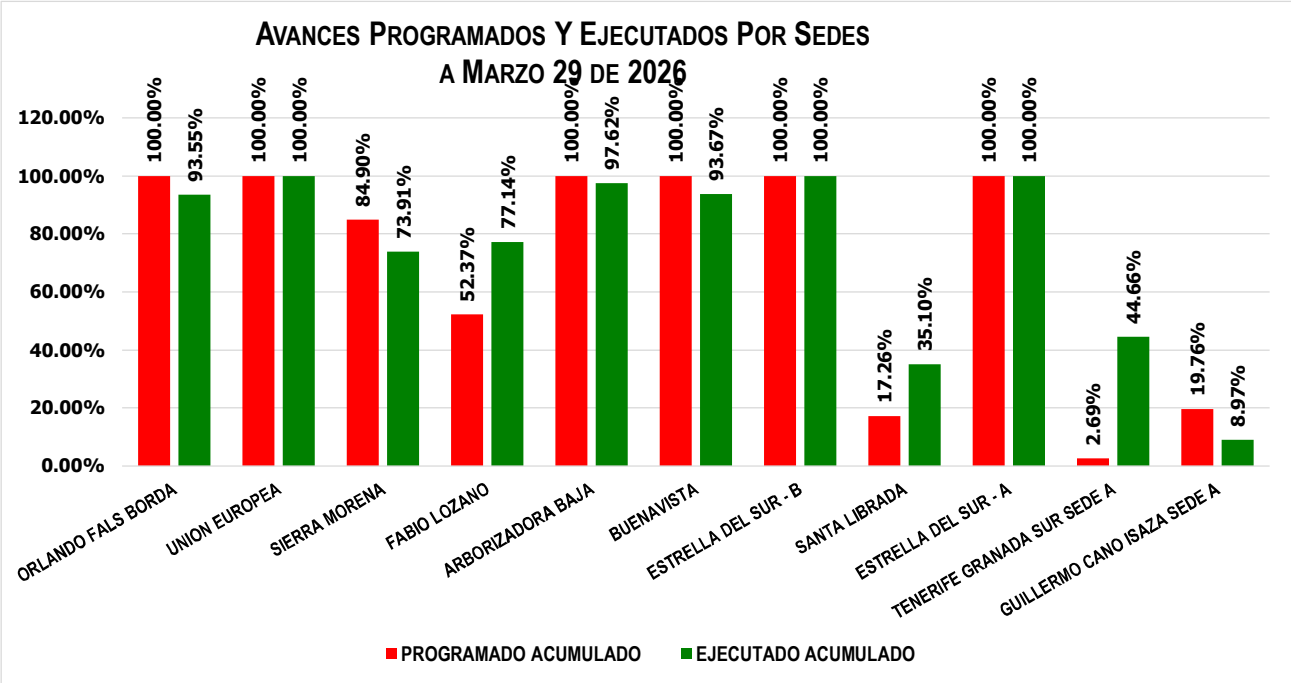

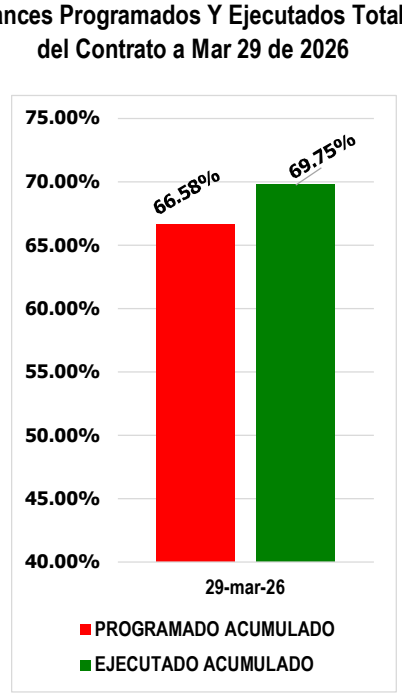

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Mar. 29 2026

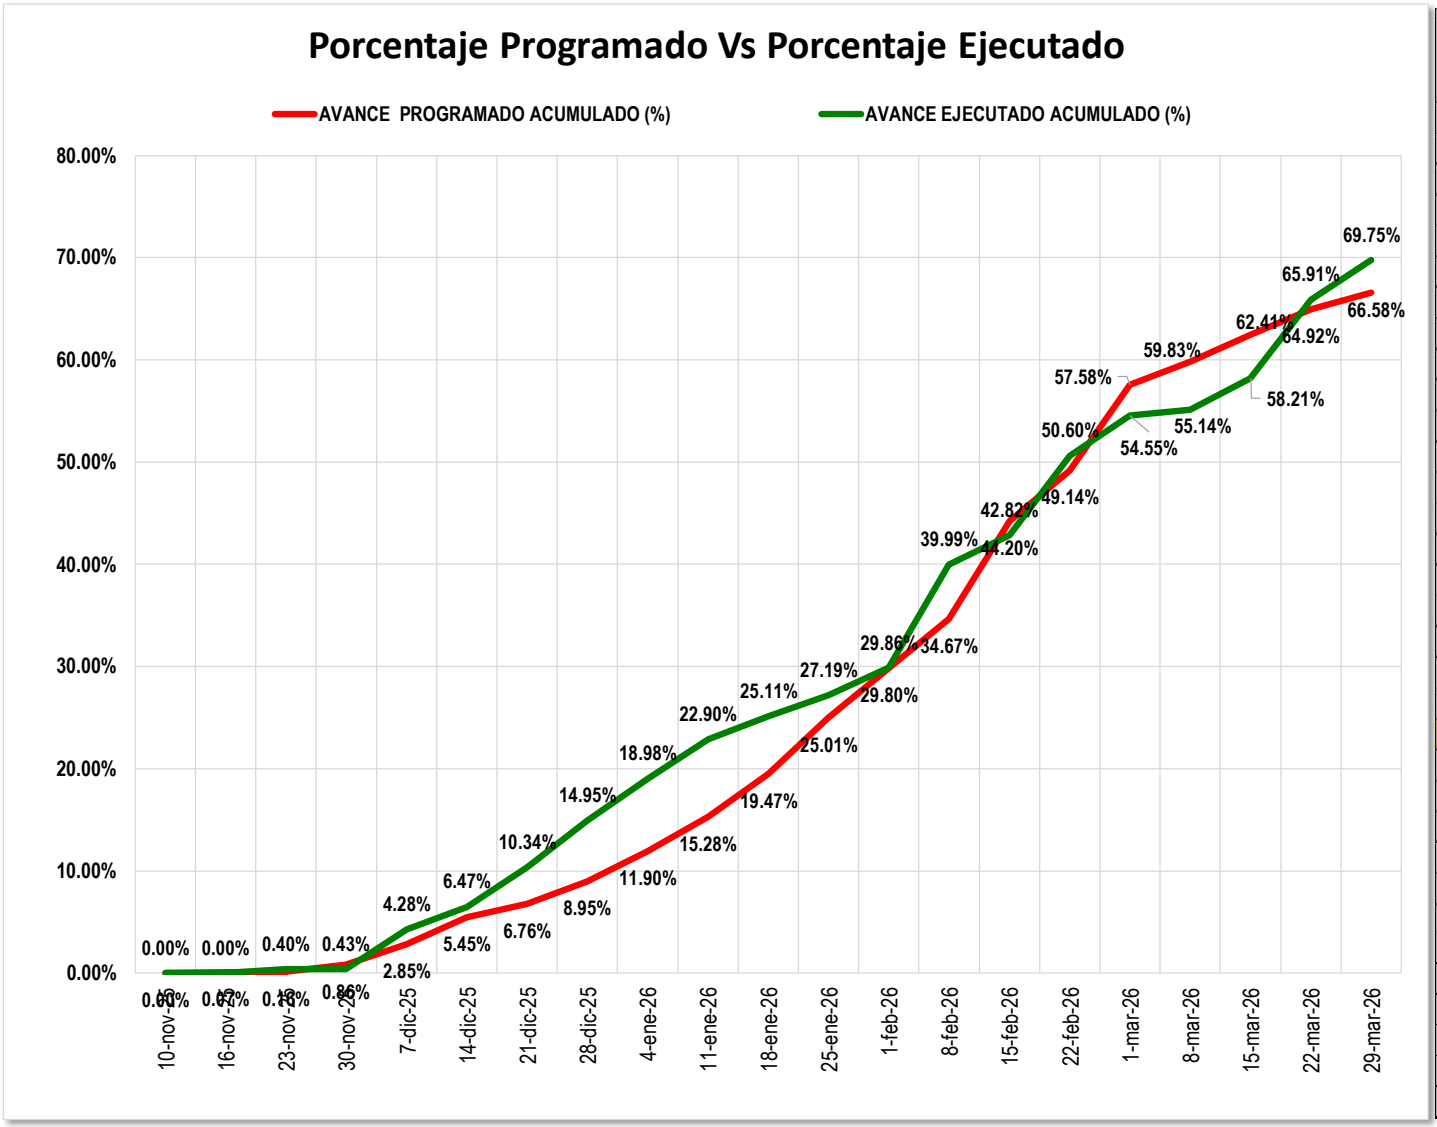

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0,00%	0,00%
16-nov-25	0,07%	0,00%
23-nov-25	0,16%	0,40%
30-nov-25	0,86%	0,43%
7-dic-25	2,85%	4,28%
14-dic-25	5,45%	6,47%
21-dic-25	6,76%	10,34%
28-dic-25	8,95%	14,95%
4-ene-26	11,90%	18,98%
11-ene-26	15,28%	22,90%
18-ene-26	19,47%	25,11%
25-ene-26	25,01%	27,19%
1-feb-26	29,80%	29,86%
8-feb-26	34,67%	39,99%
15-feb-26	44,20%	42,82%
22-feb-26	49,14%	50,60%
1-mar-26	57,58%	54,55%
8-mar-26	59,83%	55,14%
15-mar-26	62,41%	58,21%
22-mar-26	64,92%	65,91%
29-mar-26	**66,58%**	**69,75%**
5-abr-26	69,85%	
12-abr-26	76,13%	
19-abr-26	81,09%	
26-abr-26	83,33%	
3-may-26	85,13%	
10-may-26	86,89%	
17-may-26	90,91%	
24-may-26	93,34%	
31-may-26	96,80%	
7-jun-26	98,24%	
14-jun-26	99,11%	
20-jun-26	100,00%	

FECHA: 5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS		INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES 76 Dias ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			GRUPO 2
CORTE DEL INFORME: 5 de abril de 2026	CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO PAIS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

FECHAS			PLAZOS EN DIAS			VALOR CONTRATO		
DATOS:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA	ETAPA:	INTERVENTORIA	OBRA
CONTRATO	CO1.PCCNTR.8169110	CO1.PCCNTR.8154760	INICIAL	211	211	INICIAL	$ 796,184,131	$ 2,332,049,023
INICIO	6 de octubre de 2025	6 de octubre de 2025	SUSPENSIONES			ADICIONES	$ 128,425,720	$ 785,001,422
TERMINACION INICIAL	5 de mayo de 2026	5 de mayo de 2026	PRORROGAS	46	46	TOTAL	$ 924,609,851	$ 3,117,050,445
TERMINACION FINAL	20 de junio de 2026	20 de junio de 2026	TOTAL	257	257			

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA (DIAS)	OTRO ASPECTO
1	23-dic-25	$ 128,425,720.00	46	
2				
3				
4				

MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA

MOD No	FECHA DE LAMODIFICACION	VALOR ADICION	PRORROGA	OTRO ASPECTO
1	22-dic-25	$ 785,001,422.00	46	
2				
3				
4				

POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA — GARANTE: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	CALIDAD DEL SERVICIO DESDE	CALIDAD DEL SERVICIO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA
BCH-1000046043	6 10 2025	20 12 2026	20 6 2026	20 6 2031	6 10 2025	20 6 2029

POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZA	CUMPLIMIENTO DESDE	CUMPLIMIENTO HASTA	SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE	SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA
39-44-101175397	6 10 2025	27 2 2027	6 10 2025	28 6 2029	5 5 2026	5 5 2028

SEGUROS DEL ESTADO

POLIZA	RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE	RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA
39-40-101045911	6 10 2025	23 6 2026

CPF	COLEGIO	LOCALIDAD	SEDE	NOMBRE SEDE	AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL (01/03/2026)		PROGR %	EJECUTADO VS PROG	Vlr FRENTE APROBADO	Vlr FRENTE A ESTE PERIODO	FECHA INICIO CRONOGRAMA	FECHA FIN CRONOGRAMA	oct-2025	nov-2025	nov-2025	dic-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	feb-2026	mar-2026	mar-2026	abr-2026	abr-2026	may-2026	may-2026	jun-2026	jun-2026	jul-2026
581	ORLANDO FALS BORDA (IED)	USME	A	Barranquillita Nuevo	93.55%	94.16%		100.00%		$ 164,884,421	$ 155,249,499	10/11/2025	28/02/2026																	
1930	UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	María Cano	100.00%	100.00%		100.00%		$ 165,727,196	$ 165,727,196	18/11/2025	21/02/2026																	
1913	SIERRA MORENA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	C	Divino Niño	73.91%	73.91%		89.89%		$ 121,299,091	$ 89,646,649	10/11/2025	18/04/2026																	
523	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	USME	A	Fabio Lozano Simonelli	77.14%	79.80%		69.64%		$ 243,945,084	$ 194,667,868	1/12/2025	11/04/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja	97.62%	97.62%		100.00%		$ 494,079,401	$ 482,300,657	24/11/2025	28/02/2026																	
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)	93.67%	93.67%		100.00%		$ 169,818,729	$ 159,064,994	10/12/2025	21/03/2026																	
1918	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	B	Estrella II	100.00%	100.00%		100.00%		$ 72,206,451	$ 72,206,450	1/12/2025	14/03/2026																	
546	SANTA LIBRADA (IED)	USME	A	Santa Librada	35.10%	36.03%		20.55%		$ 234,227,860	$ 84,380,749	15/01/2026	2/05/2026																	
1917	ESTRELLA DEL SUR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Estrella I	100.00%	100.00%		100.00%		$ 75,074,063	$ 75,074,063	15/01/2026	28/02/2026																	
548	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	.USME	A	Tenerife	44.66%	46.90%		5.25%		$ 130,006,456	$ 60,972,207	9/03/2026	7/06/2026																	
1959	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Guillermo Cano Isaza	8.97%	10.91%		23.58%		$ 364,449,204	$ 39,760,196	13/01/2026	19/06/2026																	
TOTAL FRENTES DE OBRA						70.63%		69.85%		$ 2,235,717,956	$ 1,579,050,526																			
EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO																													
590	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME	USME	D L E	CADEL USME	0.00%	81.58%		100.00%		$ 26,605,858	$ 21,703,882	26/01/2026	1/03/2026																	
1904	ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Arborizadora Baja						$ 35,000,000																				
1974	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	CIUDAD BOLIVAR	A	Buenavista (Calasanz)						$ 100,413,274																				
TOTAL FRENTES DE OBRA						81.58%		100.00%		$ 162,019,132	$ 21,703,882																			

ACUMULADO FRENTES DE OBRA


TERMINADAS	EN EJECUCION	POR INICIAR	TOTAL	VALOR
2	7	0	9	$ 1,579,050,526
ACUMULADO EMERGENCIAS				
0	1	0	1	$ 21,703,882
TOTAL				
2	8	0	10	$ 1,600,754,408
FRENTES POR LOCALIDAD				


RELACION DE PAGOS EFECTUADOS


No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA OBRA	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR	No ACTA INTERVENTOR	VALOR
1	$ 361,963,041.00	12		1	$ 45,496,236.00	12		23		34	
2		13		2	$ 45,496,236.00	13		24		35	
3		14		3		14		25		36	
4		15		4		15		26		37	
5		16		5		16		27		38	
6		17		6		17		28		39	
7		18		7		18		29		40	
8		19		8		19		30		TOTAL INTERVENTORIA	
9		20		9		20		31		$ 90,992,472	
10		TOTAL OBRA		10		21		32			
11		$ 361,963,041.00		11		22		33			


AVANCE GENERAL

	TECNICO	FINANCIERO	TIEMPO
AVANCE	70.63%	11.61%	70.43%
PROGRAMADO	69.85%		
ATRASO	0.78%	EN EJECUCION	
FECHA APROBACION CRONOGRAMA			









OBSERVACIONES:

FECHA: 5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2	
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
1A 94.16%	ORLANDO FALS BORDA (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA BLOQUE RECTORIA	 	  	 
2C 73.91%	SIERRA MORENA (IED)	* ADECUACION DE CUARTOS DE BASURA * ACCESIBILIDAD REDUCIDA RAMPAS * PINTURA 4 AULAS	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA


FECHA:	5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION
DIAS RESTANTES	195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO 2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
3B 100.00%	UNION EUROPEA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA PARA 3 AULAS, INCLUYE LA EDECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	 	 	FRENTE AL 100%
4A 97.62%	ARBORIZADORA BAJA (IED)	* CAMBIO DE CUBIERTA BLOQUE PRIMERA INFANCIA, INCLUYE MEJORAMIENTO ELECTRICO * ADECUACIÓN CANCHA DEPROTIVA	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

FECHA:	5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES	166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
REGISTRO FOTOGRAFICO		SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA		GRUPO	2
		DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
5A 79.80%	FABIO LOZANO SIMONELLI (IED)	* CAMBIO DE PISOS AULAS DE 3ER PISO BLOQUE A * MANEJO AGUAS LLUVIAS CANCHA * MEJORAMIENTO BATERIAS SANITARIAS 3ER PISO B	 	 	  
6B 100.00%	ESTRELLA DEL SUR (IED) SEDE B	* CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANA DE LA SEDE * CAMBIO DEL PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**

FECHA: 5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 166 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO 2	
	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
CORTE DEL INFORME	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
5/4/26	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

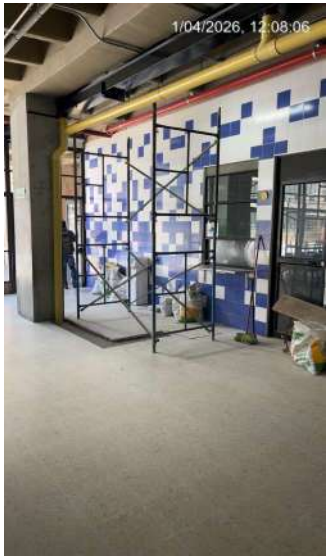TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
7A 93.67%	CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)	* CAMBIO DE CUBIERTA AULA MULTIPLE	 	 	NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA
8A 36.03%	SANTA LIBRADA (IED)	* MANTENIMIENTO CORRECTIVO TERRAZAS Y JARDINERA * ADECUACIÓN JUNTA ESTRUCTURAL COMEDOR	 	 	  

FECHA: 5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.				INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA				GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS					
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS		
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO		

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
9A 100.00%	IED ESTRELLA DEL SUR, SEDE A	* ADEACUACIÓN BATERIAS SANITARIAS * ADECUACIÓN PORTON PRINCIPAL	 	 	**FRENTE AL 100%**
10A 81.58%	DIRECCION LOCAL DE EDUCACION DE USME - EMERGENCIA	* IMPERMEABILIZACIÓN PLACA TANQUES DE AGUA POTABLE * RESANE HUMEDAD BAÑO MUJERES	 	 	**NO REGISTRA ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA**

FECHA: 5/04/2026	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			INFORME APOYO A LA SUPERVISION	
DIAS RESTANTES: 195 Dias	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
REGISTRO FOTOGRAFICO	SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA			GRUPO	2
CORTE DEL INFORME	DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS				
5/4/26	CONTRATO DE OBRA:	CO1.PCCNTR.8154780	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAIS	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CO1.PCCNTR.8169110	INTERVENTOR:	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	

TIPO DE INTERVENCION	FRENTE	ALCANCE	INICIAL	DURANTE	ESTADO ACTUAL O FINAL
11A 10.91%	GUILLERMO CANO ISAZA (IED)	* ADECUACIÓN BATERIAS SANITARIAS BLOQUE BACHILLERATO	 	 	  
12A 46.90%	TENERIFE - GRANADA SUR (IED)	* IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE * Instalación Barandas Metalicas	 	 	 

CONTRATO DE OBRA		CO1.PCCNTR.8154780					CONTRATO DE INTERVENTORIA	CO1.PCCNTR.8169110			VIGENCIA	2025
CPF	1923	IED			ORLANDO FALS BORDA			SEMANA 21				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO	m2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 4,233.48	$ 1,275,715.60	$ (1,121,193.73)	825.59%	825.59%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	91.00	(62.60)	28.40	28.40		$ 31,110.25	$ 883,530.99	$ 1,947,501.40	100.00%	100.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.50	264.84	301.34	301.34		$ 18,044.21	$ 5,437,442.99	$ (4,778,829.24)	825.59%	825.59%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M YGUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	301.34	-181.34	120.00	120.00		$ 33,201.35	$ 3,984,162.12	$ 6,020,732.99	39.82%	39.82%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	79.20			79.20		$ 69,099.55	$ 5,472,684.59	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	34.00			34.00		$ 107,273.69	$ 3,647,305.34	$ -	100.00%	100.00%	
PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E= 0.10 M	UN	16.00	(13.00)	3.00	2.00		$ 166,952.47	$ 333,904.95	$ 2,337,334.64	12.50%	12.50%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.00			11.00	11.00	$ 91,590.40	$ 1,007,494.39	$ 2,106,579.18	32.35%	32.35%	
MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI	M	58.50	136.16	194.66	194.66		$ 27,185.71	$ 5,291,971.11	$ (3,701,606.83)	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	44.00	(16.20)	27.80	3.00		$ 91,590.40	$ 274,771.20	$ 3,755,206.36	6.82%	6.82%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	96.00	(72.00)	24.00	2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 523,113.53	2.08%	2.08%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	73.00	189.00	248.96	248.96		$ 45,289.29	$ 11,275,220.89	$ (7,969,102.94)	341.04%	341.04%	
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	300.00			300.00		$ 34,369.67	$ 10,310,901.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	262.00	31.46	293.46	293.46		$ 361,355.09	$ 106,043,263.51	$ (11,368,231.00)	112.01%	112.01%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ORLANDO FALS BORDA	**$ 155,249,499.23**				
CPF	547	IED			SIERRA MORENA			SEMANA 21				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	47.37			47.37		$ 7,045.00	$ 333,721.66	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	60.00			53.10		$ 31,110.25	$ 1,651,954.06	$ 214,660.70	88.50%	88.50%	
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	m3	1.76			1.76		$ 274,656.52	$ 483,395.48	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE BARANDA METÁLICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	20.80	7.20	28.00	28.00		$ 21,488.46	$ 601,677.01	$ (154,716.95)	134.62%	134.62%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	12.60			12.60		$ 11,376.96	$ 143,349.70	$ -	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.84			36.84		$ 107,273.69	$ 3,951,962.61	$ -	100.00%	100.00%	

DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.30 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	32.64	0.72	31.92	-		$ 93,547.94	$ -	$ 3,053,405.00	0.00%	0.00%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.20			3.40		$ 15,633.37	$ 53,153.46	$ 59,407.00	47.22%	47.22%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.29			4.00		$ 11,761.45	$ 47,045.82	$ 15,172.00	75.61%	75.61%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	1.76	6.86	8.62	4.45		$ 91,988.38	$ 409,348.31	$ (247,448.75)	252.84%	252.84%	
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	24.87	-9.60	15.27	15.27		$ 21,702.97	$ 331,382.67	$ 208,370.00	61.40%	61.40%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	m2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	7.00	7.00	14.00	14.00		$ 176,060.25	$ 2,464,579.38	$ (1,232,158.00)	199.98%	199.98%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	275.63			275.63		$ 23,042.63	$ 6,351,239.56	$ -	100.00%	100.00%	
MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2	12.60			2.00		$ 146,133.16	$ 292,266.33	$ 1,549,012.00	15.87%	15.87%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	m	6.00			-		$ 78,726.73	$ -	$ 472,360.38	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	un	8.00			-		$ 28,310.86	$ -	$ 226,487.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	un	2.00			-		$ 129,729.46	$ -	$ 259,458.91	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	m	29.00			-		$ 14,988.50	$ -	$ 434,667.00	0.00%	0.00%	
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2	42.05	8.55	50.60	50.60		$ 193,996.53	$ 9,816,224.55	$ (1,658,670.00)	120.33%	120.33%	
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2	11.84			11.84		$ 165,931.21	$ 1,964,625.47	$ -	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA (TRÁFICO PESADO) ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA.	M	2.96			2.96		$ 592,067.38	$ 1,752,519.43	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	420.50	(366.54)	53.96	53.96		$ 7,255.46	$ 391,504.61	$ 2,659,416.00	12.83%	12.83%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	91.39			91.39		$ 7,103.01	$ 649,144.22	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	6.00	10.00	16.00	16.00		$ 143,600.90	$ 2,297,614.44	$ (1,436,009.00)	266.67%	266.67%	
CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	un	4.00	-4.00	0.00	-		$ 1,618,437.02	$ -	$ 6,473,748.09	0.00%	0.00%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	3.00			1.00		$ 875,947.70	$ 875,947.70	$ 1,751,895.00	33.33%	33.33%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.	M	33.78			33.78		$ 1,120,163.13	$ 37,839,110.41	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	226.80			226.80		$ 23,042.63	$ 5,226,068.03	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2	36.84			36.84		$ 264,771.67	$ 9,754,188.24	$ -	100.00%	100.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SIERRA MORENA							**$ 89,646,648.62**				
CPF	**1930**	**IED**			**UNIÓN EUROPEA**			**SEMANA 21**				
	Unidad de medida		**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**		**Precio unitario ($)**			**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	168.00	10.14	178.14	178.14		$ 4,233.48	$ 754,151.38	$ (42,927.00)	106.04%	106.04%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	45.00	7.80	52.80	23.83		$ 31,110.25	$ 741,422.37	$ 658,538.70	52.96%	52.96%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	136.13	-104.13	32.00	32.00		$ 3,248.63	$ 103,956.25	$ 338,280.13	23.51%	23.51%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	5.83	0.00	5.83	-		$ 144,722.00	$ -	$ 843,729.29	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	36.30			36.30		$ 26,782.33	$ 972,198.70	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.15	7.35	12.50	12.50		$ 27,938.51	$ 349,231.40	$ (205,348.06)	242.72%	242.72%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	168.00	5.63	173.63	173.63		$ 36,752.18	$ 6,381,281.40	$ (206,914.79)	103.35%	103.35%	
DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 11,967.87	$ 287,228.79	$ (71,807.20)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	18.00	6.00	24.00	24.00		$ 7,469.97	$ 179,279.20	$ (44,819.80)	133.33%	133.33%	
DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO DE 12-18 CIRCUITOS DETERIORADO, INCLUYE RETIRO DE PROTECCIONES Y DISPOSICIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, NO INCLUYE RESANES NI PINTURAS.	un	1.00			-		$ 55,922.89	$ -	$ 55,922.89	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	7.00	0.00	7.00	-		$ 32,498.47	$ -	$ 227,489.29	0.00%	0.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	m	3.90	-3.90	0.00	-		$ 18,687.73	$ -	$ 72,882.16	0.00%	0.00%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	19.43			19.43		$ 21,844.63	$ 424,441.11	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	3.90			3.90		$ 89,839.27	$ 350,373.14	$ -	100.00%	100.00%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	3515.11	-1076.19	2438.92	2,438.92		$ 23,042.63	$ 56,199,126.28	$ (80,997,372.11)	-226.63%	-226.63%	
CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M	19.43			19.43		$ 42,469.67	$ 825,185.65	$ (825,185.65)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (35 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M	0.50			0.50		$ 341,855.19	$ 170,927.60	$ (170,927.60)	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	26.40	18.13	44.53	44.53		$ 91,590.40	$ 4,078,520.47	$ (1,660,533.93)	245.62%	245.62%	
CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	1.00	-1.00	0.00			$ 875,947.70	$ -	$ 875,947.70	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	kg	213.75	0.29	214.04	214.04		$ 264,771.67	$ 56,671,727.78	$ (76,783.78)	100.14%	100.14%	
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	18.15			18.15		$ 106,267.26	$ 1,928,750.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	34.90			34.9		$ 91,590.40	$ 3,196,504.93	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	42.00			42		$ 23,315.15	$ 979,236.14	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	42.00			42		$ 20,790.98	$ 873,221.16	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 180,330.15	$ 4,327,923.59	$ (540,990.45)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	21.00	3.00	24.00	24		$ 238,055.44	$ 5,713,330.57	$ (714,166.32)	114.29%	114.29%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M	22.50	8.50	31.00	31		$ 304,166.74	$ 9,429,168.84	$ (2,585,417.26)	137.78%	137.78%	
SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA, PERFILES ESTUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO PGU, MONTANTES, TORNILLOS PARA ESTRUCTURA, CLAVO IMPACTADO. ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO.	M2	32.35	0.75	33.10	33.1		$ 222,048.37	$ 7,349,801.01	$ (166,536.28)	102.32%	102.32%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M2	61.70			61.70		$ 17,207.77	$ 1,061,719.44	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	224.21			224.21		$ 4,663.84	$ 1,045,679.27	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. UNION EUROPEA	**$ 165,727,196.00**				
CPF	**1904**	**IED**			**ARBORIZADORA BAJA**			**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	786.72			786.72		$ 7,045.00	$ 5,542,442.56	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA	M	96.25	26.21	122.46	122.46		$ 31,110.25	$ 3,809,760.73	$ (815,399.55)	127.23%	127.23%	
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	466.58	17.92	484.50	484.50		$ 107,273.69	$ 51,974,101.11	$ (1,922,344.00)	103.84%	103.84%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	5.25			-		$ 22,300.62	$ -	$ 117,078.27	0.00%	0.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	145.00			145.00		$ 32,594.26	$ 4,726,167.12	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	145.00			145.00		$ 42,650.45	$ 6,184,314.87	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	m2	323.02			323.02		$ 36,752.18	$ 11,871,653.14	$ 37.00	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA (INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	35.50			35.50		$ 8,680.11	$ 308,143.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	un	25.00			25.00		$ 7,469.97	$ 186,749.17	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	un	2.00			2.00		$ 398,950.46	$ 797,900.91	$ -	100.00%	100.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	21.00			-		$ 11,761.45	$ -	$ 246,991.00	0.00%	0.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	16.80			16.80		$ 91,988.38	$ 1,545,404.84	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	258.10	8.38	266.48	266.48		$ 135,394.33	$ 36,079,203.26	$ (1,133,927.00)	103.24%	103.24%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3	15.52			2.22		$ 66,591.58	$ 147,833.30	$ 885,668.00	14.30%	14.30%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	m3	103.10			103.10		$ 176,060.25	$ 18,151,811.59	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN DE PIEDRA	m3	129.05			129.05		$ 176,060.25	$ 22,720,575.03	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	m	87.00			87.00		$ 76,033.93	$ 6,614,951.64	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	kg	1809.76	-142.50	1667.26	1,667.26		$ 23,042.63	$ 38,418,051.96	$ 3,283,574.00	92.13%	92.13%	
CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	un	2.00					$ 1,088,548.32	$ -	$ 2,177,097.00	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2	684.78	-162.78	522.00	522.00		$ 11,730.42	$ 6,123,281.59	$ 1,909,479.00	76.23%	76.23%	
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	m	3.00			2.00		$ 5,565.04	$ 11,130.08	$ 5,565.00	66.67%	66.67%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	m2	323.02			323.02		$ 264,771.67	$ 85,526,544.13	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	m	35.50			35.50		$ 305,515.84	$ 10,845,812.21	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO MD-10 PARA CANCHA DEPORTIVA E=8 CM, (INCLUYE: EMULSION ASFALTICA, ASFALTO MD-10 Y ACABADO CON SLURRY	m2	484.50	-43.86	440.64	440.64		$ 225,361.76	$ 99,303,405.31	$ 9,884,367.00	90.95%	90.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2	484.50			440.64		$ 77,589.44	$ 34,189,010.49	$ 3,403,073.00	90.95%	90.95%	
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD)	M	353.72			353.72		$ 18,365.30	$ 6,496,173.31	$ -	100.00%	100.00%	
CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN	2.00	-1.00	1.00	1.00		$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.48	$ 12,850,061.00	50.00%	50.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00			4.00		$ 126,905.79	$ 507,623.16	$ 126,906.00	80.00%	80.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	118.00			118.00		$ 15,217.85	$ 1,795,706.06	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M	118.00			118.00		$ 16,070.48	$ 1,896,316.55	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	25.00			25.00		$ 180,330.15	$ 4,508,253.74	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22.00			22.00		$ 238,055.44	$ 5,237,219.69	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER 2X20W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	3.00			3.00		$ 193,810.36	$ 581,431.07	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	194.18			194.18		$ 9,167.13	$ 1,780,074.18	$ -	100.00%	100.00%	
LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN EL COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (INCLUYE INSUMOS)	ML	197.54			197.54		$ 5,046.98	$ 996,981.04	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	**$ 482,300,656.68**				
CPF	**523**	**IED**				**Fabio Lozano Simonelli**		**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	1201.02	-802.02	399.00	399.00		$ 4,233.48	$ 1,689,156.84	$ 3,395,332.00	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	51.83			42.00		$ 31,110.25	$ 1,306,630.33	$ 305,813.72	81.03%	81.03%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	235.29	20.63	255.92	255.92		$ 32,594.26	$ 8,341,522.00	$ (672,419.50)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN ASITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.64	1.35	29.99	29.99		$ 22,300.62	$ 668,795.68	$ (30,105.84)	100.00%	100.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	55.48	30.02	85.50	85.50		$ 12,649.16	$ 1,081,503.32	$ (379,727.83)	154.11%	154.11%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	28.00			28.00		$ 20,708.69	$ 579,843.18	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)}	M3	15.05			3.93		$ 66,591.58	$ 261,545.07	$ 740,658.14	26.10%	26.10%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	17.32			17.32		$ 33,174.37	$ 574,580.07	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	UN	28.00			28.00		$ 27,281.50	$ 763,882.01	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66.00			66.00		$ 27,938.51	$ 1,843,941.79	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00			8.00		$ 7,469.97	$ 59,759.73	$ -	100.00%	100.00%	

DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	55.30			49.77		$ 32,569.97	$ 1,621,007.52	$ 180,111.95	90.00%	90.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	22.90			22.90		$ 18,687.73	$ 427,949.09	$ -	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	12.80			12.80		$ 135,394.33	$ 1,733,047.38	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 m	M2	194.67			194.67		$ 135,394.33	$ 26,357,213.62	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	49.31			49.31		$ 135,394.33	$ 6,676,294.26	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO CON FIBRA SINTÉTICA ESPESOR 4 CM	M2	548.06	-548.06	0.00			$ 69,868.54	$ -	$ 38,292,151.98	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	158.76			123.83		$ 7,103.01	$ 879,565.91	$ 248,108.19	78.00%	78.00%	
CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 0.50 M E= 0.07 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M	171.60	-44.68	126.92	122.00		$ 140,306.40	$ 17,117,380.80	$ 6,959,197.44	71.10%	71.10%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	M	1.00			1.00		$ 572,567.48	$ 572,567.48	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	M	8.00			8.00		$ 180,330.15	$ 1,442,641.20	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	32.00			32.00		$ 23,315.15	$ 746,084.68	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M	32.00			32.00		$ 20,790.98	$ 665,311.36	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	8.00			8.00		$ 238,055.44	$ 1,904,443.52	$ -	100.00%	100.00%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	55.30			49.77	49.77	$ 130,345.99	$ 6,487,320.16	$ 720,813.35	90.00%	90.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	226.69	12.39	239.08	239.08		$ 126,224.49	$ 30,177,196.69	$ (1,563,366.10)	105.46%	105.46%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	17.44	76.23	93.67	93.67		$ 33,727.50	$ 3,159,254.93	$ (2,571,047.33)	537.10%	537.10%	
WIN DE ALUMINIO	M	18.00			18.00		$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2	131.00			92.03		$ 98,222.57	$ 9,039,423.54	$ 3,827,733.73	70.25%	70.25%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	11.73			11.73		$ 1,128,301.00	$ 13,238,355.63	$ (3,384.90)	100.03%	100.03%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	47.82			47.82		$ 989,338.00	$ 47,313,111.17	$ (2,968.01)	100.01%	100.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80			1.80		$ 989,338.00	$ 1,780,808.40	$ (0.00)	100.00%	100.00%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	66.72	216.43	283.15	283.15		$ 20,236.50	$ 5,729,964.98	$ (4,379,785.70)	424.39%	424.39%	
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2	176.38			22.85		$ 6,610.59	$ 151,051.98	$ 1,014,923.88	12.95%	12.95%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. FABIO SIMONELLI	**$ 194,667,868.22**				
CPF	**1918**	**IED**			**Estrella del Sur Sede B**			**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28	20.48	577.76	577.76		$ 4,233.48	$ 2,445,932.98	$ (86,702.00)	103.67%	103.67%	
CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2").	M	88.20	-88.20	0.00	-		$ 154,730.98	$ -	$ (13,647,272.19)	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	54.17			33.24		$ 33,174.37	$ 1,102,716.03	$ 694,339.54	61.36%	61.36%	
DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2	95.99	-32.70	63.29	63.29		$ 29,391.49	$ 1,860,302.19	$ 960,987.18	65.94%	65.94%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	28.37					$ 707,267.02	$ -	$ 20,065,165.47	0.00%	0.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	25.81	6.00	31.81	31.81		$ 829,259.39	$ 26,378,824.17	$ (4,975,639.28)	123.25%	123.25%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.43			1.43		$ 798,362.30	$ 1,145,011.22	$ (3,353.12)	100.29%	100.29%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO, CUERPOS FIJOS, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	87.25			63.29		$ 467,649.33	$ 29,597,525.99	$ 11,204,877.91	72.54%	72.54%	
ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M	141.20			141.20		$ 9,408.62	$ 1,328,459.99	$ 37.63	100.00%	100.00%	
PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M	141.20			141.20		$ 22,829.47	$ 3,223,429.87	$ 91.32	100.00%	100.00%	
PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M	141.20			141.20		$ 17,207.77	$ 2,429,668.36	$ 68.83	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	577.76			577.76		$ 4,663.84	$ 2,694,579.45	$ -	100.00%	100.00%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - B	**$ 72,206,450.25**				
CPF	**1918**	**IED**			**CALASANZ (BUENAVISTA) (CED)**			**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	538.32			538.32		$ 4,233.48	$ 2,278,964.69	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	78.28	11.72	90.00	90.00		$ 31,137.23	$ 2,802,350.52	$ (364,928.00)	114.97%	114.97%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2	538.32					$ 3,248.63	$ -	$ 1,748,804.00	0.00%	0.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN			12.00	12.00		$ 7,469.97	$ 89,639.60	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	1.00			1.00		$ 101,214.88	$ 101,214.88	$ -	100.00%	100.00%	
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (IN	M2	538.82	-118.82	420.00	420.00		$ 36,749.48	$ 15,434,783.28	$ 4,366,574.00	77.95%	77.95%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1841.40	-1486.40	355.00	355.00		$ 23,042.63	$ 8,180,132.94	$ 34,250,562.26	19.28%	19.28%	
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	44.00			44.00		$ 130,345.99	$ 5,735,223.77	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	KG	538.31	-68.31	470.00	470.00		$ 264,771.67	$ 124,442,683.87	$ 18,086,552.63	87.31%	87.31%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. CALASANZ BUENA VISTA	**$ 159,064,993.54**				

CPF	1918	IED			SANTA LIBRADA (IED)			SEMANA 21				
Ítem / Actividad	Unidad de medida	Cantidad contratada	Balance Mayores y Menores	Cantidad Balance	Cantidad ejecutada a la fecha	Cantidad ejecutada semana	Precio unitario ($)	Valor ejecutado a la fecha	Saldo por ejecutar ($)	% Avance físico	% Avance financiero	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	m2	557.28			557.28		$ 4,233.48	$ 2,359,231.39	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5"anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	128.18			25.00		$ 31,110.25	$ 777,756.15	$ 3,209,955.18	19.50%	19.50%	
CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m	65.03	-39.70	25.33	25.33		$ 15,633.37	$ 395,993.28	$ 620,644.82	38.95%	38.95%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.90			16.47		$ 32,594.26	$ 536,827.40	$ 1,676,322.59	24.26%	24.26%	
PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	27.20			13.34		$ 21,844.63	$ 291,407.33	$ 302,766.53	49.04%	49.04%	
PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	372.13			241.34		$ 13,385.77	$ 3,230,454.85	$ 1,750,791.81	64.85%	64.85%	
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3	63.87			38.32		$ 34,724.48	$ 1,330,642.26	$ 887,210.59	60.00%	60.00%	
RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	16.47	-16.47	0.00			$ 18,044.21	$ -	$ -	0.00%	0.00%	
DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	194.87			194.87		$ 9,443.70	$ 1,840,293.82	$ 1,840,293.82	100.00%	100.00%	
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	59.96			59.96		$ 91,988.38	$ 5,515,765.80	$ 5,515,765.80	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M	63.33			13.44		$ 91,988.38	$ 1,236,323.87	$ 1,236,323.87	21.22%	21.22%	
PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 M (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE}	M2	333.93	1.67	335.60	218.00		$ 69,679.67	$ 15,190,376.21	$ 15,190,376.21	65.28%	65.28%	
MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	208.04			118.00		$ 25,122.94	$ 2,964,506.94	$ 2,964,506.94	56.72%	56.72%	
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO).	M	19.60			13.44		$ 62,023.52	$ 833,596.15	$ 833,596.15	68.57%	68.57%	
Demolición de Materas en concreto o fibrocemento 1.2x1.2x0.3 m y 1x0.7x0.7 m	M	48.00			24.00		$ 16,863.75	$ 404,730.00	$ 404,730.00	50.00%	50.00%	
TRATAMIENTO DE PISOS EN LADRILLO O ADOQUIN: LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS y REEMBOQUILLADO DE JUNTAS, (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN,	M	110.00			110.00		$ 16,863.75	$ 1,855,012.50	$ 1,855,012.50	100.00%	100.00%	#####
JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M	356.60			108.00		$ 34,369.67	$ 3,711,924.53	$ 3,711,924.53	30.29%	30.29%	

CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.00			6.00	6.00	$ 68,114.71	$ 408,688.26	$ 408,688.26	100.00%	100.00%	
DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	7.20			7.20	7.20	$ 157,817.72	$ 1,136,287.57	$ 1,136,287.57	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE EN UNA CUANTIA DE 4.5 KG/M	M	6.00			6.00	6.00	$ 101,978.47	$ 611,870.81	$ 611,870.81	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	335.60			110.00		$ 361,355.09	$ 39,749,059.39	$ 39,749,059.39	32.78%	32.78%	
							SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA	**$ 84,380,748.53**				
CPF	**1917**	**IED**			**ESTRELLA DEL SUR (IED) A**			**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	20.56			20.56		$ 4,233.48	$ 87,040.26	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	40.30	-31.81	8.49	8.49		$ 31,110.25	$ 264,138.88	$ 989,604.00	21.07%	21.07%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-2.22	17.30	17.30		$ 32,594.26	$ 563,880.63	$ 72,359.00	88.63%	88.63%	
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-5.96	13.56	13.56		$ 22,300.62	$ 302,396.45	$ 132,912.00	69.47%	69.47%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40.65	-2.49	38.16	38.16		$ 12,649.16	$ 482,692.01	$ 31,496.00	93.87%	93.87%	
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	19.52	-4.52	15.00	15.00		$ 20,708.69	$ 310,630.28	$ 93,603.00	76.84%	76.84%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11.36	-5.02	6.34	6.34		$ 33,174.37	$ 210,325.50	$ 166,535.00	55.81%	55.81%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	15.00			15.00		$ 27,281.50	$ 409,222.50	$ -	100.00%	100.00%	
SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	15.00			15.00		$ 182,479.27	$ 2,737,188.99	$ -	100.00%	100.00%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2	19.52			19.52		$ 42,650.45	$ 832,536.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.52	-1.99	17.53	17.53		$ 126,224.49	$ 2,212,715.38	$ 251,187.00	89.81%	89.81%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	0.80			0.80		$ 67,218.91	$ 53,775.13	$ -	100.00%	100.00%	
WIN DE ALUMINIO	M	3.00			3.00		$ 15,372.99	$ 46,118.98	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2	44.84			40.81		$ 116,158.86	$ 4,740,210.72	$ 468,353.00	91.01%	91.01%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	5.20			5.20		$ 707,267.02	$ 3,677,788.50	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2	2.16	0.12	2.28	2.28		$ 1,127,967.67	$ 2,571,766.29	$ (135,356.00)	105.56%	105.56%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO SISTEMA DE DESCARGA AHORRADOR (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN	7.00	1.00	8.00	8.00		$ 873,470.75	$ 6,987,765.98	$ (873,471.00)	114.29%	114.29%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00			2.00		$ 616,820.66	$ 1,233,641.32	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	5.00			5.00		$ 404,611.28	$ 2,023,056.40	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN	2.00			2.00		$ 41,130.01	$ 82,260.02	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2	28.82	12.82	41.64	41.64		$ 989,338.20	$ 41,196,042.70	$ (12,683,316.00)	144.48%	144.48%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2	1.80	-0.80	1.00	1.00		$ 989,338.20	$ 989,338.20	$ 791,471.00	55.56%	55.56%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	44.84			40.81		$ 36,193.65	$ 1,476,990.67	$ 145,933.00	91.01%	91.01%	
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	35.50			35.50		$ 21,599.09	$ 766,767.73	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2	2.16			2.16	2.16	$ 123,260.52	$ 266,242.73	$ -	100.00%	100.00%	
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	111.32			100.19		$ 4,663.84	$ 467,270.00	$ 51,909.00	90.00%	90.00%	
					SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. ESTRELLA DEL SUR - A			**$ 75,074,063.00**				


CPF	1959	IED			GUILLERMO CANO ISAZA (IED)			SEMANA 21				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	**Observaciones**
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	125.48			56.47		$ 4,233.48	$ 239,064.38	$ 292,152.00	45.00%	45.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	68.00			27.20		$ 31,110.25	$ 846,198.69	$ 1,269,298.00	40.00%	40.00%	
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	129.54			56.06		$ 32,594.26	$ 1,827,233.99	$ 2,395,026.00	43.28%	43.28%	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	150.00			76.50		$ 11,376.96	$ 870,337.46	$ 836,207.00	51.00%	51.00%	
DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	40.00			10.00		$ 7,469.97	$ 74,699.67	$ 224,099.00	25.00%	25.00%	
CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA HASTA 2" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE CORTE CON PULIDORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M	100.00			15.00		$ 18,687.73	$ 280,316.00	$ 1,588,457.00	15.00%	15.00%	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	364.26			129.31		$ 12,649.16	$ 1,635,663.09	$ 2,971,921.00	35.50%	35.50%	
MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2	7.20			5.10		$ 65,869.81	$ 335,936.02	$ 138,327.00	70.83%	70.83%	


DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	22.00			8.80		$ 20,708.69	$ 182,236.43	$ 273,355.00	40.00%	40.00%	
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.61			7.56		$ 33,174.37	$ 250,798.23	$ 631,972.00	28.41%	28.41%	
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	78.00			26.00		$ 27,281.50	$ 709,319.01	$ 1,418,638.00	33.33%	33.33%	
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2	35.00			18.85		$ 61,099.39	$ 1,151,723.50	$ 986,755.00	53.86%	53.86%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	129.54			101.94	37.70	$ 126,224.49	$ 12,867,324.94	$ 3,483,796.00	78.69%	78.69%	
WIN DE ALUMINIO	M	30.00			18.00	10.00	$ 15,372.99	$ 276,713.90	$ 184,476.00	60.00%	60.00%	
PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	364.26			177.00		$ 36,193.65	$ 6,406,276.90	$ 6,777,624.00	48.59%	48.59%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	m2	364.26			120.20	21.95	$ 98,222.57	$ 11,806,353.47	$ 23,972,202.00	33.00%	33.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA							**$ 39,760,195.66**				
CPF	**548**	**IED**			**TENERIFE - GRANADA SUR (IED)**			**SEMANA 21**				
Ítem / Actividad	**Unidad de medida**	**Cantidad contratada**	**Balance Mayores y Menores**	**Cantidad Balance**	**Cantidad ejecutada a la fecha**	**Cantidad ejecutada semana**	**Precio unitario ($)**	**Valor ejecutado a la fecha**	**Saldo por ejecutar ($)**	**% Avance físico**	**% Avance financiero**	Observaciones
REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2	193.00			193.00		$ 4,294.19	$ 828,777.76	$ -	100.00%	100.00%	
CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).	M	39.00			26.00		$ 31,110.25	$ 808,866.40	$ 404,433.00	66.67%	66.67%	
TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	24.83			24.83		$ 38,696.24	$ 960,827.52	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2	44.28			44.28		$ 361,355.09	$ 16,000,803.20	$ -	100.00%	100.00%	
PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	44.28			44.28	44.28	$ 65,757.83	$ 2,911,756.81	$ -	100.00%	100.00%	
SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA PVC PLASTIFICADO SIKAPLAN 15 PR O SIMILAR	M3	150.00			97.50		$ 404,730.00	$ 39,461,175.00	$ 21,248,325.00	65.00%	65.00%	
	SUBTOTAL I.E.D.SUBTOTAL I.E.D. TENERIFE GRANADA SUR							**$ 60,972,206.69**				

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA		**70.63%**
ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA	**$**	**1,579,050,526.44**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**2,235,717,955.58**


AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Abr 05 2026						
SEDE EDUCATIVA	PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO		TOTAL POR SEDE	% DE ADELANTO O ATRASO
ORLANDO FALS BORDA	$ 164,884,421.00	100.00%	$ 155,249,499.23	94.16%	$ 164,884,421.00	-5.84%
UNION EUROPEA	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	100.00%	$ 165,727,196.00	ENTREGADO
SIERRA MORENA	$ 109,036,666.50	89.89%	$ 89,646,648.62	73.91%	$ 121,299,091.00	-15.99%
FABIO LOZANO	$ 169,892,716.07	69.64%	$ 194,667,868.22	79.80%	$ 243,945,084.00	10.16%
ARBORIZADORA BAJA	$ 494,079,400.58	100.00%	$ 482,300,656.68	97.62%	$ 494,079,400.58	-2.38%
BUENAVISTA	$ 169,818,729.00	100.00%	$ 159,064,993.54	93.67%	$ 169,818,729.00	-6.33%
ESTRELLA DEL SUR - B	$ 72,206,451.00	100.00%	$ 72,206,450.25	100.00%	$ 72,206,451.00	ENTREGADO
SANTA LIBRADA	$ 48,125,173.43	20.55%	$ 84,380,748.53	36.03%	$ 234,227,860.00	15.48%
ESTRELLA DEL SUR - A	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	100.00%	$ 75,074,063.00	ENTREGADO
TENERIFE GRANADA SUR SEDE A	$ 6,821,740.70	5.25%	$ 60,972,206.69	46.90%	$ 130,006,456.00	41.65%
GUILLERMO CANO ISAZA SEDE A	$ 85,927,369.90	23.58%	$ 39,760,195.66	10.91%	$ 364,449,204.00	-12.67%
TOTALES	$ 1,561,593,927.18	69.85%	$ 1,579,050,526.44	70.63%	$ 2,235,717,955.58	0.78%

OBSERVACIONES: Igual que en el periodo anterior, se mantiene un adelanto con relación a lo programdo. Al cierre de esta semana encontramos que las ***IED Orlando Fals Borda y Buenavista Calasanz*** registran atrasos en promedio del 6%, mientras que las ***IED Sierra Morena y Guillermo Cano Isaza***, presentan atrasos, el primero cercano al 16% y el segundo por encima del 12%. El porcentaje de adelanto ejecutado es inferior al 1%

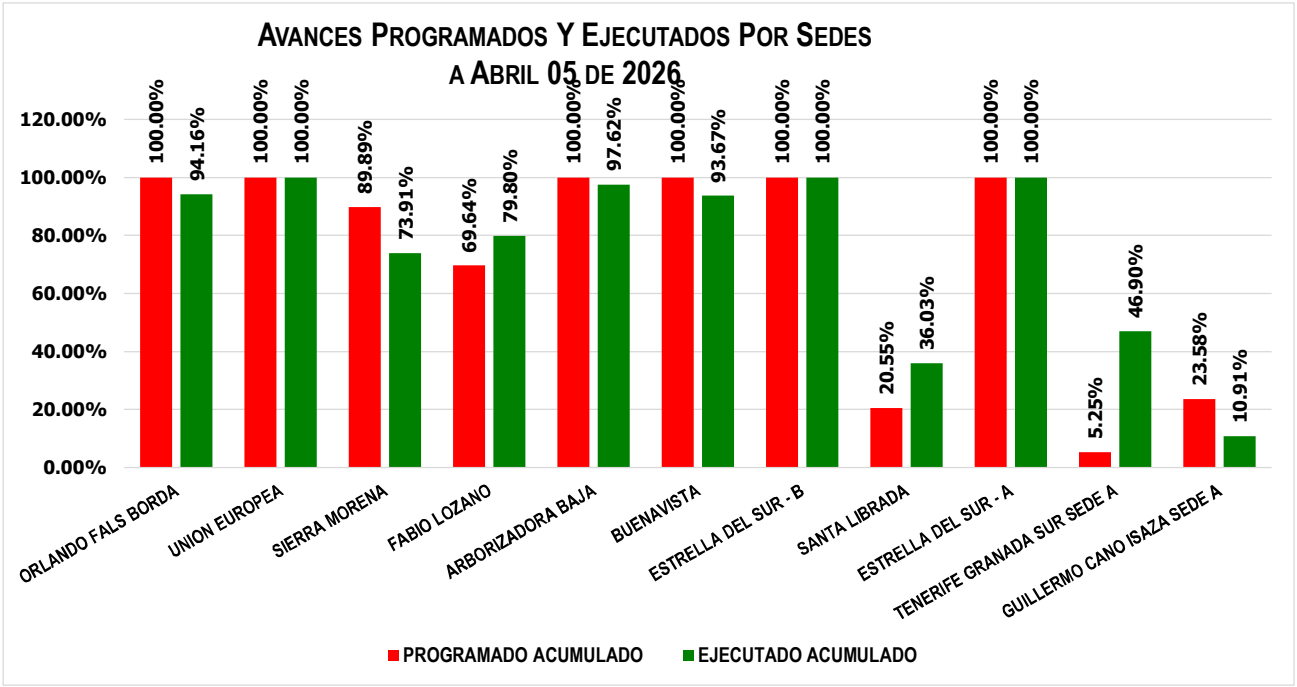

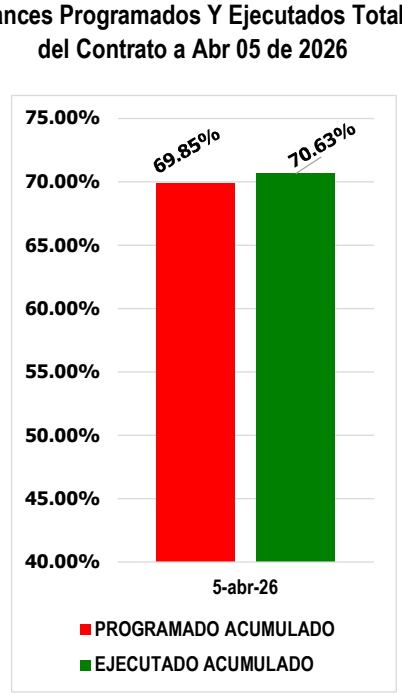

AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Abr. 05 2026

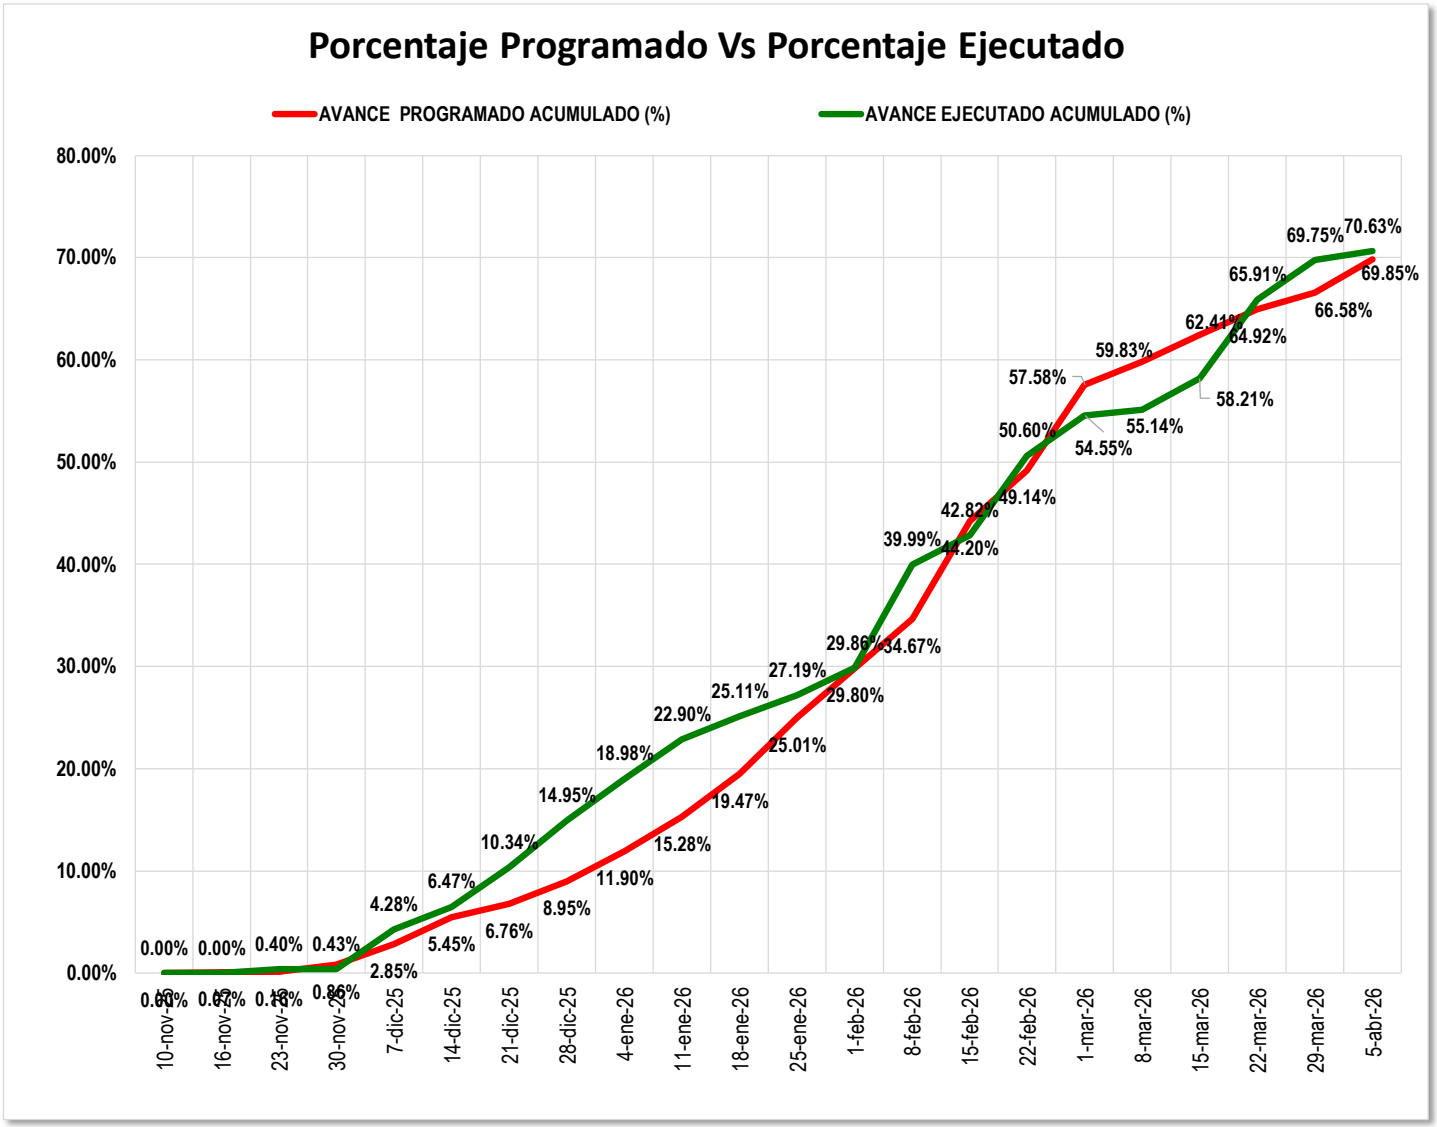

FECHA	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%)
10-nov-25	0.00%	0.00%
16-nov-25	0.07%	0.00%
23-nov-25	0.16%	0.40%
30-nov-25	0.86%	0.43%
7-dic-25	2.85%	4.28%
14-dic-25	5.45%	6.47%
21-dic-25	6.76%	10.34%
28-dic-25	8.95%	14.95%
4-ene-26	11.90%	18.98%
11-ene-26	15.28%	22.90%
18-ene-26	19.47%	25.11%
25-ene-26	25.01%	27.19%
1-feb-26	29.80%	29.86%
8-feb-26	34.67%	39.99%
15-feb-26	44.20%	42.82%
22-feb-26	49.14%	50.60%
1-mar-26	57.58%	54.55%
8-mar-26	59.83%	55.14%
15-mar-26	62.41%	58.21%
22-mar-26	64.92%	65.91%
29-mar-26	66.58%	69.75%
5-abr-26	**69.85%**	**70.63%**
12-abr-26	76.13%	
19-abr-26	81.09%	
26-abr-26	83.33%	
3-may-26	85.13%	
10-may-26	86.89%	
17-may-26	90.91%	
24-may-26	93.34%	
31-may-26	96.80%	
7-jun-26	98.24%	
14-jun-26	99.11%	
20-jun-26	100.00%	

ANEXO No. 3. ENSAYO DE LABORATORIO

1 DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

1.1 DATOS DE DISEÑO

Resistencia a la Compresión Requerida	3000 p.s.i (210 Kg/cm^2)
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Agregado Fino	Arena Puerto Boyaca
Agregado Fino	Arena rio de pescadero
Agregado Grueso	Grava de Simijaca
Cemento	Argos

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

AGREGADO GRUESO

Descripción	Material granular tipo grava, forma angular de color café. TM 1" y TMN 3/4"
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2515
Porcentaje de absorción (%)	2,08
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1306,94

AGREGADO FINO

Descripción	Arena de forma sub-redondeada de color gris
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2477
Porcentaje de absorción (%)	3,11
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1466,15
Módulo de finura (MF)	3,03

Descripción	Arena de Triturado de forma subredondeada de color gris oscuro
Densidad Bulk (Kg/m^3)	2285
Porcentaje de absorción (%)	4,12
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m^3)	1282,57
Módulo de finura (MF)	4,16

CEMENTO

Descripción	Cemento marca Argos
Densidad (Kg/m3)	3100,00
Masa Unitaria Suelta MUS (Kg/m3)	1230,00

1.3 CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE DISEÑO.

Escogida la especificación granulométrica según el tamaño máximo, se optimiza la granulometría mediante un proceso de estabilización para determinar la mejor mezcla de arena y grava para lograr un concreto de buenas propiedades de manejabilidad y resistencia para el contenido de cemento calculado.

La estabilización nos arroja la siguiente granulometría:

		PORCENTAJE PASA					
	Alterno	FRANJA RECOMENDADA TM 1"		GRAVA	ARENA DE PUERTO BOYACA	ARENA DE El Guamo	MEZCLA MATERIALES
37,50	1 ½"	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
25,00	1"	100	100	97,75	100,00	100,00	99,10
19,00	3/4"	90	85	55,89	100,00	100,00	82,36
12,70	1/2"	78	68	17,09	98,07	99,83	66,21
9,50	3/8"	71	58	9,03	97,97	99,83	62,95
4,75	No.4	56	40	1,74	93,71	78,90	52,48
2,36	No.8	44	27	1,22	84,26	43,53	38,83
1,180	No.16	34	18	1,20	65,51	24,96	27,62
0,600	No.30	27	13	1,19	35,74	15,83	15,95
0,300	No.50	21	9	1,18	15,83	11,59	8,70
0,150	No.100	17	6	1,17	6,23	9,33	5,13
0,075	No.200	0	0	1,11		7,81	3,86

AGREGADO		HUMEDAD
Grava	40%	0,10%
Arena de Puerto Boyacá	30%	1,61%
Arena rio El Gaumn	30%	6,39%

Resistencia a la Compresión requerida	3000 p.s.i 210 Kg/cm^2
Asentamiento recomendado	7.5 cm
Tamaño máximo de diseño	1” (25,00 cm)
Densidad Bulk promedio de los agregados	2434,39 (Kg/m^3)
Relación agua / cemento	0,57

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

1.3.1 Proporciones para 1 m^3 de concreto corregidas por humedad de los agregados

Saco cemento (Kg)	50,00

Saco	7.3

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	DENSIDAD BULK	PROPORCIONES EN VOLUMEN ABSOLUTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR (M3) DE CONCRETO	AJUSTES POR HUMEDAD Kg/M3
Agua	0,57	209	1000	0,209	0,21	218
Aire		15	0,015	0,000	0,02	15
Cemento	1,0	366	3100	0,118	0,30	366
Arena Puerto	1,3	491	2477	0,198	0,34	499
Arena de Rio Pescadero	1,3	491	2285	0,215	0,38	523
Grava	1,8	655	2515	0,261	0,50	656
TOTAL		2228,2		1,00	1,74	2277

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO HÚMEDO (Kg) POR (M3) DE CONCRETO	PROPORCIONES EN PESO (Kg) POR SACO DE CEMENTO	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO
Agua	218	29,80	0,030
Aire	0	0,00	0,025
Cemento	366	50,00	0,041
Arena Puerto	499	68,21	0,047
Arena de Pescadero	523	71,42	0,056
Grava	656	89,60	0,069
TOTAL	2262	309,04	0,266

1.3.2 Proporciones de diseño para concreto de 3000 p.s.i. Clase D (210 Kg/m^3)

MATERIAL	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN ABSOLUTO	DOSIFICACIÓN EN PESO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO
Agua	1,8	0,57	0,73
Aire	0,0	0,0	0,6
Cemento	1,0	1,0	1,0
Arena puerto	1,7	1,3	1,1
Arena de pescadero	1,8	1,3	1,4
Grava	2,2	1,8	1,7

1.3.3 Dosificación en baldes para un saco de cemento (Volumen suelto de agregados)

Balde (Litros)	10,0
Balde (m3)	0,010

MATERIAL	PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO (m3) POR SACO DE CEMENTO	DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN SUELTO	DOSIFICACIÓN EN BALDES DE 10 LITROS
Agua	0,030	0,7	3,0
Aire	0,025	0,6	
Cemento	0,041	1,0	4,1
Arena puerto	0,047	1,1	4,7
Arena de El Guamo	0,056	1,4	5,6
Grava	0,069	1,7	6,9

1.3.4 Mezcla de Prueba

Número de cilindros de prueba a diseñar: 3

Volumen para un cilindro (m^3)	0,00530
V Total tres cilindros (m^3)	0,0159

MATERIAL	PROPORCIONES EN PESO	PESOS TOTALES (3) CILINDROS DE PRUEBA (Kg)	PESO (1) CILINDRO DE PRUEBA (Kg)
Agua	0,57	3,92	1,307
Aire		0,00	0,000
Cemento	1,0	6,58	2,193
Arena puerto	1,3	8,97	2,991
Arena de El Guamo	1,3	9,40	3,132
Grava	1,8	11,79	3,929
TOTAL		40,66	13,553

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

OBSERVACIONES

- ✓ Las características evaluadas de los agregados permiten obtener la resistencia deseada mezclándolos en las proporciones recomendadas. La granulometría de la grava se ajusta de mejor manera dentro de la franja recomendada AG – 4 para concreto estructural tabla 630.4 especificaciones INVIAS.

- ✓ Para el agregado grueso se obtuvo un TM = 1" pulg. Y TMN = 3/4" pulg. Se debe tener en cuenta que el TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, no debe ser mayor que 1/3 del espesor de la losa ni mayor que 3/4 del espaciamiento máximo entre las barras de refuerzo.

- ✓ Los ensayos fueron realizados a una muestra suministrada por el cliente, Se recomienda realizar ensayos adicionales para verificar las propiedades mecánicas de los agregados y garantizar su óptimo comportamiento en la mezcla y durabilidad del concreto.

- ✓ Debido a que no se realizaron ensayos adicionales para verificar las propiedades de los materiales se diseñó para una resistencia mayor de acuerdo a un nivel de confiabilidad escogido por lo cual es importante realizar control sobre la mezcla en obra para lograr ajustar adecuadamente las proporciones de los materiales.

- ✓ Se debe tener en cuenta la medida de dosificación de los materiales adoptada en obra, ya sea por peso o por volumen.

- ✓ Se resalta la importancia del contenido de agua, en la mezcla tanto por la manejabilidad y consistencia (asentamiento), como para la resistencia (relación agua cemento) que esta controla. Por este motivo y debido a las diferencias de humedades que se pueden dar al momento del ensayo y al momento de efectuar la mezcla en obra, se debe controlar la cantidad de agua para generar la consistencia y resistencia deseadas.

- ✓ Para verificar la resistencia se recomienda tomar mínimo tres (3) cilindros.



ING. JIMMY VERGARA SILVA
DIRECTOR DE LABORATORIO
GLOBAL CIVIL INGENIERÍA SAS

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 3112117489
e-mail: globalcivilsas@hotmail.com

ANEXO No. 4. ACTAS DE COMITE

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 15

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Colegio Guillermo Cano Isaza	**FECHA:**	06	03	2026	**HORA INICIO:**	8:00 AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	
Camilo Andrés Cardenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de interventoría	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Ronal Clavijo	Consorcio País	Residente de obra	

ORDEN DEL DIA	
1	INFORMACION GENERAL
2	ESTADO DE FRENTES DE OBRA
3	RECORRIDO INICIAL – COLEGIO GUILLERMO CANO
4	REVISION DE FRENTES CRITICOS DE OBRA
5	PROYECCION DE ENTREGA DE FRENTES DE OBRA
6	RECORRIDOS
7	OBSERVACIONES GENERALES
8	COMPROMISOS

DESARROLLO

1. **INFORMACION GENERAL**

   El equipo de coordinación de interventoría dio inicio al Comité Técnico correspondiente al Lote No. 6, cuyo objeto es adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo en once sedes educativas de la Secretaría de Educación del Distrito.

   Se indicó:
   - Contratista: Constructora País
   - Interventoría: Consorcio Serinco Educativo

- Inversión total: $3.117.050.445 COP
- Localidades intervenidas: Ciudad Bolívar y Usme – 11 sedes
- Plazo de ejecución: 8 meses y 15 dias

2. ESTADO DE FRENTES DE OBRA

UNION EUROPEA

Actividades ejecutadas en la semana:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W.

ORLANDO FALS BORDA

Actividades ejecutadas en la semana:

- CERRAMIENTO EN LONA
- MEDIACAÑA VERTICAL EN CONCRETO 3000 PSI
- SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

SIERRA MORENA

Actividades ejecutadas en la semana:

- DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU
- RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M
- PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI.
- SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA

ARBORIZADORA BAJA

Actividades ejecutadas en la semana:

- EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W.

- LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE

FABIO LOZANO SIMONELLI

Actividades ejecutadas en la semana:

- CERRAMIENTO EN LONA
- DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES
- CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN TUBERIA
- EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO
- CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45

ESTRELLA DEL SUR – SEDE B

Actividades ejecutadas en la semana:

- ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA

BUENAVISTA (CALASANZ)

Actividades ejecutadas en la semana:

- CERRAMIENTO EN LONA
- DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH

SANTA LIBRADA

Actividades ejecutadas en la semana:

- PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO
- MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

ESTRELLA DEL SUR – SEDE A

Actividades ejecutadas en la semana:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO

GUILLERMO CANO ISAZA

Actividades ejecutadas en la semana:

- DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO
- DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45

3. RECORRIDO INICIAL – COLEGIO GUILLERMO CANO ISAZA

El comité inicia a las 08:00 a.m. en el Colegio Guillermo Cano Isaza, donde se realiza un recorrido técnico por las áreas que se encuentran actualmente en intervención.

Durante la inspección se visitan las baterías sanitarias del primer piso, ubicadas en el área de laboratorios, y las baterías sanitarias del tercer piso, ubicadas en el área de aulas.

En las baterías sanitarias del primer piso se evidencia que el contratista se encuentra realizando actividades de enchape en el baño de niñas, mientras que en el baño de niños ya se culminó la instalación del pañete.

En el tercer piso se constata que la demolición del área intervenida se encuentra finalizada en su totalidad, quedando pendiente el inicio de las actividades de adecuación y acabados correspondientes.

Posterior al recorrido, el Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión y el Arq. Héctor – Director de Interventoría manifiestan su preocupación frente al avance general de las obras y reiteran la necesidad de revisar el estado de los frentes críticos y la disponibilidad de personal en cada uno de ellos.

4. REVISIÓN DE FRENTES CRÍTICOS DE OBRA

4.2 Colegio Orlando Fals Borda

El Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión solicita al contratista informar sobre el estado actual de las actividades en este frente.

El Ing. Wilson – Director de Obra informa que actualmente se están ejecutando correcciones en los empozamientos identificados en la cubierta, y que ya se realizó el núcleo necesario para la conexión de las bajantes, actividad fundamental para el correcto manejo de aguas lluvias.

4.3 Colegio Estrella del Sur – Sede A

El Ing. Wilson – Director de Obra informa que se realizó una capacitación al personal sobre los procedimientos adecuados para la limpieza y mantenimiento de las divisiones en acero inoxidable instaladas en los baños, con el fin de garantizar su correcta conservación.

El Ing. Jhon – Residente de Interventoría consulta sobre el estado de la instalación de los espejos en las baterías sanitarias.

El Ing. Wilson – Director de Obra responde que actualmente los espejos se encuentran en proceso de fabricación, a la espera del proceso de biselado, y que se estima su entrega entre el viernes 06 de marzo o el sábado 07 de marzo de 2026.

4.4 Colegio Estrella del Sur – Sede B

Se recuerda que este frente de obra tiene como fecha de terminación contractual el día 14 de marzo de 2026.

No obstante, aún se identifican detalles pendientes en la ventanería que deben ser atendidos para lograr el cierre del frente.

El Ing. Wilson – Director de Obra informa que el viernes 06-mar-2026 se contará con personal adicional para realizar las actividades pendientes relacionadas con la ventanería y otros detalles de acabado necesarios para la entrega del frente.

4.5 Colegio Unión Europea

Se informa que posteriormente se realizará visita a esta sede con el fin de verificar directamente el avance de las actividades pendientes, considerando que este frente también es considerado crítico para el cierre del contrato.

5. PROYECCIÓN DE ENTREGA DE FRENTES DE OBRA

Durante la reunión, el Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión realiza una observación indicando que para el viernes 13-mar-2026 se requiere que al menos dos frentes de obra se encuentren completamente finalizados y entregados.

Frente a esta solicitud, el Ing. Wilson – Director de Obra manifiesta que existe la posibilidad de entregar tres frentes de obra dentro de ese plazo, los cuales corresponderían a:

- Colegio Estrella del Sur – Sede A
- Colegio Estrella del Sur – Sede B
- Colegio Unión Europea

6. RECORRIDOS

6.1 Colegio Calasanz Buenavista

Posteriormente se realiza recorrido en el Colegio Calasanz Buenavista, con el fin de revisar nuevas actividades requeridas para el frente de obra.

El Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión expone brevemente los nuevos alcances técnicos que deberán ser evaluados por el contratista, los cuales corresponden a:

- Instalación de divisiones en acero inoxidable para el baño de la cocina.
- Ampliación de la capacidad del tanque de agua potable, pasando de 1.000 litros a 4.000 litros, para lo cual se deberá realizar la construcción de una placa estructural y el suministro e instalación de un tanque adicional de 3.000 litros.
- Adecuación de una rampa de acceso hacia el aula múltiple, con el fin de mejorar las condiciones de accesibilidad.

De acuerdo con lo anterior, el Ing. Wilson – Director de Obra se compromete a presentar el presupuesto y el cronograma de ejecución correspondientes, para la revisión por parte de la Interventoría y la Supervisión.

6.2 Colegio Unión Europea

Se continúa el comité con el recorrido en el Colegio Unión Europea, donde se realiza verificación detallada de las actividades pendientes para la entrega del frente.

En esta visita participan el Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión, el Arq. Héctor – Director de Interventoría, el Ing. Jhon – Residente de Interventoría y el Ing. Ronal – Residente de Obra.

Durante la inspección se evidencia que el encorazado del aula de informática presenta un avance aproximado del 95%, quedando pendiente su culminación para la entrega del espacio.

Asimismo, se identifican las siguientes actividades pendientes:

- Instalación de canal en la cubierta de policarbonato para el adecuado manejo de aguas lluvias.

- Pintura de bajantes y perfiles metálicos, actividad necesaria para la correcta instalación y acabado de las bajantes.

7. OBSERVACIONES GENERALES

Al finalizar el comité, la Interventoría y la Supervisión reiteran la preocupación previamente manifestada en reuniones anteriores respecto a:

- La insuficiencia de personal en los frentes de obra.
- La falta de entrega de los balances actualizados de cada frente, lo cual impide tener certeza sobre la ejecución real del contrato.

El Ing. Wilson – Director de Obra reconoce las dificultades presentadas en la contratación de personal y en la consolidación de los balances; sin embargo, manifiesta que durante la próxima semana espera normalizar la información y avanzar en los frentes que serán objeto de entrega final.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega de balances actualizados de cada frente de obra	Alta	Contratista de Obra	09/03/2026	
2	Finalización y entrega de frentes priorizados	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	
3	Presentación de presupuesto y cronograma para nuevas actividades en Calasanz Buenavista	Alta	Contratista de Obra	09/03/2026	
4	Finalizar instalación de ventanería y detalles en Estrella del Sur B	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	
5	Finalizar actividades pendientes en Unión Europea Sede B	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	

Convocatoria próximo comité:	COLEGIO ARBORIZADORA – 7:00 AM
Hora de finalización:	10:00 AM

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 16

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Colegio Arborizadora Baja	**FECHA:**	10	03	2026	**HORA INICIO:**	7:30 AM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Camilo Andres Cardenas	Consorcio Serinco Educativo	Inspector de interventoria	
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Ronal Clavijo	Consorcio País	Residente de obra	04/03/2026

ORDEN DEL DIA	
1	RECORRIDO INICIAL
2	REVISION DE BALANCES DEL CONTRATO
3	SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA Y PROGRAMACION – ARBORIZADORA BAJA
4	PROGRAMACION DE REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
5	CONCLUSIONES
6	COMPROMISOS

DESARROLLO

1. RECORRIDO INICIAL

El comité inicia en las instalaciones del Colegio Arborizadora Baja, donde se realiza una revisión del estado actual de las zonas intervenidas, particularmente en el área de la cancha y el bloque de primera infancia.

Durante el recorrido, el Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión manifiesta su preocupación respecto al estado actual de la cancha, señalando la presencia de marcas de empozamientos que aún se evidencian sobre la superficie, situación que afecta las condiciones adecuadas de uso del espacio.

Frente a esta observación, el Arq. Héctor – Director de Interventoría y el Ing. Jhon – Residente de Interventoría expresan igualmente su preocupación, indicando que previamente se habían realizado intervenciones correctivas en la zona, por lo cual resulta necesario verificar nuevamente las condiciones técnicas de la superficie y determinar las causas de la persistencia de dichas marcas.

Durante la revisión del frente correspondiente al bloque de primera infancia, se realiza consulta al contratista respecto a las fechas estimadas para la finalización y entrega de esta zona.

El Ing. Wilson – Director de Obra informa que actualmente se presentan dificultades para avanzar en las actividades pendientes, debido a que no se cuenta aún con el contratista encargado de realizar el alistado de superficies, ni con el proveedor responsable del suministro e instalación del piso tipo vinilo.

Frente a esta situación, tanto la Supervisión como la Interventoría realizan un llamado de atención al contratista, indicando que esta actividad no corresponde a un retraso reciente, sino que ha transcurrido aproximadamente un mes sin avances significativos, situación que genera preocupación frente al cumplimiento de los tiempos del contrato.

2. REVISION DE BALANCES DEL CONTRATO

En el marco del comité se consulta nuevamente al contratista sobre el estado de los balances de obra correspondientes a los diferentes frentes del contrato.

El Ing. Wilson – Director de Obra manifiesta que los balances ya fueron entregados y que actualmente se encuentran en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

Sin embargo, aclara que aún se encuentra pendiente la entrega del balance consolidado del contrato, el cual deberá integrar la información de todos los frentes de obra, con el objetivo de determinar con claridad si existen faltantes o excedentes de recursos en el global del contrato.

3. SOLICITUD DE PLAN DE CONTINGENCIA Y PROGRAMACION – ARBORIZADORA BAJA

El Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión solicita formalmente al contratista la presentación de un plan de contingencia y una reprogramación específica del frente de obra del Colegio Arborizadora Baja, particularmente para las actividades relacionadas con:

- La entrega de la cancha
- La culminación del bloque de primera infancia

El Arq. Santiago – Apoyo a la Supervisión señala que la Supervisión, la Interventoría y la Rectoría del colegio no recibirán la cancha en el estado actual, debido a las condiciones evidenciadas durante el recorrido.

Por lo anterior, se requiere que el contratista presente una programación ajustada y medidas concretas de contingencia, con el fin de garantizar que estos espacios puedan ser entregados antes del inicio de la Semana Santa

4. PROGRAMACION DE REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 16

Finalmente, se acuerda realizar una reunión adicional el día 13 de marzo de 2026 en las instalaciones del Colegio Arborizadora Baja, con el objetivo de tratar específicamente los temas relacionados con el estado de la cancha y su intervención.

En esta reunión se contará con la participación del personal académico de la institución, con el fin de socializar las acciones a ejecutar y las medidas previstas para garantizar la correcta entrega del espacio.

5. CONCLUSIONES

Durante el comité se reiteran las preocupaciones relacionadas con:

- El estado actual de la cancha del colegio.
- Los retrasos en las actividades del bloque de primera infancia.
- La falta de definición del proveedor para el piso tipo vinilo.
- La necesidad de contar con un balance consolidado del contrato.

Se solicita al contratista tomar acciones inmediatas de planificación y contratación que permitan recuperar el tiempo perdido y garantizar la entrega oportuna de los espacios.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Entrega del balance general consolidado del contrato	Alta	Contratista de Obra	12/03/2026	
2	Presentación del plan de contingencia y reprogramación del frente Colegio Arborizadora Baja	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	
3	Definición del proveedor para suministro e instalación de piso tipo vinilo	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	
4	Realización de reunión con personal académico del colegio para tratar temas de la cancha	Alta	Contratista de Obra	13/03/2026	

Convocatoria próximo comité:	16/03/2026
Hora de finalización:	10:00 AM

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 17

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	16	03	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Ronal Clavijo	Consorcio País	Residente de obra	04/03/2026

ORDEN DEL DIA	
1	Estado general del contrato
2	Estado de Avance de los Frentes de Obra
3	Subsanación de Informes y Documentación
4	Balance General y Ajuste del Contrato
5	Reasignación de Proyectos y Ajuste Presupuestal
6	Análisis Específico – Colegio Arborizadora Baja
7	Programación y Plazos de Entrega
8	Situaciones Particulares de Otros Frentes
9	Compromisos

DESARROLLO

1. Estado General del Contrato

La interventoría presenta el estado general del contrato, indicando que a la fecha se registra un atraso global del 4.20%, de acuerdo con el último informe semanal.

Se resalta que, aunque algunos frentes presentan cumplimiento total, el atraso general se mantiene debido a bajos rendimientos en otros colegios.

2. Estado de Avance de los Frentes de Obra

Se realiza la revisión detallada del avance de los diferentes frentes de obra:

- La interventoría informa que el Colegio Unión Europea y los Colegios Estrella del Sur Sedes A y B fueron finalizadas al 100%.
- En contraste, el Colegio Orlando Fals Borda presenta un atraso significativo del 50.29%, debido principalmente a la demora en la instalación de membrana impermeabilizante, convirtiéndose en un frente crítico.
- El Colegio Sierra Morena no reporta actividades, registrando un atraso del 12.94%, mientras que el Colegio Calasanz presenta un atraso del 2.12%.
- El Colegio Arborizadora Baja presenta un avance, con 2.63% en actividades de alistado de pisos, lo cual genera preocupación frente a los compromisos de entrega.
- El Colegio Fabio Lozano Simonelli registra un avance del 12.32%, incluyendo actividades como cunetas, enchapes y divisiones sanitarias.
- El Colegio Santa Librada presenta un avance del 11.43%, mientras que el Colegio Tenerife registra un atraso del 9.80%.
- El Colegio Guillermo Cano Isaza presenta un atraso del 4.20%, alineado con el atraso general del contrato.

3. Subsanación de Informes y Documentación

El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – Director de Obra informa que las observaciones realizadas al informe técnico y ambiental serán atendidas entre el día del comité y el día siguiente.

Adicionalmente, indica que las memorias y el acta serán radicadas el mismo día, incluyendo la subsanación de observaciones previas.

4. Balance General y Ajuste del Contrato

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita la entrega del balance general consolidado del contrato a más tardar el viernes, indicando que este documento es indispensable para gestionar la adición contractual.

El Ing. Wilson – Director de Obra manifiesta que se realizará un nuevo barrido general del contrato para identificar ajustes necesarios en cantidades y actividades.

El Ing. Ronal Clavijo – Residente de Obra confirma que los ajustes deberán incluir la totalidad de los frentes en ejecución y las actividades proyectadas.

5. Reasignación de Proyectos y Ajuste Presupuestal

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión informa que, con el fin de garantizar la viabilidad de la adición, se realizará un ajuste en el alcance del contrato, el cual incluye:

- Retiro del Colegio Acacias del grupo contractual
- Asignación del Colegio Ciudad de Villavicencio (Usme)

El Ing. Wilson – Director de Obra señala que, sin incluir Arborizadora Baja, el saldo estimado es cercano a 480 millones de pesos, el cual deberá ajustarse según las nuevas definiciones.

6. Análisis Específico – Colegio Arborizadora Baja

Se genera discusión técnica sobre las actividades en el Colegio Arborizadora Baja, particularmente en relación con:

- Cancha
- Piso de preescolar
- Cerramientos
- Tarima y graderías

El Ing. Wilson – Director de Obra indica que la cancha y el piso de preescolar se ejecutarán dentro del contrato actual, mientras que los cerramientos requieren definición sobre si serán ejecutados por contrato o por emergencia.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión aclara que la tarima y graderías se ejecutarán como obra prioritaria (emergencia) y solicita la elaboración de los presupuestos y cronogramas independientes:

1. Actividades contractuales + cerramientos + piso
2. Actividades por emergencia (tarima y graderías)

7. Programación y Plazos de Entrega

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión establece como compromiso que:

- El Colegio Orlando Fals Borda deberá ser entregado a más tardar el 10 de abril de 2026

El Ing. Wilson – Director de Obra acepta el compromiso.

Respecto al Colegio Arborizadora Baja, se acuerda que:

- Cancha y aulas: entrega máxima el 10 de abril de 2026
- Cerramientos: El plazo debe ser establecido por Consorcio País, aclarando que las obras deben ser entregadas antes del 15 de mayo de 2026

El Ing. Wilson – Director de Obra manifiesta que no es viable finalizar la totalidad de las actividades en la misma fecha, por lo cual se acepta la extensión para cerramientos.

8. Situaciones Particulares de Otros Frentes

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión señala que el Colegio Calasanz no puede ser reprogramado, debido a que su fecha de entrega vence en la misma semana, indicando que las actividades adicionales serán priorizadas por el componente de emergencia y obras prioritarias

El Ing. Wilson – Director de Obra informa que se encuentra en proceso de contratación de entre 10 y 12 trabajadores adicionales por administración, con el fin de atender actividades que no han sido asumidas por subcontratistas.

El Ing. Jhon Castañeda – Residente de Interventoría confirma que las actas de Estrella del Sur A, Estrella del Sur B y Unión Europea se encuentran listas, quedando pendiente únicamente la firma por parte de Supervisión.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 17

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Entrega del balance general consolidado del contrato	Alta	Contratista de Obra	19/03/2026	
2	Subsanación de observaciones del informe técnico y ambiental	Alta	Contratista de Obra	17/03/2026	
3	Radicación de memorias y actas ajustadas	Alta	Contratista de Obra	16/03/2026	
4	Entrega del Colegio Orlando Fals Borda	Alta	Contratista de Obra	10/04/2026	
5	Entrega de cancha y aulas de Arborizadora Baja	Alta	Contratista de Obra	10/04/2026	
6	Presentación de presupuestos y cronogramas diferenciados (contrato/emergencia)	Alta	Contratista de Obra	20/03/2026	
7	Entrega de los Manuales de Mantenimiento e Informes Técnicos de las 3 sedes entregadas	Alta	Contratista de Obra	18/03/2026	

Convocatoria próximo comité:	Por definir
Hora de finalización:	4:50 pm

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 18

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	24	03	2026	**HORA INICIO:**	5:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Ronal Clavijo	Consorcio País	Residente de obra	04/03/2026

ORDEN DEL DIA	
1	Estado General del Contrato
2	Estado de Avance de los Frentes de Obra
3	Emergencia – Colegio Calasanz
4	Adición Presupuestal
5	Documentación Técnica y Administrativa
6	Compromisos

DESARROLLO

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del comité, se presentó el estado general del proyecto, evidenciando un adelanto del 0,99%, con tres (3) sedes ejecutadas al 100% y varios frentes con atrasos.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión manifestó su preocupación por el bajo avance general del contrato, indicando la necesidad de priorizar actividades críticas y mejorar la ejecución en los frentes con mayor rezago.

Por su parte, el Arq. Héctor Villazón – Director de Interventoría reiteró la importancia de reflejar correctamente los avances en los informes semanales, así como de establecer estrategias claras para la recuperación del atraso.

2. ESTADO DE AVANCE DE LOS FRENTES DE OBRA

Se reportó que los siguientes colegios cuentan con ejecución al 100%:

- Colegio Estrella del Sur Sede A
- Colegio Estrella del Sur Sede B
- Colegio Unión Europea

El Ing. Jhon Castañeda – Residente de Interventoría confirmó que estos frentes ya cuentan con actas de entrega y cierre.

Se identificaron los siguientes atrasos:

- Colegio Orlando Fals Borda: atraso del 6,45%
- Colegio Sierra Morena: atraso del 6,30%
- Colegio Arborizadora Baja: atraso del 2,38%
- Colegio Calasanz: atraso del 6,67%
- Colegio Guillermo Cano Isaza: atraso del 11,74%

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra indicó que estos atrasos obedecen principalmente a dificultades en la ejecución de actividades específicas y coordinación de subcontratistas.

3. EMERGENCIA – COLEGIO CALASANZ

Se abordó como punto prioritario la intervención del tanque de agua para el Colegio Calasanz.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indicó que, debido a la urgencia del colegio, las actividades deben iniciar a más tardar entre el 6 y 7 de abril de 2026, priorizando excavación y fundición de la placa antes de Semana Santa.

El Ing. Ronal Clavijo – Residente de Obra manifestó preocupación por la capacidad portante del terreno, lo cual podría afectar el diseño y ejecución del tanque.

Frente a esto, el Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra se comprometió a realizar un apique del terreno para verificar las condiciones reales.

Adicionalmente, el equipo técnico indicó que el cambio en la capacidad del tanque (de 3.000 L a 2.000 L) ha generado ajustes en el diseño y adquisición de materiales.

4. ADICION

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra informó que, tras la revisión preliminar de balances, se cuenta con un superávit aproximado de $416.000.000.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicitó formalizar una adición por el valor propuesto por la gestión territorial destinada a la intervención del Colegio Ciudad de Villavicencio Sede B, incluyendo:

- Sustitución de pavimentos
- Instalación de cajas para bajantes

- Posibles actividades de cerramiento y pisos

Asimismo, solicitó justificar técnicamente una ampliación de plazo entre 3 y 4 meses, mediante la presentación de cronograma y presupuesto formal.

El Arq. Héctor Villazón – Director de Interventoría indicó que dicha información deberá ser revisada por interventoría antes de su aprobación.

5. DOCUMENTACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

La interventoría solicitó claridad sobre la entrega de informes técnicos y manuales de mantenimiento de los colegios ya finalizados.

El Ing. Ronal Clavijo – Profesional de Obra indicó que los documentos están en proceso y se comprometió a enviar un primer informe para revisión.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión enfatizó que los informes deben entregarse completos y oportunamente para evitar incumplimientos contractuales

Se da por finalizado el comité técnico reiterando la necesidad de priorizar la ejecución de actividades críticas, fortalecer la planeación y garantizar la entrega oportuna de información técnica para la toma de decisiones contractuales.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Ajustar fechas de la Emergencia de Calazans	Alta	Contratista de Obra	30/03/2026	
2	Radicar la subsanación de observaciones del acta parcial	Alta	Contratista de Obra	25/03/2026	
3	Entregar informes técnicos y manuales de mantenimiento de sedes entregadas	Alta	Contratista de Obra	25/03/2026	
4	Presentar presupuesto y cronograma de la adición del Colegio Ciudad de Villavicencio	Alta	Contratista de Obra	30/03/2026	

Convocatoria próximo comité:	Lunes 30-mar-2026
Hora de finalización:	6:00 p.m.

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 19

LUGAR DE LA REUNIÓN:	Reunión virtual Meet	**FECHA:**	30	03	2026	**HORA INICIO:**	4:00 PM
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO PAIS– Lote 6						
PRESIDE:	INTERVENTORIA	**SECRETARIO DE LA REUNIÓN:**	INTERVENTORIA				
PROYECTO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS						

NOMBRE	COMPAÑIA	CARGO	FIRMA
Santiago Ángel Uribe	DCCEE	Supervisor Contrato de Interventoría	
Héctor Villazón Gutiérrez	Consorcio Serinco Educativo	Director de Interventoría	
John Castañeda	Consorcio Serinco Educativo	Residente de Interventoría	JOHN CASTAÑEDA
Alejandra Otalora Delgado	Consorcio Serinco Educativo	Apoyo Coordinación	
Wilson Parra Robles	Consorcio País	Director de obra	
Ronal Clavijo	Consorcio País	Residente de obra	04/03/2026

ORDEN DEL DIA	
1	ESTADO GENERAL DEL CONTRATO
2	ESTADO DE AVANCE DE LOS FRENTES DE OBRA
3	EMERGENCIA – COLEGIO CALASANZ
4	ADICIÓN PRESUPUESTAL
5	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
6	COMPROMISOS

DESARROLLO

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Durante el desarrollo del comité se presenta el estado general del contrato, evidenciando un avance total del 3.17%, con presencia de atrasos en varios frentes de obra.

La interventoría expone los principales indicadores:

- Colegio Orlando Fals: atraso del 6.45%.
- Colegio Sierra Morena: atraso del 10.99%.
- Colegio Arborizadora Baja: atraso del 2.38%.
- Colegio Fabio Lozano Simonelli: avance del 24.77%.

- Colegio Calasans: atraso del 6.33%.
- Colegio Santa Librada: avance del 17.84%.
- Colegio Tenerife: avance del 41.97%.

Se resalta que el comportamiento general del contrato refleja dificultades en la continuidad de actividades y baja ejecución en algunos frentes críticos.

2. AJUSTES Y CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión solicita la corrección del informe semanal en relación con el Colegio Estrella del Sur Sede .A., aclarando que:

- El frente ya cuenta con avance del 100%.
- No presenta actividades pendientes.

Se determina que no se incluirán anotaciones adicionales en el informe para evitar confusiones sobre su estado finalizado.

3. DISCREPANCIAS EN ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO

- **Colegio Arborizadora Baja**

  El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra manifiesta que sí se ejecutaron actividades (excavaciones y suministro de acero), aunque estas no fueron reflejadas en el informe.

  El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría aclara que la información fue remitida por separado y no integrada en el balance general, lo cual dificultó el seguimiento.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión recalca la necesidad de consolidar toda la información en un solo documento oficial para garantizar trazabilidad y control.

- **Colegio Dile Usme**

  El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra informa que, tras las lluvias recientes, no se han evidenciado filtraciones, por lo cual propone no demoler el muro y realizar actividades de mantenimiento (limpieza, estuco y pintura).

  Ante esto, el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión exige la entrega de un informe técnico escrito que sustente dicha decisión, indicando que:

  - El contratista será responsable en caso de que la humedad reaparezca.

4. SEGUIMIENTO A EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS

- **Colegio Calasans**

  La interventoría solicita claridad sobre el ajuste de fechas para la emergencia.

  El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra informa que se encuentra gestionando la actualización de la programación y se compromete a remitir el ajuste durante el desarrollo del comité.

- **Colegio Tenerife**

  El Ing. John Castañeda – Residente de Interventoría reporta problemas de humedad en el tanque, posiblemente asociados a filtraciones en una caja cercana.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión sugiere realizar la impermeabilización de dicha caja como medida correctiva.

- **Colegios Santa Librada y Orlando Fals**

  El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – Director de Obra informa que:

  - Las conexiones de tanques se realizarán posterior a Semana Santa por falta de personal.
  - En Santa Librada ya se ejecutaron actividades de demolición e instalación.
  - En Orlando Fals se proyecta la conexión a más tardar el miércoles siguiente.

  El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión enfatiza que el comedor de Santa Librada debe estar finalizado el lunes siguiente, incluso si se requiere trabajo durante el fin de semana.

5. ADICIÓN CONTRACTUAL Y PROGRAMACIÓN

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión define los lineamientos para la adición contractual del lote 6:

- Duración: 3 meses y 10 días.
- Fecha de finalización: 30 de septiembre de 2026.
- Inicio de actividades proyectadas: 01 de junio de 2026.

Se solicita al contratista:

- Entregar programación completa.
- Presentar presupuesto detallado.

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra indica que se encuentra en proceso de estructuración de la información.

6. CONTROL DOCUMENTAL Y REPORTES

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión establece un control riguroso para la entrega de informes mensuales:

- Periodo: del 6 de marzo al 5 de abril de 2026
- Fecha de presentación informes: 10 de abril (5 días hábiles)
- Observaciones interventoría: 15 de abril (3 días hábiles)
- Subsanaciones obra: 17 de abril (2 días hábiles)

Si al 17 de abril, persisten observaciones, a partir del 18 de abril empezarán a contar los días para aplicar los descuentos por ANS al contratista de obra.

Se hace la aclaración de que el informe mensual de obra se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la información, motivo por el cual aún no ha sido remitido. Sin embargo, se queda como compromiso remitirlo el día de mañana 31 de marzo.

Asimismo, se reitera la obligación de:

- Retomar el reporte diario de actividades con registro fotográfico.
- Consolidar la información técnica en un único formato oficial de acta.

7. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTAS

El Ing. Wilson Leonardo Parra – Director de Obra consulta sobre la radicación del acta de cobro.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión informa que:

- No fue posible radicar el acta en el periodo correspondiente.
- Se deberá realizar una radicación acumulada de dos periodos (febrero-marzo y marzo-abril) a partir del 06 de abril de 2026.

Se aclara que:

- El formato de acta es único y debe consolidar todos los colegios.
- Las observaciones principales corresponden a falta de firmas y nombres.

8. SEGUIMIENTO A FRENTES CRÍTICOS

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión manifiesta preocupación por la falta de avances en:

- Colegio Sierra Morena
- Colegio Orlando Fals

Se enfatiza que no se deben abandonar frentes de obra y se deben priorizar actividades para recuperación de atrasos.

Adicionalmente, se establecen fechas de entrega:

- Arborizadora Baja: 10 de abril de 2026.
- Fabio Lozano Simonelli: 11 de abril de 2026.
- Sierra Morena: 18 de abril de 2026.

COMPROMISOS

#	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Ajustar fechas de la Emergencia de Calasanz	Alta	Contratista de Obra	Inmediato	
2	Elaborar informe técnico justificando no demolición de muro en Dile Usme	Alta	Contratista de Obra	Lo antes posible	
3	Retomar reporte diario con registro fotográfico	Alta	Contratista de Obra	Inmediato	

ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 19

COMPROMISOS					
#	**ACTIVIDAD/Tarea**	**PRIORIDAD**	**RESPONSABLE**	**FECHA EJECUCIÓN**	**OBSERVACIONES**
4	Entregar programación y presupuesto de adición contractual	Alta	Contratista de Obra	6/04/2026	
5	Preparar adición de interventoría	Alta	Interventoría	8/04/2026	
6	Control de fechas de informes mensuales	Alta	Contratista / Interventoría	A partir del siguiente mes	

Convocatoria próximo comité:	6/04/2026
Hora de finalización:	5:00 pm

ANEXO No. 5. PLANILLAS DE PAGO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JUAN CARLOS CORTES CORTES
No. Identificación: CC80229176
Dirección: CLL 3 A SUR NO 19 42 APTO 502
Telefono: 6015974562
Correo: ingcortesjc@yahoo.com.ar
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8371034250

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JUAN CARLOS CORTES CORTES
Tipo y número de identificación	CC80229176
Número de planilla	8371034250
Fecha pago	2026-03-30
Número de autorización pago	83513284
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	928800
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	16800	1
231001	Colfondos	512000	1
EPS008	Compensar EPS	400000	1

8371034250

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 80229176
APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN CARLOS CORTES CORTES

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	3200000	3200000	3200000	0	400000	0	512000	0	16800	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ	calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SIBATÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	14/03/2026	67559375	$620.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades						Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización											
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	121.800							121.800			76	121.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.800	121.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	620.900	620.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1072193503	CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ		calle 16 #5-33	0315295794	cesar_carvajal1707@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SIBATÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	14/03/2026	67559375	$620.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072193503	CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR	57	0			N																	230201	1.750.000	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	218.900	14-4	1.750.000	1	121.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-25, 07:34:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84498314

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 25/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BUITRAGO GONZALEZ CARLOS SANTIAGO		
Documento	CC1020822976	**Dirección**	CR 38 #15 - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182651714
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020822976	CARLOS SANTIAGO BUITRAGO GONZALEZ	03	00	X																0	14	14	0	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 817.089	$ 102.200	0,000	$ 0	$ 0	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 817.089	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 817.089	$ 817.089	$ 0	$ 817.089	$ 130.800	$ 102.200	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.000	$ 0	$ 238.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099209679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA JUDITH PARDO DUARTE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRANS 65 59 21 SUR TORRES DE	TELÉFONO:	4202020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008906009**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179045571

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS	CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57675129	11/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$28,005,431	$6.965.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.050.500	0		0		0	0	0	0	1.050.500	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.640.600	0	0	87.500	87.500	0	0		3.815.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	348.600				348.600	0	0	348.600			3.486	348.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	980.400	0	0	980.400	5
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	140.200	0	0	140.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.120.600	1.120.600
Pensión	2	4.376.000	4.376.000
Riesgos Laborales	1	348.600	348.600
CCF	2	1.120.600	1.120.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.965.800	6.965.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901094289-2	ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO SAS		CL 98 70 91 OF 703	6013688490	financieraconsorciosarinco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		57675129	11/03/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$28,005,431	$6.965.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	1.167.270	20	186.800	0	0	0	0	EPS005	1.167.270	20	46.700	14-11	1.167.270	20	1	6.100	CCF24	1.167.270	20	46.700	0	0	0	0	0
2	CC 1000688837	CAÑON GUERRERO KAREN NATALIA	1	0			S												L					230301	583.635	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.635	10	23.400	14-11	583.635	10	1	0	CCF24	583.635	10	23.400	0	0	0	0	0
3	CC 1018489482	CEBALLOS GARCIA JULIETH STEFANIA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS005	1.459.088	25	58.400	14-11	1.459.088	25	5	101.600	CCF33	1.459.088	25	58.400	0	0	0	0	0
5	CC 1082861645	RAMIREZ CURIEUX REBECA PATRICIA	1	0			S												X					230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS005	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	5	0	CCF33	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CC 36522707	CURIEUX DE CASTILLO LIDICE MERCEDES	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 79602923	CASTILLO CURIEUX ERICK JOSE	1	0			S																	230301	17.500.000	30	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS005	17.500.000	30	700.000	14-11	17.500.000	30	1	91.400	CCF24	17.500.000	30	700.000	0	0	0	0	0
8	CC 84452367	CURIEUX BORJA JHAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF33	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 84456959	CURIEUX BORJA KEWING ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900208425-6	SEIING SAS	transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70354890	26/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$10,505,430	$2.272.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.200	0		0		0	20	1.900	0	142.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	280.400	0		0		0	20	3.700	0	284.100	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	20	3.700	0	283.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	20	3.700	0	283.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.400	0	0	0	0	20	7.300	0	567.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	280.600				280.600	20	3.700	284.300			2.806	284.300	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	420.600	20	5.500	426.100	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	420.600	426.200
Pensión	3	1.120.800	1.135.500
Riesgos Laborales	1	280.600	284.300
CCF	1	420.600	426.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.242.600	2.272.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900208425-6	SEIING SAS		transv 52b 2-30	3115134135	seiingadmon2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70354890	26/03/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$10,505,430	$2.272.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 19307265	GUTIERREZ SEGURA HORACIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 24756524	GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 53037176	GARZON UZETA NOHORA LEONOR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79207204	CANTOR RIVERA FREDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 80070003	GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 80257171	SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61161960	26/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,968,718	$1.093.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	88.800	0		0		0	9	600	0	89.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	9	500	0	70.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	9	1.700	0	281.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	9	1.700	0	281.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	74.800	0	0	0	0	9	500	0	75.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	133.600				133.600	9	800	134.400			1.336	134.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	158.900	9	1.000	159.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	9	0	0	0
ICBF				
0	9	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	158.900	160.000
Pensión	3	635.200	639.100
Riesgos Laborales	1	133.600	134.400
CCF	1	158.900	159.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.086.600	1.093.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901219974-9	SEGA INGENIERIA SAS BIC	cra 57 17-36	3112319124	segaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61161960	26/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$3,968,718	$1.093.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016053198	MIRANDA CAÑON VIVIANA ALEJANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 79844429	PEREZ OLMOS FRANZ ALEXANDER	1	0			S	X																25-14	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	8	18.700	14-23	466.908	8	1	2.500	CCF21	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
3	CC 80793169	PARRADO ROZO GERMAN ALONSO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016043952		BERMUDEZ ANDRADE ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 #47-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168254288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	181188386	9502477930	N	2026/04/15	2026/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$186,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		**$186,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		**$186,600**
1	CC	1016043952	BERMUDEZ ANA									A			▫	▫					25-14	30	($2,680,000)	($428,800)	EPS005	30	($2,680,000)	($335,000)	CCF24	30	($2,680,000)	($53,600)	14-11	0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	($817,400)
2	CC	1016043952	BERMUDEZ ANA	R								C									25-14	30	$2,680,000	$428,800	EPS005	30	$2,680,000	$335,000	CCF24	30	$2,680,000	$53,600	14-11	30	$2,680,000	6.960%	$186,600	30	$0	$0	No	$1,004,000
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,680,000		$186,600		$0	$0		$186,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,600	$0	$0	$186,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$186,600	$0	$0	$186,600
TOTAL				**1**	**$186,600**	**$0**	**$0**	**$186,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73722201	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$535.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	235.000	0		0		0	0	0	0	235.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	300.800	0	0	0	0	0	0		300.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	235.000	235.000
Pensión	1	300.800	300.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	535.800	535.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8767031	HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ	Carrera 15a1 N diag 53b - 31	3157351268	hectorvillazon@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	SOLEDAD		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73722201	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$535.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 8767031	VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE	3	0			N																	25-14	1.880.000	30	300.800	0	0	0	0	EPS042	1.880.000	30	235.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	656.700	0		0		0	0	0	0	656.700	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	0	0		560.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	365.700				365.700	0	0	365.700			3.657	365.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	656.700	656.700
Pensión	2	840.600	840.600
Riesgos Laborales	1	365.700	365.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.863.000	1.863.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901977271-0	CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO	TV 52 B # 2 - 30 AP 202	6015372584	aic.gerencia.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70975539		3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	Y	$0	$1.863.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1024465811	PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1026289628	CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1030640730	MOLANO GALLO IVAN RENE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 12:36:35 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080198664

Periodo Cotización: marzo de 2026 | Periodo Servicio: marzo de 2026 | Referencia pago 8823866386

PAGADA 06/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA YANNETH REYES MORA		
Documento	CC52215311	Dirección	CR 53 #14 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202586895
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52215311	DIANA YANNETH REYES MORA	3	0																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901449393
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARINSEGUROSAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 97 # 70C 69	TELÉFONO:	7068824
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6008732078**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		94614776	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52476959	CASTILLO CURIEUX SHIRLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-01, 10:54:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 96541217

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 01/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON QUINTERO ACEVEDO		
Documento	CC1053831407	**Dirección**	CR 69C #1 - 33 LA IGUALDAD
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8964867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053831407	JHON JAIRO QUINTERO ACEVEDO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 437.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 437.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.500	$ 0	$ 997.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018462373	JOHN FREDDY CASTAÑEDA MESIAS	calle 38 b sur 50a 53	3007637384	j.casta717@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73129912	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018462373	CASTAÑEDA MESIAS JOHN FREDDY	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO No. 6. CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES

NIT. 901.977.271-0

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Contador Público de la sociedad CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, identificada con NIT. N° 901.977.271-0, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de aportes”.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Se expide en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de abril del año 2026.

Atentamente,

ARQ. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX
CC. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA
TP 151202-T
Contador Público

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 98 No. 70-91
TELEFAX 3688490
BOGOTA, D.C.
propuestas@arincosas.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.768.840**

CURIEUX MIRANDA
APELLIDOS

JOSE DARIO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

07-JUL-1995 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42117876-M-0079768840-20031002 **03871** 03274B 01 150171711

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

151202-T

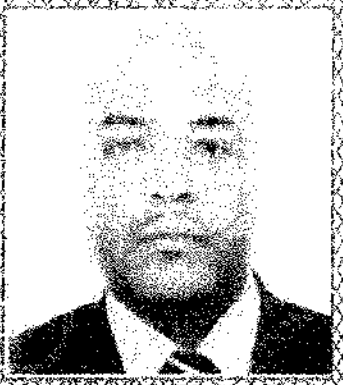

JOSE DARIO
CURIEUX MIRANDA
C.C. 79768840
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161615

J. C. Curieux

FIRMA DEL TITULAR **76162**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E03BC0B49225038B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE DARIO CURIEUX MIRANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79768840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO No. 7. ACTA DE INTERVENTORIA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - 2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL COBRO FIJO MENSUAL: 05 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2026
FECHA DE CORTE FINAL DEL AVANCE DE OBRA: 05 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATISTA : CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 2

DIRECCION : CALLE 98 NO. 70-91

C.C. ó NIT : 901.977.271-0 **ESTABLECIMIENTO :** GRUPO No.2 (ZONA SUR) CIUDAD BOLIVAR - USME **PLAZO INICIAL :** 7 MESES

TELEFONO : 6013688490 **FECHA INICIACION :** 06 DE OCTUBRE DEL 2025

SUPERVISOR: JORGE ALBERTO MORENO ALDANA **LOCALIDADES :** 5 Y 19 **FECHA TERMINAC.INICIAL :** 05 DE MAYO DEL 2026

DIRECCION : Av. El dorado No. 66 -63 **VR. INICIAL :** $ 796.184.131,00 **PLAZO ADICIONAL :** 1,5 MESES

C.C. ó NIT : 79,258,415 **VR. ADICIONAL :** $ 128.425.720,00 **TIEMPO SUSPENDIDO :**

TELEFONO : 3241000 EXT.3149 **VR. FINAL :** $ 924.609.851,00 **PLAZO TOTAL :** 8,5 MESES

FECHA TERMINACION FINAL : 20 DE JUNIO DEL 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1984	10-mar-25	5012	5-sept-25	$ 796.184.131,00	$ 563.603.908,00	$ 68.226.931,00	$ 495.376.977,00
3698	5-dic-25	7587	23-dic-25	$ 128.425.720,00	$ 128.425.720,00		$ 128.425.720,00
TOTALES				$ 924.609.851,00	$ 692.029.628,00	$ 68.226.931,00	$ 623.802.697,00

A PAGAR **$ 68.226.931,00** SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES / INTERVENTORIA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO	MES	7,00	$ 38.232.131,14	$ 267.624.917,98	1,00	$ 38.232.131,14	4,00	$ 152.928.524,56	5,00	$ 191.160.655,70	71,43%
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.1 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.1	%	100,00%	$ 148.563.595,22	$ 148.563.595,22	7,92%	$ 11.766.236,74	30,63%	$ 45.505.029,22	38,55%	$ 57.271.265,96	38,55%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.2 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.2	%	100,00%	$ 124.714.573,22	$ 124.714.573,22	4,15%	$ 5.175.654,79	21,80%	$ 27.187.776,96	25,95%	$ 32.363.431,75	25,95%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.3 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato inicial de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.3	%	100,00%	$ 128.159.208,53	$ 128.159.208,53			17,21%	$ 22.056.199,79	17,21%	$ 22.056.199,79	17,21%
	COSTO DIRECTO				**$ 669.062.294,95**		**$ 55.174.022,67**		**$ 247.677.530,53**		**$ 302.851.553,20**	**45,27%**

MODIFICACION No.1 / INTERVENTORIA ADICIONAL EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	COSTO DIRECTO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	PAGOS FIJO MENSUAL DURANTE EL PLAZO DE MODIFICACION DEL CONTRATO	MES	1,50	$ 28.778.872,83	$ 43.168.309,25							
2	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.1 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.1	%	100,00%	$ 17.447.172,59	$ 17.447.172,59	7,92%	$ 1.381.816,07	30,63%	$ 5.344.068,96	38,55%	$ 6.725.885,03	38,55%
3	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.2 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.2	%	100,00%	$ 18.740.152,58	$ 18.740.152,58	4,15%	$ 777.716,33	21,80%	$ 4.085.353,26	25,95%	$ 4.863.069,59	25,95%
4	PAGOS VARIABLES MENSUALES FRENTE No.3 (sesenta por ciento (60%) del valor del contrato adicionado de Interventoría, y será proporcional a la ejecución financiera (actas de corte tramitadas y facturadas ante la SED) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte de la interventoría. Ponderado de acuerdo al valor del contrato del frente No.3	%	100,00%	$ 28.565.138,69	$ 28.565.138,69			17,21%	$ 4.916.060,37	17,21%	$ 4.916.060,37	17,21%
	COSTO DIRECTO ADICION				**$ 107.920.773,11**		**$ 2.159.532,40**		**$ 14.345.482,59**		**$ 16.505.014,99**	**15,3%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 776.983.068,06**	**$ 57.333.555,07**	**$ 262.023.013,12**	**$ 319.356.568,19** **41,10%**
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 147.626.782,94**	**$ 10.893.375,46**	**$ 49.784.372,50**	**$60.677.747,96** **41,10%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 924.609.851,00**	**$ 68.226.930,53**	**$ 311.807.385,62**	**$380.034.316,15** **41,10%**
AJUSTE AL PESO SEGÚN			**$ 0,47**	**$ 0,38**	**$ 0,85**
VALOR A PAGAR EN ACTA			**$ 68.226.931,00**	**$ 311.807.386,00**	**$ 380.034.317,00**
DESCUENTO POR ANS PARA EL ACTA (Luego de lo acordado entre las partes el descuento es de)		**$ -**			
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**


CONTRATISTA — CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO — Nit/ C.C 901.977.271-0 — REP. LEGAL — ERICK JOSE CASTILLO CUBILLOS — C.C. 79.602.923


APOYO A LA SUPERVISION — SANTIAGO ANGEL URBIBE — Nit/CC. 79.598.873

SUPERVISOR — JORGE ALBERTO MORENO ALDANA — Nit/ C.C 79.464.477

ANEXO No. 8. REGISTRO CAPACITACIONES

REGISTRO DE ASISTENCIA

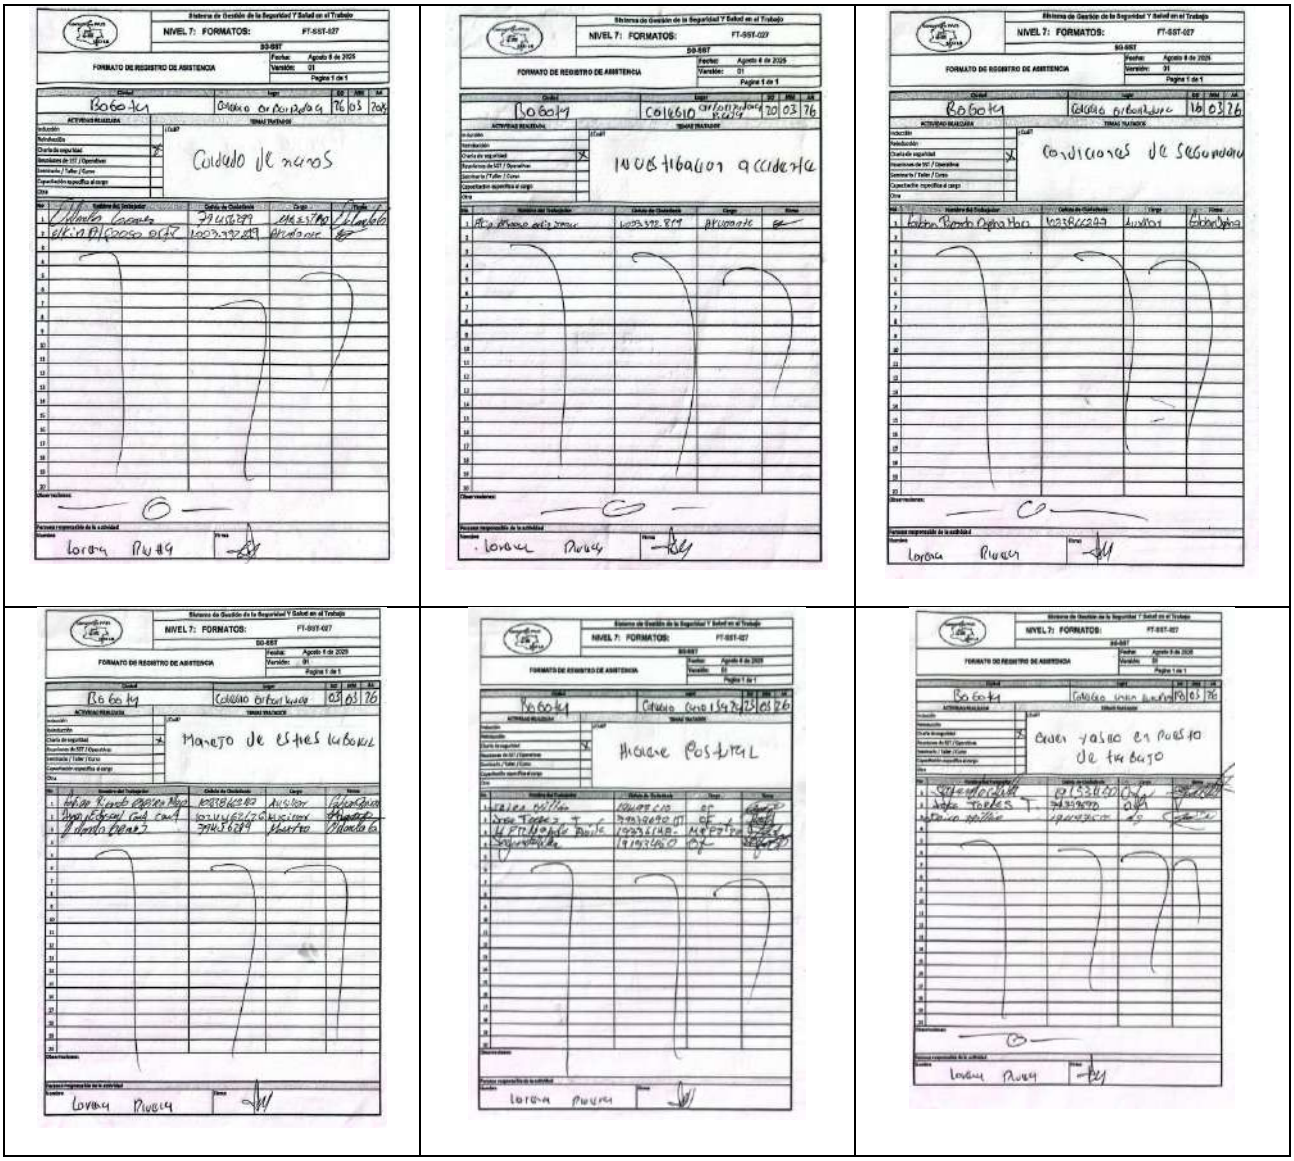




NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio Guillermo — 16/03/26

Atención de emergencias
Gm Distritales

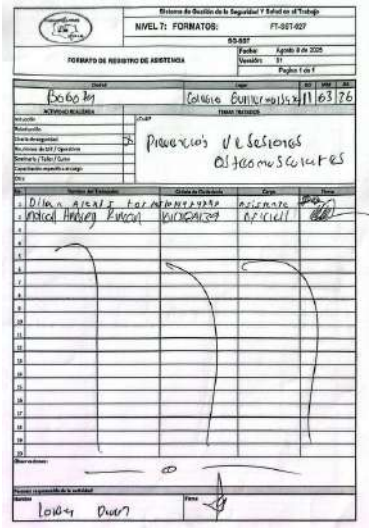

NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio Guillermo — 11/03/26

Primeros Auxilios Osteomusculares




NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio Guillermo — 04/03/26

Manejo de estres laboral

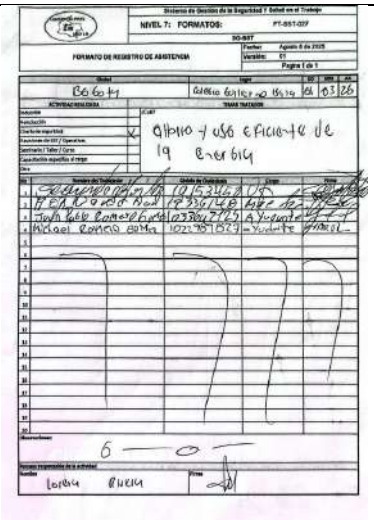

NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio Guillermo — 16/03/26

Ahorro y uso eficiente de la Energía



NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio — 03/07/26

Procedimientos de emergencias




NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio — 16/03/26

Ahorro y uso eficiente de la Energía

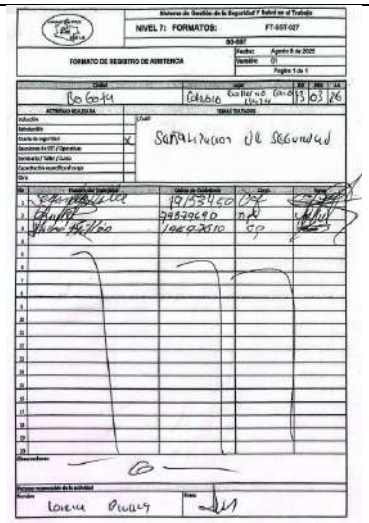


NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio — 03/03/26

Señalización de Seguridad

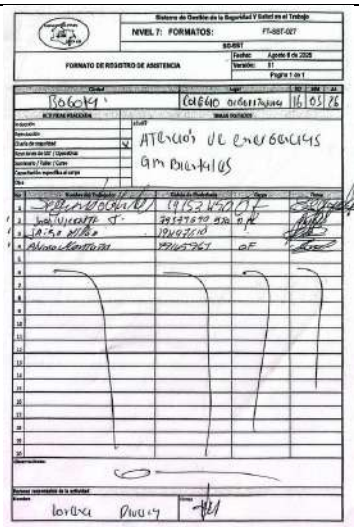


NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio — 16/03/26

Atención de emergencias
Gm Distritales

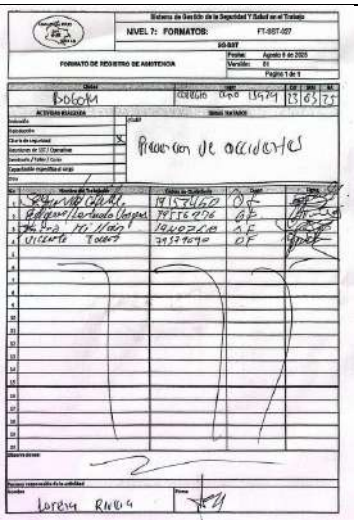

NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Bogotá — Colegio — 13/03/26

Prevención de accidentes

ANEXO SOPORTE INFORME SST- LOTE 6

TIPO DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE	COLEGIO	PERIODO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE SST CONTRATISTA	CONSORCIO CONTRATISTA
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS					
Análisis De Trabajo Seguro	Permiso De Trabajo En Caliente Demolición De Baldosa	Arborizadora Baja	13 Al 18 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Análisis De Trabajo Seguro	Permiso De Trabajo En Caliente, Excavación Para Viga De Pilote (Corte)	Arborizadora	23 Al 28 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Análisis De Trabajo Seguro	Demolición De Baños	Cano Isaza	02 Al 08 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Análisis De Trabajo Seguro	Enchape Y Pañete De Muros En Baños	Cano Isaza	04 Al 14 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Análisis De Trabajo Seguro	Instalación De Enchape Baños Y Piso	Cano Isaza	16 Al 21 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
CHARLAS DE SEGURIDAD					
Charla De Seguridad	Manejo Del Estrés Laboral	Sierra Morena	03/03/2026-04/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charla De Seguridad	Procedimiento De Emergencia	Arborizadora	03/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Ahorro Y Usos Eficiente De Energía	Calasanz Buena Vista	05/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Prevención Osteomuscular	Arborizadora	11/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charla De Seguridad	Señalización De Seguridad	Cano Isaza	12/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charla De Seguridad	Señalización De Seguridad	Cano Isaza	13/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Atención De Emergencias Ambientales	Cano Isaza	16/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Condiciones De Seguridad	Cano Isaza	16/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Orden Y Aseo En Puesto De Trabajo	Arborizadora	18/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País

Charlas De Seguridad	Investigaciones De Accidentes	Arborizadora	20/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Higuiene Postural	Cano Isaza	23/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
Charlas De Seguridad	Cuidado De Manos	Arborizadora	26/03/2026	Lorena Rivera	Consorcio País
INSPECCIÓN HERRAMIENTA, LOCATIVA					
Formato	Inspección Herramientas	Cano Isaza	09 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Formato	Inspección Herramientas	Sierra Morena	09 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Formato	Inspección Herramientas	Arborizadora Baja	25 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Formato	Inspección Herramientas	Cano Isaza	14 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
Formato	Inspección Locativa	Sierra Morena	19 De Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País
PREOPERACIONAL					
Preoperacional	Pulidora	Cano Isaza	17 Al 26 De Marzo	Edison Forero	Consorcio País
Preoperacional	Pilidora	Fabio Lozano Simonelli	13 Al 28 De Marzo	Edison Forero	Consorcio País
INDUCCIONES SST					
Inducción	Trabajador (3)	Lote 6	03,17,21 de Marzo	Lorena Rivera	Consorcio País

ANEXO No. 9. REGISTRO FOTOGRAFICO

 	 
Fotografía No.1: Realización de paso, para Bajante, material en Sitio	**Fotografía No.2:** Aplicación de Imprimante para la membrana de Poliurea.
 	 
Fotografía No.3: Aplicación de Poliurea	**Fotografía No.4:** Instalación de tubería para Bajantes, Falta Conexión entre si.

Tabla 18 - Registro fotográfico Colegio Orlando Fals
Fuente: Propia

 	
Fotografía No.5: Estructura para adecuación del cuarto de residuos.	**Fotografía No.6:** Instalación Cubierta Tipo sándwich
	
Fotografía No.7: Instalación Cubierta Tipo sándwich	

Tabla 19 - Registro fotográfico Colegio sierra morena
Fuente: Propia






Fotografía No.8: Demolición de Alistado existente zona bloque primera infancia





Fotografía No.9: Inicio de Alistado para piso zona bloque primera infancia

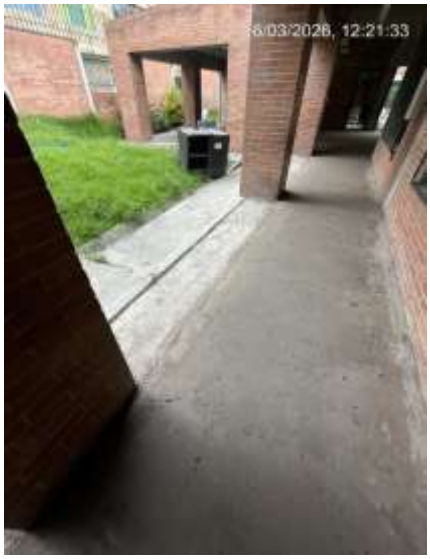

Fotografía No.10: Terminación de Alistado para piso zona bloque primera infancia



Fotografía No.11: Terminación de Alistado para piso zona bloque primera infancia

Tabla 20 - Registro fotográfico Colegio Arborizadora Baja
Fuente: Propia





Fotografía No.12: Instalación de enchape para piso y muros Baterías Sanitarias





Fotografía No.13: Instalación de enchape para piso y muros Baterías Sanitarias





Fotografía No.14: Instalación Divisiones en acero inoxidable, actividades eléctricas.





Fotografía No.15: Instalación cielo raso en PVC, Aula de Profesores

Tabla 21 - Registro fotográfico Colegio Fabio Lozano Simonelli
Fuente: Propia

 	
Fotografía No.16: Instalación Reflector, Aula Multiple	**Fotografía No.17:** Instalación Cielo Raso en PVC -Zona rampa
	
Fotografía No.18: Instalación Cielo Raso en PVC - Zona rampa	**Fotografía No.19:** Instalación Cielo Raso en PVC -Zona rampa

Tabla 22 - Registro fotográfico Colegio Calasanz
Fuente: Propia


 	
Fotografía No.20: Junta de dilatación perimetral, Jardineras	**Fotografía No.21:** Instalación de Poliurea
	
Fotografía No.22: Instalación de Poliurea	**Fotografía No.23:** Instalación canal y Bajante, Zona Comedor

Tabla 23 - Registro fotográfico Colegio Santa Librada
Fuente: Propia





Fotografía No.24: Instalación de enchape Piso y Muros, Batería Sanitaria, Primer Piso

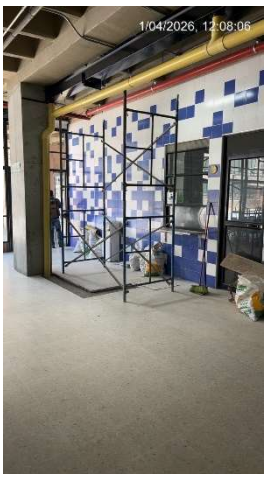



Fotografía No.25: Instalación de enchape Piso y Muros, Batería Sanitaria, Tercer Piso





Fotografía No.26: Instalación de enchape Piso y Muros, Batería Sanitaria, Tercer Piso



Fotografía No.27: Instalación de enchape Piso y Muros, Batería Sanitaria, Tercer Piso

Tabla 24 - Registro fotográfico Colegio Guillermo Cano Isaza
Fuente: Propia





Fotografía No.28: Impermeabilización con membra Poliurea en Frio





Fotografía No.29: Impermeabilización Tanque agua Potable.



Fotografía No.30: Pintura placa Superior, Antideslizante



Fotografía No.31: Pintura placa Superior, Antideslizante

Tabla 25 - Registro fotográfico Colegio Tenerife Granada Sur Sede A
Fuente: Propia

ANEXO No.10. RELACION DE CORRESPONDENCIA

ANEXO 1	CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025.	
PERIODO: FEBRERO 2026		
FECHA: 05 DE FEBRERO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
VERSION: 1		

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	TIPO	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	GRUPO	ASUNTO	MODO DE RADICACION	ARCHIVO	ELABORADO POR:	No. RADICADO
SERINCO-SED-LX-2025-338	COMUNICACIÓN	6/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-339	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-340	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-341	COMUNICACIÓN	9/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-342	COMUNICACIÓN	10/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-343	COMUNICACIÓN	11/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Implementación de plan de mejoramiento – Entrega semanal de formatos SST (Lote 4)	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-344	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-345	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-346	COMUNICACIÓN	12/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-347	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-348	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-349	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-350	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	JOHN CASTAÑEDA	
SERINCO-SED-L4-2025-351	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-352	COMUNICACIÓN	16/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L4-2025-353	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-354	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-355	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-356	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-L5-2025-357	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-L6-2025-358	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-L6-2025-359	COMUNICACIÓN	17/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1904	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-360	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-361	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-362	COMUNICACIÓN	18/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-363	COMUNICACIÓN	19/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-364	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-365	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-366	COMUNICACIÓN	20/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-367	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-368	COMUNICACIÓN	25/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-369	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-370	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-371	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L6-2025-372	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L5-2025-373	COMUNICACIÓN	24/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-L4-2025-374	COMUNICACIÓN	25/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G	
SERINCO-SED-LX-2025-375	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-376	COMUNICACIÓN	27/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON	
SERINCO-SED-LX-2025-377	COMUNICACIÓN		C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA	
SERINCO-SED-LX-2025-378	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	
SERINCO-SED-LX-2025-379	COMUNICACIÓN	26/3/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ	

SERINCO-SED-L6-2025-380	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L4-2025-381	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-LX-2025-382	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-LX-2025-383	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON				
SERINCO-SED-LX-2025-384	COMUNICACIÓN	30/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	STEFANIA CEBALLOS				
SERINCO-SED-LX-2025-385	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoría No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA				
SERINCO-SED-LX-2025-386	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	INTERVENTORIA	Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los Lotes No 04, 05 y 06 vigencia 2025.	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	MARILYN OSPINA				
SERINCO-SED-LX-2025-387	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NICOLAS HERNANDEZ				
SERINCO-SED-LX-2025-388	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 5	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	NATALIA CAÑON				
SERINCO-SED-LX-2025-389	COMUNICACIÓN	31/3/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 6	REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	ALEJANDRA OTALORA				
SERINCO-SED-L4-2025-390	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO ARSAF	LOTE 4	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L5-2025-391	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L6-2025-392	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO PAIS	LOTE 6	Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L5-2025-393	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	CONSORCIO FORTALEZA	LOTE 5	Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
SERINCO-SED-L4-2025-394	COMUNICACIÓN	1/4/2026	C SERINCO	SECRETARIA DE EDUCACION	LOTE 4	***Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4***	CORREO ELECTRONICO	CORRESPONDENCIA / ENVIADOS	H VILLAZON G				
