ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO
NIT 14.467.115-4
CL 20 29 93 BRR LAS CUADRAS
Tel: (602) 3147966463
Pasto - Colombia
facturacion.andresrias2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAR 138

Señores	MUNICIPIO DE MORALES		
NIT	891.500.982-6	**Teléfono**	(602) 3226703549 - Ext. 000
Dirección	PAR PRINCIPAL EDIFICIO CAM	**Ciudad**	Morales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2026, 09:17
Expedición	28/03/2026, 09:17
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA PARCIAL No.2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. F14-253-2025 CUYO OBJETO EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA	1.00	136,185,985.00
2	ADMINISTRACION 22% ACTA PARCIAL No. 2	1.00	29,960,916.69
3	IMPREVISTOS 3% ACTA PARACIAL No. 2	1.00	4,085,579.52
4	UTILIDAD 5% ACTA PARCIAL No. 2	1.00	6,809,299.79

Total items: 4

Total Bruto	177,041,781.00
Total a Pagar	177,041,781.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y siete millones cuarenta y un mil setecientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 177,041,781.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103314140 aprobado en 20251217 prefijo FEAR desde el número 121 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 0.6%
CUFE: a4cce1615f05e0467a4fe9fa058a655844dc7243bfc0bfeab1315af13265fb967397759fe2d0992b1a7ab03473cea674

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MORALES- CAUCA

CONTRATO DE OBRA
No. F14-253-2025

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"

INFORME PARCIAL DE OBRA No.2

CONTRATISTA:

ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO.

Periodo
(8 de octubre del 2025 – 27 de marzo del 2026)

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

1.TABLA DE CONTENIDO....1
2. INFORMACION BASICA:....5
2.1 CONTRATO DE OBRA:....5
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES....6
4. AVANCE DE OBRA EN EL PERIODO 8 DE OCTUBRE DE 2025 AL 27 DE MARZO DEL 2026:....7
4.1 Situaciones Especiales del Periodo:....7
4.1.1. ALCALDIA DE MORALES....7
4.1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS....8
4.1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO....8
4.1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC....9
4.1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO 9
4.1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO VIDRIOS....10
4.1.1.6 PINTURA MARCOS METALICOS....11
4.1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR (REFLECTORES)....11
4.1.1.8 TRANSPORTE....12
4.1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOS....12
4.1.1.10 DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE....13
4.1.1.11 INSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE....14
4.1.1.12 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE H<=8M....15
4.1.1.13 CUBIERTA METALICA CALIBRE 24....15
4.1.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO....16
4.1.1.15 FLANCHER PARA CUBIERTA....17
4.1.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA....18
4.1.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL....18
4.1.1.18 SUMINISTRO Y REPOSICION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE....19

4.1.1.19 ACOMETIDA TABLERO THHN/THWN #8(2F+1N)+1T#10 AWG - TUBO CONDUIT PVC 1" 20

4.1.1.20 SALIDA Y APLIQUE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2" 21

4.1.1.21 SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR SENCILLO BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2" 21

4.1.1.22 SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR DOBLE BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2" 22

4.1.1.23 PAST-PANNEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6 22

4.1.1.24 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS 23

4.1.1.25 SALIDA PARA LUMINARIA 24

4.1.1.26 PUESTO TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,8M EN 5/8" Y SOLDADURA 25

4.1.1.27 SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS SENCILLO X 25m 25

4.1.1.28 SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS DOBLE X 25m 26

4.1.1.29 SWITCH DE 24 PUERTOS 27

4.1.1.30 PAST.CORD DE 1M 28

4.1.1.31 CANALETA PARA DATOS DE 4 VIAS 28

4.1.1.32 ESTRUCTURA METALICA (CULUMNAS CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CIMENTACIÓN 29

4.1.2. CASA DE LA CULTURA DE MORALES 31

4.1.2.1 RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL 31

4.1.2.2 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL 32

4.1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO CALIBRE 22 33

4.1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CALIBRE 24 33

4.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO 34

4.1.2.6 FLANCHER PARA CUBIERTA 35

4.1.2.7 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3 36

4.1.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60cmx60cm 37
4.1.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 37
4.1.2.10 SALIDA PARA LUMINARIA 38
4.1.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA 39
4.1.2.12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA 39
4.2. Avance de actividades de Obra en el Periodo: 43
4.3. Gestión del Periodo 44
4.3.1. Diagrama de barras Inversión Programado Vs Inversión Ejecutado 44
4.3.2. Informe de gestión de actividades ejecutadas durante este periodo: 44
5. CONTROL DE CALIDAD 46
6. CONCLUSIONES: 47

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

2. INFORMACION BASICA:

2.1 CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA	No. F14-253-2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES.
NIT	891500982-6.
CONTRATISTA INICIAL	**OM INGENIERIA S.A.S** **Nit. 900.499.550-6** Representante legal OSCAR OSWALDO MELO RODRIGUEZ C.C 98.385.361 de Pasto Nariño
CESIÓN DE CONTRATO	31 DE OCTUBRE DEL 2025.
CONTRATISTA FIANAL	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 14.467.115 DE CALI (V).
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO COMUNITARIO – GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ.
OBJETO DEL CONTRATO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA".
LUGAR DE EJECUCIÓN	MORALES, CAUCA.
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($308.749.758) IVA INCLUIDO.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIACION	OCHO (8) DE OCTUBRE DEL 2025.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO.	31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE SUSPENSION No.1	31 DE DICIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE REINICIO No.1	21 DE MARZO DEL 2026.
FECHA OTRO SI No.3	21 DE MARZO DEL 2026.Prorroga en tiempo por 45 días.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI No.3	4 DE MAYO DEL 2026.

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

APROBACION DE GARANTIAS CONTRATO DE OBRA:

Póliza de Cumplimiento No. 775 – 47 - 994000003278 Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	CUMPLE DE ACUERDO A LO COMTEMPLADO EN EL CONTRATO	
			SI	NO
CUMPLIMIENTO	$86,574,625.00	Desde 31-10-2025 hasta 05-11-2026	X	
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	$21,643,656.25	Desde 31-10-2025 hasta 05-05-2029	X	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$86,574,625.00	5 años, 0 meses, 0 días	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	$86,574,625.00	Desde 31-10-2025 hasta 05-11-2026	X	

Póliza de Responsabilidad Civil No. 775-74-994000000662 Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPARO	VALOR ASEGURADO	CUMPLE DE ACUERDO A LO COMTEMPLADO EN EL CONTRATO	
		SI	NO
Predios, labores y operaciones	$284,700,000.00	X	

4. AVANCE DE OBRA EN EL PERIODO 8 DE OCTUBRE DE 2025 AL 27 DE MARZO DEL 2026:

4.1 Situaciones Especiales del Periodo:

El contratista de obra procedió en la ejecución del proyecto mediante un recorrido con supervisión de obra, con el fin de mirar cuales son las actividades principales más requeridas o priorizadas para su ejecución. Es por ello que, una vez realizado el recorrido, el contratista de obra pone en marcha su equipo de trabajo para dar inicio a la ejecución del proyecto. Sin embargo, durante la ejecución del contrato se realizan unas actividades de obra adicionales a las contempladas inicialmente y muy requeridas para las adecuaciones y mejoramientos del CAM y la casa de la cultura. Adicionalmente se realizó la suspensión temporal de obra No.1 a fecha 31 de diciembre del 2025 y un reinicio No.1 de fecha 21 de marzo del 2026. Con el reinicio de obra se continua con la ejecución del proyecto con un adicional en tiempo de 45 días adicionales para la ejecución total del proyecto, en estos documentos se encuentra las justificaciones de cada proceso y su requerimientos indispensables para dar soluciones a percances presentados durante la ejecución del proyecto lo anterior se describe a continuación las siguientes actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe y las cuales se van acumulando conforme avanza la ejecución del proyecto.

4.1.1. ALCALDIA DE MORALES

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS

Se realiza la medición detallada de los vidrios a suministrar e instalar, para posteriormente realizar la compra de los vidrios con silicona y una pistola. Para su instalación se realizan soportes de apoyo en vidrios, se esparce la silicona en los filos de cada uno de los vidrios. Se colocan y soportan en el lugar donde se deben instalar.





4.1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO

Se realiza la medición detallada de las ventanas a suministrar e instalar, para posteriormente realizar las ventanas en taller y finalmente retirar las ventanas en malas condiciones del CAM para ser remplazadas por unas nuevas en excelentes condiciones.







DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC

El cielo raso en pvc es comprado en el Municipio de Popayán(C), este material es transportado hasta la Alcaldía Municipal en donde es descargado y acopiado. Este cielo raso una vez realizada la adecuación e instalación de la parte eléctrica y datos se inicia con una restructuración y adecuación de la estructura de soporte para el cielo falso, posteriormente se continúa colocando todas las cornisas en el perímetro de la estructura y de esta manera con ayuda de andamios iniciar con la instalación de cada lamina de cielo raso, hasta cubrir el área contratada de este ítem.





4.1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO

Esta actividad se realizó una vez terminada la adecuación de todas las instalaciones de la red eléctrica, red de datos y finalmente la instalación del cielo raso del CAM. Se ubica según los planos eléctricos los puntos donde se instalarán las luminarias y se procede a realizar el corte del cielo raso, para posteriormente continuar asegurando la base del marco de las lámparas en la estructura que se dejo en el cielo raso y una vez asegurada la base de la lampara, se conectan las luminarias a la instalación eléctrica sobre su base asegurada y fijada.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA



4.1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO VIDRIOS

Se realiza la medición detallada de los vidrios a suministrar e instalar, para posteriormente realizar la compra de los vidrios con silicona y una pistola. Para su instalación se realizan soportes de apoyo en vidrios, se esparce la silicona en los filos de cada uno de los vidrios. Se colocan y soportan en el lugar donde se deben instalar.



DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.6 PINTURA MARCOS METALICOS

Se debe realizar un alistado todos los marcos metálicos mediante un lijado o pulimiento de los marcos, posteriormente se hace una limpieza y cubrimiento del marco con cinta para finalmente pintar los marcos con anticorrosivo y esmalte de color negro especificado por el supervisor.





4.1.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR (REFLECTORES)

Se ubica según los planos eléctricos los puntos donde se instalarán los reflectores del CAM y se procede asegurar la base donde se soportarán los reflectores y finalmente se procede a conectar a la red eléctrica instalada con anticipación los puntos de iluminación exterior requeridos según el diseño y supervisión del proyecto.





DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.8 TRANSPORTE

Durante la ejecución del proyecto se cambió la cubierta en la casa de la cultura y se realizó el desmonte de toda la teja en asbesto cemento de la cual una cantidad de material estaba en bunas condiciones y la entidad contratante dispuso de estas tejas para entregar a personas que la necesitaban. Sin embargo, la mayor parte de teja debido a las malas condiciones en las que se encontraban no servían para utilizar. Es por ello que estas tejas se desalojaron hasta sitios de acopio que querían el material para arreglar sus caminos.

Adicionalmente el cielo raso retirado en el CAM debido a sus malas condiciones, también surge la necesidad de llevar todo ese material hasta un sitio de acopio. Es por estas razones que se requirió emplear el alquiler de un transporte para ejecutar viajes de desalojo y de esa manera limpiar el lugar donde se realizo las adecuaciones y mejoramientos.





4.1.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOS

Se realiza la desinstalación de los cerrojos dañados, se adecua el lugar donde se colocarán los nuevos cerrojos y posteriormente se instalan y aseguran los nuevo cerrojos de color negro especificado por el supervisor.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA



4.1.1.10 DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE

Esta actividad se inicia realizando la instalación de andamios y una escalera donde los trabajadores con sus elementos de seguridad proceden al desmonte de cada unidad que compone al cielo falso existente, *retirando de* manera cuidadosa todos los elementos. Puesto que una gran parte se debe volver a instalar y el resto de cielo falso en malas condiciones debe ser suministrado he instalado.

Este cielo falso se retira y se acopia hasta que se realicen las adecuaciones pertinentes en la parte eléctrica y de datos, una vez terminada esa adecuación este cielo falso será una parte instalada nuevamente y la otra retirada hasta una disposición final.



DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es


ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA




4.1.1.11 INSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE

Una vez realizada la adecuación e instalación de la parte eléctrica y datos se inicia con una restructuración y adecuación de la estructura de soporte para el cielo falso, posteriormente se continúa colocando todas las cornisas en el perímetro de la estructura y de esta manera con ayuda de andamios iniciar con la instalación de cada lamina de cielo raso hasta cubrir el área contratada de este ítem y el resto comprarlo e instalarlo según las cantidades contratadas.

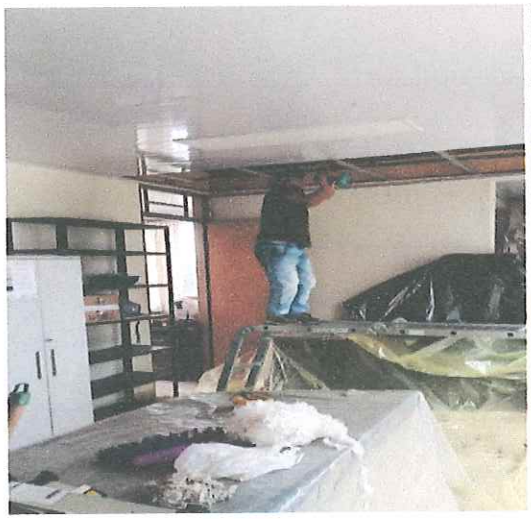


DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.12 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE H<=8M

En esta actividad se inició con una señalización del área de trabajo y posteriormente el personal de trabajo con sus elementos de protección personal y trabajo para alturas dan inicio al desmonte por tramos de cubierta, con el fin de ir simultáneamente reponiendo con la nueva cubierta a instalar. evitando de esta manera que una lluvia no prevista pueda ingresar al interior de la alcaldía y afectar materiales o equipos. Este desmonte se realiza mediante el desatornille de los tornillos de fijación con los que cuenta la cubierta actual, para posteriormente retirar las tejas y descender hasta el lugar de acopio mediante sogas.






4.1.1.13 CUBIERTA METALICA CALIBRE 24

En esta actividad se cuenta con la teja metálica de color blanco en calibre 24 y la cual es cortada según las dimensiones requeridas en el piso, para posteriormente ser subidas cada hoja mediante sogas. Una vez subidas las hojas, estas se colocan garantizando su adecuado traslapo y asegurándolas

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

mediante pernos diseñados para su ensamble a la estructura de la cubierta. Este proceso se repite con cada teja, hasta lograr el cambio total de la cubierta.






4.1.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO

Una vez terminada de colocar toda la cubierta se continua con la colocación de los caballetes metálicos de color blanco y en calibre 24, estos caballetes son colocados en la parte superior donde se juntan las pendientes que componen las vertientes de la cubierta, estos son asegurados mediante remaches y sellador de Sikaflex.





ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA




4.1.1.15 FLANCHER PARA CUBIERTA

Finalmente, luego de tener la teja y los caballetes de cubierta instalado se realiza una limpieza en la parte donde los filos de la cubierta se juntan al muro que tiene una mayor proyección que la cubierta instalada. En este caso debido a que el muro cuenta con una especie de tejado para proteger de la lluvia. Este flancher se realizó con una cinta asfáltica, garantizando que no ocurran filtraciones de agua en el muro.

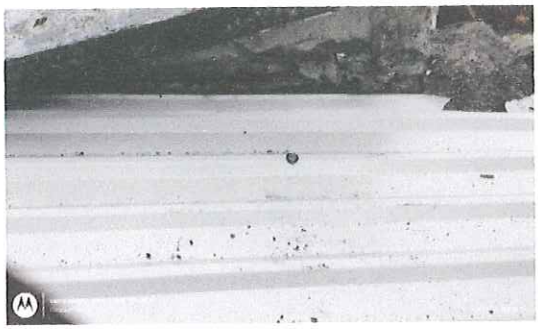




DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA

Esta actividad se realizó una vez terminada la adecuación de todas las instalaciones de la red eléctrica, red de datos y finalmente la instalación del cielo raso del CAM. Se ubica según los planos eléctricos los puntos donde se instalarán las luminarias redondas y se procede a realizar el corte del cielo raso, para posteriormente continuar conectando las luminarias a la instalación eléctrica sobre su base asegurada y fijada.



4.1.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL

Durante el desmonte de la cubierta y antes de iniciar con estas actividades se observo que existen canales dañados y otros que no están en el perímetro de la cubierta, es por ello que se realiza simultáneamente al desmontar la cubierta un retiro de esos canales en malas condiciones, posteriormente se asegura los elementos de soporte del canal y finalmente colocar el canal metálico blanco en calibre 22. Este se asegura a los soportes y se realiza su respectivo sellado con Sikaflex en las uniones, de esta manera se deja instalado y suministrado los canales requeridos para una correcta recolección de aguas lluvias evacuadas hasta sus bajantes.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4


INGENIERIA






4.1.1.19 ACOMETIDA TABLERO THHN/THWN #8(2F+1N)+1T#10 AWG - TUBO CONDUIT PVC 1"

Para esta actividad se realizó la instalación de la tubería Conduit en 1" que conectaba desde el tablero de distribución de primer piso, hasta el tablero distribución del segundo piso. El cual estaría posteriormente conectado al RACK que se ubica en el segundo piso del CAM, ya instalada la tubería, se realiza la respectiva conducción e instalación de los cables THHN/THWN #8 para la fase y neutro, así como el cable #10 para polo a tierra. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado donde se instaló la acometida, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

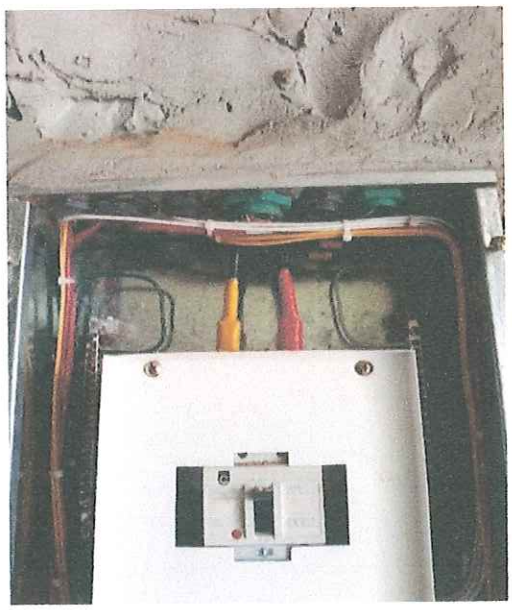

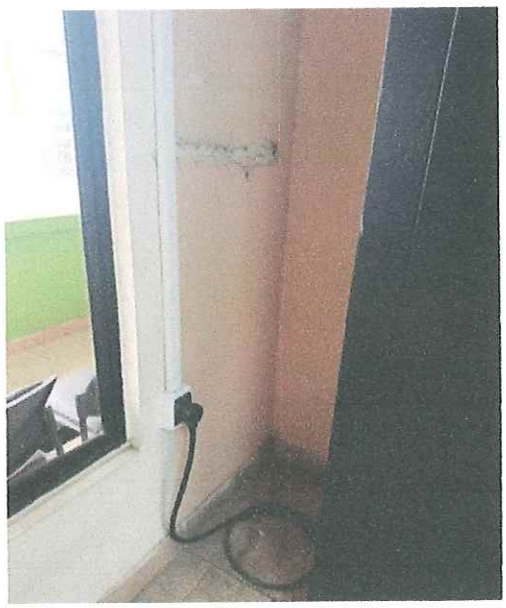

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.20 SALIDA Y APLIQUE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"

En esta actividad se realiza la conexión de la red para tomacorrientes nueva y consiste en la salida desde el tomacorriente con sus cables de fase, neutro y polo a tierra. Adicionalmente de su caja y tapa de tomacorrientes doble. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizo las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.





4.1.1.21 SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR SENCILLO BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"

En esta actividad se realiza la conexión de la red para cada interruptor sencillo nueva y consiste en la salida desde el interruptor con sus cables de fase, neutro, retorno y polo a tierra. Adicionalmente de su caja y tapa del interruptor sencillo. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.




DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.22 SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR DOBLE BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"

En esta actividad se realiza la conexión de la red para cada interruptor doble nueva y consiste en la salida desde el interruptor con sus cables de fase, neutro, retorno y polo a tierra. Adicionalmente de su caja y tapa del interruptor doble. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.







4.1.1.23 PAST-PANNEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6

Se realizo la respectiva instalación de este patch-panel de 24 puertos categoria 6 debido a que al realizar la nueva instalación de la red de datos del segundo piso del CAM se requiere de este dispositivo para la organización del cableado estructurado, que permita interconectar y gestionar profesionalmente hasta 24 puntos de red (PCs, impresoras, etc.) a equipos activos como switches, facilitando la administración, el etiquetado y la resolución de problemas en redes Gigabit Ethernet, manteniendo el orden en RACK. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas en la conexión de este past-panel, estas pruebas se

realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

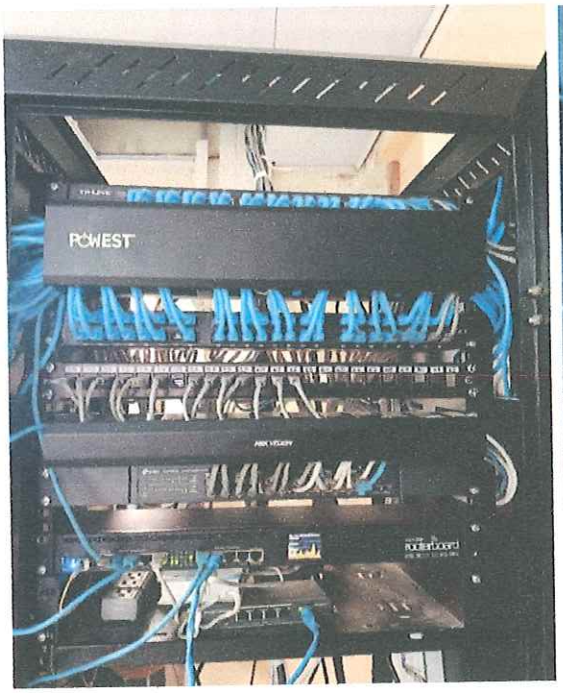


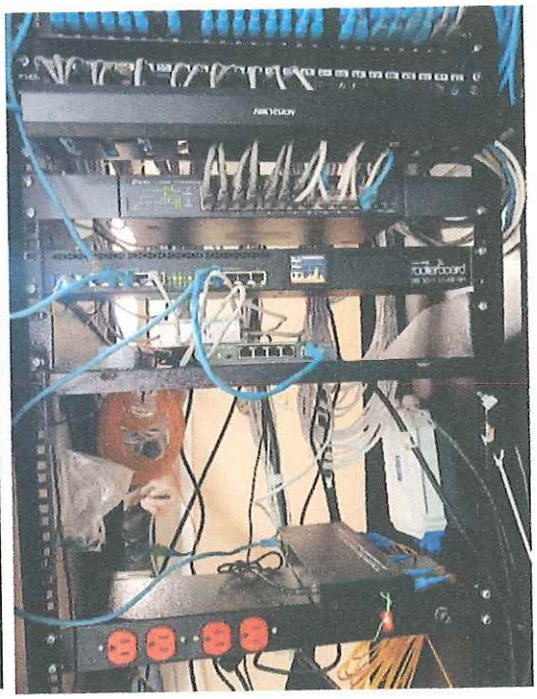

4.1.1.24 TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS

Para esta actividad se realiza la respectiva ubicación donde se instalarían los 2 totalizadores y posteriormente realizar su regateo en muros para instalar. asi como su conexión de polo a tierra. Terminado lo anterior se realizo todas las conexiones salientes u necesarias de cada circuito en tubería Conduit . Estos tableros reciben la energía trifásica principal para poder luego **dividirla de forma segura y organizada en 18 circuitos independientes**, cada uno con su propio interruptor (breaker) para controlar diferentes cargas como aires acondicionados, bombas, iluminación y maquinaria, permitiendo gestión, protección y balanceo de fases para una operación eficiente. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas en la conexión de este cada tablero y para ello se destapa los tableros y se prueba las cargas que tiene cada uno de los cables instalados en los tableros. Estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

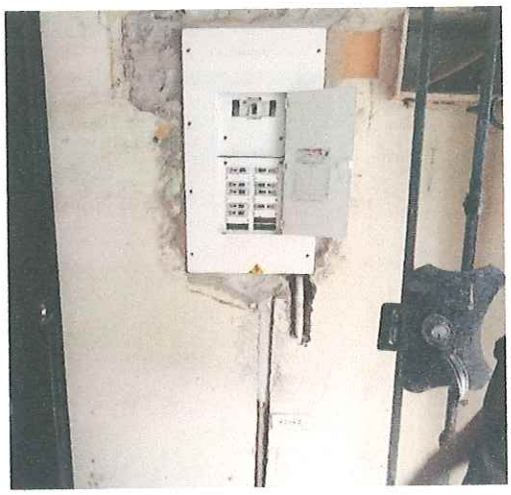



4.1.1.25 SALIDA PARA LUMINARIA

En esta actividad se realiza cada punto de la red para todas las salidas de iluminación donde se conectarán cada una de las iluminaciones con las que contara el CAM, para ello se emplean la caja a la cual llega su respectiva tubería en Conduit, donde se ingresa todo el cableado nuevo que conectara a cada una de las lámparas a instalar. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.




Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es


ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.1.26 PUESTO TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,8M EN 5/8" Y SOLDADURA

Para esta actividad se realiza unas regatas y destape hasta el suelo donde se realiza la incrustación de una varilla de cobre de 1,8m de larga en 5/8" la cual con soldadura es sujetada al cable que se conduce al interior de una tubería Conduit que se conecta hasta el tablero de distribución del primer piso del CAM. Con esta conexión realizada se proteja la a las personas y de los equipos que pueden sufrir grandes daños al momento de una descarga eléctrica. Este punto de descarga del polo a tierra es sellado por instrucción del supervisor, debido a que pueden hurtar la varilla de cobre. Cabe aclarar que finalizado esta actividad de instalación del polo a tierra se mide su voltaje y se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado que está sujeto a este puesto a tierra, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

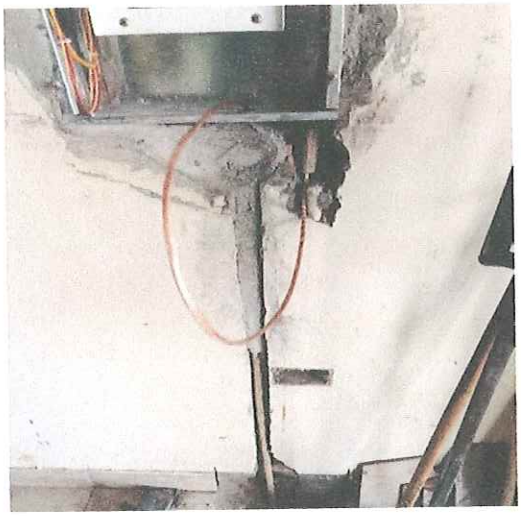

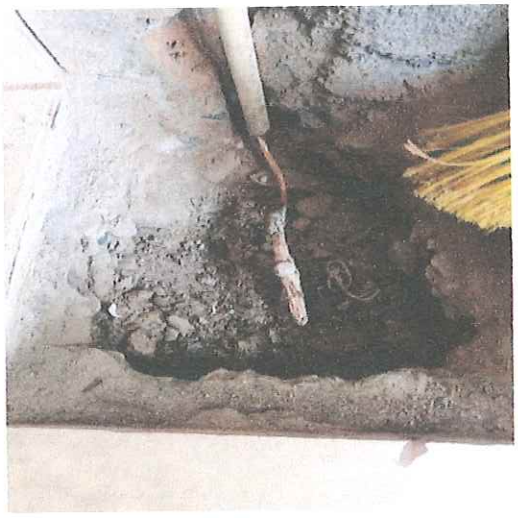

4.1.1.27 SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS SENCILLO X 25m

En esta actividad se realiza la conexión de la red de datos para cada conexión de datos sencillo y consiste en la salida desde los datos sencillos con su cable instalado hasta el RACK en una canaleta. Adicionalmente de su

caja y tapa de conexión para datos sencillo. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM, el cual se conecta en cada punto con su computador y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

En esta conexión se marca cada punto con papel adhesivo el cual permite identificar a que punto corresponde según la conexión que se tenga en el RACK, donde también se marca cada punto con su número y según le corresponda su conexión de datos.





4.1.1.28 SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS DOBLE X 25m

En esta actividad se realiza la conexión de la red de datos para cada conexión de datos doble y consiste en la salida desde los datos dobles con su cable instalado hasta el RACK (como es doble, son dos cables) en una canaleta. Adicionalmente de su caja y tapa para doble conexión de datos. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM, el cual se conecta en cada punto con su computador y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

En esta conexión se marca cada punto con papel adhesivo el cual permite identificar a que punto corresponde según la conexión que se tenga en el

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

RACK, donde también se marca cada punto con su número y según le corresponda su conexión de datos.





4.1.1.29 SWITCH DE 24 PUERTOS

Se realizo la respectiva instalación de este switch de 24 puertos debido a que al realizar la nueva instalación de la red de datos del segundo piso del CAM. Se requiere de este dispositivo para poder expandir y gestionar la red con la que se cuenta y de esta manera conectar múltiples dispositivos como computadoras, impresoras, cámaras y servidores, permitiendo que se comuniquen eficientemente dentro de la misma red, ideal para oficinas y que necesitan más puntos de conexión que un router básico, manteniendo el orden en RACK. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas en la conexión de este switch de 24 puertos, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4



4.1.1.30 PAST.CORD DE 1M

Estos past cord son empleados para poder transmitir de manera eficiente los datos y optimizando la organización del RACK. Proporcionando de esta manera una conexión estable y de alta velocidad paralas conexiones de datos instalados. Cabe aclarar que para esta actividad se realizó la contabilización de los past cort instalados en el RACK, esto se realiza en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.




4.1.1.31 CANALETA PARA DATOS DE 4 VIAS

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

Esta canaleta es requerida debido a que la conexión de la red de datos debe contar junto a ella con un tomacorriente para los equipos a conectar. Entonces por la parte aérea se realiza toda las de eléctrica y de datos en tubería Conduit. Sin embargo, para llegar a los puntos de datos y tomacorrientes los cables que vengan en la tubería Conduit pasan a ubicarse en cada una de las vías de la canaleta, con lo cual al momento de hacer la conexión de datos sencillo o doble. Se realiza también su conexión de tomacorrientes doble en la misma vía de conducción que ofrece la canaleta y de esta manera contar con una instalación estética mejorada y además funcional en cada instalación del segundo piso en el CAM. Esta canaleta fue asegurada mediante chazos incrustados al muro y que llevan su tornillo, con lo cual queda segura y fija para una conducción de cables, puntos de datos y tomacorriente confiables y seguros.



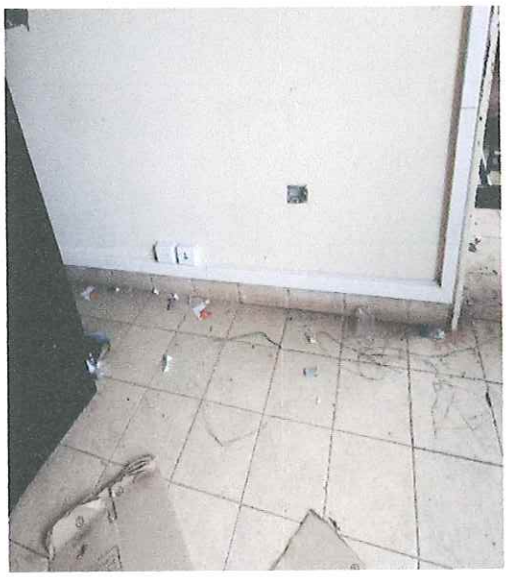


4.1.1.32 ESTRUCTURA METALICA (CULUMNAS CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CIMENTACIÓN

Una vez confirmada la ubicación del tanque de almacenamiento de agua, se inicia realizando la localización y replanteo para el tanque de almacenamiento, continuando con la excavación de la cimentación hasta profundidad y dimensiones determinadas por el diseño. En seguida de la excavación se realiza un solado de limpieza y nivelación para las zapatas,

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

con el acero figurado y armado en taller se procede a la colocación de las zapatas en las cuales estarían los pedestales del tanque y su viga de cimentación, ya realizado lo anterior según especificaciones de diseño y especificaciones técnicas se continua asegurando, aplomando y nivelando formaletas para poder ejecutar la fundición de toda la cimentación con un concreto a 3000psi y con los soportes requeridos para montar luego la estructura del tanque metálico a esta cimentación, mientras se fragua el concreto se elaboró en taller toda la estructura metálica del tanque para ser instalada posteriormente acorde a las especificaciones de diseño y según los criterios del supervisor de obra.

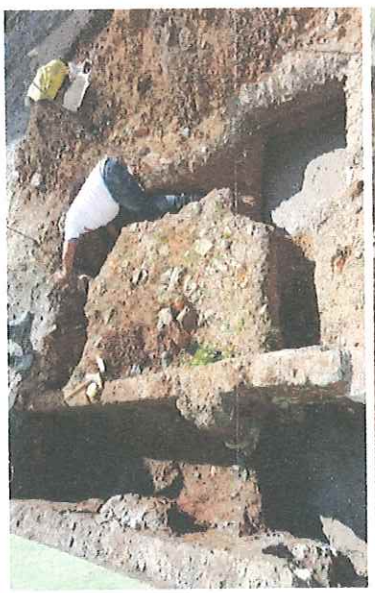






ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

4.1.2. CASA DE LA CULTURA DE MORALES

4.1.2.1 RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL

Esta actividad se inicia realizando la instalación de andamios donde los trabajadores con sus elementos de seguridad proceden al desmonte de cada unidad que compone al cielo falso existente, retirando de manera cuidadosa todos los elementos. Este cielo falso se retira y se acopia hasta una disposición final.





DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA





4.1.2.2 RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL

En esta actividad se inició con una señalización del área de trabajo y posteriormente el personal de trabajo con sus elementos de protección personal y trabajo para alturas dan inicio al desmonte por tramos de cubierta, con el fin de ir simultáneamente reponiendo con la nueva cubierta a instalar. evitando de esta manera que una lluvia no prevista pueda ingresar al interior de la alcaldía y afectar materiales o equipos. Este desmonte se realiza mediante el retiro de amarras con las que cuenta la cubierta actual, para posteriormente retirar las tejas y descender hasta el lugar de acopio mediante sogas.





DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA



4.1.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO CALIBRE 22

Debido al paso del tiempo los canales de agua lluvia con los que contaba la casa de la cultura estaban en malas condiciones y es por esta razón que una vez terminada la instalación completa de la cubierta se realizó el desmonte del canal y posteriormente se asegura los elementos de soporte del canal y finalmente colocar el canal metálico blanco en calibre 22. Este se asegura a los soportes y se realiza su respectivo sellado con Sikaflex en las uniones, de esta manera se deja instalado y suministrado los canales requeridos para una correcta recolección de aguas lluvias evacuadas hasta sus bajantes.



4.1.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CALIBRE 24

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4


INGENIERIA

En esta actividad se cuenta con la teja metálica de color blanco en calibre 24 y la cual es cortada según las dimensiones requeridas en el piso, para posteriormente ser subidas cada hoja mediante sogas. Una vez subidas las hojas, estas se colocan garantizando su adecuado traslapo y asegurándolas mediante pernos diseñados para su ensamble a la estructura de la cubierta. Este proceso se repite con cada teja, hasta lograr el cambio total de la cubierta.



4.1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO

Una vez terminada de colocar toda la cubierta se continua con la colocación de los caballetes metálicos de color blanco y en calibre 24, estos caballetes son colocados en la parte superior donde se juntan las pendientes que componen las vertientes de la cubierta, estos son asegurados mediante remaches y sellador de Sikaflex.

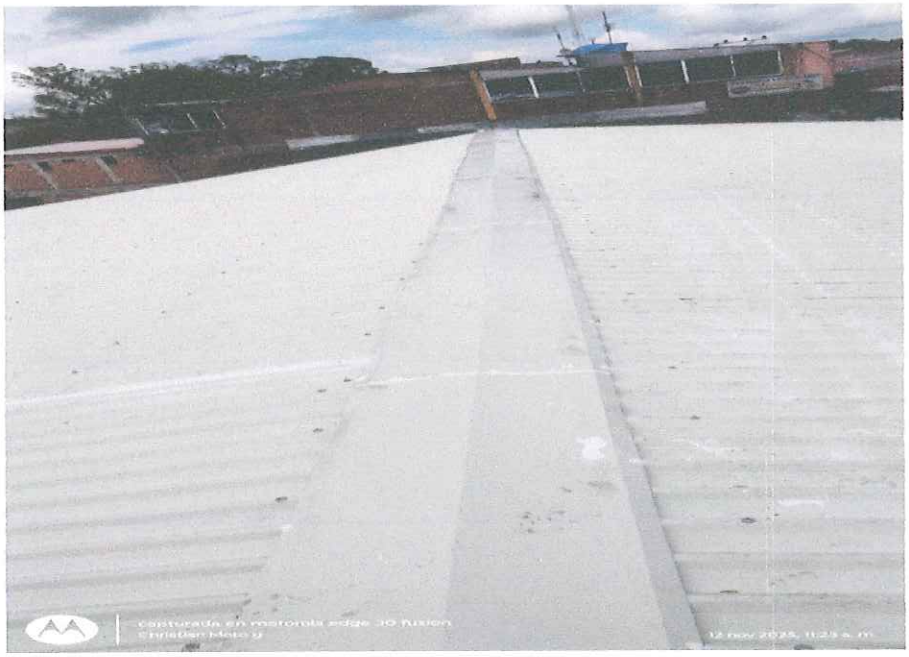

4.1.2.6 FLANCHER PARA CUBIERTA

Finalmente, luego de tener la teja y los caballetes de cubierta instalado se realiza una limpieza en la parte donde los filos de la cubierta se juntan al muro que tiene una mayor proyección que la cubierta instalada. Esto se hace con el fin de emplear una lámina cortada a 30cm de ancho y la cual es instalada en la junta entre la cubierta y el muro. Esta lamina es remachada y sellada mediante Sikaflex y con esto se evita el ingreso de agua lluvia que puede generar humedad en las paredes.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA



4.1.2.7 BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3

Por el paso del tiempo los bajantes que tenía la cubierta estaban en malas condiciones y es por esta razón que una vez instalado el nuevo canal, se procede a realizar el desmonte total de los bajantes existente. En seguida se instala la nueva tubería en PVC de 3" y sus accesorios del bajante, para poder evacuar toda el agua lluvia recolectada por la cubierta.

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA



4.1.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60cmx60cm

Esta actividad se realizó una vez terminado la colocación del nuevo cielo raso en todas las instalaciones de la casa de la cultura donde fue requerido el cambio. Para esto se ubica según los puntos donde se instalarán las luminarias y se procede a realizar el corte del cielo raso, para posteriormente continuar asegurando la base del marco de las lámparas en la estructura que se dejó en el cielo raso y una vez asegurada la base de la lampara, se conectan las luminarias a la instalación eléctrica sobre su base asegurada y fijada.



DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

El cielo raso en PVC es comprado en el Municipio de Popayán(C), este material es transportado hasta la Casa de la Cultura en donde es descargado y acopiado. Este cielo raso una vez realizado el desmonte del cielo raso existente, se inicia con una restructuración y adecuación de la estructura de soporte para el cielo falso, posteriormente se continúa colocando todas las cornisas en el perímetro de la estructura y de esta manera con ayuda de andamios iniciar con la instalación de cada lamina de cielo raso, hasta cubrir el área contratada de este ítem.









DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

En esta actividad se realiza cada punto de la red para cuatro salidas de iluminación que no se encontraban en la casa de la cultura, para ello se emplean la caja a la cual llega su respectiva tubería en Conduit, donde se ingresa todo el cableado nuevo que se conectara a cada una de las lámparas a instalar. Cabe aclarar que finalizado esta actividad se realizó las pruebas necesarias y requeridas de cada punto instalado, estas pruebas se realizaron en compañía del contratista, ingeniero de sistemas del CAM y la Supervisión de la obra. Donde todo resulto satisfactoriamente aprobado.



4.1.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA

Esta actividad se realizó una vez terminada la adecuación de todas las instalaciones de la red eléctrica y la instalación del cielo raso del CAM. Se ubica los puntos donde se instalarán las luminarias redondas y se procede a realizar el corte del cielo raso, para posteriormente continuar conectando las luminarias a la instalación eléctrica sobre su base asegurada y fijada.





4.1.2.12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO EN MADERA

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

Este piso debido a la humedad que genero las aguas lluvias se encuentra pandeado o embobado en el centro de su pista y esto no permite a las personas que practican actividades culturales como danzas, teatro, entre otras. Que lo puedan realizar en unas condiciones idóneas y seguras. Adicionalmente, también el piso ya requiere un mantenimiento en su superficie. Es por estas razones que teniendo en cuenta las necesidades requeridas para que el salón cultural, se encuentre en óptimas condiciones en términos generales se realizó las siguientes actividades de obra:

1 - DESMONTE DEL PISO EXISTENTE EN LA SUPERFICIE AFECTADA: Para esto se realizó el retiro del piso existente donde esta englobado por humedad, para ello se realizó la extracción de adhesivos, clavos, grapas y residuos adheridos y se realizó una limpieza general del área removida. También se retira la duela del perímetro de la tarima, con el fin de ayudar a evacuar toda la humedad que se encontraba debajo del piso en madera, para eliminar la humedad se dejo un tiempo adecuado y requerido para una buena aireación y retiro total de la humedad. Antes de continuar con los demás procesos para mantenimiento y reparación total del piso en madera.

2 - PREPARACIÓN DEL SOPORTE: Se realizo limpieza profunda del contrapiso y posteriormente al airado para retirar su humedad, se inició colocando de esta manera una membrana para la humedad del piso y se realiza una adecuación de soportes para la superficie de apoyo afectada con chazos, pernos y platinas que estar sujetos a los listones principales de apoyo de la duela.


3 - INSTALACIÓN DE DUELA: Se instala la duela en madera sólida donde es requerido el cambio, esta duela se instala en su mayoría de la misma retirada y que se encuentre en buenas condiciones. Pero otras son instaladas nuevas, para esta instalación se adhieren entre duelas y superficie de apoyo mediante un adhesivo especial

4 - ACABADOS (LIJADO Y BARNIZ): Se realizo un lijado de toda la superficie con lijas de grano No.36, No.60 y No.100. Este lijado se realiza en capaz diferentes donde se emplea una maquina especial para estos trabajos y que garantice la calidad de la superficie del piso. Cabe aclarar que por cada capa lijada esta contiene ya la aplicación del barniz hasta realizar el ultimo lijado más fino y finalmente realizar la última aplicación del Barniz poliuretano. Obteniendo de esta manera una superficie del piso en madera

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

de optimas y adecuadas condiciones para las diferentes actividades culturales que en este piso se practican.

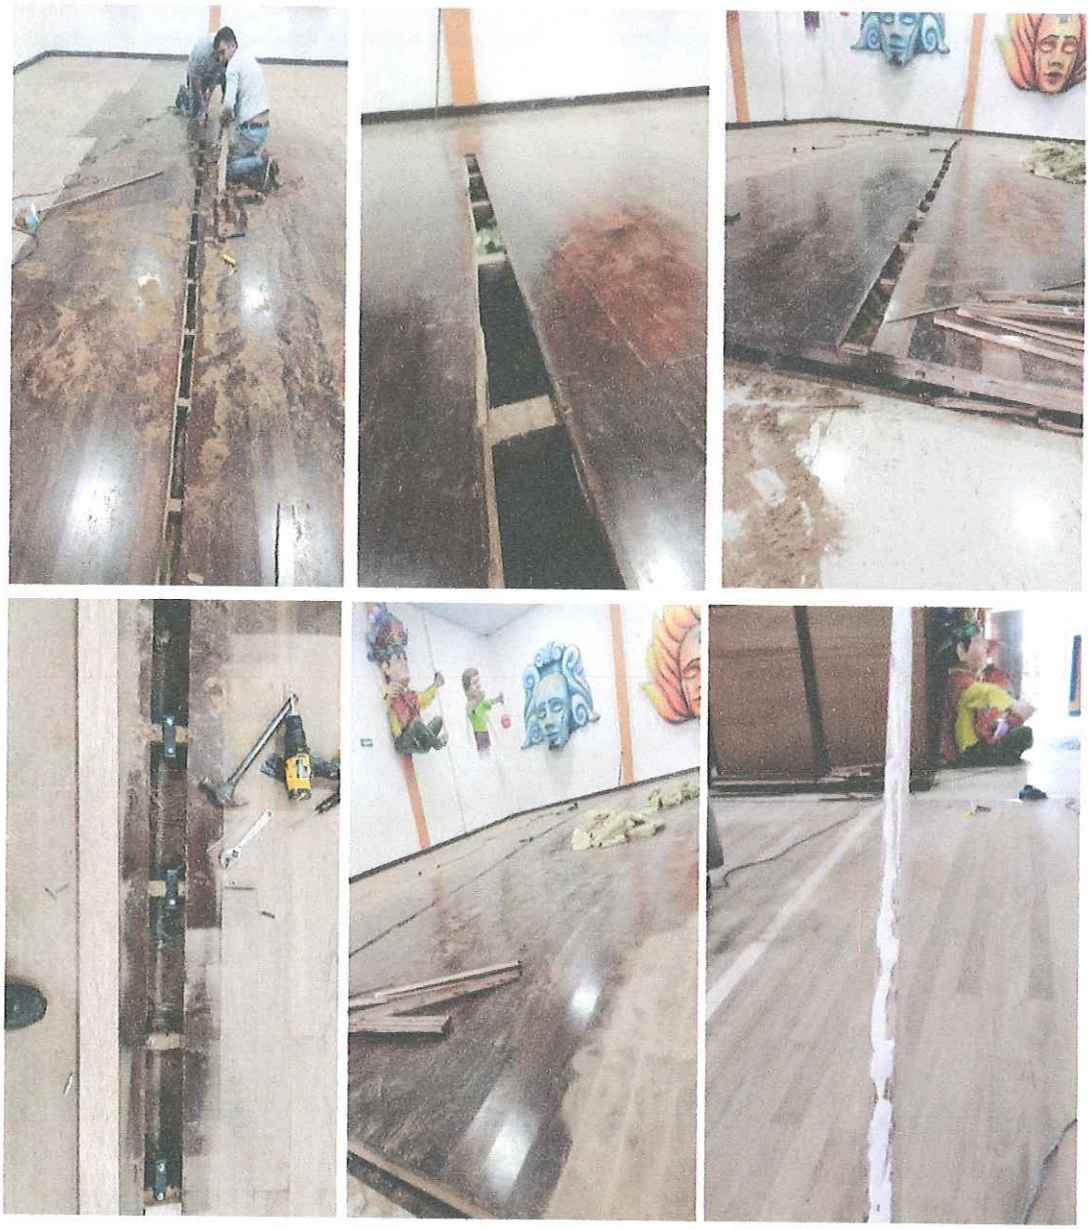


DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

AR INGENIERIA



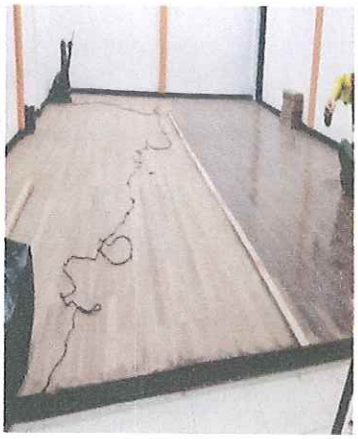







DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

En términos generales, el contratista de obra ha puesto a disposición su capacidad técnica y capacidad organizacional para mantener durante la ejecución del proyecto porcentajes de avance semanales superiores a los programados en la ejecución. Es por esta razón que a la fecha del presente informe las actividades contratadas se ejecutaron satisfactoriamente en un porcentaje aproximado del 77,30% y lo cual estaría en un porcentaje muy por arriba con respecto al cronograma actualizado según la prórroga de tiempo y lo cual estaría estipulado con una programación del 73,05% para este periodo de ejecución del proyecto.


4.2. Avance de actividades de Obra en el Periodo: a la fecha del presente informe, el avance acumulado ejecutado está en 77,30%.

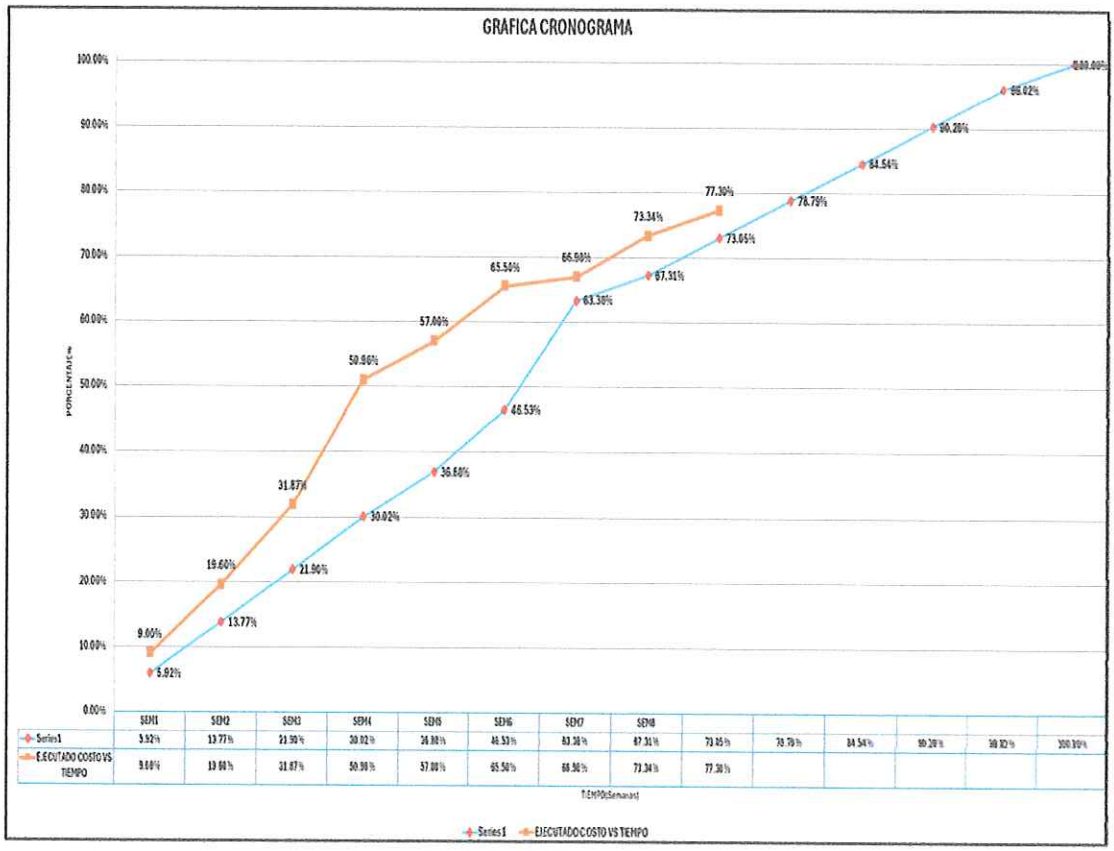

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

4.3. Gestión del Periodo

4.3.1. Diagrama de barras Inversión Programado Vs Inversión Ejecutado

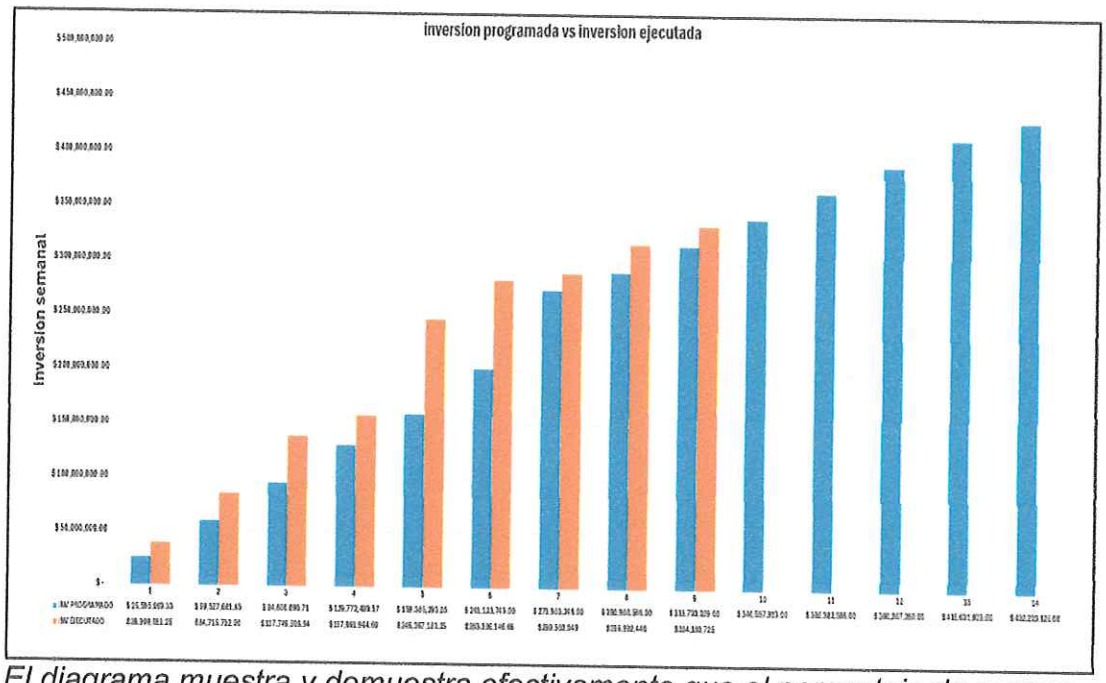

El diagrama muestra y demuestra efectivamente que el porcentaje de avance ejecutado es de $334.103.725 correspondiente al 77,30% del valor total del proyecto y para el acta parcial de obra No.2 corresponde un valor de $177.041.781.

4.3.2. Informe de gestión de actividades ejecutadas durante este periodo:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.
	MEJORAMIENTO CAM		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m^2	5.58
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO	Und	12.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m^2	75.30
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO	m^2	

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4

INGENIERIA

6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO	Und	25.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO VIDRIOS	m^2	10.50
15	PINTURA MARCOS METALICOS	Und	23.00
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ILUMINACION EXTERIOR (REFLECTORES)	Und	4.00
20	TRANSPORTE	Viaje	8.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOS	Und	15.00
	ITEM NO PREVISTOS CAM		
1	DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE	M2	250.90
2	INSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE	M2	175.60
3	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE H<=8M	M2	362.00
4	CUBIERTA METALICA CALIBRE 24	M2	362.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	ML	63.00
6	FLANCHER PARA CUBIERTA	ML	6.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA	UNIDAD	13.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL	ML	23.00
9	SUMINISTRO Y REPOSICION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE	M2	30.00
10	ACOMETIDA TABLERO THHN/THWN #8(2F+1N)+1T#10 AWG - TUBO CONDUIT PVC 1"	ML	24.00
11	SALIDA Y APLIQUE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD	43.00
13	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR SENCILLO BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD	6.00
14	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR DOBLE BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD	6.00
15	PAST-PANNEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6	UNIDAD	1.00
16	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS	UNIDAD	2.00
17	SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD	35.00
18	PUESTO TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,8M EN 5/8" Y SOLDADURA	GLOBAL	1.00
19	SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS SENCILLO X 25m	UNIDAD	20.00

DIRECCION: Calle 20 No. 29-93 Las Cuadras. Pasto - Nariño
Tel: 602 7230935 Cel: 316 626 0818 e-mail: andresriascosp@yahoo.es

20	SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS DOBLE X 25m	UNIDAD	21.00
21	SWITCH DE 24 PUERTOS	UNIDAD	1.00
22	PAST.CORD DE 1M	UNIDAD	24.00
23	CANALETA PARA DATOS DE 4 VIAS	ML	90.00
24	ESTRUCTURA METALICA (CULUMNAS CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CIMENTACIÓN	KG	721.10
	ITEM NO PREVISTOS CASA DE LA CULTURA		
25	RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL	M2	220.00
26	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL	M2	316.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO CALIBRE 22	ML	19.95
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CALIBRE 24	M2	316.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	ML	17.30
30	FLANCHER PARA CUBIERTA	ML	28.00
31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3	ML	18.00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60cmx60cm	UNIDAD	25.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	M2	220.00
34	SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD	4.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA	UNIDAD	8.00
36	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA	M2	85.90

5. CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo que correspondiente al presente informe, se contó con la presencia del personal profesional técnico del contratista. Donde ejecuta todas las actividades según las especificaciones técnicas y diseños del proyecto. Adicionalmente de contar con la supervisión de la entidad contratante, la cual realizo un seguimiento y control a todas las actividades ejecutadas en el presente periodo, garantizando que todo se ejecutó de manera correcta y en los avances contemplados, según el cronograma de obra.

ANDRES RIASCOS PINCHAO
INGENIERO CIVIL
ESP. PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
ESP. EN CONTRATACION ESTATAL
ESP. EN INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
Nit. 14.467.115-4


INGENIERIA

6. CONCLUSIONES:

En términos generarles la obra avanza a buen ritmo, el contratista de obra ha puesto a disposición su capacidad técnica y capacidad organizacional para mantener porcentajes de avance semanales superiores a los programados y cumplir a la fecha del presente informe con el porcentaje de avance aproximado del 70,30%. Así como en conjunto de la supervisión buscar soluciones a los percances presentados y buscar soluciones que conllevaron a ejecutar un porcentaje mayor al programado y se continuara trabajando con eficiencia hasta culminar con todas las actividades contempladas en el proyecto "EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA".


Elaboro.

ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO
Contratista de obra

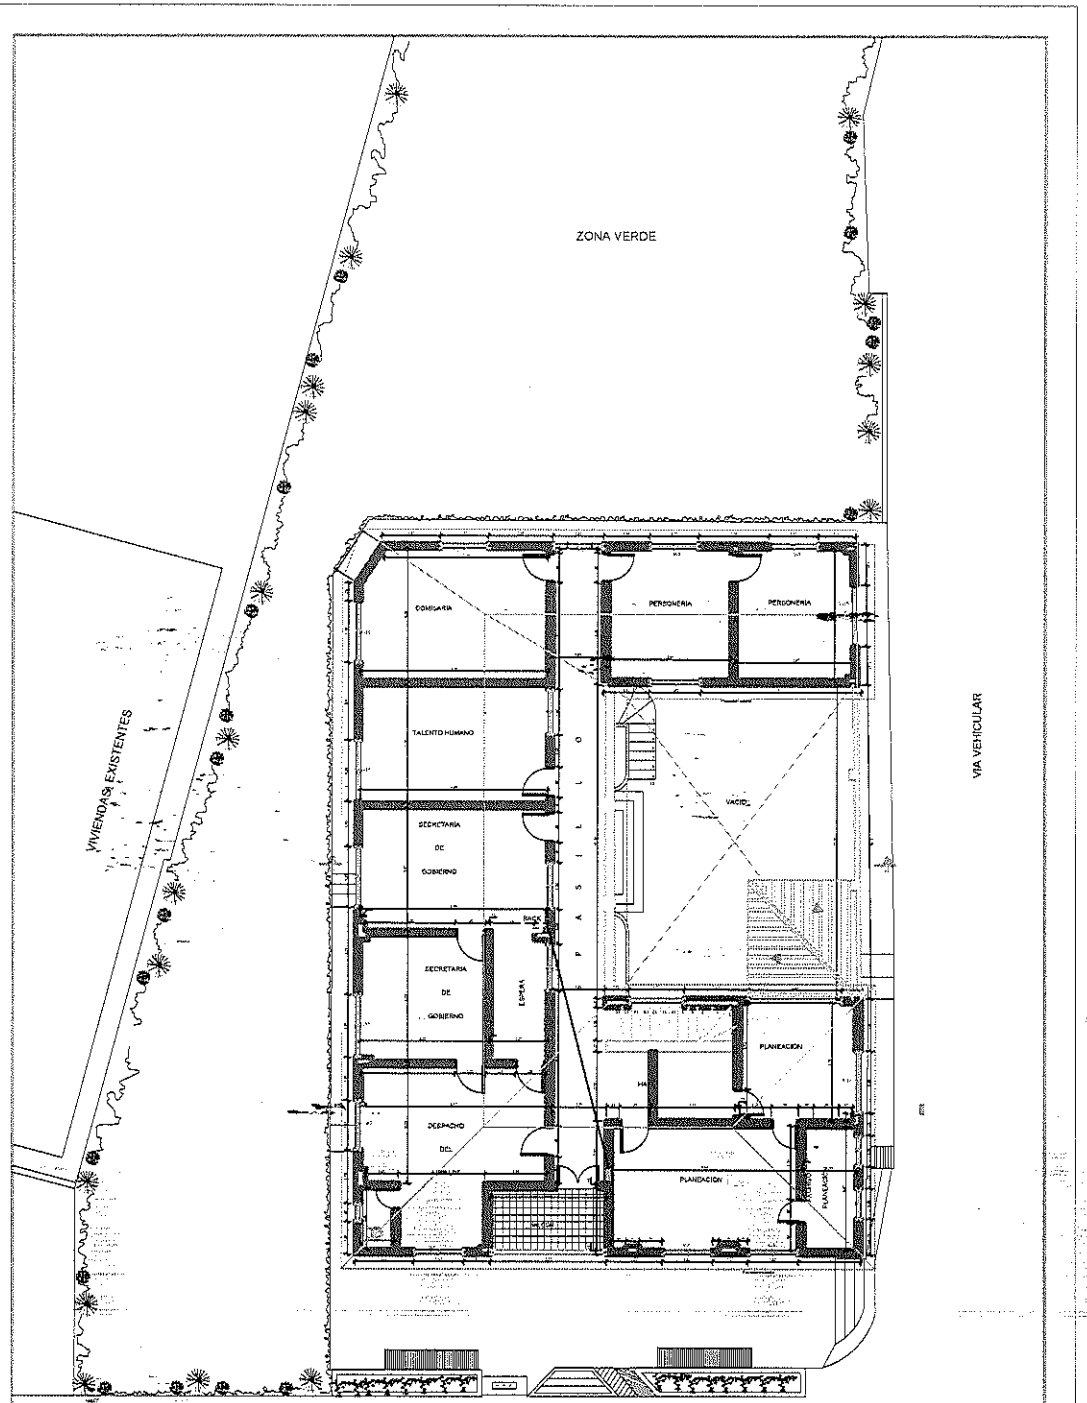

PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO

ESC 1:50

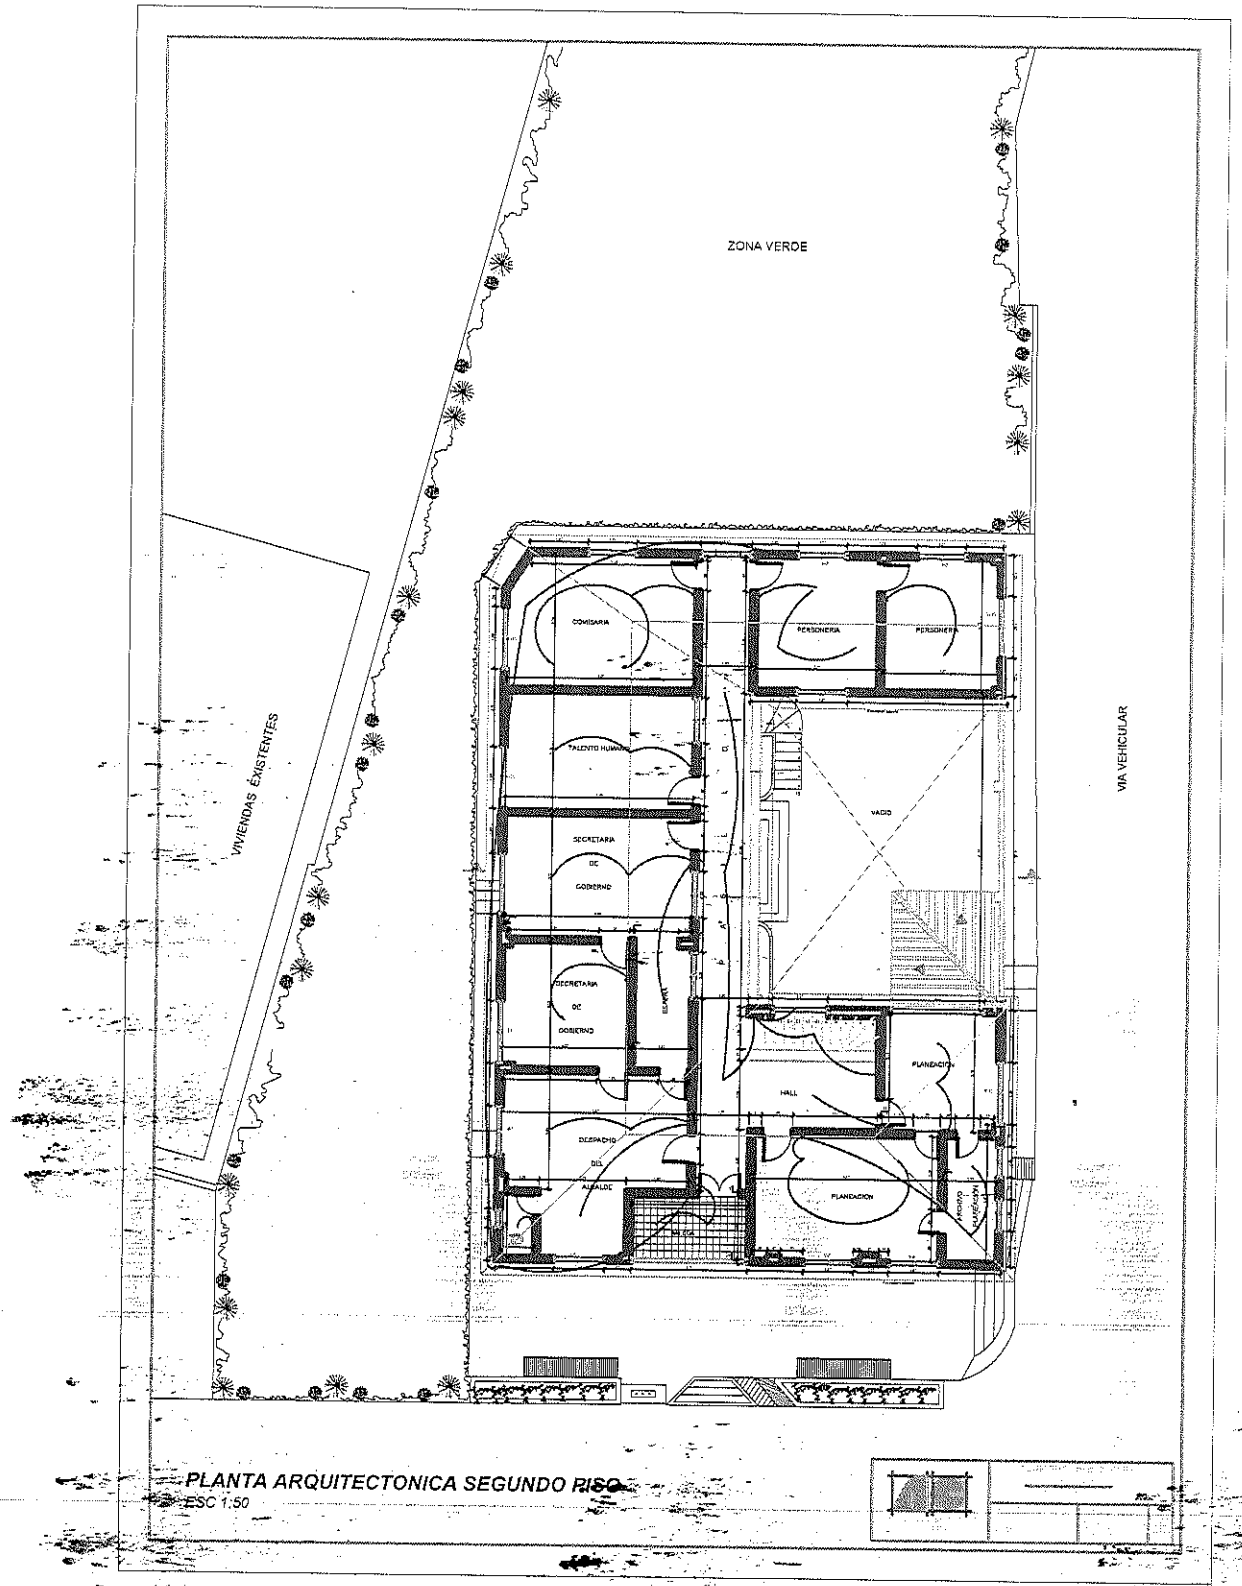

PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO

ESC 1:50

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	M2	
ITEM N°:	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS			**CANT**	36.65	

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
VIDRIOS DE PUERTAS EN PARTE SUPERIOR	0.94			0.35	0.25	0.3	18	5.08
VIDRIOS VENTANA DE ARCHIVO	0.5					0.505	2	0.51
								5.58
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (M2)								5.58

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO				**UND:**	Und
						CANT	12.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
TALENTO HUMANO							1	1.00
ARCHIVO							2	2.00
DESPACHO ALCALDE							2	2.00
PLANEACIÓN							1	1.00
CONSEJO							3	3.00
GOBIERNO							1	1.00
CAFETERIA							1	1.00
ESCALERA							1	1.00
ACTA PARCIAL No.2								12.00
TOTAL (Und)								12.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC		**UND:**	M2	
				CANT	75.30	

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA







PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
DESPACHO DEL ALCALDE			28.10					28.10
TALENTO HUMANO			22.20					22.20
COMISARIA			25.00					25.00
ACTA PARCIAL No.1								**75.30**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**75.30**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO			**UND:**	Und
					CANT	**25.00**

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
DESPACHO DEL ALCALDE							3	3.00
TALENTO HUMANO							2	2.00
COMISARIA							2	2.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							5	5.00
PERSONERIA							2	2.00
PLANEACION							6	6.00
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON							5	5.00
ACTA PARCIAL No.2								**25.00**
TOTAL (Und)								**25.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO VIDRIOS				**UND:**	m2
						CANT	30.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA







PRELIMINARES	**DIMENSIONES**						**N° Eltos.**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	**Long.**	**Área**	**H1**	**H2**	**Hprom.**		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
ALCALDE	2.10					1.8	2	5.70
ARCHIVO	1.80					1.5	2	4.80
ACTA PARCIAL No.2								**10.50**
TOTAL (m2)								**10.50**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	**CONTRATISTA**
FIRMA	**FIRMA**
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO Nº:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO Nº:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM Nº:	15 — PINTURA MARCOS METALICOS	**UND:**	Und
		CANT	23.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA





PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
PLANEACION							3	3.00
ALCALDE							1	1.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							4	4.00
TALENTO HUMANO							1	1.00
COMISARIA							1	1.00
INSPECCION DE POLICIA Y PERSONERIA							2	2.00
ARCHIVO							1	1.00
MARCO BAÑO							1	1.00
BALCON							1	1.00
MARCO PUERTA DE INGRESO							1	1.00
HACIENDA							1	1.00
SALUD							2	2.00
PUERTA DE BAÑO							1.00	1.00
PUERTAS DE INGRESO POR DOS LADOS							3.00	3.00
ACTA PARCIAL No.2								**23.00**
TOTAL (Und)								**23.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO Nº:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO Nº:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM Nº:	18	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ILUMINACION EXTERIOR (REFLECTORES)		**UND:**	Und	
				CANT	4.00	

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA







PRELIMINARES	**DIMENSIONES**						**Nº Eltos.**	**MEDIDA TOTAL**
	Ancho	**Long.**	**Área**	**H1**	**H2**	**Hprom.**		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
FACHADA DEL CAM							1	1.00
PARTE LATERAL DEL CAM- INGRESO AL PARQUE							1	1.00
PARTE TRASERA DEL CAM							1	1.00
PARTE INTERNA DEL CAM							1	1.00
ACTA PARCIAL No.2								4.00
TOTAL (Und)								4.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	**CONTRATISTA**
FIRMA	**FIRMA**
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	20	TRANSPORTE				**UND:**	Viaje
						CANT	8.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
	**ACTA PARCIAL No.1**								0.00
	VIAJES EN CAMIONETA LLEVANTO CIELO RASO DEL CAM							3	3.00
	VIAJES EN CAMIONETA LLEVANTO TEJA DE LA CASA DE LA CULTURA							2	2.00
	VIAJES ACARREO DEL MATERIAL DE ESCOMBROS,VENTANAS Y VIDRIOS ROTOS DEL CAM							3	3.00
	ACTA PARCIAL No.2								8.00
	TOTAL (Viaje)								8.00
	Observación:								

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO Nº:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO Nº:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM Nº:	21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOS				**UND:**	Und
						CANT	15.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

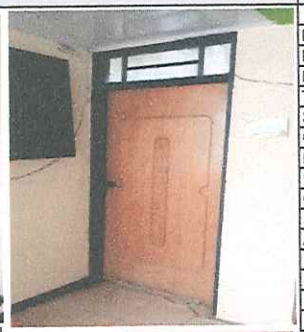

PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
DESPACHO DEL ALCALDE							1	1.00
PUERTA INGRESO							1	1.00
BALCON							1	1.00
TALENTO HUMANO							1	1.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							1	1.00
COMISARIA							1	1.00
PERSONERIA							2	2.00
INSPECCIÓN DE POLICIA							1	1.00
CONSEJO							1	1.00
PLANEACION							2	2.00
ARCHIVO							1	1.00
BAÑO							1	1.00
SEDAGRAM							1	1.00
ACTA PARCIAL No.2								15.00
TOTAL (Und)								15.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM N°:	NP 01	DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE	**UND:** M2 / **CANT** 250.90

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA






PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
DESPACHO DEL ALCALDE			28.10					28.10
TALENTO HUMANO			22.20					22.20
COMISARIA			25.00					25.00
SECRETARIA DE GOBIERNO			30.97					30.97
SECRETARIA DE GOBIERNO			16.24					16.24
INSPECCIÓN DE POLICIA			16.42					16.42
PERSONERIA			15.66					15.66
PLANEACIÓN			23.73					23.73
PLANEACION			14.11					14.11
ARCHIVO PLANEACIÓN			6.81					6.81
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON			51.66					51.66
ACTA PARCIAL No.1								**250.90**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**250.90**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	NP 02	INSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE			**UND:**	M2
					CANT	175.60

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA





PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
SECRETARIA DE GOBIERNO			30.97					30.97
SECRETARIA DE GOBIERNO			16.24					16.24
INSPECCION DE POLICIA			16.42					16.42
PERSONERIA			15.66					15.66
PLANEACION			23.73					23.73
PLANEACION			14.11					14.11
ARCHIVO PLANEACIÓN			6.81					6.81
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON			51.66					51.66
ACTA PARCIAL No.1								**175.60**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**175.60**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1 — **PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM N°:	NP 03 — RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE H<=8M	**UND:**	M2
		CANT	362.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

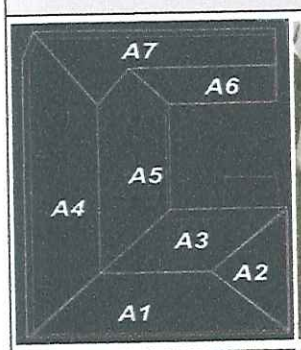







PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
AREA 1			65.13					65.13
AREA 2			26.45					26.45
AREA 3			38.51					38.51
AREA 4			96.5					96.50
AREA 5			59.40					59.40
AREA 6			24.84					24.84
AREA 7			51.17					51.17
								362.00
ACTA PARCIAL No.1								
ACTA PARCIAL No.2								0.00
TOTAL (M2)								362.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026
ITEM N°:	NP 04 — CUBIERTA METALICA CALIBRE 24	**UND:**	M2
		CANT	362.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

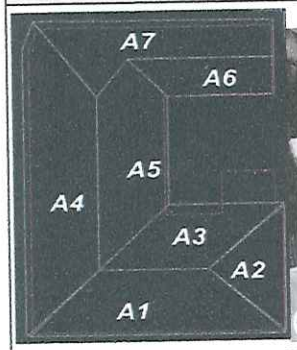







PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
AREA 1			65.13					65.13
AREA 2			26.45					26.45
AREA 3			38.51					38.51
AREA 4			96.5					96.50
AREA 5			59.40					59.40
AREA 6			24.84					24.84
AREA 7			51.17					51.17
ACTA PARCIAL No.1								362.00
ACTA PARCIAL No.2								0.00
TOTAL (M2)								362.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra


CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** ML
ITEM N°:	NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	**CANT** 63.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

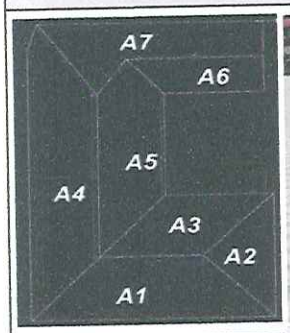

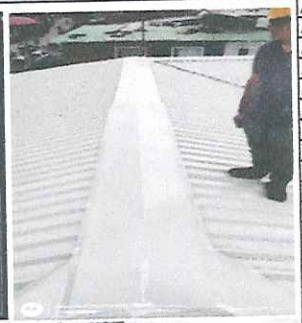





PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
AREA 1-AREA 4		7.12						7.12
AREA 1-AREA 2		7.16						7.16
AREA 1-AREA 3		7.45						7.45
AREA 2-AREA 3		7.07						7.07
AREA 4-AREA5		13.54						13.54
AREA 4-AREA 7		7.25						7.25
AREA 5-AREA 7		3.51						3.51
AREA 6-AREA7		9.90						9.90
ACTA PARCIAL No.1								63.00
ACTA PARCIAL No.2								0.00
TOTAL (ML)								63.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** ML
ITEM N°:	NP 06 — FLANCHER PARA CUBIERTA		**CANT** 6.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
PERSONERIA		3.00					2.00	6.00
								6.00
ACTA PARCIAL No.1								
								0.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (ML)								6.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	NP 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA			**UND:**	UNIDAD
					CANT	13.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
INSPECCIÓN DE POLICIA							3	3.00
COMISARIA							2	2.00
ALCALDE							1	1.00
BALCON							2	2.00
ARCHIVO PLANEACIÓN							2	2.00
PRIMER PISO BAÑO							3	3.00
ACTA PARCIAL No.2								13.00
TOTAL (UNIDAD)								13.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO Nº:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO Nº:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM Nº:	NP 08 — SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL	**UND:**	ML
		CANT	23.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

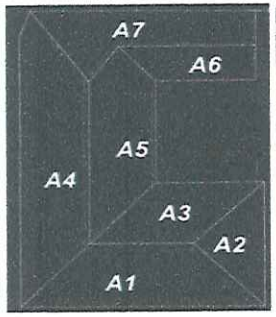







PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
CANAL ENTRE AREA 3 -AREA 5		7.00						7.00
CANAL ENTRE AREA 5 -AREA 6		4						4.00
CANALES CAMBIADOS EN PERIMETRO DE LA CUBIERTA		3					4	12.00
ACTA PARCIAL No.1								**23.00**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (ML)								**23.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	**CONTRATISTA**
FIRMA	**FIRMA**
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	NP 09	SUMINISTRO Y REPOSICION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE			**UND:**	M2
					CANT	30.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

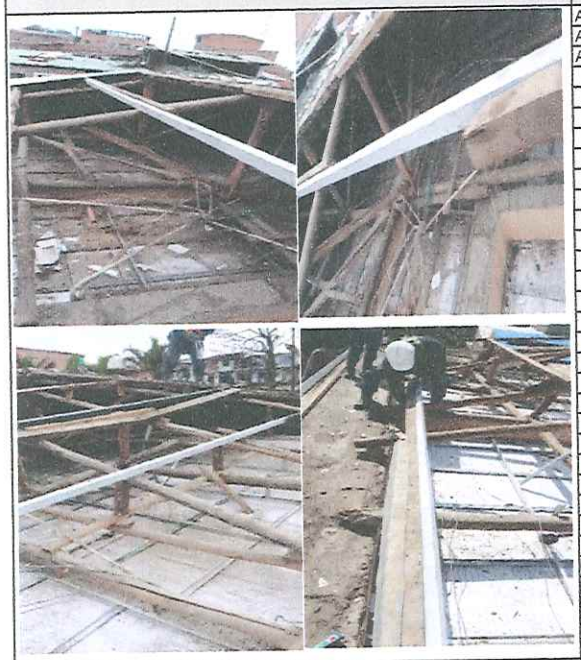

PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
AREA1	2	6.00	12.00					12.00
AREA 4	2	6	12.00					12.00
AREA 5	1	6	6.00					6.00
ACTA PARCIAL No.1								**30.00**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**30.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	**CONTRATISTA**
FIRMA	**FIRMA**
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	ML
ITEM N°:	NP 10	ACOMETIDA TABLERO THHN/THWN #8(2F+1N)+1T#10 AWG - TUBO CONDUIT PVC 1"			**CANT**	24.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

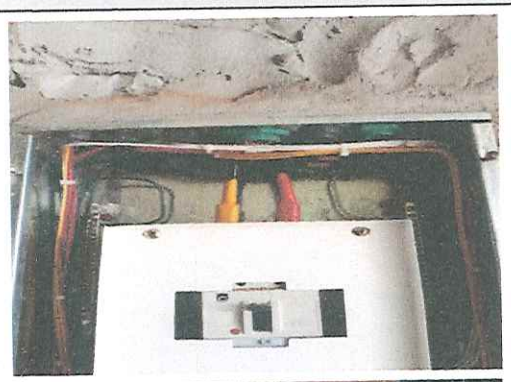



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
ACOMETIDA DEL TABLERO DE PRIMER A SEGUNDO PISO DEL CAM		1.50					2	3.00
ACOMETIDA DE TABLERO DEL SEGUNDO PISO AL RACK DEL CAM		10.5					2	21.00
ACTA PARCIAL No.2								24.00
TOTAL (ML)								24.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** UNIDAD
ITEM N°:	NP 11	SALIDA Y APLIQUE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	**CANT** 65.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							12	12.00
INSPECCIÓN DE POLICIA							3	3.00
PERSONERIA							4	4.00
PLANEACION							8	8.00
ARCHIVO PLANEACIÓN							1	1.00
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON							3	3.00
COMISARIA							5	5.00
TALENTO HUMANO							5	5
DESPACHO DEL ALCALDE							2	2.00
ACTA PARCIAL No.2								43.00
TOTAL (UNIDAD)								43.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ Cargo: Supervisor	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	NP 13	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR SENCILLO BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"			**UND:**	UNIDAD
					CANT	7.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

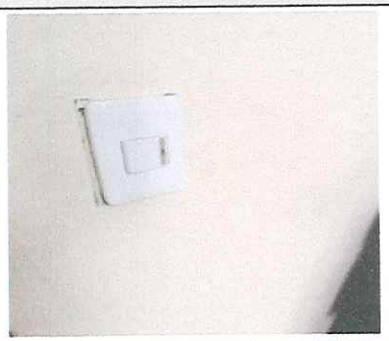



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							1	1.00
INSPECCIÓN DE POLICIA							1	1.00
PERSONERIA							1	1.00
COMISARIA							1	1.00
TALENTO HUMANO							1	1.00
BAÑO DEL DESPACHO DEL ALCALDE							1	1.00
ACTA PARCIAL No.2								6.00
TOTAL (UNIDAD)								6.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	UNIDAD
ITEM N°:	NP 14	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR DOBLE BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"			**CANT**	6.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							1	1.00
PLANEACION							2	2.00
DESPACHO DEL ALCALDE							1	1.00
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON							2	2.00
								6.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (UNIDAD)								6.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					**UND:**	UNIDAD
ITEM N°:	NP 15	PAST-PANNEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6				**CANT**	1.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
EN EL RACK DE SECRETARIA GENERAL							1	1.00
								1.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (UNIDAD)								1.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	NP 16	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS				**UND:**	UNIDAD
						CANT	2.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
	**ACTA PARCIAL No.1**								0.00
	PASILLO SEGUNDO PISO DEL CAM							1	1.00
	ENTRADA DEL PRIMER PISO DEL CAM							1	1.00
	**ACTA PARCIAL No.2**								2.00
	TOTAL (UNIDAD)								2.00
	Observación:								

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	NP 17	SALIDA PARA LUMINARIA				**UND:**	UNIDAD
						CANT	46.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
	**ACTA PARCIAL No.1**								**0.00**
	DESPACHO DEL ALCALDE							4	4.00
	TALENTO HUMANO							2	2.00
	COMISARIA							4	4.00
	SECRETARIA DE GOBIERNO							5	5.00
	PERSONERIA							2	2.00
	PLANEACION							6	6.00
	PASILLO,ESCALERAS Y BALCON							7	7.00
	INSPECCIÓN DE POLICIA							3	3
	ARCHIVO PLANEACIÓN							2	2
	ACTA PARCIAL No.2								**35.00**
	TOTAL (UNIDAD)								**35.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO Nº:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO Nº:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					**UND:**	GLOBAL
						CANT	1.00
ITEM Nº:	NP 18	PUESTO TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,8M EN 5/8" Y SOLDADURA					

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
									0.00
	ACTA PARCIAL No.1								
   	POLO TIERRA PARA EL TABLERO UBICADO EN PRIMER PISO DEL CAM							1	1.00
									1.00
	ACTA PARCIAL No.2								
	TOTAL (GLOBAL)								1.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** UNIDAD
ITEM N°:	NP 19 — SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS SENCILLO X 25m		**CANT** 20.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA





PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
TALENTO HUMANO							2	2.00
COMISARIA							5	5.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							3	3.00
PERSONERIA							4	4.00
PASILLO,ESCALERAS Y BALCON							3	3.00
INSPECCIÓN DE POLICIA							3	3
								20.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (UNIDAD)								20.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026		
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ						
ITEM N°:	NP 20	SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS DOBLE X 25m				**UND:**	UNIDAD
						CANT	21.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA





PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
DESPACHO DEL ALCALDE							2	2.00
TALENTO HUMANO							3	3.00
SECRETARIA DE GOBIERNO							7	7.00
PLANEACION							8	8.00
ARCHIVO PLANEACIÓN							1	1
ACTA PARCIAL No.2								**21.00**
TOTAL (UNIDAD)								**21.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM N°:	NP 21 — SWITCH DE 24 PUERTOS	**UND:**	UNIDAD
		CANT	1.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
RACK EN SECRETARIA GENERAL DEL CAM							1	1.00
ACTA PARCIAL No.2								**1.00**
TOTAL (UNIDAD)								**1.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** UNIDAD
ITEM N°:	NP 22 PAST.CORD DE 1M		**CANT** 24.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

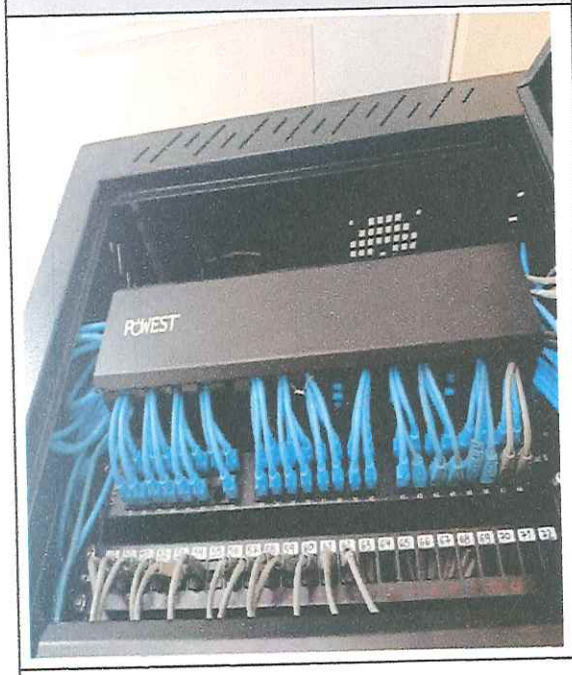

PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
							24	24.00
RACK EN SECRETARIA GENERAL DEL CAM								24.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (UNIDAD)								24.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ Cargo: Supervisor	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					**UND:**	ML
ITEM N°:	NP 23	CANALETA PARA DATOS DE 4 VIAS				**CANT**	90.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
	**ACTA PARCIAL No.1**								0.00
	SEGUNDO PISO CAM, PARA LA INSTALACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DE DATOS INSTALADOS		90.00						90.00
	ACTA PARCIAL No.2								90.00
	TOTAL (ML)								90.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ Cargo: Supervisor	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** KG
ITEM N°:	NP24	ESTRUCTURA METALICA (CULUMNAS CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CIMENTACIÓN	**CANT** 721.10

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Espesor	H1	KG/M3	KG/ML		
								0.00
ACTA PARCIAL No.1								
COLUMNAS IPE		4.00				16.20	4	259.20
VIGA IPE		1.92				16.20	4	124.42
VIGA IPE DIAGONALES		3.45				16.20	4	223.56
PLT-02 100x280x9mm	0.1	0.28	0.009		7850		4	7.91
PLT-05 120x250x9mm	0.12	0.25	0.009		7850		8	16.96
PLT-03 145x39x9mm	0.145	0.39	0.009		7850		4	15.98
PLT-01 290x290x15mm BASE DE ESTRUCTURA		0.29				62.99	4.00	73.07
								721.10
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (KG)								721.10

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** M2
ITEM N°:	NP25	RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL	**CANT** 220.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
SALON DE EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA	8.33	13.45						112.00
SALONES DEL SEGUNDO PISO EN LA CASA DE LA CULTURA	9.55	11.3						108.00
ACTA PARCIAL No.1								**220.00**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**220.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** M2
ITEM N°:	NP26	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE HASTA DISPOSICION FINAL	**CANT** 316.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

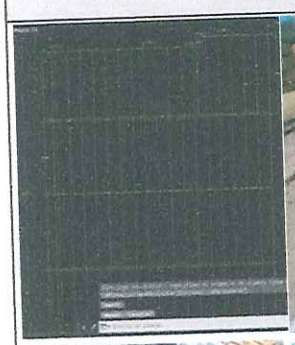





PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
CUBIERTA CASA DE CULTURA GENERAL	17.3	18.05						312.00
CUBIERTA CASA DE CULTURA BORTE TRASERO	5.7	0.65						4.00
								316.00
ACTA PARCIAL No.1								
								0.00
ACTA PARCIAL No.2								

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM N°:	NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO CALIBRE 22	**UND:** ML / **CANT** 36.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA






PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
CANAL DELANTERO TRASERO		17.30					2.00	19.30
CANAL CASA DE CULTURA BORTE TRASERO		0.65						0.65
ACTA PARCIAL No.1								**19.95**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (ML)								**19.95**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.


SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** M2
ITEM N°:	NP28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CALIBRE 24	**CANT** 316.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA

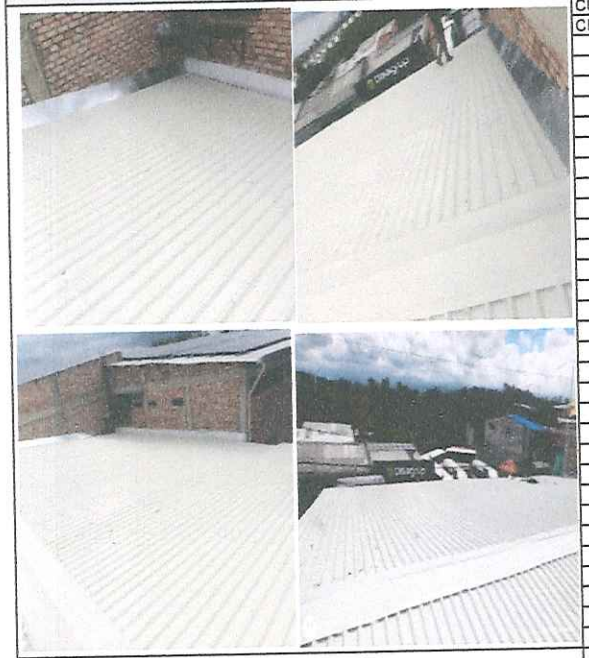

PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
CUBIERTA CASA DE CULTURA GENERAL	17.3	18.05						312.00
CUBIERTA CASA DE CULTURA BORTE TRASERO	5.7	0.65						4.00
ACTA PARCIAL No.1								**316.00**
ACTA PARCIAL No.2								**0.00**
TOTAL (M2)								**316.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ Cargo: Supervisor	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** ML
ITEM N°:	NP29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	**CANT** 17.30

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
CABALLETE DE CUBIERTA A 2 AGUAS		17.30						17.30
ACTA PARCIAL No.1								17.30
ACTA PARCIAL No.2								0.00
TOTAL (ML)								17.30

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		**UND:** ML
ITEM N°:	NP 30	FLANCHER PARA CUBIERTA	**CANT** 28.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
FLANCHER CON CONSTRUCCCION MEDIANERA DEL SUPERMERCADO		16.40						16.40
FLANCHER CON CONSTRUCCCION MEDIANERA AL RESPALDO		11.6						11.60
ACTA PARCIAL No.1								**28.00**
								0.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (ML)								**28.00**

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ Cargo: Supervisor	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					**UND:**	ML
ITEM N°:	NP 31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3				**CANT**	18.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
  	BAJANTES EN LA PARTE DELANTERA DE LA CASA DE LA CULTURA		6.00					2.00	12.00
	BAJANTE AL RESPALDO DE LA CASA DE LA CULTURA		6						6.00
	ACTA PARCIAL No.1								18.00
	ACTA PARCIAL No.2								0.00
	TOTAL (ML)								18.00
	Observación:								

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:** 1	**PERIODO DE CORTE:** 1/12/2025 HASTA 27/03/2026
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
ITEM N°:	NP 32 — SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60cmx60cm		**UND:** UNIDAD / **CANT** 25.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA





PRELIMINARES	DIMENSIONES Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.	N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
ACTA PARCIAL No.1								0.00
SALON GENERAL CASA DE CULTURA							6	6.00
SALON GENERAL SEGUNDO PISO DE LA CASA DE CULTURA							1	1.00
SALONES DEL SEGUNDO PISO DE LA CASA DE CULTURA							18	18.00
ACTA PARCIAL No.2								25.00
TOTAL (UNIDAD)								25.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	M2
ITEM N°:	NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC			**CANT**	220.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						Nº Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
SALON GENERAL LA CASA DE LA CULTURA	8.33	13.45	112.00					112.00
SALONES SEGUNDO PISO LA CASA DE LA CULTURA	18.2	5.95	108.00					108.00
ACTA PARCIAL No.2								220.00
TOTAL (M2)								220.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	**OBJETO:**	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	UNIDAD
ITEM N°:	NP 34	SALIDA PARA LUMINARIA			**CANT**	4.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA



PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								0.00
PARTE EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA							4	4.00
								4.00
ACTA PARCIAL No.2								
TOTAL (UNIDAD)								4.00

Observación:

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoría de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"			
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ				**UND:**	UNIDAD
ITEM N°:	NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA			**CANT**	8.00

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA	PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
	**ACTA PARCIAL No.1**								0.00
	SEGUNDO PISO DE LA CASA DE LA CULTURA							4	4.00
	SALÓN GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA							4	4.00
	ACTA PARCIAL No.2								8.00
	**TOTAL (UNIDAD)**								8.00
	Observación:								

Nota: Todas las cantidades registradas en esta página reflejan la ejecución de la obra. Dichas cantidades deberan ser medidas, aprobadas, sustentadas y verificadas por la Interventoria de obra.

SUPERVISOR:	CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ	Nombre: Andres Libardo Riascos Pinchao
Cargo: Supervisor	Cargo: Contratista de obra

CALCULO CANTIDADES DE OBRA

PROCESO: CONTRATO DE OBRA No. F14-253-2025

CONTRATO N°:	F14-253-2025	OBJETO:	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"				
CONTRATISTA:	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	**MEMORIA DE CÁLCULO ANEXO N°:**	1	**PERIODO DE CORTE:**	1/12/2025 HASTA 27/03/2026	
SUPERVISOR:	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
ITEM N°:	NP 36	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA			**UND:**	M2
					CANT	**85.90**

PLANO Y FOTO DESCRIPTIVOS DE LA MEMORIA






PRELIMINARES	DIMENSIONES						N° Eltos.	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Long.	Área	H1	H2	Hprom.		
ACTA PARCIAL No.1								**0.00**
SALÓN GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA	8.3	10.35	85.90					85.90
ACTA PARCIAL No.2								**85.90**














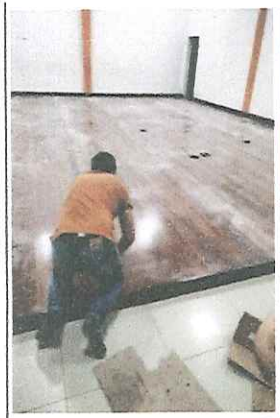




TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-253-2025	CRONOLOGIA	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"	VALOR	$ 308,749,758.00	ACTA DE INICIO	8/10/2025
		VALOR ADICIONAL	124,123,367.00	SUSPENSIÓN #1	31/12/2025
CONTRATISTA	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO Nit. 14.467.115-4 R.L ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO C.C 14.467.115 de Cali(V)	VALOR TOTAL	$ 432,873,125.00	REINICIO #1	21/03/2026
INTERVENTOR	N/A	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	578 del 6 de agosto de 2025	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS		
		FECHA DE TERMINACIÓN	4/05/2026		
REGISTRO PRESUPUETAL	726 del 27 de septiembre de 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA	27/03/2026		

	CANTIDADES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
	MEJORAMIENTO CAM												
1	SUMINISTRO E INSTALACION CORTINA TIPO PERSIANA VERTICAL	Und	17.00	$ 777,882	$ 13,223,994	17.00	$ 13,223,994.00	-	$ -				
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m^2	36.646	$ 79,982	$ 2,931,020	36.65	$ 2,931,020.00	-	$ -	5.58	$ 446,380.00	5.58	$ 446,380.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO	Und	12.00	$ 1,226,360	$ 14,716,320	12.00	$ 14,716,320.00	-	$ -	12.00	$ 14,716,320.00	12.00	$ 14,716,320.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m^2	9.80	$ 97,051	$ 951,100	75.30	$ 7,307,940.00	75.30	$ 7,307,940.00			75.30	$ 7,307,940.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO	m^2	51.30	$ 97,051	$ 4,978,716	51.30	$ 4,978,716.00	-	$ -				
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO	Und	20.00	$ 67,656	$ 1,353,120	25.00	$ 1,691,400.00	-	$ -	25.00	$ 1,691,400.00	25.00	$ 1,691,400.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN MADERA MACIZA	Und	3.00	$ 1,460,882	$ 4,382,646	0.00	$ 0.00	-	$ -				
8	SUMINSITRO EN INSTALACION DE PUERTA EN MADERA de 1.4x2.24 m	Und	5.00	$ 818,422	$ 4,092,110	0.00	$ 0.00	-	$ -				
9	SUMINSITRO EN INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	Und	3.00	$ 1,794,494	$ 5,383,482	0.00	$ 0.00	-	$ -				
10	ALISTAMIENTO DE MUROS	m^2	1200.00	$ 11,954	$ 14,344,800		$ 0.00	-	$ -				
11	PUNTURA INTERIOR	m^2	1200.00	$ 17,505	$ 21,006,000	0.00	$ 0.00	-	$ -				
12	PINTURA EXTERIOR	m^2	700.00	$ 26,203	$ 18,342,100	0.00	$ 0.00	-	$ -				
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO VIDRIOS	m^2	30.00	$ 93,019	$ 2,790,570	30.00	$ 2,790,570.00	-	$ -	10.50	$ 976,700.00	10.50	$ 976,700.00
14	ESTUCO	m^2	1200.00	$ 22,417	$ 26,900,400	0.00	$ 0.00	-	$ -				
15	PINTURA MARCOS METALICOS	Und	23.00	$ 151,219	$ 3,478,037	23.00	$ 3,478,037.00	-	$ -	23.00	$ 3,478,037.00	23.00	$ 3,478,037.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2000 LITROS	Und	1.00	$ 1,278,803	$ 1,278,803	1.00	$ 1,278,803.00	-	$ -				
17	ESTRUCTURA METALICA (CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	Und	1.00	$ 4,777,542	$ 4,777,542	1.00	$ 4,777,542.00	-	$ -				

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-253-2025	CRONOLOGIA	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"	VALOR	$ 308,749,758.00	ACTA DE INICIO	8/10/2025
		VALOR ADICIONAL	124,123,367.00	SUSPENSIÓN #1	31/12/2025
CONTRATISTA	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO Nit. 14.467.115-4 R.L ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO C.C 14.467.115 de Cali(V)	VALOR TOTAL	$ 432,873,125.00	REINICIO #1	21/03/2026
INTERVENTOR	N/A	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	578 del 6 de agosto de 2025	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS		
		FECHA DE TERMINACIÓN	4/05/2026		
REGISTRO PRESUPUETAL	726 del 27 de septiembre de 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA	27/03/2026		

			CANTIDADES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE ILUMINACION EXTERIOR (REFLECTORES)	Und	8.00	$ 524,080	$ 4,192,640	4.00	$ 2,096,320.00	-	$ -	4.00	$ 2,096,320.00	4.00	$ 2,096,320.00
19	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA (DESPACHO ALCALDE)	m^2	24.00	$ 17,870	$ 428,880	0.00	$ 0.00	-	$ -				
20	TRANSPORTE	Viaje	8.00	$ 345,940	$ 2,767,520	8.00	$ 2,767,520.00	-	$ -	8.00	$ 2,767,520.00	8.00	$ 2,767,520.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJOS	Und	15.00	$ 270,935	$ 4,064,025	15.00	$ 4,064,025.00	-	$ -	15.00	$ 4,064,025.00	15.00	$ 4,064,025.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN HIERRO	Und	4.00	$ 889,560	$ 3,558,240	4.00	$ 3,558,240.00	-	$ -				
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO 1 (DESPACHO ALCALDE)	Und	1.00	$ 12,469,966	$ 12,469,966	0.00	$ 0.00	-	$ -				
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO 2 (PUERTA PPAL)	Und	1.00	$ 21,715,148	$ 21,715,148	0.00	$ 0.00	-	$ -				
	RENOVACIÓN BAÑO DAMAS							-	$ -				
25	DESMONTE DE APARATOS	Und	4.00	$ 16,428	$ 65,712	4.00	$ 65,712.00	-	$ -				
26	DEMOLICION DE ENCHAPES	m^2	43.00	$ 9,574	$ 411,682	43.00	$ 411,682.00	-	$ -				
27	MOVIMIENTOS PUNTOS HIDRAULICOS L=2.5MTS	Und	5.00	$ 62,863	$ 314,315	5.00	$ 314,315.00	-	$ -				
28	PUNTOS SANITARIOS 2"	Und	3.00	$ 46,355	$ 139,065	3.00	$ 139,065.00	-	$ -				
29	PUNTOS SANITARIOS 3"	Und	2.00	$ 101,501	$ 203,002	2.00	$ 203,002.00	-	$ -				
30	AFINADO DE PISO	m^2	43.00	$ 59,109	$ 2,541,687	43.00	$ 2,541,687.00	-	$ -				
31	ENCHAPE DE PAREDES	m^2	30.00	$ 86,385	$ 2,591,550	30.00	$ 2,591,550.00	-	$ -				
32	ENCHAPE DE PISOS	m^2	13.00	$ 86,385	$ 1,123,005	13.00	$ 1,123,005.00	-	$ -				
33	ESTUCO PAREDES	m^2	10.00	$ 22,417	$ 224,170	10.00	$ 224,170.00	-	$ -				
34	PINTURA PAREDES	m^2	10.00	$ 17,505	$ 175,050	10.00	$ 175,050.00	-	$ -				
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ACERO INOXIDABLE	m^2	10.60	$ 511,167	$ 5,418,370	10.60	$ 5,418,370.00	-	$ -				
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	Und	2.00	$ 1,027,936	$ 2,055,872	2.00	$ 2,055,872.00	-	$ -				
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	Und	2.00	$ 158,144	$ 316,288	2.00	$ 316,288.00	-	$ -				
	RENOVACIÓN BAÑO HOMBRES							-	$ -				
38	MOVIMIENTOS PUNTOS HIDRAULICOS L=2.5 MTS	Und	5.00	$ 62,863	$ 314,315	5.00	$ 314,315.00	-	$ -				
39	PUNTOS SANITARIOS 2"	Und	3.00	$ 46,355	$ 139,065	3.00	$ 139,065.00	-	$ -				
40	PUNTOS SANITARIOS 3"	Und	2.00	$ 101,501	$ 203,002	2.00	$ 203,002.00	-	$ -				
41	AFINADO DE PISO	m^2	43.00	$ 59,109	$ 2,541,687	43.00	$ 2,541,687.00	-	$ -				
42	ENCHAPE DE PAREDES	m^2	30.00	$ 86,385	$ 2,591,550	30.00	$ 2,591,550.00	-	$ -				
43	ENCHAPE DE PISOS	m^2	13.00	$ 86,385	$ 1,123,005	13.00	$ 1,123,005.00	-	$ -				
44	ESTUCO PAREDES	m^2	10.00	$ 22,417	$ 224,170	10.00	$ 224,170.00	-	$ -				

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO N°	F14-253-2025	CRONOLOGIA	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"	VALOR	$ 308,749,758.00	ACTA DE INICIO	8/10/2025
		VALOR ADICIONAL	124,123,367.00	SUSPENSIÓN #1	31/12/2025
CONTRATISTA	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO Nit. 14.467.115-4 R.L ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO C.C 14.467.115 de Cali(V)	VALOR TOTAL	$ 432,873,125.00	REINICIO #1	21/03/2026
INTERVENTOR	N/A	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	578 del 6 de agosto de 2025	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS		
		FECHA DE TERMINACIÓN	4/05/2026		
REGISTRO PRESUPUETAL	726 del 27 de septiembre de 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA	27/03/2026		

		CANTIDADES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
45	PINTURA PAREDES	m^2	10.00	$ 17,505	$ 175,050	10.00	$ 175,050.00	-	$ -				
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS EN ACERO INOXIDABLE	m^2	10.80	$ 511,167	$ 5,520,604	10.80	$ 5,520,604.00	-	$ -				
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	Und	2.00	$ 1,027,936	$ 2,055,872	2.00	$ 2,055,872.00	-	$ -				
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	Und	2.00	$ 158,144	$ 316,288	2.00	$ 316,288.00	-	$ -				
	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA							-	$ -				
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m^2	5.635	$ 79,982	$ 450,699	5.64	$ 450,699.00	-	$ -				
50	MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE ACCESORIOS, DISPOSITIVOS DE AMARRE Y SELLOS PARA FISURAS	m^2	40.00	$ 21,745	$ 869,800	0.00	$ 0.00	-	$ -				
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD TIPO 1	Und	1.00	$ 1,186,080	$ 1,186,080	0.00	$ 0.00	-	$ -				
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBIE TIPO 2	Und	1.00	$ 4,942,000	$ 4,942,000	0.00	$ 0.00	-	$ -				
53	VENTANAS EN HIERRO	Und	4.00	$ 790,720	$ 3,162,880	4.00	$ 3,162,880.00	-	$ -				
54	VENTANAS EN ALUMINIO	Und	5.00	$ 295,360	$ 1,476,800	5.00	$ 1,476,800.00	-	$ -				
	ITEM NO PREVISTOS CAM							-	$ -				
1	DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE	M2		$ 4,127		250.90	$ 1,035,464.00	250.90	$ 1,035,464.00			250.90	$ 1,035,464.00
2	INSTALACION DE CIELO FALSO EXISTENTE	M2		$ 22,435		175.60	$ 3,939,586.00	175.60	$ 3,939,586.00			175.60	$ 3,939,586.00
3	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE H<=8M	M2		$ 8,102		362.00	$ 2,932,924.00	362.00	$ 2,932,924.00			362.00	$ 2,932,924.00
4	CUBIERTA METALICA CALIBRE 24	M2		$ 125,190		362.00	$ 45,318,780.00	362.00	$ 45,318,780.00			362.00	$ 45,318,780.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	ML		$ 79,352		63.00	$ 4,999,176.00	63.00	$ 4,999,176.00			63.00	$ 4,999,176.00
6	FLANCHER PARA CUBIERTA	ML		$ 75,062.00		6.00	$ 450,372.00	6.00	$ 450,372.00			6.00	$ 450,372.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA	UNIDAD		$ 40,583		13.00	$ 527,579.00	-	$ -	13.00	$ 527,579.00	13.00	$ 527,579.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL	ML		$ 108,890		23.00	$ 2,504,470.00	23.00	$ 2,504,470.00			23.00	$ 2,504,470.00
9	SUMINISTRO Y REPOSICION ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE	M2		$ 99,368		30.00	$ 2,981,040.00	30.00	$ 2,981,040.00			30.00	$ 2,981,040.00
10	ACOMETIDA TABLERO THHN/THWN #8(2F+1N)+1T#10 AWG - TUBO CONDUIT PVC 1"	ML		$ 97,000		24.00	$ 2,327,989.00	-	$ -	24.00	$ 2,327,989.00	24.00	$ 2,327,989.00
11	SALIDA Y APLIQUE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD		$ 116,890		65.00	$ 7,597,851.00	-	$ -	43.00	$ 5,026,271.00	43.00	$ 5,026,271.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO Nº	F14-253-2025	CRONOLOGIA	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"	VALOR	$ 308,749,758.00	ACTA DE INICIO	8/10/2025
		VALOR ADICIONAL	124,123,367.00	SUSPENSIÓN #1	31/12/2025
CONTRATISTA	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO Nit. 14.467.115-4 R.L ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO C.C 14.467.115 de Cali(V)	VALOR TOTAL	$ 432,873,125.00	REINICIO #1	21/03/2026
INTERVENTOR	N/A	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	578 del 6 de agosto de 2025	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS		
		FECHA DE TERMINACIÓN	4/05/2026		
REGISTRO PRESUPUETAL	726 del 27 de septiembre de 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA	27/03/2026		

		CANTIDADES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
12	TUBERIA EMT 1/2 THHN/THWN (2F+1N) #12	ML		$ 46,474		40.00	$ 1,858,977.00	-	$ -				
13	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR SENCILLO BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD		$ 131,871		7.00	$ 923,097.00	-	$ -	6.00	$ 791,226.00	6.00	$ 791,226.00
14	SALIDA Y APLIQUE INTERRUPTOR DOBLE BETY CON POLO A TIERRA - DUCTO EMT 1/2"	UNIDAD		$ 133,061		6.00	$ 798,366.00	-	$ -	6.00	$ 798,366.00	6.00	$ 798,366.00
15	PAST-PANNEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6	UNIDAD		$ 482,729		1.00	$ 482,729.00	-	$ -	1.00	$ 482,729.00	1.00	$ 482,729.00
16	TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS	UNIDAD		$ 2,367,170		2.00	$ 4,734,341.00			2.00	$ 4,734,341.00	2.00	$ 4,734,341.00
17	SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD		$ 106,890		46.00	$ 4,916,941.00			35.00	$ 3,741,151.00	35.00	$ 3,741,151.00
18	PUESTO TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 1,8M EN 5/8" Y SOLDADURA	GLOBAL		$ 3,905,425		1.00	$ 3,905,425.00			1.00	$ 3,905,425.00	1.00	$ 3,905,425.00
19	SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS SENCILLO X 25m	UNIDAD		$ 262,666		20.00	$ 5,253,324.00			20.00	$ 5,253,324.00	20.00	$ 5,253,324.00
20	SALIDA Y APLIQUE PARA DATOS DOBLE X 25m	UNIDAD		$ 525,332		21.00	$ 11,031,979.00			21.00	$ 11,031,979.00	21.00	$ 11,031,979.00
21	SWITCH DE 24 PUERTOS	UNIDAD		$ 476,898		1.00	$ 476,898.00			1.00	$ 476,898.00	1.00	$ 476,898.00
22	PAST.CORD DE 1M	UNIDAD		$ 65,324		24.00	$ 1,567,764.00			24.00	$ 1,567,764.00	24.00	$ 1,567,764.00
23	CANALETA PARA DATOS DE 4 VIAS	ML		$ 68,953		90.00	$ 6,205,771.00			90.00	$ 6,205,771.00	90.00	$ 6,205,771.00
24	ESTRUCTURA METALICA (CULUMNAS CON IPE`S) PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CIMENTACIÓN	KG		$ 12,823		721.10	$ 9,246,426.00			721.10	$ 9,246,426.00	721.10	$ 9,246,426.00
	ITEM NO PREVISTOS CASA DE LA CULTURA												
25	RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL	M2		$ 4,127		220.00	$ 907,940.00	220.00	$ 907,940.00			220.00	$ 907,940.00
26	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE HASTA DISPOSICICION FINAL	M2		$ 8,102		316.00	$ 2,560,232.00	316.00	$ 2,560,232.00			316.00	$ 2,560,232.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICO CALIBRE 22	ML		$ 108,890		36.00	$ 3,920,040.00	19.95	$ 2,172,356.00			19.95	$ 2,172,356.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA METALICA CALIBRE 24	M2		$ 125,190.00		316.00	$ 39,560,040.00	316.00	$ 39,560,040.00			316.00	$ 39,560,040.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO	ML		$ 79,352.00		17.30	$ 1,372,790.00	17.30	$ 1,372,790.00			17.30	$ 1,372,790.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA	CONTRATO Nº	F14-253-2025	CRONOLOGIA	
OBJETO	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE MORALES A REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM Y DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE MORALES, CAUCA"	VALOR	$ 308,749,758.00	ACTA DE INICIO	8/10/2025
		VALOR ADICIONAL	124,123,367.00	SUSPENSIÓN #1	31/12/2025
CONTRATISTA	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO Nit. 14.467.115-4 R.L ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO C.C 14.467.115 de Cali(V)	VALOR TOTAL	$ 432,873,125.00	REINICIO #1	21/03/2026
INTERVENTOR	N/A	PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO PRESUPUESTAL	578 del 6 de agosto de 2025	PLAZO ADICIONAL	45 DIAS		
		FECHA DE TERMINACIÓN	4/05/2026		
REGISTRO PRESUPUETAL	726 del 27 de septiembre de 2025	FECHA DE PRESENTE ACTA	27/03/2026		

	CANTIDADES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
30	FLANCHER PARA CUBIERTA	ML		$ 75,062.00		28.00	$ 2,101,736.00	28.00	$ 2,101,736.00			28.00	$ 2,101,736.00
31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC DE 3	ML		$ 37,335		18.00	$ 672,034.00	18.00	$ 672,034.00			18.00	$ 672,034.00
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED DE 60cmx60cm	UNIDAD		$ 67,656.00		25.00	$ 1,691,400.00			25.00	$ 1,691,400.00	25.00	$ 1,691,400.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	M2		$ 97,051.00		220.00	$ 21,351,220.00			220.00	$ 21,351,220.00	220.00	$ 21,351,220.00
34	SALIDA PARA LUMINARIA	UNIDAD		$ 108,190.02		4.00	$ 432,760.00			4.00	$ 432,760.00	4.00	$ 432,760.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA	UNIDAD		$ 40,583.00		8.00	$ 324,664.00			8.00	$ 324,664.00	8.00	$ 324,664.00
36	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISO EN MADERA	M2		$ 303,050.06		85.90	$ 26,032,000.00			85.90	$ 26,032,000.00	85.90	$ 26,032,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 236,999,814.00	$ 332,479,327.00	$ 120,816,880.00	$ 136,185,985.00	$ 257,002,865.00
TOTAL AIU	30%	30%	30%	30%	30%
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	$ 308,099,758.00	$ 432,223,125.00	$ 157,061,944.00	$ 177,041,781.00	$ 334,103,725.00

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO				
VALOR CONTRATO PPAL		$ 308,749,758.00	VALOR ANTICIPO		$ -	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 177,041,781.00
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 124,123,367.00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 177,041,781.00
VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 157,061,944.00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -		VALOR A PAGAR EN LETRAS	
VALOR ACTA PARCIAL 2	$ 177,041,781.00		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		*CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESO MDA CTE.*	
SALDO POR EJECUTAR	$ 98,769,400.00						
SUMAS IGUALES $	$ 432,873,125.00	$ 432,873,125.00	SUMAS IGUALES $	$ -	$ -		

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DANOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO
CONTRATISTA

JUAN FELIPE CALAMBAS
APOYO SUPERVISIÓN

GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Secretario de planeación, infraestructura y desarrollo municipal
Supervisor

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	14467115-4	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	CALLE 20 # 29 - 93	3147966463	facturacion.andresrias2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	NARIÑO	PASTO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	16/02/2026	27444451	$4.347.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	64.600	0		0		0	40	1.700	0	66.300	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	275.200	0		0		0	40	6.900	0	282.100	5
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	5.700	0		0		0	40	200	0	5.900	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	49.400	0		0		0	40	1.300	0	50.700	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-6	215.100	0		0		0	40	5.400	0	220.500	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	40	5.700	0	233.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.337.100	0	0	0	0	40	33.200	0	1.370.300	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	645.400	0	0	0	0	40	16.100	0	661.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	810.700				810.700	40	20.200	830.900			8.107	830.900	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfecauca	891500182-0	20.900	40	600	21.500	3
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280006-1	589.100	40	14.700	603.800	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	14467115-4	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	CALLE 20 # 29 - 93	3147966463	facturacion.andresrias2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	16/02/2026	27444451	$4.347.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	40	0	0	0
ICBF				
0	40	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	610.000	625.500
Pensión	3	2.210.300	2.265.300
Riesgos Laborales	1	810.700	830.900
CCF	2	610.000	625.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.241.000	4.347.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	14467115-4	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO		CALLE 20 # 29 - 93	3147966463	facturacion.andresrias2020@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	NARIÑO	PASTO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	16/02/2026	27444451	$4.347.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004214370	PRADO ROSERO JHOAN SEBASTIAN	1	0			S	X																25-14	1,233,700	197,400	0	0	0	0	ESSC18	1,233,700	49,400	14-23	1,233,700	5	85,900	CCF35	1,233,700	49,400	0	0	0	0	0
2	CC	1034288705	MORENO PERDOMO DANIEL FELIPE	1	0			S	X	X															25-14	189,800	30,400	0	0	0	0	EPS005	189,800	7,600	14-23	189,800	5	13,300	CCF14	189,800	7,600	0	0	0	0	0
3	CC	1061696393	ZAMBRANO TALAGA OBEIMAR	1	0			S		X															230301	142,350	22,800	0	0	0	0	EPSIC3	142,350	5,700	14-23	142,350	5	10,000	CCF14	142,350	5,700	0	0	0	0	0
4	CC	1085284739	YAQUENO PINCHAO ALVARO JAVIER	1	0			S		X															230301	1,233,700	197,400	0	0	0	0	EPS005	1,233,700	49,400	14-23	1,233,700	5	85,900	CCF35	1,233,700	49,400	0	0	0	0	0
5	CC	1085318746	CHAPAL TORO NATHALIA ISABEL	1	0			S		X															25-14	1,233,700	197,400	0	0	0	0	EPS037	1,233,700	49,400	14-23	1,233,700	1	6,500	CCF35	1,233,700	49,400	0	0	0	0	0
6	CC	1085335897	RIASCOS ROSERO CRISTIAN SANTIAGO	1	0			S		X															230301	1,386,667	221,900	0	0	0	0	ESSC18	1,386,667	55,500	14-23	1,386,667	5	96,800	CCF35	1,386,667	55,500	0	0	0	0	0
7	CC	1087416968	GUERRERO MORENO CRISTIAN DANILO	1	0			S	X	X															230301	1,233,700	197,400	0	0	0	0	EPSIC5	1,233,700	49,400	14-23	1,233,700	1	6,500	CCF35	1,233,700	49,400	0	0	0	0	0
8	CC	1144156428	MEZA DELGADO YURLEY	1	0			S		X															230301	1,560,000	249,600	0	0	0	0	EPS037	1,560,000	62,400	14-23	1,560,000	5	108,600	CCF35	1,560,000	62,400	0	0	0	0	0
9	CC	12996405	ROSERO AZAEL EMIRO	1	0			S		X															230301	1,233,700	197,400	0	0	0	0	EPS037	1,233,700	49,400	14-23	1,233,700	5	85,900	CCF35	1,233,700	49,400	0	0	0	0	0
10	CC	12997703	PADILLA JOJOA PEDRO ANTONIO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	5	99,100	CCF35	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
11	CC	37086367	RIASCOS PINCHAO ANDREA	1	0			S																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS037	1,423,500	57,000	14-23	1,423,500	1	7,500	CCF35	1,423,500	57,000	0	0	0	0	0
12	CC	5373690	FLOREZ TELLO JORGE ELIECER	1	0			S		X															230301	1,376,050	220,200	0	0	0	0	ESSC18	1,376,050	55,100	14-23	1,376,050	5	95,800	CCF35	1,376,050	55,100	0	0	0	0	0
13	CC	79732955	MORENO RODRIGUEZ JOSE ALEXANDER	1	0			S	X	X															230301	189,800	30,400	0	0	0	0	EPS005	189,800	7,600	14-23	189,800	5	13,300	CCF14	189,800	7,600	0	0	0	0	0
14	CC	98360551	MORENO MORENO WILLAN VICENTE	1	0			S		X															25-14	1,376,050	220,200	0	0	0	0	ESSC18	1,376,050	55,100	14-23	1,376,050	5	95,800	CCF35	1,376,050	55,100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	14467115-4	ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO	CALLE 20 # 29 - 93	3147966483	facturacion.andresrias2020@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200	002	2026	NARIÑO	PASTO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86597335	30/03/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$5,252,715	$1,628,900	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14467115		RIASCOS PINCHAO ANDRES LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 # 29 - 93	PASTO-NARIÑO	7228852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	109748530	9500932569	I	2026/04/08	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$957,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14467115	RIASCOS ANDRES																		25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$412,500		0	$0	$0	14-23	30	$3,300,000	$17,300	0	$0	$0	No	$957,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,300,000	$528,000			$3,300,000	$412,500			$0	$0			$3,300,000	$17,300		$0	$0		$957,800

2026/03/03 04:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14467115		RIASCOS PINCHAO ANDRES LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 # 29 - 93	PASTO-NARIÑO	7228852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	109748530	9500932569	I	2026/04/08	2026/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$957,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$528,000	$0	$528,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$528,000	$0	$528,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,300	$0	$17,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,300	$0	$17,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$412,500	$0	$412,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$412,500	$0	$412,500
TOTAL				**1**	**$957,800**	**$0**	**$957,800**

2026/03/03 04:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14467115		RIASCOS PINCHAO ANDRES LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 # 29 - 93	PASTO-NARIÑO	7228852	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2046252132	9496610302	1	2026/01/07	2025/12/30	BANCOLOMBIA		$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14467115	RIASCOS ANDRES																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0	No	$870,700
Total	Afiliados(1)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0		$870,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14467115		RIASCOS PINCHAO ANDRES LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 # 29 - 93	PASTO-NARIÑO	7228852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2046252132	9496610302	I	2026/01/07	2025/12/30	BANCOLOMBIA		$870,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$480,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$0	$15,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$0	$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000	$0	$375,000
TOTAL				1	$870,700	$0	$870,700

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **ANDRES LIBARDO RIASCOS PINCHAO** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 14.467.115** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130806000100000402** aperturada el **12 de noviembre de 2013**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **806000402**
10 dígitos: **0806000402**
16 dígitos: **0806000100000402**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03** de **octubre** de **2025** a las **17:07**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
