INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRAS
CONTRATO DE OBRA N°. 1322
GRUPO 04
SEMANA DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE 2025


USI PASTALES

REPLANTEO Y EXCAVACIÓN HIDRO-SANITARIA – INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE 2 Y 4” – INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2” – CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA – RETIRO DE ESCOMBROS

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD





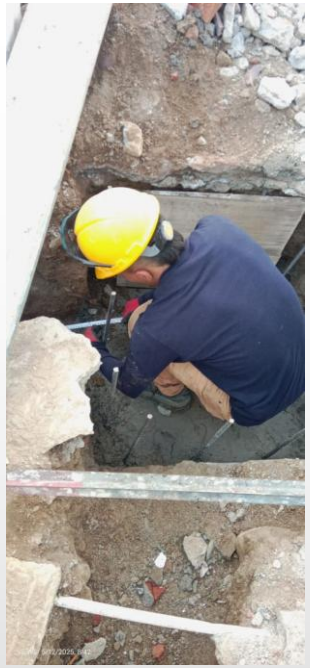









AVANCE

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 141.413.273	
EJECUTADO ACOMULADO ANTERIOR SEMANA	$ 8.800.541,17	**6,22%**
EJECUTADO PRESENTE SEMANA	$ 2.373.918,27	**1,68%**
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 10.523.578,44	**7,44%**

USI CHAPETÓN

DEMOLICIÓN DE PAÑETE – PAÑETE – GRANIPLAST – ALISTADO – CARTERAS – FILOS Y REMATES – ENCHAPE PARED BALDOSA FACHADA

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD















AVANCE

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 305.515.336	
EJECUTADO ACOMULADO ANTERIOR SEMANA	$ 11.043.708,85	3,61%
EJECUTADO PRESENTE SEMANA	$ 16.043.998,02	5,25%
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 27.087.706,87	8,87%


USI SAN JUAN DE LA CHINA


DEMOLICIÓN DE MUROS – DEMOLICIÓN DE ENCHAPE – DEMOLICIÓN DE PAÑETE – DEMOLICIÓN DE APARATOS SANITARIOS – DEMOLICIÓN DE MARCOS Y PUERTAS – DEMOLICIÓN DE VENTANAS – EXCAVACIÓN MANUAL – RETIRO DE ESCOMBROS

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD





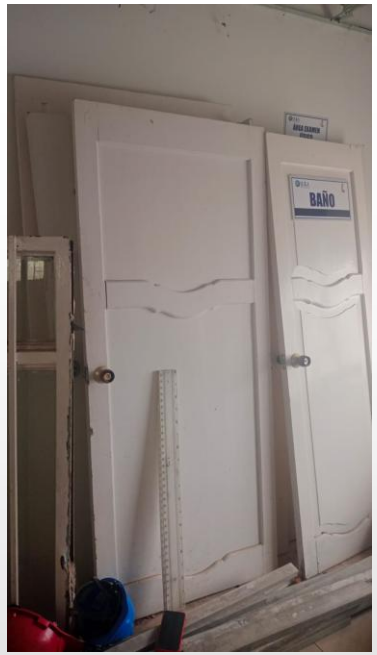

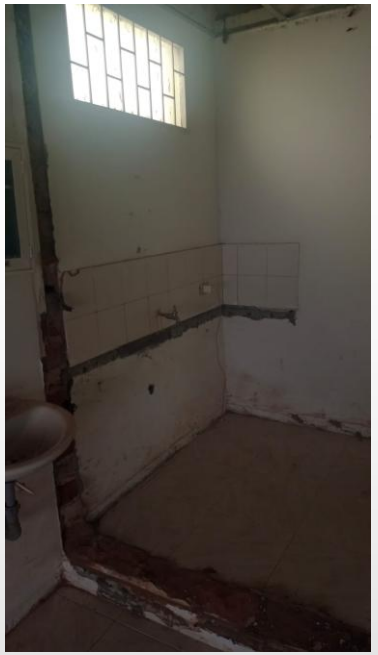







REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD









AVANCE

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 307.773.419	
EJECUTADO ACOMULADO ANTERIOR SEMANA	$ 0	
EJECUTADO PRESENTE SEMANA	$ 15.225.122,21	4,95%
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 15.225.122,21	4,95%
