
INFORME DE AVANCE DE OBRAS CONTRATO DE OBRA N°. 1322 GRUPO 04 (PASTALES, CHAPETON, SAN JUAN DE LA CHINA Y LAURELES) 875,259,119

USI PASTALES

INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA DE 2 Y 4” – INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2” – CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SANITARIA – RELLENO DE EXCAVACIONES DE TUBERÍA – ALISTADO DE PISO – INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA DE CUBIERTA – INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD




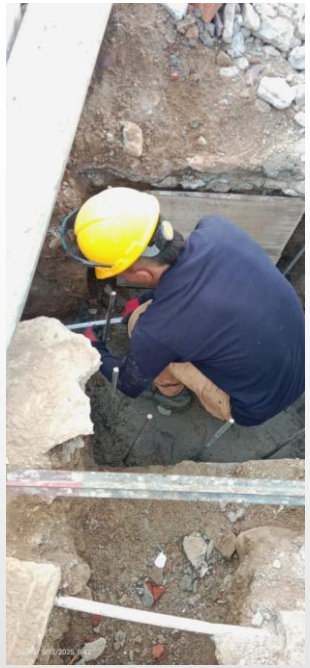







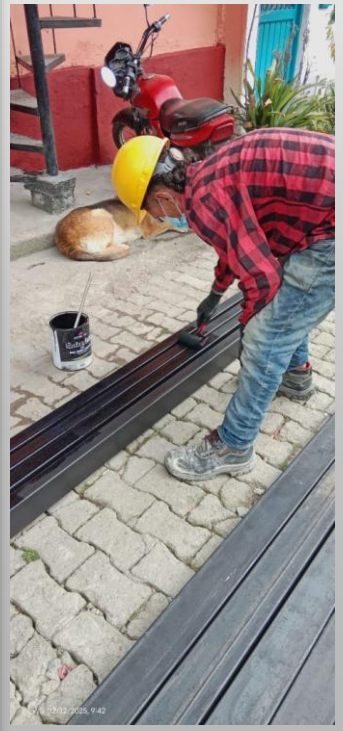







AVANCE

CONTROL DE AVANCE POR CAPITULOS DEL CENTRO DE SALUD.				
ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PRESUPUESTAL CAPITULO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR CAPITULO
0,079%	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 119.556	$ 119.556,43	100,000%
0,367%	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	$ 558.976	$ 558.976,21	100,000%
0,065%	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	$ 99.535	$ 99.535,01	100,000%
0,298%	DESMONTE ENCHAPE PARED	$ 453.371	$ 453.370,62	100,000%
0,202%	DEMOLICION DE PAÑETE	$ 307.993	$ 307.993,11	100,000%
0,189%	DESMONTE MARCO Y PUERTA	$ 288.031	$ 288.031,24	100,000%
0,168%	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 256.028	$ 256.027,77	100,000%
1,679%	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	$ 2.556.769	$ 2.556.768,86	100,000%
0,773%	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	$ 1.176.912	$ 1.176.912,00	100,000%
0,116%	DESMONTE VENTANAS	$ 177.120	$ 177.119,58	100,000%
0,009%	DEMOLICION MANUAL DE MESON EN CONCRETO A=0.60M	$ 13.504	$ 13.503,62	100,000%
0,552%	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	$ 840.737	$ 700.000,00	83,260%
1,161%	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	$ 1.768.016,04	$ 1.154.643,36	65,307%
0,653%	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO (INCLUYE CARGUE)	$ 994.643	$ 411.476,00	41,369%
0,517%	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	$ 787.718,00	$ 787.718,00	100,000%
0,150%	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	$ 228.280	$ 228.280,00	100,000%
0,068%	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	$ 103.920,81	$ 103.920,81	100,000%
1,016%	RED SANITARIA PVC-S 4"	$ 1.547.422,10	$ 1.547.422,10	100,000%
0,708%	RED SANITARIA PVC-S 2"	$ 1.077.653,18	$ 1.077.653,18	100,000%
0,007%	RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO	$ 9.960,72	$ 9.960,72	100,000%
0,071%	PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS	$ 108.098,64	$ 108.098,64	100,000%
0,150%	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	$ 228.280,00	$ 228.280,00	100,000%
0,034%	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO	$ 52.494,72	$ 52.494,72	100,000%
0,031%	VÀLVULA DE REGISTRO 1/2"	$ 46.569,41	$ 46.569,41	100,000%
0,066%	SALIDA SANITARIA PVC-S 4"	$ 100.089,00	$ 100.089,00	100,000%
2,062%	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	$ 3.140.603,74	$ 1.786.053,00	56,870%
7,706%	SUMINUSTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA UPVC BLANCA	$ 11.736.241,04	$ 5.214.784,00	44,433%
0,517%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA UPVC	$ 786.794,98	$ 354.126,00	45,009%
6,840%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS EN ACERO GRADO 50	$ 10.415.982,03	$ 6.579.612,00	63,168%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 13.356.184,64**	**$ 26.499.945,41**	**17,40%**

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 152.291.217,38	
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 26.499.945,41	**17,40%**

USI CHAPETÓN

PAÑETE – GRANIPLAST – ALISTADO – CARTERAS – FILOS Y REMATES – ENCHAPE PARED BALDOSA FACHADA

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD















AVANCE

CONTROL DE AVANCE POR CAPITULOS DEL CENTRO DE SALUD.				
ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PRESUPUESTAL CAPITULO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR CAPITULO
0,064%	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.1 M	$ 196.969,22	$ 196.969,22	100,000%
0,407%	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	$ 1.244.216,66	$ 1.244.216,66	100,000%
0,013%	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	$ 39.602,91	$ 39.602,91	100,000%
0,092%	DEMOLICION ENCHAPE MUROS	$ 282.332,36	$ 282.332,36	100,000%
0,804%	DEMOLICION DE PAÑETE	$ 2.457.240,31	$ 2.457.240,30	100,000%
0,373%	DESMONTE MARCO Y PUERTA	$ 1.138.683,49	$ 1.138.683,49	100,000%
0,115%	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 352.038,18	$ 352.038,18	100,000%
1,277%	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	$ 3.900.486,44	$ 3.602.154,00	92,351%
0,832%	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN PVC CON SU ESTRUCTURA	$ 2.543.222,82	$ 2.543.222,82	100,000%
0,193%	DESMONTE VENTANAS METALICAS	$ 591.100,83	$ 591.100,83	100,000%
0,440%	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	$ 1.344.982,34	$ 350.000,00	26,023%
4,617%	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	$ 14.105.734,72	$ 3.605.742,70	25,562%
3,074%	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	$ 9.390.635,97	$ 3.891.214,00	41,437%
4,213%	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=0.04	$ 12.870.105,19	$ 12.870.105,19	100,000%
0,112%	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	$ 342.639,47	$ 342.639,47	100,000%
0,321%	TRANSPORTE DE MATERIAL A SITIO (INCLUYE CARGUE)	$ 979.944,14	$ 100.500,00	10,256%
1,166%	CARTERAS EN VENTANAS Y PUERTAS	$ 3.562.882,65	$ 2.914.122,24	81,791%
0,967%	FILOS Y REMATES EN PAREDES	$ 2.952.978,61	$ 2.000.980,00	67,761%
2,573%	ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA PARA TRATAMIENTO IMPERMEABILIZANTE EN MUROS	$ 7.862.059,66	$ 4.800.100,00	61,054%
0,000%				
0,000%				
0,000%				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 66.157.855,99**	**$ 43.322.964,38**	**14,18%**

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 305.515.336	
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 43.322.964,38	14,18%


USI SAN JUAN DE LA CHINA


DEMOLICIÓN DE MUROS – DEMOLICIÓN DE ENCHAPE – DEMOLICIÓN DE PAÑETE – DEMOLICIÓN DE APARATOS SANITARIOS – DEMOLICIÓN DE MARCOS Y PUERTAS – DEMOLICIÓN DE VENTANAS – EXCAVACIÓN MANUAL – RETIRO DE ESCOMBROS

REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD





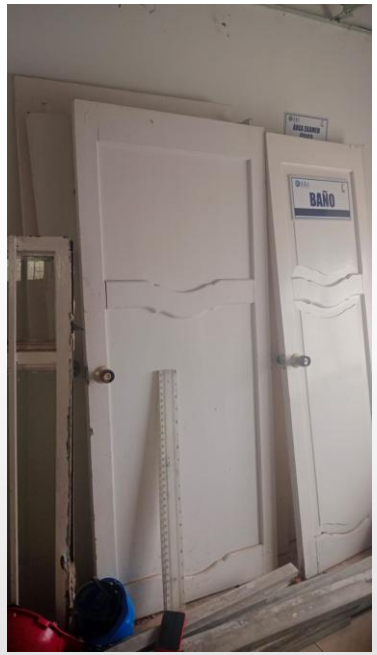

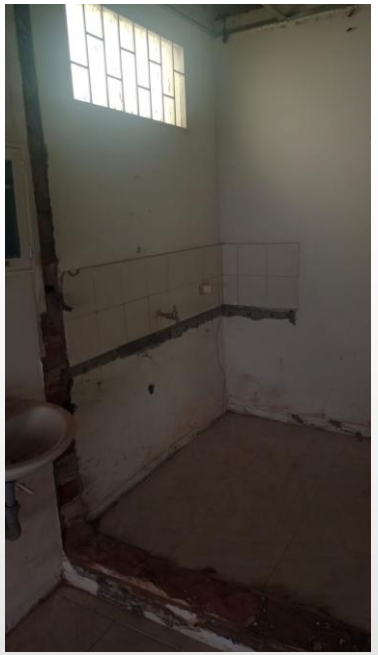







REGISTRO FOTOGRAFICO POR ACTIVIDAD









AVANCE

CONTROL DE AVANCE POR CAPITULOS DEL CENTRO DE SALUD.				
ITEM	ACTIVIDADES	VALOR PRESUPUESTAL CAPITULO	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE POR CAPITULO
0,039%	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	$ 119.556	$ 119.556,43	100%
0,182%	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS	$ 558.976	$ 558.976,21	100,000%
0,032%	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	$ 99.535	$ 99.535,01	100,000%
0,147%	DESMONTE ENCHAPE PARED	$ 453.371	$ 453.370,62	100,000%
0,100%	DEMOLICION DE PAÑETE	$ 307.993	$ 287.465,00	93,335%
0,094%	DESMONTE MARCO Y PUERTA	$ 288.031	$ 288.031,24	100,000%
0,083%	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	$ 256.028	$ 256.027,77	100,000%
0,831%	DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA	$ 2.556.769	$ 2.556.768,86	100,000%
0,382%	DESMONTE VENTANAS	$ 1.176.912	$ 1.176.912,00	100,000%
0,973%	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	$ 2.994.936	$ 1.547.896,00	51,684%
8,011%	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	$ 24.656.968	$ 16.740.223,91	67,892%
0,023%	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	$ 71.964,000	$ 71.964,00	100,000%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 33.541.039,25**	**$ 24.156.727,05**	**7,85%**

AVANCE

INFORMACION DE AVANCE.	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE
INICIAL PRESUPUESTADO	$ 307.773.419	
EJECUTADO TOTAL ACOMULADO	$ 24.156.727,05	7,85%
