CONSORCIO
POLIDEPORTIVOS COMUNAS

INFORME IMPREVISTOS DEL ACTA PARCIAL No.3

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:

DEL 10 DE ENERO DE 2026 AL 25 DE ENERO DEL 2026



CONTRATO DE OBRA N° 2602 DE 2025

OBJETO: "*CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS*

***DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA*"**

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS

REPRESENTANTE LEGAL: ING. DANIELA ALEJANDRA USMA VALLE




IBAGUE -TOLIMA

2026

CONSORCIO
FELIDEPORTIVOS COMUNAS

INFORME IMPREVISTOS DEL ACTA PARCIAL No.3

CONTRATO DE OBRA N° 2602 DE 2025

DOCUMENTO:	**INFORME IMPREVISTOS ACTA PARCIAL No.3**
ELABORADO POR:	**Nombre: Ing Yeisy Martinez**
	Firma 
Vo. Bo.	**Nombre: Ing Francisco Restrepo**
	Firma 
	Nombre: ing. Daniela Alejandra Usma Valle
	Firma 
FECHA	**25 de enero de 2026**

CONSORCIO
POLIDEPORTIVOS COMUNAS

CONTENIDO

1. **INTRODUCCIÓN** 3
2. **PRELIMINARES** 4
   - 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
     - *2.1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL* 4
     - *2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA* 5
     - *2.1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO* 5
3. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** 6
   - 3.1 DATOS GENERALES: 6
   - 3.2 CRONOLOGIA ACTUAL 7
4. **DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES IMPREVISTAS EJECUTADAS** 8
5. **PRESUPUESTO EJECUTADO DE IMPREVISTOS** 13
   - 5.1 VALOR IMPREVISTO 13
   - 5.2 RELACION DE GASTOS 13

LISTA DE IMÁGENES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZACIÓN GENERAL IBAGUÉ TOLIMA 4
ILUSTRACIÓN 2 UBICACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN PERÍMETRO URBANO 6

LISTA DE TABLAS

TABLA 1 LOCALIZACIÓN PUNTUAL DE POLIDEPORTIVOS 5
TABLA 2 **CONDICIONES DEL CONTRATO** 6

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento, me permito presentar y soportar los gastos de imprevistos que se han efectuado durante el desarrollo del contrato de obra N° 2602 DE 2025 que tiene como objeto "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", suscrito entre la gobernación del Tolima y el CONSORCIO POLIDEPORTIVO COMUNAS.

Dentro contrato de obra N° 2602 DE 2025, La ciudad de Ibagué enfrentando un reto significativo en el ámbito de la infraestructura deportiva, ya que varios polideportivos se encuentran en un avanzado estado de deterioro, este proyecto de intervención tiene como objetivo el mejoramiento y la rehabilitación de doce

(12) polideportivos ubicados en 8 comunas de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fomentar el entorno saludable.

Una vez iniciadas las actividades de obra a la fecha se viene adelantando actividades en cada uno de los polideportivos; obras que se reflejan en el presente informe para el pago del acta parcial no. 3, que comprende el periodo de 10 de enero del 2026 al 25 de enero del 2026.

2. PRELIMINARES

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

Ibagué, departamento del Tolima (Colombia), localizado en el centro del Tolima.



Ilustración 1 Localización general Ibagué Tolima

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ibagué capital musical de Colombia, situado en el departamento de Tolima. Limita por el norte con el municipio de Anzoátegui, por el sur con Rovira y San Luis, por el este con el municipio de Alvarado, Piedras, Coello y por el oeste con Cajamarca y el departamento del Valle del Cauca.

2.1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se localizan en la ciudad de Ibagué Tolima, ubicados con las siguientes direcciones: polideportivo barrio San Diego, polideportivo barrio Jordán 7 etapa, polideportivo "Tulipanes" barrio el Edén, polideportivo barrio el Limón, polideportivo barrio Jardín Atolsure, polideportivo barrio Américas, polideportivo barrio Departamental, polideportivo barrio Alto de la Cruz, polideportivo barrio Venecia, polideportivo barrio Villa Claudia, polideportivo barrio Miramar y polideportivo barrio Cerros de Granate. Estos consisten en ***"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"***.

Tabla 1 localización puntual de polideportivos

Comuna	Polideportivo	Propiedad	Coordenadas
Comuna 2	Polideportivo San diego	Municipio de Ibagué	4.452801,-75,241456
Comuna 5	Polideportivo B. Jordán 7ma etapa	Municipio de Ibagué	4.443952,-75,192116
	Polideportivo Tulipanes Barrio Eden	Municipio de Ibagué	4.444515,-75,202127
Comuna 7	Polideportivo Barrio El Limón	Gestora Urbana	4.441556,-75,150019
Comuna 8	Polideportivo Barrio Jardin Atolsure	Municipio de Ibagué	4.439342,-75,180955
Comuna 10	Polideportivo Barrio América	Municipio de Ibagué	4.431516,-75,225941
	Polideportivo Barrio Departamental	Municipio de Ibagué	4.439342,-75,221936
Comuna 11	Polideportivo Barrio Alto de la Cruz	Municipio de Ibagué	4.4390095,-75,219592
Comuna 12	Polideportivo Barrio Venecia	Municipio de Ibagué	4.434684,-75,246273
	Polideportivo Barrio Villa Claudia	Municipio de Ibagué	4.425597,-75,239149

Comuna 13	Polideportivo Barrio Miramar	Municipio de Ibagué	4.420509,-75,256404
	Polideportivo Cerros de Granate	Municipio de Ibagué	4.428684,-75,253451



Ilustración 2 Ubicación de polideportivos en perímetro urbano

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1 DATOS GENERALES:

Tabla 2 Condiciones del contrato

CONTRATO DE OBRA No.	2602 DE 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA	10 DE JULIO DE 2025
OBJETO	"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
CONTRATISTA	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS

REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA ALEJANDRA USMA
NIT DEL CONTRATISTA	**901958922 – 6**
DIRECCIÓN CONTRATISTA / CONTACTOS	CARRERA 7 NO. 9-47 GARZÓN HUILA
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT DEL CONTRATANTE	800.113.672-7
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA-GOBERNACION	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERDEPORTES 2025
NIT INTERVENTORIA	901958323-4
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA
DIRECCION INTERVENTORIA/CONTACTOS	CRA 5ª #18-25
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL OCHCOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.844.979.590,40) , MCTE exentos de IVA
VALOR ADICION	NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 919.885.389,80)
VALOR INICIAL + VALOR ADICION	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($2.764.864.980,20) M/CTE – EXCENTOS DE IVA.
UBICACION	IBAGUÉ – TOLIMA
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA MODIFICATORIA No. 01	ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA -11-12-2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCION TOTAL	DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION, FECHA DE TERMINACION 26 DE FEBRERO DE 2026

3.2 CRONOLOGIA ACTUAL

1	Fecha de inicio	01/08/2025
2	Tiempo de ejecución	162 Dias

PERIODO		AVANCE TOTAL SEGÚN ACTA PARCIAL No. 03
DESDE	HASTA	%
01/08/2025	09/01/2026	52.68%

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES IMPREVISTAS EJECUTADAS

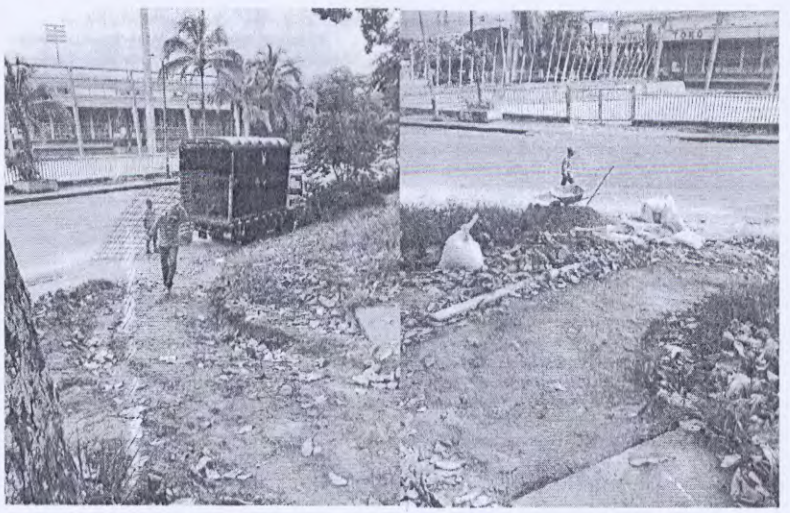
1.1 EJECUCIÓN DE OBRA, ACTIVIDAD

POLIDEPORTIVO ALTO DE LA CRUZ

- Anden de acceso

Dado las condiciones del sitio y la maniobrabilidad de la maquinaria para la demolición de la placa, retiro e ingreso de material. Se daño el andén de acceso por el peso y paso continuo de la miniexcavadora, anden que se reconstruyo y se dejó tal cual estaba, con la misma forma y pendiente.

Anden de 9.70M de largo x 1.00M de ancho, se realizó en debida forma, con capa de recebo compactado de 10cm y malla electrosoldada de 6MM, placa de espesor de 10cm.





- Recebo compactado

Cuando se empezó a realizar la excavación de la cancha para el recebo compactado se encontró que todo el terreno sobre el costado del caño tenía humedad; situación que empeoro por el clima, debido a las lluvias el terreno se empantano y fue necesario excavar de mas para poder retirar el material no apto para la nueva placa lo que ocasionó un incremento de recebo.

Se necesitaron 3.15M3 de mas para poder nivelar en ese costado de 9.00 m de largo x 3.50 m de ancho.





- Pintura de tráfico pesado para cancha

Debido a la condición climática, hubo muchos inconvenientes con la aplicación de la pintura de trafico para canchas dado que amanecía haciendo buen clima, pero se paraban las actividades en la tarde debido a las lluvias lo que ocasionó perdida de pintura ya que también llovía en la noche

y en la madrugaba lo que ocasionó que al día siguiente la pintura tuviera burbujas que soplaron la pintura.

Como resultado se tuvo que volver a raspar y lijar la pintura en muchas partes para volver a aplicar, el resultado fue de 4 a 5 capas de pintura para cada color, cuando el ítem contractual solo tiene en cuanta 2 capas por color.



Adicionalmente se aplicó antioxidante para solucionar problemas de humedad y Acronat para asegurar que la pintura no se siguiera desprendiendo.

POLIDEPORTIVO CERROS DE GRANATE

- Acondicionamiento del acceso para entrada de maquinaria

Debido a la condición del terreno fue necesario utilizar 4M3 de recebo compactado para acondicionar el acceso de la moto niveladora para la nivelación de la cancha con subrasante de arena.

Dado que se tuvo que hacer la viga de confinamiento perimetral para contener la arena previa a la nivelación, no fue posible ingresar la maquinaria por otro lado.



- Pañete de muro

Para el pañete de la cara del muro debajo de la gradería fue necesario colocar una malla con vena para garantizar calidad constructiva ya que el espesor del pañete superaba los 5cm en algunos puntos.





Costos

Actividad	Valor	
compra de pintura para altos de la cruz	$ 818,000	factura 17226
actividades varias	$ 3,474,539	Factura DYNAMO
TOTAL	**$ 4,292,539.17**	

Desglose factura Dynamo

actividades imprevista	und	cantidad	valor unitario	valor total
instalacion y compactacion de recebo en anden	m3	0.97	$ 142,100.77	$ 137,838
malla electrosoldada	m2	9.70	$ 26,875.70	$ 260,694
anden en concreto	m2	9.70	$ 94,204.14	$ 913,780
suministro e instalacion de recebo en cancha	m3	3.15	$ 142,100.77	$ 447,617
Jornales para aplicación y correctivos de pintura	jr	3	$ 75,000	$ 225,000
suministro e instalacion de recebo en cerros de granate	m3	4	$ 142,100.77	$ 568,403
suministro e instalacion de malla con vena	gl	$ 1	$ 100,000	$ 100,000
				$ 2,653,333
	A		24%	$ 636,799.85
	I		1%	$ 26,533.33
	U		5%	$ 132,666.64
	IVA		19%	$ 25,206.66
				$ 3,474,539

4.2 Gasto de Bodega

Durante la ejecución del contrato de obra para la intervención de los polideportivos, se identificó la necesidad de disponer de una bodega destinada al almacenamiento seguro de materiales, herramientas, equipos menores y elementos de protección personal. Este espacio resulta indispensable para garantizar la correcta logística de obra, la preservación de los insumos y la continuidad de las actividades constructivas, especialmente considerando la dispersión geográfica de los frentes de trabajo y la necesidad de mantener inventarios controlados.

Es importante señalar que el costo asociado a la bodega no se encuentra contemplado dentro de la administración del contrato, Sin embargo, su implementación se volvió necesaria para asegurar el adecuado manejo de materiales, evitar pérdidas o deterioro, optimizar los tiempos de ejecución y cumplir con las condiciones mínimas de orden y seguridad exigidas en obra.

La disponibilidad de este espacio contribuye directamente al cumplimiento de los estándares de seguridad industrial, almacenamiento y control establecidos en la normatividad vigente, así como a la eficiencia

operativa del proyecto. Por tratarse de un recurso indispensable para el desarrollo de las actividades y no previsto inicialmente, se registra como imprevisto dentro del presente informe

Costos

BODEGAS - cuentas de cobro anexas

ADRIANA ALVAREZ GARCIA	Polideportivo altos de la cruz	diciembre - enero	$ 275,000.00
Alejandra Martinez Ortiz	principal para polideportivos en ejecucion	enero	$ 500,000.00
			$ 775,000.00

5. PRESUPUESTO EJECUTADO DE IMPREVISTOS

5.1 VALOR IMPREVISTO

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.	OBRA EJECUTADA		
				ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.	PRESENTE ACTA No. 03	ACUMULADO TOTAL
SUBTOTAL		**$ 1 419 215 069.53**	**$ 2 126 819 215.53**	**$ 616 274 125.03**	**$ 504 178 923.20**	**$ 1 120 453 048.23**
ADMINISTRACIÓN	24%	$ 340 611 616.69	$ 510 436 611.73	$ 147 905 790.01	$ 121 002 941.57	$ 268 908 731.58
IMPREVISTOS	1%	$ 14 192 150.70	$ 21 268 192.16	$ 6 162 741.25	$ 5 041 789.23	$ 11 204 530.48
UTILIDAD	5%	$ 70 960 753.48	$ 106 340 960.78	$ 30 813 706.25	$ 25 208 946.16	$ 56 022 652.41
SUBTOTAL AIU		**$ 425 764 520.87**	**$ 638 045 764.67**	**$ 184 882 237.51**	**$ 151 253 676.96**	**$ 336 135 914.47**
VALOR TOTAL		**$ 1 844 979 590.40**	**$ 2 764 864 980.20**	**$ 801 156 362.54**	**$ 655 432 600.18**	**$ 1 456 588 962.70**

5.2 RELACION DE GASTOS

Cuadro Gastos justificados en el presente informe

		Valor
4.1	Ejecución de actividades en obra imprevistas	$ 4.292.539,17
4.2	Gasto de Bodega	$ 775.000
	Valor Total imprevistos del presente informe	**$ 5.067.539,17**
	Valor imprevistos por cobrar justificado en acta 2	**$ 1.548.458,72**
	Valor por cobrar en la presente Acta	**$ 5.041.789,23**

Balance Acumulado de Imprevistos

VALOR JUSTIFICADO INFORME IMPREVISTOS 1		**$ 2.100.000**
VALOR JUSTIFICADO INFORME IMPREVISTOS 2		**$ 5.611.200**
VALOR JUSTIFICADO INFORME IMPREVISTOS 3		**$ 5.067.539,17**

CONSORCIO
PELIDEPORTIVOS COMUNAS

VALOR COBRADO EN IMPREVISTOS ACTA PARCIAL 1	$ 1.957.271,69	
VALOR COBRADO EN IMPREVISTOS ACTA PARCIAL 2	$ 4.205.469,56	
VALOR COBRADO EN IMPREVISTOS ACTA PARCIAL 3	$ 5.092.018,14	
VALOR POR COBRAR JUSTIFICADO	$ 1.574.208,69	
SUMAS IGUALES	**$ 12.778.739,17**	**$ 12.778.739,17**

Elaboró:

Ing Yeisy Martinez
Residente de obra

Reviso :

Ing Francisco Restrepo
Director de obra

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO

GRUPO EMPRESARIAL DYNAMO S.A.S
Nit: 901327150-1 Responsable de IVA.

CL 68 A 28 70 BRR CANTABRIA IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3112066860

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEE 50

Adquiriente CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS	**Fecha** Mar-10-2026	**Forma y metodo de pago** CREDITO CUENTAS POR COBRAR	
Identific. NIT 901958922-6 **Tels:**			
Direccion	**Vencimiento** Mar-10-2026	**Estrato**	**Uso**

#	REF/COD.	DETALLE	PERIODO	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	017	ACTIVIDADES ADICIONALES CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS	Marzo-2026	1.00	2,653,333.00	2,653,333.00
2	004	ADMINISTRACION	Marzo-2026	1.00	636,799.85	636,800.00
3	005	IMPREVISTOS	Marzo-2026	1.00	26,533.33	26,534.00
4	006	UTILIDAD	Marzo-2026	1.00	132,666.64	132,667.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 0.00%	3,316,667	0
IVA 19.00%	132,667	25,206

Subtotal	**3,449,334.00**
Iva/Inc	**25,206.73**
TOTAL$	**3,474,541.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764103587790 de Dic-23-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Dic-23-2027 Rango: FEE 1-1000

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS mcte.

CONSUMO HISTORICO	
Promedio	0
2026-Feb	0
2026-Ene	0
2025-Dic	0
2025-Nov	0
2025-Oct	0
2025-Sep	0

CONSUMO ACTUAL	
Consumo	0
Lect. actual	0
Lect. anterior	0
Medidor:	
Tarifa:	
	" "

VALORACION CONSUMO				
Rango		VrMt2	Consumo	Total
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0

Meses vencidos 1

CUFE: 55f1fce2c90e1dae6faa48d1b83cf45b033ede24681b0ae6b256c3964da2f995c384483fb1472b06921907baf65d6adf
Fecha generación: 2026-03-10T09:21:00 Fecha expedición: 2026-03-10T09:28:38 Elaboró: ALEJANDRA MARTINEZ Pág: 1/1

‰†lRèèèèèèp4èèèR†Gè$@ul†Á4:#*vŠ
(415)0000000000000(8020)00000050(3900)04328541(96)20260310

CONSORCIO
PELIDEPORTIVOS COMUNAS

Ibagué – Tolima

Cuenta de cobro 001

CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS
NIT. 901872537-2

DEBE:

ADRIANA ALVAREZ GARCIA
CC 65775483

LA SUMA DE 275.000 MCTE DOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de arrendamiento de bodega para acopio de materiales desde 17 de diciembre 2025 al 31 de enero de 2026 **"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

Por medio de
Gracias por su atención.

Cordial saludo.

ADRIANA ALVAREZ GARCIA
CC.: 65775483
Celular: 322 7913798

PINTURAS ACRILFLEX CALIDAD HECHA COLOR

IVAN ARIEL OTAVO SALAZAR
Nit: 93414400-9 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 23 N° 4A 39 IBAGUE TOLIMA Tel. 6082794332

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEA 17226

Adquiriente CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS		**Fecha**	**Forma y metodo de pago**
Identific. NIT 901958922-6 Tels:3103030295		Feb-25-2026	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Direccion CR 7 9 47 CA 1 GARZON - HUILA		**Vencimiento**	**Vendedor**
		Feb-25-2026	OTAVO SALAZAR

#	REF/COD.	DETALLE	UNIDAD	MARCA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	04533	PINTURA PARA CANCHAS AZUL CUÑ	CUÑ	SAPOLIN	19	1.00	445,378.15	445,378.15
2	04107	PINTURA PARA CANCHAS BLANCO GL	GL	PINTUCO	19	1.00	80,672.27	80,672.27
3	04535	PINTURA PARA CANCHAS AMARILLO SAPOLIN GALON	GALON	SAPOLIN	19	2.00	80,672.27	161,344.54

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	687,394.96	130,605.04	**Subtotal**	**687,394.96**
					Iva/Inc	**130,605.04**
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764101242527 de Nov-07-2025 Vigencia: 6 meses Vence: May-07-2026 Rango: FEA 15699-20000					**TOTAL$**	**818,000.00**

Son: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 06812225097
NEQUI 3108618118
DAVIVIENDA 166170397482

PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS

CUFE: 01f41ad8e811dcbe9aff4bcdde5786cd0c623f6adc5b4e5c75322b11d0d260107c916d60266420f6e1cb602e5e446441
Fecha generación: 2026-02-25T18:20:00 Fecha expedición: 2026-02-25T18:20:27 Elaboró: MARIA VICTORIA Pág: 1/1

2 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No. AM02.26

Consorcio Polideportivos Comunas

NIT. 901.958.922-6

DEBE A:

ALEJANDRA MARTINEZ ORTIZ

C.C 1.005.752.488

La suma de:

Quinientos mil pesos ($500.000)

Por concepto de:

Arriendo de bodega a Consorcio polideportivos Comunas cuyo objeto es, "CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por el mes de **ENERO.**

ALEJANDRA MARTINEZ ORTIZ
C.C 1.005.752.488
