

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALLE 10 ENTRE CARRERA 6 Y 4 A BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA**	**85 días**	**$ 119.997.000,00**	**vie 6/02/26**	**vie 5/06/26**	
2		**INICIO**	0 días	$ 0,00	vie 6/02/26	vie 6/02/26	
3		**PRELIMINARES**	**8 días**	**$ 11.209.157,14**	**lun 9/02/26**	**mié 18/02/26**	
4		DEMOLICIÓN CONCRETO EMPEDRADO Y ADOQUIN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)	2 días	$ 9.743.580,00	jue 12/02/26	lun 16/02/26	
5		DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05M	8 días	$ 1.465.577,14	lun 9/02/26	mié 18/02/26	
6		**CIMIENTOS**	**31,88 días**	**$ 68.997.774,96**	**mié 4/03/26**	**jue 16/04/26**	
7		EMPEDRADO GRAVILLA CANTO RODADO DE RIO REPARCHEOS	18,88 días	$ 15.335.308,15	vie 13/03/26	mié 8/04/26	8FC-8 días
8		CONFORMACIÓN DE BANDA VEHICULAR EN ADOQUÍN DE ARCILLA ASENTADO EN MORTERO DE 3000 PSI	22,88 días	$ 37.970.067,61	mar 17/03/26	jue 16/04/26	13FC+6 días
9		CONCRETO 3500 PSI	3 días	$ 29.611,00	mié 4/03/26	vie 6/03/26	7
10		MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	3 días	$ 333.468,24	lun 6/04/26	mié 8/04/26	9FC+20 días
11		NIVELACIÓN DE TAPA POZOS DE INSPECCIÓN	3 días	$ 562.563,40	mié 8/04/26	lun 13/04/26	7
12		NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN DE SUMIDEROS EXISTENTES (INCLUYE DEMOLICIÓN RETIRO DE SOBRANTES)	3 días	$ 924.878,67	mié 8/04/26	lun 13/04/26	7
13		BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	5 días	$ 13.841.877,89	mié 4/03/26	mar 10/03/26	15FC-6 días
14		**ITEMS NO PREVISTOS**	**38 días**	**$ 39.790.067,90**	**mié 4/03/26**	**vie 24/04/26**	
15		TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	3 días	$ 14.526.718,85	mié 4/03/26	vie 6/03/26	16CC
16		RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	3 días	$ 1.888.245,12	mié 4/03/26	vie 6/03/26	17CC
17		EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	3 días	$ 2.771.833,65	mié 4/03/26	vie 6/03/26	5;4
18		CODO 45 PVC ALCANTARILLADO 8"	3 días	$ 8.217.584,55	lun 9/03/26	mié 11/03/26	15
19		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) (FONDO DE CARCAMO)	1 día	$ 666.222,32	vie 6/03/26	vie 6/03/26	21FC-2 días
20		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (ELEVACIONES) (2 MUROS LATERALES CONFORMACION CARCAMO)	2 días	$ 2.438.831,00	lun 9/03/26	mar 10/03/26	19
21		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	3 días	$ 2.574.253,71	jue 5/03/26	lun 9/03/26	17FC-2 días
22		SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE REJILLA EN LAMINA DE 3/16"	3 días	$ 2.552.243,40	mié 22/04/26	vie 24/04/26	21;12
23		PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	2 días	$ 1.483.525,89	mié 25/03/26	jue 26/03/26	17FC-2 días
24		CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	3 días	$ 1.193.581,90	vie 27/03/26	mar 31/03/26	23
25		PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	2 días	$ 1.477.027,51	mié 1/04/26	jue 2/04/26	24
26		**FIN**	0 días	$ 0,00	vie 5/06/26	vie 5/06/26	

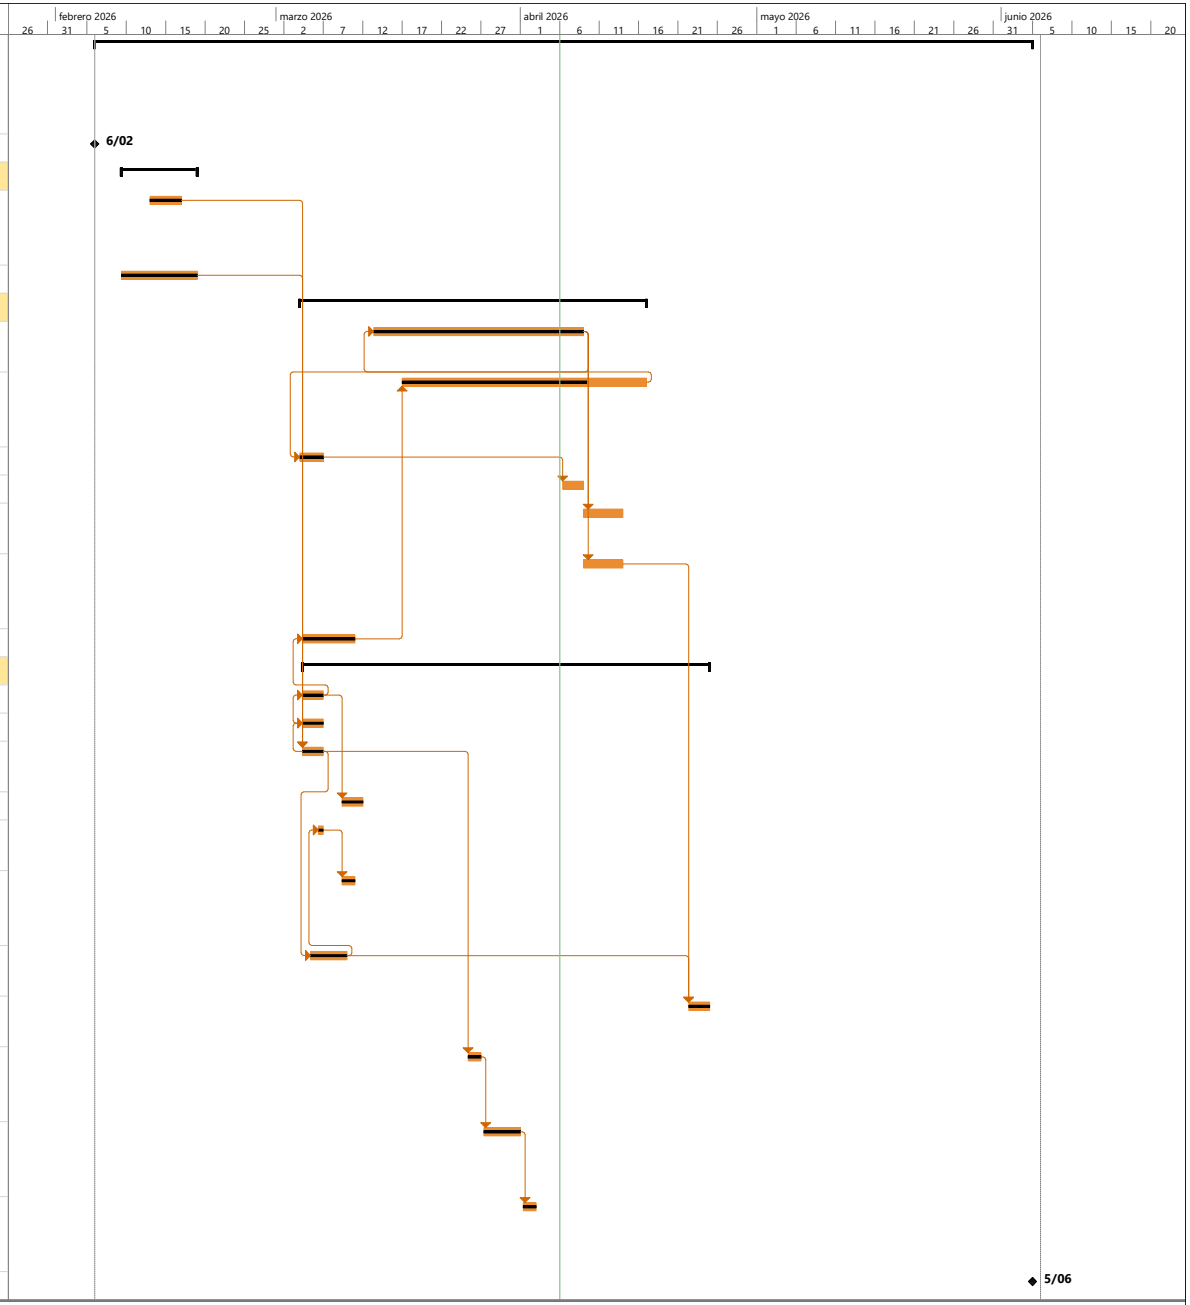

Proyecto: CRONOGRAMA MOD
Fecha: lun 6/04/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual



Proyecto: CRONOGRAMA MOD
Fecha: lun 6/04/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso

INGEMAC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

11 marzo a 8 abril

BITÁCORA DE OBRA

CO1.PCCNTR.9321511


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALLE 10 ENTRE CARRERA 6 Y 4 A BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA

INGEMAC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

INGEMAC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

BITÁCORA DE OBRA		
INGEMAC	FOLIO:	
	HOJA PORTADA	

DATOS DE LA OBRA		
NOMBRE:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALLE 10 ENTRE CARRERA 6 Y 4 A BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA	
LOCALIZACIÓN:	Calle 10 entre Carrera 6 y Carrera 4 A	
No. DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9321511	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA: 06/02/2026	REAL: 06/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMADA: 05/06/2026	REAL: 05/06/2026
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	INGEMAC	
REPRESENTANTE LEGAL	NILSON RICARDO BONILLA VARGAS	
RESPONSABLES EN LA OBRA		
DEL CONTRATISTA:		




NILSON RICARDO BONILLA VARGAS
Representante Legal

INGEMAC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

BITÁCORA DE OBRA			
Objeto contrato	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA CALLE 10 ENTRE CARRERA 6 Y 4 A BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA**		
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
001	**11-03-2026**	**Compactación mecánica Base Granular**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Secretaría de Planeación y Contratista** **Maquinaria: Vibro compactador** **El día miércoles 11 de marzo se realizó la correspondiente compactación mecánica de la Base Granular en todo el tramo de la vía, adicionalmente se realizó de manera manual en parte de las zanjas donde se realizó la instalación de material y que por condiciones geométricas la maquinaria no puede realizar.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
002	**12-03-2026**	**Revisión niveles de la vía debidamente compactada**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: Vibro compactador** **El día jueves 12 de marzo se culminó con la compactación mecánica de la vía junto con las zanjas de los costados, la cual se realizó con la verificación de niveles de manera manual de conformidad con el manejo de las aguas lluvias desde la parte superior hasta la parte inferior del tramo de vía.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
			Clima: Soleado **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A**

003	**13-03-2026**	**Instalación cajones para fundida empedrado**	**El día viernes 13 de marzo una vez fueron verificados los niveles de la vía se procedió con realizar el correspondiente armado de las cajas donde se instalará el empedrado junto con las secciones de adoquín de la vía, de esta manera se suministraron los cajones con medidas indicadas previamente para iniciar con la fundida de los mismos, para lo cual se avanzó en un total de los primeros 15 metros de la vía, iniciando desde la parte superior del tramo vial hasta terminar en la parte inferior.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
004	**14-03-2026**	**Instalación cajones para fundida empedrado**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día sábado 14 de marzo se continuó con la instalación de los cajones para realizar la fundida del empedrado, de lo cual para este día se avanzó con otro tramo correspondiente a 20 metros adicionales junto con la validación de los niveles y las condiciones topográficas del tramo vial.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
005	**16-03-2026**	**Fundida concreto tipo empedrado**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día lunes 16 de marzo se inició con la correspondiente fundida del concreto bajo una resistencia de 3000 PSI en los módulos instalados preliminarmente, así las cosas se realizó de manera manual junto con**




			la instalación de las piedras tipo canto rodado de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
006	**17-03-2026**	**Fundida concreto tipo empedrado**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día martes 17 de marzo se continuó con la respectiva fundida de concreto a la resistencia de los 3000 PSI en los otros módulos que habían sido armados con posterioridad, estos haciendo referencia a los centrales completando una longitud de 45 metros hasta el sector de la curva, los cuales se señalizaron debidamente con el fin de evitar que las personas los puedan afectar en algún momento durante su fraguado.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
007	**18-03-2026**	**Fundida concreto tipo empedrado**	**Clima: Nublado – lluvioso** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día miércoles 18 de marzo al contar con un clima tipo lluvioso hasta aproximadamente las 11 am, se realizó la fundida del concreto en los sobreanchos pendientes de los primeros 20 metros trabajados junto con los costados adicionales del tramo vial. Así las cosas se estableció un paso peatonal provisional por el costado derecho subiendo con el fin de no afectar el funcionamiento normal de la vía para las personas de**

			la comunidad que habitan en la parte superior del Barrio San Rafael.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
008	19-03-2026	Instalación cajones para fundida empedrado	Clima: Nublado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día jueves 19 de marzo se realizó la instalación de los cajones para un tramo adicional de 30 metros hacia la parte de abajo, esto hasta completar el tramo en donde se realizará la instalación del cárcamo para manejo de aguas lluvias. Adicionalmente se realizó un tipo curado al concreto instalado anteriormente con el fin de que este cumpla con las especificaciones técnicas en el diseño.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
009	20-03-2026	Fundida concreto tipo empedrado	Clima: Nublado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día viernes 20 de marzo una vez instalados los correspondientes módulos se realizó la fundida de las secciones en concreto del sector central de la vía, esto completando hasta la curva donde se instalará el cárcamo de aguas lluvias por la parte central.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
010	21-03-2026	Fundida concreto tipo empedrado	Clima: Nublado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día sábado 21 de marzo se realizó la fundida de los costados


			pendientes en el empedrado, esto junto con los sobreanchos que se tenían contemplados inicialmente para completar una longitud de 75 metros.
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
011	**24-03-2026**	**Suministro e instalación de adoquín peatonal**	**Clima: Nublado – Lluvioso** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día martes 24 de marzo se contó con un día tipo lluvioso hasta aproximadamente las 10.30 am, razón por la cual a partir de esa hora se realizó la instalación del adoquín en los sitios donde se había realizado la fundida de las placas en concreto, culminando para ese día un total de 30 metros en adoquín tanto en la parte central como en los costados de la vía.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
012	**25-03-2026**	**Suministro e instalación de adoquín peatonal e instalación sumidero**	**Clima: Soleado** **Personal presente: Contratista y Maestro de Obra** **Maquinaria: N/A** **El día miércoles 25 de marzo se culminó el tramo total con el suministro e instalación de adoquín hasta llegar al tramo de donde se encuentra el sumidero para manejo de aguas lluvias, razón por la cual para esta semana se culminó la instalación de adoquinamiento para un total de 75 metros. De igual manera, este día se realizó la instalación del respectivo sumidero con una longitud de 4 metros en lámina de 3/16" en toda la sección transversal de la vía.**

Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
013	**26-03-2026**	**Instalación cajones para fundida empedrado e inicio excavaciones del pozo de inspección**	**Clima: Nublado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día jueves 26 de marzo se realizó la instalación de los cajones para fundir las placas en concreto, esto en el sector del sumidero hacia la parte baja para una distancia de 30 metros hasta llegar al punto en donde se realizará la construcción de un pozo de inspección. Adicionalmente se realizó la correspondiente excavación para construir el pozo de inspección para un diámetro de 1.20 metros en la parte inferior de la vía.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
014	**27-03-2026**	**Fundida concreto tipo empedrado**	**Clima: Soleado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día viernes 27 de marzo se realizó la fundida en sitio del empedrado que se instalaron los módulos, esto para el sector central junto con los costados hasta llegar al punto en donde se construirá el pozo de inspección, esto teniendo presente que el sobre ancho es mínimo y el rendimiento es mayor para la realización de los trabajos en sitio.**
Consecutivo	**Fecha**	**Actividad**	**Descripción**
			Clima: Soleado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día sábado 28 de marzo se realizó la instalación de los módulos en


015	28-03-2026	Instalación cajones para fundida empedrado e inicio construcción pozo de inspección	madera de la parte baja pendientes para realizad la fundición, esto hasta completar 15 metros hacia la parte baja. Adicionalmente se inició con los trabajos para la construcción del pozo de inspección en la parte baja, inicialmente con la construcción de la placa de fondo conforme los diseños establecidos.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
016	30-03-2026	Suministro e instalación de adoquín	Clima: Soleado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día lunes 30 de marzo se realizó el suministro e instalación de adoquín en los puntos pendientes de la vía, como por ejemplo en los sobre anchos y parte de las secciones transversales que había pendientes para terminar la sección transversal de la vía.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
017	31-03-2026	Actividad por planear	Clima: Lluvioso Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día martes 31 de marzo dadas las condiciones de clima no fue posible iniciar con las labores propuestas, puesto que aproximadamente sobre las 11.30 am bajaron un poco las condiciones hidrometeorológicas en el sitio de la obra.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
			Clima: Nublado – lluvioso Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A



018	01-04-2026	Terminación placa de fondo pozo	El día miércoles 1 de abril se culminaron las labores para la construcción de la placa de fondo del pozo con un diámetro de 1.70 metros E:0.25 m a una resistencia del concreto de 3000 PSI junto con sus respectivos elementos de reforzamiento de conformidad con el diseño empleado en obra.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
019	06-04-2026	Construcción cilindro pozo ladrillo tolete Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM)	Clima: Soleado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día lunes 6 de abril se inicia con las respectivas labores para la construcción del cilindro del pozo de inspección con un diámetro de 1.20 metros E:0.25 m incluyendo el pañete interno hasta la parte superior, el cual fue proyectado dadas las condiciones topográficas de la tubería y la dirección de la misma, esto con el fin de brindar el manejo adecuado a las aguas de la vía.
Consecutivo	Fecha	Actividad	Descripción
020	07-04-2026	Construcción cilindro pozo ladrillo tolete Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM)	Clima: Nublado – lluvioso Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día martes 7 de Abril se presentaron altas precipitaciones hasta horas del medio día, por ende en horas de la tarde se realizó la verificación de niveles en la vía Calle 11 Barrio San Rafael junto con la verificación de las alturas finales del pozo de inspección.



021	08-04-2026	Construcción cilindro pozo ladrillo tolete Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM)	Clima: Nublado Personal presente: Contratista y Maestro de Obra Maquinaria: N/A El día miércoles 8 de Abril se terminó con las respectivas actividades de pañete interno en el cilindro del pozo de inspección, adicionalmente se realizó la construcción de la cubierta pozo con diámetro de 1.20 m conforme las especificaciones técnicas constructivas.



INGEMAC
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, NILSON RICARDO BONILLA VARGAS identificado con Cedula de Ciudadanía Número 1070327738 de El Colegio Cundinamarca en mi condición de representante legal de SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICOS, AMBIENTALES Y CIVILES INGEMAC SAS identificada con NIT 900616906-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En constancia, se firma en el Colegio Cundinamarca, a los 08 días del mes de abril de 2026

NILSON RICARDO BONILLA VARGAS
C. C. No. 1070327738 de El Colegio
Matrícula profesional No. No 091037-0502629 CND
Representante legal



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
213935-T
LUIS CARLOS
SILVA ALFONSO
C.C. 79865369
RESOLUCION INSCRIPCION 48 FECHA 12/02/2016
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 225731

216775
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 648 88 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 99 No. 9A - 21 Bogota D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 3 B 3 7 7 9 1 2 5 C A F E 1 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS CARLOS SILVA ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79065369 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 213935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900616906	7	INGEMAC S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	INGEMAC S.A.S	CALLE 6 # 3A-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8475496	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	76514345	9499833542	E	2026/03/03	2026/02/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070327738	BONILLA VARGAS NILSON RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$0	$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$0	$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**1**	**$542,300**	**$0**	**$0**	**$542,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900616906	7	INGEMAC S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	INGEMAC S.A.S	CALLE 6 # 3A-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8475496	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	76505649	9498036838	E	2026/02/03	2026/02/19	BANCO DAVIVIENDA	16	$548,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1070327738	BONILLA VARGAS NILSON RICARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,900	$0	$283,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$1,300	$0	$123,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$1,300	$0	$123,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$800	$0	$70,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$70,100	$800	$0	$70,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$800	$0	$70,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$800	$0	$70,900
TOTAL				**1**	**$542,300**	**$5,800**	**$0**	**$548,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900616906	7	INGEMAC S.A.S	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	INGEMAC S.A.S	CALLE 6 # 3A-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8475496	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	76500617	9496708424	E	2026/01/05	2026/02/19	BANCO DAVIVIENDA	45	$453,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070327738	BONILLA VARGAS NILSON RICARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$6,400	$0	$234,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$6,400	$0	$234,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$2,800	$0	$101,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$2,800	$0	$101,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,600	$0	$58,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000	$1,600	$0	$58,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$1,600	$0	$58,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,000	$1,600	$0	$58,600
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$12,400**	**$0**	**$453,300**
