1. **ACTA No. _____**

COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL ACCESO PORTAL DE INGRESO

2. **LUGAR:** Instalaciones del Establecimiento
3. **FECHA:** 6 marzo de 2026 (VIERNES) HORA: 10:30 AM
4. **OBJETIVOS:** Socializar la nueva configuración del acceso al portal de ingreso para optimizar la seguridad del establecimiento mediante la unificación de un solo punto de entrada.

ASISTENTES:

- **Dra. Mabel Martínez Rojas:** Directora del ERON
- **Teniente Carlos Álvarez:** Comandante de Vigilancia. INPEC
- **Ing. Nivia Guerrero:** Supervisión INPEC.
- **Ing. Keiner Gómez:** Supervisión USPEC.
- **Ing. Camilo Delgado:** Interventoría. CONSULTORES DE OCCIDENTE
- **Arq. Alvaro Murillo:** Contratista de Obra. CONSORCIO MG

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

Se realizó la socialización de la nueva configuración de acceso principal. Basándose en los planos **"PROPUESTA DE ACCESO - AMPLIADO"** y **"PERFIL MURO EXISTENTE"**, se establecieron los siguientes puntos clave:

1. Readecuación del Área de VISITOR EXISTENTE:

- Se intervendrá el **VISITOR EXISTENTE** sin demoler la pared perimetral actual.
- Se proyecta la apertura de una puerta de acceso de entrada similar a la existente en el módulo de visitantes
- **Traslado de Ventana:** Se reubicará la ventana hacia el muro lateral hacia el portón para garantizar que la guardia tenga visual directa hacia la parte externa del **PORTON.**


2. Flujo de Acceso y Circulación:

- **Control de Acceso:** El guardia de turno operará tanto el **PORTON** vehicular como el peatonal.
- **Direccionamiento:** El personal ingresará por un sendero delimitado por barandas o pasamanos que condúce directamente hacia la nueva zona de entrada del **VISITOR NUEVO.**
- **Protocolo de Seguridad:** Una vez superado el punto de control en Visitor, el flujo continúa hacia el área de **CANINOS** (zona de inspección) antes de ingresar finalmente al edificio de **CONTROL DE GUARDIA.**


3. Especificaciones del Entorno:


- Se confirma la construcción de un muro interior con malla hasta **3 metros** de altura para refuerzo perimetral.
- El diseño contempla la integración con las áreas de zona verde y anden existentes para no afectar la estética y funcionalidad del entorno.
- Se contempla que el muro existente tendrá las mismas características de uniformidad en los acabos de la entrada hasta la garita 1.

PROPUESTA DE ACCESO – AMPLIADO

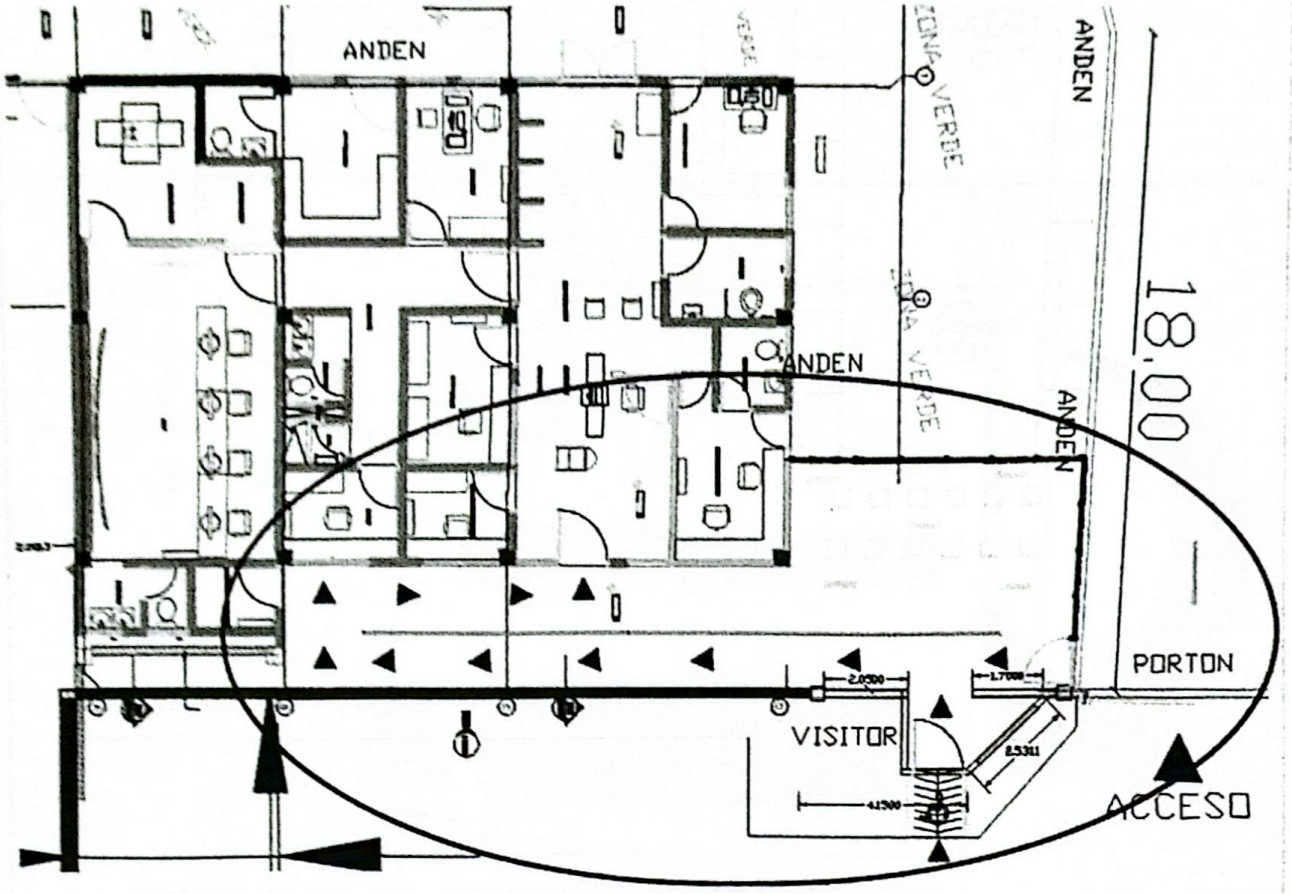

PERFIL MURO EXISTENTE

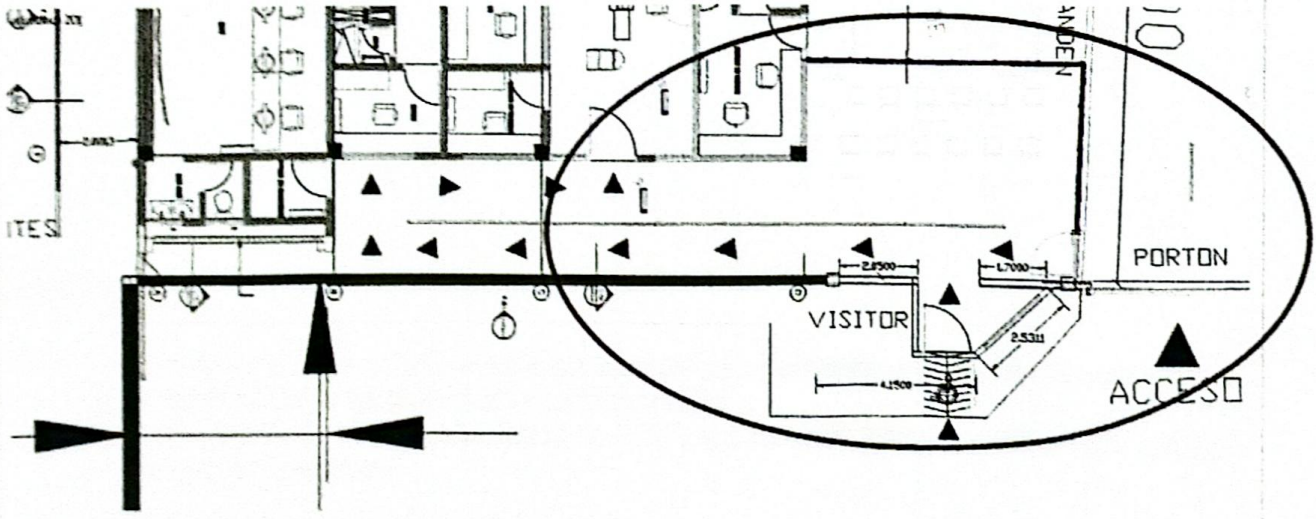

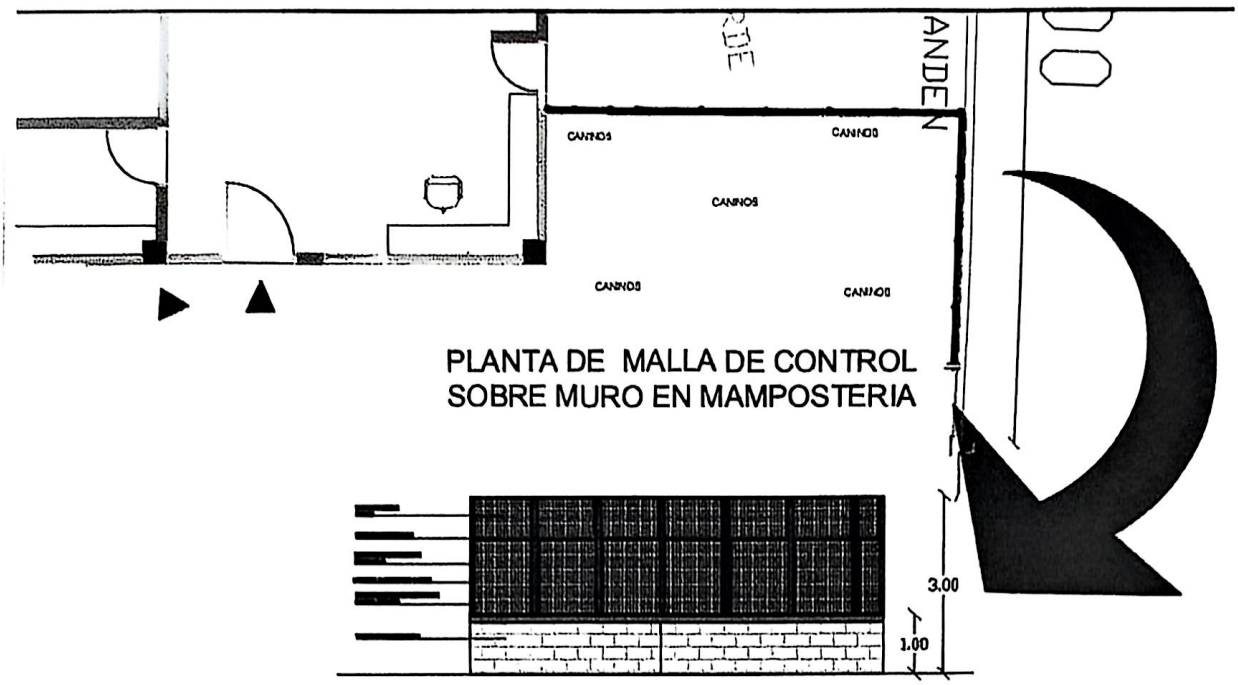

PLANTA DE MALLA DE CONTROL
SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA

FACHADA DE MALLA DE CONTROL
SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA

COMPROMISOS:

- Una vez socializado y autorizado el plano por todas las partes presentes, el contratista procederá con la ejecución inmediata de las obras civiles y complementarias.
- La interventoría realizará acompañamiento para verificar que las obras civiles y complementarias cumplan con los requisitos establecidos.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Compromisos presente comité	Responsable	Fecha del Compromiso
Se solicita que se instale vidrio blindado en el espacio que se adecuará para ingreso peatonal y puesto de servicio externo		

5. PRÓXIMA REUNIÓN

6. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
SUPERVISION USPEC	KEINER GOMEZ	
DIRECTORA DEL ERON	DRA. MABEL MARTÍNEZ ROJAS	
COMANDANTE DE VIGILANCIA. INPEC	CARLOS ÁLVAREZ	
INPEC	NIVIA GUERRERO	
INTERVENTORIA CONSULTORES DEL OCCIDENTE	CAMILO DELGADO AYAZO	
CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS MG	ALVARO MURILLO	

Ubicación archivo físico: Escriba la ubicación en la que se archiva este documento (Ej: Carpeta de Reuniones, etc.
