ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

BOGOTÁ

PROGEN
PRODUCCIONES GENERALES S.A.

SEÑALVIAS S.A.S

Socinter

CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA SUR-OCCIDENTE

CONTRATO SDM 2024-3652


INFORME MENSUAL No.12.

23 DE DICIEMBRE DE 2025 A 22 DE ENERO DE 2026


VERSIÓN 1

ENERO DE 2026

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Francy Paola Duarte Porras	Directora De Proyecto	
REALIZÓ	Daniela Orejuela Cruz	Ingeniero Residente	
REVISÓ	Kevin Amézquita Saavedra	Coordinador de obra	

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERMOVILIDAD

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Hugo Alfredo Posso Moncada	Director de interventoría	
APROBÓ	Juan Ramón Barón Zambrano	Residente de interventoría	
MODIFICACIONES			
V1	24/03/2026	ATENCIÓN OBSERVACIONES CINPOSAL–398–2026	

CONTENIDO

pág.

1. INTRODUCCIÓN 7

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 8

2.1 PÓLIZAS 9

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 10

4. PERIODO DEL INFORME 12

5. COMPONENTE DE OBRA 13

5.1 RECURSO HUMANO 13
5.2 EQUIPOS 14
5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 16
5.4 BALANCE ECONÓMICO 23
5.4.1 Suministro e instalación de la señalización 23
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO 24
5.6 GEORREFERENCIACIÓN 29

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL 32

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 33

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS 34

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 36

9. ASPECTOS TÉCNICOS 40

9.1 ESTADO DEL CLIMA 40
9.2 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES 42

10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN 42

10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS 42
10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA 43

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 43

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL 44

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 44

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS 44

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA) 44

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO 44

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 45

18. ANEXOS 46

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 1. Datos generales del Contrato 8
Tabla 2. Listado de Pólizas 9
Tabla 3. Localidades con UPZ 10
Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo 13
Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización 13
Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades 14
Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad 15
Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación 16
Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID: 20
Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes 22
Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID: 23
Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID: 29
Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato 32
Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente 33
Tabla 15. Porcentaje ejecutado por localidad 33
Tabla 16. Planes de manejo de tránsito vigentes 36
Tabla 17. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 42

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente 10

Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-12.....21

ABREVIATURAS

SDM	Secretaría Distrital de Movilidad
CSB 2025	Consorcio señalizar Bogotá 2025
PMT	Plan de manejo de transito
UPZ	Unidad de Planificación Zonal

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de noviembre de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en quince (15) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3652 con el Consorcio señalizar Bogotá 2025, el cual tiene por objeto "realizar actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS, o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 12, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por el Consorcio señalizar Bogotá 2025, durante el periodo 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3652.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla, se indica que a la fecha del presente informe se ha realizado una modificación de adición al contrato, por el contrario, no se han realizado modificaciones de suspensión o reinicio al contrato.

Tabla 1. Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM-2024-3652.
Objeto del Contrato	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	23 de enero 2025
Fecha de Terminación:	22 de noviembre de 2027
Valor total:	VEINTE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($20.048.457.275) suma que se discrimina de la siguiente manera Vigencia 2024: $2.815.721.000 Vigencia 2025: $ 6.209.487.857 Vigencia 2026: $ 6.423.895.143 Vigencia 2027: $ 3.322.369.428 Adición N° 1: $ 1.276.983.847
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS
Interventoría:	CONSORCIO INTEROBRAS POSSO-ALDEIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3667

Fuente: Elaboración propia

Respecto a aspectos del contrato como actas adicionales o modificaciones no se realizaron durante el periodo del presente Informe.

2.1 PÓLIZAS

Una vez firmado el contrato de Obra No. SDM-2024-3652 (del 23 de enero de 2025), entre el consorcio señalizar Bogotá 2025 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía Seguros del Estado SA., a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM. La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 2. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos, y se actualizaron con el acta de inicio:

Tabla 2. Listado de Pólizas

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	PÓLIZA N°	ASEGURADORA
	INICIAL	FINAL			
Cumplimiento	27/12/2024	27/04/2030	$ 6,014.537.182,50	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Prestaciones sociales	27/12/2024	27/10/2030	$ 4.009.691.455,00	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Estabilidad de la obra	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	$ 6.014.537.182,50	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	$ 6.014.537.182,50	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Amparo básico predios, labores y operaciones	27/12/2024	27/10/2027	$ 1.002.422.863,75	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Patronal	27/12/2024	27/10/2027	$ 501.211.432	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Contratistas y subcontratistas	27/12/2024	27/10/2027	$ 501.211.432	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.

Fuente: Elaboración propia

Dada la suscripción del acta de inicio el 23 de enero de 2025, se remitieron a la interventoría las pólizas correspondientes al contrato SDM-2024-3652, del Consorcio señalizar Bogotá 2025, mediante comunicación SDM-CSB2025-004, en atención a las comunicaciones CINPOSAL-002-2025, CINPOSAL-003-2025 y respuesta al traslado de los radicados SDM 202531100012811, SDM 202531100026931, con los ajustes a las vigencias, de acuerdo con el acta de inicio del contrato.

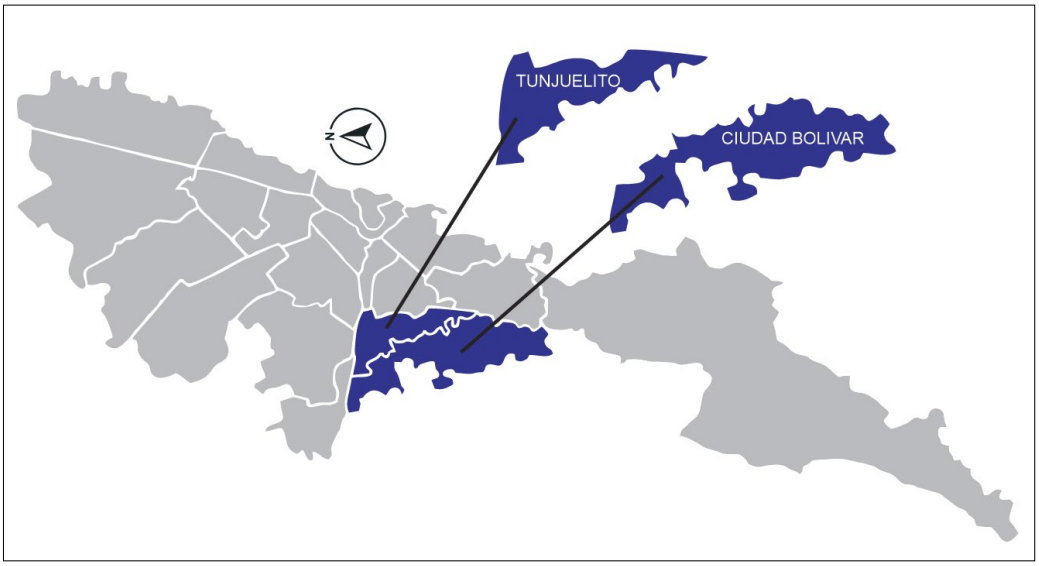
De igual forma, se realizó el ajuste correspondiente de las pólizas contractuales, conforme a la adición presupuestal aprobada el 16 de diciembre de 2025 por un valor de $1.276.983.847. Dicho ajuste se efectuó en concordancia con las condiciones del contrato y la normativa aplicable, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a la modificación contractual. Las pólizas

ajustadas fueron revisadas y aceptadas el 18 de diciembre de 2025, quedando debidamente vigentes.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la ZONA 6, ZONA SUR-OCCIDENTE, conformada por las localidades 19. Ciudad Bolívar, 06. Tunjuelito y en los corredores de la Autopista Sur Y AV Américas, en la siguiente figura, se pueden observar con detalle, las localidades que comprenden la zona 6:

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente



Fuente: Elaboración propia

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 3. Localidades con UPZ

19. Ciudad Bolívar	6. Tunjuelito
UPZ 63 El Mochuelo UPZ 64 Monte Blanco UPZ 65 Arborizadora UPZ 66 San Francisco UPZ 67 El Lucero UPZ 68 El Tesoro UPZ 69 Ismael Perdomo UPZ 70 Jerusalén	UPZ 42 Venecia UPZ 62 Tunjuelito

Fuente: Elaboración propia

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 2. descripción obra en lote o zona a intervenir, del Anexo No.1 – Anexo Técnico ADENDA 1, se tiene "…*Considerando situaciones extraordinarias y sobrevinientes la entidad podrá asignar implementación inmediata de ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, precisando que el valor de las obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del presupuesto oficial del lote,…",* previa aprobación del Comité técnico y de los responsables de área señalados en el citado numeral.

4. PERIODO DEL INFORME

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el consorcio señalizar Bogotá 2025, en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3652, para el periodo del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026.

5. COMPONENTE DE OBRA

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo y como resultado de las actividades de obra ejecutadas se dispuso de los siguientes recursos durante el período del presente informe:

5.1 RECURSO HUMANO

A continuación, se relaciona el equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo para el desarrollo del proyecto durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo

Nombres	Apellidos	Cargo
Francy Paola	Duarte Porras	Directora del proyecto
Felix Leonardo	Pulido Bastidas	Especialista en transito
Daniela	Orejuela Cruz	Residente de obra
Hector Ivan	Borda Molina	Residente de obra
Clara Consuelo	García	Trabajador social
Jeny Natalia	Ramírez Esquivel	Profesional SST
Hugo Armando	Suescún Becerra	Profesional Georreferenciación
Steven Yesid	Orejuela Cardona	Conductor
Ricardo	Fernández Sáenz	Conductor
Cindy Tatiana	Cristancho	Secretaria

Fuente: Elaboración propia

También se relacionan las cuadrillas vinculadas laboralmente para la implementación de los ID de diseño de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.7 del anexo técnico, así:

Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización

N° Cuadrilla	Nombre Cuadrilla	Actividad Principal Por Desarrollar
1	Cuadrilla NM1	Señalización Horizontal
2	Cuadrilla NM2	Señalización Horizontal
3	Cuadrilla NM3	Señalización Horizontal
4	Cuadrilla NM4	Señalización Horizontal
5	Cuadrilla QR 1	Señalización Horizontal
6	Cuadrilla QR 2	Señalización Horizontal
7	Cuadrilla PG 1	Señalización Horizontal
8	Cuadrilla SV 1	Señalización Horizontal

N° Cuadrilla	Nombre Cuadrilla	Actividad Principal Por Desarrollar
9	Cuadrilla SV 2	Señalización Vertical
10	Cuadrilla SV 3	Emergencias y Compromisos Prioritarios
11	Cuadrilla SI1	Señalización Vertical
12	Cuadrilla SI2	Señalización Vertical

Fuente: Elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 8. Informe Sistema de seguridad y salud en el trabajo, se detalla el personal operativo que conforma las cuadrillas que laboraron en la implementación de la señalización durante el periodo del presente informe.

5.2 EQUIPOS

Se emplearon los siguientes equipos para la ejecución de los trabajos del periodo del presente informe:

Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Descripción	Cantidad	Identificación
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2	1	WEP027 y TBZ541
Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.2	1	STIMSONITE TITAN 1000 D
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2	1	SPT 943
Máquina manual para pintura líquida NTC 4744-2 numeral 5.1 3	3	TITAN 8900XLT
Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.1	1	THERMO MARK II FEATHERLITE

Descripción	Cantidad	Identificación
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método Spray. NTC 4744-2 Numeral 5.1	1	HYDRA 4000
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método extrusión. NTC 4744-2 Numeral 5.1		HYDRA 4000
Camión con capacidad mínima de tres puntos cinco (3,5), modelo superior al año 2015, este vehículo deberá ser el adecuado para el transporte de los materiales a utilizar.	1	WFR172
Vehículo tipo campero o camioneta con placas de servicio público, con cilindraje de 1300 c.c. o superior, modelo 2022 o superior y matriculado en la ciudad de Bogotá D.C., conforme a la normatividad vigente en materia de tránsito y transporte (Acuerdo 352 de 2008).	1	TTZ

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad

Descripción	Cantidad
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se informa que en el Anexo 4. Plan de Calidad, carpeta; 2_FORMATOS, se relacionan los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos y elementos de control de obra mínimos.

5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 1)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar - 06_Tunjuelito	EJECUTADO
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 (TRAMO 2)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar - 06_Tunjuelito	EJECUTADO
MV_AUTO_SUR_643_24_V0 (AUTO SUR)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCIÓN
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCIÓN
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	EN EJECUCIÓN
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
EX_19_339_1561_10 (SAN FRANCISCO)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
EX_19_387_1561_10 (ACACIA)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_1_PMT CL 68G N° 31A-16	14 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_2_PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	13 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_3_PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	14 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_4_PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	13 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_5_PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	13 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_6_PMT CL 68C SUR KR 38	14 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	04 de febrero de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	03 de febrero de 2025	N/A	EJECUTADO

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
SUMINISTRO N°3 (DISPOSITIVOS Y SEÑALES VERTICALES)	07 de marzo de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°4 (SEÑALES VERTICALES)	07 de marzo de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°5 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	07 de marzo de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°6 (SEÑALES VERTICALES)	07 de marzo de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°7 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	09 de mayo de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°8 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	09 de junio de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°9 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	09 de junio de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°10 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	03 de julio de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°11 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	20 de agosto de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°12 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	20 de agosto de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°13 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	07 de octubre de 2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N°14 (SEÑALES VERTICALES IDIPRON)	20 de diciembre de 2025	N/A	EJECUTADO
EX_19_342_943_10 (ARBORIZADORA BAJA)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
EX_19_386_1561_10 (ESTANCIA)	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
EX_06_404_1561_10 (ISLA DEL SOL 1)	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_7_PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	14 de marzo de 2025	19_Ciudad Bolívar	NO EJECUTAR
CP_8_EX_19_209_1867_12	18 de febrero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_9_KR_72_CON_CL_63A_SUR	11 de marzo de 2025	19_Ciudad Bolívar	NO EJECUTAR
CP_10_PMT KR 75 CON DG 57Z SUR	14 de marzo de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_11_CL 79B SUR CON KR 18Q	31 de marzo de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_12_CL 75A SUR ENTRE DG 75 SUR Y TV 54	14 de abril de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_13_AUTOPISTA SUR DETECCIÓN ELECTRÓNICA	02 de abril de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_14_CL 69S CON TV 73D	28 de abril de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_15_AV. BOYACÁ	28 de abril de 2025	06_Tunjuelito	NO EJECUTAR

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
CP_16_EX_18_235_937_09	28 de abril de 2025	18_Rafale Uribe	NO EJECUTAR
CP_17_MV_AV_BOYACA_941_09_COMPROMISO RESALTOS	28 de abril de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_18_PASACALLES_MV_02_335_946_10_V14_LA CALERA	28 de abril de 2025	02_Chapinero	EJECUTADO
CP_19_PASACALLES_MV_03_001_1783_19_V11_VÍA A CHOACHI	28 de abril de 2025	03_Santa Fe	EJECUTADO
CP_20_PASACALLES_MV_05_122_1867_12 (ENTRADA USME)	28 de abril de 2025	05_Usme	EJECUTADO
CP_21_PASACALLES_MV_19_189_1556_10 (AC 13XKR137)	28 de abril de 2025	19_Fontibon	EJECUTADO
CP_22_PASACALLES_MV_AUTO_SUR_643_24_TERMINAL DEL SUR	28 de abril de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_23_AV BOYACÁ – DG 49 SUR (N-S) y (S-N)	05 de junio de 2025	06_Tunjuelito	NO EJECUTAR
CP_24_PASACALLES KR 7 ENTRE CL 29 Y CL 61	16 de mayo de 2025	02_Chapinero	EJECUTADO
CP_25_EX_19_184	27 de junio de 2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
CP_26_19_1294	27 de junio de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_27_19_148_1244	02 de julio de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_28_1307. CP-AUTOSUR CON KR 63 Y CP_29_1308. CP-AUTOSUR CON KR 71	02 de julio de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_30_19_1361(Cl 68 sur con TV 70) - Ciudad Bolívar	02 de julio de 2025	KENNEDY	EJECUTADO
CP_31_SDM_08_1354 CICLORRUTA (Ciclomotor - Kennedy)	02 de julio de 2025	08_KENNEDY	EJECUTADO
CP_32_PMT DE EMERGENICA DG 73C S	13 de agosto de 2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
CP_33_19_1585_ACCIÓN POPULAR 2025-00102	15 de septiembre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_34_06_1657	02 de octubre de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_35_06_1658	02 de octubre de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
CP_36_PMT_VILLAGLORIA_SIRE_5443806	02 de octubre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_37_19_1618 SIERRA MORENA	02 de octubre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_38_AUTOSURCONKR75F	01 de septiembre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
CP_39_CP_19_1618(COMPROMISO INTERSECCIÓN)	05 de enero de 2026	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCIÓN

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
CP_40_CP_AUTOSUR_BNT	05 de noviembre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT CIUDAD BOLIVAR SIRE CALLE 69F SURF	15 de septiembre de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PASACALLES ANTONIO NARIÑO	24 de junio de 2025	15_Antonio Nariño	EJECUTADO
PASACALLES BARRIOS UNIDOS	24 de junio de 2025	12_Barrios Unidos	EJECUTADO
PASACALLES CHAPINERO	24 de junio de 2025	02_Chapinero	EJECUTADO
PASACALLES ENGATIVA	24 de junio de 2025	10_Engativá	EJECUTADO
PASACALLES FONTIBÓN	24 de junio de 2025	09_Fontibón	EJECUTADO
PASACALLES KENNEDY	24 de junio de 2025	08_Kennedy	EJECUTADO
PASACALLES LOS MARTIRES	24 de junio de 2025	14_Los Mártires	EJECUTADO
PASACALLES PUENTE ARANDA	24 de junio de 2025	16_Puente Aranda	EJECUTADO
PASACALLES SANTA FE	24 de junio de 2025	03_Santa Fe	EJECUTADO
PASACALLES SUBA	24 de junio de 2025	11_Suba	EJECUTADO
PASACALLES TEUSAQUILLO	24 de junio de 2025	13_Teusaquillo	EJECUTADO
PASACALLES USAQUEN	24 de junio de 2025	01_Uaquén	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS CHAPINERO	24 de junio de 2025	02_Chapinero	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS ENGATIVA	24 de junio de 2025	10_Engativá	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS SANTAFE	24 de junio de 2025	03_Santa Fe	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS SUBA	24 de junio de 2025	11_Suba	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS USAQUEN	24 de junio de 2025	01_Usaquén	EJECUTADO
SEÑALES ELEVADAS USME	24 de junio de 2025	05_Usme	EJECUTADO
PENDONES BICIKENNEDY	24 de junio de 2025	08_Kennedy	EJECUTADO
EX_19_142_1244_11	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_017_1561_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_041_1561_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_001_643_24	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
MV_19_414_937_09	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_06_054_1561_10	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	EJECUTADO
MV_19_013	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_06_105_1867_12	27 de enero de 2025	06_Tunjuelito	INSPECCIONADO
MV_19_080_1561_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_155_1244_11	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_151_1244_11	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_292_1561_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_318_1561_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_176_1244_11	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_152_1744_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_269_1744_10	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_202_1867_12	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_211_1867_12	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_189_1867	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	INSPECCIONADO
EX_19_184_1867_12	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_273	27 de enero de 2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR

Fuente: Elaboración propia

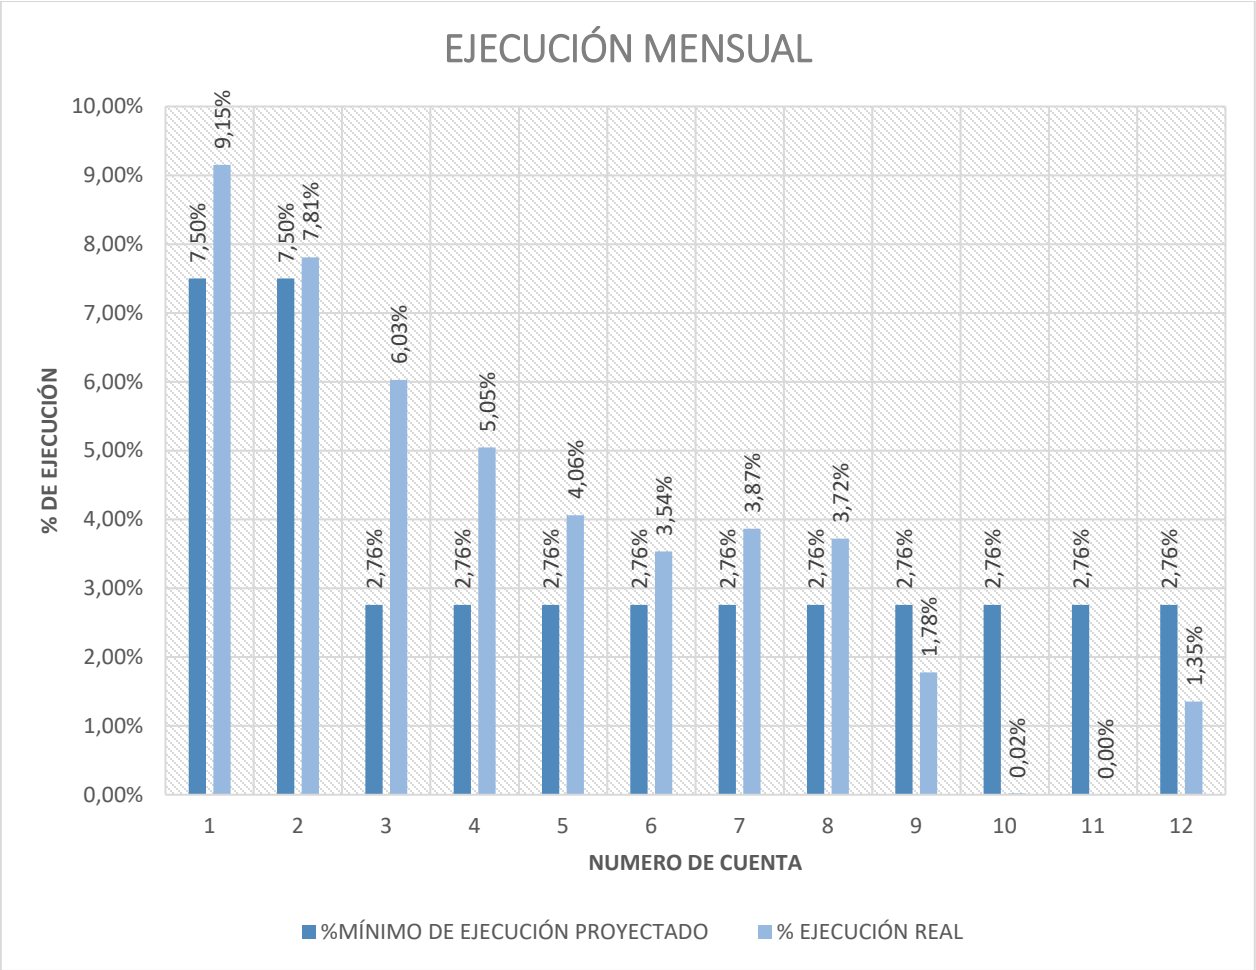
A continuación, se resume las cantidades de obra ejecutadas para cada ID:

Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID:

Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Ejecutado para Cobro cuenta 12	% Ejecutado
CP_AUTOSUR_BNT	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 1.176.345	$ 1.176.345	100,00%
EX_06_385_1561_10	06_TUNJUELITO	$ 356.459.792	$ 24.257.934	6,81%
EX_19_001_643	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 429.847.881	$ 54.885.030	12,77%
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 762.695.971	$ 37.752.839	4,95%
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 556.449.913	$ 149.593.745	26,88%
SUMINISTRO N°14	-	$ 3.497.067	$ 3.497.067	100,00%
TOTAL		**$ 2.110.126.969**	**$ 271.162.960**	

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-12



Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que en la cuenta número 12, comprendida del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026 se ejecutó el 1.35 % del valor total del contrato considerando la adición N° 1, lo cual representa un 1.41 % inferior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.6 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 2,76 % para el duodécimo mes de ejecución.

Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes

MES DE EJECUCIÓN	PROYECTADO		EJECUCIÓN REAL		PROYECTADO VS EJECUCIÓN REAL
	%MINIMO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN REAL	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN
1	7,50%	7,50%	9,15%	9,15%	1,65%
2	7,50%	15,00%	7,81%	16,96%	1,96%
3	2,76%	17,76%	6,03%	22,99%	5,23%
4	2,76%	20,52%	5,05%	28,03%	7,51%
5	2,76%	23,28%	4,06%	32,09%	8,81%
6	2,76%	26,04%	3,54%	35,63%	9,59%
7	2,76%	28,80%	3,87%	39,50%	10,70%
8	2,76%	31,56%	3,72%	43,22%	11,66%
9	2,76%	34,32%	1,78%	45,00%	10,68%
10	2,76%	37,08%	0,02%	45,02%	7,94%
11	2,76%	39,84%	0,00%	45,02%	5,18%
12	2,76%	42,60%	1,35%	46,37%	3,77%
13	2,76%	45,36%	0,00%	46,37%	0,00%
14	2,76%	48,12%	0,00%	46,37%	0,00%
15	2,85%	50,97%	0,00%	46,37%	0,00%
16	2,85%	53,82%	0,00%	46,37%	0,00%
17	2,85%	56,67%	0,00%	46,37%	0,00%
18	2,85%	59,52%	0,00%	46,37%	0,00%
19	2,85%	62,37%	0,00%	46,37%	0,00%
20	2,85%	65,22%	0,00%	46,37%	0,00%
21	2,85%	68,07%	0,00%	46,37%	0,00%
22	2,85%	70,92%	0,00%	46,37%	0,00%
23	2,85%	73,77%	0,00%	46,37%	0,00%
24	2,85%	76,62%	0,00%	46,37%	0,00%
25	2,85%	79,47%	0,00%	46,37%	0,00%
26	2,85%	82,32%	0,00%	46,37%	0,00%
27	2,55%	84,87%	0,00%	46,37%	0,00%
28	2,55%	87,42%	0,00%	46,37%	0,00%
29	2,55%	89,97%	0,00%	46,37%	0,00%
30	2,55%	92,52%	0,00%	46,37%	0,00%
31	2,55%	95,07%	0,00%	46,37%	0,00%
32	2,25%	97,32%	0,00%	46,37%	0,00%
33	2,25%	99,57%	0,00%	46,37%	0,00%
34	0,43%	100,00%	0,00%	46,37%	0,00%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se muestra el avance parcial y acumulado respecto al mes 12 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.6 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se tiene acumulado el 46.37 % considerando el valor de la adición N° 1, el cual representa un valor de 3.77 % superior al valor programado que equivale al 42.60 % acumulado para el duodécimo mes del contrato.

5.4 BALANCE ECONÓMICO

El detalle de las cantidades de obra de los puntos que se ejecutaron en el período se presenta en el Anexo 1. Acta Parcial de Obra, complementado con las planillas de obra de los IDs relacionados como ejecutados para el periodo del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026.

5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

En el Anexo 1. se presentan las planillas de los puntos o ID ejecutados durante el periododel informe, cuyos totales se relacionan a continuación:

Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID:

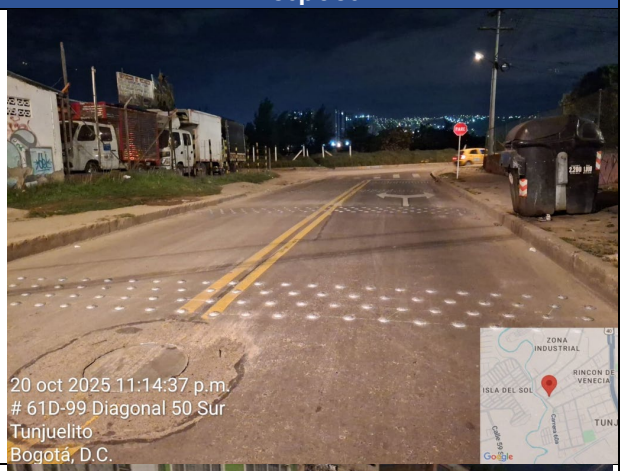
Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	% Cobrado Cuenta 1 a la Cuenta 11	% Cobrado Cuenta 12	Ejecutado para Cobro cuenta 12
CP_AUTOSUR_BNT	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 1.176.345	0,00%	100,00%	$ 1.176.345
EX_06_385_1561_10	06_TUNJUELITO	$ 356.459.792	93,19%	6,81%	$ 24.257.934
EX_19_001_643	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 429.847.881	87,23%	12,77%	$ 54.885.030
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 762.695.971	95,05%	4,95%	$ 37.752.839
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 556.449.913	0,00%	26,88%	$ 149.593.745
SUMINISTRO N°14	-	$ 3.497.067	0,00%	100,00%	$ 3.497.067
TOTAL		**$ 2.110.126.969**			**$ 271.162.960**

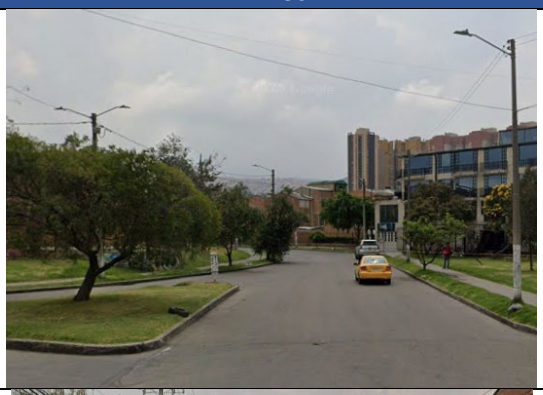
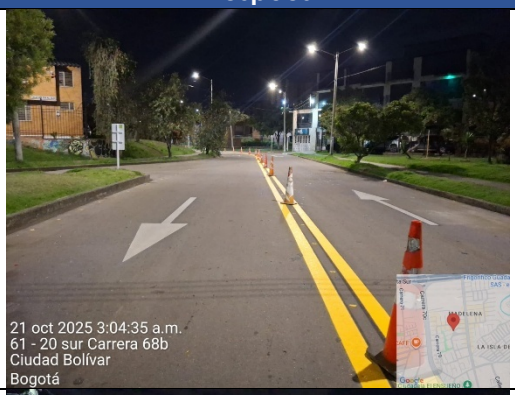
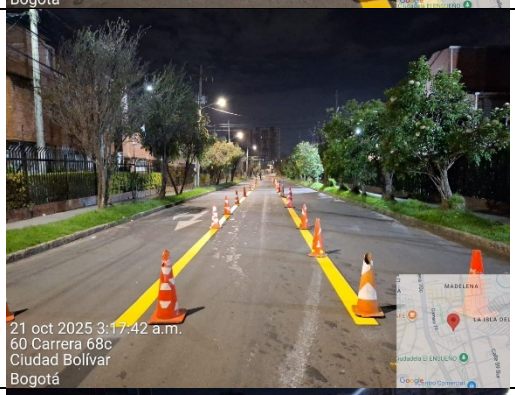
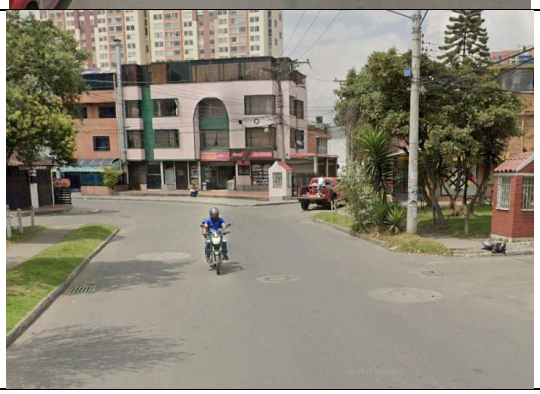
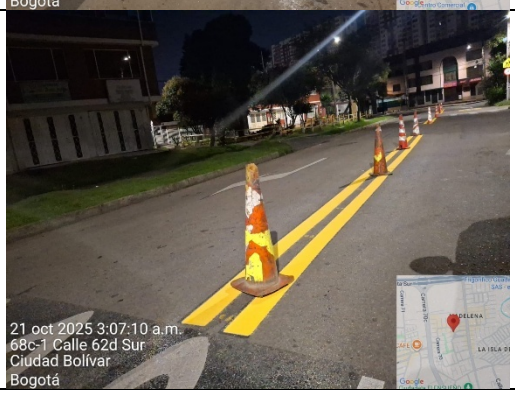
Fuente: Elaboración propia

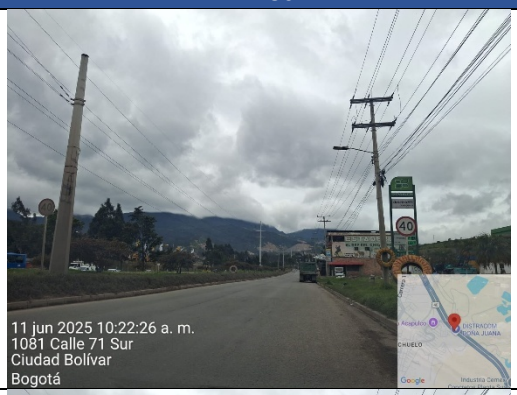
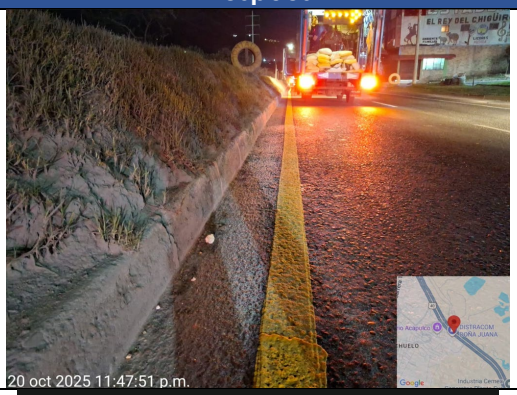
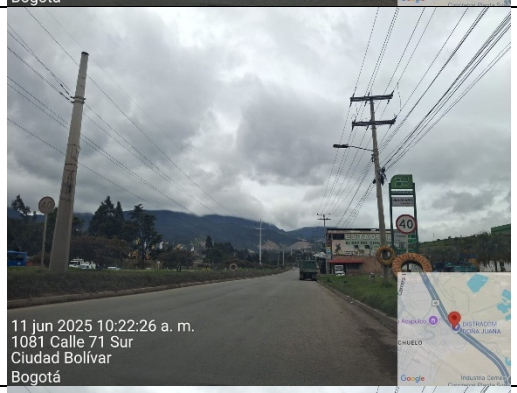
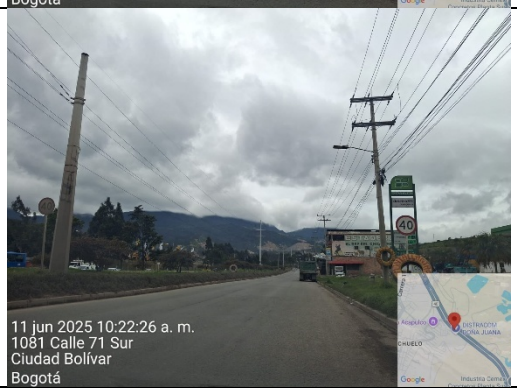
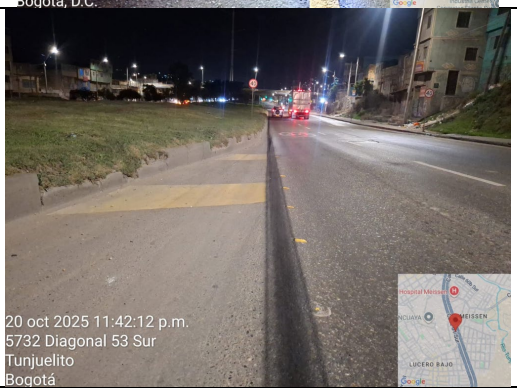
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

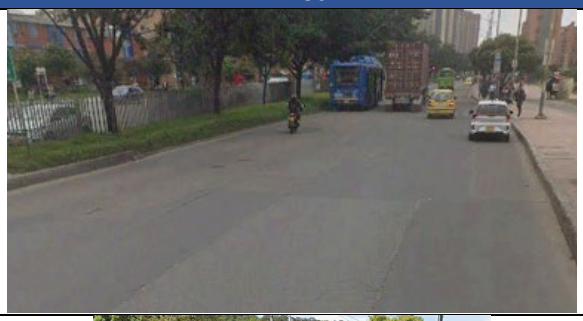
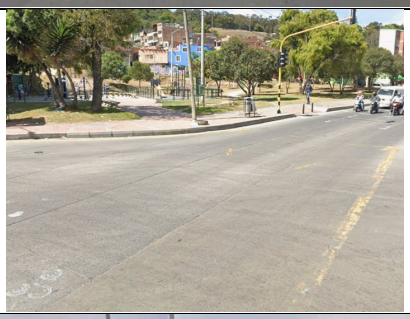
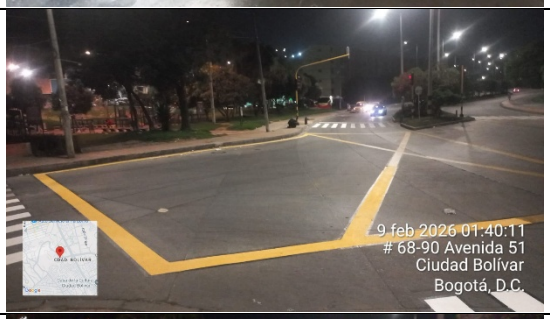
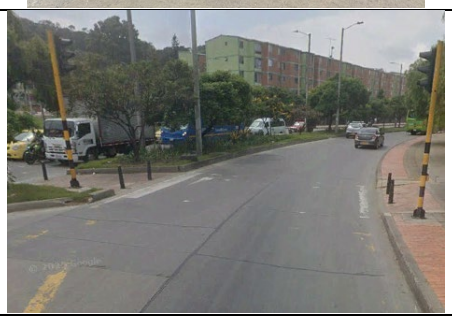
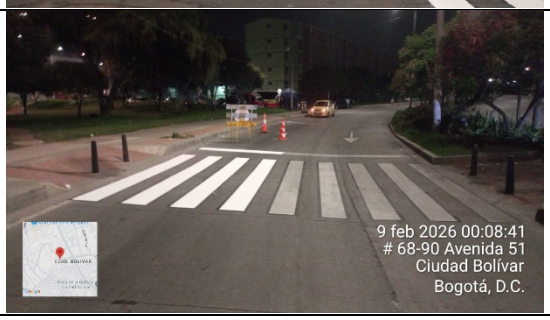
A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026:

CP_AUTOSUR_BNT	
Antes	**Después**
	
	
AUTOPISTA SUR CON KR 67	

EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2) (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
	
DIAGONAL 50 S CON KR 60D	

EX_19_001_643 (MADELENA)	
Antes	**Después**
	
	
	
KR 68B CON CL 61 SUR – KR 68B CON CL 61 SUR – CL 62D SUR CON KR 68C	

MV_AV_BOYACA_941_09 SEGUNDO TRAMO	
Antes	**Después**
	
	
	
AV. BOYACÁ CON KR 15	

CPS_941_EM_19_111 SEGUNDO TRAMO	
Antes	**Después**
	
	
	
KR 33 CON CL 68F SUR	

5.6 GEORREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación de obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 22 de enero de 2026.

Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID:

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
MV_AV_BOYACA_941_09_C1.1	1	APROBADO SDM	4/04/2025
EX_19_387_1561_10	1	APROBADO SDM	25/04/2025
CPS_941_EM_19_111_C1	1	APROBADO SDM	7/04/2025
EX_19_194_1867_12	1	APROBADO SDM	12/03/2025
MV_19_041_1561_10	1	APROBADO SDM	17/03/2025
MV_19_292_1561_10	1	APROBADO SDM	18/03/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C1.2	1	APROBADO SDM	21/04/2025
EX_19_387_1561_10_C2	2	APROBADO SDM	28/04/2025
MV_19_324_943_10_V10_C2	2	APROBADO SDM	25/04/2025
CPS_941_EM_19_111_C2	2	APROBADO SDM	28/04/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C2	2	APROBADO SDM	8/05/2025
MV_19_178_1244_11_C2	2	APROBADO SDM	6/05/2025
MV_AV_BOYACA_941_09	3	APROBADO SDM	19/05/2025
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	3	APROBADO SDM	19/05/2025
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	3	APROBADO SDM	15/05/2025
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	3	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_AUTO_SUR_643_24	3	APROBADO SDM	19/05/2025
EX_19_339_1561_10	3	APROBADO SDM	28/05/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	4	APROBADO SDM	17/06/2025
MV_AUTO_SUR_643_24_V0 (INCLUYE PASACALLES Y CP DETECCIÓN ELECTRÓNICA)	4	APROBADO SDM	17/06/2025
MV_19_178_1244_11 (VILLAVICENCIO)	4	APROBADO SDM	11/06/2025
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES)	4	APROBADO SDM	9/06/2025
MV_19_324_943_10 (ARBORIZADORA)	4	APROBADO SDM	19/06/2025
EX_19_339_1561_10 (SAN FRANCISCO)	4	APROBADO SDM	19/06/2025
EX_06_404_1561_10 (ISLA DEL SOL 1)	4	APROBADO SDM	30/05/2025
CP_10_PMT KR 75 CON DG 57Z SUR	4	APROBADO SDM	6/06/2025
CP_11_CL 79B SUR CON KR 18Q	4	APROBADO SDM	6/06/2025
CP_12_CL 75A SUR ENTRE DG 75 SUR Y TV 54	4	APROBADO SDM	6/06/2025

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
CP_14_CL 69S CON TV 79D	4	APROBADO SDM	6/06/2025
MV_02_335_946_10_V14_ (PASACALLES LA CALERA)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_03_001_1783_19_V11_ (PASACALLES VÍA BOGOTA-CHOACHI)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_19_189_1556_10 (PASACALLES AC 13 X KR137)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_05_122_1867_12 (BOYACÁ CON KR 1 ENTRADA USME)	4	APROBADO SDM	5/06/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C4.1	4	APROBADO SDM	8/07/2025
CPS_676_MV_01_04_C5 (PASACALLES KR 7)	5	APROBADO SDM	8/07/2025
EX_19_339_1561_10_C5	5	APROBADO SDM	8/07/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C5	5	APROBADO SDM	21/07/2025
EX_06_404_1561_10_C5	5	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_19_324_943_10_C5	5	APROBADO SDM	22/07/2025
MV_08_251_1244_11_V15 (CP_CICLOMOTORES)	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_19_178_1244_11_C6 (CP_CICLOMOTORES)	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_AUTO_SUR_643_24_C6	6	APROBADO SDM	21/07/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_C6	6	APROBADO SDM	22/08/2025
EX_19_339_1561_10_C6	6	APROBADO SDM	5/08/2025
EX_06_404_1561_10_C6	6	APROBADO SDM	14/08/2025
CP_8_EX_19_209_1867_12_C6	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_12_003_3652_24_C6 (PASACALLES BARRIOS UNIDOS)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_02_002_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS CHAPINERO)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_10_011_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS ENGATIVA)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_09_010_3652_24_C6 (PASACALLES FONTIBON)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_08_006_3652_24_C6 (PASACALLES KENNEDY)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_14_007_3652_24_C6 (PASACALLES LOS MARTIRES)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_16_005_3652_24_C6 (PASACALLES PUENTE ARANDA)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_15_009_3652_24_C6 (PASACALLES ANTONIO NARIÑO)	6	APROBADO SDM	5/08/2025
SV_03_001_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS SANTA FE)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_11_012_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS SUBA)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_13_004_3652_24_C6 (PASACALLES TEUSAQUILLO)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_01_013_3652_24_C6 (PASACALLES Y SEÑALES ELEVADAS USAQUEN)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
SV_05_008_3652_24_C6 (SEÑALES ELEVADAS USME)	6	APROBADO SDM	14/08/2025
EX_19_148_1244_11_C7 (CP COLEGIO AGUDELO)	7	APROBADO SDM	10/09/2025
MV_19_273_1561_10_C7 (CP SANTA MARGARITA)	7	APROBADO SDM	4/09/2025

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	7	APROBADO SDM	15/09/2025
EX_06_404_1561_10_ (ISLA DEL SOL 1)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
EX_19_209_1867_12_ (CP PARAISO)	7	APROBADO SDM	15/09/2025
EX_19_339_1561_10	7	APROBADO SDM	15/09/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_ (PARTE 2)	7	APROBADO SDM	23/09/2025
SV_02_002_3652_24_C7 (PASACALLES CHAPINERO)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
SV_03_001_3652_24_C7 (PASACALLES SANTA FE)	7	APROBADO SDM	4/09/2025
MV_AV_BOYACA_941_09_ (PARTE 2)	8	APROBADO SDM	28/10/2025
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	8	APROBADO SDM	28/10/2025
EX_06_404_1561_10_ (ISLA DEL SOL 1)	8	APROBADO SDM	8/10/2025
MV_19_178_1244_11 (CP_19_1585_ACCIÓN POPULAR 2025-00102)	8	APROBADO SDM	8/10/2025
CPS_941_EM_19_111_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
EX_19_001_643_24_Madelena	8	APROBADO SDM	17/10/2025
MV_06_054_1561_10_AV_VILLAVICENCIO T2	8	APROBADO SDM	10/10/2025
SV_08_006_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	8/10/2025
SV_02_002_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
SV_13_004_3652_24_C8	8	APROBADO SDM	10/10/2025
EX_19_339_1561_10	8	APROBADO SDM	8/10/2025
MV_AV_BOYACÁ_941_09 (PARTE 2)	9	APROBADO SDM	10/11/2025
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2	9	APROBADO SDM	11/11/2025
EX_19_001_643_24 (MADELENA)	9	APROBADO SDM	11/11/2025
MV_06_054_1561_10_AV_VILLAVICENCIO T2	9	APROBADO SDM	11/11/2025
CP_06_1658	9	APROBADO SDM	10/11/2025
DEM_CP_06_1657	9	APROBADO SDM	10/11/2025
CP_38_AUTOSURCONKR75F	10	APROBADO SDM	05/12/2025
EX_06_385_1561_10 (ISLA DEL SOL 2)	10	APROBADO SDM	05/12/2025
CP_AUTOSUR_BNT	12	DESARROLLO CONTRATISTA	-
EX_06_385_1561_10	12	DESARROLLO CONTRATISTA	-
EX_19_001_643	12	DESARROLLO CONTRATISTA	-
MV_AV_BOYACA_941_09	12	DESARROLLO CONTRATISTA	-
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2	12	DESARROLLO CONTRATISTA	-

Fuente: Elaboración propia

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

Durante el periodo del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026, el estado de avance presupuestal es el siguiente:

Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato

VALOR VIGENCIA 2024	$ 2.815.721.000
VALOR VIGENCIA 2025	$ 6.209.487.857
VALOR VIGENCIA 2026	$ 6.423.895.143
VALOR VIGENCIA 2027	$ 3.322.369.428
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 1.276.983.847
VALOR TOTAL	**$ 20.048.457.275**

Cuenta	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministros	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
N° 1	23/01/2025 a 22/02/2025	$1.388.326.935	$446.069.444	$ 0,00	$1.834.396.379	$91.719.819	$1.742.676.560	PAGO
N° 2	23/02/2025 a 22/03/2025	$1.118.356.078	$359.327.808	$87.896.288	$1.565.580.174	$ 78.279.009	$1.487.301.165	PAGO
N° 3	23/03/2025 A 22/04/2025	$ 914.429.716	$293.806.268	$ 0,00	$1.208.235.984	$60.411.799	$1.147.824.185	PAGO
N° 4	23/04/2025 A 22/05/2025	$ 765.617.145	$245.992.789	$ 0,00	$1.011.609.934	$50.580.497	$ 961.029.437,00	PAGO
N° 5	23/05/2025 A 22/06/2025	$ 616.413.251	$198.053.578	$ 0,00	$ 814.466.829	$ 40.723.341	$ 773.743.488,00	PAGO
N° 6	23/06/2025 A 22/07/2025	$ 536.383.839	$ 172.340.127	$ 0,00	$ 708.723.966	$ 35.436.198	$ 673.287.768,00	PAGO
N° 7	23/07/2025 A 22/08/2025	$ 586.768.424	$188.528.694	$ 0,00	$ 775.297.118	$38.764.856	$ 736.532.262	PAGO
N° 8	23/08/2025 A 22/09/2025	$ 564.689.238,63	$ 181.434.652	$ 0,00	$ 746.123.891,00	$ 37.306.195	$ 708.817.696,00	PAGO
N° 9	23/09/2025 A 22/10/2025	$ 269.842.659,50	$ 86.700.446	$ 0,00	$ 356.543.106,00	$ 17.827.155	$ 338.715.951,00	PAGO
N° 10	23/10/2025 A 22/11/2025	$ 3.202.509,65	$ 1.028.966,35	$ 0,00	$ 4.231.476,00	$ 211.574,00	$ 4.019.902,00	PAGO
N° 11	23/11/2025 A 22/12/2025	-	-	-	-	-	-	-
N° 12	23/112/2025 A 22/01/2026	$ 205.224.369,94	$65.938.590,06	$ 0,00	$ 271.162.960,00	$13.558.148,00	$ 257.604.812,00	EN TRÁMITE
TOTAL		**$6.969.254.166**	**$2.239.221.363**	**$87.896.288**	**$9.296.371.817**	**$464.818.591**	**$8.831.553.226**	

TOTAL, FACTURADO OBRA + SUMINISTRO ACTA N° 12	**$ 271.162.960**
TOTAL, ACUMULADO	**$ 9.296.371.817**
SALDO POR FACTURAR	**$ 10.752.085.458**

Fuente: Elaboración propia

Se presenta para el décimo segundo mes de ejecución del contrato, un valor ejecutado de **$ 271.162.960** que equivale al **1.35 %** del valor total del contrato y un valor total acumulado ejecutado de **$9.296.371.817** equivalente al **46.37 %** del valor total del contrato considerando el valor de la adición N° 1.

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	%ejecución vertical	Señalización Horizontal	%ejecución horizontal
CP_AUTOSUR_BNT	19_CIUDAD BOLIVAR	$ -	0,00%	$ 1.176.345,00	100,00%
EX_06_385_1561_10	06_TUNJUELITO	$ -	0,00%	$ 24.257.934,00	100,00%
EX_19_001_643	19_CIUDAD BOLIVAR	$ -	0,00%	$ 54.885.030,00	100,00%
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ -	0,00%	$ 37.752.839,00	100,00%
CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2	19_CIUDAD BOLIVAR	$ -	0,00%	$ 149.593.745,00	100,00%
SUMINISTRO N° 14	-	$ 3.497.067,00	100,00%	$ -	0,00%
TOTAL		**$ 3.497.067,00**		**$ 271.162.960**	**-**

Fuente: Elaboración propia

Del valor total de señalización ejecutada durante el periodo del informe, Se distribuyo de la siguiente manera por localidades

Tabla 15. Porcentaje ejecutado por localidad

Orden	Localidad	PORCENTAJE EJECUTADO
1	06_TUNJUELITO	8.95%
2	19_CIUDAD BOLIVAR	89.76%

Fuente: Elaboración propia

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El plan de Calidad provee de mecanismos para asegurarse que las actividades que afectan la calidad, están siendo registradas usando la documentación necesaria aplicable de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 de 2015, a fin de cumplir la atención integral en temas de señalización en la zona 6 adjudicada, atención integral que involucra el desarrollo de todas las actividades de implementación de señalización vertical, horizontal y los dispositivos de seguridad vial.

Consiste en la aplicación de los siguientes procesos:

- De Dirección: planificación del servicio
- Operativos o de realización del producto: Ejecución de proyectos con los respectivos soportes de compras, así como gestión del talento humano.
- De seguimiento: Acciones correctivas, preventivas, auditorías internas y análisis de datos.

Conforme al documento de Plan de Calidad presentado, se realizó el respectivo control de calidad en las actividades adelantadas de señalización horizontal, e implementación de dispositivos en los siguientes ID:

- CP_AUTOSUR_BNT
- EX_06_385_1561_10
- EX_19_001_643
- MV_AV_BOYACA_941_09
- CPS_941_EM_19_111 (GAITAN CORTES) - TRAMO 2

Para el periodo se realizaron entre otros las siguientes actividades conformes al plan de Calidad:

RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES HORIZONTALES



RESULTADOS DEL ENSAYO

1	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 8 Y KR 10D BIS	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		168	227	211	228	SI
2	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 4 Y KR 8	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		224	230	191	235	SI
3	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 4 Y KR 8	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		222	255	215	217	SI
4	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 4 Y KR 8	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		190	230	220	219	SI
5	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 8 Y KR 10D BIS	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		167	268	272	256	SI
6	LINEA DE BORDE	LB	AMARILLO	AC 71 SUR ENTRE KR 8 Y KR 10D BIS	N.A	TÉRMICA	PINTUCO	X		254	218	250	226	SI

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
NOMBRE: HECTOR IVAN BORDA MOLINA
CARGO: INGENIERO RESIDENTE

APROBADO POR
NOMBRE: JUAN JOSE PEREZ
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES HORIZONTALES



RESULTADOS DEL ENSAYO

1	LINEA DE CAMELLON	LCM	AMARILLO	TV 68C ENTRE KR 68A Y KR 68C	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		204	210	212	209	SI
2	LINEA DE CARRIL	LC	AMARILLO	KR 68A ENTRE KR 68B Y CL 61S	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		208	204	207	206	SI
3	LINEA DE INICIO FIN CARRIL	LIC	BLANCO	KR 67 ENTRE CL57T S Y AC 57RS	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		810	855	812	812	SI
4	LINEA DE AGUJA	LA	BLANCO	KR 68B ENTRE DG 62A S Y DG 62 S	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		835	821	815	822	SI
5	LINEA DE CANAL	LCN	BLANCO	CL 62A S ENTRE CL 62BS S Y KR 68B	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		247	248	272	256	SI

OBSERVACIONES

ELABORADO POR:
NOMBRE: HECTOR IVAN BORDA MOLINA
CARGO: INGENIERO RESIDENTE

APROBADO POR
NOMBRE: JUAN JOSE PEREZ
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO4_PLAN_DE_CALIDAD

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 18 de diciembre de 2025, a su vez se remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la secretaria Distrital de Movilidad con radicado SDM - 202561204634892 del 18 de diciembre de 2025. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531217034811 del 23 de diciembre de 2025, informo que "…*informa que una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de implementación de elementos de señalización vertical, horizontal y dispositivos viales, mediante el Contrato del Asunto, se emite autorización a la propuesta…*" e indica que la vigencia de la autorización es desde *la fecha de la firma del presente Oficio hasta el 31 de diciembre de 2026*, igualmente dichas comunicaciones se adjuntan en el Anexo 5. Plan de manejo de tránsito (COI).

En el periodo de este informe que comprende desde el 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026, se solicitaron planes de manejo de tránsito, los cuales junto con los PMTs vigentes de los periodos anteriores se relacionan con el respectivo resumen de los COI publicados por la SDM:

Tabla 16. Planes de manejo de tránsito vigentes

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN		
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
4	22-ene-26	1321	19006464	19006688	AV BOYACA (KR 19) CL 59A SUR	AV BOYACA (KR 19) KR 18R	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1322	19006464	19006688	AV BOYACA (KR 19) CL 59A SUR	AV BOYACA (KR 19) KR 18R	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1323	19006732	19007653	AV BOYACA (AC 61 SUR) KR 18R	AV BOYACA (AC 61 SUR) KR 18J	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1324	19006732	19007653	AV BOYACA (AC 61 SUR) KR 18R	AV BOYACA (AC 61 SUR) KR 18J	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1325	19007940	19008604	AV BOYACA (TV 17) CL 64ABIS SUR	AV BOYACA (TV 17) CL 67 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1326	19007940	19008604	AV BOYACA (TV 17) CL 64ABIS SUR	AV BOYACA (TV 17) CL 67 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1327	19008874	19009190	AV BOYACA (KR 17) CL 67 SUR	AV BOYACA (KR 17) CL 70BIS SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1328	19008874	50007749	AV BOYACA (KR 17) CL 67 SUR	AV BOYACA (KR 17) CL 71BIS SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1329	19010144	19014294	AV BOYACA (CL 71 SUR) KR 16T	AV BOYACA (CL 71 SUR) KR 4	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1330	19010144	19014294	AV BOYACA (CL 71 SUR) KR 16T	AV BOYACA (CL 71 SUR) KR 4	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1331	6000070	6001904	AV BOYACA (TV 60) CL 45A SUR	AV BOYACA (TV 60) DG 53 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1332	6000070	6001904	AV BOYACA (TV 60) CL 45A SUR	AV BOYACA (TV 60) DG 53 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1333	6000070	6001904	AV BOYACA (TV 60) CL 45A SUR	AV BOYACA (TV 60) DG 53 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1334	6000070	6001904	AV BOYACA (TV 60) CL 45A SUR	AV BOYACA (TV 60) DG 53 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1335	6001841	6001973	AV BOYACA (CL 56A SUR) DG 53 SUR	AV BOYACA (CL 56A SUR) KR 24	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1336	6001841	6001973	AV BOYACA (CL 56A SUR) DG 53 SUR	AV BOYACA (CL 56A SUR) KR 24	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1337	6001841	6001973	AV BOYACA (CL 56A SUR) DG 53 SUR	AV BOYACA (CL 56A SUR) KR 24	SI	23/01/2026	18/06/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN		
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
4	22-ene-26	1338	6001841	6001973	AV BOYACA (CL 56A SUR) DG 53 SUR	AV BOYACA (CL 56A SUR) KR 24	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1339	6001970	6001978	AV BOYACA (CL 58A SUR) KR 24	AV BOYACA (CL 58A SUR) KR 19C	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1340	6001970	6001978	AV BOYACA (CL 58A SUR) KR 24	AV BOYACA (CL 58A SUR) KR 19C	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1341	50009179	19000043	KR 67 CL 65 SUR	KR 67 AUTO SUR (AC 57R SUR)	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1342	50009179	19000043	KR 67 CL 65 SUR	KR 67 AUTO SUR (AC 57R SUR)	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1343	50001728	19003986	AV VILLAVICENCIO (AK 70C) 140m AL SUR DE LA AUTO SUR (AC 57R SUR)	AV VILLAVICENCIO (AC 61 SUR) TV 42A	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1344	50001728	19003986	AV VILLAVICENCIO (AK 70C) 140m AL SUR DE LA AUTO SUR (AC 57R SUR)	AV VILLAVICENCIO (AC 61 SUR) TV 42A	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1345	19002650	N/A	KR 49 AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	KR 49 CL 68A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1992	19000093	19012947	CL 58 SUR KR 67	CL 58 SUR KR 64B	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1993	19000107	19000170	KR 64B CL 58 SUR	KR 64B CL 59 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1994	19000242	N/A	TV 64B CL 59 SUR	TV 64B CL 59A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1995	19000299	19000482	KR 65 CL 59A SUR	KR 65 CL 61 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1996	19000488	19000533	CL 61 SUR KR 65	CL 61 SUR KR 67	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1997	19000186	N/A	KR 65 CL 58 SUR	KR 65 CL 59 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1998	19000192	N/A	KR 65A CL 58 SUR	KR 65A CL 59 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	1999	19000428	N/A	CL 60B SUR KR 67	CL 60B SUR KR 68	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2000	19000540	N/A	CL 61 SUR KR 67	CL 61 SUR KR 68	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2001	19000649	19000690	CL 62BIS SUR KR 67	CL 62BIS SUR KR 68B	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2002	19000759	30000851	CL 62A SUR KR 67	CL 62A SUR KR 68B	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2003	19000759	30000851	CL 62A SUR KR 67	CL 62A SUR KR 68B	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2004	19012951	30000850	KR 68B CL 62BIS SUR	KR 68B CL 61 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2005	19000563	19012954	CL 61 SUR KR 68C	CL 61 SUR KR 70	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2006	19012941	50001555	KR 70 CL 61 SUR	KR 70 CL 65 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2007	50001556	50001557	CL 65 SUR KR 69C	CL 65 SUR KR 68C	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2008	19001306	50001559	KR 68C CL 65 SUR	KR 68C DG 62A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2009	19001305	N/A	CL 65 SUR KR 68C	CL 65 SUR KR 67	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2010	19001159	N/A	CL 63 SUR KR 68C	CL 63 SUR KR 67	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2011	6000300	40002075	CL 62C SUR KR 65C	CL 62C SUR KR 63	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2012	19005370	19004902	KR 22 CL 60 SUR	KR 22 CL 58A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN		
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
4	22-ene-26	2013	19005132	19004741	CL 59 SUR KR 22	CL 59 SUR TV 22FBIS	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2014	19005371	19005021	CL 60 SUR KR 22	CL 60 SUR KR 22G	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2015	19005282	19004315	KR 22G AV VILLAVICENCIO (AC 61 SUR)	KR 22G CL 58 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2016	19004417	19004202	CL 58A SUR KR 22G	CL 58A SUR KR 23C	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2017	19004718	219004522	CL 59 SUR TV 22GBIS	CL 59 SUR KR 23D	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2018	19005010	19004726	CL 60 SUR KR 22G	CL 60 SUR KR 23D	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2019	19004963	19004240	TV 28 AV VILLAVICENCIO (AC 61 SUR)	TV 28 CL 58C SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2020	19003686	19003660	DG 63 SUR CL 58C SUR	DG 63 SUR KR 44A	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2021	19004241	19004070	CL 59B SUR TV 28	CL 59B SUR TV 36	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2022	19004248	19004318	TV 36 CL 59B SUR	TV 36 DG 60 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2023	19004116	19004393	TV 33 CL 58C SUR	TV 33 DG 60 SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2024	19003912	19003748	CL 58C SUR TV 28	CL 58C SUR TV 34	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2025	19003912	19003748	CL 58C SUR TV 28	CL 58C SUR TV 34	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2026	19000942	N/A	CL 62B SUR AV VILLAVICENCIO (AK 70C)	CL 62B SUR KR 70	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2027	19000942	N/A	CL 62B SUR AV VILLAVICENCIO (AK 70C)	CL 62B SUR KR 70	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2028	19001659	50001540	TV 70C AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	TV 70C DG 67A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2029	19013598	N/A	TV 70 AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	TV 70 CL 67B SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2030	19001926	N/A	TV 69 AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	TV 69 CL 68B SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2031	19001926	N/A	TV 69 AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	TV 69 CL 68B SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2032	19013604	N/A	TV 64 AV VILLAVICENCIO (AC 68 SUR)	TV 64 CL 67B SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2033	19008004	19007784	CL 64C SUR KR 18J	CL 64C SUR KR 18M	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2034	50007758	19007631	CL 64D SUR KR 18M	CL 64D SUR KR 18PBISA	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2035	19007425	19007403	KR 18PBISA CL 64D SUR	KR 18PBISA CL 64A SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2036	19007326	19007248	CL 64B SUR KR 18QBIS	CL 64B SUR TV 18R	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2037	19007140	19006786	KR 19 DG 64 SUR	KR 19 TV 19	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2038	19012852	19006682	TV 19 CL 61B SUR	TV 19 CL 61BISA SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2039	19007142	19007134	KR 19 DG 64 SUR	KR 19 DG 64B SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		AUTORIZACIÓN		
NO.	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
4	22-ene-26	2040	19007136	19006946	DG 64BIS SUR KR 19	DG 64BIS SUR KR 19B	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2041	19006893	19006748	DG 64BIS SUR KR 19B	DG 64BIS SUR KR 19D	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2042	19007084	19006877	DG 64B SUR KR 19BIS	DG 64B SUR KR 19D	SI	23/01/2026	18/06/2026
4	22-ene-26	2043	19006890	50007772	KR 19B DG 64B SUR	KR 19B DG 64BIS SUR	SI	23/01/2026	18/06/2026

Fuente: Elaboración a partir de la información de los COI de la SPMT de la SDM

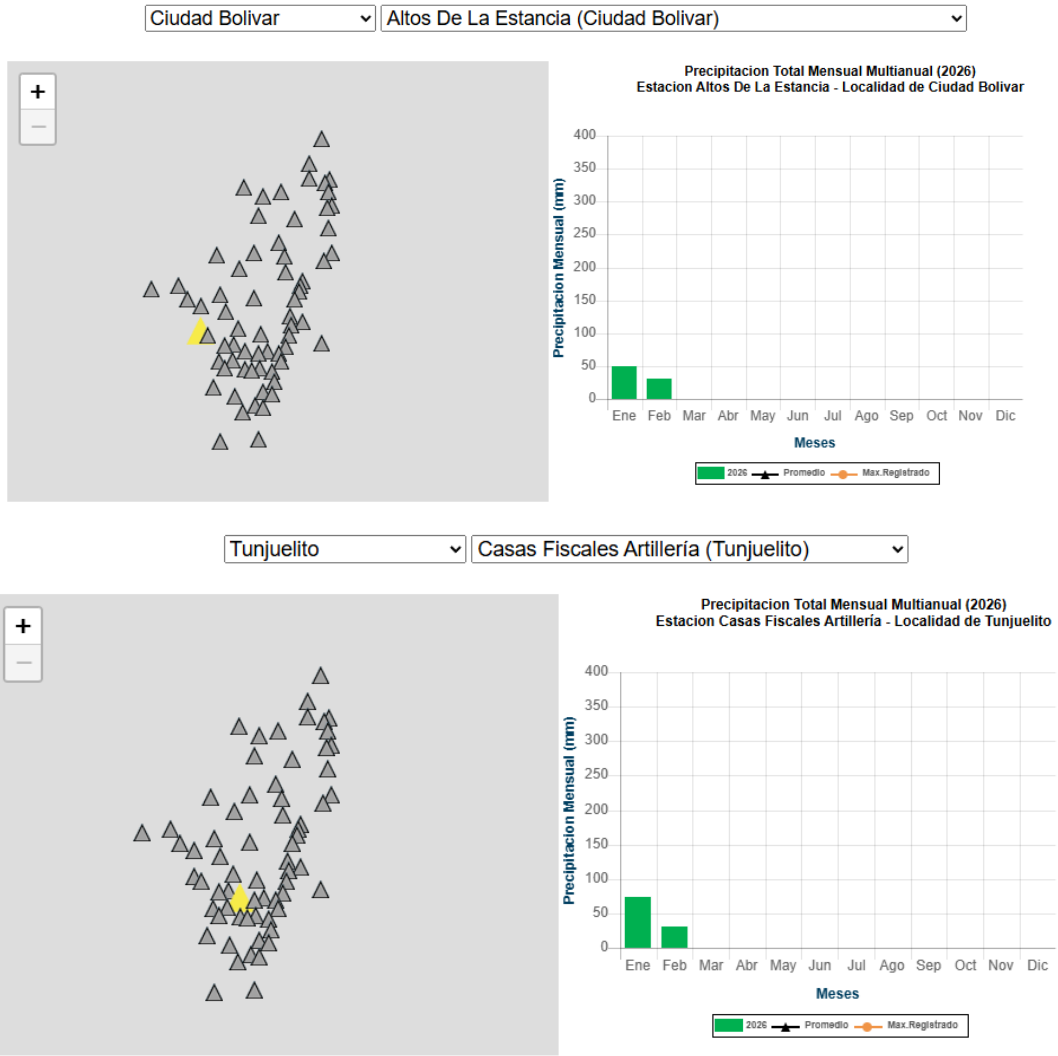
Igualmente, en el Anexo 5. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información complementaria.

9. ASPECTOS TÉCNICOS

9.1 ESTADO DEL CLIMA

En el periodo del presente informe se presentaron precipitaciones considerables en la zona de ejecución del contrato, lo cual generó afectación sobre las actividades de demarcación vial. En la figura 3, se muestran las estaciones ubicadas en las localidades del proyecto y la figura 4 muestra la distribución espacial de las precipitaciones durante el mes de enero de 2026 en las localidades relacionadas.

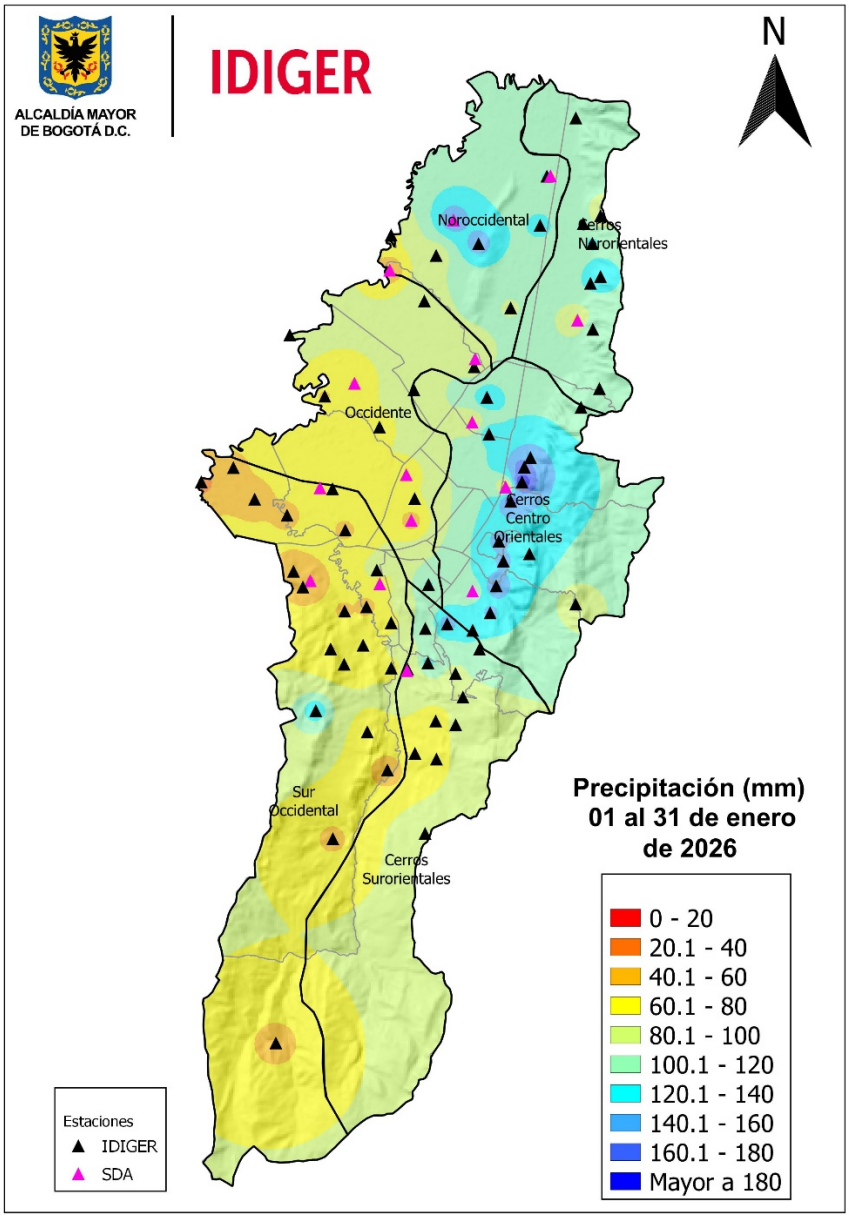
Figura 3. Precipitación mensual de la ciudad (Localidades Proyecto)



Fuente: tomado de IDIGER, Enero de 2026 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 3, que para el mes de enero de 2026 se presentaron en la ciudad de Bogotá precipitaciones entre los 50 y 60 mm, para las localidades de intervención.

Figura 4. Precipitación mensual de la ciudad



Fuente: tomado de IDIGER, enero de 2026 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 4, que para el mes de enero de 2026 las precipitaciones en la ciudad de Bogotá estuvieron en promedio por debajo de los 30 mm. Cabe aclarar que las condiciones climáticas del presente periodo afecto de manera importante la ejecución de la señalización en los IDs asignados.

9.2 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES

Para el periodo del presente informe, en las inspecciones realizadas no se encontraron diseños que presentaran garantías inferiores o iguales a 6 meses

10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN

A continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS

En el Anexo 6. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona los dispositivos viales instalados en el periodo del 23 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026:

Tabla 17. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	UNIDADES A INGRESAR A ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	5,10	$402.744	$129.402	N/A	$447.494	$2.282.219
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	3,00	$142.340	$45.734	3,00	$142.340	$427.020
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y	4,00	$196.957	$63.282	4,00	$196.957	$787.828

ITEM	UND	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	UNIDADES A INGRESAR A ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.						
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	1674,00	$46.704.493	$15.006.154	1674,00	$14.491	$24.257.934
77	UN	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	5,00	$0	$0	5,00	$235.269	$1.176.345
TOTAL								**$ 28.931.346**

Fuente: Acta de Recibo a Satisfacción 12

10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA

Para el periodo del presente informe no se realizó la entrega de señales verticales retiradas.

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Este documento se incluye en el Anexo 7. y se denomina Informe de gestión social.

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

Este documento se incluye en el Anexo 8. y se denomina Informe de sistema de seguridad y salud en el trabajo.

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el periodo del presente informe no se presentaron afectaciones en redes de servicios públicos.

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

Durante el periodo del presente informe, se enviaron comunicados a las diferentes entidades observadas en la inspección de reservas, las cuales a la fecha aún no cuentan con respuesta.

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA)

En el Anexo 9. Bitácora de obra, se presenta copia de esta. en cada informe mensual y final, se tomará como evidencia de registro de las situaciones especiales y desarrollo en general del contrato.

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

En el Anexo 11. Hoja de vida del contrato, se presenta el formato de la hoja de vida del contrato de obra SDM-2024-3652, actualizado.

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

- Para el duodécimo mes del contrato, se ejecutó el 1.35 % del valor total del contrato, lo cual representa un 1.41 % inferior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.6 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 2.76 % para el duodécimo mes de ejecución.

- El avance parcial y acumulado respecto al mes 12 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.6 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se tiene acumulado el 46.37 % el cual representa un valor de 3.77 % superior al valor programado que equivale al 42.60 % acumulado para el duodécimo mes del contrato.

- Durante el periodo de informe se realizó seguimiento a la vigencia de los PMT actuales y se gestionó la respectiva autorización por parte de la SPMT para los diseños que se asignaron y se programaron para ejecución, con el fin de que las implementaciones cuenten con los respectivos permisos de ejecución.

- A la fecha de corte del presente informe, se ha realizado la entrega de 92 planos, 87 aprobados por SDM, 0 en revisión de SDM, 0 en revisión por interventoría, y 0 en atención de observaciones por el contratista. Actualmente se encuentran en desarrollo 5 planos de la cuenta N° 12.

18. ANEXOS

Anexo 1. Acta de obra y documentos para desembolso

Anexo 2. Pólizas

Anexo 3. Equipos mínimos

Anexo 4. Plan de Calidad

Anexo 5. Plan de manejo de Transito (COI)

Anexo 6. Comprobante ingreso a almacén y entrega de señalización retirada

Anexo 7. Informe de gestión social

Anexo 8. Informe sistema de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 9. Bitácora de obra

Anexo 10. Informe Ejecutivo Mensual 12

Anexo 11. Hoja de vida del contrato
