FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE31
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha generación: 25/03/2026 08:44:06
Fecha expedición: 25/03/2026 08:44:07

OLPG CIVIL SAS
NIT: 901798741-2
Dirección por defecto
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3202714101
llonas07@yahoo.es

FACTURADO A

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P
NIT 900322539-4
CARRERA 2 No. 4 ESQUINA Subachoque (CUN)
TEL: 3162452024 - 8245125
aguasyaseo@subachoque-cundinamarca.gov.co
Principal

CUFE: 7c30c7db247de0f6cd124c3a27cdd6bc51f0257400756d79690cf20e9ecd72ff810384f1879e8227f2c064b4f156818b

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 31** ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02 CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2025 OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	1	$ 42.051.951,00		$ 42.051.951,00
2	**Cód.: 31A** ADMINISTRACION (27%)	1	$ 11.215.914,00		$ 11.215.914,00
3	**Cód.: 31B** IMPREVISTOS (1%)	1	$ 558.632,00		$ 558.632,00
4	**Cód.: 31C** UTILIDAD (5%)	1	$ 2.102.597,00		$ 2.102.597,00

Total cantidad : 4
CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL	$ 55.929.094,00
TOTAL NETO	**$ 55.929.094,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764079385334 vigencia de 12/09/2024 al 12/09/2026 rango del 1 al 100 prefijo FVE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

1. FACTURA

Recibido 25/03/2026.
3:30 pm

OLPG S.A.S

Subachoque, 24 de marzo de 2026

Doctora:

MARIA DEL PILAR HERANDEZ GOMEZ

Gerente General

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.

Carrera 2 Calle 4 esquina

Subachoque, Cundinamarca

AGUAS Y ASEO de Subachoque S.A. ESP
Nit: 900.322.539-4

25 MAR 2026
095
RECIBIDO

Ing. ANA GABRIELA RODRIGUEZ

Técnica Operativa de Aguas y Aseo

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL 2 CONTRATO 001 DE 2025

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente queremos radicar el acta de recibo parcial 2 del Contrato de Obra No. 001 DE 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE", en donde se presentan las actividades ejecutadas dentro del contrato ya mencionado, para su revisión y posterior pago, se adjuntan los siguientes documentos para el proceso de pago.

- FACTURA
- CERTIFICACION BANCARIA
- RUT
- CEDULA R/L OLPG CIVIL S.A.S
- ACTA DE RECIBO PARCIAL 2
- INFORME DE OBRA
- PLANILLAS DE SEGURIDAD

Deseándole éxitos en sus labores diarias quedamos pendientes a cualquier inquietud, buen dia.

Cordialmente,

Oscar Leonardo Pinzón García

R/L OLPG CIVIL S.A.S

Contratista de obra

Calle 1 Sur No. 2 – 58, Tabio Cundinamarca
Teléfono, 3202714101 e-mail llonas07@yahoo.es

2. CERTIFICACION BANCARIA

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa OLPG CIVIL SAS identificado(a) con NITPJ 9017987412 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a JurÃ-dica No. 444235832 desde el 03 de julio de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de febrero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

3. RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141124987478

(415)7707212489984(8020) 000014112498747 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 8 7 4 1	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OLPG CIVIL SAS

36. Nombre comercial	37. Cigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tabio 7 8 5

41. Dirección principal
CL 1 SUR NO 2 - 58

42. Correo electrónico LLONAS07@YAHOO.ES

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 2 3 0	3 2 0 2 7 1 4 1 0 1	3 1 3 8 8 3 7 4 7 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 0 2 0 8							0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
7- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

4. CEDULA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.406.070
PINZON GARCIA
APELLIDOS
OSCAR LEONARDO
NOMBRES
FIRMA

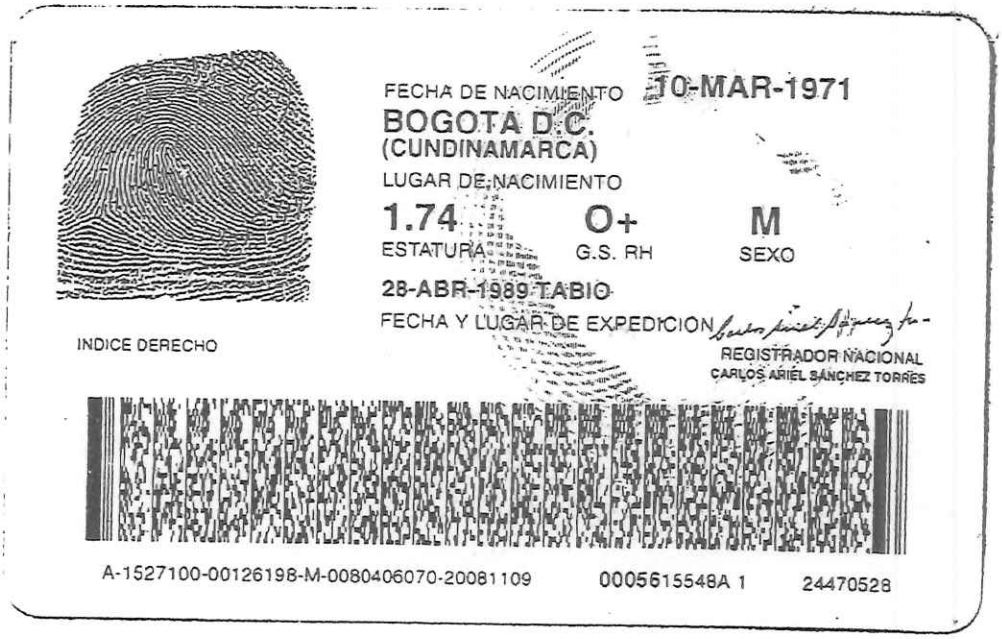
FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-ABR-1989 TABIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1527100-00126198-M-0080406070-20081109
0005615548A 1
24470528

5. ACTA PARCIAL

OBRAS DE ALCANTARILLADO A DESARROLLAR EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 259.930.257
	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 132.910.858
FECHA: 24 DE MARZO DE 2026	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL 2	$ 55.929.094
	VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 188.839.952
	VALOR POR EJECUTAR	$ 71.090.305

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
PRELIMINARES											
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES	ML	30,00	$ 10.867,00	$ 326.010,00		0,00	92,80	1008457,60	92,80	$ 1.008.458
1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	31,00	$ 64.373,00	$ 1.995.563,00	10,10	$ 650.167	28,20	1815318,60	38,30	$ 2.465.486
1	CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE	ML	71,80	$ 13.800,00	$ 990.840,00	25,50	$ 351.900	27,36	$ 377.568,00	52,86	$ 729.468
3,1,3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUÍA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	29,10	$ 63.630,00	$ 1.851.633,00	15,00	$ 954.450	32,80	$ 2.087.064,00	47,80	$ 3.041.514
1,1,3	MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO	ML	29,10	$ 12.516,00	$ 364.215,60	15,00	$ 187.740	65,40	$ 818.546,40	80,40	$ 1.006.286
2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	8,93	$ 337.156,00	$ 3.010.803,08		$ 0		0,00	0,00	$ 0
2	DESMONTE REJILLA MAL ESTADO	ML	22,50	$ 109.706,00	$ 2.468.385,00	9,50	$ 1.042.207	12,30	$ 1.349.383,80	21,80	$ 2.391.591
EXCAVACIONES Y RELLENOS											
16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H:0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	48,14	$ 74.287,00	$ 3.576.176,18		$ 0	5,81	431607,47	5,81	$ 431.607
16,9	RELLENO GRAVILLA DE RIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	2,00	$ 161.642,00	$ 323.284,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	17,60	$ 171.711,00	$ 3.022.113,60		$ 0		0,00	0,00	$ 0
16,8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0,45	$ 114.530,00	$ 51.538,50		$ 0		0,00	0,00	$ 0
2,2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	13,80	$ 161.664,00	$ 2.230.963,20		$ 0		0,00	0,00	$ 0
1,6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	625,82	$ 1.735,00	$ 1.085.797,70		$ 0	223,33	$ 387.477,55	223,33	$ 387.478
CONCRETOS											
4,33	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15 X 40 FUNDIDO EN CONCRETO CLASE E DE 2500 PSI	ML	5,00	$ 64.072,00	$ 320.360,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
3	CONCRETO CARCAMO 3500 PSI	M3	16,69	$ 1.616.906,00	$ 26.986.161,14	11,28	$ 18.240.317	3,29	$ 5.319.620,74	14,57	$ 23.559.937
4,6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	1,63	$ 790.672,00	$ 1.288.795,36		$ 0	10,29	$ 8.136.014,88	10,29	$ 8.136.015
2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,00	$ 911.849,00	$ 911.849,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
4,27	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	2,35	$ 567.490,00	$ 1.333.601,50		$ 0	2,35	$ 1.333.601,50	2,35	$ 1.333.602
4,52	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1924,34	$ 7.951,00	$ 15.300.427,34	704,94	$ 5.605.016	353,74	$ 2.812.586,74	1058,68	$ 8.417.603
ALCANTARILLADO											
4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	3,00	$ 3.034.437,00	$ 9.103.311,00		$ 0	2,00	$ 6.068.874,00	2,00	$ 6.068.874
3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	12,00	$ 68.280,00	$ 819.360,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	12,00	$ 95.783,00	$ 1.149.396,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	6,00	$ 137.362,00	$ 824.172,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
4	CONCRETO DE PROTECCION TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	0,38	$ 904.858,00	$ 343.846,04		$ 0		0,00	0,00	$ 0
5	REJILLA METALICA PARA CARCAMO	ML	28,50	$ 536.047,00	$ 15.277.339,50	22,30	$ 11.953.848	5,97	$ 3.200.200,59	28,27	$ 15.154.049
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO											
1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	519,14	$ 13.599,00	$ 7.059.784,86	439,57	$ 5.977.712,43		0,00	439,57	$ 5.977.712
3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	519,13	$ 5.948,00	$ 3.087.785,24	439,57	$ 2.614.562,36		0,00	439,57	$ 2.614.562
6	INSTALACION DE MEZCLA DENZA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	54,35	$ 1.139.888,00	$ 61.952.912,80	45,93	$ 52.355.056		0,00	45,93	$ 52.355.056
COSTOS DIRECTOS					**$ 167.056.425**		**$ 99.932.976**		**$ 36.146.322**		**$ 135.079.298**
ADMINISTRACIÓN		27%		%	$ 45.105.235		$ 26.981.903		$ 9.489.507		$ 36.471.410
IMPREVISTOS		1%		%	$ 1.670.564		$ 999.330		$ 351.463		$ 1.350.793
UTILIDAD		5%		%	$ 8.352.821		$ 4.996.649		$ 1.757.316		$ 6.753.965
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 222.185.045**		**$ 132.910.858**		**$ 46.744.608**		**$ 179.655.466**

OBRAS DE REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

PRELIMINARES											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL			CANT	VR. TOTAL
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES	ML	55,00	$ 10.867,00	$ 597.685,00		$ 0	194,89	$ 2.117.869,63	194,89	$ 2.117.870
1,1,3	MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO	ML	55,00	$ 12.516,00	$ 688.380,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
IMPACTO URBANO											

INSPECCION DE LA TRABERA Y EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	2	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1		$ 132.910.858
	FECHA: 24 DE MARZO DE 2026	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL 2		$ 55.929.094
		VALOR TOTAL ACUMULADO		$ 188.839.952
		VALOR POR EJECUTAR		$ 71.090.305

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
3,1,3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUÍA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES	20,00	$ 63.630,00	$ 1.272.600,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
EXCAVACIONES Y RELLENOS											
4,3,1	EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3	42,00	$ 21.200,00	$ 890.400,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
5,1,6	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERIA	M3	15,40	$ 158.855,00	$ 2.446.367,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
5,1,2	RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE (RANA)	M3	20,00	$ 114.530,00	$ 2.290.600,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
6.1.2	TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INCLUYE CARGUE NI DERECHOS BOTADERO)	M3	2202,00	$ 1.338,00	$ 2.946.276,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO											
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	55,00	$ 68.280,00	$ 3.755.400,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
POZOS DE INSPECCION											
8,3,13	PLACA CUBIERTA POZO D=170 CME:20 CM 27,6 MPA (4000PSI) PREFABRICADO	UN	3,00	$ 1.360.594,00	$ 4.081.782,00		$ 0	2,00	$ 2.721.188,00	2,00	$ 2.721.188
8,3,2	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION D=1.20M, E: 25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS EN ACERO 3/4"	ML	6,00	$ 1.291.607,00	$ 7.749.642,00		$ 0	1,60	$ 2.066.571,20	1,60	$ 2.066.571
8,3,5	BASE PARA POZO D=170 CM, E: 20 CM (INCLUYE RECEBO Y CAÑUELA) 21 MPA (3000PSI)	UN	3,00	$ 440.085,00	$ 1.320.255,00		$ 0		0,00	0,00	$ 0
9,5,1	ACERO DE REFUERZO	KG	45,36	$ 7.506,00	$ 340.472,16		$ 0		0,00	0,00	$ 0
COSTOS DIRECTOS					$ 28.379.859		$ 0		$ 6.905.629		$ 6.905.629
ADMINISTRACIÓN			25%	%	$ 7.094.965		$ 0		$ 1.726.407		$ 1.726.407
IMPREVISTOS			3%	%	$ 851.396		$ 0		$ 207.169		$ 207.169
UTILIDAD			5%	%	$ 1.418.993		$ 0		$ 345.281		$ 345.281
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 37.745.213		$ 0		$ 9.184.486		$ 9.184.486
COSTOS DIRECTOS									$ 42.051.951		
ADMINISTRACIÓN			25%	%					$ 11.215.914		
IMPREVISTOS			3%	%					$ 558.632		
UTILIDAD			5%	%					$ 2.102.597		
VALOR TOTAL OBRA					$ 259.930.257		$ 132.910.858		$ 55.929.094		$ 188.839.952

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
GERENTE GENERAL
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,1,1	ML	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

DESCRIPCION	LONGITUD			TOTAL
LOCALIZACION POZO 1 EXISTENTE EN PRADERA PARA UBICACIÓN DE POZO	65,4			65,40
LOCALIZACION POZO 2 EXISTENTE EN PRADERA PARA UBICACIÓN DE POZO	27,40			27,40
PASAN				92,80
				92,80

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

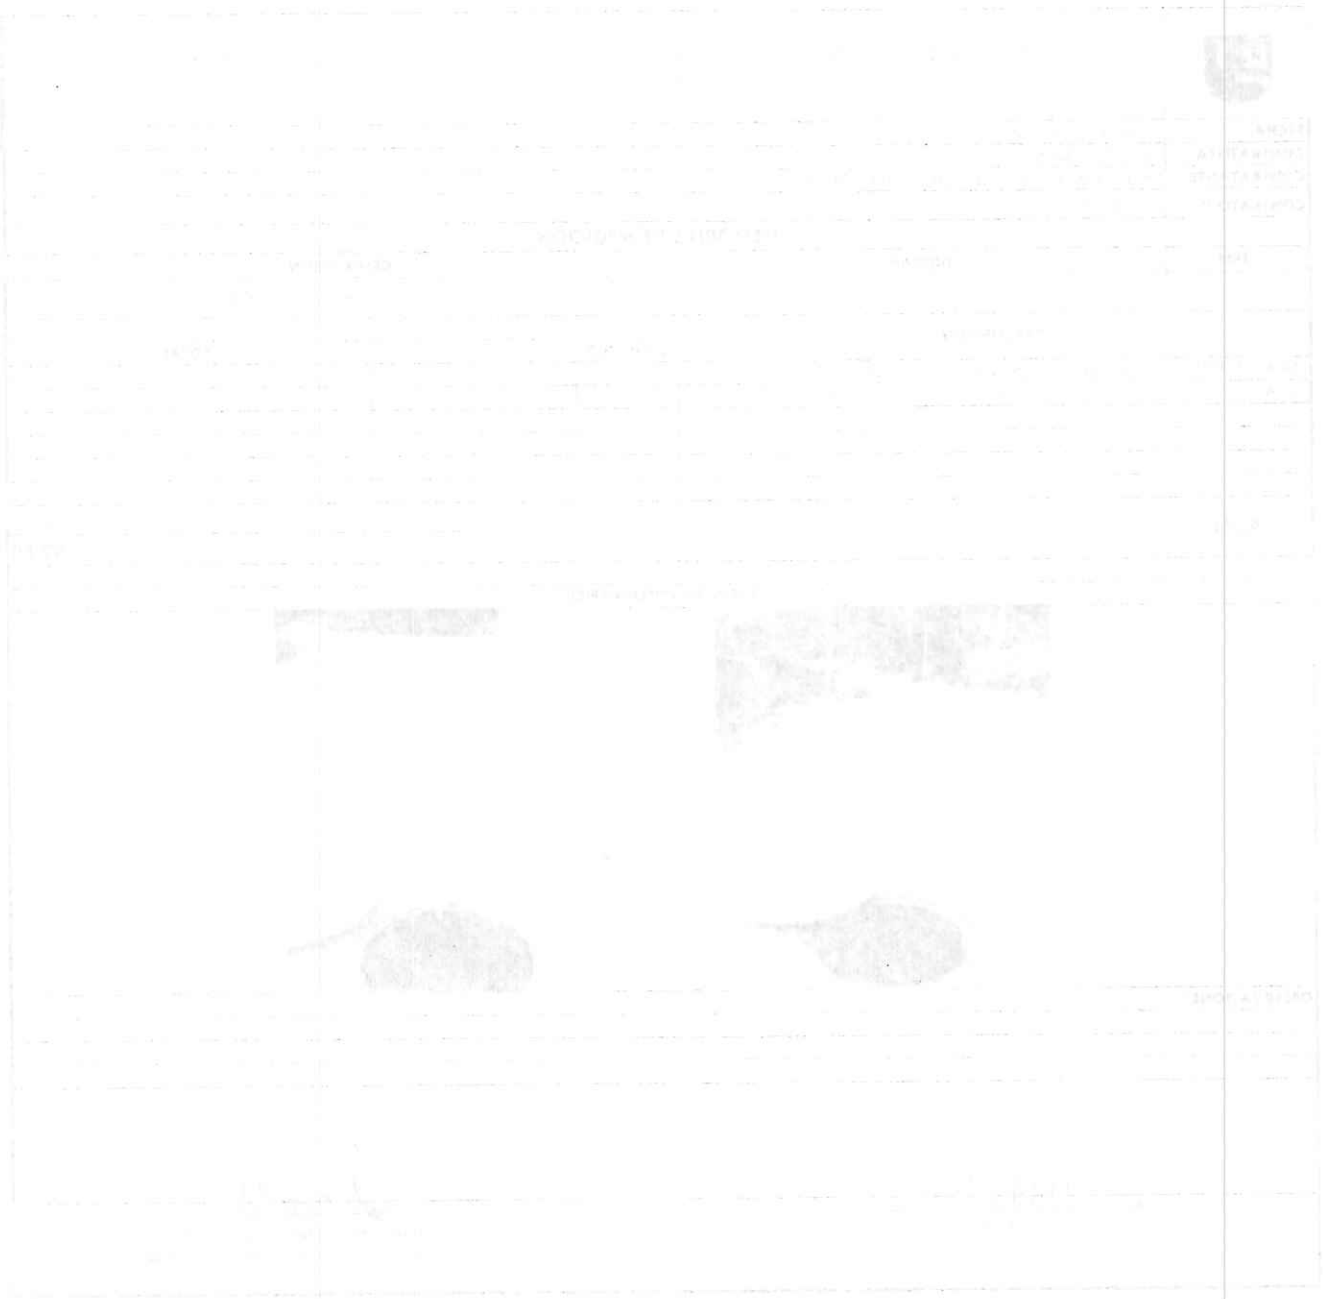

	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,28	M2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO		TOTAL
SE HACE LA DEMOLICION DE PLACA EN EL SECTOR DE LA UNION EN	4,7	6		28,20
LA INSPECCION DE LA PRADERA PARA UBICACIÓN DE POZO Y				
ARREGLO DE PLACA HUELLA EXISTENTE				
PASAN				28,20
				28,20

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP



OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,00	ML	CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

DESCRIPCION	LONGITUD			TOTAL
CORTE DE ASFALTO DE EL SECTOR DEL BOSQUE PARA CARCAMO	12			12,00
CORTE DE ASFALTO EN CLL 3-A PARA SUMIDERO	2,33			2,33
CORTE DE ASFALTO EN SECTOR DE LA PRADERA PARA SUMIDERO	2,33			2,33
CORTE DE ASFALTO EN EL SECTOR DE LA FUENTE EN PRADERA	10,7			10,70
PASAN				27,36
				27,36

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3.1.3	ML/MES	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUÍA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS

DESCRIPCION	ML/MES			TOTAL
SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO EN AREAS DEL BOSQUE	20,00			20,00
SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO EN PARADERA SUMIDERO	2,10			2,10
SEÑALIZACION Y AISLAMIENTO EN EL SECTOR DE LA UNION-PRADERA	10,7			10,70
PASAN				32,80
				32,80

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,1,3	ML	MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO

DESCRIPCION	LONGITUD			TOTAL
SE LLEVA A CABO EL MANEJO DE AGUAS DESDE EL POZO EXISTENTE EN LA	65,4			65,40
PARTE NORTE DE LA SALIDA DE LA UNION HASTA EL POZO QUE SE ENCONTRO				
DEBAJO DE LA PLACA HUELLA EXISTENTE				
PASAN				65,40
				65,40

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK



OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
2,00	ML	DESMONTE REJILLA MAL ESTADO

DESCRIPCION	LONGITUD			TOTAL
SE HACE EL DESMONTE DE LA REJILLA CLLE 6-2A PRADERA	6,80			6,80
SE HACE EL DESMONTE DE LA REJILLA SALIDA A UNION EN PRADERA	5,50			5,50
PASAN				12,30
				12,30

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
16,40	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H:0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

DESCRIPCION	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	TOTAL
SE LLEVA A CABO EXCAVACION PARA CARCAMO EN SECTOR DEL BOSQUE	0,86	6,00	0,88	4,54
SUMIDERO EN SECTOR COLEGIO EN LA PRADERA	0,65	1,03	1,90	1,27
PASAN				5,81
				5,81

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,60	M3/Km	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

DESCRIPCION	LONGITUD	LARGO	PROFUNDIDAD	FACTOR	KM	TOTAL
SE TRANSPORTA EL MATERIAL SOBRANTE DE EL SECTOR DEL BOSQUE	0,86	6,00	0,88	1,30	15,00	88,55
SE TRANSPORTA EL MATERIAL SOBRANTE DE SUMIDERO PRADERA	0,65	1,03	1,90	1,30	15,00	24,80
SE TRANSPORTA MATERIAL SOBRANTE DE LA UNION EN PRADERA	6,00	4,70	0,20	1,30	15,00	109,98
PASAN						223,33
						223,33

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
3,00	M3	CONCRETO CARCAMO 3500 PSI

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
SE FUNDE PLACA EN CARCAMO DEL SECTOR DEL BOSQUE	6,00	0,86	0,22	1,11
SE FUNDE CARCAMO EN SECTOR DEL BOSQUE SUBACHOQUE	LARGO	ALTURA	ESPESOR	
	13,00	0,70	0,24	2,18
PASAN				3,29
				3,29

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4.60	M3	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
SE FUNDEN HUELLAS EN SECTOR DE LA UNION EN LA PRADERA	6,00	0,75	0,75	3,00	10,08
SE FUNDE CANALETA A PLACA HUELLA	6,00	0,55	0,20		0,66
SE DESCUENTA VOLUMEN OCUPADO POR CARGUE DE POZO	π	RADIO	ALTURA		
	3,141593	0,72	(0,20)		-0,45
PASAN					10,29
					10,29

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

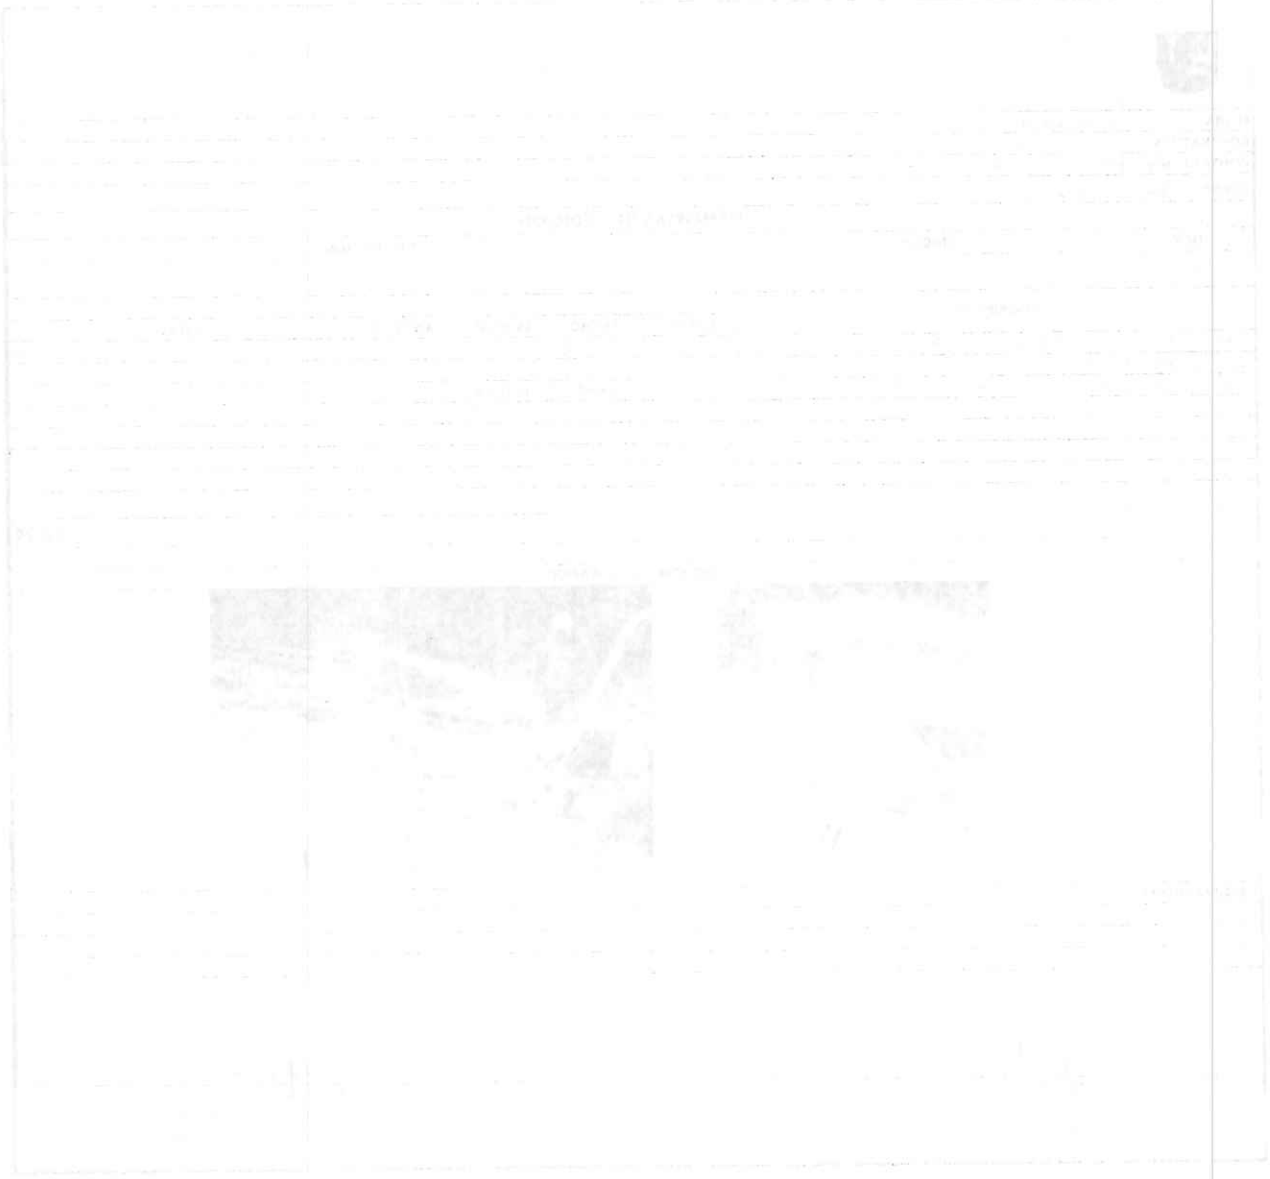

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE


FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,27	M3	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
SE FUNDE CONCRETO COCLOPEO HUELLAS EN SECTOR DE LA UNION	6,00	0,65	0,20	3,00	2,35
PASAN					2,35
					2,35

REGISTRO FOTOGRAFICO

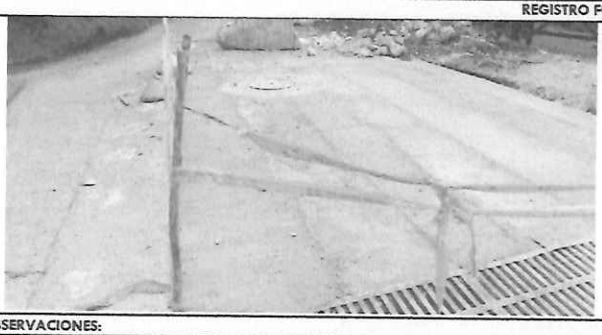



OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP



	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,52	KG	ACERO FIGURADO 60000 PSI

DESCRIPCION	LONGITUD	CANTIDAD	ESO UNITARO (K	TOTAL
ACERO LONGITUDINAL PARA MURO DE CONCRETO CARCAMO DEL BOSQUE	12,94	4,00	0,994	51,45
ACERO TRANSVERSAL PARA MURO DE CONCRETO CARCAMO DEL BOSQUE	0,88	68,00	0,994	59,48
TRASLAPOS	0,50	16,00	0,994	7,95
ACERO PLACA LONGITUDINAL	12,94	5	0,994	64,31
ACERO PLACA TRASNVERSAL	0,62	29	0,994	17,67
TRASLAPO VARILLA PLACA	0,4	6	0,994	2,39
ACERO DE REFUERZO LONGITUDINALPARA HUELLAS EN SECTOR LA UNION	6	12	0,994	71,57
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL PARA HUELLAS EN SECTOR LA UNION	0,88	90	0,994	78,72
PASAN				353,74
				353,74

REGISTRO FOTOGRAFICO



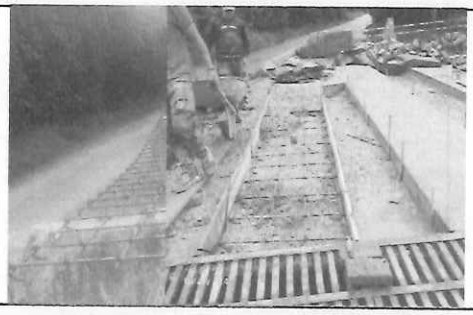

OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
4,90	UNIDAD	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100

DESCRIPCION	UNIDAD		TOTAL
SE CONSTRUYE SUMIDERO EN LA PRADERA SECTOR DEL COLEGIO	1,00		1,00
SE CONSTRUYE SUMIDERO EN LA CLLE 3A SUBACHOQUE	1,00		1,00
PASAN			2,00
			2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP



	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
5,00	ML	REJILLA METALICA PARA CARCAMO

DESCRIPCION	LONGITUD			TOTAL
REJILLA PARA CARCAMO EN EL SECTOR DEL BOSQUE SUBACHOQUE	5,97			5,97
PASAN				5,97
				5,97

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
1,1,1	ML	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

DESCRIPCION	UBICACIÓN	LONGITUD		TOTAL
SE LLEVA A CABO LA LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES EN EL	PE-PZ1	30,00		30,00
SECTOR DE LA SALIDA DE LA PTAR PARA LA CONSTRUCCION DE LA	PZ1-PZ2	30,00		30,00
RED DE ALCANTARILLADO EN 8"	PZ2-PZ3	55,25		55,25
	PZ3- PE	79,64		79,64
PASAN				194,89
				194,89

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP



	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
8,3,13	UNIDAD	PLACA CUBIERTA POZO D=170 CME:20 CM 27,6 MPA (4000PSI) PREFABRICADO

DESCRIPCION	CANTIDAD		TOTAL
SE INSTALA CUBIERTA D: 1,7 M EN POZO SECTOR LA UNION DE LA INSPECCION	1,00		1,00
DE LA PRADERA			
SE INSTALA CUBIERTA D: 1,7 M AL FRENTE DE LA INSPECCION DE POLIICIA DEL	1,00		1,00
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE			
PASAN			2,00
			2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP


	OBJETO: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
FECHA:	24 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	OLPG CIVIL S.A.S
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	001 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
8,3,2	ML	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION D=1.20M, E: 25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS EN ACERO 3/4"

DESCRIPCION	LONGITUD		TOTAL
SE HACE LA CONSTRUCCION DEL CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION EN	1,40		1,40
LADRILLO RECOCIDO EN EL SECTOR DE LA UNION DE INSPECCION DE LA			
PRADERA			
SE LEVANTA MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA ARREGLO DE POZO DE	0,20		0,20
INSPECCION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SUBCHOQUE			
PASAN			1,60
			1,60

REGISTRO FOTOGRAFICO

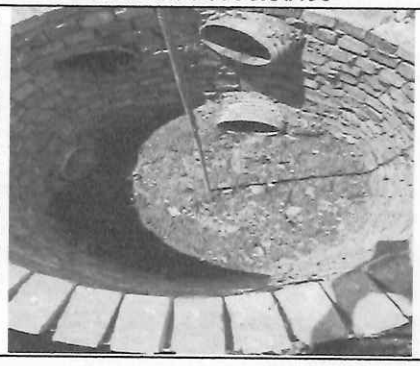
OBSERVACIONES:

ING. OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA
R/L OLPG S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

6. INFORME DE OBRA 2

6. INFORME DE ORRA 2

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA 2

CONTRATO 001 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE"

2026

CONTENIDO

- INTRODUCCION
- ESTADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 001 DE 2025
- ESTADO PORCENTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 001 DE 2025
- ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO 001 DE 2025
- REGISTRO FOTOGRAFICO

INTRODUCCION

En el siguiente informe se dan a conocer las actividades realizadas dentro del contrato 01 de 2025 cuyo objeto es: CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE", en donde se llevaron a cabo actividades como la construcción de sumideros, construcción de cárcamo en el sector del bosque del municipio de Subachoque, construcción de pozo de inspección y placa huella en la inspección de la Pradera en la salida de la unión y arreglo de pozo de inspección existente en la estación de policía del municipio de Subachoque.

ESTADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 001 DE 2025

Objeto: "CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Acta de inicio: 20 de noviembre de 2025

Valor: $ 259.930.257

Supervisor: EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE

CONTRATISTA: OLPG CIVIL S.A.S

PRORROGAS: 2

PAGOS REALIZADOS: $ 132.910.858

ESTADO PORCENTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 001 DE 2025

Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance del **72,65%** de la ejecución total del contrato 01 DE 2025, en donde se llevaron a cabo las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO 001 DE 2025

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

Esta actividad se llevó a cabo en el sector de la unión de la inspección de la Pradera para la ubicación del pozo existente bajo la placa huella existente y que se encontraba rebosando aguas negras en este sector, lo que estaba causando un problema de tipo sanitario y ambiental para la comunidad aledaña al sitio.

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M

Esta actividad se llevo a cabo en el sector de la unión en la inspección de la Pradera en donde se hizo la demolición de placa huella para la ubicación del pozo de inspección que se encontraba rebosando aguas negras en este sitio y en donde después de la ubicación y arreglo del pozo se llevo a cabo la construcción de la placa huella intervenida.

CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE

Esta actividad se llevó acabo en el sector del bosque del municipio de Subachoque para la construcción del cárcamo en concreto reforzado para poder dar manejo a las aguas lluvias en esta parte del municipio de Subachoque, además del corte de asfalto en la CLL 3-A para la construcción del sumidero en este sector de Subachoque, además se hizo corte de pavimento rígido en el sector del colegio en la inspección de la Pradera para la construcción de un sumidero para poder disponer las aguas lluvias en el sector hacia la quebrada natural existente y por último se hizo el corte de concreto de la placa huella existente en el sector de la unión de la inspección de la Pradera para la ubicación del pozo de inspección que se encuentra rebosando aguas negras en el sector.

SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUÍA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS

Esta actividad se llevó a cabo para la correcta señalización de las áreas intervenidas para la construcción tanto del cárcamo en el sector del bosque, como para los sumideros en la inspección de la Pradera y Subachoque y para la construcción del pozo de inspección y placa huella en el sector de la unión de la inspección de la Pradera.

MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO

Esta actividad se realizó en el sector de la unió de la inspección de la Pradera para la ubicación del pozo de inspección que estaba tapado y rebosando aguas negras en el sitio, para el arreglo del mismo y para la construcción de la placa huella intervenida para llevar a cabo las actividades ya mencionadas.

DESMONTE REJILLA MAL ESTADO

Se llevó a cabo esta actividad en la inspección de la Pradera en donde se retiraron las rejillas existentes y en mal estado en la calle 6-2ª y en la salida hacia la UNION, para la posterior instalación de la rejilla nueva para la correcta disposición de las aguas lluvias en ambos sectores. OK

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H:0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Se llevó a cabo la excavación manual en el sector del bosque del municipio de Subachoque para la construcción del cárcamo en concreto reforzado y en la inspección de la pradera sector del colegio para la construcción del sumidero en este sector. OK

TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES

Se llevo a cabo el transporte de materiales provenientes de las excavaciones realizadas en el sector del bosque para la construcción del cárcamo, en el sector del colegio en la inspección de la Pradera para la construcción del sumidero en el sector del colegio y el sector de la unión el material sobrante de la demolición de la placa huella existente también en la inspección de la Pradera. OK

CONCRETO CARCAMO 3500 PSI

Se construye cárcamo en concreto reforzado en el sector del bosque del municipio de Subachoque para el correcto manejo y disposición de las aguas lluvias. OK.

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

Esta actividad se llevó a cabo en el sector de la unión en la inspección de la Pradera para la construcción de la placa huella que se intervino en este sitio para el arreglo del pozo de inspección que se encontraba tapado y rebosando aguas negras y causando afectaciones de tipo sanitario y ambiental para la comunidad aledaña a este sector. OK.

CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

Esta actividad se llevó a cabo en el sector de la unión en la inspección de la Pradera para la construcción de la placa huella que se intervino en este sitio para el arreglo del pozo de inspección que se encontraba tapado y rebosando aguas negras y causando afectaciones de tipo sanitario y ambiental para la comunidad aledaña a este sector. OK

ACERO FIGURADO 60000 PSI

Se utiliza acero figurado como refuerzo trasversal y longitudinal para la placa del cárcamo y el cárcamo de concreto en el sector del bosque del municipio de Subachoque, también se utilizó para la construcción de la huella intervenida en el sector de la unión la cual se tuvo que intervenir para el arreglo del pozo de inspección que se encontraba tapado y que estaba causando afectaciones de tipo sanitario y ambiental para la comunidad aledaña a este sector. OK

SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100

Se construye sumidero en la calle 3ª del municipio de Subachoque para poder disponer las aguas lluvias en este sector a las redes de alcantarillado municipal y se construye un sumidero en la inspección de la pradera en el sector del colegio para disponer las aguas provenientes por escorrentía hacia la fuente natural existente en el sector.

OK

REJILLA METALICA PARA CARCAMO

Se instala rejilla para el cárcamo en el sector del bosque del municipio de Subachoque para la correcta disposición de las aguas lluvias en este sector y evitar que las mismas causen afectaciones a las viviendas aledañas.

OK

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

Se lleva a cabo la localización y replanteo de las redes existentes de alcantarillado en la entrada de la PTAR para poder llevar a cabo la construcción de la red de alcantarillado en 8" sanitaria para las viviendas aledañas a este sector, en donde se tuvo que llevar a cabo la excavación aleatoria en este sector para poder ubicar la red existente y así poder diseñar la red a construir, después de encontrar la red existente se llevo a cabo el levantamiento topográfico con elementos de precisión para el diseño de la red de alcantarillado a construir.

OK

PLACA CUBIERTA POZO D=170 CME:20 CM 27.6 MPA (4000PSI) PREFABRICADO

Se hace la instalación de la cubierta para pozo de diámetro 1,7 m para el pozo ubicado en la vía al frente de la inspección de policía del municipio de Subachoque y se hace la instalación de otra cubierta para pozo en el sector de la unión para el pozo que se encontraba tapado y rebosando aguas negras en este sitio.

OK


CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION D=1.20M, E: 25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS EN ACERO 3/4"


Se construye el cilindro para pozo de inspección en el sector de la de policía del municipio de Subachoque para el arreglo del pozo existente que presentaba afectaciones estructurales en su mampostería y cubierta, además se construye el cilindro para pozo en el sector de la unión de la inspección de la Pradera para el pozo de inspección que se encontraba tapado y rebosando aguas negras en el sitio.

OK

REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES

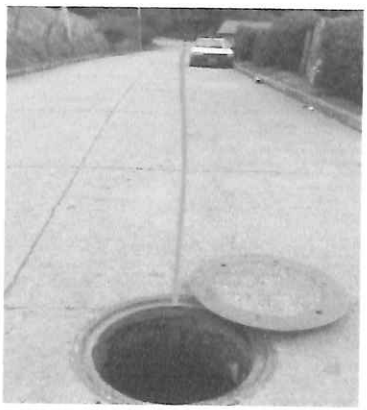

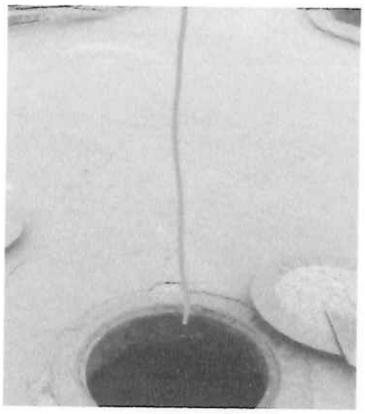

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M





CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE





SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUÍA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS





MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO





DESMONTE REJILLA MAL ESTADO







EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H:0.0 - 2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)






CONCRETO CARCAMO 3500 PSI





CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)

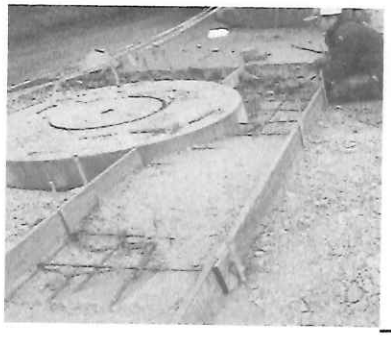




CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES





ACERO FIGURADO 60000 PSI



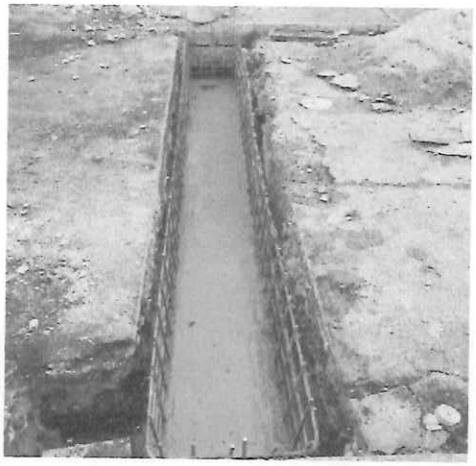

SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100





REJILLA METALICA PARA CARCAMO





LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES





PLACA CUBIERTA POZO D=170 CME:20 CM 27,6 MPA (4000PSI) PREFABRICADO





CILINDRO PARA POZO DE INSPECCION D=1.20M, E: 25 CM, EN LADRILLO RECOCIDO, INCLUYE PAÑETE Y PASOS EN ACERO 3/4"





DANIEL CASTAÑEDA CHISCO

ING RESIDENTE DE OBRA

7. PLANILLAS DE SEGURIDAD

7. PLANILLAS DE SEGURIDAD

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
D...mento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
T... e Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076620299		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑEDA CHISCO DANIEL ALBEIRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															30	30	30	30		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS009		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	0.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF20	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80393464						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	VELA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIT		Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	ISC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	ISC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	ISC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	ISC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30			F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	0.696 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
D[illegible]mento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
T[illegible]e Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3152435		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					PEREZ GAONA JOSE FRANCISCO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	VIT	DIAS AFP	DIAS EPS	DIAS ARP	DIAS CCF				Código APP	Código Trns. APP	Tarifa APP	IBC	Total Aporte APP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	30				230501		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento							Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 1077033556		Residente		Exonerado	S					
Tipo Cotizante	01	00					LEON BARRAGAN JUAN SEBASTIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30			F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	0.696 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF20	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

$ '

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1074188047						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	MORALES VILLALBA YESID ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TDE	TDP	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0		F	$ 1.750.000	230301		16 %	$ 1.750.000	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.000	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.000	$ 121.800	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Nazomento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Ti, e Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79729995		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SILVA JOSE ARNULFO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
D[illegible]ento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
T[illegible]e Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076620299		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑEDA CHISCO DANIEL ALBEIRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COT	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SPE	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS003		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 10.000	$ 400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

AGUAS Y ASEO ESP
DE SUBACHOQUE S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2025	
Fecha en la que se rinde en informe	30 de Marzo de 2026
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	OLPG CIVIL S.A.S
NIT / C.C.	901.798.741-2
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica – Operativa
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCIÓN DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE".
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($259,930,26.00)
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contados a partir de la firma del acta de inicio correspondiente.
FECHA DE INICIO:	20/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19/12/2025
SUSPENSIÓN NO.	1
FECHA INICIO SUSPENSIÓN:	18/12/2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	Seis (6) días
FECHA DE REINICIO	24/12/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2025
FECHA INICIO PRORROGA NO. 1 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	24/12/2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	Veintitrés (23) días
FECHA DE REINICIO	16/01/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN.	17/01/2026
FECHA INICIO PRORROGA NO. 2 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	15/01/2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	Ocho (8) días
FECHA DE REINICIO	22/01/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	23/01/2026
FECHA INICIO PRORROGA NO. 3 A LA SUSPENSIÓN NO. 1	22/01/2026
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	20 DÍAS
FECHA DE REINICIO	11/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	12/02/2026
FECHA INICIO PRORROGA NO. 1	12/02/2026

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02	
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2025	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11/03/2026
FECHA INICIO PRORROGA NO. 2	12/02/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20/03/2026
FECHA INICIO PRORROGA NO. 3	21/03/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	20/04/2026

- **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1 INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE OBRA 001 de 2025 en cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre La Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP y **OLPG CIVIL S.A.S**. con Nit No 901.798.741-2, representada legalmente por el Señor **OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No 80.406.070 de Tabio - Cund, del desarrollo del Contrato en mención.

2 ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del Contrato de Obra **COP 001//2025** informa:

Que el contratista, **OLPG CIVIL S.A.S**.con Nit No 901.798.741-2, representada legalmente por el Señor **OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No 80.406.070 de Tabio – Cund, para dar cumplimiento al Contrato de Obra **C00-001//2025** y desarrollar el objeto el cual es "CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCIÓN DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE". Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones conforme a la factura No. FVE31 de fecha 25/03/2026

3 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones que se deben cumplir prestando a la Empresa.

3.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

REF	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	ACTA 2	
				CANT	VR. PARCIAL
PRELIMINARES					
EPC 2025	1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES	ML	92,80	$ 1.008.457,60
ICCU CONSTRUCCION	1,28	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M	M2	28,20	$ 1.815.318,60
APU	1	CORTE A MÁQUINA DE PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE	ML	27,36	$ 377.568,00
EPC 2025	3,1,3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE	ML/MES	32,80	$ 2.087.064,00
EPC 2025	1,1,3	MANEJO DE AGUAS EN ZANJA CUALQUIER ANCHO	ML	65,40	$ 818.546,40
ICCU CONSTRUCCION	2,4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	0,00	$ 0,00
APU	2	DESMONTE REJILLA MAL ESTADO	ML	12,30	$ 1.349.383,80
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
ICCU CONSTRUCCION	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H:0.0 - 2.0 M (INCLUYE	M3	5,81	$ 431.607,47
ICCU CONSTRUCCION	16,9	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	0,00	$ 0,00
ICCU CONSTRUCCION	16,12	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	0,00	$ 0,00
ICCU CONSTRUCCION	16,8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	0,00	$ 0,00
ICCU CONSTRUCCION	2,2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	0,00	$ 0,00
ICCU VIAS 2025	1,6	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES,	M3-KM	223,33	$ 387.477,55
CONCRETOS					
ICCU VIAS 2025	4,33	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 15 X 40 FUNDIDO EN CONCRETO CLASE	ML	0,00	$ 0,00
APU	3	CONCRETO CARCAMO 3500 PSI	M3	3,29	$ 5.319.620,74
ICCU VIAS 2025	4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	10,29	$ 8.136.014,88
ICCU CONSTRUCCION	2,7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,00	$ 0,00
ICCU VIAS 2025	4,27	CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	2,35	$ 1.333.601,50
ICCU VIAS 2025	4,52	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	353,74	$ 2.812.586,74
ALCANTARILLADO					
ICCU URBANISMO	4,9	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO REFORZADO SL-100	UN	2,00	$ 6.068.874,00
ICCU URBANISMO	3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML	0,00	$ 0,00
ICCU URBANISMO	3,26	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	0,00	$ 0,00
ICCU URBANISMO	3,27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	0,00	$ 0,00
APU	4	CONCRETO DE PROTECCION TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	0,00	$ 0,00
APU	5	REJILLA METALICA PARA CARCAMO	ML	5,97	$ 3.200.200,59
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO					
ICCU CONSTRUCCION	1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE	M2	0,00	$ 0,00
ICCU VIAS 2025	3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	0,00	$ 0,00
APU	6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO	M3	0,00	$ 0,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 35.146.322**
ADMINISTRACIÓN					$ 9.489.507
UTLIDAD					$ 1.757.316
IMPREVISTOS					$ 351.463
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 46.744.608**

OBRAS DE REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA					
ITEM		DESCRIPCION		ACTA 2	
		PRELIMINARES		CANT	VR. PARCIAL
EPC 2025	1,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	194,89	$ 2.117.869,63
EPC 2025	1,1,3	MANEJO DE AGUAS EN ZANJA, CUALQUIER ANCHO.	ML		$ 0,00
IMPACTO URBANO					
EPC 2025	3,1,3	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML/MES		$ 0,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
EPC 2025	4,3,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	M3		$ 0,00
EPC 2025	5,1,6	ARENA DE PEÑA PARA SOPORTE DE TUBERÍA	M3		$ 0,00
EPC 2025	5,1,2	RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE (RANA)	M3		$ 0,00
EPC 2025	6,1,2	TRANSPORTE DE SOBRANTES (NO INCLUYE CARGUE NI DERECHOS BOTADERO)	M3		$ 0,00
TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO					
ICCU URBANISMO	3,25	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8"	ML		$ 0,00
POZOS DE INSPECCION					
EPC 2025	8,3,13	PLACA CUBIERTA POZO D=170CM-E=20CM 27,6MPA (4000PSI)	UN	2,00	$ 2.721.188,00
EPC 2025	8,3,2	CILINDRO PARA POZO DE INSPECCIÓN Ø1.20 M., E=25 CM, EN LADRILLO	ML	1,60	$ 2.066.571,20
EPC 2025	8,3,5	BASE PARA POZO D=170CM E=20CM (INCLUYE RECEBO Y CAÑUELA) 21	UN		$ 0,00
EPC 2025	9,5,1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG		$ 0,00
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO HASTA 4 MTS.					
COSTOS DIRECTOS TOTALES					**$ 6.905.629**
ADMINISTRACION 25%			25%		$ 1.726.407
IMPREVISTOS 3%			3%		$ 207.169
UTILIDAD 5%			5%		$ 345.281
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 9.184.486**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 55.929.094**

3.2 PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE PAGO	VALOR

1	**$132´910.858**

4 PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

El contratista certifica encontrarse al día con las obligaciones al sistema de seguridad social integral de salud, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena.

Certificación de pago de aportes sistema general de seguridad social parafiscales / Articulo 50 Ley 789 de 2002 expedido por el señor **OSCAR LEONARDO PINZON GARCIA,** representante legal de OLPG CIVIL SAS

El contratista realiza de pago de obligaciones parafiscales conforme a las planillas adjuntas, que hacen parte del presente informe.

5 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		**$ 259´930.257**
Valor Adición		$ 0
Valor Ejecutado a la fecha	$188.839.952	
Saldo por ejecutar	$71.090.305	
Sumas iguales	**$ 259´930.257**	**$ 259´930.257**

6 VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

La dirección técnica y operativa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el Contrato de Obra **C00 001//2025** cuyo contratista es OLPG CIVIL SAS., Por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($55.929.094.00) MCTE**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca a los Treinta (30) días del mes de Marzo de 2026.

ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Directora Técnica - Operativa

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.		Versión:
		Fecha Versión Formato:
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000060

lunes, 30 de marzo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	OLPG CIVIL SAS	**CC o NIT**	901798741	**DV**	2
DIRECCION	CL 1 SUR 2 58	**TEL**	3202714101		
DESCRIPCION	SEGUNDO PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO 001-2025 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, PAGO DE ACUERDO A LA FRA FVE 31 Y ACTA DE SUPERVISION 02 DEL 30 DE MARZO 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362704	Retención de ICA contratos de obra	55,929,094	0.7	00.00	392,000.00
24408502	Sobretasa Bomberil RETEICA	392,000	2	00.00	8,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	55,929,094	4	00.00	2,237,000.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreacion	55,929,094	1	00.00	559,000.00
24072203	Estampilla justicia para la familia	55,929,094	2	00.00	1,119,000.00
24072201	Estampilla Procultura	55,929,094	1.5	00.00	839,000.00
24402303	Contribucion 5% Contrato de Obra	55,929,094	5	00.00	2,796,000.00
243626	Contratos de construccion			00.00	1,118,582.00
29020123	CONVENIO CONV-CD-129-2025 MTO ALCANTARILLADO			55,929,094.00	00.00
24010101	Bienes y servicios			00.00	46,860,512.00
	SUMAS IGUALES			**55,929,094.00**	**55,929,094.00**
Total Deducciones	**9,068,582.00**	**Valor a Girar**		**46,860,512.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000046	2026000034	2.3.2.3.2.01.01.001.03.16.02.1. 3.1.1.07	GASTOS DE INVERSION. FUENTE: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	GERENCIA	55,929,094.00

TOTAL PRESUPUESTO	**55,929,094.00**

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
GERENTE

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jgonzalez
Elaboró

Modificó

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código: Versión: Fecha Versión Formato:
AGUAS ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000067

Pendiente de Reapuesta

Nit: 900322539-4

martes, 31 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000060	31-mar.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE OLPG CIVIL SAS **CC o NIT** 901798741 **DV** 2

DIRECCION CL 1 SUR 2 58 **TELEFONO** 3202714101

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A OLPG CIVIL SAS **VALOR PAGO** 46,860,512.00

TIPO PAGO transferencia

DESCRIPCION

SEGUNDO PAGO AL CONTRATO DE OBRA CONTRATO 001-2025 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, PAGO DE ACUERDO A LA FRA FVE 31 Y ACTA DE SUPERVISION 02 DEL 30 DE MARZO 2026

SON CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111006109	901798741	Cta Ah Davivienda 459300053244 Convenio CD No 129 de 2025 - Mto Alcantarillado	00.00	46,860,512
24010101	901798741	Bienes y servicios	46,860,512.00	00
		SUMAS IGUALES	**46,860,512.00**	**46,860,512.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000046	2026000034	2.3.2.3.2.01.01.001.03.16.02. 1.3.1.1.07	GASTOS DE INVERSION. FUENTE: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	55,929,094.00
TOTAL PRESUPUESTO				**55,929,094.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000060

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Contratos de construccion	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	2	1,118,582.00
Contribucion 5% Contrato de Obra	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	5	2,796,000.00
Estampilla Procultura	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	1.5	839,000.00
Estampilla justicia para la familia	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	2	1,119,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	1	559,000.00
Estampilla Adulto Mayor	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	4	2,237,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	901798741 OLPG CIVIL SAS	392,000	2	8,000.00
Retención de ICA contratos de obra	901798741 OLPG CIVIL SAS	55,929,094	0.7	392,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**9,068,582.00**

Elaboró: Jgonzalez	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	Transferencia
MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ **GERENTE**	**MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**c.c ó Nit**

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 54148471

Fecha y hora de la transacción: 31 de marzo, 2026 - 12:14 p. m.

Valor

$46,860,512.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550459300053244

Destino

Olpg civil sas

Nit: 9017987412

Bogotá

Cuenta de ahorro | 444235832

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
