OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

DIRECCIÓN : Carrera 8 No. 10-65

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CC-419-2025, COD. 637



INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA No. 01

PERÍODO: 19 DE ENERO DE 2026 AL 16 DE MARZO DE 2026

N V P
CONSORCIO
NIT. 900.850.840-1

NESTOR VARGAS PEDROZA
ARQ. RESTAURADOR
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NVP

NESTOR VARGAS PEDROZA
ARQ. RESTAURADOR
DIRECTOR CONSULTORIA CONSORCIO NVP

OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

DIRECCIÓN : Carrera 8 No. 10-65

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

NÚMERO DE CONTRATO **CONTRATANTE** **NIT.** **CONTRATISTA** **NIT.** **REPRESENTANTE LEGAL** **CEDULA REP. LEGAL** **INTERVENTORIA** **NIT.** **REPRESENTANTE LEGAL** **CEDULA REP. LEGAL**	**: CC-419-2026** **INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC** : 860.506.170-7 : CONSORCIO NVP : 900.850.840.-1 :NÉSTOR VARGAS PEDRAZA : 79378301 :QUINTERO Y RIAÑO SAS : 800.203.806-3 : JUAN DIEGO QUINTERO LOPEZ :79364037
OBJETO DEL CONTRATO	: Cod. 637 - "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C" - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025 SUSCRITO CON SECRETARÍA GENERAL E IDPC"
LUGAR DE EJECUCIÓN	: EL CONSULTOR REALIZARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SOBRE LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS COMO PALACIO LIÉVANO Y PALACIO MUNICIPAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, LOS CUALES ESTÁN UBICADOS EN LA CARRERA 8 NO. 10-65 COSTADO ORIENTAL DE LA MANZANA LIÉVANO Y CARRERA 8 NO. 10-65 COSTADO SUR DE LA MANZANA LIÉVANO RESPECTIVAMENTE.
VALOR DEL CONTRATO	EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION CORRESPONDE A LA SUMA DE QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($511.700.000), INCLUIDO IVA, DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES Y TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO ES DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 41° DE LA LEY 80 DE 1993 Y ARTÍCULO 23° DE LA LEY 1150 DE 2011. EL TÉRMINO DEL PLAZO NO EXIMIRÁ A LA CONSULTORÍA DE ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE LE FORMULE EL INSTITUTO SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, O AQUELLAS QUE RESULTEN NECESARIAS, EN CUYO CASO, LA CONSULTORÍA SE OBLIGARÁ A RESPONDER Y ATENDER LAS MISMAS, SIN QUE ELLO GENERE COSTO O RECLAMACIÓN ALGUNA A FAVOR DEL CONSULTOR Y ÉSTA ASÍ LO ACEPTA EXPRESAMENTE CON LA FIRMA DEL CONTRATO.

CONTENIDO

1. INFORME TÉCNICO

1,1 ESTUDIOS PRELIMINARES
1,2 PROGRAMACIÓN
1,3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1,4 DOCUMENTOS ANEXOS
1,5 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

2. INFORME ADMNISTRATIVO

2,1 RESUMEN CONTRATO DE ESTUDIOS
2,2 CONTROL DEL PERSONAL
2,3 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2,4 POLIZAS
2,5 COMITES
2,6 ACTAS REALIZADAS
2,7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2,8 DOCUMENTOS ANEXOS
2,9 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS
2,10 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

3. INFORME FINANCIERO

3,1 RESUMEN DEL CONTRATO
3,2 PAGOS REALIZADOS POR EL IDPC
3,3 DOCUMENTOS ANEXOS
3,4 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS
3,5 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

4. INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	Consorcio NVP
INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA	**No. 01**

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

1. ESTUDIOS PRELIMINARES

1,0 ESTUDIOS PRELIMINARES	Se avanzó en la recopilación y revisión de información documental, histórica y normativa existente en archivos institucionales, planos de diferentes épocas, registros fotográficos históricos, contratos de intervención anteriores, licencias y actos administrativos relacionados con la declaratoria patrimonial y el Plan Especial de Manejo y Protección.

1.2 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN	En el presente período se desarrolló el Primer Mes de Consultoría (19 enero a 19 febrero de 2026), registrando los porcentajes de AVANCE PROGRAMADO (AP) vs. AVANCE REAL (AR), según la PROGRAMACIÓN DE CONSULTORÍA, donde se tiene en cuenta las actividades ejecutadas en la obra por capítulos, relacionadas así:
	1. ESTUDIOS PRELIMINARES: AP (30%) - AR (25%).
	2. ESTUDIOS DE VALORACIÓN: AP (0%) - AR (0%).
	3. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS: AP (0%) - AR (0%).
	4. REDIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS EXTERIORES (CALLE 10, CARRERA 8, CALLE 11): AP (0%) - AR (0%).
	5. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FACHADAS INTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y PALACIO LIÉVANO (OCCIDENTAL DEL PALACIO MUNICIPAL, NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y OCCIDENTAL DE PALACIO LIÉVANO): AP (0%) - AR (0%).
	6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA CAÍDAS - PUNTOS DE ANCLAJE EN CUBIERTAS: AP (0%) - AR (0%).
	7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS: AP (0%) - AR (0%).
	8. PRESUPUESTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CRONOGRAMA, LOGÍSTICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: AP (0%) - AR (0%).
	9. ELABORACIÓN DE INSUMOS PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN: AP (0%) - AR (0%).
	10. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: AP (0%) - AR (0%).
	11. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: AP (0%) - AR (0%).

1.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRELIMINAR	Se realizó visita a los inmuebles el dia 6 de febrero por parte de los consultores, con el fin de verificar el estado actual de las fachadas y las cubiertas de los edificios y poder contrastar con los planos arquitectónicos. Esta visita fue acompañada por parte de la profesional de la alcaldia y se generó un acta de visita.
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO	Se realizó el levantamiento fotográfico de las fachadas exteriores del Palacio Lievano y Municipal, se presentaron problemas en las fachadas norte y sur dado que el ancho de via no permite realizar un toma fotográfica apropiada y perpendicular a la fachada. Se inicio el proceso de gestión de espacio con lo edificios equineros que se encuentran en frente de estas fachadas con el fin de realizar el ingreso y poder realizar una toma fotográfica apropiada.
TRABAJO DE CAMPO	Se inicio el mapeo de patologías en la fachada exterior del Palacio Lievano, comenzando desde el costado sur hacia el norte.

1.4 - DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	Acta de Inicio Consultoría
	Formatos de trabajo (Ficha de registro fotográfico - Ficha de calificación de fachadas - Rotulo para planos - cronograma)

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CAPITULO 1 - INFORME TÉCNICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

1.5 - COMENTARIOS Y CONCLUSIONES TÉCNICAS

- Se entregaron los documentos requeridos para el Primer Pago del contrato de consultoría CC-573-2024, describiendo los ítems y registro del estado de cada producto, según oficio No. 010-24-NVP-Diseños CC, del 09 de diciembre 2024.

- Se comenzó la verificación y análisis de los Estudios anteriroes enviados por el IDPC.

- Se realizó comité virtual el dia 5 de febrero, en el cual la supervisión por parte el IDPC solicitó al consultor enviar los formatos de trabajo de campo, rotulos y cronograma, con el fin de validar por parte de la interventoria.

-Se envio a la inteventoria mediante oficio 008-26-NVP-PLM. con fecha del 6 de febrero la documentación solicitada, en respuesta la interventoria solicita realizar ajustes mediante el oficio QYR–004–2026, con fecha del 9 de febrero

- Se pudo evidenciar que aunque los planos de las fachadas exteriores contienen la información necesaria, presentan algunas variaciones en medidas y proporción, como es el caso del tamaño de algunos dinteles en el segundo y tercer cuerpo, el ancho de algunas columnas y vanos en la galeria del primer nivel, la dimensión de la base en las columnas de la galeria y el tamaño de las rejas de los balcones entre otros.

- Se avanza en el mapeo de las fachadas exteriores del Palacio Lievano con el fin de registrar las patologias exitentes, comenzando desde el costado norte hacia el sur.

- Se comenzó el registro de la calificación en los planos arquitectonicos en versión .DWG

1.6 - CONSTANCIA DE ACEPTACION

Arq. NÉSTOR VARGAS PEDRAZA
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
CONSORCIO NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | BOGOTÁ	Consorcio NVP
INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA **PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026**	**No. 01**

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

2.1 RESUMEN CONTRATO DE ESTUDIOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	CC-419-2025
OBJETO	Cod. 637 - "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C" - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025 SUSCRITO CON SECRETARÍA GENERAL E IDPC"
CIUDAD	BOGOTA D.C
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC
NIT.	860.506.170-7
VALOR INICIAL	$511.700.000
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	Acta de Inicio 19 de enero 2026
FECHA DE TERMINACIÒN	19 de mayo 2026

2.2 CONTROL DEL PERSONAL

2.2.1 PERSONAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS	Director de Consultoría (50% mes)	1	Arq. Néstor Vargas Pedroza
	Coordinador de Estudios (100% mes)	1	Arq. Edgar Anzola
	Asesor Restaurador (30% mes)	1	Arq. David Rivera Galeano
	Especialista en Ing.Hidráulica (20% mes)	1	Sandra Lorena Diaz Martinez
	Profesional costos y presupuesto (50% mes)	1	Cristian Correcha
2.2.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	Abogado (10% mes)	1	Gustavo Adolfo Castro

2.3 AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El Consultor vinculo a su personal y verifico el estado de afiliaciones de los asesores, quedando al dia con la documentación de su personal administrativo y profesional, con sus afiliaciones y pagos a las entidades de Salud, ARL y Pensiones.

2.4 POLIZAS

El consultor CONCORCIO NVP, suscribió y actualizó de acuerdo con el Acta de Inicio de Consultoría, el día diez y nueve (19) de enero 2026, las siguientes pólizas a favor de INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC, según la Clausula Diez y siete que hace referencia a las "Polizas" del Contrato de Consultoría No. CC-419-2025, las cuales se encuentran al dia en amparos y fechas otorgados por SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificado con Nit. 860.028.415, descritos así:

Póliza	No. Poliza	Compañía Aseguradora	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	33-44-101270436	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 102.340.000	03/12/2025 a 03/10/2026
Calidad del servicio	33-44-101270436	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 102.340.000	03/12/2025 a 03/10/2026
Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	33-44-101270436	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	$ 25.585.000	03/12/2025 a 03/04/2029

2.5 COMITES

Durante el periodo se realizaron los siguientes Comités de Consultoria:

No. 03 (05 de febrero 2026) y No. 04 (12 de febrero de 2026), con la participación de los representantes de la Supervisión del IDPC, Consultor Consorcio NVP e Interventoría de estudios Quintero y Riaño S.A.

Las actas son realizadas por la Interventoría y entregadas a todos los miembros del comité por vía Internet, para revisión, observaciones y complemento, dando lectura para ser firmada como aceptación en el comité siguiente. En cada comité se trataron los aspectos administrativos, técnicos y financieros, registrando el estado de los compromisos acordados.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	Consorcio NVP
INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA **PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026**	**No. 01**

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" -
Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CAPITULO 2 - INFORME ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

2.6 ACTAS REALIZADAS

Se diligencio y firmo el ACTA DE INICIO, con fecha del 19 de enero 2026, con un plazo de ejecución de 4 meses.

2.7 DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	Acta de inicio
	Pólizas actualizadas.
	Certificación pagos seguridad social

2.8 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

- Para el contrato de consultoría No. CC-419-2025, se registró con fecha del Acta de Inicio, el diez y nueve (19) de febrero 2026, con una duración de cuatro (4) meses.

- El consultor Consorcio NVP ha cumplido con sus obligaciones de personal y afiliaciones al sistema de seguridad social integral.

- Se envió la documentación solicitada (Ficha de registro fotográfico, fichas de texto por fachada, Rotulo de planos de calificación y diagnóstico) por parte de la interventoría, según oficio 008-26-NVP-PLM, del 6 de febrero 2026.

- La interventoría solicitó mediante el oficio QYR–004–2026 del 9 de febrero de 2026, realizar ajustes a los formatos de trabajo entregados

2.10 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN



Arq. NÉSTOR VARGAS PEDRAZA
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
CONSORCIO NVP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ	Consorcio NVP
INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA **PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026**	**No. 01**

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CAPITULO 3 - INFORME FINANCIERO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

3.1 RESUMEN DEL CONTRATO

				% DE EJECUCION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	$ 511.700.000	20%

3.2 PAGOS REALIZADOS POR EL IDPC

VALOR PRIMER PAGO	30%	$	$ 0	

3.3 DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	FACTURA No.: No aplica para este periodo
	RUT: No aplica para este periodo
	RIT: No aplica para este periodo
	CERTIFICACIÓN BANCARIA: No aplica para este periodo

3.4 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS

El valor del contrato de consultoría CC-419-2025, corresponde a $511.700.000, con fecha de Acta de Inicio del diez y nueve (19) de enero 2026, para una fecha de terminación del contrato para el 18 de mayo 2026, con una duración de cuatro (4) meses. Para el primer período, se registra el primer pago del 30%, correspondiente a $153.510.000.
Se tiene programado para marzo el primer pago

3.5 CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN



Arq. NÉSTOR VARGAS PEDRAZA
DIRECTOR DE CONSULTORÍA
CONSORCIO NVP

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA - "PALACIO LIEVANO Y MUNICIPAL"


CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025

638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

4 - INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA - LOCALIZACIÓN TOMAS

PERÍODO: 19 DE ENERO DE 2026 AL 16 DE MARZO DE 2026

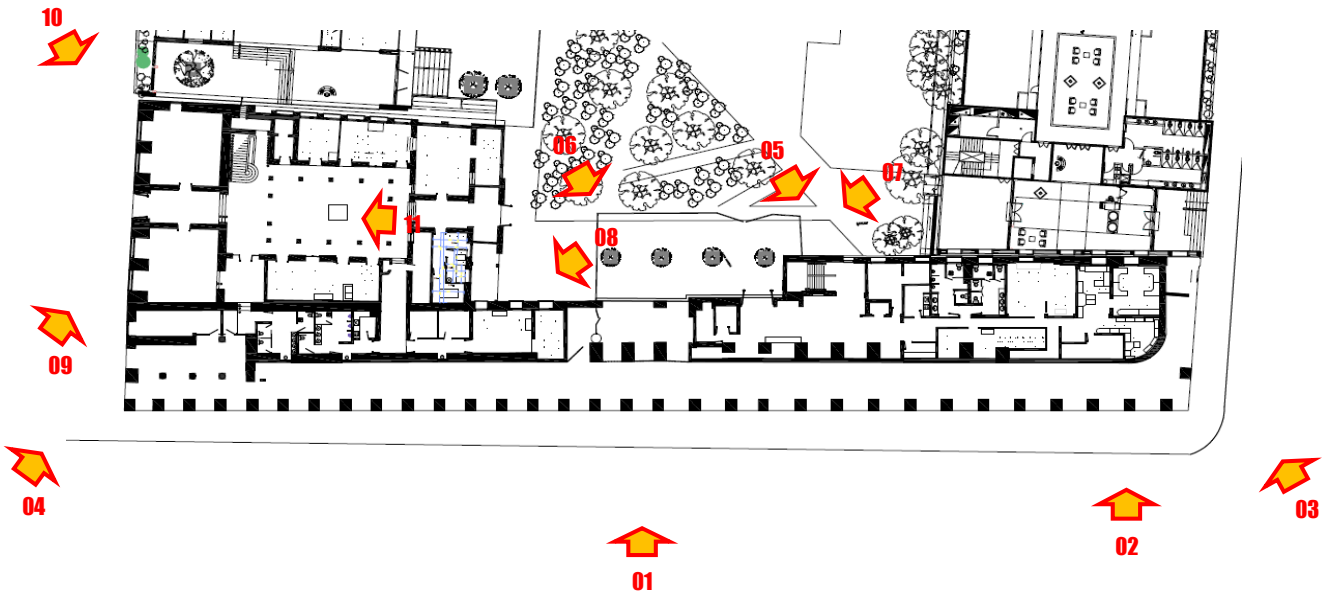

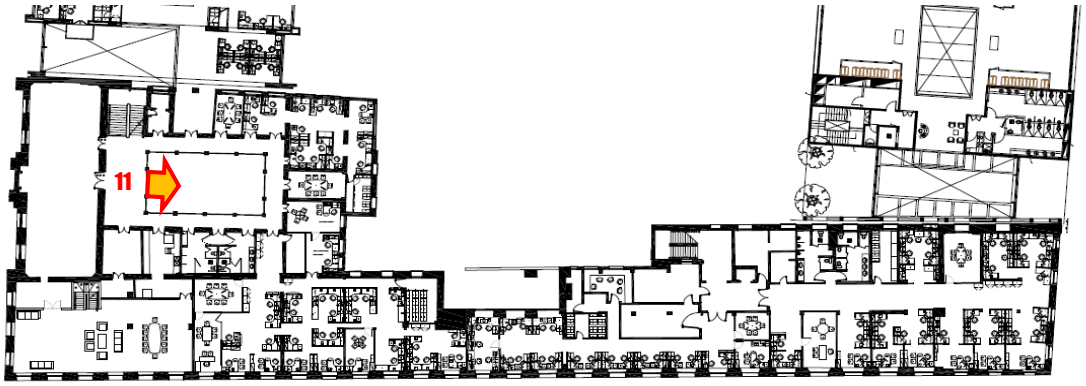

PLANTAS PRIMER Y TERCER PISO - "PALACIO LIEVANO"

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA - "PALACIO LIEVANO Y MUNICIPAL"

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

4 - INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026





1. FACHADA PRINCIPAL CARRERA 8: Inmueble resaltando sus acabados sobre las superficies.

2. FACHADA PRINCIPAL CARRERA 8: Detalle esquina con mansarda costado norte





3. FACHADA NORTE CALLE 11: Detalle esquina costado norte

4. FACHADA SUR CALLE 10: Detalle esquina costado sur

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA - "PALACIO LIEVANO Y MUNICIPAL"

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".


CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

4 - INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026



5. FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO: Detalle de vanos y adosamiento edificio contiguo costado norte

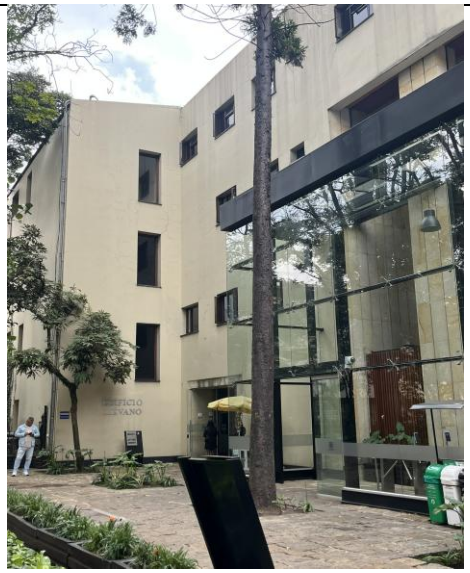

6. FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO: Detalle de vanos y marquesina en acceso



7. FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO: Costado occidental general



8. FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO: Detalle marquesina y cornisa interior

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA - "PALACIO LIEVANO Y MUNICIPAL"

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025
638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

4 - INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026



9. FACHADA PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL CALLE 10: Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos.



10. FACHADA PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL CALLE 10: Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos.



11. FACHADA INTERIOR PALACIO MUNICIPAL: Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos interiores del costado sur.



12. FACHADA INTERIOR PALACIO MUNICIPAL: Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos interiores del costado norte.

INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA - "PALACIO LIEVANO Y MUNICIPAL"

CONTRATO DE CONSULTORIA IDPC-CC-419-2025-COD. 637 - OBJETO: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C" - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC".

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDPC-CINT- 427-2025

638-Realizar la interventoría técnica, ambiental, jurídica, administrativa y financiera de la consultoría que tiene por objeto: "Elaboración de estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C - Convenio Interadministrativo No. 4233000-933-2025 suscrito con Secretaría General e IDPC"

4 - INFORME DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

PERIODO: 19 DE ENERO DE 2026 A 16 DE MARZO DE 2026

No. FOTO	DESCRIPCIÓN	ESPACIO
1	Inmueble resaltando sus acabados sobre las superficies.	FACHADA PRINCIPAL CARRERA 8
2	Detalle esquina con mansarda costado norte	FACHADA PRINCIPAL CARRERA 8
3	Detalle esquina costado norte	FACHADA NORTE CALLE 11
4	Detalle esquina costado sur	FACHADA NORTE CALLE 10
5	Detalle de vanos y adosamiento edificio contiguo costado norte	FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO
6	Detalle de vanos y marquesina en acceso	FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO
7	Costado occidental general	FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO
8	Detalle marquesina y cornisa interior	FACHADA INTERIOR PALACIO LIEVANO
9	Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos.	FACHADA PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL CALLE 10
10	Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos.	FACHADA PRINCIPAL PALACIO MUNICIPAL CALLE 10
11	Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos interiores del costado sur.	FACHADA INTERIOR PALACIO MUNICIPAL
12	Inmueble medianero resaltando sus acabados y ornamentos interiores del costado norte.	FACHADA INTERIOR PALACIO MUNICIPAL
